	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN, FEBRERO 2026

Contrato de Interventoria No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____/_____/_____

Periodo del Informe: Desde: 01/ 01 / 2026 Hasta: 31 / 01 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	*INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO IDE INTERVENTORIA*					
1.01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
2	*INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
2.01	Cuadro de trazabilidad : 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
3	*INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
3.01	Control de pólizas aprobadas del contrato de interventoria vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
4	*INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
4.01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)				X	Contratista
4.02	Información de avance financiero de la interventoria	X	X			Contratista
4.03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la interventoria	X	X			Contratista
4.04	Acta de pago del anticipo de interventoria (si aplica).				X	Contratista
4.05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de interventoria.	X	X			Contratista
4.06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de interventoria con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
5	*INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA*					
5.01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
6	*INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA*					
6.01	Cuadro de trazabilidad : 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliacion de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
7	*INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA*					
7.01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
8	*INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA*					
8.01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)	X	X			Contratista
8.02	Información de avance financiero de la obra	X	X			Contratista
8.03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la obra	X	X			Contratista
8.04	Acta de pago del anticipo de obra (si aplica).	X	X			Contratista
8.05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra	X	X			Contratista
8.06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de obra con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
9	*INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO*					
9.01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			Contratista
9.02	Dificultades presentadas durante la ejecución e imprevistos presentados en desarrollo de las actividades (si aplica)	X	X			Contratista
9.03	Informe jurídico del estado de cumplimiento e incumplimiento del contrato y actuaciones realizadas por la interventoria	X	X			Contratista
10	*INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO*					
10.01	Cuadro de relación de personal (administrativo - operativo) de interventoria propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) organigrama de personal	X	X			Contratista
10.02	Certificado del representante legal de la interventoria y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales del personal de obra y de interventoria, avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			Contratista
11	*CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS POR LA INTERVENTORIA VS OBRA Y SU CONCEPTO*					
12	*VERIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)*					
13	*INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO*					
13.01	certificación de interventoria, de existencia de permisos y licencias ambientales y prediales para la ejecución total del proyecto y su vigencia cada uno	X	X			Contratista
13.02	Certificación a la disposición de materiales	X	X			Contratista
13.03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			Contratista
13.04	Concepto de la interventoria en el cual se hace el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y Plan de Gestión del Riesgo (PGR) firmado por el profesional (si aplica).	X	X			Contratista
14	*ANEXOS*					
14.01	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			Contratista

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN, ENERO 2026

Contrato de Interventoria No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____/_____/_____

Periodo del informe: Desde: 18 / 12 / 2026 Hasta: 31 / 12 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
14,02	verificación de cartera topografica de obra y concepto (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)	X	X			Contratista
14,03	Copia de los ensayos de laboratorio (interventoria)				X	Contratista
14,04	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)	X	X			Contratista
14,05	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según apliqus (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			Contratista
14,06	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratad por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			Contratista
14,07	Informe de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de interventoria				X	Contratista
14,08	Copia bitacora de obra del periodo	X	X			Contratista
15	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			Contratista

NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoria, deben allegarse por la interventoria conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) dias del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días (V)

Revisó

DIEGO ARMANDO CAPDOSO GUERRERO
RA. interventoria

Aprobó

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Nota: se debe paginar los informes

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 02

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
(01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026)

INTERVENTORÍA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

La interventoría del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 se constituye como el mecanismo de control integral para la ejecución del proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán – Meta. Su alcance es multidisciplinario, abarcando los componentes técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La interventoría actúa como mecanismo de control y vigilancia permanente del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad, funcionalidad y correcta inversión de los recursos asignados al proyecto.
Dentro del alcance contractual de la interventoría se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:
- Supervisión y control técnico de las actividades ejecutadas en obra.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma físico y financiero.
- Verificación de cantidades de obra ejecutadas.
- Control de calidad de materiales, procesos constructivos y ensayos de laboratorio.
- Seguimiento administrativo, contractual y documental.
- Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales y SST.
- Revisión y trámite de actas, informes y soportes contractuales.
- Control y seguimiento a maquinaria, personal y equipos en obra.
- Emisión de conceptos técnicos, recomendaciones y observaciones a la entidad contratante.

1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

Puerto Gaitán es un municipio ubicado en el departamento de Meta. Incluye una extensa área de estructura plana conocida como las Sabanas de la Altillanura, cuyo eje principal es el río Meta.
El municipio es un rectángulo irregular circunscrito por el río Meta al norte, los ríos Manacacias y Yucao al oeste, el río Iteviare al sur y una línea recta al este. Forma el extremo noreste del departamento de Meta, siendo el municipio más alejado de la capital departamental, Villavicencio.Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.
Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.
Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y Recreación.
Límites del municipio:
Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripán y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

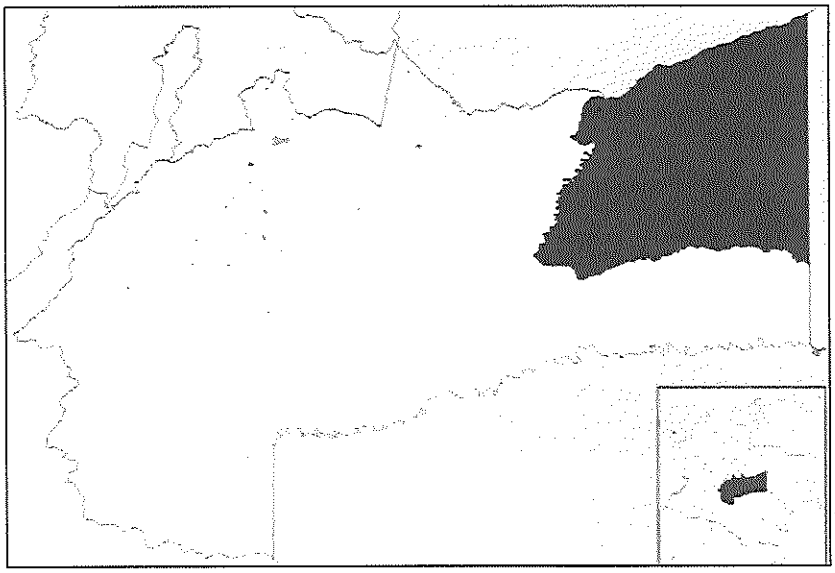


Ilustración 1. Localización de la cabecera municipal de Puerto Gaitán-Meta.

1.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

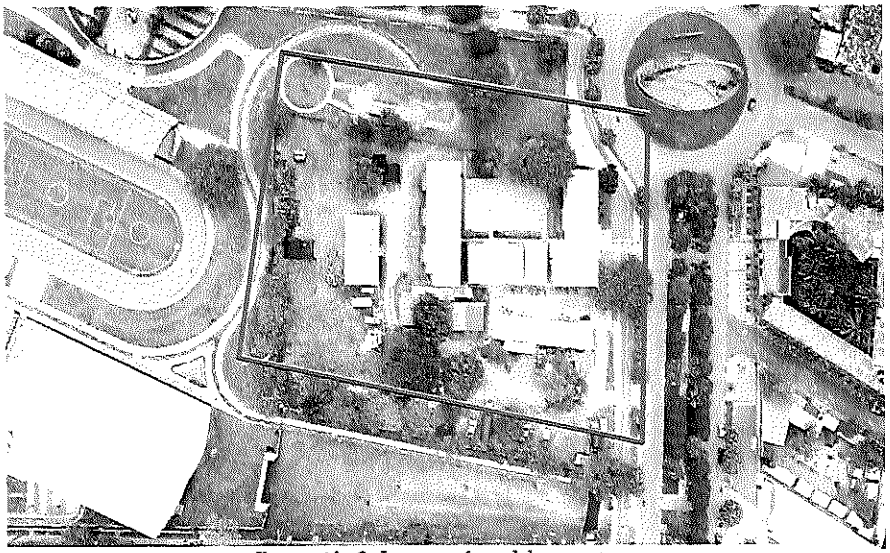


Ilustración 2. Imagen aérea del proyecto

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.

De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.

La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.

En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.

Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

1.5. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	utinterpolicia2025@gmail.com
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
MODIFICATORIA N.°1:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 Modificación a la cláusula decima octava del contrato de interventoría.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

3 INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de interventoría:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.3.3.4.01-R. B CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 74.136.286.00	DIS.2025002849	RES.2025004220
	$ 222.176.808,00	DIS. 2026000009	RES.2026000003
TOTALES	**$ 296.313.094,00**		

3.1. VERIFICACIÓN DE POLIZAS

SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	09/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	09/08/2026	09/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/12/2025	09/08/2029	$14,815,654.70	
SEGUROS DEL ESTADO	30-40-101025734 ANEXO 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	Aprobada
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

SEGÚN MODIFICATORIA No.01						
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


4.1. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
N/A	$		
N/A	$		
TOTALES	**$**		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	$ 00		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	**$ 00**

El Contrato Interventoría No. 1701 de 2025 no cuenta con anticipo.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

4.2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

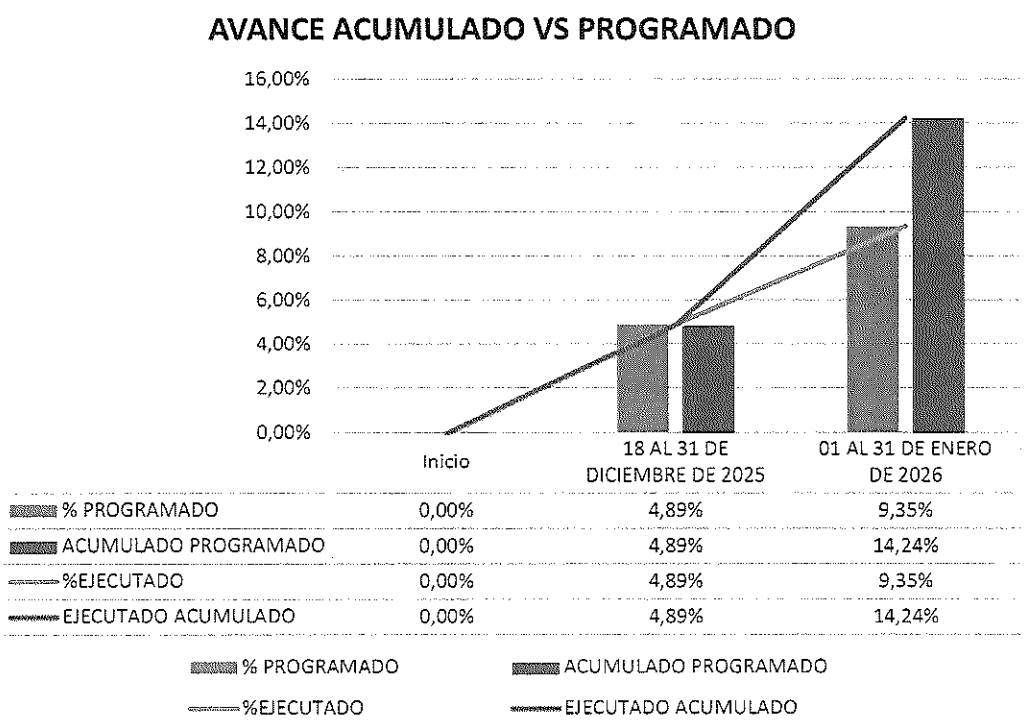

% PROGRAMADO	0,00%	4,89%	9,35%
ACUMULADO PROGRAMADO	0,00%	4,89%	14,24%
%EJECUTADO	0,00%	4,89%	9,35%
EJECUTADO ACUMULADO	0,00%	4,89%	14,24%

4.3. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$296.313.094
VALOR PROYECTO ACTUALIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 01 – 35%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 02 – 15%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

PERSONAL (NOMBRE Y IDENTIFICACION)	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES C,C 80.074.961	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C 1.121966360	CADENERO

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL



PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período comprendido entre el 01 enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RELACIÓN PLANILLA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (01/01/2026-31/01/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD		ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS		SURA	1079327449
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS		SURA	1079327449
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS		SURA	1079327449
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS		SURA	1079327449
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS		SURA	1079327449
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS		SURA	1079327449

OBRA

6 GENERALIDADES DEL CONTRATO:


Considerando que el municipio de Puerto Gaitán – Meta, en su plan de desarrollo "JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027", ha viabilizado, priorizado y aprobado proyectos de inversión los cuales se encuentran incluido el programa 4501 "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA". Con la finalidad de cumplir con la meta PDM0318 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO", fue adjudicado mediante la licitación pública LP-SI-010-2025, que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META", con código BPIN 202500000031783 Este proyecto se encuentra suscrito al contrato de obra pública 1683 del día tres (03) de diciembre de 2025, siendo perfeccionado con el acta de inicio de fecha el día dieciocho (18) de diciembre de 2025.


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.1. LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla un resumen de la ubicación del municipio.

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

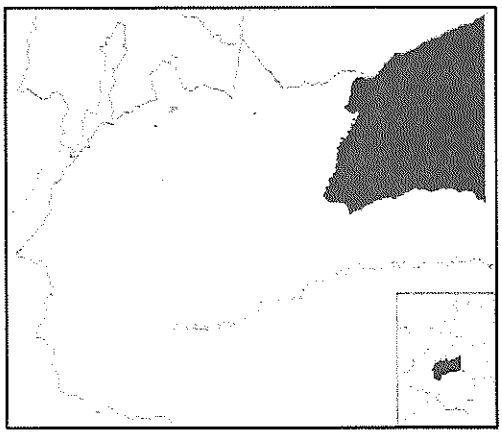

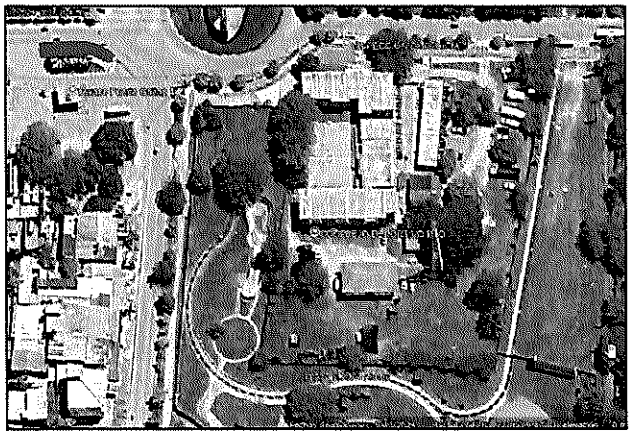

El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la Estación de Policía, ubicada en la Carrera 10 N.° 17-31, barrio Alto Manacacías. Este sector corresponde a un área estratégica del municipio, donde se concentra una parte significativa de la actividad administrativa, comercial y social del territorio.

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal. Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.
La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

6.3. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.

A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00
11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.306.277.668,00**

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

7 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	LP-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE OBRA NO. 1683 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	902.011.453-2
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	INGRID MARYORY GARCÍA FONSECA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. NO. 1.122.120.037 DE ACACIAS - META
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	UTINGEPOLICIAGAITAN@GMAIL.COM
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INGE POLICÍA GAITAN
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.306.277.668,00 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	17 DE AGOSTO DE 2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

7 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	LP-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE OBRA NO. 1683 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	902.011.453-2
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	INGRID MARYORY GARCÍA FONSECA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. NO. 1.122.120.037 DE ACACIAS - META
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	UTINGEPOLICIAGAITAN@GMAIL.COM
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INGE POLICÍA GAITAN
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.306.277.668,00 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	17 DE AGOSTO DE 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIONES, FECHA Y TIEMPO (SI APLICA EN ORDEN CRONOLÓGICO):	NO APLICA
ACTAS DE REINICIO Y FECHA, INDICANDO EL PLAZO YA EJECUTADO Y EL PLAZO RESTANTE DE EJECUCIÓN:	NO APLICA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

8 INFORMACION FINACIERA Y INFORMACION DE INVERSION DEL ANTICIPO

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de obra:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 620.406.812,00	DIS.2025002848	RES.2025004223
	$ 3.685.870.856,00	DIS.2026000007	RES.2026000004
TOTALES	**$ 4.306.277.668,00**		

BALANCE FINANCIERO

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
EGR.2026010031	$1.431.837.324,61	ANTICIPO No. 01 CTO 1683/2025 – 35%	21/01/2026
TOTALES	$1.431.837.324,61		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	$1.431.837.324,61		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	**$ 00**

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

VERIFICACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

SEGUN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 0	Cumplimiento	02/12/2025	02/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	02/12/2025	02/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	02/08/2029	$ 215.313.883,40	
		Estabilidad y calidad	02/12/2025	02/12/2030	$ 430.627.766,80	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2	Cumplimiento	18/12/2025	18/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	18/12/2025	18/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	18/12/2025	18/08/2029	$ 215.313.883,40	
		Estabilidad y calidad	18/12/2025	18/12/2030	$ 430.627.766,80	


SEGUN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101025675 ANEXO 0	Predios labores y operaciones	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Perjuicios extrapatrimoniales	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Responsabilidad civil patronal	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Vehículos propios y no propios	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871	Predios labores y operaciones	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

	ANEXO 1 Y 2	Perjuicios extrapatrimoniales	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Responsabilidad civil patronal	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Vehículos propios y no propios	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	


9 PROGRAMADO VS EJECUTADO (GRAFICAS) AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%

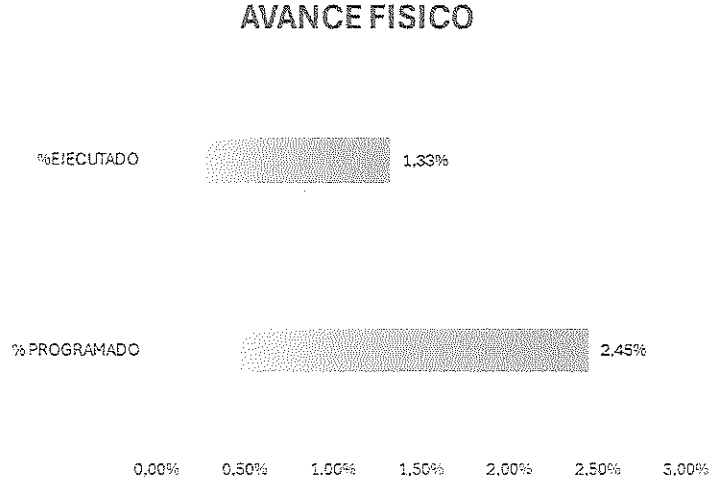


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

TABLA DE SEGUIMIENTO $

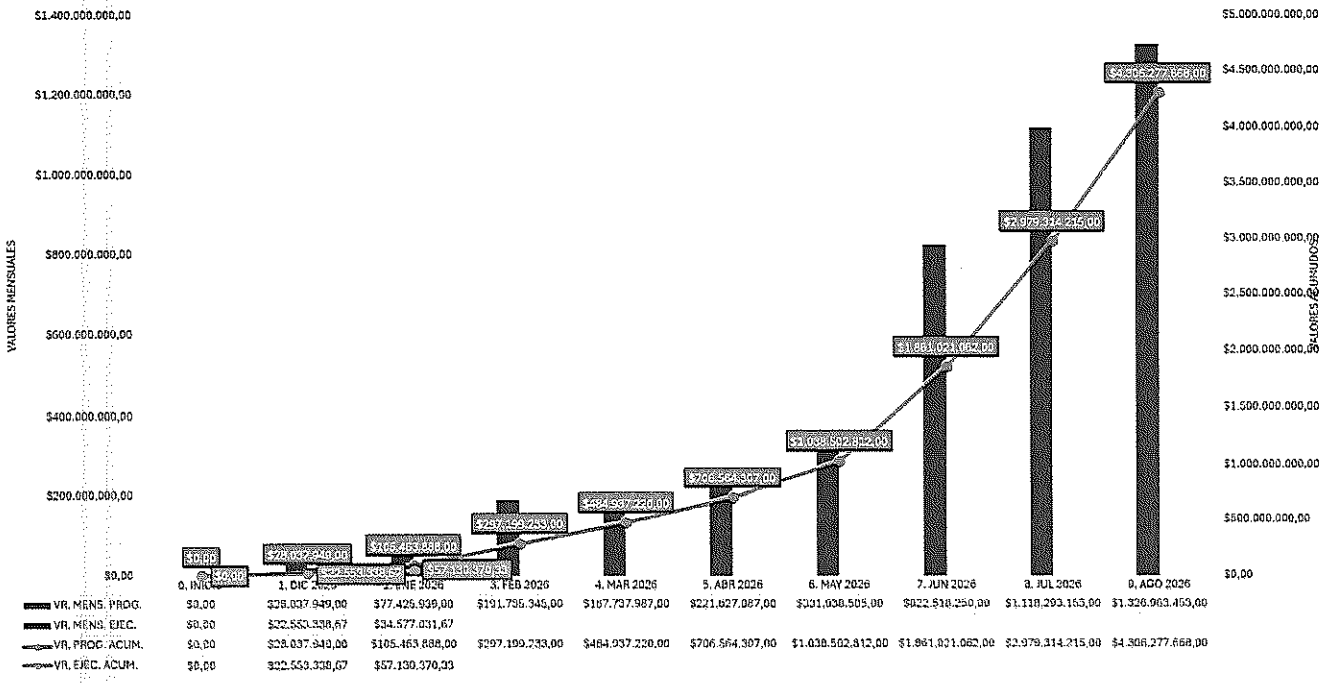

	0. INICIO	1. DIC 2025	2. ENE 2026	3. FEB 2026	4. MAR 2026	5. ABR 2026	6. MAY 2026	7. JUN 2026	8. JUL 2026	9. AGO 2026
VR. MENS. PROG.	$0,00	$28.037.940,00	$77.426.939,00	$191.795.345,00	$187.737.987,00	$221.627.087,00	$331.938.505,00	$822.518.250,00	$1.118.293.153,00	$1.326.963.453,00
VR. MENS. EJEC.	$0,00	$22.553.338,67	$34.577.031,67							
VR. PROG. ACUM.	$0,00	$28.037.940,00	$105.463.888,00	$297.199.233,00	$484.937.220,00	$706.564.307,00	$1.038.502.812,00	$1.861.021.062,00	$2.979.314.215,00	$4.306.277.668,00
VR. EJEC. ACUM.	$0,00	$22.553.338,67	$57.130.370,33							

TABLA DE SEGUIMIENTO %

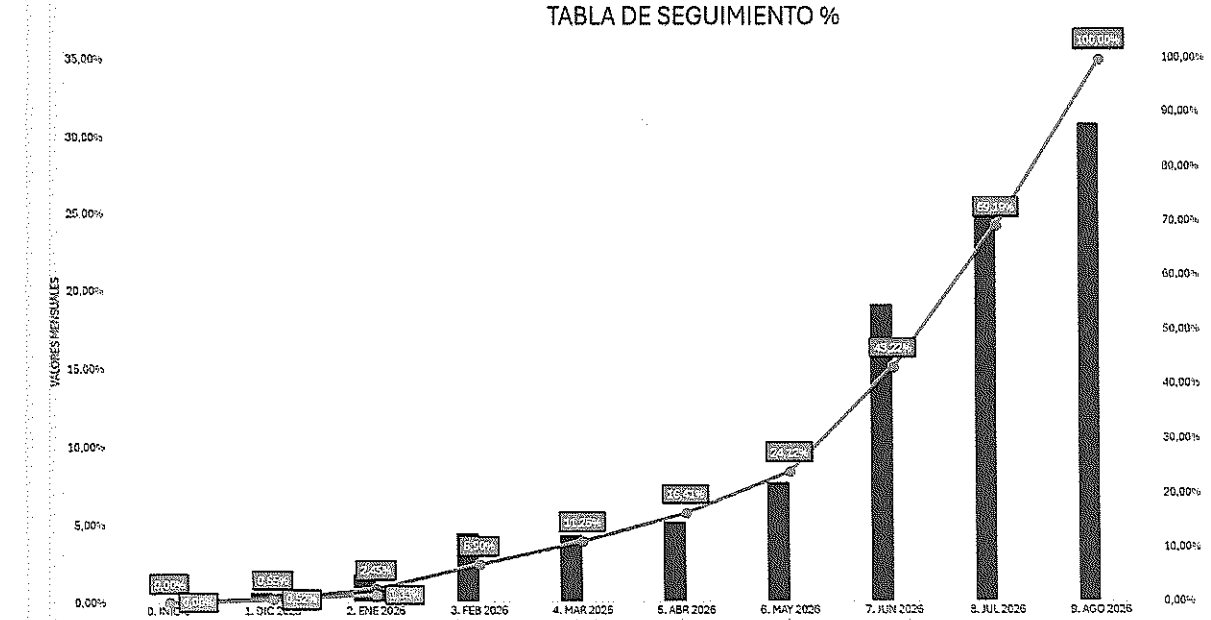

	0. INICIO	1. DIC 2025	2. ENE 2026	3. FEB 2026	4. MAR 2026	5. ABR 2026	6. MAY 2026	7. JUN 2026	8. JUL 2026	9. AGO 2026
% MENS. PROG.	0,00%	0,65%	1,80%	4,45%	4,36%	5,15%	7,71%	19,10%	25,97%	30,81%
% EJEC. MENS.	0,00%	0,52%	0,80%							
% PROG. ACUM.	0,00%	0,65%	2,45%	6,90%	11,26%	16,41%	24,12%	43,22%	69,19%	100,00%
% EJEC. ACUM.	0,00%	0,52%	1,33%							

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

10 EVALUACION DEL AVANCE EJECUTADO VS PROGRAMADO (INCLUYE DIFICULTADES, PROBLEMATICAS E IMPREVISTOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION)

En cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia, seguimiento y control técnico, administrativo y contractual, la interventoría realizó la revisión y verificación de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, correspondientes al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, cuyo objeto es la Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, constatando el inicio formal de la etapa de ejecución física del proyecto conforme a la programación contractual.

Como resultado de las visitas técnicas, inspecciones de campo y revisión de los registros de obra, la interventoría verificó la correcta ejecución de las actividades preliminares correspondientes al frente de nuevos alojamientos, evidenciando el desarrollo de las labores de descapote manual, excavación mecánica en material común, cargue, transporte y manejo del material producto de la excavación, constatando que dichas actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos aprobados y las condiciones establecidas en los documentos contractuales.

Así mismo, la interventoría verificó la ejecución de las actividades de localización, trazado y replanteo correspondientes a los frentes del tanque elevado de almacenamiento y del cerramiento perimetral, constatando la correcta materialización de ejes, alineamientos, linderos y puntos de referencia necesarios para el desarrollo de las obras, con fundamento en la información topográfica y los diseños aprobados.

De manera paralela, la interventoría realizó seguimiento al proceso de revisión técnica de los estudios y diseños suministrados por la entidad contratante, verificando conjuntamente con el equipo técnico del contratista los componentes hidráulicos, eléctrico y demás especialidades del proyecto. Como resultado de dicho proceso, se evidenció la existencia de aspectos técnicos que requieren ajustes y complementaciones para garantizar la funcionalidad integral de la infraestructura proyectada.

En el componente hidráulico, la interventoría verificó que los análisis preliminares realizados por el contratista evidencian que la capacidad del tanque elevado contemplado en los diseños resulta insuficiente para atender la demanda hidráulica del complejo, razón por la cual se avala la continuidad de los estudios técnicos orientados a definir la alternativa más adecuada para garantizar la continuidad y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua.

De igual manera, la interventoría constató que el diagnóstico efectuado sobre la infraestructura eléctrica existente evidencia condiciones de deterioro e insuficiencia en la capacidad instalada para atender la ampliación proyectada, motivo por el cual se continúa con las actividades de inspección, levantamiento de información y evaluación técnica que permitan definir las intervenciones requeridas para asegurar la operatividad del sistema eléctrico.

Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó igualmente la ejecución de actividades complementarias no previstas inicialmente dentro del proceso constructivo, entre ellas la construcción de un cerramiento provisional interno, implementado como medida de control para restringir el acceso de personal ajeno a las áreas de trabajo y fortalecer las condiciones de seguridad durante la ejecución de la obra. Así mismo, se constató la adecuación del campamento de obra, incluyendo las áreas destinadas para oficina técnica, bodega de materiales y espacios de apoyo operativo, verificando que estas instalaciones cumplen con las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y constructivas.

En materia ambiental, la interventoría realizó seguimiento a las actividades adelantadas por el contratista relacionadas con la verificación de la cobertura vegetal existente dentro del área de influencia del proyecto, constatando que las evaluaciones realizadas se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de la normativa ambiental vigente, particularmente en lo relacionado con la identificación de individuos arbóreos susceptibles de intervención y la gestión de los respectivos permisos cuando estos sean requeridos.

Respecto al componente de movilidad, la interventoría verificó el avance en la formulación y trámite del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), constatando que el documento fue elaborado y radicado ante la autoridad competente, encontrándose en proceso de revisión para su aprobación por parte de la Secretaría

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

de Movilidad del municipio de Puerto Gaitán, requisito indispensable para la ejecución de actividades que involucren el tránsito de maquinaria, equipos y vehículos de carga.

Así mismo, la interventoría deja constancia de que las actividades de revisión técnica, inspección y levantamiento de información especializada presentaron una incidencia menor en los tiempos inicialmente programados, atribuible a los protocolos de seguridad y control de acceso establecidos en las instalaciones de la Estación de Policía. No obstante, se verificó que el contratista implementó las medidas logísticas necesarias para minimizar dichos efectos y garantizar la continuidad de las actividades.

11 ACTUALIZACIONES DE LA INTERVENTORIA
N/A

12 INFORME SISO Y AMBIENTAL GENERAR (ANEXOS)

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, inspección, vigilancia y control establecidas en el contrato de interventoría, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se realizó la revisión y verificación de la gestión desarrollada por el contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Seguridad Industrial (SISO) y Gestión HSEQ, constatando su implementación conforme al avance físico del proyecto, a la normatividad vigente y a las obligaciones contractuales.

Como resultado de las inspecciones realizadas en los diferentes frentes de obra, la interventoría verificó que las actividades correspondientes a la localización y replanteo, descapote manual y excavación mecánica en material común fueron ejecutadas bajo la aplicación de medidas preventivas orientadas a la identificación, evaluación y control de los riesgos inherentes a cada proceso constructivo, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Plan HSEQ del proyecto.

La interventoría constató que el contratista implementó los mecanismos de planificación, seguimiento y control requeridos para la gestión de los riesgos laborales, verificando la elaboración, actualización y aplicación de la documentación HSEQ correspondiente, incluyendo los formatos de inspección, registros operacionales y demás soportes exigidos para el desarrollo seguro de las actividades ejecutadas durante el periodo.

Así mismo, se verificó la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos asociados a las actividades de excavación, movimiento de tierras y replanteo topográfico, constatando la implementación de medidas de control encaminadas a minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y condiciones inseguras durante la ejecución de las labores.

Durante las visitas técnicas de seguimiento, la interventoría verificó la realización de las jornadas de socialización de procedimientos seguros de trabajo y de las medidas preventivas aplicables a cada frente de obra, evidenciando la participación del personal operativo y el fortalecimiento de la cultura preventiva dentro del proyecto.

De igual manera, se efectuó el control permanente sobre el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal vinculado a la obra, verificando su disponibilidad, estado de conservación y utilización conforme a los riesgos identificados para cada actividad, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La interventoría también realizó seguimiento a las condiciones generales de seguridad en los frentes de trabajo, verificando aspectos relacionados con el orden y aseo, señalización preventiva, delimitación de áreas de intervención, control de acceso, condiciones de tránsito interno y aplicación de medidas de prevención para el desarrollo seguro de las actividades constructivas, sin evidenciar situaciones que comprometieran la integridad del personal o la continuidad de la ejecución del proyecto.

En el componente ambiental, la interventoría verificó que las actividades ejecutadas durante el periodo se desarrollaron bajo criterios de prevención y control de impactos ambientales, evidenciando la implementación de buenas prácticas para el manejo de materiales, control de emisiones de material particulado y preservación de las áreas intervenidas, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

13 INFORME DE ESTADO DE TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS (AMBIENTALES, CONSTRUCCION ENTRE OTRAS)

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, legal y ambiental establecidas en el contrato de interventoría, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se efectuó la revisión y verificación del estado de los trámites, permisos, licencias y demás requisitos normativos aplicables al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, constatando el avance de las gestiones requeridas para la adecuada ejecución del proyecto.

Como resultado de la revisión documental, la interventoría verificó que el contratista dispone de la documentación legal que soporta la viabilidad de la intervención, evidenciándose la existencia y vigencia del Certificado de Tradición y Libertad, el certificado predial y la Licencia de Construcción, documentos que acreditan la titularidad del inmueble y la autorización para la ejecución de las obras, conforme a la normatividad urbanística y demás disposiciones legales aplicables. La interventoría deja constancia de que dichos documentos reposan como soporte documental en los anexos del presente informe y fueron objeto de revisión para efectos de seguimiento y control contractual.

En materia ambiental, la interventoría realizó seguimiento a las actividades asociadas al manejo y disposición temporal de los materiales provenientes de las labores de descapote, excavación y limpieza del área de intervención, verificando que el contratista implementó medidas de control para su almacenamiento provisional dentro del predio, en sectores previamente definidos y acondicionados para tal fin, garantizando condiciones adecuadas de orden, estabilidad, seguridad y manejo ambiental.

Así mismo, la interventoría verificó que, debido a que el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) se encontraba en proceso de revisión y aún no contaba con la aprobación de la autoridad competente, no era procedente el ingreso de volquetas para el transporte y disposición externa del material producto de las excavaciones. En consecuencia, se constató que el contratista adoptó como medida temporal el acopio interno de dichos materiales, sin evidenciar afectaciones a la operación de la obra ni incumplimientos frente a los lineamientos ambientales establecidos para esta etapa del proyecto.

Durante las visitas de inspección, la interventoría verificó igualmente la implementación de medidas preventivas orientadas a minimizar la generación de material particulado, controlar la dispersión de sedimentos y preservar las condiciones de limpieza y organización del área de intervención, evidenciando el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales mientras se surten los trámites necesarios para la aprobación del PMT y la posterior disposición final del material en sitios debidamente autorizados.

Adicionalmente, la interventoría realizó seguimiento al estado de los trámites ambientales asociados al proyecto, verificando el avance de las gestiones requeridas para la evaluación de la cobertura vegetal existente y la obtención de las autorizaciones que resulten aplicables para la intervención de individuos arbóreos, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en la normatividad ambiental vigente.

14 INFORME DE VERIFICACION DE TOPOGRAFICA DONDE SE COMPARE LA TOPOGRAFIA REALIZADA VS LO PROGRAMADO

N/A

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

15 CUADRO RESUMEN DE LABORATORIOS Y RESULTADOS DE INTERVENTORIA VS OBRA

Durante el periodo del presente informe no aplica resultados de laboratorio

16 ACTAS SUSCRIPTAS

- **ACTA DE INICIO**

17 CUADRO DE CORRESPONDECIA- RELACION

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
N/A				

18 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Con fundamento en las actividades de seguimiento, inspección, control y verificación realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, la interventoría reviso, verifico y avalo el inicio formal de la etapa de ejecución física del proyecto, constatando que las actividades preliminares de localización, trazado, replanteo topográfico y arquitectónico, descapote manual y excavación mecánica en material común fueron ejecutadas conforme a los procedimientos constructivos, las especificaciones técnicas y la programación establecida para esta fase. Así mismo, se evidenció que la preparación de los frentes de trabajo se desarrolló bajo condiciones técnicas adecuadas, garantizando el control del manejo del material producto de las excavaciones y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y orden en obra.

Como resultado de la revisión técnica efectuada por la interventoría sobre los estudios y diseños suministrados por la entidad contratante, se verificó la existencia de aspectos técnicos que requieren ajustes y complementaciones para garantizar la funcionalidad integral del proyecto. En particular, se constató que el sistema de almacenamiento de agua proyectado presenta una capacidad insuficiente para atender la demanda del complejo y que la infraestructura eléctrica existente evidencia limitaciones de capacidad y condiciones de deterioro que hacen necesaria su intervención. En consecuencia, la interventoría avala la continuidad de los estudios y diagnósticos especializados, por considerarlos técnicamente necesarios para definir las soluciones que permitan asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

La interventoría deja constancia de que las actividades de revisión, inspección y levantamiento de información técnica desarrolladas durante el periodo presentaron una incidencia controlada en los tiempos inicialmente programados, atribuible a los protocolos de seguridad y control de acceso establecidos en las instalaciones de la Estación de Policía. No obstante, se verificó que esta condición no ha comprometido la calidad de las evaluaciones realizadas ni el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos para el desarrollo del proyecto.

En materia ambiental, la interventoría verificó el avance de las actividades de evaluación de la cobertura vegetal y el seguimiento a las condiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), constatando que las acciones adelantadas por el contratista se orientan a identificar los posibles impactos derivados de la intervención y a gestionar oportunamente las autorizaciones ambientales requeridas. En este sentido, se considera que el componente ambiental se desarrolla de manera preventiva y conforme a la normatividad vigente, garantizando la sostenibilidad de las futuras actividades constructivas.

Respecto al componente de movilidad, la interventoría verificó que el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) continúa en trámite de revisión ante la autoridad competente, condición que constituye un requisito previo para la movilización de maquinaria pesada y vehículos de carga hacia el proyecto. En consecuencia, se deja constancia de que el contratista ha implementado medidas logísticas temporales

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

para el desarrollo de las actividades autorizadas, sin evidenciar incumplimientos frente a las disposiciones normativas aplicables.

19 ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO.
2. COPIA DE BITACORA.
3. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA.
4. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA.
5. NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.
6. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA.
7. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA.
8. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA.
9. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO.




Ing. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025




NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO 01/01/2026 AL 31/01/2026

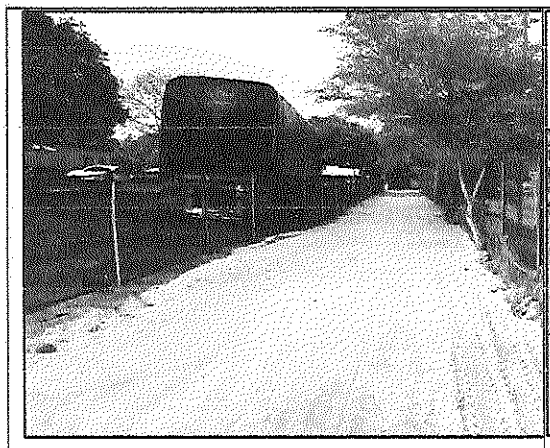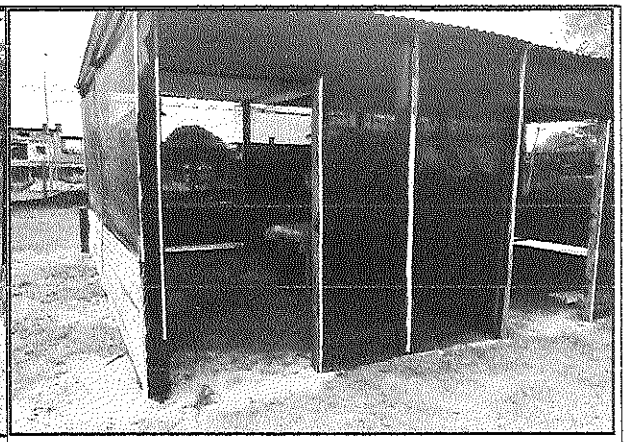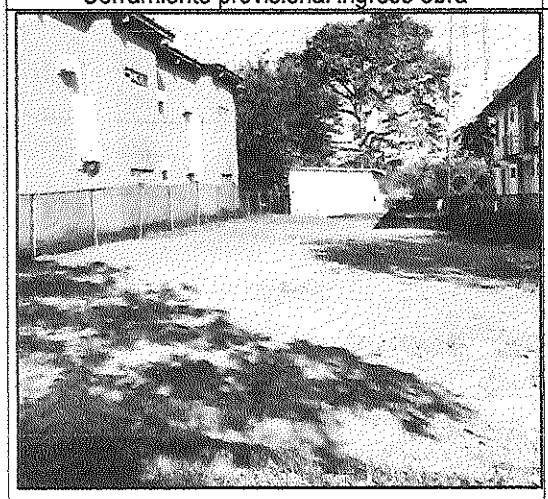	
Cerramiento provisional ingreso obra	Campamento provisional
	
Descapote manual de alojamientos nuevos	Excavación mecánica

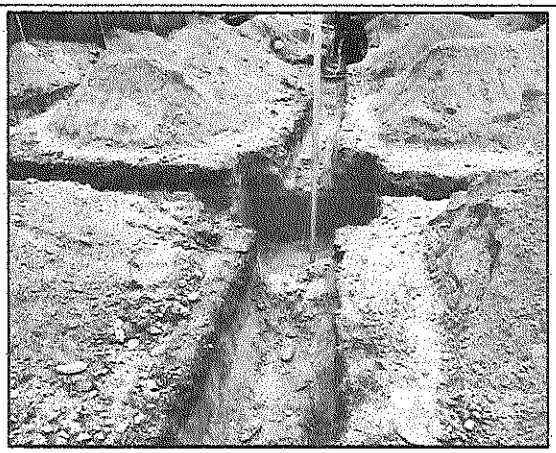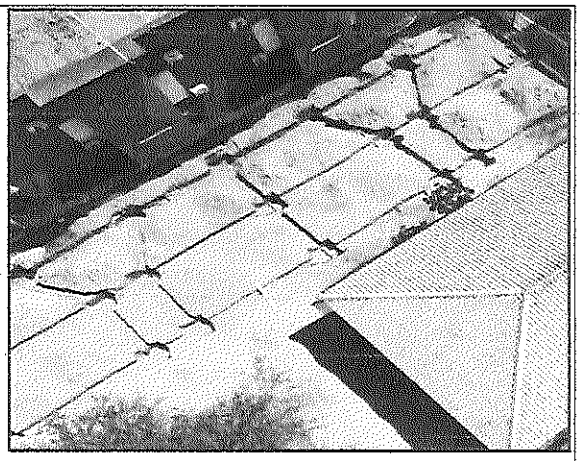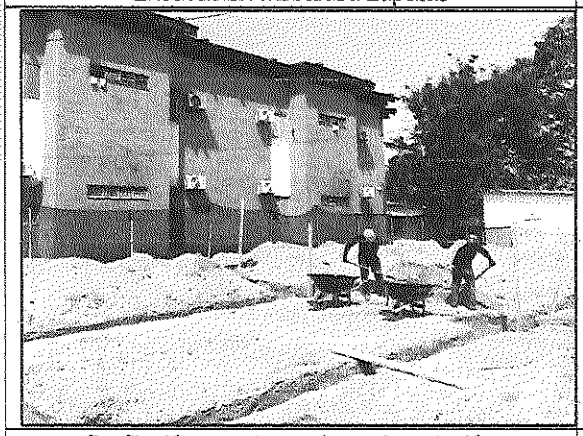	
Excavación mecánica zapatas	Excavación mecánica zapatas
	
Perfilación zapatas y vigas cimentación	Perfilación zapatas y vigas cimentación

ANEXO 2.
COPIA DE BITACORA

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO	0	MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se laboró por día festivo.

OBSERVACIONES:

C: Conforme		JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Adecuación Campamento Obra		Estación Policía	X	
Cerramiento Interno.		11	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq e inducción al personal, verificación del uso de EPP y rutina de Cotidianeidad. Se ejecutaron actividades preliminares de adecuación del Campamento de Obra y organización inicial del área.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
TOPOGRAFO	1	Minicargador	1	X				
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Cerramiento interno		Estación Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre riesgos locativos y mecanicos, se realiza estiramiento laboral. Ejecución de cerramiento interno provisional con lona y malla rollizo. Atención de imprevistos asociados a la delimitación del área.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir Impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 ENERO 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se laboró - Día Domingo.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
TOPOGRAFO	1	Unicargador	1	X				
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Construcción Campamento		Estación Policía	X	
Cerramiento lateral		Estación Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
	X			X	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla Hseq Sbe Socialización y Circulación interna, con Satisfacción · Continuación de Cerramiento interno y ajustes por condiciones del terreno. Avance en adecuación de Campamento.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 06 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
TOPOGRAFO	1	Mini Cargador	1	X				
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Cerramiento interno.		Estación Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
	X			X	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
	X				X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
		X			X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 06 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla Hseq sobre el Manejo seguro de herramientas y Maquinaria, se realiza la calistenia. Se inicia la adecuación para el ingreso a la obra mediante el suministro y extendido de material de afirmado para el ingreso de Vehiculos y Maquinaria del proyecto.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 .

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
TOPOGRAFO	1	Mincargada	1	X				
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Cerramiento Provisional		Estación Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hsq sobre el control ambiental y manejo de residuos, se realiza aislamiento y se continua con la adecuacion del acceso y se realizan excavaciones por empuñador operativo =

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER BECERRA FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 2.

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Localización y Replanteo	M2	Estación de Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre trabajo seguro en excavaciones y se realiza aislamiento. Se realizan actividades de localización y replanteo de las áreas a intervenir conforme a los planos del proyecto.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 09 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	-	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Localización y replanteo	M2	Estación Policia.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISIGTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 09 enero 2026.	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq sobre ergonomia y postura de trabajo, se realiza calistenia.

Se continua con la localización y replanteo, se realiza preparación del área para descapote.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0
PLAZO ACTUAL: 8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS: / DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Descapote manual	M2	Estación de Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISIGTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a tal actividades con la charla hseq sobre riesgos físicos y uso de EPP, se realiza caracterización.

Se realiza ejecución de descapote Manual en las áreas puntualmente localizadas.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se trabajó por día domingo.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	x	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se laboró por día festivo.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 1

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	✓	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	✓	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	✓	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	✓	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	0			Botas	✓	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Descapote Manual	M2	Estacion de Policia	✓	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 1

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq enfocada en las excavaciones mecanicas, se realiza calistenia. Se continua con el descapote manual y la limpieza general del area intervenida.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	✓	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir Impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanica	M3	Estacion de Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre seguridad con maquinaria pesada, se realizan coordenadas. Se inicia excavación mecanica en las áreas autorizadas Del proyecto.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanica	M3	estacion Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hrg Sobre prevención de accidentes laborales, se realiza calistenia. Se continua con la excavación mecánica y retiro de material producto de excavación.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora deba venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	✓		Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavacion mecanica	m3	Estacion de Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre el control de riesgos operativos, se realiza calistenia.
Se Avanza en la excavación mecanica y conformación nivel del terreno.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecánica	M3	Estación Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inicia actividades con la charla Hseq sobre el uso adecuado de EPP, se realizo calistenia.
Se continua Excavacion mecanica

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER A B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Casco		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se trabajó el día Domingo.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 enov 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación Mecanica	M3	Estacion Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 enero 2026 .	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre orden y aseo en obra.
Se avanza en la excavación mecánica y verificación de niveles conforme al replanteo.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanica	M3	Estación de policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 ENERO 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq sobre condiciones inseguras y actos inseguros, se realiza evidencia.

Se continua con la excavación mecanica y retiro de excedentes.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	✓		Cascos	✓	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	✓	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	✓	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	✓	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	✓	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavacion mecanica	M3	Estacion de Policia	✓	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 enero 2026.	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio con las actividades con la charla hseq sobre riesgos ambientales y control de polvo, se realiza el listado. Se realiza ingreso de acceso de vehículos con material de arrecife y se continua con la excavación mecanica.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 ENERO 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Cerramiento Interno		Estación Policía	X	
Excavación mecánica	m3	Estación Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 ENERO 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla HSEQ sobre señalización y control de acceso, se realiza caracteriza se realizan Ajustes al cerramiento interno y actividades complementarias de excavación

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	✓		Cascos	✓	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	✗	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	✓	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	✓	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	✗	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanica	M3	Estación Policia	✓	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza Charla sobre manejo de materiales, se realiza Asistencia.

Se continua con la excavacion mecanica y limpieza de frente de Obra.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	✓	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 24 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	✓	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	✓	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	✓	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	✓	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	✓	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavacion mecanica	M3	Estacion Policia	✓	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 24 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hoy sobre primeros auxilios y respuesta ante emergencias, se realiza calistenia se avanza en excavacion mecanica y organizacion de la area intervenida

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÀCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se laboró por día domingo.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanica	M3	Estacion Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre identificación de peligros, se realiza calistenia. Se continua actividad de excavación mecanica y limpieza de muros.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER K B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanica	M3	Estacion Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre el control de riesgos generales, se realiza caliseteria
Se continua con la excavación Mecanica y retiro de material sobrante.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación Mecanica	M3	Estación de Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla diaria sobre trabajo seguro y uso de EPP, se realiza caracterización Se realizan Ajustes finales en excavaciones conforme a especificaciones técnicas.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	Y	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	Y	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	Y	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	Y	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	Y	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanicas	M3	Estación de Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre orden y aseo, se realiza calistenia. se continua con la excavación mecánica y nivelación del terreno.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 30 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	1	X		Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavación mecanica	M3	Estación de Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 30 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq sobre prevención de accidentes, se realiza calistenia. Se realizan actividades complementarias de excavación y limpieza del área.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 31 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	1	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Orden y Aseo		Estación Policia	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 31 enero 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades con la charla hseq de cierre mensual, se realiza calistenia
Se realiza revisión general de actividades ejecutadas durante el mes, se realiza organización del área de Obra, campamento, acceso y cerramiento interno

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ANEXO 3.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-14, 10:50:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079310169

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 14/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		
Documento	NI902011453	**Dirección**	CL 2 #27 - 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	GARCIA FONSECA INGRID MARYORY	**Identificación**	CC 1121837768
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121863524	JENNY PAOLA FERIA TRIANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121867537	YORLI YULIETH LOZANO GONZALEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 291.818	$ 46.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF34) COFREM	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121956149	JHONATAN MORALES SALCEDO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF34) COFREM	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	8,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 498.600
CC 17346598	PEDRO NEL LEAL LEAL	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 80166369	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80169145	JUAN CARLOS SOLANO BONILLA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 118.625	$ 19.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 118.625	$ 4.800	6,960	$ 118.625	$ 8.300	(CCF34) COFREM	$ 118.625	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.900
CC 93372770	SEGUNDO ROA CRUZ	01	00	X																6	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 291.818	$ 11.700	8,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF34) COFREM	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.805.544	$ 11.556.449	$ 11.556.449	$ 11.556.449	$ 1.569.200	$ 611.600	$ 804.800	$ 462.800	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.536.100	$ 9.600	$ 3.545.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 4.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Los suscritos **INGRID MARYORY GARCIA FONSECA** identificado con la cedula de ciudadanía **1.121.837.768** de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN** identificada con **Nit. 902.011.453-2**, y **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.071.198 y Tarjeta profesional 187.220-T en mi condición de **CONTADOR PUBLICO**, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo comprendido del 01/01/2026 al 31/01/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los quince (15) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

R.L. INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

CESAR OSWALDO SOTO H.
CONTADOR PUBLICO
T.P 187.220-T

Puerto Gaitán, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.071.198

SOTO HERNANDEZ

APELLIDOS

CESAR OSWALDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1982

MITU
(VAUPES)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	B+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-FEB-2000 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5205000-00363556-M-0086071198-20130303 0029375069A 2 97367233

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187220-T



CESAR OSWALDO
SOTO HERNANDEZ
C.C. 86071198
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/02/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199044

187784

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 5 0 5 A B F 0 7 C 7 3 F Z Z 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86071198 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 187220-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO 5.
NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 AL 31-01-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892064	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	140,000	140,000	280,000	3,220,000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3,558,750	3,558,750	-	3,558,750	142,350	142,350	284,700	3,274,050	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
						14,062,370	996,380	16,058,750	562,495	562,495	1,124,990	13,933,760	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 09:24:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079327449

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 14/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	N!902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121884182	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121892054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966369	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074951	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053763	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 2.250.200	$ 562.800	$ 978.900	$ 562.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.354.700	$ 108.700	$ 4.463.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 7.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA


UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

Los suscritos DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO identificado con la cedula de ciudadanía 86.088.145 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025 identificado con Nit. 902.014.419-5, y JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.848.323 y Tarjeta profesional 180143-T en mi condición de CONTADOR PUBLICO, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo de enero comprendido del 01/01/2026 al 31/01/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Dada en Villavicencio, a los quince (15) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR PUBLICO
T.P 180143-T

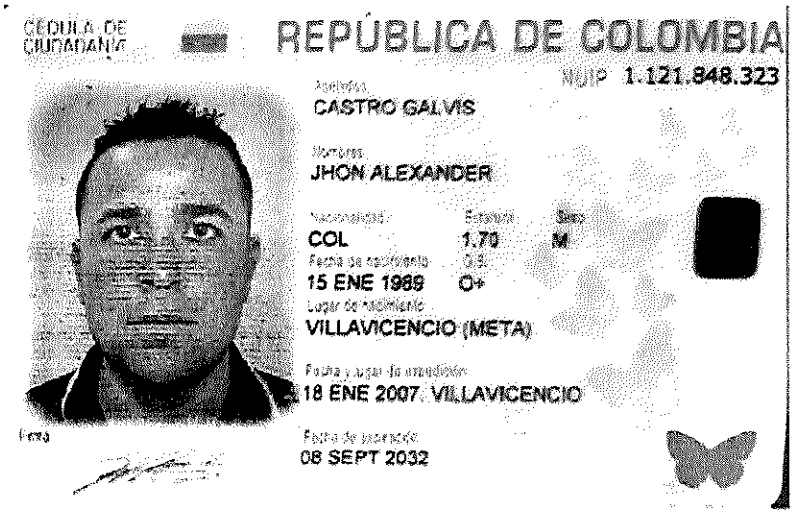

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.121.848.323

Apellidos
CASTRO GALVIS

Nombres
JHON ALEXANDER

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.70
Sexo: M
Fecha de nacimiento: 15 ENE 1989
G.S.: O+
Lugar de nacimiento
VILLAVICENCIO (META)

Fecha y lugar de expedición
18 ENE 2007. VILLAVICENCIO

Firma

Fecha de vencimiento
08 SEPT 2032

.CO

033884599

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0038845998520O1<<<<<<<<<<
8901158M3209088COL1121848323<1
CASTRO<GALVIS<<JHON<ALEXANDER<




República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

180143-T

JHON ALEXANDER
CASTRO GALVIS
C.C. 1121848323
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 191641

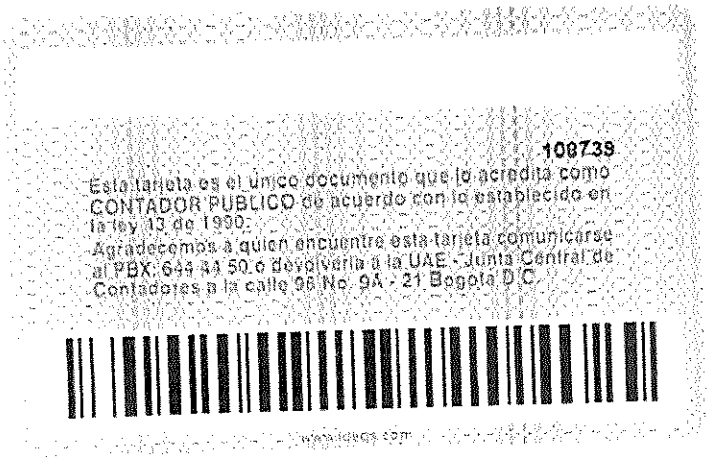

108739
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B A 5 3 7 2 2 5 A 5 9 E 1 9 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121848323 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 180143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 8.
INFORME SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 2

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

Contrato de Interventoría No. 1701 DE 2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CR. 6 #17-49 Puerto Gaitán – Meta
Tel. 3204253826

UT INTERPOLICIA
2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 3
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
Localización Especifica 5
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 8
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
RELACIÓN PERSONAL DE INTERVENTORIA 11
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12
CHARLAS E INDUCCIONES 13
PMA 14
SST 14
IMPREVISTOS Y RECOMENDACIONES 14
CONCLUSIONES 15

INTRODUCCION

El presente informe HSEQ corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2026 y tiene como objetivo presentar el estado de las actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad del proyecto.

Durante este periodo, el proyecto se desarrolló en fase de alistamiento administrativo y técnico, con ejecución de actividades preliminares en campo, tales como el recorrido técnico de inspección de terreno, la localización y replanteo de alojamientos nuevos y el descapote manual en la zona de intervención. Estas labores permitieron avanzar en la verificación de las condiciones iniciales del sitio y en la preparación del área para el inicio de las actividades constructivas.

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito fundamental la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades laborales, promoviendo entornos de trabajo seguros y saludables. En la actualidad, este enfoque se extiende a todas las profesiones y oficios, buscando que el trabajo se adapte a las capacidades del trabajador y no que el trabajador se exponga a condiciones que afecten su integridad física o mental.

El presente informe se fundamenta en las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, orientadas a la planeación, organización y estructuración del sistema HSEQ, así como a la identificación preliminar de las condiciones de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto. Lo anterior permite establecer las medidas preventivas necesarias, aplicar buenas prácticas y garantizar condiciones seguras para el personal que será vinculado en las etapas posteriores de la obra.

El principal objetivo del sistema HSEQ es la identificación y control de peligros que puedan afectar tanto a los trabajadores como a personal ajeno a la obra, fortaleciendo el compromiso con la seguridad, la salud y el cumplimiento normativo, y asegurando la correcta implementación del sistema de gestión durante el desarrollo del proyecto.

La Unión Temporal Inge Policía Gaitán mantiene un firme compromiso con la protección de la salud y la seguridad de su población trabajadora, mediante la evaluación continua y la mitigación de los riesgos presentes en las áreas de trabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, reconoce que la participación y el compromiso de los trabajadores son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Temporal responsable del proyecto, alineado con los requisitos HSEQ establecidos por la interventoría y la normativa vigente, garantizando condiciones seguras y controladas para el personal que será vinculado durante la ejecución del contrato.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover condiciones de trabajo que favorezcan el bienestar físico y mental de los trabajadores.
- Fomentar la concientización sobre la mitigación de impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto.
- Garantizar el control de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de la obra, conforme a los lineamientos del plan ambiental aplicable.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio ubicado en la región del río Manacacias, es el Cuarto municipio con extensión territorial en Colombia y primero en el departamento del Meta con 17.499 km². Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.


Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.

Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y recreación.

Límites del municipio:

Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripan y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

Ilustración 1: Localización Geográfica Municipio de Puerto Gaitan, Dpto. Meta

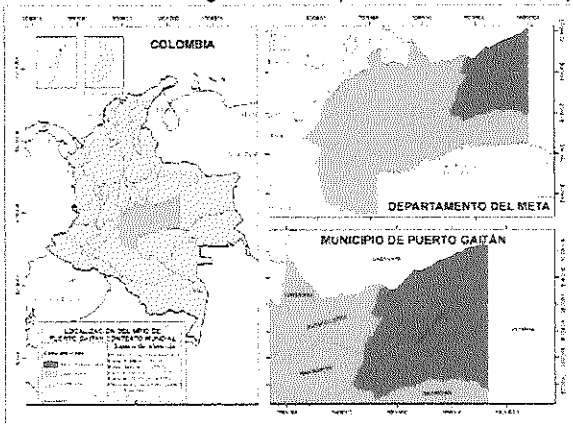


FUENTE: https://www.researchgate.net/publication/325613809

Localización Especifica

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

Ilustración 2: Localización Especifica del Proyecto

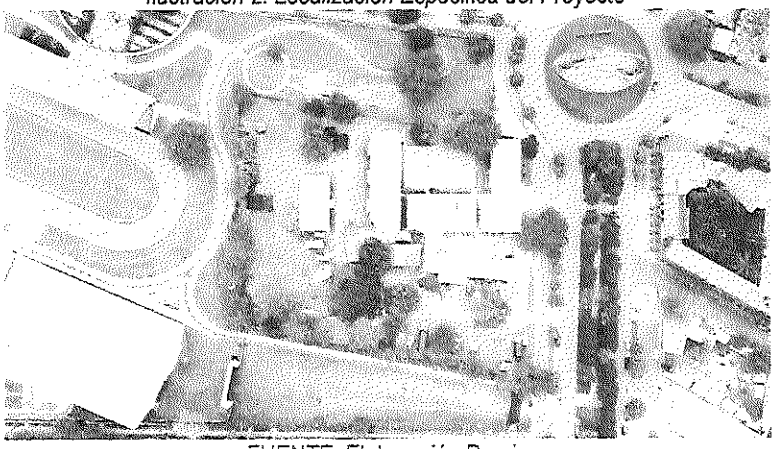

FUENTE: Elaboración Propia

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.

De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.

La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.

En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.

Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	utinterpolicia2025@gmail.com
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES

	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	utinterpolicia2025@gmail.com
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	utinterpolicia2025@gmail.com
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE


PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL (NOMBRE Y IDENTIFICACION)	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C. 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C. 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES C.C. 80.074.961	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C. 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C. 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C. 1.121966360	CADENERO

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

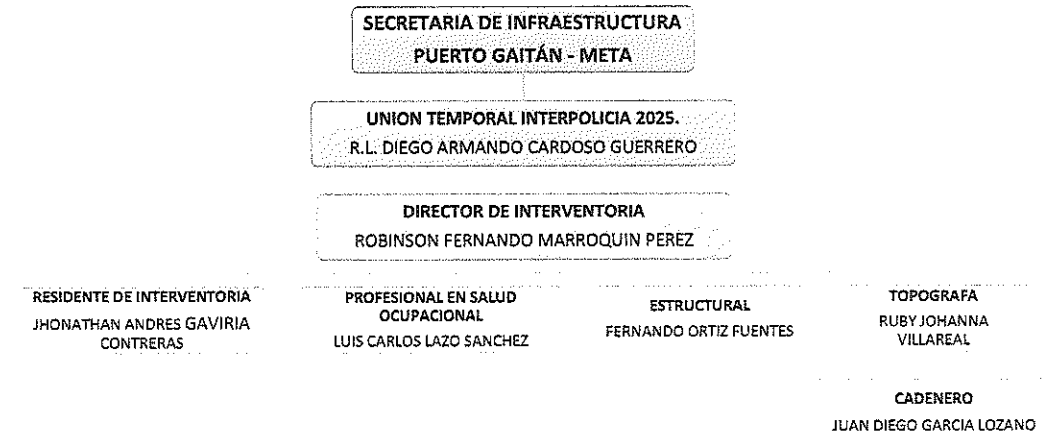

RELACIÓN PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025.

RELACIÓN PLANILLA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079327449
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1079327449
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079327449
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079327449
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1079327449
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079327449

PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, la interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de interventoría No. 1701 de 2025.

RELACIÓN PLANILLA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079307728
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1079307728
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079307728
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079307728
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1079307728
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079307728

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución del contrato 1701 que tiene como objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META", por parte de contratista de obra se realizó la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con verificación de interventoría, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las obligaciones contractuales en esta materia.

En el marco de la gestión realizada, se verificó y avaló la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, los cuales fueron ejecutados conforme a la normatividad vigente. Se constató que dichos procedimientos se ofrecieron como opción voluntaria al trabajador, garantizando el derecho a decidir sobre la valoración médica laboral, sin perjuicio de la obligación contractual del contratista de disponer y ofrecer tales exámenes.


De igual manera, se corroboró la entrega oportuna y adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP), verificando que estos correspondieran a los riesgos identificados en las actividades de obra, cumplieran con las

especificaciones técnicas exigidas y fueran suministrados mediante actas de recibido debidamente firmadas por los trabajadores, lo cual asegura trazabilidad documental y cumplimiento normativo.


Se ejerció control sobre la ejecución de charlas de inducción y capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo, enfocadas en la prevención de riesgos asociados a labores de mantenimiento vial, manipulación de herramientas, trabajo en campo y prácticas de autocuidado. Dichas actividades fueron soportadas mediante listas de asistencia y registros documentales, los cuales fueron revisados y validados por la interventoría para garantizar su pertinencia y efectividad.

El acompañamiento incluyó la verificación de la implementación de campañas de promoción de la salud y prevención de accidentes, la ejecución de pausas activas y la difusión de protocolos de actuación en caso de emergencias, asegurando la cobertura integral de las obligaciones en materia de SST.


CHARLAS E INDUCCIONES

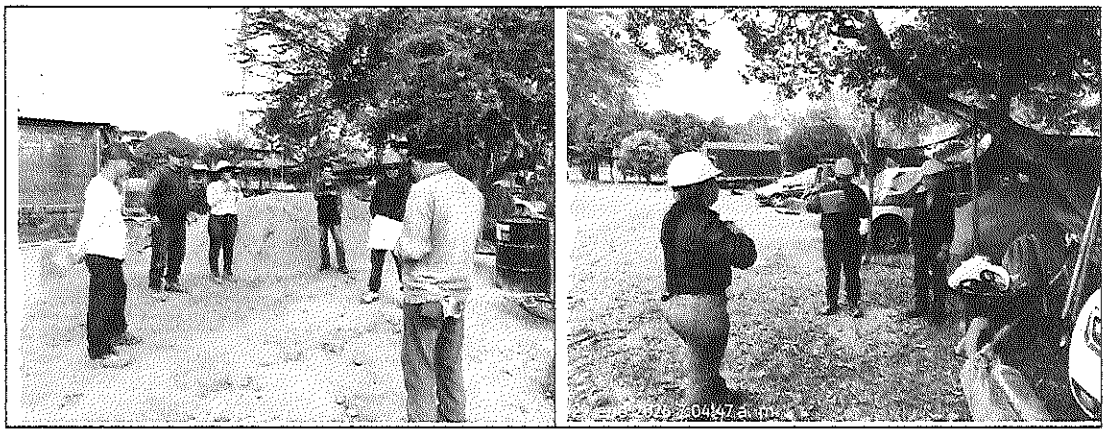

PMA

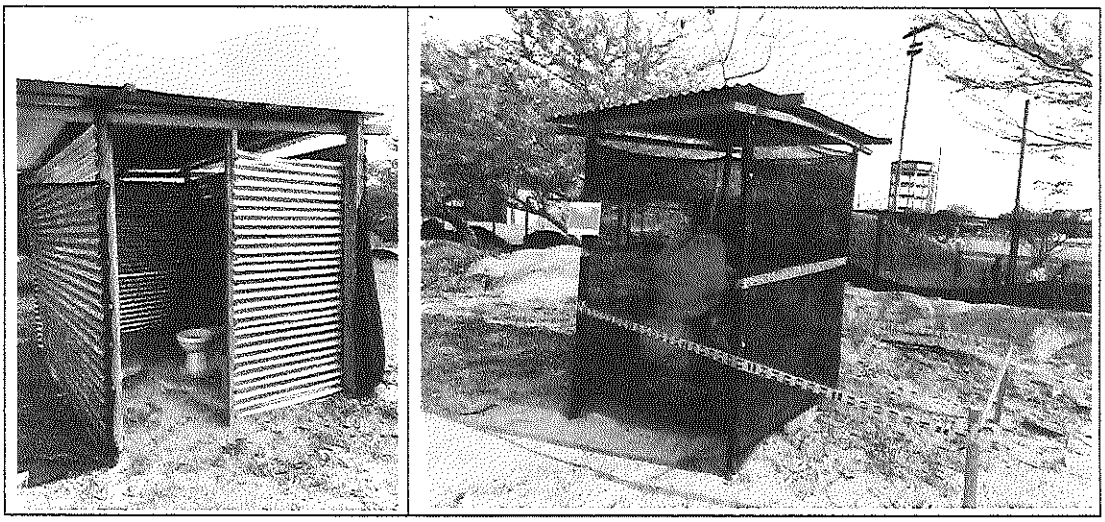

SST

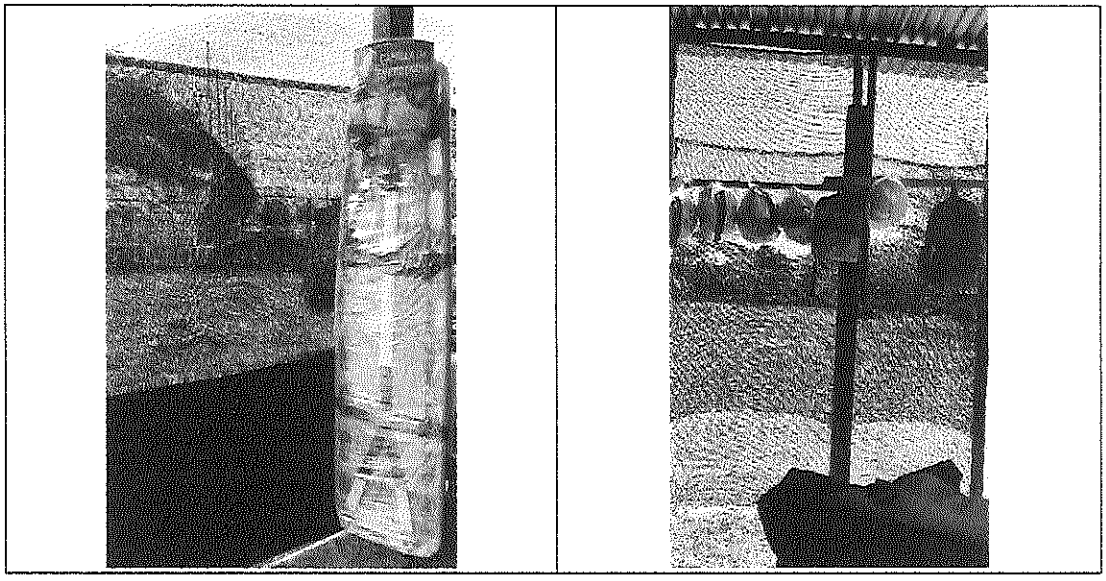

IMPREVISTOS Y RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunos imprevistos menores relacionados principalmente con variaciones climáticas que afectaron la programación de actividades preliminares, ajustes en la disponibilidad de

personal operativo durante el alistamiento inicial y requerimientos adicionales de documentación para garantizar la trazabilidad de las capacitaciones, inducciones y entrega de EPP. Asimismo, se evidenciaron retrasos puntuales en la consolidación de actas y listas de asistencia por parte del contratista.

En atención a lo anterior, la interventoría recomienda fortalecer los mecanismos de control documental para asegurar soportes completos y firmados en todas las actividades de SST, implementar planes de contingencia frente a condiciones climáticas adversas que permitan mantener la continuidad de las labores sin comprometer la seguridad, optimizar la coordinación entre contratista e interventoría para anticipar ajustes en la programación y disponibilidad de recursos, y consolidar campañas de autocuidado y prevención que promuevan la participación activa de los trabajadores en la cultura de seguridad. Estas acciones permitirán minimizar riesgos emergentes y garantizar la conformidad técnica y normativa durante la ejecución contractual.

CONCLUSIONES

Con fundamento en la verificación documental y en las inspecciones realizadas durante la ejecución contractual, la interventoría concluye que el contratista dio cumplimiento integral al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en concordancia con la normativa nacional vigente y con las obligaciones contractuales establecidas.

Se constató la implementación efectiva de los procedimientos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de medidas de control; la práctica y registro de exámenes médicos ocupacionales de ingreso y retiro; la entrega y uso de Elementos de Protección Personal (EPP) con soporte documental; la ejecución de programas de inducción, reinducción y capacitaciones en SST; así como la difusión de protocolos de emergencia y actividades de promoción de la salud.

De igual manera, se verificó el cumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, garantizando la cobertura en salud, pensión y riesgos laborales para el personal vinculado.

No se evidenciaron incumplimientos sustanciales en materia de seguridad y salud en el trabajo ni en el componente laboral y prestacional, por lo cual la interventoría recomienda dar por cumplido el componente de SST y el correspondiente a obligaciones laborales y prestacionales, dentro del proceso de la orden de asistencia, asegurando la conformidad técnica, administrativa y normativa del contrato.

Luis Carlos Lazo

LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ
Profesional SST
Union Temporal Interpolicia 2025

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	2/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion Bolivia, Pte Gardin			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Robinson Naranjo	86053753	Director	
2	Johathan Gaviria	1121844182	Resident	
3	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	3/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Rio Caiton			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lozo			CUAL:			
TEMA:	charla uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lozo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Robinson Mariaquin	86053753	Director	
2	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	
3	Luis Carlos Lozo	1121892054	SST	Luis Carlos Lozo
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	5/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estación de Policía, Pto Carton			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Robinson Marroquín	86053753	Director	
2	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	
3	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	6/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lozo			CUAL:			
TEMA:	charla de uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lozo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Robinson Marroquin	86053753	Director	
2	Johathan Gaona	1121804182	Residente	
3	Luis Carlos Lozo	1121892054	SST	Luis Carlos Lozo
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	7/11/2026	HORA:	7:00am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Rio Lacho			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lozo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso de correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lozo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Robinson Marroquin	85053753	Director	RM
2	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
3	Luis Carlos Lozo	1121892054	SST	Luis Carlos Lozo
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	8/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	x	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Asis			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	Charla de uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	9/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	10/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Rio Caribe			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lozo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	Charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lozo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121 844 182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lozo	1121892054	SST	Luis Carlos Lozo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	13/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo.			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	Charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO

FECHA: 14/01/2026 HORA: 7:00am

UBICACIÓN: Estacion de Policia, Pto Gaitan

DURACIÓN: 10 min

FACILITADOR: Luis Carlos Lazo

TEMA: charla uso correcto de EPP

TIPO DE EVENTO

REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
INDUCCIÓN		SIMULACRO	
CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	

CUAL:

FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	15/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, PTO Gaitan			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			CUAL:			
TEMA:	charla uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	16/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	17/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia Pto Gaitan			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			CUAL:			
TEMA:	Charla uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	19/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			CUAL:			
TEMA:	Charla uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo.		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	20/01/2026	HORA:	7:00am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, PTO Caitan			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			CUAL:			
TEMA:	charla uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	21/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pin Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lozo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	Charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Loaza.		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gavina	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lozo	1121892054	SST	Luis Carlos Loaza
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSIÒN: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	22/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	23/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			CUAL:			
TEMA:	Charla uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo.		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	24/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	26/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 MIN			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	27/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estación de Policía, Pto Gaitan			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			CUAL:			
TEMA:	Charla Uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	28/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estación de Policía, Pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	charla uso correcto de EPP			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo.		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO			
FECHA:	29/01/2026	HORA:	7:00 am
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan		
DURACIÓN:	10 min		
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo		
TEMA:	Charla uso correcto de EPP		

TIPO DE EVENTO			
REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
INDUCCIÓN		SIMULACRO	
CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
CUAL:			
FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gavina	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	30/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia, Pto Gaitan			INDUCCIÓN		SIMULACRO	
DURACIÓN:	10 min			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
TEMA:	Charla uso correcto de Epp			CUAL:			
				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gavina	1121844182	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	31/01/2026	HORA:	7:00 am	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN:	Estacion de Policia (Pto Gaitan)			CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN:	10 min			REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR:	Luis Carlos Lazo			CUAL:			
TEMA:	charla uso correcto de EPP			FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Johathan Gaviria	1121844152	Residente	JG
2	Luis Carlos Lazo	1121892054	SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

ANEXO 9.
CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1683 de 2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero del 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de enero de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN / META

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1683 de 2025.**

CERTIFICO QUE:

La **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero del 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
