	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN, MAYO 2026

Contrato de Interventoría No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____ / _____ / _____

Periodo del informe: Desde: 01/ 04 / 2026 Hasta: 30 / 04 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	*INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO IDE INTERVENTORIA*					
1,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
2	*INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
2,01	**Cuadro de trazabilidad :** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
3	*INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de interventoría vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
4	*INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
4,01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)				X	Contratista
4,02	Información de avance financiero de la interventoría	X	X			Contratista
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la interventoría	X	X			Contratista
4,04	Acta de pago del anticipo de interventoría (si aplica).				X	Contratista
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de interventoría	X	X			Contratista
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de interventoría con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
5	*INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA*					
5,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
6	*INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA*					
6,01	**Cuadro de trazabilidad :** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
7	*INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA*					
7,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
8	*INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA*					
8,01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)	X	X			Contratista
8,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			Contratista
8,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la obra	X	X			Contratista
8,04	Acta de pago del anticipo de obra (si aplica).	X	X			Contratista
8,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra	X	X			Contratista
8,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de obra con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
9	*INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO*					
9,01	Gráfica avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas, (financiera, por porcentajes)	X	X			Contratista
9,02	Dificultades presentadas durante la ejecución e imprevistos presentados en desarrollo de las actividades (si aplica)	X	X			Contratista
9,03	Informe jurídico del estado de cumplimiento e incumplimiento del contrato y actuaciones realizados por la interventoría	X	X			Contratista
10	*INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO*					
10,01	Cuadro de relación de personal (administrativo - operativo) de interventoría propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) organigrama de personal	X	X			Contratista
10,02	Certificado del representante legal de la interventoría y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales del personal de obra y de interventoría, avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			Contratista
11	*CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS POR LA INTERVENTORIA VS OBRA Y SU CONCEPTO*					
12	*VERIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)*					
13	*INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO*					
13,01	certificación de interventoría, de existencia de permisos y licencias ambientales y prediales para la ejecución total del proyecto y su vigencia cada uno	X	X			Contratista
13,02	Certificación a la disposición de materiales	X	X			Contratista
13,03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			Contratista
13,04	Concepto de la interventoría en el cual se hace el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y Plan de Gestión del Riesgo (PGR) firmado por el profesional (si aplica).	X	X			Contratista
14	*ANEXOS*					
14,01	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			Contratista

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN, ENERO 2026

Contrato de Interventoria No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____/_____/_____

Periodo del informe: Desde: 18 / 12 / 2026 Hasta: 31 / 12 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
14,02	verificación de cartera topográfica de obra y concepto (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)	X	X			Contratista
14,03	Copia de los ensayos de laboratorio (interventoria)				X	Contratista
14,04	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)	X	X			Contratista
14,05	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			Contratista
14,06	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratad por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			Contratista
14,07	Informe de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de interventoria				X	Contratista
14,08	Copia bitacora de obra del periodo	X	X			Contratista
15	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			Contratista

NOTA: Se aclara asi alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el Informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de Interventoria, deben allegarse por la interventoria conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) dias del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Revisó

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
R/L Interventoria

Aprobó

CHRISTIAN JULIO FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Nota: se debe paginar los informes

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 05

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
(01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026)

INTERVENTORÍA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

La interventoría del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 se constituye como el mecanismo de control integral para la ejecución del proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán – Meta. Su alcance es multidisciplinario, abarcando los componentes técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La interventoría actúa como mecanismo de control y vigilancia permanente del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad, funcionalidad y correcta inversión de los recursos asignados al proyecto.
Dentro del alcance contractual de la interventoría se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:
• Supervisión y control técnico de las actividades ejecutadas en obra.
• Seguimiento al cumplimiento del cronograma físico y financiero.
• Verificación de cantidades de obra ejecutadas.
• Control de calidad de materiales, procesos constructivos y ensayos de laboratorio.
• Seguimiento administrativo, contractual y documental.
• Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales y SST.
• Revisión y trámite de actas, informes y soportes contractuales.
• Control y seguimiento a maquinaria, personal y equipos en obra.
• Emisión de conceptos técnicos, recomendaciones y observaciones a la entidad contratante.

1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

Puerto Gaitán es un municipio ubicado en el departamento de Meta. Incluye una extensa área de estructura plana conocida como las Sabanas de la Altillanura, cuyo eje principal es el río Meta.
El municipio es un rectángulo irregular circunscrito por el río Meta al norte, los ríos Manacacias y Yucao al oeste, el río Iteviare al sur y una línea recta al este. Forma el extremo noreste del departamento de Meta, siendo el municipio más alejado de la capital departamental, Villavicencio.Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.
Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.
Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y Recreación.
Límites del municipio:
Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripán y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

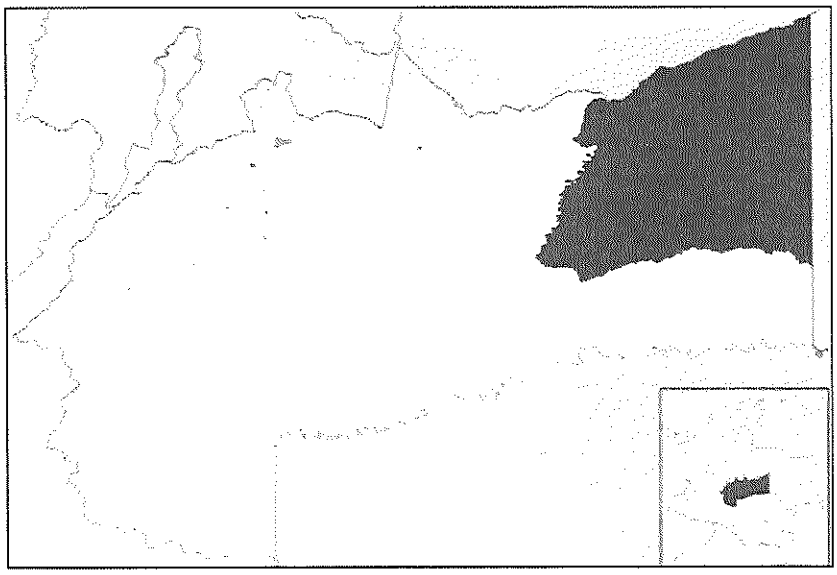


Ilustración 1. Localización de la cabecera municipal de Puerto Gaitán-Meta.

1.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

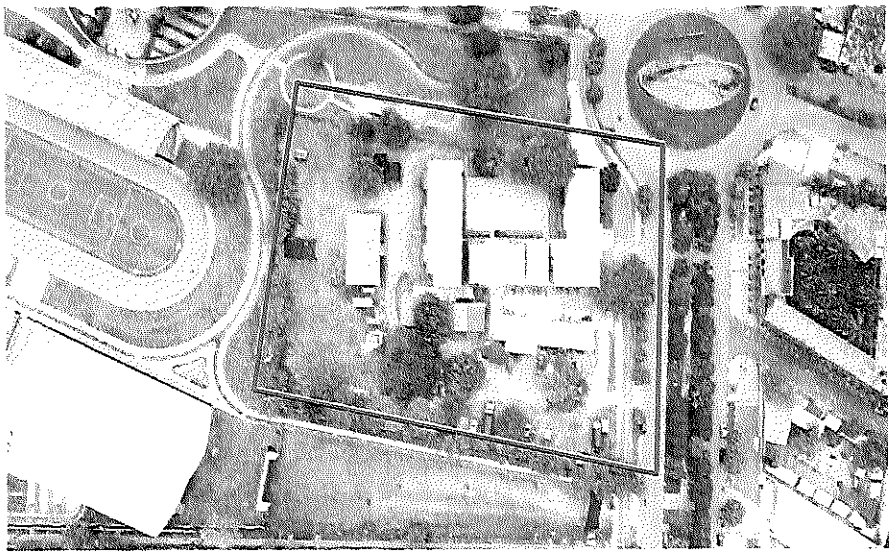


Ilustración 2. Imagen aérea del proyecto

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.
De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.
La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.
En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.
Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.
El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.
En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

1.5. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2 INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	utinterpolicia2025@gmail.com
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
MODIFICATORIA N.°1:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 Modificación a la cláusula decima octava del contrato de interventoría.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

3 INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de interventoría:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.3.3.4.01-R. B CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 74.136.286.00	DIS.2025002849	RES.2025004220
	$ 222.176.808,00	DIS. 2026000009	RES.2026000003
TOTALES	**$ 296.313.094,00**		

3.1. VERIFICACIÓN DE POLIZAS

SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	09/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	09/08/2026	09/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/12/2025	09/08/2029	$14,815,654.70	
SEGUROS DEL ESTADO	30-40-101025734 ANEXO 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	Aprobada
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Pagina web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

SEGÚN MODIFICATORIA No.01						
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


4.1. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
N/A	$		
N/A	$		
TOTALES	**$**		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	$ 00		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	**$ 00**

El Contrato Interventoría No. 1701 de 2025 no cuenta con anticipo.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

4.2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

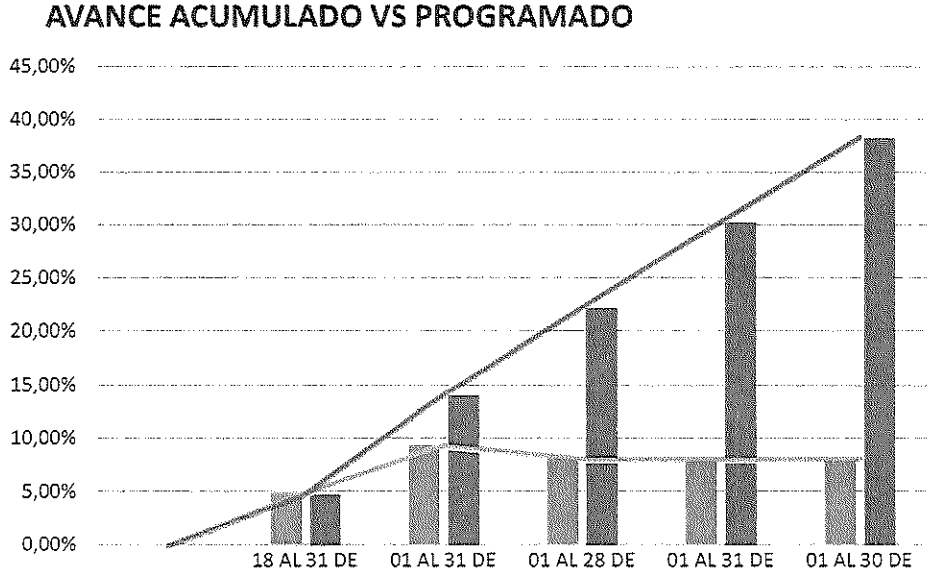

	Inicio	18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	01 AL 31 DE MARZO DE 2026	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
% PROGRAMADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%
ACUMULADO PROGRAMADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%
%EJECUTADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%
EJECUTADO ACUMULADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%

4.3. BALANCE FINANCIERO


DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$296.313.094
VALOR PROYECTO ACTUALIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 01 – 35%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 02 – 15%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

PERSONAL (NOMBRE Y IDENTIFICACION)	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES C,C 80.074.961	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C 1.121966360	CADENERO
GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ C.C 1.006.874.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

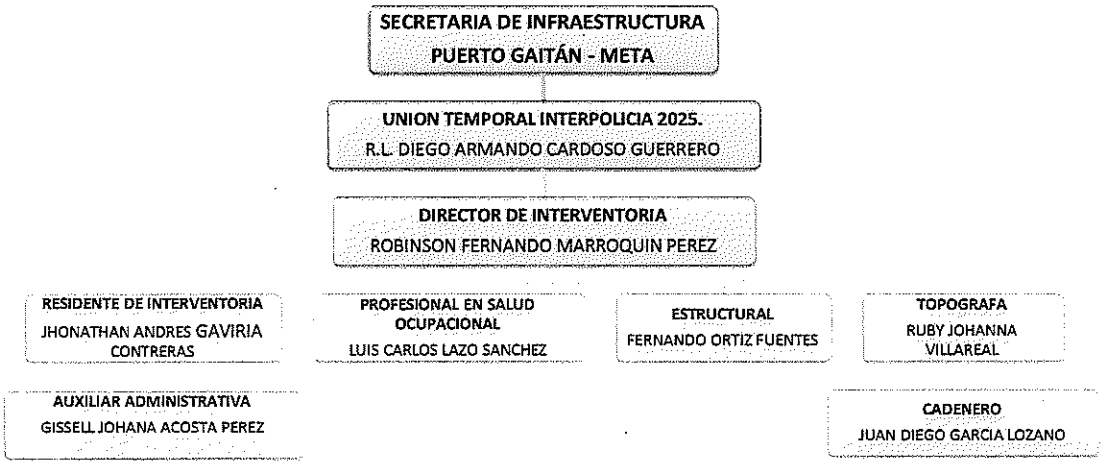

PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período comprendido entre el 01 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RELACIÓN PLANILLA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (01/04/2026-30/04/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1081588607
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1081588607
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1081588607
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607

OBRA

6. GENERALIDADES DEL CONTRATO:


Considerando que el municipio de Puerto Gaitán – Meta, en su plan de desarrollo "JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027", ha viabilizado, priorizado y aprobado proyectos de inversión los cuales se encuentran incluido el programa 4501 "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA". Con la finalidad de cumplir con la meta PDM0318 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO", fue adjudicado mediante la licitación pública LP-SI-010-2025, que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META", con código BPIN 202500000031783 Este proyecto se encuentra suscrito al contrato de obra pública 1683 del día tres (03) de diciembre de 2025, siendo perfeccionado con el acta de inicio de fecha el día dieciocho (18) de diciembre de 2025.


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.1. LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla un resumen de la ubicación del municipio.

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

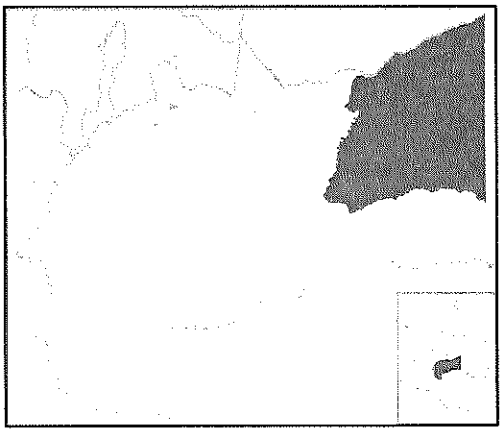

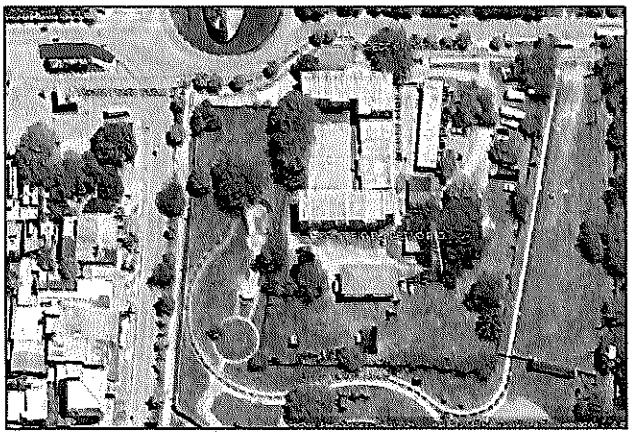

El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la Estación de Policía, ubicada en la Carrera 10 N.° 17-31, barrio Alto Manacacías. Este sector corresponde a un área estratégica del municipio, donde se concentra una parte significativa de la actividad administrativa, comercial y social del territorio.

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal. Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.
La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional. El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

6.3. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.

A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

CAPITULO	DESCRIPCION	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00
11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.306.277.668,00**

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	LP-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE OBRA NO. 1683 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	902.011.453-2
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	INGRID MARYORY GARCÍA FONSECA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. NO. 1.122.120.037 DE ACACIAS - META
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	UTINGEPOLICIAGAITAN@GMAIL.COM
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.306.277.668,00 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	17 DE AGOSTO DE 2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

8. INFORMACIÓN FINACIERA Y INFORMACION DE INVERSION DEL ANTICIPO

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de obra:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 620.406.812,00	DIS.2025002848	RES.2025004223
	$ 3.685.870.856,00	DIS.2026000007	RES.2026000004
TOTALES	**$ 4.306.277.668,00**		

BALANCE FINANCIERO

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
EGR.2026010031	$1.431.837.324,61	ANTICIPO No. 01 CTO 1683/2025 – 35%	21/01/2026
EGR.2026030507	$24.257.838,20	ANTICIPO No. 02 CTO 1683/2025 – 15%	16/03/2026
EGR.2026030508	$589.386.812,00		16/03/2026
TOTALES	**$ 2.045.481.974,81**		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	**$ 2.045.481.974,81**		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	**$ 00**

VERIFICACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

SEGUN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZAS N°**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS POLIZAS**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 0	Cumplimiento	02/12/2025	02/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	02/12/2025	02/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	02/08/2029	$ 215.313.883,40	
		Estabilidad y calidad	02/12/2025	02/12/2030	$ 430.627.766,80	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta


SEGÚN ACTA DE INICIO						
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2	Cumplimiento	18/12/2025	18/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	18/12/2025	18/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	18/12/2025	18/08/2029	$ 215.313.883,40	
		Estabilidad y calidad	18/12/2025	18/12/2030	$ 430.627.766,80	

EGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101025675 ANEXO 0	Predios labores y operaciones	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Perjuicios extrapatrimoniales	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Responsabilidad civil patronal	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Vehículos propios y no propios	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2	Predios labores y operaciones	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Perjuicios extrapatrimoniales	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Responsabilidad civil patronal	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Vehículos propios y no propios	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

9. PROGRAMADO VS EJECUTADO (GRAFICAS) AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345	$297.199.233	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987	$484.937.220	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087	$706.564.307	5,15%	16,41%	$95.934.936,12	$379.838.767,96	2,23%	8,82%

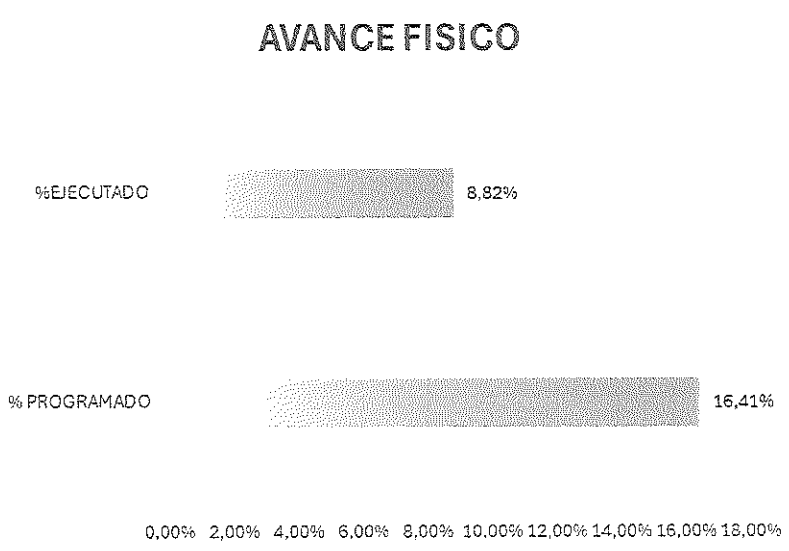

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

TABLA DE SEGUIMIENTO $


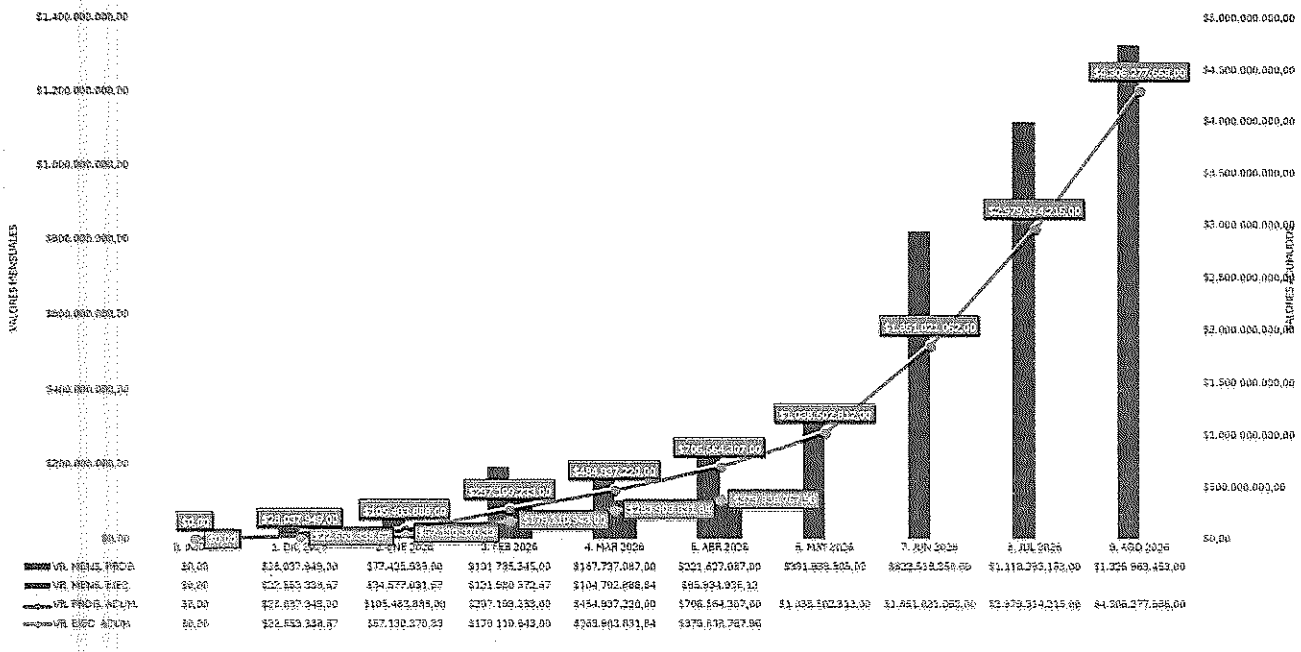


TABLA DE SEGUIMIENTO %

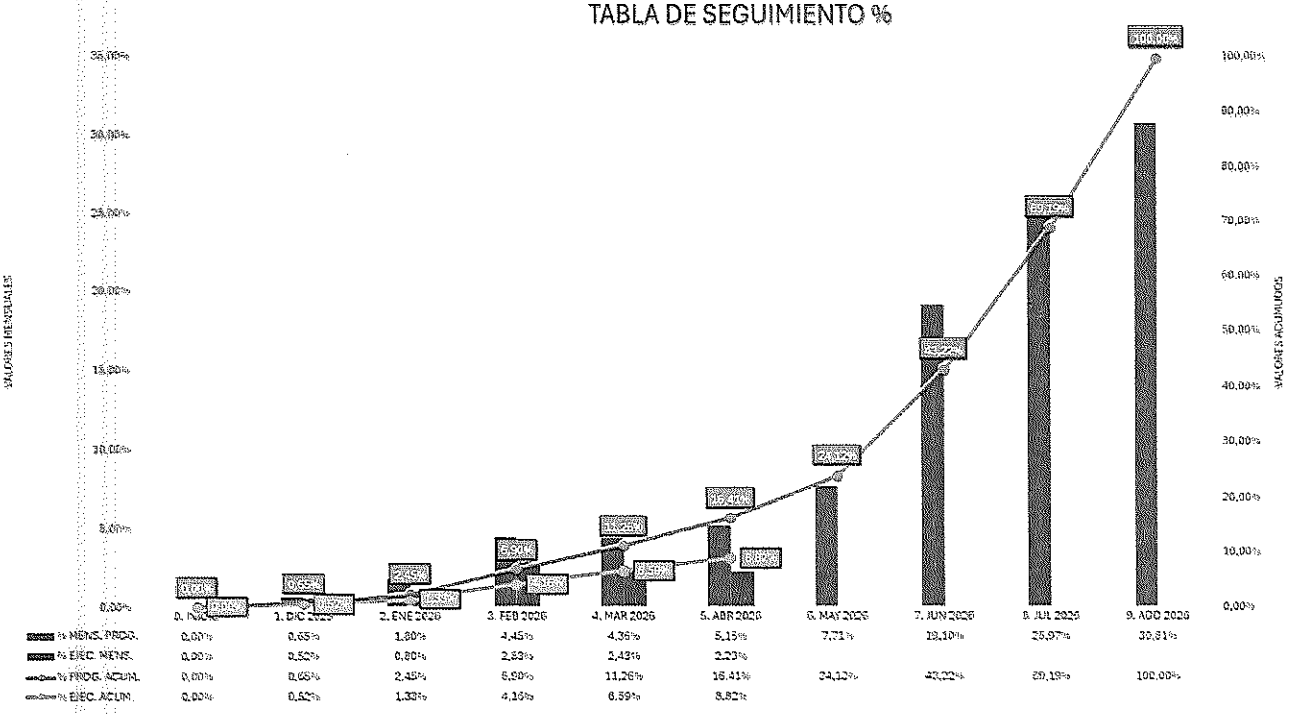

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

10. EVALUACION DEL AVANCE EJECUTADO VS PROGRAMADO (INCLUYE DIFICULTADES, PROBLEMATICAS E IMPREVISTOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION)

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026 la interventoría efectuó actividades de seguimiento, verificación y control en materia, evidenciando avances en la ejecución de las actividades relacionadas con el movimiento de tierras y adecuación del terreno. La Interventoría realizó el seguimiento continuo, la inspección técnica en campo y la verificación de las actividades correspondientes a la ejecución de la placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de resistencia 20,7 MPa (3.000 PSI), mezcla en obra, incluyendo el suministro de materiales, la preparación de la mezcla, la colocación y el proceso de curado del concreto. Durante las visitas de verificación realizadas, la Interventoría constató que las actividades se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas contractuales, en las áreas previamente adecuadas y aprobadas para la instalación de pisos, consolidando de manera progresiva los sectores intervenidos. Se verificó la correcta incorporación del aditivo impermeabilizante en la mezcla de concreto, así como el cumplimiento de los espesores de diseño y las condiciones de nivelación y acabado superficial requeridas.

Por otro lado, la Interventoría efectuó la verificación de las actividades relacionadas con el suministro, figurado, armado, colocación y amarre del acero de refuerzo con límite de fluencia Fy=420 MPa (4.200 kgf/cm², 60.000 PSI) destinado a las vigas aéreas del proyecto. Durante las inspecciones técnicas realizadas, la Interventoría verificó el cumplimiento de las especificaciones de resistencia del material, los diametrales y espaciamientos de refuerzo definidos en los planos estructurales aprobados, los traslapos y longitudes de desarrollo requeridos por la normativa NSR-10, y la correcta ejecución del proceso de figurado y amarre conforme a los estándares técnicos aplicables, constatando el avance progresivo en la construcción de los elementos estructurales elevados del proyecto.

Paralelamente, la Interventoría realizó la inspección y la verificación de las actividades correspondientes al suministro e instalación de la red de presión para los baños del primer piso del área de alojamientos. Durante los recorridos de inspección efectuados en campo, se verificó que los trazados de tubería instalados guardan concordancia con los diseños hidráulicos aprobados, que los diámetros, materiales y accesorios utilizados cumplen con las especificaciones técnicas contractuales, y que las pendientes, anclajes y protecciones de la red ejecutada son conformes a los criterios técnicos del sistema hidráulico interno del edificio. La Interventoría certifica el avance verificado en la implementación de los sistemas hidráulicos internos conforme a los diseños aprobados y al programa de obra vigente.

Adicionalmente, la interventoría deja constancia de la continuidad en la elaboración del Acta Modificatoria No. 1, la cual contempla un Adicional No. 1 y la solicitud de prórroga contractual, como resultado de los recorridos técnicos y revisiones especializadas efectuadas en las instalaciones de la Estación de Policía. Dichas actividades fueron desarrolladas conjuntamente con profesionales técnicos vinculados por el contratista, permitiendo profundizar en el análisis de los componentes hidráulicos y eléctricos y generando estudios e informes técnicos que sustentan la necesidad de ajustes al alcance inicial del proyecto.
En relación con las condiciones de ejecución, la interventoría verificó inconvenientes para el inicio de las actividades correspondientes a la remodelación de la edificación denominada "Casa Blanca", debido a la ocupación actual del inmueble por parte de seis (6) oficiales, situación que ha limitado la disponibilidad del área de intervención. Frente a esta condición, se constató la realización de reuniones de coordinación con el comandante de estación, orientadas a gestionar la desocupación del espacio y definir la programación para el inicio de las actividades constructivas.

Finalmente, la interventoría deja constancia de que los ajustes técnicos derivados de los estudios realizados en los componentes hidráulico y eléctrico, así como las restricciones operativas para intervenir determinadas áreas del proyecto, han generado afectaciones en los tiempos inicialmente programados. No obstante, se verificó que dichas situaciones están siendo gestionadas mediante acciones técnicas, administrativas y de coordinación interinstitucional, encaminadas a garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, manteniendo los criterios de calidad y funcionalidad requeridos para el proyecto.

11. ACTUALIZACIONES DE LA INTERVENTORIA

N/A

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

12. INFORME SISO Y AMBIENTAL GENERAR (ANEXOS)

Durante el período comprendido entre el 1 y 30 de abril, la Interventoría efectuó seguimiento técnico, revisión documental e inspecciones permanentes en campo al cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad (HSEQ) implementado por el contratista, verificando que las actividades correspondientes a excavaciones, rellenos, compactación manual, ejecución de elementos en concreto y colocación de acero de refuerzo se desarrollaran bajo los procedimientos establecidos y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental y aseguramiento de la calidad.

Como resultado de las verificaciones realizadas, la Interventoría constató que las labores ejecutadas contaron con la aplicación de los controles operacionales definidos para cada frente de trabajo, orientados a prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, controlar los aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución de las actividades y garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y de calidad exigidos contractualmente.

De igual manera, la Interventoría verificó la adecuada elaboración, actualización, organización y aplicación de la documentación correspondiente al Sistema HSEQ, constatando la implementación de los formatos y registros requeridos para el control de las actividades ejecutadas, así como el seguimiento a las medidas preventivas y de mitigación definidas para la gestión de los riesgos identificados durante la ejecución de la obra.

Dentro de las actividades objeto de seguimiento y verificación por parte de la Interventoría se evidenció el cumplimiento de las siguientes acciones:

- Identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos inherentes a las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo.
- Socialización de procedimientos seguros de trabajo, análisis de riesgos y medidas preventivas con el personal operativo.
- Verificación permanente del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), conforme a la naturaleza de las actividades ejecutadas.
- Inspección y seguimiento continuo a las condiciones locativas y de seguridad industrial en los frentes de obra, verificando el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas dentro del Sistema de Gestión HSEQ.

Por otro lado, la interventoría efectuó actividades de seguimiento, control y verificación permanente al manejo, disposición y almacenamiento de los materiales utilizados en la ejecución del proyecto, constatando su cumplimiento frente a las especificaciones técnicas, lineamientos ambientales aplicables y buenas prácticas constructivas.

En desarrollo de las visitas de inspección y recorridos de obra, se verificó el adecuado almacenamiento, organización y utilización de los materiales dentro del área de intervención, evidenciando la implementación de medidas orientadas a garantizar su protección frente a agentes externos y a evitar interferencias con las actividades constructivas y la movilidad interna del proyecto. Así mismo, la interventoría realizó control sobre la disposición de residuos y materiales sobrantes, promoviendo condiciones de orden, limpieza y adecuada gestión dentro del frente de obra.

De igual manera, se deja constancia de que durante el periodo evaluado se presentaron ajustes en el suministro y utilización de algunos materiales, derivados de las revisiones técnicas efectuadas a los diferentes componentes del proyecto y de las restricciones de acceso a determinadas áreas de intervención. No obstante, la interventoría verificó que dichas situaciones fueron gestionadas de manera coordinada entre el contratista, la interventoría y el personal operativo en obra, minimizando afectaciones en el desarrollo de las actividades programadas.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

13. INFORME DE ESTADO DE TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS (AMBIENTALES, CONSTRUCCION ENTRE OTRAS)

Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión documental y verificación del estado de los permisos, licencias y demás instrumentos administrativos requeridos para la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, constatando el cumplimiento de los requisitos legales, urbanísticos y ambientales aplicables al proyecto de Construcción, Adecuación y Mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta.

Como resultado de la verificación efectuada, se evidenció que el contrato cuenta con la documentación jurídica y técnica que acredita la viabilidad de la intervención, encontrándose vigente y disponible el Certificado de Tradición y Libertad, el certificado predial y la Licencia de Construcción, documentos que respaldan la titularidad del predio, la legalidad de la intervención y el desarrollo de las actividades constructivas conforme a la normatividad urbanística y demás disposiciones legales aplicables.

De igual manera, la Interventoría verificó que el proyecto dispone de la aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) emitida por la autoridad competente, instrumento mediante el cual se establecen las medidas de prevención, mitigación, control, seguimiento y manejo de los impactos ambientales derivados de la ejecución de las obras. Así mismo, se constató que las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se ejecutaron en concordancia con las obligaciones, programas y medidas contempladas en dicho instrumento ambiental.

Como parte de las labores de control contractual, la Interventoría revisó la vigencia, consistencia y trazabilidad de la documentación soporte relacionada con los permisos y licencias del proyecto, verificando que esta se encuentra debidamente organizada y disponible para efectos de seguimiento, control y eventual inspección por parte de la Entidad Contratante y de las autoridades competentes

14. INFORME DE VERIFICACION DE TOPOGRAFICA DONDE SE COMPARE LA TOPOGRAFIA REALIZADA VS LO PROGRAMADO

N/A

15. CUADRO RESUMEN DE LABORATORIOS Y RESULTADOS DE INTERVENTORIA VS OBRA

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA

Los resultados de laboratorio del contrato de interventoría se encuentran adjuntados en el capítulo de anexos No. 08 del presente informe

16. ACTAS SUSCRIPTAS

- ACTA DE INICIO

17. CUADRO DE CORRESPONDECIA- RELACION

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
N/A				

18. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Con base en las actividades de seguimiento, inspección y control realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la interventoría deja constancia de que el proyecto presentó avances en la ejecución de actividades constructivas asociadas a elementos de piso, estructura y redes hidráulicas, evidenciando desarrollo conforme a la programación establecida y a las especificaciones técnicas definidas para el contrato.

Así mismo, la interventoría verificó que, de manera paralela a la ejecución física de obra, se adelantaron recorridos técnicos especializados y estudios complementarios en los componentes hidráulico y eléctrico, los cuales permitieron identificar la necesidad de efectuar ajustes al alcance contractual inicialmente previsto. En

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

este sentido, se deja constancia de que actualmente se encuentra en proceso de estructuración y trámite el Acta Modificatoria No. 1, que contempla un adicional contractual y solicitud de prórroga, soportados en los análisis y diagnósticos técnicos desarrollados.

De igual manera, se evidenciaron limitaciones operativas para la intervención de algunas áreas del proyecto, particularmente en la edificación denominada "Casa Blanca", debido a condiciones de ocupación existentes, situación que ha incidido en el ritmo de ejecución de determinadas actividades programadas.

Finalmente, la interventoría concluye que, si bien se han registrado avances en la ejecución de la obra, los ajustes técnicos actualmente en evaluación y las condiciones logísticas propias del proyecto han generado afectaciones en los tiempos inicialmente programados. No obstante, se verificó que dichas situaciones se encuentran en proceso de gestión mediante acciones técnicas, administrativas y de coordinación interinstitucional, orientadas a minimizar su impacto sobre el cronograma general y garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

19. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO.
2. COPIA DE BITACORA.
3. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA.
4. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA.
5. NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.
6. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA.
7. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA.
8. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA.
9. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA.
10. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO.



Ing. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025




NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta



ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO 01/04/2026 AL 30/04/2026

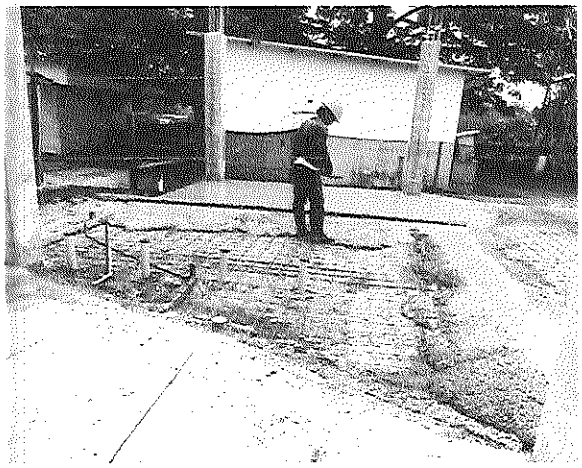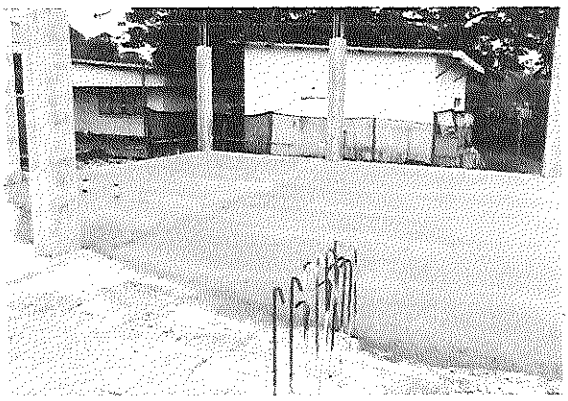PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	
	
Se realizó fundida para placa de contrapiso	Se realizó fundida para placa de contrapiso
	
Se realizó fundida para placa de contrapiso	Se realizó fundida para placa de contrapiso

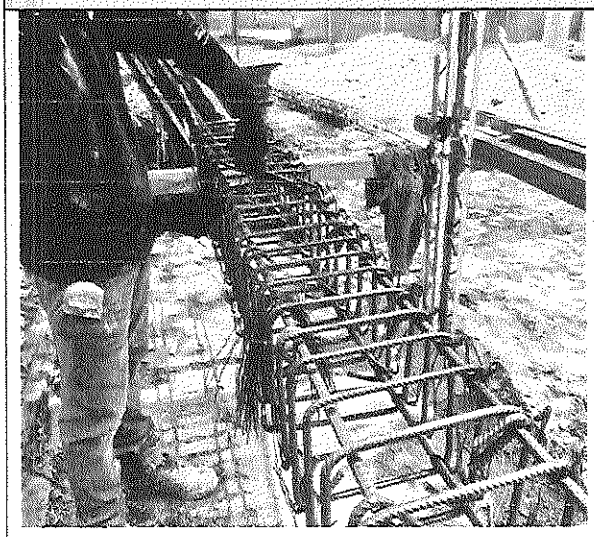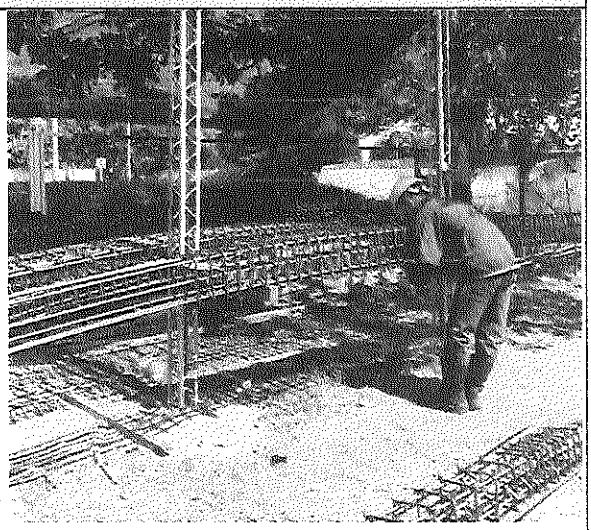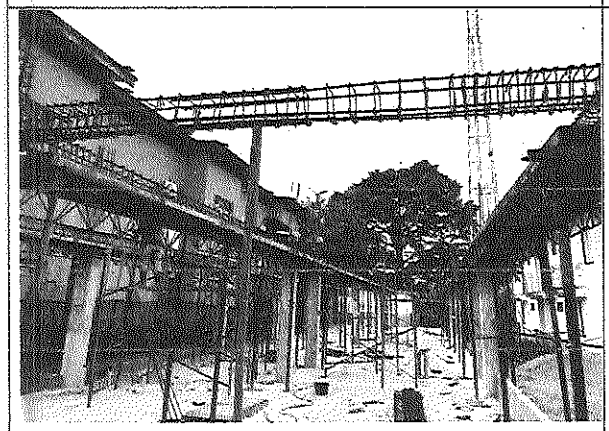ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	
	
Se realizó amarre de acero para vigas aéreas	Se realizó amarre de acero para vigas aéreas
	
Se realizó amarre de acero para vigas aéreas	Se realizó amarre de acero para vigas aéreas

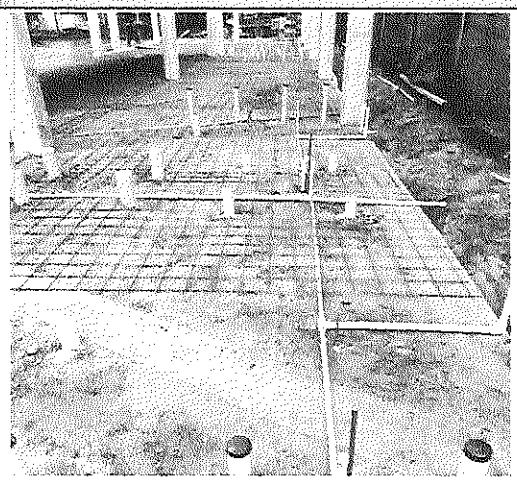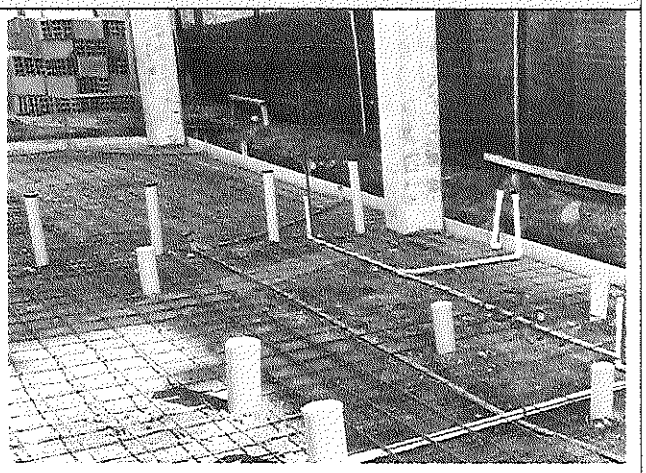RED DE PRESIÓN	
	
Se realizó instalacion de redes de presión para baños de primer piso	Se realizó instalacion de redes de presión para baños de primer piso

ANEXO 2.
COPIA DE BITACORA

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapaboocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							
Electrico	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Verificación traslapos malla electrosoldada		Alojamientos Nuevos	X	
Recorridos técnicos		Estación de Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq dirigido de la Calistenia. Se realiza reunion de instalación de malla electrosoldada plana para de contrapiso, verificando trabajos, Nivelación y amare se ejecutan recorridos técnicos para verificación de redes hidraulicas y sanitarias en primer piso de alojamiento nuevo. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada	Kg	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq seguido la cuadrilla se continua con la revisión de malla electrosoldada y adecuaciones menores. Se presentan lluvias fuertes durante la jornada lo que genera disminución en el rendimiento de actividades. Se realizan inspecciones de redes de presión No se presentan novedades

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	x	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada	Kg	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la calistenia. Se realizan revisiones de redes sanitarias en punto fijo. Se presentan lluvias moderadas durante la jornada no se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER R FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÌA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÒN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Revisional técnica		Alojamiento Nuevo	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la cotidiana. Se realizan revisiones de redes sanitarias en primer piso. Se presentan lluvias moderadas durante la jornada. No se presentan accidentes laborales

OBSERVACIONES:

C: Conforme	Y	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se laboro - por dia domingo.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 06 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa Contrapiso 3000 psi	M3	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 06 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla Hseq seguido la calistenia. Se inicia fundición de Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado (3000 psi) mezclado en obra, verificando dosificación, extendido y nivelación. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Casco	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa de Contrapiso 3000 Ps	M3	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÒN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla
treq y seguido la calistenia. Se continúa la fundición
de placa de contrapiso. Se presentan fuertes lluvias
pero se logra terminar la fundida sin novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1583 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 mes(es)	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Casco	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa contrapiso	M3	Alojamiento	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla inicial y seguido la caracterización se ejecuta el corte de la placa de contrapiso y limpieza del área.
Se realizan recomendaciones técnicas e hidráulicas.
NO se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 09 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa contapiso	M3	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 09 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq, seguido la calistenia. Se continuan actividades de cerrado y verificación de redes de presión. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 6

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Casco	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Verificación Area	GBL	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 6

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hse, seguido la existencia se continuan actividades de corrales y verificación de redes. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER R. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Acero de refuerzo	KG	Vigas aereas	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 Nov 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				
OBSERVACIONES:		SI		NO

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq, seguido la caracteriz. Se inicia figurado, armado y ace de acero de refuerzo fy=420 MPa para vigas aéreas N+3.00, ademas de mastas y viguetas. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dia no laborado (Domingo)

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Casco	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Acero de Refuerzo	Kg	Vigas aéreas	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la existencia. Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo en vigas aéreas. NO se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	✓	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Aseo de Reparo	Kg	Vigul Cielar.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla inicial y seguido la cotidiana. Se avanza en el armado de acero de refuerzo y verificación de diseño estructural. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	✓	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Acero de refuerzo	Kg	Vigas cadenas	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la cotidiana. Se continuan trabajos de armado de area de refuerzo en Viga y cerca. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Casco	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Aseo de oficina	UG	Viguel oficina	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla
diaria y seguido la cotidiana. Se piercatan lluvias
moderadas. Se realizan ajustes finales en acero de
refuerzo previo a encofrado. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	√	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	√	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	√	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	√	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	√	
TOPÓGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aereas		Acopiamiento	√	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la Charla inicial, seguido la calistenia. Se da inicio a las actividades de excavación de vigas aéreas N+3.00, incluyendo instalación de formaletas, alineación y nivelación No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamiento Y	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hse y seguido la calistenia. Se continua con el encapuchado de vigas diafragma, recalzando ajuste, alineamiento y revisión de estabilidad de formaletas. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	✓	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se labora (Domingo)

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 .

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Montaje Vigas aereas		Alojamientos nuevos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 3

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla Hseq, seguido la Calistenia. Se presentan lluvias moderadas se continua con el trabajo de encofrado de vigas aéreas N+3.00 y se realizan recorridos técnicos de revisión eléctrica e hidráulica bajo supervisión de interventoría. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 1

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Montaje Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 1

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla HSEQ y seguido la calistenia. Se continúa con las actividades de encofrado de viga aéreas, verificando alineación, nivelación y aseguramiento de formaletas. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	✓	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Montaje Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades laborales con la charla hseq y seguido la caminata. Se continúa con las actividades de formaleteado / encofrado de vigas aéreas, realizando ajuste y arriostramiento de la formaleta instalada. Se realiza revisión de niveles y alineación con equipo de Medición.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 de Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla diaria y seguido la caminata. Se avanza en el armado y colocación de formaleta en vigas aereas restantes. Se verifica la correcta Fijación de elementos de soporte y se realiza control de nivelación

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R. FIRMA	J. A. H. FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 24 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Casco	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Encofrado de Vigas aéreas		Alojamiento Nuevo	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 24 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la Coristenia. Se ejecutan actividades de revisión general del sistema de Formaleta instalado, corrigiendo desviaciones encontradas en niveles.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamiento	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigacion Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÀCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas. Con la charla Hseq y seguido la Calistenia. Se continua el proceso de encofrado, sin embargo, se presentan condiciones climáticas de lluvia durante la jornada, lo cual genera disminución en el rendimiento de las actividades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	✓	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Casco	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0	-						
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 April 2026.	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla Hseq y seguido la calistenia. Se adelantan labores de Verificación de niveles y alineación. Durante el dia se presentan lluvias intermitentes, afectando parcialmente el desarrollo normal de las actividades. Se corrigen inconsistencias de nivelación.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamientos Nuevos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla inicial, seguido la calistenia. Se continua con el abastecimiento de la formaleta. Se realiza reunión conjunta con equipo técnico para validación de elementos.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Viga aérea		Alojamiento 1.		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla
hseq y seguido la diligencia. Se realiza inspección detallada
de toda la formaleta instalada en vigas aéreas

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	√	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aereas.		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hse y seguido la caminata. Se realizan Ajustes en la Formaleta, no obstant, se presentan lluvias durante la jornada, lo que limita el avance continuo. Se realiza limpieza general en la obra.

OBSERVACIONES:

C: Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 30 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas Aéreas		Alojamiento	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
	X			X	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
	X				X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
		X			X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 30 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se continúa con las actividades de formaleteado de vigas aéreas, realizando ajuste, alineación y verificación de niveles. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	✓	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ANEXO 3.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-20, 04:35:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081588727

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 15/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		
Documento	NI902011453	**Dirección**	CL 2 #27 - 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	GARCIA FONSECA INGRID MARYORY	**Identificación**	CC 1121837768
Total Afiliados	18	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1088346902	YESID GALINDO GAITAN	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF34) COFREM	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121883524	JENNY PAOLA FERIA TRIVIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121887637	YONLI YULIETH LOZANO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121922788	ELKIN FABIAN ZAMBRANO ALVAREZ	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF34) COFREM	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1122144736	MARGIE DANIELA HERRERA PAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1124990792	ALEXIS DAVID BELTRAN YAVINAPE	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1124999733	JHONI RODRIGUEZ PEREZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPS/C6) EPS PIJAOSALUD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1125549456	JUAN MARTIN BOLIVAR GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1193092733	BRAYAN STEVEN RIVERA MARTINEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.225.634	$ 196.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.225.634	$ 49.100	6,960	$ 1.225.634	$ 85.400	(CCF34) COFREM	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.800
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
CC 74857071	DAGOBERTO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS/C34) RECAUDO EGP CAPITAL SALUD	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80166369	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8192573	VICENTE GAITAN GAITAN	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS/C5) EPS MALLAMAS	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF34) COFREM	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 86008126	AGUSTIN AGUILAR GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86055645	OSCAR ALEXANDER PATIÑO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 93372770	SEGUNDO ROA CRUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.760.905	$ 70.100	6,960	$ 1.760.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.760.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 24.919.794	$ 26.670.699	$ 26.670.699	$ 26.670.699	$ 3.988.100	$ 1.067.900	$ 1.857.000	$ 1.067.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.980.900	$ 6.600	$ 7.987.500

ANEXO 4.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Los suscritos **INGRID MARYORY GARCIA FONSECA** identificado con la cedula de ciudadanía **1.121.837.768** de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN** identificada con **Nit. 902.011.453-2**, y **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.071.198 y Tarjeta profesional 187.220-T en mi condición de **CONTADOR PUBLICO**, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo comprendido del 01/04/2026 al 0/4/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los seis (6) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

R/L. INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

CESAR OSWALDO SOTO H.
CONTADOR PUBLICO
T.P 187.220-T.

Puerto Gaitán, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.071.198

SOTO HERNANDEZ

APELLIDOS

CESAR OSWALDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1982
MITU
(VAUPES)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 B+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-FEB-2000 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5205000-00363566-M-0086071198-20126300 0029373BNEA 2 37397293

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187220-T



CESAR OSWALDO
SOTO HERNANDEZ
C.C. 86071193
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/02/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199044

187784

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 D 0 9 D 2 3 4 C 5 B C A 2 8 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86071198 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 187220-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 5.
NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	140,000	140,000	280,000	3,220,000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3,558,750	3,558,750	-	3,558,750	142,350	142,350	284,700	3,274,050	
CC 80074981	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 86063763	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISELL JOHANNA			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
						15,813,275	1,245,475	17,058,750	632,531	632,531	1,265,062	15,793,688	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-05-20, 04:42:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1081588607

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

Fecha límite de pago: 2026-05-07

GUARDADA 28/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025				
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META		
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC86088145		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 41952332	VILLARREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISSELL JOHANA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 9.200	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	ARL SURA	$ 3.558.750	$ 247.700	COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	ARL SURA	$ 3.500.000	$ 243.600	COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121956360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 2.530.400	$ 0	$ 0	$ 632.900	$ 988.100	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.784.300	$ 44.900	$ 4.829.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO 7.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Los suscritos DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO identificado con la cedula de ciudadanía 86.088.145 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025 identificado con Nit. 902.014.419-5, y JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.848.323 y Tarjeta profesional 180143-T en mi condición de CONTADOR PUBLICO, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo de abril comprendido del 01/04/2026 al 30/04/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Dada en Villavicencio, a los quince (15) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR PUBLICO
T.P 180143-T

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.121.848.323



CASTRO GALVIS

JHON ALEXANDER

COL | 1.70 | M

15 ENE 1989 | O+

VILLAVICENCIO (META)


18 ENE 2007, VILLAVICENCIO

08 SEPT 2032

.CO

003884599

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha




ICCOL0038845998520O1<<<<<<<<<<<
8901158M3209088COL1121848323<1
CASTRO<GALVIS<<JHON<ALEXANDER<

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

130143-T



JHON ALEXANDER
CASTRO CALVIS
C.C. 1121848323
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 191641

108739

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 8 C 0 5 C B F 2 0 2 C 0 0 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121848323 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 180143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 8.
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA

Villavicencio, 28 de marzo del 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
Ciudad.

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
Tema: Informe de resistencia a la compresión de concretos.

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud para la realización del ensayo de resistencia a la compresión simple a muestras cilíndricas de concreto elaboradas y transportadas por ustedes. Me permito informar que estas fueron probadas de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 673-10, con el fin determinar su resistencia a los siete, catorce y veintiocho días de curado.

En virtud de lo anterior entrego los resultados de quince (15) muestras falladas.

El presente informe consta de dos (02) páginas y no debe reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio, los resultados contenidos en él se relacionan únicamente con las muestras ensayadas.

Quedo en espera de cualquier inquietud.

Sin otro particular.

INGRID ARANGUREN BEJARANO
Especialista en diseño y construcción de Vías y aeropistas
Especialista en Patología de la Construcción
Especialista en Gerencia Estratégica
Gerente de RAMCODES Ingeniería y Ensayos

LABORATORIO RAMCODES INGENIERIA Y ENSAYOS	LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES,CONCRETOS Y PAVIMENTOS	VERSIÓN	001
		CODIGO	F-CON-001
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	FECHA DE VIGENCIA	1/01/2017
			CON-RAMW-01
	ESPECIFICACION/NORMA	INV E-410-13 Y NTC 673-10	

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.				
DIRIGIDO A:	UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025	NIT:	902014419-5	FECHA DE ENTREGA:	sábado, 28 de marzo de 2026
CONTACTO:	ING. MIGUEL CIPAGAUTA	CELULAR:	3183308819	CORREO:	utinterpolicia2025@gmail.com
DESCRIPCION:	MUESTRAS ELABORADAS EN OBRA	MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	DEPARTAMENTO:	META

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (Mpa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
RDG-1	ZAPATAS-ALOJAMIENTOS	f'c 3000 PSI	21	--	22-feb.-26	7	1-mar-26	104	3792	8495	2199	107.2	1,838	12.9	61.3%	5
						14	8-mar-26	104	3808	8495	2208	141.0	2,418	16.9	80.6%	4
						28	22-mar-26	105	3817	8659	2204	183.0	3,079	21.6	102.6%	4
RDG-2	PEDESTALES - ALOJAMIENTOS	f'c 3000 PSI	21	--	23-feb.-26	7	2-mar-26	103	3762	8332	2257	107.8	1,885	13.2	62.8%	5
						14	9-mar-26	105	3831	8659	2190	145.5	2,448	17.1	81.6%	6
						28	23-mar-26	103	3776	8332	2232	172.1	3,009	21.1	100.3%	5
RDG-3	VIGA CIMENTACIÓN - ALOJAMIENTOS	f'c 3000 PSI	21	--	25-feb.-26	7	4-mar-26	103	3779	8332	2268	107.1	1,872	13.1	62.4%	4
						14	11-mar-26	103	3747	8332	2248	142.4	2,490	17.4	83.0%	4
						28	25-mar-26	104	3728	8495	2162	176.0	3,070	21.5	102.3%	4
RDG-4	COLUMNA FILA A, B, C - ALOJAMIENTOS	f'c 3000 PSI	21	--	27-feb.-26	7	6-mar-26	104	3722	8495	2130	107.9	1,860	13.0	61.7%	5
						14	13-mar-26	104	3788	8495	2157	144.7	2,481	17.4	82.7%	6
						28	27-mar-26	105	3787	8659	2158	178.7	3,008	21.0	100.2%	6
RDG-5	COLUMNA FILA D, E, F - ALOJAMIENTOS	f'c 3000 PSI	21	--	28-feb.-26	7	7-mar-26	105	3822	8659	2174	108.4	1,824	12.8	60.8%	4
						14	14-mar-26	105	3787	8659	2154	146.4	2,463	17.2	82.1%	6
						28	28-mar-26	103	3791	8332	2280	174.0	3,042	21.8	101.4%	5

OBSERVACIONES: _____


REVISO Y APROBO:

Ing. Ingrid Aranguren Bejarano

Gerente de RAMCODES Ingeniería y Ensayos

*Este informe no es válido, sin la firma y sello original.

TIPO DE FALLA

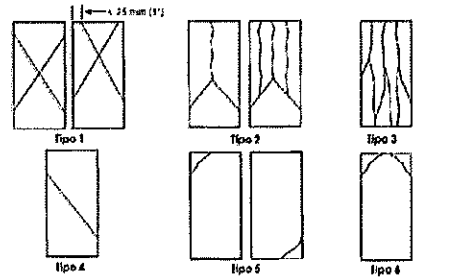

ANEXO 9.
INFORME SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 5

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

CR. 6 #17-49 Puerto Gaitán – Meta
Tel. 3204253826

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION....3
2. OBJETIVOS....3
   2.1. OBJETIVO GENERAL....3
   2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS....3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....4
   3.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA....5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA....7
5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA....8
6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN HSEQ....9
7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS....10
8. CONDICIONES CLIMÁTICAS....11
9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....11
10. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO....11
11. REGISTRO FOTOGRAFICO....13
CHARLAS E INDUCCIONES....13
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL....13
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....14
12. CONCLUSIONES....15

1. INTRODUCCION

El presente informe HSEQ corresponde al periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril 2026 y tiene como objetivo presentar el estado de las actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad del proyecto.

Durante este periodo, el proyecto se desarrolló en fase de alistamiento administrativo y técnico, con ejecución de actividades preliminares en campo, tales como el recorrido técnico de inspección de terreno, la localización y replanteo de alojamientos nuevos y el descapote manual en la zona de intervención. Estas labores permitieron avanzar en la verificación de las condiciones iniciales del sitio y en la preparación del área para el inicio de las actividades constructivas.

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito fundamental la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades laborales, promoviendo entornos de trabajo seguros y saludables. En la actualidad, este enfoque se extiende a todas las profesiones y oficios, buscando que el trabajo se adapte a las capacidades del trabajador y no que el trabajador se exponga a condiciones que afecten su integridad física o mental.

El presente informe se fundamenta en las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, orientadas a la planeación, organización y estructuración del sistema HSEQ, así como a la identificación preliminar de las condiciones de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto. Lo anterior permite establecer las medidas preventivas necesarias, aplicar buenas prácticas y garantizar condiciones seguras para el personal que será vinculado en las etapas posteriores de la obra.

El principal objetivo del sistema HSEQ es la identificación y control de peligros que puedan afectar tanto a los trabajadores como a personal ajeno a la obra, fortaleciendo el compromiso con la seguridad, la salud y el cumplimiento normativo, y asegurando la correcta implementación del sistema de gestión durante el desarrollo del proyecto.

La Unión Temporal Inge Policía Gaitán mantiene un firme compromiso con la protección de la salud y la seguridad de su población trabajadora, mediante la evaluación continua y la mitigación de los riesgos presentes en las áreas de trabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, reconoce que la participación y el compromiso de los trabajadores son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Temporal responsable del proyecto, alineado con los requisitos HSEQ establecidos por la interventoría y la normativa vigente, garantizando condiciones seguras y controladas para el personal que será vinculado durante la ejecución del contrato.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover condiciones de trabajo que favorezcan el bienestar físico y mental de los trabajadores.

- Fomentar la concientización sobre la mitigación de impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto.

- Garantizar el control de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de la obra, conforme a los lineamientos del plan ambiental aplicable.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio ubicado en la región del río Manacacias, es el Cuarto municipio con extensión territorial en Colombia y primero en el departamento del Meta con 17.499 km². Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.

Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.

Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y recreación.

Límites del municipio:

Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripan y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

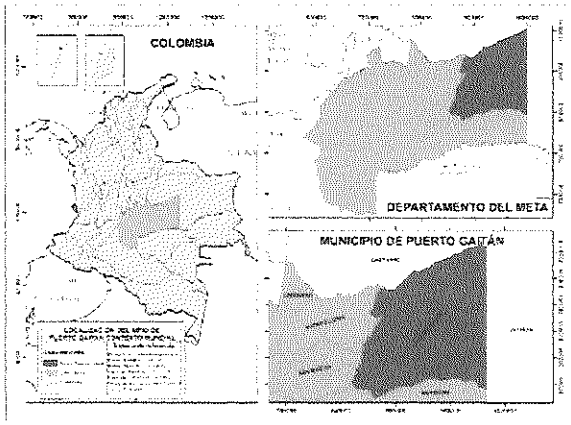


Ilustración 1. Localización Geográfica Municipio de Puerto Gaitan, Dpto. Meta

FUENTE: https://www.researchgate.net/publication/325613809

3.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

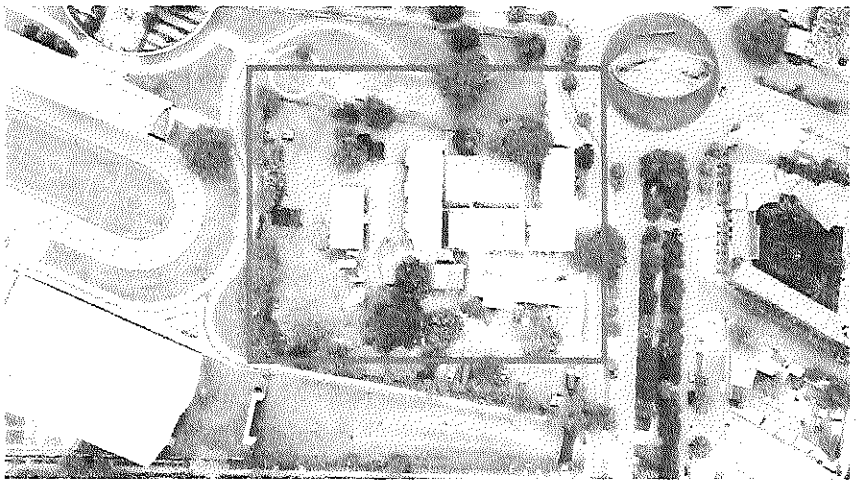


Ilustración 2. Localización Especifica del Proyecto

FUENTE: Elaboración Propia

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.

De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.

La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control

territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.

En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.

Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

3.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

3.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	utinterpolicia2025@gmail.com
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026

Tabla 1. Información del contrato de interventoria

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA

La interventoría cuenta con el personal profesional estipulado y ofertado, los cuales han realizado las actividades correspondientes del periodo en mención. A la fecha el personal vinculado ofertado para el presente periodo según el presupuesto vigente de la interventoría es el siguiente:

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1081588607
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1081588607
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1081588607
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607

Tabla 2. Información administrativa de interventoria

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN HSEQ

La Interventoria realizó el seguimiento técnico continuo, la inspección en campo y la revisión documental de las condiciones bajo las cuales se ejecutaron las actividades operativas del período, correspondientes a la ejecución de placa de contrapiso en concreto impermeabilizado, el armado de acero de refuerzo para vigas aéreas y la instalación de redes hidráulicas.

Durante las visitas de verificación realizadas, se constató que la totalidad de las actividades fueron desarrolladas bajo los lineamientos del Sistema de Gestión HSEQ implementado por el contratista, verificando el establecimiento y mantenimiento de condiciones seguras de trabajo en los frentes de obra activos, el control efectivo de los aspectos e impactos ambientales asociados a cada actividad constructiva y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos en las especificaciones técnicas del proyecto.

Por otro lado, se realizó la verificación en campo y la revisión documental de cada una de las actividades del Sistema de Gestión HSEQ implementadas por el contratista durante el período de reporte, certificando lo siguiente:

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos: La Interventoría verificó que la identificación sistemática de los peligros asociados a las actividades ejecutadas en campo, aplicando la metodología de evaluación de riesgos establecida en su Sistema de Gestión HSEQ. Se constató la actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos conforme a las actividades del período, así como la implementación efectiva de los controles operativos definidos para la mitigación de los riesgos identificados, en cumplimiento de la jerarquía de controles establecida por la normativa vigente.

Socialización de Procedimientos Seguros de Trabajo: La Interventoría verificó la realización de las jornadas de socialización de procedimientos seguros de trabajo y medidas preventivas con el personal vinculado a la obra, constatando la existencia de los registros de asistencia y soportes documentales correspondientes.

Verificación del Uso de Elementos de Protección Personal (EPP): La Interventoría realizó inspecciones técnicas en campo orientadas a verificar el suministro, disponibilidad y uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de la totalidad del personal en obra, constatando que los EPP utilizados corresponden a los requeridos para cada actividad según la matriz de riesgos vigente, que se encuentran en buen estado de conservación y que su uso es consistente con los procedimientos de seguridad establecidos.

Control y Seguimiento a las Condiciones de Seguridad en Campo: La Interventoría realizó recorridos periódicos de inspección técnica a los frentes de obra activos con el propósito de verificar el mantenimiento de las condiciones de seguridad durante la ejecución de las labores constructivas. Durante dichos recorridos se verificó el estado de las señalizaciones y demarcaciones de las zonas de trabajo, la adecuada instalación de las medidas de protección colectiva requeridas, el orden y aseo de los frentes de trabajo y el cumplimiento de los procedimientos operativos seguros definidos para cada actividad. Las observaciones y hallazgos identificados durante las inspecciones fueron comunicados oportunamente al contratista para su atención y cierre en los términos establecidos.

7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó seguimiento, revisión y verificación permanente al estado operativo de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en la ejecución de las actividades constructivas, en cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del componente HSEQ del proyecto. Como resultado de las inspecciones efectuadas, se constató que los equipos empleados en obra se encontraban en adecuadas condiciones de funcionamiento y operación, cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad exigidos para su utilización.

De igual manera, la interventoría verificó el control y uso adecuado de equipos menores y herramientas manuales empleadas en actividades de mezcla de concreto, manipulación e instalación de acero de refuerzo y ejecución de redes hidráulicas, evidenciando que previo a su utilización se realizaban inspecciones visuales y preoperacionales orientadas a identificar condiciones inseguras, desgaste, fallas mecánicas o posibles riesgos asociados a su operación.

Asimismo, se realizó seguimiento al cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos vinculados al proyecto, verificando que dichos mantenimientos se encontraran al día y debidamente soportados.

En relación con la maquinaria y equipos movilizados en obra, la interventoría verificó la disponibilidad y operación de los siguientes elementos: pulidoras de 7 ½" y 4 ½", mezcladora, planta eléctrica y volqueta, utilizados conforme a las necesidades operativas del proyecto.

Finalmente, se evidenció que todos los equipos, maquinaria y herramientas empleados durante la ejecución de las actividades descritas en el presente informe fueron sometidos a las respectivas inspecciones preoperacionales con la periodicidad establecida, dejando los correspondientes registros de control y seguimiento, en cumplimiento de los procedimientos definidos dentro del sistema de gestión HSEQ.

8. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante el periodo objeto de seguimiento, la interventoría realizó actividades de verificación y control sobre las condiciones climáticas y su posible incidencia en la ejecución de las actividades constructivas, en el marco del componente HSEQ del proyecto. Como resultado del seguimiento efectuado, se constató que no se presentaron eventos climáticos adversos que generaran afectación, suspensión o disminución en el rendimiento de las actividades programadas en obra.

9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución del contrato 1701 que tiene como objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META", por parte de contratista de obra se realizó la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con verificación de interventoría, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las obligaciones contractuales en esta materia.

En el marco de la gestión realizada, se verificó y avaló la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, los cuales fueron ejecutados conforme a la normatividad vigente. Se constató que dichos procedimientos se ofrecieron como opción voluntaria al trabajador, garantizando el derecho a decidir sobre la valoración médica laboral, sin perjuicio de la obligación contractual del contratista de disponer y ofrecer tales exámenes.

De igual manera, se corroboró la entrega oportuna y adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP), verificando que estos correspondieran a los riesgos identificados en las actividades de obra, cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas y fueran suministrados mediante actas de recibido debidamente firmadas por los trabajadores, lo cual asegura trazabilidad documental y cumplimiento normativo.

Se ejerció control sobre la ejecución de charlas de inducción y capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo, enfocadas en la prevención de riesgos asociados a labores de mantenimiento vial, manipulación de herramientas, trabajo en campo y prácticas de autocuidado. Dichas actividades fueron soportadas mediante listas de asistencia y registros documentales, los cuales fueron revisados y validados por la interventoría para garantizar su pertinencia y efectividad.

El acompañamiento incluyó la verificación de la implementación de campañas de promoción de la salud y prevención de accidentes, la ejecución de pausas activas y la difusión de protocolos de actuación en caso de emergencias, asegurando la cobertura integral de las obligaciones en materia de SST.

10. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Esta Interventoría verificó que el Plan de Manejo de Tránsito implementado por el contratista durante el periodo de reporte mantiene coherencia con su objetivo técnico fundamental, orientado a la identificación, prevención y mitigación de los impactos generados sobre la movilidad y la seguridad vial como consecuencia de la ejecución de las actividades constructivas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad para la totalidad de los usuarios del área de influencia del proyecto. Durante las visitas de inspección realizadas en campo, esta Interventoría constató la continuidad en la implementación efectiva de las medidas contempladas en el plan aprobado, evidenciando un avance progresivo y satisfactorio en el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas.

- **VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO IMPLEMENTADAS**

Señalización Informativa en Vías con Obras (SIO)

La Interventoría realizó la inspección técnica y verificación en campo de la instalación de la señalización informativa en vías con obras (SIO), constatando que los dispositivos instalados cumplen con las especificaciones técnicas de tamaño, color, reflectividad y ubicación establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente. Se verificó que la señalización dispuesta provee información oportuna y suficiente a los usuarios viales sobre la presencia de actividades constructivas en el área de influencia del proyecto, contribuyendo efectivamente a la prevención de incidentes de tránsito en el sector intervenido.

Dispositivos de Canalización y Delimitación del Área de Intervención

Esta Interventoría verificó la implementación y el estado de los dispositivos de canalización dispuestos para la delimitación del área de intervención y el control del tránsito interno, incluyendo conos de señalización, cinta de demarcación y demás elementos de control vial. Durante las inspecciones técnicas realizadas, se constató que los dispositivos se encuentran correctamente ubicados conforme al esquema de señalización del PMT aprobado, en buen estado de conservación y visibilidad, y que su disposición garantiza la separación efectiva entre las zonas de trabajo activo y las áreas de circulación de usuarios, en cumplimiento de los criterios de seguridad vial establecidos.

Control de Ingreso y Salida de Vehículos de Obra

La Interventoría verificó la implementación de los elementos y procedimientos para el control operativo del ingreso y salida de vehículos asociados a la obra, constatando la disponibilidad y uso efectivo de paletas PARE/SIGA por parte del personal operativo y la operación de los equipos de comunicación requeridos para la coordinación del tránsito vehicular en el área de influencia. Se verificó que estos dispositivos y procedimientos fortalecen el control operativo en los puntos críticos de acceso a la obra, reduciendo el riesgo de conflictos entre el tránsito vehicular externo y las maniobras de los vehículos de construcción.

- **VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO VIAL**

Esta Interventoría verificó durante las visitas de campo realizadas en el período de reporte la presencia continua del personal operativo de inspección vial asignado por el contratista para las labores de control, orientación y gestión del tránsito en el área de influencia del proyecto. Se constató que los inspectores viales desarrollaron sus funciones de manera permanente durante los horarios de ejecución de las actividades constructivas, ejerciendo el control direccional del flujo vehicular, orientando a los usuarios viales y garantizando condiciones adecuadas de seguridad en el sector, en cumplimiento de los roles y responsabilidades definidos en el PMT aprobado.


- **VERIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA MOVILIDAD EXTERNA**

Con base en las visitas de inspección técnica realizadas en campo durante el período de reporte, esta Interventoría constató y certifica que la totalidad de las actividades constructivas ejecutadas se desarrollaron al interior del perímetro de las instalaciones de la Estación de Policía, condición que limitó de manera efectiva la generación de interferencias sobre la infraestructura vial externa y la movilidad vehicular del entorno urbano del proyecto. Esta

Interventoría verificó que no se registraron afectaciones significativas a la movilidad vehicular externa durante el período evaluado, evidenciando que las medidas de manejo de tránsito implementadas resultaron proporcionales y adecuadas a las condiciones reales de la obra en el período de reporte.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO


CHARLAS E INDUCCIONES

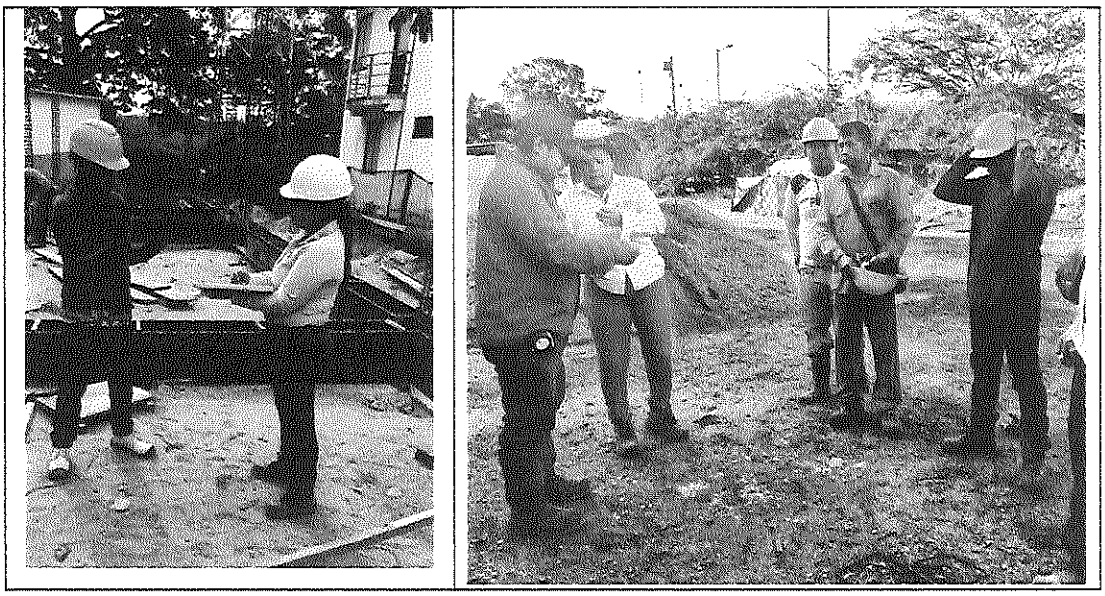

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

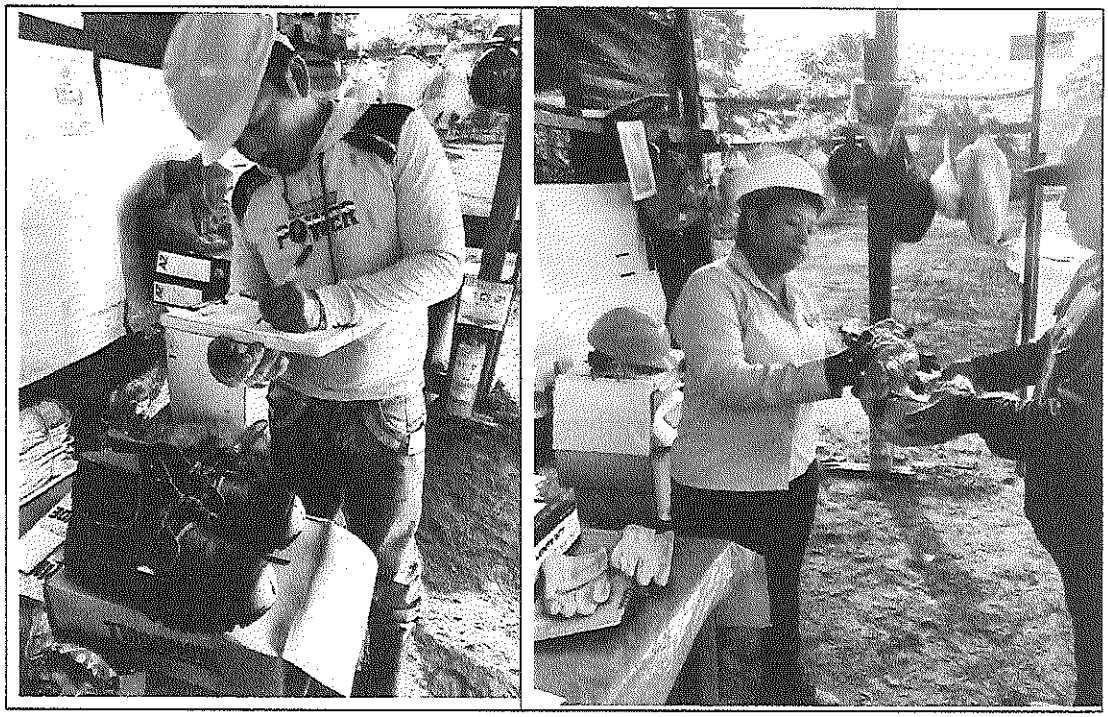

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO



UT INTERPOLICIA
2026
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

12. CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades de seguimiento, inspección y control realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, la interventoría evidenció avances en la ejecución de actividades constructivas asociadas a la construcción de placa de contrapiso en concreto, armado de acero de refuerzo para vigas aéreas e instalación de redes hidráulicas, verificando que dichas labores fueron desarrolladas conforme a las condiciones técnicas y operativas establecidas para el proyecto.

La interventoría constató el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), mediante la implementación de medidas de identificación, evaluación y control de riesgos asociados a las actividades ejecutadas en obra. Asimismo, se verificó el adecuado uso de elementos de protección personal, el control operacional en actividades de riesgo y la aplicación de medidas preventivas orientadas a minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y actos inseguros durante la ejecución de las labores.

De igual manera, se realizó seguimiento permanente al estado y condiciones de operación de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en obra, verificando el cumplimiento de las inspecciones preoperacionales, mantenimientos preventivos y controles de seguridad establecidos dentro del sistema de gestión HSEQ, evidenciando que su operación fue desarrollada bajo condiciones adecuadas y por personal autorizado.

En el componente ambiental, la interventoría verificó la correcta implementación de las medidas de manejo y disposición de residuos sólidos generados durante la ejecución de las actividades, evidenciando prácticas adecuadas de segregación, almacenamiento temporal y control ambiental, contribuyendo a la prevención y mitigación de impactos sobre el entorno intervenido.

Finalmente, la interventoría concluye que la gestión HSEQ desarrollada durante el periodo evaluado presentó un cumplimiento adecuado de los lineamientos técnicos, normativos y de seguridad establecidos para el proyecto. No obstante, se identificaron situaciones que han generado afectaciones al cronograma de ejecución, las cuales se encuentran en proceso de atención mediante acciones técnicas, operativas y administrativas orientadas a garantizar la continuidad, seguridad y correcto desarrollo de las actividades constructivas.

Luis Carlos Lazo

LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ
Profesional SST
Union Temporal Interpolicia 2025
Nit. 902.014.419-5

ANEXO 10.
CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

UT INTERPOLICIA
2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1683 de 2025.**

CERTIFICO QUE:

La **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1683 de 2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de abril del 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de abril de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoria continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
