	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN, JUNIO 2026

Contrato de Interventoria No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____ / _____ / _____

Periodo del Informe: Desde: 01/ 05/ 2026 Hasta: 31 / 05 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	*INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO IDE INTERVENTORIA*					
1,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
2	*INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
2,01	**Cuadro de trazabilidad :** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
3	*INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de interventoría vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
4	*INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA*					
4,01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)				X	Contratista
4,02	Información de avance financiero de la interventoría	X	X			Contratista
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la interventoría	X	X			Contratista
4,04	Acta de pago del anticipo de interventoría (si aplica).				X	Contratista
4,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de interventoría.	X	X			Contratista
4,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de interventoría con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
5	*INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA*					
5,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
6	*INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA*					
6,01	**Cuadro de trazabilidad :** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
7	*INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA*					
7,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
8	*INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA*					
8,01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)	X	X			Contratista
8,02	Información de avance financiero de la obra	X	X			Contratista
8,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la obra	X	X			Contratista
8,04	Acta de pago del anticipo de obra (si aplica).	X	X			Contratista
8,05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra	X	X			Contratista
8,06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de obra con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
9	*INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO*					
9,01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			Contratista
9,02	Dificultades presentadas durante la ejecución e imprevistos presentados en desarrollo de las actividades (si aplica)	X	X			Contratista
9,03	Informe jurídico del estado de cumplimiento e incumplimiento del contrato y actuaciones realizadas por la interventoría	X	X			Contratista
10	*INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO*					
10,01	Cuadro de relación de personal (administrativo - operativo) de interventoría propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) organigrama de personal	X	X			Contratista
10,02	Certificado del representante legal de la interventoría y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales del personal de obra y de interventoría, avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			Contratista
11	*CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS POR LA INTERVENTORIA VS OBRA Y SU CONCEPTO*					
12	*VERIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)*					
13	*INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO*					
13,01	certificación de interventoría, de existencia de permisos y licencias ambientales y prediales para la ejecución total del proyecto y su vigencia cada uno	X	X			Contratista
13,02	Certificación a la disposición de materiales	X	X			Contratista
13,03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			Contratista
13,04	Concepto de la interventoría en el cual se hace el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Plan de Adaptación de la Guia Ambiental (PAGA) y Plan de Gestión del Riesgo (PGR) firmado por el profesional (si aplica).	X	X			Contratista
14	*ANEXOS*					
14,01	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			Contratista

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025	

Ciudad y Fecha: PUERTO GAITAN, ENERO 2026

Contrato de Interventoria No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____/_____/_____

Periodo del Informe: Desde: 16 / 12 / 2026 Hasta: 31 / 12 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
14,02	verificación de cartera topográfica de obra y concepto (si en el periodo se ejecutaron labores que requiere esta labor)	X	X			Contratista
14,03	Copia de los ensayos de laboratorio (interventoria)				X	Contratista
14,04	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)	X	X			Contratista
14,05	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			Contratista
14,06	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratad por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			Contratista
14,07	Informe de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de interventoria				X	Contratista
14,08	Copia bitácora de obra del periodo	X	X			Contratista
15	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			Contratista

NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoria, deben allegarse por la interventoria conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Envió

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
RÍL Interventoría

Aprobó

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Nota: se debe paginar los informes

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 06

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
(01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026)

INTERVENTORÍA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

La interventoría del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 se constituye como el mecanismo de control integral para la ejecución del proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán – Meta. Su alcance es multidisciplinario, abarcando los componentes técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La interventoría actúa como mecanismo de control y vigilancia permanente del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad, funcionalidad y correcta inversión de los recursos asignados al proyecto.
Dentro del alcance contractual de la interventoría se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:
- Supervisión y control técnico de las actividades ejecutadas en obra.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma físico y financiero.
- Verificación de cantidades de obra ejecutadas.
- Control de calidad de materiales, procesos constructivos y ensayos de laboratorio.
- Seguimiento administrativo, contractual y documental.
- Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales y SST.
- Revisión y trámite de actas, informes y soportes contractuales.
- Control y seguimiento a maquinaria, personal y equipos en obra.
- Emisión de conceptos técnicos, recomendaciones y observaciones a la entidad contratante.

1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

Puerto Gaitán es un municipio ubicado en el departamento de Meta. Incluye una extensa área de estructura plana conocida como las Sabanas de la Altillanura, cuyo eje principal es el río Meta.
El municipio es un rectángulo irregular circunscrito por el río Meta al norte, los ríos Manacacias y Yucao al oeste, el río Iteviare al sur y una línea recta al este. Forma el extremo noreste del departamento de Meta, siendo el municipio más alejado de la capital departamental, Villavicencio.Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.
Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.
Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y Recreación.
Límites del municipio:
Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripán y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

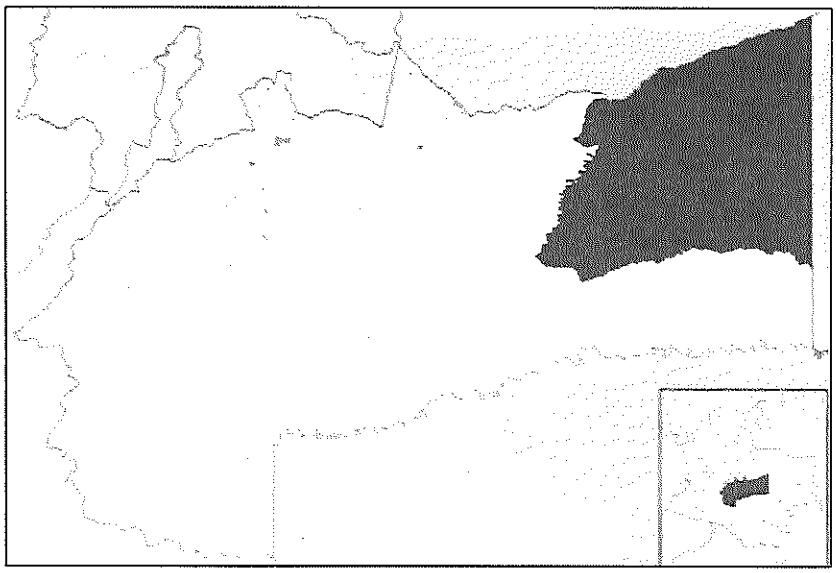


Ilustración 1. Localización de la cabecera municipal de Puerto Gaitán-Meta.

1.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

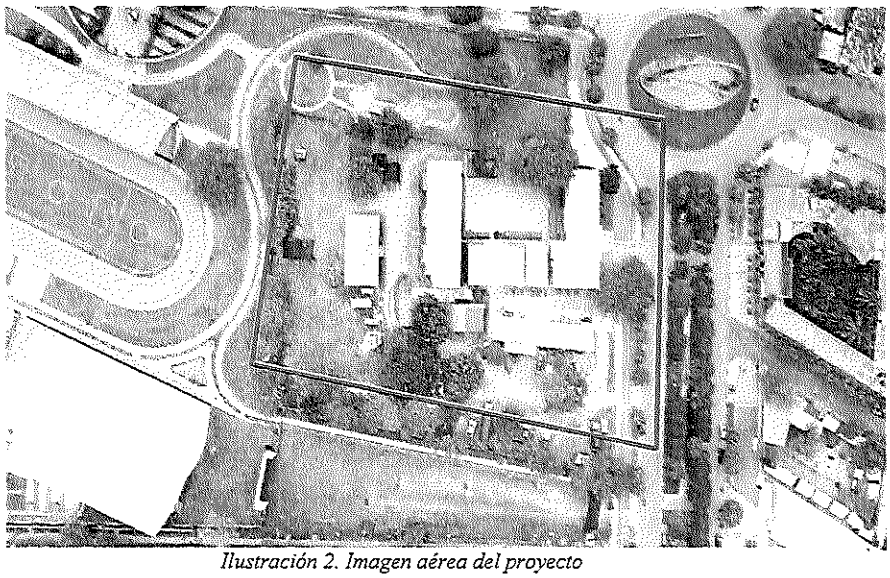


Ilustración 2. Imagen aérea del proyecto

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.
De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.
La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.
En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.
Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.
El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.
En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

1.5. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2 INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	utinterpolicia2025@gmail.com
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
MODIFICATORIA N.°1:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 Modificación a la cláusula decima octava del contrato de interventoría.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

3 INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de interventoría:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.3.3.4.01-R. B CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 74.136.286.00	DIS.2025002849	RES.2025004220
	$ 222.176.808,00	DIS. 2026000009	RES.2026000003
TOTALES	**$ 296.313.094,00**		

3.1. VERIFICACIÓN DE POLIZAS

SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	09/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	09/08/2026	09/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/12/2025	09/08/2029	$14,815,654.70	
SEGUROS DEL ESTADO	30-40-101025734 ANEXO 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	Aprobada
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Pagina web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

SEGÚN MODIFICATORIA No.01						
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO


RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
N/A	$		
N/A	$		
TOTALES	$		

BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO	$ 00		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	$ 00

El Contrato Interventoría No. 1701 de 2025 no cuenta con anticipo.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

4.2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

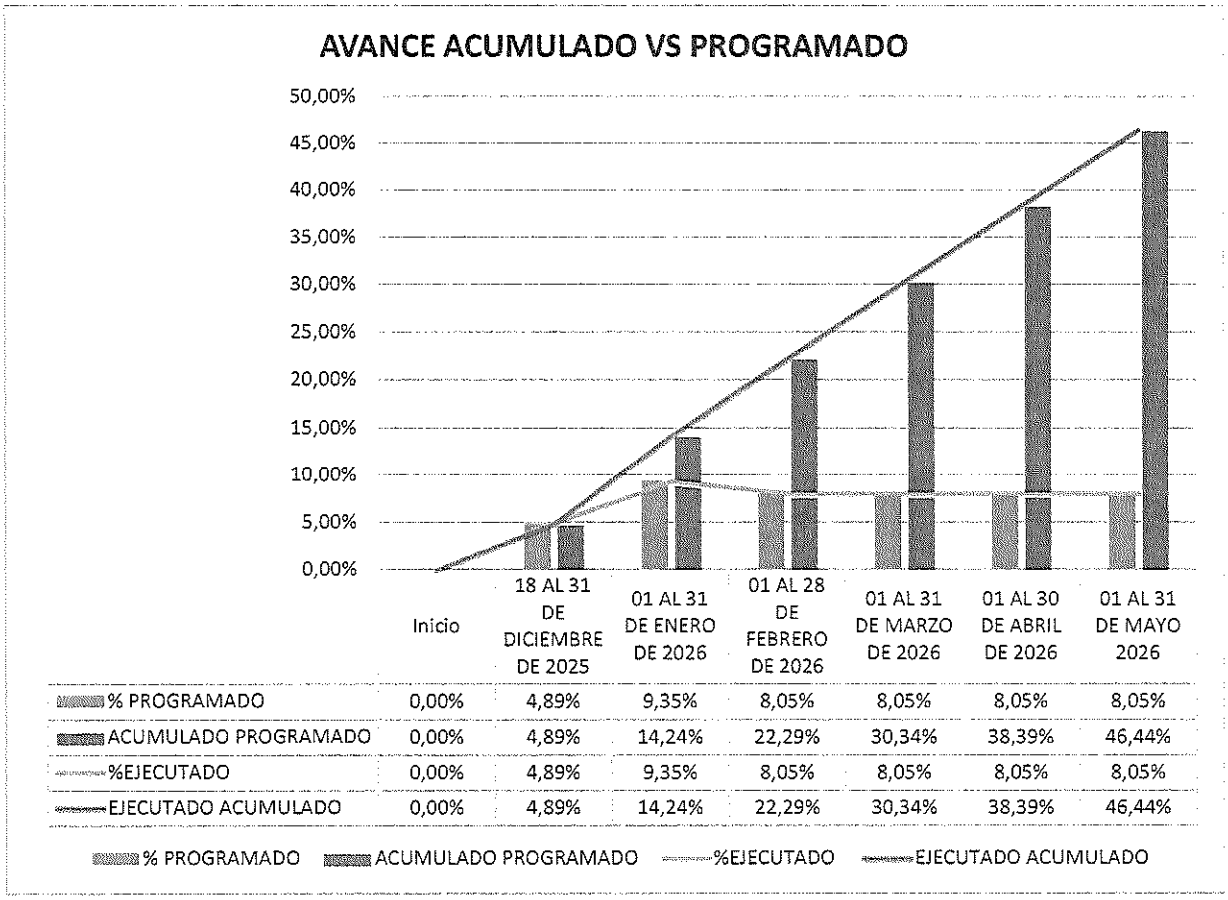

	Inicio	18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	01 AL 31 DE MARZO DE 2026	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	01 AL 31 DE MAYO 2026
% PROGRAMADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
ACUMULADO PROGRAMADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%	46,44%
%EJECUTADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
EJECUTADO ACUMULADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%	46,44%

4.3. BALANCE FINANCIERO


DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$296.313.094
VALOR PROYECTO ACTUALIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 01 – 35%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 02 – 15%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

5 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

PERSONAL (NOMBRE Y IDENTIFICACION)	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES C,C 80.074.961	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C 1.121966360	CADENERO
GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ C.C 1.006.874.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

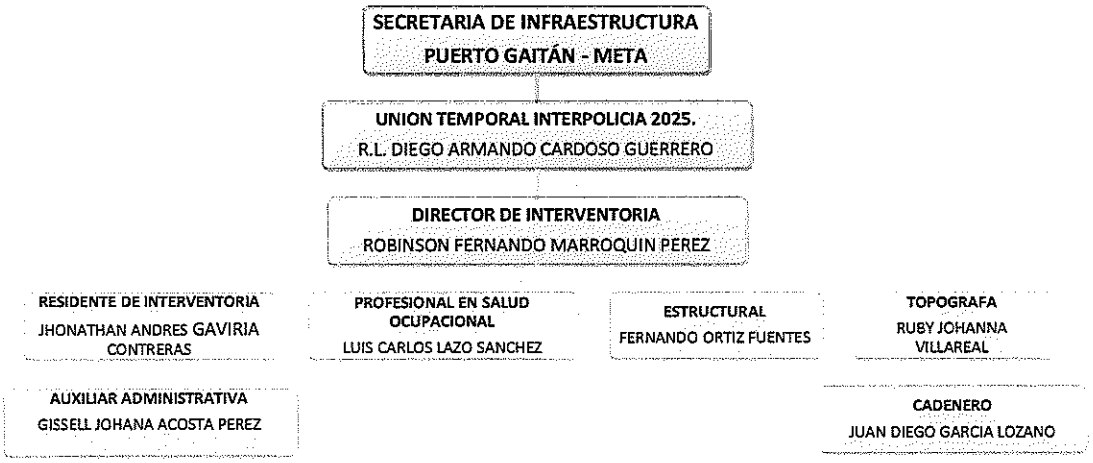

PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período comprendido entre el 01 de mayo del 2026 al 31 de mayo del 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RELACIÓN PLANILLA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (01/05/2026-30/05/2026)

Durante el período comprendido entre el 01 de mayo del 2026 al 31 de mayo del 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025.

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1082450092
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1082450092
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092

OBRA

6 GENERALIDADES DEL CONTRATO:

Considerando que el municipio de Puerto Gaitán – Meta, en su plan de desarrollo "JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027", ha viabilizado, priorizado y aprobado proyectos de inversión los cuales se encuentran incluido el programa 4501 "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA". Con la finalidad de cumplir con la meta PDM0318 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO", fue adjudicado mediante la licitación pública LP-SI-010-2025, que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META", con código BPIN 202500000031783 Este proyecto se encuentra suscrito al contrato de obra pública 1683 del día tres (03) de diciembre de 2025, siendo perfeccionado con el acta de inicio de fecha el día dieciocho (18) de diciembre de 2025.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.1. LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla un resumen de la ubicación del municipio.

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

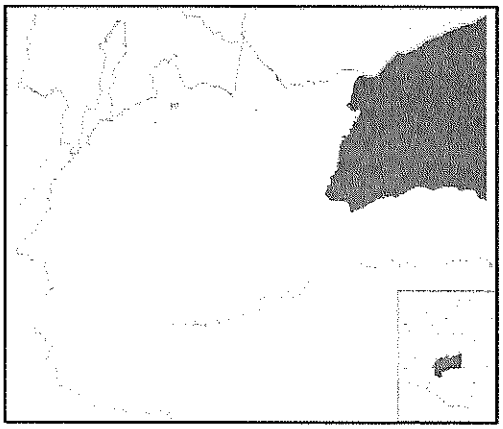


Ilustración 3. Localización de la cabecera municipal de Puerto Gaitán-Meta.

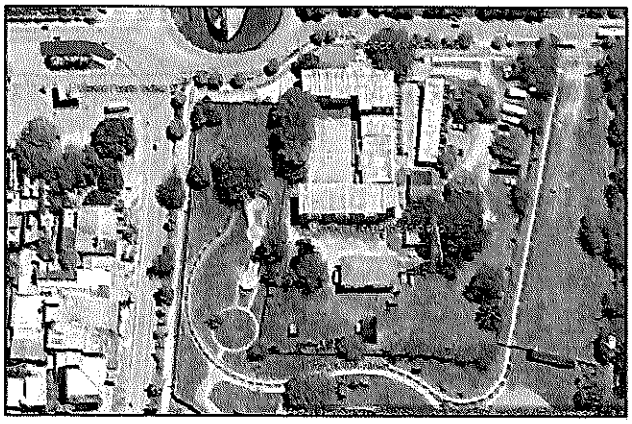


Ilustración 4. Imagen aérea del proyecto

El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la Estación de Policía, ubicada en la Carrera 10 N.° 17-31, barrio Alto Manacacías. Este sector corresponde a un área estratégica del municipio, donde se concentra una parte significativa de la actividad administrativa, comercial y social del territorio.

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal. Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.
La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado a vivienda familiar, la implementación de

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional. El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

6.3. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.

A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00
11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.306.277.668,00**

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

7 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	LP-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE OBRA NO. 1683 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	902.011.453-2
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	INGRID MARYORY GARCÍA FONSECA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. NO. 1.122.120.037 DE ACACIAS - META
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	UTINGEPOLICIAGAITAN@GMAIL.COM
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INGE POLICÍA GAITAN
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.306.277.668,00 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	17 DE AGOSTO DE 2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

8 INFORMACIÓN FINACIERA Y INFORMACION DE INVERSION DEL ANTICIPO

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de obra:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 620.406.812,00	DIS.2025002848	RES.2025004223
	$ 3.685.870.856,00	DIS.2026000007	RES.2026000004
TOTALES	**$ 4.306.277.668,00**		

BALANCE FINANCIERO

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
EGR.2026010031	$1.431.837.324,61	ANTICIPO No. 01 CTO 1683/2025 – 35%	21/01/2026
EGR.2026030507	$24.257.838,20	ANTICIPO No. 02 CTO 1683/2025 – 15%	16/03/2026
EGR.2026030508	$589.386.812,00		16/03/2026
TOTALES	**$ 2.045.481.974,81**		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	**$ 2.045.481.974,81**		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	**$ 00**

VERIFICACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

SEGUN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZAS N°**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS POLIZAS**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 0	Cumplimiento	02/12/2025	02/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	02/12/2025	02/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	02/08/2029	$ 215.313.883,40	
		Estabilidad y calidad	02/12/2025	02/12/2030	$ 430.627.766,80	
SEGÚN ACTA DE INICIO						

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta


SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2	Cumplimiento	18/12/2025	18/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	18/12/2025	18/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	18/12/2025	18/08/2029	$ 215.313.883,40	
		Estabilidad y calidad	18/12/2025	18/12/2030	$ 430.627.766,80	

SEGUN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZAS Nº**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS POLIZAS**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101025675 ANEXO 0	Predios labores y operaciones	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Perjuicios extrapatrimoniales	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Responsabilidad civil patronal	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Vehículos propios y no propios	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2	Predios labores y operaciones	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Perjuicios extrapatrimoniales	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Responsabilidad civil patronal	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Vehículos propios y no propios	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

9 PROGRAMADO VS EJECUTADO (GRAFICAS) AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345	$297.199.233	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987	$484.937.220	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087	$706.564.307	5,15%	16,41%	$95.934.936,12	$379.838.767,96	2,23%	8,82%
31/05/2026	$331.938.505	$1.038.502.812	7,71%	24,12%	$189.309.686	$569.148.454	4,40%	13,22%

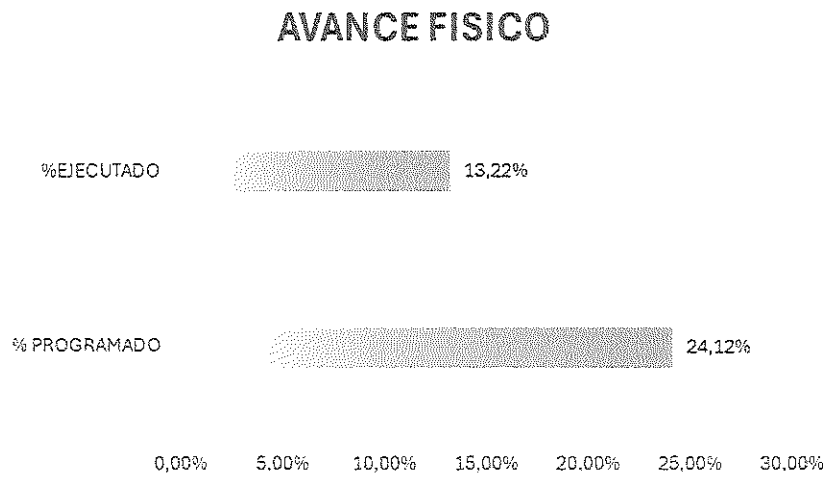

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

TABLA DE SEGUIMIENTO $


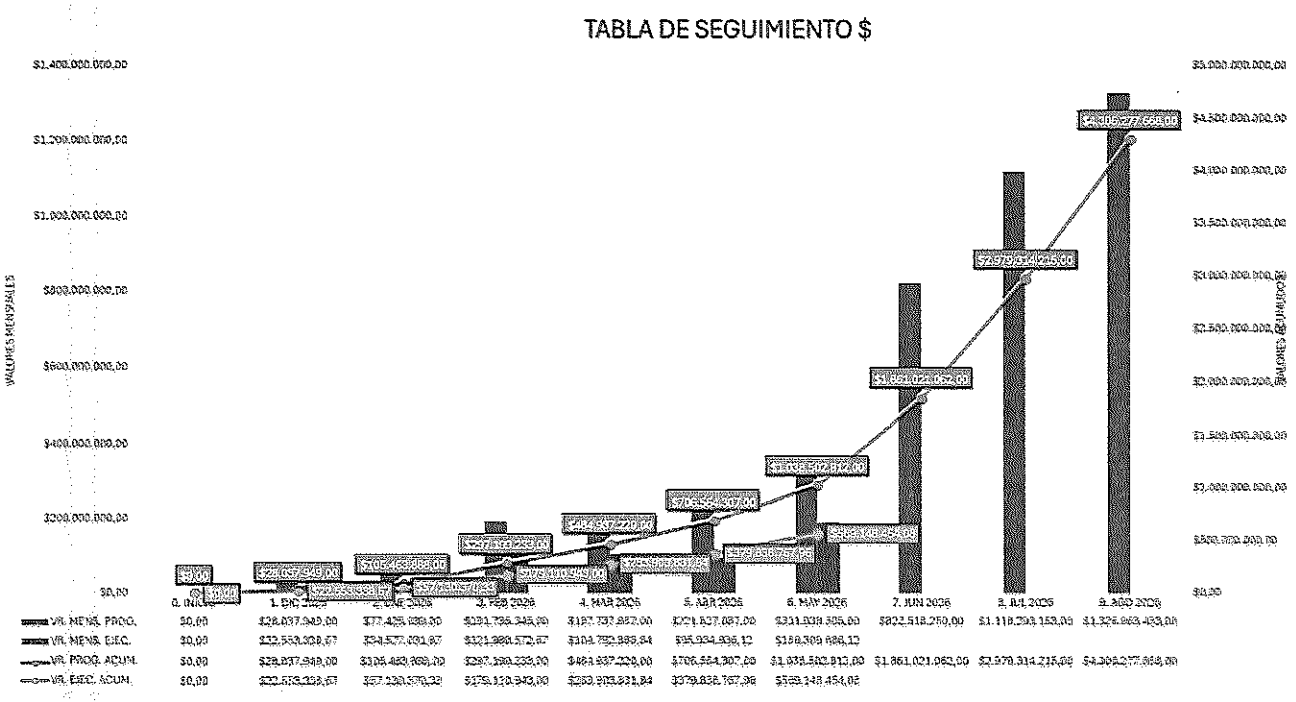


TABLA DE SEGUIMIENTO %

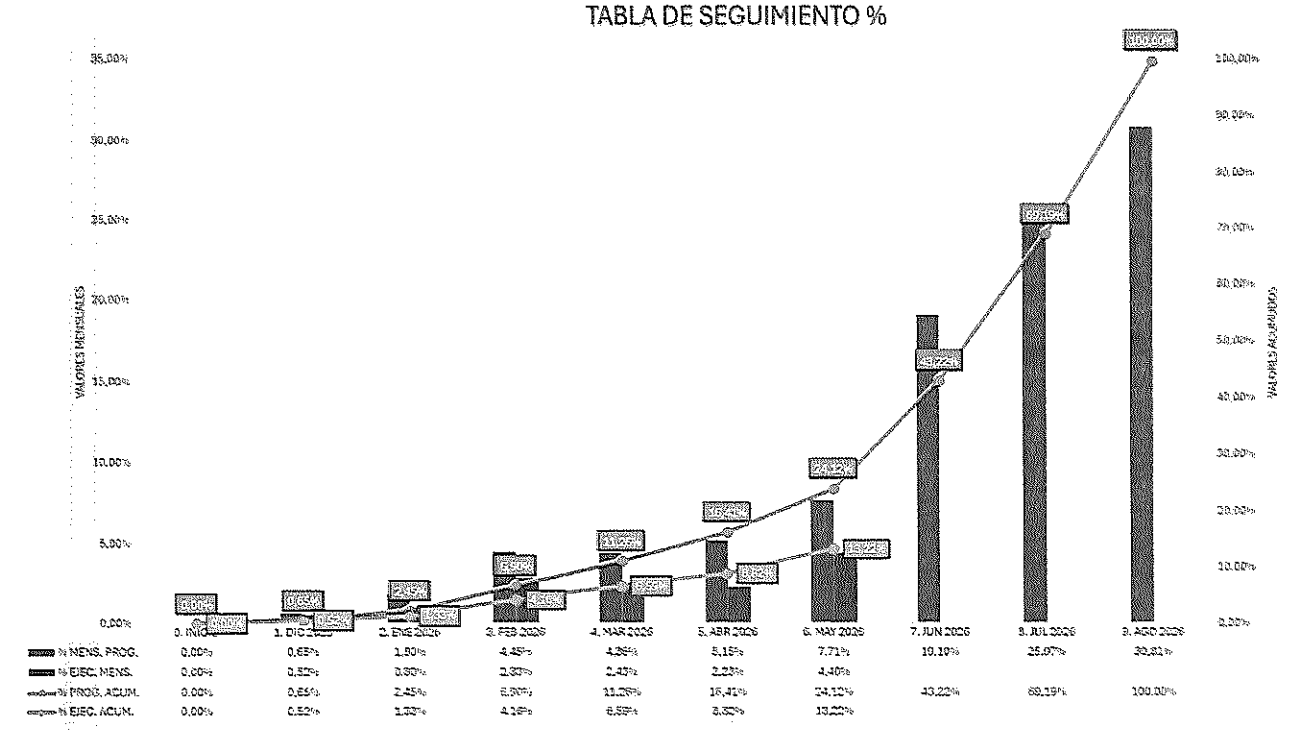

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

10 EVALUACIÓN DEL AVANCE EJECUTADO VS PROGRAMADO (INCLUYE DIFICULTADES, PROBLEMATICAS E IMPREVISTOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION)

En cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control establecidas en el Contrato de Interventoría, durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026 se efectuó el seguimiento técnico permanente a las actividades ejecutadas por el contratista en el marco del proyecto "Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta", verificando su desarrollo conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados, programación de obra y demás obligaciones contractuales.

Como resultado de las visitas de inspección, revisiones documentales y verificaciones en campo, la Interventoría constató la ejecución de actividades correspondientes al movimiento de tierras, rellenos, nivelación y compactación manual con material mixto de río, verificando que los procedimientos constructivos implementados, el volumen ejecutado y el transporte del material granular se desarrollaran conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando las condiciones requeridas para la conformación de las áreas destinadas a la cimentación y estructura.

De igual manera, la Interventoría realizó el control técnico de las actividades correspondientes a la ejecución de la estructura en concreto reforzado, verificando la correcta construcción de elementos de cimentación, vigas de cimentación, vigas aéreas y placa de entrepiso, así como la adecuada dosificación, colocación, vibrado y curado del concreto empleado. Asimismo, se constató el cumplimiento de los procedimientos de control de calidad implementados por el contratista para la ejecución de los elementos estructurales, verificando que las actividades se desarrollaran de conformidad con las especificaciones técnicas y las buenas prácticas constructivas.

Respecto al componente estructural metálico, la Interventoría verificó el adecuado suministro, almacenamiento, figurado, corte, doblado y colocación del acero de refuerzo, incluyendo la instalación de malla electrosoldada y láminas tipo Metaldeck, constatando que los procesos constructivos se ejecutaran conforme a los planos estructurales, especificaciones de diseño y procedimientos de calidad establecidos para el proyecto.

En relación con las instalaciones eléctricas, se verificó la ejecución de las canalizaciones mediante la instalación de tubería PVC conduit de una (1) pulgada, evidenciando el cumplimiento de las actividades programadas para este frente de obra, quedando preparadas las canalizaciones para las posteriores labores de cableado e instalación de los sistemas eléctricos del proyecto.

Durante el período evaluado, la Interventoría efectuó seguimiento permanente al avance físico de la obra, verificando que, pese a la ejecución de actividades relevantes en los diferentes frentes constructivos, el rendimiento general presentó una disminución frente a la programación inicialmente prevista como consecuencia de las condiciones climáticas adversas registradas durante el mes. De acuerdo con las verificaciones realizadas en obra y los registros de seguimiento, se evidenció que las precipitaciones constantes limitaron significativamente la disponibilidad de jornadas efectivas de trabajo, afectando principalmente las actividades de movimiento de tierras, transporte de materiales, armado de acero y ejecución de estructuras en concreto.

Así mismo, la Interventoría verificó que el contratista implementó medidas de mitigación orientadas a minimizar el impacto de las condiciones climáticas sobre el desarrollo del proyecto, tales como la protección de materiales, la reorganización de los frentes de trabajo, la reprogramación de actividades y el aprovechamiento de las ventanas climáticas favorables para la ejecución de los vaciados de concreto y demás actividades críticas de la ruta constructiva. Estas acciones permitieron mantener la continuidad de la obra dentro de las condiciones operativas posibles, sin comprometer la calidad de los procesos ejecutados.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

11 ACTUALIZACIONES DE LA INTERVENTORIA

Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría realizó el seguimiento y la verificación de la actualización del personal técnico donde se realizó el retiro de uno de los profesionales que hacía parte del equipo inicialmente aprobado para la ejecución del proyecto. Como parte de las actividades de control administrativo y contractual, se revisó la documentación soporte correspondiente, constatando que la desvinculación fue formalizada conforme a los procedimientos establecidos y que, de manera simultánea, se efectuó su retiro de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

12 INFORME SISO Y AMBIENTAL GENERAR (ANEXOS)

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento, control y supervisión establecidas en el Contrato de Interventoría, durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, se efectuó la verificación permanente de la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad (HSEQ) por parte del contratista, así como del cumplimiento de los procedimientos técnicos, ambientales y de seguridad aplicables a las actividades ejecutadas en el proyecto.

Como resultado de las inspecciones realizadas en campo, la Interventoría verificó que las actividades correspondientes a la ejecución de placa de contrapiso en concreto impermeabilizado, armado, figurado y colocación de acero de refuerzo para vigas aéreas, e instalación de redes hidráulicas, fueron desarrolladas bajo condiciones controladas, implementando las medidas preventivas necesarias para la mitigación de los riesgos inherentes a cada proceso constructivo. Se constató la aplicación de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión HSEQ, garantizando condiciones seguras para el personal, el control de los aspectos e impactos ambientales y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos en las especificaciones técnicas del contrato.

De igual manera, esta Interventoría realizó la revisión y verificación del componente documental asociado al Sistema de Gestión HSEQ, evidenciando la adecuada elaboración, diligenciamiento, actualización y control de los formatos, registros e instrumentos de gestión requeridos para las actividades desarrolladas durante el período. Asimismo, se verificó la implementación y seguimiento de las medidas de prevención y control orientadas a la adecuada gestión de los peligros y riesgos asociados a la manipulación de concreto, acero de refuerzo, instalaciones hidráulicas, herramientas manuales y equipos menores empleados en los diferentes frentes de trabajo.

Durante las visitas de inspección se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, implementación de controles operacionales, socialización de procedimientos seguros de trabajo, verificación permanente del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), control de las condiciones locativas, orden y aseo, señalización preventiva y seguimiento a las condiciones de seguridad industrial, constatándose el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución segura de las actividades constructivas.

En el componente ambiental, la Interventoría efectuó seguimiento permanente al manejo, almacenamiento, protección y disposición de los materiales utilizados durante la ejecución de la obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y las buenas prácticas constructivas. Como resultado de las inspecciones realizadas, se constató el adecuado control sobre la recepción, acopio, almacenamiento y utilización de los diferentes insumos empleados en el proyecto.

Respecto a los materiales granulares, la Interventoría verificó el correcto transporte, descargue, acopio y disposición de 32,42 m³ de material mixto de río sin procesar, destinado a las actividades de relleno y conformación de superficies, comprobando que su extendido y compactación se ejecutaran conforme a las especificaciones técnicas, evitando fenómenos de segregación, pérdidas de material y afectaciones a la estabilidad de los rellenos. Igualmente, se realizó seguimiento al transporte interno de material mediante volquetas, verificando el adecuado control logístico y la organización de las rutas de circulación dentro del área de intervención.

Así mismo, se verificó el adecuado almacenamiento y protección de los materiales pétreos, cemento y demás insumos requeridos para la producción de 54,37 m³ de concreto, inspeccionando las condiciones de acopio y las medidas implementadas para preservar sus propiedades físicas frente a las condiciones climáticas adversas

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

registradas durante el período. La Interventoría constató la utilización de cubiertas y elementos de protección que permitieron minimizar la exposición de los materiales a la humedad y garantizar su aptitud para la elaboración de los concretos estructurales.

En cuanto al acero de refuerzo y elementos metálicos, se verificó el adecuado almacenamiento de 298,04 kg de malla electrosoldada, 874,23 kg de acero de refuerzo y 286,02 m² de lámina colaborante tipo Metaldeck, evidenciándose que estos materiales permanecieron almacenados sobre superficies aisladas del terreno y protegidos contra la humedad, evitando procesos de oxidación prematura y garantizando el mantenimiento de sus condiciones técnicas previo a su instalación.

La Interventoría igualmente efectuó seguimiento al manejo de los materiales provenientes de excavaciones y actividades preliminares, verificando su reutilización cuando las condiciones técnicas lo permitieron y controlando la disposición final del material no aprovechable en sitios autorizados, conforme a la normativa ambiental vigente. De igual manera, se inspeccionó el almacenamiento, identificación y protección de los materiales correspondientes a las instalaciones eléctricas, verificando las condiciones de conservación de los 16,00 metros lineales de tubería PVC Conduit de una (1) pulgada, evitando deformaciones o deterioros antes de su instalación definitiva.

Durante el período evaluado, esta Interventoría evidenció que las condiciones climáticas excepcionales, sumadas a las restricciones de acceso propias de la Estación de Policía, representaron dificultades operativas para el ingreso, almacenamiento y movilización de materiales dentro del proyecto. No obstante, se verificó que el contratista implementó medidas de coordinación logística, programación de suministros y protección de materiales, las cuales permitieron mitigar los efectos ocasionados por las precipitaciones y mantener la continuidad de los procesos constructivos dentro de condiciones técnicas aceptables.

13 INFORME DE ESTADO DE TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS (AMBIENTALES, CONSTRUCCION ENTRE OTRAS)

Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión documental y verificación del estado de los permisos, licencias y demás instrumentos administrativos requeridos para la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, constatando el cumplimiento de los requisitos legales, urbanísticos y ambientales aplicables al proyecto de Construcción, Adecuación y Mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta.

Como resultado de la verificación efectuada, se evidenció que el contrato cuenta con la documentación jurídica y técnica que acredita la viabilidad de la intervención, encontrándose vigente y disponible el Certificado de Tradición y Libertad, el certificado predial y la Licencia de Construcción, documentos que respaldan la titularidad del predio, la legalidad de la intervención y el desarrollo de las actividades constructivas conforme a la normatividad urbanística y demás disposiciones legales aplicables.

De igual manera, la Interventoría verificó que el proyecto dispone de la aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) emitida por la autoridad competente, instrumento mediante el cual se establecen las medidas de prevención, mitigación, control, seguimiento y manejo de los impactos ambientales derivados de la ejecución de las obras. Así mismo, se constató que las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se ejecutaron en concordancia con las obligaciones, programas y medidas contempladas en dicho instrumento ambiental.

Como parte de las labores de control contractual, la Interventoría revisó la vigencia, consistencia y trazabilidad de la documentación soporte relacionada con los permisos y licencias del proyecto, verificando que esta se encuentra debidamente organizada y disponible para efectos de seguimiento, control y eventual inspección por parte de la Entidad Contratante y de las autoridades competentes

14 INFORME DE VERIFICACION DE TOPOGRAFICA DONDE SE COMPARE LA TOPOGRAFIA REALIZADA VS LO PROGRAMADO

N/A

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

15 CUADRO RESUMEN DE LABORATORIOS Y RESULTADOS DE INTERVENTORIA VS OBRA

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA
Los resultados de laboratorio del contrato de interventoría se encuentran adjuntados en el capítulo de anexos No. 08 del presente informe.

16 ACTAS SUSCRIPTAS

- **ACTA DE INICIO**

17 CUADRO DE CORRESPONDECIA- RELACION

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
N/A				

18. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Con fundamento en las actividades de seguimiento, inspección y control técnico desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, la Interventoría verificó en campo y mediante la revisión de los soportes técnicos, administrativos y de control de calidad, que el Contratista ejecutó las actividades programadas conforme a las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos establecidos y las obligaciones contractuales, evidenciándose avances significativos en la ejecución de la estructura principal del proyecto.

La Interventoría constató el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con la construcción de elementos estructurales en concreto reforzado, verificando la correcta ejecución de las vigas aéreas, placa de entrepiso y demás elementos de cimentación, así como la instalación del acero de refuerzo y del sistema Metaldeck, observándose el cumplimiento de los criterios técnicos, de calidad y de control requeridos para esta etapa constructiva. Los avances alcanzados permiten consolidar la continuidad de la estructura portante de la edificación y generan las condiciones necesarias para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

De igual manera, se verificó el cumplimiento de las actividades correspondientes al componente de redes eléctricas, evidenciándose la culminación de la instalación de las canalizaciones mediante tubería PVC conduit programadas para el período, las cuales fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas y dejan preparada la infraestructura para la posterior instalación del sistema de cableado eléctrico.

Durante el período evaluado, la Interventoría efectuó seguimiento permanente a las condiciones de ejecución de la obra, verificando que el comportamiento climático registrado incidió de manera directa sobre el rendimiento de las actividades programadas. No obstante, se constató que el contratista implementó oportunamente medidas de mitigación orientadas a preservar la calidad de los materiales, proteger los elementos en proceso constructivo y reorganizar los frentes de trabajo, acciones que fueron objeto de revisión y acompañamiento por parte de la Interventoría y que permitieron reducir el impacto generado por las precipitaciones extraordinarias presentadas durante el mes.

Así mismo, la Interventoría verificó el adecuado manejo logístico del proyecto, constatando que el transporte, almacenamiento, protección y disposición de los materiales de construcción se ejecutaron bajo condiciones controladas y conforme a las especificaciones técnicas, ambientales y de seguridad aplicables, garantizando el orden de los frentes de trabajo y la correcta administración de los recursos disponibles, aun frente a las restricciones de acceso propias de la Estación de Policía y a las condiciones adversas del terreno ocasionadas por la temporada invernal.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

19. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO.
2. COPIA DE BITACORA.
3. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA.
4. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA.
5. NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.
6. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA.
7. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA.
8. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA.
9. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA.
10. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO.


Ing. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO 01/05/2026 AL 31/05/2026

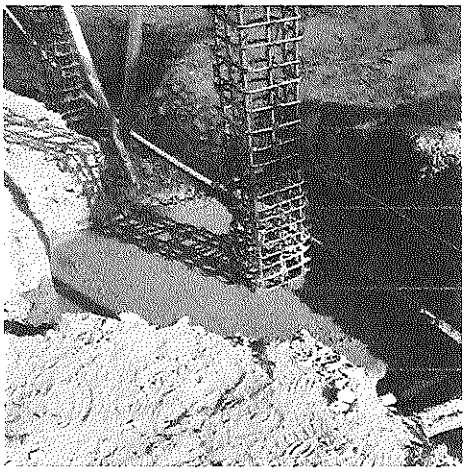
RELLENOS Y TRANSPORTE	
	
Se realizó el relleno con material mixto de río sin procesar tamaño máx. 2", incluyendo el extendido, nivelación, humedecimiento y la compactación manual con equipo liviano	Se realizó el transporte de material granular mediante volqueta para el respectivo suministro y acopio en la obra.
ELEMENTOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.	
	
Se realizó la fundida de zapata en concreto 20.7 MPa (3000 PSI), evidenciando el vaciado del concreto sobre el acero de refuerzo de la cimentación.	Se realizó la construcción de columnas en concreto 3000 PSI - 20.7 MPa mezcla en obra, mostrando el proceso de vaciado vertical con andamiaje y soporte del encofrado.

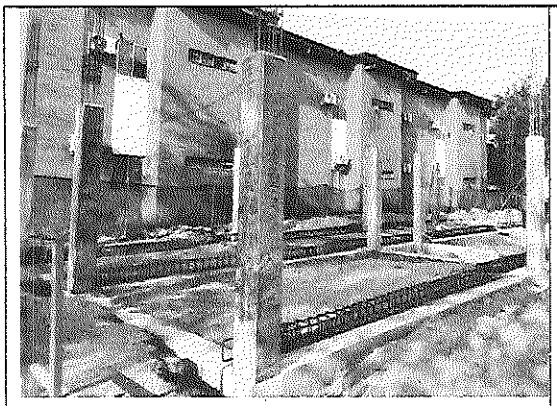


Se realizó el desencofrado y acabado de viga en concreto 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra, detallando la estructura de cimentación superficial lista y las columnas en proceso de curado envueltas en película plástica.

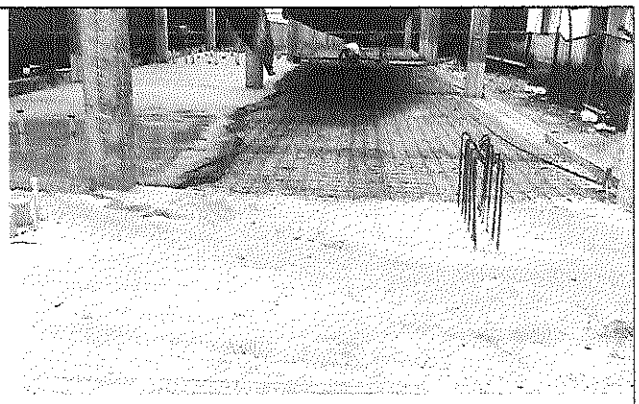


Se realizó el proceso de vaciado y afinado de la placa de entrepiso maciza en concreto impermeabilizado 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra, incluyendo la colocación previa de la malla electrosoldada y el acero de refuerzo.

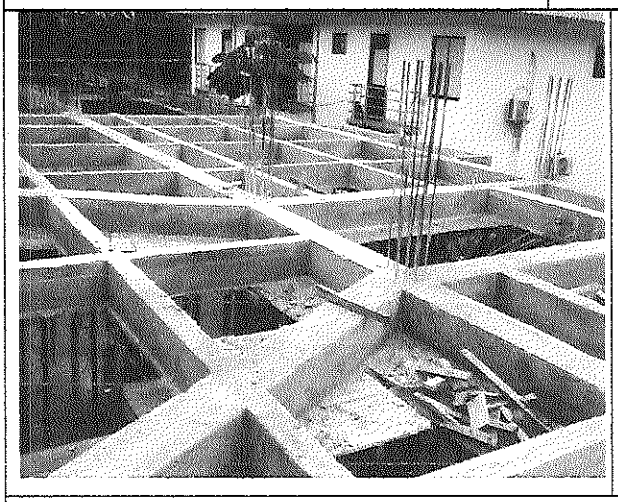

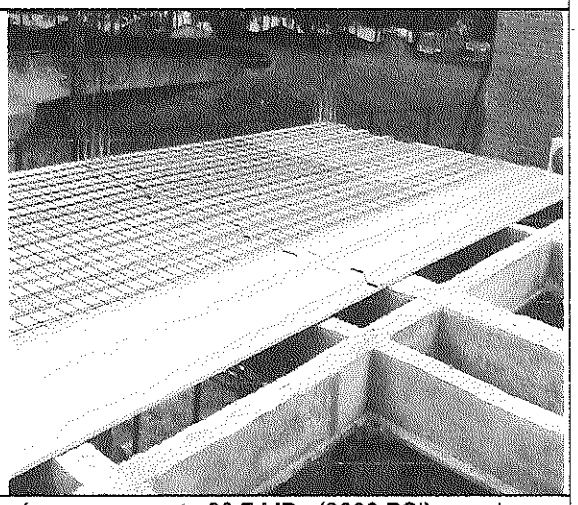

Se realizó el montaje estructural que comprende la viga aérea en concreto 20.7 MPa (3000 PSI) mezcla en obra y el suministro e instalación de lámina Metaldeck 2" Cal 22, con su respectivo apuntalamiento y soporte inferior.

DUCTERIA ELECTRICA

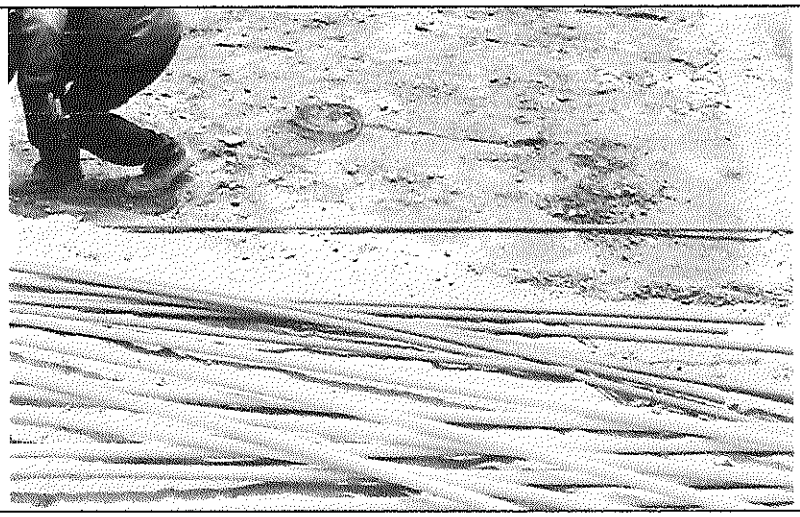

Se realizó el suministro e instalación de tubo conduit PVC 1" para las redes de ductería eléctrica subterránea y canalizaciones en obra

ANEXO 2.
COPIA DE BITACORA

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES 01 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTRE PISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES - 01 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY NO SE HIZO ACTIVIDADES DE OBRA POR SER DIA FESTIVO

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B. (FIRMA)	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 02 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 HORAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 02 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 HORAS

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EL DIA DE HOY SE SUSPENDEO LABORES DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER BECERRA FIRMA	JHATO FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO - 03 MAYO 2026.	HORAS DE LLUVIA: 2,5 HORAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISO		ALOJAMIENTOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 03 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 Horas

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY NO SE LLEVO A CABO LABORES DE OBRA, SE REALIZARON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 04 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 5 HORAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTRE PISOS.		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 04 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 5 HORAS

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE VIGAS, VIGUETAS DE ENTREPISOS PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA, POR LAS FUERTES LLUVIAS Y ZONAMIENTO ELECTRICO SE SUSPENDIO LAS LABORES DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES 05 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 5 HORAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA				Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREJESOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES-05 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 5 HORAS

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE VIGAS Y VIGUETAS ENTRE PISOS LA ACTIVIDAD SE VE INTERRUMPIDA POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 06 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 HORAS lluvia

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA				Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTRE PISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 06 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA:

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA NUVO A CABO LABORES DE ENCOFRADO DE VIGAS ENTREPISO EN HORAS DE LA MAÑANA A PESAR QUE SE PRESENTA RON NOVEDADES, PERO TUVO QUE SUSPENDER LABORES EN HORAS DE LA TARDE POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES 07 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLOVIZNAS DURANTE EL DIA

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES-07 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS NOVISMOS DURANTE EL DIA.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE RAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE ENCOFRADO DE VIGAS ENTRE PISOS. TENIENDO EN CUENTA LOS NIVELES Y ESPESORES DE VIGAS DETERMINADOS EN PLANOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES- 08 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS AISLADAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
CONFORMACION VIAS ENTRADA		ALOJAMIENTOS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES - 08 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS AISLADAS

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUO CON EL ENCOFRADO DE LA VIGA DE AMARRE PISOS CON LA INSTALACION DE CERCHA, CAMILLAS Y CORMALETO PARA LA TERNALES DE VIGAS.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 09 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 Horas lluvias fuertes

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTRE PISOS		ALOJAMIENTOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO - 09 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 Horas fuertes.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUO EL ENCOFRADO PARA VIGAS ENTRE PISOS TENIENDO EN CUENTA LOS NIVELES DE PLANOS Y ESPESORES DE VIGAS Y VIGUETAS.

LA LABOR SE VIO INTERRUMPIDA POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADOS EN EL TRANSCURSO DE LA JORNADA LABORAL.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO - 10 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS AISLADAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTRE PISOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 10 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS AISLADAS

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY NO SE LLEVO A CABO ACTIVIDADES EN OBRA, SE REALIZO LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE OFICINA.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 11 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 HORAS LLUVIAS CON TORMENTA

PLAZO ACTUAL	8 MESES.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENDOPADO VIGAS ENTRE PISOS.		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 11 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas lluvia con tormenta.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA EN HORAS DE LA MAÑANA INTERRUMPIO ACTIVIDADES POR LLUVIAS PRESENTADAS, EN HORAS DE LA TARDE SE CONTINUAN LABORES DE ENCOFRADO DE VIGAS ENTRE PISO.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES - 12 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 Horas lluvias Aisladas

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA ENTRE PISOS ENCOFRADO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES - 12 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 HORAS DE LLUVIAS

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA CONFORMACION DE ENCOFRADO DE VIGAS ENTRE PISOS DE ALOJAMIENTOS NUEVOS LAS ACTIVIDADES SE RETRASAN CONTINUAMENTE POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	JTTG FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 13 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3. HORAS LLUVIAS FUERTES.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISO.		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACIÒN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 13 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLUVIAS FUERTES.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE VIGA ENTRE PISO CON MADERA, ACOMPAÑANDOLO CON TRAMOS Y CONSIGUIENDO EL NIVEL NUEVO DE ALGUNOS CANASTOS DE ACERO DE REFUERZO.

EN LA TARDE SE PRESENTO FUERTES TORMENTAS QUE OBLIGARON AL CONTRATISTA A SUSPENDER LABORES DE OBRA.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES 14 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 6 HORAS DE/NUVO INTENSO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTRE PISO		ALOJAMIENTOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES -14 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 6 HORAS DE LLUVIA INTENSA.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EL CONTRATISTA SUSPENDIO LAS LABORES DE OBRA,

LAS LLUVIAS EN ESTA TEMPORADA INVERNAL QUE SE PRESENTA EN TODO EL PAIS ESTA AFECTANDO CONSIDERABLEMENTE EL CRONOGRAMA Y EJECUCION DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES - 15 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas de lluvias Moderadas

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTRE PISO		ALOJAMIENTOS.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES - 15 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS DE LLUVIAS MODERADAS.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO EL ENCOFRADO DE LA VIGA DE ENTREPISO DE EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS. ACORDE CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES APROBADOS POR LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 16 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 Horas lluvias Moderados

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTRE PISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1583 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 16 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 HORAS LLUVIAS MODERADAS.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA TRABAJO HASTA MEDIO DIA, SE LLEVA A CABO ACTIVIDADES DE ENCOFRADO DE VIGA DE ENTREPISO, ENCOFRADO, INSTALACION DE PASOS, CONCRETO DE VIGAS

LA ANTERIOR ACTIVIDAD SE REALIZA ACORDE CON LOS PLANOS Y DISEÑOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 17 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VISITA ENTIDAD PISOS ENCHAPADO		ALCANTARILLAS		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EBTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA EBTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 17 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				
OBSERVACIONES:		SI		NO

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY NO SE HICIERON A CABO ACTIVIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 18 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 Horas lluvias fuertes

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0
TOPOGRAFO	0		
INSPECTOR SISO	1		

ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
Operacion	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
		Cascos	X	
		Gafas	X	
		Tapabocas	X	
		Guantes	X	
		Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCERRADO DE VIAS ENTRADAS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÒN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 18 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3,5 HORAS LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES EN HORAS DE LA MAÑANA, SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES EN HORAS DE LA TARDE POR LO QUE SE INTERRUMPIO LAS ACTIVIDADES DE OBRA

SE REALIZA VACIADO DE VIGAS DE ENTREPISO, ACORDE A PLANOS Y DISEÑOS APROBADOS POR INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	J T FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES 19 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 5 Horas lluvias fuertes.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTRE PISOS.		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS.	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES - 19 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 5 HORAS LLUVIAS FUERTES.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA INTERRUMPIO LAS ACTIVIDADES PUESTO QUE LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN EL TRANSCURSO DEL DIA NO PERMITIERON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA

LAS LLUVIAS PRESENTADAS POR LA PUERTA OLA INVERNAL ESTA OCASIO. NANDO ATRASOS SIGNIFICATIVOS EN LA EJECUCION DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 20 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4,5 Horas lluvias fuertes

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCONTRADO VIGA ENTREPISOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 20 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4,5 HORAS LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY INICIO ACTIVIDADES DE ENCOFRADO DE VIGAS DE ENTREPISO, PERO FUERON INTERUMPIDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS A LO LARGO DEL DIA.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES 21 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas lluvias moderadas

PLAZO ACTUAL	8 HORAS	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS DE COBERTA		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES- 21 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS MODERADAS

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA CONFORMACION DE ENCOFRADO DE VIGA DE ENTREPISO, EN EL TRANSCURSO DEL DIA SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS LO QUE RETRASO LAS ACTIVIDADES DE OBRA

LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA ESTA ACORDE CON LOS PLANOS Y DISEÑOS APROBADOS POR INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER BECERRA FIRMA	JHG FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES 22 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTREPISOS.		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES - 22 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS DE LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN HORAS DE LA MAÑANA SE VIERON INTERRUMPIDAS LAS LABORES DE OBRA POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS, SE REINICIA LABORES DE FUNDIDA DE VIGA DE ENTREPISO EN HORAS DE LA TARDE.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 23 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 Horas lluvias Moderadas

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 23 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 Horas lluvias Moderadas

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

LAS LLUVIAS MODERADAS DURANTE EL DIA OCASIONARON RETRAZOS EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA, EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE VIGA INTERRUPCION, ACORDE CON LOS DISEÑOS APROBADOS

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFERB FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a dobie cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 24 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	6	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO 24 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: Dia NUBLADO

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista el Dia De Hoy no Hizo Actividades en Obra

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 25 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 6 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0						\	
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISOS.		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: LUNES 25 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 6 HORAS LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI | | NO |

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY SE SUSPENDIERON LAS ACTIVIDADES EN OBRA POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS CON TORMENTA ELECTRICA

LA JORNADA INICIA CON ENCUENTRO DE VIGA GANADERO PERO DICHA ACTIVIDAD FUE SUSPENDIDA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES - 26 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 Horas Lluvias Fuertes
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ENTREPISOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MARTES - 26 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 HORAS LLUVIAS FUERTES

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUA CON EL ENCOFRADO PARA VIGAS DE ENTREPISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ALOJAMIENTOS, DICHA ACTIVIDAD ES SUPERVISADA CONTINUAMENTE POR LA INTERVENTORIA

LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN EL TRANSCURSO DEL DIA AFECTAN EL DESARROLLO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER RB FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 27 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 HORAS LLUVIAS MODERADAS

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGA ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: MIERCOLES 27 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 4 HORAS LLUVIAS MODERADAS

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA MAMPOSTERIA DE LOS MUROS ENTRE PISOS DEL EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS, LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN ACORDES CON LOS DISEÑOS Y PLANOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

LAS ACTIVIDADES SE VIERON INTERRUMPIDAS POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN EL TRANSCURSO DEL DIA.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES 28 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS MODERADAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS ANTEPECHOS		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: JUEVES - 28 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas lluvias Moderadas

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				
OBSERVACIONES:		SI		NO

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL DIA DE HOY SE REALIZA EL SUMINISTRO TOTAL DE LA LAMINA METAL DECK PARA LA PLACA ENTREPISO.

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY CONTINUA CON EL ENCOFRADO DE VIGAS PARA ENTREPISOS, LAS LLUVIAS MODERADAS PRESENTADAS EL DIA DE HOY EN SUSPENDEN MANERA RETRASAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES 29 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DÍAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS DE ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota; Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: VIERNES- 29 MAYO 2026,	HORAS DE LLUVIA: 3 Horas lluvias Fuertes

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?				
OBSERVACIONES:		SI		NO

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

EL CONTRATISTA CONTINUO CON EL ENCOFRADO DE VIGAS ENTRE EJES POR LAS LLUVIAS ANTES PRESENTADAS EN HORAS DE LA MAÑANA SE ACORDO EL REINICIO DE DICHA ACTIVIDAD SE SUSPENDIO ACTIVIDADES EN HORAS DE LA MAÑANA Y SE CONTINUO EN HORAS DE LA TARDE CON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO - 30 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 Horas lluvias Moderadas

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	8	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ENCOFRADO VIGAS DE ENTREPISO		ALOJAMIENTOS	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: SABADO 30 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2,5 Horas lluvias no demoras

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua las actividades de encofrado de las vigas de cuatro pisos, teniendo encuenta los diseños y planos previamente aprobados por la interventoria

Las lluvias presentadas en horas de la tarde afectan el avance de las actividades realizadas

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: DOMINGO - 31 MAYO 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS FUERTES

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE		VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: Domingo - 31 Mayo 2026	HORAS DE LLUVIA: 2 Horas lluvia fuerte

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

El dia de hoy no se llevo a cabo actividades de obra se realizan votaciones presidenciales

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

ANEXO 3.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 04:12:59 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082108229

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 22/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		
Documento	NI902011453	**Dirección**	CL 2 #27 - 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	GARCIA FONSECA INGRID MARYORY	**Identificación**	CC 1121837768
Total Afiliados	19	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065946002	YESID GALINDO GAITAN	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1101450750	DAVID VERBEL SOLIS	01	00	X																	0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 992.160	$ 158.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 992.160	$ 39.700	6,960	$ 992.160	$ 69.100	(CCF34) COFREM	$ 992.160	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MONALES	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121863524	JENNY PAOLA FERIA TRIANA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121867537	YOULI YULIETH LOZANO GONZALEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1122144736	MARGE DANIELA HERRERA PAEZ	01	00		X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 291.818	$ 46.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF34) COFREM	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1124092965	JUAN RAMON GALINDO NARIÑO	01	00	X																	0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 992.160	$ 158.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 992.160	$ 39.700	6,960	$ 992.160	$ 69.100	(CCF34) COFREM	$ 992.160	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1125519456	JUAN MARTIN BOLIVAR GAITAN	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1193092733	BRAYAN STEVEN RIVERA MARTINEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA	01	01																		0	0	30	30	30	(NI-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
CC 17340851	MARTIN OMAR GUTIERREZ VEGA	01	00	X																	0	15	16	15	15	(230201) PROTECCION	$ 933.816	$ 149.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF34) COFREM	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 74857071	DAGOBERTO CORTES	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80166369	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8102573	VICENTE GAITAN GAITAN	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC5) EPS MALLAMAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86008125	AGUSTIN AGUILAR GONZALEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86055545	OSCAR ALEXANDER PATIÑO PEREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 93372770	SEGUNDO ROA CRUZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 1024421	ROBINSON GREGORIO MARTINEZ GIL	01	00	X																	0	9	17	17	17	(NI-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 992.189	$ 39.700	6,960	$ 992.189	$ 69.100	(CCF34) COFREM	$ 992.189	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 27.779.604	$ 30.522.689	$ 30.522.689	$ 30.522.689	$ 4.445.800	$ 1.221.900	$ 2.125.100	$ 1.221.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.014.500	$ 66.700	$ 9.081.200

ANEXO 4.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Los suscritos **INGRID MARYORY GARCIA FONSECA** identificado con la cedula de ciudadanía **1.121.837.768** de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN** identificada con **Nit. 902.011.453-2**, y **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.071.198 y Tarjeta profesional 187.220-T en mi condición de **CONTADOR PUBLICO**, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo comprendido del 01/05/2026 al 31/5/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los cuatro (4) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

R.L. INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

CESAR OSWALDO SOTO H.
CONTADOR PUBLICO
T.P 187.220-T.

Puerto Gaitán, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.071.198
SOTO HERNANDEZ
APELLIDOS
CESAR OSWALDO
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1982
MITU
(VAUPES)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-FEB-2000 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-3205000-00760550-M-0086071198-20120303 00293 37307205

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



187220-T

CESAR OSWALDO
SOTO HERNANDEZ
C.C. 86071198
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/02/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199044

187784

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 D 0 9 D 2 3 4 C 5 B C A 2 8 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86071198 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 187220-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 5.
NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	140,000	140,000	280,000	3,220,000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3,658,750	3,658,750	-	3,658,750	142,350	142,350	284,700	3,274,050	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISELL JOHANNA			30	1,750,905	1,750,905	249,095	2,000,000	70,036	70,036	140,072	1,859,928	
						15,813,275	1,245,475	17,058,750	632,531	632,531	1,266,062	15,793,688	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-03, 02:27:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082450092

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 03/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	SLN	VSP	TDE	TDP	TAP	VST	COR	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1121844182	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121892054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074961	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 2.250.200	$ 562.800	$ 866.200	$ 562.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.242.000	$ 0	$ 4.242.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 7.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Los suscritos DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO identificado con la cedula de ciudadanía 86.088.145 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025 identificado con Nit. 902.014.419-5, y JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.848.323 y Tarjeta profesional 180143-T en mi condición de CONTADOR PUBLICO, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo de mayo comprendido del 01/05/2026 al 31/05/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Dada en Villavicencio, a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT. 902.014.419-5

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR PUBLICO
T.P 180143-T

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.121.848.323



CASTRO GALVIS

JHON ALEXANDER


Nacionalidad: COL
Estatura: 1.70
Sexo: M
Fecha de nacimiento: 15 ENE 1988
G.S.: O+
Lugar de nacimiento: VILLAVICENCIO (META)
Fecha y Lugar de expedición: 18 ENE 2007 VILLAVICENCIO
Fecha de expiración: 08 SEPT 2032

Firma

.CO

0038845999


REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL0038845998520O1<<<<<<<<<<
8901158M3209088COL1121848323<1
CASTRO<GALVIS<<JHON<ALEXANDER<

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

130143-T



JHON ALEXANDER
CASTRO GALVIS
C.C. 1121848329
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 191641

108739

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 649 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 8 C 0 5 C B F 2 0 2 C 0 0 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121848323 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 180143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 8.
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA

Villavicencio, 04 de mayo del 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
Ciudad.

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
Tema: Informe de resistencia a la compresión de concretos.

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud para la realización del ensayo de resistencia a la compresión simple a muestras cilíndricas de concreto elaboradas y transportadas por ustedes. Me permito informar que estas fueron probadas de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 673-10, con el fin determinar su resistencia a los siete, catorce y veintiocho días de curado.

En virtud de lo anterior entrego los resultados de tres (03) muestras falladas.

El presente informe consta de dos (02) páginas y no debe reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio, los resultados contenidos en él se relacionan únicamente con las muestras ensayadas.

Quedo en espera de cualquier inquietud.

Sin otro particular.

INGRID ARANGUREN BEJARANO
Especialista en diseño y construcción de Vías y aeropistas
Especialista en Patología de la Construcción
Especialista en Gerencia Estratégica
Gerente de RAMCODES Ingeniería y Ensayos

LABORATORIO RAMCODES INGENIERIA Y ENSAYOS

LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES,CONCRETOS Y PAVIMENTOS

VERSIÓN	001
CODIGO	F-CON-001
FECHA DE VIGENCIA	1/01/2017

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

CON-RAMW-01

ESPECIFICACION/NORMA	INV E-410-13 Y NTC 673-10

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META

DIRIGIDO A:	UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025	NIT:	902014419-5	FECHA DE ENTREGA:	lunes, 4 de mayo de 2026
CONTACTO:	ING. MIGUEL CIPAGAUTA	CELULAR:	3183308819	CORREO:	utinterpolicia2025@gmail.com
DESCRIPCION:	MUESTRAS ELABORADAS EN OBRA	MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	DEPARTAMENTO:	META

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (Mpa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A F'c	TIPO DE FALLA
RDG-10	PLACA CONTRAPISO	F'c 3000 PSI	21	..	6-abr.-26	7	13-abr-26	104	3743	8496	2171	110.2	1,890	13.2	63.0%	5
						14	20-abr-26	103	3825	8332	2261	142.9	2,488	17.4	82.9%	6
						28	4-may-26	103	3768	8332	2261	177.3	3,100	21.7	103.3%	6
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

OBSERVACIONES: _____


REVISO Y APROBO:

Ing. Ingrid Aranguren Gelarano

Gerente de RAMCODES Ingeniería y Ensayos

*Este informe no es válido, sin la firma y sello original

TIPO DE FALLA

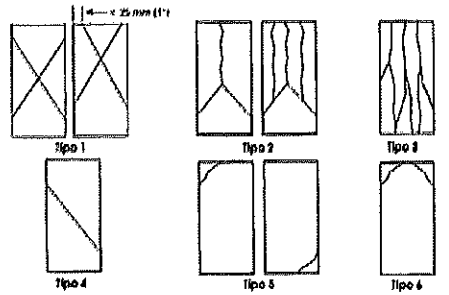

ANEXO 9.
INFORME SE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 6

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO

CR. 6 #17-49 Puerto Gaitán – Meta
Tel. 3204253826

UT INTERPOLICIA
2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
   2.1. OBJETIVO GENERAL 3
   2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
   3.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA 8
6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN HSEQ 9
7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
8. CONDICIONES CLIMÁTICAS 11
9. RELACIÓN PERSONAL DE OBRA 11
10. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 12
11. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 12
12. REGISTRO FOTOGRAFICO 14

CHARLAS E INDUCCIONES 14
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 14
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15

13. CONCLUSIONES 16

UT INTERPOLICIA
2025

1. INTRODUCCION

El presente informe HSEQ corresponde al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo 2026 y tiene como objetivo presentar el estado de las actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad del proyecto.

Durante este periodo, el proyecto se desarrolló en fase de alistamiento administrativo y técnico, con ejecución de actividades preliminares en campo, tales como el recorrido técnico de inspección de terreno, la localización y replanteo de alojamientos nuevos y el descapote manual en la zona de intervención. Estas labores permitieron avanzar en la verificación de las condiciones iniciales del sitio y en la preparación del área para el inicio de las actividades constructivas.

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito fundamental la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades laborales, promoviendo entornos de trabajo seguros y saludables. En la actualidad, este enfoque se extiende a todas las profesiones y oficios, buscando que el trabajo se adapte a las capacidades del trabajador y no que el trabajador se exponga a condiciones que afecten su integridad física o mental.

El presente informe se fundamenta en las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, orientadas a la planeación, organización y estructuración del sistema HSEQ, así como a la identificación preliminar de las condiciones de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto. Lo anterior permite establecer las medidas preventivas necesarias, aplicar buenas prácticas y garantizar condiciones seguras para el personal que será vinculado en las etapas posteriores de la obra.

El principal objetivo del sistema HSEQ es la identificación y control de peligros que puedan afectar tanto a los trabajadores como a personal ajeno a la obra, fortaleciendo el compromiso con la seguridad, la salud y el cumplimiento normativo, y asegurando la correcta implementación del sistema de gestión durante el desarrollo del proyecto.

La Unión Temporal Inge Policía Gaitán mantiene un firme compromiso con la protección de la salud y la seguridad de su población trabajadora, mediante la evaluación continua y la mitigación de los riesgos presentes en las áreas de trabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, reconoce que la participación y el compromiso de los trabajadores son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Temporal responsable del proyecto, alineado con los requisitos HSEQ establecidos por la interventoría y la normativa vigente, garantizando condiciones seguras y controladas para el personal que será vinculado durante la ejecución del contrato.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover condiciones de trabajo que favorezcan el bienestar físico y mental de los trabajadores.

- Fomentar la concientización sobre la mitigación de impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto.

- Garantizar el control de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de la obra, conforme a los lineamientos del plan ambiental aplicable.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio ubicado en la región del río Manacacias, es el Cuarto municipio con extensión territorial en Colombia y primero en el departamento del Meta con 17.499 km². Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.

Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.

Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y recreación.

Límites del municipio:

Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripan y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

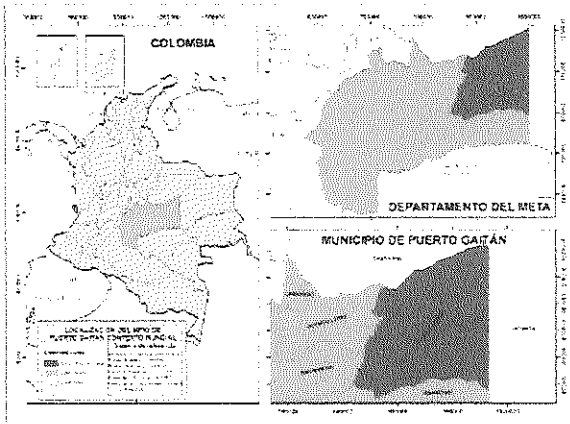


Ilustración 1. Localización Geográfica Municipio de Puerto Gaitan, Dpto. Meta

FUENTE: https://www.researchgate.net/publication/325613809

3.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

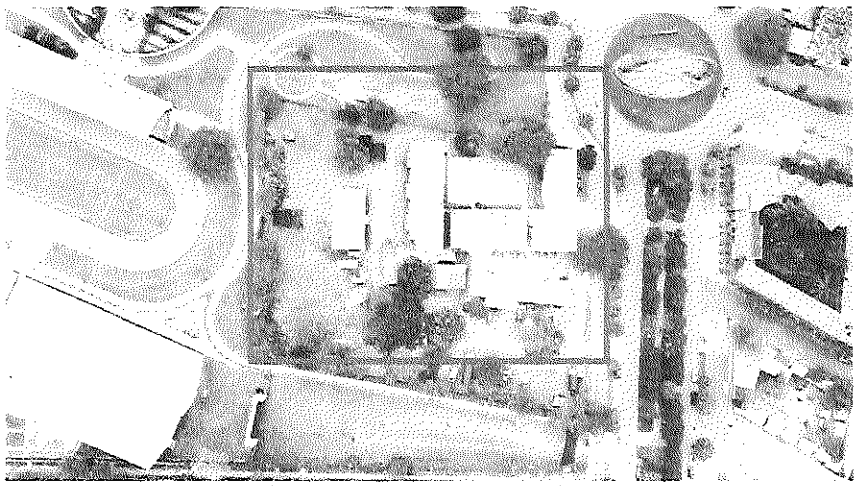


Ilustración 2. Localización Específica del Proyecto

FUENTE: Elaboración Propia

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.

De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.

La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.

En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones

de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.

Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

3.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

3.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

UT INTERPOLICIA
2025

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DEL PROCESO	CONCURSO DE MERITOS CM-SI-010-2025
NÚMERO DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTEVENTORIA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025 DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO C. C No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA	utinterpolicia2025@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026

Tabla 1. Información del contrato de interventoria

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA

La interventoría cuenta con el personal profesional estipulado y ofertado, los cuales han realizado las actividades correspondientes del periodo en mención. A la fecha el personal vinculado ofertado para el presente periodo según el presupuesto vigente de la interventoría es el siguiente:

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1082450092
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1082450092
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092

Tabla 2. Información administrativa de interventoria

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN HSEQ

La Interventoría realizó el seguimiento técnico continuo, la inspección en campo y la revisión documental de las condiciones bajo las cuales se ejecutaron las actividades operativas del período, correspondientes a la ejecución de placa de contrapiso en concreto impermeabilizado, el armado de acero de refuerzo para vigas aéreas y la instalación de redes hidráulicas.

Durante las visitas de verificación realizadas, se constató que la totalidad de las actividades fueron desarrolladas bajo los lineamientos del Sistema de Gestión HSEQ implementado por el contratista, verificando el establecimiento y mantenimiento de condiciones seguras de trabajo en los frentes de obra activos, el control efectivo de los aspectos e impactos ambientales asociados a cada actividad constructiva y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos en las especificaciones técnicas del proyecto.

Por otro lado, se realizó la verificación en campo y la revisión documental de cada una de las actividades del Sistema de Gestión HSEQ implementadas por el contratista durante el período de reporte, certificando lo siguiente:

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos: La Interventoría verificó que la identificación sistemática de los peligros asociados a las actividades ejecutadas en campo, aplicando la metodología de evaluación de riesgos establecida en su Sistema de Gestión HSEQ. Se constató la actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos conforme a las actividades del período, así como la implementación efectiva de los controles operativos definidos para la mitigación de los riesgos identificados, en cumplimiento de la jerarquía de controles establecida por la normativa vigente.

Socialización de Procedimientos Seguros de Trabajo: La Interventoría verificó la realización de las jornadas de socialización de procedimientos seguros de trabajo y medidas preventivas con el personal vinculado a la obra, constatando la existencia de los registros de asistencia y soportes documentales correspondientes.

Verificación del Uso de Elementos de Protección Personal (EPP): La Interventoría realizó inspecciones técnicas en campo orientadas a verificar el suministro, disponibilidad y uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de la totalidad del personal en obra, constatando que los EPP utilizados corresponden a los requeridos para cada actividad según la matriz de riesgos vigente, que se encuentran en buen estado de conservación y que su uso es consistente con los procedimientos de seguridad establecidos.

Control y Seguimiento a las Condiciones de Seguridad en Campo: La Interventoría realizó recorridos periódicos de inspección técnica a los frentes de obra activos con el propósito de verificar el mantenimiento de las condiciones de seguridad durante la ejecución de las labores constructivas. Durante dichos recorridos se verificó el estado de las señalizaciones y demarcaciones de las zonas de trabajo, la adecuada instalación de las medidas de protección colectiva requeridas, el orden y aseo de los frentes de trabajo y el cumplimiento de los procedimientos operativos seguros definidos para cada actividad. Las observaciones y hallazgos identificados durante las inspecciones fueron comunicados oportunamente al contratista para su atención y cierre en los términos establecidos.

7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación al control operacional de la maquinaria, equipos y herramientas empleadas en la ejecución de las actividades de localización y replanteo, excavación, relleno y compactación manual, así como en las labores correspondientes a la estructura de concreto y acero de refuerzo, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión HSEQ y la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como parte de las actividades de supervisión técnica, la interventoría verificó que la maquinaria y equipos movilizados en obra fueron sometidos a las respectivas inspecciones preoperacionales antes de su puesta en funcionamiento, constatando su adecuado estado mecánico y operativo, la funcionalidad de los dispositivos y sistemas de seguridad, así como el cumplimiento de las recomendaciones técnicas y procedimientos establecidos para su utilización segura en las diferentes actividades constructivas.

Asimismo, se realizó seguimiento a la competencia y autorización del personal encargado de la operación de los equipos, verificando que los operadores contaran con las capacitaciones, certificaciones y autorizaciones requeridas para el desarrollo de sus funciones, en concordancia con los procedimientos internos del componente HSEQ y las exigencias contractuales aplicables al proyecto.

La interventoría evidenció la utilización de los equipos y herramientas movilizados durante el periodo, correspondientes a pulidoras de 7 ½" y 4 ½", vibro concreto, mezcladora, planta eléctrica, volqueta sencilla, canguro (compactador tipo martillo) y taladros, verificando que su uso fue acorde con las actividades ejecutadas y que su operación se desarrolló bajo condiciones controladas de seguridad y eficiencia operativa.

De igual manera, se verificó el adecuado control sobre las herramientas menores empleadas en obra, constatando que estas se encontraban en condiciones óptimas de funcionamiento y que su manipulación se realizó bajo prácticas seguras de trabajo, orientadas a la prevención de riesgos mecánicos y a la protección de la integridad física del personal.

8. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante el periodo objeto de seguimiento, la interventoría realizó actividades de verificación y control sobre las condiciones climáticas y su posible incidencia en la ejecución de las actividades constructivas, en el marco del componente HSEQ del proyecto. Como resultado del seguimiento efectuado, se constató que se presentaron eventos climáticos adversos que generaran afectación, suspensión o disminución en el rendimiento de las actividades programadas en obra.

9. RELACIÓN PERSONAL DE OBRA

De acuerdo con las necesidades del proyecto y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C. T.P.	AFP	EPS	ARL	PLANILLA NO.
Director de Obra	Gonzalo Becerra Mejia	17.310.424	N/A	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Residente de Obra	Jennifer Andrea Becerra Morales	1.121.852.433	Colpensiones	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Profesional en Salud Ocupacional	Mayra Alejandra Cardenas Lesmes	1.121.884.993	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1082108229
Topografo	Marcos Didier Delgadillo Delgadillo	80.166.369	Porvenir	Capital Salud	Sura	1082108229
Ingeniera Ambiental	Jenny Paola Feria Triana	1.121.863.524	Protección	Sanitas	Sura	1082108229
Aux. Administrativo	Brayan Steven Rivera Martinez	1.193.092.733	Porvenir	EPS Sanitas	Sura	1082108229
Auxiliar Ingeniero Residente	Martin Omar Gutierrez Vega	17.340.851	Porvenir	Salud total	Sura	1082108229
Aux. Profesional SST	Yonli Yulieth Lozano Gonzalez	1.121.867.537	Colfondos	Famisanar	Sura	1082108229
Maestro Obra	Oscar Alexander Patiño Perez	86.055.645	Colfondos	Famisanar	Sura	1082108229
Oficial	Segundo Roa	93.372.770	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Agustin Aguilar Gonzalez	86.008.125	Porvenir	Famisanar	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Dagoberto Cortes	74.857.071	Porvenir	Capital salud	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Juan Martin Bolivar Gaitan	1.125.549456	Porvenir	Nueva EPS	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Vicente Gaitan Gaitan	8.192.573	Porvenir	Mallamas eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Yesid Galindo Gaitan	1.006.946.002	Porvenir	Nueva eps	Sura	1082108229

Ayudante de Obra	David Verbel Solis	1.101.450.750	Colpensiones	Famisanar	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Robinson Martinez Gil	PPT 1824421	N/A	Nueva eps	Sura	1082108229
Ayudante de Obra	Juan Ramon Galindo Nariño	1.124.992.965	Proteccion	Mallamas	Sura	1082108229

Tabla 3. Relación personal de obra

10. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución del contrato 1701 que tiene como objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META", por parte de contratista de obra se realizó la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con verificación de interventoría, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las obligaciones contractuales en esta materia.

En el marco de la gestión realizada, se verificó y avaló la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, los cuales fueron ejecutados conforme a la normatividad vigente. Se constató que dichos procedimientos se ofrecieron como opción voluntaria al trabajador, garantizando el derecho a decidir sobre la valoración médica laboral, sin perjuicio de la obligación contractual del contratista de disponer y ofrecer tales exámenes.

De igual manera, se corroboró la entrega oportuna y adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP), verificando que estos correspondieran a los riesgos identificados en las actividades de obra, cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas y fueran suministrados mediante actas de recibido debidamente firmadas por los trabajadores, lo cual asegura trazabilidad documental y cumplimiento normativo.

Se ejerció control sobre la ejecución de charlas de inducción y capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo, enfocadas en la prevención de riesgos asociados a labores de mantenimiento vial, manipulación de herramientas, trabajo en campo y prácticas de autocuidado. Dichas actividades fueron soportadas mediante listas de asistencia y registros documentales, los cuales fueron revisados y validados por la interventoría para garantizar su pertinencia y efectividad.

El acompañamiento incluyó la verificación de la implementación de campañas de promoción de la salud y prevención de accidentes, la ejecución de pausas activas y la difusión de protocolos de actuación en caso de emergencias, asegurando la cobertura integral de las obligaciones en materia de SST.

11. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Esta Interventoría verificó que el Plan de Manejo de Tránsito implementado por el contratista durante el período de reporte mantiene coherencia con su objetivo técnico fundamental, orientado a la identificación, prevención y mitigación de los impactos generados sobre la movilidad y la seguridad vial como consecuencia de la ejecución de las actividades constructivas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad para la totalidad de los usuarios del área de influencia del proyecto. Durante las visitas de inspección realizadas en campo, esta interventoría

constató la continuidad en la implementación efectiva de las medidas contempladas en el plan aprobado, evidenciando un avance progresivo y satisfactorio en el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas.

- **VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO IMPLEMENTADAS**

Señalización Informativa en Vías con Obras (SIO)

La Interventoría realizó la inspección técnica y verificación en campo de la instalación de la señalización informativa en vías con obras (SIO), constatando que los dispositivos instalados cumplen con las especificaciones técnicas de tamaño, color, reflectividad y ubicación establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente. Se verificó que la señalización dispuesta provee información oportuna y suficiente a los usuarios viales sobre la presencia de actividades constructivas en el área de influencia del proyecto, contribuyendo efectivamente a la prevención de incidentes de tránsito en el sector intervenido.

Dispositivos de Canalización y Delimitación del Área de Intervención

Esta Interventoría verificó la implementación y el estado de los dispositivos de canalización dispuestos para la delimitación del área de intervención y el control del tránsito interno, incluyendo conos de señalización, cinta de demarcación y demás elementos de control vial. Durante las inspecciones técnicas realizadas, se constató que los dispositivos se encuentran correctamente ubicados conforme al esquema de señalización del PMT aprobado, en buen estado de conservación y visibilidad, y que su disposición garantiza la separación efectiva entre las zonas de trabajo activo y las áreas de circulación de usuarios, en cumplimiento de los criterios de seguridad vial establecidos.

Control de Ingreso y Salida de Vehículos de Obra

La Interventoría verificó la implementación de los elementos y procedimientos para el control operativo del ingreso y salida de vehículos asociados a la obra, constatando la disponibilidad y uso efectivo de paletas PARE/SIGA por parte del personal operativo y la operación de los equipos de comunicación requeridos para la coordinación del tránsito vehicular en el área de influencia. Se verificó que estos dispositivos y procedimientos fortalecen el control operativo en los puntos críticos de acceso a la obra, reduciendo el riesgo de conflictos entre el tránsito vehicular externo y las maniobras de los vehículos de construcción.

- **VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO VIAL**


Esta Interventoría verificó durante las visitas de campo realizadas en el período de reporte la presencia continua del personal operativo de inspección vial asignado por el contratista para las labores de control, orientación y gestión del tránsito en el área de influencia del proyecto. Se constató que los inspectores viales desarrollaron sus funciones de manera permanente durante los horarios de ejecución de las actividades constructivas, ejerciendo el control direccional del flujo vehicular, orientando a los usuarios viales y garantizando condiciones adecuadas de seguridad en el sector, en cumplimiento de los roles y responsabilidades definidos en el PMT aprobado.

- **VERIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA MOVILIDAD EXTERNA**


Con base en las visitas de inspección técnica realizadas en campo durante el período de reporte, esta interventoría constató y certifica que la totalidad de las actividades constructivas ejecutadas se desarrollaron al interior del perímetro de las instalaciones de la Estación de Policía, condición que limitó de manera efectiva la generación de interferencias sobre la infraestructura vial externa y la movilidad vehicular del entorno urbano del proyecto. Esta Interventoría verificó que no se registraron afectaciones significativas a la movilidad vehicular externa durante el período evaluado, evidenciando que las medidas de manejo de tránsito implementadas resultaron proporcionales y adecuadas a las condiciones reales de la obra en el período de reporte.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO

CHARLAS E INDUCCIONES

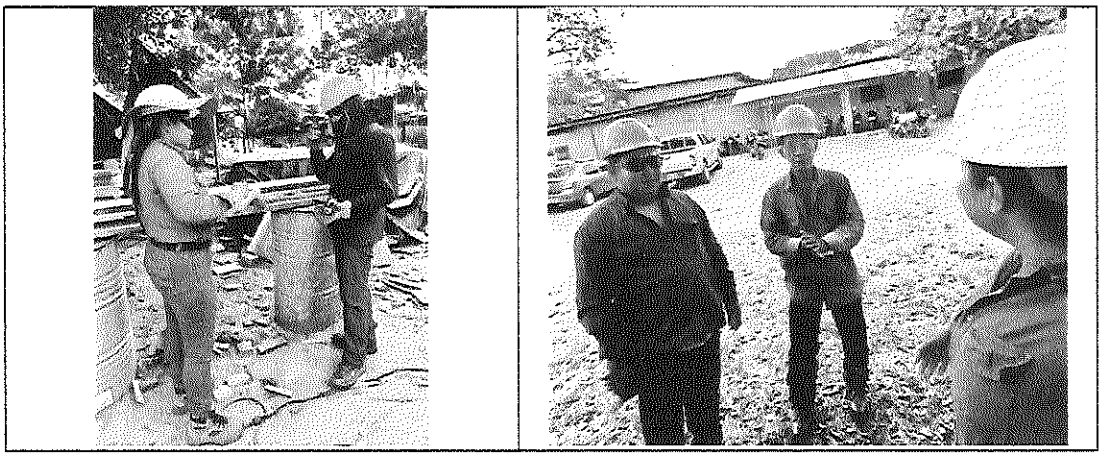


PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

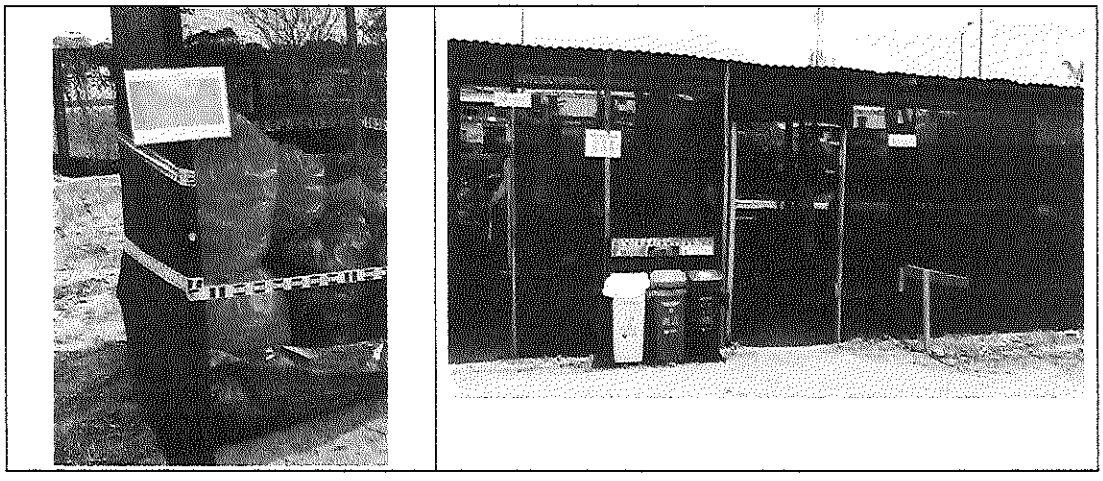

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

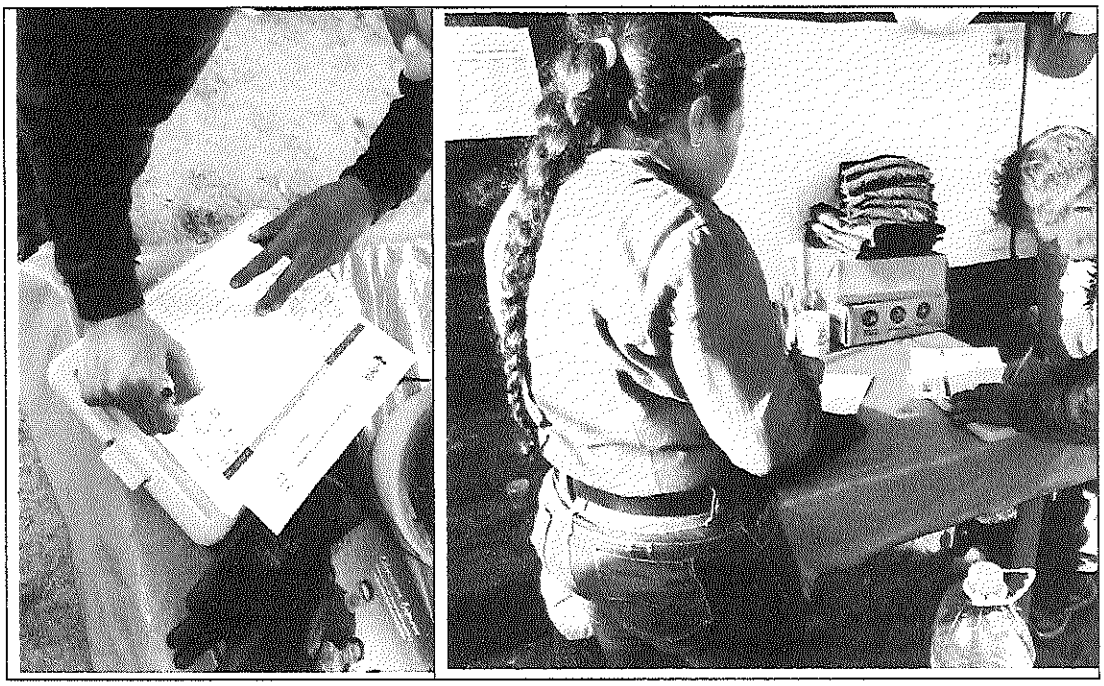

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO



UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

13. CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades de seguimiento, revisión y verificación realizadas por la interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, se evidenció que el proyecto presentó avances en la ejecución de las actividades programadas, correspondientes a la demolición de elementos estructurales (columnas, vigas y placa de piso en concreto), rellenos con material mixto, instalación de redes sanitarias y eléctricas, fundida de placa de concreto e instalación de formaleta para vigas aéreas, las cuales fueron desarrolladas conforme a las condiciones técnicas, operativas y de seguridad definidas para la etapa constructiva del proyecto.

La interventoría verificó el adecuado cumplimiento de los lineamientos establecidos en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciando la implementación de medidas orientadas a la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, particularmente aquellos relacionados con trabajos de demolición, manipulación de materiales, operación de maquinaria y equipos, y ejecución de actividades estructurales. Asimismo, se constató la aplicación de controles operacionales y medidas preventivas que contribuyeron al desarrollo seguro de las labores y a la prevención de incidentes y accidentes laborales durante el periodo evaluado.

De igual manera, se realizó seguimiento al estado y condiciones de operación de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en obra, verificando el cumplimiento de las inspecciones preoperacionales, la adecuada utilización de los elementos de protección personal (EPP) y la implementación de prácticas seguras de trabajo, en concordancia con los procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión HSEQ del proyecto.

En el componente ambiental, la interventoría evidenció el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas por el contratista, particularmente en lo relacionado con la segregación en la fuente, almacenamiento temporal y disposición adecuada de los residuos sólidos generados durante la ejecución de las actividades constructivas, contribuyendo a la mitigación de los impactos ambientales derivados del proceso constructivo y al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
Finalmente, la interventoría concluye que la gestión HSEQ desarrollada durante el periodo evaluado presentó un cumplimiento satisfactorio de los requisitos contractuales, técnicos y normativos establecidos para el proyecto, permitiendo garantizar condiciones adecuadas de seguridad, orden y control operacional en los diferentes frentes de trabajo. En consecuencia, se avalan las acciones implementadas por el contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión ambiental, las cuales constituyen un soporte fundamental para la continuidad y correcta ejecución de las siguientes fases constructivas, bajo criterios de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental.

Luis Carlos Lazo

LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ
Profesional SST
Union Temporal Interpolicia 2025
Nit. 902.014.419-5

ANEXO 10.
CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1683 de 2025.**

CERTIFICO QUE:

La **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1683 de 2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo del 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de mayo de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de

El presente certificado se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
