GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P. 01193-0214

MUNICIPIO DE TAURAMENA
MCMT-SI-001-2026

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

01 DE JULIO 2026 AL 22 DE JULIO DE 2026

TAURAMENA, CASANARE. JULIO 2026

Inventario y estado inicial de la vía

Estado inicial de la Vía Tauramena- Monterrey K8+000; K8+250






SOCAVACION MUROS, DEBAJO DE FALLA VIA K8+250 IZQ.





SOCAVACIÓN MUROS DEBAJO DE LA FALLA DE PAVIMENTO K8+250 IZQ.

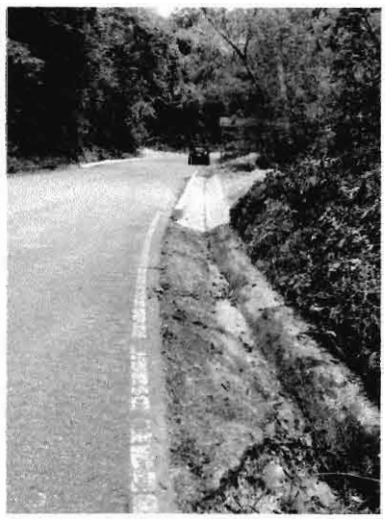





CUNETAS DESGASTADAS Y DAÑADAS K8+000 Y K8+020 IZQUIERDA



CUNETA EN TIERRA K8+250 IZQ




CUNETA EN TIRRA EMPOZADA K8+250 LADO DERECHO







FALLA EN VIA CON PERDIDA DE MATERIAL GRANULAR Y PERDIDA DE PAVIMENTO CALZADA K8+250 DER

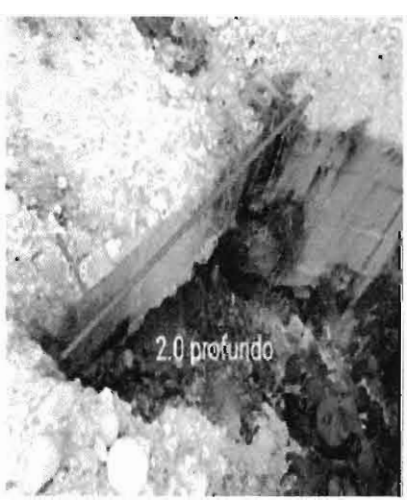





SOCAVACION POR DEBAJO DE MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PONTON K8+250 DER

Descripción de las actividades ejecutadas durante el periodo

A continuación, se presentan la descripción de las actividades realizadas durante el periodo 01/07/2026 al 22/07/2026

1. Demolición de cunetas con retiro
2. Corte en carpeta asfáltica
3. Se dispone de personal y señalización para control de tráfico.
4. Excavación manual en conglomerado (nivelación)
5. Se procede con el cargue, transporte y colocación de material para concreto ciclópeo y concreto para cunetas en los sitios de la vía requeridos.
6. Se construyen Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)
7. Se colocan en materiales en obra para construcción de sacos con suelo cemento
8. Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m.
9. Se construyen Muros de gravedad en concreto ciclópeo de 3000 Psi
10. Se hace limpieza de cunetas (con retiro max. A 2 Km)

A continuación se presenta la justificación técnica mediante la cual se adelantó un ajuste a las cantidades de obra del contrato de obra en referencia, por lo cual y de acuerdo a los presupuestos aprobados, es necesario adelantar un balance de cantidades de obra para hacer posible la ejecución de las actividades en mención, y de igual forma se presentan las memorias de cantidades de obra requeridas a ejecutar, balance de cantidades de obra, un presupuesto ejecutado de acuerdo a las nuevas cantidades del contrato y la justificación técnica del aumento y disminución de cantidades de obra en los diferentes Ítems:

- **1– Demolición de cunetas con retiro**

Justificación Técnica: Esta cantidad disminuyo de 3.78 m3 a 2.10 m3 ya que se programó hacer demolición de 3 tramos de cunetas en el k8+000, k8+020/030 y K8+030/040 para reconstrucción de de las mismas debido a su avanzado estado de deterioro, lo cual no se llevó a cabo en su totalidad ya que al hacer la limpieza del tramo entre el K8+030/040 izq. se pudo observar que la cuneta estaba era bastante taponada y cubierta de material y maleza y al retirar estos materiales se observó que aún se encontraba en buen estado, por lo que no fue necesario su demolición y reconstrucción.

2. **Corte en carpeta asfáltica**

Se adelanta el corte de la carpeta asfáltica en los sitios definidos y programados para adelantar los reparcheos de la vía, con el uso de la cortadora requerida para esta actividad en L=26.80 m.

3. Se dispone de personal y señalización para control de tráfico.
Fue necesario disponer de personal y señalización para seguridad y control del tráfico en estos puntos donde se adelantan las intervenciones, que, aunque no es necesario hacer cierres temporales de la vía, por cuanto las obras se adelantan en los costados de la banca, si es necesario garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la carretera.

4. Excavación manual en conglomerado (nivelación)

Justificación Técnica: Este tipo de actividad disminuyo de 53.04 m3 a 41.21 m3 ya que no se ha adelantado las excavaciones para hacer los reparcheos en los sitios programados.
En los demás sitios se adelantaron las excavaciones para reconstrucción de cunetas y las excavaciones necesarias para la construcción de los recalces de los muros de acompañamiento del pontón del K8+250 izquierda, en concreto ciclópeo de 3000 psi.

5. Se procede con el cargue, transporte y colocación de material para concreto ciclópeo y concreto para cunetas en los sitios de la vía requeridos.
Se dispone en obra de materiales de arena, tritura, piedra y cemento, además de los equipos necesarios para la construcción en sitio de los concretos simple de 3000 psi para las cunetas y el concreto ciclópeo para los muros gravedad en el recalce de los muros de acompañamiento del pontón K8+250.

6. Se construyen Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)

Se hizo necesario disminuir el la longitud de construcción de las cunetas, de 53.50 m a 42.50 m; por la razón expuesta anteriormente " *el tramo entre el K8+030/040 izq. se pudo observar que la cuneta estaba era bastante taponada y cubierta de material y maleza y al retirar estos materiales se observó que aún se encontraba en buen estado* ", por lo que tampoco fue necesaria su reconstrucción, entonces se ejecutaron los tramos del K8+000 izq en 2,50 ml, el tramo del K8+020/030 izq. en una longitud de 15.00 ml, el tramo del K8+030/040 Izq. no se reconstruyo y el tramo del K8+250 Der, se construyó en una longitud de 25 ml.

7. Se colocan en materiales en obra para construcción de sacos con suelo cemento

Se dispone en obra sacos de lonas de 0.60 m x 0.80 m. para la construcción de los sacos de suelo cemento, se dispone de cemento, suelo producto de mixto de arena y gravilla y de nailon y agujas para sellarlos.

8. Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m

Esta actividad requirió menos cantidad, ya que se dispusieron para minimizar el desbordamiento y encausamiento de cunetas en el K8+000 derecha y la longitud programada de 15 m, solo se requirieron 10 ml. Y en el descole de la cuneta izq del K8+250 se utilizó concreto ciclópeo para disipar el impacto de la entrega de agua del descole de la cuneta al talud bajo el muro de acompañamiento de la obra.

9. Se construyen Muros de gravedad en concreto ciclópeo de 3000 Psi

Esta actividad aumento de 13.84 m3 a 19.80 m3, debido a que al hacer la limpieza de la maleza debajo de los muros de acompañamiento de la obra K8+250 izq, se observo que el nivel de socavación de estas estructuras era mucho mayor al esperado inicialmente, por lo que al adelantar el recalce de dichos muros fue necesario introducir concreto ciclópeo bien por debajo de la cimentación de dichos muros y además para contener el deslizamiento de materiales del aproche, materiales granulares y estructura de vía, que se perdían a través de dichos espacios y ocasionando los daños evidenciados en la banca de la via.

10. Se hace limpieza de cunetas (con retiro max. A 2 Km)

Se adelanto la limpieza de cunetas en el K8+030/040 Izq. y en el K8+250 lado Izq en una longitud de 10 m en cada sitio para un total ejecutado de 20 m, esta actividad aumento de 10 m a 20 m, ya que fue necesario limpiar estos 2 tramos para evidenciar el estado de las cunetas y garantizar un descole mas adecuado de las mismas.


Justificación Técnica: Los ítems de 3. Demolición de pavimento, 5. base granular para reparcheo, y 7. Reparcheo de mezcla densa en caliente, no se ejecutaron en este periodo y no se tuvieron en cuenta para pago en la presente acta parcial de obra No. 01.

Y las excavaciones que se requirieren son para la reconstrucción de cunetas en el K8+000 lados izquierdo y K8+250 lado derecho, que se encontraba taponada, por lo cual se encharca y se desborda y esta escorrentía es la que está ocasionando el daño de hundimiento del material en el carril izquierdo de la calzada en el K8+250

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO FINAL DE LA VIA

A continuación, se presenta el registro de las actividades ejecutadas.

Cunetas tipo C-1 en concreto

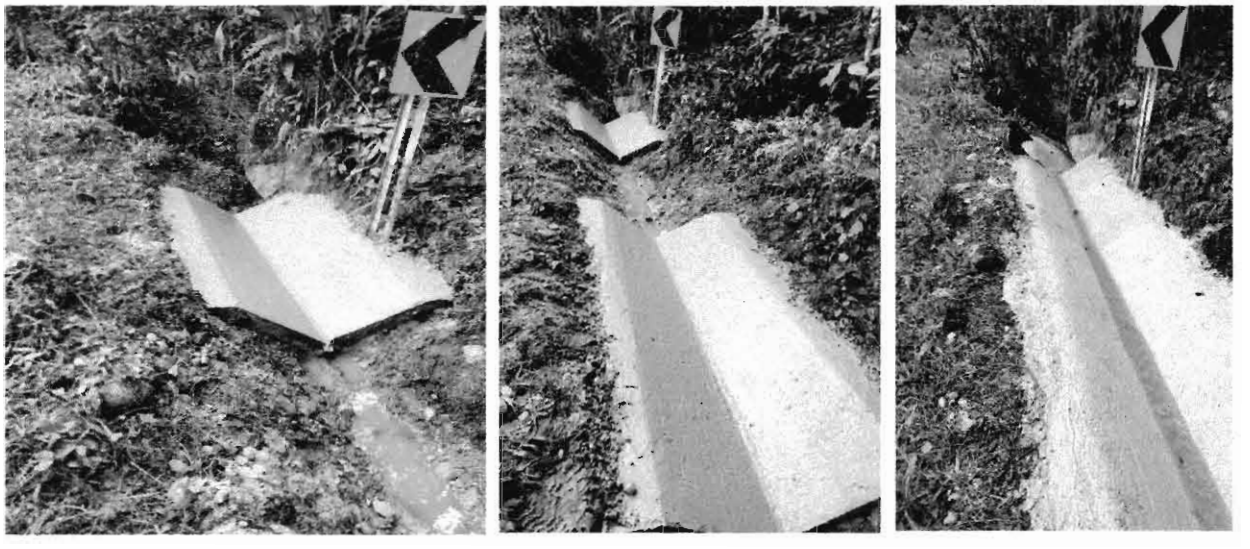

Cunetas revestidas en sacos



Muro de gravedad en concreto ciclópeo


















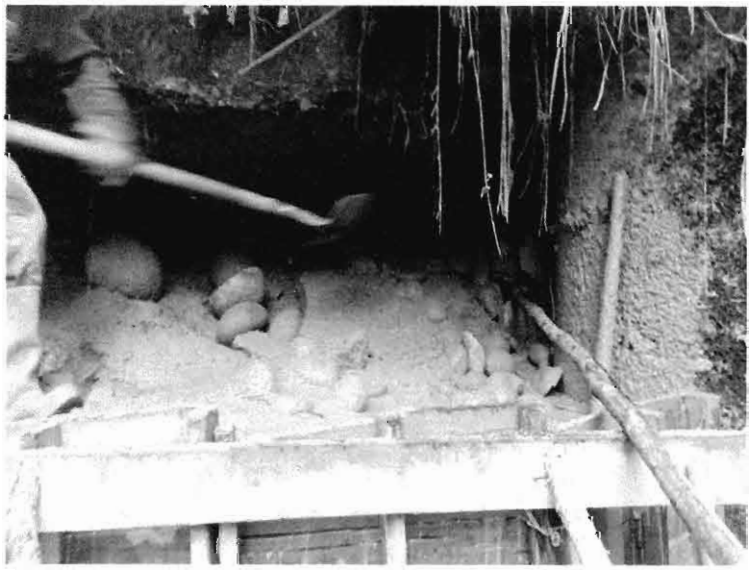













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Reconocimiento de avances técnicos: Se resalta que ya fue adelantado el recalce con concreto ciclópeo debajo y posterior de los muros de acompañamiento de obra (Ponton) K8+250 lado izq. Y que con esta labor se mitigo y controlo la perdida de material de la estructura de la via en el aproche de la obra.

- ✓ La ejecución de actividades del muro en concreto ciclópeo debajo del muros de acompañamiento, no es suficiente garantía para la estabilidad de la obra (Pontón), ya que se evidencia una gran socavación por debajo de la obra (Pontón), lo requiere ser atendida con obras que mitiguen al máximo este efecto, por cuanto la caída de agua ha provocado la erosión del material del lecho de la quebrada Surimena, lo que está ocasionando el descubrimiento casi por completo de los pilotes y la cimentación de la obra, lo cual a futuro podría ocasionar el colapso total de la obra, debido a la socavación de su cimentación.
- ✓

- ✓ Se evidencia que es fundamental la reconstrucción y limpieza de las cunetas en los 2 costados de la vía en estos tramos de la carretera, para garantizar un debido drenaje superficial de la escorrentía y así evitar que esta llegue a los taludes aledaños o provoquen afectaciones por erosión o encharcamientos en la calzada.

ANEXOS

-Memorias de cantidades

Atentamente,

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA

CONTRATO 295/2026: "OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA DE LA VEREDA EL PALMAR, ALTERNA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA," CASANARE.

PRESUPUESTO AJUSTADO

ITEM	C. GOB	DESCRIPCION.	UND	CANT	VR UNIT.	VR TOTAL
1	6,226	Demolicion de cunetas con retiro	m3	2,10	$134.483,00	$282.414,00
2	5,562	Corte en carpeta asfaltica	m	26,80	$20.196,00	$541.253,00
3	6,202	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc.retiro) e. prom 0.10 m	m2	0,00	$61.506,00	$0,00
4	5,138	Excavacion manual en conglomerado (nivelación)	m3	41,21	$124.199,00	$5.118.241,00
5	7,319	Base granular para reparcheo e=0.20 m (colocacion manual)	m2	0,00	$48.496,00	$0,00
6	4,726	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)	m	42,50	$120.813,00	$5.134.553,00
7	2,703	Reparcheo con Mezcla densa en caliente MDC-2. art.400 inv	m3	0,00	$1.855.705,00	$0,00
8	8,430	Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m	m	10,00	$110.552,00	$1.105.520,00
9	3,945	Muro de gravedad en concreto ciclopeo de 3000 Psi	m3	19,90	$1.008.108,00	$20.061.349,00
10	4,601	Limpieza cunetas (con retiro max. A 2 Km)	m	20,00	$6.292,00	$ 125.840,00
11	6,604	transporte de material asfaltico	m3-km	0,00	$2.677,00	$ 0,00
COSTO EJECUTADO AJUSTADO AL PESO						**$32.369.170**

GILBERTO GALINDO ALVARADO

CINTRATISTA Ctrato 295/2026

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

HOJA 1 DE 11 FECHA:

CAPÍTULO	1		ITEM	1,0	Demolicion de cunetas con retiro	UNIDAD	m3



SE DEMOLIERON 2.50 m - K8+000 IZQ



SE DEMOLIERON 15.00 m - K8+020 IZQ



NO SE DEMOLIO NADA, SOLO SE HIZO LIMPIEZA K8+030 IZQ

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				No. Elementos	CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor/ profundidad (m)	Volumen (m3)		
Punto critico No. 1 K8+000 IZQUIERDA	2,50	1,20	0,10	0,30	1,00	0,30
punto critico No. 2 - K8+020 IZQ	15,00	1,20	0,10	1,80	1,00	1,80
punto critico No. 3 - K8+030 IZQ	0,00	1,20	0,10	0,00	1,00	0,00
				Subtotal		2,10
				Descuento		
				TOTAL		2,10

Elaboró:

Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista 295-2026

V.° B.°:

Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

HOJ 2 DE 11 FECHA:

CAPÍTULO	1		ITEM	2,0	Corte en carpeta asfaltica	UNIDAD	m









DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				No. Elementos	CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)	ancho (m)	metros l		
punto No. 1	8,50	2,20	2,20	12,90	1,00	12,90
punto No. 2	1,90	1,00	1,00	3,90	1,00	3,90
punto No. 3	1,00	1,00		2,00	1,00	2,00
punto No. 4	2,00	2,00	4,00	8,00	1,00	8,00
Observaciones:				Subtotal		26,80
				Descuento		
				TOTAL		26,80

Elaboró:

Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista 295-2026

V.° B.°:

Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA DE LA VEREDA EL PALMAR, ALTERNA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

4	DE	11		FECHA:	

CAPÍTULO	1		ITEM	4,0	Excavacion manual en conglomerado (nivelación)	UNIDAD	m3



1. SE HIZO DE 2.50M



2. SE HIZO DE 15 M



3. NO SE EJECUTO, SE HIZO LIMPIEZA.



4. NO SE HA EJECUTADO



5. NO SE HA EJECUTADO



6. NO SE HA EJECUTADO



7. SE EJECUTO DE 25M



8. SE EJECUTO DE 10M Y H=0.45M





9. SE EJECUTO DE 8M X 0.90 DE ANCHO X H=0,30 PROMEDIO





10. SE EJECUTO DE 4,90M x 1,0 DE ANCHO x H=1,10 PROMEDIO





11. SE EJECUTO DE 5M x 3,15 DE ANCHO x H=1,32 PROMEDIO



12. NO SE EJECUTO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				No. Elementos	CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor/ profundidad (m)	Volumen (m3)		
Punto No. 1	2,50	1,20	0,15	0,45	1,00	0,45
punto No. 2	14,00	1,20	0,15	2,52	1,00	2,52
punto No. 3	10,00	1,20	0,00	0,00	1,00	0,00
Punto No. 4	8,50	2,20	0,00	0,00	1,00	0,00
Punto No. 5	1,80	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Punto No. 6	1,00	1,00	0,30	0,00	1,00	0,00
Punto No. 7	25,00	1,20	0,15	4,50	1,00	4,50
Punto No. 8	10,00	1,20	0,45	5,40	1,00	5,40
Punto No. 9	8,00	0,90	0,30	2,16	1,00	2,16
Punto No. 10	4,90	1,00	1,10	5,39	1,00	5,39
Punto No. 11	5,00	3,15	1,32	20,79	1,00	20,79
Punto No. 12	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Observaciones:				**Subtotal**		41,21
				Descuento		
				TOTAL		41,21

Elaboró:

Nombre: GILBERTO ARLINDO ALVARADO
Contratista 295-2026

V.° B.°:

Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

HOJA 6 DE 11 FECHA:

CAPÍTULO	1		ITEM	6,0	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)	UNIDAD	m





1. K8+000 IZQ



SE RECONSTRUYERON 2,50 M





2. K8+000 IZQ - SE RECONSTRUYERON 15 M



3. SOLO SE LIMPIO





4. K8+250 DER-SE CONSTRUYERON 25 M

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				No. Elementos	CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)				
punto No,1	2,50				1,00	2,50
punto No,2	15,00				1,00	15,00
punto No,3	0,00				1,00	0,00
punto No,4	25,00				1,00	25,00
					1,00	0,00
Observaciones:			Subtotal			42,50
			Descuento			
			TOTAL			42,50

Elaboró:

Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista 295-2025

V.º B.º:

Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

HOJA 8 DE 11

FECHA:

CAPÍTULO	1		ITEM	8,0	Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m	UNIDAD	m











DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				No. Elementos	CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)				
Punto Critico No.1						
tramo No,1 K8+000	10,00				1,00	10,00

Observaciones:		
	Subtotal	10,00
	Descuento	
	TOTAL	10,00

Elaboró:

Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista 295-2026

V.º B.º:

Nombre: LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

HOJ	9	DE	11	FECHA:	

CAPÍTULO	1		ITEM	9,0	Muro de gravedad en concreto ciclopeo de 3000 Psi	UNIDAD	m3















DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				No. Elementos	CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)	Espesor/ profundidad (m)	Volumen (m3)		
Muro No,1 : seccion inferior	4,50	0,80	1,30	4,68	1,00	4,68
seccion media- posterior	4,00	2,50	0,30	3,00	1,00	3,00
seccion superior	5,50	2,50	0,55	7,56	1,00	7,56
Muro No,2 primera seccion baja	1,50	1,20	0,80	1,44	1,00	1,44
segunda sección alta	3,40	1,10	0,70	2,62	1,00	2,62
Bajante de cuneta izquierda.	5,00	0,60	0,20	0,60	1,00	0,60
				Subtotal		19,90
				Descuento		
				TOTAL		19,90

Elaboró:

Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista 295-2026

V.º B.º:

Nombre: LINO RODRÍGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

MUNICIPIO DE TAURAMENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

HOJA	11	DE	11	FECHA:	

CAPÍTULO	1		ITEM	10,0	Limpieza cunetas (con retiro max. A 2 Km)	UNIDAD	m





Limpieza cuneta K8+000 lado Izquierdo



Limpieza cuneta K8+250 lado Izquierdo

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				No. Elementos	CANTIDAD
	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	TOTAL		
Limpieza cuneta K8+000 lado Izquierdo	10,00			10,00	1,00	10,00
Limpieza cuneta K8+250 lado Izquierdo	10,00			10,00		10,00
Observaciones:				**Subtotal**		20,00
				Descuento		
				TOTAL		**20,00**

Elaboró:


Nombre: **GILBERTO GALINDO ALVARADO**
Contratista 295-2026

V.° B.°:


Nombre: **LINO RODRIGUEZ OCHOA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

MURO 1

SECCION SUPERIOR

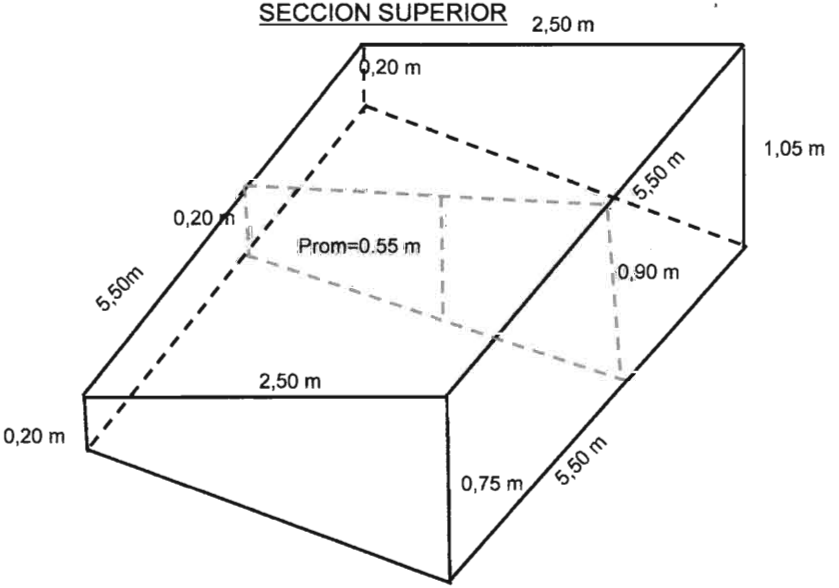


SECCION MEDIA POSTERIOR

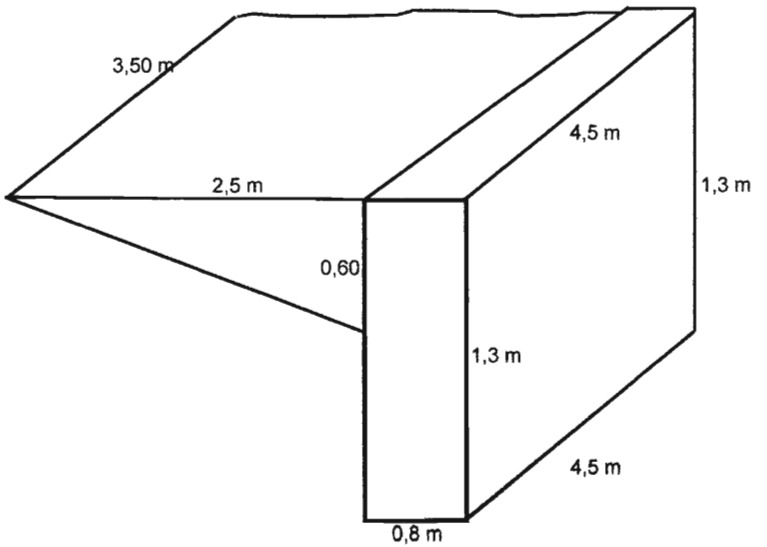

SECCION INFERIOR

MURO 2

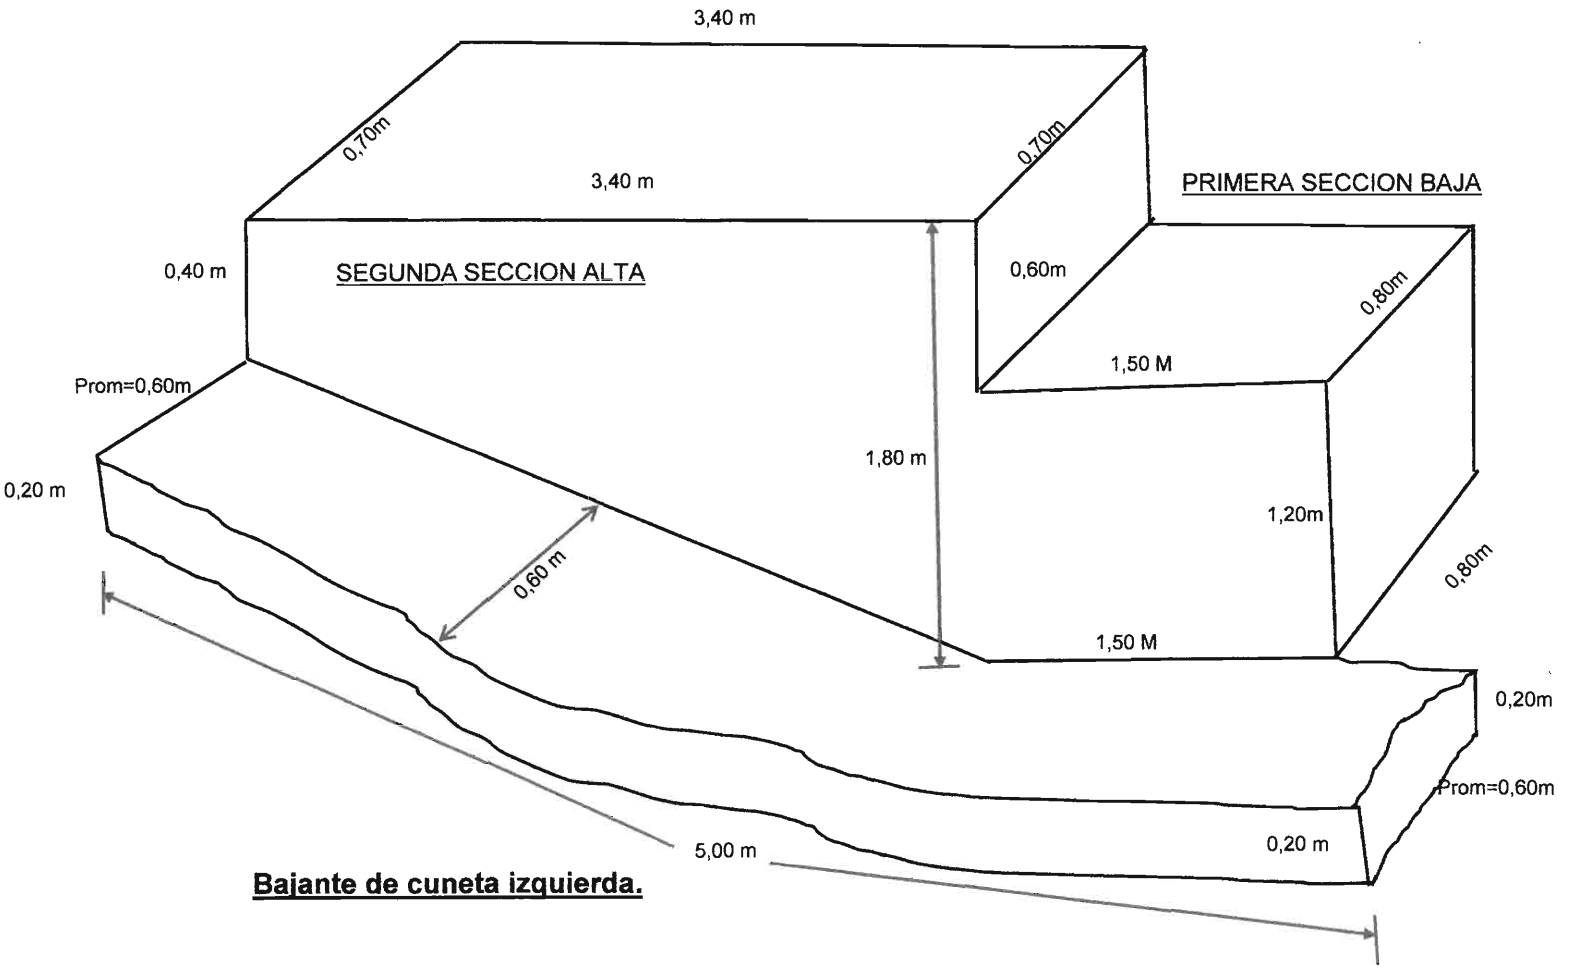

Bajante de cuneta izquierda.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 N 17-59	TELÉFONO:	6332721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - TAURAMENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4660762503**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997492220

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 37.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 37.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 14.700
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	3	$ 22.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 36.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	5	$ 12.100
		SUBTOTAL:	5	**$ 12.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	$ 20.600
		SUBTOTAL:	5	**$ 20.600**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	5	$ 6.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	5	$ 9.100
		SUBTOTAL:		**$ 15.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 121.600**
VALOR MORA:	**$ 700**
TOTAL PAGADO:	**$ 122.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 N 17-59	TELÉFONO:	6332721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - TAURAMENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4650762503	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997492220

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 37.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 37.600	$ 100	$ 37.700
SUBTOTALES:										$ 37.600	$ 100	$ 37.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 21.900	$ 100	$ 0	$ 22.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 14.600	$ 100	$ 0	$ 14.700
SUBTOTALES:													$ 36.500	$ 200	$ 0	$ 36.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.500	$ 20.500	$ 100	$ 0	$ 20.600
SUBTOTALES:									$ 20.500	$ 100	$ 0	$ 20.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	5	$ 12.000	$ 100	$ 12.100
SUBTOTALES:			$ 12.000	$ 100	$ 12.100

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 9.000	$ 100	$ 9.100
PASENA	PASENA - SENA	5	$ 6.000	$ 100	$ 6.100
SUBTOTALES:			$ 15.000	$ 200	$ 15.200

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1115912545	MORALES GONZALEZ JEFFERSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO	30																	230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 58.364	$ 7.300	$ 0	$ 7.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.400	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0
2	CC 1115913101	RINCON DAZA EDIXON YOANI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO	30																	230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 58.364	$ 7.300	$ 0	$ 7.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.400	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0
3	CC 74845131	PAEZ MENDOZA LINO ANTONIO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.750.905	FIJO			NO	30																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 58.364	$ 7.300	$ 0	$ 7.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.400	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0
4	CC 74845423	RODRIGUEZ ALFONSO JOEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO	30																	230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 58.364	$ 7.300	$ 0	$ 7.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.400	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0
5	CC 74845761	LEGUIZAMO PEÑA JOSE ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO	30																	230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 58.364	$ 7.300	$ 0	$ 7.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 58.364		$ 4.100	1	$ 58.364	CCF69-COMFACASANARE	$ 2.400	$ 1.200	$ 1.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 122.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 Nº 17-59	TELÉFONO:	6247018
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4660763208**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997492172

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 219.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 219.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 18.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 600**
TOTAL PAGADO:	**$ 518.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 Nº 17-59	TELEFONO:	6247018
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4660763208	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/17		NUMERO AUTORIZACIÓN:		9997492172

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 280.200	$ 300	$ 280.500
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 300**	**$ 280.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 218.900	$ 200	$ 0	$ 219.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 219.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 100	$ 0	$ 18.400
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 18.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6773569	GALINDO ALVARADO GILBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	6773569	$ 18.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 518.000

Planilla Pagada
