OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

INFORME SUPERVISION

Acta Parcial No. 1 Contrato 295 de 2026

LINO RODRIGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA 2026

FECHA: Julio de 2026

INFORME SUPERVISION

CONTRATO No.	295 del 13 de Mayo de 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBJETO	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO, NIT. 6.773.569-7
R/LEGAL	N.A.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO SUPERVISIÓN	N.A.
VALOR CONTRATO	$49,016,056.00
VALOR ANTICIPO (50%)	$24,508,028.00
FECHA INICIACIÓN	30 de junio de 2026
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	30 de julio de 2026
PLAZO	Un (1) mes
% AVANCE FINANCIERO	67.90%
% AVANCE FISICO	67.90%
FECHA PRESENTE INFORME	23 de julio de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el contratista en la Cláusula Cuarta del contrato en mención, me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Demolicion de cunetas con retiro		0.58%
Corte en carpeta asfaltica		1.10%
Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc.retiro) e. prom 0.10 m		0.00%
Excavacion manual en conglomerado (nivelación)		10.44%
Base granular para reparcheo e=0.20 m (colocacion manual)		0.00%
Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)		10.48%
Reparcheo con Mezcla densa en caliente MDC-2. art.400 inv		0.00%
Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m		2.26%
Muro de gravedad en concreto ciclopeo de 3000 Psi		40.93%
Limpieza cunetas (con retiro max. A 2 Km)		0.26%
Transporte de material asfáltico		0.00%
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	8	**66.0%**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			21/jul./26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones labor	X			
Responsabilidad civil extracontractual	X			
Estabilidad y calidad de la obra		x		

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
57-46-101012301	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	$4,901,605.60	30/jun./26	30/nov./26	Anexo 4
		Anticipo	$24,508,028.00	30/jun./26	30/nov./27	
		Pago de salarios, prestaciones	$2,450,802.80	30/jun./26	31/jul./29	
57-54-101001932		Responsabilidad civil extracontractual	$350,181,000.00	30/jun./26	30/ago./26	Anexo 4

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO X	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	$49,016,056.00			
Valor Anticipo (50%)		$24,508,028.00		$24,508,028.00
Valor Adicional No. (XXX)				
Valor Acta No.XXX				
Valor presente Acta		($16,652,226.00)	$33,304,452.00	$16,652,226.00
Saldo por ejecutar		($7,855,802.00)	$15,711,604.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$49,016,056.00**	**$0.00**	**$49,016,056.00**	**$41,160,254.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

- No se materializó ninguno de los riesgos previstos inicialmente

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	30 de junio de 2026
SUSPENSION No.xx	23 de julio de 2026
REINICIO No.xx	10 de agosto de 2026
PRORROGA No.1	N.A.
ACTA DE TERMINACIÓN	
ACTA DE RECIBO FINAL	

ACTA DE LIQUIDACIÓN	

Se deja constancia, que el contratista hizo entrega de: Informe Parcial de Obra No. 1, con sus respectivos soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social, los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal empleado para la ejecucion contractual (planillas de pago numeros 4660762503 y 4660763208). Lo anterior se remitió a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que repose en el expediente del contrato.

6. ANEXOS

Anexo 1. Soportes de pagos de Seguridad Social, anexos en el informe final del contratista

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SUPERVISOR

INFORME SUPERVISION, de Julio de 2026, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.295 del 13 de Mayo de 2026

ANEXO 2

INFORME SUPERVISION

OBJETO	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO









ANEXO 2

INFORME SUPERVISION

OBJETO	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME FOTOGRAFICO









ANEXO 3

INFORME SUPERVISION

OBJETO	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR EJECUTADO
1	Demolicion de cunetas con retiro	m3	3.78	2.10	1.0%	0.58%		$134,483.00	$508,346.00		$282,414.00
2	Corte en carpeta asfaltica	m	26.80	26.80	1.1%	1.10%		$20,196.00	$541,253.00		$541,253.00
3	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc.retiro) e. prom 0.10 m	m2	25.60	0.00	3.2%	0.00%		$61,506.00	$1,574,554.00		$0.00
4	Excavacion manual en conglomerado (nivelación)	m3	53.04	41.21	13.4%	10.44%		$124,199.00	$6,587,515.00		$5,118,241.00
5	Base granular para reparcheo e=0.20 m (colocacion manual)	m2	85.60	0.00	8.5%	0.00%		$48,496.00	$4,151,258.00		$0.00
6	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)	m	53.50	42.50	13.2%	10.48%		$120,813.00	$6,463,496.00		$5,134,553.00
7	Reparcheo con Mezcla densa en caliente MDC-2. art.400 inv	m3	6.53	0.00	24.7%	0.00%		$1,855,705.00	$12,117,754.00		$0.00
8	Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m	m	15.00	10.00	3.4%	2.26%		$110,552.00	$1,658,280.00		$1,105,520.00
9	Muro de gravedad en concreto ciclopeo de 3000 Psi	m3	13.84	19.90	28.5%	40.93%		$1,008,108.00	$13,952,215.00		$20,061,349.00
10	Limpieza cunetas (con retiro max. A 2 Km)	m	10.00	20.00	0.1%	0.26%		$6,292.00	$62,920.00		$125,840.00
11	Transporte de material asfáltico	m3-km	522.40	0.00	2.9%	0.00%		$2,677.00	$1,398,465.00		$0.00
								TOTALES EJECUTADOS	**$49,016,056.00**		**$32,369,170.00**


VALOR TOTAL EJECUTADO	**$32,369,170.00**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)	**$16,184,585.00**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$16,184,585.00**

ANEXO 4

INFORME SUPERVISION

OBJETO	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

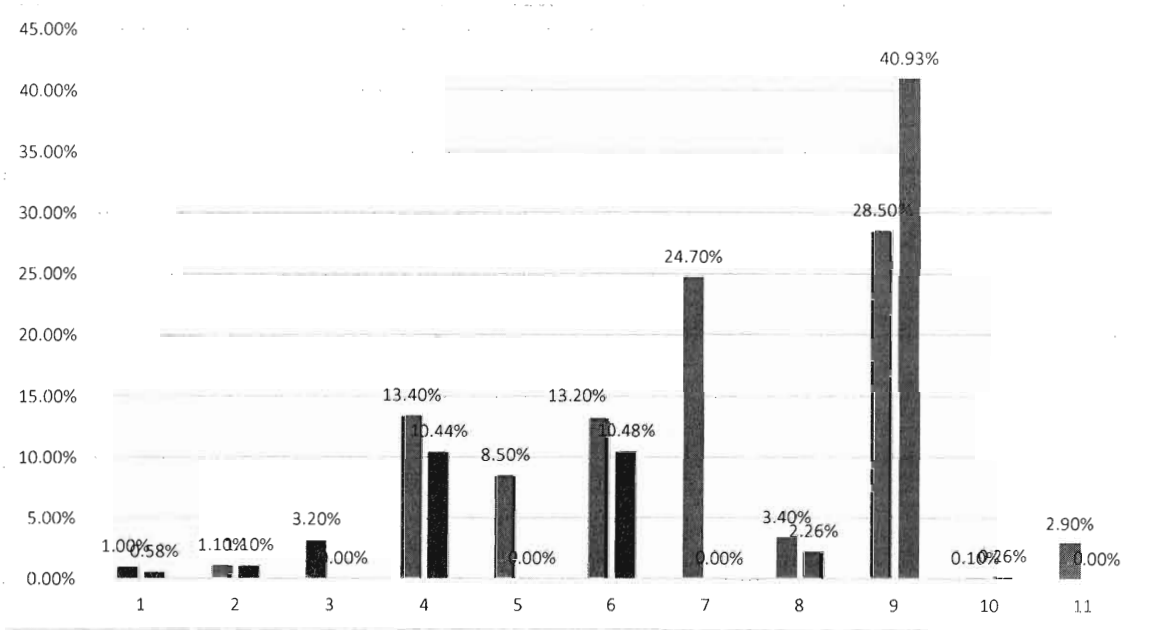

Contratado Ejecutado

CANTIDADES CONTRATADAS VS CANTIDADES EJECUTADAS

1 Demolicion de cunetas con retiro (Aporte Municipio)
2 Corte en carpeta asfaltica (Aporte Municipio)
3 Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc.retiro) e. prom 0.10 m (Aporte Municipio)
4 Excavacion manual en conglomerado (nivelación) (Aporte Municipio)
5 Base granular para reparcheo e=0.20 m (colocacion manual) (Aporte Municipio)
6 Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m) (Aporte Municipio)
7 Reparcheo con Mezcla densa en caliente MDC-2. art.400 inv (Aporte Municipio)
8 Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m (Aporte Municipio)
9 Muro de gravedad en concreto ciclopeo de 3000 Psi (Aporte Municipio)
10 Limpieza cunetas (con retiro max. A 2 Km) (Aporte Municipio)
11 Transporte de material asfáltico (Aporte Municipio)

ANEXO 5
INFORME SUPERVISION

OBJETO	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
MAYO 2026	1					
	2					
	3					
	4					
JUNIO 2026	1					
	2					
	3					
	4			Acta de Inicio	Revisión	
JULIO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4					
AGOSTO 2026	1					
	2					
	3					
	4					
SEPTIEMBRE 2	1					
	2					
	3					
	4					
OCTUBRE 2026	1					
	2					
	3					
	4					
NOVIEMBRE 2(	1					
	2					
	3					
	4					
DICIEMBRE 2026	1					
	2					
	3					
	4					
