ANEXO No. 5

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ACTAS COMITÉS DE OBRA

ACTA No. 88.1	COMITÉ TRANSVERSALES No. 88.1 CTO OBRA: 3232/23 - CTO INTERV. 3219/23	DD	MM	AA
		2	12	2025

LUGAR:	Virtual	HORA DE INICIO:	9:30 a.m.	HORA FIN:	10:15 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los componentes transversales	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

COMPONENTE SOCIAL: El contratista de la UTMP, informa que se envió el acta del comité de participación ciudadana No. 20 con el listado de asistencia, presentación, registro fotográfico y la evaluación, la interventoría emite su aprobación y la misma es remitida como compromiso a los asistentes.

La profesional social del contratista, reporta el personal con corte al 25 de noviembre, la misma es aprobada por la profesional SST de la interventoría y del contratista.

Se informa que el informe No 22 de obra, fue remitido el 28 de noviembre, a la fecha está pendiente la aprobación de las actas transversales, razón por la cual no se ha podido radicar para su aprobación final.

Para el comité de participación ciudadana No 21, ya el contratista hizo el envío de los volantes de convocatoria y los oficios ya se encuentran aprobados por la interventoría y la entidad contratante.

Se hace una recomendación por parte de la profesional social, ya que se recibe llamada de las señora Magaly quien es la persona encarga del cuidado de los perros y es que al momento de ingresar por la puerta vehicular, tener mayor cuidado al ingreso con las motos y carros, ya que puede interponer alguna queja directamente en la SDA, esta misma recomendación se le hará a los contratistas que laboran actualmente en el proyecto.

La profesional social de la interventoría informa que para el transcurso de esta semana se recibirá la presentación del CPC No 21, I a efectuarse el 12 de diciembre, la cual será revisada para su aprobación o subsanación según sea el caso

La interventoría informa que las actas de los comités transversales se han compartido una vez finalizada la semana de cada comité, además, se envió correo electrónico el día 28 de noviembre con el consolidado de las mismas a cada unos de los participantes, sin embargo a la fecha no se han recibido observaciones o aprobaciones a las mismas.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se informa por parte del contratista que durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:
Capacitación Medidas de control de olores ofensivos (28/11/2025)
Jornada de orden y aseo.
Limpieza de sumideros y sedimentador lavado de llantas.
Se recibe aceptación propuesta de sistema de aislamiento zonas verdes mediante radicado CIG-IDRD-VEL-922-2025 del 28/11/2025 y se remite el plano actualizado mediante radicado CE-125-2054 del 28/11/2025
Entrega informe N° 22 mediante radicado CE-206-125-2052 del 28/11/2025
Entrega memorias acta N° 19: 456.500 kg (excavación) y 88.960 kg (lixiviados), total: 545.560 kg.
Se subsanaron las medidas del PMA solicitadas en el oficio CIG-IDRD-VEL-916-2025 del 27/11/2025 mediante radicado CE-206-125-2038 del 27/11/2025.
Retiro de RESPEL excavación.

02


Elementos Ingresados del 24 al 30 de Noviembre: 2 Unds para 13,27 Ton TOTAL : 157,08 TON.
Se realizó la toma de muestras para fallos a compresión de los concretos estructurales para los diferentes elementos estructurales fundidos durante el período
Se radicó informe mensual No 22 mediante comunicado CE-206-125-2053 del 02 de diciembre de 2025.
La profesional de apoyo del componente ambiental informa que se dio respuesta al comunicado radicado por la interventoría frente a la solicitud de concepto a la reliquidación del rubro de compensación de la resolución silvicultural, sin embargo, la interventoría informa que a la fecha no ha llegado el comunicado, en el mismo la profesional aclara que si bien lo que tiene que ver con compensación esta en evaluación por de la SDA, sin embargo, estos temas no los puede definir el IDRD, ya que estamos sujetos a la respuesta de la autoridad ambiental, con respecto al árbol No. 70, ya se realizó la visita por parte de la SDA, dónde se acepta la tala del individuo arbóreo debido a su estado de deterioro, por lo que solicita dar traslado al contratista a fin de garantizar las actividades que se deben desarrollar, de acuerdo a procedimientos, primero informar a la comunidad, una vez se programe la actividad se debe contar con el profesional forestal por parte del contratista y de la interventoría.

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Dar alcance al oficio radicado a la entidad con el protocolo de descargue y acopio a la estructura metálica para la cubierta	CIG-UTMP	5/12/2025
Informar a la comunidad sobre la tala del arbol No 70	UTMP	12/12/2025
Respuesta al formato registro de proveedores No 7	IDRD	Sin fecha

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	X	**NO**	
Observaciones				

Siendo las _10:15 a.m._____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**	N.A	N.A
NOMBRE	NUBIA YANETH BARRETO	**NOMBRE**	N.A	N.A
CARGO	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	**CARGO**	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ING. NUBIA YANETH BARRETO

Actividad de control de olores, aplicación de CAL en Túnel Administrativo, Pozos de achique y punto de acopio RESPEL. Se realizaron 11 jornadas de monitoreo en los Cuadrantes 19,20, 23, 24, 27, 28, 30, 38 0% LEL CH4 Inspección Vehículos de Carga RESPEL, cumplan con el Debido Carpado y Kit de Atención de derrames. 28/11/25 Recorrido con Geotecnia inspección de estabilización de taludes. Confinamiento de sacos en Túnel Principal
COMPONENTE SST: La profesional de la interventoría, informa que dentro de los compromisos del comité anterior, esta la remisión de los soportes del accidente laboral, dicha información fue enviada por correo electrónico el día 27 de noviembre de 2025.
La profesional SST del contratista, informa que a corte de este comité el personal promedio es de 137 personas, en el cual se incluye e personal del subcontratista.
En cuanto al tema de accidentes se han presentado 5, de los cuales 2 se encuentran abiertos.
Actividades ejecutadas durante el periodo:
Con respecto al accidente del maestro se informa que para el día 12 de diciembre, tiene cita de control con fisiatría, para revisar si ya se puede cerrar el accidente. El accidente reportado del señor Omar Ríos quien inicia tema de terapias (9), el día de 3 de diciembre, y para el día 9 del mismo mes tiene la lectura de la resonancia.
Inspección y uso de EPP´s y dotación en los frentes de obra. Inspección y armado de andamios, uso de EPCC. Aseo en unidades sanitarias Señalización de cajas eléctricas. Señalización de condiciones inseguras Instalación punto de hidratación Acompañamiento para el descargue de la estructura metálica
La profesional SST de la interventoría, informa que la semana anterior se realizó capacitación al personal referente al riesgo publico por parte de la ARL de la interventoría
El informe No 22 de obra, se encuentra en revisión y se proyecta emitir respuesta con observaciones el día 3 de diciembre de 2025. Con respecto al informe No 17 fue aprobado por la profesional de apoyo del IDRD el día 27 de noviembre. El informe No 22 de interventoría se encuentra en proceso de elaboración.
La profesional de apoyo del componente SST informa, que el informe No 18, se emitirá una vez se cuente con las aprobaciones del informe No 17 del componente calidad, que se ha priorizado por temas de facturación, para llevar de manera paralela los informes de los componentes SST y calidad. Se reitera que la visita por parte de la SDA, la cual se reprograma para el día 10 de diciembre, el día de hoy la profesional del IDRD, enviará por correo electrónico los soportes del personal que asistirá a la visita para su verificación y aprobación. La profesional de apoyo del IDRD, agradece mostrar las evidencias de las correcciones a los hallazgos reportados, los cuales son atendidos de manera inmediata por el contratista de obra, una vez la interventoría realiza los reportes.
COMPONENTE DE CALIDAD: Dentro de los compromisos continúa pendiente la radicación al alcance del acopio de la estructura metálica, para ello la interventoría informa que ya se recibió el día 02 de diciembre el alcance por parte del contratista y el mismo esta en revisión para dar traslado a la entidad contratante.
Se realiza vaciado de concreto estructural Concreto Estructural: 359,38 m3 en Placas (Módulo 7 – Tramo 2, Túnel de Ambulancia – Tramo 2), Muros (Túnel Deportivo 2to al 6to Tramo y Túnel Advo 6to y 7mo Tramo), Columnas M8, Cuellos de Columnas M6, Dados del M2 y Viga Cortante del M8
Durante el periodo se realizaron actividades de armado de: Durante el periodo se realizaron actividades de armado de: Placa – 3cer Tramo Tamb 2do Tramo M7 Muros – Túnel Deportivo y Advo Columnas – Se continúa con Columnas del M8.

03


Elementos Ingresados del 24 al 30 de Noviembre: 2 Unds para 13,27 Ton TOTAL : 157,08 TON.
Se realizó la toma de muestras para fallos a compresión de los concretos estructurales para los diferentes elementos estructurales fundidos durante el período
Se radicó informe mensual No 22 mediante comunicado CE-206-125-2053 del 02 de diciembre de 2025.
La profesional de apoyo del componente ambiental informa que se dio respuesta al comunicado radicado por la interventoría frente a la solicitud de concepto a la reliquidación del rubro de compensación de la resolución silvicultural, sin embargo, la interventoría informa que a la fecha no ha llegado el comunicado, en el mismo la profesional aclara que si bien lo que tiene que ver con compensación esta en evaluación por de la SDA, sin embargo, estos temas no los puede definir el IDRD, ya que estamos sujetos a la respuesta de la autoridad ambiental, con respecto al árbol No. 70, ya se realizó la visita por parte de la SDA, dónde se acepta la tala del individuo arbóreo debido a su estado de deterioro, por lo que solicita dar traslado al contratista a fin de garantizar las actividades que se deben desarrollar, de acuerdo a procedimientos, primero informar a la comunidad, una vez se programe la actividad se debe contar con el profesional forestal por parte del contratista y de la interventoría.

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Dar alcance al oficio radicado a la entidad con el protocolo de descargue y acopio a la estructura metálica para la cubierta	CIG-UTMP	5/12/2025
Informar a la comunidad sobre la tala del arbol No 70	UTMP	12/12/2025
Respuesta al formato registro de proveedores No 7	IDRD	Sin fecha

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	X	**NO**	
Observaciones				

Siendo las _10:15 a.m._____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**	N.A	N.A
NOMBRE	NUBIA YANETH BARRETO	**NOMBRE**	N.A	N.A
CARGO	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	**CARGO**	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ING. NUBIA YANETH BARRETO

Marca temporal	Nombre	Cedula:	Correo electrónico	Cargo:	Entidad::	Número de teléfono
2/12/2025 9:54:37	Nubia Yaneth Barreto Ga	52739658	directora.consorciointervg@gmail.com	Directora Interventoría	CIG	31123139348
2/12/2025 10:05:38	JULIAN RICARDO AGUDE	80767393	JULIANAGUDELOINGENIERO@GMAIL.COM	RESIDENTE AMBIENTAL	CIG	3202336372
2/12/2025 10:17:06	José Luis Cantor G	80188353	calidad.gibraltar2@gmail.com	Profesional de Calidad	CIG	311 8568897
2/12/2025 10:17:15	Arturo Rojas Torres	13873937	interventoria.velodromo@gmail.com	Residente	CIG	3166420036
2/12/2025 9:51:09	Mary Luz Ramírez	52494809	socialvelodromo6@gmail.com	Profesional Social	CIG	3132205175
2/12/2025 9:50:15	Edgar Solórzano Medina	19222971	corint.carvel.2@gmail.com	Coordinador Técnico	CIG	3124326589
2/12/2025 10:04:25	Astrid Viviana Rojas Can	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Profesional de Gestión del Riesgo de Desastres	CIG	3157994502
2/12/2025 9:52:10	LINDY RUBIANO MOYAN	1051954740	interventoria.sgsstvelodromo@gmail.com	RESIDENTE SGSST INTERVENTORÍA	CIG	3202548911
2/12/2025 9:38:45	Francy Murillo	52968323	francy.murillo@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión	IDRD - STC	3043808785
2/12/2025 9:39:18	Ricardo Gonzalez	79856960	john.gonzalez@idrd.gov.co	Profesional Especializado	IDRD - STC	3002181560
2/12/2025 9:43:26	Carmen Lucía Vélez Cárc	65777928	carmen.velez@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión componente social	IDRD - STC	3204054770
2/12/2025 9:46:39	Lina Johanna Falla	52517090	linajfalla@hotmail.com	Apoyo supervisión Ambiental	IDRD - STC	3103143272
2/12/2025 9:47:17	Juan Pablo Villate Diaz	1019010837	juan.villate@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD - STC	3197021334
2/12/2025 10:14:57	Jaime Andrés Cañón Ver	80096733	Jaime.canon@idrd.gov.co	Contratista Ing. Electricista	IDRD - STC	3164116578
2/12/2025 10:17:30	Bibiana Paola Sosa Linar	52996077	bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo supervisión SST	IDRD - STC	3134649125
2/12/2025 9:40:57	Javier sanchez	1014177632	Javier.sanchez@idrd.gov.co	Apoyo técnico a la supervisión	IDRD - STC	3014394635
2/12/2025 9:51:25	Ivonne Aguilar	1013601022	ivonne.aguilar@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD - STC	3114002656
2/12/2025 10:15:16	Carlos Héctor castro	79340835	carlosh.castro@idrd.gov.co	Cintratista	IDRD - STC	3003101408
2/12/2025 10:17:23	Diego Fernando Castro C	1110453570	calidad.velodromo@cyg.com.co	Profesional de Calidad	UTMP	3175751527
2/12/2025 9:40:40	Alfonso Peñaranda Suar	88235391	a.penaranda@cyg.com.co	Director de Proyecto	UTMP	3008620623
2/12/2025 9:47:50	LUZ STELLA RODRIGUEZ	31432956	sst2.velodromo@cyg.com.co	Residente SGSST	UTMP	3214693331
2/12/2025 10:14:13	Diana Ortiz	1014212007	social.velodromo@cyg.com.co	Residente ambiental	UTMP	3153935487
2/12/2025 10:16:40	Paula Blanco	1073383630	ambiental.velodromo@cyg.com	Residente ambiental	UTMP	3024219947
2/12/2025 10:18:14	CESAR FERNANDEZ SOL	80109419	contingencias.velodromo@cyg.com.co	Profesional ambiental de Suelos contaminados	UTMP	3002662060



COMPONENTE SOCIAL

IDRD BOGOTÁ

Actividades ejecutadas por el Componente social

1. **Comité de participación ciudadana No. 20** — Se envía acta, listado de asistencia, presentación, registro fotográfico y la evaluación

2. **Reporte personal – Corte 25.11.25**

HISTÓRICO								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	486	38	46	10	14	0	59	427

REPORTE MENSUAL (Corte 25 de noviembre)								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	160	24	38	4	12	0	48	112

Actividades ejecutadas por el Componente social

3. **Informe mensual No. 22** — 28.11.2025: Se emite informe mensual a la interventoría

01.12.2025: Se realiza mesa de trabajo con la interventoría para revisión y ajustes

4. **Convocatoria comité de participación ciudadana No. 21**


Se envían Volantes de convocatoria y oficios de entidades Distritales para revisión de interventoría


CONVOCATORIA
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NRO. 20
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Actividades ejecutadas por el Componente social

5. **Punto de atención al ciudadano** — Se brindo atención al ciudadano durante la semana.

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**

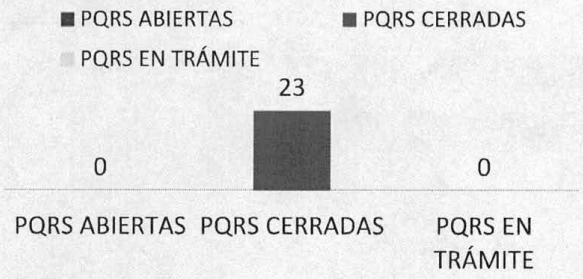

COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades ejecutadas PMA


1. Capacitación Medidas de control de olores ofensivos (28/11/2025)
2. Jornada de orden y aseo.
3. Limpieza de sumideros y sedimentador lavado de llantas.
4. Se recibe aceptación propuesta de sistema de aislamiento zonas verdes mediante radicado CIG-IDRD-VEL-922-2025 del 28/11/2025 y se remite el plano actualizado mediante radicado CE-125-2054 del 28/11/2025
5. Entrega informe N° 22 mediante radicado CE-206-125-2052 del 28/11/2025
6. Entrega memorias acta N° 19: 456 500 kg (excavación) y 88.960 kg (lixiviados), total: **545.560 kg.**
7. Se subsanaron las medidas del PMA solicitadas en el oficio CIG-IDRD-VEL-916-2025 del 27/11/2025 mediante radicado CE-206-125-2038 del 27/11/2025.

8. **Metas RCD: Aprovechamiento: 99,79%**
   Circularidad: 20,66%

Actividades ejecutadas PMA


Registro Fotográfico de las Actividades




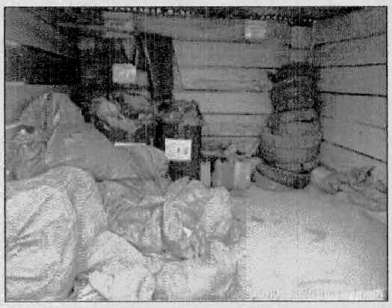





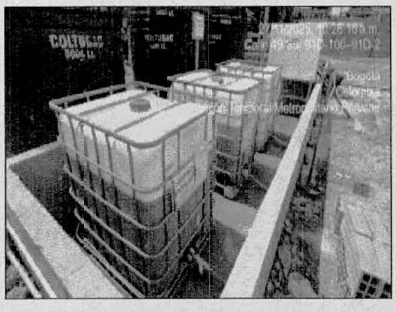

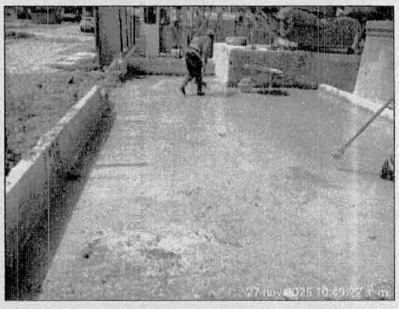

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

RETIRO RESPEL A NIVEL CONTRACTUAL


ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.262.609**	**84%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.176.354**	**85,71%**

Semana 22 al 25 de noviembre: 187.040 kg (excavación)
Semana 26 al 27 de noviembre: 19.740 kg (excavación)
Total semanal: 206.780 kg


COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PGRDEPP)

Reducción del riesgo de escenario ER14 Afloramiento de lixiviados ER07 Aumento de lixiviadcs por escorrentía

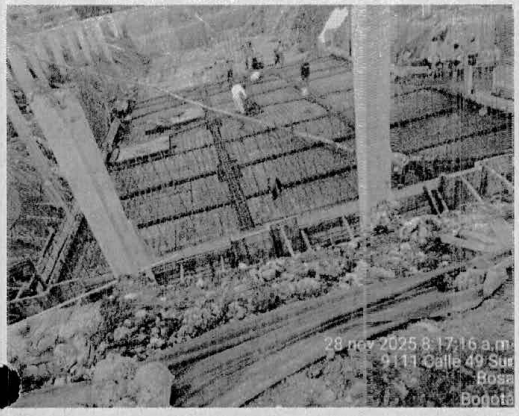



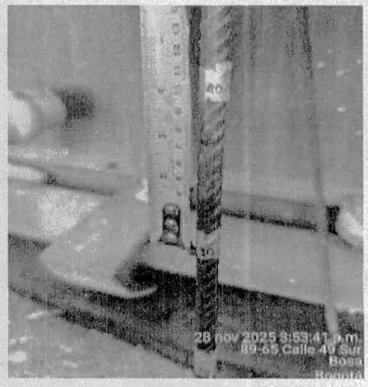

01 Manejo de lixiviados mediante activación de bombas en zcnas de excavación: túnel de apoyc, túnel principal y túnel administrativo.

02 Inspección del llenado, Catch Tank y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención.
No se ha generado servicic de Recolección de lixiviados, a corte 28 de noviembre 24% de la capacidad instalada.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PGRDEPP)

Reducción del riesgo del ER14 Afloramiento de lixiviados - ER07 Aumento de lixiviados por escorrentía Monitoreo del riesgo del ER08 ER12 ER13 Fugas, Explosiones e Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico








01 Actividad de control de olores, aplicación de CAL en Túnel Administrativo, Pozos de achique y punto de acopio RESPEL.

02 Se realizaron 11 jornadas de monitoreo en los Cuadrantes 19,20, 23, 24, 27, 28, 30, 38
0% LEL CH4

03 Inspección Vehículos de Carga RESPEL, cumplan con el Debido Carpado y Kit de Atención de derrames



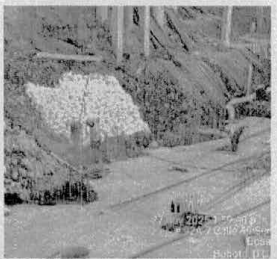

04 28/11/25 Recorrido con Geotecnia inspección de estabilización de taludes.
Confinamiento de sacos en Túnel Principal.

COMPONENTE SST

PERSONAL - MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	PROMEDIO 23 - 30/NOV 2025
PROFESIONALES	25
COMISION TOPOGRAFIA	2
ALMACENISTA	2
MAESTRO	2
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	35
AYUDANTES	37
HERREROS	16
OPERADORES	3
BACHEROS	2
CONDUCTORES	3
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**137**

REPORTE DE MAQUINARIA / EQUIPO Y VEHICULOS	
VEHICULO / MAQUINARIA / EQUIPOS	CANTIDAD
Volquetas Doble troque	7
Volcos	3
Cisterna	1
Minicargador Bobcat	2
Retroexcavadora	1
Bomba de concreto	2
Planta de concreto	1
Torre grua	2

NOTA: El total de trabajadores incluye los trabajadores operativo de UTMP y sus contratistas del proyecto.

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

IDRD | BOGOTÁ


REPORTE DE ACCIDENTALIDAD	
MES	ACCIDENTES REPORTADOS
feb -24 a dic - 24	3
ene-25	0
feb-25	0
mar-25	1
abr-25	0
may-25	0
jun-25	0
jul-25	0
ago-25	0
sep-25	0
oct-25	0
nov-25	1
TOTAL ACCIDENTES	**5**

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
TOTAL AUSENTISTAS	**49**


NOTA: **A la fecha se cuenta con 3 accidentes cerrados y 2 abiertos**


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST

IDRD | BOGOTÁ

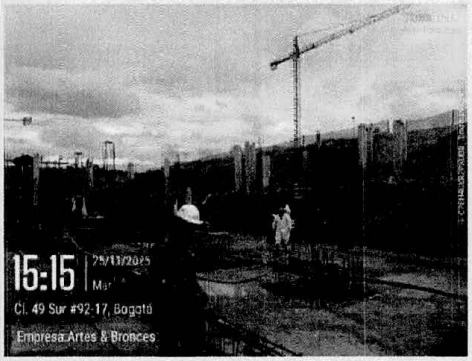


INSPECCION YSO DE EPP Y DOTACION EN FRENTE DE OBRA

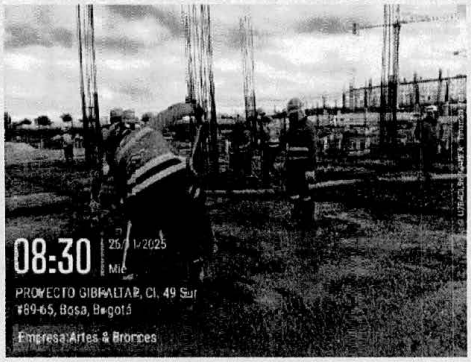


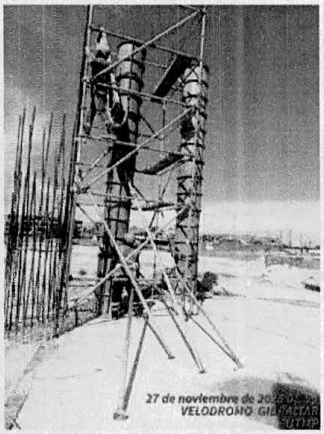

INSPECCION ARMADO DE ANDAMIOS, USO DE EPCC

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST






ASEO UNIDADES SANITARIAS



SEÑALIZACION CAJAS

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST

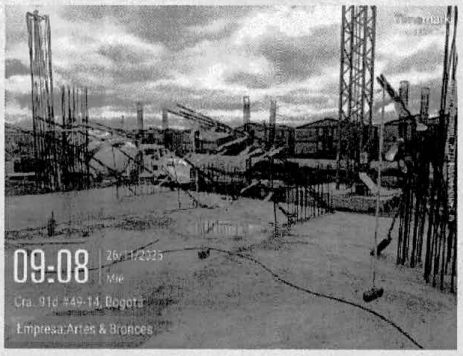

SEÑALIZACION DE CONDICIONES INSEGURAS




INSTALACION PUNTO DE HIDRATACION



ACOMPAÑAMIENTO DESCARGUE ESTRUCTURA METALICA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIONES CORRECTIVAS

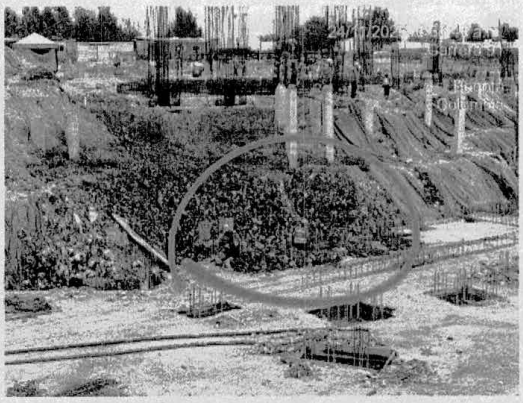

Hallazgo: Personal sin Tiveck




Atención a la observación

REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIONES CORRECTIVAS




Hallazgo: Vacios sin señalización

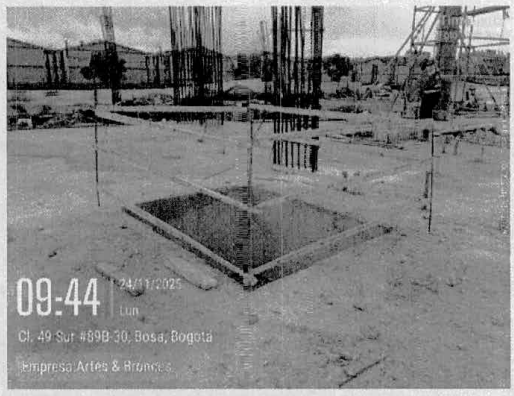


Atención a la observación

REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIONES CORRECTIVAS

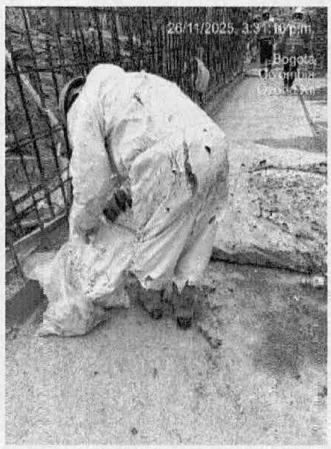


Hallazgo: Tiveck deteriorado

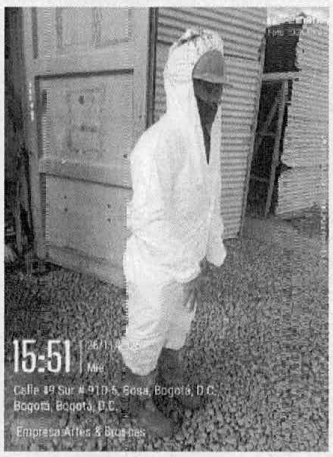

Atención a la observación


COMPONENTE CALIDAD

CONCRETOS ESTRUCTURALES Y SOLADOS DE LIMPIEZA
TOTAL REAL 1697,38 m3

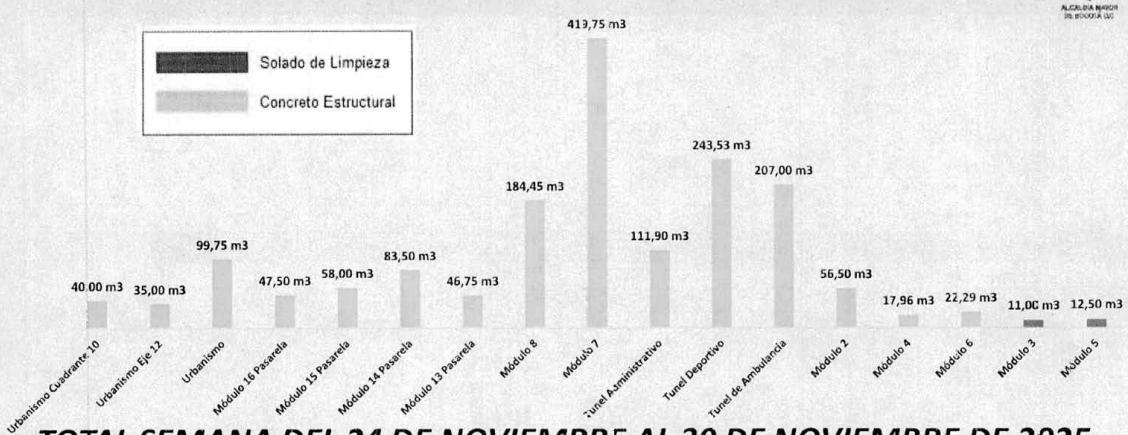

IDRD | BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana
359,38 m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673




TOTAL SEMANA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.


ncreto Estructural: ***359,38*** **m3** en Placas (Módulo 7 – Tramo 2, Túnel de Ambulancia – Tramo 2), Muros (Túnel Deportivo 2to al 6to Tramo y Túnel Advo 6to y 7mo Tramo), Columnas M8, Cuellos de Columnas M6, Dados del M2 y Viga Cortante del M8

CEMEX **347,50 m3** *97%*

ALTARA Ingeniería S.A.S **11,88 m3** *3%*




Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **399,67 Ton**

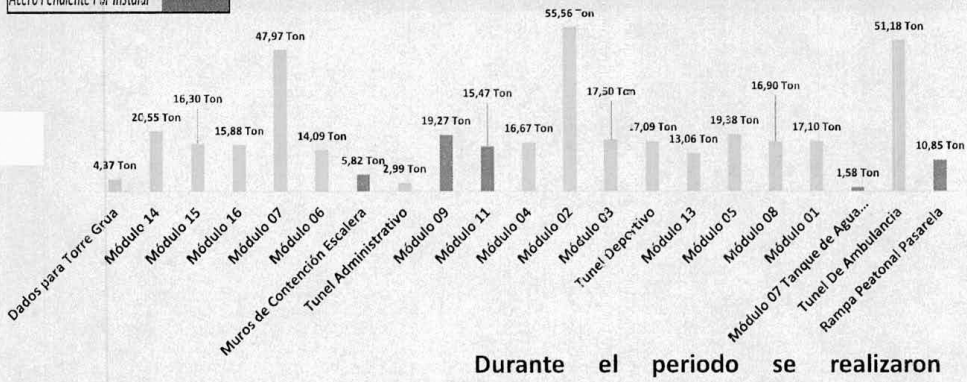

IDRD | BOGOTÁ



Certificados de Calidad

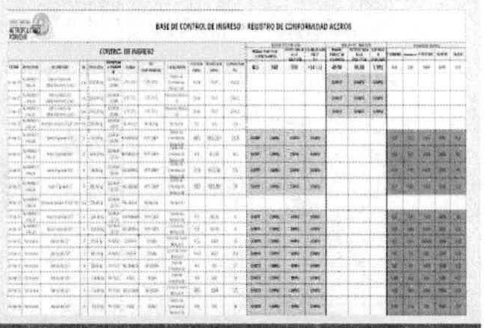

Durante el periodo se realizaron actividades de armado de:

- ✓ **Placa –** 3cer Tramo Tamb 2do Tramo M7
- ✓ **Muros –** Túnel Deportivo y Advo
- ✓ **Columnas** – Se continúa con Columnas del M8.


Del 24 al 30 de Noviembre de 2025

No se ingresó Acero de Refuerzo al Proyecto

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
					Total	17 Unds		Total	157,08 Ton



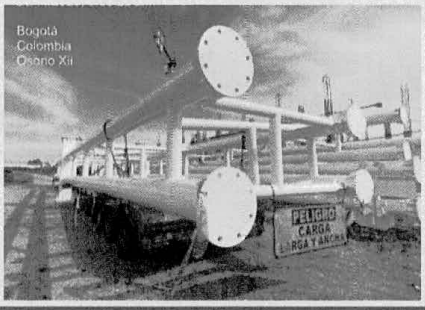

Elementos Ingresados del 24 al 30 de Noviembre:

2 Unds para **13,27 Ton**

TOTAL : 157,08 TON.

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozo - Eyectores Túneles	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2036 del 27 de Noviembre de 2025.	Interventoria
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 25 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2015 del 13 de Noviembre de 2025.	Interventoria
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	Suministro	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	Paisajismo	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0685-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
8	Bioclimática	Informe Componente Bioclimático	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 11 de noviembre de 2025	Aprobado

ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE DE CALIDAD

- ✓ Se realizó la toma de muestras para fallos a compresión de los concretos estructurales para los diferentes elementos estructurales fundidos durante el período.

- ✓ Se radicó informe mensual No 22 mediante comunicado CE-206-125-2053 del 02 de diciembre de 2025.

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDRD | BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ TRANSVERSALES CTO OBRA: 3232/23 - CTO INTERV. 3219/23	DD	MM	AA
ACTA No. 89.1		9	12	2025

LUGAR:	Virtual	**HORA DE INICIO:**	9:30 a.m.	**HORA FIN:**	10:15 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los componentes transversales	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se inicia la sesión del comité. La Interventoría solicita el permiso correspondiente para efectuar la grabación del encuentro, sin que se presenten observaciones u objeciones por parte de los asistentes; en consecuencia, se autoriza y se inicia el registro.

COMPONENTE SOCIAL: Por parte de la profesional social del contratista de obra (UTMP) se informó que se llevó a cabo la Convocatoria de Participación Ciudadana No. 21, dirigida a las entidades distritales y a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Asimismo, se realizaron las publicaciones correspondientes en las carteleras informativas de Margarita Etapa I y II. Se recordó que la sesión del Comité se desarrollará el día viernes a partir de las 9:00 a. m. La presentación asociada a dicha convocatoria fue remitida a la Interventoría el día jueves 4 de diciembre, sobre la cual se emitieron observaciones que posteriormente fueron atendidas y ajustadas por el contratista.

Por parte de la profesional social de la Interventoría (CIG) se indicó que fue aprobado el Informe Mensual No. 22 presentado por el contratista, previa verificación mediante la lista de chequeo correspondiente. Posteriormente, se consolidó el Informe Mensual No. 22 de Interventoría, el cual fue remitido a la Supervisión Social para su revisión, obteniendo el aval respectivo. Actualmente, dicho informe se encuentra impreso y listo para ser enviado al IDRD, compilado con los informes de los demás componentes.

En las Diapositivas 2-3-4 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

- Se radicó la Convocatoria CPC No. 21 ante entidades distritales y miembros del CPC, incluyendo alcaldías locales, JAL, Personería, Federación Colombiana de Ciclismo, Liga de Ciclismo de Bogotá, Secretaría de Seguridad, DADEP, Contraloría, SDA y SDIS.
- Se remitió a la Interventoría la presentación del CPC No. 21 el 4 de diciembre.
- Se gestionaron 23 PQRS durante la semana, todas cerradas, sin casos en trámite.
- Se brindó atención a la ciudadanía en punto de atención.
- Se enviaron presentación y acta del CPC No. 20 a los asistentes.

La interventoría deja constancia que las actas de los comités transversales se han compartido una vez finalizada la semana de cada comité, además, se envió correo electrónico el día 06 de diciembre con el consolidado de las mismas a cada unos de los participantes, sin embargo a la fecha no se han recibido observaciones o aprobaciones a las mismas.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se informa por parte del contratista de obra que durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:

- Capacitación en medidas de protección frente a olores ofensivos (05/12/2025).
- Inducciones ambientales al personal operativo.
- Limpieza de sumideros y pozos de red pluvial.
- Protección de árboles internos y externos.
- Se recibió aprobación del Informe Mensual N° 22 V2 el 05/12/2025 por parte de la interventoria
- Se realizaron subsanaciones tras recorrido ambiental del 03/12/2025.
- Gestión RCD: 99,79% aprovechamiento y 20,66% circularidad.
- Avances en retiro de material excavado: 65.304 ton ejecutadas (85,71%)
- Retiro de RESPEL Semana 28/11/2025 al 05/12/2025 de noviembre: 73,230 kg (excavación) .

En cuanto al manejo de residuos de construcción y demolición, se reportaron metas de aprovechamiento del 99,79% y de circularidad del 20,89%.

El apoyo a la supervision del Componente confirma que se tendra el dia 10/1/2025 recorrido programado por la autoridad ambiental al proyecto Veloddromo, solicita que se tenga muy organizada la obra para que la SDA no tenga comentarios al respecto y sea un recorrido muy efectivo.La interventoria solicita que se complemente para la visita (aunque no este en funcionamiento la planta) se revise y verifique el estado de diques de contencion, cunetas de recoleccion de agua de sedimentador por si la autoridad requiere verificar las medidas de esta planta. Se hacen mejoras constantes en la zona.

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO: En las Diapositivas 09 -13 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

- Manejo de lixiviados mediante activación de bombas en túneles de excavación.
- Monitoreo de nivel freático en pozos eyectores.
- Inspección de catch tank, mangueras y geomembranas.
- Orden y aseo en taludes; capacitación en buenas prácticas a los trabajadores.
- Simulación de escritorio del escenario ER06 y análisis del monitoreo de red adyacente en conjunto con la interventoria y CAR.
- Aplicación de cal en zonas con RESPEL y control de material particulado.
- Monitoreo de gases en zonas excavadas: 9 jornadas realizadas.
- Inspección de volquetas transportadoras de RESPEL, buen carpado, kit de emergencias etc.

El apoyo a la supervision del Componente solicita que para mañana visita de la SDA a primera hora retiro de cualquier apozamiento de lixiviados, manejo de olores y que todo el personal cuente con los EEs segun corresponda, segun el plan de Gestion de riesgo propuesto.

COMPONENTE SST: La profesional de la interventoría, informa que no se tienen compromisos para el presente comité respecto al componente.

En las Diapositivas 14 - 22 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

- Recuento promedio de 140 trabajadores en obra durante la semana.
- Inventario de maquinaria: 7 volquetas doble troque, 3 volcos, 1 cisterna, bobcat, retro, bombas de concreto, planta de concreto y 2 torres grúa.
- Se reportó 1 accidente leve el 5 de diciembre (7 días de incapacidad). Total: 5 accidentes en el año.
- Ausentismo acumulado: 49 casos.
- Acciones de SST: inspección de EPP, orden y aseo, entrega de dotación, armado de andamios, señalización y atención de hallazgos.

La profesional SST del contratista, informa que se tuvo un accidente por esguinse de tobillo y se realizó lo pertinente, se remitira el FURAT y la incapacidad para remitir como corresponde al IDRD, se realizara la investigacion y los planes de accion pertinente. El apoyo a la supervision de el componente por parte de la entidad contratante IDRD estara péndiente al respecto para hacer la verificacion pertinente.
La profesional SST de la Interventoria reporta la aprobacion de personal de Artes y Bronce, un minicargados y personal operarios y administrativos. Segun recorrido se comenta que el acceso al tunel administrativo la señalización se debe ajustar (cierre) y se definiera un solo ingreso. Se comenta que se realiza la aprobacion del informe SST V.2 No 22 de obra se realizó y el avance en aliste del informe No 22 de la Interventoria. se remitira el dia 10/12/2025. Al respecto de las revisiones a la fecha de los informes de interventoria se cuenta hasta el informe No 18 se indaga con la profesional de apoyo del componente cuando se continua con estas revisiones, esta profesional manifiesta que esta semana se emiten observaciones y respecto al cerramiento se solicita atención el dia de hoy del cerramiento del tunel, antes de la visita de la SDA.
El informe No 22 de obra, se encuentra en revisión y se proyecta emitir respuesta con observaciones el día 3 de diciembre de 2025. Con respecto al informe No 17 fue aprobado por la profesional de apoyo del IDRD el día 27 de noviembre. El informe No 22 de interventoría se encuentra en proceso de elaboración.
En las Diapositivas 23 a la 28 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi: • Concretos fundidos semana: 244,65 m³ en placas, muros, columnas y dados. • Toma de muestras conforme NTC 673 y ensayos de asentamiento NTC 396. • Acero ingresado: 26,3 ton para vigas, graderías y columnas; control acumulado: 426 ton. • Ingreso de 13,24 ton de estructura metálica de cubierta, acumulando 170,32 ton. • Todos los rediseños estructurales revisados se encuentran aprobados; algunos elementos siguen en proceso. • Se radicaron subsanaciones al Informe Mensual No. 22. • Se radicó Control de Cambios No. 27 para estructura metálica de cubierta.
COMPONENTE DE CALIDAD: Se remite por parte de la interventoria Alcance al Radicado No 20252100479352 del 28/10/2025 - Asunto Traslado Procedimiento Transporte y Descargue Estructura Metálica Cubierta Velódromo ante la entidad contratante. El apoyo a la supervision de el componente solicita se remita por texto dicho radicado.
En las Diapositivas 23 a la 28 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi: • Concretos fundidos semana: 244,65 m³ en placas, muros, columnas y dados. • Toma de muestras conforme NTC 673 y ensayos de asentamiento NTC 396. • Acero ingresado: 26,3 ton para vigas, graderías y columnas; control acumulado: 426 ton. • Ingreso de 13,24 ton de estructura metálica de cubierta, acumulando 170,32 ton. • Todos los rediseños estructurales revisados se encuentran aprobados; algunos elementos siguen en proceso. • Se radicaron subsanaciones al Informe Mensual No. 22. • Se radicó Control de Cambios No. 27 para estructura metálica de cubierta.

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** **PARA SU REALIZACIÓN**

Informar a la comunidad sobre la tala del arbol No 70	UTMP	12/12/2025
Respuesta al formato registro de proveedores No 7	IDRD	Sin fecha

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _10:15 a.m._____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N.A	N.A
NOMBRE	ING. EDGAR SOLORZANO MEDINA	NOMBRE	N.A	N.A
CARGO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	CARGO	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ING. Arturo Rojas Torres - residente de Interventoria

Marca temporal	Nombre	Cedula:	Correo electrónico	Cargo:	Entidad:	Número de teléfono
9/12/2025 9:31:50	Mary Luz Ramirez	52494809	socialvelodromo6@gmail.com	Profesional Social	CIG	3132205175
9/12/2025 9:32:24	Francy Murillo	52968323	francy.murillo@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión	IDRD	3043808785
9/12/2025 9:33:16	Edgar Solórzano Medina	19222971	corint.carvel.2@gmail.com	Coordinador Técnico de Interventoría	Consorcio Interventores	3124326589
9/12/2025 9:38:20	Diana Marcela Ortiz	1014212007	social.velodromo@cyg.com.co	Residente social	UTMP	3153935487
9/12/2025 9:40:29	Javier Sanchez	1014177632	javier.sanchez@idrd.gov.co	Apoyo Tecnico a la Supervisión	IDRD	
9/12/2025 9:41:57	Ricardo Gonzalez	79856960	john.gonzalez@idrd.gov.co	Profesional EspecialiAdo	IDRD	3002181560
9/12/2025 9:43:02	Carmen Lucía Velez Cárc	65777928	carmen.velez@idrd.gov.co	Apoyo a la Supervisión Componente Social	IDRD	3204054770
9/12/2025 9:44:48	Bibiana Paola Sosa Linar	52996077	bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión SST y Calidad	IDRD	3134649125
9/12/2025 9:47:46	Paula Blanco	1073383630	paublancoa@gmail.com	Residente ambiental	UTMO	3024219947
9/12/2025 9:51:29	Ingrid Johanna Barriento	1090495553	riesgos.velodromo@cyg.com.co	Profesional en gestión del riesgo de desastres	Unión Temporal Metropo	3125587967
9/12/2025 9:51:32	JULIÁN RUCARDO AGUD	80676393	julianagudeloingeniero@gmail.com	Residente ambiental	GIC	3202336372
9/12/2025 9:53:03	Astrid Rojas	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Prof gestión del riesgo de desastres	Consorcio Interventores	3157994502
9/12/2025 9:55:29	LUZ STELLA RODRIGUEZ	31432956	sst2.velodromo@cyg.com.co	Residente SG-SST	UTMP	3214693331
9/12/2025 10:04:20	LINDY RUBIANO MOYAN	1051954740	interventoria.sgsstvelodromo@gmail.com	RESIDENTE SGSST INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENT	3202548911
9/12/2025 10:04:21	Ivonne Aguilar	1013601022	ivonne.aguilar@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD- STC	31140026569
9/12/2025 10:05:07	Alfonso Peñaranda Suár	88235391	a.penaranda@cyg.com.co	Director	UTMP	3008620623
9/12/2025 10:05:15	Diego F Castro	1110453570	calidad.velodromo@cyg.com.co	Profesional de Calidad	UTMP	3175751527
9/12/2025 10:06:29	Arturo Rojas Torres	13873937	interventoria.velodromo@gmail.com	Residente Interventoria	CIG	3166420036



COMPONENTE SOCIAL

IDRD BOGOTÁ


Actividades ejecutadas por el Componente social

1. **Convocatoria CPC No. 21** — Se radica a entidades distritales la convocatoria y a los del CPC

- Alcaldía Local de Bosa.
- Junta Administradora Local de Bosa.
- Alcaldía Local de Kennedy.
- Junta Administradora Local de Kennedy.
- Personería Local de Kennedy.
- Federación Colombiana de Ciclismo.
- Presidente Liga de Ciclismo de Bogotá.
- Secretaría de seguridad, convivencia y justicia.
- Departamento administrativo del espacio público.
- Contraloría de Bogotá
- Secretaría Distrital de Ambiente
- Secretaría de Integración Social








2. **Presentación CPC No. 21** — Se envía a la interventoría el día jueves 04 de diciembre

Actividades ejecutadas por el Componente social

3. **Punto de atención al ciudadano** — Se brindo atención al ciudadano durante la semana.

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**



4. **Compromiso CPC NO. 20** — Se envía la presentación y el acta a los asistentes del ultimo encuentro.

COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades ejecutadas PMA

1. Capacitación Medidas de protección de olores ofensivos (05/12/2025)
2. Inducciones al personal operativo
3. Limpieza de sumideros y pozos de la red pluvial
4. Protección de árboles externos e internos
5. Se recibe aprobación informe mensual N° 22 V2 mediante radicado CIG-IDRD-VEL-950-2025 el 5/12/2025.
6. Subsanación entre el 04 y 05 de diciembre de 2025 de observaciones recorrido componente ambiental realizado el 03/12/2025.
7. **Metas RCD: Aprovechamiento: 99,79%**
   Circularidad: 20,66%

Actividades ejecutadas PMA

Registro Fotográfico de las Actividades













PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

RETIRO RESPEL A NIVEL CONTRACTUAL


ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.390.739**	**84%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.304.484**	**85,71%**

28 de noviembre a 5 de diciembre: **73.230 kg** (excavación)

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PGRDEPP)

Reducción del riesgo de escenario ER14 Afloramiento de lixiviados ER07 Aumento de lixiviados por escorrentía

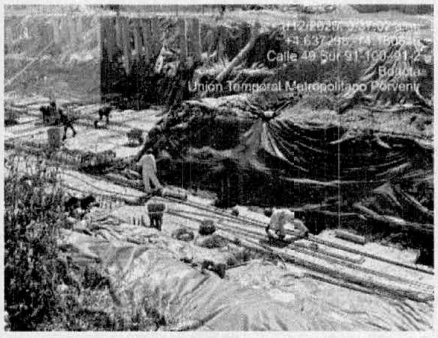

01 Manejo de lixiviados mediante activación de bombas en zonas de excavación: túnel de apoyo, túnel principal y túnel administrativo.



02 Inspección del llenado del catch tank y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención.

Durante la semana no se realizó activación de servicio de carro cisterna.



03 Medición de nivel freático en pozos eyectores instalados en obra.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PGRDEPP)

Reducción del Riesgo ER06 Contaminación de Acuíferos ER09 – ER10 – ER15 Accidentes de trabajo









01 Jornadas de orden y aseo en taludes y charlas a trabajadores reforzando buenas prácticas en gestión del riesgo.

02 Protección de materiales granulares para evitar dispersión de material particulado/ Mejoramiento cerramientos

03 Desarrollo de segunda parte de la simulación de escritorio en torno al Escenario ER06 – Análisis de resultados de la 2da Campaña Monitoreo de la Red Adyacente

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PGRDEPP)

Reducción del riesgo del ER14 Afloramiento de lixiviados - ER07 Aumento de lixiviados por escorrentía – ER09/ ER10 Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado








01 Medición de nivel freático en pozos eyectores instalados en obra.


02 Inspección visual de taludes con acompañamiento de geotecnia y verificación del desarrollo de actividades recomendadas para contención de taludes.

03 Inspección de volquetas con transporte de RESPEL (kit de emergencias) y buen carpado.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PGRDEPP)

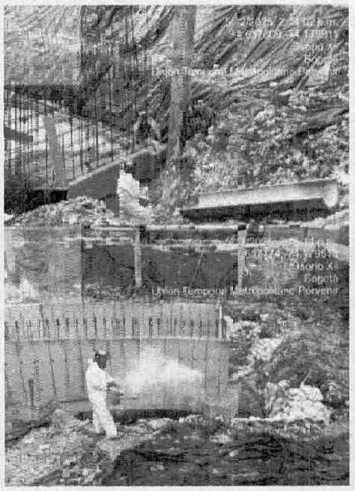

01 Aplicacion de cal como medida preventiva en zona expuestas con RESPEL (túnal principal y de apoyo a la competición) y zonas con evidencia de agua acumulada.

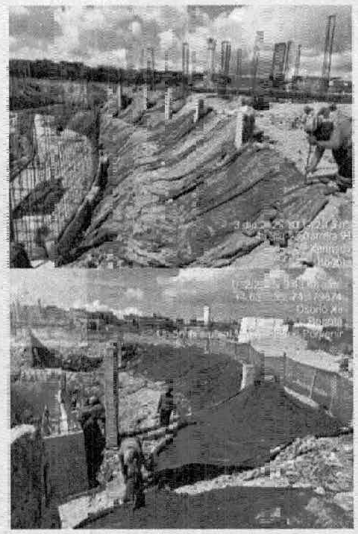

02 Mejoramiento y reposición de plásticos para protección de taludes en túneles.

Monitoreo del riesgo del ER08-ER12-ER13
Reducción del Riesgo ER09-ER10-ER16



03 Monitoreo de gases en zonas excavadas (tuneles y zona central), con un total de 9 jornadas de monitoreo en los cuadrantes 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 y 36.

0% LEL CH_4

COMPONENTE SST

PERSONAL - MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	PROMEDIO 1 - 7/DIC 2025
PROFESIONALES	26
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	3
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	38
AYUDANTES	35
HERREROS	16
OPERADORES	7
BACHEROS	2
CONDUCTORES	2
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	140

REPORTE DE MAQUINARIA / EQUIPO Y VEHICULOS	
VEHICULO / MAQUINARIA / EQUIPOS	CANTIDAD
Volquetas Doble troque	7
Volcos	3
Cisterna	1
Minicargador Bobcat	2
Retroexcavadora	1
Bomba de concreto	2
Planta de concreto	1
Torre grua	2

NOTA: El total de trabajadores incluye los trabajadores operativo de UTMP y sub contratistas del proyecto.


REPORTE DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD	
MES	ACCIDENTES REPORTADOS
feb -24 a dic - 24	3
ene-25	0
feb-25	0
mar-25	1
abr-25	0
may-25	0
jun-25	0
jul-25	0
ago-25	0
sep-25	0
oct-25	0
nov-25	1
TOTAL ACCIDENTES	5

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
TOTAL AUSENTISTAS	49

NOTA: El 5 de diciembre se presenta 1 accidente laboral leve, el cual genera 7 días de incapacidad
A la fecha se cuenta con 3 accidentes cerrados y 3 abiertos

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST

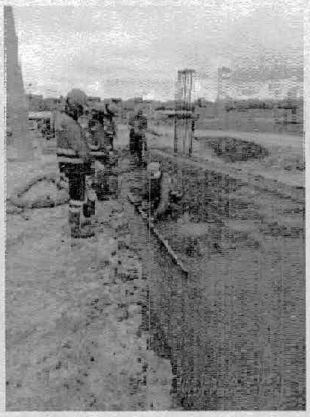
INSPECCION YSO DE EPP Y DOTACION EN FRENTE DE OBRA



ORDEN Y ASEO EN FRENTE DE OBRA


REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST



ASEO UNIDADES SANITARIAS




ENTREGA DE EPP

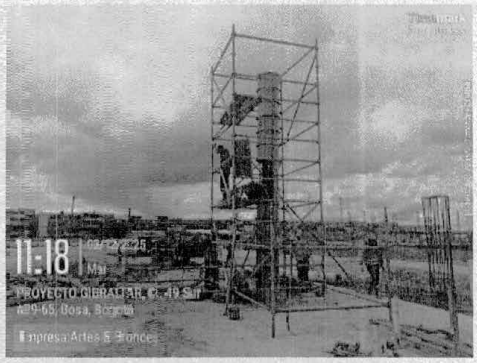


INSPECCION ARMADO DE ANDAMIOS Y USO DE EPCC

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SST

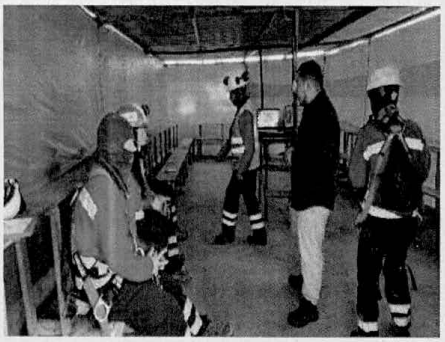

CAPACITACION AL PERSONAL

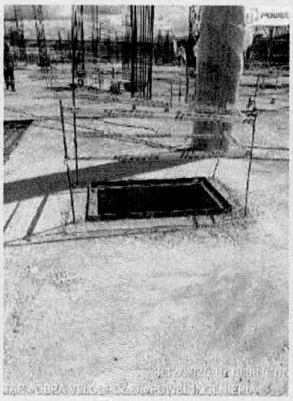




SEÑALIZACION DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIONES CORRECTIVAS



Hallazgo: Atomizador sin rotulo

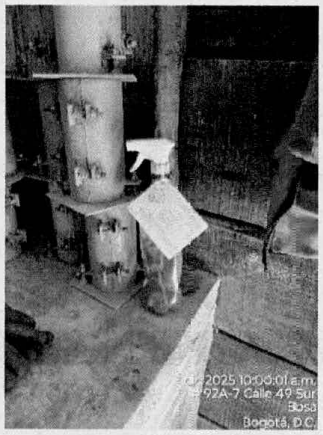

Atención a la observación

REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIONES CORRECTIVAS




Hallazgo: Falta señalización de sendero peatonal



Atención a la observación

REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIONES CORRECTIVAS

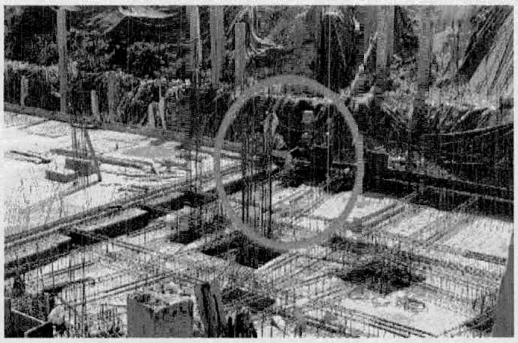

Hallazgo: Personal si Tiveck



Atención a la observación




Atención a la observación
Hallazgo punto de hidratación con botellón vacío

COMPONENTE CALIDAD

IDRD BOGOTÁ

CONCRETOS ESTRUCTURALES Y SOLADOS DE LIMPIEZA
TOTAL REAL 1624,93 m3

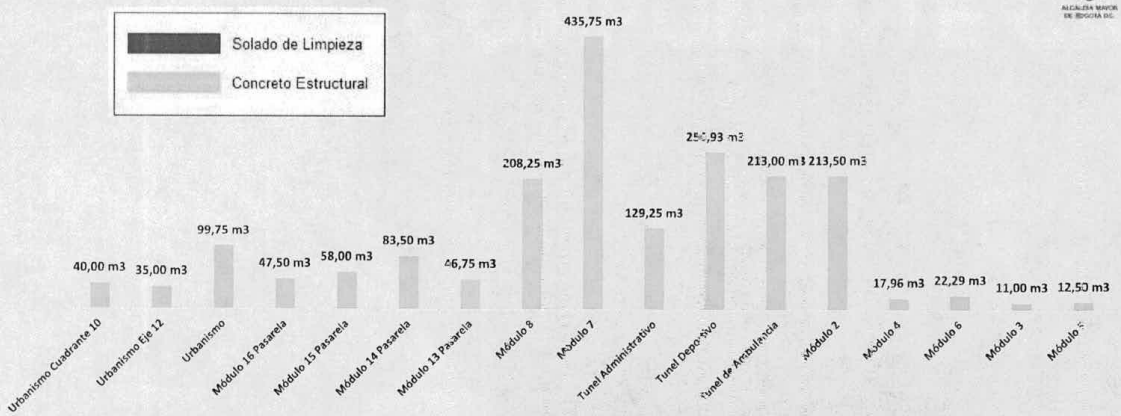

Total Concreto Fundidos Última Semana
244,65m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673




TOTAL SEMANA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025.

Concreto Estructural: ***244,65*** **m3** en Placas (Módulo 2 – Tramo 1 y 2- Módulo 8 – Tramo 2) Muros (Tunel Administrativo y Túnel Deportivo), Columnas Pasarela Módulo 13, Viga Zarpa entre Módulo 7 y Pista y Dados de los Módulo 3 y 5

CEMEX **241,00 m3** *99%*

ALTARA **3,65 m3** *1%*

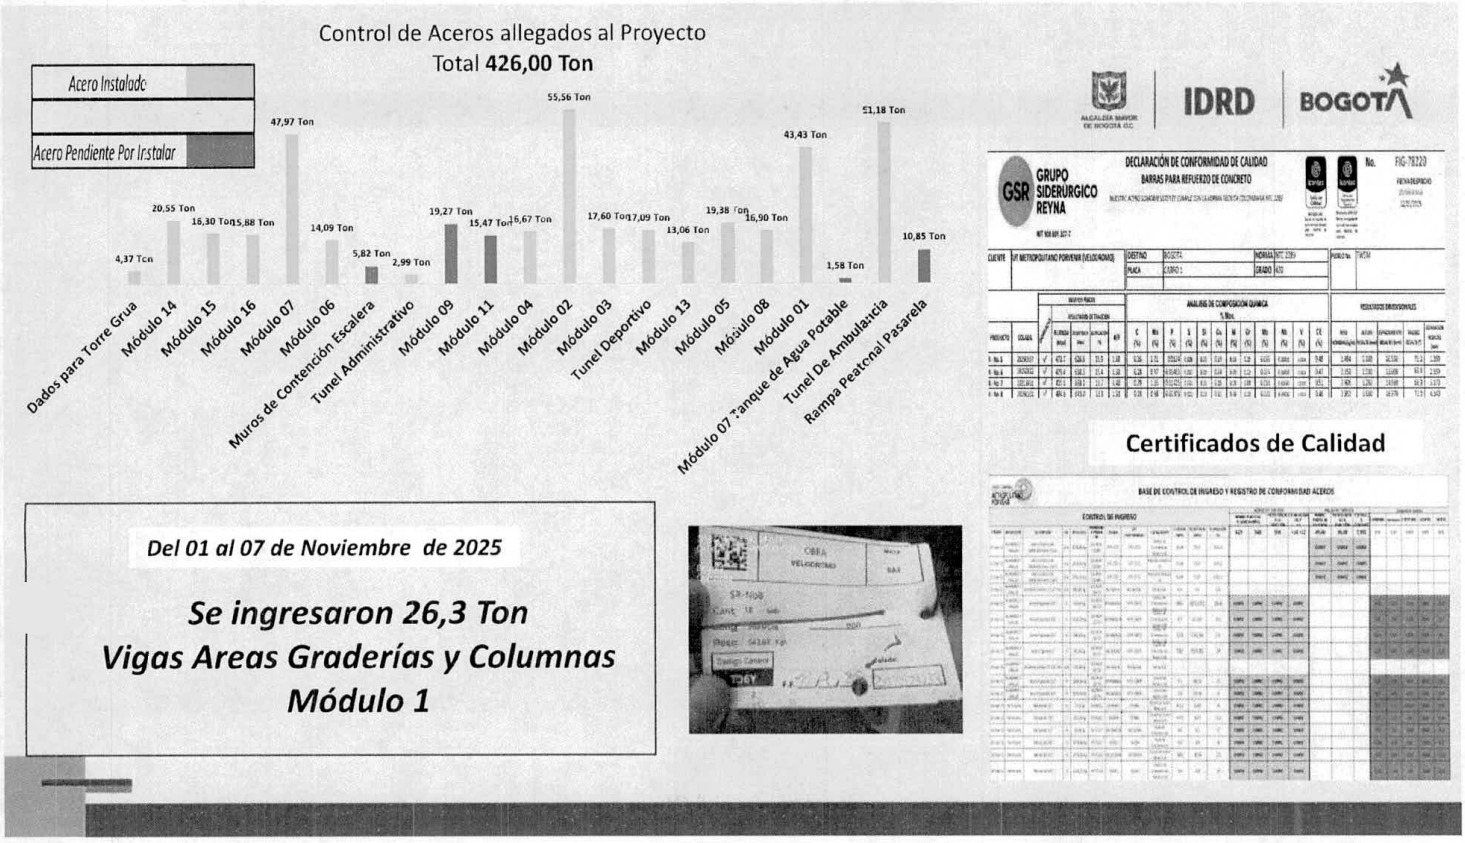

Certificados de Calidad


Del 01 al 07 de Noviembre de 2025


Se ingresaron 26,3 Ton
Vigas Areas Graderías y Columnas
Módulo 1

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	**8**	**7-dic-25**	**CERCHA PRINCIPAL**	**CHP3**	**9586T45A-1**	**1 Unds**	**6619,18 Kg**	**6619,18 Kg**	**6,62 Ton**
14		**7-dic-25**	**CERCHA PRINCIPAL**	**CHP3**	**9586T45A-1**	**1 Unds**	**6619,18 Kg**	**6619,18 Kg**	**6,62 Ton**
					Total	19 Unds		**Total**	170,32 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



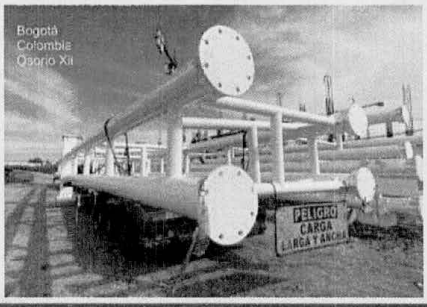

Elementos Ingresados del 01 al 07 de Diciembre:

2 Unds para **13,24 Ton**

TOTAL : 170,32 TON.

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2036 del 27 de Noviembre de 2025.	Interventoría
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2015 del 13 de Noviembre de 2025.	Interventoría
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoría
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado

ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE DE CALIDAD

- ✓ Se realizó la toma de muestras para fallos a compresión de los concretos estructurales para los diferentes elemento estructurales fundidos durante el período.
- ✓ Se radicó subsanaciones al informe mensual No 22 mediante comunicado CE-206-125-2074 del 05 de Diciembre de 2025 en respuesta al comunicado CIG-IDRD-VEL-0928-2025
- ✓ Se radicó el Control de Cambios No 27 referente a la Estructura Metálica de Cubierta

GRACIAS



IDRD

BOGOTÁ

		DD	MM	AA
ACTA No. 90	Comité TECNICO/TRANSVERSALES - VELÓDROMO - CTO OBRA: 3232/23 - CTO INTERV. 3219/23	18	12	2025

LUGAR:	Obra Velódromo Gibraltar	HORA DE INICIO:	8:00am	HORA FIN:	10:40am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia presencial		

ORDEN DEL DIA

1. Comité Periodo 01/12/2025 al 07/12/2025	4.
2. Presentación de los componentes Técnicos	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS COMITÉ TRANSVERSALES No. 90,1

Se inicia la sesión del comité. La Interventoría solicita el permiso correspondiente para efectuar la grabación del encuentro, sin que se presenten observaciones u objeciones por parte de los asistentes; en consecuencia, se autoriza y se inicia el registro. Por solicitud de la Entidad Contratante, se repite comite de transversales celebrado el día 16 de diciembre del año en curso.

COMPONENTE SOCIAL: En las Diapositivas 2 al 5 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado se informa que se desarrolló el Comité de Participación Ciudadana No. 21 el 12 de diciembre de 2025, con la asistencia de 25 personas, incluyendo comunidad, IDRD, UTMP, Interventoría y la Secretaría Distrital de Planeación.

Las principales inquietudes comunitarias estuvieron relacionadas con los siguentes temas, estos fueron aclarados demanera respectiva por parte de los profesionales del proyecto presentes en la reunion:

- Presunto traslado de lixiviados al predio del proyecto. Se hacen aclaraciones respectivas por parte de la UTMP.
- Beneficios directos del proyecto para las comunidades aledañas. Se explican los multiles beneficios al respecto.
- Posibles intervenciones en barrios vecinos. Se aclara que se intervienen zonas a cargo de Velodromo.
- Reconocimiento del impacto positivo de los proyectos en ejecución.
- En materia de atención al ciudadano, se reporta gestión completa de PQRS, con 23 solicitudes cerradas y sin registros abiertos o en trámite, evidenciando adecuada respuesta institucional y cumplimiento del deber de atención.

La interventoría CIG deja constancia que se recibe, revisa y subsana por parte del contratista de obra UTMP el acta respectiva de la reunión y fue emitida al profesional del componente por parte de la entidad contratante IDRD la cual dia aprobación y se remite a los participantes de manera pertinente.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se informa por parte del contratista de obra que durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:

- Se ejecutaron actividades preventivas, operativas y de control ambiental, entre las que se destacan:
- Capacitaciones en uso eficiente de agua y energía.
- Inducciones ambientales al personal operativo.
- Jornadas de orden, aseo y protección de materiales.
- Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.

Se recibió visita técnica de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sin hallazgos operativos ni documentales, quedando únicamente como requerimiento el cargue del reporte RCD 2025 ante la SDA, por parte del IDRD

En gestión de residuos:
Aprovechamiento de RCD: 99,79 %.
Circularidad: 20,66 %.
Avance contractual global de gestión de residuos: 85,90 %. (Retiro de 17,380 Kg)

Lo anterior evidencia cumplimiento sustancial de las obligaciones ambientales contractuales y normativas.

La UTMP consulta sobre las gestiones adelantadas por el IDRD respecto a la programación de la mesa técnica con la Subdirección de Parques, cuyo objeto es definir el esquema de manejo de las aguas con contenido de lixiviados del proyecto durante la etapa de operación.Frente a lo anterior, el apoyo del IDRD manifiesta que el tema de los pozos eyectores se encuentra directamente asociado al manejo operativo del sistema de conduccion, el cual podria el cual se conectará a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR u otro método técnico en CAR, para el manejo de las aguas recolectadas en Velodromo.

Por su parte, la Interventoría informa que, a la fecha, no ha recibido notificación formal por parte del IDRD sobre la definición del sistema de manejo de aguas subterráneas. Adicionalmente, aclara que los pozos eyectores en construccion funcionarian para la recoleccion y posteriormente se hara la conduccio, la UTMP manifiesta que se defina agilmente esta conducciones para dejar la tuberia previamente instalada en el avance que se tiene en los diferentes espacios programados a ser fundidos a la fecha, el día 15 de diciembre de 2025 radicó solicitud formal para la definición del esquema de manejo.

Se indica, por parte de la interventoría, que aún se encuentra pendiente la definición del sistema o de los dos (2) sistemas propuestos para el manejo de lixiviados, dado que existen propuestas técnicas distintas, las cuales continúan en proceso de evaluación, especialmente en lo relacionado con costos y viabilidad técnica, situación que ha generado demoras en la toma de decisión. En este sentido, se deja constancia de que la mesa de trabajo se encuentra pendiente de realización, la cual se ejecutará inicialmente de manera interna, con el fin de socializar y analizar las propuestas técnicas presentadas.

Finalmente, la UTMP informa que el día 15 de diciembre de 2025 radicó solicitud formal para la definición del esquema de manejo, en atención a la necesidad de tener claridad sobre el trazado de conducción desde el proyecto Velódromo hacia el proyecto CAR, si es la mejor determinación, así como la ubicación del punto de conexión definitivo de las instalaciones, con el fin de evitar afectaciones al normal desarrollo del proyecto.

Por ultimo se indaga por la Planta de produccion de concreto en la cual se hacen pruebas técnicas para punto y reinicio, a la fecha no esta en funcionamiento total.

Se manifiesta por parte de la Interventoría CIG al respecto de los temas pendientes de:
- Soporte de radicación ante la SDA, de la Planimetria asociada al requerimiento realizado por el área de Toxicología. La supervision manifiesta que sigue en compilacion, teniendo en cuenta que es

un UNICO concepto en conjunto con CAR (perndiente una revision)
- Soporte de la Radicación de los resultados del segundo monitoreo, ante la SDA. La supervision manifiesta que sera remitidos el dia de mañana 19/12/2025.
- Remisión por parte del IDRD a la Interventoría del Formato "Registro de Proveedores" V7, avalado. La supervision manifiesta que estan aprobados y seran remitidos por correo.

Por parte de la UTMP se comenta que se esta revisando también el tema de la geomembrana para las zonas verdes que va relacionado con el tema de la toxicología. Sin embargo, manifiesta la UTPM que internamente hemos visto que se va a presentar un gran tema en conflicto con el manejo de agua de escorrentía debido a esta impermeabilización; manifiesta aprovechar esta mesa para llevar la forma a ver si de pronto, pues yo sé que sería retroceder el tiempo, si se puede mantener solamente el tema del manejo con el recebo como lo teníamos propuesto y evitar esta impermeabilización,

teniendo en cuenta que el nivel freático acá no ha presentado señales de que va a subir y que va a generar una afectación a los usuarios y que dicho sistema va a presentar un sobre costo significativo, no solo en la instalación de la geomembrana, sino en el manejo que va de la geomembrana para la parte de arriba. Usted lo escribe, como lo manifiesta la Interventoria se aclara que la geomembrana tiene un componente adicional que consiste en el componente de sello para todo lo que es la parte de los residuos de gas y todo lo demás productos de los lixiviados sobre los que estamos cimentando la obra.

La supervisión del IDRD manifiesta que dicho sello que hay en este momento en recebo podría servir como sello para garantizar que eso no va a suceder. Sí, me gustaría, manifiesta la supervisión, ya mirarlo desde el punto de vista que dice el toxicólogo de la SDA si es viable la propuesta porque en realidad la geomembrana propuesta tiene las características que exige el fabricante para garantizar el funcionamiento de la misma es exacta. La UTMP manifiesta que lo que le preocupa al contratista son dos cosas. Digamos que la geomembrana si bien obviamente impermeabiliza el tema de lo que es abajo y no va a dejar que suba, tampoco va a dejar que baje. Entonces en temporadas de lluvia podemos tener saturaciones o incluso inundaciones en zonas verdes porque el agua no va a poder percolar entonces ese es uno de los problemas a futuro. Y el otro problema que me parece complejo es que igual así pongamos el perímetro que tenemos por curaduría intervenido que va a pasar con el resto del predio, pues solo se garantizaría esto en el área intervenida y el resto quedaría sin la protección propuesta con la geomembrana (masa).

La supervisión del IDRD manifiesta que, una vez entendida la situación, se entiende la preocupación con el sentido de las escorrentías que se generaran y cuanto se aumenta el caudal, considerando que las zonas verdes ya no tendrían un coeficiente de permeabilidad. Se consideraría casi como una zona dura para el análisis de los caudales entre la geomembrana y la zona verde se debe hacer un análisis del drenaje superficial, lo veo más complicado por la percolación o por la saturación de esa masa. Esa sí la veo más y habría que pensar en cómo se subtrenarían esas áreas intermedias.

El análisis de caudal como un área dura, pero para su drenaje serían una masa de suelo permeable pues tiene limitante con la membrana superior, pues no tendría una percolación y debería haber una propuesta para evacuar dichas aguas de escorrentía infiltradas hasta la geomembrana propuesta para no tener a futuro tener una sobresaturación o una inundación de las zonas verdes. Se necesita hacer un análisis de la propuesta desde el alcance de todos los componentes implicados, no se podría todavía radicar la propuesta a la SDA hasta que se tengan todos los posibles factores y consecuencias estudiados, actualmente se tiene definido un concepto técnico o unos determinantes ambientales específicos para el velódromo y otros específicos para el parque total, se debe presentar una propuesta totalmente fundamentada.

La UTMP manifiesta que se tiene contemplado para los tres túneles equipos de bombeo para poder controlar el nivel freaticoque tenemos en la zona. Sería hacer una revisión, qué tanto podía abatirse en una área más grande, pues a la fecha los afloramientos existentes durante las excavaciones ha sido mínimo y e momentos de lluvia ha sido controlado en obra, se pensaría que una de las medidas podría ser revisar con respecto a los tres pozos o cuatro pozos eyectores que tenemos, uno en cada túnel, en la influencia que puede tener o bajar el nivel freático en caso tal de necesidad.

Cuando yo indico que no es fiable, que esas sean mis justificaciones, porque si bien es cierto, o sea, eso que tú dices es una realidad. Lo que encontramos acá es totalmente diferente. Encontramos más RCDs, encontramos más todo, pero pues frente ya a un documento técnico de soporte, frente a las investigaciones que tenemos, el seguimiento que tenemos, pues digamos, no es fiable simplemente indicar de acuerdo a lo que veo.

La supervisión manifiesta que revisen muy bien todo lo que implica o cuáles son los riesgos que tenemos y que nos determinó la Secretaría especialmente en los diferentes conceptos técnicos. Si tenemos una verificación técnica y soportada, podemos manejarla, pero por favor.

La interventoría CIG que preocupa que este relleno entrópico trabaja como si fuera un tanque de GLP. El cual es un tanque con agua, me inyecto un gas y cuando el agua calienta, me genera evaporación y estamos hablando que esta evaporación genera gas metano y los invito a que busquemos una solución superficial a defecto de drenaje de las capas de terreno que tengamos por encima de la geomembrana propuesta.

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO: En las Diapositivas 10 -14 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Se implementaron medidas activas de prevención, mitigación y monitoreo frente a riesgos identificados, especialmente asociados a:

•Afloramiento y aumento de lixiviados.
•Escorrentías superficiales.
•Riesgos a la salud ocupacional, olores ofensivos, material particulado y estabilidad de taludes.

Entre las acciones relevantes se incluyeron:
• Manejo de lixiviados mediante bombeo y control hidráulico.
• Inspección permanente de catch tank, geomembranas y sistemas de contención.
• Monitoreo de nivel freático en pozos eyectores.
• Monitoreo de gases en túneles, sin detección de niveles explosivos (0 % LEL – CH_4).
• Jornadas de orden, aseo y socialización del PGRDEPP ante la comunidad.

Estas acciones permiten evidenciar una gestión preventiva y correctiva adecuada del riesgo, en la semana no se tuvo uso de carro sisterna, sin embargo se continua con la utilizacion del cath tank.

. Se solicita a la mesa la radicación del informe Semestral (Enero-Junio 2025) del PGRD y en revision por parte de CIG y posteriormente radicar al IDRD para cerrar año cerrando con radicado ante la SDA.El informe es muy ejecutivo teniendo en cuenta que se anexan todos los informes aprobados.

COMPONENTE FORESTAL: En las Diapositivas 15-21 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Se realizó seguimiento al arbolado de protección permanente, verificando su estado físico y sanitario, así como el correcto aislamiento mediante malla de protección. Se identificó una afectación crítica en el árbol No. 70, con muerte en pie por quema externa.

Frente a este evento se adelantaron:
• Verificación técnica y registro fotográfico.
• Elaboración y radicación de informe de novedades.
• Solicitud formal de tala por emergencia ante la SDA.
• Programación de tala, aclarando que la afectación es ajena a las actividades del proyecto.(árbol No. 70), pendiende la recepcion de acta de emergencia, esto para la socializacion a la comunidad respectivamente y hacer el tratamiento.

Se mantiene seguimiento a la reliquidación del método de compensación conforme a la Resolución 1639 de 2023. La supervision manifiesta que ya se tiene el Acta de emergencia y sera actualizada con la actual supervisora y sera remitida a Obra e Interventoria, se solicita que durante la diligencia de tala esten presentes los profesionales de compnente foreatal e informe respectivo y los profesionales de fauna para el euyentamiento respectivo que aplique .

COMPONENTE FAUNA: En las Diapositivas 22-23 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período se realizaron recorridos de seguimiento mensual, sin requerirse liberación de áreas adicionales. Se registraron 6 especies de fauna silvestre, entre residentes y migratorias, sin afectaciones asociadas al desarrollo del proyecto.

Se tiene pendiente enviar cartelera informativa con el tema de manejo de abejas, para tener claridad ante eventuales incidentes que se presente en el proyecto Velodromo.

La supervision manifiesta que se debe tener en cuenta si se realizan algun tipo de descapone (zonas sin intervencion) ingreso de Biologa y registro respectivo de auyentamiento..

112

COMPONENTE SST: La profesional de la interventoría, informa que el compromiso que era remitir al IDRD el FURAT y reporte del accidente materializado por subcontratista remitido el 09/12/2025.

En las Diapositivas 24 - 32 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:
El proyecto contó con un promedio de 135 trabajadores, incluyendo personal UTMP y subcontratistas, y una flota activa de maquinaria y equipos acorde con las actividades en ejecución.
En materia de accidentalidad:
• Total histórico: 5 accidentes, de los cuales 3 cerrados y 2 activos.
• Ausentismo acumulado: 49 casos.

Se ejecutaron inspecciones permanentes de EPP, señalización, andamios, puntos de hidratación y frentes de obra, así como la implementación oportuna de acciones correctivas frente a hallazgos, evidenciando control operativo del SG-SST. Se describe el avance en el incidente del subcontratista.

El informe No 22 de Velodromo, se realizo radicacion respectiva de informes mensuales de obra e Interventoria respectivamente ante la entidad contratante IDRD. Se reciben observaciones al informe de interventoria No 18 se procedera con lista de chequeo el dia de hoy para subsanaciones respectivas..
Se indaga por el apoyo del componente que cuando se allegaria a supervision la total de documentacion del reporte del accidente en comento, UTMP manifiesta que una vez se tenga reintegro del trabajador se remitiran en su totalidad.

COMPONENTE DE CALIDAD: En las Diapositivas 33 a la 38 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante la semana se fundieron 108,14 m³ de concreto estructural, con ensayos de asentamiento y toma de muestras conforme a las NTC 396 y NTC 673, garantizando la trazabilidad y control de calidad de los elementos estructurales.
Asi mismo se reporta durante el comite:
•Volumen total acumulado de concretos estructurales: 1.647,03 m³.
•Control de acero: 434,77 toneladas ingresadas al proyecto.
•Avance en estructura metálica de cubierta: 170,32 toneladas ingresadas.

Desde el punto de vista documental y contractual:
•Se radicaron Informe Mensual No. 22, obra e Interventoria ante la entidad contratante IDRD..
•Se presentó el Control de Cambios No. 27 para la estructura metálica.

La mayoría de los rediseños y componentes técnicos cuentan con aprobación formal por parte del IDRD; permanecen algunos ítems puntuales en estado pendiente (pozos eyectores, pasarela de mantenimiento, fachada, paisajismo y componente bioclimático).

Port parte del apoyo de Supervision de Calidad se manifiesta que se tienen observaciones al respecto de Almacenamiento de Estructura metalica, estas observaciones se remitiran a mas tardar el dia viernes 19/12/2025.

TEMAS TRATADOS COMITÉ TÉCNICO No. 90,2

COMPONENTE BIM: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 02 del informe semanal UTMP.

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS. Se informa que la Interventoría CIG llevó a cabo reunión el día 16 de diciembre de 2025 con la empresa VANTI, en la cual se indicó que la alternativa propuesta corresponde a la implementación de una red única sobre la carrera 91. En dicha reunión, VANTI manifestó que remitirá los criterios técnicos, operativos y constructivos al constructor UTMP, estimando un plazo aproximado de dos (2) semanas para la definición de la solución, incluyendo los costos asociados y las salvedades constructivas correspondientes. Así mismo, se precisó que, desde el punto de vista técnico, operativo y constructivo, la alternativa más favorable corresponde a la ejecución de una acometida de cuatro (4) pulgadas por la carrera 91. La Unión Temporal UTMP presentará formalmente la información socializada, con el fin de proceder al cierre del acta respectiva.
2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – PRESENTACION PRELIMINAR próximo comité 18/12/2025. PENDIENTE La UTMP revisa y avanza en el tema con reuniones con el subcontratista.

Se presenta por parte del profesional BIM de la UTMP el avanace de lo ejecutado se efectuó el seguimiento y control técnico integral de la ejecución de la estructura en concreto y la coordinación BIM del proyecto, abarcando los módulos 2, 3, 5 y 14, así como el túnel principal y el túnel de deportistas, con el fin de verificar el avance físico, la correcta secuencia constructiva y la coherencia con la programación vigente hasta el 25 de diciembre de 2025. En el Módulo 2 – zona de edificio, el control se realizó sobre los elementos de dados, losas, muros y vigas de cimentación, registrándose un avance físico del 33 %, lo que evidencia un frente de obra activo y articulado con las zonas previamente ejecutadas. Para el Módulo 3 – zona de edificio, el seguimiento se concentró en dados y columnas, alcanzando un avance del 47 %, reflejando un mayor grado de consolidación estructural y cumplimiento de los hitos programados. En el Módulo 5 – zona de edificio, el control técnico se enfocó en la ejecución de dados de cimentación, con un avance físico del 20 %, consistente con una fase inicial–intermedia de ejecución. De manera complementaria, en el túnel principal y el túnel de deportistas, el seguimiento abarcó la ejecución de dados, losas, muros, columnas y vigas de cimentación, verificando la continuidad entre zonas previamente construidas y las intervenidas durante el periodo; si bien no se reportan porcentajes individuales en las láminas, ambos frentes se mantienen en ejecución activa conforme a la programación establecida. En la pasarela – Módulo 14, el control técnico se efectuó sobre columnas, dados y vigas de cimentación, confirmándose su ejecución progresiva y alineada con la planeación del proyecto. Finalmente, desde el componente BIM, se realizó seguimiento a la detección y gestión de interferencias, partiendo de una línea base de 14.479 interferencias, logrando reducirlas a 2.818 interferencias pendientes, lo que representa una reducción acumulada aproximada del 80,54 %, resultado de la aplicación de reglas CIG, la actualización de modelos por parte del constructor y los procesos iterativos de depuración, fortaleciendo la coordinación técnica y mitigando riesgos constructivos para la ejecución en obra.

COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN:
Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 12.

1) Radicados 14 Items de de Concreto (Radicado IDRD No 20252100514232 del 18/11/2025) y radicados 95 APUS base CIO y contractuales ante el IDRD por parte de LA INTERVENTORIA CIG.(Radicado IDRD No 2025100554592 de 11/12/2025). De los cuales 144 APUS dependen de los 150 INSUMOS radicados. (Radicado IDRD No 20252100519882 del 20/11/2025 y Radicado IDRD No 20252100531492 del 27-11-2025) para un Total 239 APUS 253 para ser tenidos em cuenta para el modificatorio No 3 (No incluyen los 14 Items de concreto ya radicados). Pendiente respuesta del IDRD
2) Revisión de Cierre de facturación a final de 2025 (31/12/2025) – Análisis Basado en la programación REAL del proyecto. Se tiene escenario muy OPTIMISTA y PESIMISTA se depende de los reconocimientos planteados de membrana. Se hizo remisión al IDRD de la proyección del PAC a 2027, en revision a la fecha sin Observaciones.
3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. (17-12-2025) En revisión CIG.
4) Texto aprobado Sub-Dirección Construcción IDRD - Modificatorio No 3 Obra
5) Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación). Se informa por parte de la Interventoria que se remitira concepto el 19/12/2025. La supervision manifiesta que una vez se tenga dicho documento se hara el respectivo analisis y revision Juridica para la pertinencia o no de este reconocimiento segun lo propuesto.

Los porcentajes, según modificatorio No 2 en valor ganado, Diapositiva No 14, a corte de este reporte son:

Programado: 51,07%
Ejecutado: 51,18%
Costo: 51,18%
Avance 0,11%

Se presenta por la Interventoria CIG (Diapositiva No 12) el estado de revisio de informes de interventoria por parte del IDRD y pagos respectivos a la fecha, se tierne compromiso por parte de la entidad (plande contingencia) para ponerse al dia en la revision y aprobacion de informes mensuales (7 componentes) y poder dar tramite a las actas parciales de obra pendientes por pago, segun las siguientes imagenes:

INFORME No.	PERIODO	ESTADO
18	26 de junio al 25 de julio de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
19	26 de julio al 25 de agosto de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
20	26 de agosto al 25 de septiembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
21	26 de septiembre al 25 de octubre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
22	26 de octubre al 25 de noviembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad y social

ESTADOS FINANCIEROS INTERVENTORÍA PROYECTO 2				
CONCEPTO	**VALOR**	**No. RADICADO**	**FECHA**	**ESTADO**
Valor Total	**$ 7.607.817.556,00**			
Hasta el 90%	**$ 6.847.035.800,40**			
Acta De Pago No 13	$ 131.098.878,00	20252100535372	01-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No 14	$ 395.968.576,00	20252100546612	05-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No.15	$ 189.405.670,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.16	$ 11.096.625,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.17	$ 9.116.564,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.18	$ 47.440.544,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.19	$ 118.315.394,00			PENDIENTE
Pte PAGO	**$ 902.442.251,00**			
% Pte PAGO	**11,86%**			

COMPONENTE TÉCNICO:
Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 12.

1) ANUENCIA DADEP – DOCUMENTOS REMITIDOS AL IDRD (*) para gestión interadministrativa y radicar en debida forma ante la curaduría la revalidación /Modificación de la licencia de construcción por parte del IDRD. PENDIENTE
2) Solicitud de aclaración al profesional jurídico de la curaduría respecto del alcance necesario, teniendo en cuenta que el constructor responsable figura como titular en el acto administrativo emitido por el IDRD de la prorroga a la Licencia de Construcción Vigente. PENDIENTES se elevó solicitud a la Supervisión del IDRD para el apoyo mediante gestión interadministrativa, teniendo en cuenta que no ha sido posible concretar una cita para la revisión correspondiente. Al respecto, la Supervisión informó que dicha sinergia interadministrativa se llevará a cabo una vez se cuente con la totalidad de los documentos debidamente consolidados y listos para la presentación de la modificación contractual pendiente.
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD. PENDIENTE se planteará y expondrá durante la visita a la planta de transformacion (corte) de la membrana.
4) Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar. Por parte de la Supervision se propone la visita el proximo 23/12/025
5) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. PENDIENTE.(Esta depende de gestión interadministrativa a cargo del IDRD)

La UTMP reporta los avances de confección de la membrana para la cubierta, (Diapositiva No 21), así:

Total material a a Nacionalizar 10,256 m2 equivalente a 33,3%
En avance en Sellado:63,3% a la fecha se proyecta visita a planta de corte. (Para proceso de nacionalización)
a la fecha el Total Secciones de paneles Selladas: 300 UND y/o Secciones

En cuanto al tema de estructura metálica de la cubierta, se informa que en planta hay **912,42 Ton** equivalentes al **80,3,93%**, en producción **236,21 Ton**, el total proyectado es: **1085 Ton**, su porcentaje de avance es: **21,73%.** (diapositiva 23)

Dentro de las actividades ejecutadas en la semana, se informa que la estructura metálica de cubierta con secciones de cercha principal acopiada en obra corresponde a **170,32 Toneladas** (Diapositiva 24)

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA					Total	19 Unds		Total	170,32 Ton

Durante el periodo reportado, se ejecutaron actividades correspondientes a la ejecución y seguimiento técnico de la estructura en concreto en diferentes frentes del proyecto, conforme a los planos estructurales y de cimentación aprobados. En la zona de edificio, se ejecutó la fundida de placa del tramo No. 2 del Módulo 8, así como la fundida de placas en el Módulo 2, tramos 1 y 2, garantizando la continuidad con las zonas previamente fundidas; adicionalmente, se realizó la fundida de columnas en el Módulo 8 y la fundida de columnas del Módulo 13 en la zona de pasarela, consolidando los elementos verticales del sistema estructural. En el Módulo 7, se llevó a cabo la fundida de vigas zarpas en las zonas 1 y 2, articuladas con las fundidas ejecutadas en periodos anteriores. En cuanto a los frentes subterráneos, se ejecutaron actividades de armado y fundida de muros en el túnel administrativo, sector No. 8, y la fundida de muros del túnel deportivo en la zona 2, sectores 7 al 10, asegurando la integración estructural entre zonas previamente ejecutadas y las intervenidas en el periodo; igualmente, se avanzó en el armado del tercer tramo de placa del túnel de ambulancias, específicamente en la zona 2. Finalmente, se efectuó la fundida de dados de cimentación en los Módulos 3 y 5, complementando las áreas ya ejecutadas y manteniendo la secuencia constructiva prevista. Todas estas actividades fueron objeto de seguimiento y control técnico, verificándose su correcta localización, alineación con el diseño estructural y coherencia con la programación de obra vigente (Diapositivas No 24 a la 33).

En el tema de los informes de instrumentación se leen las conclusiones a la fecha (Diapositiva 34-35):
✓ Durante el periodo comprendido desde el 01 al 05 de diciembre de 2025; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.
✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.03 m y 8.99 m.
✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 7 cm, las columnas de agua se encuentran entre 1.76 y 6.05 m de profundidad.
✓ Es importante proteger toda la instrumentación instalada para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE ELÉCTRICO:
No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 37)

AVANCE DE OBRA (Diapositiva 38-40)
Se ejecutaron actividades en el módulo 5, consistentes en la construcción de la caja CS276 y la instalación de tuberías eléctricas de 4 pulgadas, tanto en la entrada como en la salida de la subestación eléctrica. Las actividades se desarrollaron conforme a los diseños aprobados y la programación vigente. Se continua con construcción de cajas de inspección.

COMPONENTE HIDRÁULICO:
Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 41.
1) Entrega de las dos (2) alternativas para la conexión de GAS – Proyecto Velódromo – y entrega de planos GAS.(*) Remitir consolidado de trazabilidad al IDRD por parte de CIG (**) Se ejecuto reunión con VANTI el 16/12/2025.PENDIENTE. Descartadas dos alternativas y se esta pendiente a la llegada de la propuesta planteada durante reunion de VANTI del 16/12/2025.
2) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. La supervision Indica que se tiene programada por parte de la EAAB visita el dia 05/01/2026 al proyecto Velodormo segun lo descrito.
3) Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo PENDIENTE.
4) "Radicación respectiva de la solicitud de prorroga para la temporal de Obra de acueducto y alcantarillado ante la EAAB -Velódromo" CUMPLIDO.

AVANCE DE OBRA (Diapositiva 42)
Se adelantaron gestiones administrativas ante las empresas de servicios públicos, específicamente la elaboración de la solicitud de prórroga de la TPO de acueducto y alcantarillado, en concordancia con la prórroga otorgada a la licencia de construcción, garantizando la continuidad legal y técnica del proyecto.

TEMAS ADICIONALES TRATADOS

COMPROMISOS


TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (Depende de la propuesta de conexión y diseños respectivos de VANTI de acuerdo a la ultima REUNION 16/12/2025)	UTMP - VANTI	26/08/2025
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK	UTMP	18/12/2025
Actualización del BEP y posterior Seguimiento mesa de trabajo jueves 27/11/2025 informar Fecha en comité 88, entrega UTMP 09/12/2025 revisión CIG 12/12/2025 y radicado ante el IDRD el 15/09/2025. Presentación Actualización respectiva próximo comité 26/12/2025.	UTMP - CIG	22/12/2025
Radicados 14 Items de de Concreto (*) y radicados 95 APUS base CIO y contractuales ante el IDRD por parte de LA INTERVENTORIA CIG.(**). De los cuales 144 APUS dependen de los 150 INSUMOS radicados. (***) para un Total 239 APUS 253 para ser tenidos em cuenta para el miodificatorio No 3 (No incluyen los 14 Items de concreto ya tadicados). Pendiente respuesta del IDRD	IDRD	Sin Fecha
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. (17-12-2025) Respuesta con observaciones y/o remisión al IDRD por parte de CIG.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025
Texto aprobado Sub-Dirección Construcción IDRD - Modificatorio No 3 Obra	IDRD	31/12/2025
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación) Radicado el dia 19/12/202520252100566762	CIG	19/12/2025
ANUENCIA DADEP – DOCUMENTOS REMITIDOS AL IDRD (*) para gestión interadministrativa y radicar en debida forma ante la curaduría la revalidación /Modificación de la licencia de construcción por parte del IDRD.	IDRD	26/11/2025
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	23/12/2025
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha
Entrega de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP- IDRD- VANTI	16/12/2025
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 05/01/2025	IDRD	Sin Fecha
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD	IDRD – CIG-UTMP	Sin Fecha

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

N-A

Siendo las _10:40 a.m._ se da por terminado el Comité TECNICO/TRANSVERSALES - VELÓDROMO No 90, en constancia se adjunta Listado de asistencia.				
PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**		
FIRMA		**FIRMA**	N.A	N.A
NOMBRE	**EDGAR SOLORZANO MEDINA**	**NOMBRE**	N.A	N.A
CARGO	**COORDINADOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO**	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Ing. ARTURO ROJAS TORRES - Residente 2 Interventoría

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite en Obra Nº 90,2 Velodromo. RESPONSABLE DEL EVENTO CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

FECHA 18/12/2025 HORA INICIAL 8:00 am HORA FINAL 9:32 Am LUGAR PROYECTO VELÓDROMO CONTRATO 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Juan Pablo Villate Diaz	1014201932	Apoyo tecn.	STC		IDRD	Juan.villate@	3197024234
2	Francy Liliana Murillo	52968323	Apoyo Tecnico	STC		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043800785
3	Nurmen Lucia Velez Mercedes	65777928	Apoyo Social	STC		IDRD	nurmen.velez@idrd.gov.co	
4	Angela Milena Sánchez C.	1020.739.111	Programación	UTMP		UTMP	programacion.velodromo@cyg.com.co	
5	CARLOS E GUZMÁN SANCHEZ	79617888	RESIDENTE OBRA	UTMP		UTMP	residente1.velodromo@cyg.com.co	315 8685824
6	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Apoyo Tecnico	STC		IDRD		
7	Oscar Javier Soto Ortega	80761720	Apoyo Tecnico	STC		IDRD	oscar.soto@IDRD	3002101408
8	Alfonso Rescaniere Sierra	88235891	Director	UTMP		UTMP	a.perea@cygcom.co	
9	Jairo Parra Reyes	1143829208	Apoyo Tecnico	STC		IDRD	jairo.parra@idrd.gov.co	3052150830
10	Katherin Amaya Roa	1016026233	Sub Directora	STC		IDRD	katherin.amaya@	3179308609
11	Javier O Sanchez Lagos	1014177632	Apy Tec Super	STC		IDRD	javier.sanchez@idrd.gov	3045746355
12	Ivonne L. Agudelo Gutierrez	1013601022	Apoyo Transv.	STC		IDRD	ivonne.cayla@cidgroup.com	3144220056
13	Julián Ricardo Agudelo Niño	80767393.	R. Ambiental	Interventoría		CIG	julianagudelo.ingeniero@gmail.com	3202336371
14	Jhon Ruben Mayorga	1015954740	R. SGSST Iw.	CIG.		CIG	interventoria.velodromo@	3202548911
15	Astrid Viviana Rojas Congote	52932509	P. GRD	CIG		CIC		3157994502
16	Diana Marcela ORTIZ D.	1014200077	Res. Social	UTMP		UTMP	Social.velodromo@	3153433487
17	Paula Blanco Alarcón	1073383630	Res Amb	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
18	JOHN H. RAMOS P.	80002268	COORDINADOR	UTMP		UTMP	coordinador.bim@cyg.com.co	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.6

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de Obra 90.2 Velodromo

FECHA: 18-12-2025 HORA INICIAL: 8:00 AM HORA FINAL: 9:32 AM LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Lauramorales	1118565112	Residente BIM	CBC			laura.mp227@gmail.com	3102123494
2	Daniela Prieto Rodriguez	1018490778	Apoy. Transversal Residente	STC				
3	LINA JOHANNA FALLA L.	52.517.090	Ap. Sop. Ambien.	IDRD		IDRD	lina.falla@idrd.gov.co	3103143272
4	Ingrid Johanna Barrientos Muñoz	1090493553	PROF. GRD.	UTMP.		UTMP.	riesgos. velodromo @cyg-com.co	3125584962
5	EDGAR SEBASTIANO HERRERA	1922971	Coord. Tec. Estr.	P.I.G		P.I.G.	coord.tecnico.2@cyg.com.co	
6	Andres Vega	79882811	Dir Tec	UTMP		UTMP	avega@cyg.com	3112577333
7	Jose Luis Chavez	79885757	Rep. Legal	UTMP		UTMP	rdutmp@cyg.com.	3157330176
8	Eduard Antonio Corredor	80383913	Resid. de Estr. Inst. electricas	UTMP		UTMP	electrico.velodromo @cyg.com.co	3004290201
9	Luz Stella Rodriguez	51432856	Res. SST	UTMP		UTMP	sst2.velodromo@cyg.com.co	3214693331
10	Ivone Faibelly Alvarez Gonzalez	1032468305	Rel. Costos y Pres	UTMP		UTMP	[illegible]	3137705723
11	Jose M. Galeano V.	80.031.322	Residente	UTMP.		UTMP	estructural.velodromo@ cyg.com.co	3105570234
12	Diego F Castro	1110453573	Prof Calidad	UTMP		UTMP	Calidad.velodromo @cyg.com.co	3176751772
13	Ivonn Perez Tellez	1026279000	Apoy Superv.	STC		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	
14	Bibiana Rocio Sosa Lindo	52996077	Apoy Seguim	STC - IDRD		IDRD	bibiana.sosa@idrd.gov.co	
15	Wilber Pinzon Sanchez	1053806234	Prof. BIM	Inter		CIG	binvelop@predibyg.com	
16	Diego Luis Bello	1075652081	Ing. Estructural	Interv		CTC		
17	Arturo Rojas Torres	13873937	Residente	CIG		CIG	interventor.velodromo@gmail.com	3176440036
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL- V.0

115

Marca temporal	Nombre	Cedula:	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
16/12/2025 9:53:09	javier sanchez	1014177632	javier.sanchez@idrd.gov.co	Apoyo Tecnico a la Supe	IDRD	
16/12/2025 9:53:21	Ivonne Aguilar	1013601022	ivonne.aguilar@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD- STC	3114002656
16/12/2025 9:53:27	Lina Johanna Falla	52517090	lina.falla@idrd.gov.co	Apoyo supervisión comp	IDRD	3103143272
16/12/2025 9:54:08	Paula Blanco	1073383630	ambiental.velodromo@cyg.com.co	Residente ambiental	UTMP	3024219947
16/12/2025 9:54:29	Carmen Lucía Vélez Cárc	65777928	carmen.velez@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión c	IDRD	3204054770
16/12/2025 9:54:37	CESAR FERNANDEZ SOL	80109419	contingencias.velodromo@cyg.com.co	PROFESIONAL AMBIENT	UTMP	3002662060
16/12/2025 9:54:58	Claudia Infante Jaimes	68248723	claudiabiouis@gmail.com	Bióloga	UTMP	3202701471
16/12/2025 9:57:40	Jairo Parra Reyes	1143829208	jairo.parra@idrd.gov.co	Contratista STC	IDRD	3052150830
16/12/2025 9:57:44	Mary Luz Ramirez Carvaj	52494809	socialvelodromo6@gmail.com	Profesional social	Interventoría	3132205175
16/12/2025 9:58:01	Juan Pablo Villate Diaz	1019010837	juan.villate@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD	3197021334
16/12/2025 9:58:04	Lindy Rubiano Moyano	1051954740	interventoria.sgsstvelodromo@gmail.com	Residente SGSST Interve	Consorcio Interventores	3202548911
16/12/2025 9:58:24	Edgar Solórzano Medina	19222971	corint.carvel.2@gmail.com	Coordinador Técnico de I	Consorcio Interventores	3124326589
16/12/2025 9:58:41	Alfonso Peñaranda Suar	88235391	a.penaranda@cyg.com.co	Director	UTMP	3008620623
16/12/2025 9:58:49	Astrid Viviana Rojas C	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Prof. Gestión del Riesgo	Consorcio Interventores	3157994502
16/12/2025 9:59:21	Bibiana Paola Sosa Linar	52996077	bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo a la supervision S	IDRD	3134649125
16/12/2025 10:01:02	Francy Murillo	52968323	francy.murillo@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión	IDRD	3043808785
16/12/2025 10:06:35	Ivonn Perez Tellez	1026279000	ivonn.perez@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión	IDRD	3223578250
16/12/2025 10:07:08	Diana Marcela Ortiz	1014212007	dortiz.ts@gmail.com	Residente social	UTMP	3153935487
16/12/2025 10:10:14	Juan Jaiver Espinel Silva	1070956933	r.forestal.velodromo@gmail.com	Residente Forestal	Unión Temporal Metropo	3118778828
16/12/2025 10:10:37	Julián Ricardo Agudelo	80767393	julianagudeloingeniero@gmail.com	Residente ambiental	CIG	3202336372
16/12/2025 10:11:45	Eleana Suaza García	1026267356	eleana.suaza.biologa@gmail.com	Bióloga	CIG	3115049944
16/12/2025 10:17:33	Johanna Barrientos	1090495553	riesgos.velodromo@cyg.com.co	Profesional gestión del ri	Unión temporal Metropol	3125587967
16/12/2025 10:17:35	Luz Stella Rodriguez	31432956	sst2.velodromo@cyg.com.co	Residente SST	UTMP	3214693331
16/12/2025 10:19:02	Arturo Rojas Torres	13873937	interventoria.velodromo@gmail.com	Residente	CIG	3166420036



COMPONENTE BIM


Compromisos


DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) de los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (**)	UTMP - VANTI	26/03/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunion de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – PRESENTACION PRELIMINAR próximo comité 18/12/2025.	UTMP	18/12/2025	PENDIENTE
Actualización del BEP y posterior Seguimiento mesa de trabajo jueves 27/11/2025 informar Fecha en comité 88, entrega UTMP 09/12/2025 revisión CIG 12/12/2025 y radicado ante el IDRD el 15/09/2025. Presentación Actualización respectiva próximo comité 18/12/2025.	UTMP - CIG	18/12/2025	ENTREGADO Y EN REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA

(**) Depende de la propuesta de conexión y diseños respectivos de VANTI de acuerdo a la última visita 17/12/2025. Se propone Gestión IDRD-VANTI para seguimiento y agilización de entrega dos (2) alternativas para la conexión Proyecto Velódromo. Radicado ante el IDRD trazabilidad respectiva el 04/12/2025 Rad. No 20252100544352 y en gestiones Interinstitucionales IDRD-VANTI

IDRD BOGOTÁ

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 2

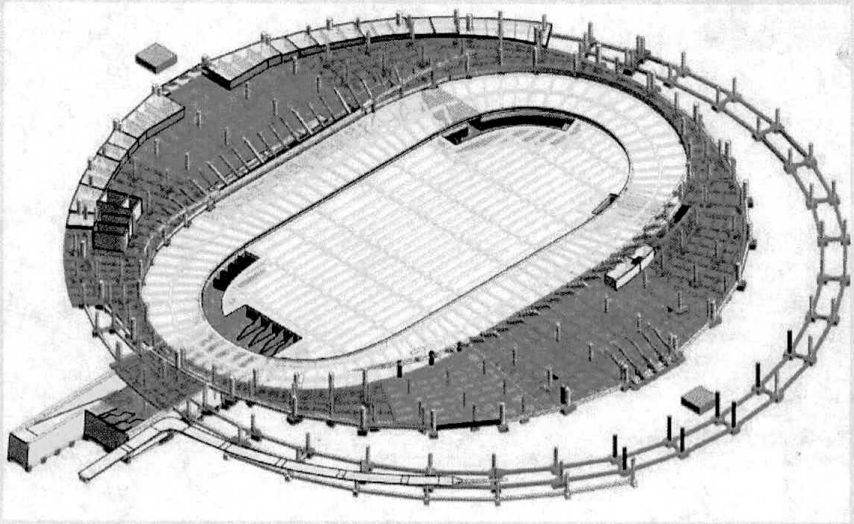





ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
EN EJECUCIÓN

Volumen total	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.325,096	1.806,691	0,00 % 21,70 % 100,00 %

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 2

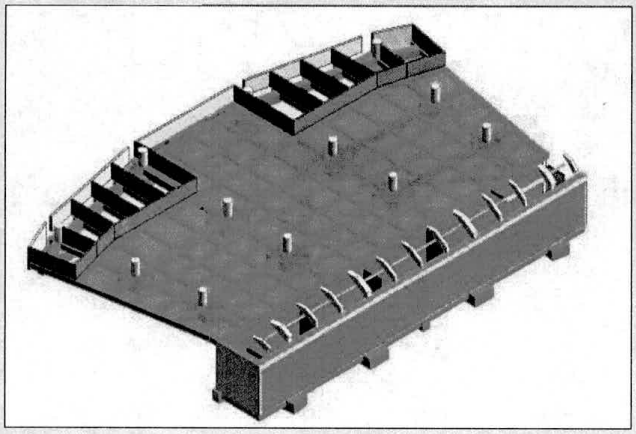




UBICACIÓN EN EL PROYECTO

	Volumen total	Volumen total fundido (m3)	% Avance
DADOS	93,660	74,312	79,34 %
LOSAS	251,306	126,986	50,53 %
	Área total (m2) 1.952,32	Área total fundida (m2) 938,29	48,06 %
MUROS	155,501	92,527	59,50 %
	Área total (m2) 662,16	Área total fundida (m2) 308,45	46,58 %
VIGAS C MENTACIÓN	140,873	16,213	11,51 %

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
EN EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 3

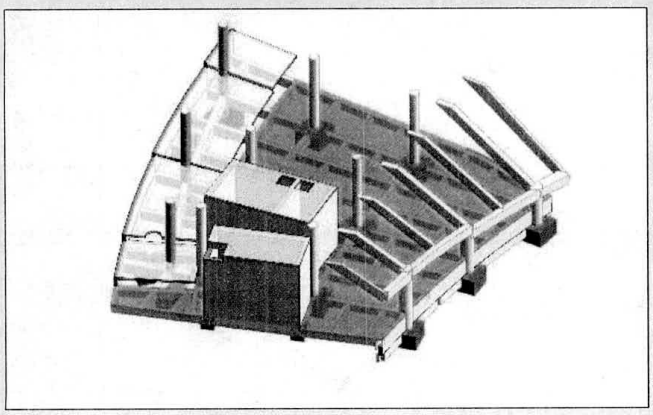




UBICACIÓN EN EL PROYECTO

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
17,792	4,852	27.27 %	COLUMNAS
Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance	
57,49	17,70	30.79 %	
Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
42,012	7,710	18.35 %	DADOS

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 5

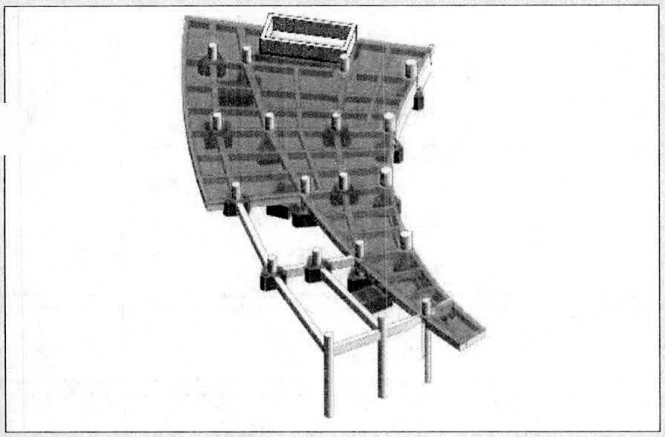





UBICACIÓN EN EL PROYECTO

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
43,690	1,698	3.89 %	DADOS

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / TÚNEL PRINCIPAL

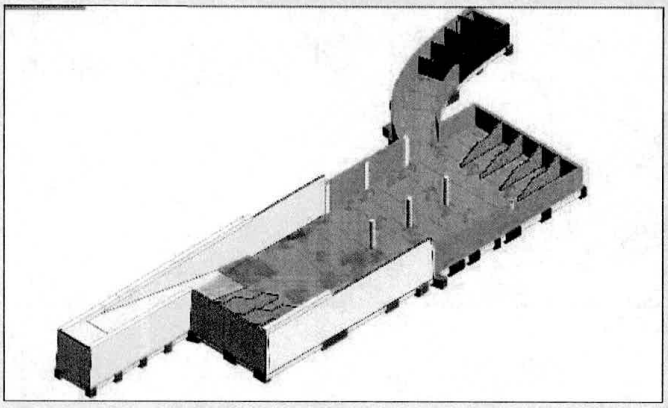





UBICACIÓN EN EL PROYECTO

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
82,613	19,434	23.52 %	DADOS
184,426	168,097	91.15 %	LOSAS
949,34	840,49	88.53 %	
246,479	78,268	31.75 %	MUROS
945,77	262,14	27.72 %	
95,751	41,873	43.73 %	VIGAS CIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / TÚNEL DE DEPORTISTAS

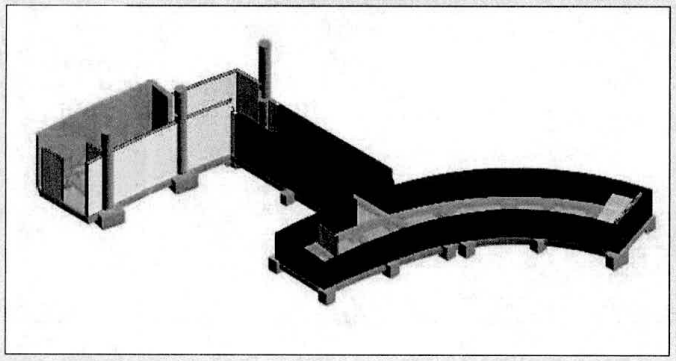





UBICACIÓN EN EL PROYECTO

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
8,205	8,205	100.00 %	COLUMNAS
Longitud total (ml) 20,61	Longitud total fundida (ml) 20,61	100.00 %	
20,245	20,245	100.00 %	DADOS
44,813	43,851	97.85 %	LOSAS
227,27	219,25	96.47 %	
98,800	69,764	70.61 %	MUROS
340,28	233,66	68.67 %	
27,634	27,634	100.00 %	VIGAS CIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / PASARELA MÓDULO 14

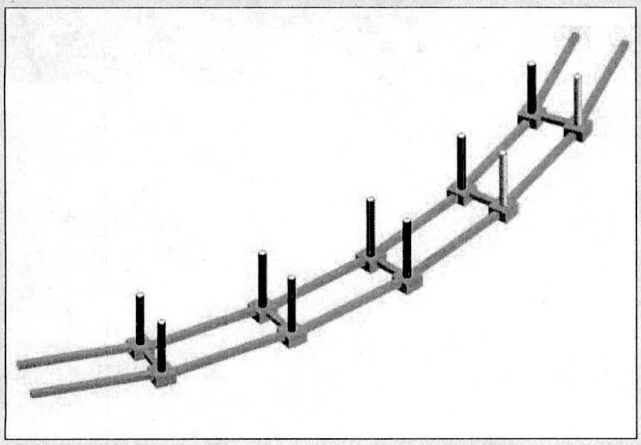




UBICACIÓN EN EL PRCYECTO

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
17,643	14,179	80.37 %	COLUMNAS
Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance	
62,40	50,15	80.37 %	
Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
28,900	28,900	100.00 %	DADOS
Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
32,044	32,044	100.00 %	VIGAS CIMENTACIÓN

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

AVANCE DETECCION INTERFERENCIAS - 2025

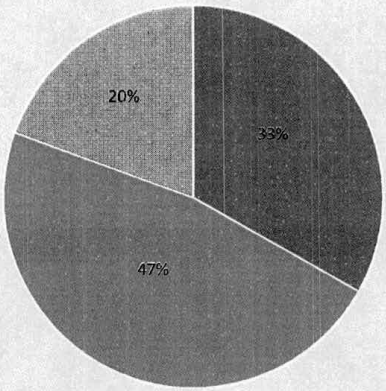

Línea base 14479 interferencias

- Aplicación de Reg as CIG - 4807
- Modelos Actualizados UTMP - 6854
- Pendientes por resolver - 2818

Etapa	Descripción	N° de Interferencias	Reducción vs. Etapa Anterior	Reducción Acumulada vs. Inicial
Prueba 5	Línea Base (Bruta)	14,479		0%
Prueba 6	Aplicación de Reglas 1 Filtro Basico (Omitir Datos vs. Pilotes)	12,964	1 515	10.46%
Prueba 7	Modelos Actualizados por Constructor	11,952	1 012	6.99%
Prueba 8	Aplicación de Reglas 2 (Omitir Mampostería vs. MEP)	10,267	1 685	11.64%
Prueba 12	Modelos Actualizados por Constructor	5,897	4 370	30.18%
Prueba 14	Aplicación de Reglas 3 y 4 (Omitir Tubos vs. Suelos) (Omitir Pilotes vs. Pozos)	4,290	1 607	11.10%
Prueba 16	Modelos Actualizados por Constructor	2,818	1 472	10.17%

COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN

Radicados 14 Items de de Concreto (*) y radicados 95 APUS base CIO y contractuales ante el IDRD por parte de LA INTERVENTORIA CIG.(**). De los cuales 144 APUS dependen de los 150 INSUMOS radicados. (***) para un Total 239 APUS 253 para ser tenidos em cuenta para el miodificatorio No 3 (No incluyen los 14 Items de concreto ya tadicados). Pendiente respuesta del IDRD	IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Revisión de Cierre de facturación a final de 2025 (31/12/2025) – Análisis Basado en la programación REAL del proyecto. Se tiene escenario muy OPTIMISTA y PESIMISTA se depende de los reconocimientos planteados de membrana. Se hizo remisión al IDRD de la proyección del PAC a 2027.	UTMP - CIG	12/11/2025	CUMPLIDO
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. (17-12-2025) En revisión CIG.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025	CUMPLIDO
Texto aprobado Sub-Dirección Construcción IDRD - Modificatorio No 3 Obra	IDRD	31/12/2025	VIGENTE
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(***)	CIG	03/12/2025	PENDIENTE

(*) Radicado IDRD No 20252100514232 del 18/11/2025

(**) Radicado IDRD No 2025100554592 de 11/12/2025

(***) Radicado IDRD No 20252100519882 del 20/11/2025 y Radicado IDRD No 20252100531492 del 27-11-202

ESTADO DE REVISION INFORMES DE INTERVENTORIA POR PARTE DEL IDRD Y PAGOS RESPECTIVOS

INFORME No.	PERIODO	ESTADO
18	26 de junio al 25 de julio de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
19	26 de julio al 25 de agosto de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
20	26 de agosto al 25 de septiembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
21	26 de septiembre al 25 de octubre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
22	26 de octubre al 25 de noviembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad y social

ESTADOS FINANCIEROS INTERVENTORÍA PROYECTO 2				
CONCEPTO	VALOR	No. RADICADO	FECHA	ESTADO
Valor Total	**$ 7.607.817.556,00**			
Hasta el 90%	**$ 6.847.035.800,40**			
Acta De Pago No.13	$ 131.098.878,00	20252100535372	01-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No.14	$ 395.968.576,00	20252100546612	05-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No.15	$ 189.405.670,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.16	$ 11.096.625,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.17	$ 9.116.564,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.18	$ 47.440.544,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.19	$ 118.315.394,00			PENDIENTE
Pte PAGO	**$ 902.442.251,00**			
% Pte PAGO	**11,86%**			


REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 75.475.287.344,01	51,07%
% EJECUCIÓN	$ 75.643.657.361,90	51,18%
% COSTO	$ 75.643.657.361,90	51,18%

AVANCE	0,11%

13/12/2025 programación v3

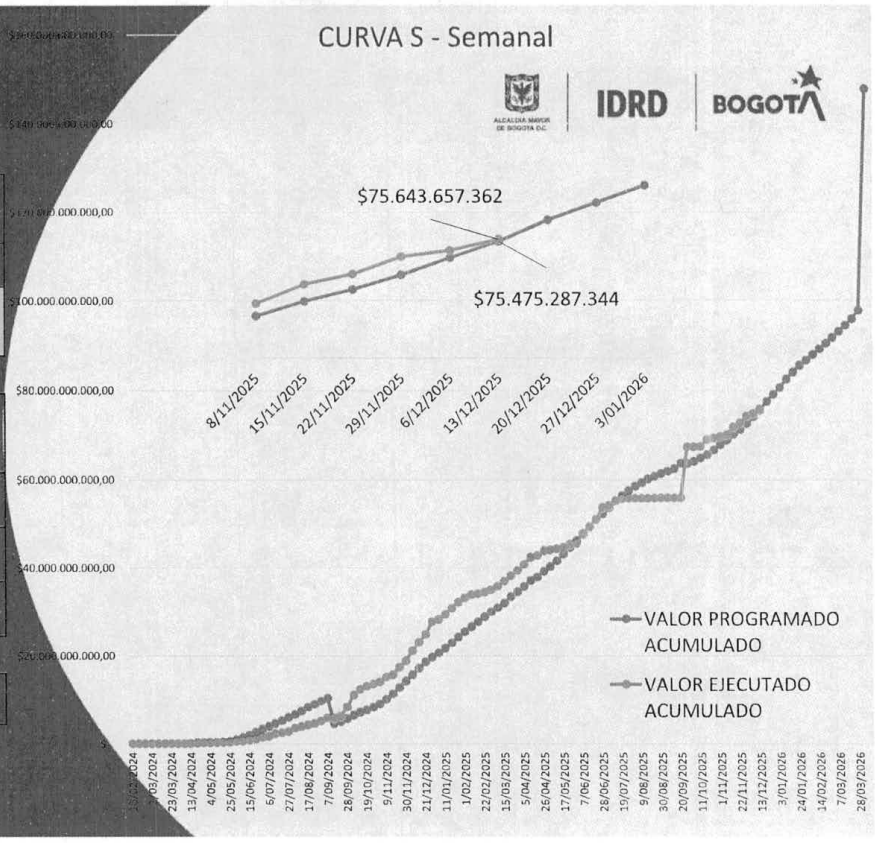

IDRD BOGOTÁ

PRESUPUESTO

MOD. 2

CAPÍTULO	Modificatorio 1 AIU	Modificatorio 2 AIU	ADICIÓN
PRELIMINARES	$ 1.022.595.510,00	$ 1.022.361.676,00	-$ 233.834,00
CIMENTACIÓN	$ 24.121.713.133,00	$ 26.844.904.023,00	$ 2.723.190.890,00
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 39.231.255.196,00	$ 42.621.903.944,00	$ 3.390.648.748,00
CONCRETO	$ 11.218.302.074,00	$ 14.674.309.189,00	$ 3.456.007.115,00
ACERO/MALLAS	$ 18.160.390.368,00	$ 9.548.194.506,00	-$ 8.612.195.862,00
ESTRUCTURA METÁLICA	$ 13.434.795.000,00	$ 26.024.337.020,00	$ 12.589.542.020,00
CUBIERTA	$ 7.909.811.667,00	$ 8.117.728.708,00	$ 207.917.041,00
CARPINTERÍA	$ 9.234.682.282,00	$ 7.064.994.464,00	-$ 2.169.687.818,00
PISOS	$ 1.291.343.798,00	$ 1.244.071.882,00	-$ 47.271.916,00
ELÉCTRICAS	$ 2.249.278.929,00	$ 5.426.457.278,00	$ 3.177.178.349,00
HIDRÁULICA	$ 2.292.248.689,00	$ 3.678.167.777,00	$ 1.385.919.088,00
MAMPOSTERÍA / PAÑETE / PINTURA	$ 1.227.658.568,00	$ 974.031.120,00	-$ 253.627.448,00
HVAC	$ 413.876.395,00	$ 4.138.767,00	-$ 409.737.628,00
VIDEO	$ 320.117.179,00	$ 3.201.171,00	-$ 316.916.008,00
DOTACIÓN CONTRACTUAL	$ 225.472.626,00	$ 225.472.626,00	$ -
SONIDO	$ 21.789.817,00	$ 217.897,00	-$ 21.571.920,00
APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES	$ 15.038.188,00	$ 38.378,00	-$ 14.999.810,00
ACABADOS	$ 101.553.657,00	$ 21.423,00	-$ 101.542.234,00
CERRAMIENTO Y PINTURA	$ 4.373.827,00	$ 43.740,00	-$ 4.330.087,00
EQUIPAMIENTO URBANO	$ 2.217.235,00	$ 22.171,00	-$ 2.195.064,00
SEÑALETICA	$ 6.770.574,00	$ 67.705,00	-$ 6.702.869,00
SILVICULTURA	$ 4.424.574,00	$ 44.243,00	-$ 4.380.331,00
TOTAL	$ 132.509.719.286,00	$ 147.474.729.708,00	$ 14.965.010.422,00
REEMBOLSABLE	$ 311.927.320,00	$ 311.927.320,00	
Total	$ 132.821.646.606,00	$ 147.786.657.028,00	

FACTURACIÓN DEL PROYECTO

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20


No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
TOTAL 2025			$ 42.884.029.994,00	$ 12.842.066.430,00	$ 30.041.963.564,00
TOTAL VELODROMO			$ 70.258.148.335,00	$ 21.054.301.933,00	$ 49.203.846.402,00


IDRD BOGOTÁ

MES DE OCTUBRE DE 2025

SEGUIMINENTO PRESUPUESTAL

IDRD BOGOTÁ

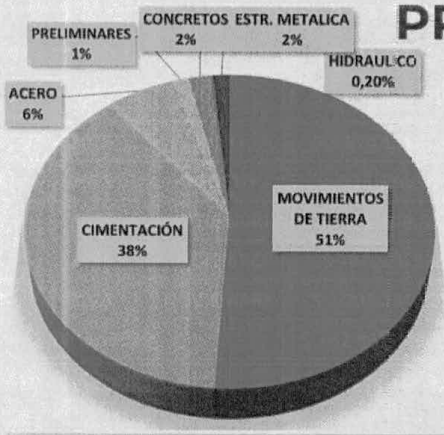

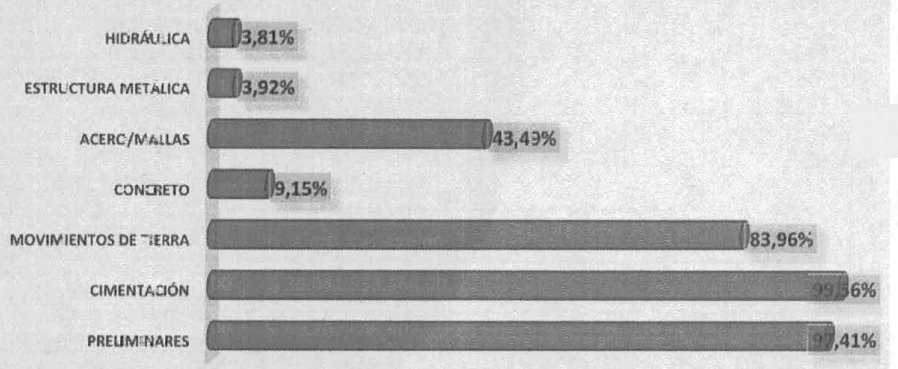

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 28.945.354.284,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.785.295.176,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.232.506.870,00	$ 45.902.784,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.725.617.182,00
ACERO	$ 3.973.552.532,00		$ 178.635.272,00		$ 4.152.187.804,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
CONCRETOS	$ 1.088.471.728,00		$ 254.549.952,00		$ 1.343.021.680,00
HIDRAULICO	$ 140.124.825,00				$ 140.124.825,00
ESTR. METALICA	$ 1.020.722.288,00				$ 1.020.722.288,00
Total general	$ 58.694.890.732,00	$ 3.359.341.754,00	$ 1.823.457.406,00	$ 6.285.143.403,00	$ 70.162.633.295,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR. CDRC	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO PARA LOSA DE CONTRAPISO Y/O FUNDACION, FABRICADOS EN POLIETILENO EXPANDIDO CON MATERIAL TIPO COPOR, DENSIDAD 8 KG/M3 RECUBIERTO EXTERIORMENTE EN POLIETILENO CAL 3	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.	CONTINUA
MODULO 7 Y 8, PASARELA	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE TUBERÍA PVC –S, YEE, SEMICODOS, CODOS, SIFON, SALIDAS SANITARIAS.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA

120

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7 Y 8, PASARELA	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
MODULO 2, 7 Y 8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. INLCUIDO LOS TRASIEGOS.	CONTINUA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	



COMPONENTE TÉCNICO


Compromisos


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
ANUENCIA DADEP – DOCUMENTOS REMITIDOS AL IDRD (*) para gestión interadministrativa y radicar en debida forma ante la curaduría la revalidación /Modificación de la licencia de construcción por parte del IDRD.	IDRD	26/11/2025	Sin fecha
Solicitud de aclaración al profesional jurídico de la curaduría respecto del alcance necesario, teniendo en cuenta que el constructor responsable figura como titular en el acto administrativo emitido por el IDRD de la prorroga a la Licencia de Construcción Vigente.	UTMP - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización de 10 Paneles - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.


MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA

AVANCE EN CORTE

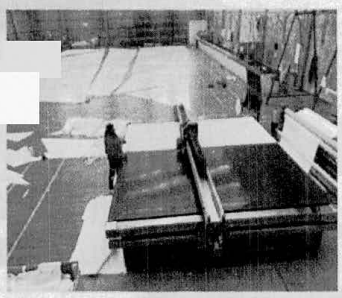


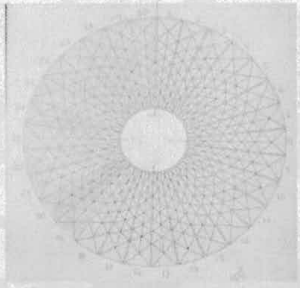


SECCIONADO PARA NACIONALIZACIÓN

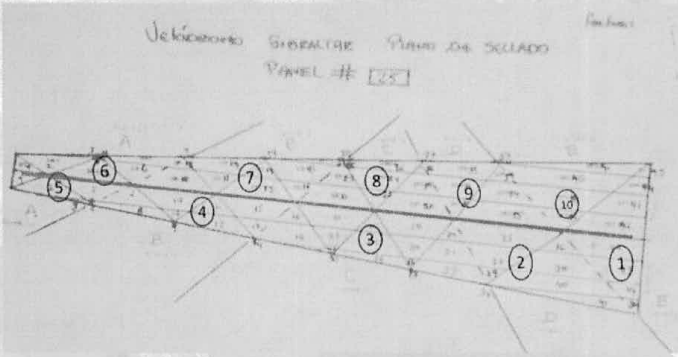

AVANCE EN SELLADO





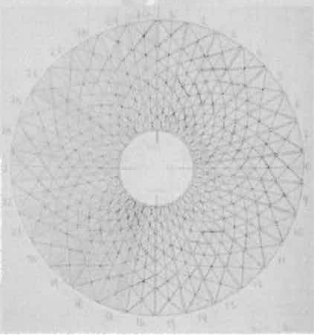

10 SECCIONES POR PANEL

TOTAL A NACIONALIZAR: (341,85 m2/Panel) * 30 Paneles = 10.256 m2

AVANCE EN SELLADO (m2): 10.256 m2 = 10.256 m2/ 10.256 m2 = 100%

TOTAL MÓDULOS DE PANEL SELLADAS = 300 Unidades y/o Secciones

TOTAL SECCIONES NACIONALIZADAS A LA FECHA = 100 Unidades y/o Secciones

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	30,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	436,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	912,42 Ton

TOTAL EN PLANTA: *912,42 Ton*

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODC	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 25 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 07 de Diciembre de 2025	6,66 Ton
dic-25	07 de Diciembre al 14 de Diciembre de 2025	1,65 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	236,21 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***236,21 Ton***


TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **21,73%**

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9585TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
					Total	19 Unds		Total	170,32 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA

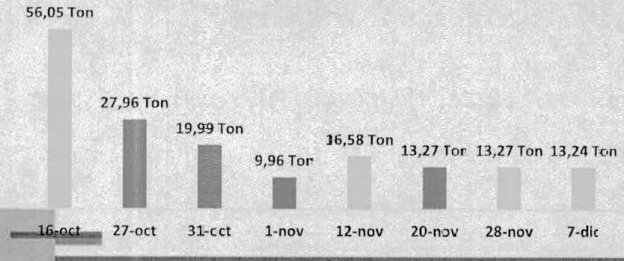

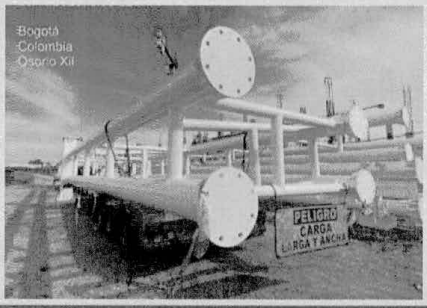


Elementos Ingresados del 08 al 14 de Diciembre.


No se presentó envío.

TOTAL : 170,32 TON.

FUNDIDA DE 3cer Tramo de PLACA MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

IDRD | BOGOTÁ

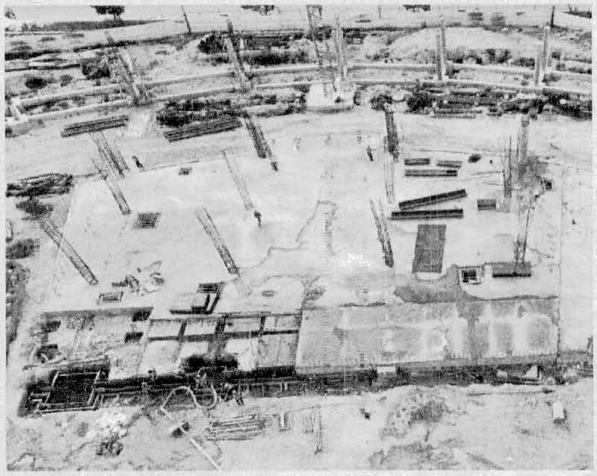

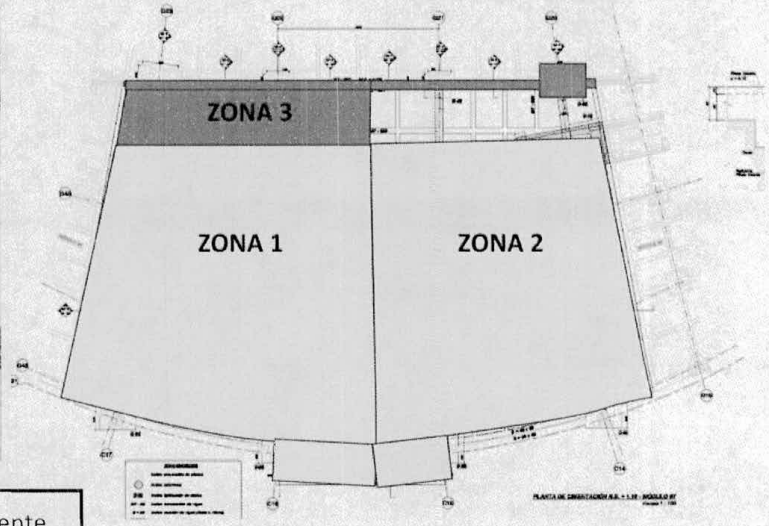


Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 7

FUNDIDA DE 3cer Tramo de PLACA MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

IDRD | BOGOTÁ

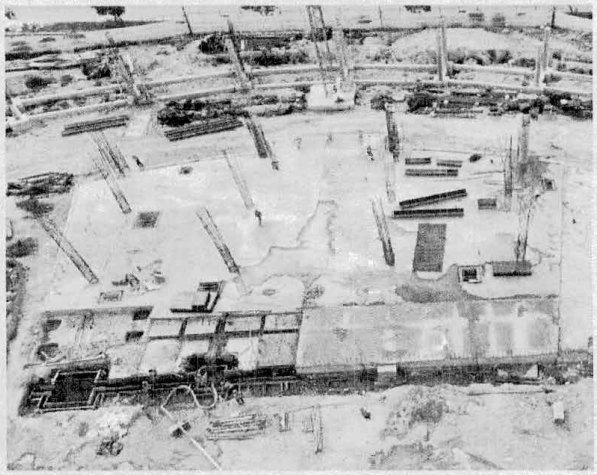

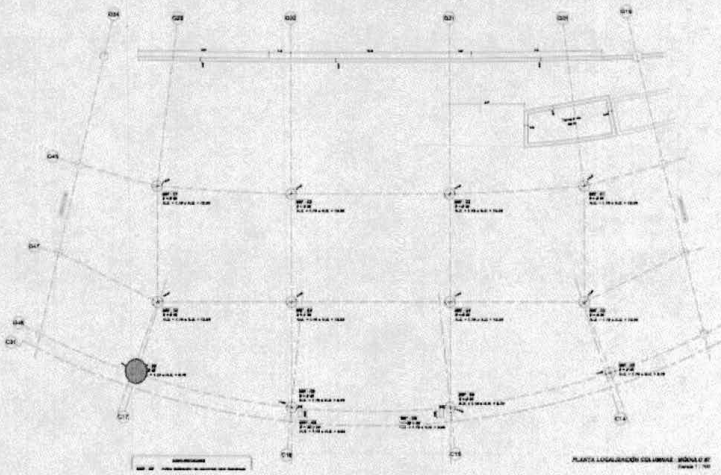



Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08


ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS TUNEL ADMINISTRATIVO

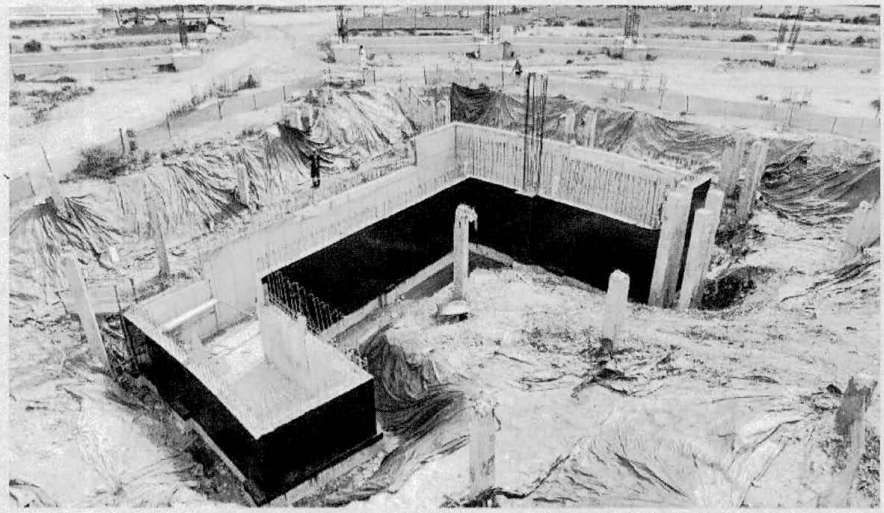


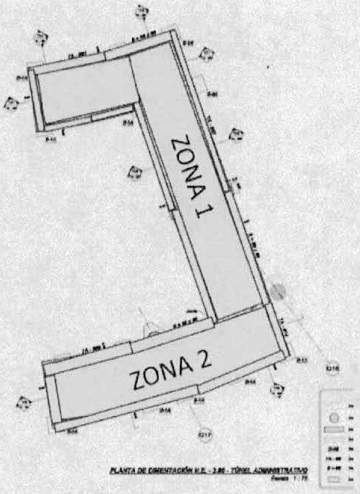

PLANO TA – E01
PLANTA ESTRUCTURAL
TUNEL ADMINISTRATIVO

FUNDIDA DE MURO TUNEL DEPORTIVO – Zona 2 Sectores 11 al 14

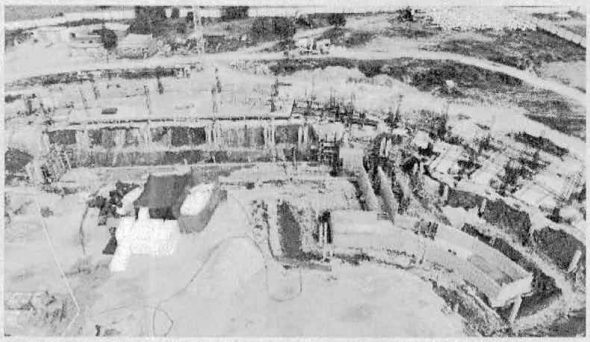

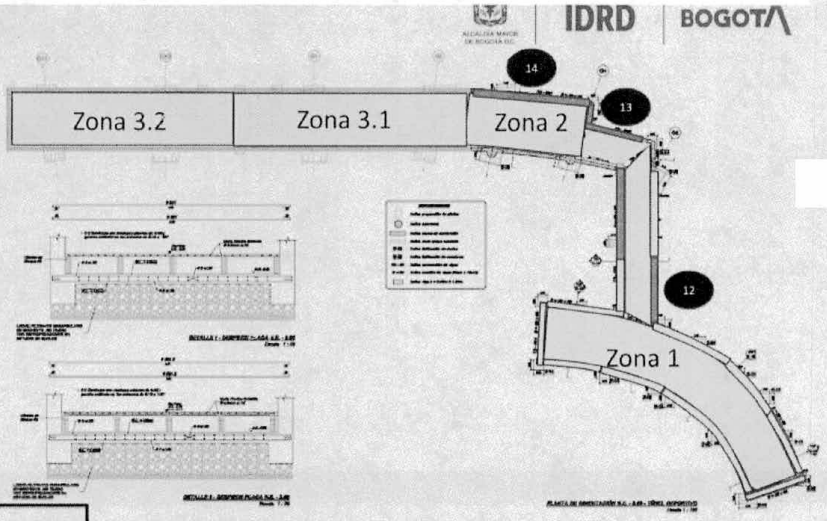


Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL
DE AMBULANCIAS

ARMADO Y FUNDIDA DE MUROS TUNEL DE AMBULANCIA – Tramos 1 y 2



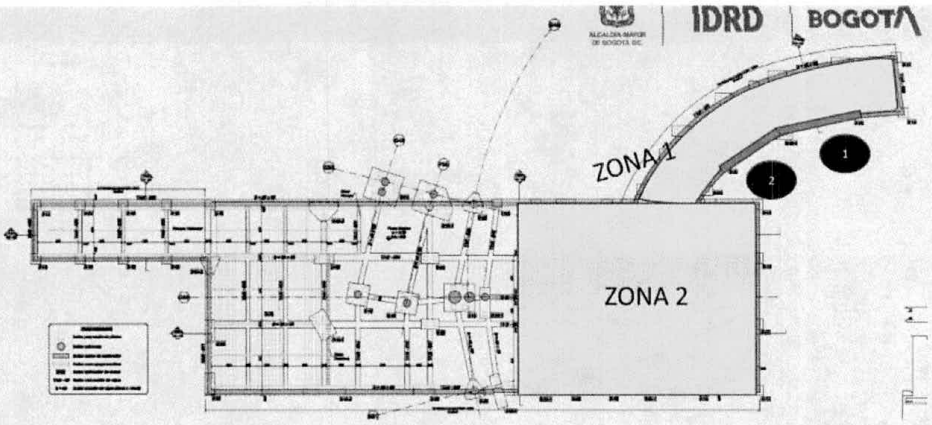


Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 8 – ZONA DE EDIFICIO



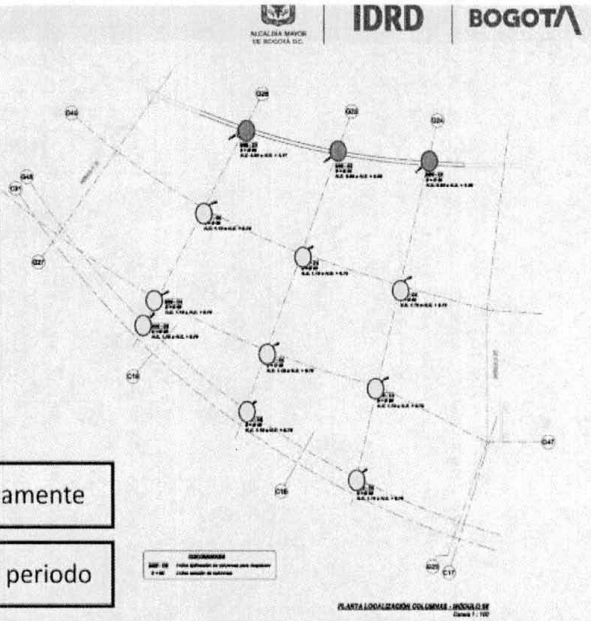

Columnas Fundidas Previamente

Columnas Fundidas En el periodo

PLANO M8 – E01
PLANTAS ESTRUCTURALES MÓDULO 8
