un UNICO concepto en conjunto con CAR (perndiente una revision)
- Soporte de la Radicación de los resultados del segundo monitoreo, ante la SDA. La supervision manifiesta que sera remitidos el dia de mañana 19/12/2025.
- Remisión por parte del IDRD a la Interventoría del Formato "Registro de Proveedores" V7, avalado. La supervision manifiesta que estan aprobados y seran remitidos por correo.

Por parte de la UTMP se comenta que se esta revisando también el tema de la geomembrana para las zonas verdes que va relacionado con el tema de la toxicologia. Sin embargo, manifiesta la UTPM que internamente hemos visto que se va a presentar un gran tema en conflicto con el manejo de agua de escorrentía debido a esta impermeabilización; manifiesta aprovechar esta mesa para llevar la forma a ver si de pronto, pues yo sé que sería retroceder el tiempo, si se puede mantener solamente el tema del manejo con el recebo como lo teníamos propuesto y evitar esta impermeabilización,

teniendo en cuenta que el nivel freático acá no ha presentado señales de que va a subir y que va a generar una afectación a los usuarios y que dicho sistema va a presentar un sobre costo significativo, no solo en la instalación de la geomembrana, sino en el manejo que va de la geomembrana para la parte de arriba. Usted lo escribe, como lo manifiesta la Interventoria se aclara que la geomembrana tiene un componente adicional que consiste en el componente de sello para todo lo que es la parte de los residuos de gas y todo lo demás productos de los lixiviados sobre los que estamos cimentando la obra.

La supervisión del IDRD manifiesta que dicho sello que hay en este momento en recebo podría servir como sello para garantizar que eso no va a suceder. Sí, me gustaría, manifiesta la supervisión, ya mirarlo desde el punto de vista que dice el toxicólogo de la SDA si es viable la propuesta porque en realidad la geomembrana propuesta tiene las caracteristicas que exige el fabricante para garantizar el funcionamiento de la misma es exacta. La UTMP manifiesta que lo que le preocupa al contratista son dos cosas. Digamos que la geomembrana si bien obviamente impermeabiliza el tema de lo que es abajo y no va a dejar que suba, tampoco va a dejar que baje. Entonces en temporadas de lluvia podemos tener saturaciones o incluso inundaciones en zonas verdes porque el agua no va a poder percolar entonces ese es uno de los problemas a futuro. Y el otro problema que me parece complejo es que igual así pongamos el perímetro que tenemos por curaduría intervenido que va a pasar con el resto del predio, pues solo se garantizaría esto en el área intervenida y el resto quedaría sin la protección propuesta con la geomembrana (masa).

La supervisión del IDRD manifiesta que, una vez entendida la situación, se entiende la preocupación con el sentido de las escorrentías que se generaran y cuanto se aumenta el caudal, considerando que las zonas verdes ya no tendrían un coeficiente de permeabilidad. Se consideraría casi como una zona dura para el análisis de los caudales entre la geomembrana y la zona verde se debe hacer un análisis del drenaje superficial, lo veo más complicado por la percolación o por la saturación de esa masa. Esa sí la veo más y habría que pensar en cómo se subtrenarían esas áreas intermedias.

El análisis de caudal como un área dura, pero para su drenaje serían una masa de suelo permeable pues tiene limitante con la membrana superior, pues no tendría una percolación y debería haber una propuesta para evacuar dichas aguas de escorrentía infiltradas hasta la geomembrana propuesta para no tener a futuro tener una sobresaturación o una inundación de las zonas verdes. Se necesita hacer un análisis de la propuesta desde el alcance de todos los componentes implicados, no se podría todavía radicar la propuesta a la SDA hasta que se tengan todos los posibles factores y consecuencias estudiados, actualmente se tiene definido un concepto técnico o unos determinantes ambientales específicos para el velódromo y otros específicos para el parque total, se debe presentar una propuesta totalmente fundamentada.

La UTMP manifiesta que se tiene contemplado para los tres túneles equipos de bombeo para poder controlar el nivel freaticoque tenemos en la zona. Sería hacer una revisión, qué tanto podía abatirse en una área más grande, pues a la fecha los afloramientos existentes durante las excavaciones ha sido mínimo y e momentos de lluvia ha sido controlado en obra, se pensaría que una de las medidas podría ser revisar con respecto a los tres pozos o cuatro pozos eyectores que tenemos, uno en cada túnel, en la influencia que puede tener o bajar el nivel freático en caso tal de necesidad.

Cuando yo indico que no es fiable, que esas sean mis justificaciones, porque si bien es cierto, o sea, eso que tú dices es una realidad. Lo que encontramos acá es totalmente diferente. Encontramos más RCDs, encontramos más todo, pero pues frente ya a un documento técnico de soporte, frente a las investigaciones que tenemos, el seguimiento que tenemos, pues digamos, no es fiable simplemente indicar de acuerdo a lo que veo.

La supervisión manifiesta que revisen muy bien todo lo que implica o cuáles son los riesgos que tenemos y que nos determinó la Secretaría especialmente en los diferentes conceptos técnicos. Si tenemos una verificación técnica y soportada, podemos manejarla, pero por favor.

La interventoría CIG que preocupa que este relleno entrópico trabaja como si fuera un tanque de GLP. El cual es un tanque con agua, me inyecto un gas y cuando el agua calienta, me genera evaporación y estamos hablando que esta evaporación genera gas metano y los invito a que busquemos una solución superficial a defecto de drenaje de las capas de terreno que tengamos por encima de la geomembrana propuesta.

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO: En las Diapositivas 10 -14 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Se implementaron medidas activas de prevención, mitigación y monitoreo frente a riesgos identificados, especialmente asociados a:

•Afloramiento y aumento de lixiviados.
•Escorrentías superficiales.
•Riesgos a la salud ocupacional, olores ofensivos, material particulado y estabilidad de taludes.

Entre las acciones relevantes se incluyeron:
• Manejo de lixiviados mediante bombeo y control hidráulico.
• Inspección permanente de catch tank, geomembranas y sistemas de contención.
• Monitoreo de nivel freático en pozos eyectores.
• Monitoreo de gases en túneles, sin detección de niveles explosivos (0 % LEL – CH_4).
• Jornadas de orden, aseo y socialización del PGRDEPP ante la comunidad.

Estas acciones permiten evidenciar una gestión preventiva y correctiva adecuada del riesgo, en la semana no se tuvo uso de carro sisterna, sin embargo se continua con la utilizacion del cath tank.

. Se solicita a la mesa la radicación del informe Semestral (Enero-Junio 2025) del PGRD y en revision por parte de CIG y posteriormente radicar al IDRD para cerrar año cerrando con radicado ante la SDA.El informe es muy ejecutivo teniendo en cuenta que se anexan todos los informes aprobados.

COMPONENTE FORESTAL: En las Diapositivas 15-21 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Se realizó seguimiento al arbolado de protección permanente, verificando su estado físico y sanitario, así como el correcto aislamiento mediante malla de protección. Se identificó una afectación crítica en el árbol No. 70, con muerte en pie por quema externa.

Frente a este evento se adelantaron:
• Verificación técnica y registro fotográfico.
• Elaboración y radicación de informe de novedades.
• Solicitud formal de tala por emergencia ante la SDA.
• Programación de tala, aclarando que la afectación es ajena a las actividades del proyecto.(árbol No. 70), pendiende la recepcion de acta de emergencia, esto para la socializacion a la comunidad respectivamente y hacer el tratamiento.

Se mantiene seguimiento a la reliquidación del método de compensación conforme a la Resolución 1639 de 2023. La supervision manifiesta que ya se tiene el Acta de emergencia y sera actualizada con la actual supervisora y sera remitida a Obra e Interventoria, se solicita que durante la diligencia de tala esten presentes los profesionales de compnente foreatal e informe respectivo y los profesionales de fauna para el euyentamiento respectivo que aplique .

COMPONENTE FAUNA: En las Diapositivas 22-23 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período se realizaron recorridos de seguimiento mensual, sin requerirse liberación de áreas adicionales. Se registraron 6 especies de fauna silvestre, entre residentes y migratorias, sin afectaciones asociadas al desarrollo del proyecto.

Se tiene pendiente enviar cartelera informativa con el tema de manejo de abejas, para tener claridad ante eventuales incidentes que se presente en el proyecto Velodromo.

La supervision manifiesta que se debe tener en cuenta si se realizan algun tipo de descapone (zonas sin intervencion) ingreso de Biologa y registro respectivo de auyentamiento..

COMPONENTE SST: La profesional de la interventoría, informa que el compromiso que era remitir al IDRD el FURAT y reporte del accidente materializado por subcontratista remitido el 09/12/2025.

En las Diapositivas 24 - 32 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:
El proyecto contó con un promedio de 135 trabajadores, incluyendo personal UTMP y subcontratistas, y una flota activa de maquinaria y equipos acorde con las actividades en ejecución.
En materia de accidentalidad:
• Total histórico: 5 accidentes, de los cuales 3 cerrados y 2 activos.
• Ausentismo acumulado: 49 casos.

Se ejecutaron inspecciones permanentes de EPP, señalización, andamios, puntos de hidratación y frentes de obra, así como la implementación oportuna de acciones correctivas frente a hallazgos, evidenciando control operativo del SG-SST. Se describe el avance en el incidente del subcontratista.

El informe No 22 de Velodromo, se realizo radicacion respectiva de informes mensuales de obra e Interventoria respectivamente ante la entidad contratante IDRD. Se reciben observaciones al informe de interventoria No 18 se procedera con lista de chequeo el dia de hoy para subsanaciones respectivas..
Se indaga por el apoyo del componente que cuando se allegaria a supervision la total de documentacion del reporte del accidente en comento, UTMP manifiesta que una vez se tenga reintegro del trabajador se remitiran en su totalidad.

COMPONENTE DE CALIDAD: En las Diapositivas 33 a la 38 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante la semana se fundieron 108,14 m³ de concreto estructural, con ensayos de asentamiento y toma de muestras conforme a las NTC 396 y NTC 673, garantizando la trazabilidad y control de calidad de los elementos estructurales.
Asi mismo se reporta durante el comite:
•Volumen total acumulado de concretos estructurales: 1.647,03 m³.
•Control de acero: 434,77 toneladas ingresadas al proyecto.
•Avance en estructura metálica de cubierta: 170,32 toneladas ingresadas.

Desde el punto de vista documental y contractual:
•Se radicaron Informe Mensual No. 22, obra e Interventoria ante la entidad contratante IDRD..
•Se presentó el Control de Cambios No. 27 para la estructura metálica.

La mayoría de los rediseños y componentes técnicos cuentan con aprobación formal por parte del IDRD; permanecen algunos ítems puntuales en estado pendiente (pozos eyectores, pasarela de mantenimiento, fachada, paisajismo y componente bioclimático).

Port parte del apoyo de Supervision de Calidad se manifiesta que se tienen observaciones al respecto de Almacenamiento de Estructura metalica, estas observaciones se remitiran a mas tardar el dia viernes 19/12/2025.

TEMAS TRATADOS COMITÉ TÉCNICO No. 90,2

COMPONENTE BIM: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 02 del informe semanal UTMP.

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS. Se informa que la Interventoría CIG llevó a cabo reunión el día 16 de diciembre de 2025 con la empresa VANTI, en la cual se indicó que la alternativa propuesta corresponde a la implementación de una red única sobre la carrera 91. En dicha reunión, VANTI manifestó que remitirá los criterios técnicos, operativos y constructivos al constructor UTMP, estimando un plazo aproximado de dos (2) semanas para la definición de la solución, incluyendo los costos asociados y las salvedades constructivas correspondientes. Así mismo, se precisó que, desde el punto de vista técnico, operativo y constructivo, la alternativa más favorable corresponde a la ejecución de una acometida de cuatro (4) pulgadas por la carrera 91. La Unión Temporal UTMP presentará formalmente la información socializada, con el fin de proceder al cierre del acta respectiva.
2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – PRESENTACION PRELIMINAR próximo comité 18/12/2025. PENDIENTE La UTMP revisa y avanza en el tema con reuniones con el subcontratista.

Se presenta por parte del profesional BIM de la UTMP el avanace de lo ejecutado se efectuó el seguimiento y control técnico integral de la ejecución de la estructura en concreto y la coordinación BIM del proyecto, abarcando los módulos 2, 3, 5 y 14, así como el túnel principal y el túnel de deportistas, con el fin de verificar el avance físico, la correcta secuencia constructiva y la coherencia con la programación vigente hasta el 25 de diciembre de 2025. En el Módulo 2 – zona de edificio, el control se realizó sobre los elementos de dados, losas, muros y vigas de cimentación, registrándose un avance físico del 33 %, lo que evidencia un frente de obra activo y articulado con las zonas previamente ejecutadas. Para el Módulo 3 – zona de edificio, el seguimiento se concentró en dados y columnas, alcanzando un avance del 47 %, reflejando un mayor grado de consolidación estructural y cumplimiento de los hitos programados. En el Módulo 5 – zona de edificio, el control técnico se enfocó en la ejecución de dados de cimentación, con un avance físico del 20 %, consistente con una fase inicial–intermedia de ejecución. De manera complementaria, en el túnel principal y el túnel de deportistas, el seguimiento abarcó la ejecución de dados, losas, muros, columnas y vigas de cimentación, verificando la continuidad entre zonas previamente construidas y las intervenidas durante el periodo; si bien no se reportan porcentajes individuales en las láminas, ambos frentes se mantienen en ejecución activa conforme a la programación establecida. En la pasarela – Módulo 14, el control técnico se efectuó sobre columnas, dados y vigas de cimentación, confirmándose su ejecución progresiva y alineada con la planeación del proyecto. Finalmente, desde el componente BIM, se realizó seguimiento a la detección y gestión de interferencias, partiendo de una línea base de 14.479 interferencias, logrando reducirlas a 2.818 interferencias pendientes, lo que representa una reducción acumulada aproximada del 80,54 %, resultado de la aplicación de reglas CIG, la actualización de modelos por parte del constructor y los procesos iterativos de depuración, fortaleciendo la coordinación técnica y mitigando riesgos constructivos para la ejecución en obra.

COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN:
Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 12.

1) Radicados 14 Items de de Concreto (Radicado IDRD No 20252100514232 del 18/11/2025) y radicados 95 APUS base CIO y contractuales ante el IDRD por parte de LA INTERVENTORIA CIG.(Radicado IDRD No 2025100554592 de 11/12/2025). De los cuales 144 APUS dependen de los 150 INSUMOS radicados. (Radicado IDRD No 20252100519882 del 20/11/2025 y Radicado IDRD No 20252100531492 del 27-11-2025) para un Total 239 APUS 253 para ser tenidos em cuenta para el modificatorio No 3 (No incluyen los 14 Items de concreto ya radicados). Pendiente respuesta del IDRD
2) Revisión de Cierre de facturación a final de 2025 (31/12/2025) – Análisis Basado en la programación REAL del proyecto. Se tiene escenario muy OPTIMISTA y PESIMISTA se depende de los reconocimientos planteados de membrana. Se hizo remisión al IDRD de la proyección del PAC a 2027, en revision a la fecha sin Observaciones.
3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. (17-12-2025) En revisión CIG.
4) Texto aprobado Sub-Dirección Construcción IDRD - Modificatorio No 3 Obra
5) Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación). Se informa por parte de la Interventoria que se remitira concepto el 19/12/2025. La supervision manifiesta que una vez se tenga dicho documento se hara el respectivo analisis y revision Juridica para la pertinencia o no de este reconocimiento segun lo propuesto.

Los porcentajes, según modificatorio No 2 en valor ganado, Diapositiva No 14, a corte de este reporte son:

Programado: 51,07%
Ejecutado: 51,18%
Costo: 51,18%
Avance 0,11%

Se presenta por la Interventoria CIG (Diapositiva No 12) el estado de revisio de informes de interventoria por parte del IDRD y pagos respectivos a la fecha, se tierne compromiso por parte de la entidad (plande contingencia) para ponerse al dia en la revision y aprobacion de informes mensuales (7 componentes) y poder dar tramite a las actas parciales de obra pendientes por pago, segun las siguientes imagenes:

INFORME No.	PERIODO	ESTADO
18	26 de junio al 25 de julio de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
19	26 de julio al 25 de agosto de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
20	26 de agosto al 25 de septiembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
21	26 de septiembre al 25 de octubre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
22	26 de octubre al 25 de noviembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad y social

ESTADOS FINANCIEROS INTERVENTORÍA PROYECTO 2				
CONCEPTO	VALOR	No. RADICADO	FECHA	ESTADO
Valor Total	**$ 7.607.817.556,00**			
Hasta el 90%	**$ 6.847.035.800,40**			
Acta De Pago No 13	$ 131.098.878,00	20252100535372	01-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No 14	$ 395.968.576,00	20252100546612	05-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No.15	$ 189.405.670,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.16	$ 11.096.625,00			PENDIENTE
Acta De Pago No 17	$ 9.116.564,00			PENDIENTE
Acta De Pago No 18	$ 47.440.544,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.19	$ 118.315.394,00			PENDIENTE
Pte PAGO	**$ 902.442.251,00**			
% Pte PAGO	**11,86%**			

COMPONENTE TÉCNICO:
Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 12.

1) ANUENCIA DADEP – DOCUMENTOS REMITIDOS AL IDRD (*) para gestión interadministrativa y radicar en debida forma ante la curaduría la revalidación /Modificación de la licencia de construcción por parte del IDRD. PENDIENTE
2) Solicitud de aclaración al profesional jurídico de la curaduría respecto del alcance necesario, teniendo en cuenta que el constructor responsable figura como titular en el acto administrativo emitido por el IDRD de la prorroga a la Licencia de Construcción Vigente. PENDIENTES se elevó solicitud a la Supervisión del IDRD para el apoyo mediante gestión interadministrativa, teniendo en cuenta que no ha sido posible concretar una cita para la revisión correspondiente. Al respecto, la Supervisión informó que dicha sinergia interadministrativa se llevará a cabo una vez se cuente con la totalidad de los documentos debidamente consolidados y listos para la presentación de la modificación contractual pendiente.
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD. PENDIENTE se planteará y expondrá durante la visita a la planta de transformacion (corte) de la membrana.
4) Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar. Por parte de la Supervision se propone la visita el proximo 23/12/025
5) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. PENDIENTE.(Esta depende de gestión interadministrativa a cargo del IDRD)

La UTMP reporta los avances de confección de la membrana para la cubierta, (Diapositiva No 21), así:

Total material a a Nacionalizar 10,256 m2 equivalente a 33,3%
En avance en Sellado:63,3% a la fecha se proyecta visita a planta de corte. (Para proceso de nacionalización)
a la fecha el Total Secciones de paneles Selladas: 300 UND y/o Secciones

En cuanto al tema de estructura metálica de la cubierta, se informa que en planta hay **912,42 Ton** equivalentes al **80,3,93%**, en producción **236,21 Ton**, el total proyectado es: **1085 Ton**, su porcentaje de avance es: **21,73%.** (diapositiva 23)

Dentro de las actividades ejecutadas en la semana, se informa que la estructura metálica de cubierta con secciones de cercha principal acopiada en obra corresponde a **170,32 Toneladas** (Diapositiva 24)

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	95867A53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	95867A50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	95867A49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	95867A52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	95867A51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	95867A54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	95867A54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	**8**	**7-dic-25**	**CERCHA PRINCIPAL**	**CHP3**	**9586T45A-1**	**1 Unds**	**6619,18 Kg**	**6619,18 Kg**	**6,62 Ton**
14		**7-dic-25**	**CERCHA PRINCIPAL**	**CHP3**	**9586T45A-1**	**1 Unds**	**6619,18 Kg**	**6619,18 Kg**	**6,62 Ton**
CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA					Total	19 Unds		Total	170,32 Ton

Durante el periodo reportado, se ejecutaron actividades correspondientes a la ejecución y seguimiento técnico de la estructura en concreto en diferentes frentes del proyecto, conforme a los planos estructurales y de cimentación aprobados. En la zona de edificio, se ejecutó la fundida de placa del tramo No. 2 del Módulo 8, así como la fundida de placas en el Módulo 2, tramos 1 y 2, garantizando la continuidad con las zonas previamente fundidas; adicionalmente, se realizó la fundida de columnas en el Módulo 8 y la fundida de columnas del Módulo 13 en la zona de pasarela, consolidando los elementos verticales del sistema estructural. En el Módulo 7, se llevó a cabo la fundida de vigas zarpas en las zonas 1 y 2, articuladas con las fundidas ejecutadas en periodos anteriores. En cuanto a los frentes subterráneos, se ejecutaron actividades de armado y fundida de muros en el túnel administrativo, sector No. 8, y la fundida de muros del túnel deportivo en la zona 2, sectores 7 al 10, asegurando la integración estructural entre zonas previamente ejecutadas y las intervenidas en el periodo; igualmente, se avanzó en el armado del tercer tramo de placa del túnel de ambulancias, específicamente en la zona 2. Finalmente, se efectuó la fundida de dados de cimentación en los Módulos 3 y 5, complementando las áreas ya ejecutadas y manteniendo la secuencia constructiva prevista. Todas estas actividades fueron objeto de seguimiento y control técnico, verificándose su correcta localización, alineación con el diseño estructural y coherencia con la programación de obra vigente (Diapositivas No 24 a la 33).

En el tema de los informes de instrumentación se leen las conclusiones a la fecha (Diapositiva 34-35):
✓ Durante el periodo comprendido desde el 01 al 05 de diciembre de 2025; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.
✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.03 m y 8.99 m.
✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 7 cm, las columnas de agua se encuentran entre 1.76 y 6.05 m de profundidad.
✓ Es importante proteger toda la instrumentación instalada para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE ELÉCTRICO:
No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 37)

AVANCE DE OBRA (Diapositiva 38-40)
Se ejecutaron actividades en el módulo 5, consistentes en la construcción de la caja CS276 y la instalación de tuberías eléctricas de 4 pulgadas, tanto en la entrada como en la salida de la subestación eléctrica. Las actividades se desarrollaron conforme a los diseños aprobados y la programación vigente. Se continua con construcción de cajas de inspección.

COMPONENTE HIDRÁULICO:
Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 41.
1) Entrega de las dos (2) alternativas para la conexión de GAS – Proyecto Velódromo – y entrega de planos GAS.(*) Remitir consolidado de trazabilidad al IDRD por parte de CIG (**) Se ejecuto reunión con VANTI el 16/12/2025.PENDIENTE. Descartadas dos alternativas y se esta pendiente a la llegada de la propuesta planteada durante reunion de VANTI del 16/12/2025.
2) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. La supervision Indica que se tiene programada por parte de la EAAB visita el dia 05/01/2026 al proyecto Velodormo segun lo descrito.
3) Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo PENDIENTE.
4) "Radicación respectiva de la solicitud de prorroga para la temporal de Obra de acueducto y alcantarillado ante la EAAB -Velódromo" CUMPLIDO.

AVANCE DE OBRA (Diapositiva 42)
Se adelantaron gestiones administrativas ante las empresas de servicios públicos, específicamente la elaboración de la solicitud de prórroga de la TPO de acueducto y alcantarillado, en concordancia con la prórroga otorgada a la licencia de construcción, garantizando la continuidad legal y técnica del proyecto.

TEMAS ADICIONALES TRATADOS

COMPROMISOS


TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (Depende de la propuesta de conexión y diseños respectivos de VANTI de acuerdo a la ultima REUNION 16/12/2025)	UTMP - VANTI	26/08/2025
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK	UTMP	18/12/2025
Actualización del BEP y posterior Seguimiento mesa de trabajo jueves 27/11/2025 informar Fecha en comité 88, entrega UTMP 09/12/2025 revisión CIG 12/12/2025 y radicado ante el IDRD el 15/09/2025. Presentación Actualización respectiva próximo comité 26/12/2025.	UTMP - CIG	22/12/2025
Radicados 14 Items de de Concreto (*) y radicados 95 APUS base CIO y contractuales ante el IDRD por parte de LA INTERVENTORIA CIG.(**). De los cuales 144 APUS dependen de los 150 INSUMOS radicados. (***) para un Total 239 APUS 253 para ser tenidos em cuenta para el miodificatorio No 3 (No incluyen los 14 Items de concreto ya tadicados). Pendiente respuesta del IDRD	IDRD	Sin Fecha
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. (17-12-2025) Respuesta con observaciones y/o remisión al IDRD por parte de CIG.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025
Texto aprobado Sub-Dirección Construcción IDRD - Modificatorio No 3 Obra	IDRD	31/12/2025
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación) Radicado el dia 19/12/202520252100566762	CIG	19/12/2025
ANUENCIA DADEP – DOCUMENTOS REMITIDOS AL IDRD (*) para gestión interadministrativa y radicar en debida forma ante la curaduría la revalidación /Modificación de la licencia de construcción por parte del IDRD.	IDRD	26/11/2025
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	23/12/2025
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha
Entrega de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP- IDRD- VANTI	16/12/2025
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 05/01/2025	IDRD	Sin Fecha
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD	IDRD – CIG-UTMP	Sin Fecha

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

N-A

Siendo las _10:40 a.m._ se da por terminado el Comité TECNICO/TRANSVERSALES - VELÓDROMO No 90, en constancia se adjunta Listado de asistencia.				
PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**		
FIRMA		**FIRMA**	N.A	N.A
NOMBRE	**EDGAR SOLORZANO MEDINA**	**NOMBRE**	N.A	N.A
CARGO	**COORDINADOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO**	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Ing. ARTURO ROJAS TORRES - Residente 2 Interventoría

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite en Obra Nº 90,2 Velodromo.

FECHA 18/12/2025 HORA INICIAL 8:00 am HORA FINAL 9:32 Am LUGAR PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Juan Pablo Villate Diaz	1014210532	Apoyo tecn.	STC		IDRD	Juan-villatec@	3197012374
2	Francy Liliana Murillo	52968323	Apoyo Tecnico	STC		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043808785
3	Carmen Lucia Velez Cardenas	65777928	Apoyo Social	STC		IDRD	Carmen.velez@idrd.gov.co	
4	Angela Milena Sánchez C.	1020.739.111	Programación	UTMP		UTMP	programacion.velodromo@cyg.com.co	
5	CARLOS E GUZMAN SANCHEZ	79617888	RESIDENTE OBRA	UTMP		UTMP	residente1.velodromo 3136 @cyg.com.co	3005824
6	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Apoyo Tecnico	STC		IDRD		
7	Oscar Javier Soto Ortega	80761720	Apoyo Técnico	STC		IDRD	Oscar.Soto@IDRD	3002101408
8	Alfonso Pescarolo Suarez	88235391	Director	UTMP		UTMP	a.pescarolo@cygcom.co	
9	Jairo Parra Reyes	1143829208	Apoyo Técnico	STC		IDRD	jairo.parra@idrd.gov.co	3052150830
10	Katherin Amaya Rou	1016026233	Sub Directora	STC		IDRD	katherin.amaya@	3174908609
11	Javier O Sanchez Lagos	1014177632	Apoy Tec Super	STC		IDRD	javier.sanchez@idrd.gov	3014514635
12	Ivonne L. Agudelo Gutierrez	1013601022	Apoyo Tecnsv.	STC		IDRD	ivonne.agudelo@idrd.gov.co	3144220
13	Julián Ricardo Agudelo Niño	80767393.	R. Ambiental	Interventoria		CIG	julianagudelo.ingeniero@gmail.com	3202336371
14	Indry Rosario Mayorga	1051954940	R. SGSST In.	CIG.		CIG	interventoria.velodromo@	3202549811
15	Astrid Viviana Rojas Cardozo	52932504	P. GRD	CIG		CIC		3157494502
16	Diana Marcela Ortiz	1014200077	Res. Saud	UTMP		UTMP	Saud.velodromo@	3153435487
17	Paula Blanco Alarcón	1073383650	Res Amb	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
18	JOHN H. RAMOS P.	80002208	COORDINADOR	UTMP		UTMP	coordinador.bim@cyg.com.co	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.b

113

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité de obra 90.2 Velodromo

FECHA: 18-12-2025 HORA INICIAL: 8:00 AM HORA FINAL: 9:32 AM LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Lauramorales	1118565112	Residente BIM	CBC			Laura.mp227@gmail.com	3102123494
2	Daniela Prieto Rodriguez	1018490778	Apoy. Transversal Ingeniería	STC				
3	LINA JOHANNA FALLA L.	52.517.090	AP. SOP. AMBIEN.	IDRD		IDRD	lina.falla@idrd.gov.co	3103143272
4	Ingrid Johanna Barrientos Murcia	1090493553	PROF. GRD.	UTMP.		UTMP.	riesgos.velodromo@cyg.com.co	3155589967
5	EDGAR SOLORZANO HERRERA	19221971	Coor. Tec. Inst.	P.I.G.		P.I.G.		
6	Andres Vega	79882811	Dir Tec	UTMP		UTMP	avega@cyg.com	3112577333
7	Jose Luis Chavez	79855757	Ing. Local	UTMP		UTMP		
8	Eduard Antonio Corredor	80383913	Residente Inst. Electricas	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290201
9	Luz Stella Rodriguez	31432856	Ing. SST	UTMP		UTMP	sst2.velodromo@cyg.com.co	3214693331
10	Ivone Faibelly Alvarez Gonzalez	1032468305	Ref. Costos y Proy	UTMP		UTMP		3137705723
11	Jose M. Galeano V.	80.031.322	Residente	UTMP.		UTMP	estructural.velodromo@cyg.com.co	3105710274
12	Diego F Castro	1110453573	Prof Calidad	UTMP		UTMP	Calidad.velodromo@cyg.com.co	3170715177
13	Ivonn Perez Tellez	1026279000	Apy Interdis	STC		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	
14	Barbara Paola Sosa Lindo	52996077	Apoy Social	STC - IDRD		IDRD	barbara.sosa@idrd.gov.co	
15	Wilber Pinto Sanchez	1053806234	Prof. BIM	Interv		CIG		
16	Diego Leon Bello	1075652	Ing. Estructural	Interv		CTC		
17	Antonio Rojas Torres	13873937	Residente	CIG		CIG	interventor.velodromo@gmail.com	5766440036
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

Marca temporal	Nombre	Cedula:	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
16/12/2025 9:53:09	javier sanchez	1014177632	javier.sanchez@idrd.gov.co	Apoyo Tecnico a la Supe	IDRD	
16/12/2025 9:53:21	Ivonne Aguilar	1013601022	ivonne.aguilar@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD- STC	3114002656
16/12/2025 9:53:27	Lina Johanna Falla	52517090	lina.falla@idrd.gov.co	Apoyo supervisión comp	IDRD	3103143272
16/12/2025 9:54:08	Paula Blanco	1073383630	ambiental.velodromo@cyg.com.co	Residente ambiental	UTMP	3024219947
16/12/2025 9:54:29	Carmen Lucía Vélez Cárc	65777928	carmen.velez@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión c	IDRD	3204054770
16/12/2025 9:54:37	CESAR FERNANDEZ SOL	80109419	contingencias.velodromo@cyg.com.co	PROFESIONAL AMBIENT	UTMP	3002662060
16/12/2025 9:54:58	Claudia Infante Jaimes	68248723	claudiabiouis@gmail.com	Bióloga	UTMP	3202701471
16/12/2025 9:57:40	Jairo Parra Reyes	1143829208	jairo.parra@idrd.gov.co	Contratista STC	IDRD	3052150830
16/12/2025 9:57:44	Mary Luz Ramirez Carvaj	52494809	socialvelodromo6@gmail.com	Profesional social	Interventoría	3132205175
16/12/2025 9:58:01	Juan Pablo Villate Diaz	1019010837	juan.villate@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD	3197021334
16/12/2025 9:58:04	Lindy Rubiano Moyano	1051954740	interventoria.sgsstvelodromo@gmail.com	Residente SGSST Interve	Consorcio Interventores	3202548911
16/12/2025 9:58:24	Edgar Solórzano Medina	19222971	corint.carvel.2@gmail.com	Coordinador Técnico de I	Consorcio Interventores	3124326589
16/12/2025 9:58:41	Alfonso Peñaranda Suar	88235391	a.penaranda@cyg.com.co	Director	UTMP	3008620623
16/12/2025 9:58:49	Astrid Viviana Rojas C	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Prof. Gestión del Riesgo	Consorcio Interventores	3157994502
16/12/2025 9:59:21	Bibiana Paola Sosa Linar	52996077	bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo a la supervision S	IDRD	3134649125
16/12/2025 10:01:02	Francy Murillo	52968323	francy.murillo@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión	IDRD	3043808785
16/12/2025 10:06:35	Ivonn Perez Tellez	1026279000	ivonn.perez@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión	IDRD	3223578250
16/12/2025 10:07:08	Diana Marcela Ortiz	1014212007	dortiz.ts@gmail.com	Residente social	UTMP	3153935487
16/12/2025 10:10:14	Juan Jaiver Espinel Silva	1070956933	r.forestal.velodromo@gmail.com	Residente Forestal	Unión Temporal Metropo	3118778828
16/12/2025 10:10:37	Julián Ricardo Agudelo	80767393	julianagudeloingeniero@gmail.com	Residente ambiental	CIG	3202336372
16/12/2025 10:11:45	Eleana Suaza García	1026267356	eleana.suaza.biologa@gmail.com	Bióloga	CIG	3115049944
16/12/2025 10:17:33	Johanna Barrientos	1090495553	riesgos.velodromo@cyg.com.co	Profesional gestión del ri	Unión temporal Metropol	3125587967
16/12/2025 10:17:35	Luz Stella Rodriguez	31432956	sst2.velodromo@cyg.com.co	Residente SST	UTMP	3214693331
16/12/2025 10:19:02	Arturo Rojas Torres	13873937	interventoria.velodromo@gmail.com	Residente	CIG	3166420036



COMPONENTE BIM


Compromisos


DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (**)	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – PRESENTACION PRELIMINAR próximo comité 18/12/2025.	UTMP	18/12/2025	PENDIENTE
Actualización del BEP y posterior Seguimiento mesa de trabajo jueves 27/11/2025 informar Fecha en comité 88, entrega UTMP 09/12/2025 revisión CIG 12/12/2025 y radicado ante el IDRD el 15/09/2025 Presentación Actualización respectiva proximo comité 18/12/2025.	UTMP - CIG	18/12/2025	ENTREGADO Y EN REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA

(**) Depende de la propuesta de conexión y diseños respectivos de VANTI de acuerdo a la ultima visita 17/12/2025 . Se propone Gestión IDRD-VANTI para seguimiento y agilización de entrega dos (2) alternativas para la conexión Proyecto Velódromo. Radicado ante el IDRD trazabilidad respectiva el 04/12/2025 Rad. No 20252100544352. y en gestiones Interinstitucionales IDRD-VANTI

IDRD BOGOTÁ

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 2

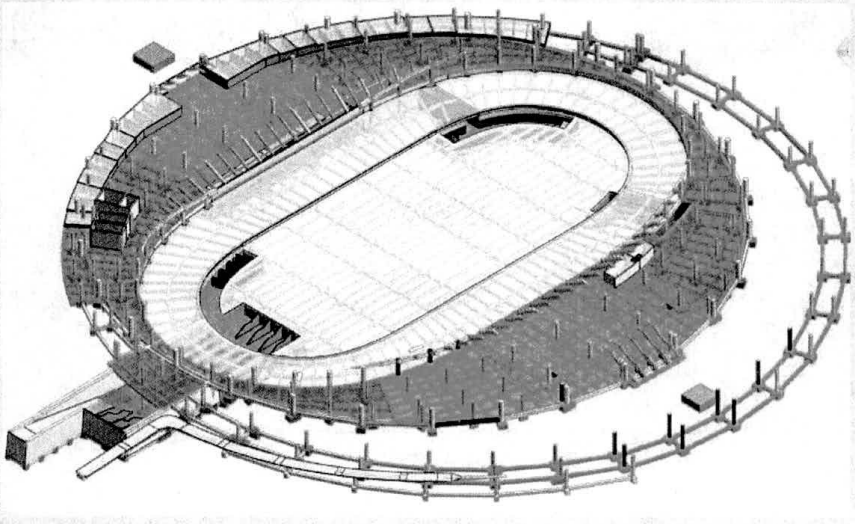





- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

Volumen total	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.325,096	1.806,691	0,00 % — 21.70 % — 100,00 %

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 2

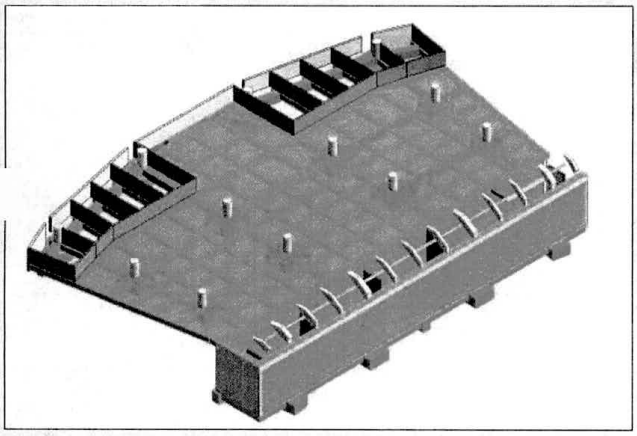




UBICACIÓN EN EL PROYECTO

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

Volumen total	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
93,660	74,312	79.34 %	DADOS
Volumen total (m3) 251,306	Volumen total fundido (m3) 126,986	50.53 %	LOSAS
Área total (m2) 1.952,32	Área total fundida (m2) 938,29	48.06 %	
Volumen total (m3) 155,501	Volumen total fundido (m3) 92,527	59.50 %	MUROS
Área total (m2) 662,16	Área total fundida (m2) 308,45	46.58 %	
Volumen total (m3) 140,873	Volumen total fundido (m3) 16,213	11.51 %	VIGAS CIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 3

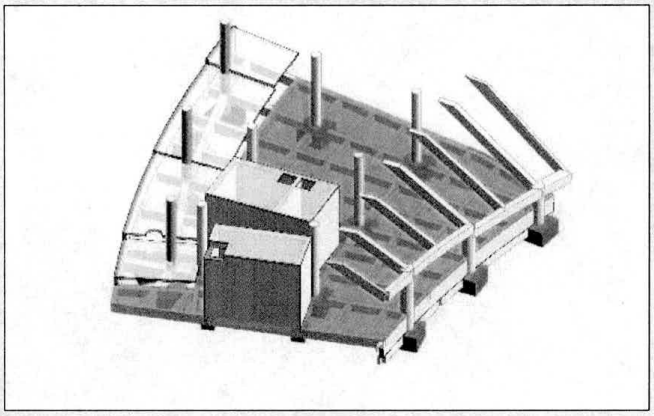




UBICACIÓN EN EL PROYECTO

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
17,792	4,852	27.27 %	COLUMNAS
Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance	
57,49	17,70	30.79 %	

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
42,012	7,710	18.35 %	DADOS

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / MÓDULO 5

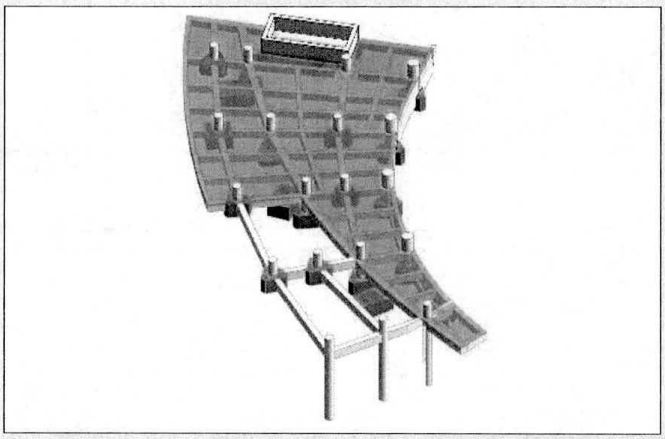





UBICACIÓN EN EL PROYECTO

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
43,690	1,698	3.89 %	DADOS

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / TÚNEL PRINCIPAL

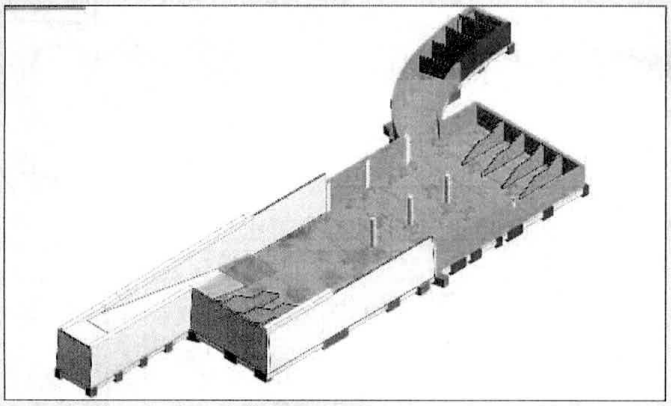





UBICACIÓN EN EL PROYECTO

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

Volumen total (m3) 82,613	Volumen total fundido (m3) 19,434	% Avance 23.52 %	DADOS
Volumen total (m3) 184,426	Volumen total fundido (m3) 168,097	% Avance 91.15 %	LOSAS
Área total (m2) 949,34	Área total fundida (m2) 840,49	% Avance 88.53 %	
Volumen total (m3) 246,479	Volumen total fundido (m3) 78,268	% Avance 31.75 %	MUROS
Área total (m2) 945,77	Área total fundida (m2) 262,14	% Avance 27.72 %	
Volumen total (m3) 95,751	Volumen total fundido (m3) 41,873	% Avance 43.73 %	VIGAS CIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / TÚNEL DE DEPORTISTAS

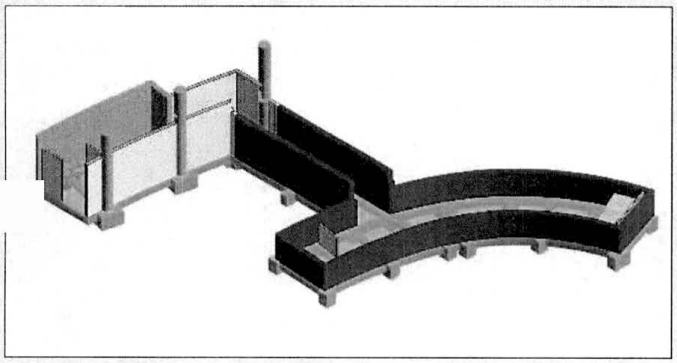




UBICACIÓN EN EL PROYECTO


- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
- EN EJECUCIÓN

Volumen total (m3) 98,800	Volumen total fundido (m3) 69,764	% Avance 70.61 %	MUROS
Área total (m2) 340,28	Área total fundida (m2) 233,66	% Avance 68.67 %	
Volumen total (m3) 8,205	Volumen total fundido (m3) 8,205	% Avance 100.00 %	COLUMNAS
Longitud total (m) 20,61	Longitud total fundida (m) 20,61	% Avance 100.00 %	
Volumen total (m3) 20,245	Volumen total fundido (m3) 20,245	% Avance 100.00 %	DADOS
Volumen total (m3) 44,813	Volumen total fundido (m3) 43,851	% Avance 97.85 %	LOSAS
Área total (m2) 227,27	Área total fundida (m2) 219,25	% Avance 96.47 %	
Volumen total (m3) 27,634	Volumen total fundido (m3) 27,634	% Avance 100.00 %	VIGAS CIMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN - ESTRUCTURA EN CONCRETO / PASARELA MÓDULO 14

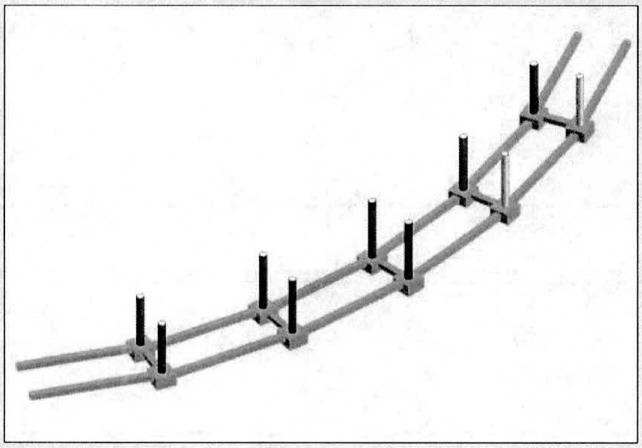


ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO PARA INICIO HASTA 25 DE DICIEMBRE DE 2025
EN EJECUCIÓN



UBICACIÓN EN EL PROYECTO

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
17,643	14,179	80.37 %	COLUMNAS
Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance	
62,40	50,15	80.37 %	
Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
28,900	28,900	100.00 %	DADOS
Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance	
32,044	32,044	100.00 %	VIGAS CIMENTACIÓN

AVANCE DETECCION INTERFERENCIAS - 2025

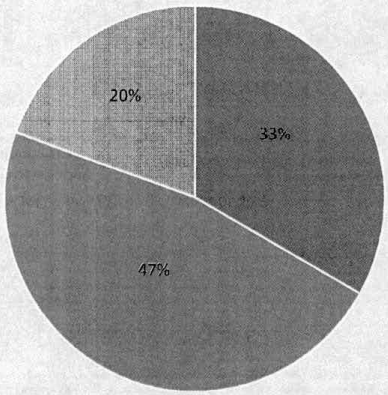

Línea base 14479 interferencias

- Aplicación de Reglas CIG - 4807
- Modelos Actualizados UTMP - 6854
- Pendientes por resolver - 2818

Etapa	Descripción	N° de Interferencias	Reducción vs. Etapa Anterior	Reducción Acumulada vs. Inicial
Prueba 5	Línea Base (Bruta)	14,479		0%
Prueba 6	Aplicación de Reglas 1 Filtro Basico (Omitir Datos vs. Pilotes)	12,964	1,515	10.46%
Prueba 7	Modelos Actualizados por Constructor	11,952	1,012	6.99%
Prueba 8	Aplicación de Reglas 2 (Omitir Mampostería vs. MEP)	10,267	1,685	11.64%
Prueba 12	Modelos Actualizados por Constructor	5,897	4,370	30.18%
Prueba 14	Aplicación de Reglas 3 y 4 (Omitir Tubos vs. Suelos) (Omitir Pilotes vs. Pozos)	4,290	1,607	11.10%
Prueba 16	Modelos Actualizados por Constructor	2,818	1,472	10.17%

COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN

Radicados 14 Items de de Concreto (*) y radicados 95 APUS base CIO y contractuales ante el IDRD por parte de LA INTERVENTORIA CIG.(**). De los cuales 144 APUS dependen de los 150 INSUMOS radicados. (***) para un Total 239 APUS 253 para ser tenidos em cuenta para el miodificatorio No 3 (No incluyen los 14 Items de concreto ya tadicados). Pendiente respuesta del IDRD	IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Revisión de Cierre de facturación a final de 2025 (31/12/2025) – Análisis Basado en la programación REAL del proyecto. Se tiene escenario muy OPTIMISTA y PESIMISTA se depende de los reconocimientos planteados de membrana. Se hizo remisión al IDRD de la proyección del PAC a 2027.	UTMP - CIG	12/11/2025	CUMPLIDO
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. (17-12-2025) En revisión CIG.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025	CUMPLIDO
Texto aprobado Sub-Dirección Construcción IDRD - Modificatorio No 3 Obra	IDRD	31/12/2025	VIGENTE
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG Suministro e Instalación).(***)	CIG	03/12/2025	PENDIENTE

(*) Radicado IDRD No 20252100514232 del 18/11/2025

(**) Radicado IDRD No 2025100554592 de 11/12/2025

(***) Radicado IDRD No 20252100519882 del 20/11/2025 y Radicado IDRD No 2025210053 492 del 27-11-202

ESTADO DE REVISION INFORMES DE INTERVENTORIA POR PARTE DEL IDRD Y PAGOS RESPECTIVOS

INFORME No.	PERIDODO	ESTADO
18	26 de junio al 25 de julio de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
19	26 de julio al 25 de agosto de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
20	26 de agosto al 25 de septiembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
21	26 de septiembre al 25 de octubre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad.
22	26 de octubre al 25 de noviembre de 2025	Pendiente por revisar y aprobar los informes: técnico, ambiental, fauna, forestal, SST, calidad y social

ESTADOS FINANCIEROS INTERVENTORÍA PROYECTO 2				
CONCEPTO	VALOR	No. RADICADO	FECHA	ESTADO
Valor Total	**$ 7.607.817.556,00**			
Hasta el 90%	**$ 6.847.035.800,40**			
Acta De Pago No.13	$ 131.098.878,00	20252100535372	01-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No.14	$ 395.968.576,00	20252100546612	05-dic-25	TRAMITADA
Acta De Pago No.15	$ 189.405.670,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.16	$ 11.096.625,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.17	$ 9.116.564,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.18	$ 47.440.544,00			PENDIENTE
Acta De Pago No.19	$ 118.315.394,00			PENDIENTE
Pte PAGO	**$ 902.442.251,00**			
% Pte PAGO	**11,86%**			


REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 75.475.287.344,01	51,07%
% EJECUCIÓN	$ 75.643.657.361,90	51,18%
% COSTO	$ 75.643.657.361,90	51,18%

AVANCE	0,11%

13/12/2025 programación v3

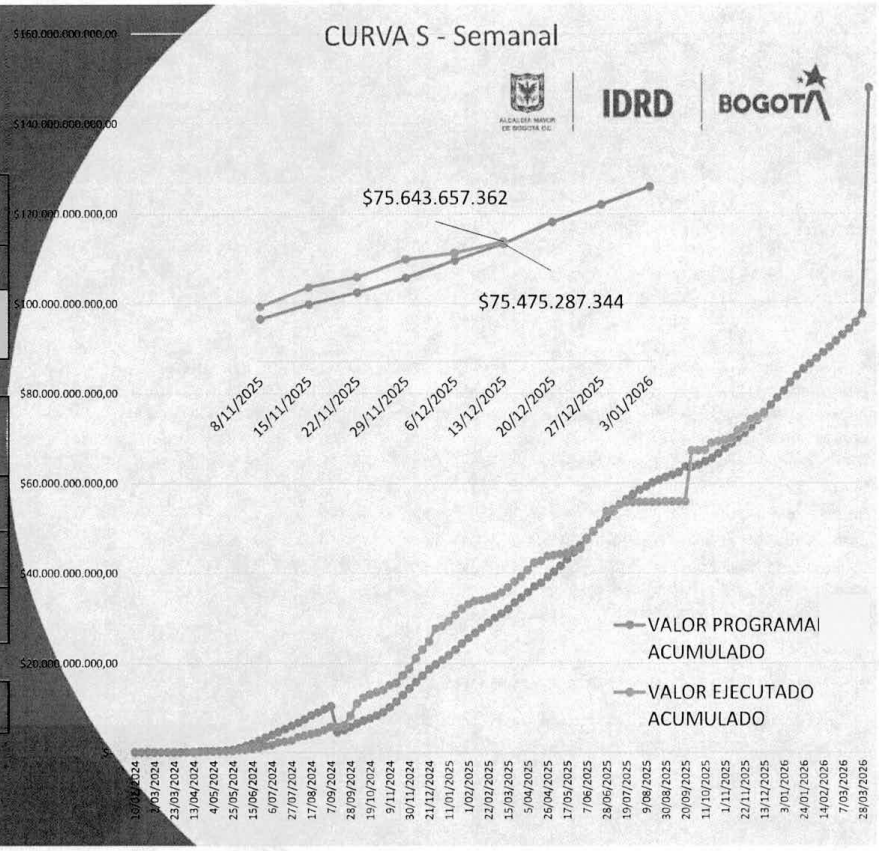

CAPÍTULO	Modificatorio 1 AIU	Modificatorio 2 AIU	ADICIÓN
PRELIMINARES	$ 1.022.595.510,00	$ 1.022.361.676,00	-$ 233.834,00
CIMENTACIÓN	$ 24.121.713.133,00	$ 26.844.904.023,00	$ 2.723.190.890,00
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 39.231.255.196,00	$ 42.621.903.944,00	$ 3.390.648.748,00
CONCRETO	$ 11.218.302.074,00	$ 14.674.309.189,00	$ 3.456.007.115,00
ACERO/MALLAS	$ 18.160.390.368,00	$ 9.548.194.506,00	-$ 8.612.195.862,00
ESTRUCTURA METÁLICA	$ 13.434.795.000,00	$ 26.024.337.020,00	$ 12.589.542.020,00
CUBIERTA	$ 7.909.811.667,00	$ 8.117.728.708,00	$ 207.917.041,00
CARPINTERÍA	$ 9.234.682.282,00	$ 7.064.994.464,00	-$ 2.169.687.818,00
PISOS	$ 1.291.343.798,00	$ 1.244.071.882,00	-$ 47.271.916,00
ELÉCTRICAS	$ 2.249.278.929,00	$ 5.426.457.278,00	$ 3.177.178.349,00
HIDRÁULICA	$ 2.292.248.689,00	$ 3.678.167.777,00	$ 1.385.919.088,00
MAMPOSTERÍA / PAÑETE / PINTURA	$ 1.227.658.568,00	$ 974.031.120,00	-$ 253.627.448,00
HVAC	$ 413.876.395,00	$ 4.138.767,00	-$ 409.737.628,00
VIDEO	$ 320.117.179,00	$ 3.201.171,00	-$ 316.916.008,00
DOTACIÓN CONTRACTUAL	$ 225.472.626,00	$ 225.472.626,00	$ -
SONIDO	$ 21.789.817,00	$ 217.897,00	-$ 21.571.920,00
APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES	$ 15.038.188,00	$ 38.378,00	-$ 14.999.810,00
ACABADOS	$ 101.563.657,00	$ 21.423,00	-$ 101.542.234,00
CERRAMIENTO Y PINTURA	$ 4.373.827,00	$ 43.740,00	-$ 4.330.087,00
EQUIPAMIENTO URBANO	$ 2.217.235,00	$ 22.171,00	-$ 2.195.064,00
SEÑALETICA	$ 6.770.574,00	$ 67.705,00	-$ 6.702.869,00
SILVICULTURA	$ 4.424.574,00	$ 44.243,00	-$ 4.380.331,00
TOTAL	$ 132.509.719.286,00	$ 147.474.729.708,00	$ 14.965.010.422,00
REEMBOLSABLE	$ 311.927.320,00	$ 311.927.320,00	
Total	$ 132.821.646.606,00	$ 147.786.657.028,00	

IDRD BOGOTÁ

PRESUPUESTO

MOD. 2

FACTURACIÓN DEL PROYECTO

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.835,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
TOTAL 2025			$ 42.884.029.994,00	$ 12.842.066.430,00	$ 30.041.963.564,00
TOTAL VELODROMO			$ 70.258.148.335,00	$ 21.054.301.933,00	$ 49.203.846.402,00


IDRD BOGOTÁ

MES DE OCTUBRE DE 2025

SEGUIMINENTO PRESUPUESTAL

IDRD BOGOTÁ



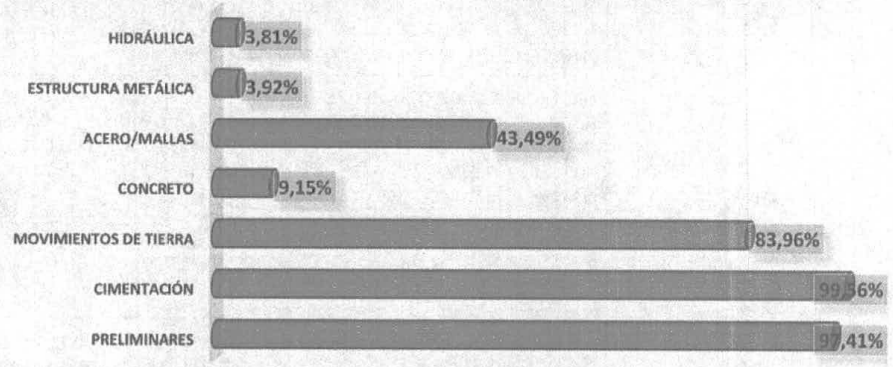

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 28.945.354.284,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.785.295.176,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 45.902.784,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.725.617.182,00
ACERO	$ 3.973.552.532,00		$ 178.635.272,00		$ 4.152.187.804,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
CONCRETOS	$ 1.088.471.728,00		$ 254.549.952,00		$ 1.343.021.680,00
HIDRAULICO	$ 140.124.825,00				$ 140.124.825,00
ESTR. METALICA	$ 1.020.722.288,00				$ 1.020.722.288,00
Total general	$ 58.694.890.732,00	$ 3.359.341.754,00	$ 1.823.457.406,00	$ 6.285.143.403,00	$ 70.162.833.295,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO PARA LOSA DE CONTRAPISO Y/O FUNDACION, FABRICADOS EN POLIETILENO EXPANDIDO CON MATERIAL TIPO ICOPOR, DENSIDAD 8 KG/M3 RECUBIERTO EXTERIORMENTE EN POLIETILENO CAL 3	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.	CONTINUA
MODULO 7 Y 8, PASARELA	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE TUBERÍA PVC –S, YEE, SEMICODOS, CODOS, SIFON, SALIDAS SANITARIAS.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7 Y 8, PASARELA	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
MODULO 2, 7 Y 8	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. INLCUIDO LOS TRASIEGOS.	CONTINUA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	



COMPONENTE TÉCNICO

Compromisos


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
ANUENCIA DADEP – DOCUMENTOS REMITIDOS AL IDRD (*) para gestión interadministrativa y radicar en debida forma ante la curaduría la revalidación /Modificación de la licencia de construcción por parte del IDRD.	IDRD	26/11/2025	Sin fecha
Solicitud de aclaración al profesional jurídico de la curaduría respecto del alcance necesario, teniendo en cuenta que el constructor responsable figura como titular en el acto administrativo emitido por el IDRD de la prorroga a la Licencia de Construcción Vigente.	UTMP - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización de 10 Paneles - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDRD | BOGOTÁ


MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA

AVANCE EN CORTE

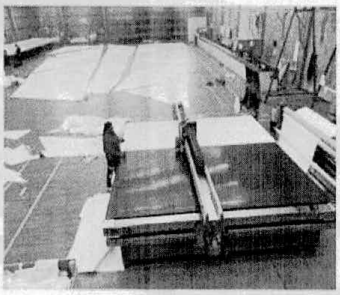

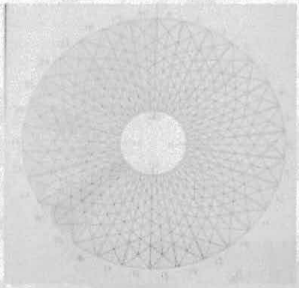



SECCIONADO PARA NACIONALIZACIÓN

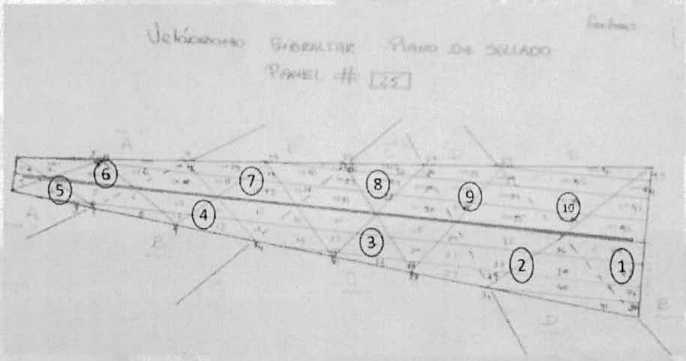

AVANCE EN SELLADO





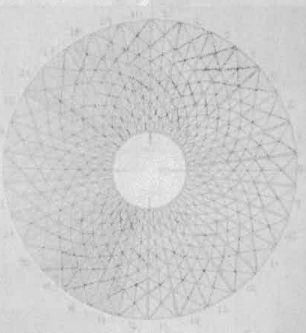

10 SECCIONES POR PANEL

TOTAL A NACIONALIZAR: (341,85 m2/Panel) * 30 Paneles = 10.256 m2

AVANCE EN SELLADO (m2): 10.256 m2 = 10.256 m2/ 10.256 m2 = 100%

TOTAL MÓDULOS DE PANEL SELLADAS = 300 Unidades y/o Secciones

TOTAL SECCIONES NACIONALIZADAS A LA FECHA = 100 Unidades y/o Secciones

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
[illegible]-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 07 de Diciembre de 2025	6,66 Ton
dic-25	07 de Diciembre al 14 de Diciembre de 2025	1,65 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	236,21 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***236,21 Ton***


TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **21,73%**

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
					Total	19 Unds		Total	170,32 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA

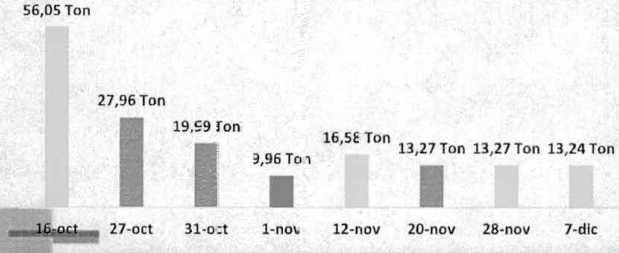

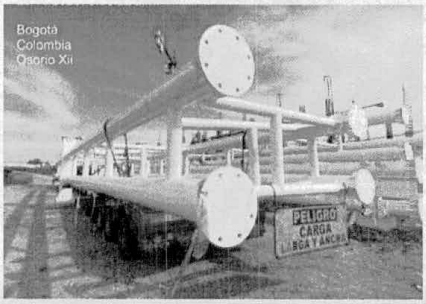


Elementos Ingresados del 08 al 14 de Diciembre:


No se presentó envío.

TOTAL : 170,32 TON.

120
1297

FUNDIDA DE 3cer Tramo de PLACA MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

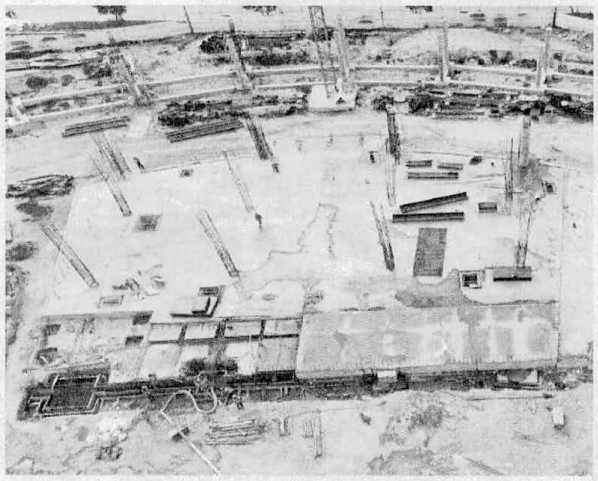

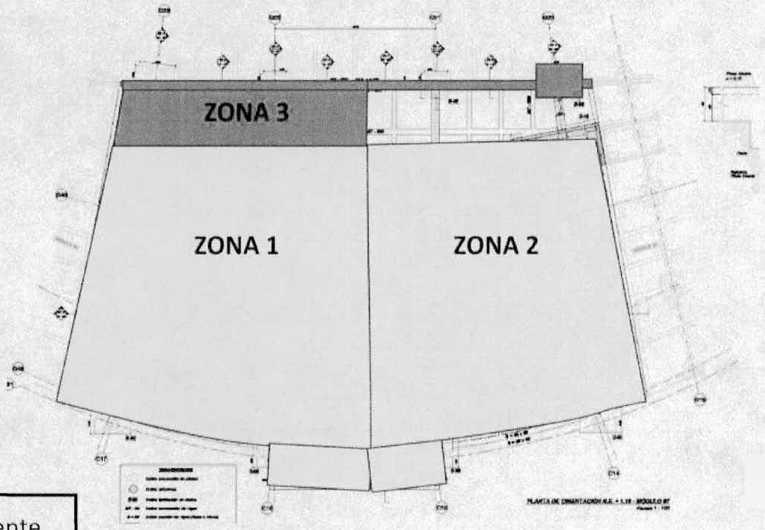



Zcna Fundida Previamente

Zcna Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 7

FUNDIDA DE 3cer Tramo de PLACA MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

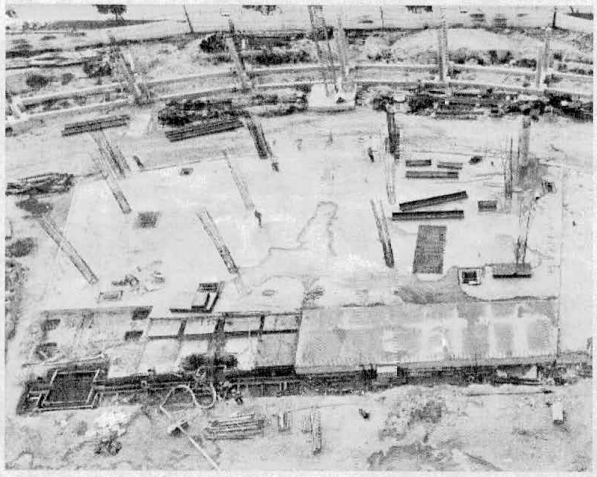

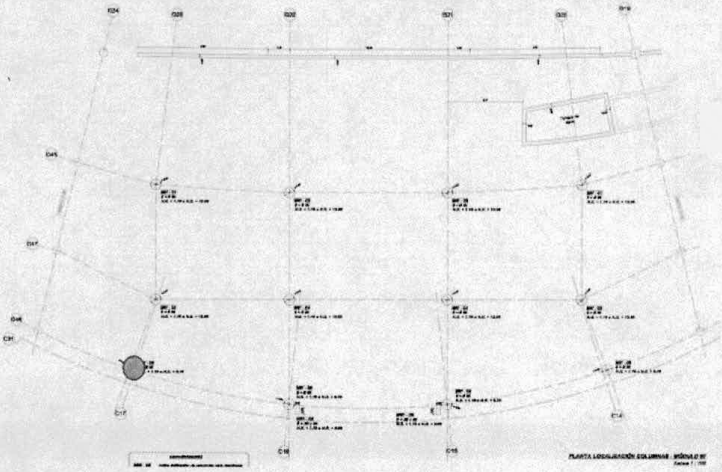



Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08


ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS TUNEL ADMINISTRATIVO

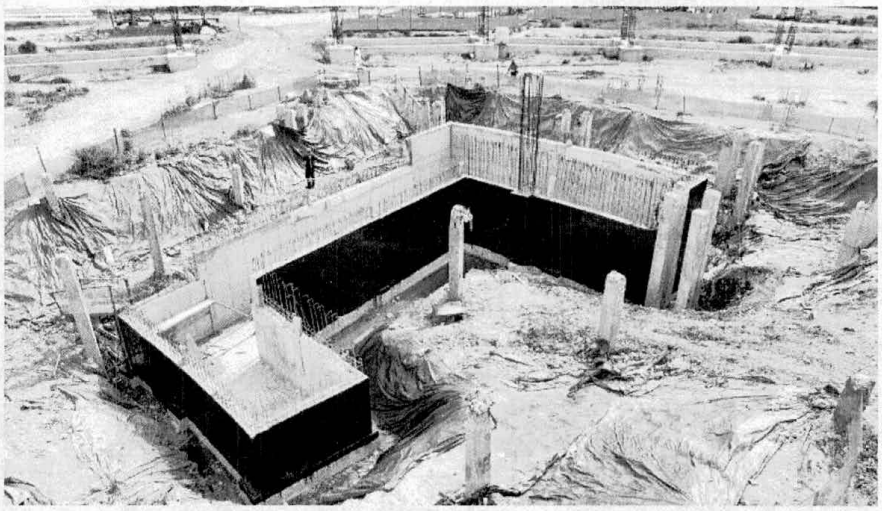


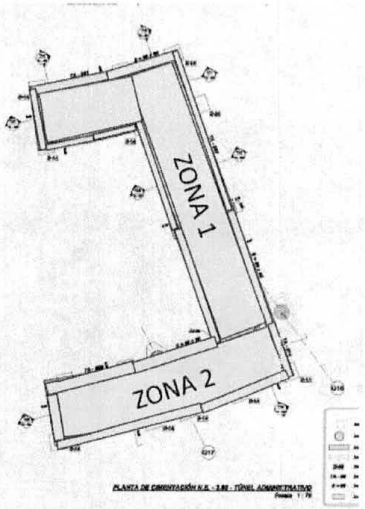

PLANO TA – E01
PLANTA ESTRUCTURA_
TUNEL ADMINISTRATIVO

FUNDIDA DE MURO TUNEL DEPORTIVO – Zona 2 Sectores 11 al 14

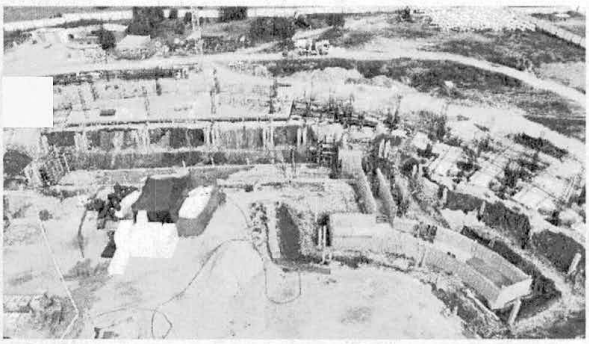

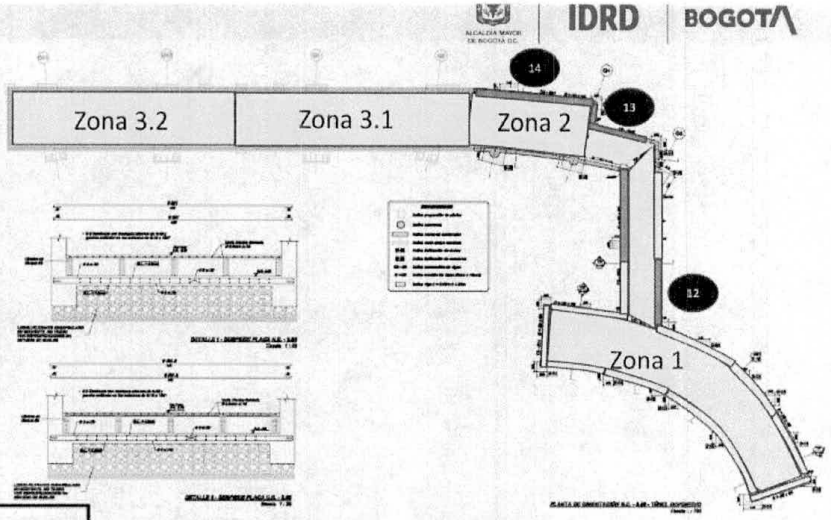

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL
DE AMBULANCIAS

121
1244

ARMADO Y FUNDIDA DE MUROS TUNEL DE AMBULANCIA – Tramos 1 y 2



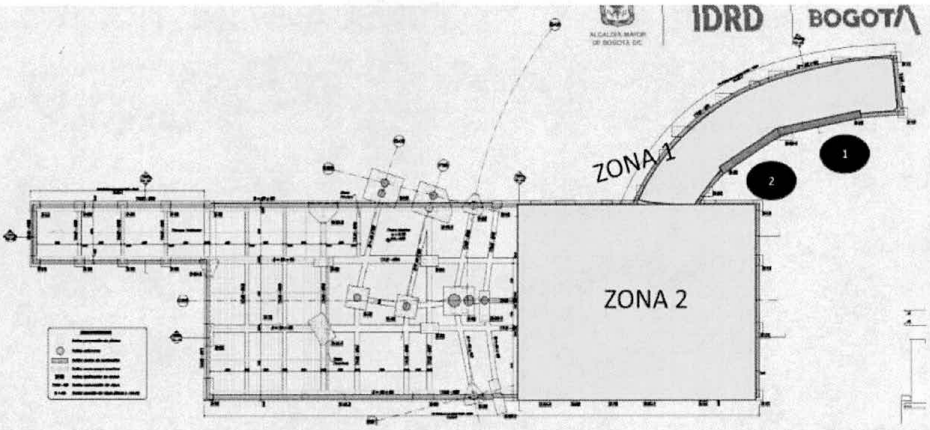



Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 8 – ZONA DE EDIFICIO

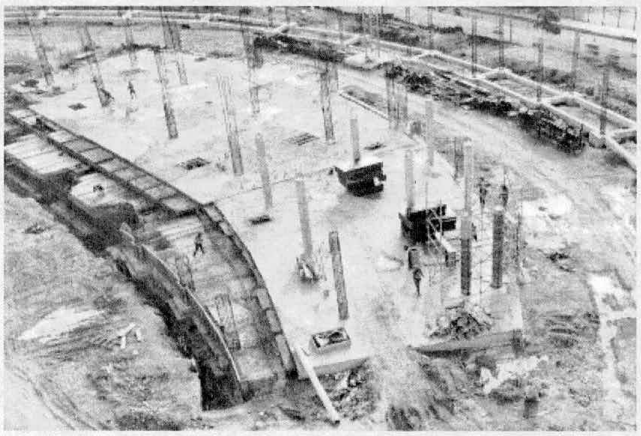

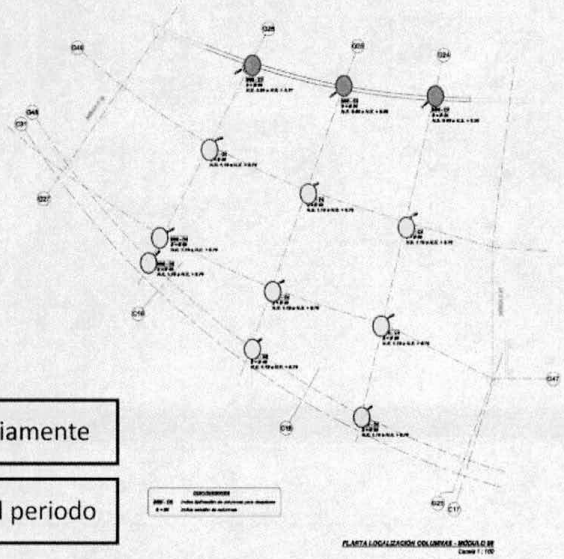


Columnas Fundidas Previamente

Columnas Fundidas En el periodo


PLANO M8 – E01
PLANTAS ESTRUCTURALES MÓDULO 8

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 14 – ZONA DE PASARELA

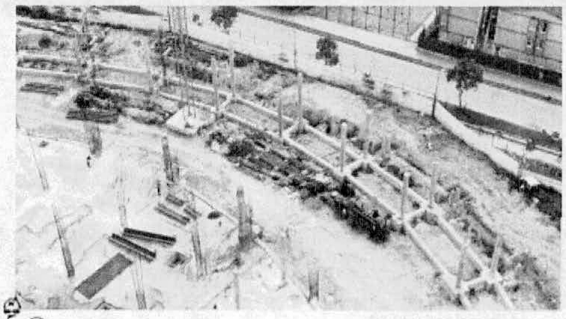

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

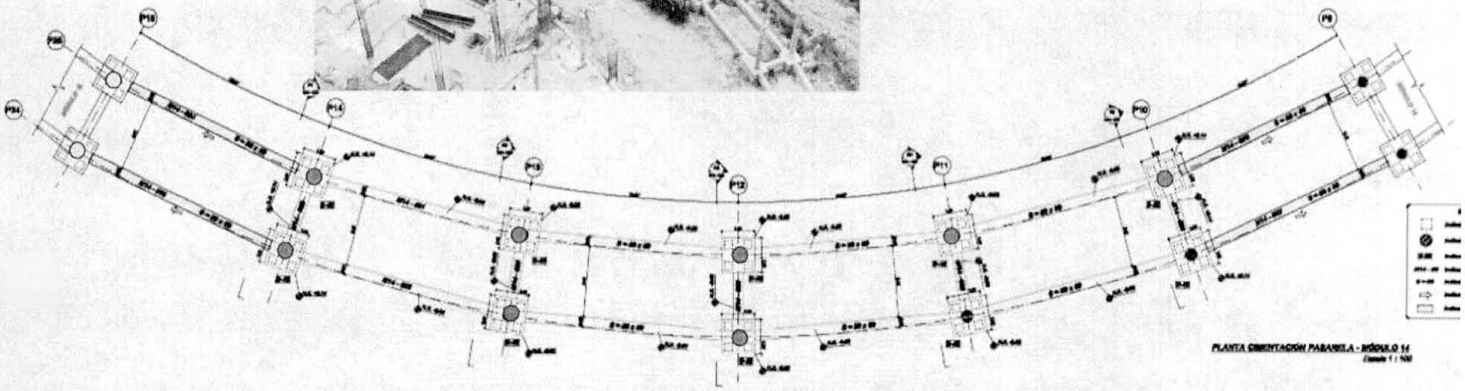


PLANO M14-E01
PLANTA ESTRUCTURALES MÓDULO 13 -PASARELA


FUNDIDA DE DADOS MÓDULO 3– ZONA DE EDIFICIO

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo



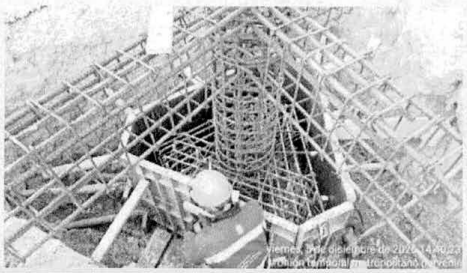

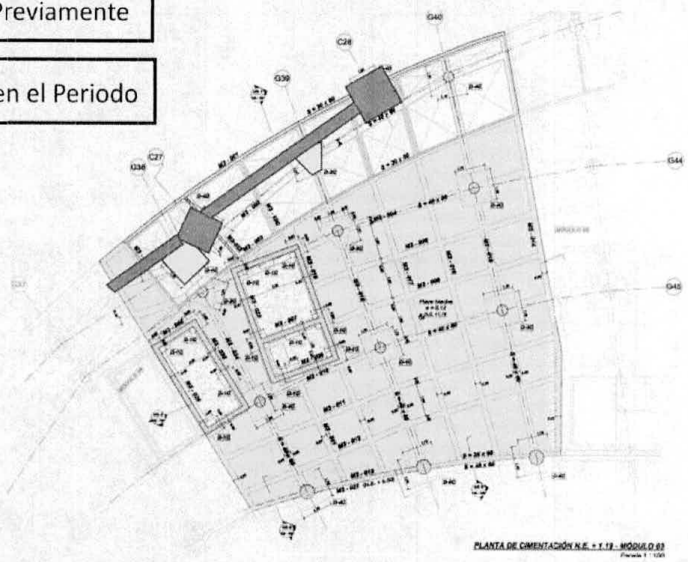



PLANO M3 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 3

FUNDIDA DE DADOS MÓDULO 5– ZONA DE EDIFICIO

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

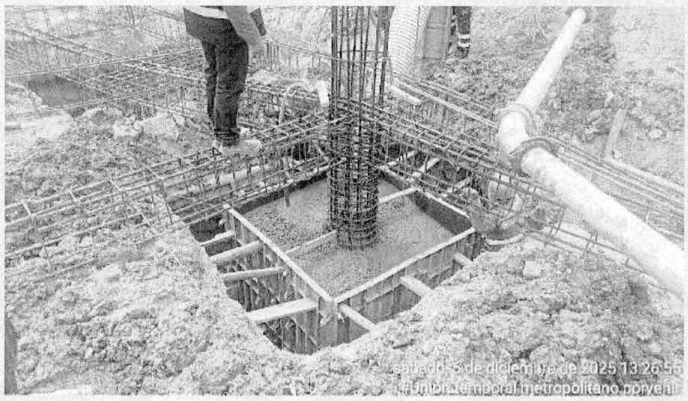


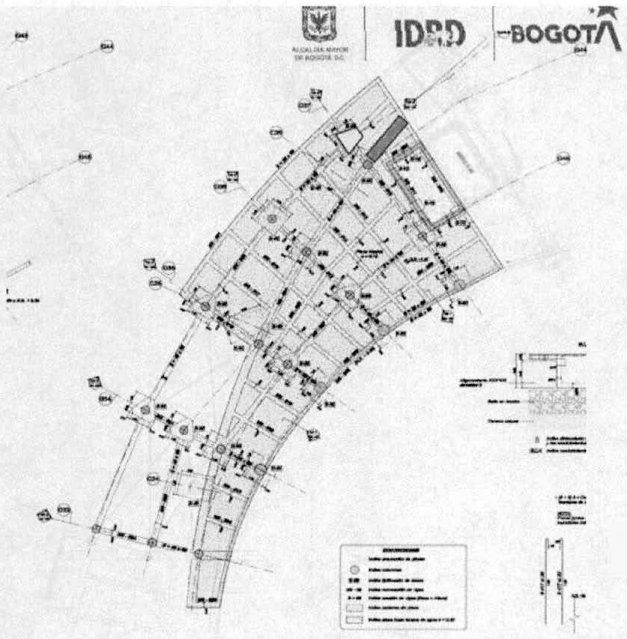

PLANO M5 – E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN - MÓDULO 05

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

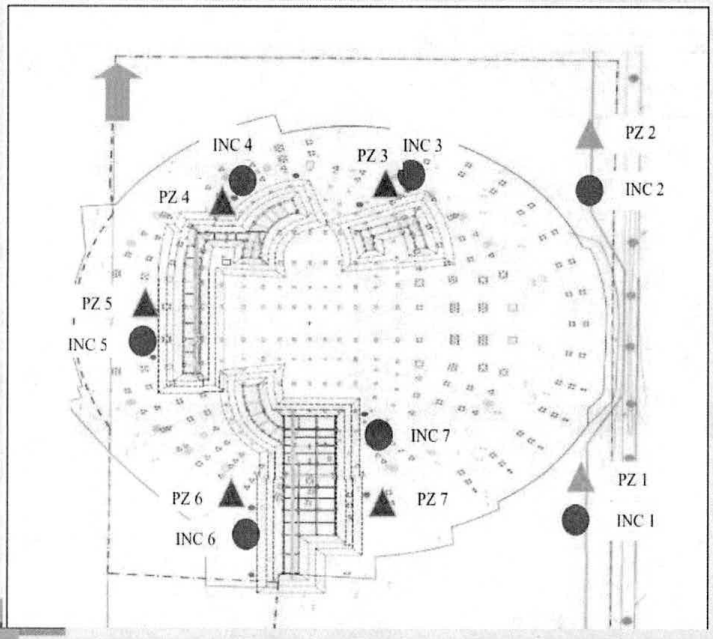

INCLINOMETRO

PIEZOMETRO CASAGRANDE

PIEZOMETRO DE HILO

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 01 al 05 de diciembre de 2025; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.
- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.03 m y 8.99 m
- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 7 cm, las columnas de agua se encuentran entre 1.76 y 6.05 m de profundidad.
- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

CONTROL DE ASENTAMIENTO

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO PARCIAL	ASENTAMIENTO ACUMULADO	DESCRIPCION	
N-1	2541,660	-0,002	-0,001	PARAMENTO	
N-2	2541,659	-0,004	0,011	PARAMENTO	
N-3	2541,575	-0,003	0,009	PARAMENTO	
N-4	2542,43	-0,003	-0,019	CERRAMIENTO	
N-5	2542,221	-0,001	0,016	CERRAMIENTO	
N-6	2543,941	-0,001	-0,019	CERRAMIENTO	
N-7	2543,962	-0,001	0,015	CERRAMIENTO	
N-8	2543,816	-0,001	0,020	CERRAMIENTO	
N-9	2544,448	-0,001	0,013	CERRAMIENTO	
N-10	2547,607	-0,001	-0,029	CERRAMIENTO	
N-11	2546,929	-0,001	-0,024	CERRAMIENTO	
MA-12	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-13	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-14	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-15	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-16	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-17	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-18	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-19	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-20	2542,189	-0,003	-0,007	PERIMETRO	
P-21	2541,005	0,000	0,005	BORDILLO	
P-22	2540,972	0,001	0,009	BORDILLO	
N-23	2541,603	-0,001	0,010	PARAMENTO	
P-24	2540,721	-0,002	0,000	SUMIDERO	
P-25	2540,980	-0,003	0,010	POZO	
P-26	2540,962	-0,002	0,012	POZO	
P-27	2540,702	-0,002	0,012	SUMIDERO	
P-28	2540,729	0,000	0,006	POZO	
P-29	2540,951	-0,001	0,018	POZO	
P-30	2540,672	-0,001	0,017	SUMIDERO	
N-31	2541,577	-0,001	0,009	PARAMENTO	
P-32	2540,985	0,000	0,006	BORDILLO	
P-33	2541,053	-0,001	0,012	BORDILLO	
N-34	2541,543	-0,002	0,007	PARAMENTO	
N-35	2540,877	-0,001	0,010	PARAMENTO	
P-36	2541,092	-0,002	0,013	BORDILLO	
P-37	2541,137	-0,001	0,016	BORDILLO	
N-38	2542,148	0,001	0,014	REJAS PARQUE	
N-39	2542,290	-0,001	0,014	REJAS PARQUE	
P-40	2541,173	-0,001	0,019	BORDILLO	
P-41	2541,196	-0,001	0,020	BORDILLO	
N-42	2541,671	-0,001	0,018	PARAMENTO	
N-43	2541,601	0,000	0,017	PARAMENTO	
P-44	2541,203	0,000	0,028	BORDILLO	
P-45	2540,988	-0,001	0,022	POZO	
P-46	2540,942	0,001	0,022	POZO	
P-47	2541,163	-0,001	0,024	BORDILLO	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO PARCIAL	ASENTAMIENTO ACUMULADO	DESCRIPCION	
N-48	2541,569	-0,001	0,014	PARAMENTO	
N-49	2541,533	-0,001	0,012	PARAMENTO	
P-50	2541,110	-0,001	0,016	BORDILLO	
P-51	2541,081	-0,002	0,012	BORDILLO	
N-52	2541,488	-0,002	0,018	PARAMENTO	
P-53	N/A	N/A	N/A	BORDILLO	PERDIDA
P-54	2541,186	0,001	-0,003	ANDEN	
N-55	2541,745	0,000	0,005	PARAMENTO	
P-56	2540,859	0,002	-0,001	ANDEN	
N-57	2541,745	0,006	0,005	PARAMENTO	
P-58	2541,002	-0,003	-0,001	ANDEN	
P-59	2540,751	-0,006	0,000	ANDEN	
N-60	2541,344	-0,003	0,003	PARAMENTO	
N-61	2540,668	-0,006	0,000	PARAMENTO	
P-62	2540,544	-0,005	0,001	ANDEN	
C-63	2541,916	0,004	0,003	47-40	
C-64	2541,762	0,003	0,000	39-38	
C-65	2541,600	0,003	0,005	110-103	
C-66	2541,620	0,003	0,002	102-95	
C-67	2541,658	0,003	0,002	94-87	
C-68	2541,714	-0,002	0,001	78-71	
C-69	2541,715	0,000	0,002	70-63	
C-70	2541,667	-0,008	0,005	62-61	
C-71	2541,814	0,002	0,004	31-24	
C-72	2541,953	0,001	0,002	23-16	
C-73	2542,094	0,005	-0,001	15-8	
C-74	2542,229	0,003	-0,001	7	
C-75	2541,658	0,000	0,012	49-42	
C-76	2541,715	-0,001	0,015	41-34	
C-77	2541,718	-0,002	0,048	33-32	
C-78	2541,767	-0,002	0,014	90-83	
C-79	2541,757	-0,002	0,012	82-75	
C-80	2541,732	-0,002	0,015	66-59	
C-81	2541,742	-0,002	0,018	58-57	
C-82	2541,740	-0,002	0,018	25-18	
C-83	2541,692	0,000	0,017	17-10	
C-84	2541,665	-0,001	0,011	9-2	
P-85	2540,983	0,003	0,020	PARQUE	
P-86	2541,008	-0,002	0,013	PARQUE	
P-87	2540,913	-0,001	-0,006	PARQUE	
P-88	2540,952	-0,001	0,012	PARQUE	
P-89	2543,464	-0,001	-0,002	TACO 1	
P-90	2543,317	-0,003	-0,012	TACO 2	
P-91	2542,220	-0,002	-0,012	TACO ADMI	
P-92	2542,221	-0,003	-0,007	TACO ADMI	
P-93	2542,451	-0,004	-0,014	TACO APOYO	
P-94	2544,099	1,802	1,783	TACO APOYO	


COMPONENTE ELECTRICO


Compromisos


N-A	N-A	N-A	N-A

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Durante la semana del 8 al 13 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:
Se construye caja CS276 del modulo 5

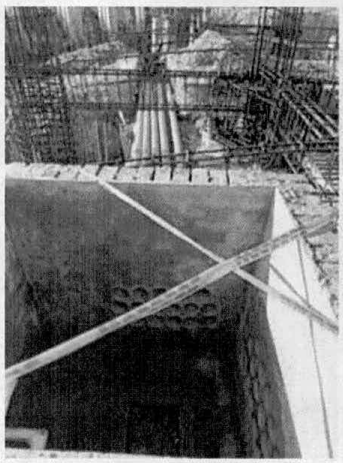

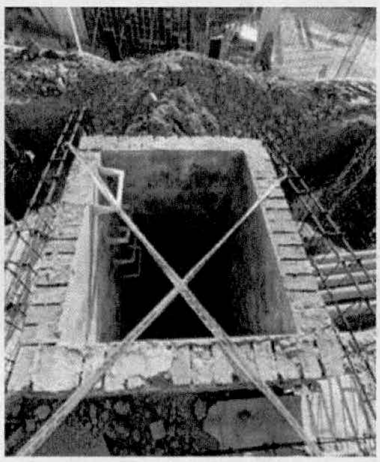

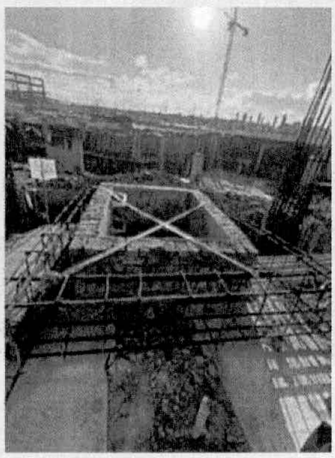


CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Se realiza instalación de tuberías de 4 pulgadas en modulo 5 que entra a subestación.







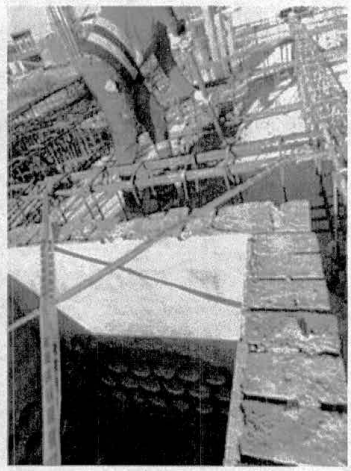

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Se realiza instalación de tuberías de 4 pulgadas en modulo 5 salida de subestación

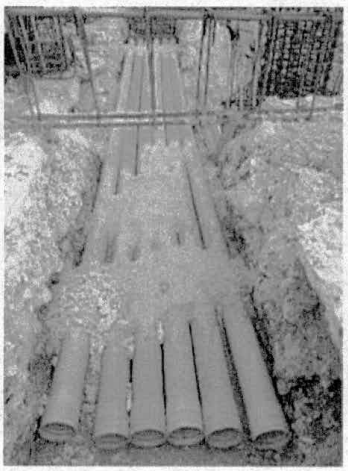

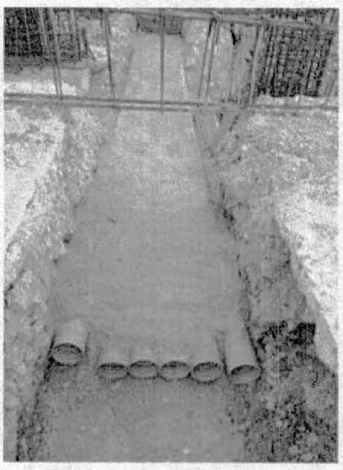



COMPONENTE HIDRÁULICO

Compromisos

Entrega de las dos (2) alternativas para la conexión de GAS – Proyecto Velódromo – y entrega de planos GAS.(*) Remitir consolidado de trazabilidad al IDRD por parte de CIG (**) Se ejecuto reunión con VANTI el 16/12/2025.	UTMP- IDRD- VANTI	16/12/25	EN REVISIÓN POR UTMP
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD.	IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Radicación respectiva de la solicitud de prorroga para la temporal de Obra de acueducto y alcantarillado ante la EAAB -Velódromo	UTMP	17/12/25	CUMPLIDO

(*) Gestión IDRD-VANTI para seguimiento y agilización de entrega dos (2) alternativas para la conexión Proyecto Velódromo .


(**) Se hace remisión por parte de CIG al IDRD Rad. No 20252100544352 del 04/12/2025


ACTIVIDADES COMPONENTE HIDRÁULICO

Con corte al domingo 14 de diciembre de 2025 se tienen los siguientes avances.

➢ **GESTIÓN EMPRESAS PÚBLICAS.**

- Se está elaborando solicitud de prórroga de la TPO de Acueducto y alcantarillado conforme a la prórroga en la licencia de construcción.

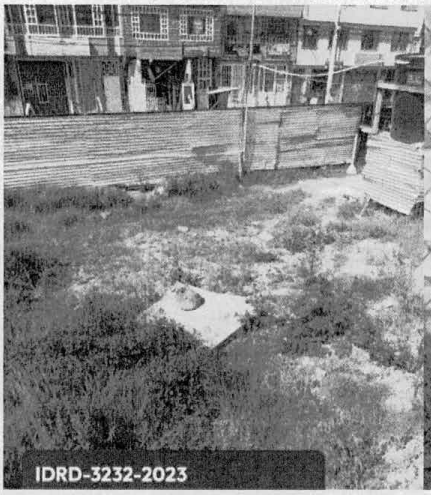

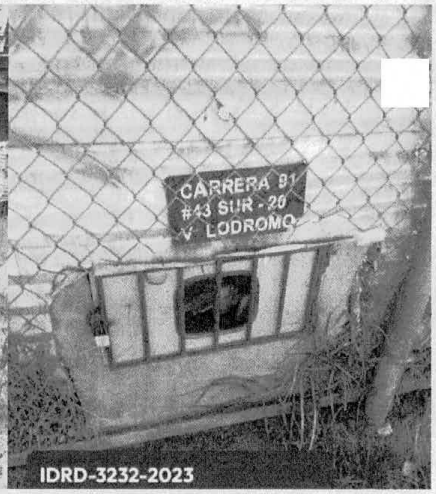

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

BOGOTÁ

125
1298

Anexo 2

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

126
~~1299~~

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2035	27/11/2025	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 22 – COMPONENTE DE FAUNA SILVESTRE.	Virtual	Claudia Infante	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2036	27/11/2025	INTERVENTORÍA	Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles del proyecto.	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2037	28/11/2025	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 22 – COMPONENTE DE FORESTAL.	Virtual	Juan Espinel	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2038	27/11/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al comunicado CIG-IDRD-VEL-916-2025	Virtual	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2039	04/12/2025	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2040	04/12/2025	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE BOSA	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2041	04/12/2025	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2042	05/12/2025	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2043	03/12/2025	PERSONERÍA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2044	03/12/2025	PERSONERÍA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2045	04/12/2025	LIGA DE CICLISMO	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2046	05/12/2025	SECRETARIA DE SEGUIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2047	03/12/2025	DADEP	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez

1966
123

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	126	2048	04/12/2025	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2049	03/12/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2050	03/12/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2051	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual V1 No. 22 del componente social, 26 octubre al 25 de noviembre de 2025.	Virtual	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2052	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Informe Mensual Ambiental N° 22- V1 - Período del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025.	Virtual	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2053	28/11/2025	INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL N°22 COMPONENTE DE CALIDAD	Fisico	Diego Castro	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2054	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta a comunicado CIG-IDRD-VEL-922-2025 – Aceptación de La propuesta de instalación de geotextil en ambas caras de la geomembrana.	Virtual	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2055	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual No. 22 V1 – Componente SST.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2056	29/11/2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual N° 22 -Componente técnico.	Virtual	Mauricio Barajas	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2057	01/12/2025	INTERVENTORÍA	Tercer Monitoreo de Agua Subterránea de la Red Adyacente al Predio Gibraltar, proyección cronograma y actividades.	Fisico	Sara Chaparro	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2058	01/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio obra CIG-IDRD-VEL-0919-2025 según revisión Informe Mensual Componente fauna N° 22 V01 (noviembre 2025) -Observaciones	Virtual	Claudia Infante	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2059	01/12/2025	INTERVENTORÍA	Remisión NPS Cubierta, Arquitectónicos, Mampostería, silvicultural e hidraulico"	Virtual	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2060	02/12/2025	INTERVENTORÍA	Entrega de informes de Instrumentación geotécnica No. 51 y 52, control de asentamientos e informe de análisis y conclusiones del periodo del 08 al 24 de noviembre de 2025	Virtual	Carlos Guzman	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2061	02/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de pago de las actas parciales de obra.	Virtual	Pendiente	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2062	02/12/2025	INTERVENTORÍA	RESPUESTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0857-2025 - DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, PLANOS DE TALLER Y SISTEMA DE APOYOS – CONTROL DE CAMBIOS No 27.	Virtual	Diego Castro	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2063	02/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0881-2025 de asunto "confirmación procedimiento para maniobra y acopio de estructura metálica".	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2064	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Diseño de puntales túneles.	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2065	03/12/2025	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 17 – COMPONENTE AMBIENTAL APROBADO MEDIANTE COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-931-2025.	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2066	03/12/2025	INTERVENTORÍA	ALMACENAMIENTO PÁNELES MEMBRANA	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2067	03/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio obra CIG-IDRD-VEL-0933-2025 según revisión Informe Mensual Componente fauna N° 22 (noviembre 2025) V2-Observaciones	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2068	03/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al oficio con No. De radicado - CIG-IDRD-VEL-923-2025 - Remisión Informe mensual V2 No. 22 del componente social	Virtual	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2069	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de respuesta comunicado CE-206-125-2005 del 10-11-2025 "Reiteración análisis de manejo de agua subterránea (lixiviados)durante la operación del proyecto"	Fisico	Claudia Gualteros	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2070	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Entrega avance Timelapse – noviembre 2025.	Fisico	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2072	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta Comunicado CIG-IDRD-VEL-0942-2025. Subsanación observaciones al Informe Mensual del Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres N° 22, Período del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025 - Radicación Versión 2.	Virtual	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2073	05/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 36	Virtual	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2074	05/12/2025	INTERVENTORÍA	RESPUESTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0928-2025 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES AL INFORME DE CALIDAD N°22 DE OBRA CIVIL VERSIÓN UNO - V.1	Fisico	Diego Castro	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2075	05/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0948-2025. Remisión acta parcial de obra N°18.	Fisico	Abgela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2076	05/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud información relacionada con el Concepto Técnico 06540 del 29-07-2025, radicados CE-206-125-1734 del 25-08-2025, CE-206-125-1816 del 10-09-2025 y CE-206-125-1853 del 23-09-2025	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2077	05/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0941-2025 - Atención de observaciones Informe mensual No. 22V1 – Componente SST.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2078	09/12/2025	INTERVENTORÍA	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES CIG-IDRD-VEL-0930-2025 - INFORME MENSUAL No. 22 V. 2 – COMPONENTE TÉCNICO.	Virtual	Mauricio Barajas	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2079	09/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de inclusión de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) – Amigable Componedor y Arbitraje.	Virtual	Claudia Gualteros	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2080	10/12/2025	INTERVENTORÍA	Entrega informes mensuales de obra – noviembre 2025.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2081	10/12/2025	INTERVENTORÍA	REMISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No 19.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2082	10/12/2025	INTERVENTORÍA	Repuesta al comunicado CIG-IDRD-VEL-957-2025. Radicación NPS Arquitectónicos, Mampostería, Silvicultural e Hidráulico – Proyecto Velódromo Gibraltar.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2083	12/12/2025	INTERVENTORÍA	ATENCIÓN DE AL COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0943-2025 – ALMACENAMIENTO PANELES MEMBRANA.	Fisico	Claudia Gualteros	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2084	12/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 36 APROBADO.	Fisico	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2085	15/12/2025	INTERVENTORÍA	Atención comunicado CIG-IDRD-VEL-0964-2025 mediante el cual la interventoría da respuesta a los comunicados CE-206-125-2069 y CE-206-125-2005.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2086	15/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de información sobre el estado de los 14 ítems de concreto necesarios para la ejecución del proyecto.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2087	16/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0967-2025 del 13-12-2025. Alcance al Informe Mensual del Componente Ambiental N° 18, período del 26 de junio al 25 de julio de 2025.	Virtual	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2088	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Radicación Informe Semestral del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia Ambiental N° 2, Primer Semestre del año 2025, Versión 1.	Virtual	Johanna Barrientos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2089	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al oficio CIG-IDRD-VEL-0867-2025 - Radicación ante la EAAB – Solicitud de prórroga del servicio temporal de obra.	Fisico	Alfredo Ferreira	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2090	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta a oficio CE-206-128-1142 COM CIG-IDRD-VEL-0935-2025 proceso constructivo rellenos posteriores en túneles.	Virtual	Carlos Guzman	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2091	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Profesiograma V4.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2092	18/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta a oficio CIG-IDRD-VEL-0963-2025 Limitación de exposicióna la intemperie del igol denso	Fisico	Carlos Guzman	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2093	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0932-2025 Atención solicitud de intervención y reinstalación de señalización de Plan de Manejo de Transito (PMT)	Fisico	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2094	18/12/2025	INTERVENTORÍA	Presentación de cotizaciones para el desarrollo de las actividades de monitoreo ambiental descritas en el Concepto Técnico SDA No. 6540 del 29 de julio de 2025.	Fisico	Johanna Barrientos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2095	23/12/2025	INTERVENTORÍA	Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas	Virtual	Alfredo Ferreira	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2096	20/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 37	Virtual	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2097	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0972-2025 – atención observaciones profesiograma V4	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2098	22/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 37 APROBADO.	Fisico	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2099	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Diseño de puntal túnel Deportivo.	Fisico	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2100	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Informe de despacho estructura metálica de cubierta No. 4 diciembre 2025.	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez

796 129

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2101	23/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0974-2025 – Entrega Informe Mensual Ambiental número 18 Versión 3 del contratista de obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de junio y el 25 de julio de 2025.	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2102	23/12/2025	INTERVENTORÍA	CERTIFICADO DE NACIONALIZACIÓN DE 20 PANELES – MEMBRANA DE CUBIERTA VELODROMO - GIBRALTAR	Fisico	Alfonso Peñaranda Suárez	Alfonso Peñaranda Suárez

DIEGO F CASTRO
PROFESIONAL DE CALIDAD
UTMP

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2035	27/11/2025	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 22 – COMPONENTE DE FAUNA SILVESTRE.	Virtual	Claudia Infante	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2036	27/11/2025	INTERVENTORÍA	Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles del proyecto.	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2037	28/11/2025	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 22 – COMPONENTE DE FORESTAL.	Virtual	Juan Espinel	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2038	27/11/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al comunicado CIG-IDRD-VEL-916-2025	Virtual	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2039	04/12/2025	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2040	04/12/2025	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE BOSA	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2041	04/12/2025	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2042	05/12/2025	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2043	03/12/2025	PERSONERÍA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2044	03/12/2025	PERSONERÍA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2045	04/12/2025	LIGA DE CICLISMO	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2046	05/12/2025	SECRETARIA DE SEGUIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2047	03/12/2025	DADEP	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	126	2048	04/12/2025	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2049	03/12/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	126	2050	03/12/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Invitación comité de participación ciudadana N°21 - Velódromo	Fisico	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2051	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual V1 No. 22 del componente social, 26 octubre al 25 de noviembre de 2025.	Virtual	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2052	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Informe Mensual Ambiental N° 22- V1 - Período del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025.	Virtual	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2053	28/11/2025	INTERVENTORÍA	INFORME MENSUAL N°22 COMPONENTE DE CALIDAD	Fisico	Diego Castro	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2054	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta a comunicado CIG-IDRD-VEL-922-2025 – Aceptación de La propuesta de instalación de geotextil en ambas caras de la geomembrana.	Virtual	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2055	28/11/2025	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual No. 22 V1 – Componente SST.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2056	29/11/2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual N° 22 -Componente técnico.	Virtual	Mauricio Barajas	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2057	01/12/2025	INTERVENTORÍA	Tercer Monitoreo de Agua Subterránea de la Red Adyacente al Predio Gibraltar, proyección cronograma y actividades.	Fisico	Sara Chaparro	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2058	01/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio obra CIG-IDRD-VEL-0919-2025 según revisión Informe Mensual Componente fauna N° 22 V01 (noviembre 2025) -Observaciones	Virtual	Claudia Infante	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2059	01/12/2025	INTERVENTORÍA	Remisión NPS Cubierta, Arquitectónicos, Mampostería, silvicultural e hidraulico"	Virtual	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2060	02/12/2025	INTERVENTORÍA	Entrega de informes de Instrumentación geotécnica No. 51 y 52, control de asentamientos e informe de análisis y conclusiones del periodo del 08 al 24 de noviembre de 2025	Virtual	Carlos Guzman	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2061	02/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de pago de las actas parciales de obra.	Virtual	Pendiente	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2062	02/12/2025	INTERVENTORÍA	RESPUESTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0857-2025 - DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, PLANOS DE TALLER Y SISTEMA DE APOYOS – CONTROL DE CAMBIOS No 27.	Virtual	Diego Castro	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2063	02/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0881-2025 de asunto "confirmación procedimiento para maniobra y acopio de estructura metálica".	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2064	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Diseño de puntales túneles.	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2065	03/12/2025	INTERVENTORÍA	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 17 – COMPONENTE AMBIENTAL APROBADO MEDIANTE COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-931-2025.	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2066	03/12/2025	INTERVENTORÍA	ALMACENAMIENTO PÁNELES MEMBRANA	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2067	03/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio obra CIG-IDRD-VEL-0933-2025 según revisión Informe Mensual Componente fauna N° 22 (noviembre 2025) V2-Observaciones	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2068	03/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al oficio con No. De radicado - CIG-IDRD-VEL-923-2025 - Remisión Informe mensual V2 No. 22 del componente social	Virtual	Diana Ortiz	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2069	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de respuesta comunicado CE-206-125-2005 del 10-11-2025 "Reiteración análisis de manejo de agua subterránea (lixiviados)durante la operación del proyecto"	Fisico	Claudia Gualteros	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2070	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Entrega avance Timelapse – noviembre 2025.	Fisico	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2072	04/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta Comunicado CIG-IDRD-VEL-0942-2025. Subsanación observaciones al Informe Mensual del Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres N° 22, Período del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025 - Radicación Versión 2.	Virtual	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2073	05/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 36	Virtual	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2074	05/12/2025	INTERVENTORÍA	RESPUESTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0928-2025 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES AL INFORME DE CALIDAD N°22 DE OBRA CIVIL VERSIÓN UNO - V.1	Fisico	Diego Castro	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2075	05/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0948-2025. Remisión acta parcial de obra N°18.	Fisico	Abgela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2076	05/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud información relacionada con el Concepto Técnico 06540 del 29-07-2025, radicados CE-206-125-1734 del 25-08-2025, CE-206-125-1816 del 10-09-2025 y CE-206-125-1853 del 23-09-2025	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2077	05/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0941-2025 - Atención de observaciones Informe mensual No. 22V1 – Componente SST.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2078	09/12/2025	INTERVENTORÍA	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES CIG-IDRD-VEL-0930-2025 - INFORME MENSUAL No. 22 V. 2 – COMPONENTE TÉCNICO.	Virtual	Mauricio Barajas	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2079	09/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de inclusión de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) – Amigable Componedor y Arbitraje.	Virtual	Claudia Gualteros	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2080	10/12/2025	INTERVENTORÍA	Entrega informes mensuales de obra – noviembre 2025.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2081	10/12/2025	INTERVENTORÍA	REMISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL No 19.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2082	10/12/2025	INTERVENTORÍA	Repuesta al comunicado CIG-IDRD-VEL-957-2025. Radicación NPS Arquitectónicos, Mampostería, Silvicultural e Hidráulico – Proyecto Velódromo Gibraltar.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2083	12/12/2025	INTERVENTORÍA	ATENCIÓN DE AL COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0943-2025 – ALMACENAMIENTO PANELES MEMBRANA.	Fisico	Claudia Gualteros	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2084	12/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 36 APROBADO.	Fisico	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2085	15/12/2025	INTERVENTORÍA	Atención comunicado CIG-IDRD-VEL-0964-2025 mediante el cual la interventoría da respuesta a los comunicados CE-206-125-2069 y CE-206-125-2005.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2086	15/12/2025	INTERVENTORÍA	Solicitud de información sobre el estado de los 14 ítems de concreto necesarios para la ejecución del proyecto.	Fisico	Angela Sanchez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2087	16/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0967-2025 del 13-12-2025. Alcance al Informe Mensual del Componente Ambiental N° 18, período del 26 de junio al 25 de julio de 2025.	Virtual	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2088	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Radicación Informe Semestral del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia Ambiental N° 2, Primer Semestre del año 2025, Versión 1.	Virtual	Johanna Barrientos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2089	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al oficio CIG-IDRD-VEL-0867-2025 - Radicación ante la EAAB – Solicitud de prórroga del servicio temporal de obra.	Fisico	Alfredo Ferreira	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2090	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta a oficio CE-206-128-1142 COM CIG-IDRD-VEL-0935-2025 proceso constructivo rellenos posteriores en túneles.	Virtual	Carlos Guzman	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2091	17/12/2025	INTERVENTORÍA	Profesiograma V4.	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2092	18/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta a oficio CIG-IDRD-VEL-0963-2025 Limitación de exposicióna la intemperie del igol denso	Fisico	Carlos Guzman	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2093	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0932-2025 Atención solicitud de intervención y reinstalación de señalización de Plan de Manejo de Transito (PMT)	Fisico	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2094	18/12/2025	INTERVENTORÍA	Presentación de cotizaciones para el desarrollo de las actividades de monitoreo ambiental descritas en el Concepto Técnico SDA No. 6540 del 29 de julio de 2025.	Fisico	Johanna Barrientos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2095	23/12/2025	INTERVENTORÍA	Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas	Virtual	Alfredo Ferreira	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2096	20/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 37	Virtual	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2097	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0972-2025 – atención observaciones profesiograma V4	Virtual	Luz Stella Rodriguez	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2098	22/12/2025	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 37 APROBADO.	Fisico	John Ramos	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2099	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Diseño de puntal túnel Deportivo.	Fisico	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-200	125	2100	22/12/2025	INTERVENTORÍA	Informe de despacho estructura metálica de cubierta No. 4 diciembre 2025.	Virtual	Jose Galeano	Alfonso Peñaranda Suárez

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

CONTROL CONSECUTIVO CORRESPONDENCIA ENVIADA

CE / PROYECTO : 206 - VELÓDROMO GIBRALTAR

AD / CE	N° sub carpeta	N° consecutivo	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Referencia/Asunto	Medio	Solicitado por	Firmado por:
CE-206	125	2101	23/12/2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0974-2025 – Entrega Informe Mensual Ambiental número 18 Versión 3 del contratista de obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de junio y el 25 de julio de 2025.	Fisico	Paula Blanco	Alfonso Peñaranda Suárez
CE-206	125	2102	23/12/2025	INTERVENTORÍA	CERTIFICADO DE NACIONALIZACIÓN DE 20 PANELES – MEMBRANA DE CUBIERTA VELODROMO - GIBRALTAR	Fisico	Alfonso Peñaranda Suárez	Alfonso Peñaranda Suárez

DIEGO F CASTRO
PROFESIONAL DE CALIDAD
UTMP

Anexo 3

BITACORAS DE OBRA

00555 24/12/2025

Estado del clima Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal de Obra:	# Personas
Union Temporal Metropolitano	23
Consorcio Interventores Gibraltar	13
Vigilancia	2
Manos a la obra	1
Alteran	8
Powel Ingenieros	1
Aides y Bianes	69
Ingear	1

Maquinaria y Equipos
1 miniexcavadora, 2 minicargadores, 2 bombas de Concreto

Actividades de Obra:
Se realiza monitreo de gases, se realizo la actividad de vaciado del dado D-2C-2, del modulo 11 Se realiza la fundida de los 2 Secciones del Tunel de ambulancias del Muro Tipo 9 y la fundida de viga y dado Modulo 5, se realiza la georeferenciacion de encofrados y revision de aceros de 2 columnas del Modulo 13 de pasarela y 1 columna del Modulo 7, se realizo liberaciones de estas actividades por Topografia

Residente Interventor

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente UTMP

00556 26/12/2025

26 Diciembre de 2025 - Visita de inspección

Se realizó una visita de inspeccion geotécnica a los taludes del proyecto. Durante la visita se evidenció el avance de la construcción de los muros de contención de los túneles administrativo, deportistas y principal, también se observó el avance en la construcción de los dados de cimentación y columnas en algunos sectores del proyecto. Se destaca que los taludes no muestran evidencias ~~(no)~~ de inestabilidad general y los procesos de erosión superficial y caídas de material se han controlado de manera satisfactoria. Se recomienda

elementos.
Se realiza encofrado para sección de muro del
tunel de deportistas.

Residente Interventoría

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente UTMP

00554 23/12/2025

Estado del clima. Mañana : Soleado
Tarde : Soleado.

Personal de Obra:	# Personas.
Union Temporal Metropolitan	39.
Consorcio Interventores Gibraltar	19
Vigilancia.	2
Manos a la obra.	3
Altura	8
P&F Consultores	1
Artes y Bronces	64.
Ingeo	2

1 Minirexcavadora
2. Mini cargadores
2. Bombas de Concreto

Actividades de obra:
Se realiza la actividad de vaciado de concreto para la columna C14 modulo 1, la cimentacion parcial de vigas dadas y placa del Modulo 1, la fundida de la columna P17 de pasarela y la fundida de la seccion tunel deportistas.
Se libera dado modulo 11 D-2C-2, se revisa armado de acero, nivelacion y encofrado del tramo de viga y dado Modulo 5.
Se revisa aceros y encofrado secciones tunel de ambulancia, se realiza chequeo topografico de niveles y plomos de muros de los taneles, asi mismo verificacion de Modulos 4 y 6

Residente Interventoría

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente UTMP

Maquinaria y Equipos:
2 minicargadoras | 2 Bombas de Concreto.
1 minirretroexcavadora |
Actividades de obra: Se realiza monitoreo de gases, aforo de trabajadores. Se continua con armado y armado de aceros de refuerzo de vigas y losas modulo 3, 5 y 4. Se realiza fundida del muro de contención final del modulo 5. Se realiza fundida de viga 3 nodos. Hidrosuritora modulo 5.

Residente Interventoría
ING. ALFC. ISO PE. [illegible] DA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
CONSORCIO GIBRALTAR

Residente UTMP

00563 22/12/2025

Estado del clima Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra:	# Personas
Unión temporal Metropolitano Porvenir	39
Consorcio Interventores Gibraltar.	15
Vigilancia	3
Monos a la obra	4
Altura	8
P&C Consultores	1
Artes y Bronces	72

Maquinaria y Equipos
1. Miniexcavadora.
2 Minicargadores
2 Bombas de Concreto
Actividades de Obra:
Se realiza monitoreo de gases, se realizo la actividad de vaciado de concretos para los elementos estructurales (columnas) Modulo 5 de Pasarela.
Se realiza el armado de aceros y adecuacion de niveles para cimentacion del modulo 4
Se realiza el encofrado de la columna C14 del modulo 5, se realiza aceros y niveles de los

A

135
~~308~~

Depotados y ambulancia, fundida de Columnas modulo 15 pasarela, modulo 8 (modulos). Se continua con descabeza del pilote en zona de pasarela conpa se continua con instalacion de refuerzo con igol para muro tunel Depotados instalacion hidraulicas modulos.

Residente Interventoria

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente UTMP

00552 20/11/2025.

Estado de clima: mañana: soleado
tarde soleado

personal de obra:	
Union temporal Metropolitano	15 profesionales
	4 Cuadrillas trabajando
	1 almacenista
	2 maestros
	2 operarios trabajando
	2 Bachilleres
	1 ayudantes.
Consorcio interventor 6.	9 profesionales
Urb. Lara	2 Celadores
Mano a la obra	1 encargado
	3 ayudantes
Altura	6 operarios
	2 auxiliares.
PyC Consultores	1 operador
personal incorporado	2 profesionales
	2 tecnicos
Antes y Bronces	6 Profesionales
	1 maestro
	1 almacenista
	30 oficiales
	18 ayudantes
	15 Horneros
Inducor	1 Maestro

Residente Interventoría

ING. ALFONSO PEÑA [illegible] SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente UTMP

.00551 19/12/2015

Estado de clima	mañana: Soleado
	Tarde: Soleado
Personal de obra	22 profesionales
Unión temporal M	4 Conductores Retroexcavadora
	1 almacenista
	2 maestros
	2 operarios de Gv
	2 Rocheros
	7 ayudantes
Consorcio Intervías Gibraltar	15 profesionales
Vigilancia	2 Guardas
Manos a la obra	1 encargado
	3 ayudantes
Altura	6 cuerdas
	2 auxiliares
P y E Consultores	1 operador
Postal Ingeniería	2 profesionales
	1 maestro
	2 técnicos
Redes y Bronces	6 profesionales
	1 maestro
	1 almacenista
	30 oficiales
	18 ayudantes
	15 Flameros
Ingecar	1 maestro
	1 ayudante

Maquinaria y Equipos.
1 miniExcavadora | 2 Bombas de concreto
2 minicargadores |

Actividades de obra: Se realiza monitoreo de Gases, aforo de lixiviados, se continua con armado de acero de modulo 4 y 6 y 3. Se realiza fundida de muros del Exill

A

136
1309

Personal de obra:

Unidad Sanitaria M.

Profesionales
4 Comités topográficos
1 almacenista
2 maestros
1 operarios t. brus
2 Bachilleres
6 ayudantes.

Consorcio Interventores Ciudad Bolívar

Profesionales
2 Guardas
1 encargado
5 ayudantes

Vía Lenta

Manejo de la obra

Altura

6 oficiales
1 auxiliar

Fase 1 Infraestructura

2 profesionales
1 técnico

Arte y Bronces

6 profesionales
1 maestro.
1 almacenista
26 oficiales
15 ayudante
17 Horneros.
1 ayudante.

Interior

Maquinaria y Equipos:

2 minicargadores | 2 Bombas de Concreto
1 mini Excavadora |

Actividades de obra: Se realiza montaje de bases, apoyos de Neoprenos. se continua con instalación de Casetones y encofrado para cimientos en modulo 4 y 6, 3, se realiza fundida de Columnas de pozuelos. Columna modulo 7 eje 625, se realiza vaciado de placa tramo 4 modulo 7, se continua con aplicación de igol impermeable en tunal Dependientes, se realiza fundida de muro # 16 tunal Dependientes, 7 muro # 4 y 5 tunal principal. se continua con armada de aceros de refuerzo, instalación de tubería a presión modulo 5.

	6 ayudantes
Consorcio Interventores Bolívar	15 profesionales
Usaquén	2 Guardas
Manos a la obra	1 encargado
	5 ayudantes
Altura	6 operarios
	1 auxiliar
Arcos y Bóvedas	6 profesionales
	1 maestro
	1 almacenista
	26 oficiales
	15 ayudantes
	17 Horneros
Interior	1 ayudante

maquinaria y Equipos:
2 minicargadores / 2 Bombas de concreto.
1 minexcavadora /

Actividades de obra: se realiza contorno de muros, acopio de formaletas se continua con colado y conformación de muros para fundición de elementos en zonas de los modulos 3, 4, 6. se realiza fundida de 3 pedestales y viga modulo 1 ubicados en modulo 4 y 6. encofrado para muros tunel dependientes y principal, se realiza fundida de Columnas parcial modulo 15 en los ejes P24 - P9 P25 - P9, P8 - P24. se continua con instalación de refuerzo para placa tramo 4. modulo 7 se realiza liberación de acero de refuerzo Columnas modulo 1 eje 626, se realiza tanqueo de silo.

Residente de Interventoría

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
CONSORCIO GIBRALTAR

Presidente UTMP

00550 18/12/2019

Estado de clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado

137
1310

1 auxiliar
2 profesionales
1 tecnico
6 profesionales
1 maestro
1 almacenista
16 oficiales
15 ayudantes
12 Hannas
1 ayudante

Personal informara

Arcos y Bovedas

Informar
Maquinaria y Equipo
2 minicargadores | 2 Bombas concreto
1 miniexcavadora |

Actividades de obra: Se realiza monitoreo de Gases, acopio de Agregados se continua con armado y colocacion del concreto en modulos 3, 5 y 4. se realiza fundida de tramo 3 de obra de excavacion tunel principal fundido de muro tunel Derecho, muro tramo 3 tunel principal, ingreso de Estructura metalica, se realiza e inicia impermeabilizacion de muros con tunel Derecho Cuadrante 31, excavacion de columnas pozo de modulo 14. excavacion de Aladros modulo rampa

Residente Interventoria

ING. ALFONSO REINALDO SUAREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente. UTMP

00549 17/12/2025

Estado de clima mañana: Soleado
tarde: Soleado

personal de obra
Union temporal metropolitano

19 profesionales
4 Comisionados topografo
1 almacenista
2 maestros
2 oficiales t. Gua
2 Bacheros

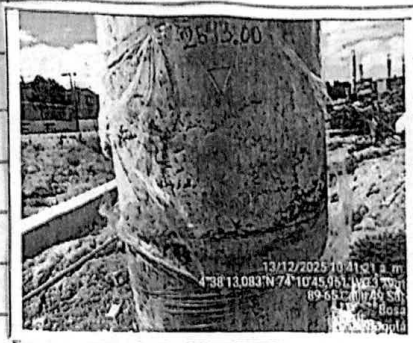


Imagen 3



Imagen 4.

NOTA: LAS ZONAS DE COLUMNAS QUE APARECEN EN ESTAS IMÁGENES FUERON RESANADAS EL MISMO DIA SÁBADO 13 DE DICIEMBRE, POR EL PERSONAL DE LA UTMP.

RESIDENTE UTMP.

Residente Interventoría

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

.00547 15/12/2025 VELÓDROMO GIBRALTAR

Estado de clima: mañana: Soleado
tarde: soleado.

Personal de obra:	
Unión temporal M.	20 profesionales
	4 Cadenas trabajadores
	1 almacenista
	2 maestros
	2 operarios t. Grúa
	2 Barberos
	4 ayudantes
Consorcio interventoras 6.	13 profesional
Vigilancia	12 Guardas
Manos a la obra	1 encargado
	5 ayudantes
Altoria	6 oficiales
	1 auxiliar
Raval Ingeniería	2 profesionales
	2 técnicos
Arita y Blanco	7 profesionales
	1 maestro
	1 almacenista
	26 oficiales
	16 ayudantes
Ingecar	17 Horneros
	1 ayudante.

Actes y Broncos.

4 Profesionales
1 maestro
2 técnicos
1 almacenista
25 oficiales
24 ayudantes
17 Horario

Maquinaria y Equipo.

2 minicargadores | 1 Bomba de concreto
1 mini Excavadora |

Actividades de obra: Se realiza monitoreo de gases, acopio de lixiviados. Se continúa con instalación de aceros de refuerzo en tramo 3. Losa principal se realiza fundida de tramo 2 Muro losa ambas bruces se realiza fundida de viga y Pedestal modulo 3, se continúa con encofrado, para vigas modulo 4. Se realiza fundida de columnas en pasarela modulo 14, fundida de muro losa Deportivas. NOTA: Se sigue presentando Hormigones en columnas por mal proceso en vaciado del concreto, se recomienda la corrección y mejoras para Garantizar un Buen acabado de Dichos Elementos; Columnas en pasarela de los ejes: P25 - P15 imagen 1
P25 - P10 Imagen 2
P25 - P12 Imagen 3
P24 - P15 Imagen 4

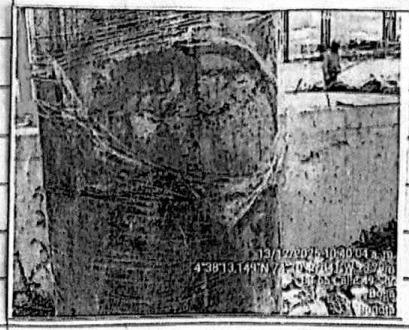


Imagen 1



Imagen 2

Maquinaria y Equipos
2 mini cargadores ; 2 Bombas de concreto
1 mini excavadora |
Actividades de obra: Se realiza monitoreo de bases, apoyo de iluminados, se continua con armado de aceros de columna de cimentación tunel principal, se realiza fundida de tramo 2 modulo 7. Columna modulo 14 pasarela, Columna c17 modulo 7. muro de contención tunel portal, se continua con instalación de tuberías eléctricas modulo 5. Se continua con aplicación de impermeabilizante tunel administrativo. Se continua con encofrado para armado modulo 6.

RESIDENTE UTMP ING. ALFONSO [illegible] SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR
Residente Interventoría

00546 13/12/2025.

Estado de clima:	mañana: Soleado
	Tarde: Soleado
Personal de obra:	16 Profesionales
Unión temporal Metropolitano	4 Comisión topográfica
	1 almacenista
	2 maestros
	2 operario t. bus
	2 Berbenos
	7 ayudantes
Consorcio interventor Gibraltar	13 Profesionales
Vigilancia	2 Guardas
Mano de la obra	1 encargado
	5 ayudantes
Altura	6 operarios
	1 auxiliar
Personal interventoría	2 profesionales
	1 encargado
	2 topógrafos

A

dado modulo 6, encofrado modulo 4, instalacion de tuberia electrica, y construccion de cajas electricas modulo 5. Fundida muro tunal Deportistas. Nota: la interventoria recomienda al terminado de las columnas de pasarela ya que se esta evidenciado Hormigon superficial.

ING. ALFONSO FERNANDO DAS SUÁREZ, PMP
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente Interventoria

00545 12/12/2025.

Estado de clima mañana: Soleado
tarde: Soleado

Personal de obra:
Union temporal Metropolitano
21 profesionales
4 comisionistas
1 almacenista
2 maestros
2 operarios ti. Grua
1 Bachaco
7 ayudantes
Consorcio interventoria Gibraltar
13 profesionales
2 Guardas
1 encargado.
5 ayudantes
Mano a la obra
6 operarios
1 auxiliar
2 profesionales
1 maestro
2 tecnicos
Actas y Bronces
6 profesionales
1 maestro
1 almacenista
25 oficiales
21 ayudantes
17 Honorarios
Inbecar
1 ayudante

- 00 SAB 11/12/2021

Estado del clima: mañana: Soleado
tarde soleado

Personal de obra:
21 Protocolos
4 Conexos topógrafos
1 almacenista
2 maestros
2 oficiales 1ª Gas
1 Bachiller
7 ayudantes.

Cargado en Tarumba 6.
Ubicación
Manos a la obra
15 Protocolos
2 Guardas
1 encargado
5 ayudante

Alturas
6 oficiales
1 auxiliar

Personal intervenido
2 protocolos
1 maestro
2 técnicos

Actas y Bocas
6 protocolos
1 maestro
15 oficiales
21 ayudantes
17 Horarios.

Unidad
1 ayudante
Vehículo
1 Conductor

Maquinaria y Equipo
2 minicargadora | 2 Bomba de concreto
1 mini excavadora |

Actividades del día: Se realiza monitoreo de Gases, drenaje de lixiviados Se continua con armada de aceros del cabezal de Cimentación tunal principal. Se continua con vaciado de columnas en zona posterior, armada de vigas y

A

	2 maestros
	2 operarios de Grúa
	2 Bachaco
	4 ayudantes
Consorcio Interventores 6.	14 profesionales
Vigilancia	2 Guardas
Manos a la obra	1 encargado
	3 ayudantes
Altura	5 operarios
	1 auxiliar
Fase I Infraestructura	2 profesionales
	2 técnicos
Artes y Oficios	8 profesionales
	1 maestro
	1 almacenista
	25 oficiales
	18 ayudantes
	17 Honorarios
Inbacor	1 ayudante

maquinaria y Equipo
2 minicargadores ! 1 Bomba de concreto
1 miniExcavadora ;
Actividades de obra: Se realiza monitoreo de Gases, aforo de lixiviados, se continua con armado de aceros de refuerzo de cimentación, instalación de sensores tramo 3 tunel ambulancias, se realiza fundida del primer tramo muro tunel ambulancia Cuadrante 21, fundida tramo 12, muro de Contención tunel Depositos, fundida de Columnas 2 und modulo 13, se continua con relleno para Conformar plaza tramo 2, armado de aceros de refuerzo modulo 3 se funda 3 Columnas modulo 8 Costado Bta. se inicia impermeabilización con igol para muro zona Exhibición tunel administrativo

ING. ALFONSO HERNANDA SUÁREZ, PMP®
GERENTE DE PROYECTO
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

RESIDENTE UTMP

	3 ayudantes
Altura	6 operarios
	1 auxiliares.
Pavol Inbanarca	2 profesionales
	2 tecnicos
Arcos y Bovedas	7 profesionales
	1 Maestro
	1 almacenista
	34 oficiales.
	24 ayudantes
	17 Horneros.
Inbear	1 ayudante.

Maquinaria y Equipos
2 minicargadores : 1 Bomba de Concreto.
1 miniexcavadora :

Actualmente en obra se realiza monitoreo de Gases, aforo de luviales. se Contara con armado de acero de refuerzo de cimentacion y muros ambuberias, vaciado de concreto de muro de contencion tunel Definitivo tramo II, fundida de Colmo modulo 14 ejes P24-P14 P25-P14, P25-P13. Se Continua con rellano con concreto tramo 2 modulo 7. fundida de Losa, cuellos Colmos modulo 5 y 3 instalacion de tuberos Hidrosanitarias modulo 6. NOTA!

RESIDENTE UTMP
ING. ALFONSO FERNANDO SUÁREZ, PMP
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente Interventoria

DOSAB 10/12/2025

Estado del clima : mañana: Soleado
tarde : soleado

Personal de obra: Union temporal metropolitano
profesionales
4 Conductores
1 almacenista

141
314

con armada de aceros de refuerzo, e instalación de casetones tramo 3 placa de cimentación parcial, se realiza fundida de tramo 2. modulo 2. columnas modulo 13 2 unidades, se continua con encofrado para muros tanque de contacto, se realiza fundida de 3 cuellos de columnas modulo 5. se continua con instalación de tuberías hidrosanitarias modulo 3 y 5. Ventilación de ductos con conexión topográfica.

00541 Nota: La Interventoría reitera a la Unión temporal la obligatoriedad de liberar las áreas destinadas al vaciado de concreto con, al menos, un día de anticipación. Este cumplimiento es crucial (00541) para prevenir la ejecución de fundidas bajo condiciones que propician malas prácticas o comprometan la calidad.

RESIDENTE UTM1 ING. ALFONSO FERNANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente Interventoría

00542 9/12/2025.

Estado de clima: mañana: soleado
tarde: lluvia fuerte 3:30 4:00

Personal de obra:
Unión temporal metropolitano.
- 21 profesionales
- 4 conviven topografía
- 1 almacenista
- 2 maestros
- 2 operarios t. Grúa
- 2 Buchones
- 6 ayudante de obra

Consorcio Interventoría Gibraltar
Visitantes
Varios a la obra:
- 13 profesionales
- 2 Guardas
- 1 encargado

Hidrosanitarias modulo 3 y 5, Se realiza fundida
Primer tramo modulo 2. Nota: se realiza observación de excentricidad
y Pinos acero columnas modulo 1 ejes 62.

RESIDENTE UTMP
Residente Interventoría
ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

00 540 6/12/2025.

Estado del Clima: mañana, Soleada
tarde: Soleada.

personal de obra:
Unión temporal metropolitana
- 4 Comisionistas topografía
- 1 almacenista
- 2 maestros
- 2 obreros de obra
- 2 Bachacos
- 7 ayudantes

Consorcio interventoría Gibraltar
- 1 profesionales
- 2 Guardas

Vigilancia

Manos a la obra
- 1 encargado
- 1 oficial
- 3 ayudantes

Altura
- 5 operarios
- 1 auxiliar.

Pasual Interventoría
- 1 profesional
- 3 técnicos

Artes y Bronces
- 5 profesionales
- 1 maestro
- 1 almacenista
- 37 oficiales
- 27 ayudantes
- 16 Horarios

Inbcar
- 1 profesional
- 1 maestro
- 1 ayudante

Maquinaria y Equipos:
2 mini Excavadoras | 2 Bombas de Concreto
1 mini cargador |

Actividades de obra: Se realiza monitoreo de Gases, acopio de líquidos, Se Continua.

142
~~315~~

A

Personal de obra:

Turno estándar Matutino

- 21 profesional
- 4 Conveyor dobladores
- 1 almacenista
- 2 maestros
- 2 oficiales de grua
- 2 Bachareros
- 7 ayudantes de obra

Consorcio Interamericano Gibraltar

- 14 profesionales
- 2 Guardas
- 1 encargado
- 1 oficial
- 3 ayudantes

Mano de obra

- 6 operarios
- 1 auxiliar

Altura

- 1 profesional
- 3 técnicos
- 6 profesionales

Patio infantería

- 1 maestro
- 1 almacenista
- 31 oficiales
- 26 ayudantes

Arte y Bancos

- 16 técnicos
- 1 maestro
- 1 ayudante

Pabellón

Maquinaria y Equipos:

2 minicargadores 2 Bombas de Concreto.

1 miniexcavadora

Actividades de obra: Se realiza monitoreo de Gases, acopio de Explosivos, se continua con avance de accesos de salida a Instalaciones de casetones modulo 2, se continua con avance de accesos de circulación, muros, columnas tunel principal, se realiza fundida de muro de contención tunel Separadores, fundida de viga zapata cambio de nivel modulo 4 a pista se continua con instalacion de tuberias

Vigilancia	2 Guardas
Mano a la obra	1 encargado
	1 oficial
	3 ayudantes
Aldaya	1 operario
	1 oficial
	2 ayudantes
Panal Infraestructura	1 Profesional
	3 tecnicos.
Arlo y Barcas	6 Profesionales
	1 maestro
	1 almacenista
	37 oficiales
	26 ayudante
	16 Torreros
Infracor	1 Maestro
	1 ayudante.
Vadra	1 Conductor.

Maquinaria y equipos:
2 mini excavadoras | 2 Bombas de concreto
1 mini excavadora |

Actividades de obra: Se realiza (fundida) muro tipo 6 en L, acople y curado de pilotes se continua con armada de acero de refuerzo de viga de amarre y arranque de muro tipo principal, se realiza fundida de columnas modulo 13 eje P25 - P16, tramo 2 modulo 8. se continua con pañete de Cajas electricas, encofrado de viga zapata fundida de tramo 8 de muro de Contención tipo I Pilotes. verificación de niveles con equipos topograficos.

RESIDENTE UTMP

Residente Interventoría

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Fecha: 5/12/2024

Estado del clima: mañana: Soleado

143
1316

30 oficiales.
23 ayudantes
16 fierreros.
2 profesionales
1 maestro.
1 ayudante.

Labores

Maquinaria y Equipos:
2 minicargadores
1 minicargadora
1 2 Bombas de concreto.

Actividades de obra: se realiza monitoreo de taludes, acopio de lixiviados, se continua con armado de acero de refuerzo viga cabezal, armado de acero de refuerzo viga (contrafuerte) zapata cambio de nivel hacia Poste modulo 7. instalacion de malla tramo 2 placa modulo 8, excavacion e instalacion de casetas modulo 2, se realiza fundida de tramo 8 muro tunel apoyo de portales. Desencofrado de muro tunel administrativo. se continua con instalacion de cerchas para columnas con concreto topografia, y la fundida columna modulo 13 eje P-25 - P16.

ING. ALFONSO MIRANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

RES. PENICO UTMP
Residente Interventoria

4/12/2023

Estado del Clima: mañana: Sabado
Tarde: Sabado

Personal de obra:
Union temporal metropolitano
18 profesionales
2 Comisiones topograficas
1 directa cuadrilla
2 maestros
2 operarios retroexcavadora
2 Bachicos
7 ayudantes
15 profesionales

Contratista interventoria Gibraltar

retiro de frente 3. tunel ambulancia,
se continua con instalacion de casetones en
zona del modulo 8, modulo 2,
armado de acero de retiro viga zarpa
modulo 7 cambio de nivel losa fondo, se
realiza fundida de muro # 6. tunel
Deportivos, muro 7. tunel administrativo,
se continua con instalacion de tuberia
Hidrosanitaria en modulo 6 y 4. verificacion
de niveles con comision topografica en
zona de tunel ambulancia, se realiza fundida
de Columna modulo 8.

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

Residente Interventoria
.00537 3/12/2025.
Estado del Clima mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal de obra:
Union temporal M: 21 Profesionales
4 Comisiones topograficas
1 almacenista
2 maestros
2 operarios t. Gua
2 Bachilleres
8 ayudantes.
Consorcio Interventoria Gibraltar 14 profesionales
Ubicacion: 2 Cuadrillas.
Maquinaria en la obra: 1 encargado
1 oficial
1 ayudante
Altura: 6 operarios
1 auxiliar
Pared interiores: 1 profesional
2 tecnicos
Arcos y Bancos. 6 Profesionales
almacenista

144
1317

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

RES. TECNICO UTMP

Residente Interventoria

00536 2/12/2025.

Estado de clima — mañana: Soleado
tarde: Soleado

Personal de obra	
Union temporal metropolitano	17 profesionales
	4 Cadenas topografo
	1 almacenista
	2 maestros
	2 operarios tiro
	2 Cadeneros
	8 ayudantes.
Consorcio interventoria Gibraltar	4 profesionales
UrbGibraltar	2 Guardas
Manos a la obra	1 encargado
	1 oficial
	2 ayudantes
Altaria	6 operarios
	1 auxiliar
Pavel ingenieria	1 profesional
	2 tecnicos
Arte y Concreto	6 profesionales
	1 almacenista
	30 oficiales
	22 ayudantes
	16 Horneros
Ingecar	2 profesionales
	1 maestro
	1 ayudante

Maquinaria y Equipos:
2 minicargadores | 2 Bombas de Concreto
1 mini excavadora |

Actividades de obra: Se continua con monitoreo de gases, acopio de tuberias. Se continua con armado de acero de

00535. 1/12/2025.

Estado de clima: mañana: Soleado
tarde. Soleado.

Personal de obra:
Unión Vial del Madrigalejo
21 Profesionales
4 Comisión Técnica
1 almacenista
2 maestros
2 operarios tipos
2 Barberos
8 ayudantes
15 profesionales
2 Guardas
1 encargado
1 oficial
2 ayudantes
6 operarios
1 auxiliar
2 tractores
4 profesionales
1 almacenista
32 oficiales
23 ayudantes
16 Herreros.
1 profesional
1 maestro
1 ayudante

Consorcio Intervuelos Gibraltar
Vigilancia
Mano a la obra
Altura
Vial Infraestructura
Arte y Barreras
Labores

Maquinaria y Equipos:
2 minicargadores | 2 Bombas de Concreto.
1 mini Excavadora |

Actividades de obra: Se realiza monitoreo de fases, acopio de lixiviados, se realiza fundida de drenes y muros tunel administrativo rellano e instalación de concreto tramo 2 modulo 8 costado pista encofrado e instalación de cortinas modulo 8. armado de acero de refuerzo tramo 3. tunel ambulancias instalación de tuberías hidrosanitarias en modulo 3, 2 y 5.

145
1318

1 oficial
1 ayudante
Varios 1 Conductor
Maquinaria y Equipo:
2 minicargadores | 2 Bombas de Concreto
1 mini Excavadora |
Actividades de obra: Se realiza monitoreo de bases acopio y retiro de lixiviados se continua con armado de aceros de columna de cimentacion tramo 3. tunel ambulancias, se realiza vaciado de viga y losa modulo 1 costado modulo 2. Se continua con instalacion de canaletas modulo 2. desencofrado de Columnas modulo 8. relleno con recebo costado modulo 8 hacia pista.

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

RES. TÉCNICO UTMP

Residente interventoria

00534 30/11/2025. (Festivo)

Estado de clima: mañana: Soleado
tarde: Soleado

Personal de obra: 1 profesional
Union temporal M
Albañileria 2 Cuadrillas
Arcos y Bovedas 1 profesional
1 oficial
1 ayudante
15 Horarios:

Maquinaria y Equipo:
2 minicargador | 2 Bombas Concreto
1 mini Excavadora |
Actividades de obra: Se realizo armado de aceros de columna tramo 3. tunel ambulancias, y modulo 2. encofrado.

Actividades de obras se realiza monitoreo de bases, alcance de linderadas. se realiza fundida de segundo tramo tunal ambiental fundida de muro de contención tunal de particular, encofrado de muros de contención tunal administrativo, encofrado elementos costado modulo 2 (modulo 1.). se continua con mayores de talud tunal ambiental, ingreso de excavadora metálica cubierta.

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

RES. TÉCNICO UTMP

Residente Interventor

.00533 29/11/2025.

Estado de clima: mañana: Soleado
tarde: Soleado

Parcial de obra:	15 profesionales
Unión temporal Metropolitano	2 comisionados
	1 almacenista
	2 maestros
	2 operarios t. obra
	2 Boteros
	8 ayudantes.
Consorcio interventores Gibraltar:	8 profesionales
Vigilancia	2 Guardas
Manejo de la obra	1 oficial
	3 ayudantes
Altura	6 operarios
	1 auxiliar
Parcial ambiental	1 Profesional
	1 Maestro
	2 Fauneros
Artes y oficios	3 Profesionales
	1 almacenista
	3 oficial
	23 ayudantes
	16 Horneros
Obra	1 maestro

A

146

de tuberos Hidrotandem modulo 3 y 2.

Residente Interventor

00532 28/11/2025.

Estado de clima: mañana: nublado
tarde: lluvias suaves

Personal de obra:	20 profesionales
Union laboral metropolitana	2 Comisión laboral
	2 almacenistas
	2 maestros
	2 operarios de grúa
	2 Bachaneros
	8 ayudantes
Consorcio interventor Gbraltar	15 profesionales
Gibraltar	2 Guardas
Mano a la obra	1 encargado
	1 oficial
	3 ayudantes
Altura	6 operarios
	2 auxiliares
Fauna Ingeniería	1 profesional
	1 maestro
	2 técnicos
	1 ayudante
Arte y Bronces	5 profesionales
	1 almacenista
	21 oficiales
	23 ayudantes
	16 Herreros
Ingeniería	1 profesional
	1 Maestro
	1 oficial
	1 ayudante

Maquinaria y Equipos

2 mini cargadoras, 1 mini excavadora, 12 Bombas concreto.

Union temporal Metrobaños	2 Comunes trabajos
	1 almacenista.
	2 maestros
	2 operarios t. Gva
	2 Bachilleres
	8 ayudantes.
Consorcio interventores Gobantes	4 profesionales
Ubicacion	2 Guardas
Manos a la obra	1 encargado
	1 oficial
	3 ayudantes.
Altura	6 operarios
	2 auxiliares
Pavel Infraestructura	1 maestro
	2 técnicos
	1 ayudante.
Artes y Brancas	5 profesionales
	1 almacenista
	31 oficiales
	23 ayudantes
	16 Hayudantes
Inbeac	1 profesional
	1 encargado
	1 oficial
	1 ayudante.

Maquinaria y Equipos:

2 mezcladoras | 2 Bombas de concreto.
1 mini Excavadora

Actividades de obra: Se contrata con monitoreo de bases, acopio de lixiviados se realiza fundida de dos columnas modulo B. se contrata con relleno con recebo modulo B costado pista, se contrata con excavado de muros tunel aminutrativo, Pantallas, instalacion de acero placa, cinta sika tunel ambiental se contrata con descabece de platea Cuadrante 21, tunel ambiental instalacion

147
320

1 almacenista
31 oficiales
23 ayudantes
16 Herreros
Laborar 1 profesional
1 maestro
1 cadenal
Vehiculo 1 conductor

Maquinaria y Equipos:
2 mixer agitadores ; 2 Bombas Concreto.
1 mini excavadora

Actividades de obra: Se realiza desmonte de fondo, acopio de ladrillos, retiro de Asfalto. Se construye con armado de acero de refuerzo de cimientos tanque ambulancias, y se realiza liberación por parte de interventoría sobre dicho tramo. Se realiza vaciado de Concreto para muro de contención tramo 3 tanque Diesel, Se funde tramo 2 de cimientos modulo 4. se funde Solado modulo 6 gradas modulo 8. Se Continua con armado de muro de contención tanque administrativo, encofrado de columnas modulo 8, instalación de tuberías para registros de baja Contra incendios tanque ambulancias. NOTA: la interventoría recuerda la importancia de subsanar las observaciones y recomendaciones que se dan en cada actividad de liberación de fundida.

DIRECTORA INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
AUTODROMO GIBRALTAR

00531 27/11/20

Estado del clima: mañana: Soleado
tarde: soleado

Personal de obra: 18 profesionales

Actividades de (concreto) de obra: se realiza monitoreo de Gases, polvo y ruido. Disposición de lixiviados a sitio autorizado. se continua con armado de acero de refuerzo de vigas viguetas y dados tunel embalcones Cuadrante 28, instalacion de mallas electrosoldada, Distanciadores y Axio tramo 2 modulo 7, se realiza fundida. d tramo 5 muro de contorno muro tunel administrativo, 1 tramo 3 muro tunel Depositos, fundida de cubierta modulo 8.

DIRECTORA INTERVENTORIA

RESIDENTE INTERVENTORIA

ING. ALFONSO PEÑARANDA SUÁREZ, PMP®
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
VELÓDROMO GIBRALTAR

INGS. TEC. UTHP

00530 26/11/2025.

Estado del clima: mañana: Soleado
tarde. Soleado

Personal de obra:	
Union temporal metropolitano	19 Profesionales
	2 Conductores
	1 almacenistas
	2 maestros
	2 oficios varios
	2 Fierreros
	8 ayudantes
Consorcio Interventores Gibraltar	15 Profesionales
Vigilancia	2 Guardas
Mano a la obra	1 encargado
	1 oficial
	3 ayudantes
Altura	6 operarios
	2 auxiliares
Fecial interventoria	1 profesional
	1 encargado
	2 fierreros
	1 ayudante
Andes y Bronces:	5 Profesionales

148
1321
