AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 7

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
Semana No.	44	**Del :**	6 de diciembre de 2025	**al**	12 de diciembre de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	304	días	**Tiempo restante**	230 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	56,93%			
Nombre del Supervisor :	MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Realizar el mantenimiento de la Infraestructura física Lado Tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (VF).

CONTROL DE LA PROGRAMACION

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,39%	61,12%	**(%) Ejecutado**	1,43%	57,36%
Valor programado ($)	$ 40.260.504,8	**$1.770.146.931**	**Valor ejecutado ($)**	$41.340.140	**$1.661.076.106,0**
			Porcentaje Adelanto/Atraso		**-3,77%**
			Evaluación	**Valor Adelanto/Atraso**	**-$ 109.070.825**

OBSERVACIONES

El Contratista durante esta semana, continuo con los trabajos de sello y correccion de filtraciones a nivel de cubiertas de la Terminal de pasajeros, haciendo enfasis en las salas de llegadas nacionales e internacionales, donde se reportan filtraciones de ALL, sobre las bandas transportadoras. De igual manera, se avanza en los trabajos de S.I de flanches metalicos, para el reemplazo de elementos en mal estado o reposicion en areas donde no se encuentran estos elementos. La Interventoria realiza el acompañamiento tecnico verificando el procedimiento como materiales. En relacion a los posibles trabajos de instalación de equipos de AA, el Contratista entrego una propuesta inicial, la interventoría realizo la verificación de esta información y emitio algunas observaciones, sobre precios e insumos para el montaje. La Supervision realizo la entrega de las fichas tecnicas de los equipos a suministrar, de tal forma que se puedan evaluar mayores alcance tecnicos, de igual forma, se informa nuevamente a la Supervision que el proyecto no cuenta con recursos para la instalacion de estos equipos, por lo cual se plantea proyectarlos en un 2do modificatorio. Respecto a los costos de mantenimiento correctivo y preventivo emitidos por parte de STV para el ascensor de la Torre de Control, una vez realizada la inspeccion de la empresa certificadora, la Interventoria emitio respuesta y posible validacion en relacion a este asunto, se espera la entrega de cotizaciones adicionales, con el objetivo de realizar el comparativo tecnico/economico de la propuesta. Se solicito nuevamente a la Supervision en comite apoyo con las gestiones de validacion del aclaratorio y modificatorio. En caso del aclaratorio, una vez aprobado por la Supervision se puede proceder a la facturacion de los Items que hacen parte del mismo, permitiendo la facturacion. Se realizo nuevamente, la radicación del acta de cobro N.7subsanada, conforme a las observaciones realizadas por parte de la Supervisión, durante esta semana se avanzo en la validacion del acta de cobro del periodo del diciembre N.8, junto con el Contratista. Asimismo, fueron radicadas las actas de cobro N.6 y 7, del Contrato de Interventoria. Se avanzo en la presentacion del acta de cobro N.6 del Contratista, para presentacion a la Supervision, actividades, como cantidades revisadas y validadas en el sitio del proyecto. La radicacion de las actas de Interventoria, las cuales de igual manera tenian observaciones por parte de la Supervision, sobre las cuales se ha trabajado en la subsanacion. Fueron finalizados por parte del contratista, los trabajos de pintura interna en sede Bomberos, de tal manera que, junto con los trabajos de impermeabilizacion validados en esta infraestructura, se pueda realizar la entrega general de esta sede.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001240 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 2.896.025.016,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 450.665.880	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	20,00	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	20,00	**Plazo actualizado:**	20,00
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.896.025.016	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1) Ejecucion del informe semanal N.44.
2) Radicacion del acta de obra #7, subsanada.
3) Verificacion y ajuste de los documentos, para la presentacion del acta N.8, correspondiente a diciembre.
4) Se realizo la actualizacion de la bitacora del proyecto, en mesa de trabajo con el Residente de Obra.
5) Revision de cantidades de obra, conciliacion de las mismas y de las actividades ejecutadas para el reporte semanal.
6) Revision y respuesta a correspondecia (enviada y recibida), por medio de oficios y correos.
7) Revision programacion de obra y ajuste del % fisico y financiero, para el seguimiento a la ejecucion.
8) Validacion de los informes Semanales 43 y 44, del Consorcio Obras la Sabana.
9) Verificacion del uso de EPP y de los procedimientos para el trabajo seguro en alturas.
10) Revision de la informacion SST del personal de obra, orden, aseo y todo lo relacionado con temas ambientales.
11) Recorrido de obra, para la toma de medidas en sitio, actividades: S.I Policarbonato, impermeabilizacion de losas.
12) Diligenciamiento y envio del acta de comite #39.
13) Revision de actividades, cantidades y memorias para incluir en el acta de cobro #8 (diciembre).

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3.43%.

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región, aspecto sobre el cual se estan realizando las respectivas gestiones por parte del Contratista, asi mismo se aclara que el personal operativo contratado hasta el momento pertenece a la region.

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del Aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional, lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que genererá beneficios económicos para la región. De igual modo, se generaran puestos de empleo en consideracion del porcentaje de contratacion de personal local, dispuesto en las condiciones tecnicas del contrato, esto para personal operativo, como administrativo.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
N.A	**N.A**	 
No hay vehiculos a la fecha	No hay equipos a la fecha	En este periodo, reportamos el uso de andamios certificados. Continua la utilizacion de lineas de vida y equipos de seguridad para el personal. De igual modo, se relacionan tres hidrolavadoras en funcionamiento para actividades a nivel de cubiertas, se incluyen 3 cuerpos de mangueras y extensiones. Herramienta menor basica y elementos de aseo, como cepillos, escobas, desengrasantes, detergente neutro y limpiavidrios.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (50% LT; 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	100%	APROBADO
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	CESAR FERNANDO LOSADA	11%	APROBADO
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	APROBADO
	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO	30%	APROBADO
	CADENERO	-	30%	APROBADO
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA		-	-	-
	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	100 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	DIRIGIDO A
6-dic-25	CIMGAIN–507-2025	Radicación acta de obra No.7 Lado Tierra, del 01 al 31 de noviembre del 2025. Consorcio Obras la Sabana.	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
9-nov-25	CIMGAIN–508–2025	Acta de recibo parcial de interventoría No. 7 del periodo del 01/11/2025 al 301/11/2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
9-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Solicitud Factura Definitiva Acta Parcial de Interventoría No.6 - Contrato No.24001242 H3 de 2024	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
9-dic-25	CIMGAIN–511–2025	CIMGAIN–511–2025 - Informes mensuales Noviembre Imga Ingenieros	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
10-dic-25	CIMGAIN–496-2025	CIMGAIN-482-2025_Validacion balance mayores y menores cantidades LA SABANA (Reenvio de la Informacion)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
10-dic-25	CORREO ELECTRONICO	MTTO - LADO TIERRA - BATERIAS UPS (se reenvia informacion, según solicitud)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
10-dic-25	CIMGAIN–512-2025	Visto Bueno informe semanal N. 43 Consorcio Obras la Sabana, Lado Tierra	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.
10-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Validacion para presentacion, PRE ACTA DE CORTE No 8	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.
10-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Entrega informe semanal N.43; Proyecto Lado Tierra_Aeropuerto Leticia	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.
11-dic-25	CIMGAIN–516-2025	Validación S.I flanches metalicos, para cubiertas de la Terminal de Pasajeros	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.
12-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Revisión y observaciones - Acta parcial de interventoría No. 7 - Noviembre 2025 (se da respuesta a las observaciones de la Supervision)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
12-dic-25	CORREO ELECTRONICO	RV: Revisión y observaciones - Acta parcial de interventoría No. 7 - Noviembre 2025 (respuesta a observaciones)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.
12-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Citación Comité de seguimiento Lado Tierra N.40; 12/dic/2025.	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Maria Consuelo Duran Caro. Supervisor.
12-dic-25	CIMGAIN–521-2025	Visto Bueno informe semanal N. 44 Consórcio Obras la Sabana, Lado Tierra	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CODIGO/TIPO	ASUNTO	ENVIADO POR	DIRIGIDO A
9-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Invitación: Revision Corte 8 - Diciembre mar 9 de dic de 2025 11am - 12pm (COT) (imgaingenierosconsorcio@gmail.com)	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
9-dic-25	COS-1240-LET-OF193	Radicacion Informe Semanal N.º 43	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-dic-25	COS-1240-LET-OF191	Solicitud de uso de BMA para suministro e instalación de flanches	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-dic-25	COS-1240-LET-OF195	Solicitud de autorización para uso de BMA – Suministro de 30 baterías banco UPS (Subestación 5).	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Mesa de trabajo se adjuntan documentos corregidos para continuar con el trámite (balance menores/mayores cantidades).	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-dic-25	CORREO ELECTRONICO	ENTREGA PRE ACTA DE CORTE No 8 (CORREGIDA, SEGÚN OBSERVACIONES INTERVENTORIA).	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
10-dic-25	CORREO ELECTRONICO	Invitación: Revision Informes y Acta mié 10 de dic de 2025 3pm - 4pm (COT) (imgaingenierosconsorcio@gmail.com)	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
12-dic-25	CORREO ELECTRONICO	RV: Recomendaciones de ajuste – Acta Parcial No. 7 del Contrato 24001240 H4	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. Supervisor.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
5-dic-25	COS-1240-LET-OF196	Presentacion Informe Semanal N.º 44	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTAS CONTRATISTA/LA SABANA	AMORTI ACTA 1	VALOR ACTAS	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO/ACTA N°
			$ 2.896.025.016,00	
$ 465.036.751,00	$ 74.405.880	$ 465.036.751	$ 2.430.988.265,00	PAGADA (1)
$ 73.545.282,00	$ 11.767.245	$ 61.778.037	$ 2.357.442.983,00	PAGADA (2)
$ 40.551.122,00	$ 6.488.180	$ 34.062.942	$ 2.316.891.861,00	PAGADA (3)
$ 44.291.730,00	$ 7.086.677	$ 37.205.053	$ 2.272.600.131,00	EN TRAMITE (4)
$ 326.868.773,00	$ 52.299.004	$ 274.569.769	$ 1.945.731.358,00	EN TRAMITE (5)
$ 211.386.248,00	$ 33.821.800	$ 177.564.448	$ 1.734.345.110,00	EN TRAMITE (6)
$ 100.717.643,00	$ 16.114.823	$ 84.602.820	$ 1.633.627.467,00	EN TRAMITE (7)

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880,0	$ 74.405.880,00	$ 376.260.000
	$ 11.767.245,00	$ 364.492.755
	$ 6.488.180,00	$ 358.004.575
	$ 7.086.677,00	$ 350.917.898
	$ 52.299.003,68	$ 298.618.894
	$ 33.821.800,00	$ 264.797.094
	$ 16.114.823,00	$ 248.682.271

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ACTAS INTERVENTORIA	ACUMULADO FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
		$ 1.685.576.900	
$ 141.913.832,00	$ 141.913.832,00	$ 1.543.663.068,00	CANCELADA (1)
$ 42.847.431,00	$ 184.761.263,00	$ 1.500.815.637,00	CANCELADA (2)
$ 39.480.155,00	$ 224.241.418,00	$ 1.461.335.482,00	EN TRAMITE (3)
$ 18.177.753,00	$ 242.419.171,00	$ 1.443.157.729,00	EN TRAMITE (4)
$ 80.311.293,00	$ 322.730.464,00	$ 1.362.846.436,00	EN TRAMITE (5)
$ 59.145.081,00	$ 381.875.545,00	$ 1.303.701.355,00	EN TRAMITE (6)


REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSPECCION AREAS LADO TIERRA


Plano Arquitectonico Areas en intervencion



A continuacion, se resaltan las zonas intervenidas a nivel de cubiertas y demas mantenimientos, que se ejecutan en Terminal, TWR y sede Bomberos base SEI: **(1)** Suministro e instalacion de flanches metalicos. **(2)** Correccion de filtraciones en cubiertas, ajuste flanches y remates de silicona. **(3)** Limpieza de alero de cubierta, sobre fachada principal. Se dio inicio a la limpieza del Alero Lado Tierra del Modulo 02 **(4)** Limpieza de cubiertas de las pasarelas, del Modulo 02 y 01, sobre el Lado Aire. **(5)** Trabajos de limpieza de alero en Policarbonato Lado Aire. **(6)** Mantenimientos/limpieza de fachada principal (LT) sobre Modulos 1 y 2, Terminal de pasajeros. **(7)** Limpieza de superficies de fachadas del Lado Aire.

ZONAS EN INTERVENCION TERMINAL/TORRE (CUBIERTAS/FACHADAS)



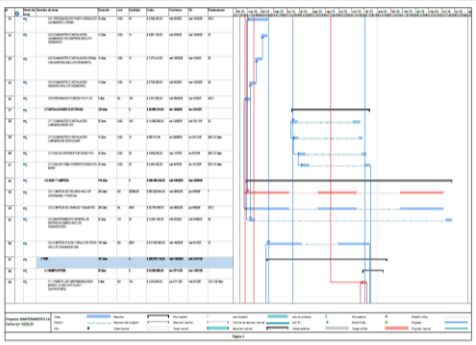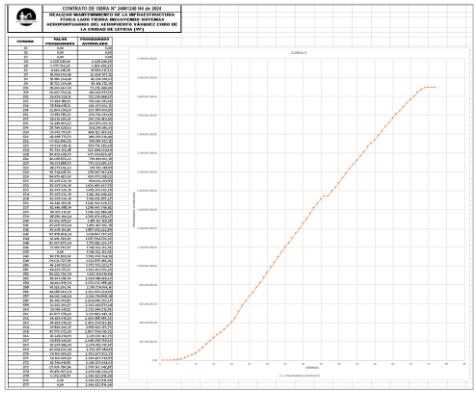ZONAS EN INTERVENCION TERMINAL/TORRE/BOMBEROS



Presentacion de la programacion de obra (Aval por medio de oficio CIMGAIN–092-2025; 26/03/2025). Radicado por medio plataforma Aerocivil 28/03/25. RAD: 2025190010037037; CIMGAIN-092-2025_Lado_Tierra_Rta Ofi COS-1240-LTE Programación de Obra	
Presentacion del flujo de caja	

Presentacion Seguimiento Fisico


AVANCE FÍSICO SEMANAL


19-abr	25-abr		11	4,00%	6,65%	2,64%
26-abr	2-may	3	12	5,13%	8,52%	3,39%
3-may	9-may		13	6,42%	9,32%	2,90%
10-may	16-may		14	7,71%	10,16%	2,45%
17-may	23-may		15	8,97%	11,21%	2,24%
24-may	30-may	4	16	10,23%	12,48%	2,25%
31-may	6-jun		17	11,27%	13,68%	2,41%
7-jun	13-jun		18	12,73%	16,58%	3,85%
14-jun	20-jun		19	14,67%	17,78%	3,11%
21-jun	27-jun	5	20	16,44%	18,83%	2,39%
28-jun	4-jul		21	18,27%	20,50%	2,23%
5-jul	11-jul		22	20,34%	21,52%	1,18%
12-jul	18-jul		23	22,30%	22,48%	0,18%
19-jul	25-jul		24	24,28%	23,98%	-0,30%
26-jul	1-ago	6	25	26,26%	24,96%	-1,30%
2-ago	8-ago		26	27,88%	25,98%	-1,90%
9-ago	15-ago		27	29,86%	27,76%	-2,10%
16-ago	22-ago		28	31,50%	28,57%	-2,93%
23-ago	29-ago	7	29	33,51%	30,30%	-3,21%
30-ago	5-sep		30	35,51%	30,82%	-4,69%
6-sep	12-sep		31	37,52%	31,08%	-6,44%
13-sep	19-sep		32	39,52%	33,79%	-5,73%
20-sep	26-sep		33	41,53%	37,80%	-3,72%
27-sep	3-oct	8	34	43,53%	39,97%	-3,56%
4-oct	10-oct		35	45,54%	41,45%	-4,08%
11-oct	17-oct		36	47,18%	42,68%	-4,50%
18-oct	24-oct		37	49,18%	43,57%	-5,61%
25-oct	31-oct	9	38	51,19%	45,22%	-5,97%
1-nov	7-nov		39	52,81%	47,44%	-5,37%
8-nov	14-nov		40	54,78%	49,02%	-5,76%
15-nov	21-nov		41	56,29%	51,02%	-5,26%
22-nov	28-nov	10	42	58,04%	54,15%	-3,90%
29-nov	5-dic		43	59,73%	55,93%	-3,80%
6-dic	**12-dic**		**44**	**61,12%**	**57,36%**	**-3,77%**
13-dic	19-dic		45	62,96%	0,00%	

Presentacion Seguimiento Financiero




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEMANAL

Inicio sem	Fin de la sem	Mes	Semana	Planeado $	Ejecutado $	Pagado
19-abr	25-abr		11	115.905.549	192.470.481	0,0
26-abr	2-may	3	12	148.686.666	246.836.649	0,0
3-may	9-may		13	185.930.668	269.907.467	0,0
10-may	16-may		14	223.174.670	294.165.895	0,0
17-may	23-may		15	259.820.330	324.570.851	0,0
24-may	30-may	4	16	296.240.825	361.490.351	0,0
31-may	6-jun		17	326.284.978	396.143.051	0,0
7-jun	13-jun		18	368.680.911	480.091.589	0,0
14-jun	20-jun		19	424.876.397	514.897.369	0,0
21-jun	27-jun	5	20	476.037.634	545.315.649	465.036.751,0
28-jun	4-jul		21	528.988.944	593.562.585	0,0
5-jul	11-jul		22	589.005.306	623.165.520	0,0
12-jul	18-jul		23	645.762.586	650.992.439	0,0
19-jul	25-jul		24	703.068.479	694.405.898	0,0
26-jul	1-ago	6	25	760.374.372	722.775.687	0,0
2-ago	8-ago		26	807.378.082	752.296.564	0,0
9-ago	15-ago		27	864.683.975	803.948.673	0,0
16-ago	22-ago		28	912.258.832	827.288.296	0,0
23-ago	29-ago	7	29	970.323.412	877.437.421	0,0
30-ago	5-sep		30	1.028.387.993	892.484.987	0,0
6-sep	12-sep		31	1.086.452.573	899.994.987	0,0
13-sep	19-sep		32	1.144.517.153	978.572.437	0,0
20-sep	26-sep		33	1.202.581.734	1.094.716.094	0,0
27-sep	3-oct	8	34	1.260.646.314	1.157.506.462	0,0
4-oct	10-oct		35	1.318.710.895	1.200.449.395	0,0
11-oct	17-oct		36	1.366.336.899	1.235.913.540	0,0
18-oct	24-oct		37	1.424.401.479	1.261.814.330	0,0
25-oct	31-oct	9	38	1.482.353.025	1.309.491.930	0,0
1-nov	7-nov		39	1.529.329.471	1.373.837.670	0,0
8-nov	14-nov		40	1.586.585.477	1.419.746.694	0,0
15-nov	21-nov		41	1.630.066.239	1.477.676.240	0,0
22-nov	28-nov	10	42	1.680.973.179	1.568.062.266	0,0
29-nov	5-dic		43	1.729.886.426	1.619.735.966	0,0
6-dic	**12-dic**		**44**	**1.770.146.931**	**1.661.076.106**	
13-dic	19-dic		45	1.823.403.464	0	0,0

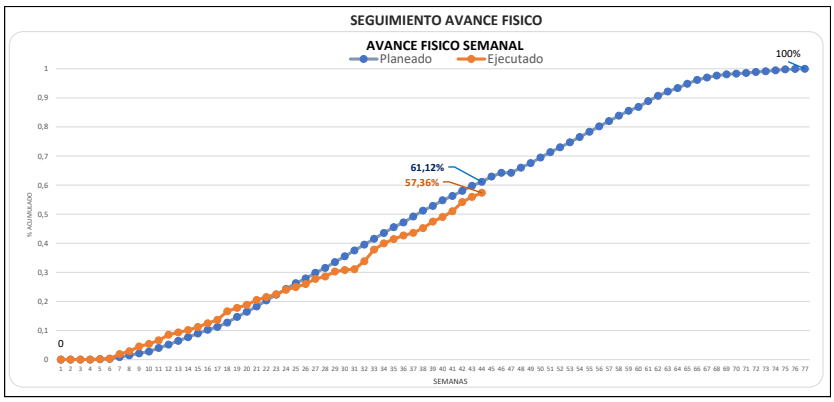

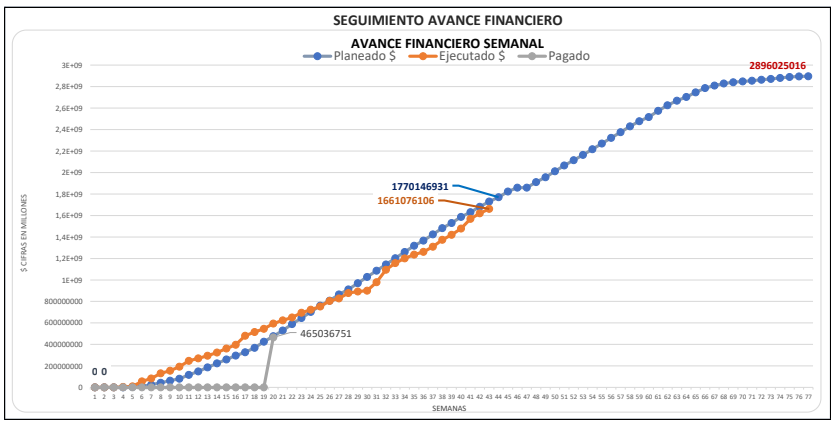

Actividades de limpieza de cubiertas pasarelas Lado Aire, incluyendo elementos de soporte (vigas, tensores, etc) en tramos de Modulo 02 y Modulo 01. Uso de andamios certificados, lineas de vida, señalizacion y todos los protocolos para trabajo seguro en alturas.	
Actividades de limpieza de cubiertas y elementos de soporte (vigas, tensores, etc) sobre el alero de la fachada posterior, del Lado Aire, tramos Modulos 03 y 02. Uso de andamios certificados, señalizacion, lineas de vida y todos los protocolos para trabajo seguro en alturas. Se realiza aseo periodico sobre el perimetro de las zonas intervenidas	
Trabajos de limpieza de superficies de fachadas principal Lado Tierra, sobre el Modulo 02. De igual forma, se realiza la limpieza de bajantes existentes, se realiza limpieza con agua, jabon y desengrasante, sobre estos elementos. Asimismo, uso andamios certificados, protocolos trabajo en alturas, señalizacion areas de trabajo.	

Actividades, de ajuste y reinstalacion de flanches de cubiertas, con el objetivo de subsanar las filtraciones de ALL al interior de la Terminal. Asimismo, aplicación de silicona, para sello de vidrios a nivel de cubiertas, incluyendo reparaciones de flanches y remates de cubiertas que presentan deterioros	     
Area SST: Pausas activas al personal operativo, verificacion y uso de EPP, S.I lineas de vida, instalacion andamios certificados, señalizacion y capacitaciones al personal Operativo. Finalmente, se reporta visita de la Especialista Hidraulica de la Interventoria, se realiza recorrido de obra, en las infraestructuras de la Terminal de carga, donde se evidencia el estado actual, en relacion a la acumulacion de ALL en el patio de maniobras	      

REUNIONES Y OBSERVACIONES GENERALES	
Se describen los ultimos compromisos abordados en el comite N.39, realizado el 03/12/2025: (1) La supervisión realizo la entrega de las fichas técnicas de los equipos de AA, de esta forma, se podrá evaluar de forma más integral los trabajos de instalación. (2) Se realizará la radicación del acta de cobro N.6, correspondiente al mes de octubre 26/11/25. Radicación del acta 7 antes del 05/12/25 y la 8 antes del 10/12/25. Fue radicada el acta de cobro N.6 del mes de Octubre y se avanzo en el montaje y validacion del acta de cobro N.7 de Noviembre, se proyecto en mesa de trabajo, la proyeccion del acta de cobro de diciembre N.8. (3) Se realizará la radicación del modificatorio a la Supervisión, se cumplio con este compromiso, se espera de igual forma, respuesta y validacion del Aclaratorio por parte de la Supervision, el cual permitira avanzar en el cobro de los Items 8.1 y 8.2, del capitulo de Aseo y Limpieza. (4) La Interventoría, dará respuesta a la propuesta técnico/económica, suministrada por parte de stv, sobre la evaluación del certificador del ascensor de twr. Fue validada la necesidad y se espera el cumplimiento de los demas requisitos, como presentacion de cotizaciones complementarias, para la validacion del equipo. (5) Está pendiente por parte del contratista, la propuesta de un plan de contingencia para finalización vigencia 2025. (6) Se realizaro comité de seguimiento N.39, de manera presencial en la ciudad de leticia-amazonas, con la presencia de la Supervisión del contrato, profesionales de Obra y de Interventoria, se realizan recorridos de Obra, para los Contratos de Lado Tierra y Lado Aire. La Supervision solicita evaluar la posibilidad de ajustar las proyecciones de inversion de la BMA, de tal manera que se puedan incluir el suministro de unas baterias y mantenimiento de una UPS, que se requieren como soporte tecnico vital en las operaciones. La Supervision informara, sobre la solicitud y requisitos totales que se necesitan para esta actividad. El comite N.40, fue aplazado para el proximo lunes 15/dic/2025, esto en consideracion de la priorizacion de trabajos administrativos, que tienen curso durante el periodo de diciembre, cierre de vigencia del periodo del 2025.	
CONCLUSIONES	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA LT**
El Contratista, avanza en la ejecucion de actividades en Terminal, TWR y sede de bomberos. Pendiente definicion sobre la solicitud del Modificatorio y aclaratorio, proyecto Lado Tierra; El Aclaratorio se muestra como un aspecto fundamental, para el cumplimiento de las metas financieras de la vigencia del 2025. Se realizo la radicacion del acta de cobro de Noviembre y mesa de trabajo para el montaje del acta de diciembre, la cual sera radicada antes del 15/dic/2025, aclarando que la misma, se presentara considerando las actividades incluidas en el Aclaratorio de los Items 8.1 y 8.2, de los capitulos de aseo y limpieza. Se dio respuesta sobre la propuesta de mantenimiento del ascensor, considerando el informe tecnico emitido por parte de la empresa certificadora. De igual manera, se realizo la radicacion de las actas de cobro de la Interventoria. Las actividades de fin de año, se acordaron en la orden de trabajo N.1, conforme a los trabajos proyectados en mesas de trabajo y las que puedan surgir como gestión técnica. El dia 11/dic/2025, se recibio visita a sitio de la Especilista Hidraulica de la Interventoria, con el objetivo de verificar el estado actual de la Terminal de cargas, en relacion a las inundaciones del patio de maniobras, se entregara un concepto tecnico, en relacion a esta visita.	**ARQ. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ**
