- Herreros:4
- Operadores:9
- Conductores:12
- Mecánico:1
- Personal de Vigilancia:2

Indica que para la fecha de corte mencionada, se contaba con un total de 95 trabajadores en la obra.

- ✓ **Medicina preventiva:** señala que todo el personal que ingresa a laborar cuenta con un examen médico ocupacional; dicho examen es realizado por un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo y se realiza con el fin de verificar las condiciones de salud de cada uno de los trabajadores y la aptitud médica para laborar.

- ✓ **Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (copasst):** El COPASST es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.A la fecha se han realizado 13 reuniones mensuales.

- ✓ **Comité de convivencia laboral (COCOLA):** El COCOLA es un grupo de apoyo conformado por los trabajadores en el que se busca reconocer y controlar el riesgo psicosocial o situaciones de acoso laboral en una organización. A la fecha se han realizado 5 reuniones, dado que esta se realiza trimestral.

- ✓ **Capacitación a los trabajadores:** expone que para el periodo se han realizado las siguientes capacitaciones:

  - Socialización – Matriz de riesgos de peligros.
  - Acoso Laboral (miembros CCL).
  - Conservación auditiva.

- ✓ **Vehículos, maquinaria y equipos de obra:** expone que en la obra se encuentran en actividad 14 volquetas doble troque, 6 volcos, 1 cisterna, 2 mini cargador bobcat, 2 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 torre grúas, 2 micropiloteadora y 2 piloteadoras

- ✓ **Frecuencia de accidentabilidad:** expone que a la fecha del corte del 31 de mayo no se reportaron accidentes.

- ✓ **Ausentismo laboral:** manifiesta que el ausentismo laboral con fecha de corte del 31 de mayo se ha generado por causas personales.

- ✓ **Inducción al personal:** expone que a todo el personal que ingresa al proyecto se le realiza inducción del componente ambiental, de riesgos y de seguridad y salud en el trabajo.

- ✓ **Identificación vehículos de carga:** refiere que todos los vehículos que brindan servicio en la obra, cuenta con la debida identificación. Cuya identificación contiene el número del contrato, la entidad contratante y el número telefónico de atención a la comunidad en caso de alguna novedad o acontecimiento con los vehículos.

- ✓ **Acompañamiento de actividades en campo:** refiere que todas las actividades cuentan con el acompañamiento del área de seguridad y salud en el trabajo.

- ✓ **Señalización áreas internas:** manifiesta que toda la obra se encuentra debidamente señalizada. Además, de direccionar a todo el personal al punto de encuentro en caso de alguna emergencia.

- ✓ **Actividades de excavación en el predio:** indica que dado que la actividad que se está realizando desde el área técnica son las excavaciones, desde el componente se realiza inspección de los elementos de protección personal y delimitación de las áreas de excavación.

- ✓ **Inspección de equipos de emergencia:** manifiesta que de manera constante se realiza la inspección a los extintores y a las camillas ubicadas en la obra.

- ✓ **Plan de manejo de tráfico:** refiere que actualmente la obra cuenta con el COI vigente con fecha hasta el 26 de febrero del 2026. Igualmente, en campo se realiza la verificación constante de que se está cumpliendo con la señalización requerida por la secretaria de movilidad.

La profesional social Diana Marcela Ortiz de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, realiza la presentación de las actividades a ejecutar desde su componente:

- ✓ **Programa de información:** Refiere que la reunión informativa de inicio que se hizo el 08 de marzo del 2024. Señala que con el 50% de avance se realiza la segunda reunión y cuando el proyecto esté al 100% se realiza la reunión de finalización. Igualmente, expone que se incluyen las reuniones extraordinarias, para cuando el contrato o la comunidad lo requiera.

- ✓ **Programa de divulgación:** indica que así como se realiza todos los meses, se convoca al comité de participación ciudadana N° 15, donde se entregaron 42 piezas, las cuales fueron divulgadas mediante oficio, correo electrónico y WhatsApp.

  En relación de los oficios se remitió el día 13 de junio, con un tiempo estimado de ocho días antes, la convocatoria a las siguientes entidades distritales:

  - IDRD – Subdirección técnica de parques.
  - IDRD – Subdirección técnica de recreación y deporte.
  - IDRD – Oficina de asuntos locales
  - Alcaldía Local de Bosa.
  - Junta Administradora Local de Bosa.
  - Alcaldía Local de Kennedy.
  - Junta Administradora Local de Kennedy.
  - Personería Local de Kennedy.
  - Federación Colombiana de Ciclismo.
  - Liga de ciclismo de Bogotá.
  - Secretaría de seguridad, convivencia y justicia.
  - Departamento administrativo del espacio público.
  - Contraloría de Bogotá

- ✓ **Programa de control social – comités de participación ciudadana:** expone que se cuenta con 37 personas inscritas, las cuales indicaron su interés de participar en este escenario a través de la reunión informativa de inicio, comités de participación ciudadana y mediante los canales de atención al ciudadano.

  Indica que a la fecha se han realizado catorce comités de participación ciudadana. A continuación se relacionan las fechas y números de asistentes:

N° de comité	Fecha	Asistentes
1	18/04/2024	9 participantes
2	16/05/2024	9 participantes
3	20/06/2024	21 participantes
4	18/07/2024	27 participantes
5	22/08/2024	27 participantes
6	26/09/2024	25 participantes
7	24/10/2024	21 participantes
8	14/11/2024	20 participantes
9	12/12/2024	15 participantes
10	22/01/2025	15 participantes
11	21/02/2025	11 participantes
12	21/03/2025	13 participantes
13	11/04/2025	15 participantes
14	23/05/2025	14 participantes
15	20/06/2025	En ejecución

Se realiza la recomendación a los asistentes que apoyen la convocatoria, ya que se inscribieron 37 personas y la asistencia no es la esperada. Se aclara que desde la reunión informativa de inicio se les informo que las reuniones serían en horas de la mañana o tarde entre semana. Por tal razón, se les informo que es importante contar con el tiempo para participar en estos escenerarios.

- ✓ **Programa de atención a la comunidad:** indica que se brinda atención al ciudadano a través de línea telefónica, correo electrónico, el comité de acompañamiento ciudadano, WhatsApp y verbal. Para la modalidad virtual se brinda la atención mediante la línea telefónica 3102751982 y correo electrónico social.velodromo@cyg.com.co, Para la modalidad presencial la profesional responsable es Diana Marcela Ortiz en la dirección Carrera 91 # 43 - 20 Sur, una vez se instale el pendón, se brindará atención los días martes de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. y sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

  Puntualiza que se encuentran a la fecha 13 PQRS cerradas, 6 en trámite, para un total de 19 recibidas en la totalidad de la ejecución del proyecto, con fecha de corte del 12 de junio del 2025. Destaca que se recibió una solicitud posterior a la fecha de corte y esta será relacionada en el próximo comité de participación.

- ✓ **Programa de sostenibilidad social, económica y ambiental:** manifiesta que a la fecha del corte del 25 de mayo del 2025 se vinculó el siguiente personal:

REPORTE MENSUAL MAYO (Corte 25 de mayo)								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	161	26	32	3	11	0	49	112

Igualmente, indica que de acuerdo a los porcentajes, está vinculado el 16% de mujeres y el 22% de población diferencial, que corresponde a población joven, adulta mayor, entre otros.

Intervenciones:

- ✓ Uno de los asistentes manifiesta "*la obra se está ejecutando bajo unas bases internacionales de la construcción, los estándares para estos escenarios o desarrollos de esta magnitud y deben cumplir todas las normas*"

R/: El arquitecto John Ramos de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir manifiesta que la UCI (Unión Ciclista Internacional), por lo cual establece sus modelos para los escenarios y todos sus requerimientos para que se pueda garantizar la competencia internacional, pero a nivel constructivo claramente debemos de cumplir las normas propias de construcción, sino también se avala una licencia de construcción que garantiza que todo lo presentado cumple normativamente y técnicamente a lo que requiere el escenario.

- ✓ La señora Clara menciona: "*La vía de la calle 49 sur se encuentra muy deteriorada por el paso de los vehículos pesados.* Es importante que se realice un mantenimiento por la cantidad de huecos en el sector".

R/: La profesional social Diana Ortiz de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir manifiesta que en la reunión informativa de inicio se les indico a los asistentes que se realizarían unas actas de vecindad de inicio de vía y espacio público, las de la calle 49 sur fueron firmadas por la alcaldía Local de Bosa. Al finalizar las actividades constructivas se vuelve a tomar el registro fotográfico, citar a la Alcaldía y se determina si las afectaciones fueron ocasionadas por el proyecto se realizaran los arreglos correspondientes, pero hasta finalizar obra, dado que siguen ingresando vehículos de carga pesada.

La ingeniara Paula Blanco de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir adicionalmente menciona que los conductores al ingresar al proyecto se les expone mediante la inducción que no pueden transitar en la zona residencial, ellos tienen habilitada la avenida Guayacanes y la calle 49 sur. Por eso es de gran importancia que si alguno de los vehículos con el ticket De la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, transita por vías no autorizadas, por favor contactarse a la línea de atención al ciudadano con el número de placa, para realizar el respectivo llamado de atención.

- ✓ La señora Blanca Cecilia manifiesta "*en cuanto la seguridad y el riesgo. ¿En el temblor que se presentó se ocasiono alguna afectación?*"

R/: La ing. Paula Blancc de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir manifiesta que el lunes siguiente en el que se retomó actividades, desde el componente de gestión de riesgo y geotécnica hicieron una inspección visual de los taludes a la vista en el proyecto. No se contaron con fisuras evidentes, pero si movimiento de tierras. Es importante destacar que se contaba con estabilidad porque ya están todos los pilotes instalados, garantizando seguridad a nivel de estabilidad del terreno local. Puntualiza que no se ha evidenciado afloramiento de lixiviados por el sismo.

los estudios indican un comportamiento cíclico del agua que afecte directamente a los conjuntos residenciales. Por lo tanto, no se evidencia que la obra esté alterando el flujo natural, situación que considera importante socializar con la comunidad.

La Señora Elsa Barón administradora de Margarita etapa 1 indica "*mientras que el área técnica verifica, realiza los estudios y dan respuesta, a mi si me gustaría que cerquemos, marquemos o delimitemos esa zona.*"

La profesional social Mary Luz Ramírez informa que tanto el contratista como la interventoría han realizado visitas técnicas en los puntos señalados, y que se llevó a cabo una reunión el miércoles anterior para tratar esta situación. Señala que actualmente se encuentran en curso los análisis por parte de las distintas especialidades, y que el resultado de estos será verificado y comunicado por la interventoría.

Añade que se encuentran en trámite seis (6) PQRSD asociadas a afectaciones similares, y que a partir del 1 de julio se iniciarán las intervenciones correspondientes. En lo que respecta a las zonas comunes, estas también están en revisión. Se destaca que el mes anterior se realizó una visita técnica con participación de profesionales del Velódromo y del Centro de Alto Rendimiento. Finalmente, indica que se ha mantenido una comunicación constante con la administradora del conjunto como representante de la comunidad, y que se continuará con el seguimiento y la entrega de respuestas conforme al análisis técnico de cada especialidad.

La Señora Elsa Barón administradora de Margarita etapa 1 manifiesta "*Estoy de acuerdo con lo que menciona y el análisis, pero esto se ha venido mencionando desde enero, en relación al nivel freático que se presentó desde agosto, nosotros le dimos manejo, porque la póliza dijo que es un tubo roto, correspondiente a un daño de acueducto o de aguas residuales, pero resulta que no. Nosotros tapamos el hueco y no encontramos nada de eso. Posteriormente, un especialista del Acueducto indicó que se trataba de presencia de nivel freático con lixiviado. En los 20 años de existencia del conjunto, nunca se había presentado esta situación. Actualmente, esto ha generado inestabilidad en la superficie, con hundimiento de adoquines, haciendo el área intransitable. Adicionalmente, representa un riesgo ya que los niños juegan en ese sector*"

La ingeniera Paula Blanco de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir responde que, frente a lo expuesto, es importante precisar que la cimentación de la obra se ejecutó en octubre del año pasado, por lo cual este dato es relevante dentro del análisis técnico, ya que el evento descrito por la administradora ocurrió antes del inicio de las actividades de excavación y cimentación de la obra. No obstante, se compromete a consultar internamente si es posible apoyar a la administración con un cerramiento preventivo en la zona afectada, con el fin de minimizar riesgos mientras se avanza en el análisis técnico correspondiente.

- ✓ La señora blanca procede a realizar la siguiente intervención: "Es de gran importancia contar con la participación de las Alcaldías Locales en estos escenarios de participación. Porque los procesos ciudadanos están presentes solo las comunidades y las entidades distritales no están participando"

R/: La profesional social Diana Ortiz de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir indica que ocho días antes del encuentro se radica mediante oficio a la Alcaldía Local de Kennedy y de Bosa, con el fin de contar con la participación de estas entidades en los encuentros.

La Señora Elsa Barón administradora de Margarita etapa 1 manifiesta: "Es importante realizar la convocatoria con más tiempo de antelación, para que puedan participar o asignar un delegado "

La profesional Johanna Barrientos de riesgos de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir refiere que la medida de sacos de contención no está ligada por movimientos sísmicos, si no es una medida relacionada con el proceso de obra. El siguiente día hábil del acontecimiento se realizó inspección visual con el área técnica, geotecnia y de riesgos. Además, de destacar que de manera semanal se realiza seguimiento desde geotecnia y esos informes no han indicado afectación por la situación.

La señora Blanca Cecilia refiere que hace algunos años tenían que meter unos tubos que se dirigían al canal para retirar todas las aguas que se generaban por esos acontecimientos. Pero en el momento que se empezó a construir, estas aguas se dejaron de presentar por los diferentes tratamientos que se han venido haciendo.

La ing. Paula Blanco de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir manifiesta que en cada túnel que se está excavando, cuenta con una zona adecuada denominada pozo de achique, donde se direcciona toda el agua considerada lixiviado. De manera posterior se retira todo el material peligroso mediante el cash tank que es un tanque grande hermético. Puntualiza que de acuerdo a las dimensiones de los túneles se realizaron varios pozos para controlar el agua. El túnel de apoyo que es el más largo tiene dos pozos de achique para garantizar que el agua sea conducida hacia estas zonas. Refiere que estos pozos permiten separar las lluvias a los lixiviados.

- ✓ Una asistente Claudia manifiesta: "*yo creía que todo el proyecto iba desde la calle 49 sur hasta la av. Villavicencio, pero vi que está dividida en dos partes.*"

R/: La ing. Paula Blanco de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir indica que el predio actualmente está dividida en tres zonas y presenta el registro fotográfico donde se proyecta la ubicación. Refiere que se encuentra el Centro de Alto Rendimiento, El Velodromo que es el proyecto que se está presentando y en el costado occidental del predio los futuros proyectos que ya cuenta con los estudios y diseños.

La Señora Elsa Barón administradora de Margarita etapa 1 manifiesta *"Buenos días, nosotros vivimos en la etapa 1 y quiero dejar en conocimiento de la comunidad que, en las áreas comunes del conjunto, se ha presentado presencia de nivel freático, lo cual ha generado la aparición de un lixiviado. Nos gustaría que nos ayudaran a mitigar esta situación mientras se finaliza la obra, con el fin de evitar posibles riesgos. Consideramos necesario aislar o señalizar el área afectada, ya que actualmente los niños están jugando en esa zona".*

R/: La profesional social Diana Ortiz de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir informa que los arreglos contemplados al finalizar la obra corresponden específicamente a la vía y el espacio público. En cuanto a posibles afectaciones en predios o zonas comunes del conjunto residencial, se revisarán los casos de manera individual, emitiendo respuesta formal a cada requerimiento presentado.

La ingeniera Paula Blanco de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir aclara que los equipos de hidrogeología, geotecnia, técnica e hidráulica han realizado visitas en el sector mencionado. Explica que dentro del proceso técnico se cuenta con un conducto regular en el cual cada especialista emite su concepto, el cual es evaluado por la interventoría y posteriormente comunicado al solicitante. En caso de evidenciarse que la afectación ha sido ocasionada por la obra, se procederá con la respectiva intervención. Resalta que la respuesta no necesariamente se da al finalizar la obra, ya que cada situación requiere análisis particular.

Con respecto al comportamiento del nivel freático, informa que, según los estudios base del parque y los análisis realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, el flujo natural del agua subterránea es hacia el río Bogotá. En ningún caso

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

La profesional social Diana Ortiz de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir indica que para conocimiento de los asistentes, la fecha del próximo encuentro se realizará el día viernes 18 de julio del 2025 a las 9:00 a.m. en el conjunto Margarita Etapa 1.

Se finaliza la reunión agradeciéndoles a los asistentes su participación. Se contó con la participación de 27 personas con el acompañamiento de la comunidad, los profesionales de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, la Interventoría, IDRD, Integración social, secretaria de planeación y Juntas de acción comunal.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Enviar el acta del encuentro y la presentación del comité de participación a los asistentes N° 15.	Unión temporal metropolitano Porvenir	Una vez se cuente con la aprobación del acta por parte de la interventoría

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN						
¿Se aplicó formato de Evaluación de evento?	**SI**	X	**NO**		**NRO**	12

OBSERVACIONES
Sin novedades.

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	**Profesional social Diana Marcela Ortiz**

4. Acta de la reunión celebrada el 18 de junio de 2025.

BOGOTÁ

ACTA No. 39	REUNIÓN CON COMUNIDAD: Solicitud Nº 20	DD 16	MM Junio	AA 2025

LUGAR:	Conjunto Compartir la margarita etapa 1	HORA DE INICIO: 11:40 am.	HORA FIN: 12:15
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Atender la Solitud de la adm. de etapa 1.		
NRO. Y OBJETO DE CONTRATO	3232 del 2023		
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	UTMP.		

ORDEN DEL DIA

1. Reunión de Adm y UTMP.	4.
2. Recorrido	5.
3. Cierre de Actividad.	6.

TEMAS TRATADOS

Se hace la administradora del Conjunto Compartir la margarita-etapa 1, integrantes del comité de participación ciudadana, miembros del consejo de administración, la unión temporal metropolitano Porvenir (UTMP) y la interventoria - interventores Gbalter.
La administradora del conjunto la señora Elsa Bohórquez manifiesta su preocupación por las afectaciones que se han presentado en las zonas comunes del conjunto
La profesional social de la UTMP indica que por solicitud de la adm. el día 04 de abril se realizo el acta de vecindad y que una vez finalice el pilotaje se realizaría una nueva visita, ahora que la actividad finalizó el 06 de junio y por tal razón estan prestos para la verificación. La administradora solicita que la UTMP debe realizar los arreglos correspondientes, ya que esto no se había presentado previamente, Refiere que el conjunto se construyo hace aproximadamente 22 años y no tenian afectaciones como las de ahora, Consideran que es el nivel freatico. Indican que si no se realizan los arreglos correspondientes acudirían a otras entidades o bloquear la obra, ya que la afectación esta desde agosto.
La profesional social de la UTMP indica que conforme la información se realizará verificación con dirección de obra, el equipo transversal e interventoria, para poder emitir el concepto de las posibles afectaciones.

Scanned with CamScanner

5. Concepto técnico emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Concepto Tecnico No. 09579, 27 de agosto del 2021

ASUNTO:	**Recurso Suelo**	**Control y Vigilancia**		
SECTOR	Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos			
CIIU:	Sección F 3900			
DOCUMENTOS EVALUADOS	Radicado	2021ER173789	19/08/2021	
USUARIO:	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP Predio Gibraltar			
EXPEDIENTE	DM-06-1998-06			
NIT:	899.999.094-1			
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTINA ARANGO OLAYA	C.C:	29.104.391	
DIRECCIÓN:	Kr. 91 # 43-20 Sur			
BARRIO:	004615-OSORIO XII	**TELÉFONO:**	3447000 ext 4514	
LOCALIDAD:	8-KENNEDY	**CUENCA:**	FUCHA	
UPZ:	83-LAS MARGARITAS	**Subcuenca:**	-----	
CHIP Predio:	AAA0138ZKFZ AAA0138ZKBS AAA0138ZKCN	**Dirección CHIP:**	Kr. 91 # 43-20 Sur KR 91 43 08 SUR KR 91 43 08 SUR IN 1	
El predio se encuentra afectado por Zonas de Corredor Ecológico de Ronda "CER"	SI	**Cuerpo hídrico afectado:**	CANAL TINTAL II	
		Acto administrativo que alindera el cuerpo hídrico	RES. 2771 DE 24/03/2010	
Uso del suelo:		Residencial		
REQUIERE ACTUACIÓN DEL GRUPO JURÍDICO DE LA SRHS			***No***	

1 OBJETIVO

En respuesta al memorando 2021IE175705 del 23/08/2021 donde la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial solicita a la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo verificar las precisiones realizadas por la Empresa de Acueducto de Bogotá mediante el radicado 2021ER173789 del 19/08/2021 y determinar si es necesario realizar ajustes a las determinantes ambientales emitidas mediante oficios 2021EE20780 del 03/02/2021 y 2021EE61146 del 07/04/2021; se evalúa la información allegada por dicha Empresa.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

2 ANTECEDENTES

El presente concepto se emite con base en la revisión de los antecedentes del predio denominado Gibraltar, encontrados en el sistema de información de la Entidad FOREST, el expediente DM-06-1998-06 y las bases de datos de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, para el predio objeto de control y vigilancia:

DOCUMENTOS			Descripción	Observaciones
Tipo	No.	Fecha		
Oficio	202407	17/11/2016	Se presenta a la EAAB lineamientos para adelantar actividades de investigación de suelo y agua subterránea en áreas contiguas al predio denominado Gibraltar	EAAB presenta respuesta mediante radicado 2020ER167025 del 29/09/2020
Oficio	173838	06/09/2017	La SDA comunica las determinantes ambientales para la formulación del plan Director del Parque Metropolitano PM-10 Porvenir (Gibraltar) al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.	En respuesta, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP allega los radicados 2019ER104814 del 14/05/2019, 2019ER180582 del 09/08/2019 y 2019ER184547 del 13/08/2019
Radicado	104814	14/05/2019	La EAAB presenta informe de diagnóstico ambiental del predio Gibraltar en el marco de convenio interinstitucional suscrito entre la EAAB- ESP y el IDRD.	Evaluado en el concepto técnico 00325 del 29/01/2021.
Radicado	180582	09/08/2019	La EAAB presenta informe de selección de alternativas tecnológicas, operativas y/o de infraestructura que, partiendo de experiencias nacionales e internacionales, puedan ser aplicadas al cumplimiento de las Determinantes Ambientales Emitidas por la SDA. Diseño detallado de ingeniería a las alternativas de manejo Seleccionadas. Estudio Geotécnico y ambiental de la franja adicional Predio Gibraltar.	Evaluado en el concepto técnico 00325 del 29/01/2021.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

101

DOCUMENTOS			Descripción	Observaciones
Tipo	No.	Fecha		
Radicado	184547	13/08/2019	La EAAB allega complemento de Estudio Geotécnico y ambiental de la franja adicional Predio Gibraltar.	Evaluado en el concepto técnico 00325 del 29/01/2021.
Radicado	167025	29/09/2020	La EAAB informa que la caracterización de los pozos de monitoreo instalados en el predio será realizada en el segundo y cuarto trimestre de 2021.	Se da respuesta mediante oficio 2020EE201699 del 11/11/2020
Oficio	201699	11/11/2020	La SDA informa a la Dirección de Saneamiento Ambiental de la EAAB, que la información allegada mediante radicado 2020ER167025 del 29/09/2020 se encuentra acorde a lo requerido y se reiteran los requisitos previamente informados para que los resultados de los análisis sean válidos y representativos. De igual forma se solicita informar fechas con exactitud a fin de realizar acompañamiento y verificación en la toma de muestras.	Enviado a la EAAB el 12/11/2020. Sin respuesta por parte de la EAAB
Concepto Técnico	00325 (2021IE17142)	29/01/2021	Realizó la evaluación del diagnóstico, selección de medidas de manejo ambiental y diseños detallados de ingeniería para la construcción del Parque Metropolitano PM 10 El Porvenir.	Se emite oficio 2021EE20780 del 03/02/2021
Oficio	20780	03/02/2021	Se comunica al IDRD los determinantes ambientales para formulación del Plan Director del Parque Metropolitano El Porvenir (Gibraltar) de acuerdo al Concepto Técnico 00325 del 29/01/2021	Se allega oficio 2021ER173789 del 19/08/2021 en respuesta
Memorando	58504	31/03/2021	La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo presenta a la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial y Dirección de Control Ambiental, los lineamientos técnicos para desgasificación y muestreo de suelo superficial del predio Gibraltar como alcance al Concepto técnico 00325 del 29/01/2021.	Se emite oficio 2021EE61146 del 07/04/2021
Oficio	61146	07/04/2021	Se comunica al IDRD los lineamientos técnicos para desgasificación y muestreo de suelo superficial del predio Gibraltar como alcance al Concepto técnico 00325 del 29/01/2021 de acuerdo a lo establecido por el memorando o 2021IE58504 del 31/03/2021	Comunicado al IDRD vía correo electrónico el 09/04/2021

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

DOCUMENTOS			Descripción	Observaciones
Tipo	No.	Fecha		
Radicado	173789	19/08/2021	La EAAB presenta copia de la respuesta allegada por tal entidad al IDRD respecto a lo indicado por la SDA mediante oficio 2021EE20780 del 03/02/2021	Evaluado en el presente concepto técnico
Memorando	175705	23/08/2021	La Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial remite a la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo el radicado 2021ER173789 del 19/08/2021	Evaluado en el presente concepto técnico

3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Según la Ventanilla Única de la Construcción – VUC, en su Certificación Catastral, el área de estudio, Parque Metropolitano Porvenir (Gibraltar) se encuentra localizado en la localidad de Kennedy y está compuesto por 3 predios propiedad de la EAAB. En la siguiente tabla, se presenta la información catastral de cada predio que compone el área:

Tabla 1. Información catastral del predio Gibraltar

LOCALIZACIÓN	ÍTEM	PREDIO
	**MATRÍCULA INMOBILIARIA**	050S40273245
	PROPIETARIO	EAAB
	DIRECCIÓN	KR 91 43 20 SUR
	CHIP	AAA0138ZKFZ
	ESTRATO	0
	TIPO DE PROPIEDAD	DISTRITAL
	USO ACTUAL	OFICIAL
	DESTINO CATASTRAL	DOTACIONAL PÚBLICO
	ÁREA	613,978.3 m^2

Fuente: Certificación Catastral (VUC). 2021

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

LOCALIZACIÓN	ÍTEM	PREDIO
	MATRÍCULA INMOBILIARIA	050S40230108
	PROPIETARIO	EAAB
	DIRECCIÓN	KR 91 43 08 SUR
	CHIP	AAA0138ZKBS
	ESTRATO	0
	TIPO DE PROPIEDAD	DISTRITAL
	USO ACTUAL	-
	DESTINO CATASTRAL	ESPACIO PÚBLICO
	ÁREA	20,257.5 m^2

Fuente: Certificación Catastral (VUC). 2021

LOCALIZACIÓN	ÍTEM	PREDIO
	MATRÍCULA INMOBILIARIA	050S40230107
	PROPIETARIO	EAAB
	DIRECCIÓN	KR 91 43 08 SUR IN 1
	CHIP	AAA0138ZKCN
	ESTRATO	0
	TIPO DE PROPIEDAD	DISTRITAL
	USO ACTUAL	-
	DESTINO CATASTRAL	ESPACIO PUBLICO
	ÁREA	26,150.2 m^2

Fuente: Certificación Catastral (VUC). 2021

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

4 RADICADOS EVALUADOS

Radicado 2021ER173789 del 19/08/2021
Información remitida
La EAAB presenta copia de la respuesta allegada por tal entidad al IDRD respecto a lo indicado por la SDA mediante oficio 2021EE20780 del 03/02/2021
Observaciones
La Dirección de Saneamiento Ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – ESP presenta a la Subdirección Técnica de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD observaciones frente a las determinantes ambientales establecidas en el Concepto Técnico 00325 del 29/01/2021 emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente. De dicha comunicación, la EAAB allega a esta Secretaría copia, la cual es evaluada en el numeral 5 del presente concepto técnico.

5 INFORMACIÓN REMITIDA POR EL USUARIO


5.1 Componente Hidrogeológico

A partir de las aclaraciones que realiza la EAAB – ESP mediante el Radicado 2021ER173789 del 19/08/2021, esta Autoridad con la información reportada en los radicados 2019ER10484 del 14/05/2019, 2019ER180582 del 09/08/2019 y 2019ER184547 del 13/08/2019 y el Modelo Hidrogeológico Conceptual-MHC del Acuífero Subsuperficial o Somero en el Perímetro Urbano Del Distrito Capital realiza las siguientes consideraciones:

El predio Gibraltar está ubicado sobre una capa continua de arcillas y limos con una profundidad de máximo 14 m en el sector occidental; suelos finos con un alto contenido de humedad en comparación con los suelos arenosos, disminuyendo su espesor a medida que se acercan al canal Cundinamarca (Figura 2, 9 y 10). Bajo esta capa conformada por arcillas y limos se encuentran suelos de composición principalmente arenosa con algunas intercalaciones de finos. En la siguiente figura se puede observar la distribución de los suelos en un bloque diagrama.

Figura 1. Modelo estratigráfico, vista panorámica 3D.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

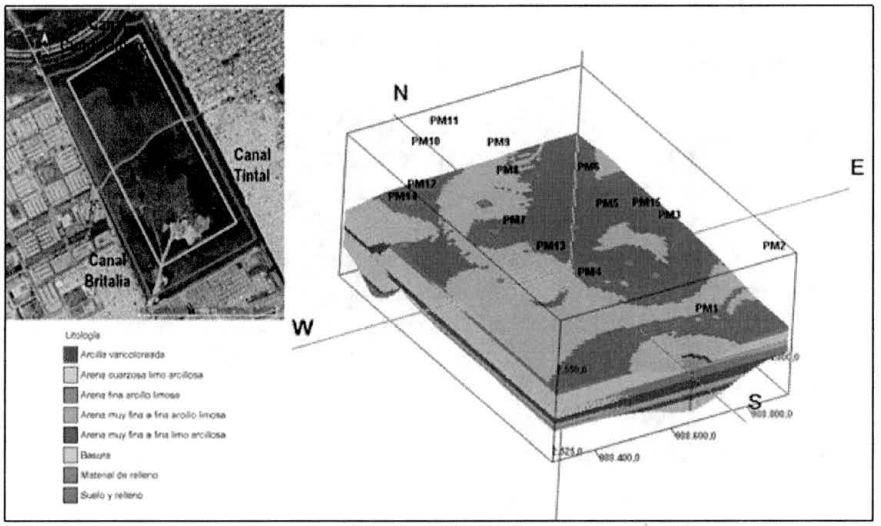


Fuente: SDA, 2021.

Como se menciona con anterioridad, las arcillas tienden a disminuir su espesor a medida que se acercan al Rio Bogotá, conectando el lecho del rio con arenas del Depósito Aluvial. De igual forma, es importante mencionar que hacia el sector Nor-Este donde están ubicados los piezómetros PM-6, PM-9 y PM-11 la capa de arcilla desaparece, poniendo en contacto las arenas con los residuos sólidos. En la siguiente figura se observa la distribución de donde se pinchan las arcillas que suprayacen las arenas.

Figura 2. Distribución real donde no existe la unidad arcilla sello-Predio Gibraltar.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

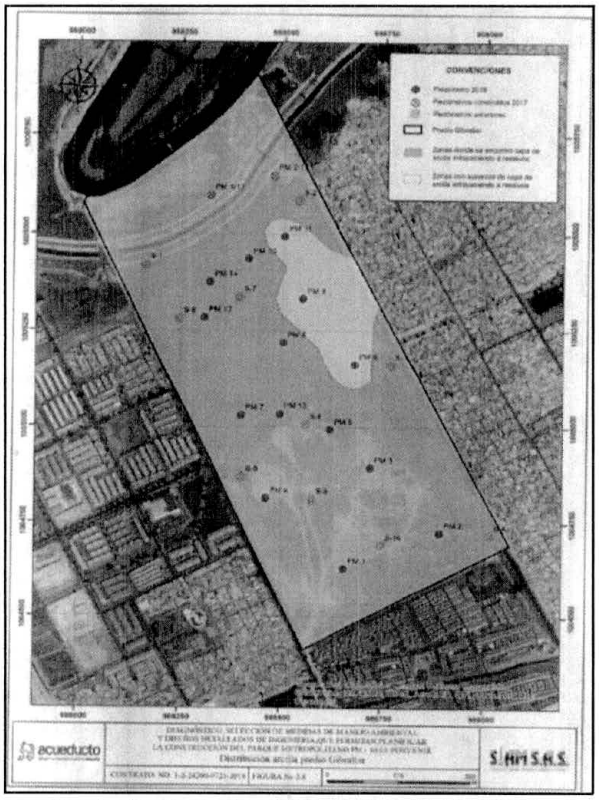


Fuente: Radicado No. 2019ER104814 del 14/05/2019.

En relación con la dinámica subterránea se determina que, a partir del nivel freático medido en 8 piezómetros, el flujo del agua subterránea presenta una dirección Norte - Noroeste, es decir hacia el río Bogotá, el cual se comporta como afluente, ya que recibe agua subterránea del acuífero que lo infrayace. En la siguiente figura, se pueden observar las líneas equipotenciales y las direcciones de flujo del agua subterránea del área de estudio.

Figura 3. Equipotenciales y direcciones de flujo del agua subterránea.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gcv.co
Bogotá, D.C. Colombia

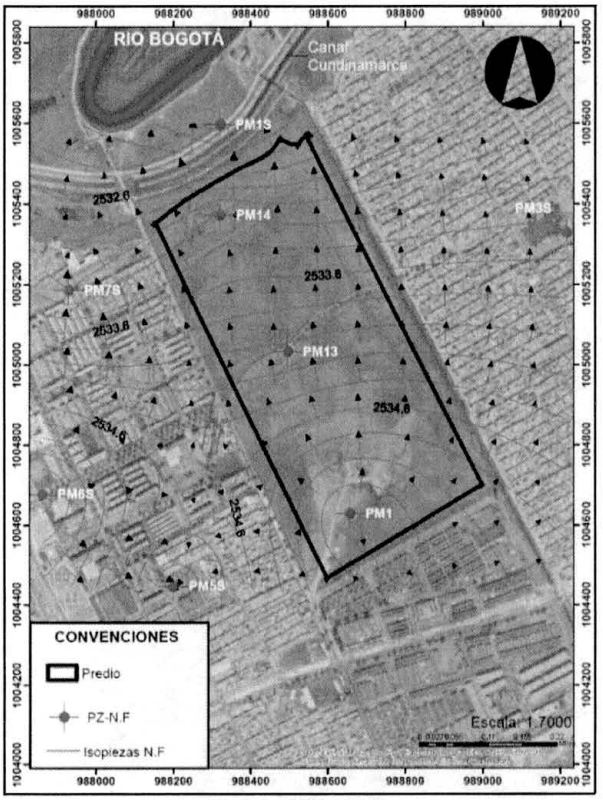


Fuente: SDA, 2021.

Ahora bien, en el predio se encuentran depositados residuos sólidos que aumentan la topografía modificando en las primeras capas las direcciones de flujo y almacenando lixiviados que se dispersan en el nivel freático. Así las cosas y teniendo en cuenta el nivel de los lixiviados, se realiza el mapa de isopiezas como se observa la siguiente figura.

Figura 4. Equipotenciales y direcciones de flujo del lixiviados.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

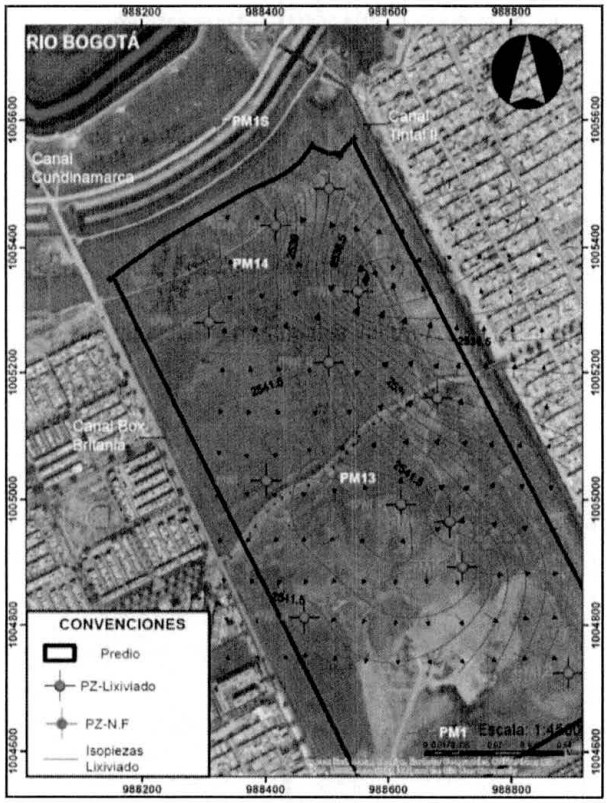


Fuente: SDA, 2021.

En este contexto, se puede resaltar que el lixiviado se mueve de la máxima cota en el piezómetro PM-3 de forma radial, es decir hacia el Sur, Sureste, suroeste y principalmente hacia el Norte - Noroeste donde se encuentra el piezómetro PM-9 a una profundidad de 10.33 m de lixiviado.

En la siguiente figura se resumen los vectores de flujo del lixiviado ubicado el área de residuos.

Figura 5. Equipotenciales y principales vectores de flujo del lixiviado.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

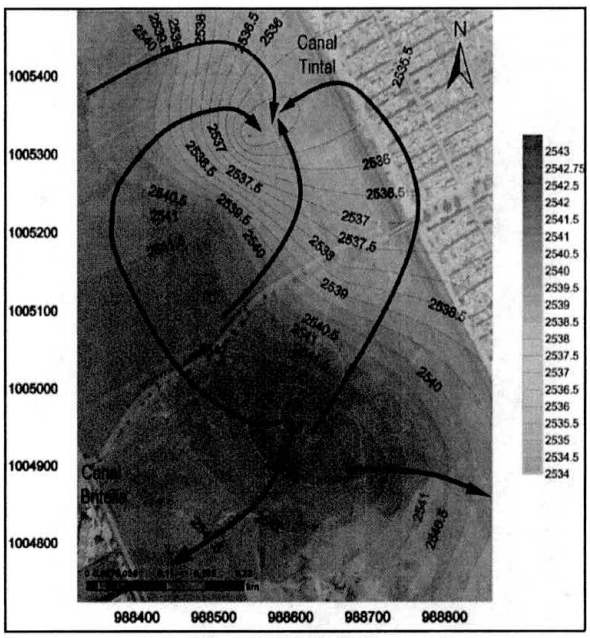

Fuente: SDA, 2021.

Como complemento a lo anterior, se construyen 2 perfiles donde se puede evidenciar que los residuos depositados generan un cambio en la topografía que condiciona el flujo de los lixiviados. Los perfiles con dirección Norte-Sur y Este-Oeste se pueden observar en las siguientes figuras.


Figura 6. Condición topográfica del predio Gibraltar (vista Norte-Sur).



Fuente: SDA, 2021.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Figura 7. Condición topográfica del predio Gibraltar (vista Este-Oeste).

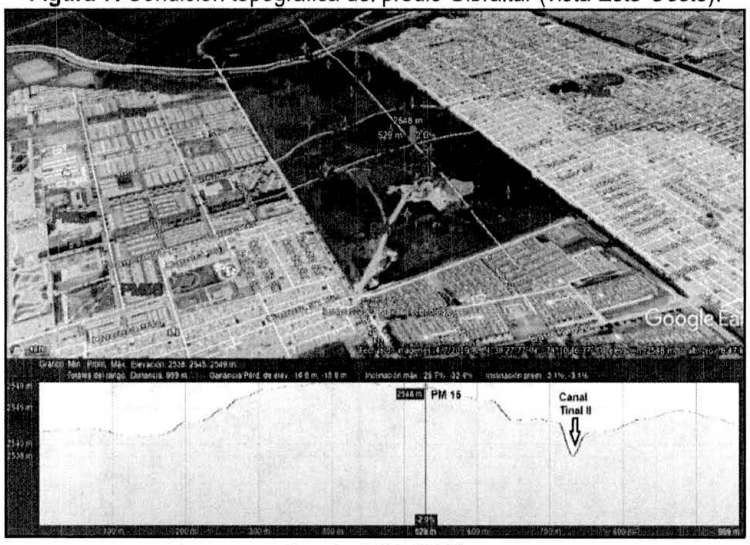

Fuente: SDA, 2021.

A partir de la anterior información se puede determinar que, el nivel freático se encuentra en el contacto entre las arenas de grano fino y las arcillas, aumentando las cargas hidráulicas hacia el Rio Bogotá con una velocidad promedio de 0.121 m/d (**Figura 9**). Cabe aclarar que las condiciones de frontera de flujo en el área de estudio están conformadas por el Rio Bogotá y la recarga generada por precipitación, sin embargo, existen canales perimetrales que rodean el predio y están anclados a 6.0 m de profundidad, restringiendo la migración del contaminante en la zona no saturada.

Ahora bien, la EAAB – ESP menciona lo siguiente:


a) **Según el modelo de la SDA la infiltración se produce únicamente en la zona NW del predio cerca al PM9, situación que es discutible cuando el predio presenta una cobertura vegetal de condiciones similares distribuidas en todo el predio y de naturaleza limo arcillosa que le da un carácter semi impermeable a TODA el área.**

Esta Autoridad considera que es importante precisar que la infiltración obedece a condiciones de porosidad y permeabilidad del terreno, si bien en el sector NW del predio cerca del PM9 se presenta "*... suelo natural limo arcilloso a arcillo limoso, mezclado en diferentes proporciones con material de relleno compuesto por escombros y recebo cuyo porcentaje puede variar entre un 10% a un 30% con fragmentos de ladrillo y gravas de 1 – 3 cm de diámetro; presenta baja plasticidad y generalmente es compacto*"; según lo anterior, se puede presentar infiltración en menor proporción por los materiales de fragmentos de ladrillo y gravas, además un espesor de 0.2 metros hace posible infiltración.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Como complemento a lo anterior y según el "*Modelo hidrogeológico conceptual del acuífero subsuperficial o somero en el perímetro urbano del distrito capital, Convenio de asociación No SDA-CV 20161264., noviembre de 2018*", en el área de estudio la recarga potencial varia de 1.25 mm/año a 123 mm/año, donde los valores más bajos predominan debido a que el predio está rodeado por una zona urbana. En la siguiente figura se puede observar la distribución de la recarga potencial en el área de estudio.

Figura 8. Distribución de la recarga potencial en el área de estudio.

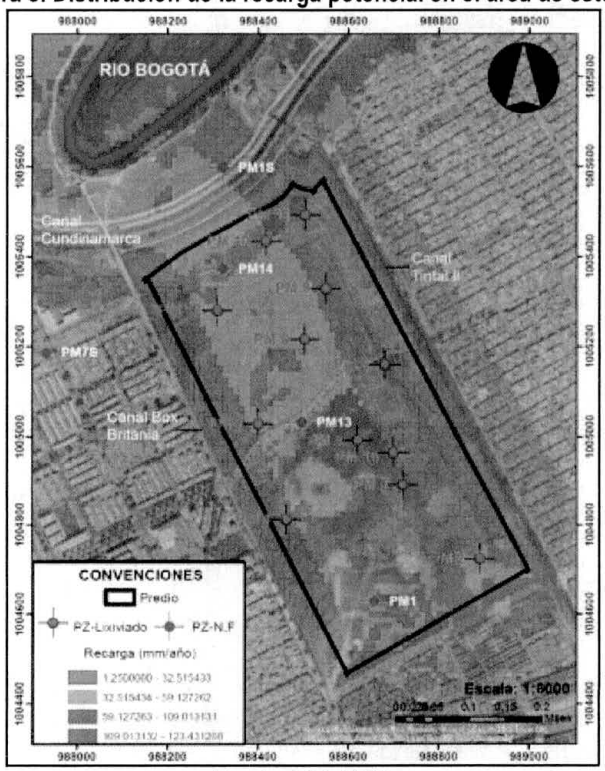

Fuente: SDA, 2021.

Esta recarga puede variar debido a las condiciones locales del relleno, las cuales impiden que el proceso se ejecute de forma natural, reflejándose en la alta variabilidad del nivel freático. Del mismo modo, es importante resaltar que el cambio en la carga hidráulica también se debe a la principal condición de frontera representada por el Río Bogotá.

En síntesis, en el área de estudio existe una fuente superficial conformada por el Rio Bogotá que tiene un caudal medio mensual multianual de mínimo 18 m^3/día y máximo 31 m^3/día, su régimen es de tipo bimodal y se comporta como un

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

rio perdedor en relación al acuífero que lo infrayace. Adicional a esto, los canales que rodean el predio no intervienen la tabla de agua debido a que la máxima profundidad es de máximo 6.0 m. La condición bimodal permite que la recarga promedio a partir de una precipitación total anual del orden de 1223.12 mm/año, varié de 0.0 mm/año a 123 mm/año, bajo las condiciones de época de alta y baja precipitación.

Adicionalmente la EAAB – ESP destaca lo siguiente:

b) **Según el modelo se reporta que hay flujo de lixiviados a través de la unidad de basuras hacia el costado Sur -SE y Oeste - SW del predio, lo cual es muy poco probable ya que los taludes se observan totalmente drenados. Si bien es cierto en años anteriores (hacia el 2007) se reportó salida de lixiviado por estos costados esto no significa que exista un flujo hidrogeológico en estos sentidos, ya que esto, se pudo suceder debido a una sobresaturación local temporal por la disposición de lodos que en ese momento se hacía sobre el predio. Además, según los reportes a la fecha después de más de 10 años y de haber suspendido la disposición de lodos sobre el predio NO existe reportes ni evidencia alguna de la presencia de flujos de lixiviados sobre ningún talud del predio.**

Como se describe con anterioridad, esta Autoridad señala que en el predio se encuentran depositados residuos sólidos que aumentan la topografía modificando en las primeras capas las direcciones de flujo y almacenando lixiviados que se dispersan en el nivel freático. Ahora bien, el lixiviado se mueve de la máxima cota en el piezómetro PM-3 de forma radial, es decir hacia el sur, sureste, suroeste y principalmente hacia el Norte-NoroEste donde se encuentra el piezómetro PM 9 a una profundidad de 10.33 m de lixiviado, tal como se observa en la Figura 5:

c) **En sentido longitudinal se muestra un flujo en direcciones opuestas no teniendo en cuenta entre otros factores, que topográficamente la zona norte del predio es más baja que la zona Sur SE del mismo, así mismo, dado que se tiene una cabeza hidráulica que sirve de límite de base hidrológico regional y local a la zona de estudio y que corresponde al Río Bogotá. En este sentido es claro que el flujo principal hidrogeológico del acuífero somero es en dirección del Rio Bogotá y no hacia aguas arriba.**


En relación con lo anterior esta Autoridad determina que el flujo del agua subterránea presenta una dirección norte - noroeste, es decir hacia el río Bogotá, el cual se comporta como afluente, ya que recibe agua subterránea del acuífero que lo infrayace. En la Figura 3, se pueden observar las líneas equipotenciales y las direcciones de flujo del agua subterránea del área de estudio

Siguiendo con el análisis de la información para llegar por parte de esta Autoridad a una primera aproximación del MHC, se puede concluir a partir de la calidad del agua que los lixiviados que conforman la pluma de contaminación ya migraron en dirección al Rio Bogotá, afectando el agua subterránea con concentraciones de cadmio, hierro y plomo por encima de la norma como se detecta en el piezómetro PM1S. Esto, se debe posiblemente al tiempo de residencia de los residuos y a que estos se encuentran en contacto directo con las arenas (**Figura 10**).

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia


En la siguiente figura se resumen las anteriores consideraciones mediante un bloque diagrama y un corte (A-A') que representa el modelo hidrogeológico conceptual.

Figura 9. Modelo Hidrogeológico Conceptual-MHC.

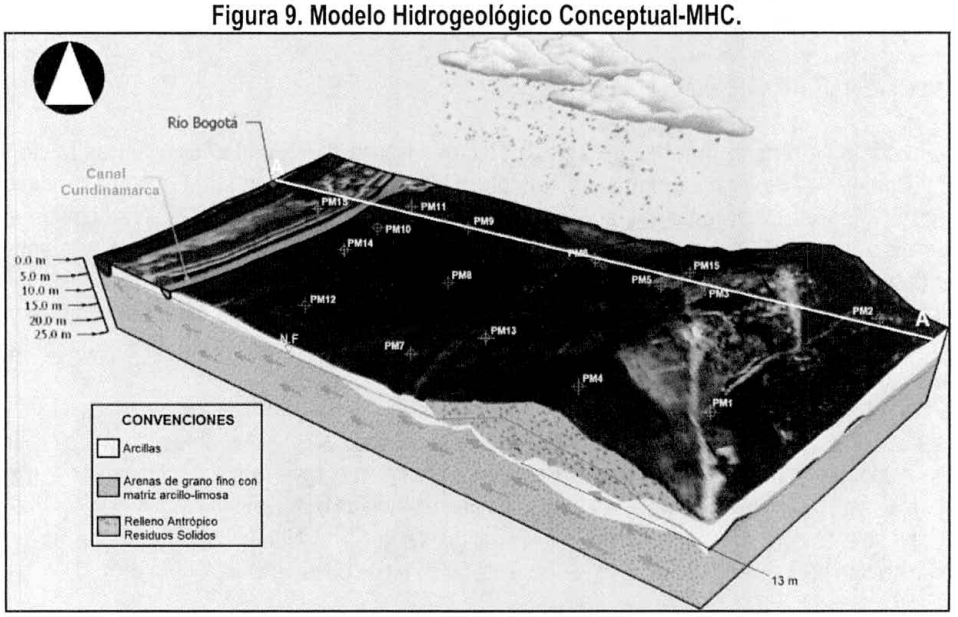

Fuente: SDA, 2021.

Figura 10. Dinámica de flujo en el contacto entre los residuos y las arenas en el sector de los piezómetros PM 6, PM 9 y PM 11 (Corte A-A').

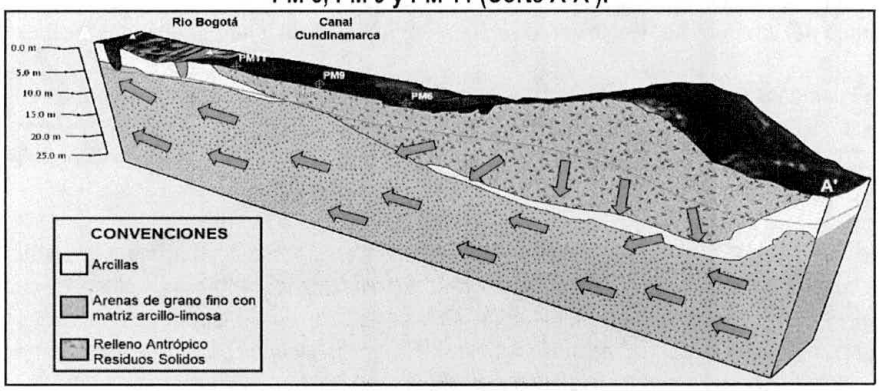

Fuente: SDA, 2021.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

En conclusión, con la información analizada esta Autoridad determina que los residuos sólidos ubicados en el predio Gibraltar están contaminando el agua subterránea, estos residuos que generan lixiviados impregnan la zona no saturada y zona saturada migrando hacia el Norte – Noroeste, es decir hacia el río Bogotá. Por este motivo, es de vital importancia realizar la red de monitoreo del recurso hídrico subterráneo durante las diferentes epatas de construcción del parque.

5.2 Hidrología

Si bien se toma información secundaria para realizar la modelación hidráulica del canal Tintal de los siguientes estudios: (i) "Estudios y diseños para el traslado de las redes de acueducto y alcantarillado para el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá" contrato No. 1-02-25400-0797-2016, (ii) "Producto 1, informe de recopilación, análisis y diagnóstico de la estación de bombeo Gibraltar" contrato 2-02-25500-0784-2010, y (iii) estudio "Consultoría para la actualización del plan maestro de abastecimiento y elaboración y formulación del plan maestro de alcantarillado para Bogotá y sus municipios vecinos" contrato 1-02-25500-1318-2013; esta información permitió evidenciar con mayor claridad las condiciones hidráulicas consideradas en la construcción del modelo tanto de frontera en la entrega de sus aguas al canal Cundinamarca y los niveles de sus aguas en función de la operación elevadora de Gibraltar, la procedencia de los caudales de descarga que ingresan al canal para diferentes periodos de retorno (es decir, 10, 25 y 100 años), el levantamiento topográfico de las secciones transversales del canal cada 25 m en los 2.4 km modelados, los coeficientes de Manning (Manual de Drenaje de INVIAS) y los resultados del comportamiento de las velocidades y niveles a lo largo del canal para cada periodo de retorno.

Por otra parte, si bien los eventos de inundación del río Bogotá no se podrían asociar a la presencia directa del polígono en el cual se desarrollará el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar) y aunque este proyecto no se encuentre dentro del Área de Manejo Especial de este río; es importante verificar si los eventos de inundación del río Bogotá afectaran al parque objeto de estudio. Por lo tanto, al verificar el numeral 2.2.9.3 el Mapa de amenaza por inundaciones del Volumen V – Gestión del Riesgo del Ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Bogotá del año 2019 y la cartografía anexa al volumen en mención, se evidenció que el área donde se desarrollara el proyecto no se encuentra en ninguna de las categorías de amenaza de inundación definidas, es decir, alta, media o baja.

Así mismo, el Decreto 190 de 2004 con el cual se reglamentó el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, desarrolló el mapa de inundación para el Distrito Capital y que fue actualizado mediante la Resolución 1641 de 2020. Se evidenció en el mapa anexo de este último Acto Administrativo que donde se desarrollara el proyecto tiene una amenaza de inundación media predominantemente y alta en un área reducida del sector sur oriental del parque, tal como se observa en la **Error! Reference source not found.**1 y la **Error! Reference source not found.**.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

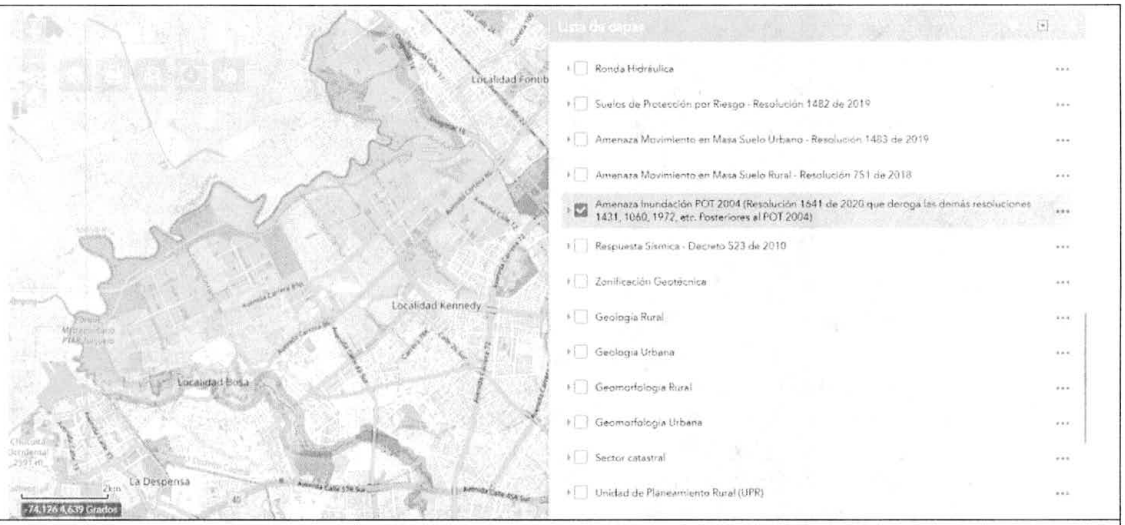


Figura 11. Amenaza de Inundación para el área del proyecto (recuadro de color negro) según la Resolución 1641 de 2020

Fuente: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa4b277533584c3a95a9208b4d542e19

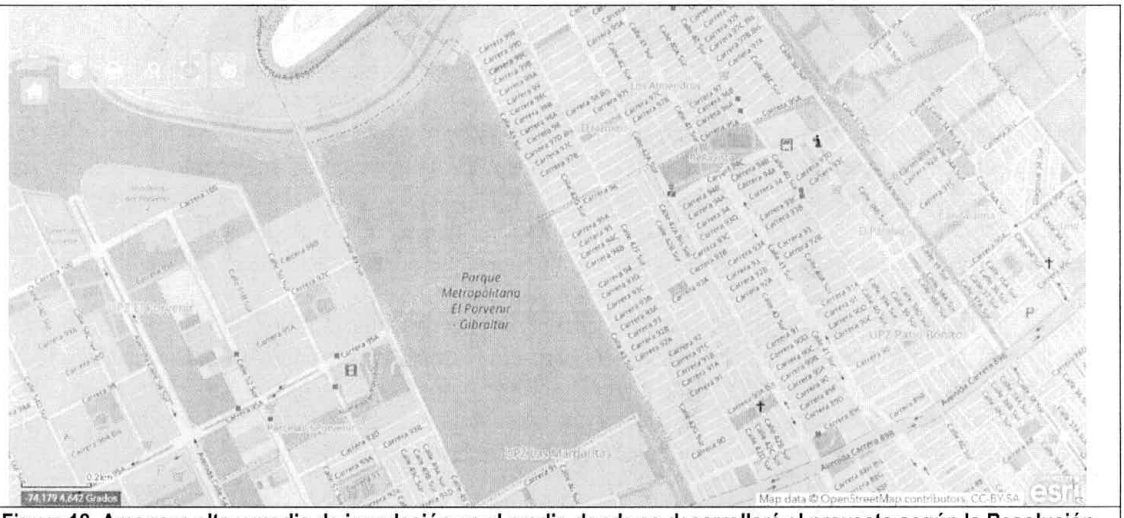


Figura 12. Amenaza alta y media de inundación en el predio donde se desarrollará el proyecto según la Resolución 1641 de 2020

Fuente: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fa4b277533584c3a95a9208b4d542e19

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Si bien la evaluación del componente riesgo a nivel hidrológico e hidráulico (inundación) no hace parte de las funciones de la SRHS, se debe considera por parte de las entidades competentes su incorporación en la gestión del riesgo del proyecto en los niveles de amenaza que define la Resolución 1641 de 2020.

5.3 Suelo

La EAAB propone el desarrollo de una cobertura semipermeable para el desarrollo del futuro Parque Metropolitano PM-10 Porvenir (Gibraltar) y sugiere para las zonas en las cuales se va a realizar construcciones superficiales tales como cachas de fútbol, basquetbol, ciclo rutas; adelantar actividades de impermeabilización de toda el área mediante la instalación de una capa de mínimo 0.8 metros separada por una geomembrana.

Por lo anterior, la EAAB resalta la importancia de conocer la zonificación de las diferentes estructuras a desarrollarse al interior del predio.

De igual forma, se hace importante tener en cuenta los lineamientos técnicos definidos por esta Secretaría mediante memorando 2021IE58504 del 31/03/2021, para el muestreo de suelo superficial en toda el área del predio, el cual fue comunicado al IDRD mediante oficio 2021EE61146 del 07/04/2021. El resultado de dichos muestreos permitirá determinar el manejo necesario para el suelo superficial durante la etapa de construcción, así como las características de diseño de cada una de las diferentes estructuras a adelantarse en el futuro Parque Metropolitano.

5.4 Lixiviados

La EAAB resalta el echo que durante los últimos 5 años no se han notificado casos de afloramiento de lixiviados en las zonas aledañas al predio Gibraltar. Basado en los estudios presentados por la EAAB y realizados por la firma SIAM, tal entidad indica que los lixiviados encuentran confinados al interior del predio, sin afectar a la comunidad aledaña.

Aun así, la Secretaría Distrital de Ambiente reitera la importancia de considerar el manejo que requieren los lixiviados del predio teniendo en cuenta que se tratan de un residuo peligroso, y los cuales podrían encontrarse durante el desarrollo de las obras de construcción y excavaciones a realizarse en el futuro Parque Metropolitano PM 10 El Porvenir.

5.5 Red De Monitoreo Adyacente Al Área De Estudio

La EAAB aclara que la red adyacente al predio de interés está compuesta por 7 piezómetros de la siguiente manera:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

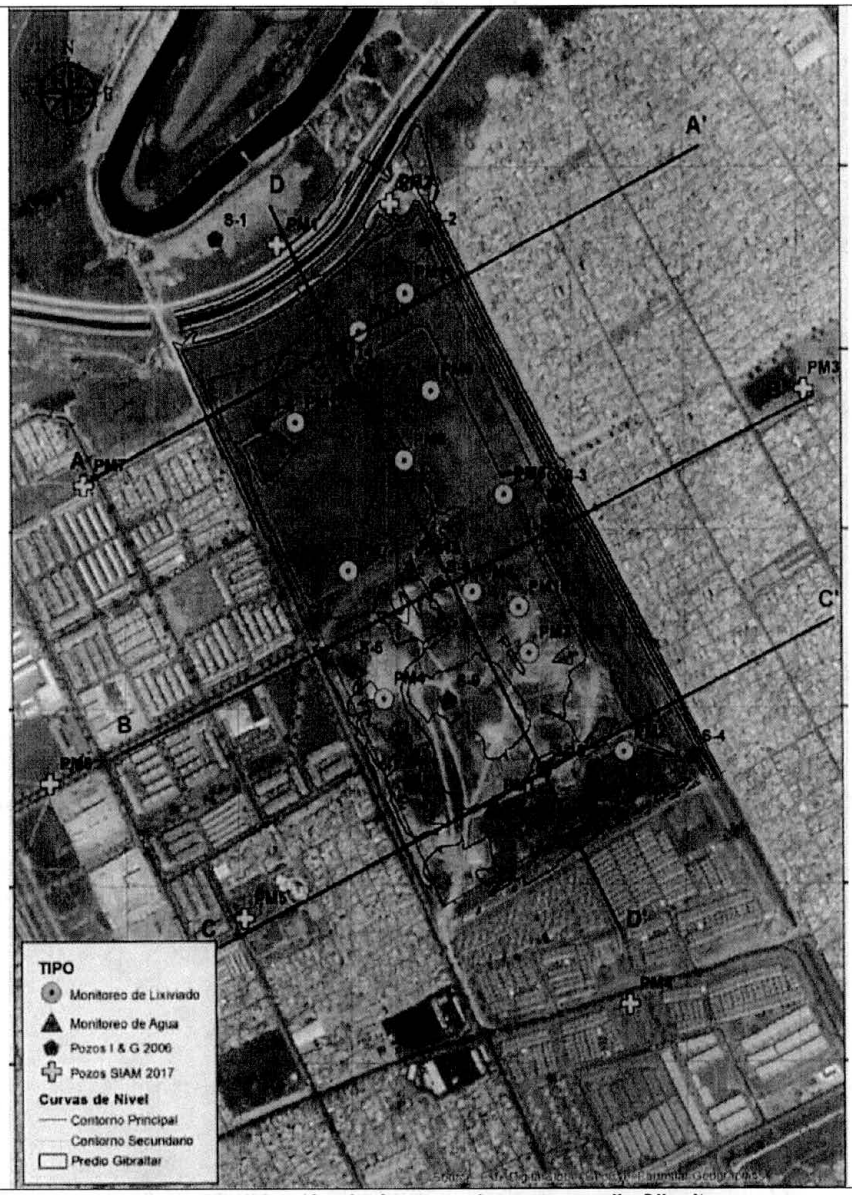


Figura 13. Ubicación piezómetros adyacentes predio Gibraltar
Fuente: Radicado 2019ER104814 del 14/05/2019

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Dicha entidad indica que el 18/03/2021 realizó visita al predio evidenciando que se encuentran en buenas condiciones.

5.6 Manejo de Gases

Mediante memorando 2021IE58504 del 31/03/2021 se establecen lineamientos técnicos para desgasificación en todo el predio, el cual fue comunicado al IDRD mediante oficio 2021EE61146 del 07/04/2021. Dichas actividades de desgasificación deberán ser adelantadas previo a la ejecución de cualquier actividad constructiva con el fin de evitar riesgos asociados sobre el medio ambiente, comunidad aledaña y trabajadores a intervenir el predio.

5.7 Manejo De Material Particulado Y Olores

La EAAB indica que las recomendaciones relacionadas con material particulado y olores deberán ser tenidas en cuenta por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el cual será el encargado de la construcción del Parque Metropolitano El Porvenir.

5.8 Geotecnia

La evaluación geotécnica desarrollada dentro de la consultoría 1-02-24200-0721-2018 pretendía establecer si las condiciones del área definida con menor afectación ambiental, contaba con la capacidad de soportar la construcción de una infraestructura de gran tamaño como el Centro de la Felicidad propuesto por el IDRD. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que en el momento en el que se llevó a cabo el estudio antes mencionado, no se contaba con el diseño específico de dicha infraestructura, el IDRD, dentro del desarrollo de los diseños de la infraestructura que se proponga desarrollar en el predio, deberá adelantar las evaluaciones geotécnicas pertinentes dentro de las cuales podrá abordar los requisitos definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente dentro del documento de determinantes ambientales 2021EE20780 del 03/02/2021.

5.9 Abandono Del Sitio Por Parte De La EAAB

La EAAB informa que entregó el predio al IDRD el 06/12/2019, por lo que el 05/02/2020 finalizó el tratamiento de residuos generados por las actividades de mantenimiento de alcantarillado de la ciudad. Así, el desmantelamiento de estructuras fue realizado por la EAAB entre el 18 y 28 de febrero de 2020. Así mismo, desde el mes de marzo del mismo año la EAAB inicia el tratamiento de residuos provenientes del mantenimiento de alcantarillado en la Estación Elevadora El Salitre.

6 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Dando respuesta a la solicitud allegada por la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial mediante memorando 2021IE175705 del 23/08/2021, la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo se permite informar que revisada la información allegada mediante radicados 2019ER10484 del 14/05/2019, 2019ER180582 del

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

09/08/2019 y 2019ER184547 del 13/08/2019 y evaluada en el Concepto Técnico 00325 del 29/01/2021, así como la allegada recientemente bajo radicado 2021ER173789 del 19/08/2021, se considera necesario realizar una reinterpretación de las determinantes establecidas mediante oficio 2021EE20780 del 03/02/2021.

Así pues, esta Subdirección ve la necesidad de generar una línea base para el predio, considerando toda la evidencia documental presente en la misma. Dicha línea base será la hoja de ruta para orientar a cualquier tercero que vaya a intervenir el predio o desarrollar actividades constructivas y, en dado caso, implementar apartes del plan de contingencia, en aspectos técnicos de relevancia ambiental relacionados con el predio, ya que brinda información suficiente para toma de decisiones técnicas responsables en aspectos relacionados con salud y medio ambiente.

Considerando la futura intervención del predio (remoción y excavación) por las actividades de construcción del Parque Metropolitano Porvenir, la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, se establecen los **Lineamientos Técnicos para el Plan de Contingencia Ambiental** cuyo objeto es tomar en consideración situaciones que se pueden presentar durante la ejecución de la labores dentro de la etapa constructiva del proyecto o durante su operación. Las especificaciones allí descritas deberán ser acatadas y adaptadas por todos los actores, tanto durante la construcción como durante la operación del mismo.

Los documentos mencionados (LÍNEA BASE AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PM 10 EL PORVENIR y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PM 10 EL PORVENIR) se incluyen como anexo al presente concepto técnico, así como los lineamientos técnicos para desgasificación y muestreo de suelo superficial establecidos. Valga la pena aclarar que éstos últimos se conservan de la misma forma en que fueron comunicados mediante oficio 2021EE61146 del 07/04/2021 dado que no hay información adicional que represente un cambio en las condiciones descritas en el memorando 2021IE58504 del 31/03/2021.

El Plan de Contingencia Ambiental que genere el responsable de adelantar las etapas constructiva y operativa del parque, basado en los lineamientos anexos al presente concepto técnico; así como el correspondiente plan de trabajo y cronograma de actividades, deberán ser allegados de igual forma a esta Entidad para su conocimiento y fines pertinentes.

Así mismo, es importante recordar que la Entidad se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la EAAB al oficio 2020EE201699 del 11/11/2020, relacionada con las fechas exactas a realizarse la caracterización de los pozos de monitoreo instalados en áreas contiguas al predio denominado Gibraltar, informada mediante radicado 2020ER167025 del 29/09/2020; respecto a lo cual, se reitera que se deberán seguir los lineamientos informados por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante oficio 2016EE202407 del 17/11/2016.

Lo anterior sin perjuicio de que la Secretaría Distrital de Ambiente realice las acciones técnicas y jurídicas por el incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, con el fin de que se cumpla con las obligaciones ambientales contempladas en la misma. El incumplimiento de dichas obligaciones dará lugar a la imposición de medidas

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

preventivas, sanciones y medidas compensatorias consagradas en los Artículos 36, 40 y 31, respectivamente de la Ley 1333 de 2009.

REINALDO GELVEZ GUTIERREZ
SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

Anexos: *- LÍNEA BASE AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PM 10 EL PORVENIR*
- LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PM 10 EL PORVENIR
- Memorando 2021IE58504 del 31/03/2021 (Lineamientos técnicos para desgasificación y muestreo de suelo superficial del predio Gibraltar)

Elaboró:				
JULIO CESAR REYES VARGAS	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20210221 DE 2021	FECHA EJECUCION:	27/08/2021
Revisó:				
JULIO CESAR REYES VARGAS	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20210221 DE 2021	FECHA EJECUCION:	27/08/2021
DIANA MILENA RINCON DAVILA	CPS:	CONTRATO 20210138 DE 2021	FECHA EJECUCION:	27/08/2021
Aprobó: **Firmó:**				
REINALDO GELVEZ GUTIERREZ	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	27/08/2021

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100577982 Código Web:(qy)6U
FECHA:30-12-2025 16:54:46 FOLIOS: 30
RADICADOR: ANDRES FELIPE SANCHEZ PENA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: RESPUESTA AL TRASLADO IDRD POR COMPETENC
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Bogotá D.C.,30 de diciembre de 2025

CIG-IDRD-VEL-990-2025

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
DRA. KATHERINE AMAYA ROA
Supervisora designada - Subdirección Técnica de Construcciones
Katherin.amaya@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª – 06
La Ciudad

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Respuesta al traslado IDRD por competencia, PQRS afectación a zonas comunes CTO. 3219-2023 Proyectos 1 y 2 Parque el Porvenir Gibraltar – Radicado No 20255821269561 del 10/12/2025 de la secretaria de Gobierno con asunto: *Respuesta a radicación 1-2025-53842 del 15 de octubre de 2025 proyecto compartir la margarita et 1.*

Respetado Ingeniero:

En nuestra calidad de interventores para el contrato de la referencia, nos permitimos remitir para su conocimiento y fines pertinentes; el comunicado de respuesta elaborado por el contratista Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), mediante su comunicado CE-206-125-2112 _29/12/2025; el cual cuenta con nuestro aval; y en donde se expresa de manera detallada, el proceso adelantado con la señora Ana Elsa Barón Merchán, quien en su calidad representante legal de la Agrupación Residencial Compartir La Margarita etapa 1, ha reportado a través del Punto de Atención al Ciudadano dar tratamiento a las situaciones que se venían presentando en las zonas comunes peatonales de su conjunto residencial.

Es por ello, que el equipo interdisciplinario del contratista e interventoría; programaron las visitas correspondientes, verificando los descrito en las actas de vecindad y realizando un exhaustivo análisis que derivó en la respuesta emitida a la peticionaria, con los debidos conceptos de las especialidades intervinientes y las acciones de mejoramiento de algunas zonas en donde se hallo responsabilidad por ocasión de las obras desarrolladas en el proyecto; tal como se puede verificar en los anexos adjuntos a esta comunicación.

Lo anterior, en aras de que el Instituto de Recreación y Deporte _ IDRD; pueda remitir la

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

respuesta del derecho de petición que allego la representante legal del conjunto a la Secretaría Distrital de Hábitat mediante radicado 1-2025-53842 el 15/10/2025; y el traslado de competencia realizado por esta entidad a través del comunicado 2-2025-72428 a la alcaldía de Kennedy el 6/11/2025; en el marco de sus competencias institucionales.

Cordialmente,

Ing. Edgar Solorzano Medina
Coordinador de Interventoría

Elaboró y Proyectó: Ts. Mary Luz Ramírez Carvajal
Revisó: Ing. Edgar Solorzano Medina. Coordinador de Interventoría.
Aprobó: Ing. Edgar Solórzano Medina. Coordinador Técnico de Interventoría

Anexos: Oficio Respuesta contratista de obra UTMP No CE-206-125-2112 _ 29 folios

Copias:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Calle 52 No. 13 - 64, Bogotá D.C., Colombia

ANA ELSA BARON MERCHÁN
Representante legal
Conjunto COMPARTIR LA MARGARITA ETAPA
Calle 49 sur # 89 b 30

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

No. 20252100577982 Código Web (qy)0U
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
FECHA:30-12-2025 16:54:45 FOLIOS: 30
RADICADOR: ANDRES FELIPE SANCHEZ PEÑA
REMITENTE: DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
ASUNTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
RESPUESTA AL TRASLADO IDRD POR COMPETENC
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Bogotá D.C.,30 de diciembre de 2025

CIG-IDRD-VEL-990-2025

1-2026-891

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
DRA. KATHERINE AMAYA ROA
Supervisora designada - Subdirección Técnica de Construcciones
Katherin.amaya@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª – 06
La Ciudad

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Respuesta al traslado IDRD por competencia, PQRS afectación a zonas comunes parque el Porvenir Gibraltar – Radicado No 20255821269561 del 10/12/2025 de la secretaria de Gobierno con asunto: *Respuesta a radicación 1-2025-53442 del 15 de octubre de 2025 proyecto compartir la margarita et 1.*

Respetado Ingeniero:

En nuestra calidad de interventores para el contrato de la referencia, nos permitimos remitir para su conocimiento y fines pertinentes; el comunicado de respuesta elaborado por el contratista Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), mediante su comunicado CE-206-125-2112_29/12/2025; el cual cuenta con nuestro aval; y en donde se expresa de manera detallada, el proceso adelantado con la señora Ana Elsa Barón Merchan, quien en su calidad representante legal de la Agrupación Residencial Compartir La Margarita etapa 1, ha reportado a través del Punto de Atención al Ciudadano dar tratamiento a las situaciones que se venían presentando en las zonas comunes peatonales de su conjunto residencial.

Es por ello, que el equipo interdisciplinario del contratista de interventoría; programaron las visitas correspondientes, verificando los descrito en las actas de vecindad y realizando un exhaustivo análisis que derivó en la respuesta emitida a la peticionaria, con los debidos conceptos de las especialidades intervinientes y las acciones de mejoramiento de algunas zonas en donde se halló responsabilidad por ocasión de las obras desarrolladas en el proyecto; tal como se puede verificar en los anexos adjuntos a esta comunicación.

Lo anterior, en aras de que el Instituto de Recreación y Deporte _ IDRD; pueda remitir la

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

respuesta del derecho de petición que a go la representante legal del conjunto a la Secretaría Distrital de Hábitat mediante radicado 1- 25-53842 el 15/10/2025; y el traslado de competencia realizado por esta entidad a través de municado 2-2025-72428 a la alcaldía de Kennedy el 6/11/2025; en el marco de sus competenc s institucionales.

Cordialmente,

Ing. Edgar Solorzano Medina
Coordinador de Interventoría

Elaboró y Proyectó: Ts. Mary Luz Ramírez Carvajal
Revisó: Ing. Edgar Solorzano Medina. Coordinador de Interventoría.
Aprobó: Ing. Edgar Solórzano Medina. Coordinador técnico de Interventoría

Anexos: Oficio Respuesta contratista de obra UTM No CE-206-125-2112 _ 29 folios

Copias:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Calle 52 No. 13 - 64, Bogotá D.C., Colombia

ANA ELSA BARON MERCHÁN
Representante legal
Conjunto COMPARTIR LA MARGARITA ETAPA
Calle 49 sur # 89 b 30

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

113

CONSOLIDADO DE PQRS

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FORMATO CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO

PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN - PQRS

Contratista :	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	Contrato No.	3232 DE 2023	Duracion (Meses)	26 MESES	Fecha inicio:	6/02/2024	Fecha Finalización:	5/04/2026

Objeto del Contrato:	"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Profesional Social	DIANA MARCELA ORTIZ DOMINGUEZ

CONSULTA No.	FECHA DE RECEPCION	NOMBRE DEL PETICIONARIO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	TIPO DE CONSULTA				ESTADO		FECHA DE CIERRE	OBSERVACIONES
					P	Q	R	S	C	A		
1	18/03/2024	MIGUEL ANTONIO GAVIRIA	3025287844	MIGUELGAVIRIA@esap.edu.co	X				X		18/04/2024	Se remitió respuesta al peticionario, de que se realizará el encuentro solicitado el día 18 de abril del 2024. Una vez, se realice el encuentro se dará por cerrado el requerimiento.
2	20/03/2024	ELSA BARÓN	3112524535	compartirlamargarita@gmail.com	X				X		18/04/2024	Se remitió respuesta al peticionario, de que se realizará el encuentro solicitado el día 18 de abril del 2024. Una vez, se realice el encuentro se dará por cerrado el requerimiento.
3	18/04/2024	CAROLINA CARVAJAL	3015144712	ligaciclismobogota@yahoo.es	X				X		14/05/2024	El día 25 de abril se expone en el comité integral N° 11 el requerimiento realizado de la señora Carolina Carvajar de la Liga de Ciclismo de Bogota . El día 26 de abril se remite oficio a la interventoría exponiendo la solicitud. Dado que las inquietudes planteadas en el comité se relacionan estrechamente con la homologación y los trámites ejecutados en la etapa preliminar correspondiente al Contrato N°. 2758 DE 2021 4 de mayo a las 9:00 a.m. se realiza mesa técnica con el IDRD, Liga de Ciclismo, Consultoria del contrato N°. 2758, contratista del contrato N° 3232 e interventoría.
4	1/08/2024	ELSA BARÓN	3112524535	compartirlamargarita@gmail.com	X				X		22/08/2024	01/08/2024: mediante llamada telefónica la administradora del conjunto, manifiesta inquietud y preocupación sobre las vibraciones ocasionadas por la obra y que son percibidas en algunos predios del conjunto residencial. 01/08/2024: El área social y técnica se acercan al conjunto residencial con el fin de explicar el proceso constructivo y hacer un inventario predial para ampliar el área de actas de vecindad. 03/08/2024: Se inicia con la actividad de elaboración de actas de vecindad y la actividad se culmina el día 12 de agosto del 2024. 22/08/2024: Se convoca a los residentes de la Ampliación de las Actas de Vecindad al quinto Comité de Participación Ciudadana, para que conozcan el proceso constructivo y estén informados de que la sensación de vibraciones continuará percibiéndose. El mismo día de consolida el formato de PQRS, y la adm. Cierra la solicitud.
5	3/09/2024	MAGDA BONILLA	3184853103	lissetboy@hotmail.com		X			X		7/09/2024	03/09/24: Se recibe llamada telefónica de la propietaria del predio donde indica su preocupación por la presencia de fisuras en el predio. Se programa visita desde el componente social y técnico. 07/09/24:. En la visita se exponen las actividades constructivas y se verifican las fisuras en piso. El área técnica expone que las fisuras evidenciadas no son generadas por el proyecto e informa el alcance de las actividades constructivas ejecutadas. Para tranquilidad de la propietaria se levanta acta de vecindad con su respectivo registro fotográfico.

6	7/09/2024	LUZ DARY ARDILA	3134701102	luz-dary74@hotmail.com	X				X		7/09/2024	07/09/24: se recibió una solicitud por parte de la ciudadana Luz Dary Ardila, de la Urbanización Margaritas Etapa 1, quien manifestó su preocupación por las vibraciones generadas por las actividades del proyecto, lo que le causa incertidumbre. El mismo día, se realizó una visita técnica y social por parte del contratista y se procedió con el levantamiento del acta de vecindad de su predio para brindar tranquilidad a la peticionaria.
7	8/10/2024	EDNA BEATRIZ DUCUARA	3203607151	ebdr_1973.45@hotmail.com		X			X		2/07/2025	08/10/24: Se realiza visita desde el componente social y técnico. 10/10/24: Se le informa a la propietaria que se realizará visita mensual. Una vez finalicen las columnas vibradas, se tomaran las medidas correctivas. Asimismo, se realizan recomendaciones generales del cuidado del enchape suelto. 07/02/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 07/03/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnico 02/07/2025: Como compromiso adquirido previamente con la propietaria, se realizaría visita de seguimiento nuevamente al finalizar el pilotaje. Al evidenciar que no se genero afectaciones adicionales, se determina cerrar la solicitud con consentimiento de la propietaria. 02/07/2025: se realiza visita en el predio, en donde se le indica a la propietaria que ya culmino la actividad de pilotes hincados y por tal razón el contratista realiza verificación de la zona posiblemente afectada. Al no ver alteración en la zona, la propietaria firma el cierre de la solicitud.
8	24/10/2024	SILDANA OLARTE	3168782802	silogam@hotmail.com		X			X		20/11/2024	24/10/2024: en el 7mo comité de participación ciudadana refiere la Sra. Sildana que el predio en el que vive se han presentado fisuras en un muro, ocasionadas presuntamente por las vibraciones de la obra. 30/10/2024: Se realiza visita técnica y social, con acompañamiento de la interventoría para revisar el posible muro afectado. Se le informa a la Sra Sildana que una vez evaluada la afectación, se realiza la consulta con los especialistas, para emitir respuesta en quince días hábiles posteriores a la visita. 20/11/2024: Se hace entrega de la respuesta proyectada por la parte técnica. En donde la solicitante indica no estar conforme con el oficio.
9	6/12/2024	LILIANA RIOS DIAZ	3124684633	conjuntomargarita2@gmail.com		X			X		25/09/2025	09/12/2024: Se realiza visita técnica para verificar la afectación. 11/12/2024: Se realiza una nueva visita de inspección con geotécnica e interventoría. 26/12/2024: Se realiza entrega de respuesta parcial a la administradora del conjunto residencial. 07/02/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 07/03/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 11/03/2025: Se realiza un arreglo de manera provisional, de manera preventiva. 20/08/2025: Se realiza visita técnica para validar cantidades y conciliar con la adm. Las actividades de arreglo en las zonas comunes. 25/09/2025: Se realizan los ajustes en las zonas comunes afectadas y registradas desde la apertura de la solicitud. Se cierra a satisfacción de la administradora del conjunto residencial.
10	11/12/2024	CLARA INES VELA	3003787625	SIN INFORMACIÓN		X			X		17/07/2025	11/12/2024: Se realiza visita técnica para verificar la afectación. 13/12/2024: Se retiran las baldosas de manera preventiva y voluntaria con consentimiento de la propietaria. 17/12/2024: Se realiza una nueva visita de inspección con geotécnica. 26/12/2024: Se realiza entrega de respuesta parcial a la propietaria del predio. 07/02/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica. 07/03/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 17/07/2025: La firma contratista como responsable del arreglo del enchape de la vivienda, realiza la verificación de la actividad. La Sra. Clara Vela propietaria del predio recibe a satisfacción Los arreglos realizados por la Unión Temporal.

11	16/12/2024	MIREYA WILCHES	3144502675	SIN INFORMACIÓN		X			X		4/07/2025	17/12/2024: Se realiza visita de inspección con geotécnica. 18/12/2024: Se retiran las baldosas de manera preventiva y voluntaria con consentimiento de la propietaria. 26/12/2024: Se realiza entrega de respuesta parcial a la propietaria del predio. 07/02/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica. 07/03/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 24/06/2025: mediante acta se notifica que los arreglos se iniciaran en el predio el día 01 de julio del presente año. 04/07/2025: La firma contratista como responsable del arreglo del enchape de la vivienda, realiza la verificación de la actividad. La Sra. Mireya Wilches propietaria del predio recibe a satisfacción Los arreglos realizados por la Unión Temporal.
12	16/12/2024	PAOLA HERRERA	3168605225	ARIZARI@HOTMAIL.COM		X			X		21/08/2025	18/12/2024: Se realiza visita técnica para verificar la afectación. 26/12/2024: Se realiza entrega de respuesta parcial a la propietaria del predio. 07/02/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 07/03/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 03/08/2025: se acordó con la propietaria - compensación económica. 12/08/2025: Se realizo la consignación a la cuenta referida por la solicitante. 21/08/2025: Se cierra la solicitud con las firmas en los formatos y actas.
13	20/12/2024	ASTRID VERA	3009507591	ASTRIDV0320@GMAIL.COM		X			X		16/01/2025	23/12/2024: Se realiza visita técnica para verificar la afectación. 27/12/2024: se realiza visita técnica desde la firma contratista y la interventoría 16/01/2025: se le entrega a la propietaria la respuesta proyectada por la Unión Temporal y aprobada por la interventoría.
14	16/01/2025	LUZ DARY ARDILA	3134701102	luz-dary74@hotmail.com		X			X		7/02/2025	16/01/2025: se programa visita técnica y social para conocer la afectación. 27/01/2025: se realiza levantamiento de acta de vecindad de la casa 75. 07/02/2025: Se realiza entrega de la respuesta oficial mediante el oficio CE-206-126-992 a la propietaria del predio.
15	3/02/2025	LUZ AMPARO MARTINEZ	3105616998	wilmerandres9712@hotmail.com		X			X		7/07/2025	28/01/2025: Se recibe correo electrónico de la propietaria con la solicitud. 03/02/2025: se realiza apertura de la PQRS N° 15 y se realiza visita técnica y social. 11/02/2025: Se remite desde la firma contratista la respuesta parcial. 13/03/2025: Se realiza visita de seguimiento con el área técnica 07/07/2025: La firma contratista como responsable del arreglo del enchape de la vivienda, realiza la verificación de la actividad. La Sra. Luz Amparo propietaria del predio autoriza a la arrendataria Luz Marina de recibir a satisfacción los arreglos realizados por la Unión Temporal.
16	20/02/2025	JHONY ANDERSON HURTADO	3115743269	SIN INFORMACION		X			X		6/03/2025	20/02/2025: se realiza apertura de la PQRS N° 16 y se realiza visita técnica y social 03/03/2025: La firma contratista emite respuesta desde el área técnica mediante correo electrónico. Ese mismo día el peticionario emite, recibido. 06/03/2025: Mediante red social WhatsApp se solicita al peticionario para que firme el acta de cierre de la PQRSD, en donde informa que no puede de manera presencial y lo envié con firma digital al correo electrónico
17	1/04/2025	SOED TORRES	3204222201	SOEDTORRES@GMAIL.COM		X			X		4/04/2025	01/04/2025: Se realiza visita técnica en donde se registra que las afectaciones no corresponden a las actividades de obra. Al infórmalo a la propietaria se niega a firmar el formato de atención a PQRS. 04/04/2025: Se radica en la portería del conjunto residencial la respuesta a la solicitante, como respuesta y cierre al requerimiento.

18	1/04/2025	LUZ DE INDABURO	3214023422	INDABUROA@GMAIL.COM		X			X		1/04/2025	01/04/2025: Se realiza visita técnica en donde se registra mediante registro fotográfico el estado del piso del primer nivel. La propietaria indica que la solicitud de la visita no es por afectación, sino para tener registro de prevención.
19	9/04/2025	ELSA BARÓN	3112524535	compartirlamargarita@gmail.com	X				X		7/05/2025	09/04/2025: Se programa visita por parte del área técnica y social, en donde se elabora el acta de vecindad. 11/04/2025: Se recibió el acta con la firma del representante legal de la interventoría 07/05/25: Se remite el acta a la administradora del conjunto y se le da cierre a la solicitud.
20	18/06/2025	ELSA BARÓN	3112524535	compartirlamargarita@gmail.com		X			X		N/A	16/06/25: La administración se comunica mediante llamada telefónica y solicita reunión con área técnica y social. 18/06/25: Se participa en la reunión con el área técnica, de geotecnia y social. Además se realiza recorrido de manera posterior. 20/06/25: La administradora mediante el comité de participación ciudadana N° 15, solicita apoyo para demarcar la afectación en la zona común. 24/06/25: Se apoya a la administración con la solicitud de generar un cerramiento en la zona afectada. 17/07/25: La firma contratista remite respuesta, aprobada por la interventoría a la administración del conjunto residencial. En la respuesta se relaciona concepto del área técnica, hidrogeología y geotecnia. Además, se expone que, de 5 condiciones mencionadas por la administración, se realizará el arreglo de una de las zonas 16/06/25: La administración se comunica mediante llamada telefónica y solicita reunión con área técnica y social. 18/06/25: Se participa en la reunión con el área técnica, de geotecnia y social. Además, se realiza recorrido de manera posterior. 20/06/25: La administradora mediante el comité de participación ciudadana No. 15, solicita apoyo para demarcar la afectación en la zona común. 24/06/25: Se apoya a la administración con la solicitud de generar un cerramiento en la zona afectada. 17/07/25: La firma contratista remite respuesta, aprobada por la interventoría a la administración del conjunto residencial. En la respuesta se relaciona concepto del área técnica, hidrogeología y geotecnia. Además, se expone que, de 5 condiciones mencionadas por la administración, se realizará el arreglo de una de las zonas. 25/09/2025: Se realizan los ajustes en las zonas comunes afectadas y registradas desde la apertura de la solicitud. Se cierra a satisfacción de la administradora del conjunto residencial. 06/10/2025: Se culmina con los arreglos en las zonas comunes y se gestiona cierre a satisfacción con la administradora del Conjunto Residencial. 16/12/2025: La entidad contratante (IDRD) remite correo electrónico con la PQRSD, adjuntando la solicitud presentada por la peticionaria, señora Elsa Barón, administradora del conjunto residencial, ante la Secretaría Distrital del Hábitat, así como el respectivo traslado a la entidad contratante. 29/12/2025: Se remite a la interventoría el oficio con radicado CE-106-125-2112, en el cual se presenta la trazabilidad completa de las acciones adelantadas por la Unión Temporal Metropolitano Porvenir. 30/12/2025: La interventoría emite el comunicado con radicado CIG-IDRD-VEL-990-2025 dirigido al IDRD, validando las acciones realizadas por la Unión Temporal. Dicho comunicado fue radicado ante la Secretaría Distrital del Hábitat el 09 de enero de 2026 y notificado a la peticionaria el 08 de enero de 2026.

21	4/07/2025	JULIETH HERNANDEZ	3147938142	arlene.luly-25@hotmail.com		X			X		4/07/2025	04/07/2025: A través del canal de atención presencial, se presenta el propietario del predio 145 del Conjunto Margarita Etapa 2, quien manifiesta la presencia de fisuras en la placa del segundo y tercer nivel de su vivienda. En atención a lo anterior, se programa y realiza una visita conjunta con el área técnica el mismo día, con el propósito de verificar las posibles afectaciones reportadas. Durante la inspección se constata que las fisuras identificadas no son atribuibles a las actividades de la obra. Como soporte, se presenta el registro fotográfico levantado durante las actas de vecindad previas al inicio de la etapa constructiva, correspondientes a los predios de Margarita Etapa 1 y Etapa 2, en donde ya se evidenciaban dichas patologías. Se aclara al propietario que estas fisuras corresponden a condiciones propias del proceso constructivo de la vivienda y son comunes en este tipo de edificaciones, por lo que la solicitud no procede como una afectación ocasionada por el proyecto.
22	25/07/2025	GISELA CADENA	3114520516	giselaccarpio@gmail.com		X			X		8/08/2025	25/07/2025: Se realiza visita técnica con el fin de verificar las afectaciones mencionadas por la propietaria del predio. 08/08/2025: Se entrega respuesta a la solicitante aprobada por la interventoría, en donde se le menciona que la UTMP no es responsable de las afectaciones.
23	8/10/2025	LILIANA RIOS DIAZ	3124684633	conjuntomargarita2@gmail.com		X			X		14/11/2025	28.10.2025: Se realiza apertura de la solicitud y se realiza visita técnica y social en la zona mencionada por la administradora del conjunto residencial. 12.11.2025: Se emite concepto técnico para validación de la interventoría. 14.11.2025: se entrega respuesta formal a la administradora del conjunto, en donde se le informa que las afectaciones validadas por el área técnica no fueron ocasionadas por el proceso constructivo de la obra.

Tipo de Atencion Ciudadana: (P) Pregunta; (Q) Queja; (R) Reclamo; (S) Solicitud de Información
Etado: (C) Cerrada (A) Abierta

Cargo	Nombres y Apellidos	Fecha	Firma
Residente Técnico del Contratista	Ing. Carlos Guzmán	25/01/2026	
Profesional Social del Contratista	TS. Diana Marcela Ortiz	25/01/2026	
Residente Técnico de Interventoría	Ing. Armando Rodriguez	25/01/2026	
Profesional Social de Interventoría	TS. Mary Luz Ramírez	25/01/2026	

ANEXO N° 4

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

SOPORTES GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL

Cargo: Profesional sst

40802

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
NUEVO RECREO III CONSTRUCTORA
CL 74A SUR 92 71 TO 20 AP 402

BOSA
SAN BERNARDINO
XX

ESTRATO	2	CLASE DE USO	Residencial
UND HABIT/FAMILIAS	1	UND. NO HABITACIONAL	0

ZONA: 5 CICLO: R5 RUTA: R55670

Datos del medidor
MARCA WATERTECH ITALIA NÚMERO 10-1209020 TIPO VELOCIDAD DIÁMETRO 15

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **12043795**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **13085412511**

TOTAL A PAGAR
Agua y Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$108.758**

Fecha de pago oportuno **JUL/02/2024**

Fecha de suspensión **JUL/05/2024**

Datos del consumo

	942		20
	922		18
	Consumo Normal		0

Consumos m³: 17 | 17 | 21 | 20

SEP NOV	NOV ENE	FEB MAR	ÚLTIMO CONSUMO
$44.401	$85.627	$103.891	

Periodo facturado
MAR/28/2024 - MAY/25/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/14/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/23/2024
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico	20	$3.380,84	$67.617	$27.047-	$2.028,50	$40.570
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$85.438	$34.175-		$51.263
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico	20	$3.613,39	$72.268	$28.907-	$2.168,04	$43.361
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$80.739	$32.295-		$48.444

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$3	
Ben. mín. vital total			$24.342-	
Subtotal Otros Cobros ④			$24.339-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	


Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual $24.342-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ④ $75.368

CONSUMO MES $49.854 CONSUMO DIA $1.690

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NIU Y CODE REGISTRO 1-1101010-15-5778-5-5

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

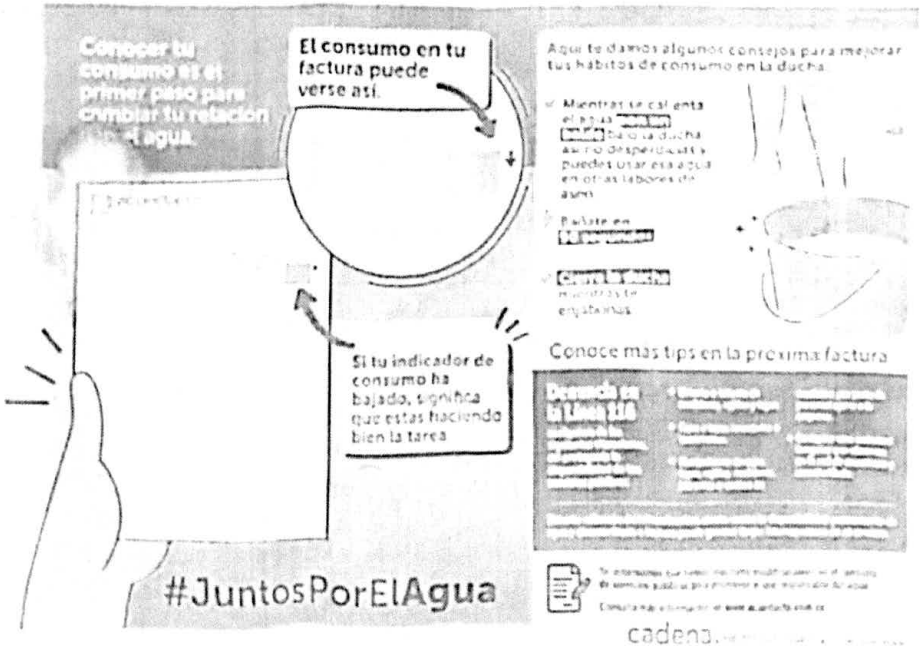

118

Trabajador: Yeison Bustos Perdomo
CC: 1079174898
Cargo: Ayudante de Obra.

enel | Bogotá

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0391976-5**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 134945099-0


CLIENTE

LUIS ALFREDO PERILLA MORENO
KR 69 C NO 1 33
BOGOTA, D.C. - HIPOTECHO SUR

02 317 2311 / 018-5202366

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $862,37

CONSUMO DIARIO: 6,91 kWh

VALOR DIARIO: $4.309

PERÍODO FACTURADO: 29 FEB/2024 A 01 ABR/2024 | **DÍAS FACTURADOS:** 33 | **CONSUMO MES** 228 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 188 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presentó una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Información Enel

Cuidemos a nuestros técnicos.

En los últimos dos años se han presentado 25 casos de ataques caninos a personal de Enel en el ejercicio de sus funciones. Con tu ayuda podremos protegernos, mantén a tu mascota con correa y acompañala cuando trabajemos cerca de tu casa.


¡Disminuyamos juntos esta cifra!



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	7,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003023172311
RUTA LECTURA:	13023171061
MANZANA DE LECTURA:	MS00455132
MEDIDOR NO:	018-5202366
MEDIDOR NO:	018-5202366

CALIDAD DEL SERVICIO

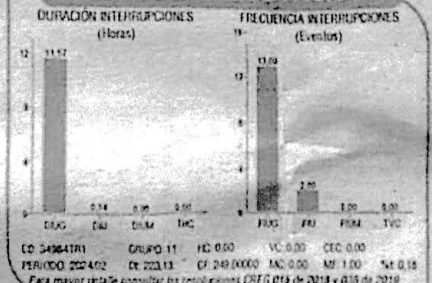

CD 54364781 GRUPO 11 HC 0.00 VC 0.00 CEC 0.00
PERIODO 202402 DI 222.13 CF 249.00000 MC 0.00 MF 1.00 %I 0.18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2018

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Elige estufas de inducción, estas requieren menos energía. No dejes que el calor sobresalga de los laterales de la olla así, no desperdicias recursos

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chatt-de-atencion.html
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco | Internet | Teléfono Banco | Débito Automático | Cajero Electrónico | APP Enel Clientes Colombia | Botón de Pago Online

Billetera Virtual
Rappi pay | DAVIplata | MOVII | NEQUI | tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED | Relácil | Reval | Efecty | MOVIRED | puntored

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Olímpica | Alkosto

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

Powered by CamScanner

14049

FACTURA POR 2 MESES Nombre: Samuel Oona
Cargo Aguclante.
Cedula: 76.589.531

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

FUNDACION COMPARTIR FUNDACION
CL 48 SUR 89B 43 CA 32

KENNEDY
LAS MARGARITAS

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051092

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 04015/80040173 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **12389020**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **39290618618**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$139.698**


Fecha de pago oportuno MAY/20/2024

Fecha de suspensión MAY/23/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1593	CONSUMO (m³)	30
LECTURA ANTERIOR:	1563	PROMEDIO (m³)	9
FACTURADO CON:	Alto consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
FEB/13/2024 - ABR/12/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/03/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/08/2024
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$7.128-	$10.692,78	$10.693
Consumo residencial básico	22	$3.380,84	$74.378	$29.751-	$2.028,50	$44.627
Consumo residencial superior a básico	8	$3.380,84	$27.047	$0	$3.380,88	$27.047
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$119.246	$36.879-		$82.367
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$3.388-	$5.082,50	$5.083
Consumo residencial básico	22	$3.612,36	$79.472	$31.789-	$2.167,42	$47.683
Consumo residencial superior a básico	8	$3.612,36	$28.899	$0	$3.612,38	$28.899
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$116.842	$35.177-		$81.665

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$2-	
Ben. min. vital total			$24.342-	
Intereses de mora			$10	
Subtotal Otros Cobros ③			$24.334-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m Periodo actual $24.342-


TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④ $139.698

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $82.016 CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $2.734

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN





Powered by CamScanner

119

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial.
www.grupovanti.com/eficinavirtual

¿Quieres tu factura digital? Escanea aquí

Nombre: Rena Gil Gair CC: 79326273
Cargo: Aguacante

Conoce:
vanti
Tienda Virtual
El precio que sí puedes pagar

Encuentra en:
grupovanti.com
Calentadores, estufas a gas y otros gasodomésticos
Servicios de gas y hogar
Tecnología

¡Con la asesoría de expertos!

Publicidad a cargo de Vanti Plus S.A.S.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Aval* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: 61770680

Vanti S.A. ESP.

Cliente: AMPARO HERNANDEZ
Direccion: CL 57C SUR 97B 0034 02
Municipio: BOGOTA Sector: EL CORSO
Codigo Postal: 000000 Lote: P16GN
Ruta: 0011850075760005000
Código Sector 426
Medidor No.: 5057105-98004

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE:
$ 2.546.494



Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

exito · flamingo · Alkosto · Ktronix

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilista.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnocer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Powered by CamScanner

Nombre - Javier Miquilena Mora
Cargo - Auxiliar - PPT. 5715745

31373

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Para pagos y consultas su número de cliente es:

3359374-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 1411359978


CLIENTE

PISCILIO BLANCO CAMARGO
KR 93 C NO 49 F SUR 17 PI 2
FACHADA
BOGOTA, D.C. - OSORIO DIEZ

12 147 1531 / 074-2951702



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO	$890,22
CONSUMO DIARIO:	7,43 kWh
VALOR DIARIO:	$6 606


PERIODO FACTURADO: 16 ABR/2024 A 15 MAY/2024 | DIAS FACTURADOS: 30 | CONSUMO MES 223 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	1,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001121471531
RUTA LECTURA:	11121470091
MANZANA DE LECTURA:	MS205210V1
MEDIDOR NO:	074-2951702
MEDIDOR NO:	074-2951702

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Utiliza el microondas para calentar tus comidas, ya que este consume 50% menos energía que un horno convencional.

CONTÁCTANOS

Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115
115
601 5 864 864
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: Rappi, DaviPlata, MOVII, NEQUI, Ipaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, Efecty, Reval, MOVIRED

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ABR/2024
G: $381,24 T: $54,27 D: $256,13 CV: $107,85 PR: $73,48 R: $7,13 CF: $0,00 / $890,22 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11.04 por ent. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1994.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente Cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de dicho amparo de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994.

En cumplimiento de la resolución CREG 015/6/11 consulte www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlo en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP prestará el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Empresa de Cobranza. De acuerdo con la autorización expresa prestada por el cliente para el uso de la factura como carta de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos conceptos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 17 MAY/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación NIT NO 0 830 812 8

3684 - Página 1 de 2

Powered by CamScanner

120

CRISANTO GUTIERREZ NEIZA - CC:1.022.347.013
CARGO: AUXILIAR OPERATIVO

6664

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
CARMEN CHAPARRO
KR 93 54D SUR 47

BOSA
EL CORZO

ESTRATO:	1	CLASE DE USO:	Residencial
UND HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 CICLO: 05 RUTA: 051087


Datos del medidor
MARCA: ISERCONTA NÚMERO: 0001503039644 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ¾

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	11165136		
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	13063046810		
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$184.766		
Fecha de pago oportuno	MAR/13/2024		
Fecha de suspensión	MAR/18/2024		

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA	2333	CONSUMO (m³)	35
LECTURA ANTERIOR	2298	PROMEDIO (m³)	37
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/15/2023 - FEB/12/2024

MAR/02/2024 — MAY/10/2024


RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant.	Un.				
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.083,31	$17.883	$12.364-	$5.293,00	$5.293
Consumo residencial básico	22	$3.351,12	$73.725	$51.808-	$1.005,34	$22.117
Consumo residencial superior a básico	13	$3.351,12	$43.565	$0	$3.351,15	$43.565
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$134.973	$63.972-		$70.981
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.395,75	$8.396	$5.877-	$2.518,73	$2.519
Consumo residencial básico	22	$3.581,09	$78.784	$55.149-	$1.074,33	$23.635
Consumo residencial superior a básico	13	$3.581,09	$46.554	$0	$3.581,08	$46.554
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$133.734	$61.026-		$72.708
Beneficio Mínimo Vital hasta Período actual			$12.064-			
TOTAL AGUA ALCANTARILLADO Y OTR			$131.746		$71.845	CONSUMO P... $2.395

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

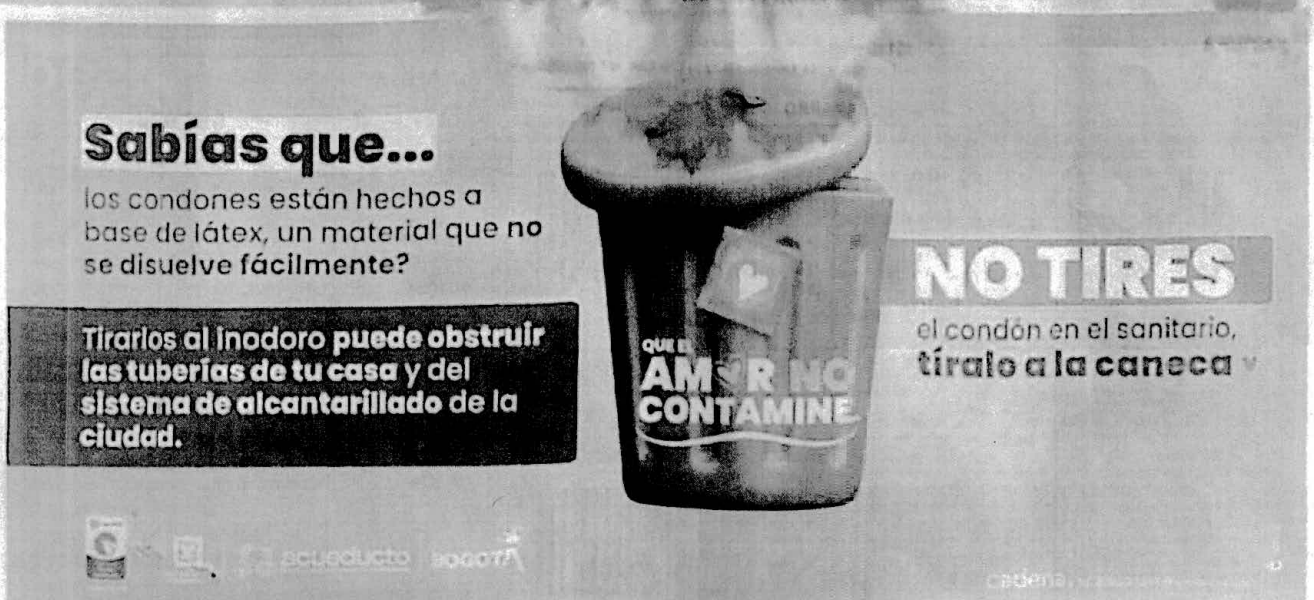


Scanned with CamScanner

SAAVEDRA MONROY EDILSON YESIT – CC: 1030527724
CARGO: MENSAJERO



JHONATAN DAVID RUEDA CARREÑO – CC 1.143.118.721
CARGO: AUXILIAR OPERATIVO

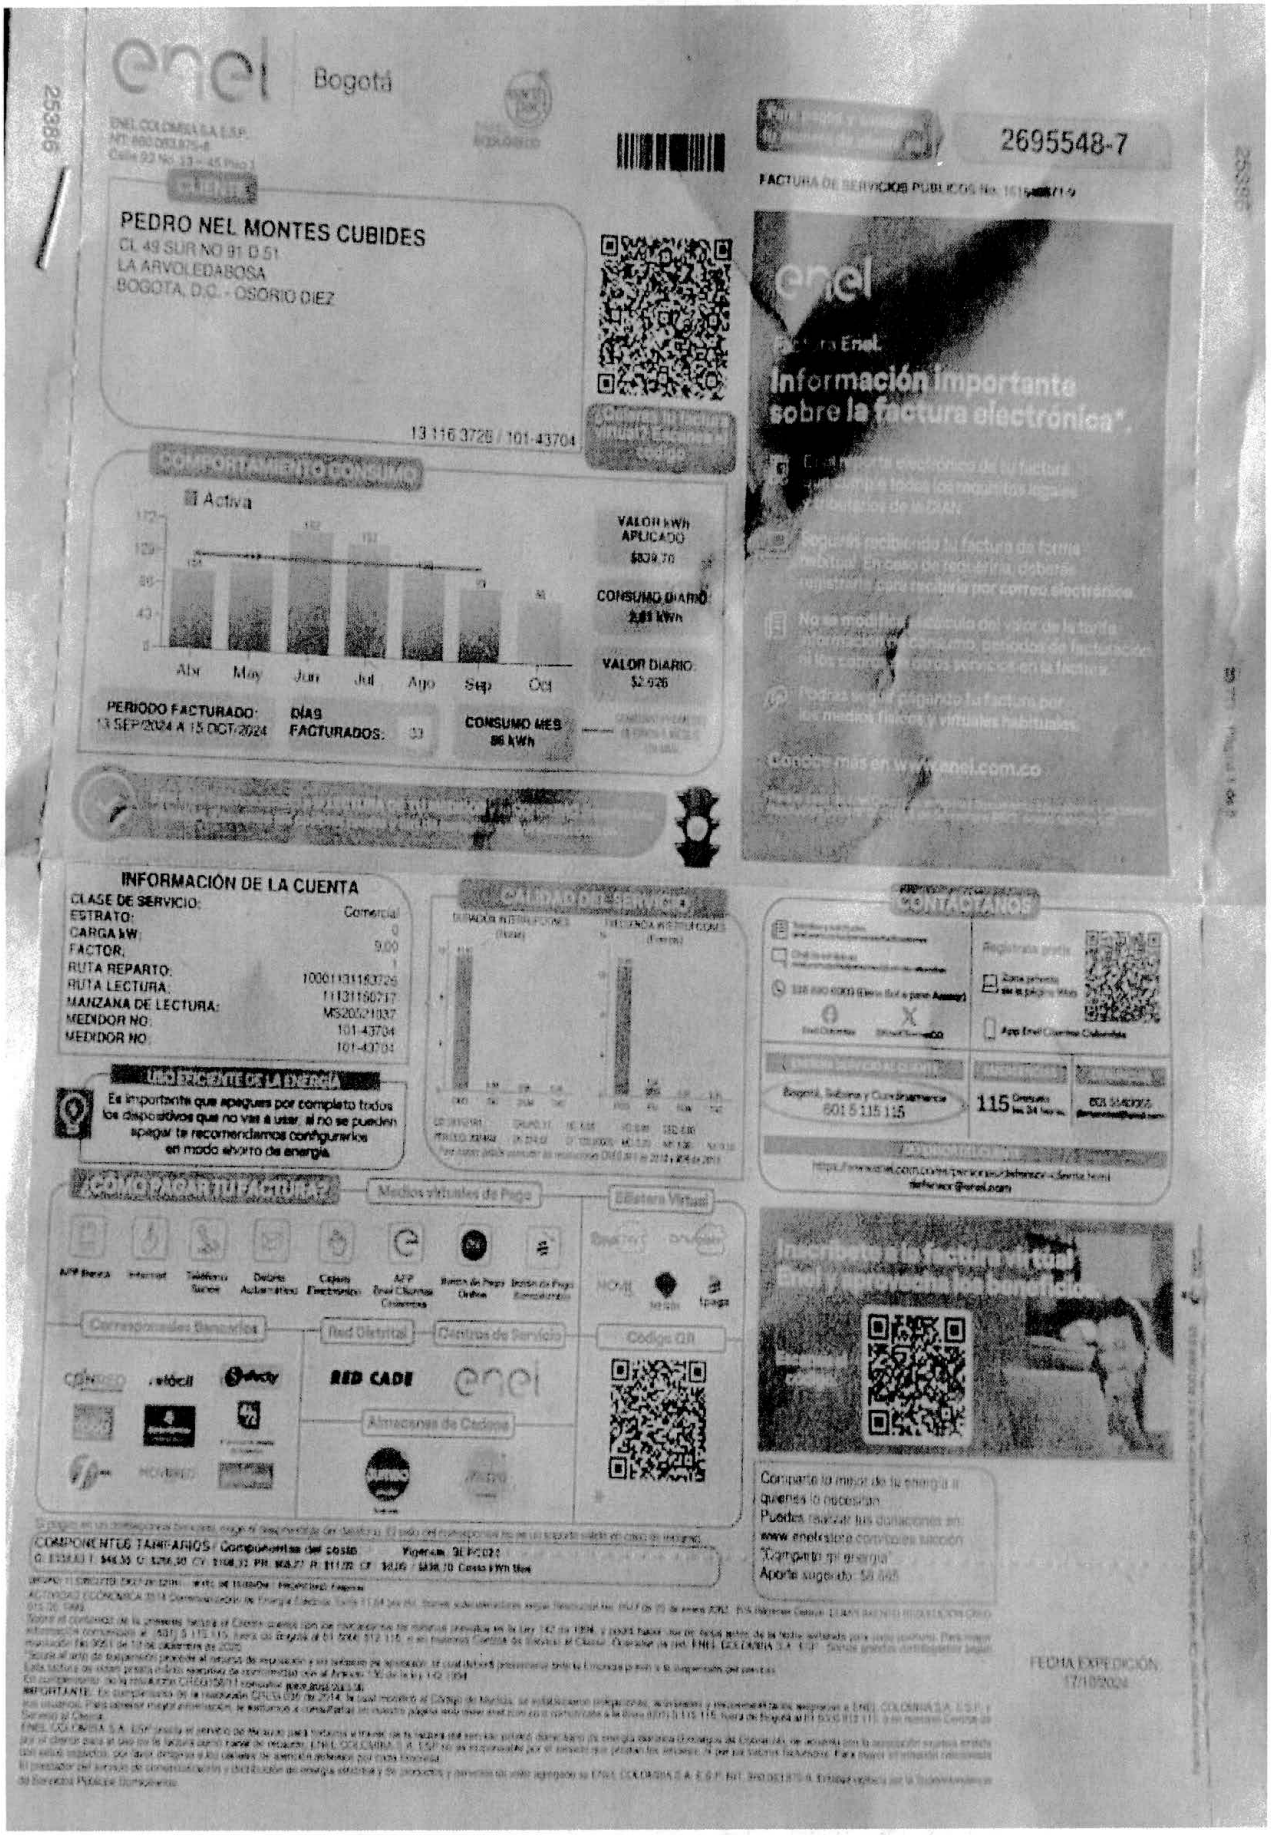

29220

FACTURA POR 2 MESES

Mendoza Vanegas Jelver Julián
CC: 1018489255
Cargo: Topografo

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

JOSE ALBERTO PARADA RINCON
CL 49A SUR 91D 60

BOSA
OSORIO X
URBANO

ESTRATO:	1	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** O51089A

Datos del medidor


MARCA: G2 MISURATORI NÚMERO: 23-613744 TIPO: VELO015R200 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	12181383
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	13784878814
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$374.062
Fecha de pago oportuno	NOV/12/2024
Fecha de suspensión	NOV/15/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	401	CONSUMO (m³)	55
LECTURA ANTERIOR:	346	PROMEDIO (m³)	85
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/11/2024 - OCT/09/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/29/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/04/2025

RANGO CMO BAS CO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$18.391,58	$18.392	$12.875-	$5.517,48	$5.517
Consumo residencial básico	22	$3.485,52	$76.681	$53.676-	$1.045,66	$23.005
Consumo residencial superior a básico	33	$3.485,52	$115.022	$0	$3.485,52	$115.022
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$210.095	$66.551-		$143.544
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,90	$8.742	$6.119-	$2.622,58	$2.623
Consumo residencial básico	22	$3.722,77	$81.901	$57.331-	$1.116,83	$24.570
Consumo residencial superior a básico	33	$3.722,77	$122.851	$0	$3.722,76	$122.851
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$213.494	$63.450-		$150.044

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$2	
Ben. min. vital total			$12.548-	
Desincentivo consumo			$38.340	
Subtotal Otros Cobros ③			$25.794	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $12.548-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $319.382

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $146.794 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $4.893

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

El cambio está en tus manos

#JUNTOSPORELAGUA

MI CASA TIENE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Sigue estas recomendaciones para el ahorro del agua:

- Cierra la llave cuando te cepillas los dientes, te afeitas o te aplicas champú.
- Lava frutas y verduras en un recipiente, nunca con la llave abierta.
- Usa el agua del lavamanos de manera que puedas usarla para regar las plantas.
- Cierra la llave mientras enjabonas las manos.
- Reutiliza el agua lluvia en el riego de tu hogar.
- Lava tu vehículo con la carga completa.

acueducto BOGOTÁ

Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto o retiro de infraestructura afecta la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

cadena. Nit. 860.930.534-0

122

Ivone Faibelly Alvarez Gonzalez
CC 1.03 2458.305
profesional de apoyo

29261

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

PORTAL DEL PORVENIR
CL 59 SUR 93C 46 CA 82

BOSA
LA CABANA

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** 05 **RUTA:** 051083

Datos del medidor


MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 04015IB041012 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	12388071
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	43351813514
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$165.940
Fecha de pago oportuno	Inmediato
Fecha de suspensión	Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2730	CONSUMO (m³)	12
LECTURA ANTERIOR:	2718	PROMEDIO (m³)	13
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/11/2024 - OCT/09/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/29/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/04/2025

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cant. Unidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$18.391,58	$18.392	$7.357-	$11.034,94	$11.035
Consumo residencial básico	12	$3.485,52	$41.826	$16.730-	$2.091,32	$25.096
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$60.218	$24.087-		$36.131
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,90	$8.742	$3.497-	$5.245,14	$5.245
Consumo residencial básico	12	$3.722,77	$44.673	$17.869-	$2.233,66	$26.804
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$53.415	$21.366-		$32.049

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ben. min. vital total				$25.096-	
Deuda anterior				$47.446	
Intereses de mora				$740	
Subtotal Otros Cobros ③				$23.090	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $25.096-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $91.270

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $34.090

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.136

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

El cambio está en tus manos

#JUNTOSPORELAGUA

MI CASA TIENE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Sigue estas recomendaciones para el ahorro del agua:



acueducto BOGOTÁ

Denuncia en la Línea 116


cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto o daño de infraestructura afecta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

cadena. Nit. 890.930.534-0

Julián Rojas
Unión Temporal Metropolitano Porvenir
Operario

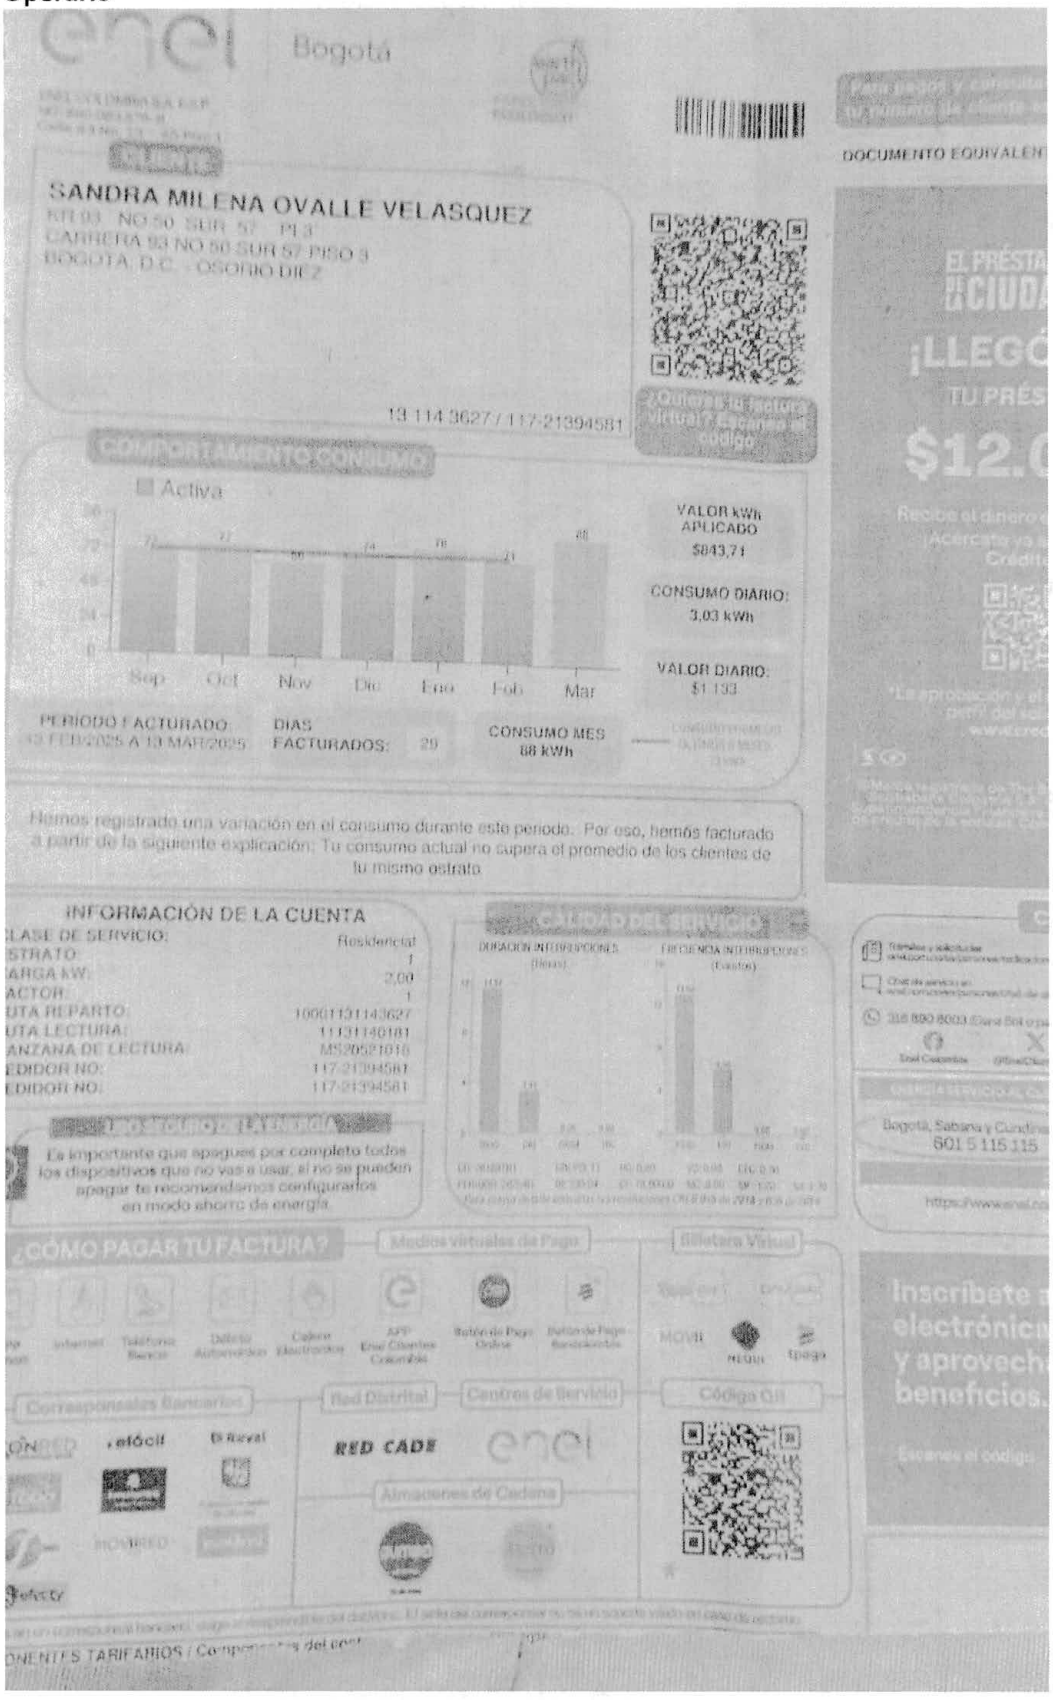

enel | Bogotá

PAPEL ECOLÓGICO

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **3113127-2**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 366894136-5


CLIENTE

CONSTRUCTORA BOLIVAR
CL 50 SUR NO 93 D 38 BQ 5 AP 302
ARMARIO
BOGOTA, D.C. - OSORIO DIEZ

13 113 1899 / 22570401

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $798,17

CONSUMO DIARIO: 2,07 kWh

VALOR DIARIO: $994

PERÍODO FACTURADO: 14 AGO/2025 A 12 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 62 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 70 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la zona privada de enel.com.co y podrás:

Pagar seguro por PSE

Consultar facturas, consumos y más.


Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guión.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	1,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001131131899
RUTA LECTURA:	11131130402
MANZANA DE LECTURA:	MS205210B6
MEDIDOR NO:	22570401
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 008 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revise tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/tramites-solicitudes

Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion

316 890 6003 (Elena Bot o pasa Asesor)

Enel Colombia @EnelClientesCO

Registrate gratis

Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5140055 denunciar@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-clientes.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de pago PSE en Zona Privada enel.com.co, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Daviplata, Cornercash, dale!, MOVII, Nequi, Ipaga

Corresponsales Bancarios: CONVELDA, efecty, El Reval, Su Red, Supergiros, Multipagos, Punto Red, Gana, Baloto, Movilred, Western Union

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Éxito, Carulla

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo — Vigencia AGO/2025

$ 373,43 CU + $ 0,00 PR + $ 0,00 R + $ 84,16 CP - $ 0,00 / $ 795,17 Costo kWh Mes

FECHA GENERACIÓN: 17/09/2025 00:24:00
FECHA EXPEDICIÓN: 17/09/2025 13:43:08

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.059.812-1 Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW CENVanciero - NIT 830.321.151-0 1 de 2 - Pag 1 de 2

VALIDACIÓN PERSONAL ÁREA SST

Gmail

Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos 3
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 2
Compras
Más

Etiquetas

CPC CAR
CPC Velódromo
Documentos contractua...
IDRD
Informes Interventoría
Relación personal
Varios 1

Actualizar

Validación relación de personal _ Histórico y corte mensual Velódromo

Recibidos

Mary Ramirez
Cordial Saludo Ing Lindy De manera atenta, me permito remitir los datos del reporte histórico y mensual (26/12/2025 al 25/01/2026) refe

Ing. Lindy Rubiano Moyano
para mí, ADRIANA, Velódromo, Edgar, Lisdy

Buen día Mary Luz,

Teniendo en cuenta la información que antecede el presente correo, me permito manifestar que, una vez corroborado el personal adjunt 24 presentado por la UTMP, los mismos son consecuentes y se da aval para su respectivo trámite ante la Entidad Contratante.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

Ing. Lindy Rubiano Moyano
Residente SGSST Interventoría
Consorcio Interventores Gibraltar

Mil gracias. | Muchas gracias. | Muchas gracias por la información.

Responder a todos | Responder | Reenviar

ANEXO No. 5

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ACTAS COMITÉS DE OBRA

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	MESA DE TRABAJO : COMITÉ TRANSVERSAL No. 179 Proyecto 1 Velódromo Contrato de obra IDRD-CTO-3232-2023	DD	MM	AA
MESA No.179		30	12	2025
LUGAR: VIRTUAL – meet.google.com/xqr-feuq-ggn	HORA INICIO: 2:00 P.M.	HORA FIN: 2:20 P.M.		

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
Se adjunta listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA	
1. Presentación componente Social	3.
2.	4.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación componente SOCIAL.

La profesional social del contratista; realiza su intervención dando alcance a los siguientes aspectos:

Actividades desarrolladas durante la semana

1. **Programa de Atención a la Comunidad**

Atención presencial y virtual durante toda la semana en el Punto de Atención al Ciudadano; no se recibieron solicitudes ciudadanas

Estado de PQRSD a la fecha
Total: 23
Cerradas:23
Abiertas: 0
En trámite: 0

2. **Programa de sostenibilidad ambiental, social y económica**

El contratista envío el reporte del personal – Corte 25 de diciembre

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	MESA DE TRABAJO: COMITÉ TRANSVERSAL No.179 Proyecto 1 Velódromo Contrato de obra IDRD-CTO-3232-2023	DD	MM	AA
MESA No.179		30	12	2025
LUGAR: VIRTUAL – meet.google.com/xqr-feuq-ggn	HORA INICIO: 2:00 P.M.	HORA FIN: 2:20 P.M.		

REPORTE MENSUAL (Corte 25 de diciembre)								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	165	24	34	4	12	0	48	117

HISTÓRICO								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	513	39	46	10	14	0	59	454

3. Programa de evaluación y seguimiento

Informe No. 23 _ contratista

22/12/2025: Se envía mediante correo electrónico el avance del informe mensual

22/12/2025: La profesional social de la interventoría emite observaciones del informe mensual mediante lista de chequeo

23/12/2025: Se realiza mesa de trabajo para validación y corrección de observaciones

26/12/2025: Se incluye información del personal

Comentarios adicionales

La profesional social de interventoría expreso que, en cuanto al traslado por competencia remitido por el IDRD, el contratista consolido la trazabilidad de las acciones realizadas para la atención de la PQRS que instauro la señora Elsa Barón durante el segundo semestre del 2025; en donde refería daños en el espacio publico peatonal con el hundimiento de los adoquines. Es por ello; que, con el fin de dar alcance a lo solicitado por el IDRD, la interventoría revisó y valido el comunicado de respuesta el cual fue radicado a la entidad con copia a la peticionaria y la secretaria distrital de Hábitat.

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	MESA DE TRABAJO: COMITÉ TRANSVERSAL No. 179 Proyecto 1 Velódromo Contrato de obra IDRD-CTO-3232-2023	DD	MM	AA
MESA No.179		30	12	2025
LUGAR: VIRTUAL – meet.google.com/xcr-feuq-ggn	HORA INICIO: 2:00 P.M.	HORA FIN: 2:20 P.M.		

La profesional social del IDRD, solicitó una vez se cuente con los radicados a las entidades y la peticionaria se den a conocer para hacer la trazabilidad correspondiente.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Sin compromisos	Sin compromisos	Sin compromisos

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	X	**NO**	
Observaciones				
Adjunto a la presente acta, se incluye el listado de asistencia y la presentación				

Siendo las 2:40 p.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		**FIRMA**	N.A.	
NOMBRE	Mary Luz Ramírez Carvajal	**NOMBRE**	N.A.	
CARGO	Profesional Social	**CARGO**		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Profesional social

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

Componente

social


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

Mesa de trabajo – Revisión informe mensual No. 23

FECHA	ACTIVIDAD
22/12/2025	se envía mediante correo electrónico el avance del informe mensual
22/12/2025	La profesional social de la interventoría emite observaciones del informe mensual mediante lista de chequeo
23/12/2025	Se realiza mesa de trabajo para validación y corrección de observaciones
26/12/2025	Se incluye información del personal

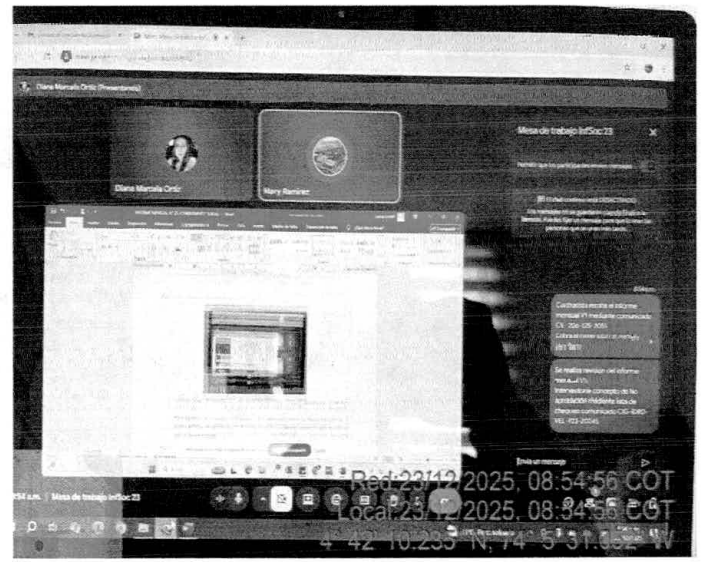

Pendiente: Actas comités transversales

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

Reporte del personal – Corte 25 de Diciembre

REPORTE MENSUAL (Corte 25 de diciembre)								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	165	24	34	4	12	0	48	117


HISTÓRICO								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	513	39	46	10	14	0	59	454

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

Atención al ciudadano

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**

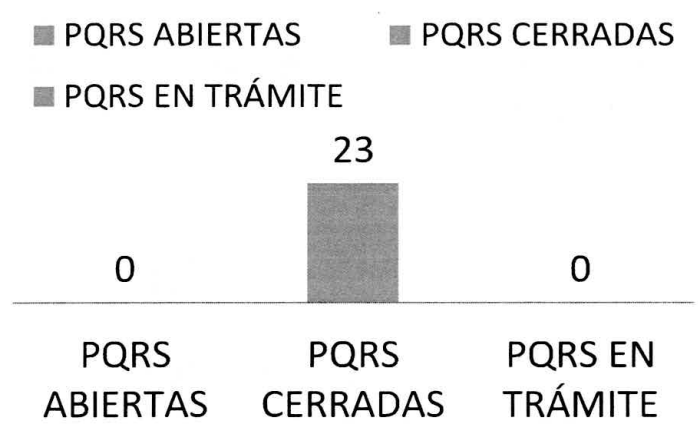

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Seguimiento transversal Componente Social — RESPONSABLE DEL EVENTO: Consorcio Interventores Gibraltar cto 3219 - 2003.

FECHA: 30/12/25 — HORA INICIAL: 2:00 PM — HORA FINAL: 2:20 pm. — LUGAR: Conexión virtual

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Marylu Ramírez Cunapul	52494807	Prof. Social	C&G		Interventoría	socialvelasnoc@gmail.com	3132203175
2	Diana Marcela Ortiz	1014212007	Res. Social	OTMP		Contratista IDRD.	socialvebolivar@	3659857
3	Carmen Lucía Vélez Cardenas	65777928	Apoyo S. Social	S+C.			carmen.velez@idrd	3204054770
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ TÉCNICO Y TRANSVERSALES CTO OBRA: 3232/23 - CTO INTERV. 3219/23	DD	MM	AA
ACTA No.92		8	1	2026

LUGAR: Presencial IDRD **HORA DE INICIO:** 8:10 a.m. **HORA FIN:** 10:17 a m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los componentes transversales	4.
2. Presentación de los componentes técnicos	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se inicia la sesión del comité. La Interventoría solicita el permiso correspondiente para efectuar la grabación del encuentro, sin que se presenten observaciones u objeciones por parte de los asistentes; en consecuencia, se autoriza y se inicia el registro.

COMITÉ COMPONENTES TRANSVERSALES No 92,1

COMPONENTE SOCIAL: En las Diapositivas 2 al 6 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado, el Componente Social desarrolló actividades de seguimiento, control y gestión social, orientadas a garantizar la adecuada articulación entre el proyecto, la comunidad y la interventoría, en concordancia con los lineamientos contractuales y los principios de participación y transparencia.

En el marco del Comité de Obra Transversal, se efectuó la trazabilidad integral del Informe Mensual de Obra No. 23, cuyo proceso se desarrolló de la siguiente manera: el 22 de diciembre de 2025 se remitió el avance del informe, fecha en la cual la profesional social de la interventoría emitió las observaciones correspondientes; el 23 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo para la validación y ajuste del contenido; el 26 de diciembre de 2025 se incorporó la información del personal; el 27 de diciembre de 2025 se radicó la versión 2 del informe; y, finalmente, el 30 de diciembre de 2025, la interventoría otorgó la aprobación formal, cerrando satisfactoriamente el proceso de revisión.

En relación con la atención al ciudadano, se gestionaron un total de 23 PQRS, de las cuales 23 fueron cerradas, 0 permanecen abiertas y 0 se encuentran en trámite, alcanzando un 100 % de cierre efectivo, lo cual evidencia una gestión oportuna, controlada y conforme a los procedimientos establecidos para la atención de solicitudes ciudadanas.

Adicionalmente, se realizó el seguimiento social y técnico a una solicitud de traslado asociada a afectaciones en zonas comunes cuya trazabilidad se remonta a agosto de 2024 con el reporte inicial de hundimientos. Posteriormente, se adelantó la ejecución del pilotaje entre octubre de 2024 y marzo de 2025; se atendieron PQRSD en mayo de 2025; se efectuaron evaluaciones técnicas y comités de participación ciudadana en junio de 2025; se implementaron acciones correctivas en julio de 2025; y se procedió al escalamiento a las entidades competentes en octubre de 2025. A la fecha, el caso se mantiene en seguimiento institucional, con soporte técnico, social y documental que respalda las actuaciones adelantadas y la mitigación de las afectaciones identificadas.

Con fundamento en lo anterior, desde la interventoría se informó que se dio respuesta al IDRD, con copia a la Secretaría Distrital del Hábitat y a la peticionaria. Así mismo, se deja constancia de que lo concerniente a las actuaciones adelantadas por el contratista de obra y la interventoría en relación con la respuesta al traslado de competencia será referenciado de manera detallada en el Informe Mensual de Obra No. 24, incluyendo los respectivos soportes técnicos, sociales y administrativos.

COMPONENTE AMBIENTAL:
Durante el período evaluado, el Componente Ambiental ejecutó actividades del Plan de Manejo Ambiental (PMA) enfocadas en capacitación, control operativo y gestión de residuos, con intervención directa en las zonas Edificio E, Pasarela R, y Urbanismo. Se desarrolló la capacitación sobre riesgos ambientales en el Área de Influencia Directa (02/01/2026), además de jornadas permanentes de orden y aseo, protección de materiales y limpieza de sumideros. En gestión de RESPEL, se ejecutaron 65.321.859 kg de un total presupuestado de 76.040.380 kg, alcanzando un 85,90 % de avance global, con desempeños del 100 % en Pasarela R y Parqueadero, 87 % en Urbanismo y 85 % en Edificio E; no se registró retiro de RESPEL en la semana reportada. En RCD, se reportó un aprovechamiento del 99,80 % y un índice de circularidad del 20,02 %, evidenciando cumplimiento alto de metas ambientales. La profesional ambiental de la UTMP indica que se presentó a la interventoría la propuesta de instalación de material de lleno de origen reciclado, lo que aumentaría el porcentaje de cumplimiento de la meta de circularidad si este material es aprobado por las partes técnicas y ambientales de la interventoría.

1. Conceptos técnicos SDA- Geomembrana

Se presenta el alcance y generalidades de los conceptos técnicos con los que se elaboraron los planes del componente ambiental, emitidos por la SDA previo a la etapa de construcción del proyecto, los cuales son: CT 09579 del 27/08/2021 y 1.1 CT 03441 del 31/03/2023

Citando el numeral 5.3 del CT 09579 del 27/08/2021 que relaciona lo siguiente:
"La EAAB propone el desarrollo de una cobertura semipermeable para el desarrollo del futuro Parque Metropolitano PM-10 Porvenir (Gibraltar) y sugiere para las zonas en las cuales se va a realizar construcciones superficiales tales como cachas de fútbol, basquetbol, ciclo rutas; adelantar actividades de impermeabilización de toda el área mediante la instalación de una capa de mínimo 0.8 metros separada por una geomembrana."
La UTMP aclara que el acto administrativo de la SDA no relaciona medidas de
Y que en el concepto técnico 03441 del 31/03/2023 mediante el cual la SDA realiza el análisis de resultados de los muestreos de suelo y resultados de desgasificación remitidos por la EAAB por zonas de intervención. De este concepto en el numeral de manejo de suelo se evidencia que no relaciona medidas de impermeabilización de las zonas verdes como tampoco de construcciones superficiales, y relaciona las acciones de riesgo en sus diferentes niveles, de las cuales se destaca el nivel 2, que indica lo siguiente:
"Nivel 2: Esta autoridad ambiental se permite resaltar, que es necesario el cubrimiento de las zonas en donde, de acuerdo con el diseño final de parque, el usuario recreacional pueda llegar a tener contacto directo con el suelo, de manera que se evite la exposición de los receptores sensibles por las tres vías de exposición: dérmica, oral e inhalatoria."
La UTMP presenta la información relacionada con zonas verdes acorde con los conceptos técnicos surgidos durante el seguimiento de ejecución de obra por parte de la entidad ambiental, los cuales son:
- Concepto técnico 09237 del 21/10/2024 (Atendido mediante radicado 2025ER23084 del 29/01/2025)
"Adicionalmente, para las zonas de urbanismo con zonas verdes, sea césped o jardinería, se propone desde la UTMP la instalación de mínimo una capa de 0.2 metros de sello con recebo común, la instalación del sustrato orgánico para la vegetación y las especies seleccionadas en el acta WR 1388A suscrita el 16/06/2024. Se aclara que en la etapa final del proyecto de urbanismo se realizarán únicamente llenos, no se requiere realizar excavaciones profundas"
Y Concepto técnico 01572 del 12/04/2025 (Atendido mediante radicado 2025ER242157 del 14/10/2025)
Mediante el cual se reitera lo relacionado en el radicado 2025ER23084 del 29/01/2025 y se adiciona:
"Las zonas de urbanismo como senderos peatonales y zonas duras de permanencia contarán con acabados que garantizan la separación del relleno antrópico con futuros usuarios y la huella del edificio contará con un sello de 40 cm de espesor en recebo común, seguido de las estructuras de concreto definitivas"
Es decir, se aclara que, durante la ejecución del proyecto, los pronunciamientos remitidos a la entidad ambiental en relación con la protección de futuros usuarios del proyecto, no han presentado la medida de instalación de geomembrana como aislami**ento.**

COMPONENTE HIDROGEOLÓGICO Y SUELOS
El análisis hidrogeológico se desarrolló en el Predio Gibraltar, considerado como una única estructura espacial, con diferenciación operativa por zonas (Velódromo – CAR, Área 2). La dirección conceptual del flujo de agua subterránea está dominada por la dinámica del Río Bogotá, con flujos predominantemente horizontales y baja probabilidad de ascensos, salvo por intervenciones antrópicas. El monitoreo de niveles freáticos entre 2024 y 2025 evidenció variabilidad en los pozos PZ_Dre_1 y PZ_Dre_4, con niveles más cercanos a la cota del proyecto en octubre y noviembre, mientras que PZ_Dre_2 y PZ_Dre_3 presentaron comportamiento estable. En cuanto a impermeabilización, se concluye que no es técnicamente recomendable

impermeabilizar la totalidad de las zonas verdes, por riesgo de encharcamiento; la impermeabilización se limita a áreas con SUDS y puntos de conducción, mediante geomembranas, para evitar mezcla de aguas lluvias con niveles freáticos asociados a lixivi**ados.**

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)
La implementación de SUDS en zonas verdes se orienta a emular el ciclo hidrológico natural, controlando escorrentías y mitigando riesgos de inundación. Se diseñaron zonas de bio-retención localizadas en sectores SW, SE y E, con áreas de recolección de 3.127,99 m², 1.804,80 m² y 2.171,54 m², respectivamente, y volúmenes de manejo de 20,39 m³, 16,23 m³ y 14,13 m³. Las áreas de fondo impermeabilizadas oscilan entre 30,96 m² y 44,84 m², limitadas exclusivamente a los puntos de control hidráulico. El sistema cubre un área total de recolección con SUDS de 7.104,33 m², mientras que las zonas verdes sin SUDS suman 2.322,10 m², para un área total de manejo de 9.426,43 m², garantizando coherencia hidráulica y compatibilidad con las condiciones hidrogeológicas del predio.

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO: En las Diapositivas 26 al 28 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida así:

Durante el período evaluado, el Componente de Gestión del Riesgo desarrolló acciones continuas de monitoreo y reducción del riesgo en los frentes activos del proyecto, con intervención directa en las zonas excavadas del Túnel Administrativo, Túnel de Deportistas y Túnel Principal, así como en áreas generales de excavación profunda. Se ejecutaron actividades de evacuación de lixiviados mediante el uso de Catch Tank y activación permanente de motobombas, garantizando el abatimiento del nivel freático, el cual fue monitoreado mediante mediciones sistemáticas en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra, permitiendo un control efectivo de las condiciones hidráulicas del terreno. Así mismo, se realizó seguimiento a los escenarios ER07 a ER16, con énfasis en la reducción activa de los riesgos ER14, ER15 y ER16, mediante inspecciones técnicas, control de sistemas de contención y verificación del adecuado funcionamiento de mangueras y geomembranas empleadas como diques de contención. Adicionalmente, se adelantaron jornadas de control de olores mediante la aplicación preventiva de cal en zonas excavadas, mitigando impactos ambientales y sanitarios. En cuanto a la estabilidad del terreno, se efectuaron inspecciones visuales de taludes, con acompañamiento del equipo de geotecnia, verificando la implementación de las medidas recomendadas para su contención. Complementariamente, se ejecutaron ocho (8) jornadas de monitoreo de gases volátiles en frentes de trabajo activos, registrándose valores de 0 % LEL para CH_4, lo que confirma condiciones seguras de operación. Como refuerzo a las actividades de control, se incorporó un equipo de monitoreo de respaldo marca CROWCON, serial W259628/01-059, fortaleciendo la capacidad de respuesta y confiabilidad del sistema de gestión del riesgo en obra. Se informa que fue radicado el Informe Semestral II, correspondiente al primer semestre de 2025, ante la Interventoría CIG este ultimo remite ante el IDRD con Rad. IDRD No 20252100575732 del 29/12/2026.

Componente Fauna: En las Diapositivas 29-33 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el periodo evaluado, el Componente Fauna desarrolló actividades de seguimiento, control y manejo de fauna silvestre en el predio del proyecto, con intervención directa en las áreas liberadas para el desarrollo de las obras. Se ejecutaron recorridos mensuales de seguimiento faunístico, orientados a la identificación, registro y protección de especies residentes, así como a la liberación controlada de áreas de intervención, garantizando la minimización de impactos sobre la fauna silvestre presente. Como resultado del monitoreo realizado entre los años 2024 y 2025, se evidenció un comportamiento variable en la riqueza y abundancia de especies, registrándose para el año 2025 valores mensuales que oscilaron entre 4 y 12 taxones, con un número de individuos que varió entre 30 y 149, alcanzando el mayor registro en septiembre de 2025 con 11 taxones y 149 individuos, lo que confirma la presencia activa de fauna residente en el predio y la efectividad de las medidas de manejo implementadas. En términos de seguimiento y control documental, el Informe Mensual de Fauna No. 23 fue entregado por el contratista el 29 de diciembre de 2025, recibió observaciones por parte de la interventoría en la misma fecha, las cuales fueron atendidas y ajustadas mediante respuesta remitida el 02 de enero de 2026, culminando con la aprobación formal del informe el 07 de enero de 2026, mediante radicado CE-206-128-1175, evidenciando el cumplimiento de los compromisos ambientales y el adecuado control institucional del componente.

COMPONENTE FORESTAL: En las Diapositivas 34-38 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el periodo evaluado, el Componente Forestal desarrolló actividades de seguimiento, control y protección del arbolado de conservación permanente localizado en el costado sur interior del predio, zona perimetral correspondiente a la Calle 49 Sur. El 07 de enero de 2026 se realizó un recorrido técnico conjunto con la Interventoría, en el cual se verificó el estado físico y sanitario del arbolado protegido, así como la correcta instalación de la malla azul de aislamiento, confirmándose que los individuos evaluados se encuentran en condiciones adecuadas de conservación y estabilidad, manteniendo su integridad en el lugar de emplazamiento. En el recorrido se inspeccionaron específicamente los árboles No. 70, 71 y 72, así como los árboles No. 77, 78, 79 y 80, evidenciándose como única novedad relevante el árbol No. 70, el cual presenta afectación por quemadura, situación que queda registrada para su seguimiento técnico y definición de acciones conforme a la normatividad ambiental vigente. En cuanto a la gestión administrativa del componente, se cuenta con la aprobación del Informe Mensual Forestal No. 22, mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-924-2025, lo que acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales del periodo anterior. Adicionalmente, se encuentra pendiente la información relacionada con la reliquidación del método de compensación, en el marco de la Resolución 1639 de 2023, considerando lo establecido en el acta WR WR 1388ª de 2024. Finalmente, mediante el comunicado CIG-IDRD-VEL-981-2025, se deja constancia de que las actividades de tala autorizadas serán ejecutadas directamente por el Jardín Botánico de Bogotá,

COMPONENTE SST: En las Diapositivas 34-38 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida así:

Durante el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, el proyecto contó con un promedio de 87 trabajadores activos en los frentes de obra, con predominio de personal operativo (oficiales, ayudantes, herreros y operadores), lo que demanda un control permanente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En los frentes operativos se dispuso de maquinaria, equipos y vehículos en operación, los cuales fueron objeto de seguimiento SST para garantizar condiciones seguras de uso y cumplimiento de los protocolos establecidos.

En cuanto a accidentalidad laboral, se registran 8 accidentes reportados en el período comprendido entre febrero de 2024 y diciembre de 2025, de los cuales 3 se encuentran cerrados y 5 permanecen abiertos, concentrándose estos últimos en marzo, noviembre y diciembre de 2025. Con relación a los procesos activos de investigación y seguimiento a los accidentes de trabajo se puntualizan los siguientes casos: Héctor Umaña, accidente ocurrido el 05/12/2025; Alberto Ardila, accidente ocurrido el 26/12/2025; y Alejandro Villamil, accidente ocurrido el 29/12/2025.

Respecto al ausentismo, se reporta un total acumulado de 56 casos, presentando su mayor incidencia en diciembre de 2025 (7 casos), indicador que continúa siendo monitoreado por su impacto en la operación y la planeación de obra.

Adicionalmente, se ejecutaron actividades preventivas en los frentes de obra, incluyendo inspecciones de uso de EPP y dotación, trabajo en alturas, señalización interna y charlas de sensibilización a subcontratistas, quedando dichas actuaciones debidamente registradas dentro del sistema de gestión SST

COMPONENTE DE CALIDAD: En las Diapositivas 39-46 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante la semana comprendida entre el 28 de diciembre de 2025 y el 04 de enero de 2026, se ejecutaron 141,75 m^3 de concreto estructural en los frentes correspondientes a placas de los Módulos 5 (Tramo 1) y 6, así como en muros del Túnel Deportivo y Túnel de Ambulancia, y columnas de los Módulos 1, 7 y 16 y del Túnel de Ambulancia. El volumen acumulado real de concretos estructurales ejecutados en el proyecto asciende a 2.304,58 m^3, con control de calidad mediante ensayos de asentamiento (NTC 396) y toma de muestras (NTC 673).

En cuanto al acero de refuerzo, se cuenta con un total acumulado controlado de 471,06 toneladas. Durante el período del 29 de diciembre de 2025 al 04 de enero de 2026 no se registró ingreso de nuevo material, manteniéndose el control documental y la trazabilidad de los aceros previamente ingresados.

Respecto a la estructura metálica de cubierta, el proyecto registra un total acumulado de 198,69 toneladas ingresadas, correspondientes a 21 elementos, principalmente cerchas principales. El último ingreso se efectuó entre el 21 y el 28 de diciembre de 2025, con 2 unidades equivalentes a 15,07 toneladas, debidamente controladas y certificadas.

Adicionalmente, se mantiene actualizado el control de cambios y rediseños del proyecto, contando con aprobación formal para la mayoría de los componentes estructurales, arquitectónicos y técnicos. Permanecen en seguimiento técnico algunos componentes específicos, tales como estructura de fachada, pasarela de mantenimiento, gas, paisajismo y componente bioclimático, los cuales cuentan con trazabilidad documental mediante oficios y mesas de trabajo, bajo control del contratista y la interventoría.

COMITÉ TÉCNICO No 92,2

COMPONENTE BIM: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 03 del informe semanal UTMP.

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*) PENDIENTE la UTMP comenta que se ha venido actualizando parametrizando con los elementos hidro sanitario y se actualiza segun propuesta VANTI.
2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.
3) Actualización del BEP remitido al IDRD (**) y estrategia de seguimiento remitido al apoyo supervisión el día 07/01/2025. En revisión por parte del IDRD. CUMPLIDO.

En las Diapositivas 39-46 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Se desarrolló el seguimiento y control del avance estructural del proyecto mediante modelos actualizados que reflejan, por frente de obra, el avance ejecutado en el período, el avance acumulado de períodos anteriores, las actividades proyectadas y los elementos en ejecución.

El control se realizó de manera sectorizada, abarcando los Módulos 1, 5, 6, 7, 11 y 16 (pasarela), así como los frentes de Túnel Principal, Túnel Deportivo y Túnel Administrativo, permitiendo una visualización precisa del estado de la estructura en cada zona del proyecto y su correspondencia con la programación.

Adicionalmente, se ejecutaron simulaciones 4D de la estructura para el período comprendido entre el 11 y el 25 de enero de 2026, incorporando análisis comparativos de proyección versus ejecución, los cuales sirven como herramienta de apoyo para la toma de decisiones y el ajuste de la planeación de obra.

Finalmente, se mantuvo actualizado el modelo federado BIM, garantizando la coordinación interdisciplinaria, la trazabilidad entre diseño y ejecución, y el fortalecimiento del control técnico del proyecto.

COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 22.

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. PENNDIENTE En desarrollo por parte de la UTMP.
2) Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. PENNDIENTE En desarrollo por parte de la UTMP teniendo en cuenta los insumos y NP devueltos por la entidad. La UTMP manifiesta al respecto que los rendimientos y precios se presentan incrementos en mano de obra y concretos principalmente, se remitira un oficio al respecto teniendo en cuenta los ultimos incrementos y medidas. La supervision manifiesta que el incremento del SMLV es un tema que no maneja la entidad y se miraran las condiciones contractuales del contrato firmado en el 2023.
3) Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025) Pendiente Respuesta IDRD se informa que se tendra una remision adicional de la nacionalización de material adicional para canales y faldón perimetral los cuales hacen parte de la membrana arquitectónica de la cubierta ante el IDRD.

Los porcentajes, según modificatorio No 2 en valor ganado, Diapositiva No 22, a corte de este reporte son:
Programado: 54,48%
Ejecutado: 51,82%
Costo: 51,82%
Atraso porcentual 2,66%

Por parte de la UTMP se aclara que la programacion empieza a presentar atrasos constantes teniendo en cuenta que se requieren reestablecer tiempo perdidos/pasados del contrato generados por los modificatorios suscritos y sustentados en debida forma y se tendra ajuste respectivo cuando sea firmado el proximo modificatorio.

Se presenta desde la diapositiva No 22 hasta la No 28, las actividades tecnicas presupuestales desarrolladas y que son la base de las cantidades mostradas durante la reunion.

El avance programado acumulado es del 54,48% ($80.517.224.198,06), mientras que el avance ejecutado real alcanza el

51,82% ($76.577.378.932,84), evidenciando un rezago del -2,66% respecto a la programación. El costo incurrido coincide con la ejecución, sin desviaciones presupuestales relevantes.

La facturación acumulada del proyecto asciende a $72.600.786.011, equivalente al 49,13% del valor contractual vigente. Durante 2025 se facturaron $45.226.667.670, concentrándose los mayores valores entre abril y junio, con disminuciones marcadas en agosto y septiembre.

Desde el punto de vista presupuestal, la mayor ejecución se concentra en movimientos de tierra (50%) y cimentación (37%), capítulos que presentan avances físicos altos o concluidos. En contraste, se identifican rezagos significativos en estructura metálica (5%), acero (47%) y acabados, los cuales explican la variación negativa del avance general.

En cuanto a la ejecución en obra, se mantienen frentes activos en túneles (apoyo, administrativo y principal) y en el Módulo 5, con actividades estructurales y de redes en ejecución continua. Adicionalmente, se inició la construcción de columnas en los Módulos 7 y 11 – Pasarela, ampliando el frente productivo del proyecto.

Respecto al anticipo, se ha girado el 94% ($35.535.169.187,51), con una amortización acumulada de $21.048.849.991 y un saldo pendiente por amortizar de $18.797.643.991, coherente con el nivel actual de avance financiero, esto correspondiente a la pista, la supervision indaga sobre el contrato con el constructor de pista , subcontratista TEAM SHARK, la UTMP manifiesta que se esta cerrando negociacion en los proximos dias.

COMPONENTE TÉCNICO: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 30

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. PENDIENTE la UTMP revisa los documentos y se dará la respuesta respectiva.
2) Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. PENDIENTE la UTMP revisa los documentos y se dará la respuesta respectiva.
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. Se espera respuesta por parte del IDRD a reconocimiento planteado segun radicados No Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025.
4) Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar. PENDIENTE.
5) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD. PENDIENTE.

La UTMP reporta los avances de confección de la membrana para la cubierta, (Diapositiva No 31-32-33), así:

Total material a a Nacionalizar 10,256 m2 equivalente a 100% equivalente a 30 paneles en 300 unidades y/o secciones

En cuanto al tema de estructura metálica de la cubierta, a la fecha a Obra se ha suministrado un total de 198,6 Toneladas segun el cronograma de recibo suministrado por el subcontratista EMECON Próxima entrega del 05 al 10 de Enero 2026 de 60 Ton. Pendiente llegada a obra de 176,4 Toneladas (Oct-Nov-Dic 2025) adicional se informa que en planta hay **912,42 Ton** equivalentes al **83,93%**, en producción **254,99 Ton**, el total proyectado es: **1085 Ton**, su porcentaje de avance es: **23,46%.** (diapositiva 32-33)

Dentro de las actividades ejecutadas en la semana, se informa que la estructura metálica de cubierta con secciones de cercha principal acopiada en obra corresponde a **198,69 Toneladas** (Diapositiva 33)

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA58C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton

9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA6A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
					Total	21 Unds		**Total**	198,69 Ton

En cuanto a estructuras de concreto, se reportan avances significativos en múltiples frentes:

✓ Túnel de ambulancias (zonas 13 y 14): fundida de muros estructurales.
✓ Túnel deportivo (tramos 23 al 27): continuidad en fundida de muros.
✓ Módulos 5 y 6: fundida de placas de fundación (tramo 1).
✓ Módulo 11: fundida de dados estructurales.
✓ Módulos 1 y 7: fundida de columnas en zonas de edificio y columnas de cubierta.
✓ Módulo 16 – pasarela: fundida de columnas estructurales.

Estas actividades consolidan el cierre de fases de cimentación y habilitan el montaje de elementos superiores.

En el tema de los informes de instrumentación se leen las conclusiones a la fecha (Diapositiva 45-46):

✓ Durante el período comprendido desde el 15 al 22 de diciembre de 2025, los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable, con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34,1 mm.
✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6,17 m y 8,92 m.
✓ Los piezómetros tipo Casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 2 cm; las columnas de agua se encuentran entre 4,28 m y 6,12 m de profundidad.
✓ Es importante proteger toda la instrumentación instalada para garantizar su correcto funcionamiento.

COMPONENTE ELÉCTRICO: No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 45-48)

Se reporta por parte de la UTMP que presenta avances puntuales durante la semana comprendida entre el 29 de diciembre de 2025 y el 03 de enero de 2026, con intervenciones en tres frentes principales:

En el Módulo 5, se ejecutó la instalación de tubería PVC de 1 1/4" para el alumbrado exterior.

En el mismo módulo, se inició la canalización de la red de media tensión, mediante la instalación del primer tramo de ingreso a la subestación, conformado por cuatro tuberías PVC de 6 pulgadas.

En el Módulo 6 (zona de pista), se realizó la instalación de tuberías para redes de comunicaciones.

COMPONENTE HIDRÁULICO: No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 49)

1) Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025. PENDIENTE.
2) Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD PENDIENTE.
3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 05/01/2025. PENDIENTE teniendo en cuenta tiempos de reinicio de actividades año nuevo 2026 EAAB.

Se reporta por parte de la UTMP que concentra su ejecución en el Túnel Administrativo, específicamente en el perímetro de la estructura, donde se continúa con la instalación del geodrén perimetral. Esta actividad se encuentra en ejecución, orientada al control de aguas subterráneas y a la protección de la estructura; no se reportan porcentajes de avance cuantitativos, solo progreso operativo en obra.

TEMAS TRATADOS

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Envío de las investigaciones según exigencia normativa para la investigación y reporte de accidentes de trabajo establecidos en la resolución 1401 de 2007, para seguimiento respectivo. Sr. Héctor Umaña y el Sr. Alberto Ardila	UTMP	8/01/2026
Envío de las investigaciones según exigencia normativa para la investigación y reporte de accidentes de trabajo establecidos en la resolución 1401 de 2007, para seguimiento respectivo. Sr. Alejandro Villamil.	UTMPb	13/01/2026
Informar a la comunidad sobre la tala del arbol No 70	UTMP - IDRD	CUMPLIDO
Respuesta al formato registro de proveedores No 7 (Rad. IDRD No 20252100514222 del 18/11/2025)	IDRD	Sin fecha
Remision de Totalidad de documentos de incidente con trabajador del Sub-Contratista.	UTMP - CIG	Sin fecha
Establecer Mesa de trabajo Interna IDRD - CIG al respecto de alternativas de manejo de Aguas subterraneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velodromo	IDRD - CIG	Sin fecha
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (propuesta) Pendiente según evaluacion de alternativa propuesta.	UTMP	10/12/2025
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.	UTMP	26/08/2025
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG.	UTMP	31/12/2025
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP.	UTMP	22/11/2025
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025) Pendiente Respuesta IDRD	IDRD	19/12/2025
Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP	25/12/2025
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 05/01/2025	IDRD-EAAB	Sin fecha

Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO.	UTMP	23/12/2025
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO.	UTMP	26/12/2025
Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD.	UTMP	2/12/2025
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	IDRD	Sin fecha

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	X	**NO**	
Observaciones				

Siendo las _10:16 a.m.__ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**		
FIRMA		**FIRMA**	N.A	N.A
NOMBRE	**ARQ. RUBÉN DARÍO CRESPO BOTERO**	**NOMBRE**	N.A	N.A
CARGO	**DIDECTOR DE INTERVENTORIA**	**CARGO**	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ING. Arturo Rojas Torres - residente de Interventoria



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente


social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

Comité de obra transversal



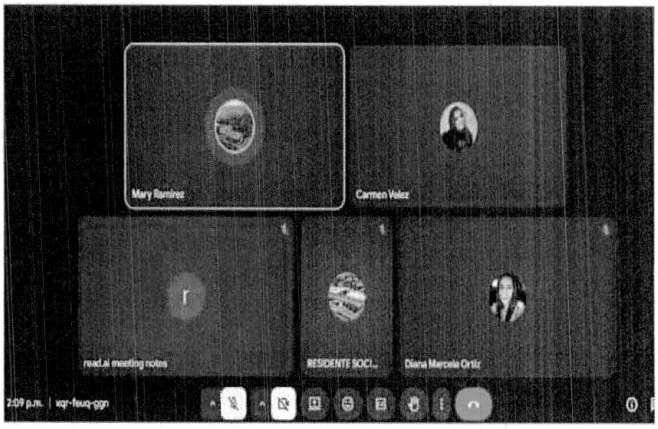

Actividades ejecutadas por el componente social


Trazabilidad informe mensual No. 23

FECHA	ACTIVIDAD
22/12/2025	se envía mediante correo electrónico el avance del informe mensual
22/12/2025	La profesional social de la interventoría emite observaciones del informe mensual mediante lista de chequeo
23/12/2025	Se realiza mesa de trabajo para validación y corrección de observaciones
26/12/2025	Se incluye información del personal
27/12/2025	Se radica versión 2 del informe mensual a la interventoría
30/12/2025	La interventoría emite **aprobación** del informe

Actividades ejecutadas por el componente social

Atención al ciudadano

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**

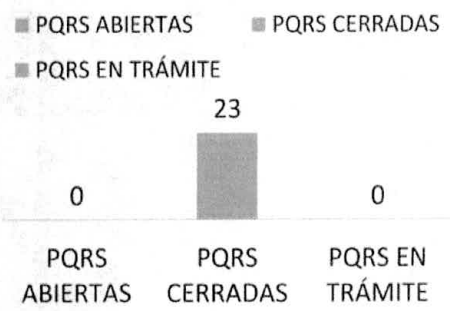

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

Solicitud por traslado

Fecha	Reporte	Actuación UTMP	Resultado
Ago 2024	Reporte inicial de hundimientos	Se deja constancia de afectaciones previas al pilotaje en espacios comunitarios	Antecedente documentado
Oct 2024 – Mar 2025	Ejecución pilotaje	Actividad ejecutada conforme a cronograma aprobado	Afectaciones predios aledaños y se asumió responsabilidad
Mayo 2025	PQRSD por zonas comunes	Visitas técnicas interdisciplinarias (técnica, geotecnia, social e hidrogeología)	Diagnostico inicial
Junio 2025	Evaluación técnica	Emisión de conceptos técnicos especializados	Responsabilidades en zonas especificas
Junio 2025	Comité de Participación Ciudadana	La administradora manifiesta afectaciones previas al pilotaje (queda en acta)	Soporte social
Julio 2025	Acciones correctivas	Arreglos puntuales donde se corroboró responsabilidad	Afectaciones mitigadas
Oct 2025	Escalamiento a entidades	Respuesta técnica previa; traslado por competencia	Caso en seguimiento institucional





INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

ACTIVIDADES EJECUTADAS PMA



- Capacitación: Riesgos ambientales en el AID (02/01/2026)
- Jornadas de orden y aseo
- Protección de materiales
- Limpieza de sumideros
- Metas RCD: Aprovechamiento: 99,80%
  Circularidad: 20,02%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

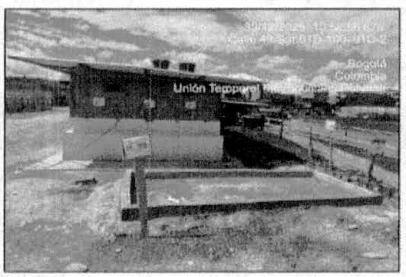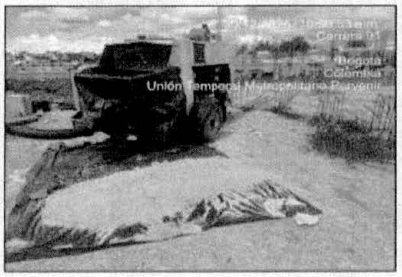


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RESPEL

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.408.119**	**85%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.321.859**	**85,90%**

Sin retiro de RESPEL Semanal


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTOS SDA GEOMEMBRANA


BOGOTÁ

CT 09579 DEL 27/08/2021 **CT 03441 DEL 31/03/2023**

ALCANCE

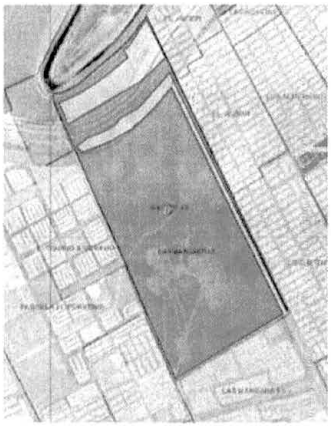

PREDIO GIBRALTAR UNA ÚNICA ESTRUCTURA ESPACIAL

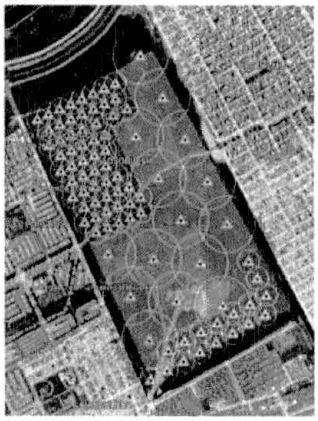

PREDIO GIBRALTAR SEGREGADO POR ZONAS (VELÓDROMO-CAR) ÁREA 2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTOS SDA GEOMEMBRANA

BOGOTÁ

CT 09579 DEL 27/08/2021 **CT 03441 DEL 31/03/2023**

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (NUMERAL SUELO)

" 5.3 SUELO

La EAAB propone el desarrollo de una cobertura semipermeable para el desarrollo del futuro Parque Metropolitano PM-10 Porvenir (Gibraltar) y sugiere para las zonas en las cuales se va a realizar ***construcciones superficiales*** *tales como cachas de fútbol, basquetbol, ciclo rutas; adelantar actividades de impermeabilización de toda el área mediante la instalación de una capa de mínimo 0.8 metros separada por una geomembrana."*

No relaciona medidas de impermeabilización de las zonas verdes como tampoco de construcciones superficiales

" Acción de riesgo

Nivel 2: *Esta autoridad ambiental se permite resaltar, que es necesario el cubrimiento de las zonas en donde, de acuerdo con el diseño final de parque, el usuario recreacional pueda llegar a tener contacto directo con el suelo, de manera que se evite la exposición de los receptores sensibles por las tres vías de exposición: dérmica, oral e inhalatoria."*

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTOS SDA- VELÓDROMO

BOGOTÁ

CT 09237 DEL 21/10/2024

RESPUESTA REALIZADA MEDIANTE RADICADO 2025ER23084 del 29/01/2025

"Adicionalmente, para las zonas de urbanismo con zonas verdes, sea césped o jardinería, se propone desde la UTMP la instalación de ***mínimo una capa de 0.2 metros de sello con recebo común, la instalación del sustrato orgánico para la vegetación*** *y las especies seleccionadas en el acta WR 1388A suscrita el 16/06/2024. Se aclara que en la etapa final del proyecto de urbanismo se realizarán únicamente llenos, no se requiere realizar excavaciones profundas"*

CT 01572 del 12/04/2025

RESPUESTA REALIZADA MEDIANTE RADICADO 2025ER242157 del 14/10/2025

Se reitera lo relacionado en el radicado **2025ER23084 del 29/01/2025** y se adiciona:


"las zonas de urbanismo como senderos peatonales y zonas duras de permanencia contarán con acabados que garantizan la separación del relleno antrópico con futuros usuarios y la huella del edificio contará con un sello de 40 cm de espesor en recebo común, seguido de las estructuras de concreto definitivas"


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

DIRECCIÓN CONCEPTUAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA

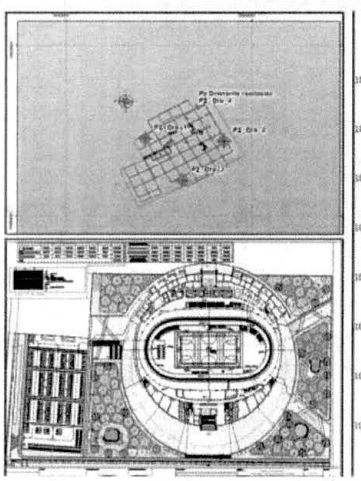

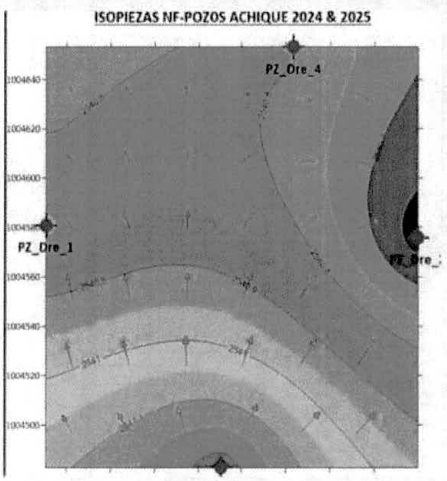


Se rige por la dinámica de la principal fuente hídrica como lo es el Río Bogotá, lo que sugiere flujos con vectores horizontales , con menor posibilidad de ascensos, a menos que haya intervenciones antrópicas.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

COMPORTAMIENTO COLUMNA DE AGUA SUBTERRÁNEA

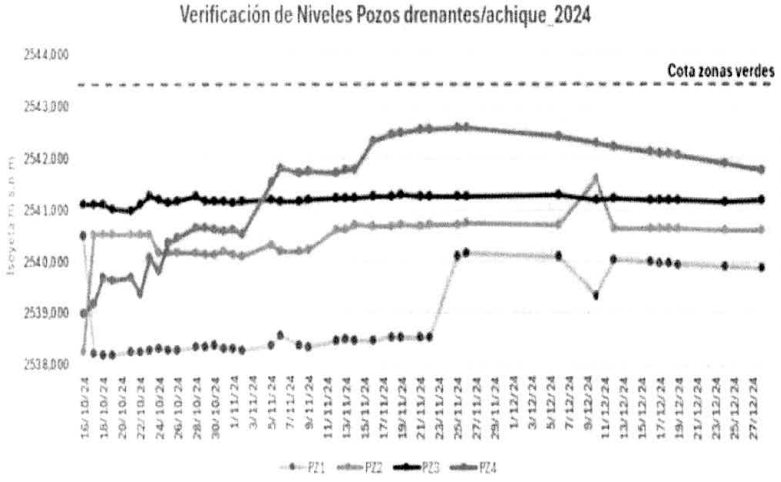


Los niveles de agua medidos desde el 2024 a la fecha 2025, son variables en los pozos PZ_Dre_1 y PZ_Dre_4 es decir los de menor carga hidráulica en términos hidrogeológicos, con la característica que los niveles más cercanos a la cota del proyecto se dieron en octubre y noviembre siendo las temporadas que de acuerdo con el comportamiento bimodal de la zona corresponde a la zona de mayores precipitaciones. Siendo los PZ_Dre_2 & PZ_Dre_3 los más estables.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

COMPORTAMIENTO COLUMNA DE AGUA SUBTERRÁNEA

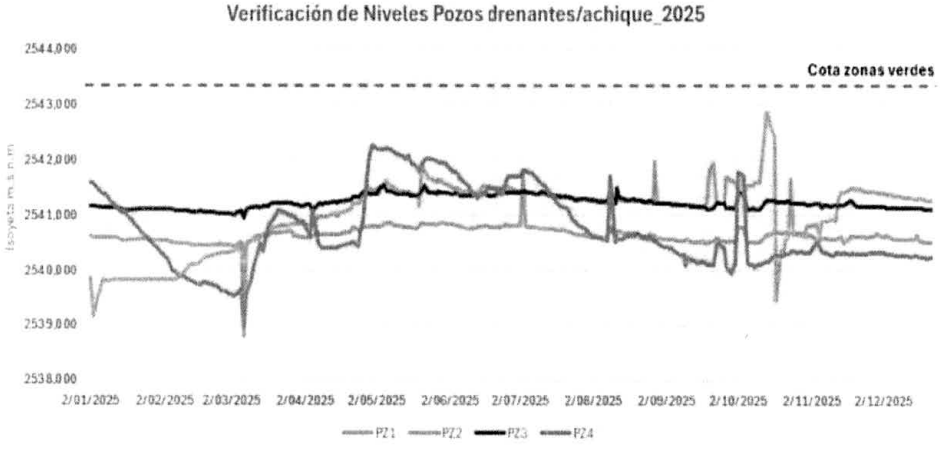

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

CONSIDERACIONES IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS VERDES

1. Es importante mencionar que si se impermeabiliza todas las zonas verdes podría darse encharcamiento o saturación del terreno

2 En las zonas verdes donde no se proyecta la instalación de SUDS, y donde no hay un sistema de recolección y manejo de las aguas lluvias se infiere que el proceso de impermeabilización no es necesario, toda vez que el agua que se precipita y posteriormente se infiltra como parte del ciclo hidrológico en la zona, hace parte de la dinámica pluvial propia del terreno

3. Considerando que para el manejo de aguas lluvias y la regulación de estas, se proyecta la implementación de SUDS, se debe tener en cuenta para el agua recolectada tanto en su punto de recolección como en el transporte de esta hasta la zona de disposición, la protección mediante una geomembrana impermeable para evitar la mezcla de aguas lluvias (y sus niveles máximos) con los niveles freáticos que para el caso corresponden a mezcla de lixiviados, dado los procesos de infiltración natural del agua en zonas verdes.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible ZONAS VERDES

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


SUDS ZONAS VERDES

BOGOTÁ


SUDS

LOS SUDS BUSCAN EMULAR EL CICLO HIDROLÓGICO NATURAL

CICLO EN SISTEMA NATURAL

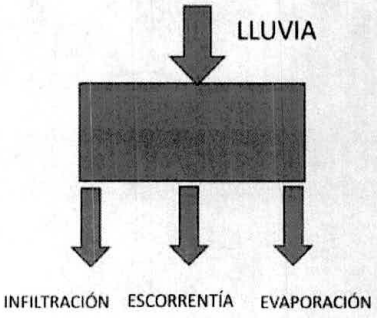

CICLO EN SISTEMA URBANO

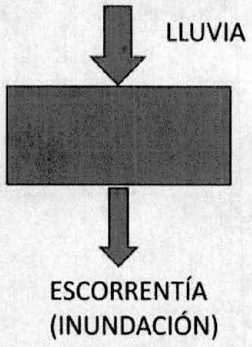


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES

BOGOTÁ


ZONAS DE BIO-RETENCIÓN

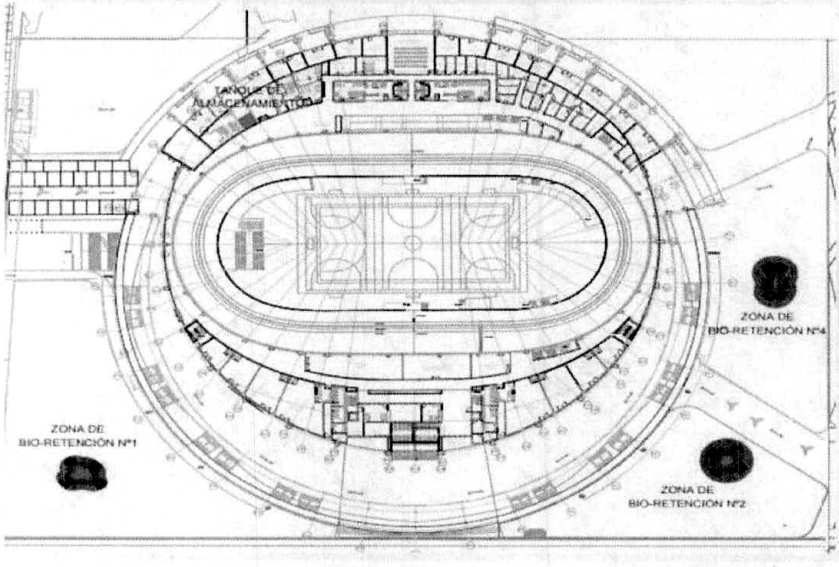

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES


PERFIL ZONA DE BIO-RETENCIÓN

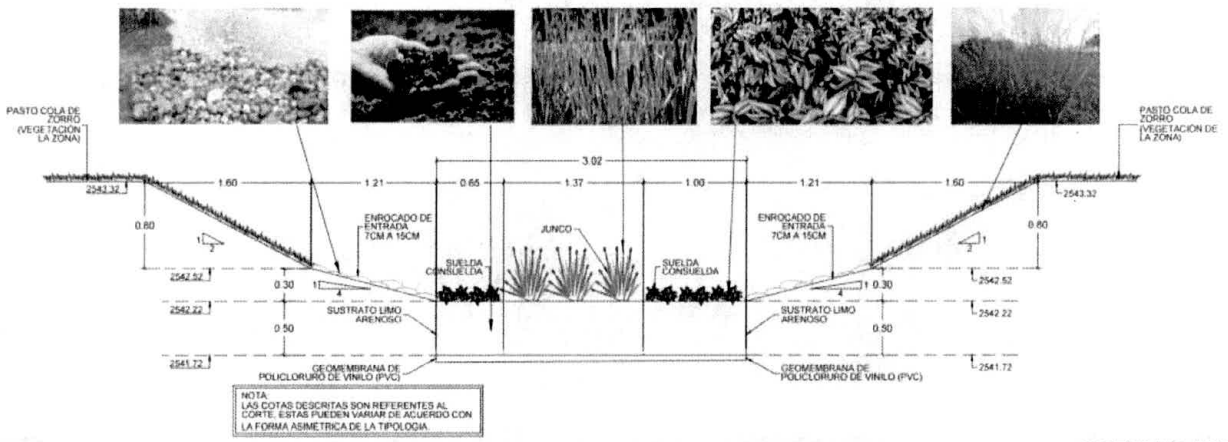


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES

ZONA DE BIO-RETENCIÓN 1 (SW)

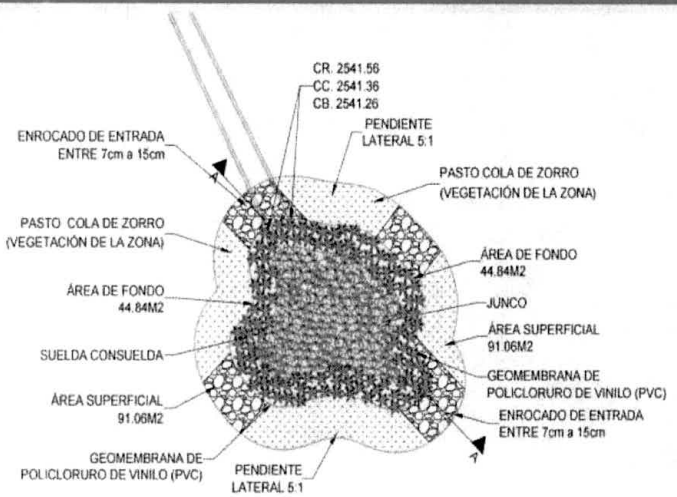

ÁREA DE RECOLECCIÓN: 3127,99 m²
ÁREA DE FONDO (IMPERMEABILIZADA): 44,84 m²
VOLUMEN TOTAL: 20,39 m³

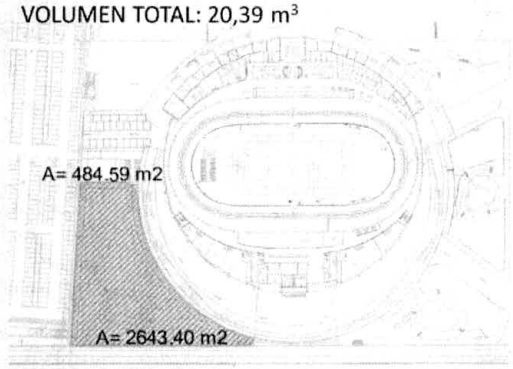

	C[]	A[m2]
1	0.34	2643.40
2	0.88	484.59


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


SUDS ZONAS VERDES

ZONA DE BIO-RETENCIÓN 2 (SE)

BOGOTÁ

ÁREA DE RECOLECCIÓN: 1804,8 m²
ÁREA DE FONDO IMPERMEABILIZADA: 44,84 m²
VOLUMEN TOTAL: 16,23 m³

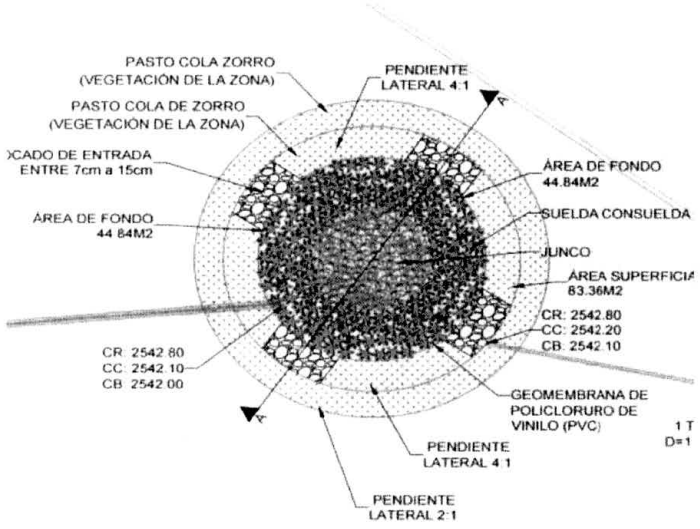

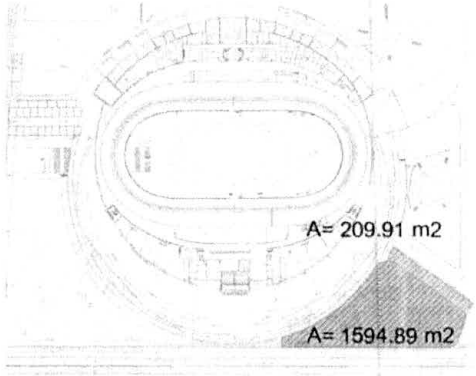

	C[]	A[m2]
1	0.34	1594.89
2	0.88	209.91


INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


SUDS ZONAS VERDES

ZONA DE BIO-RETENCIÓN 4 (E)

BOGOTÁ

ÁREA DE RECOLECCIÓN: 2171,54m²
***ÁREA DE FONDO* (IMPERMEABILIZADA): 30,96m²**
VOLUMEN TOTAL: 14,13 m³

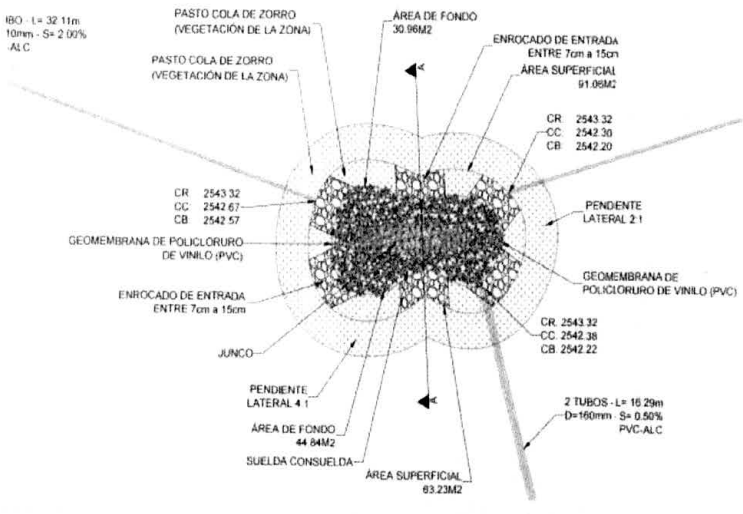

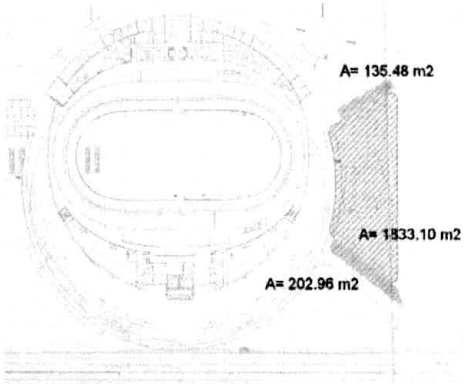


	C[]	A[m2]
1	0.34	1833.10
2	0.88	338.44

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

ZONAS VERDES SIN SUDS

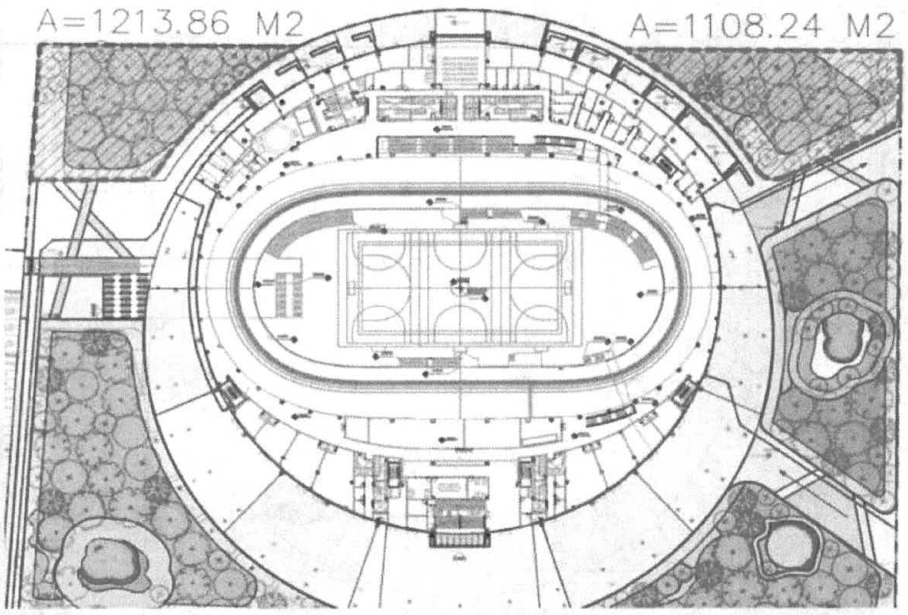

ÁREA TOTAL SIN SUDS: 2322,1 m^2

ÁREA TOTAL DE RECOLECCIÓN CON SUDS: 7.104,33 m^2

ÁREA TOTAL DE MANEJO: 9426,43 m^2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA


BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ

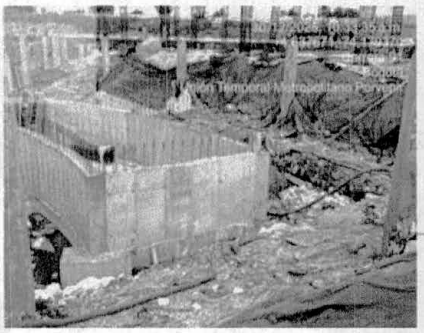


Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo y Deportistas)



Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención

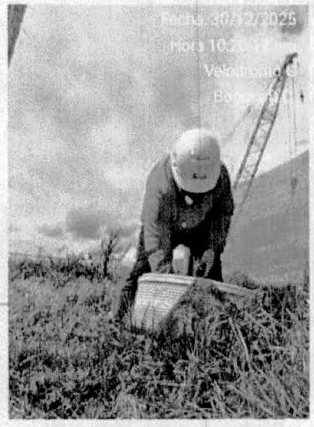


Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13
Reducción del Riesgo ER14-ER15-ER16

BOGOTÁ

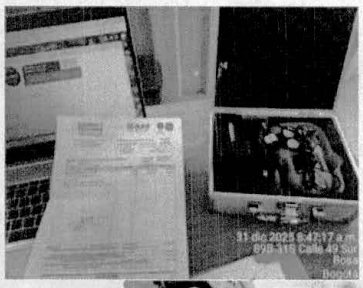


Ingreso del equipo de respaldo de Marca CROWCON - Serial W259628/01-059

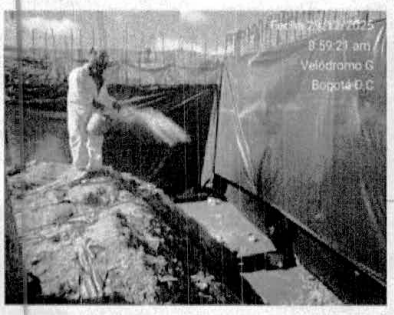

Control Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores

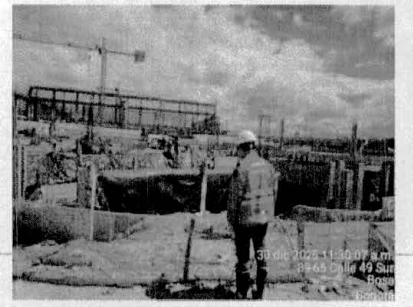

Inspección de taludes

Inspección visual de taludes con acompañamiento de geotecnia y verificación del desarrollo de actividades recomendadas para contención de taludes



Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 8 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

Fauna

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES DE FAUNA

BOGOTÁ

7 ene. 2026 08:19 A.M.

92-39 Calle 49 Sur, Bogotá, Bogotá, CO (4.638, -74.181)

Distrito Capital de Bogotá, Colombia





Claudia Infante Jaimes


Con Desplazamiento · 82min · 0,68 Km — Completo

7 Species +

53	Zenaida auriculata
18	Orochelidon murina
2	Troglodytes musculus

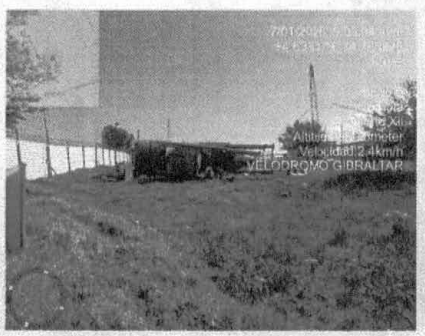

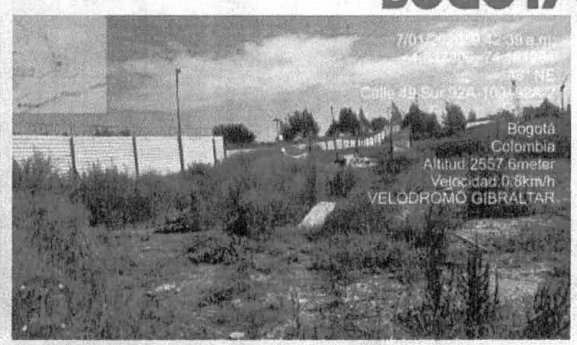

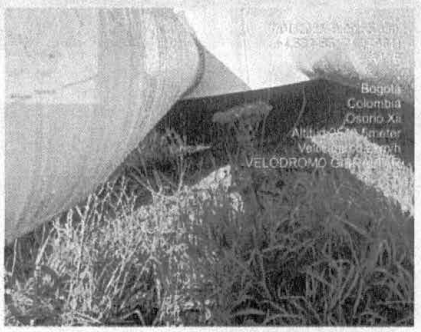


Actividades cumplidas en el componente fauna	
Recorridos de seguimiento mensual	
Liberación de áreas de desarrollo del proyecto	
Especies registradas en el predio (residentes)	


LIBERACION DE AREAS



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FAUNA SILVESTRE

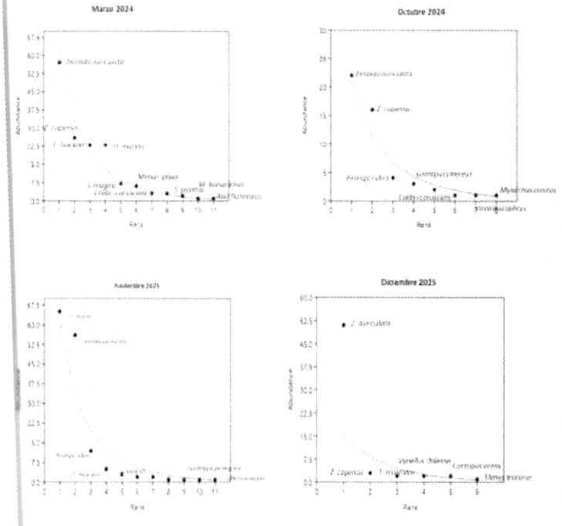

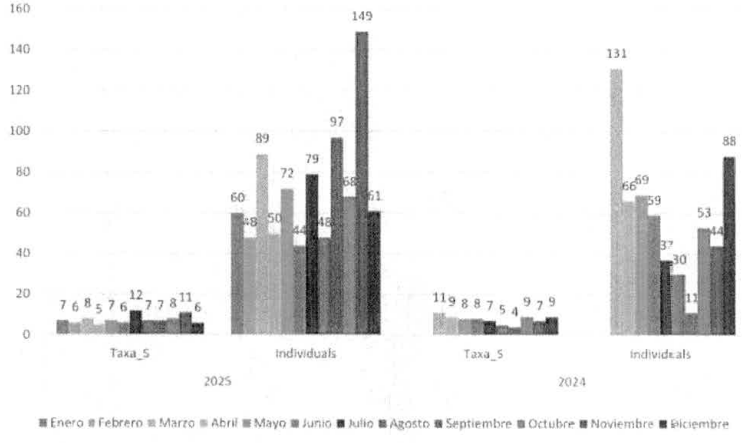

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FAUNA SILVESTRE



IDRD | BOGOTÁ

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA".

CONTRATO IDRD N° 3232 DE 2023
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INFORME MENSUAL N°23 COMPONENTE FAUNA SILVESTRE V-02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDRD N° 3219 DE 2023
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025
BOGOTÁ D.C

1

- Informe mensual No. 23 entregado por el contratista el 29 de diciembre de 2025
- Observaciones realizadas por parte de interventoría al informe No. 23 enviadas el 29 de diciembre de 2025
- Atención a observaciones realizadas al informe No. 23 de obra enviadas el 02 de enero de 2026
- Aprobación del informe No. 23 de obra el 07 de enero de 2026 mediante el radicado CE-206-128-1175

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente
Forestal

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO

El día 7 de enero de 2026 se efectuó recorrido en conjunto con la interventoría, en la revisión del arbolado de protección permanente (conservación), se verificó el estado actual físico y sanitario del arbolado, así como la adecuada instalación de la malla azul para el aislamiento, como se observa a continuación los individuos cuentan con un apropiado estado en su lugar de emplazamiento, excepto el árbol No. 70 (quemado):



Árbol No. 70



Árbol No. 71



Árbol No. 72




PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO



Árbol No. 77



Árbol No. 78

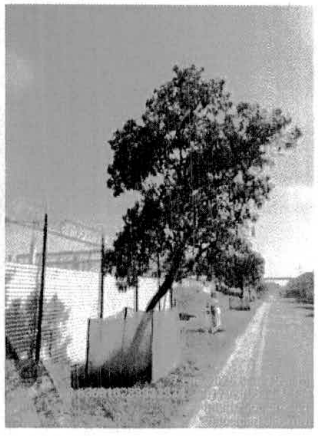

Árbol No. 79




Árbol No. 80

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO





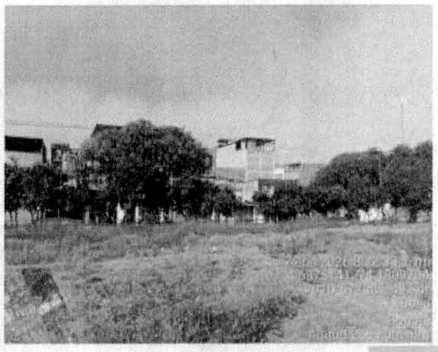

Revisión de árboles Costado Sur Interior predio, perimetral – Calle 49 Sur.



OTRAS ACTIVIDADES

- APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 22 (APROBADO CIG-IDRD-VEL-924-2025)
- En espera de información frente a la reliquidación método de compensación Resolución 1639 de 2023 teniendo en cuenta el acta WR WR 1388ª de 2024.
- Comunicado CIG-IDRD-VEL-981-2025, la tala la ejecuta directamente el Jardín Botánico de Bogotá.

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE SST


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

PROMEDIO PERSONAL

REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	**PROMEDIO 29/12/25 - 04/01/26**
PROFESIONALES	13
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	2
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	16
AYUDANTES	29
HERREROS	9
OPERADORES	6
BACHEROS	1
CONDUCTORES	0
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**87**

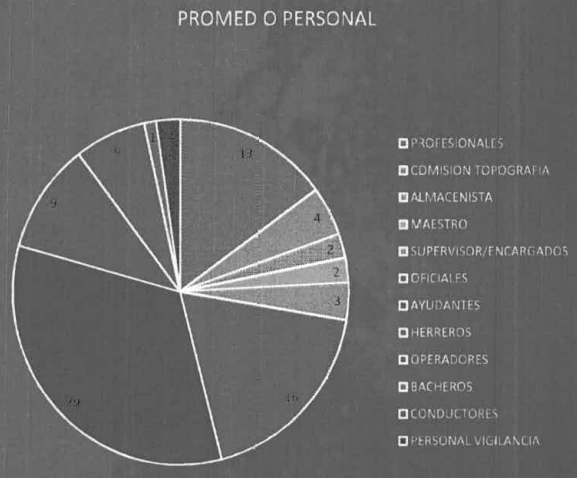



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

BOGOTÁ

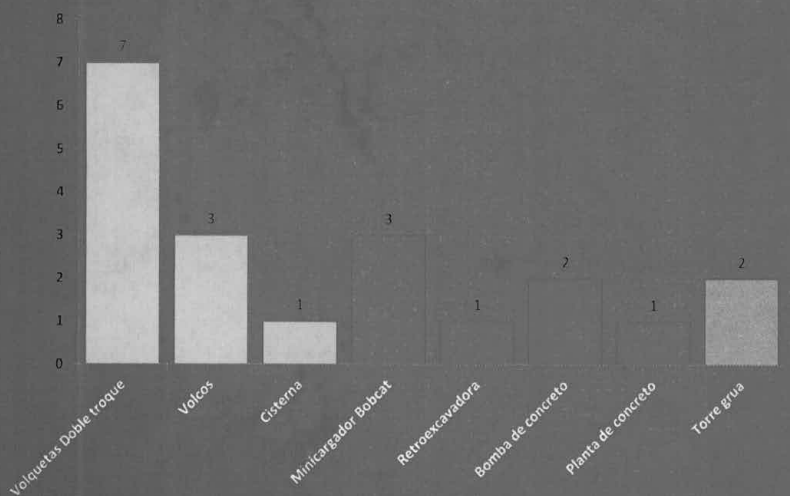

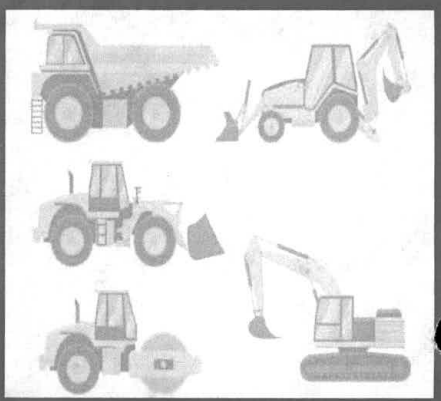

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

BOGOTÁ

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	ABIERTO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	ABIERTOS
TOTAL ACCIDENTES	8	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
TOTAL AUSENTISTAS	56


NOTA: A la semana se presenta 1 accidente laboral, se cuenta con 3 accidentes cerrados y 5 abiertos


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion tabajo en alturas

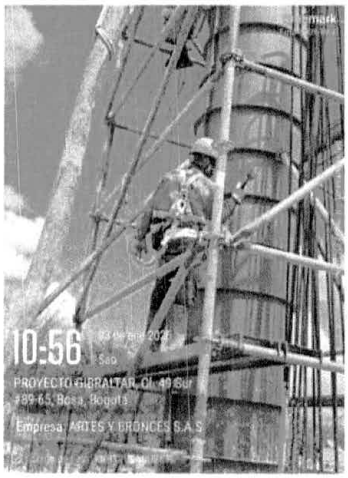

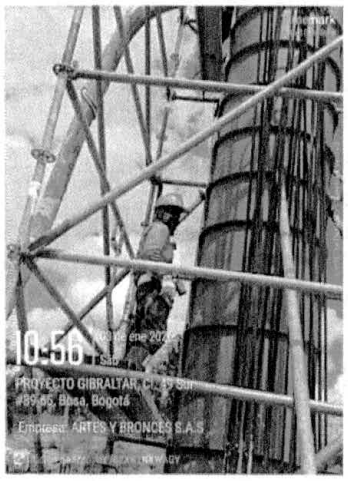

Inspeccion uso de dotacion y EPP




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion de EPP y dotación acorde al manual de identidad

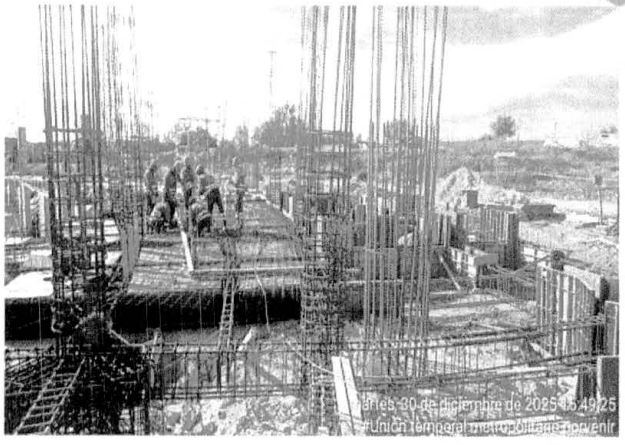




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Charla subcontratistas – Inportancia trabajo seguro en alturas



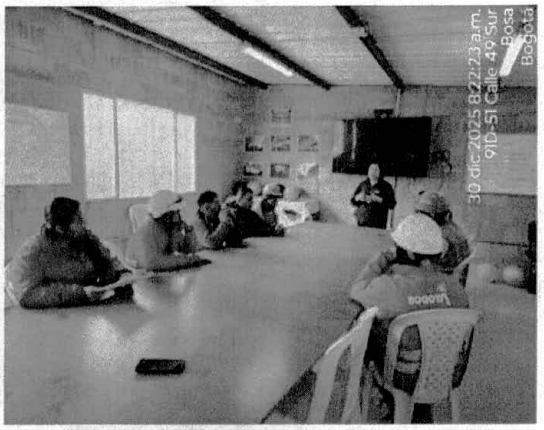



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion Señalizacion interna

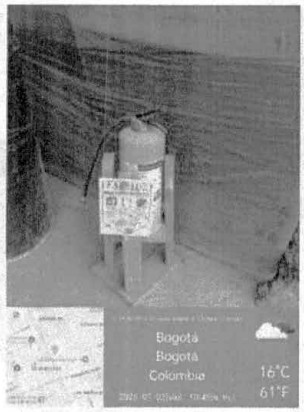

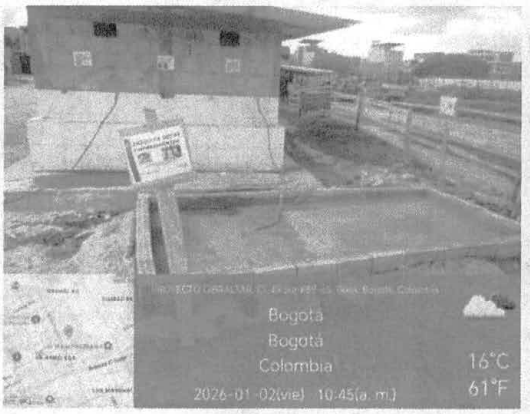

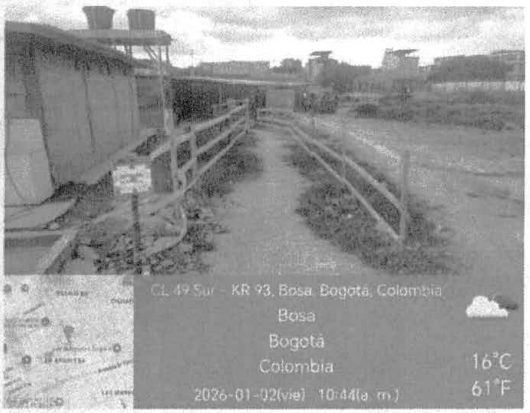

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA


BOGOTÁ

Componente

De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2304,58 m3

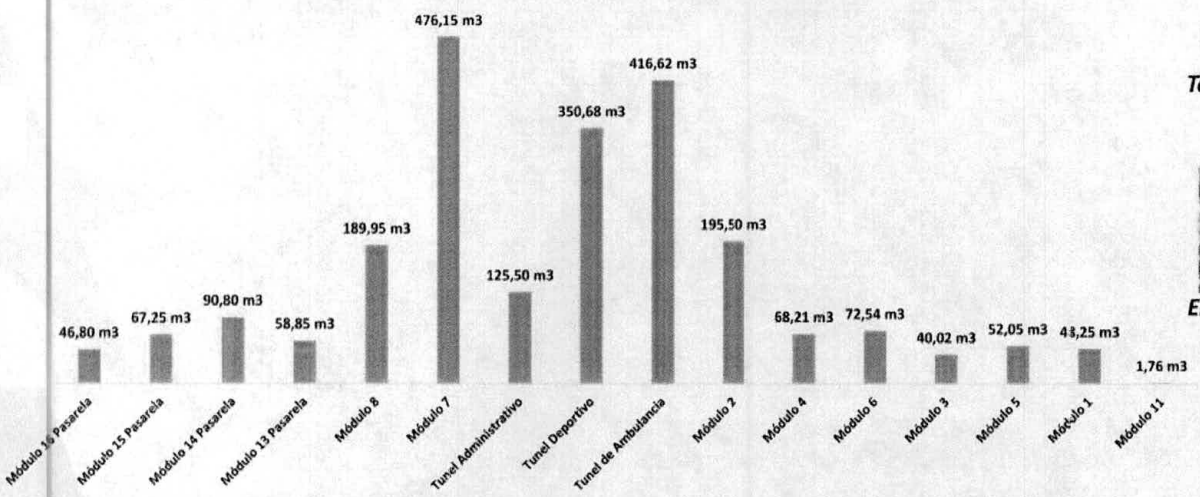

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana
141,75m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673



TOTAL SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DE 2026.

Concreto Estructural: *141,75* m3 **Placa** (Placa Módulo 5 – Tramo 1 y Placa Módulo 6), **Muros** (Túnel Deportivo y Túnel de Ambulancia) **Columnas (**Módulo 1, Módulo 7**,** Módulo 16, Túnel de Ambulancia)


CEMEX **57,00 m3** *40%*

ALTARA **84,75 m3** *60%*

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Control de Aceros allegados al Proyecto

Total **471,06 Ton**

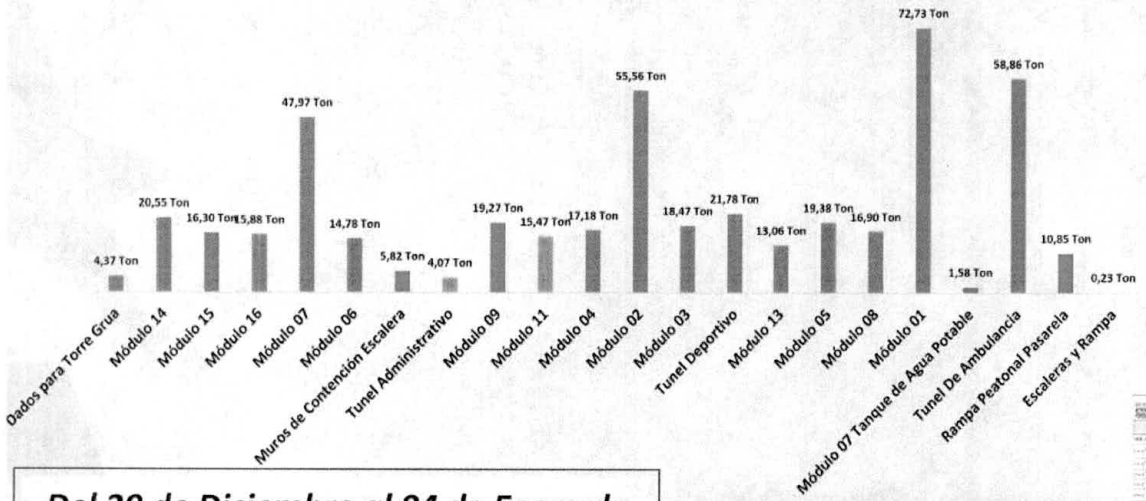

Del 29 de Diciembre al 04 de Enero de 2025

No hubo ingreso de Acero de Refuerzo a obra



BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

BOGOTÁ

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
					Total	21 Unds		**Total**	198,69 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 21 al 28 de Diciembre:

2 Unds para **15,07 Ton**

TOTAL : 198,69 TON.



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderias	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderias Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2036 del 27 de Noviembre de 2025.	Interventoria
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2015 del 13 de Noviembre de 2025.	Interventoria
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0764 del 05 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0685-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0685-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega de modelo visual de Ítems NP adicionales a tramitar – REDES.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*)	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Actualización del BEP remitido al IDRD (**) y estrategia de seguimiento remitido al apoyo supervisión el dia 07/01/2025. En revisión por parte del IDRD.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE


SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


AVANCE GENERAL

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.325,093	2.292,895	27,54 %


Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
25.242,36	5.720,89	22,66 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
20.459,34	4.826,76	23,59 %

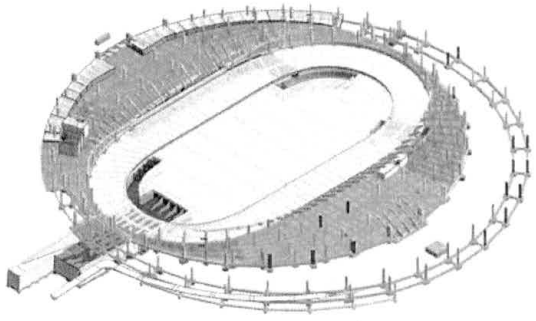

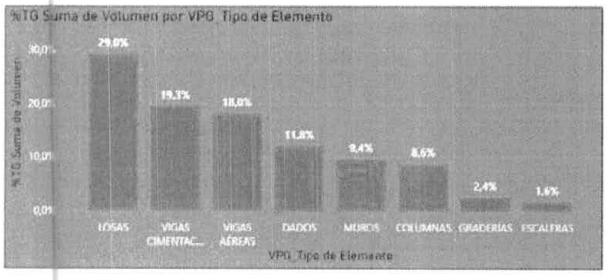









SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	77,937	0,00 % 10,33 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	0,00 % (En blanco) 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	99,72	0,00 % 6,43 % 100,00 %

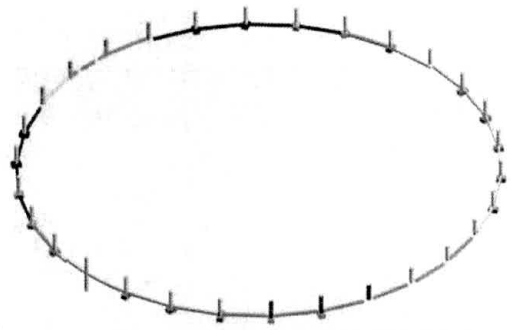

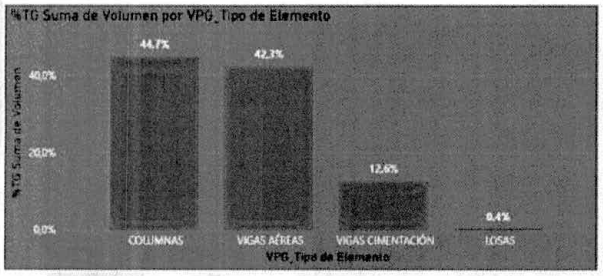


Tipo Elemento
COLUMNAS
LOSAS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
19/12/25
20/12/25
29/12/25
2/01/26

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 5


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
323,012	49,757	0,00 % 15,40 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
836,86	317,60	0,00 % 37,95 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
964,77	12,80	0,00 % 1,33 % 100,00 %



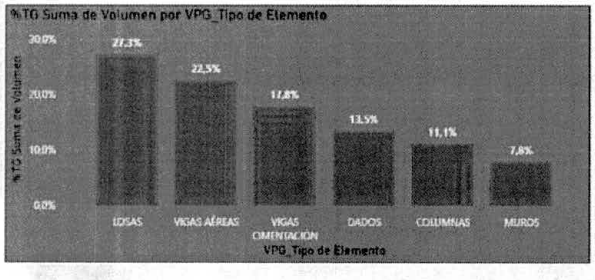

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
9/12/25
13/12/25
16/12/25
24/12/25
30/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 6


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
318,075	39,101	12.29 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
839,01	234,76	27.98 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.055,70	16,90	1.60 %

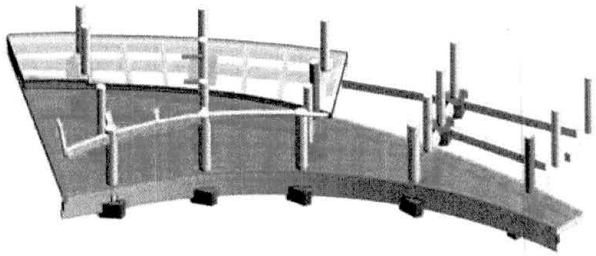

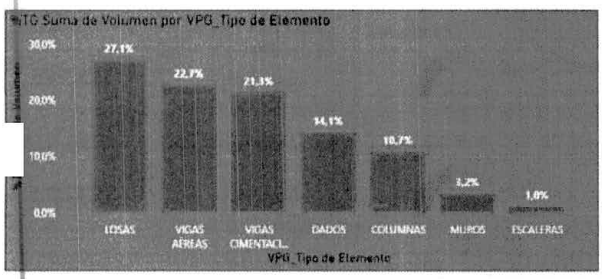

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
22/11/25
24/11/25
29/12/25
31/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	271,736	30.22 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	40.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.488,74	117,82	4.73 %

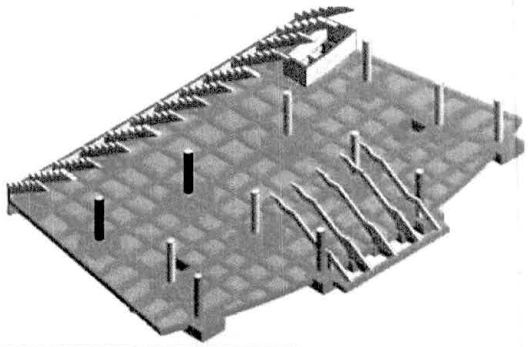

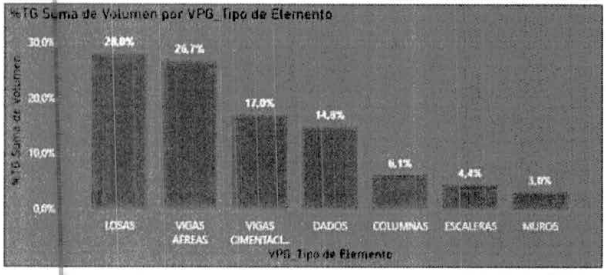

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
20/11/25
22/11/25
25/11/25
26/11/25
10/12/25
12/12/25
15/12/25
18/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 11


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
207,013	3,780	0,00 % 1,83 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
555,25	1,72	0,00 % 0,31 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
617,85	4,19	0,00 % 0,68 % 100,00 %

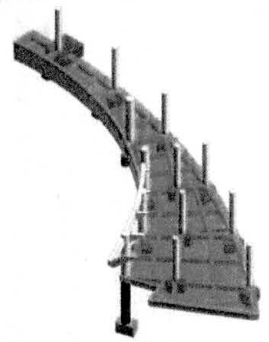

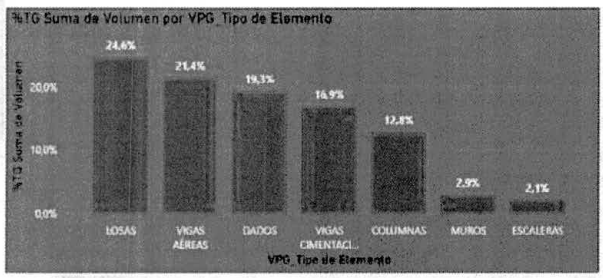


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 24/12/25
☐ 30/12/25

Ubicación
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08
☐ Módulo 09
☐ Módulo 10
■ Módulo 11
☐ Módulo 12 - Pas...
☐ Módulo 13 - Pas...
☐ Módulo 14 - Pas...
☐ Módulo 15 - Pas...

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA

MÓDULO 16 - PASARELA


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
167,936	39,660	0,00 % 23,62 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
425,65	23,12	0,00 % 5,43 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
683,60	268,18	0,00 % 39,23 % 100,00 %



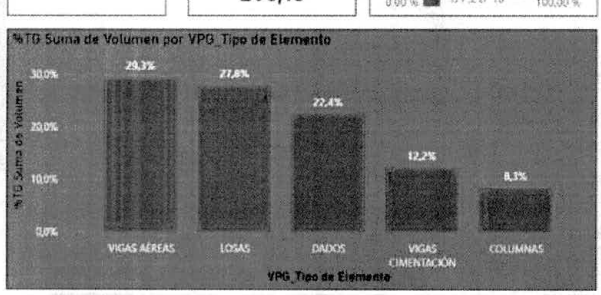

Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 3/10/25
☐ 6/10/25
☐ 29/10/25
☐ 20/11/25
☐ 22/11/25
☐ 31/12/25
☐ 3/01/26

Ubicación
☐ Módulo 10
☐ Módulo 11
☐ Módulo 12 - Pas...
☐ Módulo 13 - Pas...
☐ Módulo 14 - Pas...
☐ Módulo 15 - Pas...
■ Módulo 16 - Pas...
☐ Pista
☐ Rampa Peatonal

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
644,624	427,525	66,32 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.585,58	1.195,32	46,23 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
986,63	753,06	76,33 %

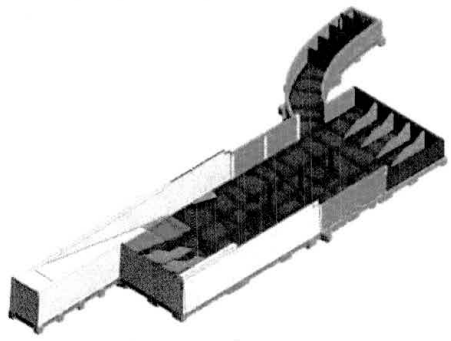

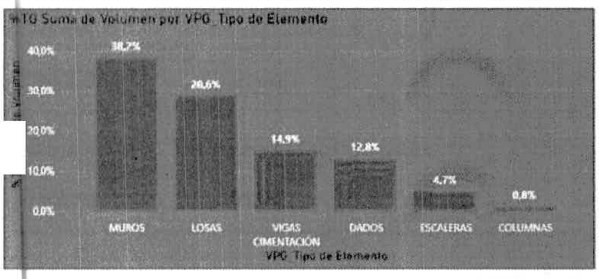

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
RAMPAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
9/10/25
11/10/25
7/11/25
11/11/25
20/11/25
28/11/25
16/12/25
29/12/25

Ubicación
Módulo 15 - Pas...
Módulo 16 - Pas...
Pista
Rampa Peatonal
Torre grúa
Túnel Administra...
Túnel de Ambula...
Túnel Deportivo
Zona Central

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL DEPORTIVO


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
204,328	195,275	95,57 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
799,36	561,06	70,19 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
402,95	391,73	97,22 %

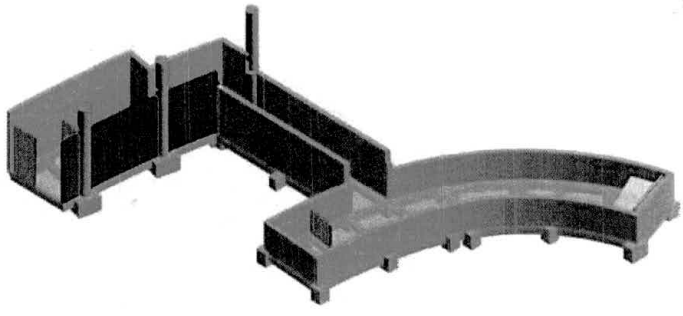

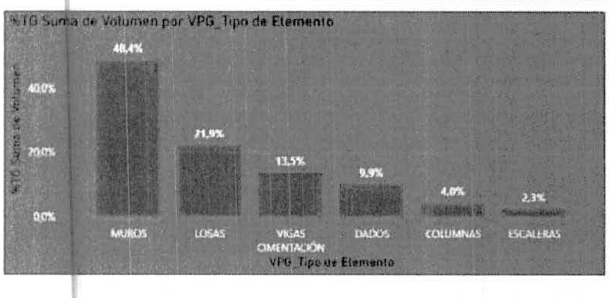

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
RAMPAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
25/10/25
7/11/25
11/11/25
22/11/25
26/11/25
28/11/25
9/12/25
11/12/25

Ubicación
Módulo 15 - Pas...
Módulo 16 - Pas...
Pista
Rampa Peatonal
Torre grúa
Túnel Administra...
Túnel de Ambula...
Túnel Deportivo
Zona Central

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL ADMINISTRATIVO


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
122,414	114,900	93.86 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
429,72	338,04	78.67 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
227,61	214,84	94.39 %

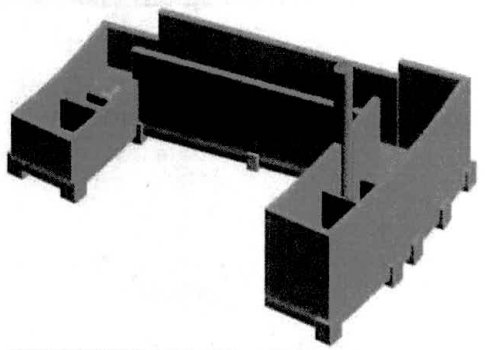

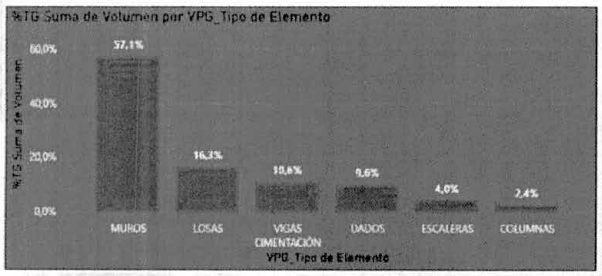

Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 20/10/25
☐ 30/10/25
☐ 31/10/25
☐ 7/11/25
☐ 20/11/25
☐ 26/11/25
☐ 1/12/25
☐ 30/12/25

Ubicación
☐ Módulo 15 - Pas...
☐ Módulo 16 - Pas...
☐ Pista
☐ Rampa Peatonal
☐ Torre grúa
■ Túnel Administra...
☐ Túnel de Ambula...
☐ Túnel Deportivo
☐ Zona Central

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

PROYECCIÓN 11 A 25 DE ENERO DE 2026

BOGOTÁ

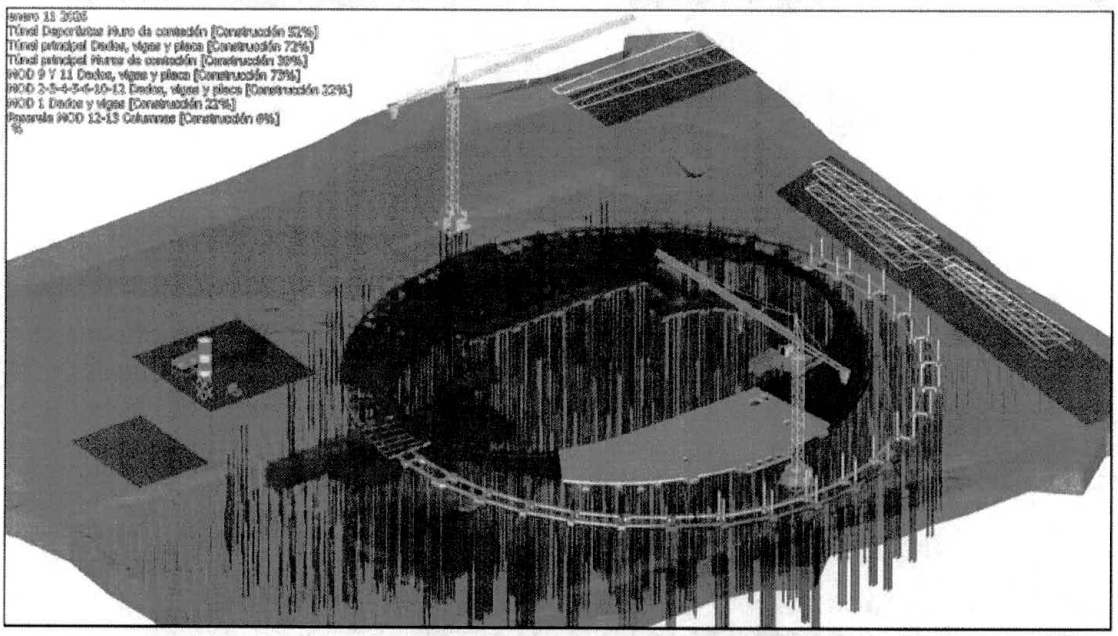


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

EJECUCIÓN 11 A 25 DE ENERO DE 2026

BOGOTÁ

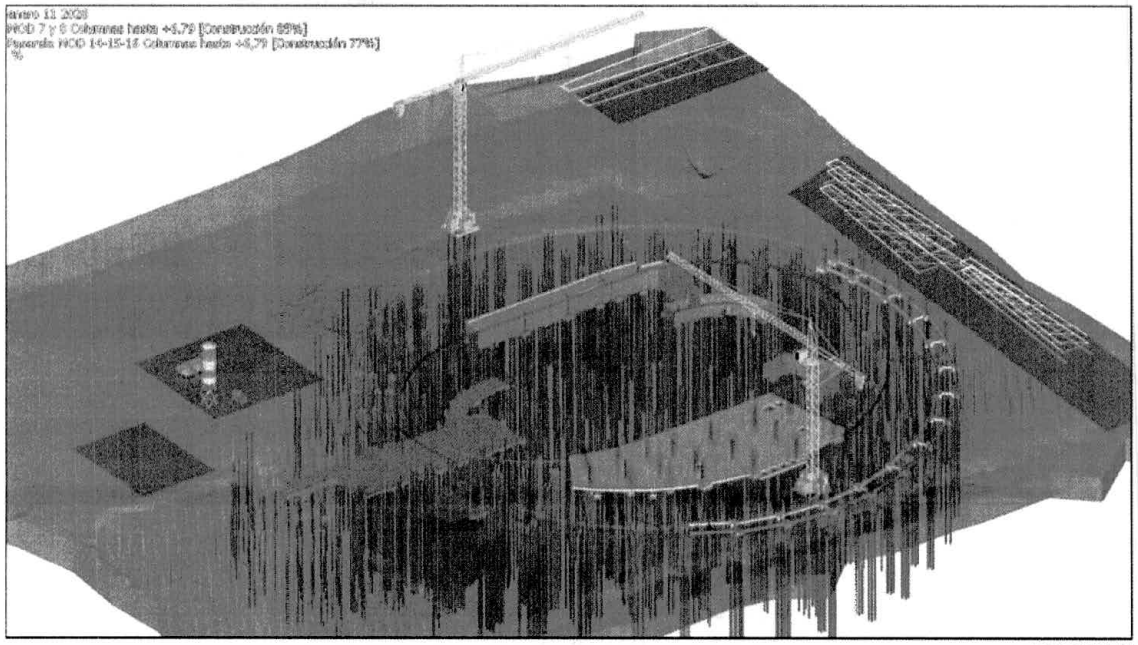

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

DIAGRAMA PROYECCION VS EJECUCIÓN

BOGOTÁ

Tareas | Orígenes de datos | Configurar | Simular

Añadir tarea | Enlazar | Zoom

Nombre	Estado	Inicio planeado	Fin planeado	Inicio real	Finalización real
Túnel Admin Datos, vigas y placa		11/11/2025	23/12/2025	6/11/2025	1/12/2025
Túnel Admin Muro Contención		11/11/2025	23/12/2025	6/11/2025	1/12/2025
Túnel Casa Mitas Datos, vigas y placa		25/11/2025	10/01/2026	4/10/2025	20/11/2025
Túnel Casa Mitas Muro de contención		6/12/2025	12/02/2026	22/11/2025	8/01/2026
Túnel Control Datos, vigas y placa		29/11/2025	27/01/2026	20/11/2025	16/12/2025
Túnel Control Muro de contención		12/12/2025	26/02/2026	10/12/2025	N/D
MOD 7 y 8 Datos, vigas y placa		22/10/2025	22/12/2025	25/10/2025	18/12/2025
MOD 7 y 8 Columnas hasta +8.79		27/01/2026	5/04/2026	15/11/2025	20/01/2026
MOD 7 y 8 Placa +8.79		26/03/2026	5/04/2026	N/D	N/D
MOD 9 - 11 Datos, vigas y placa		26/11/2025	27/01/2026	24/12/2025	N/D
MOD 9 - 11 Columnas hasta +8.79		27/01/2026	5/04/2026	24/12/2025	N/D
MOD 9 - 11 Placa +8.79		26/03/2026	5/04/2026	N/D	N/D
MOD Escaleras 9-10-11 Datos, vigas y placa		18/12/2025	5/04/2026	13/11/2025	N/D
MOD Escaleras 9-10-11 Columnas hasta +8.79		27/01/2026	5/04/2026	19/11/2025	N/D
MOD Escaleras 9-10-11 Placa +8.79		26/03/2026	5/04/2026	N/D	N/D
MOD 14 Datos, vigas		18/12/2025	5/04/2026	25/11/2025	N/D
MOD 14 Columnas y vigas aereas		27/03/2026	5/04/2026	19/12/2025	N/D
Pendiente MOD 14-15-16 Datos y vigas		9/10/2025	19/11/2025	3/10/2025	30/10/2025
Pendiente MOD 14-15-16 Columnas hasta +8.79		19/11/2025	8/01/2026	9/12/2025	20/01/2026
Pendiente MOD 14-15-16 Placa +8.79		25/02/2026	5/04/2026	N/D	N/D
Pendiente MOD 12-13 Datos, vigas		31/10/2025	11/12/2025	20/10/2025	N/D
Pendiente MOD 12-13 Columnas		8/01/2026	25/02/2026	3/12/2025	N/D
Pendiente MOD 12-13 Placa aerea		25/02/2026	5/04/2026	N/D	N/D

Qtr 4, 2025: octubre, noviembre, diciembre
Qtr 1, 2026: enero

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

DIAGRAMA PROYECCION VS EJECUCIÓN


BOGOTÁ

SIMULACIÓN 4D COMPONENTE ESTRUCTURA 11 DE ENERO A 25 DE ENERO DE 2026						
FRENTE DE OBRA	ELEMENTO	FECHA INICIO PROGRAMAD	FECHA FINALIZACIÓN PROGRAMADA	FECHA INICIO REAL	FECHA FINALIZACIÓN REAL	OBSERVACIONES
TÚNEL ADMINISTRATIVO	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	31/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	29/10/2025	Actividad inició 11 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	MUROS DE CONTENCIÓN	13/11/2025	23/12/2025	6/11/2025	1/12/2025	Actividad inició 7 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
TÚNEL DEPORTISTAS	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	25/11/2025	10/01/2026	4/10/2025	20/11/2025	Actividad inició 52 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	MUROS DE CONTENCIÓN	6/12/2025	12/02/2026	22/11/2025	8/01/2026	Actividad inició 14 días antes de lo programado
TÚNEL PRINCIPAL	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	29/11/2025	27/01/2026	20/11/2025	16/12/2025	Actividad inició 9 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	MUROS DE CONTENCIÓN	12/12/2025	26/02/2026	10/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 2 días antes de lo programado
MÓDULOS 7 Y 8	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	22/10/2025	22/12/2025	25/10/2025	18/12/2025	Actividad inició 3 días después de lo programado. YA FINALIZADA
	COLUMNAS HASTA +6,79	27/01/2026	5/04/2026	15/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 73 días antes de lo programado
MÓDULOS 9 Y 11	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	26/11/2025	27/01/2026	24/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 28 días después de lo programado.
MÓDULOS 2-3-4-5-6-10-12	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	18/12/2025	5/04/2026	13/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 35 días antes de lo programado
	COLUMNAS HASTA +6,79	27/01/2026	5/04/2026	19/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 69 días antes de lo programado
MÓDULO 1	DADOS Y VIGAS CIMENTACIÓN	18/12/2025	5/04/2026	25/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 23 días antes de lo programado
	COLUMNAS Y VIGAS AEREAS	27/03/2026	5/04/2026	19/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 98 días antes de lo programado
PASARELA MÓDULOS 14-15-16	DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	9/10/2025	19/11/2025	3/10/2025	30/10/2025	Actividad inició 6 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	COLUMNAS	19/11/2025	8/01/2026	9/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 20 días después de lo programado.
PASARELA MÓDULOS 12-13	DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	31/10/2025	11/12/2025	20/10/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 11 días antes de lo programado
	COLUMNAS	8/01/2026	25/02/2026	3/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 36 días antes de lo programado

Presentado en simulacion de periodos anteriores
Presentado en la simulación del presente periodo

MODELO FEDERADO


BOGOTÁ

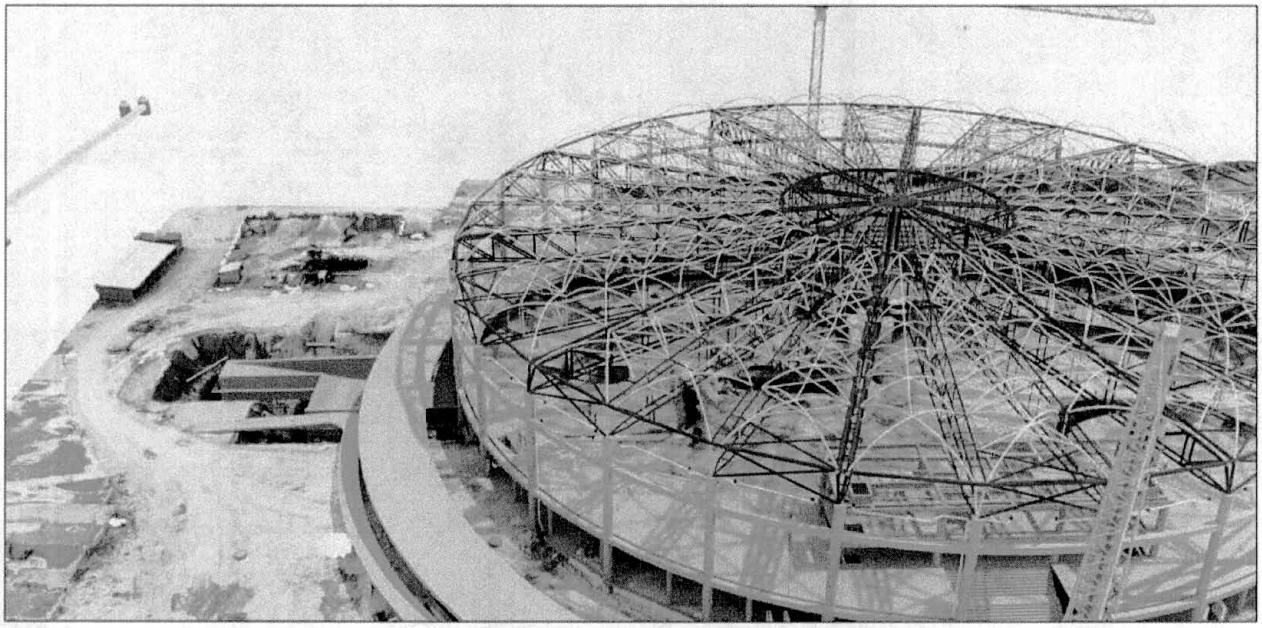

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MODELO FEDERADO

BOGOTÁ

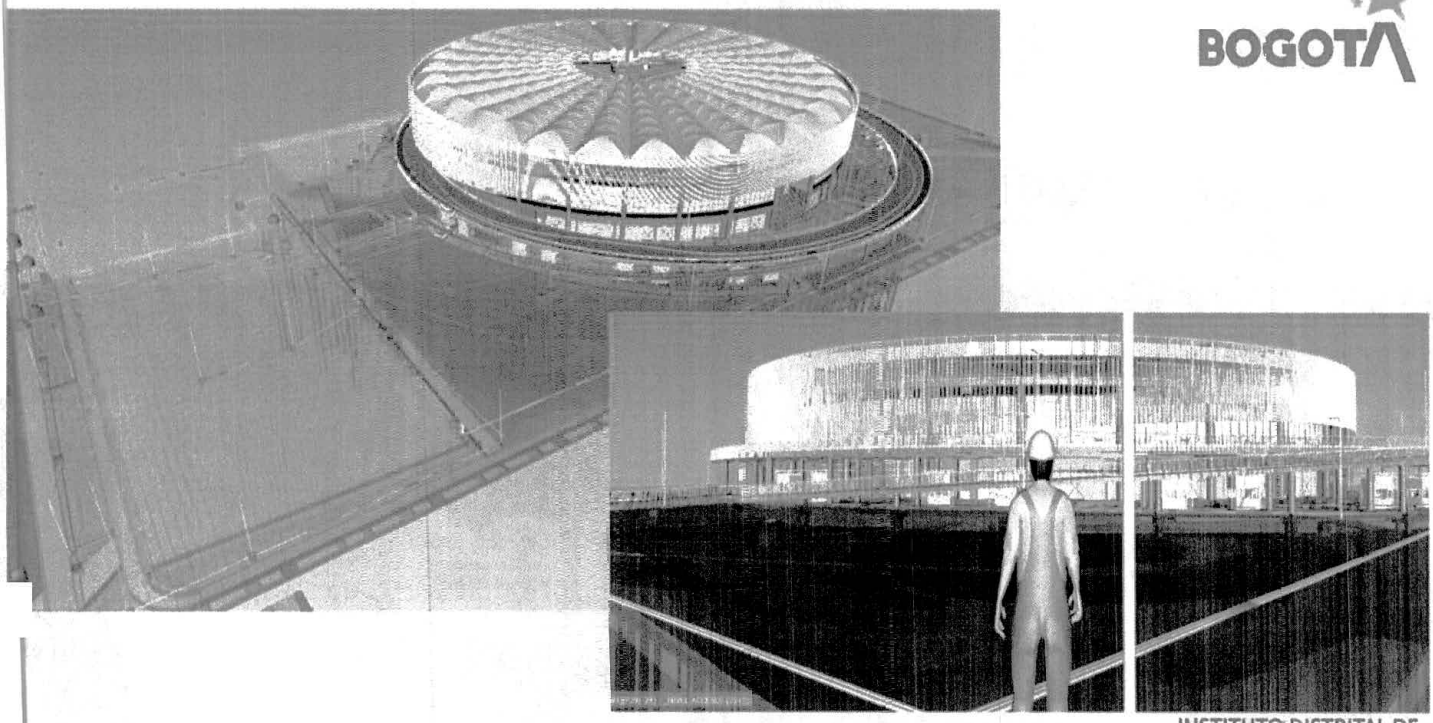

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025	CUMPLIDO
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(*) Pendiente Respuesta IDRD	CIG	19 y 29 /12/2025	PENDIENTE

(*) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 80.517.224.198,06	54,48%
% EJECUCIÓN	$ 76.577.378.932,84	51,82%
% COSTO	$ 76.577.378.932,84	51,82%

AVANCE	-2,66%

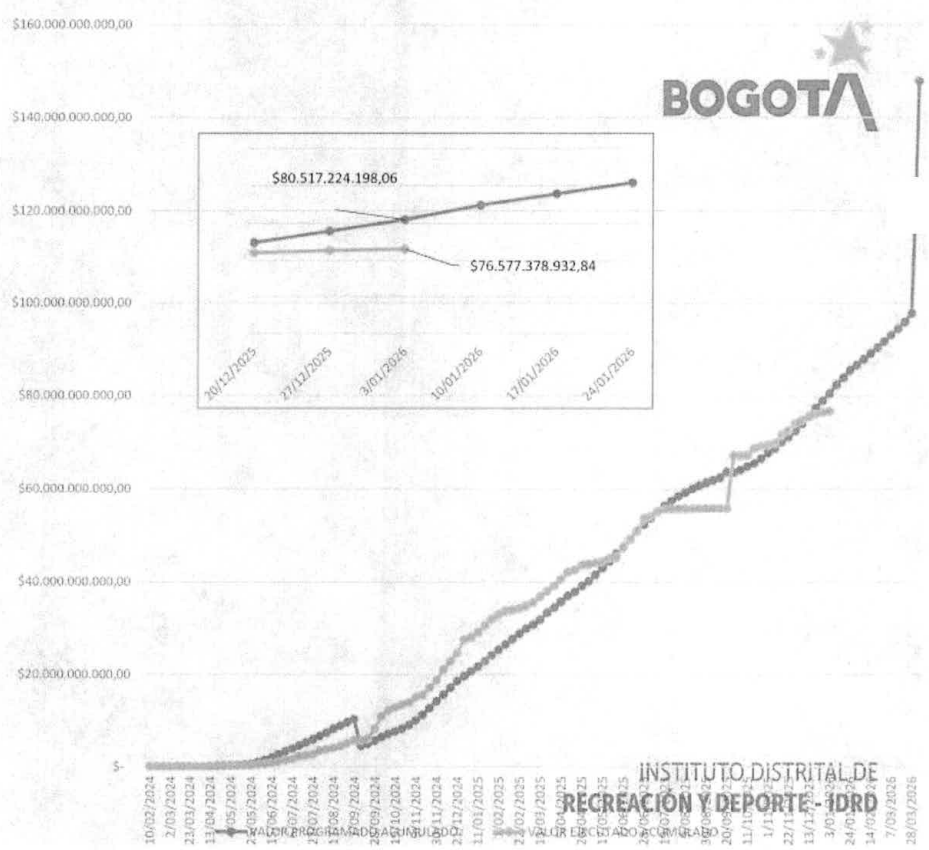

BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

03/01/2026 **programación v3**

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
[illegible] -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
[illegible] -023	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE -024	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO

MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

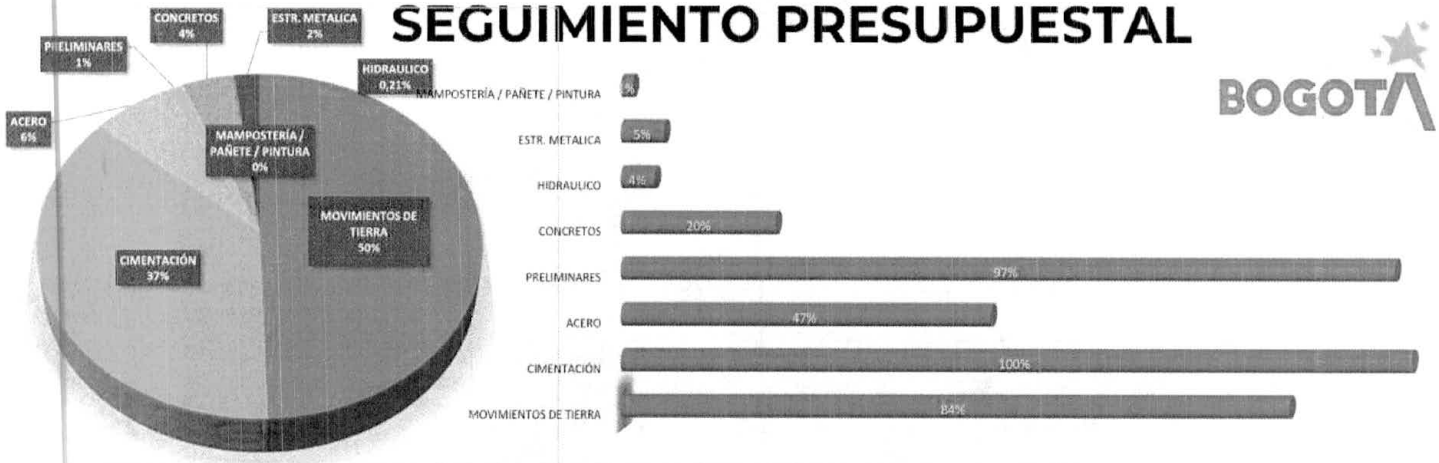

BOGOTÁ

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METALICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	**$ 61.010.761.815,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.868.397.139,00**	**$ 6.285.143.403,00**	**$ 72.523.644.111,00**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 5	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO PARA LOSA DE CONTRAPISO Y/O FUNDACION, FABRICADOS EN POLIETILENO EXPANDIDO CON MATERIAL TIPO ICOPOR, DENSIDAD 8 KG/M3 RECUBIERTO EXTERIORMENTE EN POLIETILENO CAL 3	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE TUBERÍA PVC –S, YEE, SEMICODOS, CODOS, SIFON, SALIDAS SANITARIAS.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7 Y 11, PASARELA	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
MODULO 4 Y 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. INLCUIDO LOS TRASIEGOS.	CONTINUA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

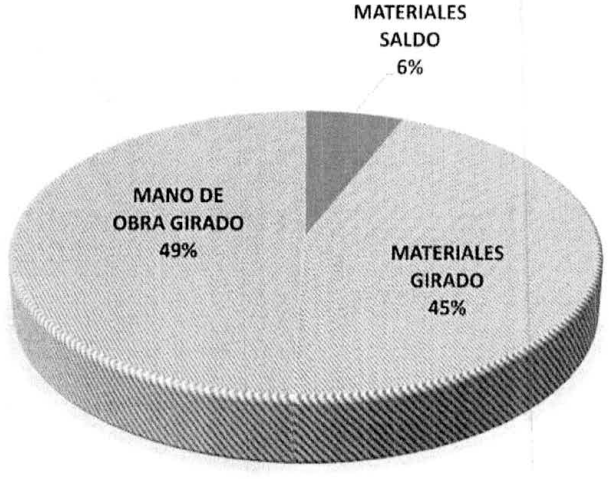

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


BOGOTÁ


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización del 100% - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.

MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA


AVANCE EN CORTE

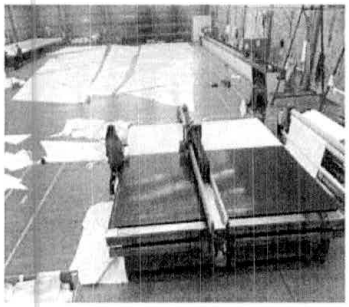


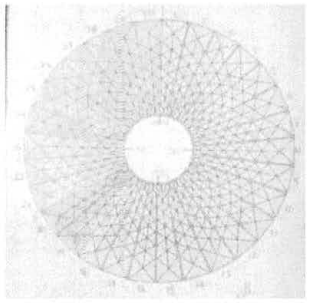


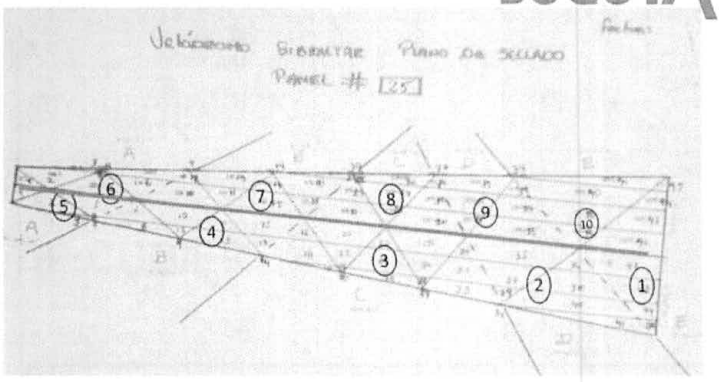

AVANCE EN SELLADO





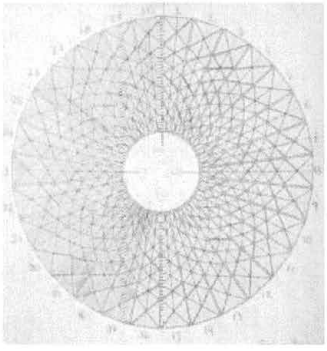

10 SECCIONES POR PANEL

TOTAL NACIONALIZADO: (341,85 m2/Panel) * 30 Paneles = 10.256 m2

AVANCE EN SELLADO (m2): 10.256 m2 = 10.256 m2/ 10.256 m2 = 100%

TOTAL MÓDULOS DE PANEL SELLADAS = 300 Unidades y/o Secciones

TOTAL SECCIONES NACIONALIZADAS A LA FECHA = 100 Unidades y/o Secciones

RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 07 de Diciembre de 2025	6,66 Ton
dic-25	07 de Diciembre al 14 de Diciembre de 2025	1,65 Ton
dic-25	14 de Diciembre al 21 de Diciembre de 2025	2,55 Ton
dic-25	22 de Diciembre al 28 de Diciembre de 2025	5,50 Ton
dic-25	29 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	10,73 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	254,99 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***254,99 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **23,46%**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
					Total	21 Unds		Total	198,69 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 22 al 28 de Diciembre:


2 Unds para **15,07 Ton**


TOTAL : 198,69 TON.



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 13 y 14

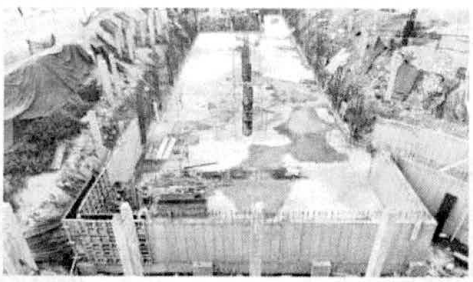

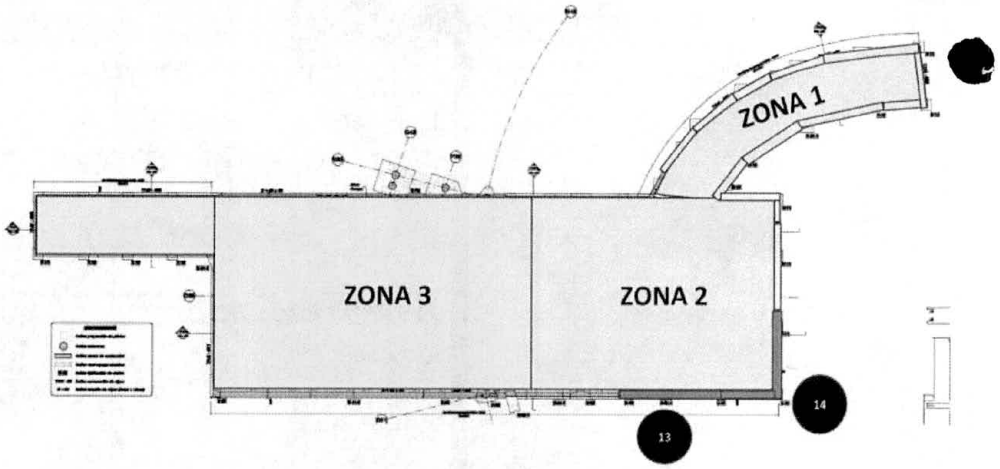

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TUNEL DEPORTIVO – TRAMOS 23 al 27



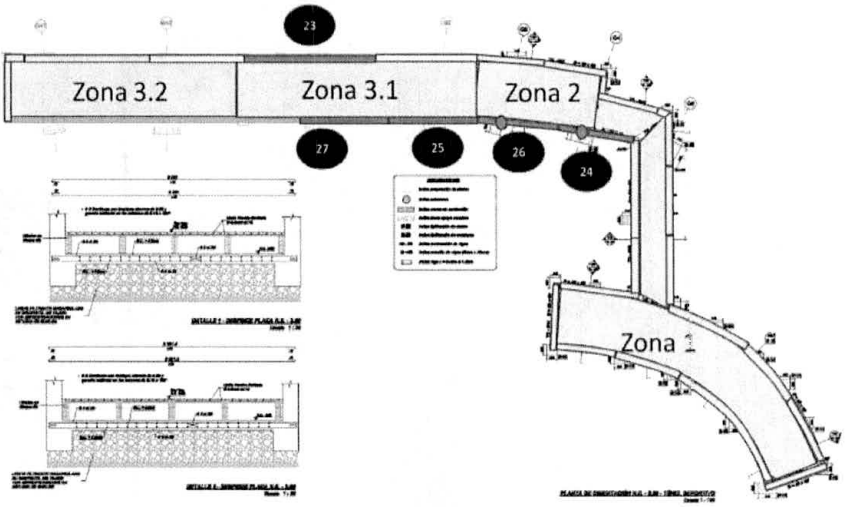



Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE PLACA MÓDULO 5 – TRAMO 1

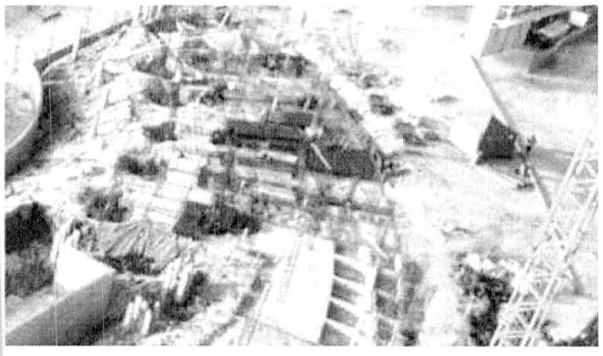

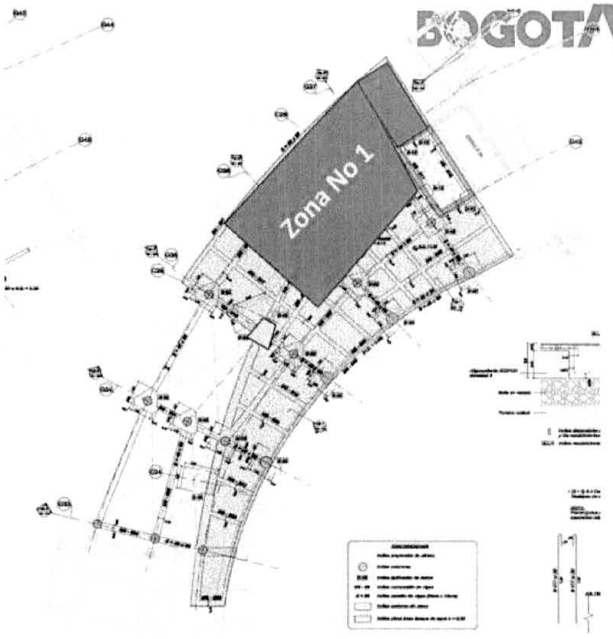


Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE PLACA – MÓDULO 6 – Tramo 1

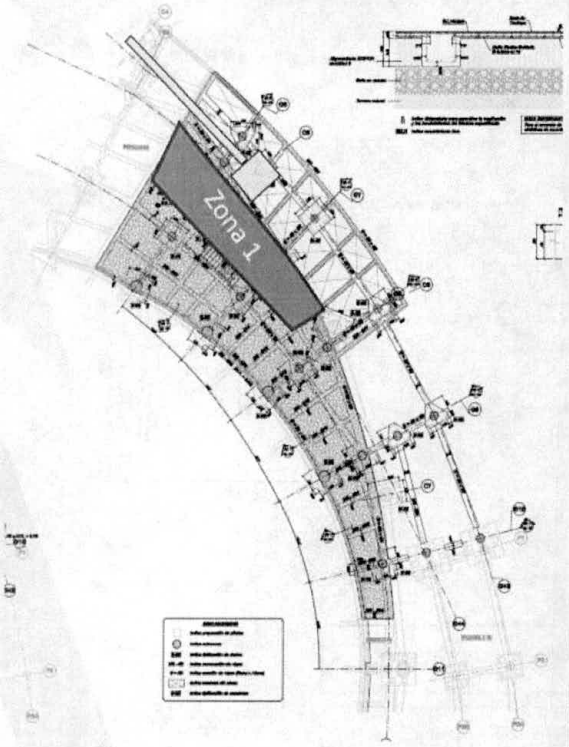

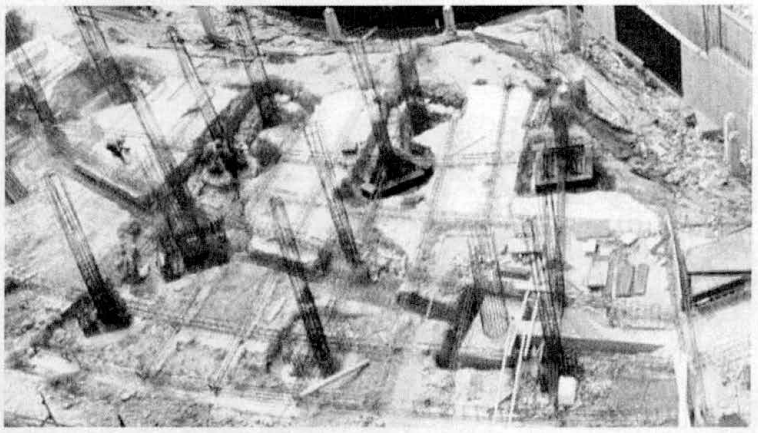

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADO MÓDULO 11 – ZONA DE EDIFICIO



Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

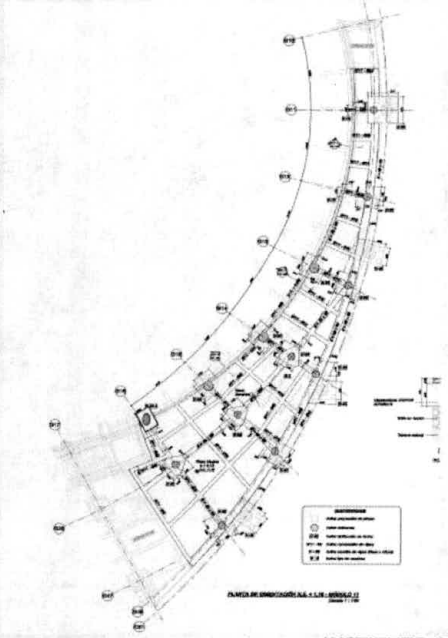


PLANO M11 – E01
PLANTAS ESTRUCTURALES – MÓDULO 11

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 1 – COLUMNAS DE CUBIERTA

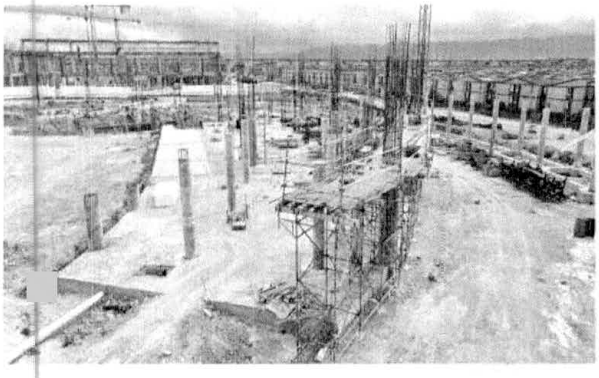

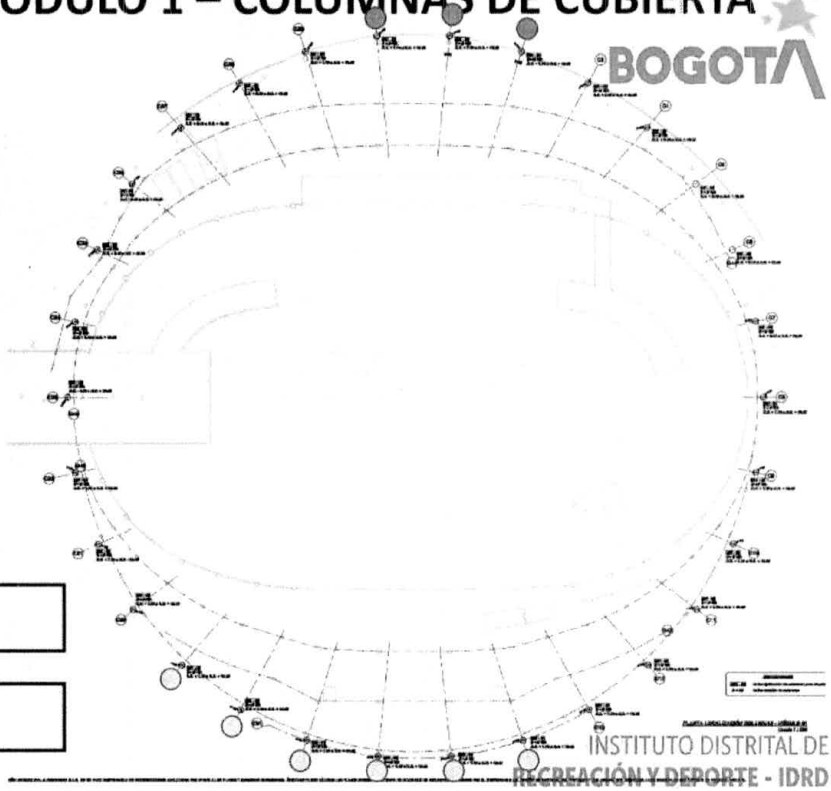



Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

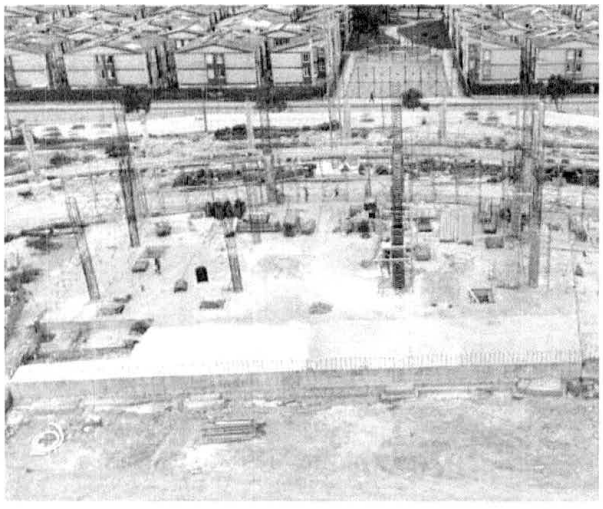

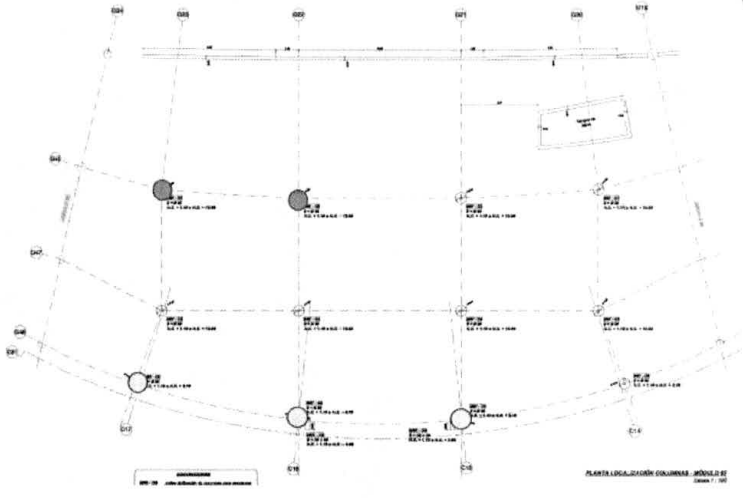

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 16 – ZONA DE PASARELA

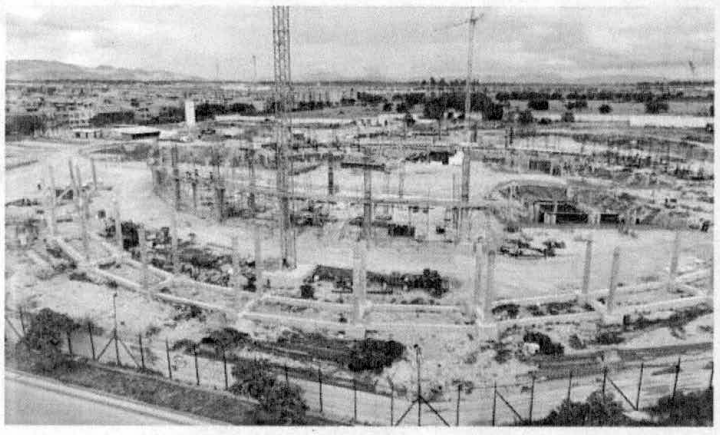

Zona Vaciada en el Periodo


Zona Vaciada Previamente

PLANO M16-E01
PLANTA ESTRUCTURALES MÓDULO 16 -PASARELA

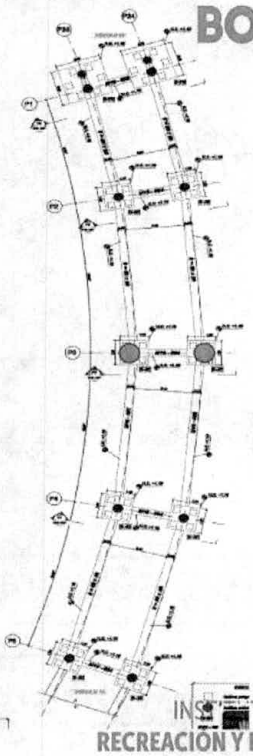

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS TÚNEL DE AMBULANCIA

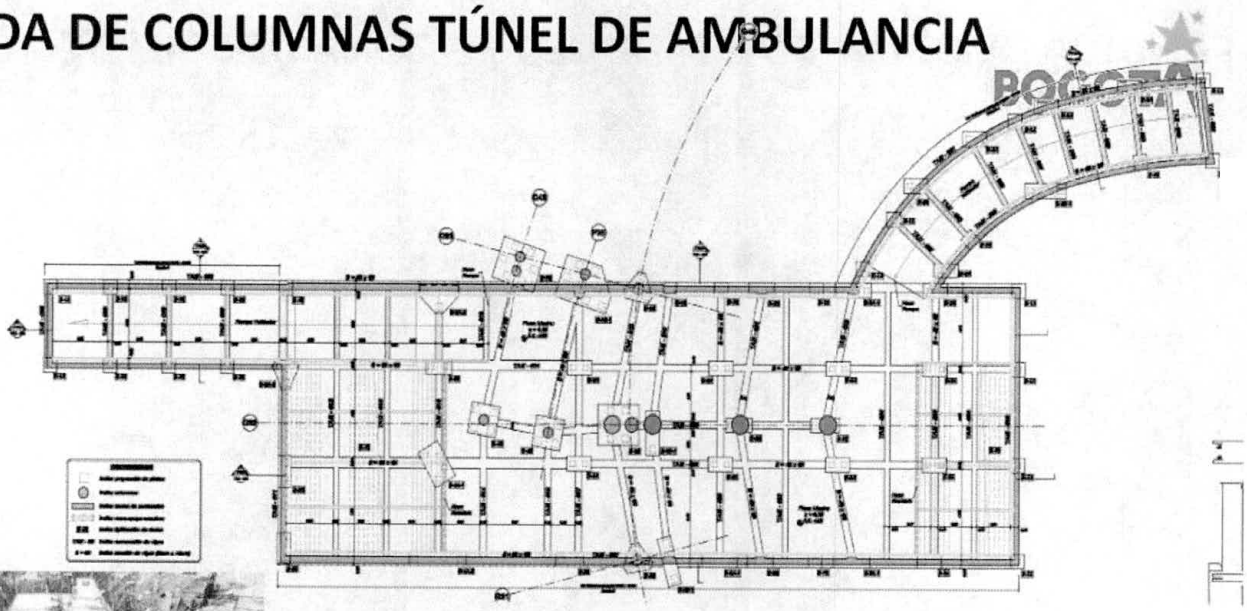




Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL
DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

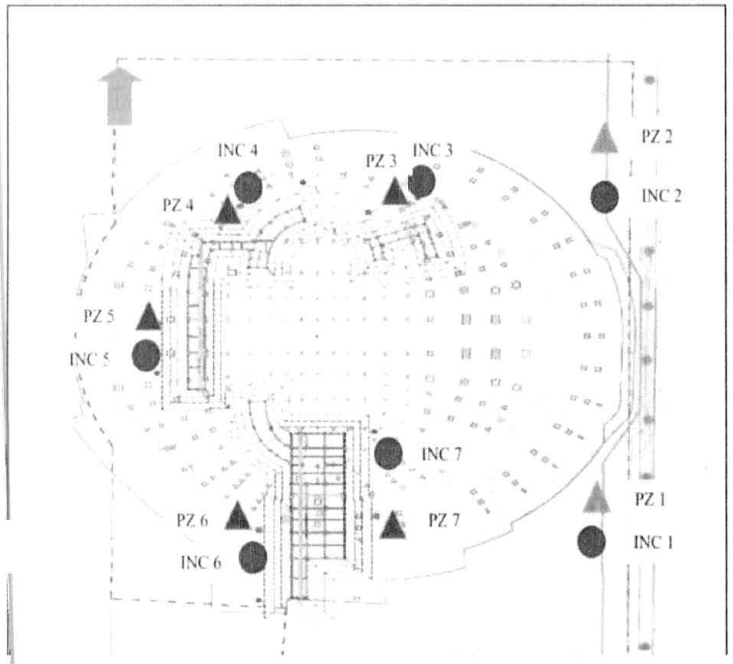

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 15 al 22 de diciembre de 2025; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.17 m y 8.92 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 2 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.28 y 6.12 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Durante la semana del 29 de diciembre al 03 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:



- Se realiza la instalación de tubería de 1-1/14" PVC para el alumbrado exterior en modulo 5.

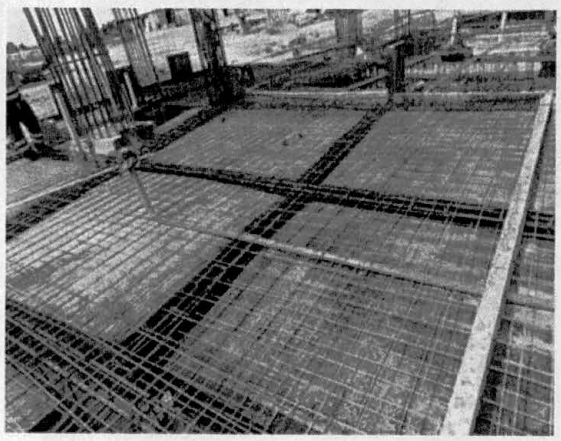



CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Se realiza la instalación del primer tramo de tuberías para la red de media tensión que entran en la subestación con 4 tubos de 6 pulgadas PVC en el modulo 5.

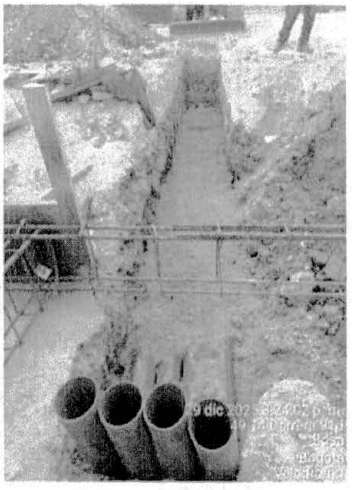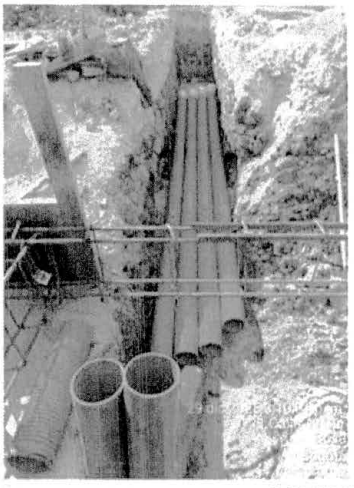




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Se realiza la instalación de tuberías para comunicaciones de la pista en modulo 6.

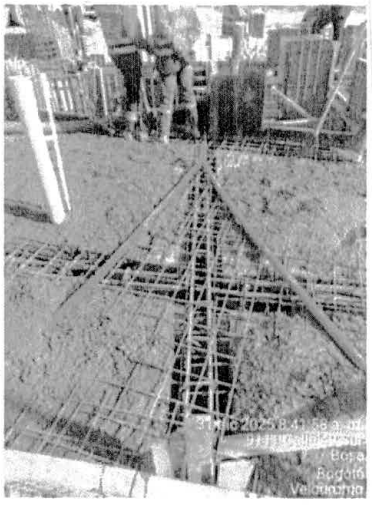



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

Hidrosanitario

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 05/01/2025	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización del 100% - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.


REDES HIDROSANITARIAS

BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se sigue con la instalación del geodrén perimetral del Túnel Administrativo.

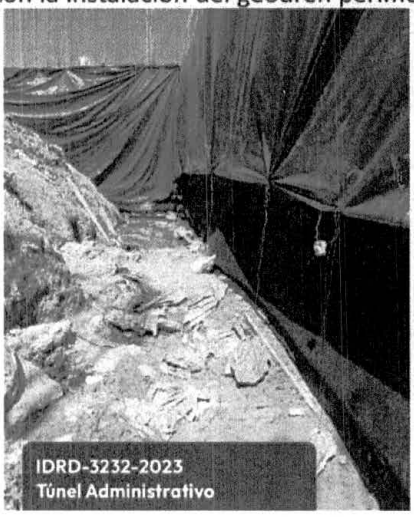

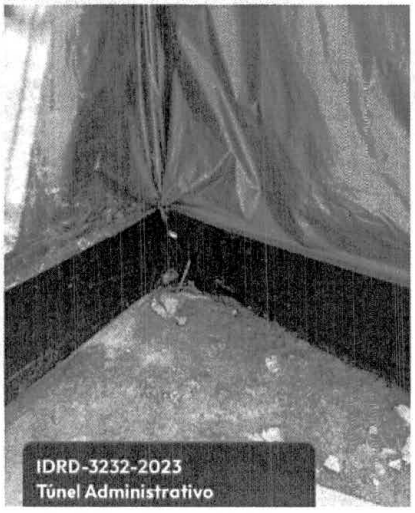

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Velodromo

FECHA: 08/01/2026 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Sara Eulalia Chaparro Gordillo	1057581903	Hidrogeologa	Ambiental		UTMP	sarageology.sg@gmail.com	3204386100
2	Paula Blanco Alarcón	1073383650	Res. Ambiental	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
3	Yammy Lorena Leon G.	53094044.	Insp. sst.	UTMP.		UTMP	sst.velodromo@cyg.com.co	8166203158
4	JOHN HANUART RAMOS PEÑA	80002268	COORDINADOR	UTMP		UTMP	coordinador.bim@cyg.com.co	
5	José M. Galeano V.	80031322	Residente	UTMP		UTMP	estructural.velodromo@cyg.com.	3005102774.
6	Angela M. Sánchez C.	1.020.739.111	Programación	UTMP		UTMP	Programacion.velodromo@cyg.com	3003522693
7	Juan Javier Espinel Silva	1070006933	R. Forestal	UTMP		UTMP	R.Forestal.velodromo@gmail.com	3178778828
8	Claudia Infante Jaimes	68298725	Bióloga	UTMP		UTMP	claudiabravo5@gmail.	3202707471
9	Diego F. Cortes O.	1.110.453.846	Calidad	UTMP		UTMP	Calidad.velodromo@cyg.com	3125179157
10	Jhon James Ofelvan B.	7509142	Hidrogeologo	G.IG		CIG	James.ofelvan@ghvtrans.com	3117717197
11	Andrés Galeano Gonzalez	1022362548	Res Patay Pres	CIG		CIG	presupuestos.interventoria@gmail.com	3192385243
12	Ivonn Pérez Téllez	1026279000	Apoyo Topografia	STC		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	3223578250
13	Oscar Javier Soto Ortega	80761720	Apoyo Hidrosanit	STC		IDRD	Oscar.soto@idrd.gov.co	3003101408
14	Julián Ricardo Agudelo Niño	80767393.	R. Ambiental	Interventoría		CIG	Julianagudelongenieroambiental@gmail.com	3202336372
15	Mayluz Zumiñel Cuaspud	52.444.804	R. Social	Interventoría		CIG	Jaizvelazquez@gmail.com	3182205175
16	Eleana Suaza Garcia	1026267356	Biologa	CIG		CIG	eleana.suaza.biologa@gmail.com	3115049944
17	LINDY RUBIANO MOJANO	1051954740	RES. SST INTE.	CIG.		CIG.	Interventoria.SGSST velodromo@gmail.	3202541891
18	Blanca Rocio Sosa Linares	52996077	Apoyo SST Calidad	STC IDRD		IDRD	blanca.sosa@idrd.gov	3134649125

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.6

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Velodromo

FECHA: 08/01/2026 HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Carmen Lucia Velez Cardenas	65779928	Apoyo S. Social	STC		IDRD	carmen.velez@idrd.gov.co	3204084770
2	Diana Maria Ortiz Dominguez	1014220097	Pos. Social	UTMP		Contratista	Social.velodromo@	3533854
3	EDGAR SOLORZANO PEDRAZA	1922797	Coord. Interv.	C.I.G		C.I.G	coord.cgrvd.2@gmail.co	
4	Rubén D. Crespo. B.	19496690	Dtor Interv.	C.I.G.		C.I.G.	robendcrespo@yahoo.es	3103231119
5	LINA JOHANNA FALLA L.	52.517.090	Ap. Supervision	STC - IDRD		IDRD	lina.falla@idrd.gov.co	3103432772
6	Juan Pablo Villate Diaz.	1014010937	Ap Supervi.	STC - IDRD		IDRD	juan.villate@idrd.gov.co	3197021834
7	Jaime Cañón	80096733	Ap Sup.	STC - IDRD		IDRD		
8	Alfonso Peñaranda Suarez	8823539	Director	UTMP	APS	UTMP	a.penaranda@cyg-com.co	
9	Carlos Ferreira	79151009	Rep. Legal	UTMP		"	"	
10	Jaime Cano	79685757	Rplegal	UTMP		UTMP	jcano@cyg.com.co	
11	Andrei Vega	79882811	Director Tec	UTMP		UTMP	avega@cyg.com.co	3112577823
12	Jaime Oswaldo Sandoval Lagos	1014197632	Apoyo Tec Sup	STC		IDRD		
13	Katherin Amaya Roa	1016026253	Supervisora	STC		IDRD		
14	Francy Liliana Murillo	52968323	Apoy. Tec. Sup.	STC - IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043666765
15	EDWIN ESCOBAR	94497629	Ap Tec	STC - IDRD		IDRD	adrosl3@gmail.com	3116058975
16	Astrid Viviana Rojas C.	52982504	Prof GRD	C16		C16		3157491502
17	Armando Rodriguez Torres	80276813	Residente	CIG		C16	—	—
18	CARLOS FERNANDO GUZMAN SANCHEZ	79617588	Residente	UTMP		UTMP	—	—

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.2

2/3

6

161

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Velodromo

FECHA: 08/01/2026 HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: _____ LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2022

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ivonne Liliana Aguilo Gutierrez	1026301222	Prof Dpcp	STC		IDRD	ivonne.aguilo@idrd.gov.co	3142026
2	Jhon James Ortiguaza B	75091401	Hidrogeologo	CIG		CIG	jamesortiz.presupuestos.intergibraltar@gmail.com	3117977
3	Andrés Gregorio González	1022362548	Res Poto y Proy	CIG		CIC		3102385243
4	Eduard Antonio Corredor	80383913	Residente inst. electricos	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290
5	Samer Arias Sepulveda	79627799	Profesional electrico	CIG		CIG	elecgibraltar@gmail.com	320
6	Andres Felipe Lengua R.	1068002731	Prof Hs-SIG-Pgas	Interventoría		CIG		3106684608
7	Wilber Pierre Sánchez M	1053806239	Prof BIM	Interventoría		CIG	bimvelo@geodiarq.com.co	
8	Arturo Rojas Torres	13873937	Residente	CIG		CIG	interventoria.velodro	3166420036
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

Marca temporal	Nombre	Cedula:	Correo electrónico	Cargo:	Entidad:	Número de teléfono
8/01/2026 8:41:24	LAURA MILENA RAMIRE.	52764737	lauram.ramirez@idrd.gov.co	Contratista	IDRD	3103378617
8/01/2026 8:43:13	JAIRO PARRA REYS	1143829208	jairo.parra@idrd.gov.co	Contratista	IDRD	3052150830

Si no maneja consecutivo	COMITÉ TÉCNICO Y TRANSVERSALES Contrato de OBRA: 3232/23 - Contrato de INTERVENTORIA: 3219/23	DD	MM	AA
ACTA No.93		15	1	2026

LUGAR:	Presencial IDRD	HORA DE INICIO:	8:10 a.m.	HORA FIN:	10:17 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia presencial y Virtual		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los componentes transversales	4.
2. Presentación de los componentes técnicos	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se inicia la sesión del comité. La Interventoría solicita el permiso correspondiente para efectuar la grabación del encuentro, sin que se presenten observaciones u objeciones por parte de los asistentes; en consecuencia, se autoriza y se inicia el registro.

COMITÉ COMPONENTES TRANSVERSALES No 93,1

COMPONENTE SOCIAL: En las Diapositivas 3-4 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado, el Componente Social ejecutó actividades orientadas a la participación ciudadana y a la atención al ciudadano dentro del área de influencia del proyecto. Se realizó la convocatoria al Comité de Participación No. 22, enviada por la firma contratista el 08 de enero de 2026, la cual fue revisada por la Entidad el 09 de enero de 2026, quedando pendiente la atención de las observaciones formuladas.

En materia de atención al ciudadano, se gestionaron 23 PQRS, alcanzando un 100 % de cierre, sin registros de PQRS abiertas ni en trámite. Lo anterior evidencia un desempeño eficiente del componente en la gestión social y en la respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad.

COMPONENTE AMBIENTAL: En las Diapositivas 6-7 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado, el Componente Ambiental desarrolló actividades de gestión, control y mitigación de impactos en las áreas de Edificio E, Pasarela R, Urbanismo U y Parqueadero P, así como en zonas externas asociadas al proyecto. Se ejecutó la capacitación en buenas prácticas ambientales el 09 de enero de 2026 y la capacitación en manejo del vidrio el 19 de diciembre de 2025, dirigidas al personal de obra.

En materia operativa, se realizaron acciones de protección de materiales y de árboles externos, limpieza de cajas de la red pluvial, mantenimiento de sumideros y el retiro de 35 m³ de RCD, garantizando el adecuado manejo ambiental de la obra. Adicionalmente, se efectuó la gestión y retiro de RESPEL, con un avance acumulado del 85,98 %, equivalente a 65.382.299 kg ejecutados de 76.040.380 kg presupuestados. Por zonas, el avance fue del 85,15 % en Edificio E, 100 % en Pasarela R, 87 % en Urbanismo U y 100 % en Parqueadero P.

Finalmente, se alcanzaron indicadores ambientales satisfactorios, con un 99,80 % de aprovechamiento de RCD y una circularidad del 20,02 %, evidenciando el cumplimiento de las metas ambientales establecidas para el proyecto.

Se comenta tambien las conclusiones de la reunion efectuada el dia 14/01/2026 denomidada MANEJO ZONAS VERDES VELÓDROMO en donde se establecieron lineamientos de presentacion de la alternativa definitiva para el manejo de las zonas verdes del velódromo, donde se discutió la propuesta de impermeabilización y las diferentes capas que lo conformaria, esto con el objetivo de presentar propuesta definitiva al la entidad contratante IDRD para tramite ante la autoridad ambiental SDA.

Se comenta también que el contratista cumplió el compromiso de radicar en oficio la información relacionada con el manejo de zonas verdes mediante radicado CE-206-125-2143 del 8 de enero de 2026 y que en marco de este oficio se realizó mesa de trabajo conjunta el dia 14/01/2026 denomidada MANEJO ZONAS VERDES VELÓDROMO en donde se establecieron lineamientos

de presentacion de la alternativa definitiva para el manejo de las zonas verdes del velódromo, donde se discutió la propuesta de impermeabilización y las diferentes capas que lo conformaria, esto con el objetivo de presentar propuesta definitiva al la entidad contratante IDRD para tramite ante la autoridad ambiental SDA. El contratista informa que a más tardar el próximo miércoles 21 de enero radica esta información ante la interventoria para revision pertinente. Compromisos de la reunion:

1. Presentar la propuesta definitiva de sello, en donde se contemplen las medidas para evitar contacto del usuario final con el relleno antrópico, con lixiviados y con gases (Oral, dérmica e inhalatoria).
2. Definir técnicamente si es necesario la instalación de un geotextil entre la capa "Terreno existente" - "Lleno desde terreno existente".
3. Presentación de la propuesta miércoles 21 de enero 2026,

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO: En las Diapositivas 09 al 12 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida así:

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades técnicas orientadas al monitoreo, control y reducción de riesgos ambientales y operativos en diferentes frentes de obra, con énfasis en el manejo de lixiviados, aguas lluvias, control de olores, prevención de incendios y estabilidad física.

Se realizó la evacuación de lixiviados en las zonas excavadas del Túnel Administrativo y Túnel Deportistas, mediante la activación de motobombas y el uso de Catch Tank como sistema de contención temporal. El retiro y disposición final se efectuó mediante carro cisterna, logrando la evacuación de 31.880 kg de lixiviados, bajo inspección permanente de mangueras y geomembranas. Estas acciones se enmarcan en el monitoreo y reducción de los escenarios de riesgo ER07 a ER14.

En cuanto al manejo de aguas lluvias y control hidrogeológico, se ejecutó la limpieza del canal de aguas lluvias en la zona norte, con evacuación del agua acumulada hacia el pozo de achique. Adicionalmente, se activaron motobombas para la evacuación de aguas lluvias del pozo de achique de la zona central, descargando de forma controlada a la alcantarilla. Se realizó la medición del nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra, como parte del seguimiento técnico a los escenarios de riesgo ER07 a ER14.

Para el control de olores y gases, se desarrollaron jornadas preventivas de aplicación de cal en zonas excavadas. Asimismo, se efectuaron 11 jornadas de monitoreo de gases volátiles en frentes de trabajo activos, obteniendo resultados de 0 % LEL de CH_4, evidenciando ausencia de riesgo por atmósferas explosivas. Estas actividades aportan al monitoreo de los riesgos ER08, ER12 y ER13, y a la reducción de ER07, ER09, ER10 y ER14.

En el componente operativo, se realizó la inspección del vehículo carro cisterna, verificando la disponibilidad y condiciones del kit de emergencias y control de derrames, como medida preventiva ante contingencias ambientales.

Finalmente, se ejecutaron acciones de prevención de incendios y estabilidad física, mediante el monitoreo y mantenimiento del cortafuegos en el área de material para reconformación, asociado a los riesgos ER04 y ER16, y el mejoramiento de la protección de taludes con polietileno, complementado con jornadas de orden y aseo en bermas.

Estas actividades evidencian un avance efectivo en la gestión integral del riesgo, garantizando a la fecha condiciones de seguridad, control ambiental y continuidad operativa en la obra.

COMPONENTE SST: En las Diapositivas 34-38 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el periodo comprendido entre el 05 y el 11 de enero de 2026, el proyecto contó con un promedio de 122 trabajadores, distribuidos principalmente en frentes operativos, destacándose 37 ayudantes, 20 oficiales, 25 profesionales y 13 herreros, lo que evidencia una alta concentración de personal expuesto a riesgos propios de actividades de obra civil, especialmente trabajos en campo y en alturas.

En cuanto a maquinaria, equipos y vehículos, se dispuso de un parque operativo variable entre 0 y 8 unidades, garantizando la continuidad de las actividades programadas. Se realizaron controles preventivos enfocados en la verificación de condiciones seguras de operación y cumplimiento de lineamientos del SG-SST.

Respecto a la accidentalidad y ausentismo, entre febrero de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 56 casos de ausentismo, con mayor incidencia en diciembre de 2025 (7 casos). En materia de accidentalidad, se reportaron 8 accidentes de trabajo, de los

cuales 4 se encuentran cerrados —incluyendo el cierre del accidente del trabajador Omar Cruz durante la semana evaluada— y 4 permanecen abiertos, los cuales continúan en proceso de seguimiento hasta su cierre definitivo.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades preventivas e inspecciones SST en los frentes de obra, incluyendo inspecciones de trabajo en alturas, verificación y armado de andamios y escaleras, inspección y entrega de dotación y EPP, instalación de señalización de seguridad, jornada de vacunación al personal y acompañamiento técnico durante la llegada y descargue de estructura metálica.

Como resultado de las inspecciones, se identificaron hallazgos relacionados con anclajes inadecuados del personal, bases de andamios en mal estado y secciones de andamio incompletas, los cuales fueron atendidos mediante acciones correctivas inmediatas, fortaleciendo el control del riesgo y las condiciones de seguridad en obra.

En conjunto, las actividades desarrolladas evidencian un avance efectivo en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con énfasis en la prevención de accidentes, el control de riesgos críticos y la protección integral del personal en los frentes de obra.

Se comenta por parte de la interventoria que la subsanacion delas observaciones del informe de Interventoria No 19 se remitieron al IDRD y se esta a la espera de la lista de chequedo de aprobacion definitiva, los informes 20-21-22 continuan en revision por parte de la entidad y se remitira el Inf. No 23 el dia 16/01/2026 de manera digital segun ultimos lineamientos de la supervision del IDRD.

COMPONENTE DE CALIDAD: En las Diapositivas 39-46 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el periodo comprendido entre el 05 y el 11 de enero de 2026, el proyecto presentó avances significativos en los componentes estructurales y de control de calidad, manteniendo coherencia con la programación y los lineamientos técnicos aprobados.

En el componente de estructura en concreto, se ejecutaron 76,15 m^3 correspondientes a muros de los Túneles Deportivo y de Ambulancia, columnas en los Módulos 1, 2, 3, 5 y 16, y vigas y dados en el Módulo 6, alcanzando un 100 % de avance semanal. El volumen total acumulado de concretos estructurales ejecutados asciende a 2.376,58 m^3, con ensayos y controles realizados conforme a las normas NTC 396 y NTC 673.

En cuanto al acero de refuerzo, el proyecto registra un acumulado de 471,06 toneladas. Durante la semana evaluada no se presentó ingreso de nuevo material, manteniéndose el control documental y de trazabilidad del acero previamente allegado.

El componente de estructura metálica de cubierta reportó el ingreso de 1 elemento equivalente a 9,99 toneladas, alcanzando un acumulado total de 208,68 toneladas (24 unidades) suministradas, correspondientes principalmente a cerchas principales y elementos especiales del domo principal. Se adelantaron actividades de inspección en obra y control de conformidad con planos aprobados.

Respecto al control de cambios y rediseños, la mayoría de los componentes estructurales, arquitectónicos y técnicos del velódromo se encuentran aprobados mediante oficios del IDRD, incluyendo módulos, graderías, pasarelas, túneles, cubierta, sistemas eléctricos, RCI, HVAC, comunicaciones y CCTV. Permanecen pendientes algunos frentes específicos como pozos eyectores, pasarela de mantenimiento, estructura de fachada, sistema de gas, paisajismo (SUDS) y componente bioclimático.

Finalmente, desde el componente de calidad, se destaca la aprobación del Informe de Calidad No. 23 y la radicación de la quinta entrega del Dossier de Calidad de la Estructura Metálica de Cubierta, consolidando el seguimiento técnico, la trazabilidad y el cumplimiento normativo del proyecto.

COMITÉ TÉCNICO No 93,2

COMPONENTE BIM: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 03 del informe semanal UTMP.

1) Entrega de modelo visual de Ítems NP adicionales a tramitar – REDES. PENDIENTE teniendo en cuenta que irian en el modificatorio No 3, esto tambien teniendo en cuenta cambios de parametrizacion con el area de presupuestos. la interventoria manifiesta que es necesario para tener alarmas 8en caso tal) en el seguimiento en la ejecucion de este componente en la obra en ejecucion.
2) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*) PENDIENTE la UTMP comenta que se ha venido actualizando parametrizando con los elementos hidro sanitario y se actualiza segun propuesta VANTI.

3) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo. se esntregara la Version 1 de la planimetria en el proximo comité 22/01/2026. PENDIENTE
4)Entrega de simulación 4D a 28 de febrero de 2026 – Estructura Velódromo. CUMPLIDO

En las Diapositivas 39-46 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado, el Componente BIM adelantó actividades de seguimiento y control del avance estructural en la totalidad del proyecto, incluyendo los Módulos 1, 2, 3, 7 y 16 (Pasarela), así como el Túnel Principal y el Túnel Deportivo. El control se realizó mediante la identificación del ejecutado del período, el avance acumulado de períodos anteriores, el avance proyectado y las actividades en ejecución, garantizando la trazabilidad entre la planeación y la ejecución de obra.

Adicionalmente, se efectuó el seguimiento a los pagos de insumos estructurales, asociados a las Actas de Fijación No. 18 (octubre de 2025) y No. 19 (noviembre de 2025), asegurando la coherencia entre el avance físico modelado y la gestión administrativa del proyecto. Como parte de la planificación y coordinación, se desarrolló la simulación 4D de la estructura con proyección a 28 de febrero de 2026 y se avanzó en la coordinación de obra y diseños mediante el modelo 3D de la membrana de cubierta, fortaleciendo la integración técnica entre diseño y ejecución.

COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 22.

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. PENDIENTE se avanza en la subsanación respectiva por parte de la UTMP. Se desarrollará mesa de trabajo CIG-UTMP 15/018/2026.
2) Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. CUMPLIDO se hace remisión del borrador a la entidad contratante IDRD se complementara remision a parte juridica y se espera respuesta respectiva del IDRD.
3) Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026) Pendiente Respuesta IDRD, esto se tendra una vez se ejecute visita el dia 16/01/2025 al subcontratista de la membrana por parte del IDRD-CIG-UTMP.
Se comenta por parte de la Supervision que se deben definir el tema de lao NPs y ajustar con el alcance REAL segun proposiciones del modificatoria, se recuerda la finalizacion del contrato es el proximo 05/04/2026.

Se presenta desde la diapositiva No 18 hasta la No 24, las actividades tecnicas presupuestales desarrolladas y que son la base de las cantidades mostradas durante la reunion.

El avance programado acumulado es del 55,77% ($82,421,632,554,54), mientras que el avance ejecutado real alcanza el 52,01% ($76,862,514,844,3), evidenciando un rezago del -3,76% respecto a la programación. El costo incurrido coincide con la ejecución, sin desviaciones presupuestales relevantes.

Por parte de la UTMP se aclara que la programacion empieza a presentar atrasos constantes teniendo en cuenta que se requieren reestablecer tiempo perdidos/pasados del contrato generados por los modificatorios suscritos y sustentados en debida forma y se tendra ajuste respectivo cuando sea firmado el proximo modificatorio.

La facturación acumulada del proyecto asciende a $72.600.786.011, equivalente al 49,13% del valor contractual vigente. Durante 2025 se facturaron $45.226.667.670, concentrándose los mayores valores entre abril y junio, con disminuciones marcadas en agosto y septiembre.

Desde el punto de vista presupuestal, la mayor ejecución acumulada se concentra en el capítulo de movimientos de tierra, con un avance del 84 %, seguido por cimentación, que registra un 100 % de ejecución, evidenciando que estos frentes se encuentran prácticamente concluidos y han jalonado el avance financiero del proyecto.

En contraste, se identifican rezagos relevantes en otros capítulos estructurales y de acabados, particularmente en acero de refuerzo, con un 47 % de avance, concretos estructurales, con apenas 20 %, y estructura metálica, cuyo avance presupuestal alcanza solo el 5 %. Adicionalmente, los capítulos de acabados (mampostería, pañete y pintura) presentan un avance marginal del 1 %, mientras que los sistemas hidráulicos registran un 4 %.

Esta distribución explica la variación negativa del avance general del proyecto (-3,76 %), toda vez que los capítulos con menor nivel de ejecución corresponden a actividades de alto impacto en la curva S y en la consolidación del valor ejecutado frente a lo programado.

En cuanto a la ejecución en obra, se mantienen frentes activos en los túneles de apoyo, administrativo y principal, así como en el Módulo 5, donde se desarrollan de manera continua actividades estructurales en concreto y obras de redes (hidráulicas y eléctricas), conforme a la programación vigente.

Adicionalmente, se dio inicio a la construcción de columnas estructurales en los Módulos 7 y 11 – Pasarela, lo cual representa la apertura de nuevos frentes productivos y contribuye a la ampliación del ritmo de ejecución física del proyecto, en coherencia con la planificación técnica y presupuestal establecida.

Respecto al anticipo, se ha girado el 94% ($35.535.169.187,51), con una amortización acumulada de $21.048.849.991 y un saldo pendiente por amortizar de $18.797.643.991, coherente con el nivel actual de avance financiero, esto correspondiente a la pista, la supervision indaga sobre el contrato con el constructor de pista , subcontratista TEAM SHARK, la UTMP manifiesta que se esta cerrando negociacion en los proximos dias teniendo en cuenta impedimentos personales por parte del RL del subcontraista.

COMPONENTE TÉCNICO: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 26

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. PENDIENTE, se remitirá por parte de la Interventoria documentos al respecto.
2) Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. PENDIENTE la UTMP revisa los documentos y se dará la respuesta respectiva. PENDIENTE.
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. Se espera respuesta por parte del IDRD a reconocimiento planteado segun radicados No Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral) PENDIENTE se tendrá visita UTMP-CIG-IDRD el dia 16/01/2026,
4) Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar. PENDIENTE. se tendrá visita UTMP-CIG-IDRD el dia 16/01/2026,
5) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD. PENDIENTE.

La supervision solicita que se entregue la informacion de acuerdo a lo solicitado por parte de la respuesta dada por el DADEP y se da lectura las observaciones dadas durante el comité.

La UTMP reporta los avances de confección de la membrana para la cubierta, (Diapositiva No 27 a la 29), así:

Total material a a Nacionalizar 10,256 m2 equivalente a 100% equivalente a 30 paneles en 300 unidades y/o secciones

La membrana arquitectónica de cubierta para canales y faldones contempla un área total de 12.452,43 m², distribuida en varios componentes: los paneles de membrana principal alcanzan 10.230,00 m², a los que se suman 412,08 m² correspondientes a sellos entre patrones y 547,02 m² asociados a faldones perimetrales; los canales comprenden 1.054,80 m² de membrana modelo y 104,18 m² en sellos a la membrana principal; finalmente, los faldones a viga canal aportan 89,70 m² de membrana modelo y 14,65 m² en sellos, conformando en conjunto el total de área requerida para la cobertura arquitectónica del proyecto.

En cuanto al tema de estructura metálica de la cubierta, a la fecha a Obra se ha suministrado un total de 208,68 Toneladas segun el cronograma de recibo suministrado por el subcontratista EMECON Próxima entrega del 12 al 17 de Enero 2026 de 84 Ton. Pendiente llegada a obra de 233,32 Toneladas (Oct-Nov-Dic 2025 y Ene-2026) adicional se informa que en planta hay **912,42 Ton** equivalentes al **83,93%**, en producción **266,32 Ton**, el total proyectado es: **1087 Ton**, su porcentaje de avance es: **24,5%.** (diapositiva 27 al 29)

Dentro de las actividades ejecutadas en la semana, se informa que la estructura metálica de cubierta con secciones de cercha principal acopiada en obra corresponde a **208,68 Toneladas** (Diapositiva 30)

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	30-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-2	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA					**Total**	24 Unds		**Total**	208,68 Ton

Durante el periodo evaluado se registraron avances significativos en el componente de estructura en concreto, con frentes activos en túneles y módulos estructurales del proyecto. En el Túnel Deportivo, se completó la finalización de muros en los tramos 28 al

en túneles y módulos estructurales del proyecto. En el Túnel Deportivo, se completó la finalización de muros en los tramos 26 al 31, abarcando las zonas 1, 2, 3.1 y 3.2, logrando el cierre del frente estructural en este sector. De igual forma, en el Túnel de Ambulancia se ejecutó la fundida de muros en las zonas 15, 16 y 17, complementando las áreas previamente vaciadas y consolidando el avance del sistema estructural del túnel.

En los Módulos 1 y 6, se adelantó la fundida de dados y vigas de fundación, garantizando la continuidad de la cimentación y habilitando los frentes para la ejecución de elementos verticales. Adicionalmente, se ejecutó la fundida de columnas estructurales en el Módulo 16 (zona de pasarela) y en el Módulo 1 (columnas de cubierta), fortaleciendo la estructura portante para los sistemas superiores.

En los Módulos 2 y 3 (zona de edificio) se continuó con la fundida de columnas, integrando los vaciados del periodo con los previamente ejecutados y evidenciando un avance progresivo del sistema estructural. Finalmente, en el Módulo 5 se realizó la fundida de la placa de fundación – Tramo 1, completando el tramo programado y permitiendo la continuidad de las actividades estructurales subsiguientes.

En conjunto, las actividades ejecutadas reflejan un avance ordenado y coherente del componente técnico, con cierre de frentes críticos en túneles y consolidación de la cimentación y elementos verticales en los módulos estructurales del proyecto.

En el tema de los informes de instrumentación se leen las conclusiones a la fecha (Diapositiva 39-46):

✓ Durante el periodo comprendido desde el 22 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026, los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable, con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.
✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.19 m y 8.88 m.
✓ Los piezómetros tipo Casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 10 cm; las columnas de agua se encuentran entre 4.30 y 6.22 m de profundidad.
✓ Es importante proteger toda la instrumentación instalada para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE ELÉCTRICO: No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 45-48)

Durante la semana del 05 al 10 de enero de 2026, en el área del túnel principal del Velódromo, se ejecutaron actividades de coordinación y ajuste técnico para definir el paso de 17 tuberías IMC de 4 pulgadas, incluyendo la corrección de la ubicación de las cajas de paso conforme al modelo revisado. Se estableció el traspaso de las tuberías a través de los muros de los túneles garantizando la hermeticidad de los pases, y se adicionaron dos cajas metálicas para asegurar una transición técnicamente correcta entre tubería IMC y PVC. Finalmente, se verificaron las alturas, alineación y llegada de las tuberías al muro de concreto, validando su correcta implantación conforme a los criterios constructivos del proyecto.

COMPONENTE HIDRÁULICO: No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 47)

1) Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025. PENDIENTE.
2) Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD PENDIENTE.
3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio el dia de hoy 15/01/2025.

En el frente correspondiente a los túneles del proyecto, se finalizó la instalación del geodrén perimetral en el Túnel Administrativo, asegurando la adecuada captación y evacuación de aguas subterráneas alrededor de la estructura. De manera complementaria, se iniciaron las actividades preliminares para la instalación del tecdrén en este mismo túnel, avanzando en la conformación del sistema de drenaje longitudinal. Adicionalmente, se dio inicio a las actividades preliminares para la instalación del geodrén en el Túnel de Apoyo, dejando preparado el frente de obra para la ejecución del drenaje perimetral proyectado.

TEMAS ADICIONALES

Se comenta por parte de la supervision que se tiene reunion/recorrido por parte del Sub Director Técnico de Recreacion y Deportes del IDRD y parte de su equipo para visita de las dos obras Velodromo - CAR.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Respuesta al formato registro de proveedores No 7 (Rad. IDRD No 20252100514222 del 18/11/2025)	IDRD	Sin fecha
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (propuesta) Pendiente según evaluacion de alternativa propuesta.	UTMP	10/12/2025
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.	UTMP	26/08/2025
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. Pendiente respuesta UTMP.	UTMP	31/12/2025
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de revision del IDRD.	UTMP	22/11/2025
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral) Pendiente Respuesta IDRD	IDRD	19/12/2025
Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP	25/12/2025
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 15/01/2025	IDRD-EAAB	Sin fecha
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. pendiente respuesta y/o tramite respectivo IDRD	CIG-IDRD-UTMP	23/12/2025
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO.	UTMP	26/12/2025
Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD, Visita Castro Rojas 16/01/2026..	UTMP	2/12/2025
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	IDRD	Sin fecha
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	**SI** [X]	**NO** [ ]
Observaciones		

Siendo las _10:16 a.m.__ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N.A	N.A
NOMBRE	ARQ. RUBÉN DARÍO CRESPO BOTERO	NOMBRE	N.A	N.A
CARGO	DIDECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ING. Arturo Rojas Torres - residente de Interventoria



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega de modelo visual de Ítems NP adicionales a tramitar – REDES.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*)	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Entrega de simulación 4D a 28 de febrero de 2026 – Estructura Velódromo	UTMP - CIG	15/01/2026	PENDIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


AVANCE GENERAL

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
3.325,093	2.396,110	28,78 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
25.242,36	5.785,21	22,92 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
20.459,34	5.006,03	24,47 %

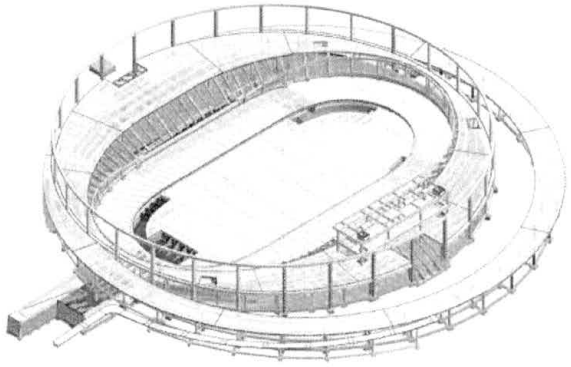

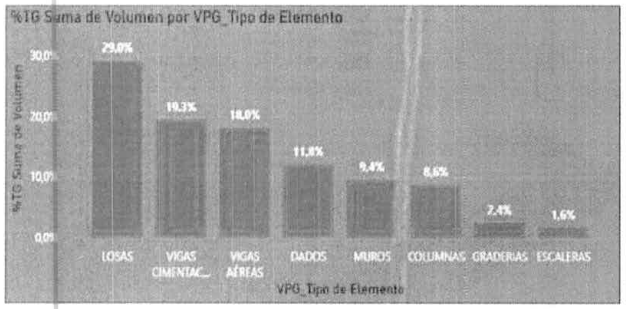



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	132,396	0,00 % 17,55 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	0,00 % (En blanco) 100,00 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	169,42	0,00 % 10,92 % 100,00 %

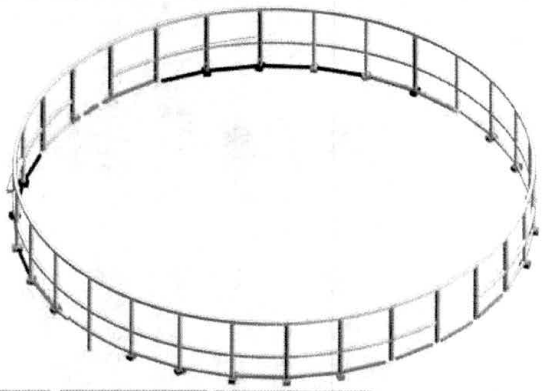

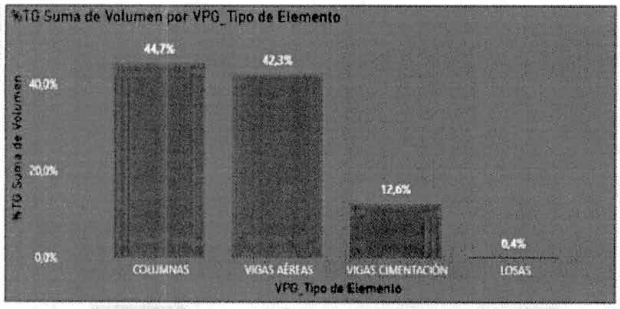

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ LOSAS	☐ 19/12/25	■ Módulo 01
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 20/12/25	☐ Módulo 02
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 22/12/25	☐ Módulo 03
	☐ 23/12/25	☐ Módulo 04
	☐ 29/12/25	☐ Módulo 05
	☐ 2/01/26	☐ Módulo 06
	☐ 6/01/26	☐ Módulo 07
		☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 2


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
842,755	332,331	0,00 % 39,43 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.919,30	1.342,23	0,00 % 45,98 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.846,24	244,30	0,00 % 13,23 % 100,00 %

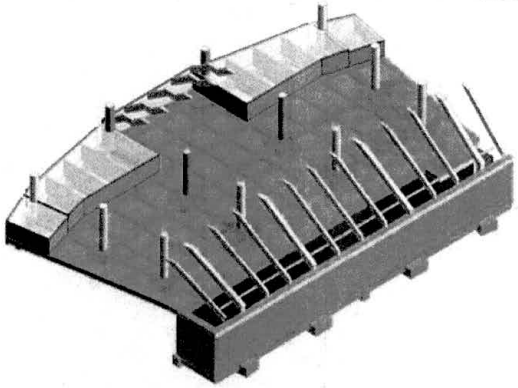

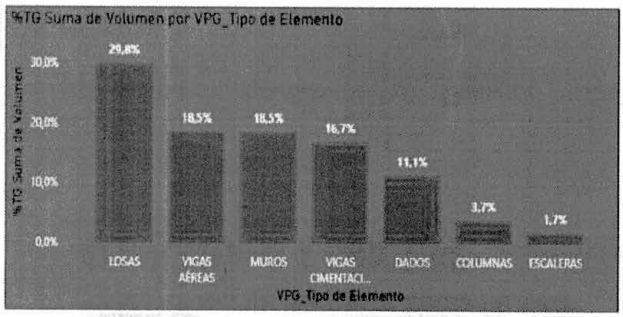

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ DADOS	☐ 9/01/25	☐ Módulo 01
☐ ESCALERAS	☐ 11/11/25	■ Módulo 02
☐ LOSAS	☐ 13/11/25	☐ Módulo 03
☐ MUROS	☐ 20/11/25	☐ Módulo 04
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 26/11/25	☐ Módulo 05
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 28/11/25	☐ Módulo 06
	☐ 5/12/25	☐ Módulo 07
	☐ 6/12/25	☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 3


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
350,452	22,519	0.00 % 6.43 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
1.104,12	14,84	0.00 % 1.34 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.008,76	35,80	0.00 % 3.55 % 100.00 %

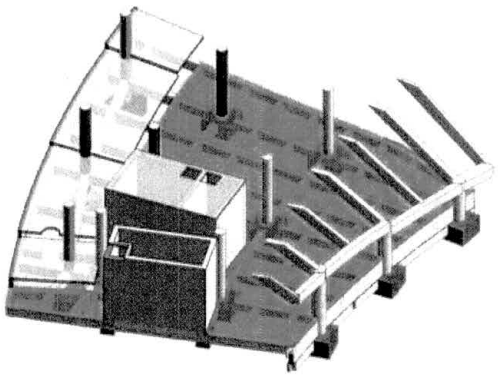

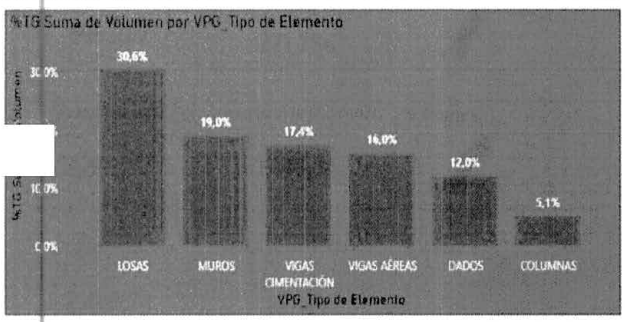


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 5/12/25
☐ 6/12/25
☐ 13/12/25
☐ 7/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
■ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
☐ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	271,736	0.00 % 30.22 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	0.00 % 40.00 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.488,74	117,82	0.00 % 4.73 % 100.00 %

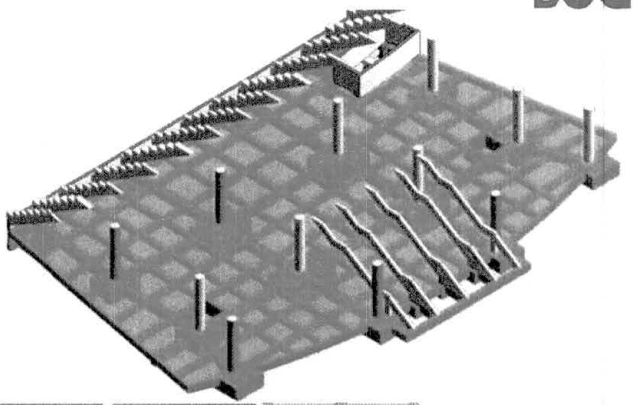

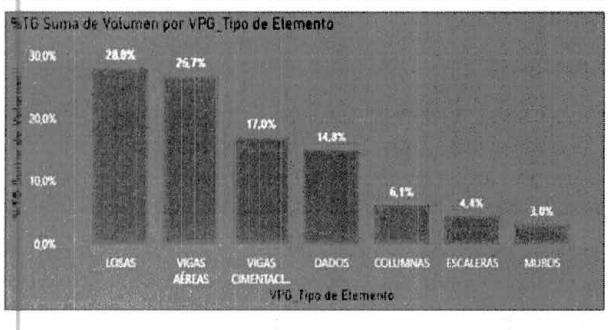


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 20/11/25
☐ 22/11/25
☐ 25/11/25
☐ 26/11/25
☐ 10/12/25
☐ 12/12/25
☐ 15/12/25
☐ 18/12/25

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
☐ Módulo 06
■ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 16 - PASARELA


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
167,936	42,466	0,00 % 25,29 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
425,65	23,12	0,00 % 5,43 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
683,60	278,38	0,00 % 40,72 % 100,00 %

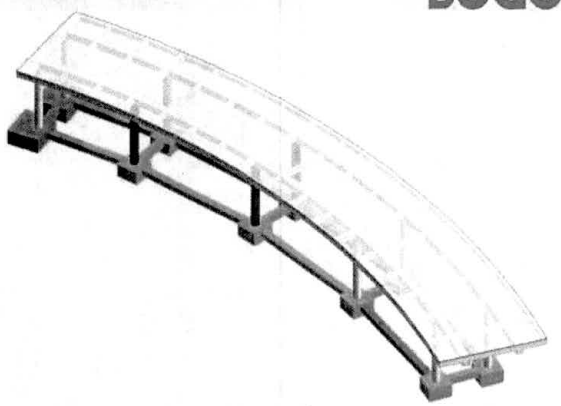

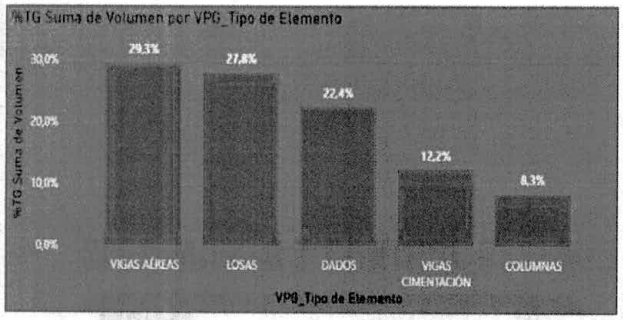


Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- LOSAS
- VIGAS AÉREAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 3/10/25
- 6/10/25
- 29/10/25
- 20/11/25
- 22/11/25
- 27/12/25
- 31/12/25
- 3/01/26

Ubicación
- Módulo 10
- Módulo 11
- Módulo 12 - Pas...
- Módulo 13 - Pas...
- Módulo 14 - Pas...
- Módulo 15 - Pas...
- Módulo 16 - Pas...
- Pista
- Rampa Peatonal

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
644,624	444,946	0,00 % 69,02 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.585,58	1.252,39	0,00 % 48,44 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
986,63	770,46	0,00 % 78,09 % 100,00 %

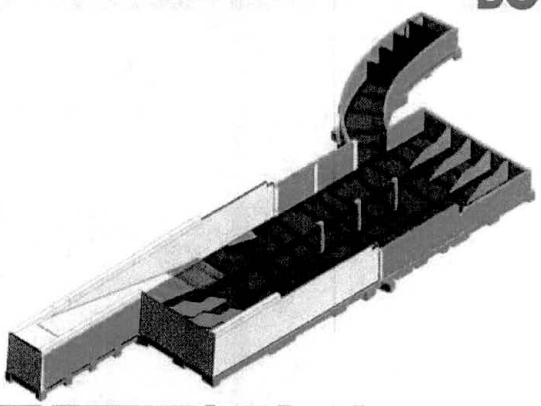

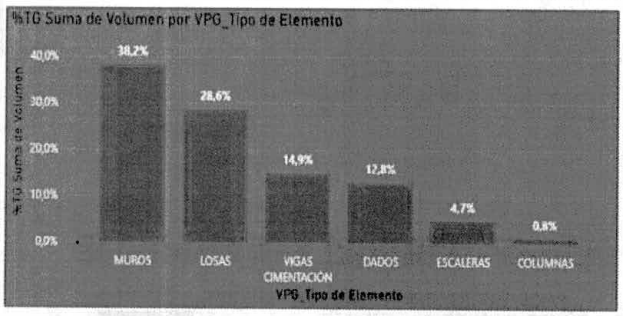


Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- ESCALERAS
- LOSAS
- MUROS
- RAMPAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 9/10/25
- 11/10/25
- 7/11/25
- 11/11/25
- 20/11/25
- 28/11/25
- 12/12/25
- 16/12/25

Ubicación
- Módulo 14 - Pas...
- Módulo 15 - Pas...
- Módulo 16 - Pas...
- Pista
- Rampa Peatonal
- Torre grúa
- Túnel Administra...
- Túnel de Ambula...
- Túnel Deportivo

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL DEPORTIVO


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
204,328	195,670	95.76 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
799,36	561,17	70.20 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
402,95	391,73	97.22 %

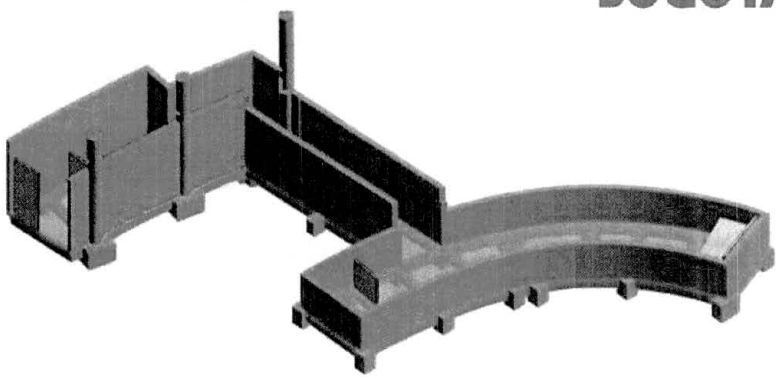

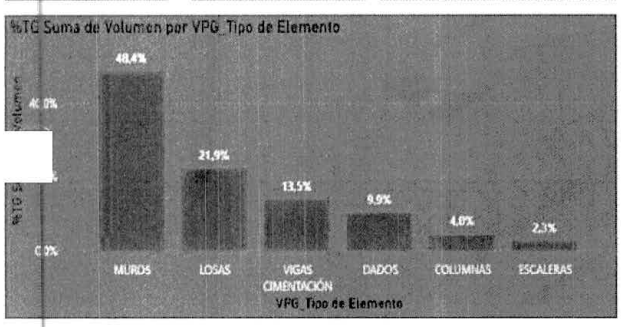


Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
RAMPAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
25/10/25
7/11/25
11/11/25
22/11/25
26/11/25
28/11/25
9/12/25
11/12/25

Ubicación
Módulo 14 - Pas...
Módulo 15 - Pas...
Módulo 16 - Pas...
Pista
Rampa Peatonal
Torre grúa
Túnel Administra...
Túnel de Ambula...
Túnel Deportivo

ACUMULADO PERICDOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – PAGO DE INSUMOS ESTRUCTURA

ACTA DE FIJACIÓN 18 – OCTUBRE 2025

BOGOTÁ

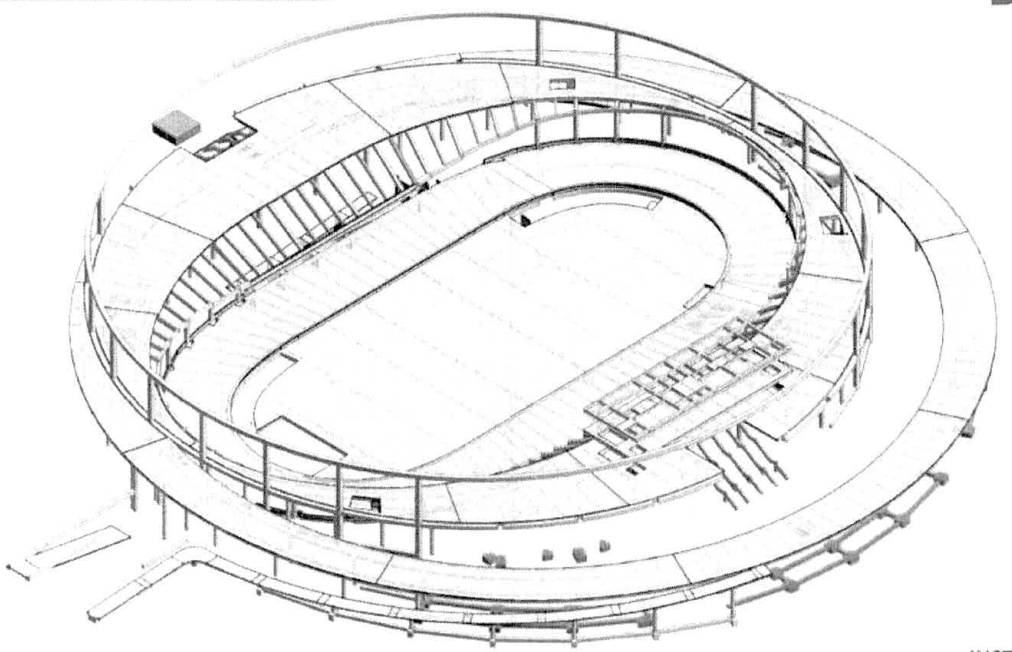


INSTITUTC DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – PAGO DE INSUMOS ESTRUCTURA

ACTA DE FIJACIÓN 19 – NOVIEMBRE 2025

BOGOTÁ

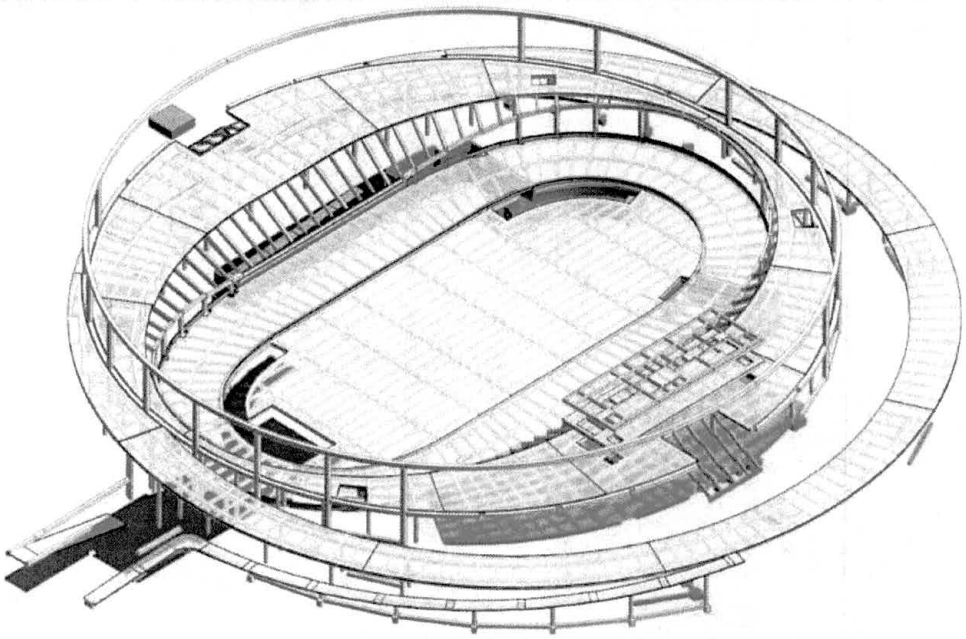


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

EJECUCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2026

BOGOTÁ

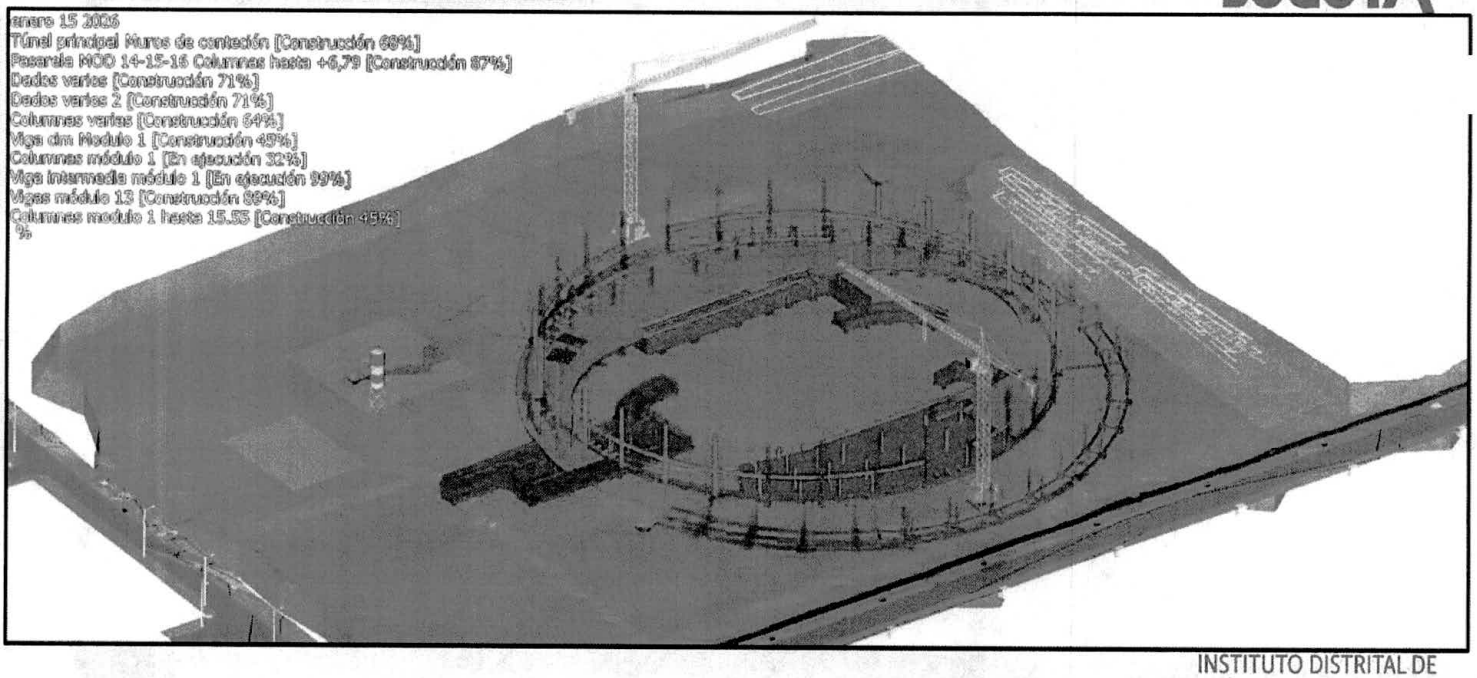



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COORDINACIÓN DE OBRA Y DISEÑOS

MODELO 3D MEMBRANA DE CUBIERTA

BOGOTÁ

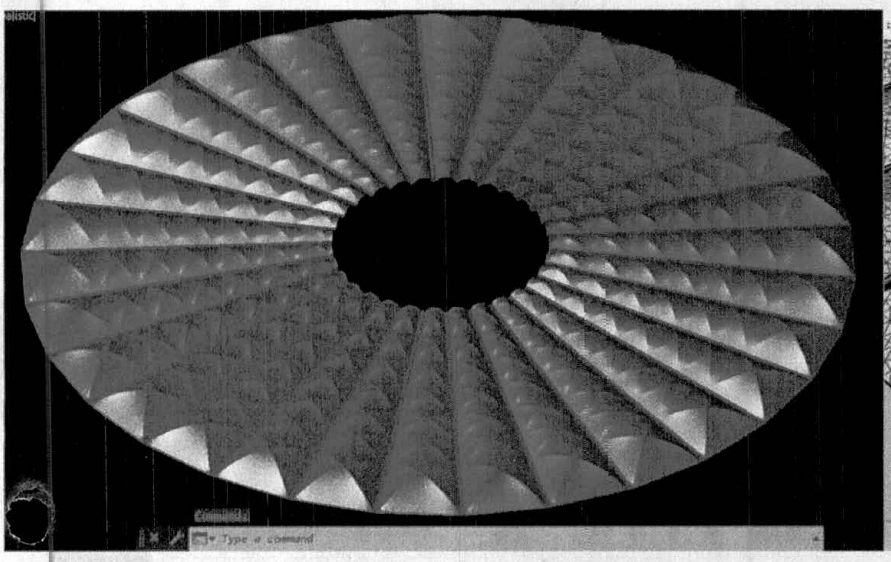

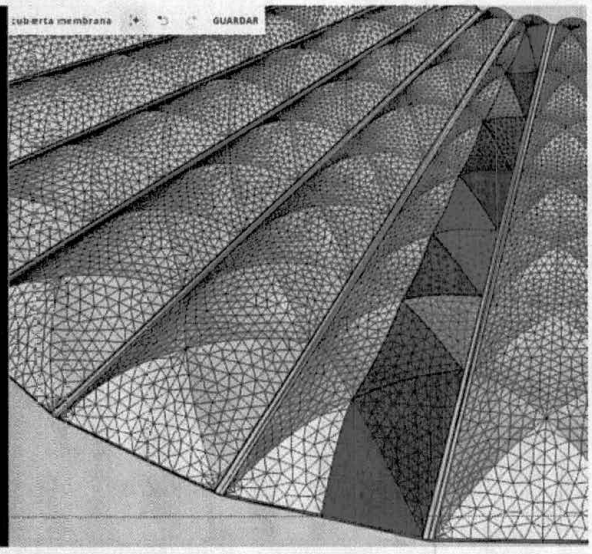

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025	CUMPLIDO
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(*) Pendiente Respuesta IDRD	CIG	19 y 29 /12/2025	PENDIENTE

(*) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 82.421.632.544,54	55,77%
% EJECUCIÓN	$ 76.862.514.844,3	52,01%
% COSTO	$ 76.862.514.844,3	52,01%

AVANCE	-3,76%

10/01/2026 **programación v3**

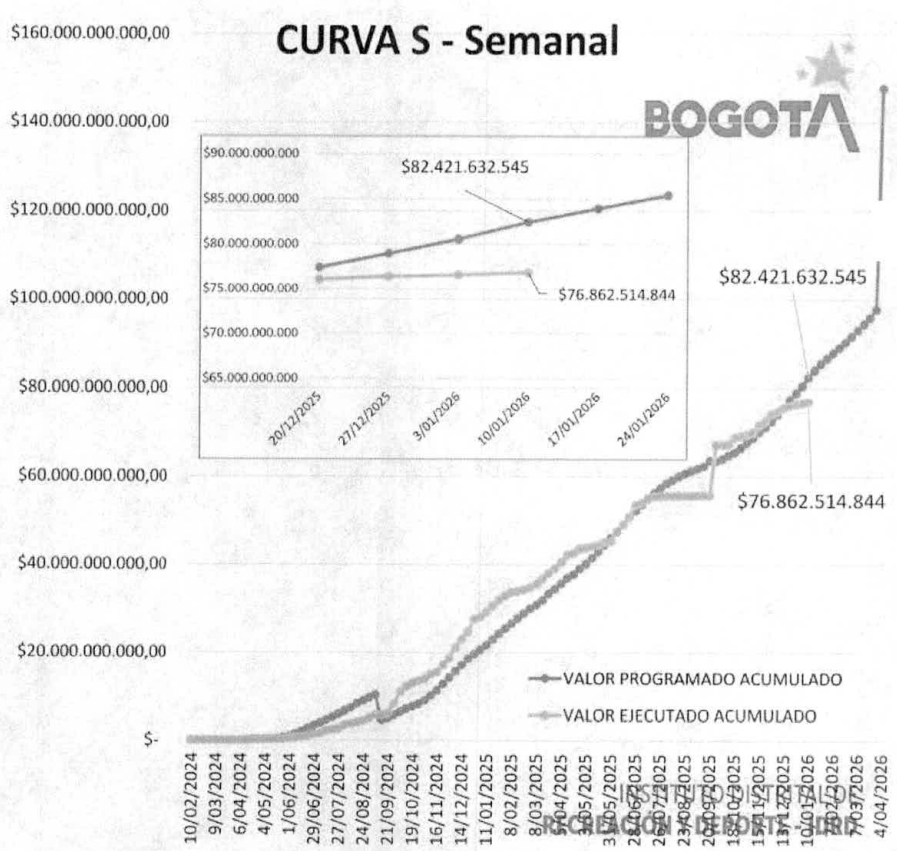

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
-023	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE -024	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO

MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

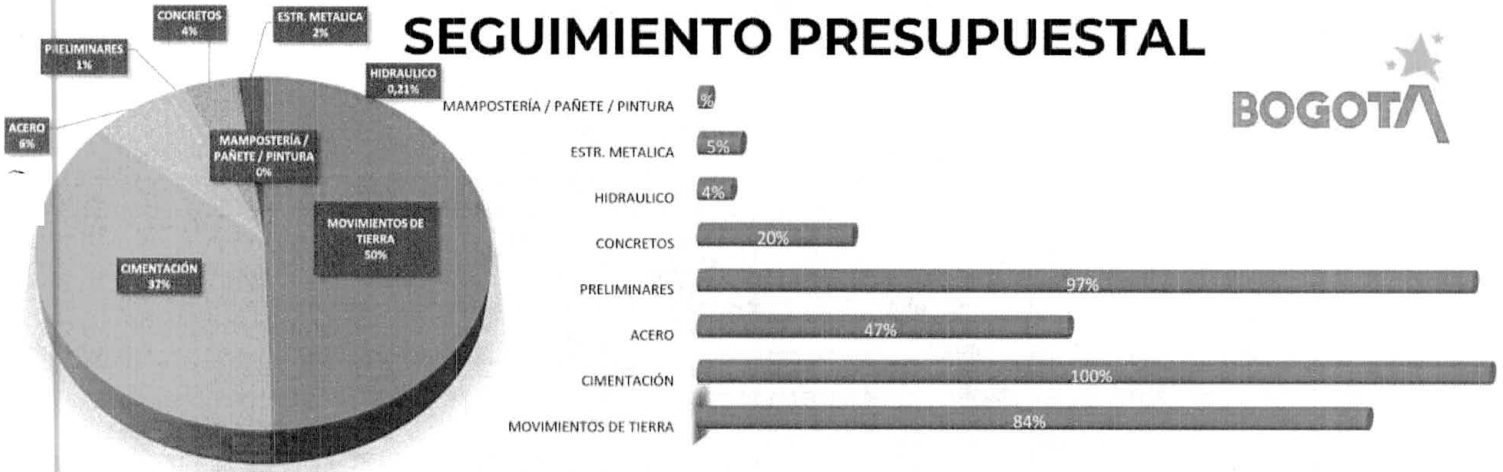

BOGOTÁ

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METALICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	**$ 61.010.761.815,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.868.397.139,00**	**$ 6.285.143.403,00**	**$ 72.523.644.111,00**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 5	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia minima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO PARA LOSA DE CONTRAPISO Y/O FUNDACION, FABRICADOS EN POLIETILENO EXPANDIDO CON MATERIAL TIPO ICOPOR, DENSIDAD 8 KG/M3 RECUBIERTO EXTERIORMENTE EN POLIETILENO CAL 3	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE TUBERÍA PVC –S, YEE, SEMICODOS, CODOS, SIFON, SALIDAS SANITARIAS.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7 Y 11, PASARELA	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
MODULO 4 Y 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. INLCUIDO LOS TRASIEGOS.	CONTINUA
TRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

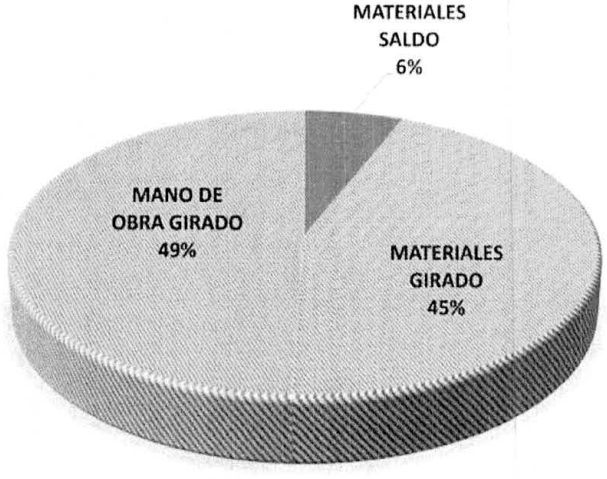

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. Se espera respuesta por parte del IDRD a reconocimiento planteado según radicados No Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)


MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA – PANELES DE CUBIERTA

BOGOTÁ


AVANCE EN CORTE

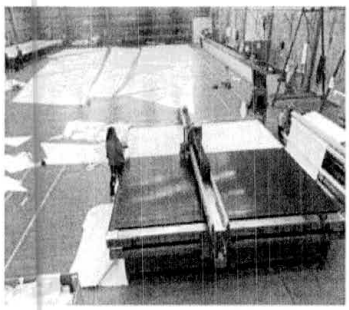

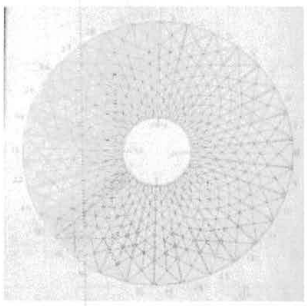


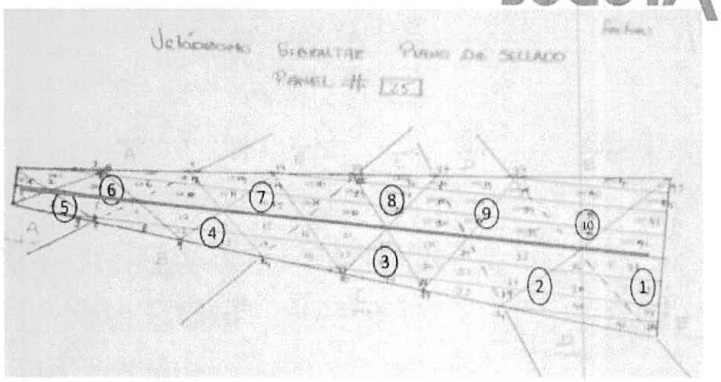

AVANCE EN SELLADO





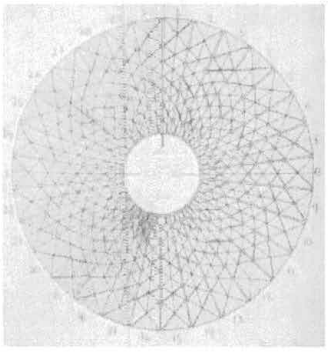

10 SECCIONES POR PANEL

TOTAL NACIONALIZADO: (341,85 m2/Panel) * 30 Paneles = 10.256 m2

AVANCE EN SELLADO (m2): 10.256 m2 = 10.256 m2/ 10.256 m2 = 100%


TOTAL MÓDULOS DE PANEL SELLADAS = 300 Unidades y/o Secciones

TOTAL SECCIONES NACIONALIZADAS A LA FECHA = 100 Unidades y/o Secciones

RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA CANALES Y FALDON

BOGOTÁ

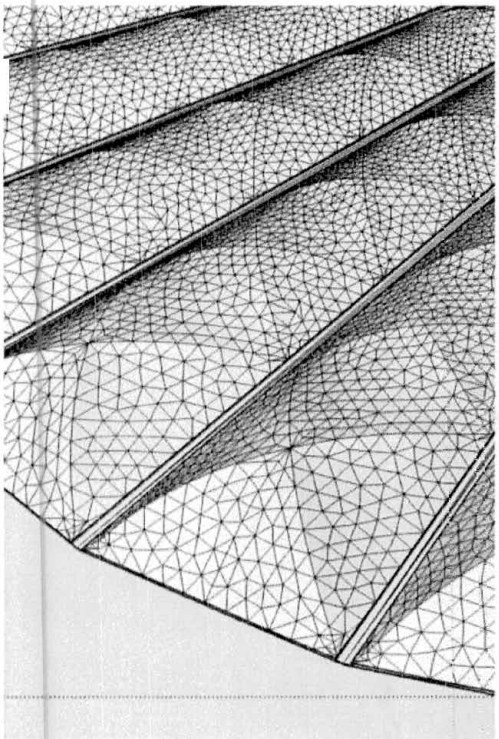

ÁREAS DE MEMBRANA

	ÁREA (m2)	Cálculo
1) Páneles de Membrana Principal		
- Modelo	10.230,00	341x30
- Sellos entre patrones	412,08	343.4x0.04x30
- Faldones Perimetrales	547,02	101.3x0.18x30
2) Canales		
- Modelo	1.054,80	35.16x30
- Sellos a membrana principal	104,18	2x43.41x0.04x30
3) Faldones a Viga Canal		
- Modelo	89,70	2.99x30
- Sellos a membrana principal	14,65	12.21x0.04x30

ÁREA TOTAL= 12.452,43 m2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	27,09 Ton
ene-26	05 de Enero al 11 de Enero de 2026	11,33 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	266,32 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***266,32 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **24,50%**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-2	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
					Total	24 Unds		**Total**	208,68 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA

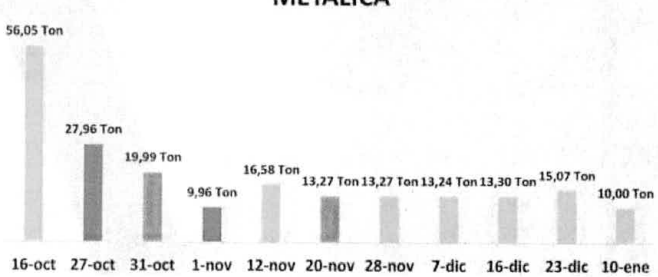

Elementos Ingresados del 05 al 11 de Diciembre:

1 Unds para **9,99 Ton**

TOTAL : 208,68 TON.




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FINALIZACIÓN DE MUROS TUNEL DEPORTIVO – TRAMOS 28 al 31

BOGOTÁ



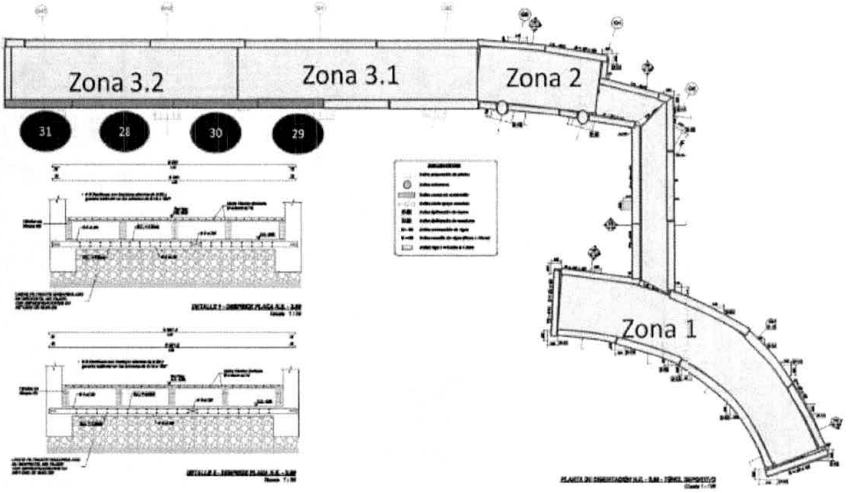

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 15 al 17

BOGOTÁ



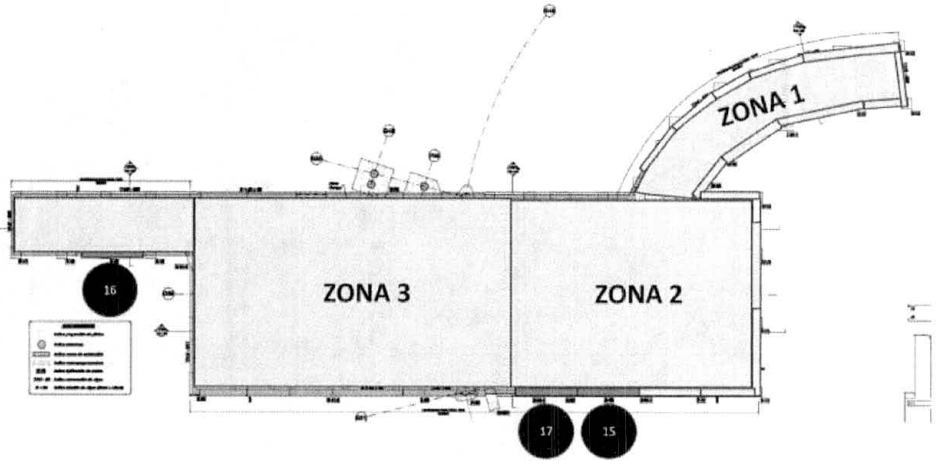

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL
DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS Y VIGAS – MÓDULO 1 CON MÓDULO 6







Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 16 – ZONA DE PASARELA

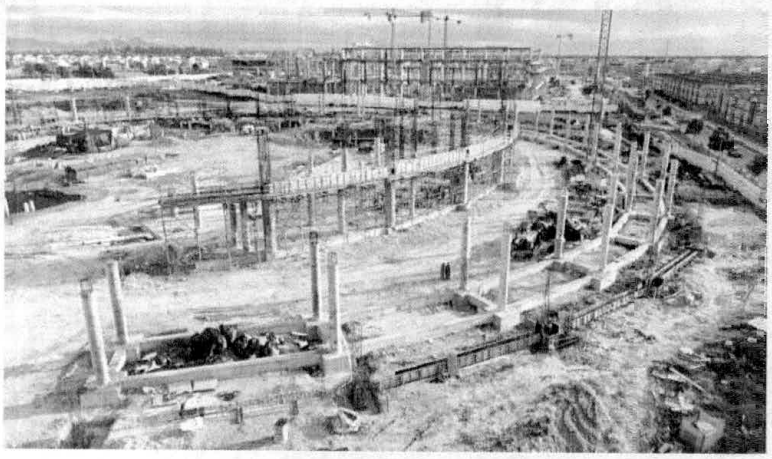

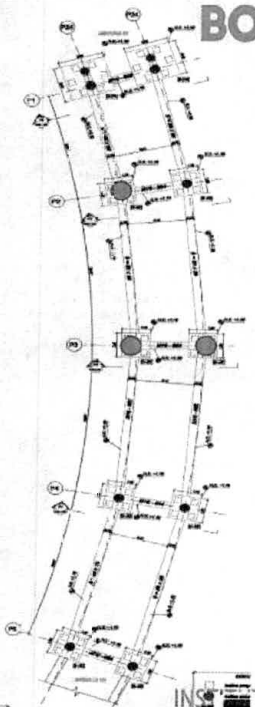


Zona Vaciada en el Periodo


Zona Vaciada Previamente

PLANO M16-E01
PLANTA ESTRUCTURALES MÓDULO 16 -PASARELA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 1 – COLUMNAS DE CUBIERTA

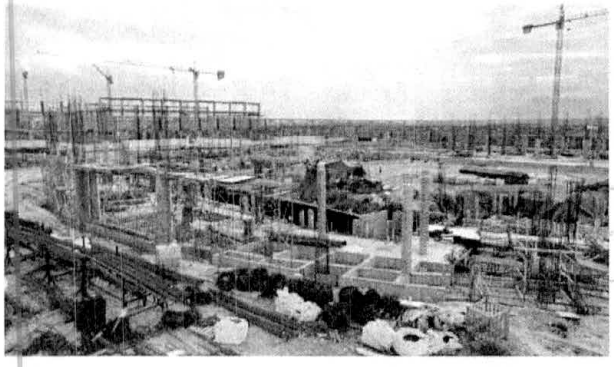

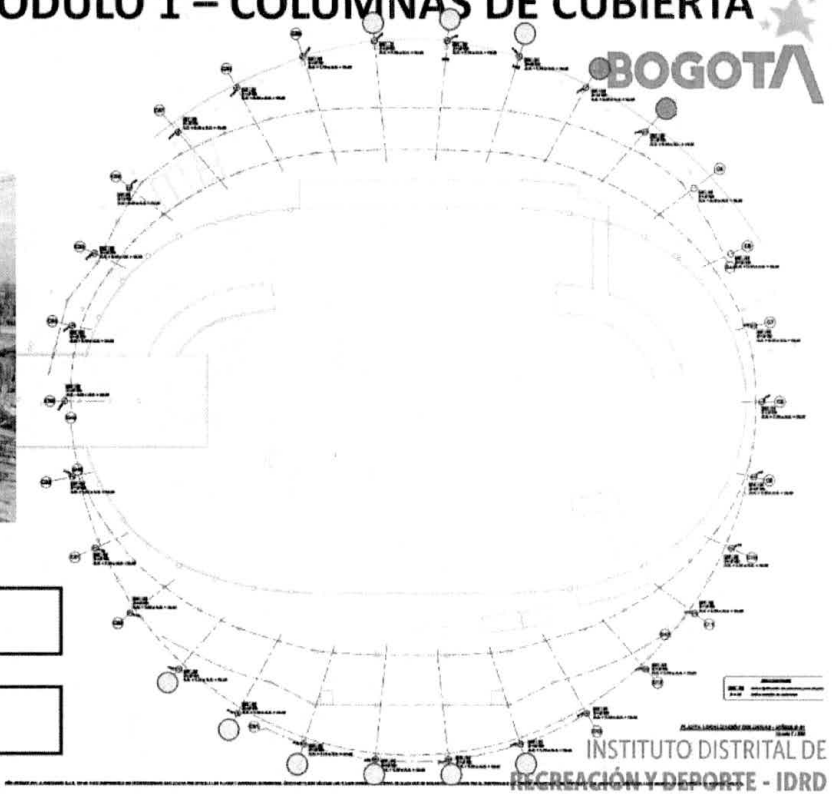

Zona Vaciada en el Periodo


Zona Vaciada Previamente


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 3 – ZONA DE EDIFICIO

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

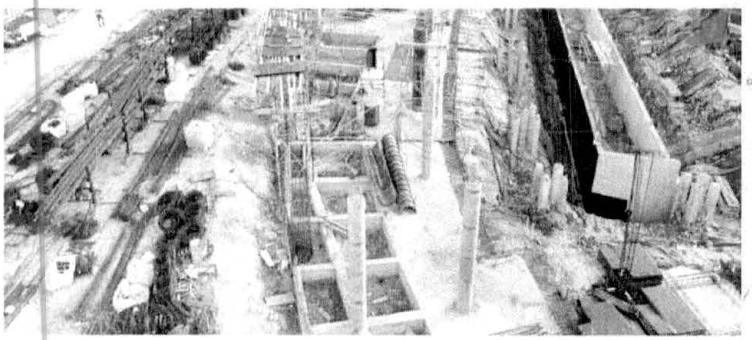


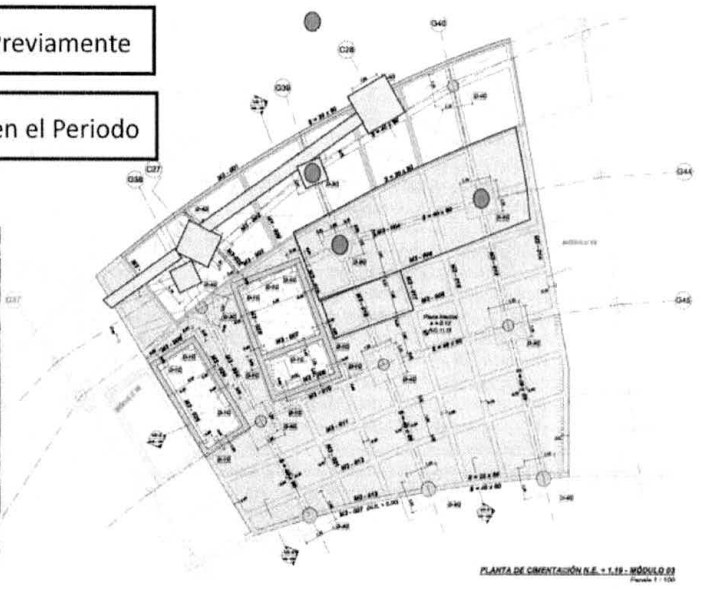


PLANO M3 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 3

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 2 – ZONA DE EDIFICIO

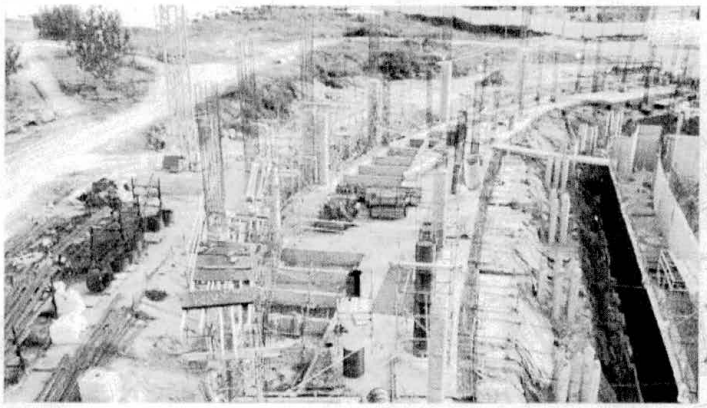

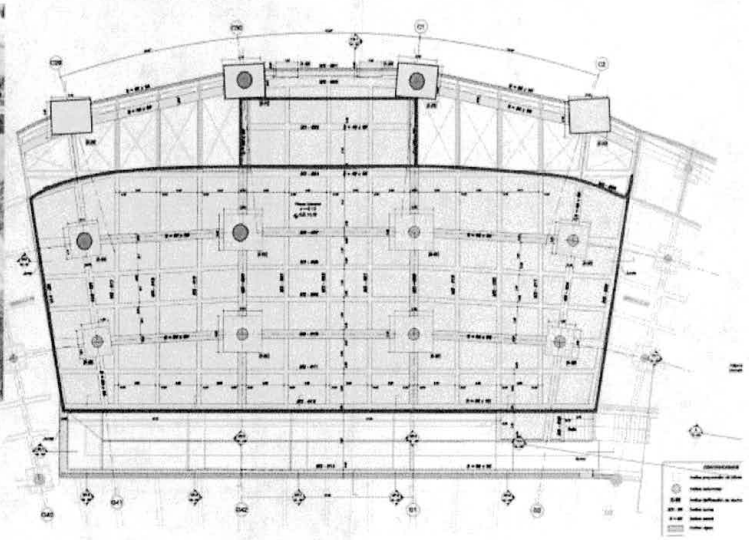

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M2 – E02 PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19
MÓDULO 2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE PLACA MÓDULO 5 – TRAMO 1






Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y
CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

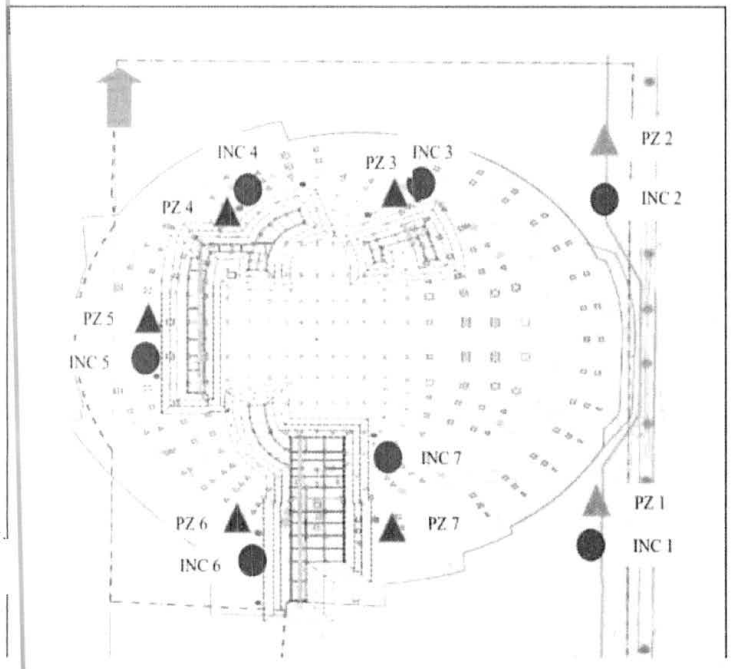

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 22 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.19 m y 8.88 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 10 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.30 y 6.22 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
N-A	N-A	N-A	N-A

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Durante la semana 05 al 10 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:


- Se trabajó en la coordinación para ajustar y definir el paso de las 17 tuberías de 4 pulgadas IMC sobre el túnel principal. La imagen es el modelo original al cual se le realizan correcciones de ubicación de las cajas de paso.

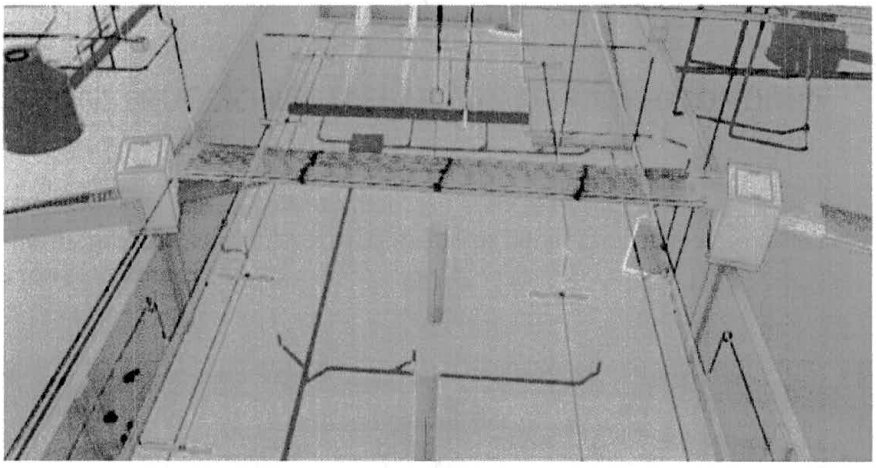

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Se estable el paso de las tuberías garantizando que al traspasar los muros de los túneles con los pases estos queden herméticos. Se adicionan 2 cajas metálicas para hacer que las conexiones y el traspaso de IMC a PVC sea técnicamente correcto.

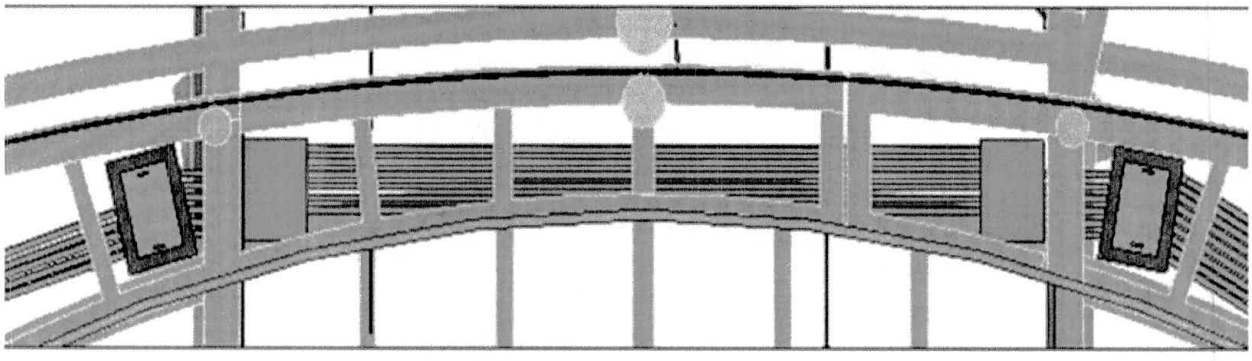



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Imágenes de detalles de la ubicación de las tuberías con un corte en el final del muro y vista lateral para verificar altura de las tuberías y llegada al muro de concreto

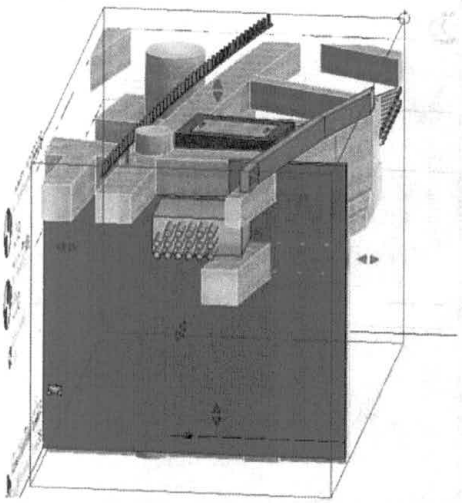

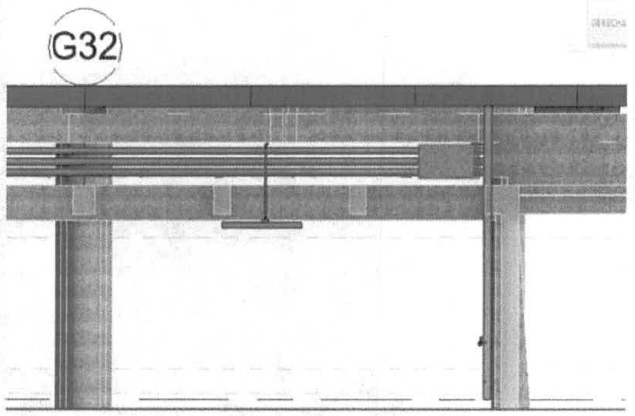

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

Hidrosanitario

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 05/01/2025	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización del 100% - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.


REDES HIDROSANITARIAS


BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se termina la instalación del geodrén perimetral del Túnel Administrativo. Así mismo, se empiezan actividades preliminares para la instalación del tecdrén en este túnel y geodrén del Túnel de Apoyo.

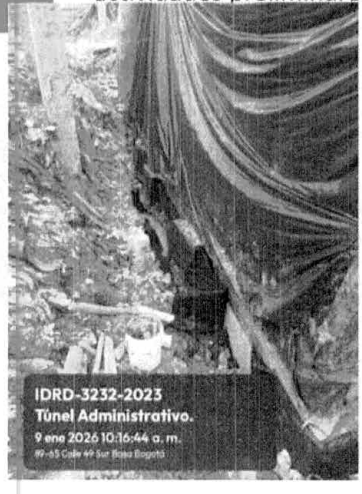

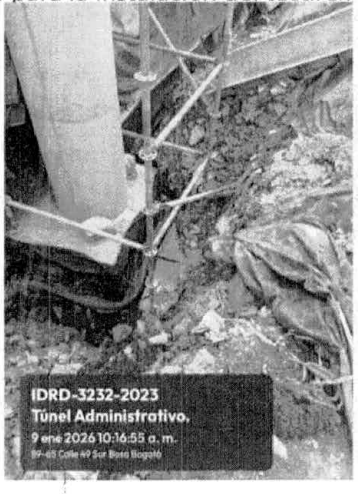

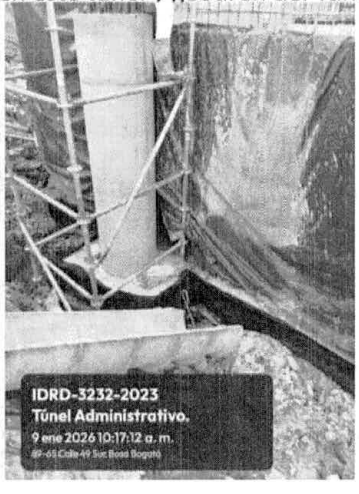

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

Convocatoria comité de participación No. 22



CONVOCATORIA
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NRO. 22
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".


- La firma contratista envía el volante de convocatoria del Comité el día Jueves 08 de enero del 2026
- El día viernes 09 de enero del 2026 la entidad emitió observaciones.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

Atención al ciudadano

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL



Capacitación: Buenas prácticas ambientales (09/01/2026)



Protección de materiales



Protección de árboles externos



Limpieza cajas red pluvial



Mantenimiento sumideros



Retiro RCD: 35 m3

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RESPEL

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.468.559**	**85,15%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.382.299**	**85,98%**

RESPEL semanal: 31.880 kg (lixiviados

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,80%
Circularidad: 20,02%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ




Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo y Deportistas)

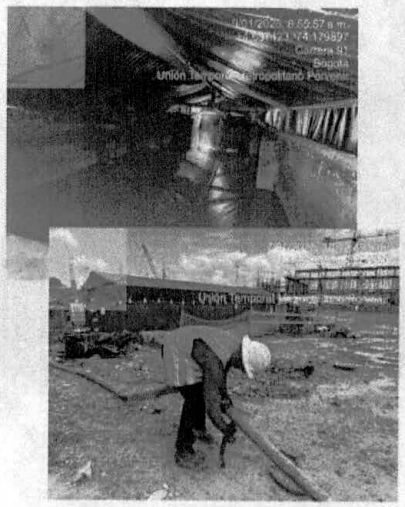

Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención

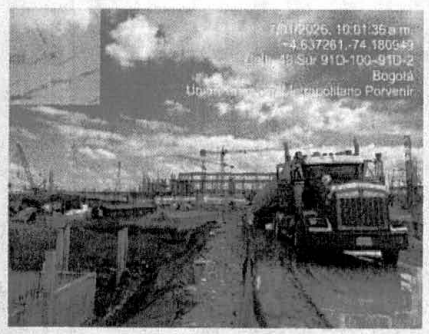

Retiro de lixiviados

Activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank, para su transporte y disposición final (31.880 kg)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ




Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra

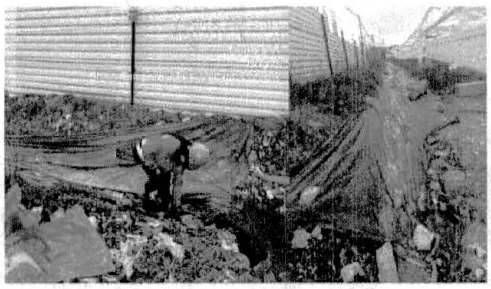

Inspección de canal de agua lluvia

Limpieza de canal de agua lluvia de la zona norte y evacuación de agua lluvia acumulada en pozo de achique

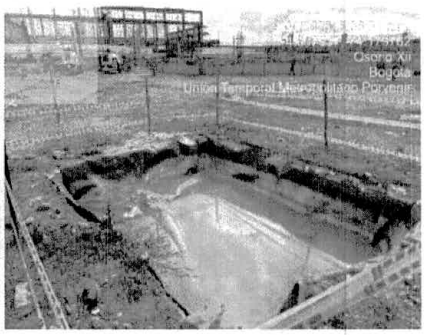


Pozo de achique de agua lluvia

Activación de motobombas para evacuación de agua lluvia contenida en pozo de achique de la zona central, a Alcantarilla

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13
Reducción del Riesgo ER07-ER09-ER10-ER14

BOGOTÁ

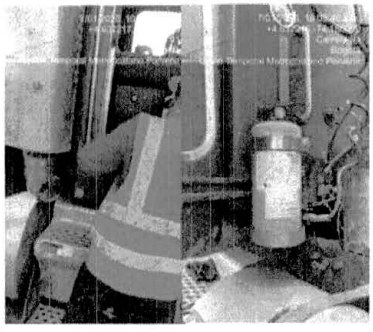

Inspección de vehículos

Inspección de vehículo carro cisterna (verificación de kit de emergencias y kit de control de derrames)

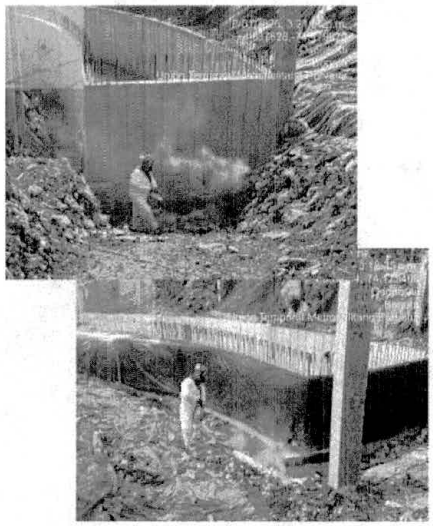

Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores




Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo del Riesgo ER04
Reducción del Riesgo ER04-ER16

BOGOTÁ

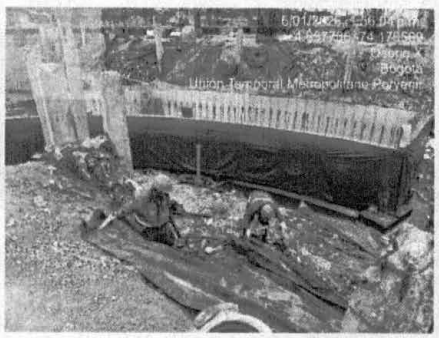

Protección de taludes

Mejoramiento de protección de taludes con polietileno, junto con jornada de orden y aseo en bermas de taludes

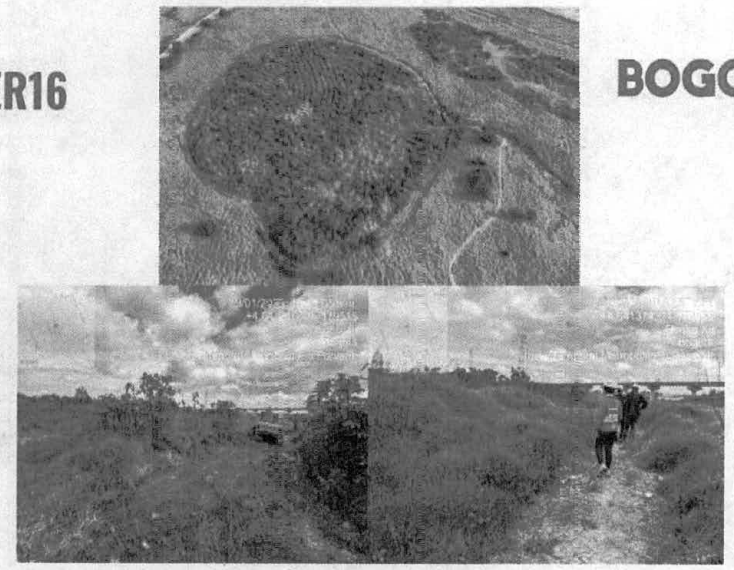

Cortafuegos del área de material para reconformación

Monitoreo y mantenimiento del cortafuegos del área de material para reconformación

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE SST


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

PROMEDIO PERSONAL

BOGOTÁ

PROFESION	PROMEDIO 05/01/26 - 11/01/26
PROFESIONALES	25
COMISION TOPOGRAFIA	5
ALMACENISTA	2
MAESTRO	4
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	20
AYUDANTES	37
HERREROS	13
OPERADORES	8
BACHEROS	2
CONDUCTORES	1
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**122**

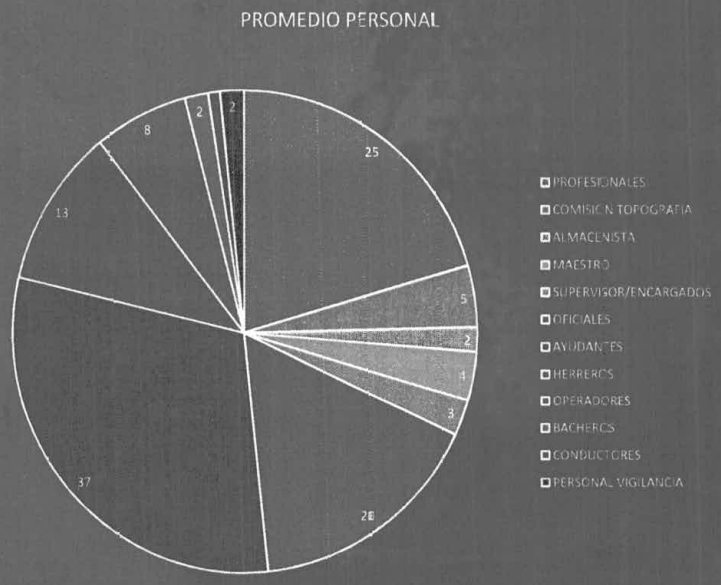


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

BOGOTÁ

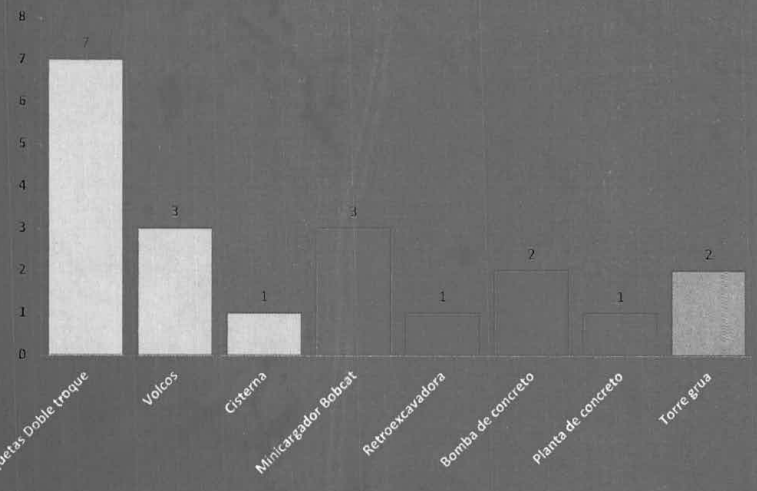



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

BOGOTÁ

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	CERRADO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	ABIERTOS
TOTAL ACCIDENTES	8	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
TOTAL AUSENTISTAS	56


NOTA: En la semana se recibe el cierre del accidente de Omar Cruz, a la fecha se cuenta con 4 accidentes cerrados y 4 abiertos


INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Armado andamio escalera para acceso a viga aérea

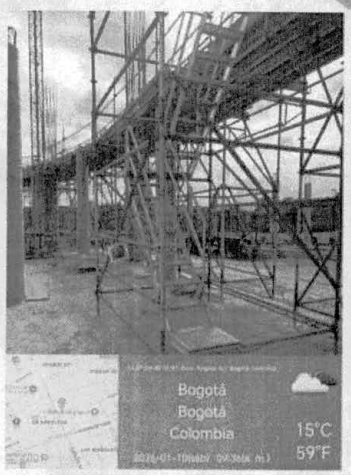

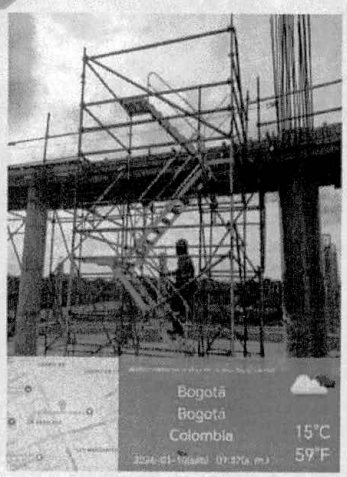

Inspeccion trabajo en alturas



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion de EPP y dotación acorde al manual de identidad



Entrega de dotacion y EPP




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Señalización en obra



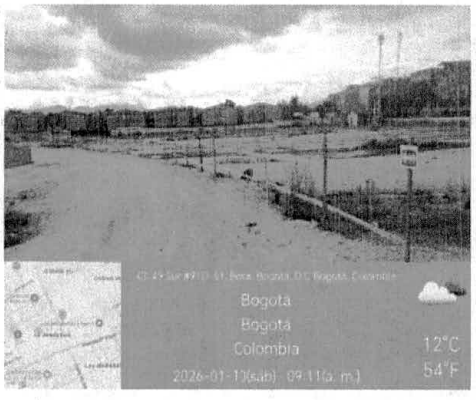

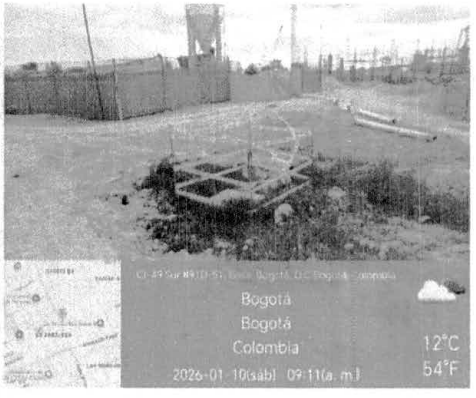

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Jornada de vacunación





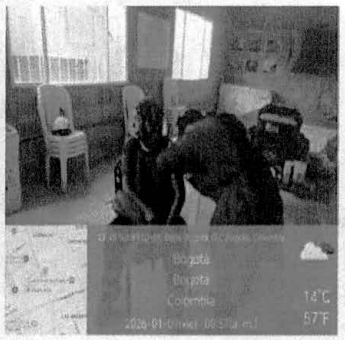





INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Acompañamiento llegada y descargue estructura metálica

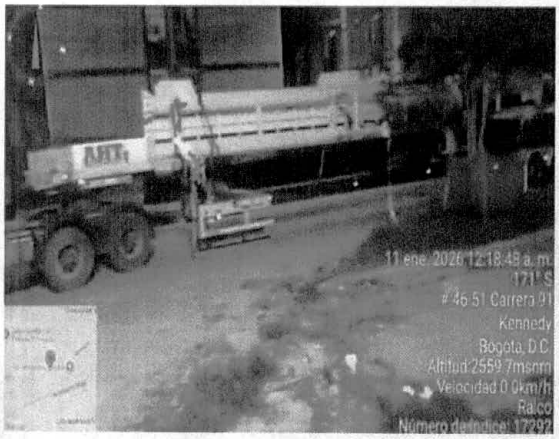

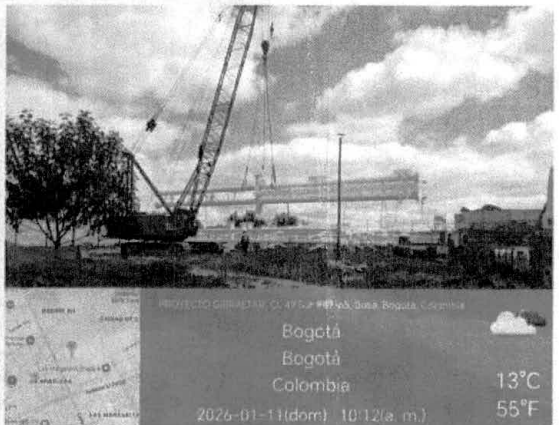

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

HALLAZGO

Personal anclado a la columna



ACCIONES CORRECTIVAS

ATENCION




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

HALLAZGO

Solicitud cambio de bases de andamios

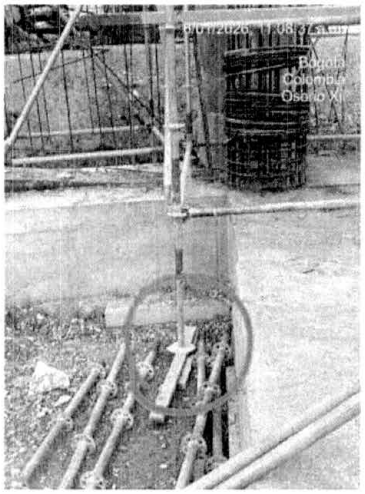

ACCIONES CORRECTIVAS

ATENCION




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ


HALLAZGO

Sección de andamio incompleta en frente de obra

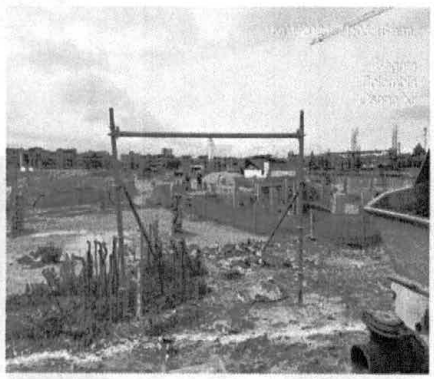

ACCIONES CORRECTIVAS

ATENCION

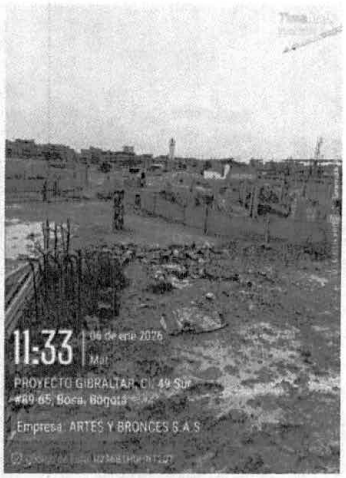

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA


BOGOTÁ

Componente

De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2376,58 m3

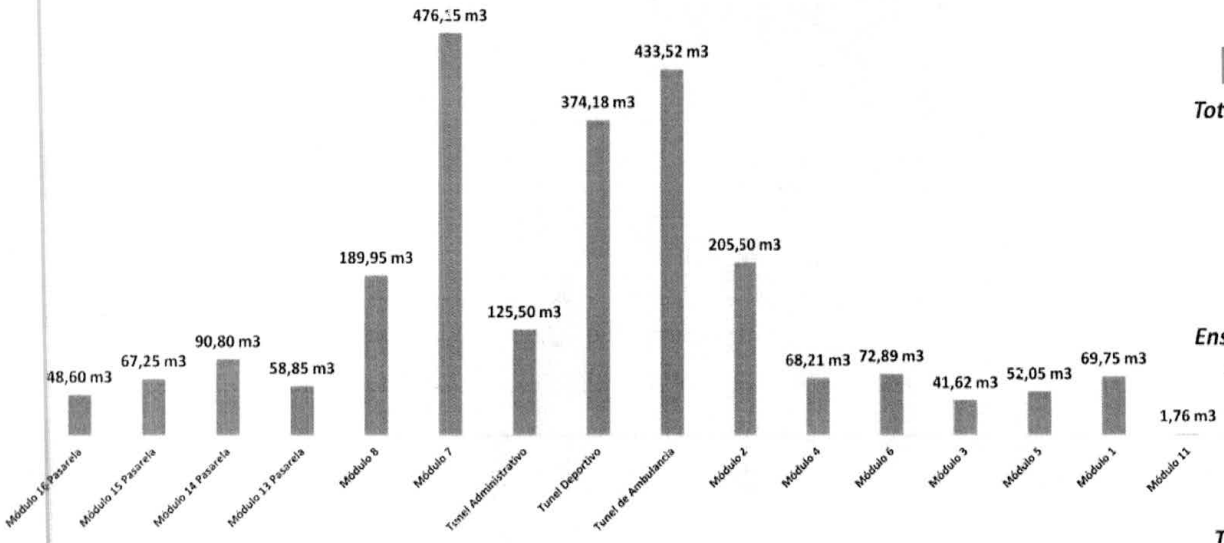

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana

76,15m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673



TOTAL SEMANA DEL 05 DE ENERO AL 11 DE ENERO DE 2026.

ncreto Estructural: *76,15* m3 **Muros** (Túnel Deportivo y Túnel de Ambulancia) **Columnas** (Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3, Módulo 5 y Módulo 16) y **Vigas y Dados** (Módulo 6)


CEMEX **0,00 m3** *0%*

ALTARA **76,15 m3** *100%*

INSTITUTO DISTRITAL DE **RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

Control de Aceros allegados al Proyecto


Total **471,06 Ton**

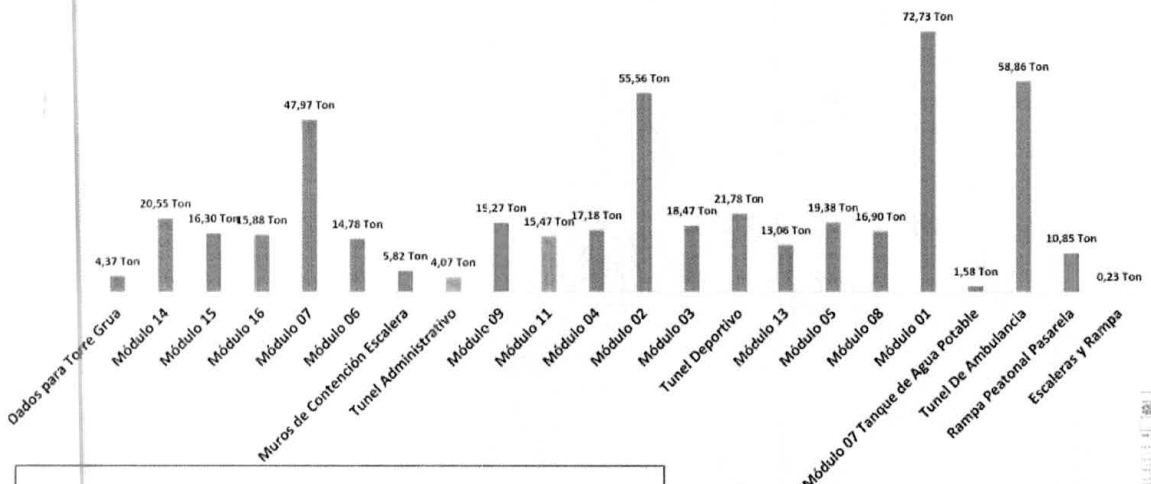

BOGOTÁ


CERTIFICADOS DE CALIDAD





Del 05 de Enero al 11 de Enero de 2025

No hubo ingreso de Acero de Refuerzo a obra



INSTITUTO DISTRITAL DE **RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**
