
ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-2	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
					Total	24 Unds		Total	208,68 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 05 al 11 de Enero de 2026:


1 Unds para **9,99 Ton**


TOTAL : 208,68 TON.





INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA EN OBRA

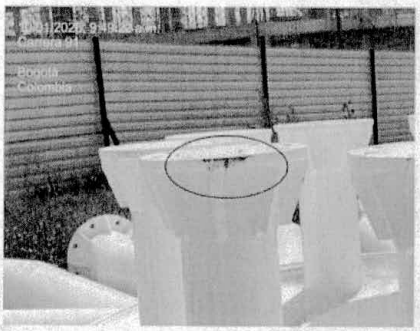

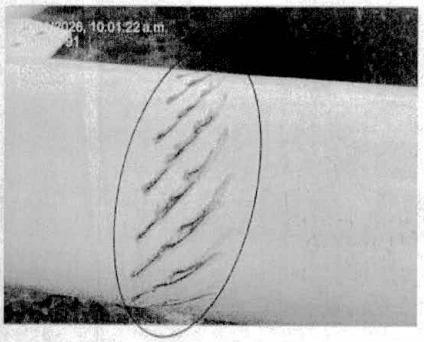

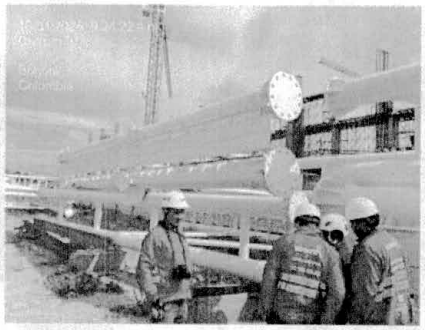

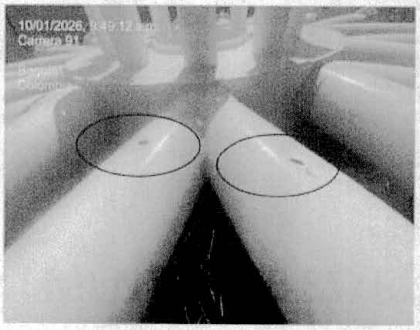

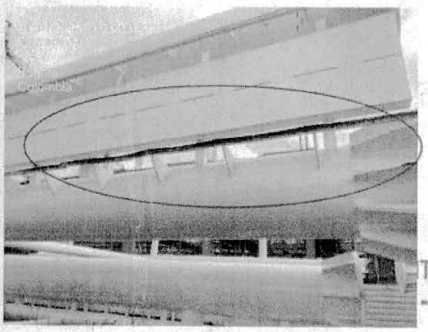

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
2	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-586-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2036 del 27 de Noviembre de 2025.	Interventoría
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 de 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 22 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 30 de Junio de 2025	Interventoría
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobacion CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEP

ACTIVIDADES ADICIONALES DESDE EL COMPONENTE DE CALIDAD

- ✓ Se aprobó por parte de la interventoría el Informe de Calidad No 23 mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0012-2026 del 07 de enero de 2026

- ✓ Se radicó la 5ta entrega del Dossier de Calidad de la Estructura Metálica de Cubierta mediante comunicado CE-206-125-2126 del 06 de enero de 2026


AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
GRACIAS
INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Transversal/Tecnico Velodromo

FECHA: 15/Enero/2026 HORA INICIAL: 8:00a.m HORA FINAL: 10:00a.m LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2022

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	Katherin Amaya Roa.	1016026233	Supervisora	STC				
2	Alfonso Peñaranda Suarez	88235391	Director	UTMP		UTMP	a.penaranda@cyg-com.co	
3	EDWIN ESCOBAR	91442629	STC-IDRD	IDRD				
4	JAIRO PARRA REYES	1143829208	STC-IDRD	IDRD		IDRD	jairo.parra@idrd.gov.co	3052150220
5	Andres Martinez	T9780393	RL Interv	CIG		CIG		
6	EDGAR SERRANO M.	1977971	Apoy TEC Interv.	C.I.G		C.I.G.		
7	Rubén D. Crespo. B.	19496690	Dtor Interv.	CIG.		CIG.		
8	Ivonn Pérez Téllez	1026279000	Apy Supervisión	STC		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	
9	Bibiana Rocio Sosa Lopez	52996077	Apoy Supervisión SST	STC		IDRD	bibiana.sosa@idrd.gov.co	
10	LINA JOHANNA FALLA LOZANO	52.517.090	APO. SUP. AMB	STC		IDRD	linafalla@idrd.gov.co	3103433272
11	Oscar Sora Ortega	80761720	Apy Hidraul.	STC		IDRD	oscar.sora@idrd.gov.co	3003101408
12	Francy Liliana Murillo	52968323	Apoy Tec. Sup.	STC		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043688785
13	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Apoy. Electrico	STC		IDRD		
14	Diana Marcela ORTIZ D.	1014220007	Res. SOCIAL	UTMP		UTMP	social.velodromo@cyg.com.co	3533555801
15	Paula Blanco Marín	1013383630	Res Ambiental	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
16	Edgar Fernandez Soler	80109414	Prof. Ambiental Coordinador	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com	3002660060
17	Luz Stella Rodriguez	31432956	Res. SST	UTMP		UTMP	sst2.velodromo@cyg.com	3214693331
18	Diego Alejandro Acosta C.	3178727894	Arquel BIM	UTMP		UTMP	edumbalaimcivil@gmail.com	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.3

2/2

A87

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Transversal / Tecnico Velodromo

FECHA: 15/Enero/2026 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: 10:00am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Julian Ricardo Agudelo Niño	P0767393	R. Ambiental	Interventoria		CIG	julianagudelaingeniero@gmail.com	3202336342
2	Abdid Vivian Rojas Congrejo	52992509	Prof. GEO	Interventoria		CIG	rojasingeniero@gmail.com	3157994503
3	Samer Arias Escalante	79627749	Prof Electri	Interventoria		CIG	electricidad.ingeniero@gmail.com	3202794504
4	Diego F Castro G	1110455553	Prof Calidad	IDUTMP		UTMP	Calidadvelodromo@cyg.com.co	3176575327
5	Wilber Piare Sánchez	1053886284	Prof BIM	Interventor		C.G	bim.vel6@gmail.com	3152076173
6	Eduard Antonio Corredor	80383913	Residente inst. electricas	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290201
7	Alfredo Fermin Barrios	79946424	Res Estr. HYSG	UTMP		UTMP	hidraulico.velodromo@cyg.com.co	3223912997
8	Andres Galeano González	1022362548	Res Pptos y Prog	C16		C16		3192355243
9	Laura Morales	1118565112	Residente BIM	CBC		C16	Laura.mp227@gmail.com	3102123494
10	Jose M Galeano C	80031322	Residente	UTMP		UTMP	estructural.velodromo@cyg.com.co	3105570274
11	Diego Boia Bello	1075652067	Ing. Estructural	Interventoria		C16		
12	CARLOS EDUARDO GOMEZ S.	79'617.505	RESIDENTE	UTMP		UTMP	residente1.velodromo@cyg.com.co	310 8235944
13	Andres felipe vargas Rodriguez	1065602731	Prof HS-SC1	Interventoría		C16		3100654698
14	Armando Rodriguez Jaimes	80218813	Residente	C16		C16		
15	Angela Milena Sanchez	1.020.739.111	programación	UTMP		UTMP	programacion.velodromo@cyg.com.co	3003522693
16	Arturo Rojas Correa	13973937	Residente	C16		C16	interventoria.velodromo@gmail.com	3166420036
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.6

Marca temporal	Nombre:	Cedula:Nombre	Correo electrónico:	Cargo:	Entidad:	Número de teléfono
15/01/2026 8:21:42	Javier sanchez	1014177632	Javier.sanchez@idrd.gov.co	Apoyo técnico a la super	Idrd	
15/01/2026 8:22:10	Juan Pablo Villate Diaz	1019010837	juan.villate@idrd.gov.co	Apoyo supervision	IDRD	3197021334
15/01/2026 8:23:20	Laura Milena Ramirez Qu	52764737	lauram.ramirez@idrd.gov.co	Contratista	IDRD	3103378617
15/01/2026 8:40:30	Lindy Rubiano Moyano	1051954740	interventoria.sgsstvelodromo@gmail.com	Residente SGSST de Inte	Consorcio Interventores	3202548911
15/01/2026 8:49:03	CARLOS HECOR CASTRO	79340835	carlosh.castro@idrd.gov.co	Contratista	SCT-IDRD	3107542732
15/01/2026 12:01:09	Ruben Dario Crespo	19496690	directora.consorciointervg@gmail.com	Director de interventoria	Consorcio Interventores	3103231119

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A	Comite Transversales / Técnico Veladromo	DD	MM	AA
ACTA No.	Cto 5232-2023 y 3219-2023	22	01	2024

LUGAR: Obra Veladromo HORA DE INICIO: 8:00am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se adjunta listado de Asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Exposicion de Avance en	4.
2. Obra componentes Transver.	5.
3. sales y Técnicos	6.

TEMAS TRATADOS

> Se inicia con recorrido en la obra donde se hace una descripcion general a la supervisial IDRD por parte de la interventoria y obra.

> Se inicia comite presencial con autorizacion xra Evaluar.

Componente Social: Por parte de la UTMP se realiza el desarrollo de lo avanzado a la fecha en la presentacion adjunta.

- La Supervision solicita al respecto de las actas de vecindad xra ampliacion del Parqueadero
- Adicional del tema de caninos y habitantes de calle, la interventoria manifiesta que no hay afectación
- Hacen recomendaciones de reunion del dia de mañana segun protocolos de Entidad durante la ley de Garantias.
- Programa xra Esp. Tecnicos de la Universi Nacional

1/7

TEMAS TRATADOS

se harán visitas para exponer lecciones aprendidas según experiencias en diferentes proyectos IDRD desarrollados y se realizará reunión el 09/02/2026.

Componente Ambiental: Por parte de la UTMP se realiza exposición de los avances respectivos a la fecha según la presentación Adjunta.
Según recorrido la Supervisión recomienda en los acopios de zona de acopios el orden y aseo respectivo según el avance en obra.

- Según propuesta de pozos eyectores se espera respuesta y/o traslado al IDRD por parte de la Interventoría.
- Según propuesta de Manejo de Zonas verdes se espera PTA CIG y/o traslado al IDRD

Componente Riesgos: Por parte de la UTMP se realiza la exposición de los avances respectivos a la fecha según la presentación adjunta.
La supervisión recomienda, teniendo en cuenta las temporadas secas, estar alertas de inspecciones para prevención incendios por resequedad en la

- cobertura vegetal e informar a la entidad. Remitir Oficio al respecto de Notificación reunión/recorrido Bomberos

La supervisión indica que en CAR se tendría contemplado la Planta de tratamiento a la cual Veladuma se conectaría y se revisarán las condiciones de Sostenibilidad x/a la entidad (Económicas/Técnicas) de esta implementación. Por Parte de CIG y la UTMP se hará revisión y propuesta del trazado de tuberías de conexión hacia el Proyecto CAR.

Componente SST: Por parte de la UTMP se realiza exposición de los avances respectivos a la

2/7.

TEMAS TRATADOS

Fecha segun presentacion adjunta. el viernes se remite por email documentes de los accidentes según compromiso.
pa Parte de CIG se menciona el Personal en obra y que se recibe aprobacion de informe N° 19 por parte del IDRD. y segun observaciones en campo se expone para ajustes respectivos (Andamios, anclajes personal y plataformas). Se remite encuesta de Radicacion al IDRD segun plan anual de la interventoria xra diligenciamiento

Componente Calidad: Por parte de la UTMP se realiza exposicion de los avances respectivos a la fecha segun presentacion adjunta.
La supervision solicita respuesta del Tema de acopio de estructura metalica, la interventoria manifiesta que se esta trabajando teniendo en cuenta que se tiene que dar clasificacion de Tipologia Segun visita subcontratista Emecon realizada la semana Pasada.

Componente BIM: Por parte de la interventoria se hace lectura de los compromisos y su desarrollo segun Acta anterior:
1. Pendiente: Teniendo en cuenta propuesta UAWT
2. Pendiente: En proceso de avance con el Subcontratista Team Shark. Planos Gral Terminados.
La supervision manifiesta que se recibe las propuestas UAWT y se tiene en cuenta precios de conexion pendiente la actualizacion a precios 2026. (Recibidos Precios 2025 a Finales de Febrero se entregaria.)
Se expresa por parte de CIG que el rendimient

3/7

TEMAS TRATADOS

Mostrado en el Modulo 1 es bajo, la UTMP manifiesta que algunos elementos son compartidos y se avanza segun permisividad de la ejecucion en obra.
La version 1 Planos Pista Veladrome la proxima semana Seran radicados por la UTMP.

Compeviente Programacion: Pa parte de la interventor se hace lectura de los compromisos y su desarrollo segun Acta Anterior.
1. Pendiente: En avance de cotizac
2. Cumplimiento en desarrollo Segun lo informado por supervisión y el alcance respectivo segun presupuestado ($16'500.000.000), tan pronto se tenga cerrada la propuesta, sera socializada por parte de la UTMP.
3. Se realiza visita y sera respondido por parte del IDRD los comunicados de recibimiento (%) de la Membrana de Cubierta.

La Supervisión Solicita la Modificacion (Borrador) ajustado de acuerdo a los alcances expuestos y el rubro presupuestal comunicado, la UTMP maxima en 15 días se presentará programacion y demas Justificaciones de Alcance y NP respectivos, se hara seguimiento con reuniones IDRD-CIC-UTMP. Se plantea estrategias interadministrativo Tecnico y Costos del IDRD para optimizar tiempos de revision y reuniones de la informacion xra socializar de Manera Respectiva, la UTMP remitira al IDRD el avance a la Fecha.
La supervisión Solicita avances (Socializacion) tema Juridico en paralelo a la parte Tecnica.
Lunes 26/01/2026 UTMP Miercoles 28 CIC al IDRD.

4/7

TEMAS TRATADOS

La supervisión recomienda darle celeridad teniendo en cuenta finalización de Contrato tanto de Interventoría como Obra.
Se expone por CIG el estado de los avances de las entregas de Informes y Actas Parciales según ajustes al Plan de Calidad.
El IDRD manifiesta que el informe enviado por parte CIG calidad Nº 23 será revisado una vez se cuente aprobado Profesional de Interventoría.

Componente Técnico: Por parte de la interventoría se hace lectura de los compromisos y su desarrollo:
1: Pendiente: Según Radicados CIG se hará trámites internos IDRD con DADEP.
2: Pendiente:
3. Pendiente Respuesta IDRD Reconocer
4: Cumplida: Ejecutada. 16/01/2026.
5: Pendiente: Temas interadministrativos.

La UTMP realiza exposición de los avances respecto a la fecha según presentación adjunta.

Componente Electrico: La UTMP realiza exposición de los avances a la fecha según presentación adjunta. Se comenta reubicación de Puesta a tierra. La supervisión solicita plano de entrada de Fibra optica, la UTMP hara remisión Respectiva una vez el subcontratista de respuesta a la Solicitud al respecto.
Componente Hidraulica: Por parte de la interventoría CIG se hace lectura de los compromisos

5/7

TEMAS TRATADOS

1. Pendiente.
2. Pendiente. Ajustes de Acuerdo a Planta CAR.
3. Pendiente: Segun Visita Zona 5ª y se hara Seguimiento IDRD - EAAB segun socializacion.

La UTMP realiza exposicion de los avances respectivos a la fecha segun presentacion adjunta.

La Supervision indica:

- Reiniciar tema de Ciclo ruta con IDU
- Presentar en Proyec Segun programa el avance de la obra, tema personeria. Segun la Version Vigente, ~~Pdf~~

Se explica pa Parte de La Interventoria el desarrollo que se ha tenido ala fecha Segun los planes actuales y las proyecciones segun los Diseños que se entrega por parte del IDRD

6/7

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Compromisos estan reflejados dentro del presente documento y en las diapositivas presentadas adjuntas.	UTMP-CIG-IDRD	— " —

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCÓ		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Rubein D. Crespo B.	NOMBRE		
CARGO	Directa Interventoría	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Cortes

7/7



AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

CONVOCATORIA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN NO. 22

- Alcaldía Local de Bosa.
- Junta Administradora Local de Bosa.
- Alcaldía Local de Kennedy.
- Junta Administradora Local de Kennedy.
- Personería Local de Kennedy.
- Federación Colombiana de Ciclismo.
- Presidente Liga de Ciclismo de Bogotá.
- Secretaría de seguridad, convivencia y justicia.
- Departamento administrativo del espacio público.
- Contraloría de Bogotá
- Secretaría Distrital de Ambiente
- Secretaría de Integración Social
- Secretaría Distrital de Hábitat

Radicación jueves 15 y viernes 16 de enero de 2026



CONVOCATORIA
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NRO. 22
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Programa de divulgación

PUBLICACIÓN CARTELERA MARGARITA ETAPA 1 Y ETAPA 2



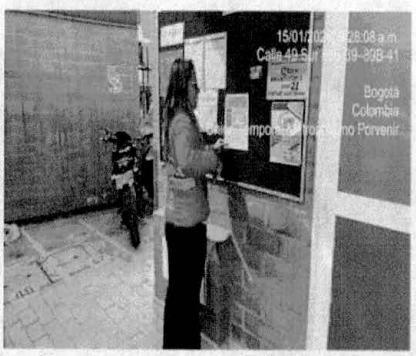

Correo electrónico	Redo Social - WhatsApp

Se emítela invitación a los 37 miembros del CPC el día jueves 15 de enero.


PIEZA DE DIVULGACION	FECHA DE ENTREGA	PIEZAS ENTREGADAS
Comité de participación ciudadana No. 22	15/01/26	49
TOTAL		49

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Programa de divulgación

BOGOTÁ

PRESENTACIÓN CPC No. 22





El día viernes 16 de enero se envia la presentación para revisión de la interventoria


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL


BOGOTÁ




Capacitación: Uso adecuado de Unidades sanitarias (16/01/2026)



Protección de materiales

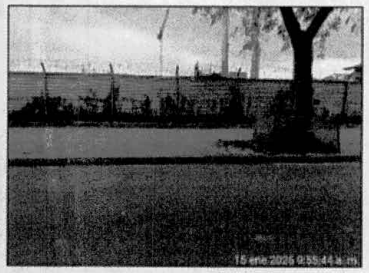

Mantenimiento de sumideros

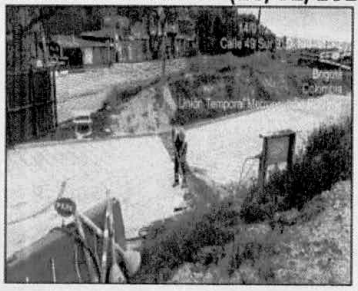

Limpieza de cárcamo



Jornada de orden y aseo





Retiro RESPEL


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL

CORRECCIONES RECORRIDO 15-01-2026

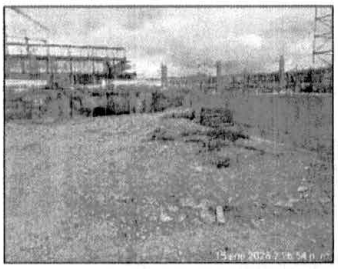

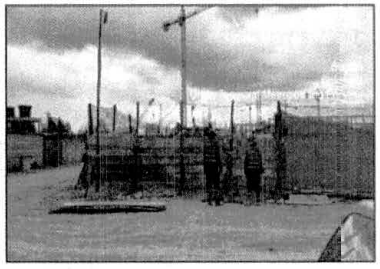

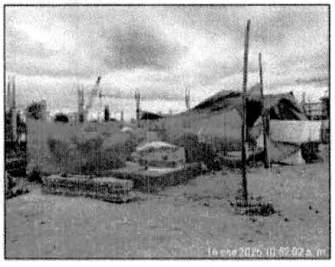

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.568.299**	**85,30%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.482.039**	**86,11%**

RESPEL EXCAVACIÓN	71.720 kg
LIXIVIADOS	28.020 kg
TOTAL SEMANAL	**99.740 kg**

Retiro de 21 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,80%
Circularidad: 20,02%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ



Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra

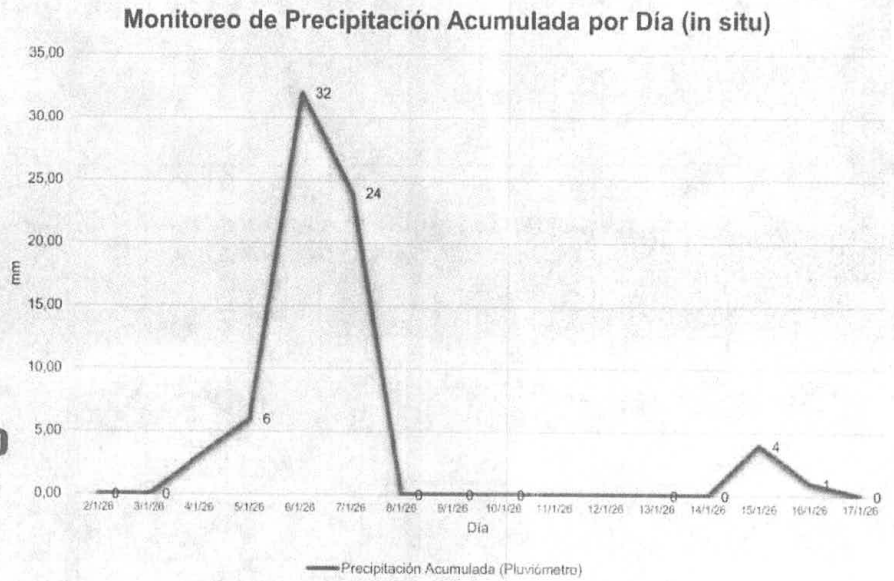

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ



Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)

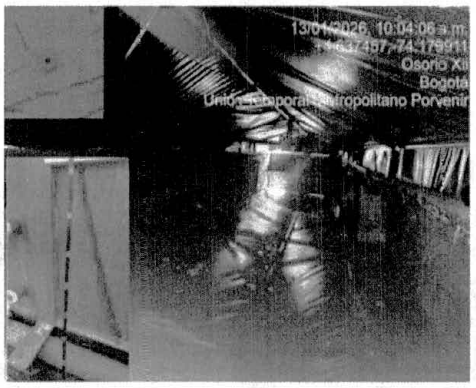

Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención



Retiro de lixiviados

Activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank, para su transporte y disposición final el 15/01/2026 (28.020 kg)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ



Manejo de agua lluvia

Evacuación de agua lluvia acumulada en diferentes zonas y abatamiento de nivel freático en pozo de achique de la zona norte

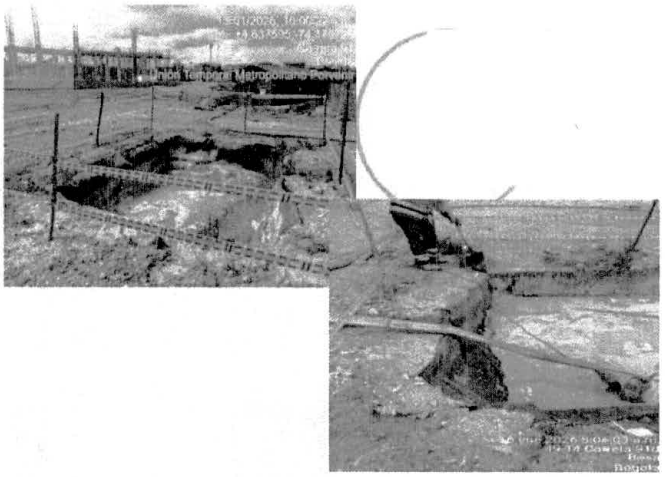


Limpieza de pozo de achique de agua lluvia

Mantenimiento, limpieza y retiro de material vegetal en pozo de achique de agua en plataforma

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13
Reducción del Riesgo ER09-ER10

BOGOTÁ

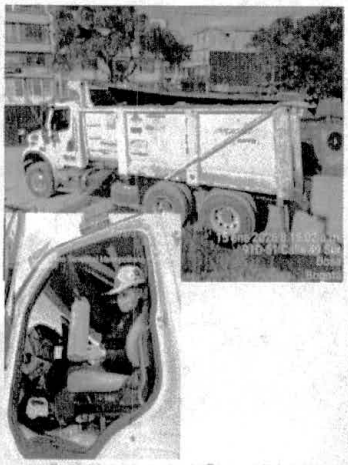

Inspección de vehículos

Inspección de vehículo Volqueta de transporte de RESPEL Operador Logístico VEOLIA, verificando buen carpado y kit de emergencias







Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores




Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas un total de 9 jornadas de monitoreo e frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER04
Reducción del Riesgo ER04-ER16


BOGOTÁ









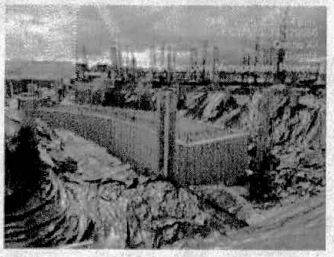

Inspección de taludes

Recorrido con el área técnica para verificar estabilidad de taludes posterior al temblor reportado a las 2:40 am, escala 5.0 con epicentro en la mesa de los Santos.

Protección de taludes

Mejoramiento de protección de taludes con polietileno, junto con jornada de orden y aseo en bermas de taludes





Inspeccion Preventiva

Recorrido con la Subdirección de riesgos de Bomberos de Bogotá, Verificar el estado y altura de la cobertura vegetal, alerta que anuncio el IDEAM ante la comisión de incendios forestales.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ


COMPONENTE SST

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROMEDIO PERSONAL


BOGOTÁ


REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	**PROMEDIO 12/01/26 - 18/01/26**
PROFESIONALES	28
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	5
SUPERVISOR/ENCARGADOS	2
OFICIALES	27
AYUDANTES	35
HERREROS	15
OPERADORES	8
BACHEROS	2
CONDUCTORES	1
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**131**

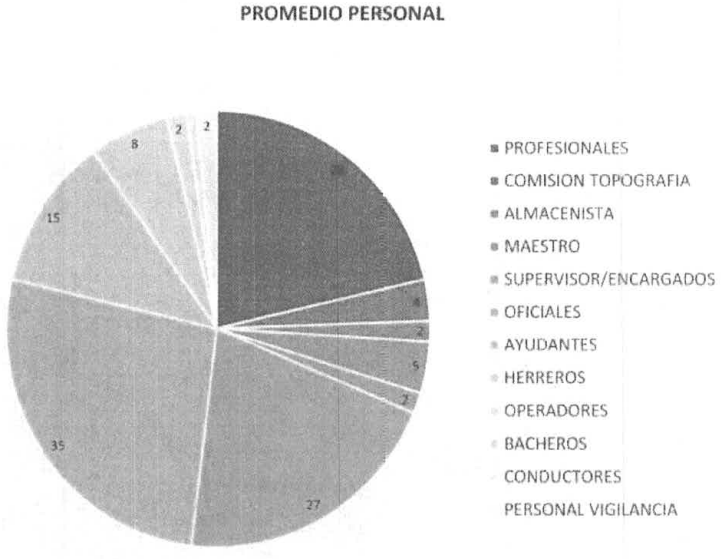

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

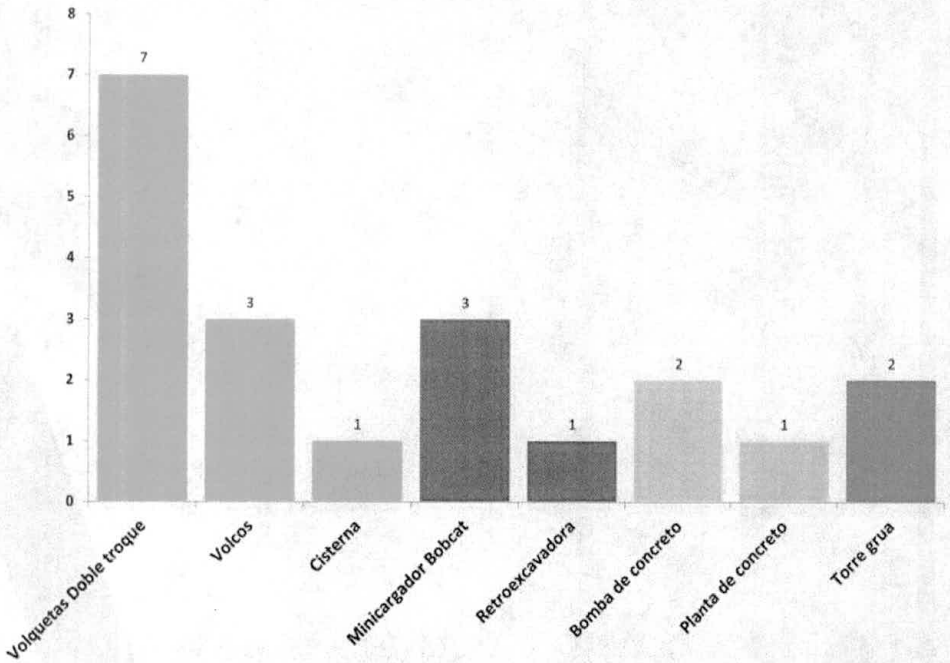


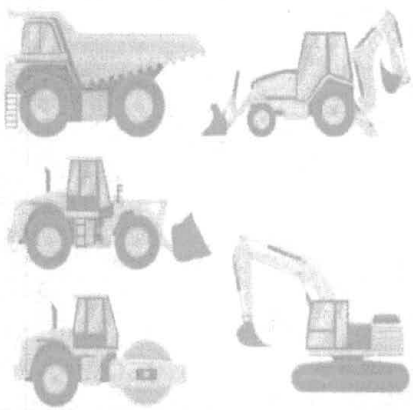


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

Identificación de andamios

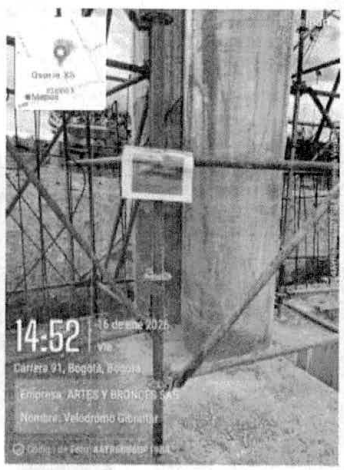

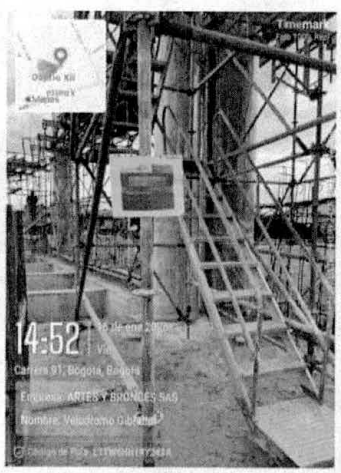

Instalacion de guayas para asegurar andamios viga aerea



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion EPP en excavaciones



Orden y Aseo

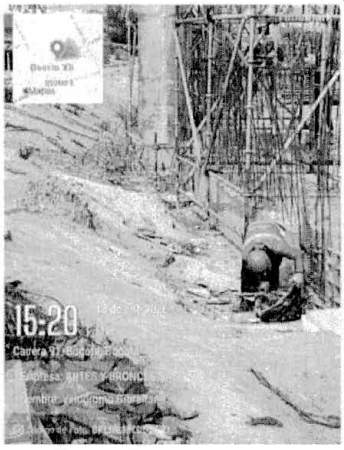



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion trabajo en alturas






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inducción y capacitación al personal

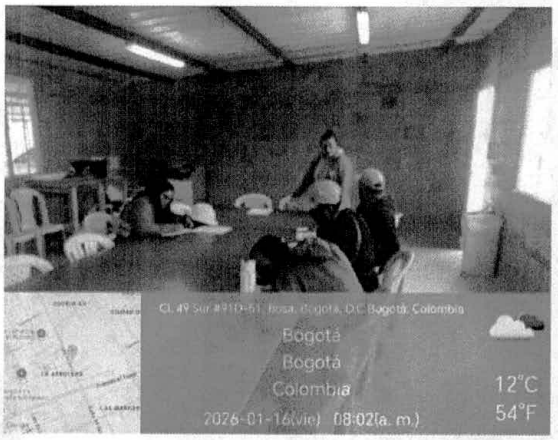



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

HALLAZGO

Plataforma de acceso sin barandas






ATENCION



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

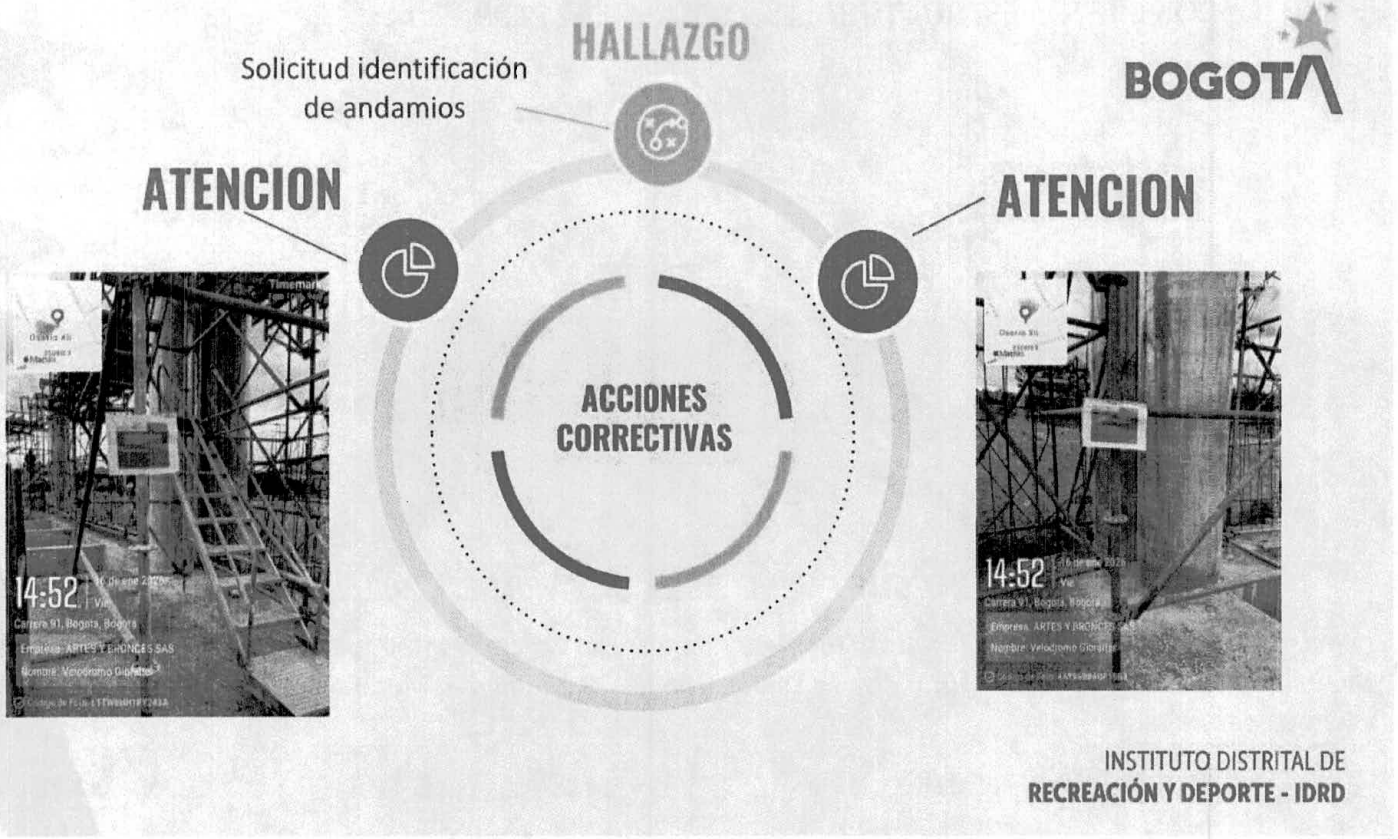

AQUÍ SÍ PASA BOGOTA MI CIUDAD MI CASA


BOGOTA

Componente

De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2499,73 m3

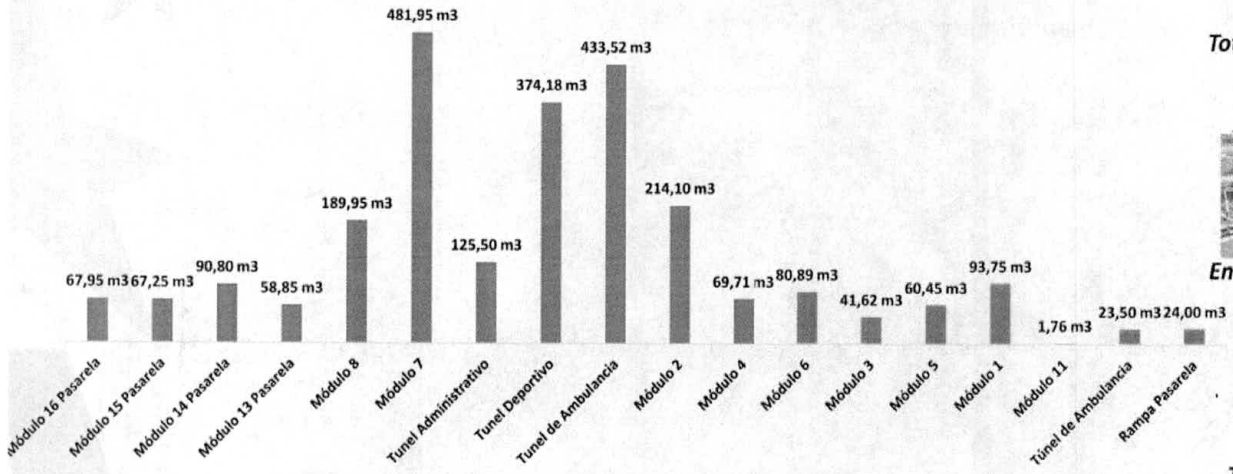

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana

120,25 m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673



TOTAL SEMANA DEL 12 DE ENERO AL 18 DE ENERO DE 2026.

Concreto Estructural: *120,25* m3 **Muros** (Túnel de Ambulancia) **Columnas (**Módulo 2, Módulo 4, Módulo 5, Módulo 7 y Módulo 16) y **Vigas y Dados** (Módulo 1, Módulo 5, Módulo 6, Módulo 16 y Rampa pasarela)


CEMEX **66,00 m3** *55%*

ALTARA **54,25 m3** *45%*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Control de Aceros allegados al proyecto

Total **471,06 Ton**

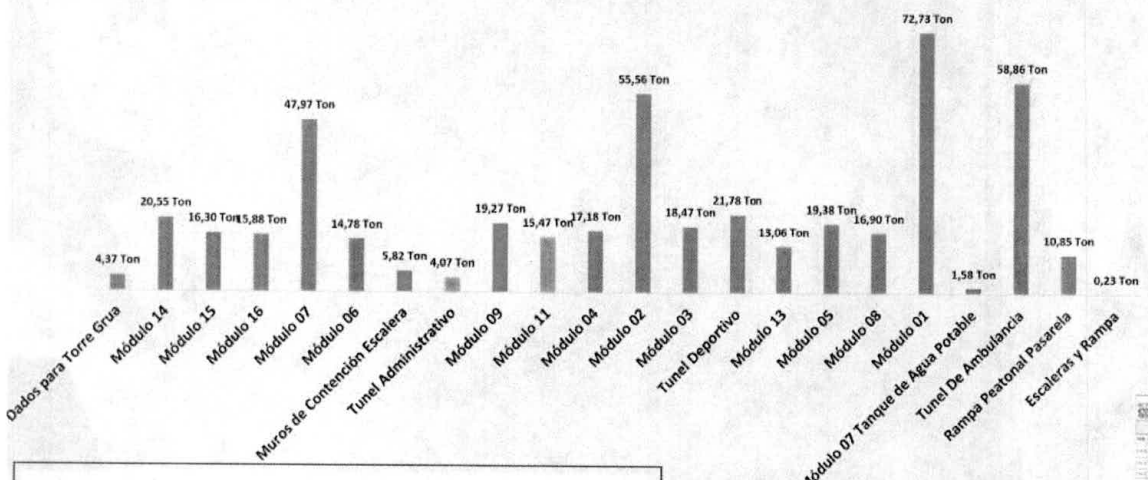

BOGOTÁ


CERTIFICADOS DE CALIDAD





Del 12 de Enero al 18 de Enero de 2025


No hubo ingreso de Acero de Refuerzo a obra

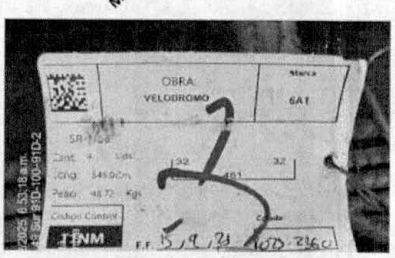

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-2	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	PVC2	9586TA67A-0	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
					Total	26 Unds		Total	230,88 Ton





CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 12 al 18 de Enero de 2026:

2 Unds para **22,19 Ton**

TOTAL : 230,88 TON.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-2036 mediante CIG-IDRD-VEL-0020-2026 del 13 de enero de 2026	Contratista
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 22 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*)	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 22/01/2026,	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


AVANCE GENERAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.325,093	2.614,237	0,00 % 31,40 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
25.242,36	6.233,36	0,00 % 24,69 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
20.459,34	5.534,18	0,00 % 27,05 % 100,00 %

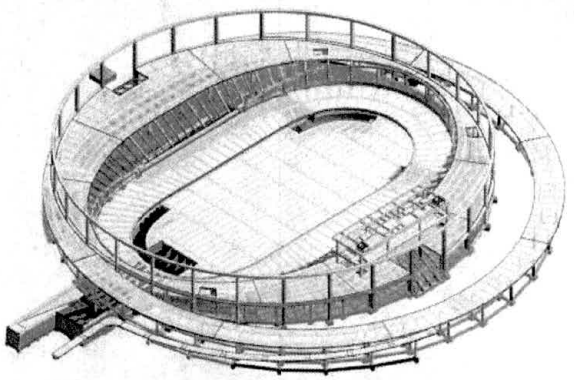

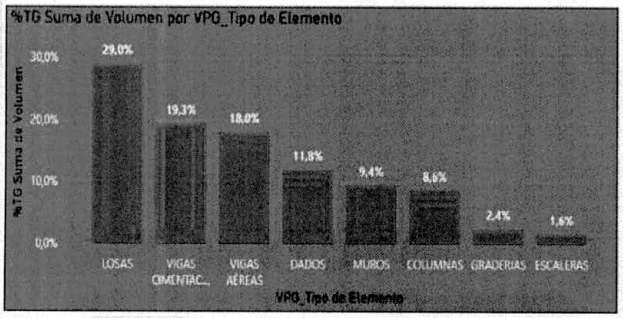

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ DADOS	☐ 9/01/25	☐ Módulo 01
☐ ESCALERAS	☐ 3/10/25	☐ Módulo 02
☐ GRADERIAS	☐ 6/10/25	☐ Módulo 03
☐ LOSAS	☐ 9/10/25	☐ Módulo 04
☐ MUROS	☐ 11/10/25	☐ Módulo 05
☐ RAMPAS	☐ 16/10/25	☐ Módulo 06
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 20/10/25	☐ Módulo 07
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 24/10/25	☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	177,074	0,00 % 23,48 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	0,00 % (En blanco) 100,00 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	269,85	0,00 % 17,40 % 100,00 %

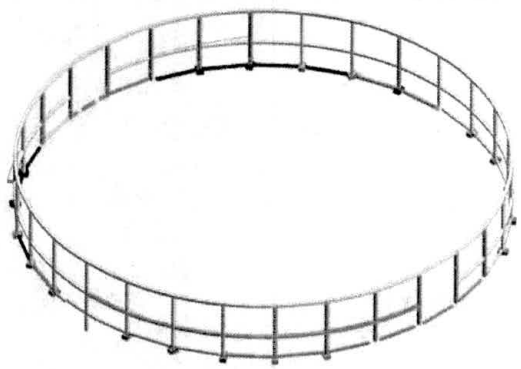

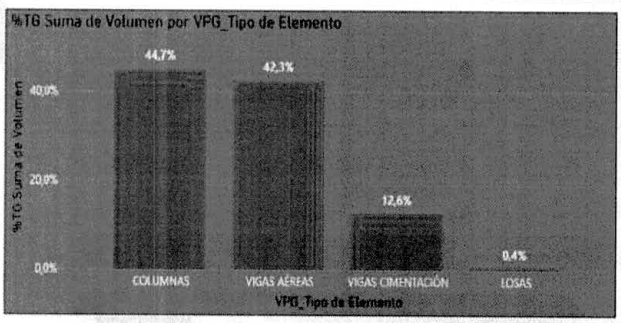

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ LOSAS	☐ 19/12/25	■ Módulo 01
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 20/12/25	☐ Módulo 02
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 22/12/25	☐ Módulo 03
	☐ 23/12/25	☐ Módulo 04
	☐ 29/12/25	☐ Módulo 05
	☐ 2/01/26	☐ Módulo 06
	☐ 6/01/26	☐ Módulo 07
	☐ 15/01/26	☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 2


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
842,755	337,607	0.00 % 40.06 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.919,30	1.342,23	0.00 % 45.98 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.846,24	255,00	0.00 % 13.81 % 100.00 %

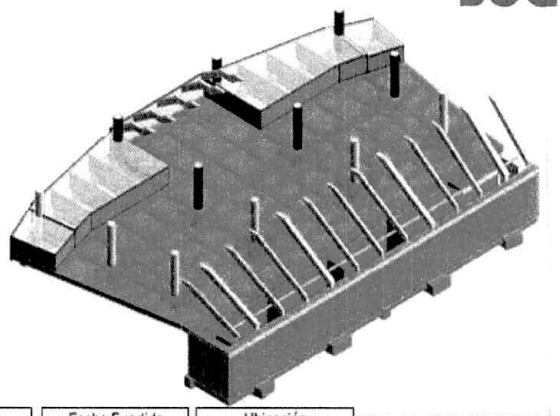

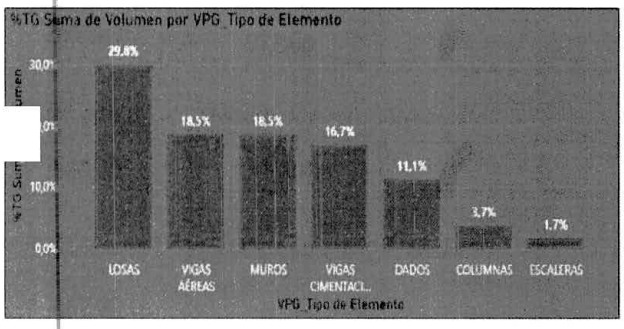

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
9/01/25
11/11/25
13/11/25
20/11/25
26/11/25
28/11/25
5/12/25
6/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 4


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
265,440	57,086	0.00 % 21.51 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
860,39	311,24	0.00 % 36.17 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
862,92	32,30	0.00 % 3.74 % 100.00 %

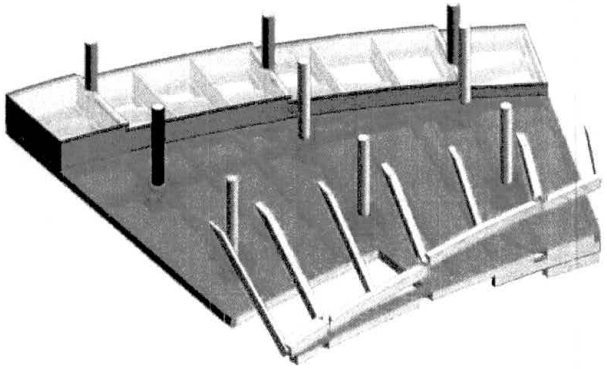

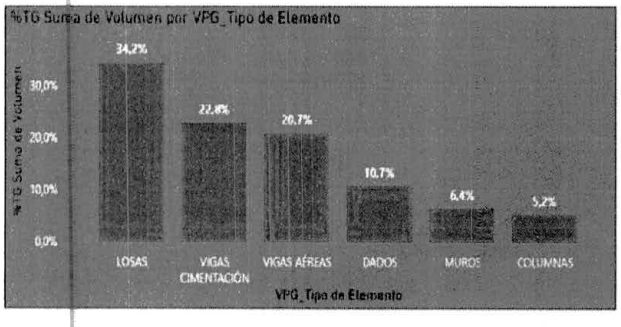

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
19/11/25
22/11/25
17/12/25
23/12/25
15/01/26

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 5


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
323,012	63,583	0,00 % 19,68 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
836,86	325,32	0,00 % 38,87 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
964,77	36,00	0,00 % 3,73 % 100,00 %

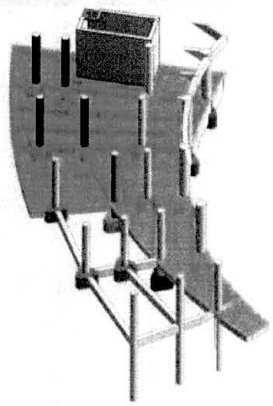

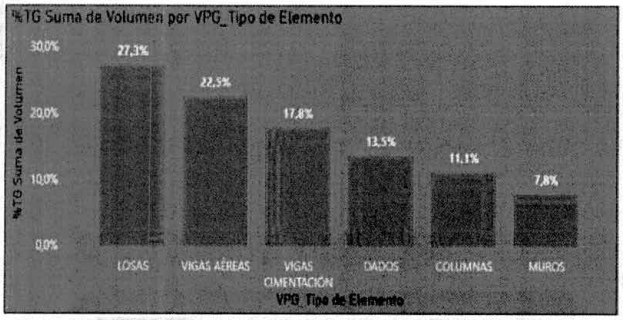


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 6/12/25
☐ 9/12/25
☐ 13/12/25
☐ 16/12/25
☐ 24/12/25
☐ 30/12/25
☐ 10/01/26
☐ 13/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
■ Módulo 05
☐ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 6


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
318,075	57,809	0,00 % 18,17 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
839,01	253,47	0,00 % 30,21 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.055,70	22,10	0,00 % 2,09 % 100,00 %

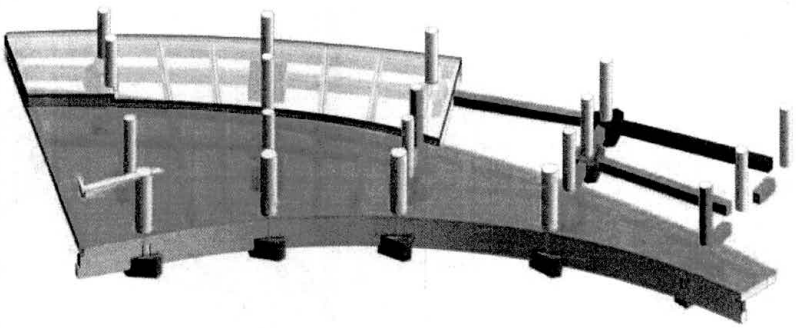

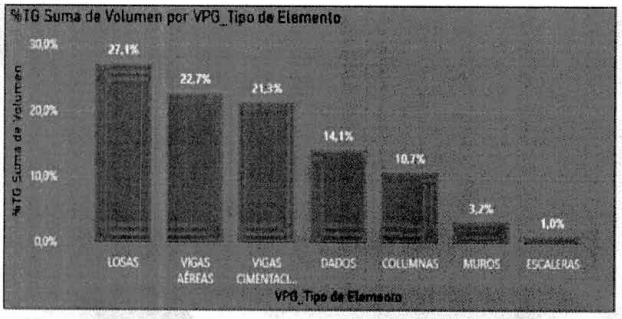


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 15/11/25
☐ 19/11/25
☐ 22/11/25
☐ 24/11/25
☐ 17/12/25
☐ 29/12/25
☐ 31/12/25
☐ 5/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
■ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	279,275	31.06 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	40.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.488,74	132,82	5.34 %

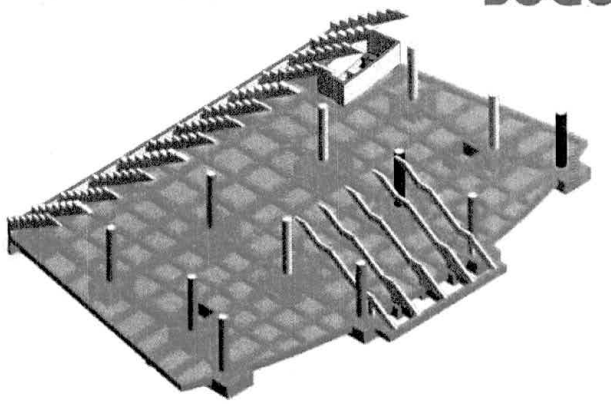

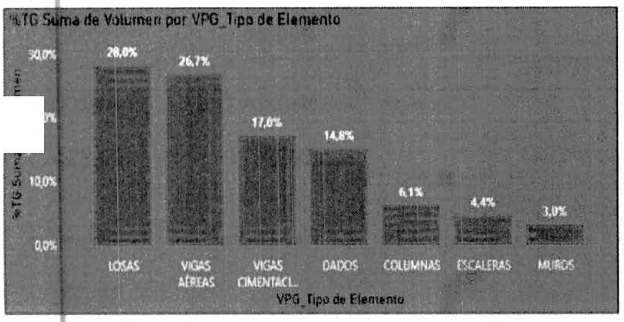


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 20/11/25
☐ 22/11/25
☐ 25/11/25
☐ 26/11/25
☐ 10/12/25
☐ 12/12/25
☐ 15/12/25
☐ 18/12/25

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
☐ Módulo 06
■ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODCS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 16 - PASARELA


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
167,936	59,646	35.52 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
425,65	36,24	8.51 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
683,60	293,44	42.93 %

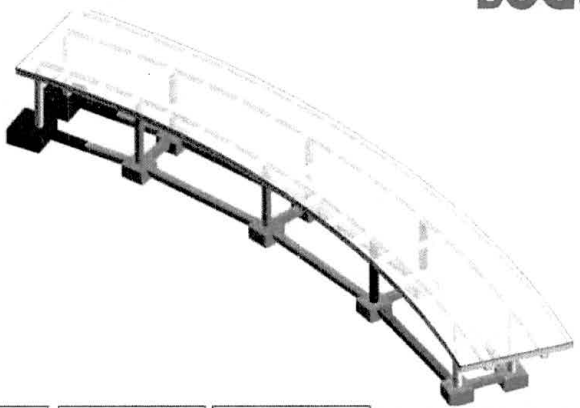

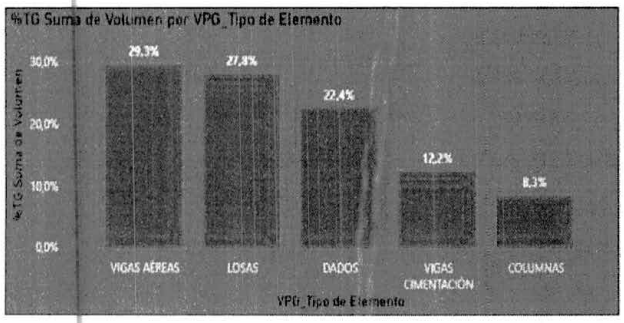


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 3/10/25
☐ 6/10/25
☐ 29/10/25
☐ 23/12/25
☐ 27/12/25
☐ 31/12/25
☐ 3/01/26
☐ 5/01/26

Ubicación
☐ Módulo 10
☐ Módulo 11
☐ Módulo 12 - Pas...
☐ Módulo 13 - Pas...
☐ Módulo 14 - Pas...
☐ Módulo 15 - Pas...
■ Módulo 16 - Pas...
☐ Pista
☐ Rampa Peatonal

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA

RAMPA DE PASARELA


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
142,135	39,503	0,00 % 27,79 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
573,49	6,80	0,00 % 1,19 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
152,99	41,69	0,00 % 27,25 % 100,00 %



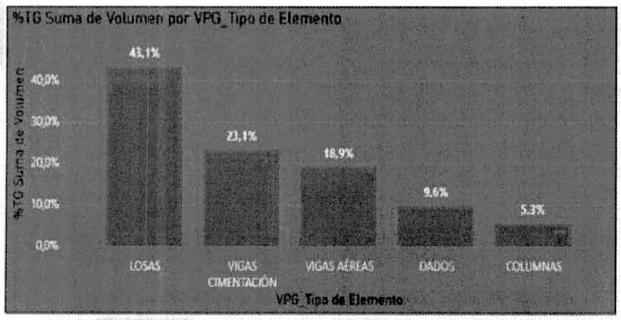


Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- LOSAS
- VIGAS AÉREAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 11/11/25
- 14/01/26
- 16/01/26

Ubicación
- Módulo 10
- Módulo 11
- Módulo 12 - Pas...
- Módulo 13 - Pas...
- Módulo 14 - Pas...
- Módulo 15 - Pas...
- Módulo 16 - Pas...
- Pista
- Rampa Peatonal

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
644,624	466,956	0,00 % 72,44 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.585,58	1.357,21	0,00 % 52,49 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
986,63	793,34	0,00 % 80,41 % 100,00 %

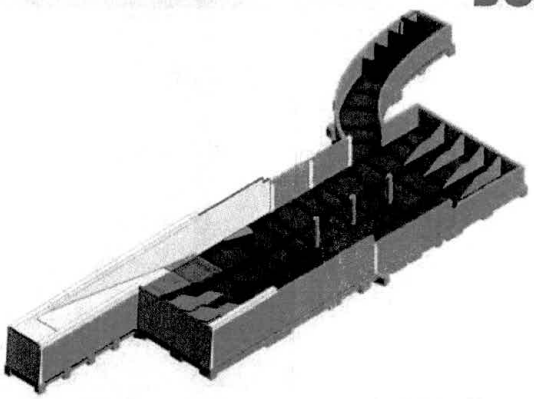

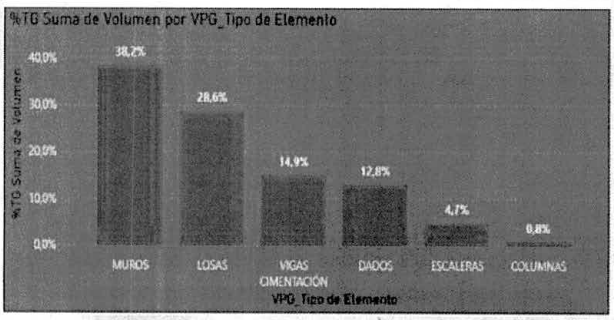


Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- ESCALERAS
- LOSAS
- MUROS
- RAMPAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 16/10/25
- 11/11/25
- 19/11/25
- 20/11/25
- 28/11/25
- 12/12/25
- 13/12/25
- 16/12/25

Ubicación
- Módulo 15 - Pas...
- Módulo 16 - Pas...
- Pista
- Rampa Peatonal
- Torre grúa
- Túnel Administra...
- Túnel de Ambula...
- Túnel Deportivo
- Zona Central

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. Pendiente respuesta UTMP.	UTMP	15/01/2026	PENDIENTE
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP - IDRD de acuerdo al valor a ser adicionado.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025	CUMPLIDO
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Ítem Suministro e Instalación).(*) Pendiente Respuesta IDRD. esto se tendrá una vez se ejecute visita el día 16/01/2025 al subcontratista de la membrana por parte del IDRD-CIG-UTMP.	UTMP – CIG - IDRD	16/01/2025	PENDIENTE

(*) Rad. IDRD No 20252100566762 del 18/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026


REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 83.949.928.703	56,80%
% EJECUCIÓN	$ 77.906.159.140	52,72%
% COSTO	$ 77.906.159.140	52,72%

AVANCE	-4,08%

17/01/2026 **programación v3**

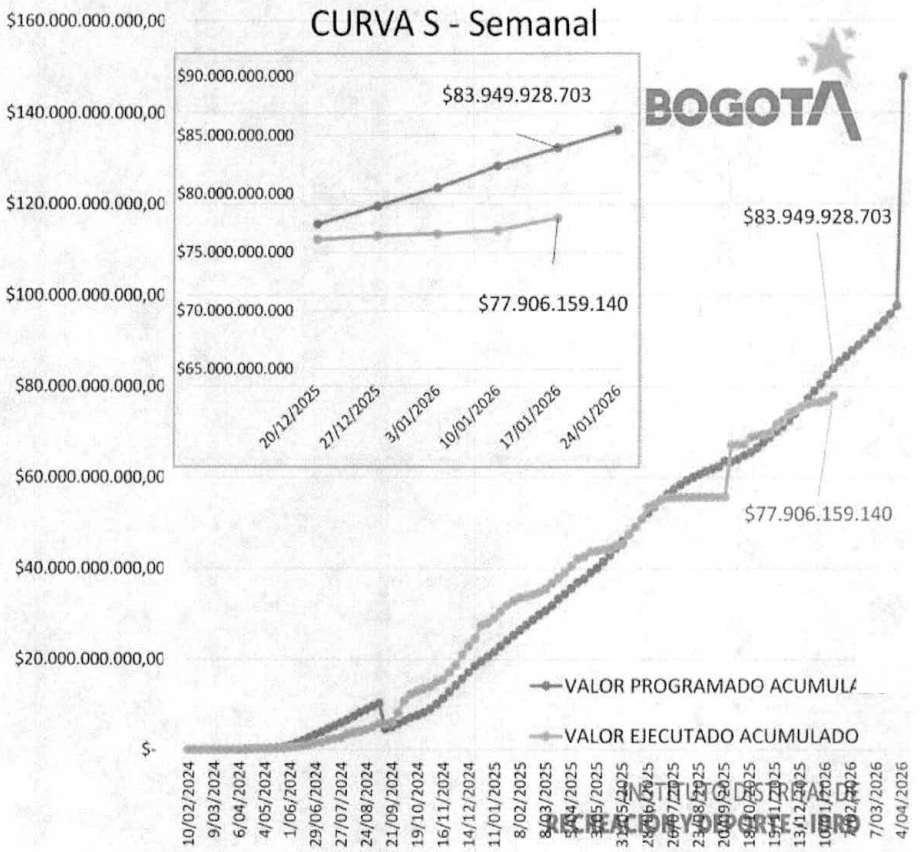

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
FE -023	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE -024	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO


MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

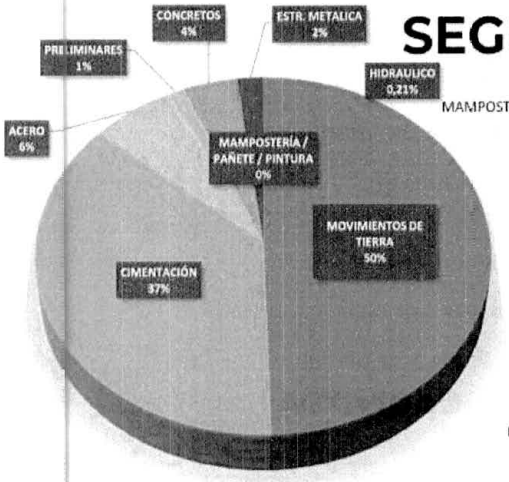

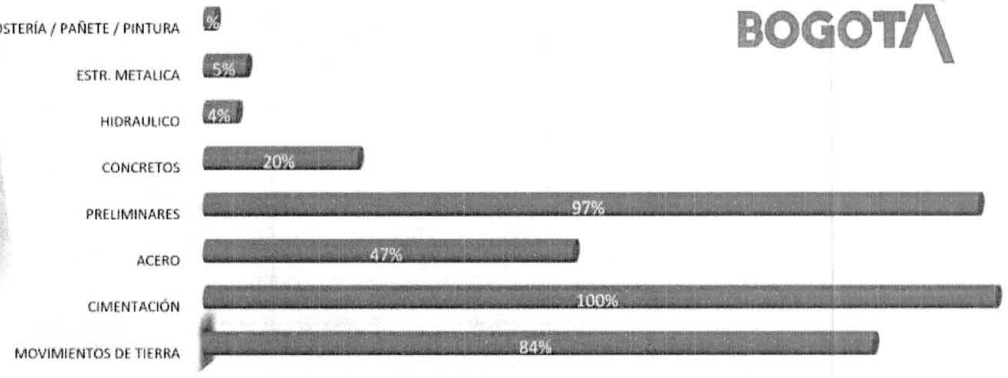

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METALICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	**$ 61.010.761.815,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.868.397.139,00**	**$ 6.285.143.403,00**	**$ 72.523.644.111,00**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA
	IMPERMEABILIZACION MUROS DE CONTENCION CON IGOL IMPRIMANTE + IGOL DENSO O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, EQUIPOS, TRASIEGO, MANO DE OBRA).	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULOS 1, 2, 4, 5 Y 6	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 100 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

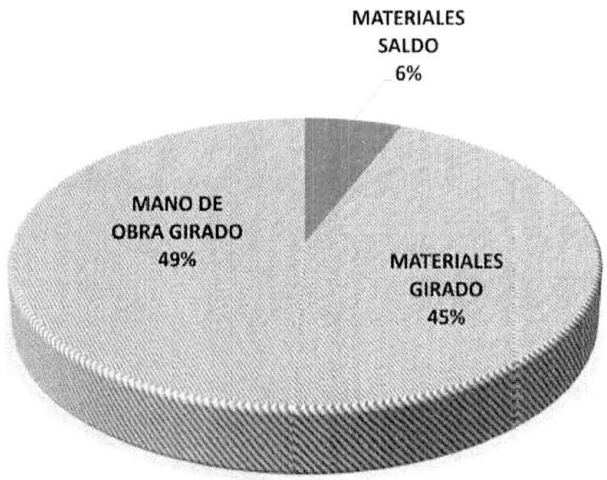

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORMES INTERVENTORIA

	COMPONENTE								Periodo		ACTAS PARCIALES	
Informe No	Técnico	Fauna	Forestal	SST	Social	Ambiental	Calidad	Mes	Desde	Hasta	OBRA	INTERVENTORIA
18	PR-IDRD	Sub. CIG	OK	OK	OK	OK	Obs. IDRD	jun-25	26/06/2025	25/07/2025	Pag.	PT-CIG
19	PR-IDRD	Sub. CIG	OK	OK	OK	Sub. CIG	PR-IDRD	jul-25	26/07/2025	25/08/2025	Pag.	PT-CIG
20	PR-IDRD	Obs. IDRD	Sub. CIG	PR-IDRD	OK	Sub. CIG	PR-IDRD	ago-25	26/08/2025	25/09/2025	Pag.	PT-CIG
21	PR-IDRD	PR-IDRD	Obs. IDRD	PR-IDRD	OK	Obs. IDRD	PR-IDRD	sep-25	26/09/2025	25/10/2025	Pag.	PT-CIG
22	PR-IDRD	PR-IDRD	PR-IDRD	PR-IDRD	OK	PR-IDRD	PR-IDRD	oct-25	26/10/2025	25/11/2025	Pag.	PT-CIG
23	PR-IDRD	PR-IDRD	PR-IDRD	PR-IDRD	OK	PR-IDRD	PR-IDRD	nov-25	26/11/2025	25/12/2025	Trami.	PT-CIG
24	PR-IDRD	PR-IDRD	PR-IDRD	PR-IDRD	OK	PR-IDRD	PR-IDRD	dic-25	26/12/2025	25/01/2026	Trami.	PT-CIG

22/01/2026

PR-IDRD	Pendiente revision IDRD
Sub. CIG	Subsanado CIG
Obs. IDRD	Observado IDRD
OK	Aprobado IDRD

Pag.	Pagada
Trami.	Tramitada
PT-CIG	Pendiente por tramitar

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


BOGOTÁ


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (*) pendiente respuesta y/o tramite respectivo.	UTMP-CIG-IDRD	Sin fecha	PENDIENTE
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. Se espera respuesta por parte del IDRD a reconocimiento planteado según radicados (**). Se tuvo visita 16/01/2026.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)


MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA
Visita a Castro Rojas – IDRD-INTERVENTORIA-CONTRATISTA



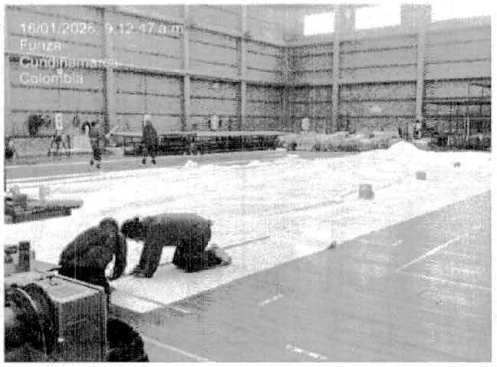

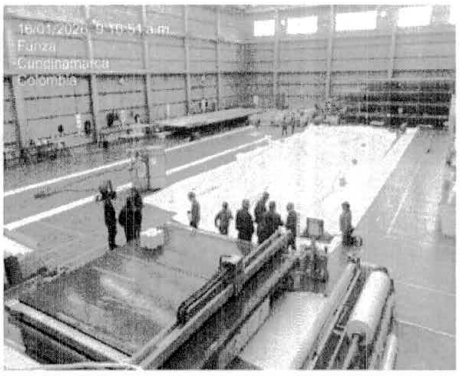




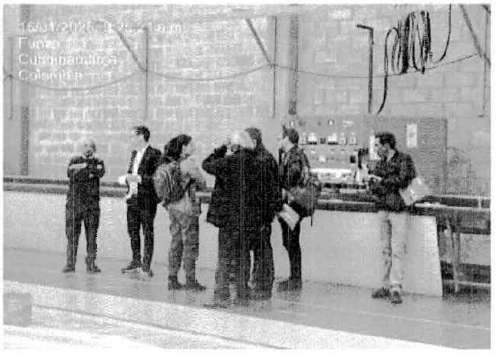

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA
PÁNELES CANALES Y FALDON (m2)

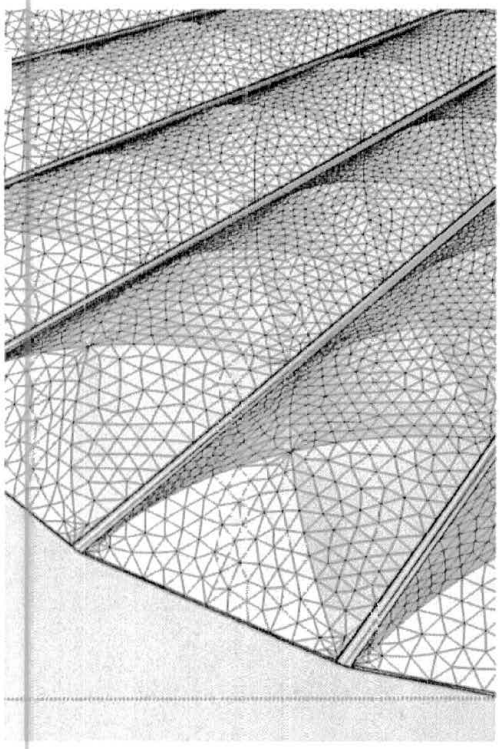

ÁREAS DE MEMBRANA

	ÁREA (m2)	Cálculo
1) Páneles de Membrana Principal		
- Modelo	10.230,00	341x30
- Sellos entre patrones	412,08	343.4x0.04x30
- Faldones Perimetrales	547,02	101.3x0.18x30
2) Canales		
- Modelo	1.054,80	35.16x30
- Sellos a membrana principal	104,18	2x43.41x0.04x30
3) Faldones a Viga Canal		
- Modelo	89,70	2.99x30
- Sellos a membrana principal	14,65	12.21x0.04x30

ÁREA TOTAL= **12.452,43** m2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	27,09 Ton
ene-26	05 de Enero al 11 de Enero de 2026	11,33 Ton
ene-26	12 de Enero al 18 de Enero de 2026	9,15 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	275,47 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***275,47 Ton***


TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE PCC: **25,34%**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-2	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	PVC2	9586TA67A-0	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
					Total	26 Unds		**Total**	230,88 Ton





CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 12 al 18 de Enero de 2026:

2 Unds para **22,19 Ton**


TOTAL : 230,88 TON.


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS TUNEL DEPORTIVO

BOGOTÁ



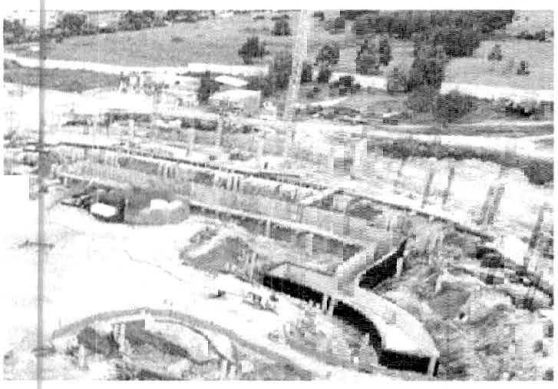

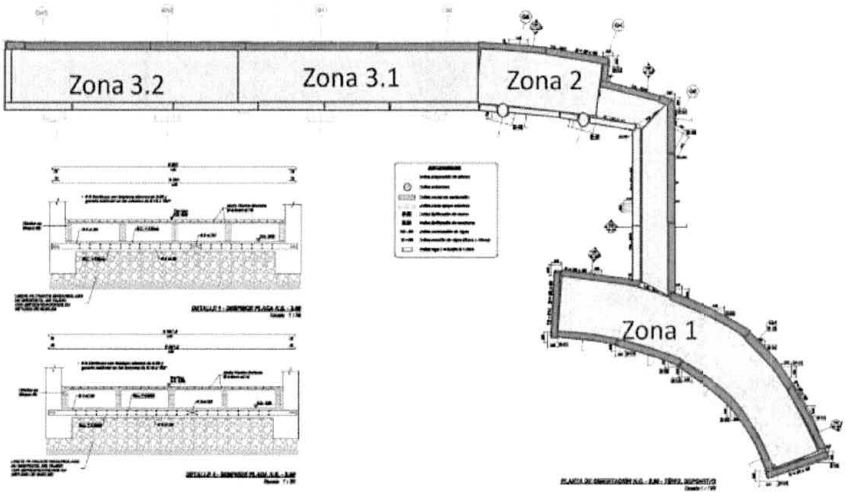

Zona Impermeabilizada Previamente


Zona Impermeabilizada en el Periodo

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 18 al 20

BOGOTÁ



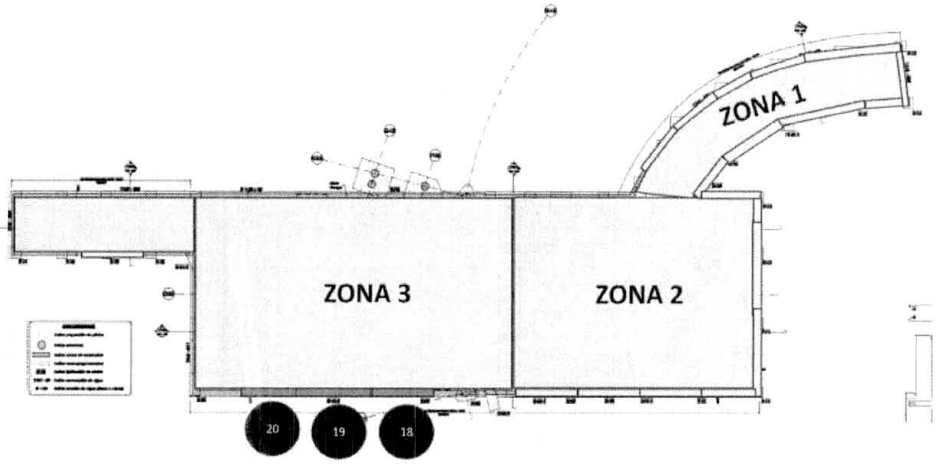


Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL
DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

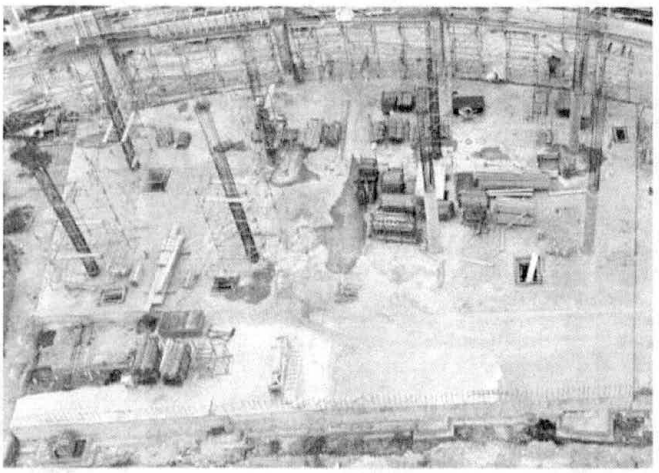

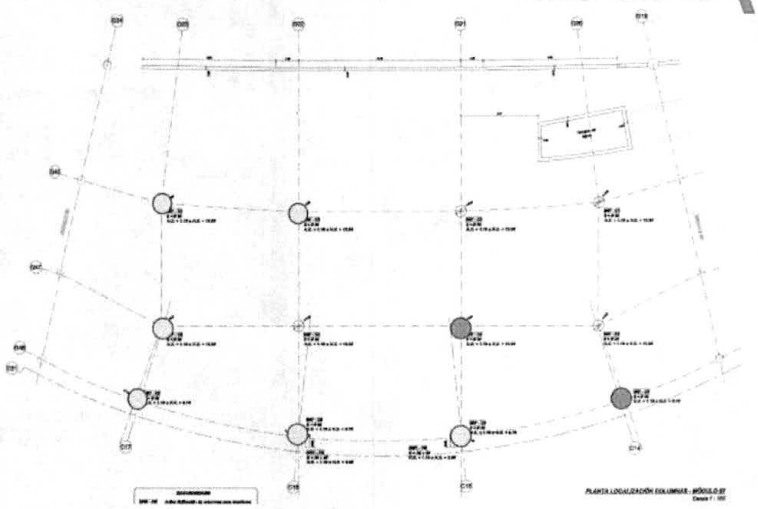

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS Y DADO MÓDULO 5

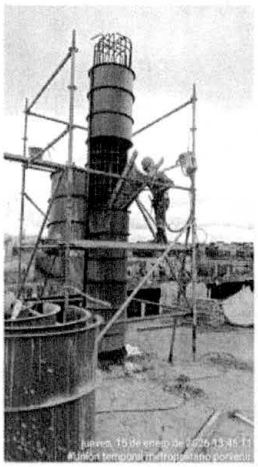



Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo


PLANO M5 – E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 2 – ZONA DE EDIFICIO

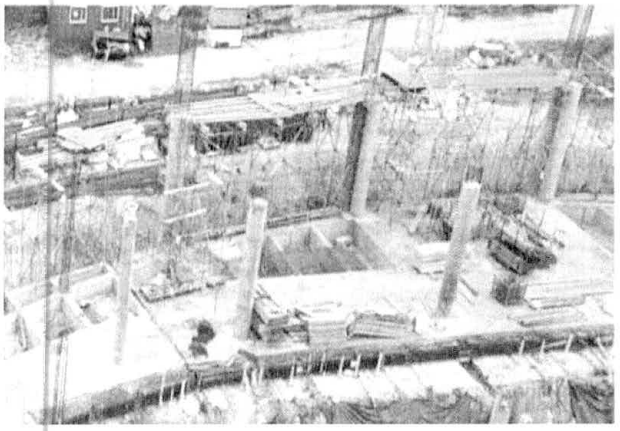

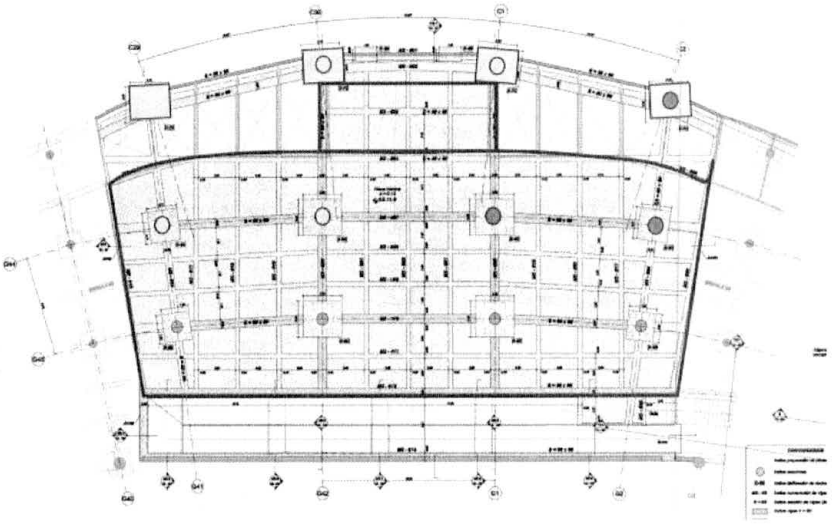

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo


PLANO M2 – E02 PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19
MÓDULO 2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS DE CUBIERTA Y VIGA AEREA MÓDULO 1



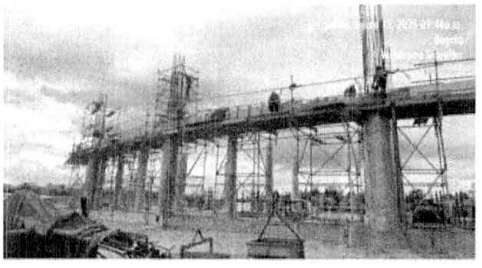

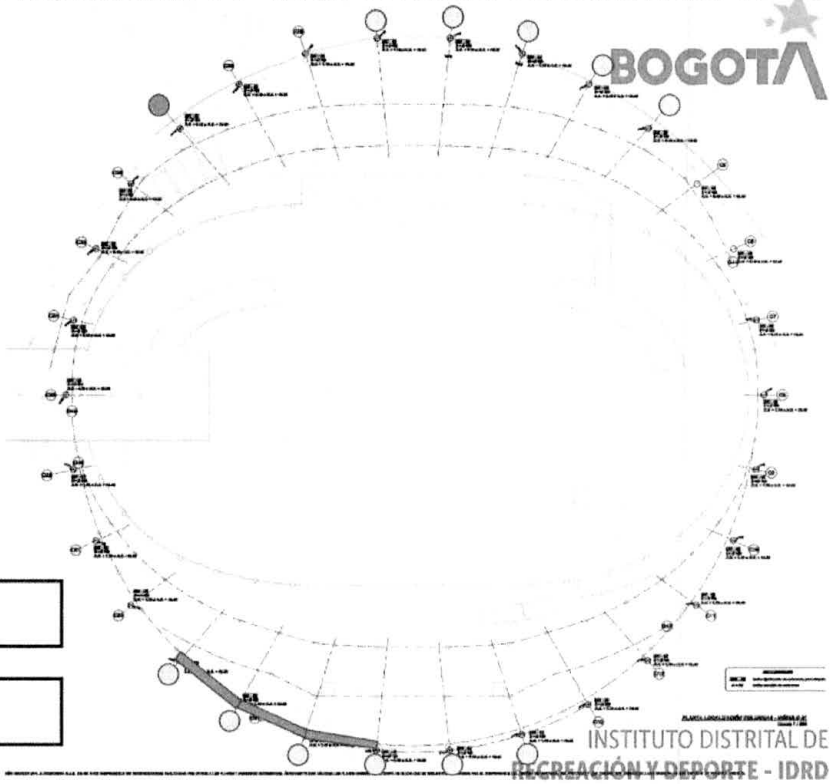


Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNA– MÓDULO 4

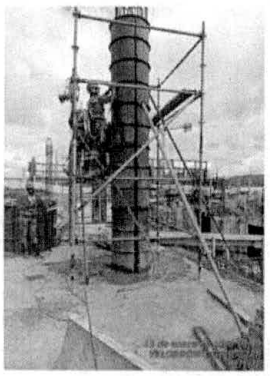

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo



PLANO M4 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 Y LOCALES – MÓDULO 04


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS, VIGAS Y COLUMNAS MÓDULO 16 – ZONA DE PASAREL A

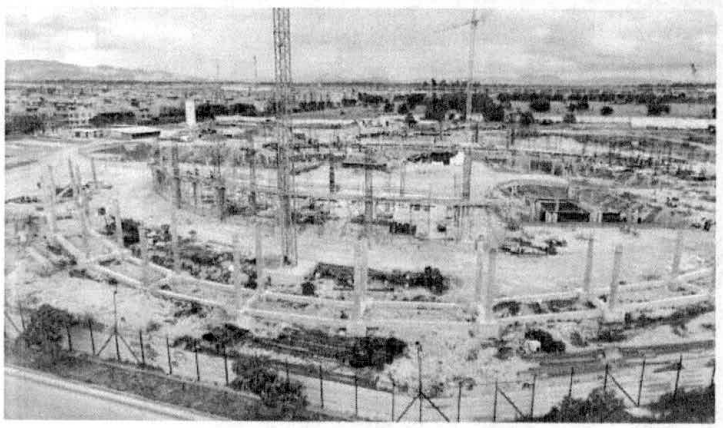

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

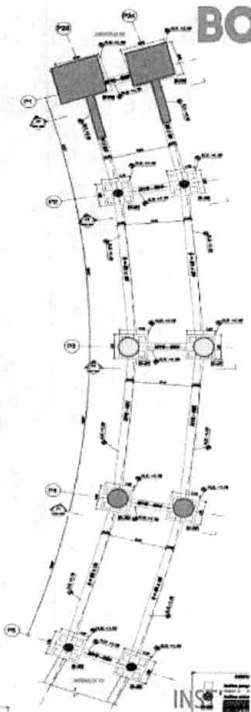

PLANO M16-E01
PLANTA ESTRUCTURALES MÓDULO 16 -PASARELA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS, VIGAS MÓDULO 6– ZONA DE EDIFICIO

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo






PLANO M6-E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 6


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS, VIGAS RAMPA PEATONAL – TRAMOS 1 Y 2

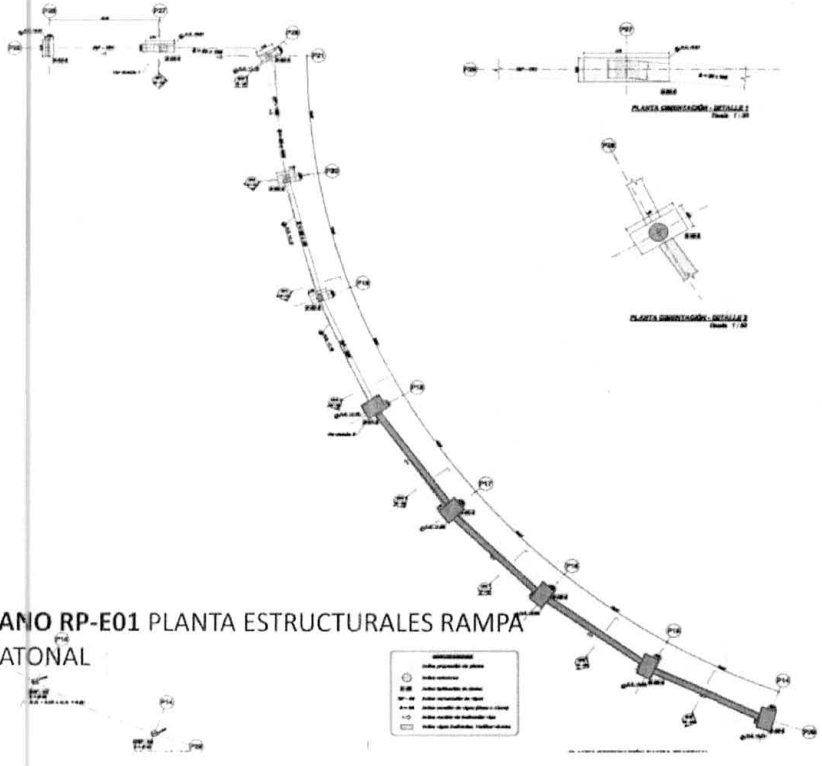

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

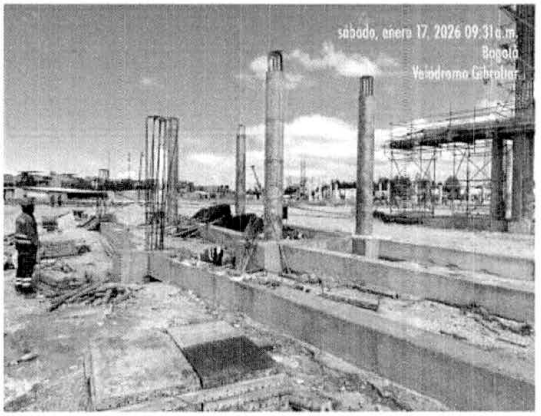

PLANO RP-E01 PLANTA ESTRUCTURALES RAMPA PEATONAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

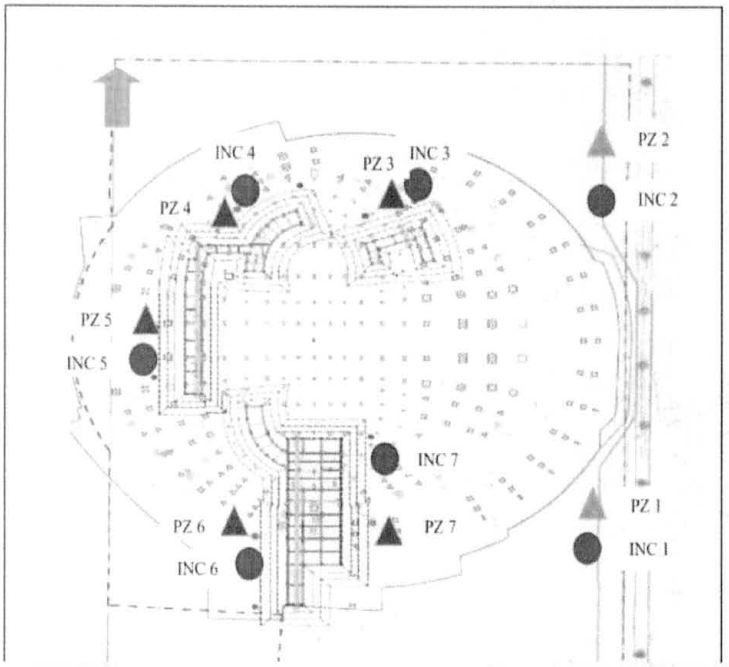

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 05 al 09 de enero de 2026; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.20 m y 8.90 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 3 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.33 y 6.23 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 16 DE ENERO DE 2026

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO PARCIAL	ASENTAMIENTO ACUMULADO	DESCRIPCION	
N-1	2541,663	0,003	0,002	PARAMENTO	
N-2	2541,662	0,004	0,014	PARAMENTO	
N-3	2541,599	0,002	0,003	PARAMENTO	
N-4	2542,431	0,060	-0,018	CERRAMIENTO	
N-5	2542,218	0,000	0,013	CERRAMIENTO	
N-6	2543,939	-0,001	-0,021	CERRAMIENTO	
N-7	2543,960	-0,001	0,013	CERRAMIENTO	
N-8	2543,814	-0,001	0,018	CERRAMIENTO	
N-9	2544,446	-0,001	0,011	CERRAMIENTO	
N-10	2547,607	0,001	-0,029	CERRAMIENTO	
N-11	2546,929	0,001	-0,024	CERRAMIENTO	
MA-12	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-13	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-14	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-15	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-16	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-17	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-18	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-19	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-20	2542,183	-0,005	-0,013	PERIMETRO	
P-21	2541,007	0,001	0,007	BORDILLO	
P-22	2540,973	0,001	0,010	BORDILLO	
N-23	2541,603	0,000	0,010	PARAMENTO	
P-24	2540,724	0,000	0,003	SUMIDERO	
P-25	2540,982	0,001	0,012	POZO	
P-26	2540,963	0,003	0,013	POZO	
P-27	2540,707	0,002	0,017	SUMIDERO	
P-28	2540,719	0,000	-0,004	POZO	
P-29	2540,953	0,002	0,018	POZO	
P-30	2540,672	0,001	0,017	SUMIDERO	
N-31	2541,575	-0,004	0,007	PARAMENTO	
P-32	2540,989	0,003	0,010	BORDILLO	
P-33	2541,052	0,001	0,011	BORDILLO	
N-34	2541,548	0,004	0,012	PARAMENTO	
N-35	2540,870	0,003	0,003	PARAMENTO	
P-36	2541,090	0,000	0,011	BORDILLO	
P-37	2541,135	0,001	0,014	BORDILLO	
N-38	2542,147	0,000	0,013	REJAS PARQUE	
N-39	2542,287	-0,002	0,011	REJAS PARQUE	
P-40	2541,170	0,000	0,016	BORDILLO	
P-41	2541,194	0,000	0,018	BORDILLO	
N-42	2541,671	0,001	0,018	PARAMENTO	
N-43	2541,595	0,000	0,011	PARAMENTO	
P-44	2541,199	0,000	0,024	BORDILLO	
P-45	2540,986	0,000	0,020	POZO	
P-46	2540,939	0,000	0,019	POZO	
P-47	2541,160	0,000	0,021	BORDILLO	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 16 DE ENERO DE 2026

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO PARCIAL	ASENTAMIENTO ACUMULADO	DESCRIPCION	
N-48	2541,565	0,000	0,010	PARAMENTO	
N-49	2541,594	0,001	0,013	PARAMENTO	
P-50	2541,107	0,001	0,013	BORDILLO	
P-51	2541,079	0,001	0,010	BORDILLO	
N-52	2541,487	0,002	0,017	PARAMENTO	
P-53	N/A	N/A	N/A	BORDILLO	PERDIDA
P-54	2541,184	0,000	-0,005	ANDEN	
N-55	2541,747	0,002	-0,003	PARAMENTO	
P-56	2540,859	0,000	-0,001	ANDEN	
N-57	2541,735	-0,001	-0,005	PARAMENTO	
P-58	2541,002	0,002	-0,001	ANDEN	
P-59	2540,732	0,001	0,001	ANDEN	
N-60	2541,346	0,002	0,005	PARAMENTO	
N-61	2540,674	0,002	0,006	PARAMENTO	
P-62	2540,548	0,001	0,005	ANDEN	
C-63	2541,912	0,002	-0,001	[illegible]	
C-64	2541,759	0,000	-0,003	[illegible]	
C-65	2541,594	0,000	-0,001	[illegible]	
C-66	2541,616	0,001	-0,002	[illegible]	
C-67	2541,654	0,001	-0,002	[illegible]	
C-68	2541,712	-0,001	-0,001	[illegible]	
C-69	2541,721	0,005	0,008	[illegible]	
C-70	2541,679	-0,001	0,007	[illegible]	
C-71	2541,812	-0,001	0,002	[illegible]	
C-72	2541,950	-0,001	-0,001	[illegible]	
C-73	2542,090	-0,001	-0,005	[illegible]	
C-74	2542,226	-0,002	-0,004	[illegible]	
C-75	2541,657	-0,001	0,011	[illegible]	
C-76	2541,717	-0,002	0,017	[illegible]	
C-77	2541,721	-0,001	0,051	[illegible]	
C-78	2541,769	-0,001	0,016	[illegible]	
C-79	2541,757	-0,002	0,012	[illegible]	
C-80	2541,731	0,000	0,014	[illegible]	
C-81	2541,737	-0,001	0,013	[illegible]	
C-82	2541,738	-0,002	0,016	[illegible]	
C-83	2541,677	-0,001	0,002	[illegible]	
C-84	2541,662	0,000	0,008	[illegible]	
P-85	2540,990	0,001	0,027	PARQUE	
P-86	2541,006	-0,001	0,011	PARQUE	
P-87	2540,908	-0,005	-0,011	PARQUE	
P-88	2540,949	0,002	0,009	PARQUE	
P-89	2543,463	0,004	-0,003	TACO 3	
P-90	2543,318	0,003	-0,011	TACO 2	
P-91	2542,221	0,003	-0,011	TACO ADMI	
P-92	2542,224	0,006	-0,004	TACO ADMI	
P-93	2542,452	0,001	[illegible]	TACO APOYO	
P-94	2542,293	-0,004	[illegible]	TACO APOYO	

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
ELÉCTRICO

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


COMPROMISOS

	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
	N-A	N-A	N-A	N-A


CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Durante la semana 12 al 17 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Se verificó en coordinación con interventoría y el área Bim que la puesta a tierra como se había diseñado originalmente no cumple con las condiciones técnicas para garantizar una buena conexión que garantice una buena protección ya que el suelo donde se ubica la subestación tiene condiciones que no cumplen con una buena resistividad.

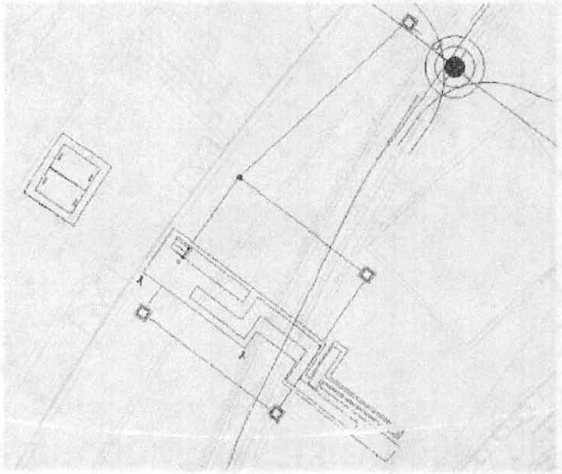

Por ese motivo se decide que la puesta a tierra se instale en la parte exterior sobre el urbanismo ya que en esa parte ya hay tierra negra que garantiza una buena resistividad para que la puesta a tierra cumpla con el requerimiento del retie que exige que debe ser menor a 10 ohmios. En la imagen se presenta el modelo actualizado por Powel contratista de la UTMP.

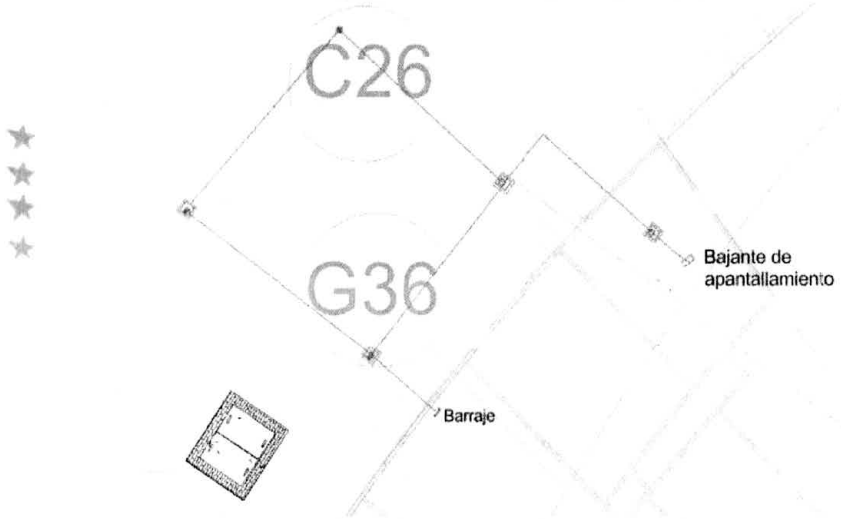

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Componente Hidrosanitario

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revisión interna CIG-IDRD	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 15/01/2025	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización del 100% - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.

REDES HIDROSANITARIAS

BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se continúa con la instalación del tecdrén perimetral del Túnel Administrativo.

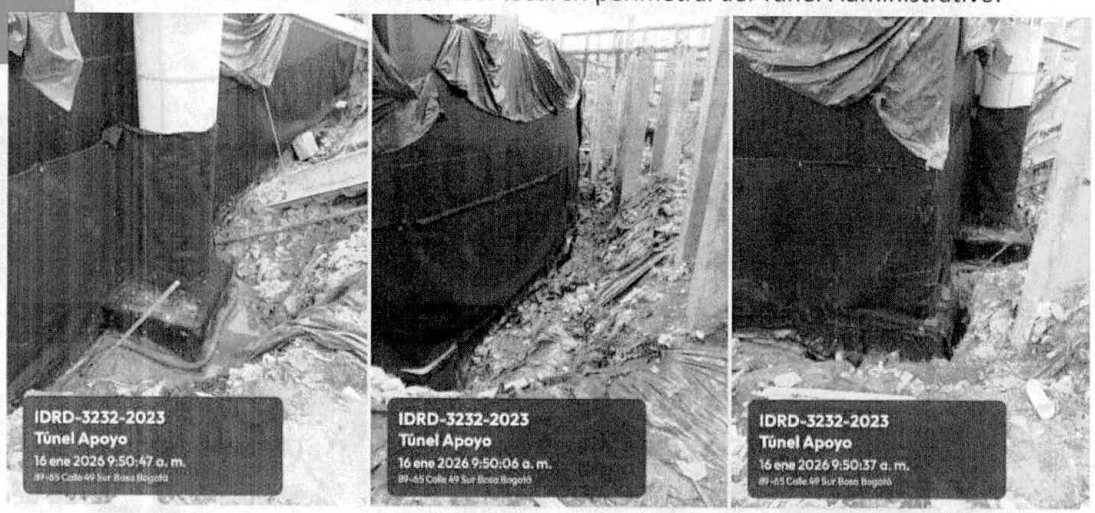

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
GRACIAS
INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Transversales Técnico

FECHA: 22/Enero/2026 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Juan Pablo Villate Diaz	1019010837	Apoyo Sup.	STC.		IDRD	Juan.villate@i.	3147021234
2	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Apoyo. Sup.	STC		IDRD		
3	Ivonn Pérez Tellez	1026279000	Apoy Sup	STC		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	—
4	Lina Johanna Falla Lozano	52.517.090	Apoy. Sup. Amb	STC		IDRD	lina.falla@idrd.gov.co	—
5	Carmen Lucía Vélez Portocarrero	65 777928	Apoyo Sup. S	STC		IDRD	carmen.velez@idrd.gov.co	
6	Alfonso Peñaranda Suarez	80235391	Director	UTMP		UTMP	a.penaranda@cyg.com.co	
7	Katherin Amaya Rios	1016026233	Sub Directora	STC		IDRD		
8	Valentina Soto Gil	1104058689	sub Consv	STC		IDRD		
9	~~Francy~~ Murillo	52968323	Apoy. Sup.	STC		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	
10	Oscar Javier Soto Ortega	80761720	Apoy Sup.	STC		IDRD	oscar.soto@idrd.gov	3005101408
11	Daniela Prieto Rodriguez	1018490798	Apoy sup	STC		IDRD	daniela.prieto@idrd.gov.co	3022972354
12	EDGAR SALAMANCA ESTUPIÑAN	1977971	Coord. TEC. DATV.	C.I.G		C.I.G.	coordinador.velodromo@gmail.com	
13	Rubén D. Crespo. B	19496690	Dtor Interv.	C.I.G.		C I G	directorvelodromo	3103239119
14	Mary luz Ramírez Cortés	52494804	Prof. Socio	CIG		C I G	socivelodromo@gmail.com	3132205745
15	Astrid V. Rojas C.	52952504	Prof. GRD	C16		C16	— — —	3157994552
16	Julian Agudelo Niño.	80767393	R. Ambiental	Interventoría		C1G	—	3202356322
17	Edward A. Condor	80383913	Residente Ing electrico	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290269
18	Dana Morales ORTIZ	1014220067	RES. Social	UTMP		UTMP	social.velodromo@cyg.com.co	3153934187

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.6

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Transversales / Tecnico Velodromo

FECHA: 22/Enero/26 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Samir Arias Sepúlveda	79627743	Prof. Eléctrica	INTERVENTORIA		CIE		
2	Paula Blanco Alarcón	1073383630	Res. Ambiental	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
3	César Fernández Sola	80094419	Residente Social (Entrando)	UTMP		UTMP	Contingencias.velodromo@cyg.com.co	3008662060
4	Armando Rodríguez Tascos	80219815	Residente	Interventoría		CIG		
5	Angela Milena Sánchez	1020739111	Programación	UTMP	UTMP	UTMP	Programacion.velodromo@cyg.com.co	3003522693
6	Andrés Cano R.	1065002731	Prof TIS-ECI	Interventoría		CIG		1065002731
7	Alejandra Tello Cespedes	1070923363	Prof. Proc. Urb.	UTMP				
8	CARLOS EDUARDO GUZMAN SANCHEZ	79617588	Residente	UTMP		UTMP	residente1.velodromo@cyg.com.co	3017415962
9	Diego Alejandro León Bello	1018452081	Ing Estructural	Interventoría		CIC		3108285944
10	Jose M. Galeano V	80031322	Residente	UTMP		UTMP	estructural.velodromo@cyg.com.co	3105540274
11	Andrés Galeano Gonzalez	1022361548	Res Pedo y Pay	CIG		CIG		3192355243
12	Jairo Parra Reyes	1143829720	Apoyo STC	IDRD		IDRD	jairo.parra@idrd.gov.co	3052150330
13	Edwin Escobar	79442679	Apoyo STC	IDRD		IDRD	edwin.escobar@idrd.gov.co	3116032773
14	Arturo Rojas Cortes	13873937	Residente	CIG		CIG	interventoria.velodromo@gmail.com	3166420056
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL- V.6

32

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Entidad:	Cargo:	Número de teléfono
22/01/2026 8:59:16	CARLOS H. CASTRO	79340835	carlosh.castro@idrd.gov.co	IDRD	Contratista	3107542732

TRAZABILIDAD Y APROBACIÓN DE INFORME No. 23

Diana Ortiz

De: Mary Ramirez <socialvelodromo6@gmail.com>
Enviado el: lunes, 22 de diciembre de 2025 3:41 p.m.
Para: Diana Ortiz
CC: ADRIANA VELANDIA MORENO; Velódromo Consorcio Interventores Gibraltar; Inf. Edgar -2- Solorzano Medina; Lisdy Johana Castro Parrado
Asunto: Re: Informe mensual No. 23 - Componente social
Datos adjuntos: Check List_ Velódromo _Rev. Inicial Inf_23V1 (1).pdf

Cordial Saludo Diana

Tal y como lo conversamos, realice la revisión del informe mensual social No. 23 remitido vía correo electrónico; emitiendo concepto de No aprobación mediante lista de chequeo, la cual adjunto; para que puedas ir realizando la subsanación y podernos reunir virtualmente el 23 de diciembre de 2025; para la validación correspondiente.

En cuanto a la inquietud **En la tabla de firmas se incluía la de la Ing. Nubia Barreto, dado que ya no se encuentra laborando para la interventoría, por favor indicar qué ajuste se debe realizar** por favor, en las dos columnas incluir al Ing. Edgar Solorzano mientras se surte para el próximo periodo la contratación del director (a) de la interventoría.

Las actas transversales, estarán organizadas para el 29 de diciembre de 2025 y te las remitiré una vez cuente con las versiones finales y lo concerniente al soporte de validación, te lo remitiré una vez la profesional SST realice la validación.

Agradezco su amable gestión;

Atentamente,

Mary Luz Ramírez Carvajal

Profesional social

Celular: 3132205175

El lun, 22 dic 2025 a la(s) 12:53 p.m., Diana Ortiz (social.velodromo@cyg.com.co) escribió:

> Cordial saludo,

Espero que se encuentre muy bien en sus labores diarias. Envío el avance del informe mensual considerando que hacen falta los siguientes soportes:

1. La totalidad de las actas de los comités de obra transversales con sus debidos soportes. Además, de incluir la que se celebra el día de mañana con su respectivo soporte fotográfico para el cuerpo del informe.
2. La aprobación del correo electrónico por parte del área SST de la interventoría de la totalidad del personal y del mensual.
3. En la tabla de firmas se incluía la de la Ing. Nubia Barreto, dado que ya no se encuentra laborando para la interventoría, por favor indicar que ajuste se debe realizar.

El avance del informe se puede revisar mediante el siguiente enlace: https://we.tl/t-hg4BJiTO2b

Quedo atenta ante cualquier novedad o situación que pueda surgir.

Cordialmente,

Diana Marcela Ortiz

Mg. Gerencia social

Unión Temporal Metropolitano Porvenir.

social.velodromo@cyg.com.co

Contrato No. 3232 de 2023

Celular: +57 3102751982

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

215

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL	CIG-SC-F-G-005-IDRD REVISIÓN: 0 FECHA: 03/05/2024

COMPONENTE SOCIAL

INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N. 3232 DEL 2023 **Parque:** ***Velódromo***

Objeto contractual: **CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ**

Supervisión: Katherine Amaya roa **N° Radicado** Correo electrónico 22/12/2025 **N° Informe:** 23 **N° Revisión** 01

Apoyo a Supervisión: Carmen Lucia Vélez Cárdenas **Revisa:** Mary Luz Ramírez

Periodo del Informe: Entre: 26-noviembre al 25 diciembre-2025 **Fecha Revisión:** lunes, 22 diciembre de 2025

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las pólizas * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)					PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* martes, 6 de febrero de 2024 *Fecha Final:* martes, 5 de mayo de 2026 *Plazo Actual:* 27 MESES *Ejecutor:* UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR *Interventoría:* CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Contratista e interventoría) Consolidado actividades ejecutadas, revisiones y aprobaciones por parte de la interventoría a productos y entregables.					
Gestión Social Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Consultoría e interventoría), de acompañamiento y seguimiento por parte de la interventoría en cumplimiento del Plan de Gestión Social					En la tabla de ilustraciones ajustar el error al marcador que aparece en la ilustración 5 y 9 En la tabla 4 incluir a las Dra. Katherine Amaya Roa En la tabla 5 ajustar la sumatoria del valor del contrato 147.786.657.028
ANEXO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL **Programa de Información** Soportes de verificación reuniones de socialización Inicio, Avance Finalización, Extraordinaria (Acta de reunión, listado de asistencia registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).					
Programa de Divulgación Soporte de verificación entrega de volantes informativos, convocatorias, plegables, radicación de oficios institucionales, correos electrónicos (planillas de divulgación, registros fotográficos)					
Acompañamiento a las actividades técnicas de la Obra Actas de inspección preliminar- inventario de elementos existentes, Actas de					

vecindad de Inicio (Volantes comunicado de visita informada, Plano de ubicación de predios, vías y espacio público involucrados en el levantamiento de las actas, actas de vecindad suscritas, CD- medio magnético con registros fílmicos y fotográficos del levantamiento).					
Programa de Atención al Ciudadano Registros de atención de preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (formatos de atención PQRS debidamente firmados por los peticionarios, consolidado de atenciones ciudadanas).					
Programa de Control Social - Comités de participación Ciudadana Soportes de la reunión comité de participación ciudadana; capacitación inicial y sesión mensual (acta de reunión, registro fotográfico, listado de asistencia, presentación, formato de evaluación de evento).					Ajustar el párrafo en donde se enuncia el número de asistentes y los actores participantes. Incluir Sumapaz, Las Margaritas. Eliminar el paréntesis después de la 3 pregunta de las inquietudes presentadas Ajustar en el párrafo luego de la tabla 14, el indicador y el número total de asistentes En el compromiso, ajustar los puntos por una coma
Programa de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental					
Soportes de verificación Talleres prevención de violencia de género (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).					
Soportes de verificación reporte de vinculación laboral población diferencial (Certificaciones de vinculación, planillas pago de aportes seguridad social, Certificados de residencia, copia recibo de servicios públicos).					Incluir el soporte de validación de la profesional SST de la interventoría sobre la relación de personal mensual e histórico
Soportes de verificación Talleres Uso, mantenimiento y conservación (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).					
Soportes de verificación capacitación y entrega Manuales de mantenimiento responsable de la administración de los parques.					
Soportes de verificación Aplicación Encuestas de Satisfacción					
Programa de Evaluación y Seguimiento					
Comité de seguimiento semanal (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos).					Incluir actas de comité transversales efectuados durante el corte del informe y el registro fotográfico del efectuado el 23/12/2025
Informes mensuales (Trazabilidad de revisión de productos y entregables consultoría- interventoría y supervisión: Listas de chequeo, correspondencia, correos electrónicos).					Incluir los comunicados de envío de la versión 1 y comunicado respuesta de la interventoría en donde se remitió la lista de chequeo
OBSERVACIONES GENERALES					
El informe presentado, ***NO CUMPLE*** con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y calidad. ***NO SE APRUEBA*** **EL INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL No.23 V1** **VoBo. Profesional Social Interventoría**					

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C.,27 de diciembre de 2025
CE-206-125-2111

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. **ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: **Informe del componente social del periodo comprendido del 26 de noviembre al 25 de diciembre del 2025**

Cordial saludo

Por medio de la presente, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, representada por el "Contratista" o la "Unión Temporal", conforme al marco jurídico establecido en el Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023, nos dirigimos respetuosamente a ustedes con el fin de radicar el informe mensual del componente social del periodo comprendido del 25 de noviembre al 25 de diciembre del presente año, con los ajustes solicitados por la interventoría mediante la mesa de trabajo celebrada el día lunes 22 de diciembre y la lista de chequeo enviada mediante correo electrónico. El informe se puede descargar mediante el siguiente enlace: https://we.tl/t-8r5F1INflS

Quedamos atentos a sus comentarios y/o recomendaciones

Cordialmente,

Ing. Alfonso Peñaranda Suárez, PMP® - PMI-ACP®
Director de Proyecto
Unión Temporal Metropolitano Porvenir
Velódromo Gibraltar.

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
NIT. 901.781.400-1
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-206-125: 1162
RECIBIDO POR: Claudia G
FECHA: 30-12-25
RECIBIDO PARA REVISION

Bogotá D.C.,30 de diciembre de 2025

CIG-IDRD-VEL-988-2025

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELODROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Rta. Oficio de obra CE-206-125-2111– asunto: Aprobación Informe Social Mensual No. 23 Versión 2.0 _ 26 noviembre al 25 de diciembre de 2025

Respetado Arquitecto:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, esta interventoría emite concepto de Aprobación del informe de Gestión Social No. 23 versión 2.0 remitido por ustedes; dado que el documento detalla de manera clara y completa todas las actividades sociales ejecutadas en el periodo comprendido entre el 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2025.

LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA	**VERIFICACIÓN**
Descripción general del contrato	CUMPLE
Descripción de actividades programa acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de información	CUMPLE
Descripción de actividades programa de divulgación	CUMPLE
Descripción de actividades programa de control social- comités de participación ciudadana	CUMPLE
Descripción de actividades programa de atención a la comunidad.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de sostenibilidad social, económica y ambiental.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de evaluación y seguimiento.	CUMPLE
Anexos soportes de las actividades sociales ejecutadas	CUMPLE

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

217

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

La interventoría solicita que el contratista haga llegar lo más pronto posible el informe social mensual No.23 versión 2.0 aprobado debidamente impreso, carta de aprobación de la interventoría y en magnético (CD), para proceder a la radicación ante la entidad.

Sin otro particular.

Cordialmente

Ing. Edgar Solorzano Medina
Coordinador de Interventoría

Elaboró: TS Mary Luz Ramirez Carvajal Profesional Social de Interventoría.
Revisó: Ing. Edgar Solorzano Medina – Coordinador de Interventoria.
Aprobó: Ing. Edgar Solorzano Medina – Coordinador de Interventoria.

Anexos: Lista chequeo aprobación _ 1 folio

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL	CIG-SC-F-G-005-IDRD
		REVISIÓN: 0
		FECHA: 03/05/2024

COMPONENTE SOCIAL

INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N. 3232 DEL 2023 *Parque:* ***Velódromo***

Objeto contractual: CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ

Supervisión: Katherine Amaya roa N° Radicado CE-206-125-2011 27/12/2025 N° Informe: 23 N° Revisión 02

Apoyo a Supervisión: Carmen Lucia Vélez Cárdenas Revisa: Mary Luz Ramírez

Periodo del Informe: Entre: 26-noviembre al 25 diciembre-2025 Fecha Revisión: lunes, 28 diciembre de 2025

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoria) Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las polizas * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)					PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* martes, 6 de febrero de 2024 *Fecha Final:* martes, 5 de mayo de 2026 *Plazo Actual:* 27 MESES *Ejecutor:* UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR *Interventoría:* CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Contratista e interventoría) Consolidado actividades ejecutadas, revisiones y aprobaciones por parte de la interventoria a productos y entregables.					
Gestión Social Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Consultoria e interventoría), de acompañamiento y seguimiento por parte de la interventoria en cumplimiento del Plan de Gestión Social					
ANEXO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL **Programa de Información** Soportes de verificación reuniones de socialización Inicio, Avance, Finalización, Extraordinaria (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).					
Programa de Divulgación Soporte de verificación entrega de volantes informativos, convocatorias, plegables, radicación de oficios institucionales, correos electrónicos (planillas de divulgación, registros fotográficos)					
Acompañamiento a las actividades técnicas de la Obra Actas de inspección preliminar- inventario de elementos existentes, Actas de					

vecindad de Inicio (Volantes comunicado de visita informada, Plano de ubicación de predios, vías y espacio público involucrados en el levantamiento de las actas, actas de vecindad suscritas, CD- medio magnetico con registros fílmicos y fotográficos del levantamiento).						
Programa de Atención al Ciudadano Registros de atención de preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (formatos de atencion PQRS debidamente firmados por los peticionarios, consolidado de atenciones ciudadanas).						
Programa de Control Social - Comités de participación Ciudadana Soportes de la reunión comité de participación ciudadana; capacitación inicial y sesión mensual (acta de reunión, registro fotográfico, listado de asistencia, presentación, formato de evaluación de evento).						
Programa de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental						
Soportes de verificación Talleres prevención de violencia de género (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).						
Soportes de verificación reporte de vinculación laboral población diferencial (Certificaciones de vinculación, planillas pago de aportes seguridad social, Certificados de residencia, copia recibo de servicios públicos).						
Soportes de verificación Talleres Uso, mantenimiento y conservación (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).						
Soportes de verificación capacitación y entrega Manuales de mantenimiento responsable de la administración de los parques.						
Soportes de verificación Aplicación Encuestas de Satisfacción						
Programa de Evaluación y Seguimiento						
Comité de seguimiento semanal (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos).						
Informes mensuales (Trazabilidad de revisión de productos y entregables consultoria- interventoria y supervisión: Listas de chequeo, correspondencia, correos electrónicos).						
OBSERVACIONES GENERALES						

El informe presentado, *CUMPLE* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y calidad.

SE APRUEBA EL INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL No.23 V2

VoBo. Profesional Social Interventoria

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

No. 20262100081982 Código Web: #5&jBH
FECHA:16-02-2026 11:21:39 FOLIOS: 219
RADICADOR: SIERVO ALEJANDRO LARA ORTIZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: REMISION INFORME MENSUAL DE OBRA NO 24-
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2026

CIG-IDRD-VEL-0122-2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Atte. Dra. Katherin Amaya Roa
Subdirectora Técnica de Construcciones
Gerente del Proyecto
Supervisora Designada
Katherin.amaya@idrd.gov.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

ASUNTO: Remisión Informe **MENSUAL DE OBRA NO 24** – Correspondiente al mes **de ENERO 2026 (26/12/2025 al 25/01/2026) – COMPONENTE SOCIAL** - Proyecto Velódromo Gibraltar

Respetada Doctora

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 3219-2023, nos permitimos remitir a la entidad contratante **IDRD** los siete (7) informes mensuales exigidos contractualmente para el contrato de obra de la referencia, en el presente oficio el **COMPONENTE SOCIAL.**

Dichos informes, correspondientes al mes de **ENERO 2026 (26/12/2025 al 25/01/2026)** entregados por el contratista de obra **Unión Temporal Metropolitano Porvenir** fueron revisados, avalados y aprobados por esta interventoría según se relacionan:

ITEM	COMPONENTE	TOMOS	FOLIOS	CD	ESTADO
1	**SOCIAL No 24**	1	1 - 218	1	**APROBADO**

Cordialmente

Arq. Rubén Darío Crespo Botero
Director de Interventoría

Elaboró y Proyectó: Arq. Arturo Rojas Torres – residente 2 de Interventoría
Revisó: Ing. Rubén Darío Crespo Botero. Director interventoría
Aprobó: Ing. Edgar Solorzano. Coordinador interventoría

Anexo: Informe Mensual de Obra No 24 en UNA (1) Carpetas, 1 CD y 218 Folios en total.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

219
