AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME MENSUAL SST INTERVENTORÍA ENERO 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024

"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

INTERVENTOR: CONSORCIO IMGA INGENIEROS



CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 de 2024

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Lista de personal Consorcio Obras la sabana
Anexo 2. Lista de chequeo de documentación mensual
Anexo 3. Acta de Reunión COPASST
Anexo 4. Acta de Reunión COCOLA
Anexo 5. Entrega de Elementos de Protección y Dotación
Anexo 6. Inspecciones Planeadas
Anexo 7. Inspección Camilla
Anexo 8. Control de Botiquín
Anexo 9. Inspección Extintores
Anexo 10. Inspección de Elementos de Protección Personal
Anexo 11. Inspección Condiciones Trabajo en Altura
Anexo 12. Inspección de equipos de alturas
Anexo 13. Inspección Herramienta Menor
Anexo 14. Asistencia Pausas Activas
Anexo 15. Registro de Capacitaciones
Anexo 16. Matriz indicadores -Matriz IPVR
Anexo 17. Matriz de Ausentismo

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA
ENERO 2026

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Estado General Del Contrato De Obra Lado tierra.

Se suscribió entre el CONSORCIO OBRAS LA SABANA y la Aeronáutica Civil, el contrato de obra No. 24001240 H4 de 2024, que tiene por objeto "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS LA SABANA
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.896.571-7
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA NIT 901.898.194-2, integrado por las siguientes personas jurídicas 1. CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S con NIT. 901.357.668-0 con un porcentaje de participación del (60%), Y 2. PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.AS., con NIT. 901.378.906-9 con un porcentaje de participación del (40%) restante.
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ; C.C. 79.615.262
DIRECCIÓN	Carrera 9 #11-38, Cota – Colombia
TELÉFONO	3134410757
CORREO ELECTRÓNICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com

Ubicación del Proyecto: El proyecto se desarrollas en el AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA-AMAZONAS.

2. Componente en Seguridad y Salud en el Trabajo SST

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desarrolladas por el contratista Consorcio Obras La Sabana durante el mes de enero de 2026, en el marco de la ejecución del proyecto denominado: "Realizar mantenimiento de la infraestructura física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF)," correspondiente al Contrato N.° 24001240 H4 de 2024.

Estas acciones se documentan con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista.

Relación Personal Profesional de obra.

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA				
ÍTEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELÉFONO**
1	GERENTE	GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ	consorcio.obraslasabana@gmail.com	
2	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ARTURO MORENO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3174388841
3	ADMINISTRATIVA	YESICA TENJO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3212235816
4	RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ MANUEL RINCÓN	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3116772614
5	RESIDENTE SST	GABRIELA MURRIETA	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3102959339
6	FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS	CADENERO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	
7	IVÁN MAURICIO GONZALEZ TENJO	TOPÓGRAFO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3118918301

Tabla 1. Listado personal profesional 24001240 del contrato H4 de 2024

Relación Personal en Obra Enero 2026

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	ALEX YOVANY CHOTA LORENZO	MAESTRO DE OBRA	1.121.204.211	19-03-25
2	ALLAN WESLEY COELLO FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.007.628.607	19-03-25
3	MARCIO SODI CASADO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	1.121.214.243	19-03-25
4	LEONARDO PINTO LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	1121215034	19-03-25
5	JUSTO HERNÁN JORDAN PARENTE	AYUDANTE DE OBRA	15.879.650	19-03-25
6	FELISBERTO FERNÁNDEZ RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	15.879.477	07-04-25
7	JUAN CAMILO JOSE FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.213.301	01-04-25
8	ALEXIS CHÁVEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	15.878.827	01-04-25
9	WIRLIN GRANDEZ HUAHUARI	AYUDANTE DE OBRA	1.131.534.209	01-04-25
10	FABIO SANTOS PINTO	AYUDANTE DE OBRA	15.875.442	07-04-25
11	LOPE FERNANDEZ LORENZO	AYUDANTE DE OBRA	6.566.776	10-03-25
12	MEJIA CURITIMA MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	15.877.581	10-03-25
13	ALBERTO CHUÑA DÍAZ	AYUDANTE DE OBRA	15.877.435	10-03-25

14	JHON ALEJANDRO CUELLAR LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.196.148	11-11-25
15	JEISON PILLIMUE PAZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.446.210	02-11-25

Tabla 2. Listado personal 24001240 del contrato H4 de 2024

El contratista realiza entrega del documento soporte para esta actividad en el anexo relacionado.

Anexo 1. Lista personal en Obra Consorcio Obras la Sabana

Durante este periodo se presentaron las siguientes novedades de ingreso y retiro del personal.

- Durante este periodo No se presentaron Ingreso del personal.
- Durante este periodo se presentaron los siguientes retiros del personal.

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA RETIRO
1	MIGUEL ÁNGEL CHUÑA PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	1.006.732.589	19-01-26
2	JOSE ALBERTO CHUÑA PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	1.193.041.424	19-01-26
3	FERNANDO FELIPE PONCIANO	AYUDANTE DE OBRA	1.121.223.043	19-01-26

3. Verificación Planillas de Seguridad Social del Personal

Durante este periodo se realiza la validación de los soportes de las siguientes planillas:

Se realiza verificación de la planilla nro. 9498540267 de 2026 correspondiente al mes de Enero de 2026, pagada 26/01/26 con un total de 3 trabajadores.

Se realiza verificación de la planilla nro. 6002566161 de 2026 correspondiente al mes de Enero de 2026, pagada 09/01/2026 con un total de 20 trabajadores.

4. Actividades Generales desarrolladas en este periodo

Durante este periodo, el contratista desarrolló las siguientes actividades, en las cuales se enfocaron los diferentes frentes de trabajo:

- ***Limpieza y mantenimiento tanto de fachadas como de sus bajantes.***
- ***Carpintería metálica: Reparación de techo de driwal en pasillo oficinas administrativas.***
- ***Instalaciones hidrosanitarias: Se inspeccionará puntos hidráulicos y sanitarios, atendiendo fugas de agua, válvulas deterioradas, sifones y reposición de elementos propios de las unidades sanitarias.***
- ***Se desarrollaron actividades de limpieza de cubiertas interiores, estructuras metálicas, limpieza vidrios y fachada en filtro de seguridad.***
- ***Instalación de Flanches en borde de canal de cubierta módulos 1,2,3.***
- ***Limpieza y mantenimiento tanto de cubiertas como de sus bajantes módulo 2 lado aire.***
- ***Se desarrollaron actividades de limpieza de cubiertas interiores, estructuras metálicas, lavado de policarbonato lado aire cubierta interior***
- ***Pintura en estructura gris.***
- ***Instalación de policarbonato contractual.: Instalación de láminas de policarbonato en módulos 2 y 1.***




INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST


INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ENERO 2026



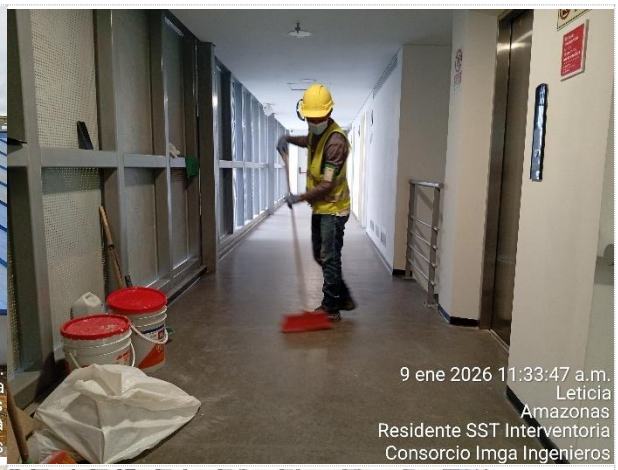

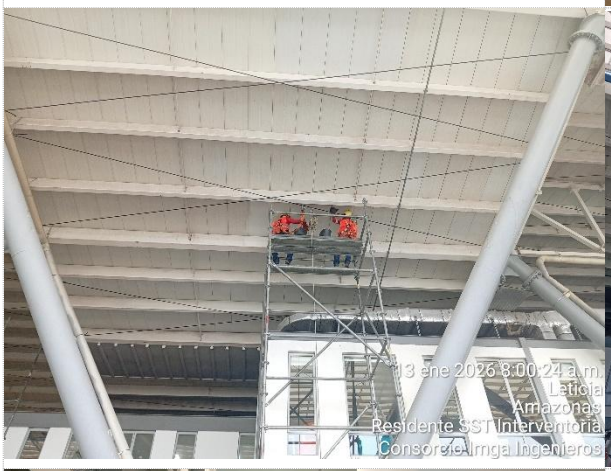








INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST


INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ENERO 2026

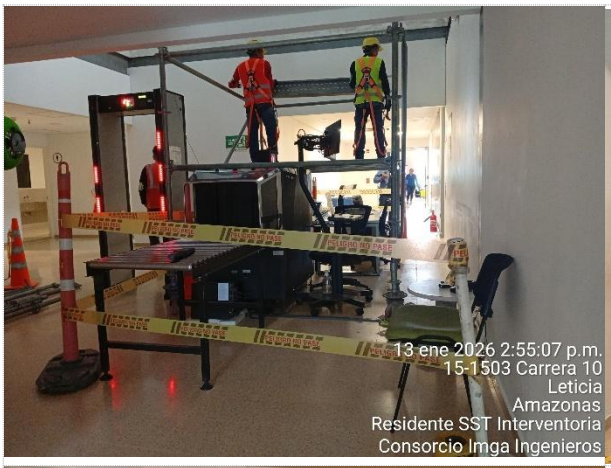



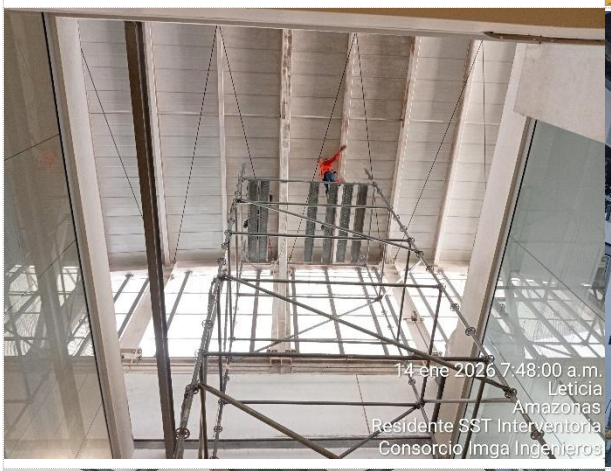









4.4.2. COPASST

Durante este periodo, el contratista realizó el seguimiento correspondiente al **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)**. Estas acciones se llevaron a cabo con el fin de garantizar condiciones laborales seguras y saludables, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los compromisos establecidos por la organización.

Anexo 3. Acta de Reunión COPASST

4.4.3. COCOLA

Durante este periodo, el contratista realizó el seguimiento correspondiente al **Comité de Convivencia Laboral (COCOLA)**, con el objetivo de promover la sana convivencia dentro del entorno laboral.

Asimismo, se llevaron a cabo actividades grupales y capacitaciones orientadas a fortalecer la convivencia, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo entre los colaboradores.

Anexo 4. Acta de Reunión COCOLA

4.4.4. Seguimiento de condiciones de Salud de los Colaboradores del Consorcio

*Durante este periodo, en el **Consorcio Obras La Sabana no se** presentaron alteraciones ni condiciones de salud reportadas por parte de los trabajadores. Asimismo, no se registraron incapacidades médicas de origen laboral.*

En el marco de las acciones de promoción y prevención, se realizaron actividades orientadas a las trabajadores, incluyendo dinámicas grupales y ejercicios de reflexión sobre los riesgos y peligros asociados a sus funciones.

4.4.5. Reporte estadístico de AT Mensual

*Durante el periodo comprendido en **enero de 2026**, no se reportaron accidentes ni incidentes asociados a las actividades ejecutadas por el contratista dentro del proyecto.*

El contratista desarrolló charlas y capacitaciones enfocadas en recomendaciones para el **uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP)**, el **trabajo en equipo**, la **revisión diaria de herramientas**, las **buenas prácticas de ejecución de actividades**, así como en **orden y aseo**, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención.

4.4.6. Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones

Durante este periodo, el contratista realizó la entrega correspondiente de los **Elementos de Protección Personal (EPP)**, garantizando así el cumplimiento de las medidas de prevención y protección para los trabajadores.

A continuación, se relacionan las cantidades entregadas y se anexan los registros correspondientes.

ÍTEMS	EPPS/DOTACIÓN	CANTIDAD
1	CHALECOS	**15**
2	TAPABOCAS	**15**
3	GUANTES DE NITRILO	**15**

Tabla 4. Listado EPP entregado Enero 2026



Anexo 5. Entrega de Elementos de Protección yo Dotación

4.4.7. Inspecciones

El contratista **Consorcio Obras La Sabana** desarrolló de manera efectiva las inspecciones periódicas programadas durante este periodo, orientadas a la prevención de riesgos laborales y a la verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas.

A continuación, se relacionan las inspecciones realizadas durante este periodo:

N°	*Fecha Planeada*	*Responsable*	*Cargo*	*Estado*	*Observaciones*
1	*Inspección de seguridad*	*Gabriela Murrieta*	*Seguridad y salud en el trabajo*	*Buen Estado*	*Revisar uso de epps Revisión Equipo de Emergencias*

2	*Inspección EPP*	*Personal*	*Personal*	*Buen Estado*	*Realizar Reposición Periódica*
3	*Inspección Equipos, Herramientas*	*Personal*	*Personal*	*Buen Estado*	*Control de Inventarios*
4	*Inspección EPP /EQUIPOS TSA*	*Personal TSA*	*Personal TSA*	*Buen Estado*	*Verificación de Orden y Aseo*

Tabla 5. Listado Inspecciones Planeadas

Anexo 6. Registros Inspecciones Planeadas.

4.4.7.1. Inspección de Botiquines, camilla y extintor

El contratista desarrolló de manera eficiente las inspecciones a los elementos de emergencia designados en la obra, los cuales incluyen el botiquín, la camilla de emergencia y el extintor.

Estas acciones se realizaron con el fin de garantizar el buen funcionamiento de dichos elementos en caso de una eventual situación de emergencia.









Anexo 7. Inspección Camilla
Anexo 8. Control de Botiquín
Anexo 9. Inspección Extintores

4.4.7.2. Inspección de EPP

El contratista desarrolló de manera eficiente el uso y la inspección de los **Elementos de Protección Personal (EPP)** asignados al personal, con el fin de garantizar su adecuada funcionalidad y prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales en las áreas donde se desarrolla la obra.






INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ENERO 2026

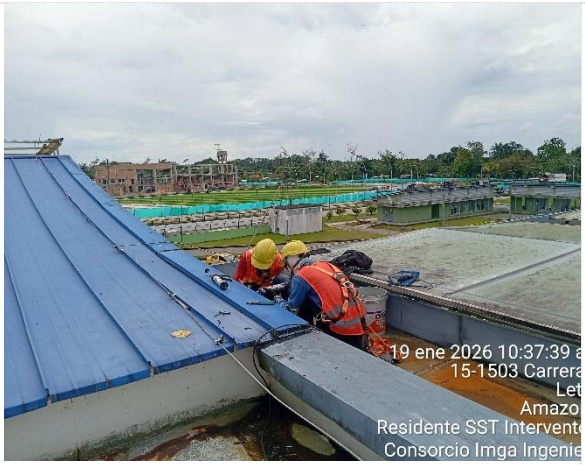















. *Anexo 10. Inspección de Elementos de Protección Personal*

4.4.7.3. Inspección de Condiciones Trabajo en Altura

Durante este periodo se realizó el seguimiento al **Consorcio Obras La Sabana** respecto al cumplimiento de las actividades relacionadas con **trabajo en alturas** en los diferentes frentes de obra.

Se verificaron los aspectos clave para garantizar la correcta ejecución de estas labores, tales como: el uso adecuado de los equipos de protección personal (arnés, eslinga, casco con barbuquejo), la instalación y aseguramiento de las líneas de vida, las condiciones estructurales de andamios y plataformas, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos (permisos de trabajo, supervisión y controles operativos).

Adicionalmente, el contratista desarrolló capacitaciones sobre el uso adecuado de los equipos de protección contra caídas, los elementos de protección personal y otros aspectos esenciales de seguridad asociados al trabajo en alturas.

También se realizó el seguimiento al cumplimiento de las **inspecciones preoperacionales de los equipos para trabajo en alturas**, con el fin de garantizar su correcto uso durante las actividades realizadas en altura y prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes.

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS


CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ENERO 2026







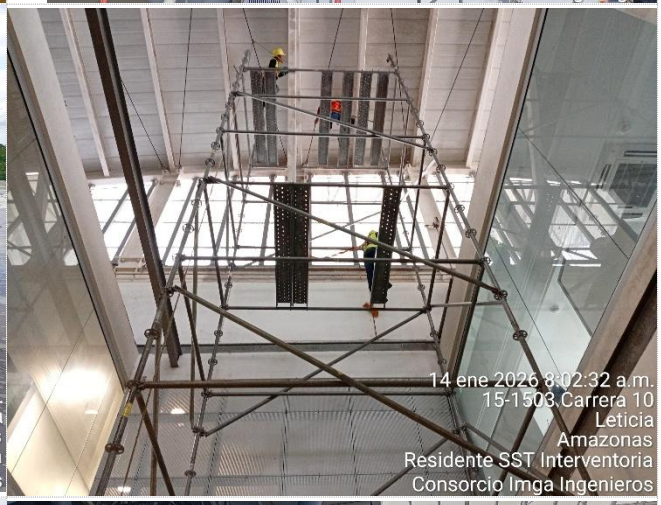





INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ENERO 2026














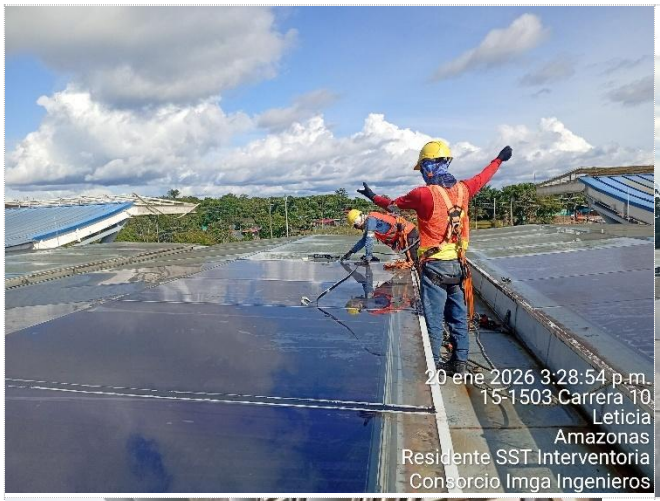











Anexo 11. .ATS, Permisos,

Anexo 12. Inspección de equipos de alturas,

4.4.7.4. Inspección Herramienta Menor, compresor, herramientas de pintura, herramientas para lavado Hidrolavadoras, escaleras, etc., otros equipos.

Durante este periodo, el contratista realizó la revisión del estado de las herramientas utilizadas, con el objetivo de garantizar su adecuado funcionamiento y prevenir accidentes laborales.

Se efectuó la reposición de los elementos que lo requerían y se llevaron a cabo las inspecciones preoperacionales correspondientes, así como la capacitación a los trabajadores sobre el manejo adecuado de las herramientas, con el fin de mantener condiciones seguras en el lugar de trabajo.

A continuación, se relacionan las herramientas utilizadas durante este periodo.

Herramienta/Equipo	Uso principal/Actividad Asociada	Observaciones/Estado
Baldes	Pintura y limpieza de cubierta	Bueno
Escobas	Limpieza y aseo	Bueno
Espátula	Emboquillado	Bueno
Brocha	Pintura	Bueno
Rodillos	Pintura	Bueno
Recogedor	Limpieza y aseo	Bueno
Hidrolavadoras	Limpieza de Cubierta	Bueno
Escalera	Limpieza, pintura	Bueno
Esponjas	Limpieza de fachada	Bueno
Pulidora	Corte de policarbonato	Bueno

Tabla 6. Listado Herramientas Enero 2026

Anexo 13. Inspección Herramienta Menor

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ENERO 2026

















4.4.8. Registros Pausas activas y Registro de capacitaciones y sus evaluaciones de eficacia.

Durante este periodo, el contratista **Consorcio Obras La Sabana** realizó de manera eficiente el desarrollo de **pausas activas diarias** en las áreas operativas, con el objetivo de reducir la fatiga laboral y promover el bienestar físico integral de los trabajadores. Estas actividades se llevaron a cabo para disminuir las tensiones musculares y contribuir a la mejora del ambiente laboral.

Durante este periodo, el contratista realizó de manera eficiente diversas **capacitaciones y charlas de seguridad**, enfocadas en temas orientados a la prevención de riesgos laborales, incidentes, accidentes de trabajo, prevención de caídas, entre otros aspectos fundamentales para la seguridad y salud en el trabajo.

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ENERO 2026





Anexo 15. Asistencia Pausas Activas

Anexo 16. Registro de Capacitaciones

4.5. Otras Actividades SST

Durante este periodo, el contratista **Consorcio Obras La Sabana** realizó diferentes actividades en las que se concentraron los distintos frentes de trabajo. De acuerdo con lo anterior, la interventoría efectuó el seguimiento correspondiente al cumplimiento de los parámetros de Seguridad y Salud en el Trabajo en las diversas áreas y frentes de intervención.

A continuación, se evidencian las áreas intervenidas durante este periodo.

INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

INTERVENTORÍA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA


ENERO 2026










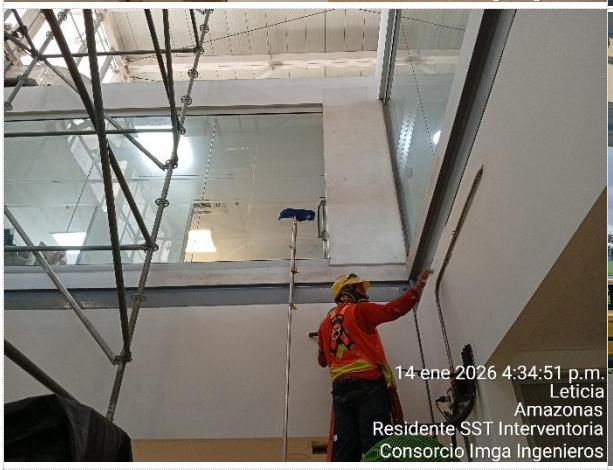



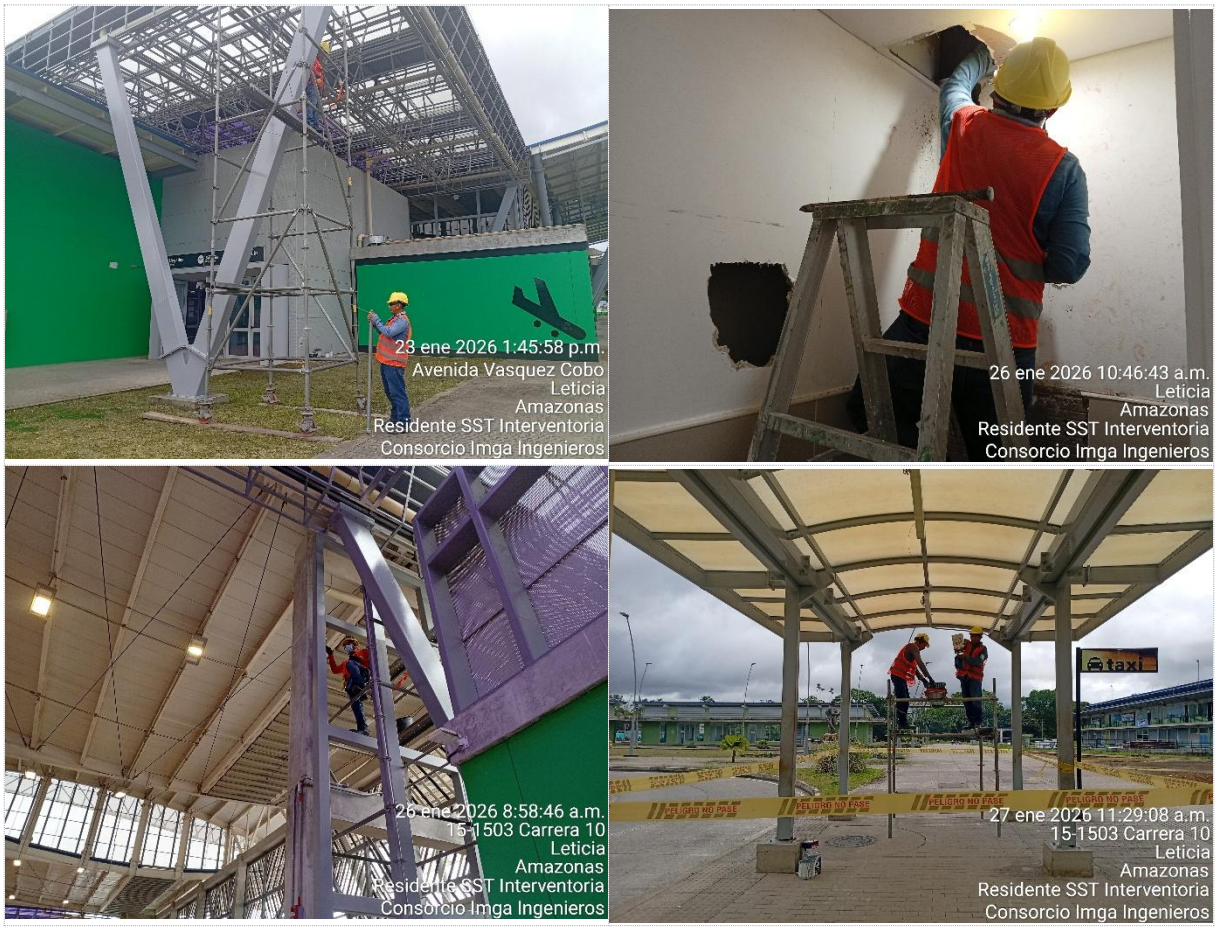

4.6. Indicadores SST

Durante este periodo, el contratista **Consorcio Obras La Sabana** presentó los indicadores requeridos para el cumplimiento de los estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las actividades desarrolladas en el marco del **SG-SST**.

Anexo 17. Matriz indicadores-IPVR
Anexo 18. Matriz de Ausentismo

4.7. Conclusiones y recomendaciones generales

Con el fin de garantizar condiciones seguras de trabajo y prevenir accidentes laborales, **el contratista deberá implementar y mantener las siguientes acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo**:

- **Verificación previa de condiciones de trabajo:** El contratista deberá realizar diariamente la verificación del estado de las herramientas, equipos, elementos de protección personal (EPP) y de las áreas de trabajo antes del inicio de las actividades, con el fin de identificar oportunamente riesgos potenciales.
- **Uso obligatorio de elementos de protección personal**: El contratista deberá asegurar que todos los trabajadores utilicen de manera obligatoria los EPP correspondientes a cada tarea, tales como casco, guantes, gafas de seguridad, protección auditiva, calzado de seguridad, arnés para trabajos en alturas, entre otros que resulten aplicables.
- **Instructivos y protocolos de trabajo seguro:** El contratista deberá contar con instructivos y protocolos actualizados para la ejecución de actividades críticas, tales como trabajos en alturas, garantizando su cumplimiento durante el desarrollo de las labores.
- **Orden y limpieza de las áreas de trabajo**: El contratista deberá mantener las áreas de trabajo ordenadas y libres de obstáculos, cables expuestos o materiales mal ubicados que puedan generar riesgos de caídas, tropiezos o golpes.
- **Señalización de seguridad**: El contratista deberá disponer de avisos y señalización visible y adecuada para delimitar las áreas de trabajo, advertir sobre los riesgos existentes y orientar a los trabajadores respecto a rutas de evacuación y zonas restringidas.
- **Capacitación y entrenamiento**: El contratista deberá realizar de manera periódica charlas y entrenamientos en prevención de riesgos, uso adecuado de EPP, primeros auxilios, manejo seguro de herramientas y aplicación de procedimientos críticos.
- **Permisos de trabajo para actividades de alto riesgo**: Para la ejecución de actividades de alto riesgo, tales como trabajos en alturas, el contratista deberá cumplir estrictamente con la emisión y control de los permisos de trabajo seguros.
- **Pausas activas y descansos**: El contratista deberá implementar pausas activas y descansos periódicos con el fin de reducir la fatiga, prevenir lesiones osteomusculares y mejorar la concentración durante la jornada laboral.
- **Elementos de atención de emergencias y comunicación interna**: El contratista deberá realizar seguimiento permanente a los elementos de atención primaria, tales como botiquines, extintores y camillas, con el fin de garantizar su disponibilidad y correcto funcionamiento en caso de emergencia. Asimismo, deberá fortalecer el sistema de comunicación interna para el reporte oportuno de condiciones o actos inseguros, con el propósito de prevenir su recurrencia y fortalecer la cultura de prevención en la organización.

Elaborado por:



Dora Pinedo
Residente de SST Interventoría
Consorcio IMGA Ingenieros
