
CONCEPTOS SDA GEOMEMBRANA

BOGOTÁ


CT 09579 DEL 27/08/2021

CT 03441 DEL 31/03/2023

ALCANCE

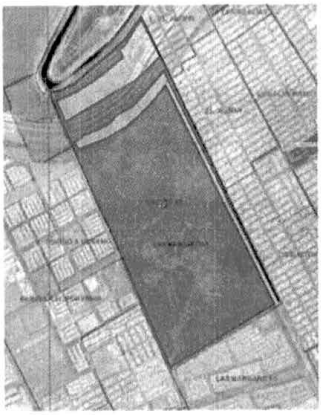

PREDIO GIBRALTAR UNA ÚNICA ESTRUCTURA ESPACIAL

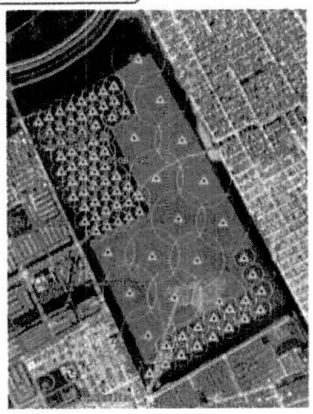

PREDIO GIBRALTAR SEGREGADO POR ZONAS (VELÓDROMO-CAR) ÁREA 2

INSTITUTO DISTRITAL DE **RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

CONCEPTOS SDA GEOMEMBRANA

BOGOTÁ

CT 09579 DEL 27/08/2021

CT 03441 DEL 31/03/2023

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (NUMERAL SUELO)

" 5.3 SUELO

La EAAB propone el desarrollo de una cobertura semipermeable para el desarrollo del futuro Parque Metropolitano PM-10 Porvenir (Gibraltar) y sugiere para las zonas en las cuales se va a realizar ***construcciones superficiales*** *tales como cachas de fútbol, basquetbol, ciclo rutas; adelantar actividades de impermeabilización de toda el área mediante la instalación de una capa de mínimo 0.8 metros separada por una geomembrana."*

No relaciona medidas de impermeabilización de las zonas verdes como tampoco de construcciones superficiales

" Acción de riesgo

Nivel 2: *Esta autoridad ambiental se permite resaltar, que es necesario el cubrimiento de las zonas en donde, de acuerdo con el diseño final de parque, el usuario recreacional pueda llegar a tener contacto directo con el suelo, de manera que se evite la exposición de los receptores sensibles por las tres vías de exposición: dérmica, oral e inhalatoria."*

INSTITUTO DISTRITAL DE **RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

CONCEPTOS SDA- VELÓDROMO

BOGOTÁ

CT 09237 DEL 21/10/2024

RESPUESTA REALIZADA MEDIANTE RADICADO 2025ER23084 del 29/01/2025

"Adicionalmente, para las zonas de urbanismo con zonas verdes, sea césped o jardinería, se propone desde la UTMP la instalación de ***mínimo una capa de 0.2 metros de sello con recebo común, la instalación del sustrato orgánico para la vegetación*** *y las especies seleccionadas en el acta WR 1388A suscrita el 16/06/2024. Se aclara que en la etapa final del proyecto de urbanismo se realizarán únicamente llenos, no se requiere realizar excavaciones profundas"*

CT 01572 del 12/04/2025

RESPUESTA REALIZADA MEDIANTE RADICADO 2025ER242157 del 14/10/2025

Se reitera lo relacionado en el radicado **2025ER23084 del 29/01/2025** y se adiciona:


"las zonas de urbanismo como senderos peatonales y zonas duras de permanencia contarán con acabados que garantizan la separación del relleno antrópico con futuros usuarios y la huella del edificio contará con un sello de 40 cm de espesor en recebo común, seguido de las estructuras de concreto definitivas"

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

DIRECCIÓN CONCEPTUAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA

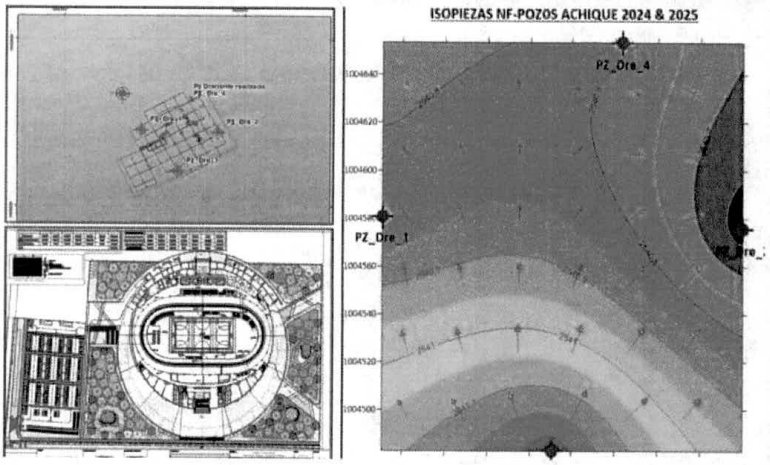


Se rige por la dinámica de la principal fuente hídrica como lo es el Río Bogotá, lo que sugiere flujos con vectores horizontales , con menor posibilidad de ascensos, a menos que haya intervenciones antrópicas.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

COMPORTAMIENTO COLUMNA DE AGUA SUBTERRÁNEA

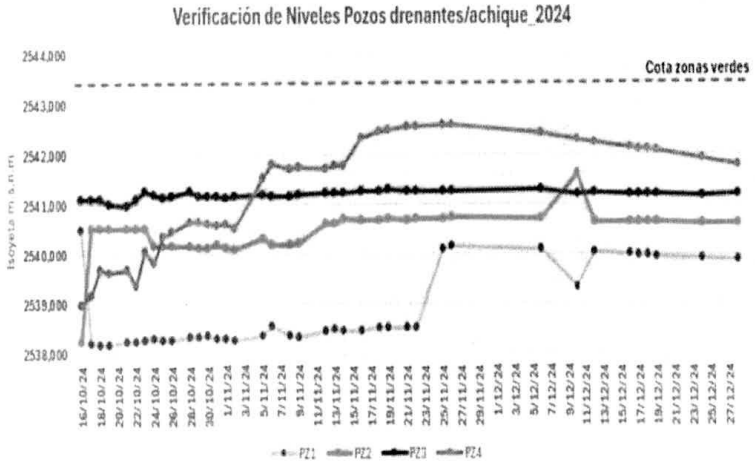


Los niveles de agua medidos desde el 2024 a la fecha 2025, son variables en los pozos PZ_Dre_1 y PZ_Dre_4 es decir los de menor carga hidráulica en términos hidrogeológicos, con la característica que los niveles más cercanos a la cota del proyecto se dieron en octubre y noviembre siendo las temporadas que de acuerdo con el comportamiento bimodal de la zona corresponde a la zona de mayores precipitaciones. Siendo los PZ_Dre_2 & PZ_Dre_3 los más estables.

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

COMPORTAMIENTO COLUMNA DE AGUA SUBTERRÁNEA

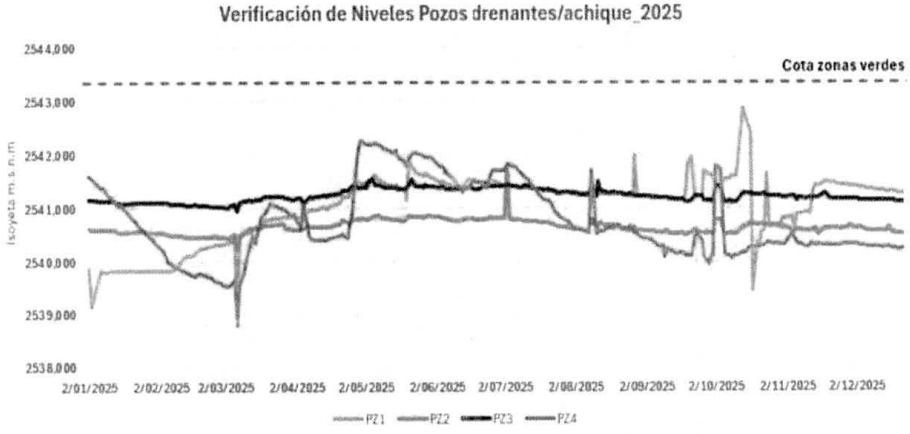

CONCEPTO HIDROGEOLOGÍA UTMP

BOGOTÁ

CONSIDERACIONES IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS VERDES

1. Es importante mencionar que si se impermeabiliza todas las zonas verdes podría darse encharcamiento o saturación del terreno

2 En las zonas verdes donde no se proyecta la instalación de SUDS, y donde no hay un sistema de recolección y manejo de las aguas lluvias se infiere que el proceso de impermeabilización no es necesario, toda vez que el agua que se precipita y posteriormente se infiltra como parte del ciclo hidrológico en la zona, hace parte de la dinámica pluvial propia del terreno

3. Considerando que para el manejo de aguas lluvias y la regulación de estas, se proyecta la implementación de SUDS, se debe tener en cuenta para el agua recolectada tanto en su punto de recolección como en el transporte de esta hasta la zona de disposición, la protección mediante una geomembrana impermeable para evitar la mezcla de aguas lluvias (y sus niveles máximos) con los niveles freáticos que para el caso corresponden a mezcla de lixiviados, dado los procesos de infiltración natural del agua en zonas verdes.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible ZONAS VERDES


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES


SUDS

LOS SUDS BUSCAN EMULAR EL CICLO HIDROLÓGICO NATURAL

CICLO EN SISTEMA NATURAL

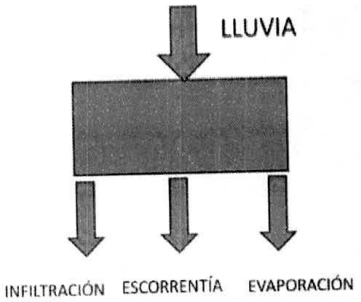


CICLO EN SISTEMA URBANO



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES

ZONAS DE BIO-RETENCIÓN

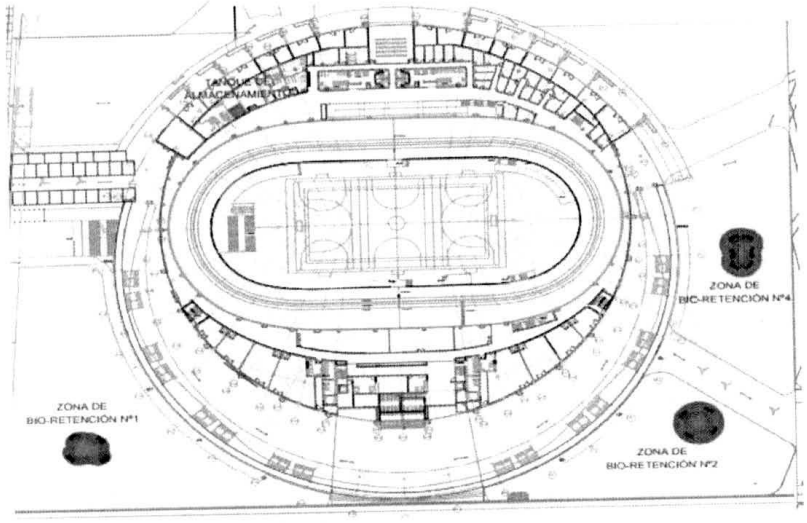


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES

PERFIL ZONA DE BIO-RETENCIÓN

BOGOTÁ

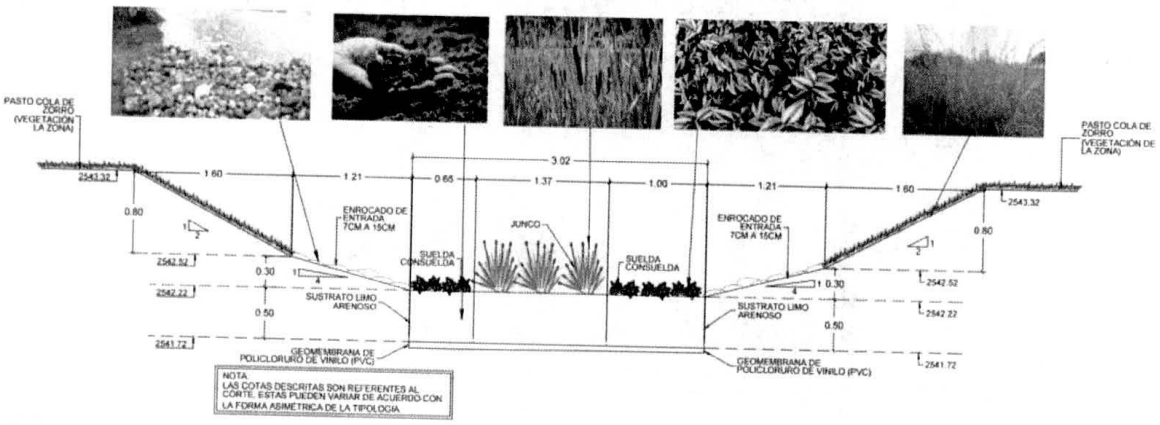


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


SUDS ZONAS VERDES

ZONA DE BIO-RETENCIÓN 1 (SW)

BOGOTÁ

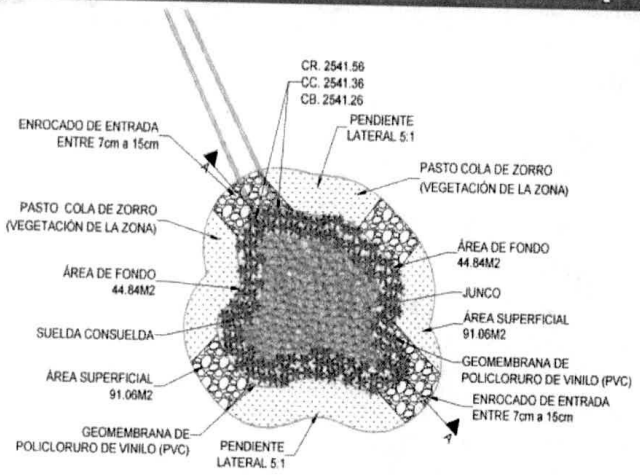

ÁREA DE RECOLECCIÓN: 3127,99 m²
ÁREA DE FONDO (IMPERMEABILIZADA): 44,84 m²
VOLUMEN TOTAL: 20,39 m³

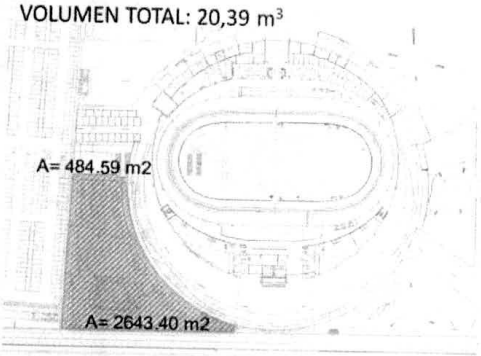


	C[]	A[m2]
1	0.34	2643.40
2	0.88	484.59


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES

ZONA DE BIO-RETENCIÓN 2 (SE)

ÁREA DE RECOLECCIÓN: 1804,8 m²
ÁREA DE FONDO IMPERMEABILIZADA: 44,84 m²
VOLUMEN TOTAL: 16,23 m³

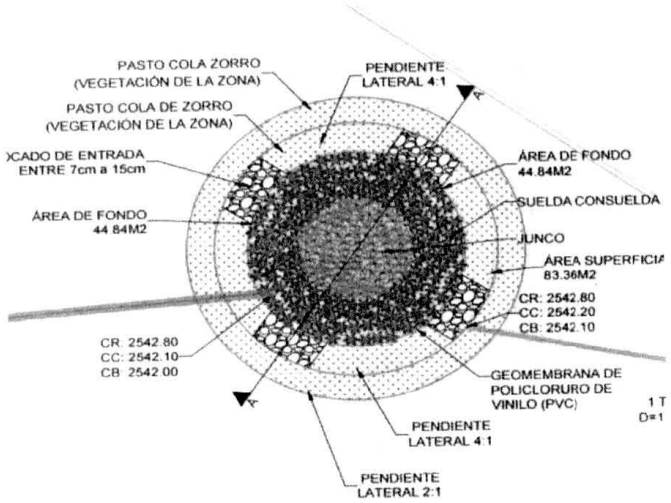

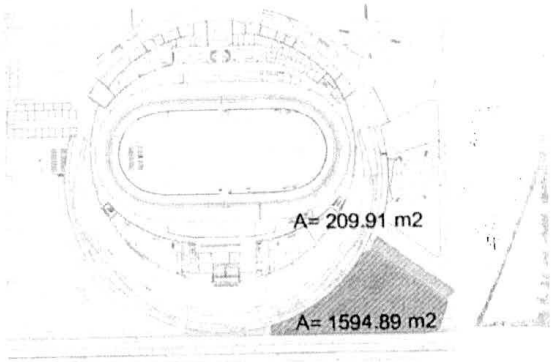


	C[]	A[m2]
1	0.34	1594.89
2	0.88	209.91


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUDS ZONAS VERDES

ZONA DE BIO-RETENCIÓN 4 (E)

ÁREA DE RECOLECCIÓN: 2171,54m²
ÁREA DE FONDO* (IMPERMEABILIZADA): 30,96*m²
VOLUMEN TOTAL: 14,13 m³

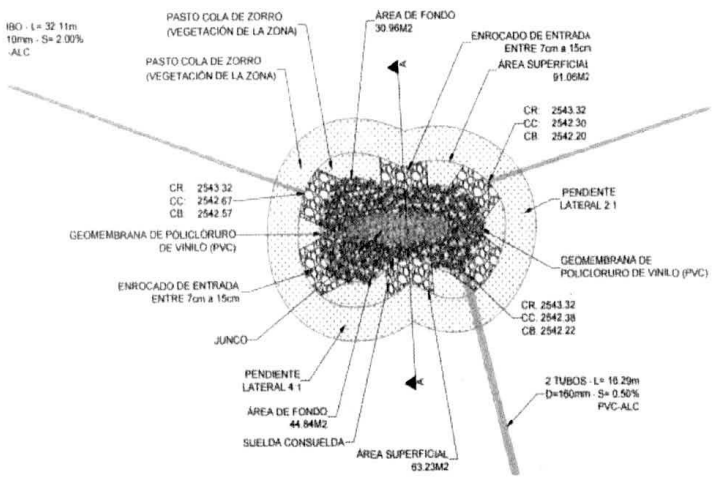

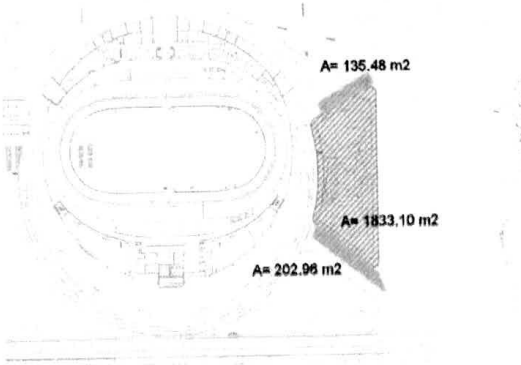


	C[]	A[m2]
1	0.34	1833.10
2	0.88	338.44

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ZONAS VERDES SIN SUDS

BOGOTÁ

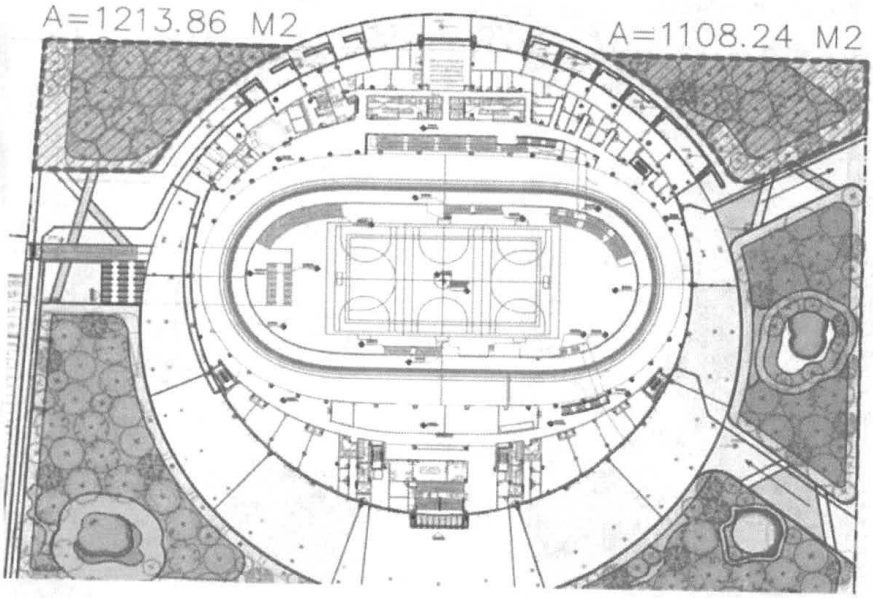

ÁREA TOTAL SIN SUDS: 2322,1 m²

ÁREA TOTAL DE RECOLECCIÓN CON SUDS: 7.104,33 m²

ÁREA TOTAL DE MANEJO: 9426,43 m²

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA


BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ

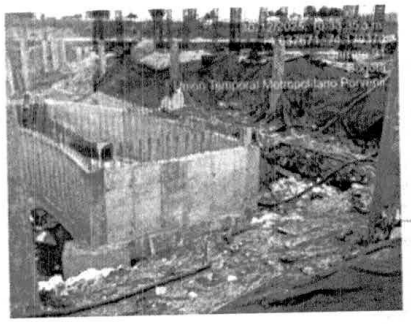


Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo y Deportistas)

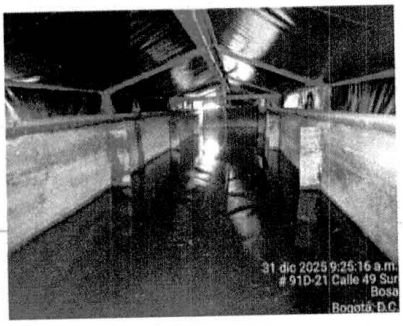

Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención

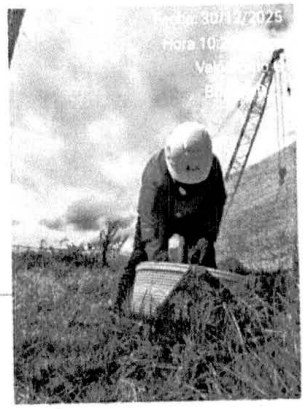


Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13
Reducción del Riesgo ER14-ER15-ER16

BOGOTÁ

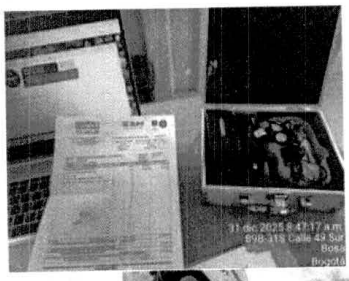

Ingreso del equipo de respaldo de Marca CROWCON - Serial W259628/01-059

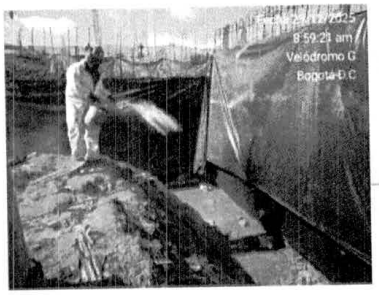

Control Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores



Inspección de taludes

Inspección visual de taludes con acompañamiento de geotecnia y verificación del desarrollo de actividades recomendadas para contención de taludes



Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 8 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

Fauna

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES DE FAUNA

BOGOTÁ

7 ene. 2026 08:19 A.M.

92-39 Calle 49 Sur, Bogotá, Bogotá, CO (4.638, -74.181)

Distrito Capital de Bogotá, Colombia





Claudia Infante Jaimes


Con Desplazamiento · 82min · 0,68 Km — Completo

7 Species +

53	Zenaida auriculata
18	Orochelidon murina
2	Troglodytes musculus

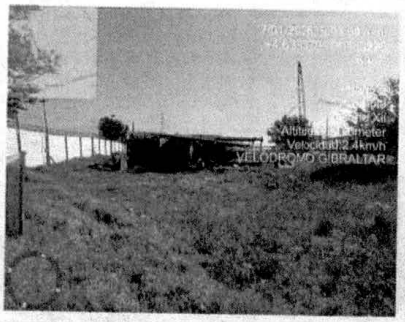

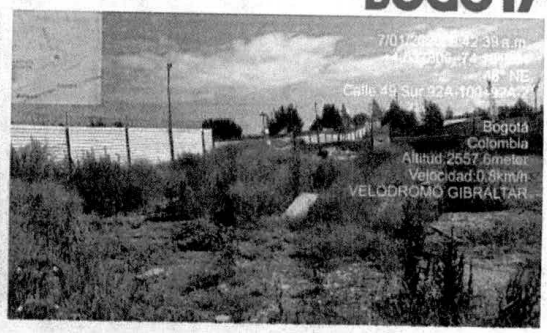




Actividades cumplidas en el componente fauna	
Recorridos de seguimiento mensual	
Liberación de áreas de desarrollo del proyecto	
Especies registradas en el predio (residentes)	


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

LIBERACION DE AREAS




FAUNA SILVESTRE

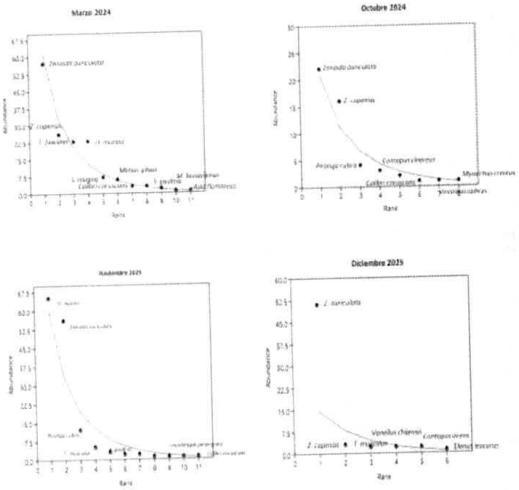

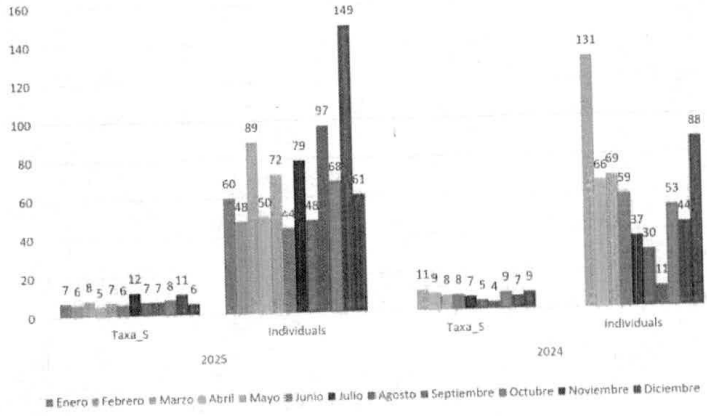

FAUNA SILVESTRE

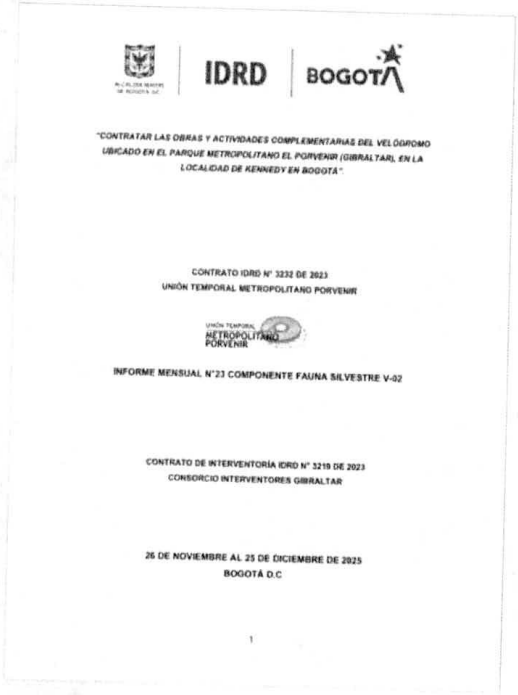

IDRD | BOGOTÁ

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".

CONTRATO IDRD N° 3232 DE 2023
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INFORME MENSUAL N°23 COMPONENTE FAUNA SILVESTRE V-02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDRD N° 3219 DE 2023
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025
BOGOTÁ D.C

1

BOGOTÁ

- Informe mensual No. 23 entregado por el contratista el 29 de diciembre de 2025
- Observaciones realizadas por parte de interventoría al informe No. 23 enviadas el 29 de diciembre de 2025
- Atención a observaciones realizadas al informe No. 23 de obra enviadas el 02 de enero de 2026
- Aprobación del informe No. 23 de obra el 07 de enero de 2026 mediante el radicado CE-206-128-1175

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO

BOGOTÁ

El día 7 de enero de 2026 se efectuó recorrido en conjunto con la interventoría, en la revisión del arbolado de protección permanente (conservación), se verificó el estado actual físico y sanitario del arbolado, así como la adecuada instalación de la malla azul para el aislamiento, como se observa a continuación los individuos cuentan con un apropiado estado en su lugar de emplazamiento, excepto el árbol No. 70 (quemado):



Árbol No. 70



Árbol No. 71



Árbol No. 72




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO


BOGOTÁ



Árbol No. 77

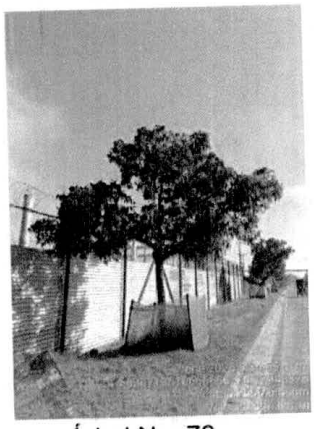

Árbol No. 78

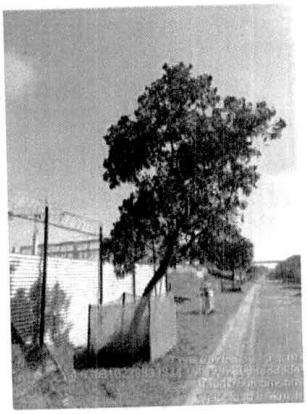

Árbol No. 79





Árbol No. 80

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO



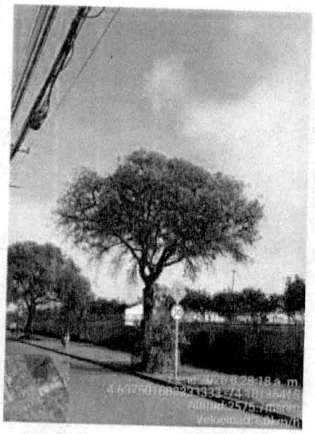

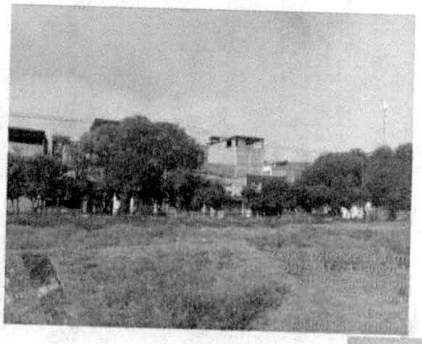

Revisión de árboles Costado Sur Interior predio, perimetral – Calle 49 Sur.



OTRAS ACTIVIDADES

- APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 22 (APROBADO CIG-IDRD-VEL-924-2025)
- En espera de información frente a la reliquidación método de compensación Resolución 1639 de 2023 teniendo en cuenta el acta WR WR 1388ª de 2024.
- Comunicado CIG-IDRD-VEL-981-2025, la tala la ejecuta directamente el Jardín Botánico de Bogotá.

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE SST


INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

PROMEDIO PERSONAL

BOGOTÁ

REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	**PROMEDIO 29/12/25 - 04/01/26**
PROFESIONALES	13
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	2
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	16
AYUDANTES	29
HERREROS	9
OPERADORES	6
BACHEROS	1
CONDUCTORES	0
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**87**

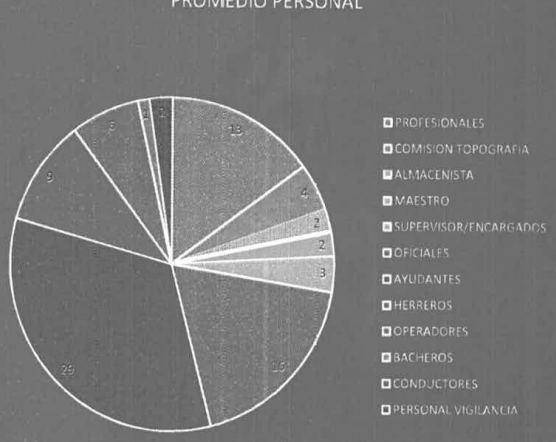



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

BOGOTÁ

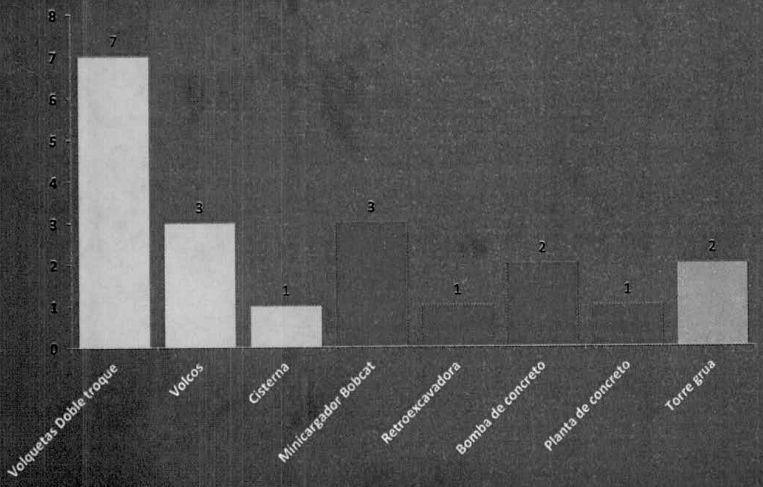



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

BOGOTÁ

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	ABIERTO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	ABIERTOS
TOTAL ACCIDENTES	8	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
TOTAL AUSENTISTAS	56


NOTA: **A la semana se presenta 1 accidente laboral, se cuenta con 3 accidentes cerrados y 5 abiertos**


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion tabajo en alturas

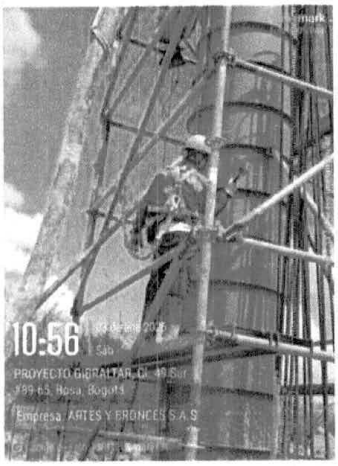

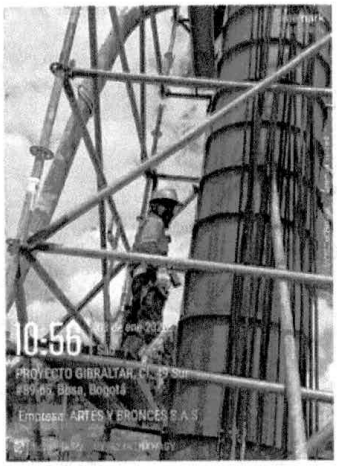

Inspeccion uso de dotacion y EPP





INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion de EPP y dotación acorde al manual de identidad

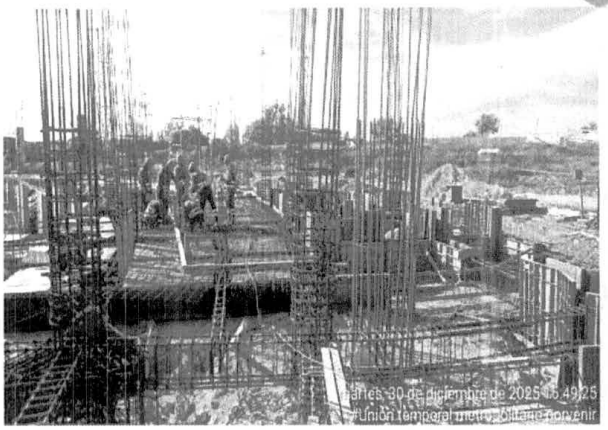

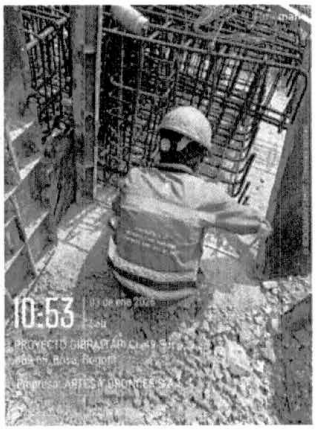

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Charla subcontratistas – Inportancia trabajo seguro en alturas






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion Señalizacion interna

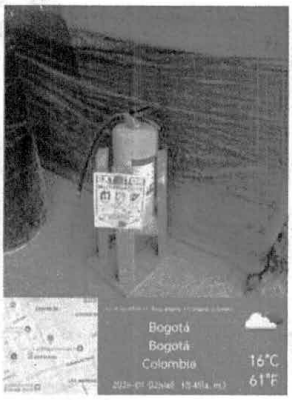



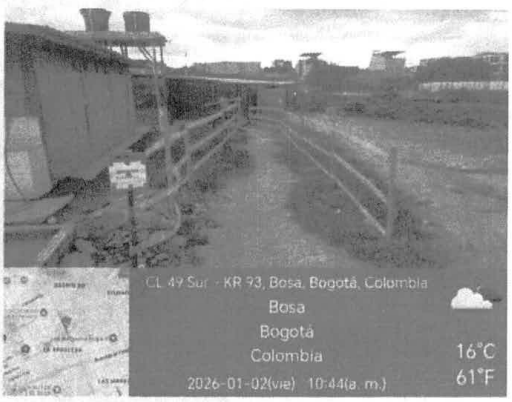

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente
De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2304,58 m3

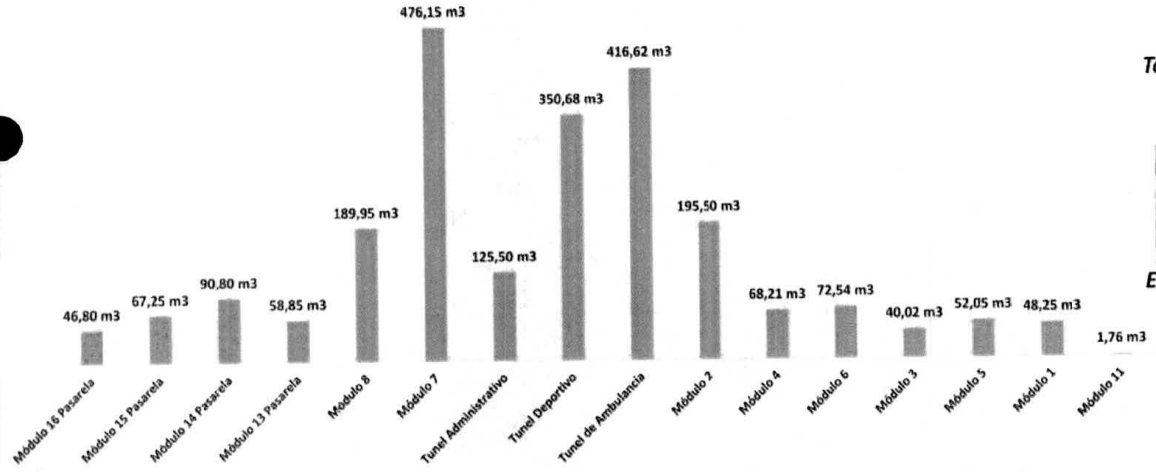

TOTAL SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 04 DE ENERO DE 2026.

Concreto Estructural: ***141,75 m3*** **Placa** (Placa Módulo 5 – Tramo 1 y Placa Módulo 6), **Muros** (Túnel Deportivo y Túnel de Ambulancia) **Columnas (**Módulo 1, Módulo 7, Módulo 16, Túnel de Ambulancia)

CEMEX **57,00 m3** *40%*

ALTARA **84,75 m3** *60%*

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana
141,75m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396




Toma de Muestras de Concreto NTC 673




INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **471,06 Ton**

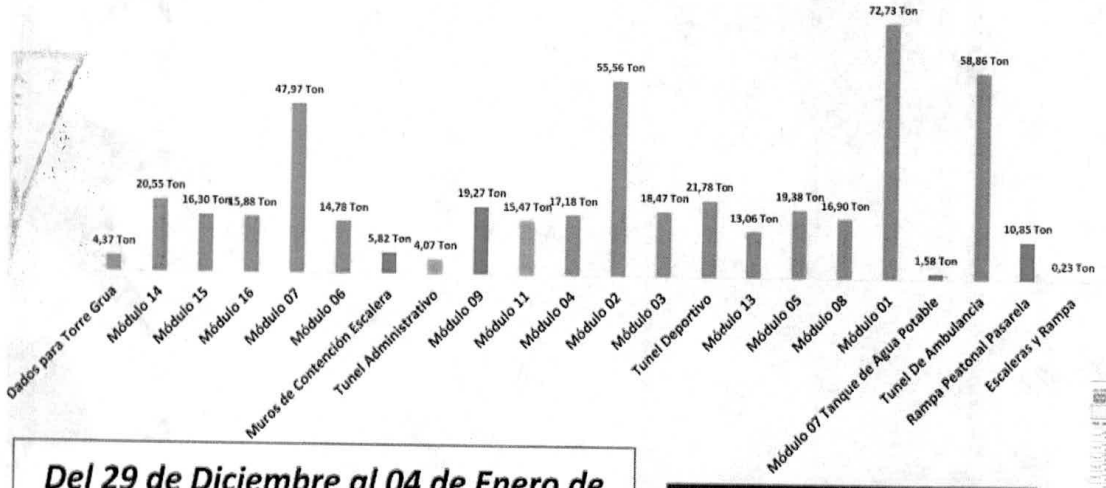

Del 29 de Diciembre al 04 de Enero de 2025


No hubo ingreso de Acero de Refuerzo a obra



BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
					Total	21 Unds		**Total**	198,69 Ton

BOGOTÁ


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 21 al 28 de Diciembre:

2 Unds para **15,07 Ton**

TOTAL : 198,69 TON.



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0639-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0639-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2336 del 27 de Noviembre de 2025.	Interventoria
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Se remite oficio CE-206-125-2315 del 13 de Noviembre de 2025.	Interventoria
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0685-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Doma Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 13 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega de modelo visual de Ítems NP adicionales a tramitar – REDES.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*)	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Actualización del BEP remitido al IDRD (**) y estrategia de seguimiento remitido al apoyo supervisión el dia 07/01/2025. En revisión por parte del IDRD.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA

AVANCE GENERAL

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.325,093	2.292,895	27,54 %
Área total (m2)	**Área total fundida (m2)**	**% Avance**
25.242,36	5.720,89	22,66 %
Longitud total (m)	**Longitud total fundida (m)**	**% Avance**
20.459,34	4.826,76	23,59 %

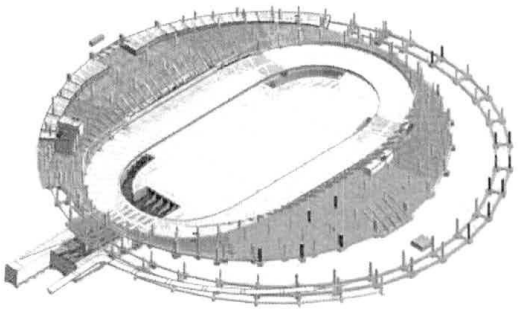

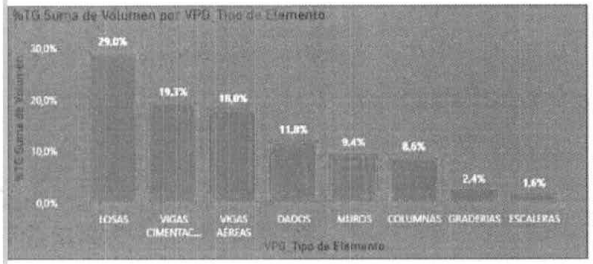

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	(En blanco)	Graderia
DADOS	3/10/25	Módulo 01
ESCALERAS	6/10/25	Módulo 02
GRADERIAS	9/10/25	Módulo 03
LOSAS	11/10/25	Módulo 04
MUROS	16/10/25	Módulo 05
RAMPAS	20/10/25	Módulo 06
VIGAS AÉREAS	24/10/25	Módulo 07
VIGAS CIMENTACI...	25/10/25	Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	77,937	0.00 % 10.33 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	0,00 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	99,72	0.00 % 6.43 % 100.00 %

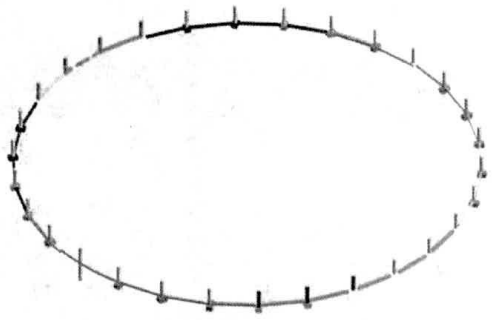

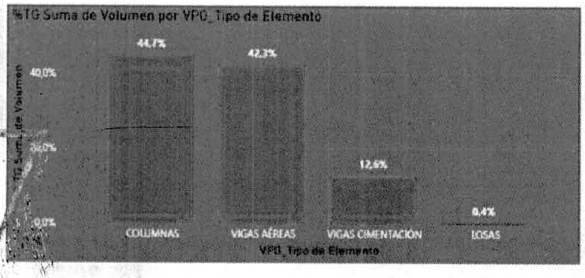

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ LOSAS	☐ 19/12/25	■ Módulo 01
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 20/12/25	☐ Módulo 02
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 29/12/25	☐ Módulo 03
	☐ 2/01/26	☐ Módulo 04
		☐ Módulo 05
		☐ Módulo 06
		☐ Módulo 07
		☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 5


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
323,012	49,757	0.00 % 15.40 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
836,86	317,60	0.00 % 37.95 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
964,77	12,80	0.00 % 1.33 % 100.00 %



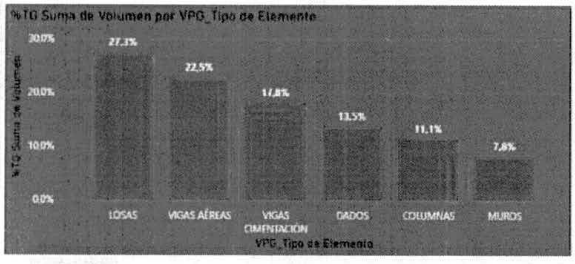

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ DADOS	☐ 9/12/25	☐ Módulo 01
☐ LOSAS	☐ 13/12/25	☐ Módulo 02
☐ MUROS	☐ 16/12/25	☐ Módulo 03
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 24/12/25	☐ Módulo 04
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 30/12/25	■ Módulo 05
		☐ Módulo 06
		☐ Módulo 07
		☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 6


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
318,075	39,101	12.29 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
839,01	234,76	27.98 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.055,70	16,90	1.60 %

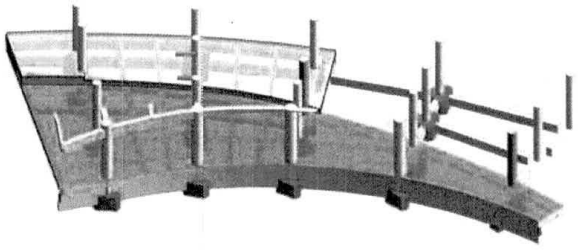

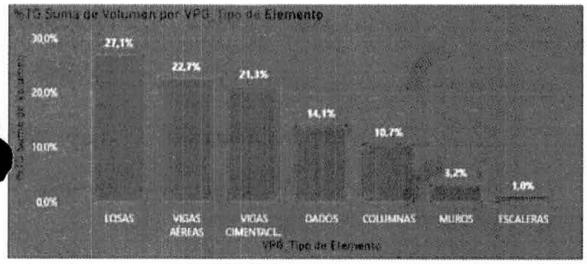

Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 22/11/25
☐ 24/11/25
☐ 29/12/25
☐ 31/12/25

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
■ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	271,736	30.22 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	40.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.488,74	117,82	4.73 %

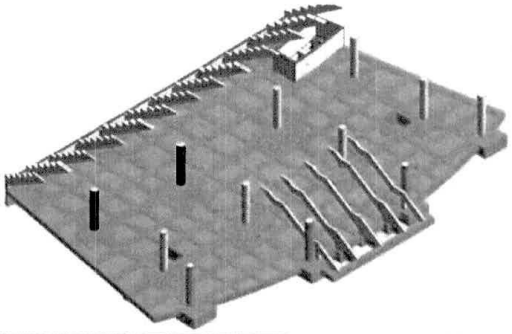

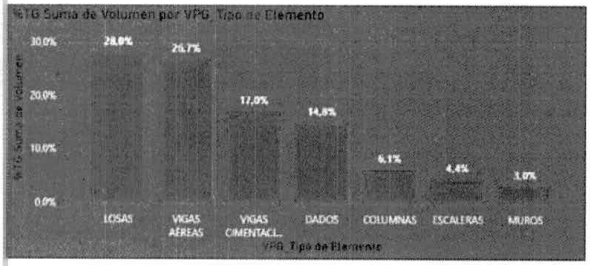

Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 20/11/25
☐ 22/11/25
☐ 25/11/25
☐ 26/11/25
☐ 10/12/25
☐ 12/12/25
☐ 15/12/25
☐ 18/12/25

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
☐ Módulo 06
■ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 11


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
207,013	3,780	0.00 % 1.83 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
555,25	1,72	0.00 % 0.31 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
617,85	4,19	0.00 % 0.68 % 100.00 %



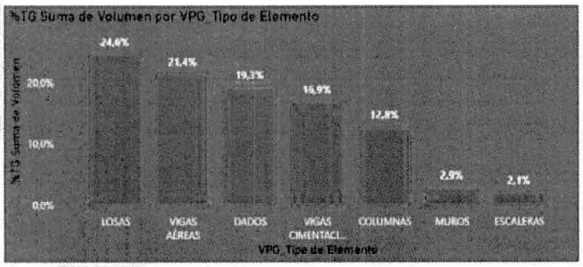

Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 24/12/25
☐ 30/12/25

Ubicación
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08
☐ Módulo 09
☐ Módulo 10
■ Módulo 11
☐ Módulo 12 - Pas...
☐ Módulo 13 - Pas...
☐ Módulo 14 - Pas...
☐ Módulo 15 - Pas...

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA

MÓDULO 16 - PASARELA


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
167,936	39,660	0.00 % 23.62 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
425,65	23,12	0.00 % 5.43 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
683,60	268,18	0.00 % 39.23 % 100.00 %



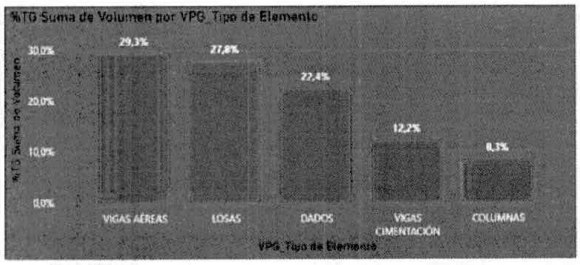

Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 3/10/25
☐ 6/10/25
☐ 29/10/25
☐ 20/11/25
☐ 22/11/25
☐ 31/12/25
☐ 3/01/26

Ubicación
☐ Módulo 10
☐ Módulo 11
☐ Módulo 12 - Pas...
☐ Módulo 13 - Pas...
☐ Módulo 14 - Pas...
☐ Módulo 15 - Pas...
■ Módulo 16 - Pas...
☐ Pista
☐ Rampa Peatonal

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
644,624	427,525	66.32 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.585,58	1.195,32	46.23 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
986,63	753,06	76.33 %

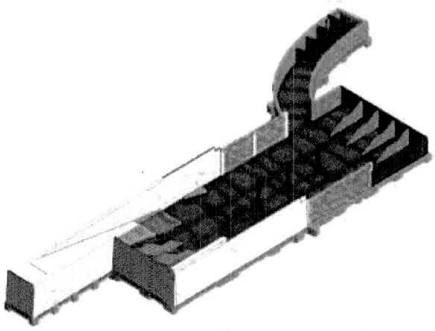

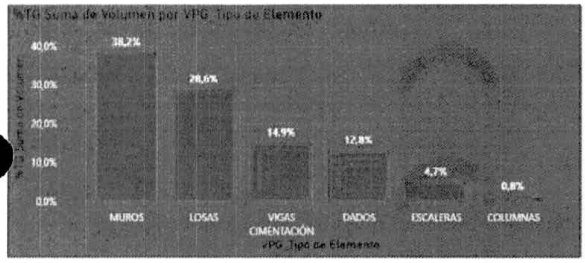

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
RAMPAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
9/10/25
11/10/25
7/11/25
11/11/25
20/11/25
28/11/25
16/12/25
29/12/25

Ubicación
Módulo 15 - Pas...
Módulo 16 - Pas...
Pista
Rampa Peatonal
Torre grúa
Túnel Administra...
Túnel de Ambula...
Túnel Deportivo
Zona Central

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL DEPORTIVO


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
204,328	195,275	95.57 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
799,36	561,06	70.19 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
402,95	391,73	97.22 %

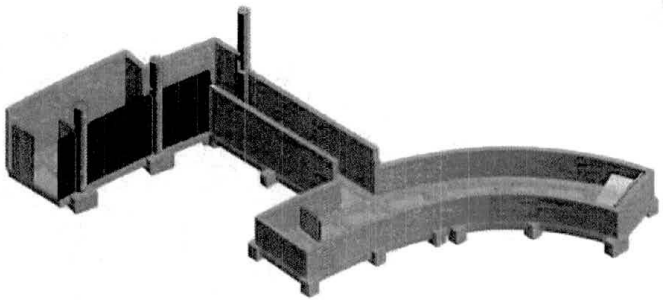

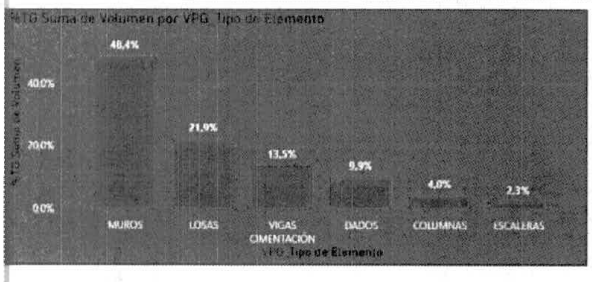

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
Llosas
MUROS
RAMPAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
25/10/25
7/11/25
11/11/25
22/11/25
26/11/25
28/11/25
9/12/25
11/12/25

Ubicación
Módulo 15 - Pas...
Módulo 16 - Pas...
Pista
Rampa Peatonal
Torre grúa
Túnel Administra...
Túnel de Ambula...
Túnel Deportivo
Zona Central

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL ADMINISTRATIVO


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
122,414	114,900	93.86 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
429,72	338,04	78.67 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
227,61	214,84	94.39 %

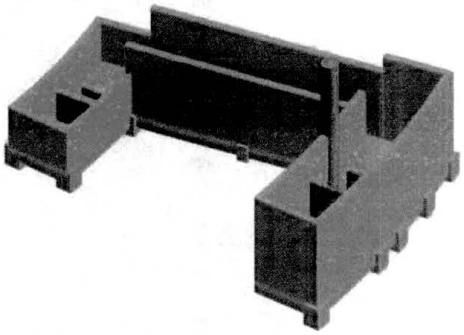

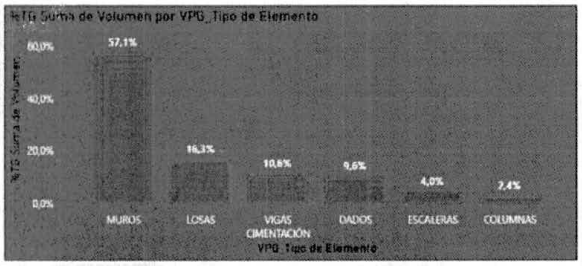

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
20/10/25
30/10/25
31/10/25
7/11/25
20/11/25
26/11/25
1/12/25
30/12/25

Ubicación
Módulo 15 - Pas...
Módulo 16 - Pas...
Pista
Rampa Peatonal
Torre grúa
Túnel Administra...
Túnel de Ambula...
Túnel Deportivo
Zona Central

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

PROYECCIÓN 11 A 25 DE ENERO DE 2026

BOGOTÁ

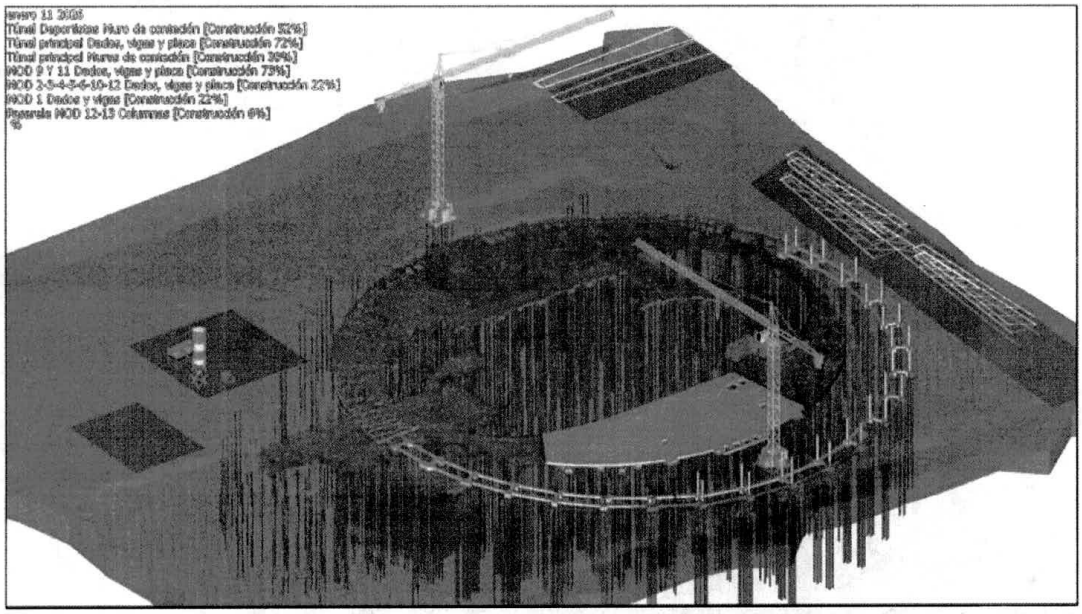


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

EJECUCIÓN 11 A 25 DE ENERO DE 2026

BOGOTÁ

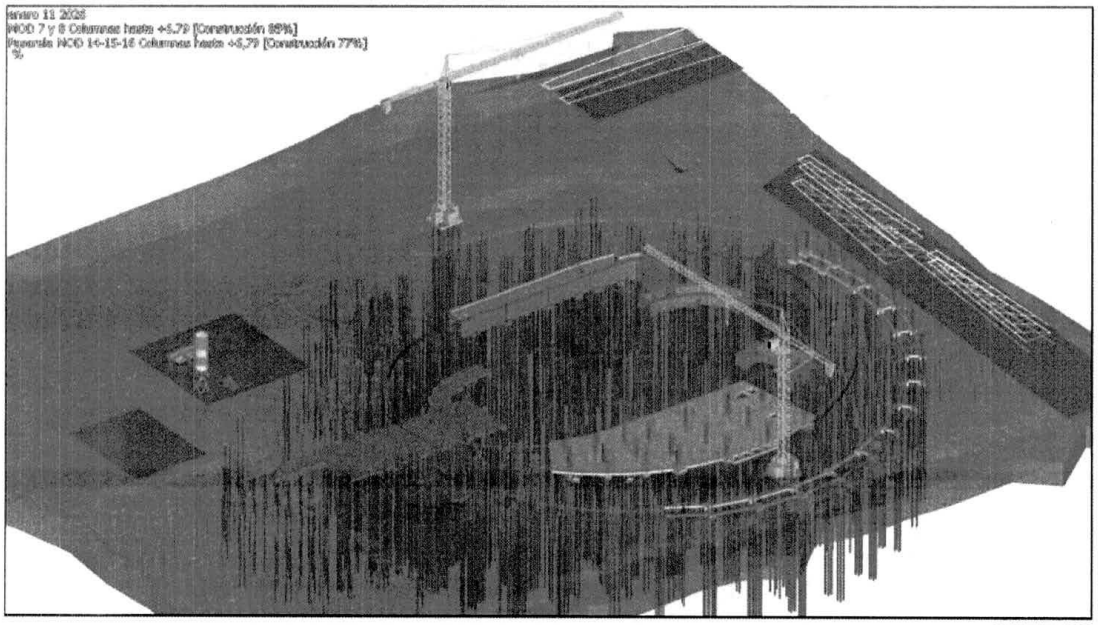

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

DIAGRAMA PROYECCION VS EJECUCIÓN

BOGOTÁ

Tareas | Orígenes de datos | Configurar | Simular

Añadir tarea | Enlazar | Zoom

Activo	Nombre	Estado	Inicio planeado	Fin planeado	Inicio real	Finalizacion real
✓	Túnel Admin Dados, vigas y placa		11/11/2025	19/12/2025	20/10/2025	29/10/2025
✓	Túnel Admin Muro Contención		13/11/2025	23/12/2025	6/11/2025	1/12/2025
✓	Túnel Desarrollo Dados, vigas y Placa		29/11/2025	10/01/2026	4/10/2025	20/11/2025
✓	Túnel Desarrollo Muro de contención		6/12/2025	12/02/2026	22/11/2025	8/01/2026
✓	Túnel Principal Dados, vigas y placa		29/11/2025	27/01/2026	20/11/2025	16/12/2025
✓	Túnel Principal Muro de contención		12/12/2025	26/02/2026	10/12/2025	N/D
✓	MOD 7 y 8 Dados, vigas y placa		22/10/2025	22/12/2025	25/10/2025	18/12/2025
✓	MOD 7 y 8 Columnas hasta +6,79		27/01/2026	5/04/2026	15/11/2025	20/01/2026
✓	MOD 7 y 8 Placa +6,79		26/03/2026	5/04/2026	N/D	N/D
✓	MOD 9 - 11 Dados, vigas y placa		26/11/2025	27/01/2026	24/12/2025	N/D
✓	MOD 9 - 11 Columnas hasta +6,79		27/01/2026	5/04/2026	24/12/2025	N/D
✓	MOD 9 - 11 Placa +6,79		26/03/2026	5/04/2026	N/D	N/D
✓	MOD 12-13-14-15-16-17 Dados, vigas y placa		18/12/2025	5/04/2026	13/11/2025	N/D
✓	MOD 12-13-14-15-16-17 Columnas hasta +6,79		27/01/2026	5/04/2026	19/11/2025	N/D
✓	MOD 12-13-14-15-16-17 Placa +6,79		26/03/2026	5/04/2026	N/D	N/D
✓	MOD 1 Dados, vigas		18/12/2025	5/04/2026	25/11/2025	N/D
✓	MOD 1 Columnas y vigas aereas		27/03/2026	5/04/2026	19/12/2025	N/D
✓	Pasarela MOD 14-15-16 Dados y vigas		9/10/2025	19/11/2025	3/10/2025	30/10/2025
✓	Pasarela MOD 14-15-16 Columnas hasta +6,79		19/11/2025	8/01/2026	9/12/2025	20/01/2026
✓	Pasarela MOD 14-15-16 Placa +6,79		25/02/2026	5/04/2026	N/D	N/D
✓	Pasarela MOD 12-13 Dados y vigas		31/10/2025	11/12/2025	20/10/2025	N/D
✓	Pasarela MOD 12-13 Columnas		8/01/2026	25/02/2026	3/12/2025	N/D
✓	Pasarela MOD 12-13 Placa aerea		25/02/2026	5/04/2026	N/D	N/D

Qtr 4, 2025 — octubre, noviembre, diciembre | Qtr 1, 2026 — enero

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

DIAGRAMA PROYECCION VS EJECUCIÓN


BOGOTÁ

SIMULACIÓN 4D COMPONENTE ESTRUCTURA 11 DE ENERO A 25 DE ENERO DE 2026						
FRENTE DE OBRA	ELEMENTO	FECHA INICIO PROGRAMAD	FECHA FINALIZACIÓN PROGRAMADA	FECHA INICIO REAL	FECHA FINALIZACIÓN REAL	OBSERVACIONES
TÚNEL ADMINISTRATIVO	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	31/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	29/10/2025	Actividad inició 11 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	MUROS DE CONTENCIÓN	13/11/2025	23/12/2025	6/11/2025	1/12/2025	Actividad inició 7 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
TÚNEL DEPORTISTAS	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	25/11/2025	10/01/2026	4/10/2025	20/11/2025	Actividad inició 52 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	MUROS DE CONTENCIÓN	8/12/2025	12/02/2026	22/11/2025	8/01/2026	Actividad inició 14 días antes de lo programado
TÚNEL PRINCIPAL	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	29/11/2025	27/01/2026	20/11/2025	16/12/2025	Actividad inició 9 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	MUROS DE CONTENCIÓN	12/12/2025	26/02/2026	10/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 2 días antes de lo programado
MÓDULOS 7 Y 8	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	22/10/2025	22/12/2025	25/10/2025	18/12/2025	Actividad inició 3 días después de lo programado. YA FINALIZADA
	COLUMNAS HASTA +6,79	27/01/2026	5/04/2026	15/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 73 días antes de lo programado
MÓDULOS 9 Y 11	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	26/11/2025	27/01/2026	24/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 28 días después de lo programado.
MÓDULOS 2-3-4-5-6-10-12	DADOS, VIGAS Y PLACA DE CIMENTACION	18/12/2025	5/04/2026	13/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 35 días antes de lo programado
	COLUMNAS HASTA +6,79	27/01/2026	5/04/2026	19/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 69 días antes de lo programado
MÓDULO 1	DADOS Y VIGAS CIMENTACIÓN	18/12/2025	5/04/2026	25/11/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 23 días antes de lo programado
	COLUMNAS Y VIGAS AEREAS	27/03/2026	5/04/2026	19/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 98 días antes de lo programado
PASARELA MÓDULOS 14-15-16	DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	9/10/2025	19/11/2025	3/10/2025	30/10/2025	Actividad inició 6 días antes de lo programado. YA FINALIZADA
	COLUMNAS	19/11/2025	8/01/2026	9/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 20 días después de lo programado.
PASARELA MÓDULOS 12-13	DADOS Y VIGAS DE CIMENTACION	31/10/2025	11/12/2025	20/10/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 11 días antes de lo programado
	COLUMNAS	8/01/2026	25/02/2026	3/12/2025	EN EJECUCION	Actividad inició 36 días antes de lo programado
			Presentado en simulacion de periodos anteriores Presentado en la simulación del presente periodo			

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


MODELO FEDERADO


BOGOTÁ

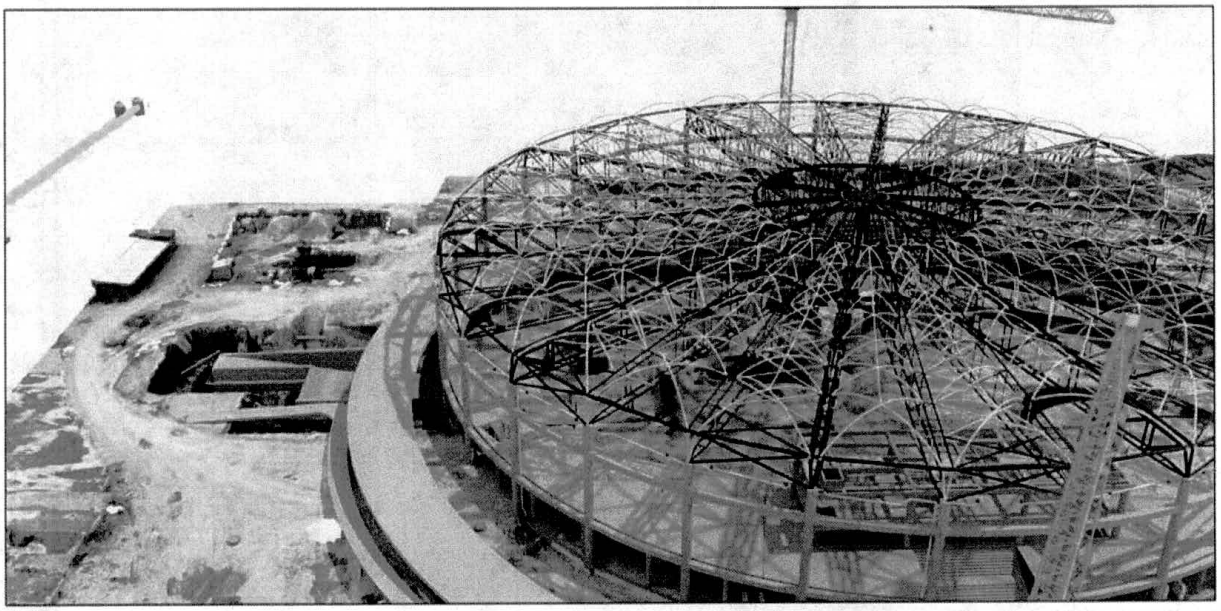

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MODELO FEDERADO

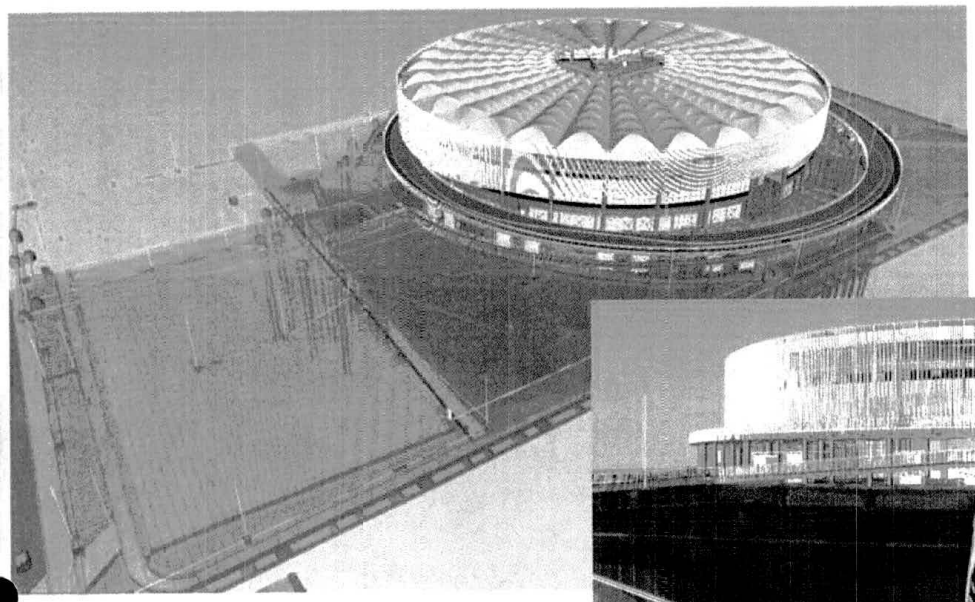

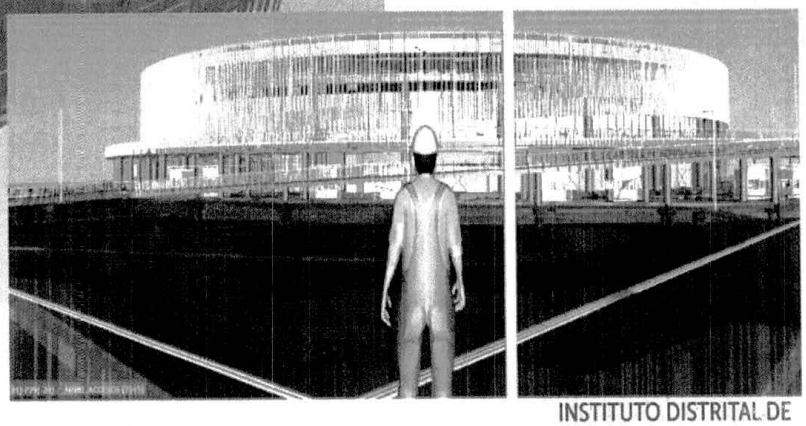

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025	CUMPLIDO
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(*) Pendiente Respuesta IDRD	CIG	19 y 29 /12/2025	PENDIENTE

(*) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 80.517.224.198,06	54,48%
% EJECUCIÓN	$ 76.577.378.932,84	51,82%
% COSTO	$ 76.577.378.932,84	51,82%

AVANCE	-2,66%

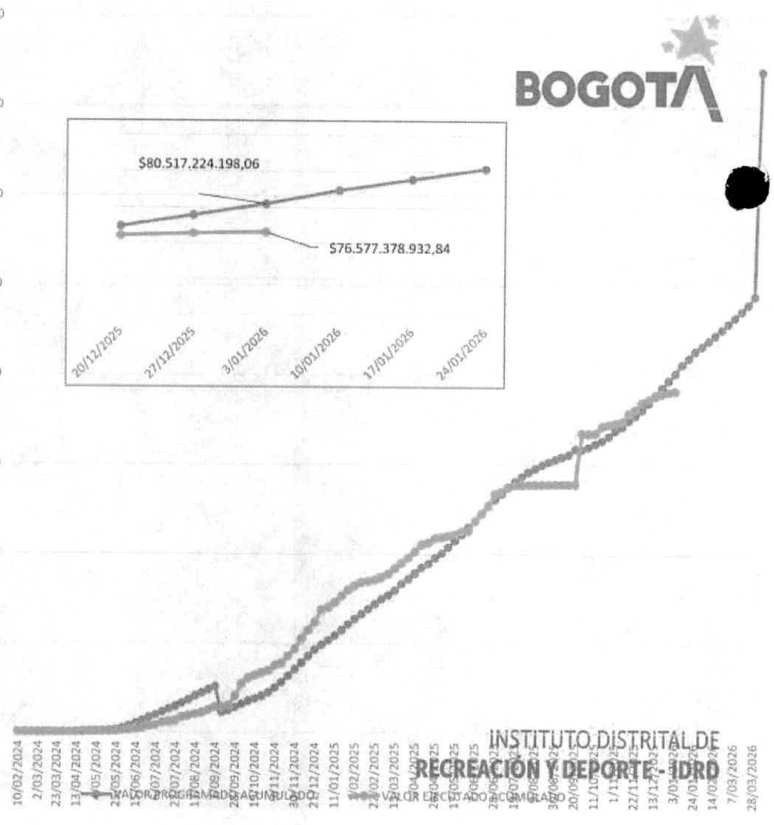

03/01/2026 **programación v3**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
FE -023	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE -024	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO

MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

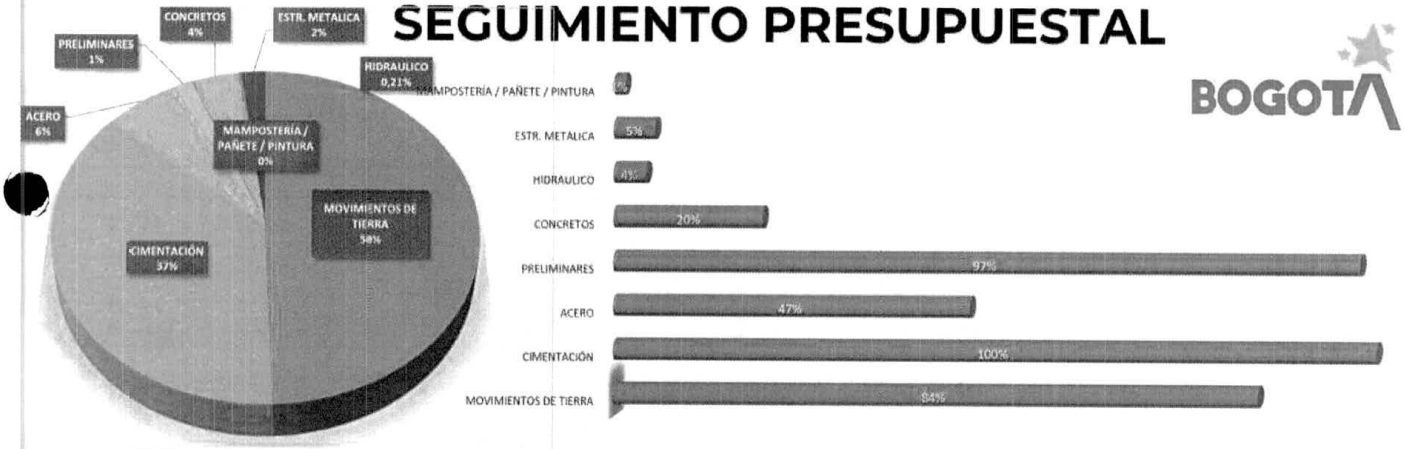

BOGOTÁ

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METALICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	$ 61.010.761.815,00	$ 3.359.341.754,00	$ 1.868.397.139,00	$ 6.285.143.403,00	$ 72.523.644.111,00

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 5	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO PARA LOSA DE CONTRAPISO Y/O FUNDACION, FABRICADOS EN POLIETILENO EXPANDIDO CON MATERIAL TIPO ICOPOR, DENSIDAD 8 KG/M3 RECUBIERTO EXTERIORMENTE EN POLIETILENO CAL 3	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE TUBERÍA PVC –S, YEE, SEMICODOS, CODOS, SIFON, SALIDAS SANITARIAS.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7 Y 11, PASARELA	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
MODULO 4 Y 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. INLCUIDO LOS TRASIEGOS.	CONTINUA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	



RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización del 100% - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.


MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA

BOGOTÁ


AVANCE EN CORTE

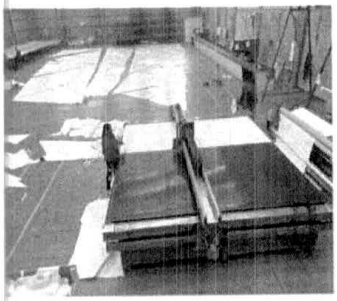


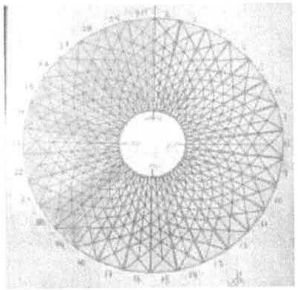


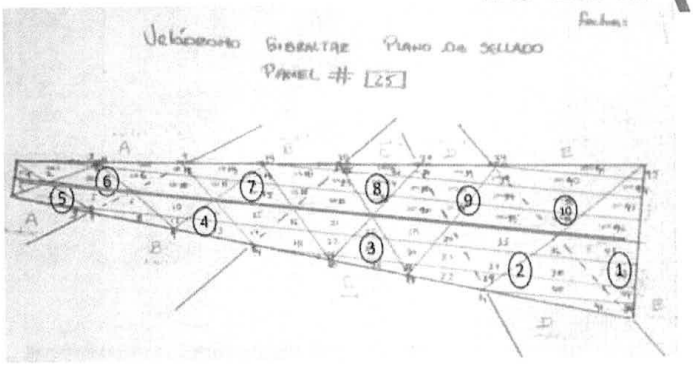

AVANCE EN SELLADO





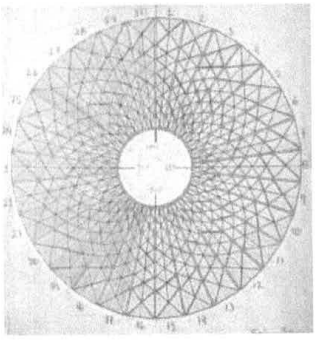

10 SECCIONES POR PANEL

TOTAL NACIONALIZADO: (341,85 m2/Panel) * 30 Paneles = 10.256 m2

AVANCE EN SELLADO (m2): 10.256 m2 = 10.256 m2/ 10.256 m2 = 100%

TOTAL MÓDULOS DE PANEL SELLADAS = 300 Unidades y/o Secciones

TOTAL SECCIONES NACIONALIZADAS A LA FECHA = 100 Unidades y/o Secciones

RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

BOGOTÁ

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 07 de Diciembre de 2025	6,66 Ton
dic-25	07 de Diciembre al 14 de Diciembre de 2025	1,65 Ton
dic-25	14 de Diciembre al 21 de Diciembre de 2025	2,55 Ton
dic-25	22 de Diciembre al 28 de Diciembre de 2025	5,50 Ton
dic-25	29 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	10,73 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	254,99 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***254,99 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE PCC: **23,46%**


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	**9586TA6A-1**	**1 Unds**	**6649,76 Kg**	**6649,76 Kg**	**6,65 Ton**
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
					Total	21 Unds		**Total**	198,69 Ton

BOGOTÁ


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 22 al 28 de Diciembre:

2 Unds para **15,07 Ton**

TOTAL : 198,69 TON.




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 13 y 14

BOGOTÁ



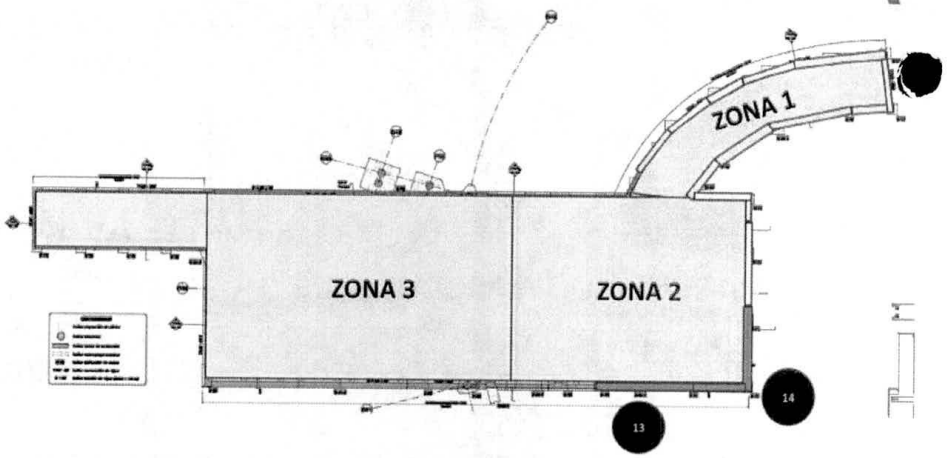

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TUNEL DEPORTIVO – TRAMOS 23 al 27



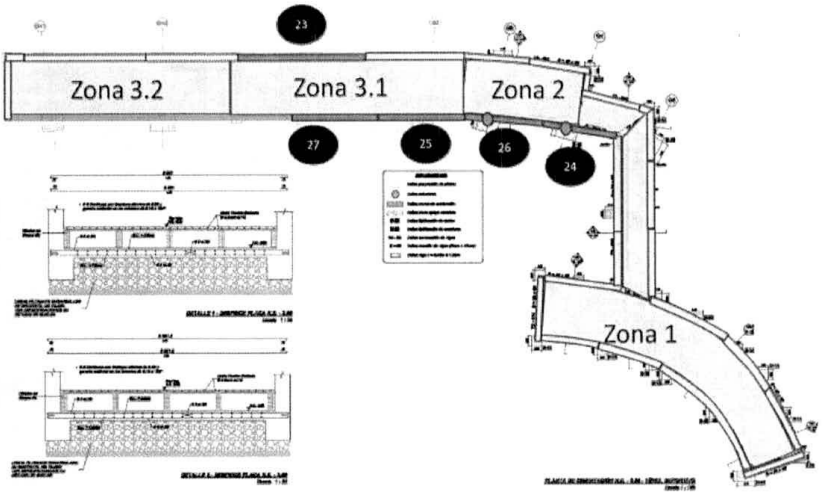


Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE PLACA MÓDULO 5 – TRAMO 1

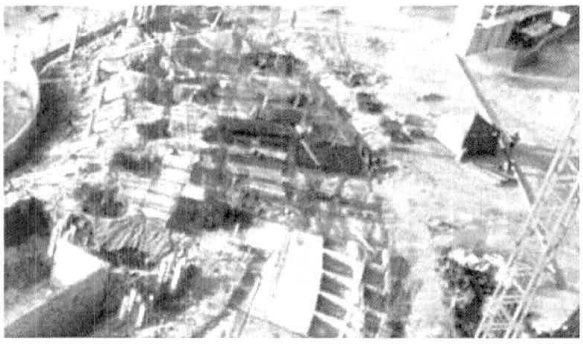



Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo


PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE PLACA – MÓDULO 6 – Tramo 1

BOGOTÁ

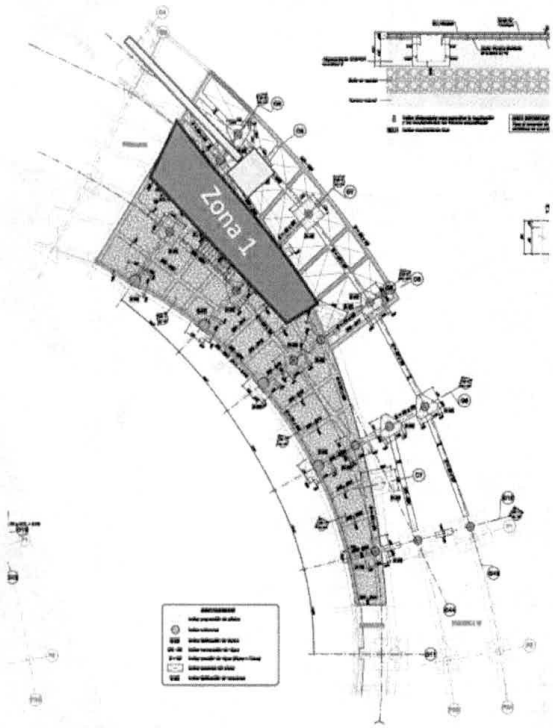

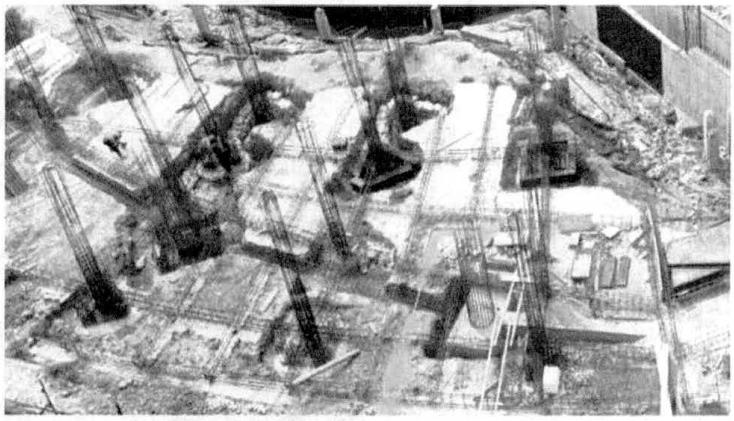

Zona Vaciada en el Periodo


Zona Vaciada Previamente

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADO MÓDULO 11 – ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ



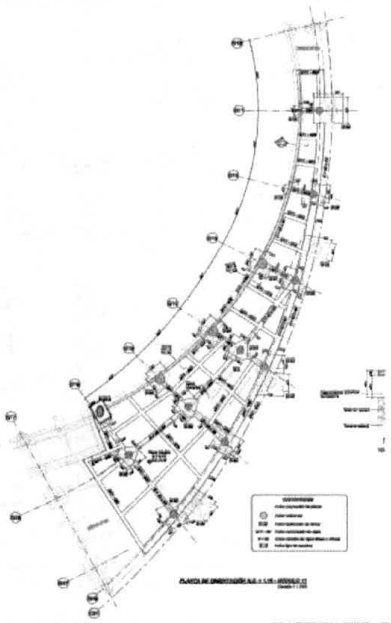


Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M11 – E01
PLANTAS ESTRUCTURALES – MÓDULO 11

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 1 – COLUMNAS DE CUBIERTA

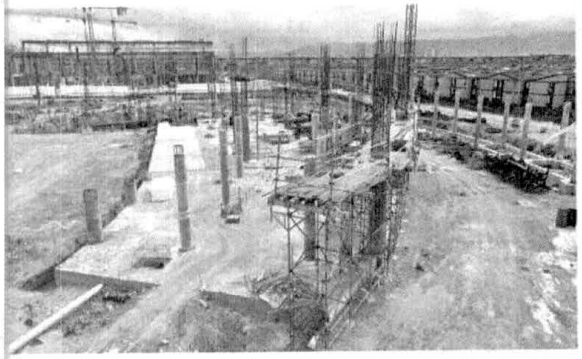

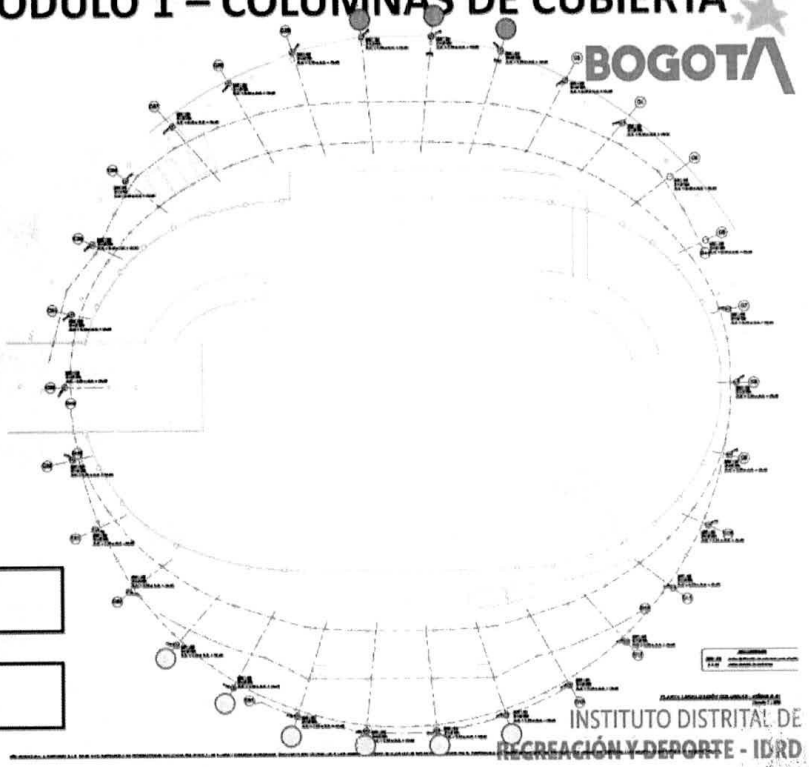



Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

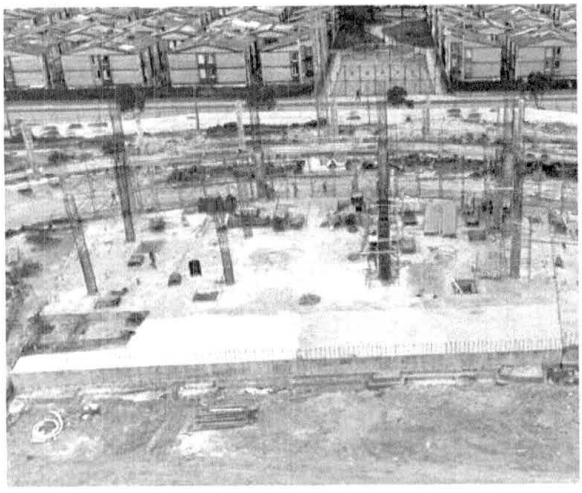

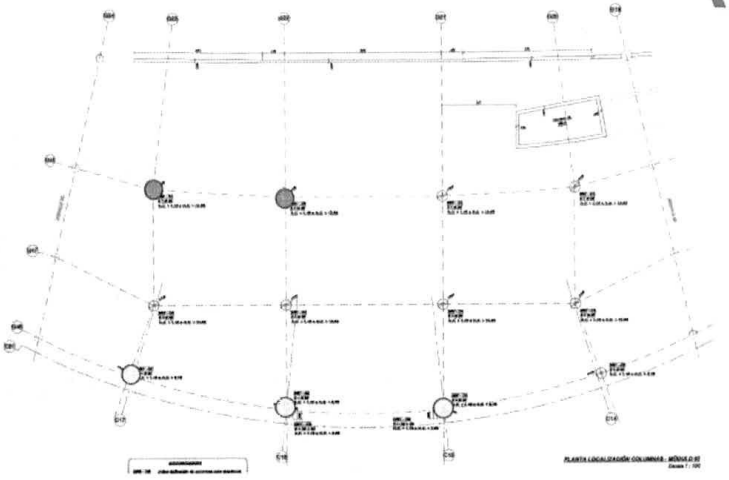

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 16 – ZONA DE PASARELA

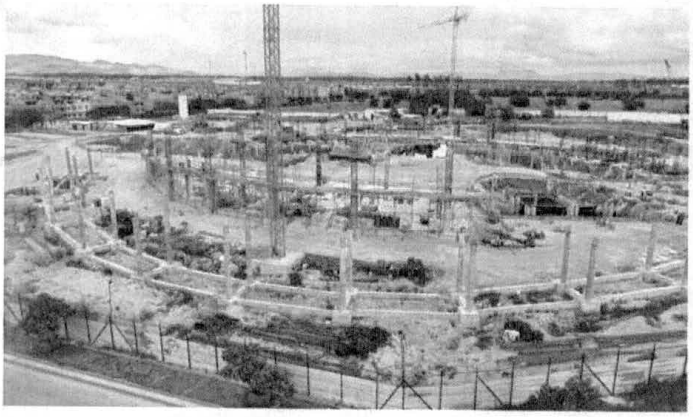

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

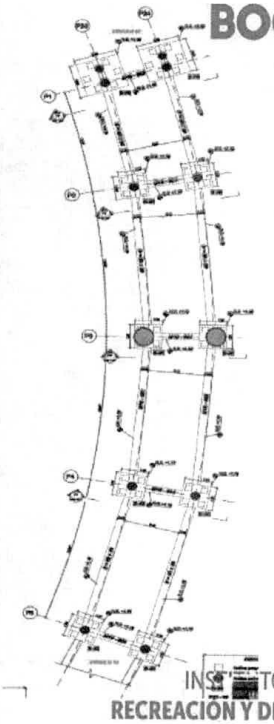

PLANO M16-E01
PLANTA ESTRUCTURALES MÓDULO 16 -PASARELA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS TÚNEL DE AMBULANCIA






Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL
DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

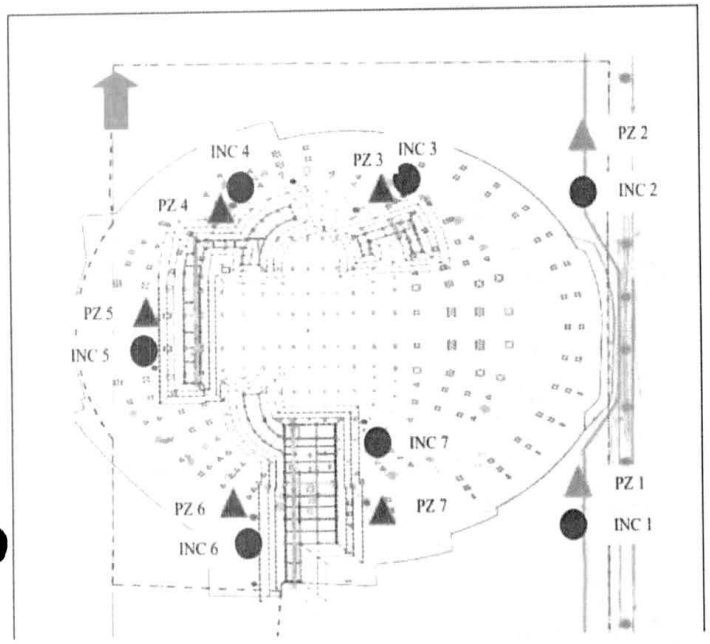

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 15 al 22 de diciembre de 2025; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.17 m y 8.92 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 2 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.28 y 6.12 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Durante la semana del 29 de diciembre al 03 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza la instalación de tubería de 1-1/14" PVC para el alumbrado exterior en modulo 5.


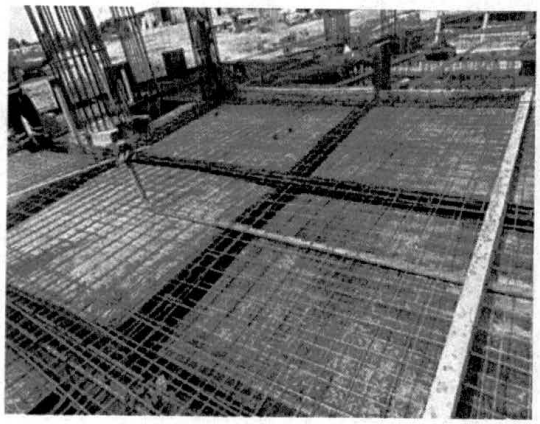




CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Se realiza la instalación del primer tramo de tuberías para la red de media tensión que entran en la subestación con 4 tubos de 6 pulgadas PVC en el modulo 5.

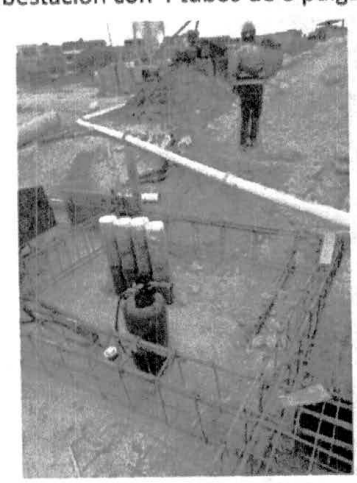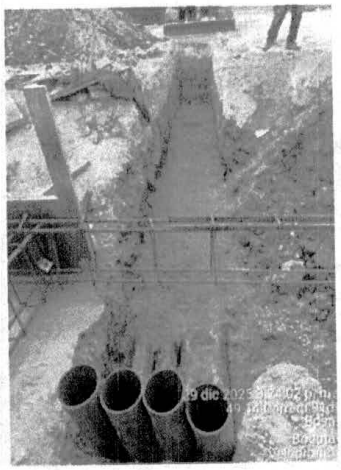




CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Se realiza la instalación de tuberías para comunicaciones de la pista en modulo 6.

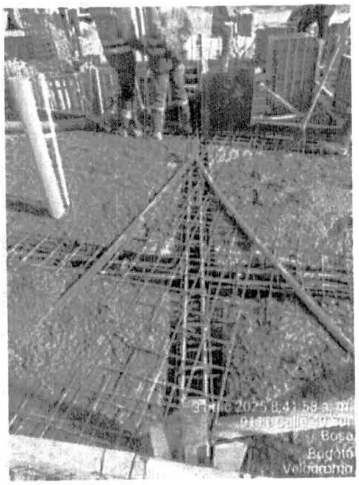



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

Hidrosanitario

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 05/01/2025	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Certificado de nacionalización del 100% - Membrana de Cubierta Proyecto Velódromo Gibraltar.


REDES HIDROSANITARIAS

BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se sigue con la instalación del geodrén perimetral del Túnel Administrativo.

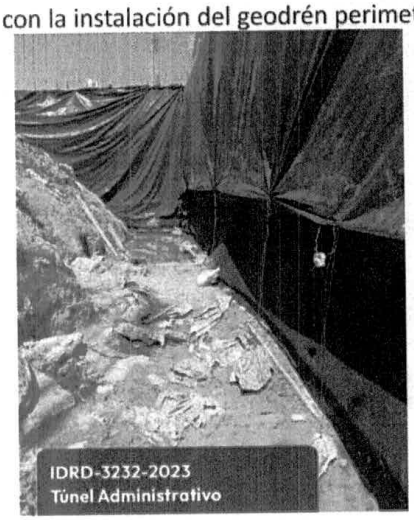

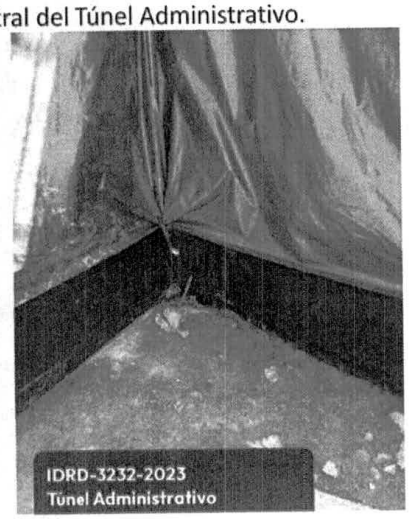

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Velodromo

FECHA: 08/01/2026 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: RESPONSABLE DEL EVENTO: LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Sara Eulalia Chaparro Gordillo	1057581903	Hidrogeologa	Ambiental		UTMP	sarageology19@gmail.com	3204386100
2	Paula Blanco Alarcón	1073383650	Res. Ambiental	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
3	Yammy Lorena Leon G.	53094044.	Insp. SST.	UTMP.		UTMP	sst.velodromo@cyg.com.co	3166205158
4	JOHN HANUART RAMOS PEÑA	80002268	COORDINADOR	UTMP		UTMP	coordinador.bim@cyg.com.co	
5	José M. Guleano V.	80031322	Residente	UTMP		UTMP	estructural.velodromo@cyg.com.	3005510274.
6	Angela M. Sánchez C.	1020.739.111	Programación	UTMP		UTMP	Programacion.velodromo@cyg.com	3003522693
7	Juan Javier Espinel Silva	1070006933	R. Forestal	UTMP		UTMP	r.forestal.velodromo@gmail.com	3178778628
8	Claudia Infante Jaimes	68298723	Bióloga	UTMP		UTMP	claudiabious@gmail.	3202707471
9	Diego F. Cortes T.	1116477876	Coldad	UTMP		UTMP	Coordinador@cyg.com	3152579757
10	Jhon James Ortiz Vera B	7509147	Hidrogeologo	C.I.G		CIG	James.ortiz@cyg.com.	3117172107
11	Andrés Guleano Gonzáles	1022362548	Res Patay Proy	CIG		CIG	presupuestos.intergibraltar@gmail.com	3192385243
12	Ivonn Pérez Téllez	1026279000	Apoyo supervisión	STC		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	3223578250
13	Oscar Javier Soza Ortega	80761720	Apoyo Hidrosant	STC		IDRD	Oscar.soza@idrd.gov.co	3003101408
14	Julián Ricardo Agudelo Niño	80767393.	R. Ambiental	Interventoría		CIG	Julianagudeloingeniero@gmail.com	3202336372
15	Yhonyluz Zumiral Cuvuqui	52.444.804	R. Social	interventoría		CIG	Jeisivelasquez@gmail.com	3182203175
16	Eleana Suaza Garcia	1026267356	Biologa	CIG		CIG	eleana.suaza.biologa@gmail.com	3115049946
17	Lindy Rubiano Mayano	1051954740	RES. SST INTE	CIG.		CIG.	Interventoria.SGSST velodromo@gmail.	3202549891
18	Bibiana Roda Soza Linares	52996077	Apoyo SST Calidad	STC IDRD		IDRD	bibiana.soza@idrd.gov	3154649125

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V2

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Velodromo

FECHA: 08/01/2026 HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Carmen Lucia Velez Valdenus	65774928	Apoyo S. Social	STC		IDRD	carmen.velez@idrd.gov.co	3204084770
2	Diana Maria Ortiz Dominguez	1014202007	Res. Social	UTMP		Contratista	Social.velodromo@3538584	
3	EDGAR SOLORZANO PERDOMO	1922797	Coord. Interv.	C.I.S		C.I.G	coordinf.carvd.i.e@gmail.co	
4	Rubén D. Crespo. B.	19496609	Dtor Interv.	C.I.G.		C.I.G.	rubendcrespo@yahoo.es	3103231119
5	LINA JOHANNA FALLA L.	52.517.090	Ap. Supervisión	STC - IDRD		IDRD	lina.falla@idrd.gov.co	3103432772
6	Juan Pablo Villate Diaz.	1014010937	Ap Supervi.	STC - IDRD		IDRD	juan.villate@idrd.gov.co	3197021334
7	Jaime Cañón	80096733	Ap. Sup.	STC - IDRD		IDRD		
8	Alfonso Peñarando Suarez	80223391	Director	UTMP	APS	UTMP	a.penaranda@cyg.com.co	
9	Carlos Ferreira.	79151009	Rep. Legal	UTMP		"	"	
10	Rodrigo Ospino	79685757	Rplegal	UTMP		UTMP	krodrigo@cyg.com.co	
11	Andres Vega	79882811	Director Tec	UTMP		UTMP	cvega@cyg.com.co	3112501123
12	Javier Osvaldo Sanchez Lago	1014177632	Apoy Tec Sup	STC		IDRD		
13	Katherin Amaya Roa	1016026253.	Supervisora	STC		IDRD		
14	Francy Liliana Murillo	52968323	Apoy. Tec Sup.	STC - IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043666785
15	EDWIN ESCOBAR	94497629	Apy Tec	STC - IDRD		IDRD	edwes1@gmail.com	3116058975
16	Astrid Viviana Rojas C.	52982504	Prof GRD	C16		C16		3157491502
17	Armando Rodriguez Torres	80276213	Residente	CIG		C16	—	—
18	CARLOS EDUARDO GUZMAN SANCHEZ	79'617388	Residente	UTMP		UTMP	—	—

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.8

6

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Velodromo

FECHA: 08/01/2026 HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3210-2022

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ivone Lliana Agudelo Gutierrez	1088301222	Prof Dpcp	STC		IDRD	ivone.agudelo@idrd.gov.co	3115002836
2	Jhon James Ortiz Alvarado	75091421	Ingeniero	CIG		CIG	jamesortiz.gibraltar@gmail.com	3117977737
3	Andrés Gibson González	1022362548	Res Pcto y Prog	CIG		CIG	presupuestos.intergibraltar@gmail.com	3102385243
4	Eduard Antonio Corredor	80383913	Residente Inst. Electricos	UTMP		UTMP	electricos.velodromo@cxg.com.co	3004290 [illegible]
5	Samer Arias Sepulveda	79627799	Profesional electrico	CIG		CIG	elec.gibraltar@gmail.com	320 [illegible]
6	Andres Felipe Lengua R.	1068002731	Prof HS-PCI-Cons	Interventoría		CIG		3106684608
7	Wilber Pierre Sánchez M	1053806239	Prof BIM	Interventoría		CIG	bimvelodromo@rodrarq.com.co	
8	Arturo Rojas Torres	13873937	Residente	CIG		CIG	interventoria.velodromo	5166420036
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.0

Marca temporal	Nombre	Cedula:	Correo electrónico	Cargo:	Entidad:	Número de teléfono
8/01/2026 8:41:24	LAURA MILENA RAMIRE.	52764737	lauram.ramirez@idrd.gov.co	Contratista	IDRD	3103378617
8/01/2026 8:43:13	JAIRO PARRA REYS	1143829208	jairo.parra@idrd.gov.co	Contratista	IDRD	3052150830

Si no maneja consecutivo	COMITÉ TÉCNICO Y TRANSVERSALES Contrato de OBRA: 3232/23 - Contrato de INTERVENTORIA: 3219/23	DD	MM	AA
ACTA No.93		15	1	2026

LUGAR: Presencial IDRD **HORA DE INICIO:** 8:10 a.m. **HORA FIN:** 10:17 a.m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia presencial y Virtual		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los componentes transversales	4.
2. Presentación de los componentes técnicos	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

Se inicia la sesión del comité. La Interventoría solicita el permiso correspondiente para efectuar la grabación del encuentro, sin que se presenten observaciones u objeciones por parte de los asistentes; en consecuencia, se autoriza y se inicia el registro.

COMITÉ COMPONENTES TRANSVERSALES No 93,1

COMPONENTE SOCIAL: En las Diapositivas 3-4 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado, el Componente Social ejecutó actividades orientadas a la participación ciudadana y a la atención al ciudadano dentro del área de influencia del proyecto. Se realizó la convocatoria al Comité de Participación No. 22, enviada por la firma contratista el 08 de enero de 2026, la cual fue revisada por la Entidad el 09 de enero de 2026, quedando pendiente la atención de las observaciones formuladas.

En materia de atención al ciudadano, se gestionaron 23 PQRS, alcanzando un 100 % de cierre, sin registros de PQRS abiertas ni en trámite. Lo anterior evidencia un desempeño eficiente del componente en la gestión social y en la respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad.

COMPONENTE AMBIENTAL: En las Diapositivas 6-7 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado, el Componente Ambiental desarrolló actividades de gestión, control y mitigación de impactos en las áreas de Edificio E, Pasarela R, Urbanismo U y Parqueadero P, así como en zonas externas asociadas al proyecto. Se ejecutó la capacitación en buenas prácticas ambientales el 09 de enero de 2026 y la capacitación en manejo del vidrio el 19 de diciembre de 2025, dirigidas al personal de obra.

En materia operativa, se realizaron acciones de protección de materiales y de árboles externos, limpieza de cajas de la red pluvial, mantenimiento de sumideros y el retiro de 35 m³ de RCD, garantizando el adecuado manejo ambiental de la obra. Adicionalmente, se efectuó la gestión y retiro de RESPEL, con un avance acumulado del 85,98 %, equivalente a 65.382.299 kg ejecutados de 76.040.380 kg presupuestados. Por zonas, el avance fue del 85,15 % en Edificio E, 100 % en Pasarela R, 87 % en Urbanismo U y 100 % en Parqueadero P.

Finalmente, se alcanzaron indicadores ambientales satisfactorios, con un 99,80 % de aprovechamiento de RCD y una circularidad del 20,02 %, evidenciando el cumplimiento de las metas ambientales establecidas para el proyecto.

Se comenta tambien las conclusiones de la reunion efectuada el dia 14/01/2026 denomidada MANEJO ZONAS VERDES VELÓDROMO en donde se establecieron lineamientos de presentacion de la alternativa definitiva para el manejo de las zonas verdes del velódromo, donde se discutió la propuesta de impermeabilización y las diferentes capas que lo conformaria, esto con el objetivo de presentar propuesta definitiva al la entidad contratante IDRD para tramite ante la autoridad ambiental SDA.

Se comenta también que el contratista cumplió el compromiso de radicar en oficio la información relacionada con el manejo de zonas verdes mediante radicado CE-206-125-2143 del 8 de enero de 2026 y que en marco de este oficio se realizó mesa de trabajo conjunta el dia 14/01/2026 denomidada MANEJO ZONAS VERDES VELÓDROMO en donde se establecieron lineamientos

de presentacion de la alternativa definitiva para el manejo de las zonas verdes del velódromo, donde se discutió la propuesta de impermeabilización y las diferentes capas que lo conformaria, esto con el objetivo de presentar propuesta definitiva al la entidad contratante IDRD para tramite ante la autoridad ambiental SDA. El contratista informa que a más tardar el próximo miércoles 21 de enero radica esta información ante la interventoria para revision pertinente. Compromisos de la reunion:

1. Presentar la propuesta definitiva de sello, en donde se contemplen las medidas para evitar contacto del usuario final con el relleno antrópico, con lixiviados y con gases (Oral, dérmica e inhalatoria).
2. Definir técnicamente si es necesario la instalación de un geotextil entre la capa "Terreno existente" - "Lleno desde terreno existente".
3. Presentación de la propuesta miércoles 21 de enero 2026,

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO: En las Diapositivas 09 al 12 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida así:

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades técnicas orientadas al monitoreo, control y reducción de riesgos ambientales y operativos en diferentes frentes de obra, con énfasis en el manejo de lixiviados, aguas lluvias, control de olores, prevención de incendios y estabilidad física.

Se realizó la evacuación de lixiviados en las zonas excavadas del Túnel Administrativo y Túnel Deportistas, mediante la activación de motobombas y el uso de Catch Tank como sistema de contención temporal. El retiro y disposición final se efectuó mediante carro cisterna, logrando la evacuación de 31.880 kg de lixiviados, bajo inspección permanente de mangueras y geomembranas. Estas acciones se enmarcan en el monitoreo y reducción de los escenarios de riesgo ER07 a ER14.

En cuanto al manejo de aguas lluvias y control hidrogeológico, se ejecutó la limpieza del canal de aguas lluvias en la zona norte, con evacuación del agua acumulada hacia el pozo de achique. Adicionalmente, se activaron motobombas para la evacuación de aguas lluvias del pozo de achique de la zona central, descargando de forma controlada a la alcantarilla. Se realizó la medición del nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra, como parte del seguimiento técnico a los escenarios de riesgo ER07 a ER14.

Para el control de olores y gases, se desarrollaron jornadas preventivas de aplicación de cal en zonas excavadas. Asimismo, se efectuaron 11 jornadas de monitoreo de gases volátiles en frentes de trabajo activos, obteniendo resultados de 0 % LEL de CH_4, evidenciando ausencia de riesgo por atmósferas explosivas. Estas actividades aportan al monitoreo de los riesgos ER08, ER12 y ER13, y a la reducción de ER07, ER09, ER10 y ER14.

En el componente operativo, se realizó la inspección del vehículo carro cisterna, verificando la disponibilidad y condiciones del kit de emergencias y control de derrames, como medida preventiva ante contingencias ambientales.

Finalmente, se ejecutaron acciones de prevención de incendios y estabilidad física, mediante el monitoreo y mantenimiento del cortafuegos en el área de material para reconformación, asociado a los riesgos ER04 y ER16, y el mejoramiento de la protección de taludes con polietileno, complementado con jornadas de orden y aseo en bermas.

Estas actividades evidencian un avance efectivo en la gestión integral del riesgo, garantizando a la fecha condiciones de seguridad, control ambiental y continuidad operativa en la obra.

COMPONENTE SST: En las Diapositivas 34-38 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el periodo comprendido entre el 05 y el 11 de enero de 2026, el proyecto contó con un promedio de 122 trabajadores, distribuidos principalmente en frentes operativos, destacándose 37 ayudantes, 20 oficiales, 25 profesionales y 13 herreros, lo que evidencia una alta concentración de personal expuesto a riesgos propios de actividades de obra civil, especialmente trabajos en campo y en alturas.

En cuanto a maquinaria, equipos y vehículos, se dispuso de un parque operativo variable entre 0 y 8 unidades, garantizando la continuidad de las actividades programadas. Se realizaron controles preventivos enfocados en la verificación de condiciones seguras de operación y cumplimiento de lineamientos del SG-SST.

Respecto a la accidentalidad y ausentismo, entre febrero de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 56 casos de ausentismo, con mayor incidencia en diciembre de 2025 (7 casos). En materia de accidentalidad, se reportaron 8 accidentes de trabajo, de los

cuales 4 se encuentran cerrados —incluyendo el cierre del accidente del trabajador Omar Cruz durante la semana evaluada— y 4 permanecen abiertos, los cuales continúan en proceso de seguimiento hasta su cierre definitivo.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades preventivas e inspecciones SST en los frentes de obra, incluyendo inspecciones de trabajo en alturas, verificación y armado de andamios y escaleras, inspección y entrega de dotación y EPP, instalación de señalización de seguridad, jornada de vacunación al personal y acompañamiento técnico durante la llegada y descargue de estructura metálica.

Como resultado de las inspecciones, se identificaron hallazgos relacionados con anclajes inadecuados del personal, bases de andamios en mal estado y secciones de andamio incompletas, los cuales fueron atendidos mediante acciones correctivas inmediatas, fortaleciendo el control del riesgo y las condiciones de seguridad en obra.

En conjunto, las actividades desarrolladas evidencian un avance efectivo en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con énfasis en la prevención de accidentes, el control de riesgos críticos y la protección integral del personal en los frentes de obra.

Se comenta por parte de la interventoria que la subsanacion delas observaciones del informe de Interventoria No 19 se remitieron al IDRD y se esta a la espera de la lista de chequedo de aprobacion definitiva, los informes 20-21-22 continuan en revision por parte de la entidad y se remitira el Inf. No 23 el dia 16/01/2026 de manera digital segun ultimos lineamientos de la supervision del IDRD.

COMPONENTE DE CALIDAD: En las Diapositivas 39-46 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el periodo comprendido entre el 05 y el 11 de enero de 2026, el proyecto presentó avances significativos en los componentes estructurales y de control de calidad, manteniendo coherencia con la programación y los lineamientos técnicos aprobados.

En el componente de estructura en concreto, se ejecutaron 76,15 m³ correspondientes a muros de los Túneles Deportivo y de Ambulancia, columnas en los Módulos 1, 2, 3, 5 y 16, y vigas y dados en el Módulo 6, alcanzando un 100 % de avance semanal. El volumen total acumulado de concretos estructurales ejecutados asciende a 2.376,58 m³, con ensayos y controles realizados conforme a las normas NTC 396 y NTC 673.

En cuanto al acero de refuerzo, el proyecto registra un acumulado de 471,06 toneladas. Durante la semana evaluada no se presentó ingreso de nuevo material, manteniéndose el control documental y de trazabilidad del acero previamente allegado.

El componente de estructura metálica de cubierta reportó el ingreso de 1 elemento equivalente a 9,99 toneladas, alcanzando un acumulado total de 208,68 toneladas (24 unidades) suministradas, correspondientes principalmente a cerchas principales y elementos especiales del domo principal. Se adelantaron actividades de inspección en obra y control de conformidad con planos aprobados.

Respecto al control de cambios y rediseños, la mayoría de los componentes estructurales, arquitectónicos y técnicos del velódromo se encuentran aprobados mediante oficios del IDRD, incluyendo módulos, graderías, pasarelas, túneles, cubierta, sistemas eléctricos, RCI, HVAC, comunicaciones y CCTV. Permanecen pendientes algunos frentes específicos como pozos eyectores, pasarela de mantenimiento, estructura de fachada, sistema de gas, paisajismo (SUDS) y componente bioclimático.

Finalmente, desde el componente de calidad, se destaca la aprobación del Informe de Calidad No. 23 y la radicación de la quinta entrega del Dossier de Calidad de la Estructura Metálica de Cubierta, consolidando el seguimiento técnico, la trazabilidad y el cumplimiento normativo del proyecto.

COMITÉ TÉCNICO No 93,2

COMPONENTE BIM: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 03 del informe semanal UTMP.

1) Entrega de modelo visual de Ítems NP adicionales a tramitar – REDES. PENDIENTE teniendo en cuenta que irian en el modificatorio No 3, esto tambien teniendo en cuenta cambios de parametrizacion con el area de presupuestos. la interventoria manifiesta que es necesario para tener alarmas 8en caso tal) en el seguimiento en la ejecucion de este componente en la obra en ejecucion.
2) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*) PENDIENTE la UTMP comenta que se ha venido actualizando parametrizando con los elementos hidro sanitario y se actualiza segun propuesta VANTI.

3) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo. se esntregara la Version 1 de la planimetria en el proximo comité 22/01/2026. PENDIENTE
4)Entrega de simulación 4D a 28 de febrero de 2026 – Estructura Velódromo. CUMPLIDO

En las Diapositivas 39-46 se desarrolla por parte de la UTMP las siguientes actividades las cuales de presentan de manera resumida asi:

Durante el período evaluado, el Componente BIM adelantó actividades de seguimiento y control del avance estructural en la totalidad del proyecto, incluyendo los Módulos 1, 2, 3, 7 y 16 (Pasarela), así como el Túnel Principal y el Túnel Deportivo. El control se realizó mediante la identificación del ejecutado del período, el avance acumulado de períodos anteriores, el avance proyectado y las actividades en ejecución, garantizando la trazabilidad entre la planeación y la ejecución de obra.

Adicionalmente, se efectuó el seguimiento a los pagos de insumos estructurales, asociados a las Actas de Fijación No. 18 (octubre de 2025) y No. 19 (noviembre de 2025), asegurando la coherencia entre el avance físico modelado y la gestión administrativa del proyecto. Como parte de la planificación y coordinación, se desarrolló la simulación 4D de la estructura con proyección a 28 de febrero de 2026 y se avanzó en la coordinación de obra y diseños mediante el modelo 3D de la membrana de cubierta, fortaleciendo la integración técnica entre diseño y ejecución.

COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 22.

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. PENDIENTE se avanza en la subsanación respectiva por parte de la UTMP. Se desarrollará mesa de trabajo CIG-UTMP 15/018/2026.
2) Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP. CUMPLIDO se hace remisión del borrador a la entidad contratante IDRD se complementara remision a parte juridica y se espera respuesta respectiva del IDRD.
3) Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026) Pendiente Respuesta IDRD, esto se tendra una vez se ejecute visita el dia 16/01/2025 al subcontratista de la membrana por parte del IDRD-CIG-UTMP.
Se comenta por parte de la Supervision que se deben definir el tema de lao NPs y ajustar con el alcance REAL segun proposiciones del modificatoria, se recuerda la finalizacion del contrato es el proximo 05/04/2026.

Se presenta desde la diapositiva No 18 hasta la No 24, las actividades tecnicas presupuestales desarrolladas y que son la base de las cantidades mostradas durante la reunion.

El avance programado acumulado es del 55,77% ($82,421,632,554,54), mientras que el avance ejecutado real alcanza el 52,01% ($76,862,514,844,3), evidenciando un rezago del -3,76% respecto a la programación. El costo incurrido coincide con la ejecución, sin desviaciones presupuestales relevantes.

Por parte de la UTMP se aclara que la programacion empieza a presentar atrasos constantes teniendo en cuenta que se requieren reestablecer tiempo perdidos/pasados del contrato generados por los modificatorios suscritos y sustentados en debida forma y se tendra ajuste respectivo cuando sea firmado el proximo modificatorio.

La facturación acumulada del proyecto asciende a $72.600.786.011, equivalente al 49,13% del valor contractual vigente. Durante 2025 se facturaron $45.226.667.670, concentrándose los mayores valores entre abril y junio, con disminuciones marcadas en agosto y septiembre.

Desde el punto de vista presupuestal, la mayor ejecución acumulada se concentra en el capítulo de movimientos de tierra, con un avance del 84 %, seguido por cimentación, que registra un 100 % de ejecución, evidenciando que estos frentes se encuentran prácticamente concluidos y han jalonado el avance financiero del proyecto.

En contraste, se identifican rezagos relevantes en otros capítulos estructurales y de acabados, particularmente en acero de refuerzo, con un 47 % de avance, concretos estructurales, con apenas 20 %, y estructura metálica, cuyo avance presupuestal alcanza solo el 5 %. Adicionalmente, los capítulos de acabados (mampostería, pañete y pintura) presentan un avance marginal del 1 %, mientras que los sistemas hidráulicos registran un 4 %.

Esta distribución explica la variación negativa del avance general del proyecto (-3,76 %), toda vez que los capítulos con menor nivel de ejecución corresponden a actividades de alto impacto en la curva S y en la consolidación del valor ejecutado frente a lo programado.

En cuanto a la ejecución en obra, se mantienen frentes activos en los túneles de apoyo, administrativo y principal, así como en el Módulo 5, donde se desarrollan de manera continua actividades estructurales en concreto y obras de redes (hidráulicas y eléctricas), conforme a la programación vigente.

Adicionalmente, se dio inicio a la construcción de columnas estructurales en los Módulos 7 y 11 – Pasarela, lo cual representa la apertura de nuevos frentes productivos y contribuye a la ampliación del ritmo de ejecución física del proyecto, en coherencia con la planificación técnica y presupuestal establecida.

Respecto al anticipo, se ha girado el 94% ($35.535.169.187,51), con una amortización acumulada de $21.048.849.991 y un saldo pendiente por amortizar de $18.797.643.991, coherente con el nivel actual de avance financiero, esto correspondiente a la pista, la supervision indaga sobre el contrato con el constructor de pista , subcontratista TEAM SHARK, la UTMP manifiesta que se esta cerrando negociacion en los proximos dias teniendo en cuenta impedimentos personales por parte del RL del subcontraista.

COMPONENTE TÉCNICO: Se da lectura de los compromisos según lo establecido en la diapositiva No 26

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. PENDIENTE, se remitirá por parte de la Interventoria documentos al respecto.
2) Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. PENDIENTE la UTMP revisa los documentos y se dará la respuesta respectiva. PENDIENTE.
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. Se espera respuesta por parte del IDRD a reconocimiento planteado segun radicados No Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral) PENDIENTE se tendrá visita UTMP-CIG-IDRD el dia 16/01/2026,
4) Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar. PENDIENTE. se tendrá visita UTMP-CIG-IDRD el dia 16/01/2026,
5) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD. PENDIENTE.

La supervision solicita que se entregue la informacion de acuerdo a lo solicitado por parte de la respuesta dada por el DADEP y se da lectura las observaciones dadas durante el comité.

La UTMP reporta los avances de confección de la membrana para la cubierta, (Diapositiva No 27 a la 29), así:

Total material a a Nacionalizar 10,256 m2 equivalente a 100% equivalente a 30 paneles en 300 unidades y/o secciones

La membrana arquitectónica de cubierta para canales y faldones contempla un área total de 12.452,43 m², distribuida en varios componentes: los paneles de membrana principal alcanzan 10.230,00 m², a los que se suman 412,08 m² correspondientes a sellos entre patrones y 547,02 m² asociados a faldones perimetrales; los canales comprenden 1.054,80 m² de membrana modelo y 104,18 m² en sellos a la membrana principal; finalmente, los faldones a viga canal aportan 89,70 m² de membrana modelo y 14,65 m² en sellos, conformando en conjunto el total de área requerida para la cobertura arquitectónica del proyecto.

En cuanto al tema de estructura metálica de la cubierta, a la fecha a Obra se ha suministrado un total de 208,68 Toneladas segun el cronograma de recibo suministrado por el subcontratista EMECON Próxima entrega del 12 al 17 de Enero 2026 de 84 Ton. Pendiente llegada a obra de 233,32 Toneladas (Oct-Nov-Dic 2025 y Ene-2026) adicional se informa que en planta hay **912,42 Ton** equivalentes al **83,93%**, en producción **266,32 Ton**, el total proyectado es: **1087 Ton**, su porcentaje de avance es: **24,5%.** (diapositiva 27 al 29)

Dentro de las actividades ejecutadas en la semana, se informa que la estructura metálica de cubierta con secciones de cercha principal acopiada en obra corresponde a **208,68 Toneladas** (Diapositiva 30)

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T46A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
					Total	24 Unds		Total	208,68 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA

Durante el periodo evaluado se registraron avances significativos en el componente de estructura en concreto, con frentes activos en túneles y módulos estructurales del proyecto. En el Túnel Deportivo, se completó la finalización de muros en los tramos 28 al

en túneles y módulos estructurales del proyecto. En el Túnel Deportivo, se completó la finalización de muros en los tramos 26 al 31, abarcando las zonas 1, 2, 3.1 y 3.2, logrando el cierre del frente estructural en este sector. De igual forma, en el Túnel de Ambulancia se ejecutó la fundida de muros en las zonas 15, 16 y 17, complementando las áreas previamente vaciadas y consolidando el avance del sistema estructural del túnel.

En los Módulos 1 y 6, se adelantó la fundida de dados y vigas de fundación, garantizando la continuidad de la cimentación y habilitando los frentes para la ejecución de elementos verticales. Adicionalmente, se ejecutó la fundida de columnas estructurales en el Módulo 16 (zona de pasarela) y en el Módulo 1 (columnas de cubierta), fortaleciendo la estructura portante para los sistemas superiores.

En los Módulos 2 y 3 (zona de edificio) se continuó con la fundida de columnas, integrando los vaciados del periodo con los previamente ejecutados y evidenciando un avance progresivo del sistema estructural. Finalmente, en el Módulo 5 se realizó la fundida de la placa de fundación – Tramo 1, completando el tramo programado y permitiendo la continuidad de las actividades estructurales subsiguientes.

En conjunto, las actividades ejecutadas reflejan un avance ordenado y coherente del componente técnico, con cierre de frentes críticos en túneles y consolidación de la cimentación y elementos verticales en los módulos estructurales del proyecto.

En el tema de los informes de instrumentación se leen las conclusiones a la fecha (Diapositiva 39-46):

✓ Durante el periodo comprendido desde el 22 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026, los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable, con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.
✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.19 m y 8.88 m.
✓ Los piezómetros tipo Casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 10 cm; las columnas de agua se encuentran entre 4.30 y 6.22 m de profundidad.
✓ Es importante proteger toda la instrumentación instalada para su correcto funcionamiento.

COMPONENTE ELÉCTRICO: No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 45-48)

Durante la semana del 05 al 10 de enero de 2026, en el área del túnel principal del Velódromo, se ejecutaron actividades de coordinación y ajuste técnico para definir el paso de 17 tuberías IMC de 4 pulgadas, incluyendo la corrección de la ubicación de las cajas de paso conforme al modelo revisado. Se estableció el traspaso de las tuberías a través de los muros de los túneles garantizando la hermeticidad de los pases, y se adicionaron dos cajas metálicas para asegurar una transición técnicamente correcta entre tubería IMC y PVC. Finalmente, se verificaron las alturas, alineación y llegada de las tuberías al muro de concreto, validando su correcta implantación conforme a los criterios constructivos del proyecto.

COMPONENTE HIDRÁULICO: No se tiene compromisos establecidos para el presente comite (Diapositiva 47)

1) Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025. PENDIENTE.
2) Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revision interna CIG-IDRD PENDIENTE.
3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio el dia de hoy 15/01/2025.

En el frente correspondiente a los túneles del proyecto, se finalizó la instalación del geodrén perimetral en el Túnel Administrativo, asegurando la adecuada captación y evacuación de aguas subterráneas alrededor de la estructura. De manera complementaria, se iniciaron las actividades preliminares para la instalación del tecdrén en este mismo túnel, avanzando en la conformación del sistema de drenaje longitudinal. Adicionalmente, se dio inicio a las actividades preliminares para la instalación del geodrén en el Túnel de Apoyo, dejando preparado el frente de obra para la ejecución del drenaje perimetral proyectado.

TEMAS ADICIONALES

Se comenta por parte de la supervision que se tiene reunion/recorrido por parte del Sub Director Técnico de Recreacion y Deportes del IDRD y parte de su equipo para visita de las dos obras Velodromo - CAR.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Respuesta al formato registro de proveedores No 7 (Rad. IDRD No 20252100514222 del 18/11/2025)	IDRD	Sin fecha
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (propuesta) Pendiente según evaluacion de alternativa propuesta.	UTMP	10/12/2025
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.	UTMP	26/08/2025
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. Pendiente respuesta UTMP.	UTMP	31/12/2025
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de revision del IDRD.	UTMP	22/11/2025
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral) Pendiente Respuesta IDRD	IDRD	19/12/2025
Análisis técnico/económico de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según reunión con VANTI el pasado 16/12/2025.	UTMP	25/12/2025
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión del IDRD. Visita predio 15/01/2025	IDRD-EAAB	Sin fecha
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. pendiente respuesta y/o tramite respectivo IDRD	CIG-IDRD-UTMP	23/12/2025
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO.	UTMP	26/12/2025
Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. (**) Se recibe el 02/12/2025 observaciones CIG, pendiente nueva remisión UTMP para posterior remisión IDRD, Visita Castro Rojas 16/01/2026..	UTMP	2/12/2025
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	IDRD	Sin fecha
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN		
¿Se logró el objetivo?	**SI** [X] **NO** [ ]	
Observaciones		

Siendo las _10:16 a.m.__ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N.A	N.A
NOMBRE	ARQ. RUBEN DARIO CRESPO BOTERO	NOMBRE	N.A	N.A
CARGO	DIDECTOR DE INTERVENTORIA	CARGO	N.A	N.A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	ING. Arturo Rojas Torres - residente de Interventoria



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega de modelo visual de Ítems NP adicionales a tramitar – REDES.	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (*)	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – En desarrollo.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Entrega de simulación 4D a 28 de febrero de 2026 – Estructura Velódromo	UTMP - CIG	15/01/2026	PENDIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


AVANCE GENERAL

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.325,093	2.396,110	0.00 % 28.78 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
25.242,36	5.785,21	0.00 % 22.92 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
20.459,34	5.006,03	0.00 % 24.47 % 100.00 %

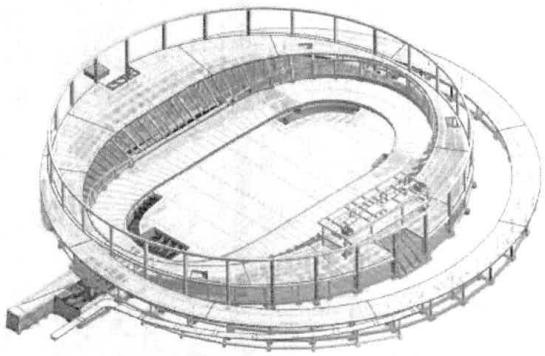

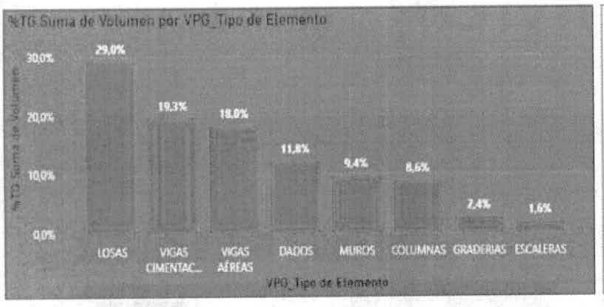

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
GRADERIAS
LOSAS
MUROS
RAMPAS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
9/01/25
3/10/25
6/10/25
9/10/25
11/10/25
16/10/25
20/10/25
24/10/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	132,396	0.00 % 17.55 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	0.00 % (En blanco) 100.00 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	169,42	0.00 % 10.92 % 100.00 %

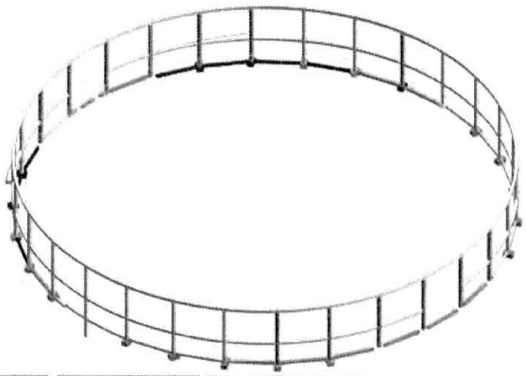

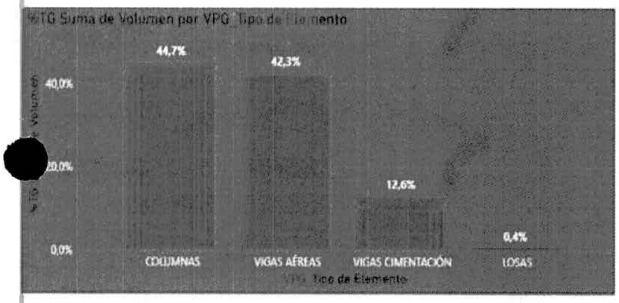

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ LOSAS	☐ 19/12/25	■ Módulo 01
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 20/12/25	☐ Módulo 02
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 22/12/25	☐ Módulo 03
	☐ 23/12/25	☐ Módulo 04
	☐ 29/12/25	☐ Módulo 05
	☐ 2/01/26	☐ Módulo 06
	☐ 6/01/26	☐ Módulo 07
		☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 2


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
842,755	332,331	0.00 % 39.43 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.919,30	1.342,23	0.00 % 45.98 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.846,24	244,30	0.00 % 13.23 % 100.00 %

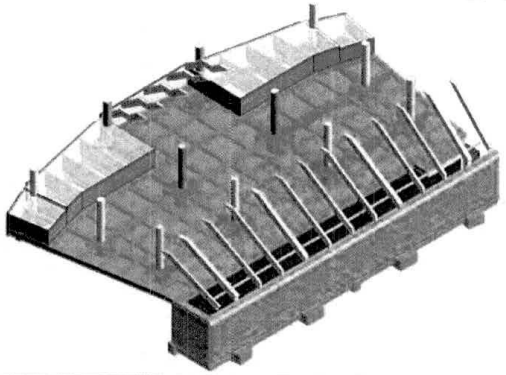

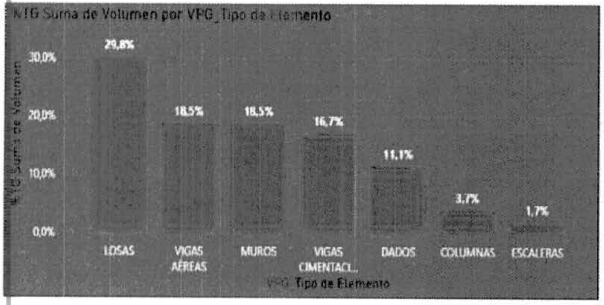

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Graderia
☐ DADOS	☐ 9/01/25	☐ Módulo 01
☐ ESCALERAS	☐ 11/11/25	■ Módulo 02
☐ LOSAS	☐ 13/11/25	☐ Módulo 03
☐ MUROS	☐ 20/11/25	☐ Módulo 04
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 26/11/25	☐ Módulo 05
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 28/11/25	☐ Módulo 06
	☐ 5/12/25	☐ Módulo 07
	☐ 6/12/25	☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 3


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
350,452	22,519	0.00 % 6.43 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
1.104,12	14,84	0.00 % 1.34 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.008,76	35,80	0.00 % 3.55 % 100.00 %

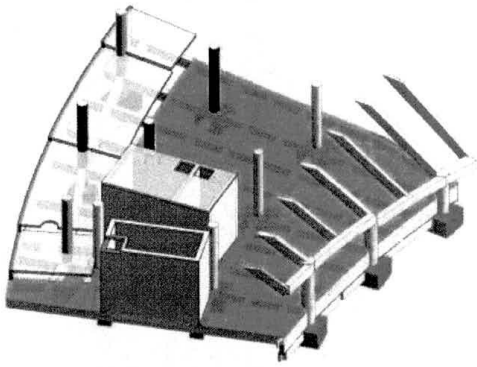

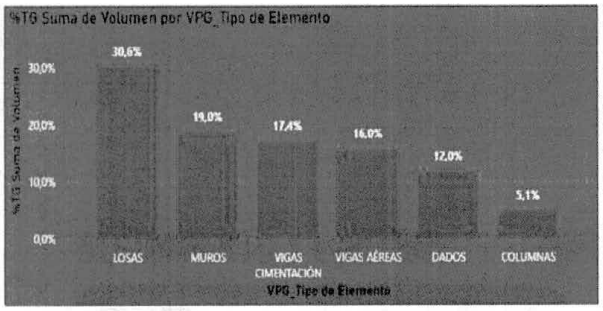


Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
5/12/25
6/12/25
13/12/25
7/01/26

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	271,736	0.00 % 30.22 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	0.00 % 40.00 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.488,74	117,82	0.00 % 4.73 % 100.00 %

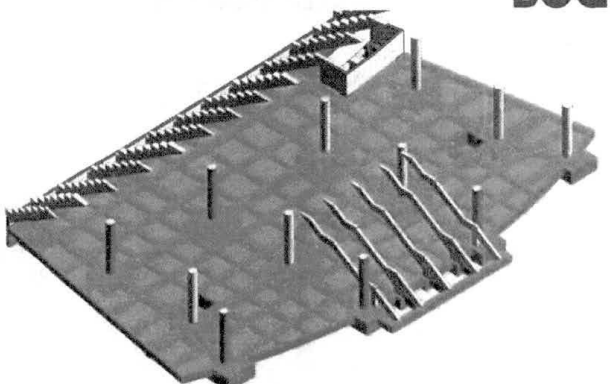

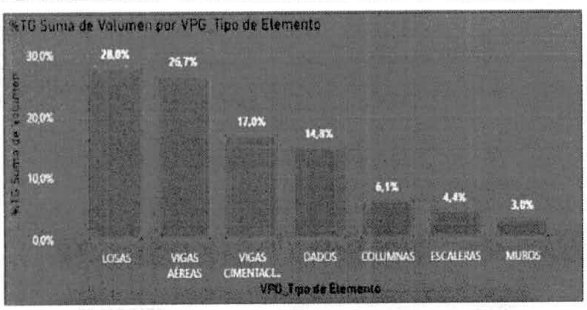


Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
20/11/25
22/11/25
25/11/25
26/11/25
10/12/25
12/12/25
15/12/25
18/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 16 - PASARELA


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
167,936	42,466	0,00 % 25,29 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
425,65	23,12	0,00 % 5,43 % 100,00 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
683,60	278,38	0,00 % 40,72 % 100,00 %

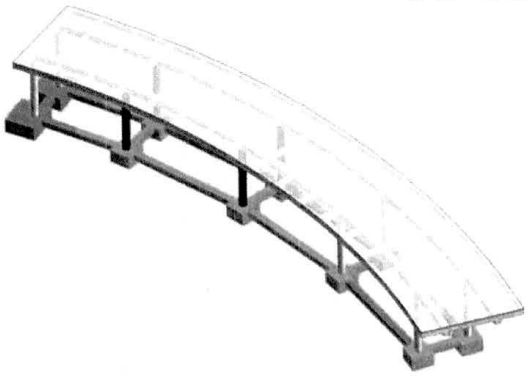

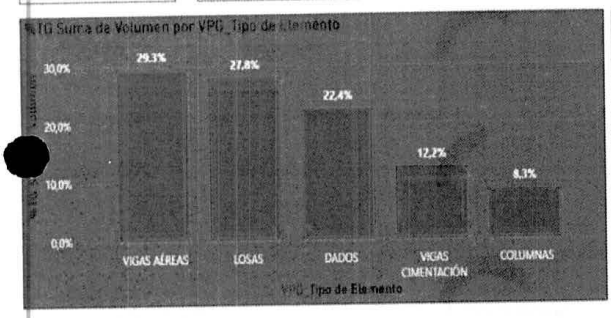

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Módulo 10
☐ DADOS	☐ 3/10/25	☐ Módulo 11
☐ LOSAS	☐ 6/10/25	☐ Módulo 12 - Pas...
☐ VIGAS AÉREAS	☐ 29/10/25	☐ Módulo 13 - Pas...
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 20/11/25	☐ Módulo 14 - Pas...
	☐ 22/11/25	☐ Módulo 15 - Pas...
	☐ 27/12/25	■ Módulo 16 - Pas...
	☐ 31/12/25	☐ Pista
	☐ 3/01/26	☐ Rampa Peatonal

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
644,624	444,946	0,00 % 69,02 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.585,58	1.252,39	0,00 % 48,44 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
986,63	770,46	0,00 % 78,09 % 100,00 %

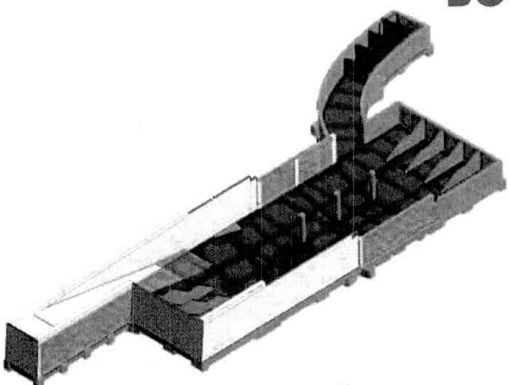

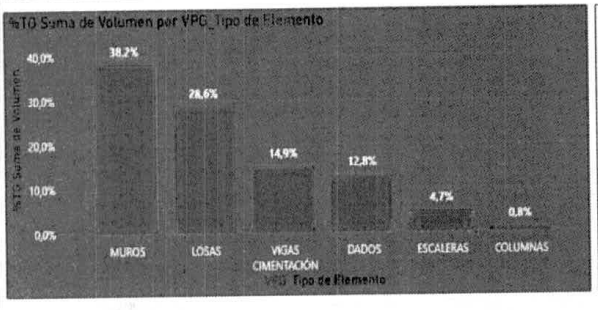

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Módulo 14 - Pas...
☐ DADOS	☐ 9/10/25	☐ Módulo 15 - Pas...
☐ ESCALERAS	☐ 11/10/25	☐ Módulo 16 - Pas...
☐ LOSAS	☐ 7/11/25	☐ Pista
☐ MUROS	☐ 11/11/25	☐ Rampa Peatonal
☐ RAMPAS	☐ 20/11/25	☐ Torre grúa
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 28/11/25	☐ Túnel Administra...
	☐ 12/12/25	■ Túnel de Ambula...
	☐ 16/12/25	☐ Túnel Deportivo

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL DEPORTIVO


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
204,328	195,670	95.76 % (0.00 % – 100.00 %)

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
799,36	561,17	70.20 % (0.00 % – 100.00 %)


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
402,95	391,73	97.22 % (0.00 % – 100.00 %)

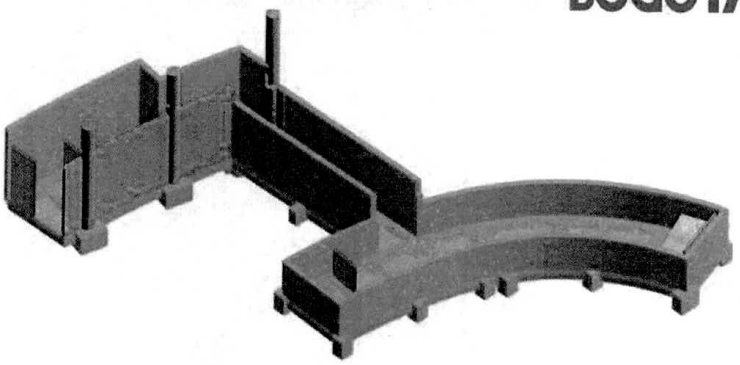

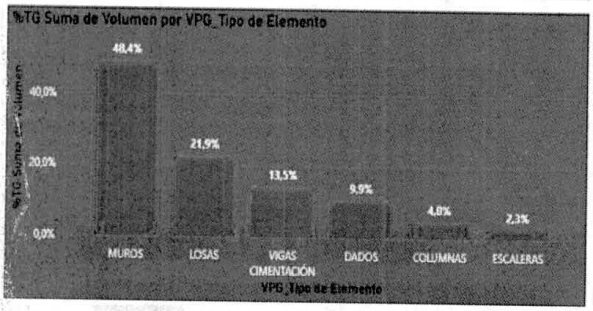

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
☐ COLUMNAS	☐ (En blanco)	☐ Módulo 14 - Pas...
☐ DADOS	☐ 25/10/25	☐ Módulo 15 - Pas...
☐ ESCALERAS	☐ 7/11/25	☐ Módulo 16 - Pas...
☐ LOSAS	☐ 11/11/25	☐ Pista
☐ MUROS	☐ 22/11/25	☐ Rampa Peatonal
☐ RAMPAS	☐ 26/11/25	☐ Torre grúa
☐ VIGAS CIMENTACI...	☐ 28/11/25	☐ Túnel Administra...
	☐ 9/12/25	☐ Túnel de Ambula...
	☐ 11/12/25	■ Túnel Deportivo

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – PAGO DE INSUMOS ESTRUCTURA

ACTA DE FIJACIÓN 18 – OCTUBRE 2025

BOGOTÁ

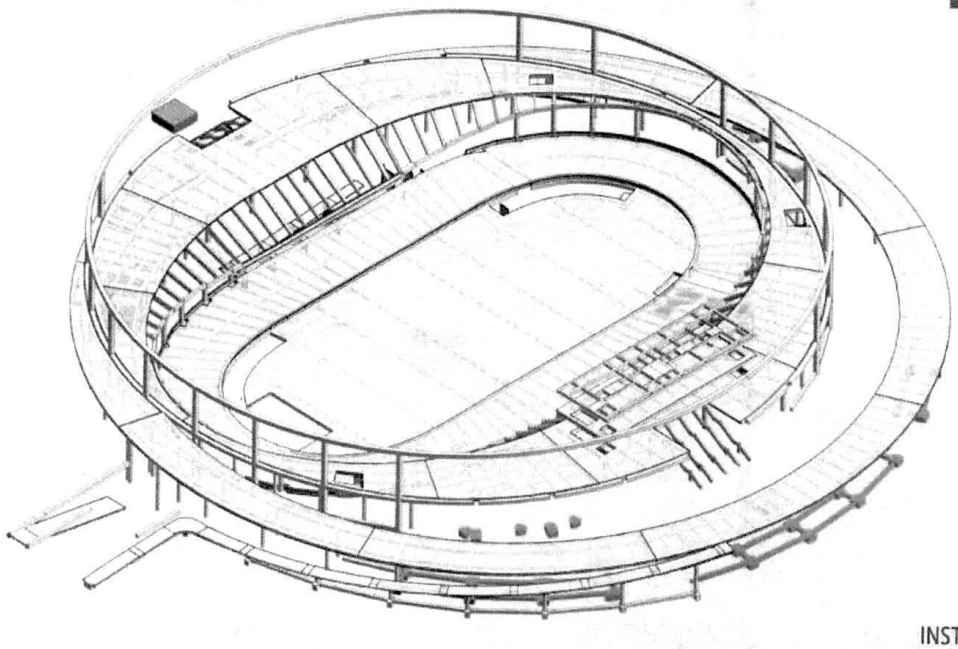


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – PAGO DE INSUMOS ESTRUCTURA

ACTA DE FIJACIÓN 19 – NOVIEMBRE 2025

BOGOTÁ

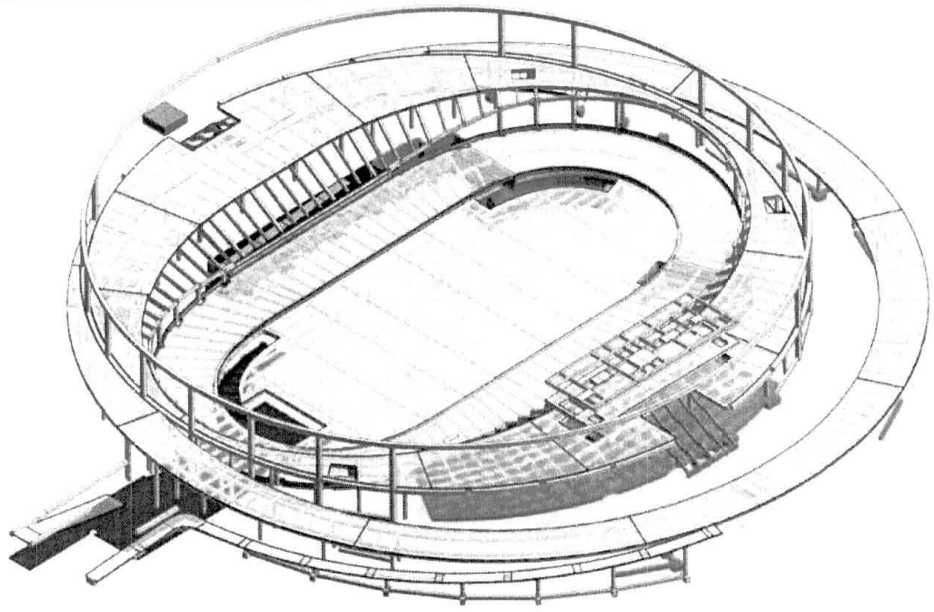


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D - ESTRUCTURA

EJECUCIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2026

BOGOTÁ

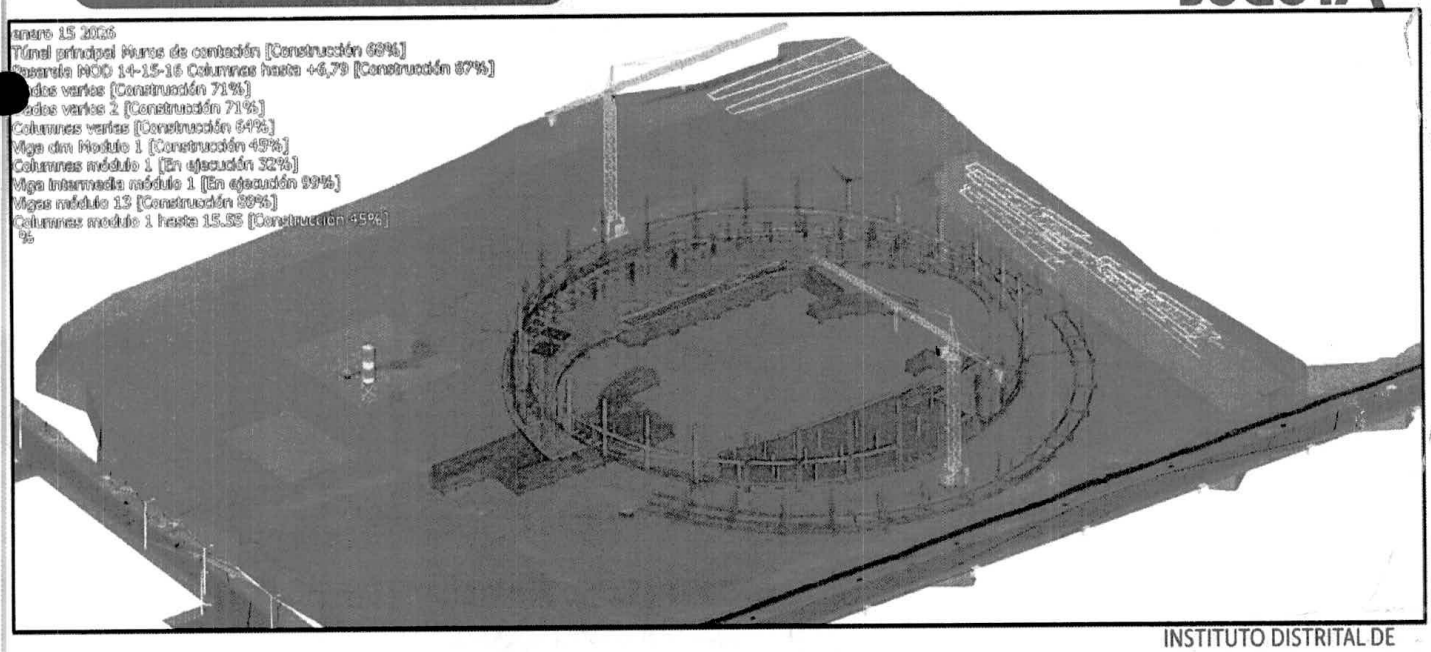



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COORDINACIÓN DE OBRA Y DISEÑOS

MODELO 3D MEMBRANA DE CUBIERTA

BOGOTÁ

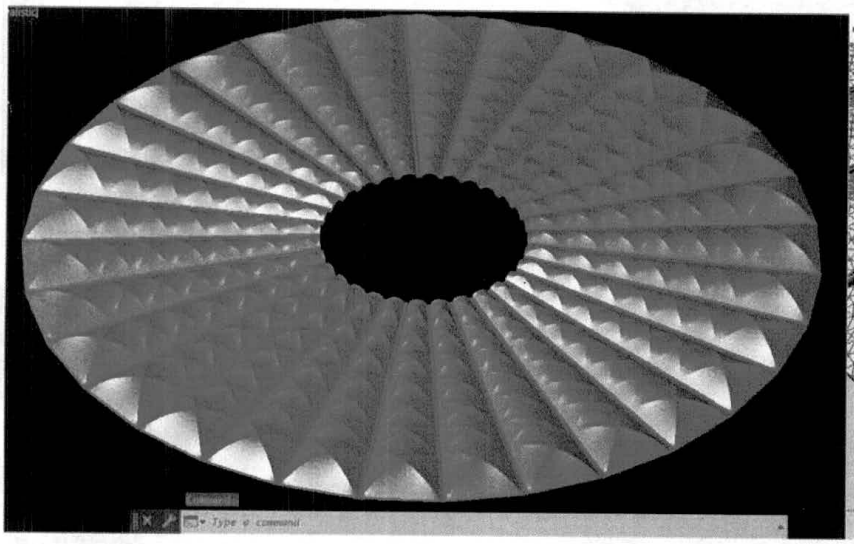

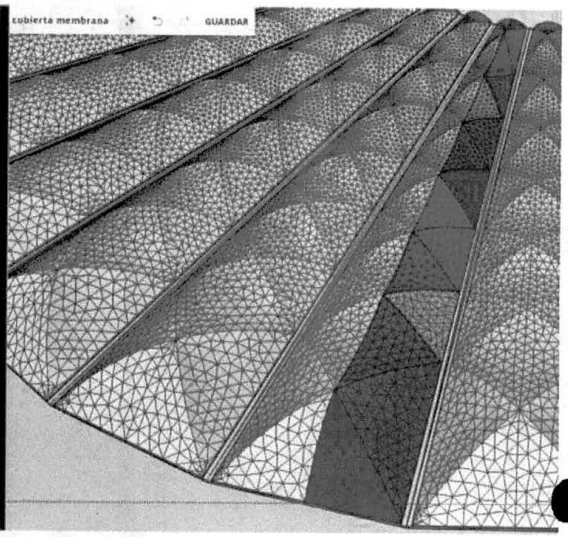

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG.	UTMP	Sin Fecha	PENDIENTE
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados. Contestado con Observaciones via email por parte del CIG al contratista el día 22/11/2025 en espera de ajuste y respuesta UTMP.	UTMP – CIG - IDRD	20/11/2025	CUMPLIDO
Radicar ante la entidad contratante oficio para reconocimiento de la membrana de cubierta dónde se especifique el concepto técnico, financiero y jurídica. En revisión CIG (Item Suministro e Instalación).(*) Pendiente Respuesta IDRD	CIG	19 y 29 /12/2025	PENDIENTE

(*) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 82.421.632.544,54	55,77%
% EJECUCIÓN	$ 76.862.514.844,3	52,01%
% COSTO	$ 76.862.514.844,3	52,01%

AVANCE	-3,76%

10/01/2026 **programación v3**

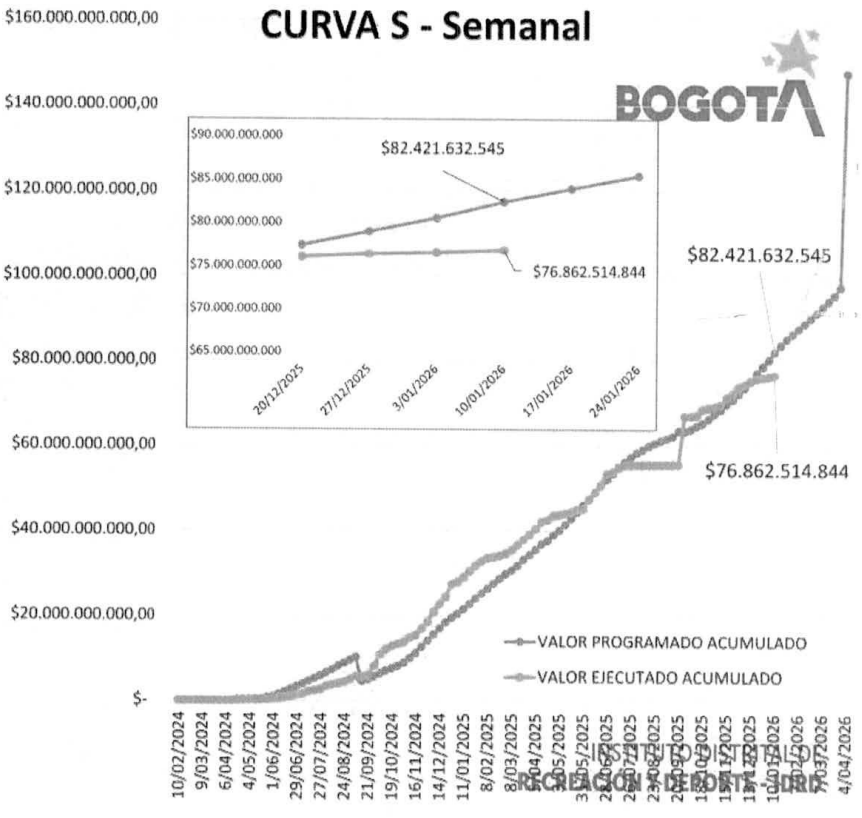

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
FE -023	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE -024	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO


MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

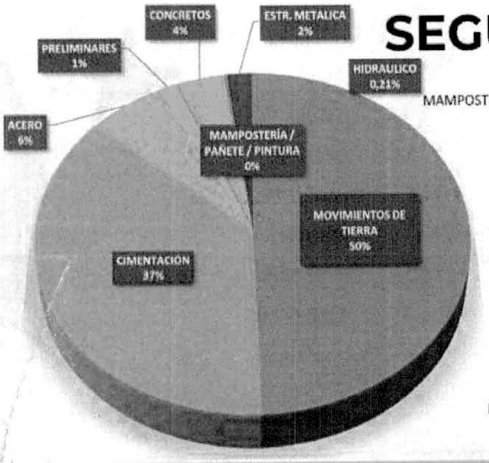

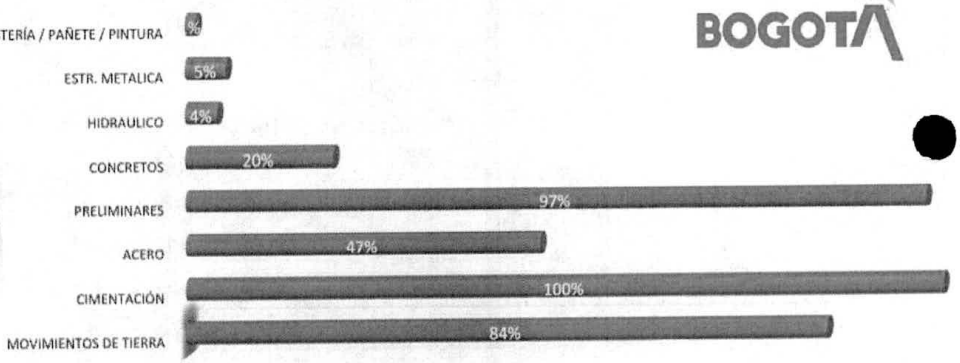

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METALICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	**$ 61.010.761.815,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.868.397.139,00**	**$ 6.285.143.403,00**	**$ 72.523.644.111,00**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 5	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO PARA LOSA DE CONTRAPISO Y/O FUNDACION, FABRICADOS EN POLIETILENO EXPANDIDO CON MATERIAL TIPO ICOPOR, DENSIDAD 8 KG/M3 RECUBIERTO EXTERIORMENTE EN POLIETILENO CAL 3	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN DISEÑO Y RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE TUBERÍA PVC –S, YEE, SEMICODOS, CODOS, SIFON, SALIDAS SANITARIAS.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7 Y 11, PASARELA	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	INICIA
MODULO 4 Y 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL MATERIAL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. INLCUIDO LOS TRASIEGOS.	CONTINUA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 referente a documentos remitidos para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Alcance por parte de la UTMP respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026.	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
3) Protocolo para el despacho y Acopio de la membrana posterior su Nacionalización. Se espera respuesta por parte del IDRD a reconocimiento planteado según radicados No Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025	UTMP - CIG	10/12/2025	PENDIENTE
Visita a empresa CASTRO ROJAS - INGENIERIA Y ARQUITECTURA que corta y confecciona la tenso membrana PVC marca Ferrari producida en Francia, para la Cubierta Velódromo Gibraltar.	UTMP - CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Se hace remisión al IDRD el día 28/11/2025 Rad No 20252100531482.
(**) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA – PANELES DE CUBIERTA

BOGOTÁ

AVANCE EN CORTE

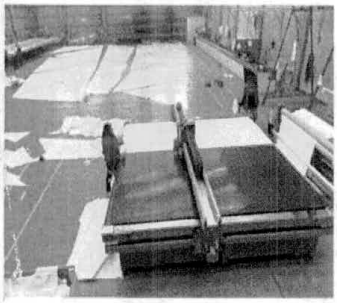

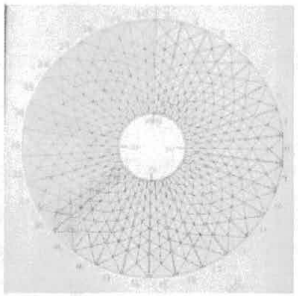


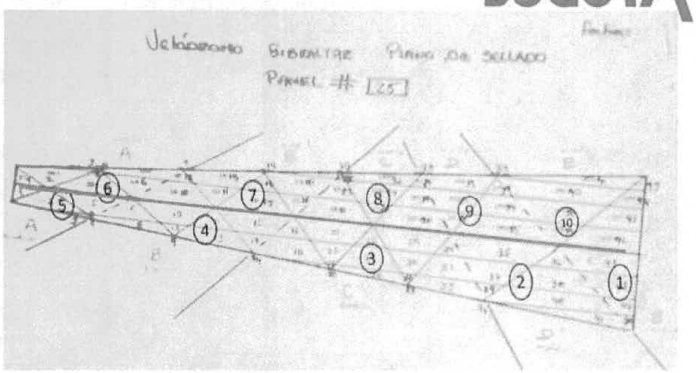

AVANCE EN SELLADO





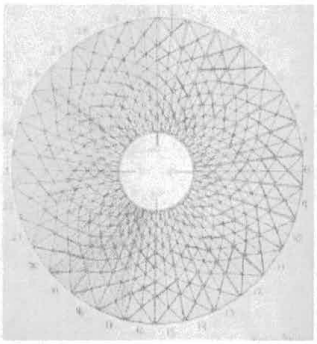

10 SECCIONES POR PANEL

TOTAL NACIONALIZADO: (341,85 m2/Panel) * 30 Paneles = 10.256 m2

AVANCE EN SELLADO (m2): 10.256 m2 = 10.256 m2/ 10.256 m2 = 100%


TOTAL MÓDULOS DE PANEL SELLADAS = 300 Unidades y/o Secciones

TOTAL SECCIONES NACIONALIZADAS A LA FECHA = 100 Unidades y/o Secciones

RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MEMBRANA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA
CANALES Y FALDON

BOGOTÁ

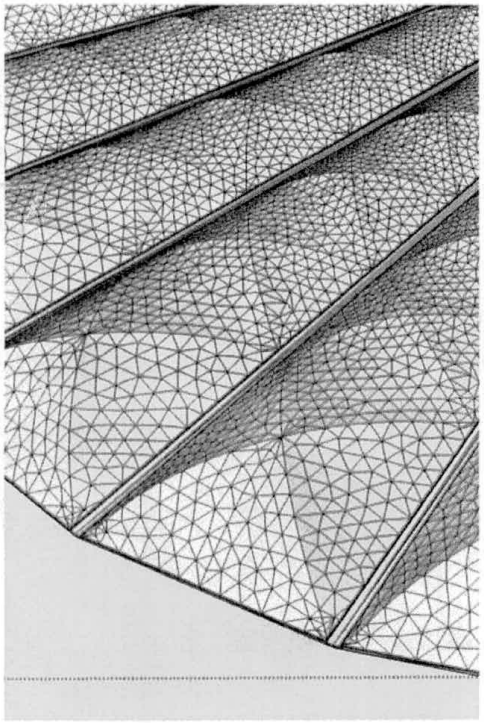

ÁREAS DE MEMBRANA

	ÁREA (m2)	Cálculo
1) Páneles de Membrana Principal		
- Modelo	10.230,00	341x30
- Sellos entre patrones	412,08	343.4x0.04x30
- Faldones Perimetrales	547,02	101.3x0.18x30
2) Canales		
- Modelo	1.054,80	35.16x30
- Sellos a membrana principal	104,18	2x43.41x0.04x30
3) Faldones a Viga Canal		
- Modelo	89,70	2.99x30
- Sellos a membrana principal	14,65	12.21x0.04x30

ÁREA TOTAL= 12.452,43 m2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	27,09 Ton
ene-26	05 de Enero al 11 de Enero de 2026	11,33 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	266,32 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***266,32 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **24,50%**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Plano	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	9586TA53C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	9586TA50C-1	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586TA49C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	9586TA52C-1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-1	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586TA54C-0	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586T45A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	9586T45A-1	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	9586TA6A-1	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	9586TA66A-0	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586TA51C-2	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
					Total	24 Unds		**Total**	208,68 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA

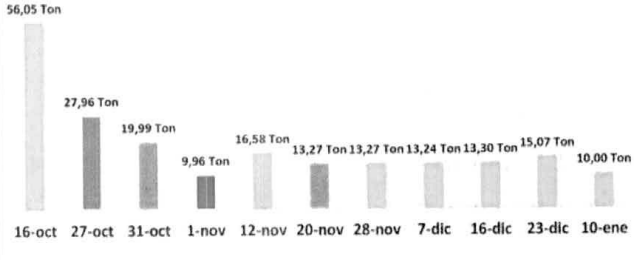

Elementos Ingresados del 05 al 11 de Diciembre:

1 Unds para **9,99 Ton**


TOTAL : 208,68 TON.




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FINALIZACIÓN DE MUROS TUNEL DEPORTIVO – TRAMOS 28 al 31

BOGOTÁ

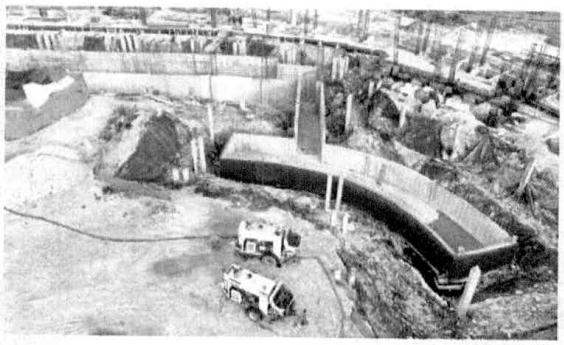

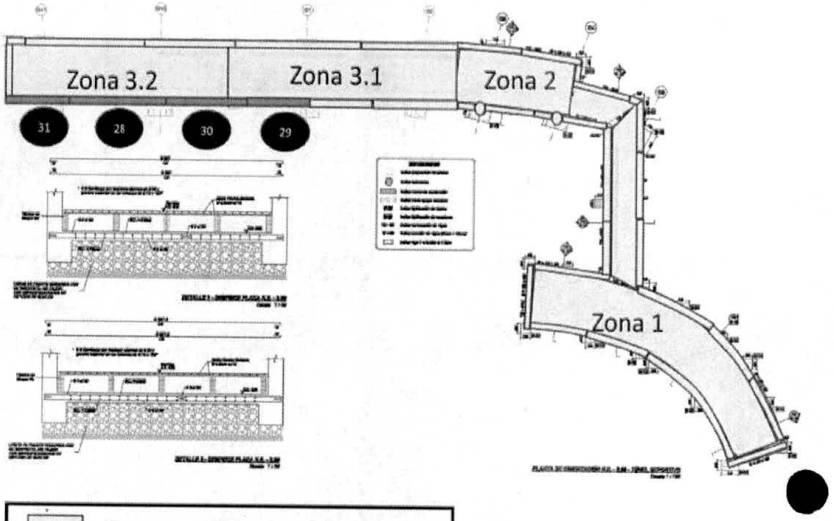

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 15 al 17

BOGOTÁ



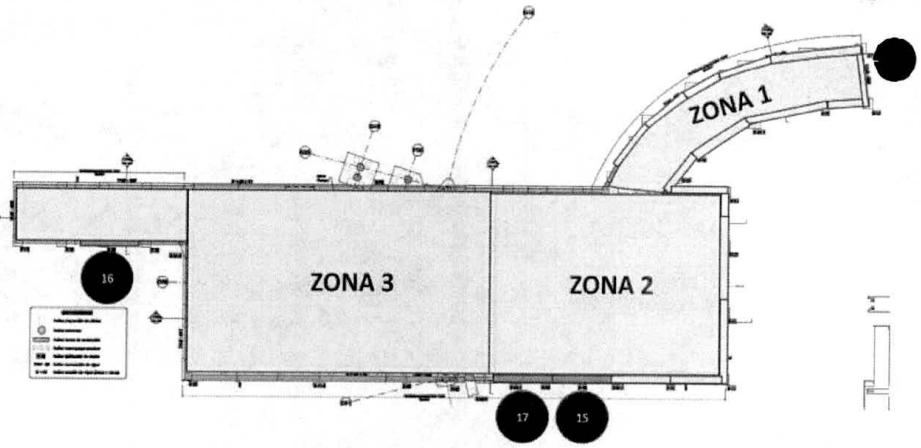

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL
DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS Y VIGAS – MÓDULO 1 CON MÓDULO 6

BOGOTÁ

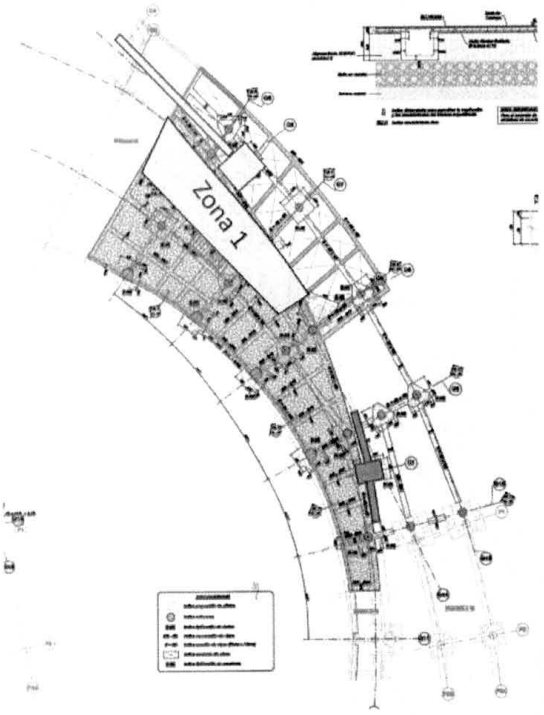



Zona Vaciada en el Periodo


Zona Vaciada Previamente

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 16 – ZONA DE PASARELA

BOGOTÁ





Zona Vaciada en el Periodo


Zona Vaciada Previamente


PLANO M16-E01
PLANTA ESTRUCTURALES MÓDULO 16 -PASARELA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 1 – COLUMNAS DE CUBIERTA

BOGOTÁ

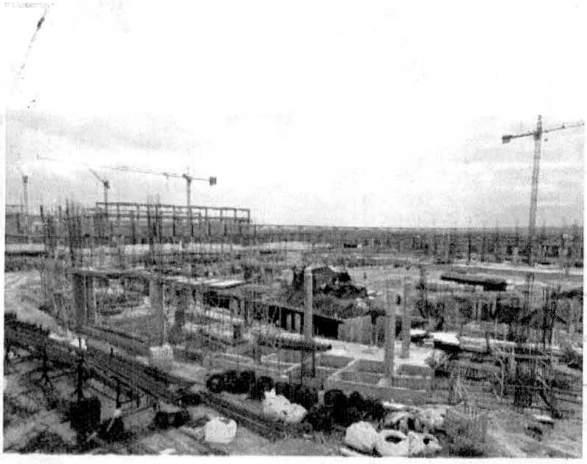

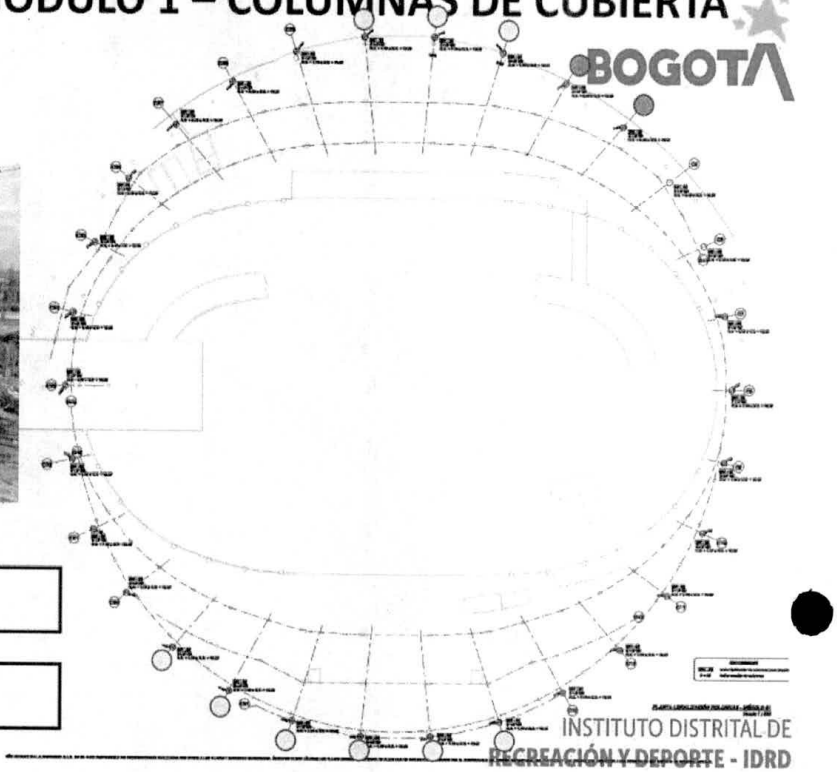

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 3 – ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

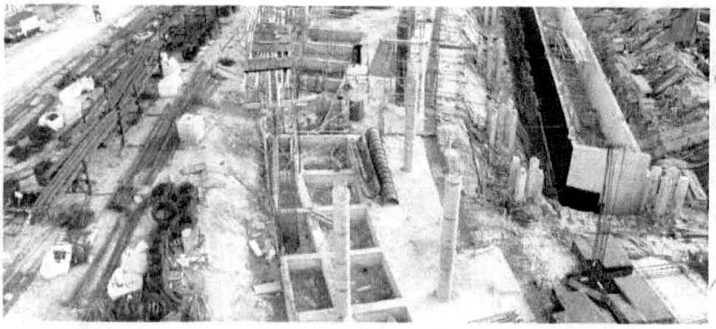


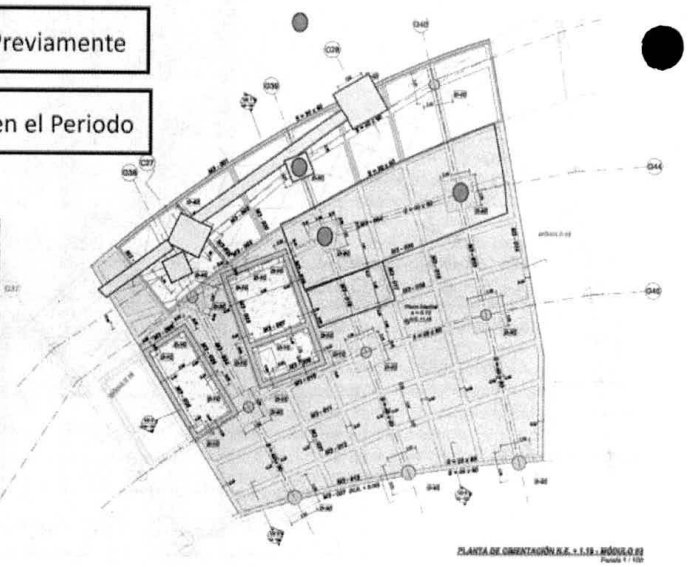


PLANO M3 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 3

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 2 – ZONA DE EDIFICIO

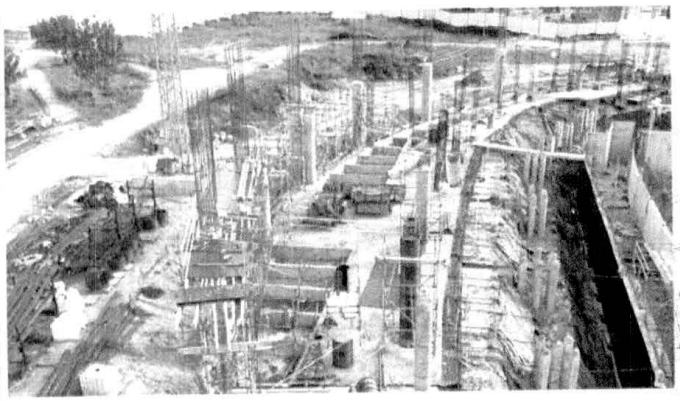

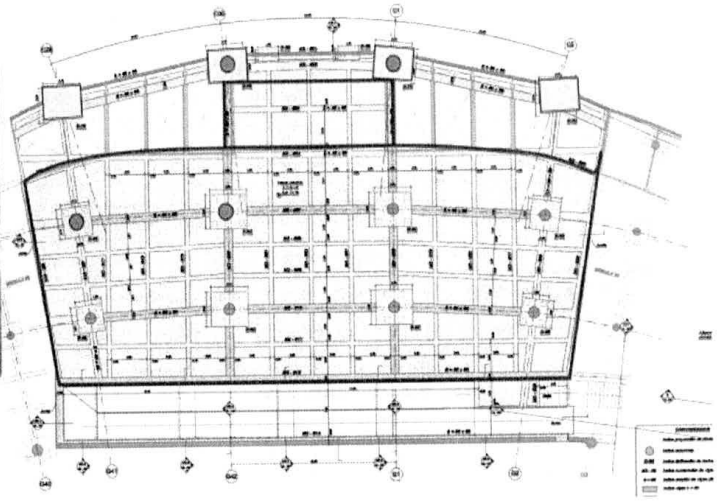

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M2 – E02 PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19
MÓDULO 2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE PLACA MÓDULO 5 – TRAMO 1



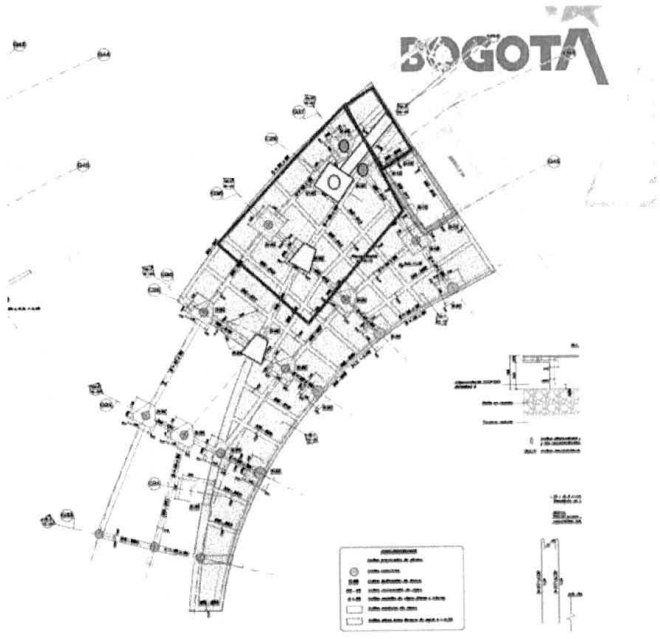


Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y
CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

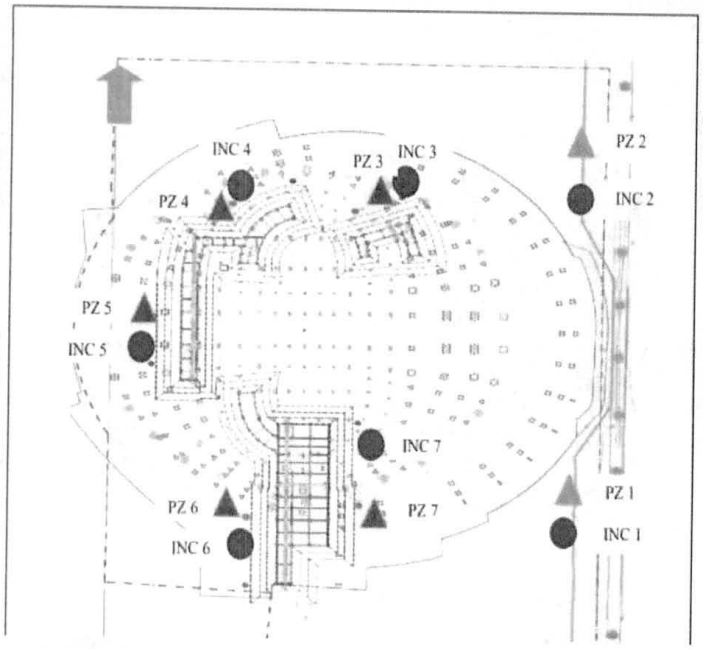

INCLINOMETRO
PIEZOMETRO CASAGRANDE
PIEZOMETRO DE HILO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 22 de diciembre de 2025 al 05 de enero de 2026; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.
- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.19 m y 8.88 m
- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 10 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.30 y 6.22 m de profundidad.
- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

COMPROMISOS


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
N-A	N-A	N-A	N-A

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Durante la semana 05 al 10 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:


- Se trabajó en la coordinación para ajustar y definir el paso de las 17 tuberías de 4 pulgadas IMC sobre el túnel principal. La imagen es el modelo original al cual se le realizan correcciones de ubicación de las cajas de paso.

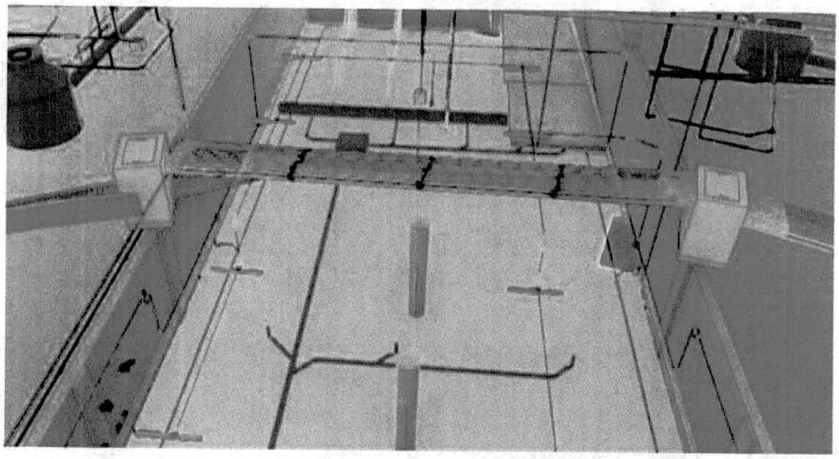

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Se estable el paso de las tuberías garantizando que al traspasar los muros de los túneles con los pases estos queden herméticos. Se adicionan 2 cajas metálicas para hacer que las conexiones y el traspaso de IMC a PVC sea técnicamente correcto.

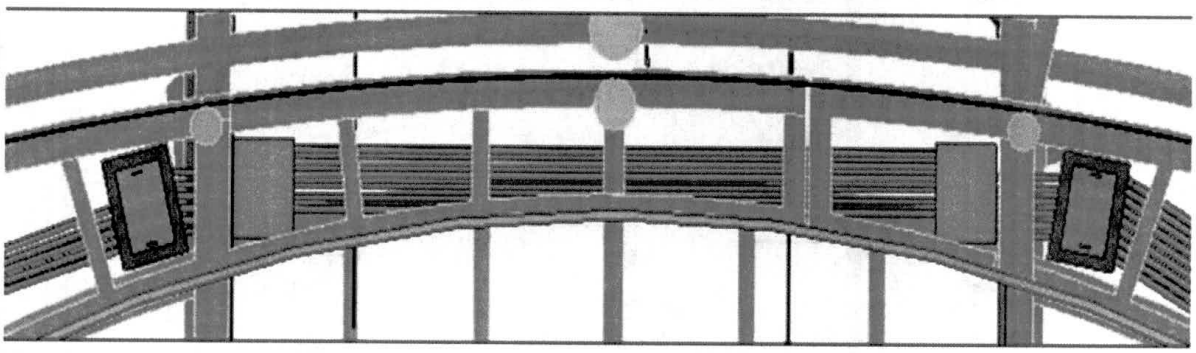

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
