Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres (PGRDEPP)

BOGOTÁ

Conocimiento del riesgo

Acciones para el monitoreo del riesgo

Reducción del riesgo

Acciones para mitigar el riesgo

Implementación del PGRDEPP

Corte: 13 de diciembre 2025 al 15 de enero de 2026

Manejo de desastres

Preparativos para la respuesta a emergencias (PDCA)

Socialización y comunicación

Acciones para socializar y comunicar el PGRDEPP

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Implementación Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres (PGRDEPP)

BOGOTÁ


Monitoreo del Riesgo y Reducción del Riesgo del escenario ER14 Afloramiento de lixiviados





Activación de motobombas para succión de lixiviados a Catch Tank y verificación de condiciones óptimas del Catch Tank para almacenamiento temporal de lixiviados y su posterior retiro en carro cisterna hasta el sitio de disposición final

Monitoreo del riesgo y reducción del riesgo del escenario ER07 Aumento de lixiviados por escorrentía

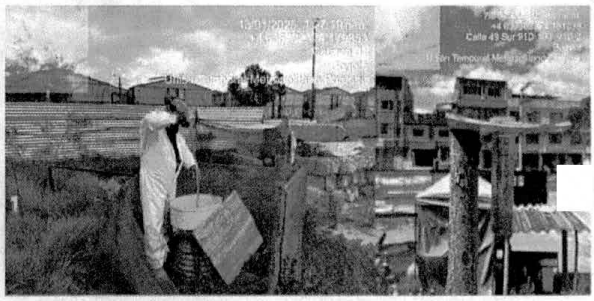


Inspección de pozos eyectores, realizando seguimiento al nivel freático y monitoreo pluviómetro

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Implementación Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres (PGRDEPP)

BOGOTÁ

Monitoreo del riesgo y reducción del riesgo del escenario ER07 Aumento de lixiviados por escorrentía

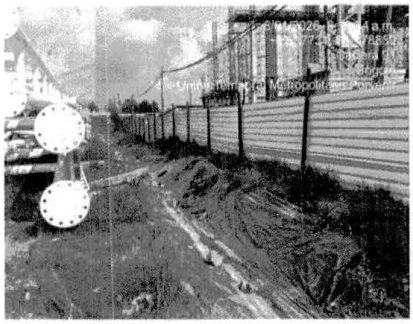

Desarrollo de jornada de limpieza y mantenimiento a canal de agua lluvia de la zona norte, con retiro de agua lluvia empozada

Monitoreo del riesgo y reducción del riesgo del escenario ER07 Aumento de lixiviados por escorrentía




Activación de motobombas para evacuación de agua lluvia contenida en pozo de achique de la zona central, al alcantarillado pluvial

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Implementación Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres (PGRDEPP)

BOGOTÁ

Monitoreo del Riesgo y Reducción del Riesgo de escenario ER16 Deslizamiento de Materiales

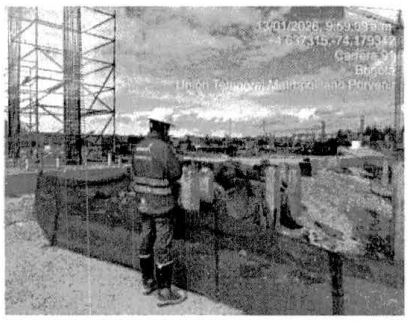

Inspección de condiciones de estabilidad de taludes mayores a 1,5 m en zona excavadas (túneles) y dados de cimentación en pasarela

Monitoreo del Riesgo de escenarios de riesgo relacionados con acumulación de gases del relleno antrópico – ER08, ER12, ER13



Monitoreo de gases en zonas de excavación, con una frecuencia de dos veces por día (por cada jornada)


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Implementación Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres (PGRDEPP)

BOGOTÁ

Reducción del riesgo de escenario ER10 Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado



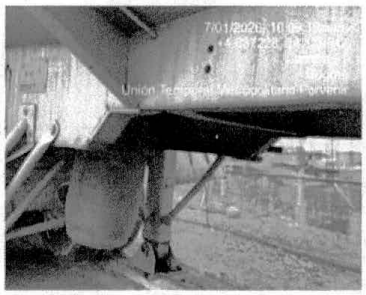

Inspección del uso del kit de control de derrames en vehículos y elementos de emergencia



Aplicación de cal en excavaciones y zonas contiguas con almacenamiento de lixiviados o acumulación de agua lluvia


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Implementación Plan De Gestión Del Riesgo De Desastres (PGRDEPP)

BOGOTÁ

Reducción del riesgo de escenario ER04 Incendios de cobertura superficial

Reducción del Riesgo de escenario ER15 Accidentes de trabajo ER16 Deslizamiento de Materiales

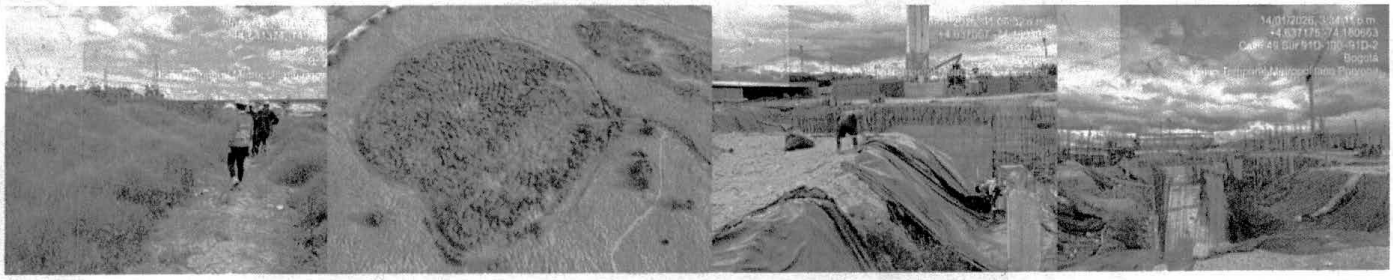

Monitoreo y mantenimiento del cortafuegos del área de material para reconformación

Jornadas de orden y aseo y mejoramiento de la protección de taludes con plástico

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SUBANEXO C8.4.1. PPT COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO. 22

2_LISTADO DE ASISTENCIA

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de participación ciudadana N° 22 FECHA: 23 ENERO 2026

HORA INICIAL 10:00am HORA FINAL 11:30am. LUGAR Salón Social - Compartir la Margarita - etapa 2.

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

No.	NOMBRE	EDAD	MARQUE CON UNA X: Se identifica como: Hombre	Mujer	Otro	Tiene discapacidad: SI	NO	Pertenece a un grupo étnico: SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Adrián Hernández	45	X				X		X	SDA-OPEL	kennedy@ambientebogota.gov.co	3017782646	
2	Oswar Giovanny Rojas		o				o		o	SDHT-OPRL	oswarojas@habitat.gov	3502840358	
3	David Santiago Yepes Ardila	27	X				X		X	Residente zonal	santisyepes@gmail.com	3155234621	
4	Ulcira Cecilia Muñoz	51		X			X		X	Veeduría Ciudadana	merce.2nin@hotmail.com	3208335798	
5	Martha L Hernández	56		X			X		X	SDSCJ/Gestor	martha.lucia1969@hotmail.com	3142103332	
6	Maria Graciela Nates	60		X		X			X	Semilla paz	graciela.nates1965@gmail.com	3124614432	
7	Jaqueline Baez	57		X			X		X	Vanguarda B	jbaezzam@gmail.com	3115277057	
8	Gloria Inés Vaca	72		X			X		X	Mav-Z	inesgloria720@gmail.com	3102351550	
9	JUAN OTALORA	37	X				X		X	SDP/SPLSOCC	jotalora@sdp.gov.co	3105597806	
10	David Sierra	41	X	X			X		X	C16 Infantes	David.sierra16@hotmail.com	3163179197	
11	Maria Inés Ortega	60								Luz Vega		3118756729	
12	Joshua David Bello P	30	X				X		X	IDRD - DEPORTES	JOSHUA.BELLO@IDRD.GOV.CO	3002418186	
13	Luis David Pascagaza Cardona	31	X				X		X	IDRD - DEPORTES	luis.pascagaza@idrd.gov.co	3136409109	
14	Nelson Castillo Clavijo	60	X				X		X	JAC Ciudadela de Bosa	nelson castillo clavijo@hotmail.com	3123108747	
15	Saul Varon Diaz	64	X				X		X	JAC Jerusalen Bosa	SaulVaron Diaz@gmail.com	3213247683	
16	JAIRO ALBERTO CRUZ	69	X				X		X	ASOJUNTAS BOSA	JAIRO ALBERTO CRUZ OB@GMAIL.COM	3118913229	
17	Isabel Nuñez N.	67		X			X		X	Et. 1 Maryori	milessa576@hotmail.com	3138775146	
18	Ana Elsa Baron	51		X			X		X	Comité participación ciudadana Et 1		3117528535	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de participación ciudadana N° 22 FECHA: 23 Enero 2026

HORA INICIAL 10:00am HORA FINAL 1130am LUGAR Salón Social - Compartir la Magoria - etapa 2.

			MARQUE CON UNA X										
			Se identifica como:			Tiene discapacidad		Pertenece a un grupo étnico					
No.	NOMBRE	EDAD	Hombre	Mujer	Otro	SI	NO	SI	NO	ENTIDAD / COMUNIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Mayra Ramirez P.	—		X			X		X	Interventoría	Socialvelodromo26@gmail.com	3132005170	
2	Linday Rosiano Moyano.	33		X			X		X	INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA.VELODROMO@GMA.	3202548911	
3	Cesar Fernandez Soler	43.	X				X		X	UTMP.	Contingencia.velodromo@cyg	3002	
4	Paula Blanco A.	32		X			X		X	UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	302 7219947	
5	Carmen Lucia Velez Velodro	48		X			X		X	IDRD	carmen.velez@idrd.gov.co	3204034740	
6	Carlos Sandoval.		X				X		X	IDRD-STC	Carlosa.sandoval@idrd.gov.co		
7	Nohemy Reina G/	69		X			X		X		reinaGi/nohemy@6.com	3118251165	No
8	Diana Marcela Ortiz D.	35		X			X		X	UTMP	Socialvelodromo@cyg.com.co	3153535407	
9	Luz Stella Rodriguez	42		X			X		X	UTMP	sstz.velodromo@cyg.com.co	3214693331	
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													

NOTA: los grupos étnicos son:
Indígena, ROM, afrocolombiano o afrodescendiente, palenquero o raizal

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

SUBANEXO C8.4.2. SOPORTES DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES

1_INDUCCIONES AL COMPONENTE AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 26-12-2025 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar

TEMA TRATADO: inducción del componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20min.

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jose perez	AYU	AYB	
2	Wilmer marcal	OF	AYB	
3	Yuleidy Estrada	OF	AYB	
4	DANIEL ESCOBAR	10.361.750 OF	AYB	
5	ALBERTO ARDILA	AY	AYB	
6	Eduardo Vanegas.	Oficial	AYB	
7	Alky Bastidas	OF.	AYB	Alky B.
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jose Perez CARGO Ayudante

CONTRATISTA AYB FECHA

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: No. Cedula 1134454044

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 26/12/26

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Wilma Mosquera CARGO OF

CONTRATISTA H & B FECHA

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos — X



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico — X



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL — X



Afloramiento de lixiviados — X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impacto
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Wilma Mosquera No. Cedula 1069 726 360

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 26/12/25

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Victor M Estrada CARGO: OFICIAL

CONTRATISTA: A y B FECHA:

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Victor Estrada C. No. Cedula 73208560

CALIFICACIÓN: 4.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 26/12/25

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: DANIEL ESCOBAR. CARGO: OFICIAL

CONTRATISTA: A Y B FECHA:

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	X	Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico - Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. - Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico - Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. - Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. - Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. - Nivel 2- Moderado impacto
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. - Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: DANIEL ESCOBAR No. Cedula 1013617801

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 26/12/25

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ALBERTO ARDILA — CARGO: Oficial

CONTRATISTA: AyB — FECHA:

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D X	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D X	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



✓ Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: ALBERTO ARDILA — No. Cedula 3147107.

CALIFICACIÓN: S.O

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 26/12/25

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Libardo Venegas — CARGO: Oficial

CONTRATISTA: AyB — FECHA: 26-12-2025

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separacion, almacenamiento tratamiento, retiro y d'sposicion final de residuos peligrosos ✓
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X


2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energia y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


Fallas estructurales por ocurrencia de sismos — X


Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico — X


Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL — X


Afloramiento de lixiviados — X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impac
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: _____ No. Cedula 1085038567

CALIFICACION: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco — Fecha 26-12-25.

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Ailyn Bautista CARGO OF

CONTRATISTA A y B FECHA 26-12-25.

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico - Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. - Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico - Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, alementos contaminados con hidrocarburos, etc. - Caneca roja

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. - Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. - Nivel 2- Moderado impacto
3. Daños y pérdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. - Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Ailyn B. No. Cedula 1085050373.

CALIFICACION: 50.

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco Fecha 26. 12. 25.

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 6-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Ecotop del Riesgo de Deslizamiento . DURACIÓN: 20 mn

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]
REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]
OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco.	UTmp.	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	ANDERSON PEREZ	AUX	AXB	
2	Pablo William Fernandez	A Y	AXB	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIDAD TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ANDERSON PEREZ CARGO: AYUDANTE OBRA

CONTRATISTA: AYB FECHA:

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos Aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja

4. Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


Fallas estructurales por ocurrencia de sismos X


Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico X


Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL X


Afloramiento de lixiviados X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impacto
3. Daños y pérdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: ANDERSON PEREZ No. Cedula 1102872503

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco Fecha 6/01/26

UNIDAD TEMPORAL METROPOLITANO FORMENTE

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Pablo Wuilman Fonseca S. CARGO: Ayudante

CONTRATISTA: A y B FECHA:

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida.
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc.

- Caneca Verde
- Caneca Blanca
- Caneca Negra
- Caneca roja


4. Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AII), se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia.
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo.
3. Daños y pérdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional.

- Nivel 1- Bajo impacto
- Nivel 2- Moderado impacto
- Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: _____ No. Cedula 1131519186

CALIFICACIÓN 5.0

Nombre y firma del evaluador: _____ Fecha 06 / 01 / 26

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 7-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Gestion de Riesgo de Desastre DURACIÓN: 20 mn

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP.	Res. Amb.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Andres Roldan	Oficial	AyB	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Andres Rodriguez Flor. CARGO Oficial

CONTRATISTA PyB FECHA 07-01-26.

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra


A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres


X
Fallas estructurales por ocurrencia de sismos


X
Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico


X
Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL


X
Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impacl
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Andres Rodriguez No. Cedula 1.085.164.668

CALIFICACIÓN: 5.0.

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco Fecha 07-01-26.

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 8-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Gestion de Riesgo de desastre DURACIÓN: 20 min

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP.	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Gomez	Oficial	F Y D	Jose Gomez
2	Luis Cortes.	Of.	Hq 13.	Luis Cortes.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Gomez — CARGO: Oficial

CONTRATISTA: A y D — FECHA: 8/01/2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Jose Gomez — No. Cedula: 78717215

CALIFICACIÓN: S.O.

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco. — Fecha: 8/01/26.

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Cortes — CARGO: Of.

CONTRATISTA: A y B — FECHA: 08-01-2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos X



Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico X



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL X



Afloramiento de lixiviados X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Luis Cortes — No. Cedula 18858009

CALIFICACIÓN:

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco — Fecha 8/01/26.

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 13-01-2026 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar.

TEMA TRATADO: Inducción componente ambiental y GRD

DURACIÓN: 20Min

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN: [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco A.	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Oscar Lopez	Oficial	AYB	
2	Jorge Rodriguez	Oficial	AYB	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Oscar Lopez CARGO Oficial

CONTRATISTA AYB FECHA 13/01/2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos ✓
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos X



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico X



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL X



Afloramiento de lixiviados X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto** ✓
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: _____ No. Cedula 1126118372

CALIFICACIÓN:

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco _____ Fecha 13/01/2026

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jorge Rodriguez — CARGO: oficial

CONTRATISTA: A y B — FECHA: 13-01-2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señala con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores

3. Conecte con una linea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviacos

5. Conecte con una linea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Jorge Rodriguez — No. Cedula 1320235

CALIFICACIÓN:

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 13-01-2026

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 16-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Gestion del Riesgo de Desastre. DURACIÓN: 20 mn

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP.	Res - Amb.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Ana Jose	Ayudante	A y B	
2	Diego Navas	Oficial	A y B	
3	Isidoro Pedro R.	Ayudante	A y B.	
4	Enej castaño	Ayudante	A y B	
5	Dayna Valentina Orozco	SST	A y B	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Amin Burgos — CARGO: Ayudant.

CONTRATISTA: AYB. — FECHA: 16-01-26

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4. Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Amin Jose — No. Cedula 1049896050

CALIFICACIÓN: 8.0

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco — Fecha 16-01-26

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Diego Novos — CARGO: Oficial

CONTRATISTA: A y B — FECHA: 16/01/2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Blanca
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Verde
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos — X



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico — X



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL — X



Afloramiento de lixiviados — X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: _____ No. Cedula 1016594765

CALIFICACIÓN: S.O.

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco — Fecha 16-01-26

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Isidro Pedro Borja CARGO Ayudante

CONTRATISTA A y B. FECHA 16-01-26

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4. Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Isidro Pedro B. No. Cedula 73-591 029

CALIFICACIÓN: 5.0.

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco. Fecha 16-01-26

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Erin Castro — CARGO: Ayudante

CONTRATISTA: A y B — FECHA: 16.01.26

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	X Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	X Todas las anteriores


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4. Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Erin — No. Cedula 1089003197

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco — Fecha 16-01-26

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Danna Valentina Orozco Amado

CARGO: 1000122056

CONTRATISTA: A y B

FECHA: 16/01/2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico - Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. - Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico - Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. - Caneca roja

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. - Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. - Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. - Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Danna Orozco No. Cedula 1000122056

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco Fecha 16/01/2026

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 17 enc 2026 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Gestion del Riesgo de desastre DURACIÓN: 20 mn.

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP.	Residente Amb.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Efren Humberto Sierra	Ayudante	UTMP.	Efren
2	Caren Daniela Ortega	Auxiliar	UTMP	Caren Ortega.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Efren Humberto Sierra CARGO Ayudante.

CONTRATISTA OTML. FECHA 17/01/2026.

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos ✓
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños ✓
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores ✓


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico → Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. → Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico → Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. → Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. → - Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. → - Nivel 2- Moderado impacto
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. → - Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Efren No. Cedula 13.791557.

CALIFICACIÓN: 5.0.

Nombre y firma del evaluador: Paula Blanco. Fecha 17/01/2026

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Caren Daniela Ortega Jimenez CARGO: Auxiliar

CONTRATISTA: UTMP FECHA: 17/01/2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X


3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — **- Caneca Verde**
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — **- Caneca Blanca**
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — **- Caneca Negra**
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — **- Caneca roja**


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres




Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — **- Nivel 1- Bajo impacto**
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — **- Nivel 2- Moderado impacto**
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — **- Nivel 3- Alto impacto**

Firma del participante: Caren Ortega No. Cedula 1055962207

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco. Fecha 17/01/26

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 20-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo.

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Gestion del Riesgo de desastre DURACIÓN: 20 min

INDUCCIÓN [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]
REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]
OTRO? CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Fabian Esteban Gonzalez	Ayudante.	A y B	
2	Sergio A Rincon	OF	A y B	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fabian Guio — CARGO: ayudante

CONTRATISTA: aytes y bronce — FECHA: 20/07/26

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energia y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc — Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Fabian Guio — No. Cedula 1000731609

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco — Fecha 20-01-26

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Sergio LO Bincon — CARGO: OF

CONTRATISTA: A Y B — FECHA: 20-01-26

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de resicuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja

4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Sergio — No. Cedula 1087100581

CALIFICACIÓN:

Nombre y firma del evaluador: Paula Bunco — Fecha 20-01-26

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 21-01-26. OBRA / PROYECTO: Velodromo.

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Gestion del Riesgo de Desastres. DURACIÓN: 20 m.n.

INDUCCION	[X]	CHARLA / DIVULGACION	[ ]	CAPACITACIÓN	[ ]
REINDUCCIÓN	[ ]	NOTIFICACIÓN	[ ]	REUNIÓN	[ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco.	UTMP.	Prof. Ambnt.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis Miguel Tovar G.	Ayudante	A y B	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Miguel Tovar — CARGO: Ayudante

CONTRATISTA: AYB — FECHA: 21/01/2026

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Luis Miguel Tovar — No. Cedula 1030665349

CALIFICACIÓN:

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco. — Fecha 21/01/26.

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 23-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo.

TEMA TRATADO: Componente Ambiental y Gotas del Riesgo de Pegatas. DURACIÓN: 20 min

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	Res. Ambiental	UTMP.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jhonis Andres Lasso	Ayudante	Mantenimiento	Jhonis
2	Deymen Dorley Silva D.	Ayudante	mismo	Deymen Silva
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES:

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Dayana Dunley Soto D. CARGO Auxiliar

CONTRATISTA Maria ala Ingeniería FECHA 23/01/26

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos ✓
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores X

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños ✓
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores X

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:

1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico — Caneca Verde
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida. — Caneca Blanca
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico — Caneca Negra
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc. — Caneca roja


4. Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



X Fallas estructurales por ocurrencia de sismos



X Incendios por acumulación de gases del relleno antrópico



X Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL



X Afloramiento de lixiviados

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia. — Nivel 1- Bajo impacto
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo. — Nivel 2- Moderado impact
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional. — Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Dayana Dunley Soto D. No. Cedula 1007330720

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco Fecha 23-01-26.

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y RIESGOS

La información diligenciada permite hacer seguimiento a los conocimientos recibidos en el área Ambiental y de Riesgos y evaluar la eficacia de la Inducción-Reinducción de los temas incluidos en la presentación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jhonis Andres Loaiza Maldonado CARGO Ayudante

CONTRATISTA Menos a la obra FECHA 23-01-26

1. Señale con una X las cuál de los siguientes son programas que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental

A	Monitoreo de emisión de gases	C	Separación, almacenamiento tratamiento, retiro y disposición final de residuos peligrosos
B	Medidas de control de lixiviados	D	Todas las anteriores

2. Señale con una X alguna de las medidas ambientales que debe realizar en obra

A	Mantener cubiertos los materiales y acopios de material de excavación	C	Hacer uso racional de agua y energía y buen uso de los baños
B	Separar y almacenar en los acopios residuos: madera, chatarra, cartón, plástico, papel	D	Todas las anteriores

3. Conecte con una línea los residuos que deben separse en cada caneca:


1. Residuos aprovechables: papel, cartón, plástico
2. Residuos orgánicos: sobrantes de comida.
3. Residuos no aprovechables: servilletas, papel higiénico
4. Residuos peligrosos: filtros de aceite, elementos contaminados con hidrocarburos, etc.

- Caneca Verde
- Caneca Blanca
- Caneca Negra
- Caneca roja


4 . Marque con una X alguno de los escenarios de riesgo que fueron priorizados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres



Fallas estructurales por ocurrencia de sismos — X



Incencios por acumulación de gases del relleno antrópico — X



Infecciones y/o brotes en la piel por contacto con RESPEL — X



Afloramiento de lixiviados — X

5. Conecte con una línea los niveles de emergencia establecidos en el Plan de Contingencia Ambiental:

1. Afectación local AID, se cuenta con la capacidad interna de manejo de la contingencia.
2. Daños y pérdidas importantes que pueden afectar la operación del proyecto sin que trascienda al exterior, requiere apoyo particular externo.
3. Daños y perdidas que afectan la operación total y puede trascender alexterior, se requiere apoyo de varias entidades de orden distrital o nacional.

- Nivel 1- Bajo impacto
- Nivel 2- Moderado impacl
- Nivel 3- Alto impacto

Firma del participante: Jhonis Andres No. Cedula 1004323476

CALIFICACIÓN: 5.0

Nombre y firma del evaluador: Paola Blanco Fecha 23-01-26

SUBANEXO C8.4.2. SOPORTES DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES

2_SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES PDCA - 2026

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL COMPONENTE DE GESTION DEL RIESGO

COMPONENTE DE GESTION DEL RIESGO - PDCA

CONTRATO N° 3232 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

PROYECCIÓN 2026

N°	Tematica de Capacitación	Responsable	Áreas/ Entidades involucradas/ aliadas	Estado de la Actividad	2026												Observaciones
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Respuesta ante emergencias ambientales, protocolos de respuesta, primeros auxilios, evacuacion y canales de comunicación (amenazas de origen natural, socionatural y/o tecnológicos)	Componente de Gestión del Riesgo de Desastres	Personal operativo del Proyecto	Planeado													
2	Prevención de incendios de cobertura vegetal: medidas de prevencion, detección y control	Componente de Gestión del Riesgo de Desastres	Personal operativo del Proyecto	Planeado													
3	Protección del recurso hidrico y el suelo, mecanismos de protección, manejo de suelos contaminados, lixiviados y prevención de la contaminacion.	Componente de Gestión del Riesgo de Desastres	Personal operativo del Proyecto	Planeado													
4	Cambio Climatico y gestion del riesgo: Impactos, adaptación y mitigación	Componente de Gestión del Riesgo de Desastres	Personal operativo del Proyecto	Planeado													
5	Mecanismos de divulgación y comunicación de riesgos: Estrategia de comunicación acertiva	Componente de Gestión del Riesgo de Desastres	Personal operativo del Proyecto	Planeado													
6	Gases y olores ofensivos: mecanismos de seguimiento, monitoreo y reporte	Componente de Gestión del Riesgo de Desastres	Personal operativo del Proyecto	Planeado													
7	Accidentes de trabajo por fallas operacionales	Componente de Gestión del Riesgo de Desastres	Personal operativo del Proyecto	Planeado													

SUBANEXO C8.4.2. SOPORTES DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES

3_CHARLA DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL AID

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 2 ene 26 OBRA / PROYECTO: Velódromo

TEMA TRATADO: Riesgos Ambientales en el AID

DURACIÓN: 10 mn

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☒

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Carlos Florian	Operador	P y E	
2	Jorge Barrera	OP. Mini	Altaria	Jorge Barrera
3	Alejandro Uthoff	Op 30M	ALTARA	
4	Steven Diaz	Op Torre Grua	UTMP	
5	OMAR CRUZ	M/OBRA	U.T.M.P.	
6	Edinson Mancera	Op minicargador	ALTARA	
7	Milton Quesada	Ayudante	UTMP	
8	Juan Barbosa Calderon	Op. Torre Grua	UTMP.	
9	Mario Jimenez	Aparejador	UTMP	
10	Jose Bustacara	Ayudante	UTMP	Jose Bustac
11	Alexander Rivas	Aparejador	UTMP	AL
12	Miguel Angel	Op Mini	ALTARA	
13	Luis Cardoso Franco	M/obra	UTMP	
14	Camilo Cortes	Laboratorista	UTMP	
15	Jose Sarmiento	AYUDANTE	UTMP	
16	ARNOL HERNANDEZ	AYUDANTE		ARNOL
17	Francisco Suarez	Ayudante	UTMP	
18				

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 4 Total participantes 65

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 02-09-26 OBRA/PROYECTO: Velódromo Gimnasio Tunal
TEMA TRATADO: Riesgos Ambientales en el AID.
DURACION: 10 mn

INDUCCION ☐ CHARLA/DIVULGACION ☒ CAPACITACION ☐
REINDUCCION ☐ NOTIFICACION ☐ REUNION ☐
OTRO ¿CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva	A y B	Rte SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jesus M Fuentes	OF	A y B	
2	Wilson Alvarado	OF.	A y B	
3	JOSE MATEUS	OF	A y B	
4	Arnaldo S	OF	A y B	Arnaldo
5	JUVENAL SARMIENTO	OF	A y B	
6	FABIO MONTES	OF	A y B	Fabio
7	LUIS ANGEL	OF	A y B	
8	Yeimy Sarai Ticino	OF	A y B	Yeimy S.
9	Luis Adriano OSPINO	OF	A y B	Luis Ospino
10	MARTIN PEDROZO	AY	A y B	MARTIN
11	HENRY CASTELLON	AY	A y B	Henry Jose
12	ANGEL GUIO G	OF	A y B	ANGEL GUIO
13	Ribaldo OSPINO	AY	A y B	
14	Jeuinson Gonzalez	OF	A y B	
15	Jeshonic Suarez	Em	A y B	
16	Wyllians Osorio	oficial	A y B	William S.
17	Cristian A Bermudez	Ejec	A y B	
18	DANIEL ESCOBAR	OF	A y B	

OBSERVACIONES: Hoja 2 de 4 Total participantes 65

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 2-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo gibraltar

TEMA TRATADO: Riesgos Ambientales en el AIO DURACIÓN: 15 mts

INDUCCIÓN	☐	CHARLA / DIVULGACIÓN	☒	CAPACITACIÓN	☐		
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐		
OTRO/ CUAL?							

Nº	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva	A Y B	Rte. SST	Oscar Silva
2				

PARTICIPANTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Hector Jesus Escalona M	Ayudante	A Y B	
2	Brayan Yosman	Oficial	A Y B	
3	Dorsie Luis Julio	Ayudante	A Y B	
4	Compo Elias Pava	Oficial	A Y B	
5	Guillermo Rojas	oficial	A Y B	
6	Shaw F Baird	Ayu	A Y B	
7	Raul SOTELO	MAESTRO	A Y B	
8	Marcos Alvarez	Ayudate	A Y B	
9	Einer de Arco	Ayudante	A Y B	
10	Wander Cora	Ayudante	A Y B	
11	Soterus Suarez	TP	A Y B	
12	Jose Ricardo Julio	Ayd	A Y B	
13	Rolando Espino	Ayd	A Y B	
14	Luis Adriano Espino	OF	A Y B	
15		OF	A Y B	
16	Jeuinson Gonzalez	OF	A Y B	
17	Johanis Cues	Gm	A Y B	
18	Yeiner Suarez	OF	A Y B	

OBSERVACIONES: Hoja 3 de 4 Total participantes 65

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 02-01-26 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Riesgos Ambientales en el AID.

DURACIÓN: 15 min

INDUCCIÓN ☐ CHARLA / DIVULGACIÓN ☒ CAPACITACIÓN ☐

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO (CUAL) ?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva.	AyB	Dte SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Eliel Barros	Herrero	A y B	
2	Esteban Fuentes	Herrero	A y B	
3				
4	Danis Gutierrez	Oficial	A y B	
5	Andres Guevara	Oficial	A y B	
6	Municha Ender	Andamie	A y B	
7	Socorro	SF		
8	Luis Cortes	OF		Luis Cortes
9	ANDERSON PEREZ	ACX	A y B	ANDERSON
10	Marcos Alvarez Franco	AyC	A y B	Marcos
11	Jorge Rodriguez	Fabricación	A y B	
12	Pablo Emilian Farfaro Fe-S.	AYUDANTE	A y B	
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 4 de 4 Total participantes 05

SUBANEXO C8.4.2. SOPORTES DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES

4_CHARLA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 9 ene 26 OBRA / PROYECTO: Velodromo.

TEMA TRATADO: Buenas Practicas Ambientales en obra DURACIÓN: 30 mn

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☒

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP	Residente Amb.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	OMAR CRUZ	H/OBRA	U.T.M.P.	
2	Jose Bustacara	[illegible]	UTMP	Jose Bustac
3	Miguel Angel	Op Mini	AITARA	
4	Wilton Quiroga	Ayudante	U.T.M.P	
5	Oscar Rojo	OF.V	UTMP	
6	Carlos Florian	op. min	U.T.M.P	
7	Francisca Suarez	Ayudante	UTMP	
8	Camilo Castro	laboratorista	UTMP	Camilo
9	Luis Cardozo Fonseca	m/obra	UTMP	
10	Steven Diaz	operario JG	utmp	
11	ALEXANDER RIVAS	APAREJADOR	utmp	
12	Juan Bautista Calderon	OP. Torre Grua	UTMP	
13	EFRCI	AY		EFRCI
14	EDILBERTO HERNANDEZ	AITARA	op minimaq	
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 5 Total participantes 71

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 09-01-26 Bogotá OBRA / PROYECTO: Velodromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Buenas Practicas en Obra DURACIÓN: 15mn

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☒ CAPACITACIÓN ☐

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva.	AyB	Rte SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Juan Gonzalez	Herrero	A y B	
2	Harold Rangel	Herrero	A y B	
3	Jeyson Vargas	Herrero	A y B	
4	Johnathan Urdaneta	Ayudante	A y B	
5	Henry Perez	Ayudante	A y B	
6	Jesus M Fuentes	Oficial	A y B	
7	Josecarlos Justo	Ayudante	A y B	
8	Yeiner Ferrer	OF	A y B	
9	Juan Ariza	OF	A y B	
10	Reinaldo Espino	Ay	A y B	
11	Mirian Castillo	Ofi	A y B	
12	Henry Castellon	Ayu	A y B	Henry Jose
13	Omar Ruiz Blanco	OF Biol	A y B	
14	Angelo J	Ay Fib	A y B	
15	Luis Ramon	Ay b	A y b	
16	Luis Carlos Rimoz	Ay b	A y b	
17	Yefer Bravo	Ofi Bial	A y B	
18	Pablo Emilio	Y TIB	A y B	Pablo E

OBSERVACIONES: Hoja 2 de 3 Total participantes 71

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 9/01/26 OBRA / PROYECTO: Velodromo gibraltar

TEMA TRATADO: Buenas Practicas Ambientales en obra DURACIÓN: 15 mts

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☒	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva	A Y B	Rte. SST.	Oscar S.
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Wilson Andres Escalante M	Ayudante	A Y B	
2	Brayan Yosmar	Oficial	A Y B	
3	Jorge Luis Julio	Ayudante	A Y B	
4	Campo Elias Pava	Oficial	A Y B	
5	Guillermo Tapia	oficial	A Y B	
6	Shaw P Baena	Fte	A Y B	
7	Raul SOTELO	MAESTRO	A Y B	
8	Marcos Alvarez	Ayudate	A Y B	
9	Omar de Arco	Ayudante	A Y B	
10	Wander Cote	Ayudante	A Y B	
11	Gotthus Suarez	TT	A Y B	
12	Jorge Camilo Rico	Aux	A Y B	
13	Antonio Espino	Aux	A Y B	
14	Luis Adriano Espino	OF	A Y B	
15	[illegible]	OF	A Y B	
16	Jesus Jose Zapata	OF	A Y B	
17	Johanic Cuy	Aux	A Y B	
18	Yenny Suarez	OF	A Y B	

OBSERVACIONES: Hoja 3 de 3 Total participantes 71

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 9-01-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo gibraltar

TEMA TRATADO: Buenos Practicos Ambientales en Obra.

DURACIÓN: 15 minutos

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☒	CAPACITACIÓN	☐
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐
OTRO/ CUAL?					

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1				
2	Oscar Silva	A y B	Rte. SST	Oscar Silva

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis A Prada	Oficial	A y B	Luis
2	Pablo Emilio	A y F	A y B	Pablo E
3	Cristian Bermudez	Ayudante	Ay B	
4	Fedrico Montes	OF	A y B	Fede
5	Dario Gutierrez	OF	A y B	
6	Mateo G	OF	A y B	
7	Brayan Mateus	A y	A y B	Brayan Mateus
8	Benito	OF	A y B	
9	Wilson Avendaño	OF	A y B	
10	Julio Gonzalez	Ayudante	A y B	
11	Freddy Poveda	A y B	A y B	Freddy
12	Leonardo Sierra	Polizia	Epe	
13	Jose Rafael Peña	A y B	of	
14	Harold Rangel	A y B	Ayudante	
15	Omar Ruiz B	A y B	OF	
16	Jeoban Vanegas	A y B	Ayudante	Jeoban
17	Juan manuel cortes	A y B	Herrero	Juan
18	Yair Sanmartin	A y B	Ayudante	

OBSERVACIONES: Hoja 1 de 5 Total participantes 71

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 09-01-26 Bogotá OBRA / PROYECTO: Valdeflores Greather

TEMA TRATADO: BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES. DURACIÓN: 15 min

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☒ CAPACITACIÓN ☐

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva.	AyB	Rte SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Wander Cobo	AyB	AyB	
2	Raul Sotelo	Maestro	AyB	
3	Hoja de Observación	AyB	AyB	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 5 de 5 Total participantes 71

SUBANEXO C8.5 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2026.04.07 09:36:17 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

SUBANEXO C8.5.1. SOPORTES DE RADICACIÓN DEL INFORME MENSUAL NO. 23

1_CE-206-125-2104. RADICACIÓN IMA23

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C.,26 de diciembre de 2025
CE-206-125- 2104

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. **ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: Informe Mensual Componente Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres N° 23 - Período del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2025.

Cordial saludo

Por medio de la presente, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, representada por el "Contratista" o la "Unión Temporal", conforme al marco jurídico establecido en el Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023, nos dirigimos respetuosamente a ustedes para radicar el Informe Mensual Ambiental No.23, remitiendo los siguientes enlaces para su respectiva verificación y/o aprobación:

Informe mensual componente ambiental (consolidado): https://drive.google.com/drive/folders/1IWpaErMUvRh2LnkPkg8nwJbp78zWM4RR?usp=drive_link

Anexo C8. PGRDEPP: https://drive.google.com/drive/folders/1kdCb5w45laWW_-8jMq0igZNvU3Vc-5bj?usp=drive_link

Se remiten por separado con el fin de evitar inconvenientes técnicos del orden de visualización de archivos de los subanexos.

Agradecemos de antemano su respectiva gestión.

Cordialmente,

Ing. Alfonso Peñaranda Suárez, PMP® - PMI-ACP®
Director de Proyecto
Unión Temporal Metropolitano Porvenir
Velódromo Gibraltar.

SUBANEXO C8.5.1. SOPORTES DE RADICACIÓN DEL INFORME MENSUAL NO. 23

2_OBSERVACIONES INFORME 23

Gmail **Johanna Barrientos <ingjohannabm@gmail.com>**

Observaciones de informe mensual No.23 PGRDEPP

Astrid Viviana Rojas Cangrejo <profriesgosvelodromo@gmail.com> 30 de diciembre de 2025 a las 15:13
Para: ingjohannabm@gmail.com, contingencias.velodromo@cyg.com.co
Cc: "Inf. Edgar -2- Solorzano Medina" <corint.carvel.2@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, ambiental.velodromo@cyg.com.co

Buenas tardes Ings. Johanna y Cesar,

Adjunto para su conocimiento y fines pertinentes documento en el cual se listan las observaciones del informe No.23 luego de la verificación de la información, igualmente se remite el documento del informe revisado con algunas con notas para subsanar o como sugerencia.

Quedo al pendiente de la remisión del informe con la subsanación de las observaciones, igual estoy al pendiente de cualquier requerimiento que se tenga, el cual será atendido en el menor tiempo posible.

--
Cordialmente,

Astrid Viviana Rojas C.
Profesional de Gestión del Riesgo de Desastres
Email: profriesgosvelodromo@gmail.com
Cel: 3157994502

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

2 adjuntos

OBSERVACIONES INFORME No23.docx
17K

Informe Mensual PGRDEPP No. 23.pdf
2615K

405

Si bien durante el periodo evaluado se registraron temperaturas significativas, el área se clasifica como poco propensa a la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal. Esto se sustenta en las inspecciones visuales realizadas y en las acciones de reducción del riesgo implementadas dentro del área de influencia, las cuales contribuyen a disminuir la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos, por lo cual el nivel de amenaza se considera medio. Los 24 días analizados en el periodo se clasificaron con un nivel de amenaza medio; sin embargo, no se registraron condiciones que dieran lugar a la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal ni señales que evidenciaran activación del escenario de riesgo.

- Revisión de reportes de bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones de orden público o por grupos sociales, en las vías colindantes al área de influencia directa, reportados por organismos de seguridad, como acciones de monitoreo del riesgo del Escenario ER05 - Orden público y social. Adicionalmente, se desarrollan acciones de reducción del riesgo incluidas en el Capítulo 5.1.2 – Numeral 2 del presente informe. Durante el periodo evaluado no se registraron eventos que afectaran la operación ni alteraciones significativas al orden público, por lo cual el nivel de amenaza se considera bajo.

- Monitoreo del riesgo del Escenario de Riesgo por Contaminación de Acuíferos – ER06.

En relación al escenario de riesgo por contaminación de acuíferos y conforme a el cronograma de actividades y las acciones de monitoreo de este escenario adelantadas desde el día 8 de julio de 2024 y reportadas en el Informe de Monitoreo de la Red Adyacente **(Subanexo C9 del Informe Ambiental),** se destaca que se llevaron a cabo acciones de medición a los niveles piezométricos de la red adyacente al predio Gibraltar, que corresponde a siete piezómetros **(Ver Subanexo C9 del Informe Ambiental)**; por tanto, el 10 de diciembre se ejecutó dicha actividad, se realizó una nueva jornada de medición de niveles piezométricos en siete pozos, utilizando sonda eléctrica. Esta actividad alimenta la

1 GDR 30/12/2025 15:00:02
Se sugiere el siguiente párrafo "Los reportes registrados y analizados en el periodo se clasificaron en un nivel de amenaza medio".

Notas

1	GDR	30/12/2025 08:42:11
25 siempre manejemos el periodo completo.		

Finalmente, se destaca que se desarrollaron acciones de reducción del riesgo, las cuales se describen el Capítulo 5.1.2. – Numeral 3 del presente informe.

- Análisis de registros de precipitación diaria registrada por el SAB y precipitación diaria in situ en obra, empleando el Formato SC-003-145 Control Horas Lluvias, como acciones de monitoreo del Escenario ER07 - Aumento de lixiviados por escorrentía (Ver **Subanexo C8.1.5. Análisis ER - PDF - Monitoreo del Riesgo ER07**). Dicho seguimiento se encuentra soportado en el **Subanexo C8.1.4. Cadenas de custodia de monitoreo del riesgo – 2. Monitoreo Pluviómetro ER07-ER14.**

Ilustración 3. Verificación de cantidad de lluvia diaria in situ.



Adicionalmente, se registraron y analizaron los datos obtenidos de los 4 pozos eyectores instalados en obra (Ver Tabla 7), con el fin de observar la evolución del nivel freático en diferentes puntos del terreno, analizando lo siguiente: todos los puntos monitoreados presentan un comportamiento estable durante el período del 26 de noviembre al 24 de diciembre de 2025. El Tubo 1 (costado sur occidental) evidenció un ligero aumento en la diferencia de cota, pasando de 0,555 a 0,735 m, lo que indica un leve asentamiento o compactación del terreno. El Tubo 2 (costado sur oriental) mostró valores relativamente estables, con diferencias que se incrementaron ligeramente de 1,369 a 1,499 m, reflejando una estabilidad general del terreno con pequeños ajustes. El Tubo 3 (costado norte oriental) se mantuvo casi constante, con diferencias entre 0,825 y 0,895 m, lo que indica condiciones

Notas

406

Ilustración 9. Cortafuegos verificado el 4 de diciembre de 2025.



2. Seguimiento a acciones de reducción del riesgo del escenario ER05 Orden público y social.

Por parte del componente social, se continúa ejecutando el Plan de Gestión Social, garantizando la vinculación de mano de obra no calificada proveniente del área de influencia del proyecto; dichos soportes se ubican en el **Subanexo C8.2.6. Soportes Plan de Gestión Social - ER05.** Adicionalmente, las organizaciones comunitarias presentes en la zona son convocadas para fortalecer la participación local, extendiéndose la invitación a los Comités de Participación Ciudadana, a los cuales asisten y participan – Ver **Subanexo C8.4.1.**

3. Adelantar acciones de reducción del riesgo de los escenarios ER08, ER12 y ER13 relacionados con acumulación de gases del relleno antrópico. De manera mensual (conforme a lo establecido en el Plan de SG-SST), se realiza la verificación de la ubicación de los botiquines y extintores para control de posibles incendios o explosiones en plataforma, con apoyo del Componente de SST – Ver **Subanexo C8.3.1. – 3_Inspecciones.** Dichas acciones se realizaron el 23 de diciembre.

1 GDR 30/12/2025 14:07:28
de 2025.

Notas

1 GDR 30/12/2025 14:45:49
el anexo es el C8.3.7

	de aguas sobrantes con concreto de las bombas estacionarias ubicadas en plataforma de cimentación. ver soportes fotográficos en el **Ver Subanexo C.8.3.4. PDCA 2 Orden y aseo en obra**
4. Seguimiento al buzón de atención de peticiones quejas y reclamos al ingreso de la obra para recibir posibles quejas de la comunidad por presencia de olores ofensivos.	A la fecha actual no se cuenta con PQRS, asociadas al componente de gestión ambiental o de riesgos de desastres que requiera implementar alguna acción correctiva al proceso constructivo que viene ejecutando la obra por parte de la UTMP.
5. Inspección diaria a los vehículos equipados con cubiertas y herméticos para evitar la filtración de lixiviados y exposición al aire libre.	Durante el periodo del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2025, fueron programados (6) viajes de RESPEL, a través del operador VEOLIA, por ende, se realizaron las inspecciones al vehículo para verificar el debido cargue como el aislamiento del RESPEL, se implementó el formato de control de olores en vehículos SC-003-352. En los vehículos con placas: - Volqueta WFG819 - Volqueta WNO006 - Volqueta SXZ456 Ver Subanexo **C.8.2.4. Inspección de Volquetas** Ver registro fotográfico en el **Subanexo C.8.3.6. PDCA F 4**

FICHA DE CONTINGENCIA No 5

	**ER08 FUGA DE GASES** **ER12 INCENDIOS POR ACUMULACIÓN DE GASES DEL RELLENO ANTRÓPICO ER13 EXPLOSIONES POR ACUMULACIÓN DE GASES DEL RELLENO ANTRÓPICO**
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PDC	
ACTIVIDADES PLANEADAS	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**
1.Inspección de la demarcación y aislamiento de las áreas donde se realizarán intervenciones en los procesos de excavación, pilotaje y construcción.	En el periodo se llevaron a cabo las actividades de cerramiento y marcado de las de las áreas donde se realiza intervención en excavaciones, por lo tanto, se adjuntan soportes fotográficos. Ver **Subanexo C8.3.4 PDCA F5 Seguimiento a medidas de manejo - Demarcación de zonas de trabajo en proceso de excavación.**
2. Registro de parámetros in situ de contenido de CH4, %CO, %H2S y %O2, durante la etapa de construcción. Ver Anexo 9 PMA Ficha de manejo No 11 Manejo y control de gases	

Año de Reporte	***2025***
Mes de Reporte	26 noviembre – 25 diciembre

1

Notas

OBSERVACIONES INFORME No.23 Velódromo

- En la página de control de profesionales para la interventoría retirar la Firma de la Ing. Nubia e Incluir en revisado por el Ing. Edgar Solorzano y aprobado por el Arq. Andrés Martínez.
- En el informe general en la pág. 24 es importante revisar la distancia del epicentro del sismo registrado (Mesa de los Santos), igualmente debe corregirse en el anexo C8.1.5 Análisis ER01.
- En el informe general en el ER06 pág. 26, en la descripción de los conceptos de asentamientos debe indicarse o aclararse lo siguiente "algunos puntos estuvieron temporalmente inaccesibles para lectura".
- En el anexo C8.1.5 Análisis ER06 en la parte de acciones de seguimiento es importante incluir en acciones de prevención del riesgo la actividad de control de nivel freático que se realiza mensualmente, ya que es un indicador de control y verificación.
- En el anexo C8.1.5 Análisis ER07 y ER14 en acciones de respuestas ejecutadas no es claro a que corresponde le anexo C8.3.5.7.
- Revisar el anexo C8.3.1.2.3 carpeta Inducciones que se encuentra vacía incluir la información soporte.
- Revisar el anexo C8.3.1.5 PC 03 dic que un reporte no se encuentra con las respectivas firmas de los responsables.
- Se requiere que se verifique con el componente SST la información de que no se presentaron accidentes de trabajo en obra, esto bajo el principio de cumplimiento del SG-SST (procedimientos y programas) que hace parte integral del PGRDEPP del proyecto y todo accidente de trabajo impacta las actividades de obra ya que está asociada al escenario de riesgo ER15.

Revisar el informe general en el cual también se tienen algunas observaciones para subsanar que se encuentra subrayadas para verificación.

SUBANEXO C8.5.1. SOPORTES DE RADICACIÓN DEL INFORME MENSUAL NO. 23

3_CIG-IDRD-VEL-996-2025. OBSERVACIONES IMA 23

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
NIT. 901.781.490-1
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-206-125 1166
RECIBIDO POR: Claudia G
FECHA: 31-12-25
RECIBIDO PARA REVISION

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2025

CIG-IDRD-VEL-996-2025

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia: PROYECTO 2 – VELÓDROMO CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ.

Asunto: Revisión Informe Mensual Ambiental Número 23 V1 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025.

Respetado Arquitecto:

De acuerdo con lo indicado en el radicado UTMP CE-206-125- 2104 del 26 de diciembre de 2025, mediante el cual se recibió el Informe Mensual Ambiental No. 23 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025, y tras la revisión efectuada, nos permitimos informar que en el siguiente link:

0. Revisión INFORME OBRA_N23_V1

Se encuentra en la carpeta "1. PGR" las observaciones asociadas al componente de Gestión de Riesgo, y en la carpeta "2. AMB" el informe de obra "1. INFORME_N_23 V1_Observaciones", con las observaciones correspondientes para que sean Subsanadas.

Cordialmente,

Ing. Edgar Solorzano Medina
Coordinador de Interventoría

Anexos: No Aplica
Elaboró: Ing. Julián Agudelo – Residente Ambiental de Interventoria
Revisó y aprobó Ing. Edgar Solorzano Medina – Coordinador de Interventoría.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX. (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

SUBANEXO C8.5.1. SOPORTES DE RADICACIÓN DEL INFORME MENSUAL NO. 23

4_CE-206-125-2124. RESPUESTA CIG-IDRD-VEL-996-2025

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C.,6 de enero de 2026
CE-206-125-2124

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. **ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802
Ciudad

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: Respuesta Comunicado CIG-IDRD-VEL-996-2025 "Revisión Informe Mensual Ambiental Número 23 V1 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025"

Cordial saludo,


Por medio de la presente, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, representada por el "Contratista" o la "Unión Temporal", conforme al marco jurídico establecido en el Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023, nos dirigimos respetuosamente a ustedes para dar respuesta al Radicado No. CIG-IDRD-VEL-996-2025 del 31 de diciembre de 2025 y, con ello, radicar el **Informe Mensual del Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres N° 23, V2**, conforme a las observaciones remitidas por la Interventoría; por tanto, se remiten los siguientes enlaces para su respectiva verificación y/o aprobación:

Informe Ambiental General:
https://drive.google.com/drive/folders/1lWpaErMUvRh2LnkPkg8nwJbp78zWM4RR?usp=drive_link

Anexo C8. PGRDEPP:
https://drive.google.com/drive/folders/1kdCb5w45laWW_-8jMq0igZNvU3Vc-5bj?usp=drive_link


Por lo anterior, y conforme a las observaciones remitidas mediante Radicado No. CIG-IDRD-VEL-996-2025, nos permitimos responder, informando lo siguiente:

Observación 1:

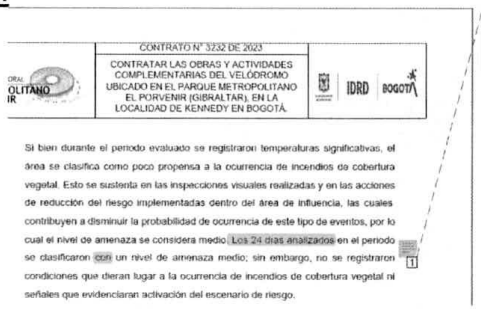


Respuesta UTMP: Se incluye dicha recomendación dentro de la descripción de acciones relacionadas con el reporte de temperatura diaria registrada por el Sistema de Alerta de Bogotá – SAB (pág. 25).

Observación 2:



Respuesta UTMP: Se ajusta fecha de reporte, de acuerdo a la recomendación (ág.27).

Observación 3:



Respuesta UTMP: Se ajusta redacción de la fecha reportada (pág.27).

Observación 4:



Respuesta UTMP: Se ajusta numeración del anexo (pág. 67).

Observación 5: En la página de control de profesionales para la interventoría retirar la Firma de la Ing. Nubia e Incluir en revisado por el Ing. Edgar Solorzano y aprobado por el Arq. Andrés Martínez.

Respuesta UTMP: Se ajusta control de firmas de la Interventoría conforme a lo solicitado (pág. 3).

Interventoría		
Revisado por:		Aprobado por:
Ing. Astrid Viviana Rojas Profesional en Gestión del Riesgo de Desastres	**Ing. Edgar Enrique Solorzano** Coordinador Técnico	**Arq. Andrés Martínez** Representante Leal

Observación 6: En el informe general en la pág. 24 es importante revisar la distancia del epicentro del sismo registrado (Mesa de los Santos), igualmente debe corregirse en el anexo C8.1.5 Análisis ER01.

Respuesta UTMP: Con respecto a esta observación, se aclara que solo se tiene información de la distancia del epicentro (mesa de los santos); sin embargo, no se detalla esta distancia hasta Bogotá (Ciudad donde se ubica el área de influencia), conforme a lo reportado por el SGC (pág. 24).

Observación 7: En el informe general en el ER06 pág. 26, en la descripción de los conceptos de asentamientos debe indicarse o aclararse lo siguiente "algunos puntos estuvieron temporalmente inaccesibles para lectura".

Respuesta UTMP: Se ajusta redacción de los resultados del monitoreo en piezómetros, aclarando que dicho acceso limitado se informa en el Informe AIG25 del 15 de diciembre (pág. 26).

> significativos. Por su parte, los piezómetros de tubo abierto ubicados en el entorno de las excavaciones registraron descensos máximos entre 2,0 y 7,0 cm, los cuales se asocian al avance de las obras. No obstante, en relación con el monitoreo realizado el 15 de diciembre de 2025, correspondiente al Concepto Geotécnico AIG25, se informa que dos de los piezómetros de tubo abierto localizados alrededor de las excavaciones actualmente en ejecución no cuentan con acceso para su lectura. En consecuencia, dichos elementos serán habilitados para los próximos monitoreos. En conjunto, las columnas piezométricas se
>
> 26

Observación 8: En el anexo C8.1.5 Análisis ER06 en la parte de acciones de seguimiento es importante incluir en acciones de prevención del riesgo la actividad de control de nivel freático que se realiza mensualmente, ya que es un indicador de control y verificación.

Respuesta UTMP: Se incluye actividad dentro de las actividades programadas de tipo preventivo para el escenario ER06 (Subanexo C8.1.5. ER06).

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN				
Tipo de Acción	**Actividad Programada**	**Indicador**	**Fecha Programada**	**Anexos**
Acción de prevención	Seguimiento de los niveles freáticos en los siete piezómetros de la red adyacente al predio Gibraltar	Número de piezómetros con lectura efectiva	1 vez en el periodo (26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026)	Ver Anexo C9 del Informe del Componente Ambiental No. 24
Acción de mitigación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de preparación	Ninguna	NA	NA	NA
Acción de recuperación	Ninguna	NA	NA	NA

<u>Observación 9:</u> En el anexo C8.1.5 Análisis ER07 y ER14 en acciones de respuestas ejecutadas no es claro a que corresponde le anexo C8.3.5.7.

Respuesta UTMP: Se ajusta numeración del Subanexo a C8.3.5 (Subanexo C8.1.5. ER07 y ER14).

<u>Observación 10:</u> Revisar el anexo C8.3.1.2.3 carpeta Inducciones que se encuentra vacía incluir la información soporte.

Respuesta UTMP: Se elimina dicha carpeta dado que en el Subanexo C8.4.2. se ubican los soportes de las inducciones del componente ambiental (aplicables para este informe).

<u>Observación 11:</u> Revisar el anexo C8.3.1.5 PC 03 dic que un reporte no se encuentra con las respectivas firmas de los responsables.

Respuesta UTMP: Se ajusta dicho anexo, incorporando las firmas relacionadas.

<u>Observación 12:</u> Se requiere que se verifique con el componente SST la información de que no se presentaron accidentes de trabajo en obra, esto bajo el principio de cumplimiento del SG-SST (procedimientos y programas) que hace parte integral del PGRDEPP del proyecto y todo accidente de trabajo impacta las actividades de obra ya que está asociada al escenario de riesgo ER15.

Respuesta UTMP: Se ajusta redacción de la información reportada, correspondiente a accidentes de trabajo (pág.33); dado que para el periodo de reporte se presentó 1 accidente de trabajo en el Proyecto, se reporta dicho evento dentro del Informe General y el Subanexo C8.1.5. ER15.

N°	**ESCENARIO DE RIESGO**	**RESULTADOS DE MONITOREO**				
		PARÁMETRO	**No. Accidentes de trabajo reportados**			
		FECHA	**HORA DE MONITOREO**	**VALOR**	**NIVEL DE AMENAZA**	**OBSERVACIÓN**
ER15	**Accidentes de trabajo**	5/12/2025	10:00:00 a. m.	1	Medio	

sábado, 5 de diciembre de 2026	Si	Medio	Durante el periodo de reporte se presentó un (1) accidente laboral, a las 10:00 a. m., cuando un trabajador, durante una ronda de supervisión, tropezó en un hueco de la obra, generándose torsión de la pierna derecha, con dolor e inflamación. El evento fue atendido conforme a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (ver Subanexo C8.3.1.1).

- Verificación de la ocurrencia de posibles accidentes de trabajo en el área de influencia directa del proyecto, con base en los reportes emitidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como parte de las acciones de monitoreo del riesgo asociadas al Escenario ER15 – Accidentes de trabajo (ver Subanexo C8.3.1. Soportes del SG-SST). Durante el periodo de reporte se presentó un (1) accidente laboral, ocurrido el 5 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m., cuando un trabajador, durante una ronda de supervisión, tropezó en un hueco de la obra, generándose torsión de la pierna derecha, con dolor e inflamación.

  El evento fue atendido conforme a los procedimientos establecidos en el SG-SST y no derivó en consecuencias mayores. No obstante, en atención a la ocurrencia del accidente, el nivel de amenaza del Escenario ER15 se clasifica como medio, considerando que este tipo de eventos tiene el potencial de afectar la continuidad de las actividades de obra. Esta valoración se sustenta en el cumplimiento de los procedimientos, programas y medidas preventivas del SG-SST, los cuales hacen parte integral del PGRDEPP del proyecto.

  Adicionalmente, se ejecutaron acciones de reducción del riesgo, las cuales se describen en el Capítulo 5.1.2, numeral 7, del presente informe.

Agradecemos de antemano su respectiva gestión.

Cordialmente,

Ing. Alfonso Peñaranda Suárez, PMP® - PMI-ACP®
Director de Proyecto
Unión Temporal Metropolitano Porvenir
Velódromo Gibraltar.

Anexos: Lo enunciado

SUBANEXO C8.5.1. SOPORTES DE RADICACIÓN DEL INFORME MENSUAL NO. 23

5_CIG-IDRD-VEL-0011-2026. APROBACIÓN IMA23

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR
NIT: 901.781.400-1
RADICADO CE-206-128 176
Claudia G
07-01-26
RECIBIDO PARA REVISION

Bogotá D.C., 07 de diciembre de 2025

CIG-IDRD-VEL-0011-2025

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia: PROYECTO 2 – VELÓDROMO CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ.

Asunto: Aprobación Informe Mensual Ambiental Número 23 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025 V1 radicado **CE-206-125-2104** del 26 de diciembre de 2025; V2 – Radicado CE-206-125-2124 del 06 de enero de 2026.

Respetado Arquitecto:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales del contrato de referencia, informamos que una vez revisada la información presentada en el Informe Mensual Ambiental número 23 Versión 2 del contratista de obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de noviembre y el 25 de diciembre de 2025, y en atención a las observaciones realizadas, por medio de la comunicación CIG-IDRD-VEL-0996-2025 del 31 de diciembre de 2025, las cuales fueron atendidas y subsanadas de acuerdo con los comentarios incluidos en el documento "INFORME_N_23_V1_Obseravciones.docx" y adjunto en el Link https://drive.google.com/drive/folders/1lWpaErMUvRh2LnkPkq8nwJbp78zWM4RR?usp=drive_link , esta Interventoría considera pertinente APROBARLO, toda vez que el documento detalla todas las actividades ejecutadas durante el periodo reportado. Sin embargo, cabe anotar que en el momento en que la supervisión del contrato realice la revisión del informe 23 de interventoría, se solicitará, si es el caso, realizar el alcance/complemento del mismo.

Cordialmente,

Edgar Solorzano Medina
Coordinador interventoría

Anexos: No Aplica
Elaboró: Ing. Julián Ricardo Agudelo - residente Ambiental de Interventoría
Revisó: Ing. Edgar Solorzano Medina - Coordinador interventoría
Aprobó: Ing. Edgar Solorzano Medina - Coordinador de Interventoría

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

SUBANEXO C8.5.2. SOPORTES DE RADICACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL NO. 2

1_CIG-IDRD-VEL-977-2025. OBSERVACIONES

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
NIT. 901.285.440-5
No RADICADO CE-206-125
RECIBIDO POR: Claudia G
FECHA: 23-12-25
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 1155
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2025

CIG-IDRD-VEL-977-2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
Ing. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ
Director del Proyecto
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Respuesta al comunicado CE-206-125-2088 Informe Semestral del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia Ambiental No.2, Primer semestre del año 2025 Versión 1.

Respetado Ing.:

Dando respuesta al comunicado de la referencia, y luego de la verificación de la información remitida se allegan observaciones al documento principal del informe semestral No.2, con el objetivo de ser subsanadas y posteriormente adelantar la respectiva verificación y posterior aprobación.

Quedamos al pendiente de la entrega de la información.

Cordialmente,

Ing. Edgar Solorzano Medina
Coordinador de Interventoría

Elaboró y proyectó: Ing. Astrid Viviana Rojas C.- Profesional Gestión del Riesgo de Desastres Proyecto 2.
Revisó: Ing. Edgar Solórzano Medina
Aprobó: Ing. Edgar Solórzano Medina

Anexo: Informe Mensual Semestral No.22 de PGRDEPP y PDCA en pdf. (Digital)

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144

www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

1 GDR 19/12/2025 11:45:13
Por favor eliminar esta información

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTRATO N° 3232 DE 2023 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.	IDRD BOGOTÁ

CONTROL DE PROFESIONALES

Contratista		
Elaborado por:		
Ing. Ingrid Johanna Barrientos Murcia Profesional en Gestión del Riesgo de Desastres	**Ing. Cesar Fernández** Profesional Ambiental en Suelos Contaminados	**Ing. Paula Blanco** Residente Ambiental
Revisado por:	**Aprobado por:**	
Ing. Alfonso Peñaranda Suárez Director de Obra	**Arq. José Luis Clavijo Olmos** Representante Legal	

Interventoría		
Revisado por:		**Aprobado por:**
Ing. Astrid Viviana Rojas Profesional en Gestión del Riesgo de Desastres	**Ing. Nubia Yaneth Barreto** Directora	**Ing. Edgar Enrique Solorzano** Coordinador Técnico

1

3

Notas

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTRATO N° 3232 DE 2023 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.	IDRD BOGOTÁ

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe describe las actividades relacionadas con la implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto Velódromo, según los requerimientos del Contrato de Obra IDRD No. 3232 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ", correspondiente a la etapa de construcción en el periodo de ejecución de obra comprendido entre el **1 de enero de 2025 y el 25 de julio de 2025**, equivalente al **segundo informe** semestral; dichas actividades pertenecen a la gestión documental adelantada en el período de reporte.

[1]

1 | GDR | 19/12/2025 11:47:10
a la etapa constructiva del pericdo comprendido

Notas

418

2. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS (PGRDEPP)

2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PGRDEPP

En el marco del proceso de implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) - Versión 6 (V6), remitido al IDIGER el 21 de octubre de 2024, conforme a lo establecido en el Decreto 2157 de 2017 mediante radicado No. CE-206-125-0763 e IDIGER 2024ER20464 y a la Secretaría Distrital de Salud el 30 de octubre de 2024, así como el PDCA a la Secretaría Distrital de Ambiente este mismo día.

A partir de la aprobación de esta versión, se continuó con su implementación en campo durante el semestre comprendido entre el **1 de enero de 2025 y el 25 de julio de 202** relacionado con las fases de construcción de cimentación profunda y excavación. Durante este periodo, se desarrollaron acciones orientadas a:

- Dirigir procesos de gestión del riesgo de desastres en el marco del proyecto.
- Ejecutar estrategias de monitoreo de escenarios de riesgo priorizados.
- Promover la divulgación interna y capacitación en gestión del riesgo.
- Socializar el PGRDEPP con actores internos y externos.
- Desarrollar obras de reducción y mitigación del riesgo.
- Fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante emergencias.
- Impulsar acciones de preparación para la respuesta ante eventos adversos.

2.1.1. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

En este proceso se adelantaron las acciones definidas con el Capítulo 6 "Proceso de Conocimiento del Riesgo" del PGRDEPP. Por tanto, en lo relacionado con el Subcapítulo 6.3. "Monitoreo del Riesgo", se desarrollaron actividades de monitoreo del riesgo, teniendo en cuenta los escenarios de riesgo identificados y priorizados en el PGRDEPP, así como las etapas, fases y actividades de ejecución del proyecto (**Ver Anexos 7, 8, 9 - Tablas No. 5, 6 y 7; Anexos 10, 11, 12 y 13 - Tablas No. 5, 6 y 8).**

Por lo anterior, durante el periodo sem al, se realizaron actividades periódicas de monitoreo y análisis de los resultados de cada uno de los escenarios priorizados en el

1 GDR 22/12/2025 07:56:29
A partir de la aprobación de esta versión, se continuó con la implementación en campo, durante el primer semestre comprendido entre el 1 enero y 25 de julio de 2025, se desarrollaron acciones de gestión del riesgo de desastres durante la ejecución de las fases de construcción de cimentación y excavación. En el curso de este periodo,

2 GDR 22/12/2025 07:56:47
del primer semestre del año 2025,

Notas

1 GDR 22/12/2025 08:52:08
es importante citar el biocatalizador y CAL

- Mantenimiento del cortafuegos, verificación de estado del área de acopio de material para conformación y fortalecimiento prácticas seguras con apoyo del SST.

- Adecuación de acopio temporal de relleno antrópico, exclusivo para el almacenamiento de sobrantes de prebarrenos de las actividades de pilotaje, en el mes de octubre de 2024. Dichos residuos son acopiados por un tiempo máximo de 48 horas en el proyecto y entregados a la empresa "Centro de Gestión Sostenible" o a "Veolia S.A.S. E.S.P.", como terceros autorizados para su transporte y disposición final en celdas de seguridad (Ver **Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 - Subanexo C8.2.1**). Se destaca que, durante el periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2025, se realizó el desmantelamiento del acopio existente de prebarrenos sobrante de la actividad de pilotaje.

- Aspersión de biocatalizador en zonas de acopio temporal de RESPEL, como medida preventiva ante posibles olores ofensivos (Ver **Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 - Subanexo C8.2.4**). [1]

- Carpado de vehículos dispuestos para transporte de RESPEL y aspersión de biocatalizador NONTOX para control de posibles olores, desde el 20 de enero de 2025, dado el inicio de actividades de excavación. Con ello, se implementa el Formato SC-003-352 para Control de olores de vehículos. Este formato es diligenciado de manera diaria, considerando los viajes de RESPEL a sitio de disposición final. Los resultados de dichas inspecciones pueden observarse en los **Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 – Subanexo C8.1.4. ER10 y Subanexo C8.2.4**).

- Inspecciones diarias para garantizar el adecuado manejo del material de relleno antrópico, incluyendo el cargue y el sellado de material expuesto en las zonas de cimentación profunda y durante las actividades de excavación – Ver **Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 – Subanexo C8.1.4. ER10 y Subanexo C8.2**. Estas medidas se complementaron con técnicas de control, como la aplicación de coberturas temporales como aplicación de recebo y verificación de carpado de materiales que se encuentren acopiados en diferentes frentes de obra, minimizando la dispersión de partículas en el ambiente.

- Inspecciones a extintores, botiquines y kits de emergencia, con apoyo del componente de SST. Los soportes documentales, evidencias y resultados se

Notas

encuentran compilados en el **Anexo 7 - Subanexo C8.3.5. - Inspecciones; Anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 - Subanexo C8.3.1. - Inspecciones.**

- Señalización de áreas inseguras, seguimiento a la entrega y reposición de EPPs, inspecciones a equipos y condiciones locativas y desarrollo de charlas y capacitaciones, en cumplimiento al Plan de SG-SST.

  Se resalta que, en caso de desgaste o deterioro, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) gestiona la reposición de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo con las necesidades específicas de cada trabajador. En este sentido, durante el segundo semestre de 2024 se realizó la entrega de 454 EPP, de los cuales 135 correspondieron a dotación inicial y 319 a reposición. Los soportes documentales, evidencias y resultados se encuentran compilados en el **Anexo 2 (Subanexo C8.3.8), Anexo 3 (Subanexo C8.1.11), Anexos 4, 5 y 6 (Subanexo C8.1.7).**

- Verificación de la disposición de kits de control de derrames, en vehículos encargados del retiro y disposición final de RESPEL.

- Activación del personal para operación de motobombas, si se identifican encharcamientos en la plataforma, que involucra la instalación de motobombas en la caja de achique dispuesta en el centro de la plataforma de cimentación para su posterior bombeo al sistema de sumideros, desde el mes de octubre de 2024, con el fin de evitar su contacto con relleno antrópico, sobrante de la actividad de prebarreno.

- Disposición de un (1) Frac Tank, como estructura de almacenamiento temporal y/o contención de RESPEL de líquidos peligrosos, que cuenta con un dique de contención con material impermeabilizado. Como medida de contingencia, se tienen dispuestos doce (12) isotanques con capacidad de contención de 1 m³, ubicados cercanos a los actuales frentes de trabajo. Una vez se alcance la capacidad máxima es solicitado el servicio con el respectivo gestor autorizado, para su posterior envío a disposición, a través de vactor o camiones de succión. Dicho Frac Tank fue instalado en la zona nor-oriental de la plataforma y cuenta con capacidad de contención de 80 m³; esta estructura fue suministrada por la empresa Centro de Gestión Sostenible S.A.S "Ciudad Limpia".

1 GDR 22/12/2025 09:00:20
en los posible debemos actualizar esta información con los datos del primer semestre de 2025.

Notas

1 GDR 22/12/2025 10:36:24
aplicación

atención de derrames y protección de taludes. Ver **Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, y Anexo 13 (Subanexo C8.3.5./ PDCA F3/ Actividades de seguimiento F3)**

Las actividades de seguimiento e inspecciones relacionadas en el formato SC-003-350 PDCA F3 se describen a continuación; inspección en el proceso de cargue de RESPEL, verificando el debido cargue y aplicación de CAL, medidas de drenaje de lixiviados y agua lluvia, mantenimiento a cajas internas de alcantarillado, seguimiento al pluviómetro implementado para medir el nivel de precipitación presentado en obra en formato SC-003-145, se llevan a cabo las inspecciones de las vías de acceso de la obra se encuentren totalmente despejadas. Ver **Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13 (Subanexo C8.3.5./ PDCA F3/ SC-003-350).**

- **Ficha No. 4 – ER10: Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado / ER05: Orden público y social.**

  Se llevaron a cabo las actividades de socialización de las actividades ejecutadas por los planes y programas de los componentes ambiental, gestión del riesgos e de desastres y SST ante los comités de participación comunitaria, la implementación de Biocatalizador y CAL en puntos de acopio temporales de RESPEL, limpieza y carpado de vehículos de carga de RESPEL, implementación del uso del formato de control de olores en vehículos SC-003-352, en el mes de abril se implementó PQRS ejecutado por la UTMP, a la empresa Ciudad Limpia para el mejoramiento de las actividades de carpado, en el mes de mayo seguimiento a las inspección de las actividades de carpado de vehículos de carga de RESPEL, se llevaron a cabo inspecciones de orden y aseo, Ver **Anexo 7 (Subanexo C.8.3.1. PDCA F4); Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13 (Subanexo C8.3.6./ PDCA F4).**

- **Ficha No. 5 – ER08, ER12 y ER13: Fuga, incendio o explosión por acumulación de gases del relleno antrópico.**

  Durante el semestre se llevaron a cabo las actividades de inspección de la demarcación y aislamiento de las áreas de intervención de los procesos de excavación y pilotaje, inspección a los equipos de atención de emergencias extintores, seguimiento y monitoreo de los procesos de medición de gases durante

Notas

420

garantizar la efectividad de las medidas adoptadas en el marco del PDCA. Las acciones incluyeron la trazabilidad de oficios y comunicaciones realizadas, entrega de informes mensuales y atención a observaciones, registro y control documental de las actividades ejecutadas, así como soportes de remisión de la actualización de instrumentos técnicos, operativos y de respuesta.

Los soportes documentales, evidencias y resultados se encuentran presentados en el Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 - Capítulo 5.1.5. y/o Subanexo C8.5.

1

1 | GDR | 22/12/2025 10:44:29

Es importante incluir un capitulo con conclusiones donde hablemos de las activación del PDCA en nivel I y tambien la importancia del monitoreo de gases de acuerdo con loo concluido en el informe de análisis de monitoreo de ER08, E12 y ER13.

Notas

SUBANEXO C8.5.2. SOPORTES DE RADICACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL NO. 2

2_CE-206-125-2109. RESPUESTA CIG-IDRD-VEL-977-2025

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2025
CE-206-125-2109

Señores:
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: **Respuesta Radicado No. CIG-IDRD-VEL-977-2025 "Respuesta al comunicado CE-206-125-2088 Informe Semestral del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia Ambiental No. 2, Primer semestre del año 2025 Versión 1".**

Cordial saludo,


De manera atenta y respetuosa, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir (el "Contratista" o la "Unión Temporal") dentro del marco jurídico del Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023 (el "Contrato"), se permite dar respuesta al Radicado No.CIG-IDRD-VEL-977-2025 del 23 de diciembre cuyo asunto es "Respuesta al comunicado CE-206-125-2088 Informe Semestral del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia Ambiental No. 2, Primer semestre del año 2025 Versión 1" y realizar alcance del Informe Semestral del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia Ambiental N° 2, I Semestre 2025, previamente radicado ante la Interventoría por la Unión Temporal mediante Radicado No CE-206-125-2088 del 17 de diciembre de 2025.

Por tanto, se remite el siguiente enlace para su respectiva verificación y/o aprobación (OneDrive IDRD):

Informe Semestral No. 2 – I Semestre 2025:
https://idrdcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ivonne_aguilar_idrd_gov_co/IgBTCCqqn3CFSaqSCXRgwIsGASI_AICFomPxQfC-64fCgVQ?e=cf4V1k


Por lo anterior, y conforme a las observaciones remitidas mediante Radicado No.CIG-IDRD-VEL-977-2025, nos permitimos responder, informando lo siguiente:

Observación 1:




Respuesta UTMP: Se procede a eliminar esta información del control de firmas.

Observación 2:



Respuesta UTMP: Se procede a modificar la redacción "etapa constructiva".

Observación 3:

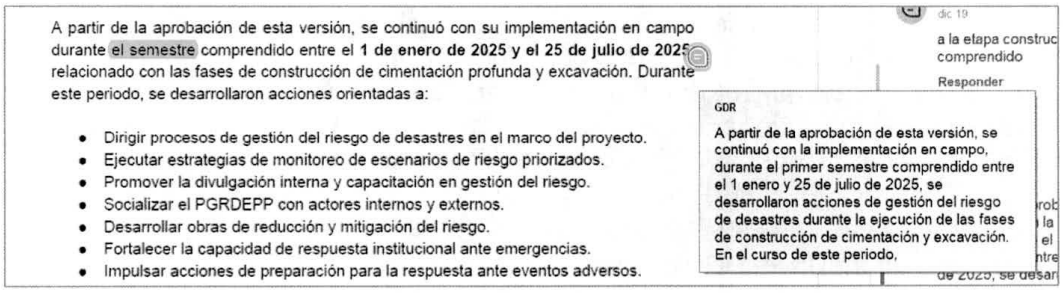

Respuesta UTMP: Se procede a reemplazar el párrafo de acuerdo con lo solicitado.

A partir de la aprobación de esta versión, se continuó con la implementación en campo, durante el primer semestre comprendido entre el 1 enero y 25 de julio de 2025, se desarrollaron acciones de gestión del riesgo de desastres durante la ejecución de las fases de construcción de cimentación y excavación. En el curso de este periodo, se desarrollaron acciones orientadas a:

- Dirigir procesos de gestión del riesgo de desastres en el marco del proyecto.
- Ejecutar estrategias de monitoreo de escenarios de riesgo priorizados.
- Promover la divulgación interna y capacitación en gestión del riesgo.
- Socializar el PGRDEPP con actores internos y externos.
- Desarrollar obras de reducción y mitigación del riesgo.
- Fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante emergencias.
- Impulsar acciones de preparación para la respuesta ante eventos adversos.

Observación 4:

5, 6 y 7; Anexos 10, 11, 12 y 13 - Tablas No. 5, 6 y 8).

Por lo anterior, durante el periodo seme[illegible]l, se realizaron actividades periódicas monitoreo y análisis de los resultados de cada uno de los escenarios priorizados er

GDR

del primer semestre del año 2025,

Respuesta UTMP: Se ajusta redacción a lo solicitado.

Observación 5:

- Aspersión de biocatalizador en zonas de acopio temporal de RESPEL, como medida preventiva ante posibles olores ofensivos (Ver **Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 - Subanexo C8.2.4**).
- Carpado de vehículos dispuestos para transporte de RESPEL y aspersión de biocatalizador NONTOX para control de posibles olores, desde el 20 de enero de 2025, dado el inicio de actividades de excavación. Con ello, se implementa el Formato SC-003-352 para Control de olores de vehículos. Este formato es diligenciado de manera diaria, considerando los viajes de RESPEL a sitio de

Responder

GDR

GDR

es importante citar el biocatalizador y CAL

Agrega una respuesta

GDR
dic 22

Respuesta UTMP: Efectivamente fue aplicado cal durante las actividades de excavación; sin embargo, a volquetas dispuestas para transporte de RESPEL no se realizó aplicación de cal, solamente de biocatalizador. Por tanto, se ajusta descripción de acciones realizadas.

- Aspersión de biocatalizador NONTOX y cal en zonas de acopio temporal de RESPEL, como medida preventiva ante posibles olores ofensivos (Ver **Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 - Subanexo C8.2.4**).

- Carpado de vehículos dispuestos para transporte de RESPEL y aspersión de biocatalizador NONTOX para control de posibles olores, desde el 20 de enero de 2025, dado el inicio de actividades de excavación. Con ello, se implementa el Formato SC-003-352 para Control de olores de vehículos. Este formato es diligenciado de manera diaria, considerando los viajes de RESPEL a sitio de disposición final. Los resultados de dichas inspecciones pueden observarse en los **Anexos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 – Subanexo C8.1.4. ER10 y Subanexo C8.2.4**).

Observación 6:

Se resalta que, en caso de desgaste o deterioro, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) gestiona la reposición de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo con las necesidades específicas de cada trabajador. En este sentido, durante el segundo semestre de 2024 se realizó la entrega de 454 EPP, de los cuales 135 correspondieron a dotación inicial y 319 a reposición. Los soportes documentales, evidencias y resultados se encuentran compilados en el **Anexo 2 (Subanexo C8.3.8), Anexo 3 (Subanexo C8.1.11), Anexos 4, 5 y 6 (Subanexo C8.1.7).**

Verificación de la disposición de kits de control de derrames, en vehículos

Responder

GDR
dic 22

en los posible deb

GDR

en los posible debemos actualizar esta información con los datos del primer semestre de 2025.

Respuesta UTMP: Se actualiza información incluyendo número de EPPs entregados nuevos y de reposición.

- Señalización de áreas inseguras, seguimiento a la entrega y reposición de EPPs, inspecciones a equipos y condiciones locativas y desarrollo de charlas y capacitaciones, en cumplimiento al Plan de SG-SST.

  Se resalta que, en caso de desgaste o deterioro, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) gestiona la reposición de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo con las necesidades específicas de cada trabajador. En este sentido, durante el primer semestre de 2025 se realizó la entrega de 584 EPPs, de los cuales 188 correspondieron a dotación inicial y 396 a reposición. Los soportes documentales, evidencias y resultados se encuentran compilados en el **Anexo 7 - Subanexo C8.3.5. – Entregas EPPs; Anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 - Subanexo C8.3.1. - Entregas EPPs.**

Observación 7:

Ficha No. 4 – ER10: Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado / ER05: Orden público y social.


Se llevaron a cabo las actividades de socialización de las actividades ejecutadas por los planes y programas de los componentes ambiental, gestión del riesgos e de desastres y SST ante los comités de participación comunitaria, la implementación de Biocatalizador y CAL en puntos de acopio temporales de RESPEL, limpieza y carpado de vehículos de carga de RESPEL, implementación del uso del formato de control de olores en vehículos SC-003-352, en el mes de abril se implementó PQRS ejecutado por la UTMP, a la empresa Ciudad Limpia para el mejoramiento de las actividades de carpado, en el mes de mayo seguimiento a las inspección de las

GDR
aplicación

Respuesta UTMP: Se procede con la corrección del párrafo de la ficha No 4 – ER10 del PDCA.

> **Ficha No. 4 – ER10: Afectación a la salud por olores ofensivos y material particulado / ER05: Orden público y social.**
>
> Se llevaron a cabo las actividades de socialización de las actividades ejecutadas por los planes y programas de los componentes ambiental, gestión del riesgos de desastres y SST ante los comités de participación comunitaria, la aplicación de Biocatalizador y CAL en puntos de acopio temporales de RESPEL, limpieza y carpado de vehículos de carga de RESPEL, implementación del uso del formato de control de olores en vehículos SC-003-352, en el mes de abril se implementó PQRS ejecutado por la UTMP, a la empresa Ciudad Limpia para el mejoramiento de las actividades de carpado, en el mes de mayo seguimiento a las inspección de las actividades de carpado de vehículos de carga de RESPEL, se llevaron a cabo inspecciones de orden y aseo, Ver **Anexo 7 enero 2025 (Subanexo C.8.3.1. PDCA F4) anexo 8 febrero 1-25, anexo 9 febrero 26 – marzo 25 INF 14, Anexo 10 marzo 26 – abril 25 INF 15, Anexo 11 abril 26 – mayo 25 – INF 16, Anexo 12 mayo 26 –**

Observación 8:



Respuesta UTMP: Se incluye el capítulo de conclusiones el cual consolida los temas relevantes durante el periodo reportado, primer semestre 2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP® – PMI-ACP®
Director de Proyecto
Velódromo Gibraltar

Folios: 5

SUBANEXO C8.5.3. SOPORTES DE ALCANCE DEL INFORME MENSUAL NO. 19

1_CIG-IDRD-VEL-0976-2025. SOLICITUD ALCANCE IMA 19

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
N.I. 901.781.406-1
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No RADICADO CE-206-125 1754
RECIBIDO POR: Claudia G
FECHA: 23-12-25
RECIBIDO PARA REVISION

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2025

CIG-IDRD-VEL-0976-2025

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia: PROYECTO 2 – VELÓDROMO CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232 DE 2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTÁ.

Asunto: Solicitud de alcance Informe Mensual Ambiental Número 19 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de julio al 25 de agosto de 2025 Versión 2 (V2), radicado CE-206-125-1792 del 4 de septiembre de 2025.

Respetado Arquitecto:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales del contrato de referencia, informamos que una vez revisada la información presentada en el Informe Mensual Ambiental de Interventoría número 19 Versión 0 (V0), por parte el apoyo ambiental de la supervisión del proyecto, se solicita dar alcance al Informe Ambiental de Obra Número 19 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de julio al 25 de agosto de 2025; Versión 2 (V2), radicado CE-CE-206-125-1792 del 4 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta lo que se lista a continuación:

1. Ficha 2 "CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE LABORA EN OBRA": se evidencia que el indicador de capacitaciones ambientales se reporta de manera general como un cumplimiento del 55,55%; sin embargo, los registros de asistencia por temática, presentan brechas en la cobertura del personal, algunas capacitaciones presentan valores inferiores al total de trabajadores (por ejemplo, 9 participantes frente a 27). Por lo anterior, el indicador no demuestra el cumplimiento de la capacitación a la totalidad del personal ni garantiza que cada trabajador reciba todas las temáticas obligatorias del PMA.

2. Ficha 4 "MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS": incluir el análisis del indicador de Recircularidad, relacionando las toneladas de materiales que ingresaron al proyecto durante el periodo y cuántas de estas corresponden a materiales con componente reciclado, indicando el porcentaje resultante de cumplimiento de circularidad. Referenciar expresamente que la meta de circularidad se reporta en la Tabla 50 – Indicadores de Aprovechamiento y Circularidad, ubicada en que capítulo 7.3 Certificados de disposición final de RCD.

3. Ficha 6 "MANEJO, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RCD APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES": durante los anteriores informes se reporta que no se ha realizado la entrega del material, manteniéndose esta condición durante varios meses

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

consecutivos. Se solicita aclarar la razón por la cual no se ha efectuado el retiro, así como llevar la trazabilidad completa de generación y retiro, indicando cuánto material permanece acopiado correspondiente a los meses en los cuales no se ha realizado entrega.

Adicionalmente, debe especificarse la proyección o programación para su retiro y documentar las condiciones de acopio, soportándolo con registro fotográfico actualizado.

De igual forma, se debe incluir el análisis relacionando las toneladas de RCD generadas durante el periodo y las toneladas que fueron manejadas adecuadamente (aprovechadas, enviadas a CTA y dispuestas en sitios autorizados), indicando el porcentaje de cumplimiento de la meta de aprovechamiento.

Se debe referenciar el capítulo del informe donde se presenta dicha meta, específicamente la Tabla 50 – Indicadores de Aprovechamiento y Circularidad, a fin de mantener coherencia entre el desempeño operativo reportado en la Ficha 6 y los indicadores globales del manejo de RCD establecidos para el proyecto.

4. Ficha 7: "SEPARACIÓN, ALMACENAMIENTO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS": Revisar la redacción y dejar explícito el motivo por el cual no se ha realizado el retiro del residuo, ya que la información presentada no es clara. No basta con indicar que no se retiró en el mes: se requiere explicar por qué no se efectuó el retiro en este y en los meses anteriores, cuando así aplica.

   Se debe llevar la trazabilidad completa de generación y retiro, indicando en un solo consolidado el volumen generado por mes, el volumen efectivamente retirado y la cantidad que permanece acopiada correspondiente a los meses en los que no se ha realizado entrega.

   Igualmente, se debe dejar claridad sobre las condiciones de acopio temporal, garantizando su cumplimiento normativo (segregación, impermeabilización, cubiertas, señalización y contención), soportando dicha información con registro fotográfico actualizado.

5. Numeral 5.13 "GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES": no se referencian de manera explícita los anexos, formatos de campo ni soportes técnicos que respalden las mediciones y acciones reportadas. se requiere identificar los registros correspondientes a monitoreos de gases, lecturas piezométricas, registros de precipitación, reportes de sismicidad, inspecciones de taludes, operatividad de pozos eyectores y verificaciones de EPP y kits de derrames.

   Adicionalmente, se solicita aclarar el análisis del escenario ER16, dado que el inclinómetro No. 6 presentó deformación constante y el criterio técnico que sustenta que dicha variación se mantiene dentro de rangos aceptables.

   Justificar la no ejecución de simulacros durante el periodo, indicando la periodicidad establecida en el PGRDEPP y la programación del siguiente ejercicio. Se recomienda incorporar los indicadores de cumplimiento del PGRDEPP así como la referencia a la matriz de riesgos.

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

6. Numeral 5.15 "DETERMINANTES AMBIENTALES": Durante el periodo en el numeral 4,15 Determinantes ambientales, se debe actualizar con información para el periodo del informe (julio - agosto 2025).

7. Numeral 5.16 "BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE": se expone la trazabilidad al respecto, sin embargo, se debe realizar un análisis si para el periodo del informe. ¿Alguna condición de las aprobadas inicialmente ha cambiado?, ¿Se encuentra en revisión durante el periodo?, o ¿Se mantienen a la fecha las condiciones?

8. Numeral 7.2 "REPORTE DE COSTOS DE TRATAMIENTOS Y DISPOSICION DE RCD DE LA OBRA": presentar el análisis de costos asociado al tratamiento y disposición de los RCD del periodo. Se requiere incluir el reporte verificando que los valores facturados en las actas parciales correspondan y coincidan con las cantidades realmente dispuestas y certificadas por el gestor autorizado, garantizando coherencia, trazabilidad y consistencia entre lo ejecutado, lo certificado y lo cobrado.

9. Numeral 7.8 "PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN": de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0507 de 2023, se debe adjuntar la tabla del Anexo I – Numeral 5, la cual debe presentarse de manera mensual y reportar de forma precisa lo instalado y efectivamente generado durante el periodo de evaluación. Sin embargo, se evidencia que la tabla incluida en el informe corresponde al Numeral 3 del mismo Anexo, que presenta la proyección inicial del proyecto y es utilizada para el trámite del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), por lo que no cumple con el requisito establecido para este reporte.

   Se solicita realizar el ajuste correspondiente e incluir la tabla exigida para garantizar la adecuada trazabilidad y verificación del cumplimiento del PMARCD.

   Verificar que estos formatos estén debidamente diligenciados y que la información allí contenida coincida con las cantidades reportadas en el cuerpo del informe, y la trazabilidad de cantidades aprobadas en informes anteriores, en los formatos oficiales y en las certificaciones adjuntas, garantizando así la consistencia, trazabilidad y cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normativa ambiental vigente.

10. Numeral 7.5 "CERTIFICACIÓN MANEJO DE RESIDUOS CONVENCIONALES APROVECHABLES": se debe realizar el balance y referenciar el anexo donde se encuentra la certificación correspondiente en la cual coincida cantidades reportadas.

Cordialmente,

Ing. Edgar Solorzano Medina
Coordinador de Interventoría

Anexos: N/A
Elaboró: Ing. Julián Ricardo Agudelo - Residente Ambiental de Interventoría
Revisó y aprobó: Ing. Viviana Astrid Rojas – Profesional Riesgos de Interventoría
Ing. Edgar Solorzano Medina – Directora de Interventoría

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

SUBANEXO C8.5.3. SOPORTES DE ALCANCE DEL INFORME MENSUAL NO. 19

2_CE-206-125-2128. RESPUESTA CIG-IDRD-VEL-0976-2025

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C., 07 de enero de 2026
CE-206-125-2128

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. **ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802
La Ciudad

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: Respuesta al Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0976-2025 del 23-12-2025. Alcance al Informe Mensual del Componente Ambiental N° 19 (Entrega V3), período del 26 de julio al 25 de agosto de 2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, representada por el "Contratista" o la "Unión Temporal", conforme al marco jurídico establecido en el Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023, nos dirigimos respetuosamente a ustedes para dar respuesta al Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0976-2025 del 23 de diciembre de 2025. Se remite el alcance del Informe Ambiental de Obra Número 19 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de julio al 25 de agosto de 2025; Versión 3 (V3), radicado CE- CE-206-125-1792 del 4 de septiembre de 2025. Así las cosas, se relacionan los siguientes enlaces para su respectiva verificación y/o aprobación:

Informe mensual consolidado componente ambiental:
https://drive.google.com/drive/folders/10pEieOvZSh9Fv8HKB2b0Jqmi_9K789v5?usp=drive_link

Anexo C8. PGRDEPP:
https://drive.google.com/drive/folders/1Up7O7h6DUrAPv4-q8QG5KJI5Ze7Lzerc?usp=drive_link

Dichos enlaces se remiten por separado con el fin de evitar inconvenientes técnicos del orden de visualización de archivos de los subanexos.

Por lo anterior, y conforme a las observaciones realizadas en dicho oficio, nos permitimos responder, informando lo siguiente:

1. *Ficha 2 "CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE LABORA EN OBRA": se evidencia que el indicador de capacitaciones ambientales se reporta de manera general como un cumplimiento del 55,55%; sin embargo, los registros de asistencia por temática, presentan brechas en la cobertura del personal, algunas capacitaciones presentan valores inferiores al total de trabajadores (por ejemplo, 9 participantes frente a 27). Por lo*

anterior, el indicador no demuestra el cumplimiento de la capacitación a la totalidad del personal ni garantiza que cada trabajador reciba todas las temáticas obligatorias del PMA.

Respuesta UTMP: La diferencia de cantidad de participantes está sustentada en el texto de la ficha 2 de la siguiente manera: "*Se aclara, de acuerdo a lo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental que, las capacitaciones son orientadas exclusivamente al personal operativo. En promedio se realizó la capacitación a 15 personas. Se aclara, que se han presentado retiros graduales y períodos de vacaciones del personal operativo, relacionado con la disminución de actividades a nivel técnico*". Así fue presentado y conciliado en la versión aprobada por interventoría.

2. *Ficha 4 "MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS": incluir el análisis del indicador de Recircularidad, relacionando las toneladas de materiales que ingresaron al proyecto durante el periodo y cuántas de estas corresponden a materiales con componente reciclado, indicando el porcentaje resultante de cumplimiento de circularidad. Referenciar expresamente que la meta de circularidad se reporta en la Tabla 50 – Indicadores de Aprovechamiento y Circularidad, ubicada en que capítulo 7.3 Certificados de disposición final de RCD.*

Respuesta UTMP: La estructura de presentación del informe corresponde a la lista de chequeo suministrada por parte de interventoría, la cual incluye el orden y los ítems aplicables a los informes de la misma, en la ficha 4 se presenta el seguimiento a los indicadores de esta establecidos en el PMA. El indicador de circularidad es entregado en el ítem acorde a la lista mencionada (capítulo N° 6). Si se modifica la ficha se aplicaría la ejecución desde enero de 2026, no previamente ya que implica el cambio de un documento contractual, la UTMP espera la directriz respectiva.

3. *Ficha 6 "MANEJO, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RCD APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES": durante los anteriores informes se reporta que no se ha realizado la entrega del material, manteniéndose esta condición durante varios meses consecutivos. Se solicita aclarar la razón por la cual no se ha efectuado el retiro, así como llevar la trazabilidad completa de generación y retiro, indicando cuánto material permanece acopiado correspondiente a los meses en los cuales no se ha realizado entrega.*

   Adicionalmente, debe especificarse la proyección o programación para su retiro y documentar las condiciones de acopio, soportándolo con registro fotográfico actualizado.

   De igual forma, se debe incluir el análisis relacionando las toneladas de RCD generadas durante el periodo y las toneladas que fueron manejadas adecuadamente (aprovechadas, enviadas a CTA y dispuestas en sitios autorizados), indicando el porcentaje de cumplimiento de la meta de aprovechamiento.

   Se debe referenciar el capítulo del informe donde se presenta dicha meta, específicamente la Tabla 50 – Indicadores de Aprovechamiento y Circularidad, a fin de mantener coherencia entre el desempeño operativo reportado en la Ficha 6 y los indicadores globales del manejo de RCD establecidos para el proyecto.
