PENDIENTE - Por parte de la interventoría CIG se manifiesta que se hicieron las aclaraciones pertinentes junto al contratista UTMP el día de hoy y se informará a la entidad contratante.
Se adelantaron actividades de control, mitigación y seguimiento ambiental, entre las que se destacan: • Jornadas de capacitación ambiental enfocadas en determinantes ambientales, protección de materiales, mantenimiento de sumideros, manejo de árboles y control de sedimentación. • Gestión integral del retiro y aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), alcanzando un avance acumulado del 86,30%, con metas de aprovechamiento del 99,82% y circularidad del 19,33%. • Manejo, control y evacuación de 27.310 kg de lixiviados, mediante sistemas de contención, bombeo, almacenamiento temporal y disposición final controlada. • Implementación de medidas de control ambiental preventivo, tales como lavado de cárcamos, control de olores, monitoreo de gases y mantenimiento de sistemas de contención.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Componente Riesgos: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a l red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente
Por parte del IDRD se comunica que el Radicado SDA No 2026ER10476(23/0/2026) programacion de la tercera campaña, por parte de la Interventoria (Profesional de Hidrogeologia) se indaga a la supervision sobre la fecha propuesta para la tercera campaña de monitoreo ante la SDA propuesta para este mes de Febrero , el apoyo a la supervision manifiesta que no se ha tenido respuesta, se revisara el dia de mañana comunicacion o se tendra que correr la fecha, se queda de compromiso dar una razon por parte del IDRD a mas tardar el dia 09/02/2026 para iniciar o no trabajos preliminares al respecto.
2) Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD
Por parte del IDRD se manifiesta que calidad de aire esta radicado hace varios meses y la interventoria CIG tiene conocimiento respectivo, no depende de IDRD y depende derespuesta expresa de la SDA en dos terminos 1) Propuesta presentada para UNICO monitoreso del Parque (incluido dos proyectos CAR y Velodromo- Parque metropolitano) y 2) Concepto tecnico 6540 indica claramente que la ubicacion de puntos de monitoreo se debe hacer en conjunto con la SDA) Se esta realizando gestion por parte del IDRD ante la SDA, se aclara por parte de la UTMP que lo que se solicita es la reiteracion ante la SDA, segun lo descrito se están agotando las instancias interinstitucionales.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Se ejecutaron acciones sistemáticas orientadas al control y reducción del riesgo, principalmente en escenarios asociados a excavaciones, aguas subterráneas y condiciones climáticas, incluyendo: • Monitoreo permanente del nivel freático en los pozos eyectores. • Control de precipitación mediante pluviómetro en sitio. • Activación de sistemas de bombeo, diques de contención, isotanques y catch tank para manejo de lixiviados. • Aplicación de cal en zonas excavadas como medida preventiva frente a generación de olores ofensivos. • Monitoreo de gases volátiles en frentes activos, sin detección de niveles críticos.
Por parte de la interventoria CIG se manifiesta que fue remitida al IDRD que se remite subsanacion del Informe No 21, se recibe lista de chequeo de aprobación del informe No 20 el cual fue remitido en fisico ante la entidad contratante.

Componente SST: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23. PENDIENTE en avance según lo reportado en las diapositivas del presente comité.
2) Subsanación de observaciones efectuadas durante recorrido preliminar a comité de Obra No 96. (05/02/2026). Por parte de la UTMP y CIG se remite a la entidad contratante registro fotografico pertinente al respecto de los ajustes según observaciones efectuadas y se presentan durante el comite.
3) Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Humaña . Por parte de la UTMP se solicito el cierre respectiva, se tiene seguimiento respectivo teniendo que esta activo en obra.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Durante el periodo se mantuvo el control permanente en frentes de trabajo, mediante: • Inspecciones en excavaciones, trabajos en altura, uso de EPP, orden y aseo. • Implementación de pausas activas, inducciones y charlas de seguridad. • Seguimiento a indicadores de accidentalidad, registrándose 8 accidentes acumulados, de los cuales 4 se encuentran cerrados y 4 abiertos. • Control del ausentismo laboral, con un acumulado histórico de 62 eventos.
Por parte de la Interventoria CIG se manifiesta que dentro de las actividades administrativas de la semana se reporta la presentacion del informe mensual No 24 de obra y la respuesta con observaciones por parte de CIG, se subsanara el dia 05/02/2026. En cuanto a la subsanacion del informe No 20 mediante correo electronico se remitio el 04/02/2026, el cual incluye el plan de trabajo 2026 tanto de obra como de interventopria. La supervision informa que se dara respuesta a la remision digital si es el caso se tendra mesa de trabajo o aval respectivo pasra remision en Fisico.
Componente CALIDAD: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad – anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar -
Cumplido. Se comunica por parte de la interventoria que la información fue recibido y esta informacion sera base del documento a presentar como respuesta a las observaciones dadas de parte de la entidad contratante IDRD.
2) Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (Rad. IDRD No 20264200013601 del 20/01/2025 Oficio Contratista de obra No CE-206-125-2150 del 13/01/2026) Revisión por parte de la Interventoría CIG
PENDIENTE: Se comunica por parte de la Interventoria que se hará revision respectiva de la respuesta a la entidad contratante.
3) Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD. (Rad. IDRD No 20262100054772 02/02/2026 Hoja de vida Prof. Calidad Interventoría)
PARCIAL - Se presenta para aprobacion profesional de interventoria componente Calidad, de esto depende la respuesta al requerimiento teniendo en cuenta que este profesional firmará dicho documento (PLAN DE CALIDAD interventoria)
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se realizó seguimiento a los sistemas de control de calidad, destacando:

• Control de concretos estructurales, con una ejecución semanal de 123,44 m³, y un acumulado total de 2.712,08 m³, bajo protocolos de ensayo y control normativo.
• Ingreso y control de aceros estructurales, con un acumulado total de 540,99 toneladas.
• Seguimiento al suministro e instalación de la estructura metálica de cubierta, con un total acumulado de 250,84 toneladas, correspondiente a 28 unidades estructurales.
• Control documental y trazabilidad técnica de rediseños, modificaciones y componentes aprobados del proyecto.

Se ejecutaron actividades relevantes en:

• Muros estructurales.
• Columnas.
• Placas.
• Vigas aéreas.
• Estructura metálica principal.

Asimismo, se consolidó el avance en túneles, módulos estructurales, graderías y pasarelas, con seguimiento permanente a rediseños y ajustes técnicos previamente aprobados.

Respecto de los materiales y rellenos estructurales, se aprobó la caracterización técnica del material granular tipo PEA (proveniente de CTA) para el lleno del trasdós de los muros de contención, cumpliendo con la totalidad de los ensayos normativos exigidos, garantizando la estabilidad geotécnica de los túneles del proyecto.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TÉCNICO
Componente BIM: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones red de GAS
PENDIENTE: Se manifiesta por parte de la interventoria que se solicito al contratista UTMP que se realice el ajuste a la red perimetral y de manera posterior se hara revision aceptacion y/o observaciones pertinentes.
2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026. (Oficio de Obra No CE-206-125-2188 del 28/01/2026) Revisión y respuesta CIG – remitido a la entidad contratante vía Email 29/01/2026.
PENDIENTE: Se remitirá 06/02/2026 al contratista de obra la respuesta a la UTMP al respecto de la revision de la informacion presentada y se espera comentarios respectivos por parte del IDRD.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Se socializa al respecto de la implementación progresiva de la metodología BIM como herramienta integral de planificación, coordinación, control técnico y seguimiento del proyecto, orientada a mejorar la eficiencia constructiva, la detección temprana de interferencias y la trazabilidad de la información. Las actividades desarrolladas en este componente incluyen: • Modelación tridimensional de los sistemas estructurales, arquitectónicos y técnicos, permitiendo la verificación geométrica, espacial y funcional de los diferentes elementos del proyecto. • Coordinación interdisciplinaria mediante modelos federados, facilitando la identificación y resolución de interferenc as (clash detection) entre estructura, redes técnicas y arquitectura. • Validación de geometrías complejas, especialmente en zonas de alta complejidad constructiva como graderías, cubiertas, túneles y estructura principal. • Soporte a la planeación de obra mediante la vinculación del modelo BIM con la programación de actividades (4D) y la

• Soporte a la planeación de obra mediante la vinculación del modelo BIM con la programación de actividades (4D) y la estimación de cantidades de obra, mejorando la precisión en la secuencia constructiva y el control de tiempos. • Actualización progresiva de modelos conforme al avance real de obra (modelos as-built parciales), fortaleciendo la trazabilidad técnica y documental del proyecto. La implementación de BIM contribuye de manera directa al control técnico de la ejecución, la reducción de reprocesos, la optimización de recursos y la mejora en la toma de decisiones, consolidándose como una herramienta clave
Componente PROGRAMACIÓN: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. (Para el Modificatorio No 3 UTMP Oficios de Obra No CE-206-126- 2196 (Concretos) 2190 (Eléctricos) 2198 (Cubierta) 2186 (Hidráulicos) 2202 (Insumos)
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes entre las partes UTMP-CIG-IDRD.
2) Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link)
PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta y observaciones de manera Digital y se remitira de manera oficial por la entidad contratante IDRD.
3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD (Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link)
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes por parte de la entidad contratante IDRD.
4) Remisión de borrador de modificatorio No 1 Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador por parte de interventoría CIG el 04/02/2026
PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta la proxima respuesta.
5) Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)) Pendiente Respuesta IDRD.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Se manifiesta por parte de la interventoria y obra que se debe tener en cuenta que para el Modificatorio No 3 de obra la secuencia de aceptacion de los insumos por parte del IDRD asi como de los APUS y de ahí se procede a consolidar el presupuesto y la programacion de acuerdo a los alcances planteados y el valor de la adicion disponible y comunicada por parte de la Supervision que es aproximadamente de $ 6,500,000.
Se presenta por parte de CIG el Balance a la fecha de las revisiones efectuados a los informes MENSUALES por parte del IDRD y los valores de actas parciales PENDIENTES de acuerdo al avance a la fecha.
Componente TÉCNICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP
PENDIENTE: Se informa por parte del IDRD que se encuentra en la consolidacion de la información al respecto, según la reunion en curaduria Urbana No 2 ejecutada el dia 04/02/2026 entre la partes.
2) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD
PENDIENTE.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
El seguimiento estructural se realiza de forma desagregada por módulos (1, 2, 4, 5, 6, 7 y 12) y por elementos especiales como el Túnel Principal. Durante el periodo se ejecutaron actividades continuas de cimentación profunda y superficial, incluyendo: • Fundida de dados, vigas y losas de fundación. • Construcción de columnas circulares en concreto de 35 MPa con diferentes diámetros. • Ejecución de muros estructurales y muros de contención. • Avance en vigas aéreas de gran altura en el Módulo 7. Estas actividades consolidan el desarrollo progresivo de la superestructura y permiten habilitar frentes para actividades posteriores. En los túneles (principal, administrativo, deportivo y de ambulancias) se avanzó en: • Fundida de muros estructurales. • Fundida de columnas. • Impermeabilización de muros de contención y juntas de construcción.
Estructura Metálica de Cubierta La estructura metálica de cubierta presenta un avance significativo en fabricación y suministro: • Material total en planta: 912,42 toneladas. • Avance de material allegado: 83,93% frente al total proyectado (1.087 t). • Material en producción: 303,90 toneladas. Durante el periodo se registró el ingreso de elementos estructurales correspondientes a cerchas principales y pivotes centrales, consolidando el inventario necesario para el montaje progresivo en obra.
Instrumentación y Control Geotécnico El informe de instrumentación evidencia el control de asentamientos en plataforma, paramentos, bordillos y elementos perimetrales. Los registros parciales y acumulados muestran variaciones controladas dentro de rangos aceptables, sin alertas críticas, lo que indica un comportamiento geotécnico estable de las estructuras y del entorno intervenido a la fecha de corte
Componente ELECTRICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo. (Se remite por parte del contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión)


CUMNPLIDO: Se remitio por parte de la UTMP, la supervision solicita sea remitida a la entidad contratante IDRD por medio de correo electronico.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Durante la semana evaluada no se registró avance físico en la ejecución de redes eléctricas y de comunicaciones. Las actividades se concentraron en: • Revisión técnica de la localización de cajas de paso. • Ajustes de coordinación espacial con la estructura de concreto para evitar interferencias futuras
Componente Hidraulico: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-0034-2026 (19/01/2026) Rad. IDRD No 20262100023932.)
PENDIENTE. Teniendo en cuenta que se haria para el 2027 de acuerdo a las cotizaciones remitidas de VANTI.
2) Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025))
PENDIENTE. Conforme a lo determinado en el Comité Técnico No. 94 del 22 de enero de 2026, la postura oficial del IDRD es la unificación del tratamiento de lixiviados mediante una única planta compartida con el proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR), priorizando la sostenibilidad operativa de la entidad. Con el fin de materializar esta postura del IDRD, la Interventoría está finalizando la elaboración de un archivo técnico en formato .CAD, que pretende unificar la planimetría de ambos proyectos, señalando los posibles puntos de inicio en el Velódromo, el punto de entrega en la futura PTAR del CAR y una propuesta esquemática de trazado preliminar para una red de impulsión. Este archivo se entregará al contratista para que sirva de base en el desarrollo de la alternativa.
3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.
PENDIENTE.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
El componente hidrosanitario presenta avance general asociado a la ejecución de redes embebidas en estructuras ya construidas y a la coordinación técnica con los frentes de obra civil. Las actividades ejecutadas se concentran en: • Instalación y preparación de redes hidráulicas en zonas estructuralmente habilitadas. • Articulación técnica con el avance de cimentaciones y muros para evitar reprocesos.
Se informa la radicación de la solicitud certificación disponibilidad de servicio Vanti – VELODROMO GIBRALTAR No Dad. No 007378-2026 del 03/02/2026.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Compromisos descritos y patados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO	UTMP-CIG	Según documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
La supervision recomienda a la Interventoria la respuesta de los comunicados pendientes teniendo en cuenta los compromisos entre las partes.				

Siendo las __10:30 am___ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N-A	N-A
NOMBRE	Arq. Rubén Darío Crespo	NOMBRE	N-A	N-A
CARGO	Director de interventoría	CARGO	N-A	N-A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Torres Residente de Interventoria	Arturo Rojas T.

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
5/02/2026 8:22:17	Javier sanchez	1014177632	Javier.sanchez@idrd.gov.co	Apoyo técnico a la super	IDRD	3014394635
5/02/2026 8:22:21	Juan Pablo Villate Diaz	1019010837	Juan.villate@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD	3197021334
5/02/2026 8:22:51	James Otalvaro	75091421	james.otalvaro@ehidrogeologicos.com	Hidrogeólogo	CIG	3117972537
5/02/2026 8:22:55	JULIAN RICARDO AGUDELO	80767393	julianagudeloingeniero@gmail.com	Residente Ambiental	CIG	3202336372
5/02/2026 8:23:07	Francy Murillo	52968323	francy.murillo@idrd.gov.co	Apoyo a la Supervision	IDRD	3043808785
5/02/2026 8:23:28	CARLOS H. CASTRO	79340835	carlosh.castro@idrd.gov.co	Ingeniero Contratista STC	IDRD	3107542732
5/02/2026 8:23:28	Edgar Solórzano Medina	19222971	corint.carvel.2@gmail.com	Coordinador Técnico de I	Consorcio Interventores	3124326589
5/02/2026 8:23:42	Sara Eulalia Chaparro G	1057581903	sarageology19@gmail.com	hidrogeologa	UTMP	3204386100
5/02/2026 8:23:49	Tatiana Ortegon	1018487557	Ltortegonpinilla@gmail.com	Ingeniera ambiental - IDR	IDRD	3138646385
5/02/2026 8:24:09	Edwin Escobar	94487629	edwin.escobar@idrd.gov.co	Apoyo tecnico STC	IDRD	3116058975
5/02/2026 8:26:34	JAIRO PARRA REYES	1143829208	jairo.parra@idrd.gov.co	Asesor STC	idrd	3052150830
5/02/2026 8:29:00	Mary Luz Ramírez Carvajal	52494809	ramirezmalu09@gmail.com	Profesional social	Interventoría	3132205175
5/02/2026 8:31:04	RUBEN DARIO CRESPO B	19496690	directora.consorciointervg@gmail.com	DIRECTOR INTERVENTOI	CONSORCIO INTERVENT	3103231119
5/02/2026 8:31:59	JHON FREDY ESPITIA BERN	80794111	jhon.espitia@idrd.gov.co	Contratista IDRD	IDRD - STC	3118103338
5/02/2026 8:32:43	Carmen Lucía Vélez Cárden	65777928	carmen.velez@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión c	Instituto Distrital de Recr	3204054770
5/02/2026 8:33:50	Jaime Andrés Cañón Vergar	80096733	jaime.canon@idrd.gov.co	Contratista	IDRD	3164116578
5/02/2026 8:33:56	JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS	79685757	JCLAVIJO@CYG.COM.CO	REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL METI	3153336978
5/02/2026 8:34:32	Lina Johanna Falla Lozano	52517090	lina.falla@idrd.gov.co	Apoyo supervisión Ambi	IDRD	3103143272
5/02/2026 8:39:38	ALFONSO PEÑARANDA SU	88235391	a.penaranda@cyg.com.co	DIRECTOR DEL PROYECT	UTMP	3008620623
5/02/2026 8:41:14	LUZ STELLA RODRIGUEZ	31432956	sst2.velodromo@cyg.com.co	Residente SG-SST	UTMP	3214693331
5/02/2026 8:46:22	Diana Marcela Ortiz	1014212007	Social.velodromo@cyg.com.co	Residente social	UTMP	3153935487
5/02/2026 8:46:26	Astrid Viviana Rojas Cangrej	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Profesional Gestión de R	Consorcio Interventores	3157994502
5/02/2026 8:46:57	Lindy Rubiano Moyano	1051954740	interventoria.sgsstvelodromo@gmail.com	Residente SGSST Interve	Consorcio Interventores	3202548911
5/02/2026 8:49:08	Diego Alejandro León Bello	1075652081	estructural.gibraltar1@gmail.com	Ingeniero Estructural	C.I.G	3165293927
5/02/2026 8:50:46	Bibiana Paola Sosa Linares	522996077	bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión S	IDRD	3134649125

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
5/02/2026 8:50:53	Samer Arias Sepúlveda	79627749	elecgibraltar@yahoo.com	Profesional en instalacio	Consorcio Interventoría (	202979450
5/02/2026 8:52:38	Daniela Prieto Rodriguez	1018490798	Daniela.prieto@idrd.gov.co	Apoyo presupuestal STC	IDRD	3022922354
5/02/2026 8:55:42	Cesar Fernandez Soler	80109419	contingencias.velodromo@ceroimpacto.com	Profesional ambiental de	UTMP	3002662060
5/02/2026 9:10:10	Andrés Galeano González	1022362548	presupuestosintergibraltar2@gmail.com	Residente de presupuest	CIG	3192385243
5/02/2026 9:12:11	Arturo Rojas Torres	13873937	interventoria.velodromo@gmail.com	Residente	CIG	3166420036
5/02/2026 9:24:22	Ivonn Pérez Téllez	1026279000	ivonn.perez@idrd.gov.co	Apoyo supervisión	IDRD	3223578250
5/02/2026 9:26:22	Andres Lengua	1065002731	profesionalvelhidraulico@gmail.com	PROFESIONAL HS-RCI	CONSORCIO INTERVENT	3106684608
5/02/2026 9:26:36	Ivonne Aguilar	1013601022	ivonne.aguilar@idrd.gov.co	Apoyo Transversal	IDRD-STC	3114002656
5/02/2026 9:27:13	Oscar Javier Sora Ortega	80761720	oscar.sora@idrd.gov.co	Apoyo Hidrosanitario STC	IDRD	3003101408
5/02/2026 9:42:57	Paula Blanco	1073383630	ambiental.velodromo@cyg.com.co	Residente ambiental	UTMP	3024219947
5/02/2026 9:51:12	CARLOS EDUARDO GUZMAI	79617588	residente1.velodromo@cyg.com.co	Residente Técnico	UTMP	3108685944

121



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Ejecución de actas de vecindad en zonas según posible ampliación de Parqueaderos verificar (*)	UTMP	Sin fecha	-
Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD	UTMP- CIG	09/02/2026	VIGENTE

(*) NOTA: dada la definición de intervención de la zona de parqueaderos verificar si habrá alguna posible afectación para el asentamiento actual del habitante de calle y los caninos.

Actividades ejecutadas por el componente social

INFORME MENSUAL No. 24

FECHA	ACTIVIDAD
29 de enero del 2026	Se remite informe mensual del componente social mediante el radicado CE-206-125-2184.
	Se reciben observaciones mediante lista de chequeo por parte de la interventoría mediante el radicado CIG-IDRD-VEL-0061-2026
	Se realiza mesa de trabajo de revisión
	La firma contratista emite el informe con la atención a las recomendaciones. Mediante el oficio CE-206-125-2189
	Interventoría **aprueba** el informe mediante el numero de radicado CIG-IDRD-VEL-0064-2026



Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

RELACIÓN PERSONAL – ENERO 2026

HISTÓRICO								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	535	41	46	10	14	0	60	475

REPORTE MENSUAL (Corte 25 de enero)								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	146	24	24	1	12	0	48	98

ACTA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 22

El día lunes 26 de enero del 2026 se emite el acta para revisión de la interventoría


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**

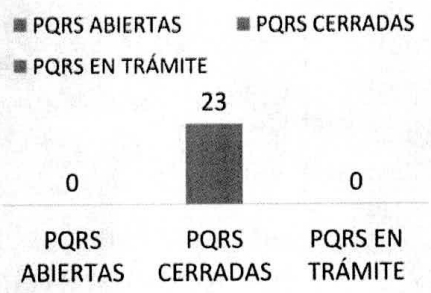

El día lunes 26 de enero del 2026 se recibe tutela, la cual fue respondida por el área ambiental, SST y el área jurídica y notificada a interventoría mediante radicado CE-206-125-2180

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (*)	CIG	29/01/2026	PENDIENTE
Propuesta de manejo de ZONAS VERDES (Oficio Obra No CE-206-125-2164 del 21/01/2026) respuesta CIG y/o traslado IDRD (**)	CIG	29/01/2026	PENDIENTE

(*) Oficio de Obra No CE-206-125-2163 (21/06/2025)

(**) Oficio de Obra No CE-206-125-2164 (21/06/2026)

COMPONENTE AMBIENTAL



Capacitación: Determinantes Ambientales (30/01/2026)



Protección de materiales




Mantenimiento de sumideros



Mantenimiento de árboles



Lavado de cárcamo y sedimentador

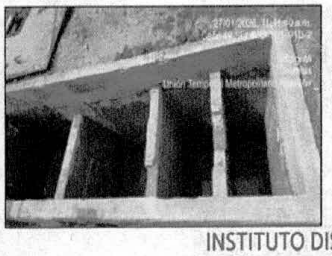

lavado de llantas

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.710.319**	**85,51%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.624.059**	**86,30%**

LIXIVIADOS	27.310 kg

Retiro de 7 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,82%
Circularidad: 19,33%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE
Verificación y reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo/Manejo de Desastres
Escenarios de Riesgo ER07-ER14/ PDCA – Ficha 3

BOGOTÁ



Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)

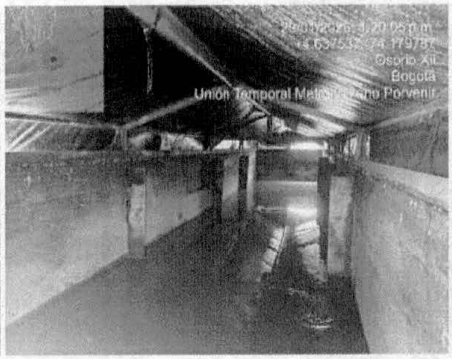

Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención



Retiro de lixiviados

Activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank, para su transporte y disposición final el 29/01/2026 (27.310 kg)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ



Monitoreo de Precipitación in situ

Verificación de precipitación acumulada diariamente mediante pluviómetro instalado en obra

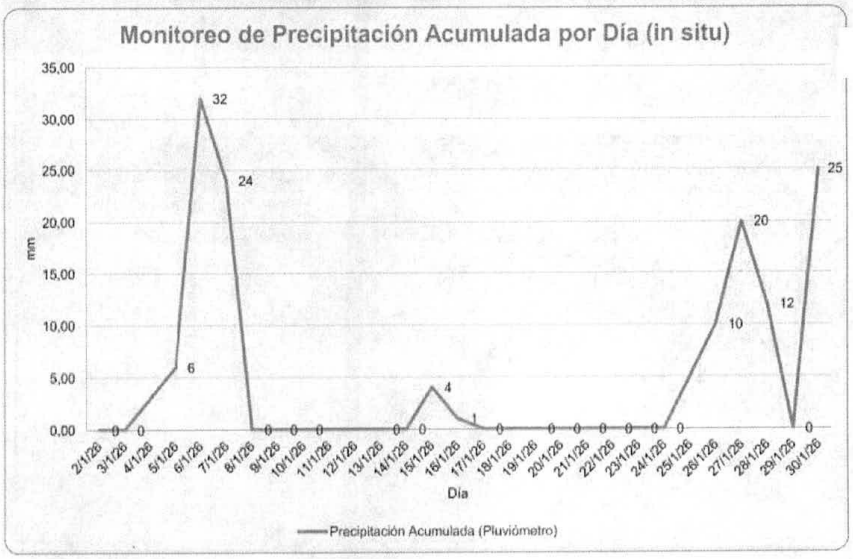


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER07
Reducción del riesgo ER07-ER09-ER14



Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra

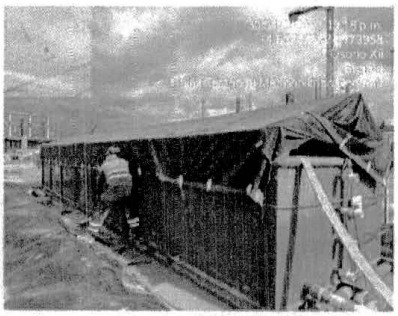

Dique de contención perimetral de Catch Tank

Mantenimiento de dique de contención perimetral, evacuando agua lluvia empozada




Cerramiento y señalización de zona de contención de lixiviados

Acopio de isotanques y catch tank

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13
Reducción del Riesgo ER09-ER10-ER15

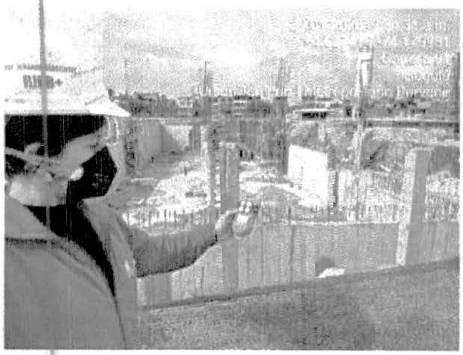


Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)



Inspección de vehículos

Inspección de vehículo carro cisterna, dispuesto para transporte y disposición final de lixiviados

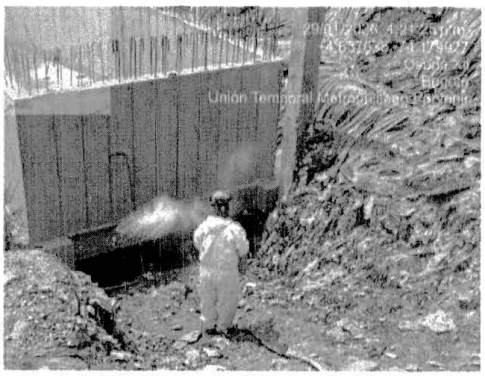

Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE SST

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Subsanación de observaciones efectuadas durante recorrido preliminar a comité de Obra No 96. (05/02/2026)	UTMP-CIG	12-06-2026	CUMPLIDO
Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Humana	UTMP-CIG	12-06-2026	Pendiente

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


PROMEDIO PERSONAL


REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	**PROMEDIO 26/01/26 - 01/02/26**
PROFESIONALES	26
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	3
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	24
AYUDANTES	31
HERREROS	11
OPERADORES	9
BACHEROS	2
CONDUCTORES	1
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**118**

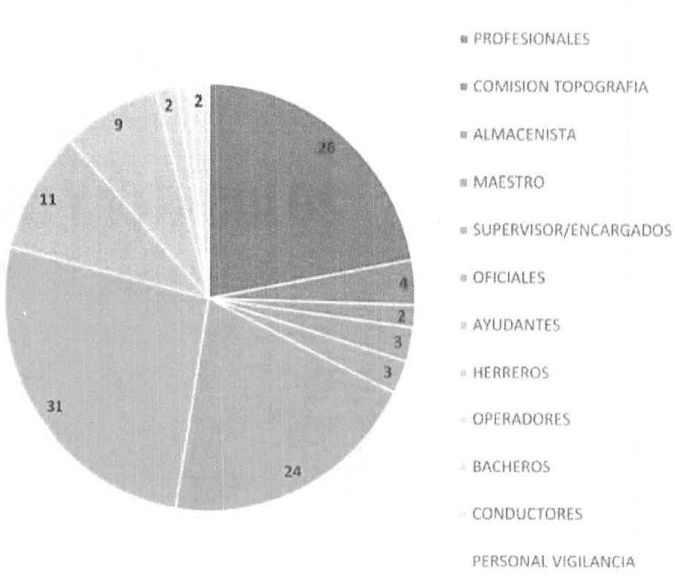

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

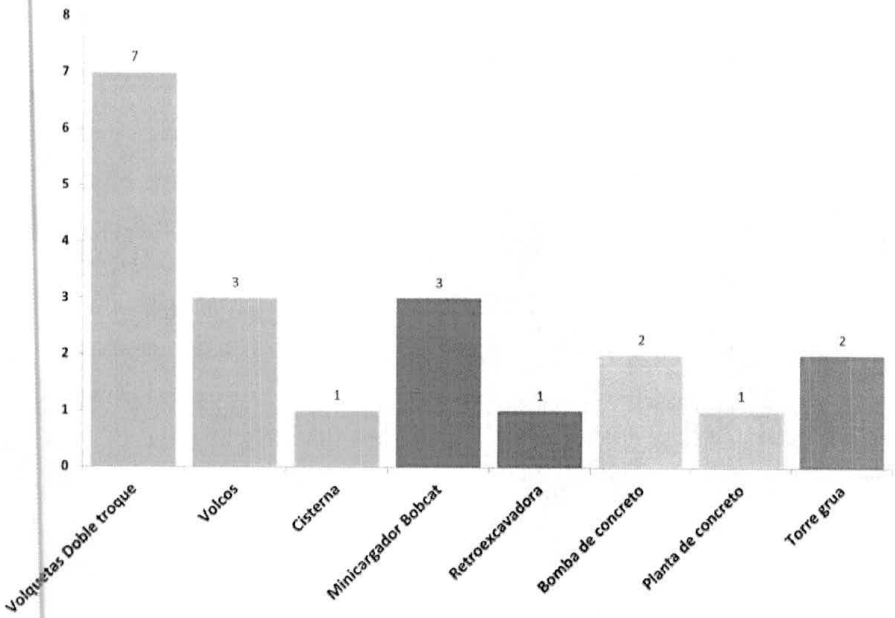



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

BOGOTÁ

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	CERRADO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	ABIERTOS
ene-26	0	N/A
TOTAL ACCIDENTES	8	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
ene-26	6
TOTAL AUSENTISTAS	62

NOTA: **A la fecha se cuenta con 4 accidentes cerrados y 4 abiertos**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST


BOGOTÁ

Charlas en frente de obra





Induccion al personal

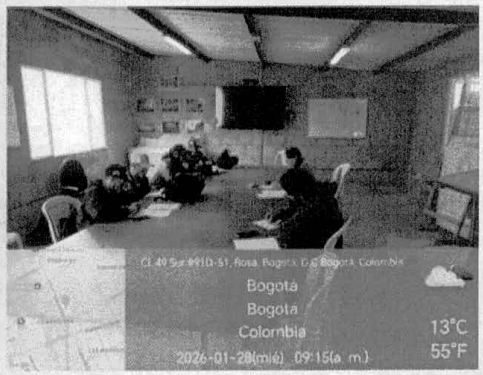


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Pausas activas

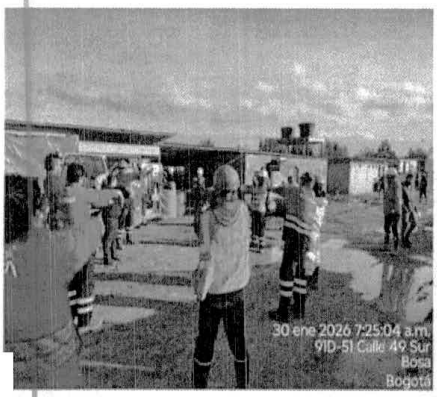



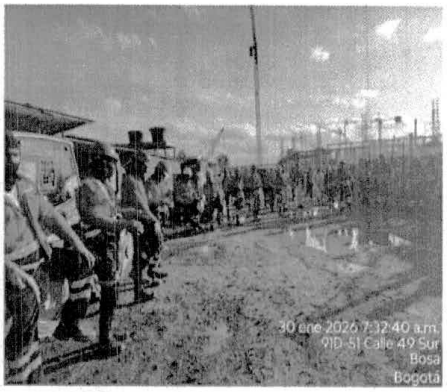



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion actividades en alturas

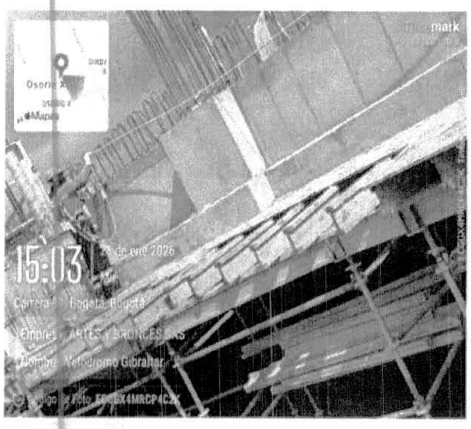

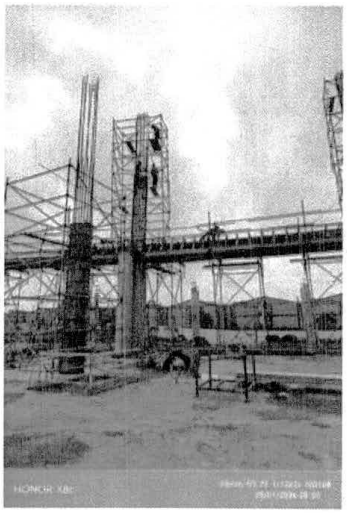

Inspeccion actividades en excavaciones



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Aseo unidades sanitarias





Inspeccion uso de dotacion y EPP en frente de obra



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Niveladores sin soporte




HALLAZGO



ACCION CORRECTIVA

Personal sin Tyvek compactando con el talud expuesto

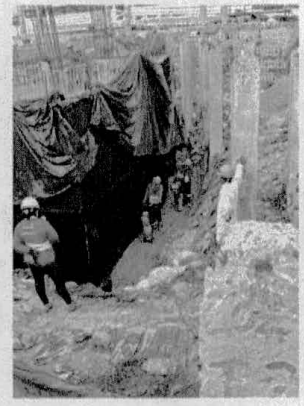

HALLAZGO




ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Personal sin línea de vida

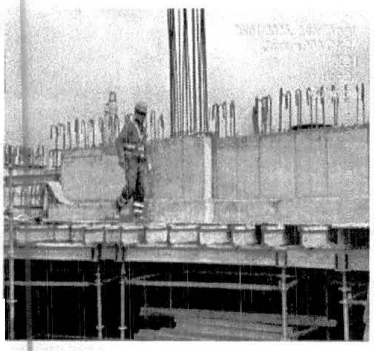


HALLAZGO

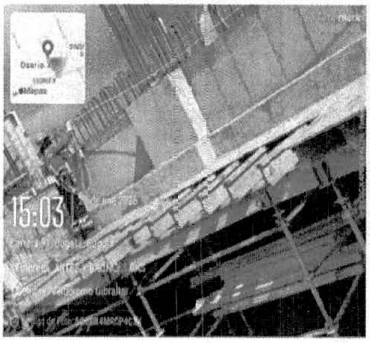


ACCION CORRECTIVA

Solicitud retiro de formaleta

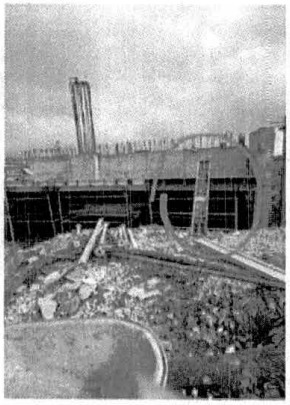

HALLAZGO

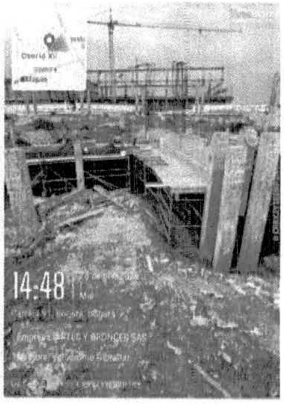

ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente
De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad – anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar - (*)	UTMP	13/01/2026	Pendiente
Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (**) Revisión por parte de la Interventoría CIG	CIG	26/12/2025	Pendiente
Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD. (***)	CIG	20/01/2025	Pendiente


(*) Rad. CIG No CIG-IDRD-VEL-21-2026 del 13/01/2026 Y Alcance CIG-IDRD-VEL-42-2026 del 04/02/2026

(**) Rad. IDRD No 20264200013601 del 20/01/2025 Oficio Contratista de obra No CE-206-125-2150 del 13/01/2026

(***) Rad. IDRD No 20262100054772 02/02/2026 Hoja de vida Prof. Calidad Interventoría.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2712,08 m3

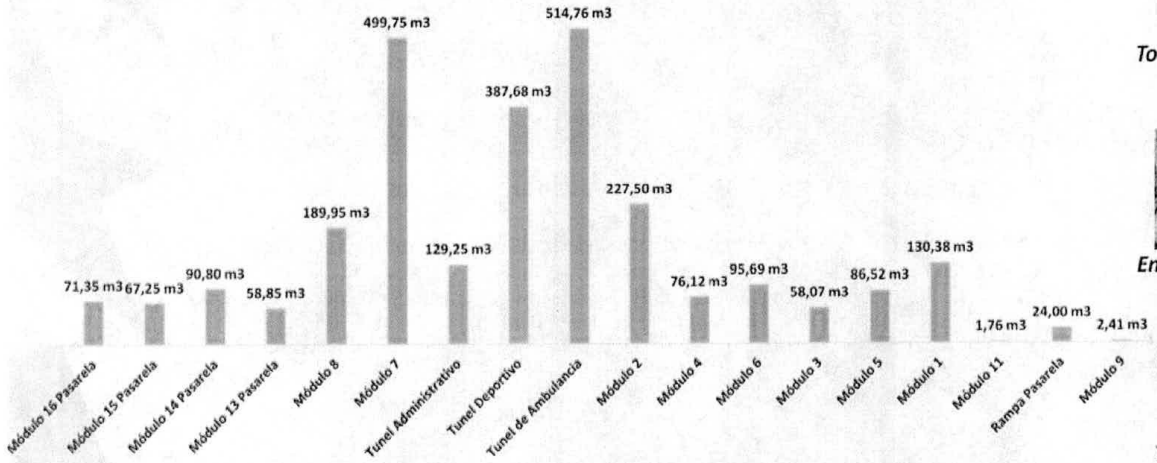

TOTAL SEMANA DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026.

Concreto Estructural: *123,44* m3 **Muros** (Túnel de Ambulancia y Túnel Deportivo) **Columnas** (Módulo 1, Módulo 2, Módulo 4, Módulo 6 y Módulo 7 y Túnel de Ambulancia) y **Placa** (Módulo 5) y **Viga Aérea** (Módulo 1 en Módulo 7)

CEMEX **0 m3** *0%* ALTARA **123,44 m3** *100%*

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana
123,44 m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396




Toma de Muestras de Concreto NTC 673



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **540,99 Ton**

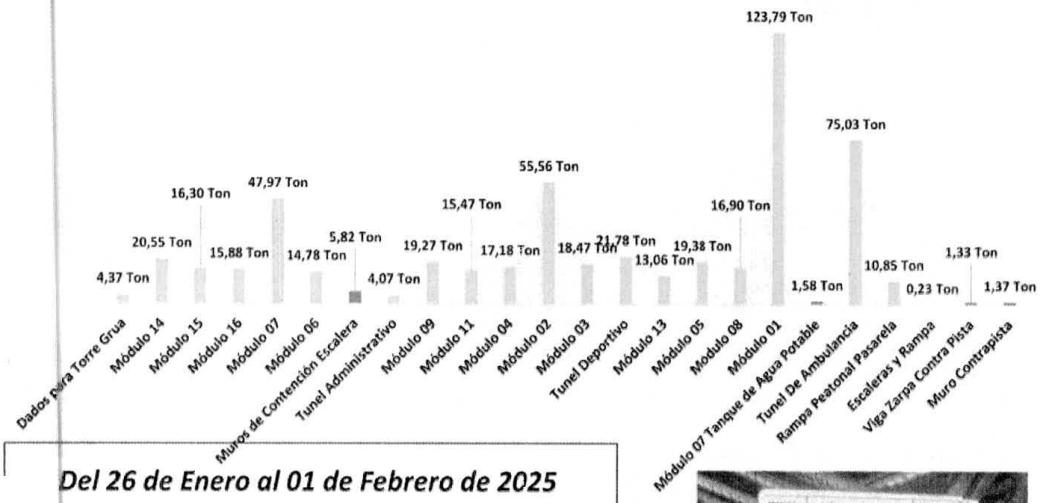

Del 26 de Enero al 01 de Febrero de 2025


*Se ingresaron **19,95 ton** para*
Muros Contrapista y Puntales y Vigas Túnel de Ambulancia



BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					28 Unds		**Total**	250,84 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA





Elementos Ingresados del 26 al 01 de febrero de 2026:

2 Unds para 19,96 TON

TOTAL : 250,84 TON.

BOGOTÁ







INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UBICACIÓN DE SECCIONES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

Sección (tipo)	Cantidad (Unds)
CHP1	2 unds
CHP2	2 unds
CHP3	5 unds
CHP4	5 unds
CHP5	2 unds
CHP6	2 unds
CHP7	5 unds
CHP8	3 unds
PVC1	1 unds
PVC2	1 unds
Total	28 unds

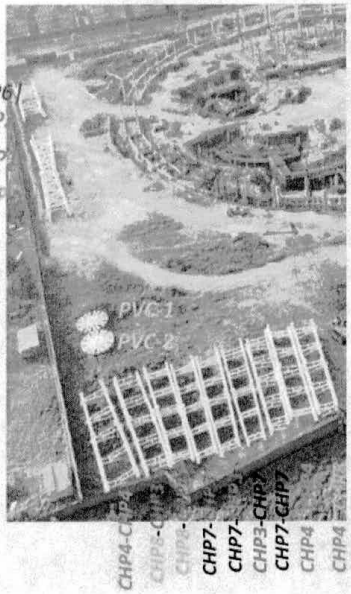

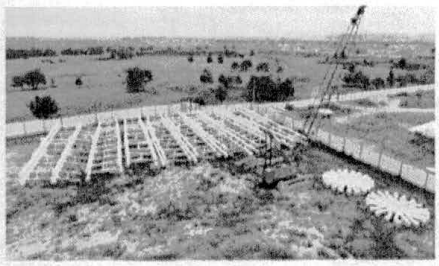

TOTAL

28 Unidades

para

250,84 Ton

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-2036 mediante CIG-IDRD-VEL-0020-2026 del 13 de enero de 2026	Contratista
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 22 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
		Pista Velodromo	Pendiente	Se radicó oficio CE-206-125-2188 del 28 de enero de 2026	Interventoria
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado
10	Mecánico	**Ascensores**	Pendiente	Se radicó oficio CE-206-125-2176 del 27 de enero de 2026	Interventoria

INSTITUTO DI
RECREACIÓN Y DEPO

MATERIAL DE LLENO PARA LOS TRASDÓS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN

BOGOTÁ

- ✓ Mediante oficio **CIG-IDRD-VEL-0039-2026** del 22 de enero de 2026 se aprobó la caracterización para el material de lleno de los trasdós de los muros de contención que conforman los túneles del proyecto.

No	ENSAYO	REQUISITO	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
1	Desgaste de la máquina de los Angeles	< 50%	38%	OK
2	Degradación en el Equipo de Micro Deval	< 45%	25%	OK
3	Límites Líquido	< 30%	0%	OK
4	Indice de Plasticidad	< 6%	NP	OK
5	Equivalente de Arena	>20%	22%	OK
6	Contenido de Terrones de Arcillas y Partículas Deleznable	< 2%	0,6%	OK

Trasdos Túnel Administrativo

Material Granular Tipo PEA	285,00 m3

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026. (*) Revisión y respuesta CIG – remitido a la entidad contratante vía Email 29/01/2026.	CIG	22/01/2025	PENDIENTE


(*) Oficio de Obra No CE-206-125-2188 del 28/01/2026,


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


AVANCE GENERAL


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.309,397	2.878,500	34.64 %
Área total (m2)	**Área total fundida (m2)**	**% Avance**
25.186,48	6.663,97	26.46 %
Longitud total (m)	**Longitud total fundida (m)**	**% Avance**
20.458,84	6.158,50	30.10 %

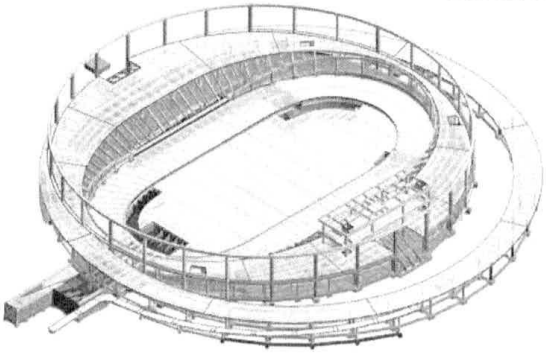


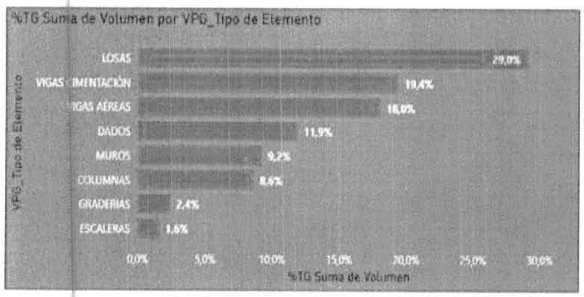









INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	317,013	42.03 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	(En blanco)

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	651,02	41.97 %

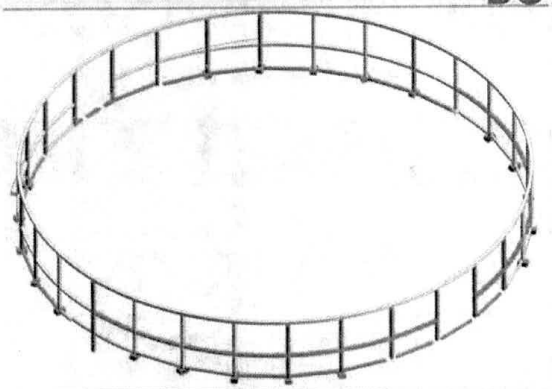

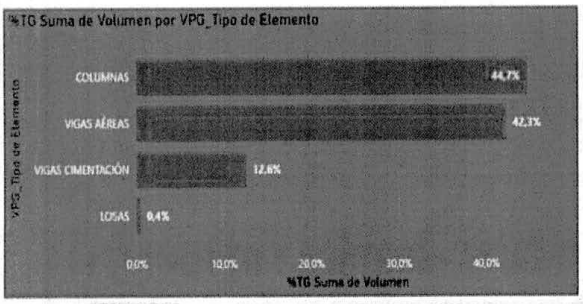


Tipo Elemento
- COLUMNAS
- LOSAS
- VIGAS AÉREAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 11/11/25
- 22/11/25
- 26/11/25
- 12/12/25
- 13/12/25
- 16/12/25
- 17/12/25
- 18/12/25

Ubicación
- Gradería
- Módulo 01
- Módulo 02
- Módulo 03
- Módulo 04
- Módulo 05
- Módulo 06
- Módulo 07
- Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 2


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
842,755	467,554	55.48 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.919,30	1.342,23	45.98 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.912,30	941,10	49.21 %

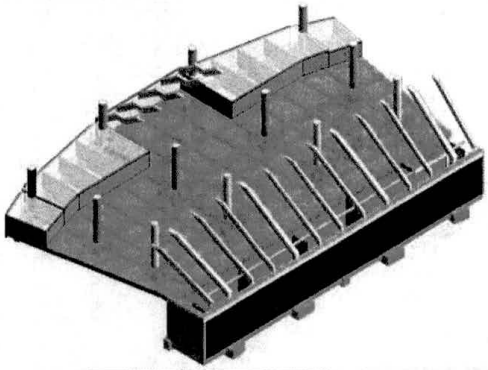

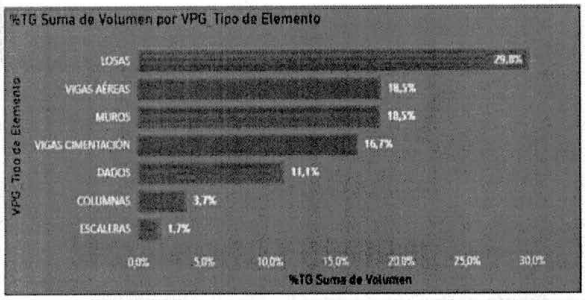


Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- ESCALERAS
- LOSAS
- MUROS
- VIGAS AÉREAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 9/01/25
- 11/11/25
- 13/11/25
- 20/11/25
- 28/11/25
- 5/12/25
- 6/12/25
- 9/12/25

Ubicación
- Gradería
- Módulo 01
- Módulo 02
- Módulo 03
- Módulo 04
- Módulo 05
- Módulo 06
- Módulo 07
- Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 4


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
265,440	97,635	36.78 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
860,39	311,24	36.17 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
868,91	273,03	31.42 %

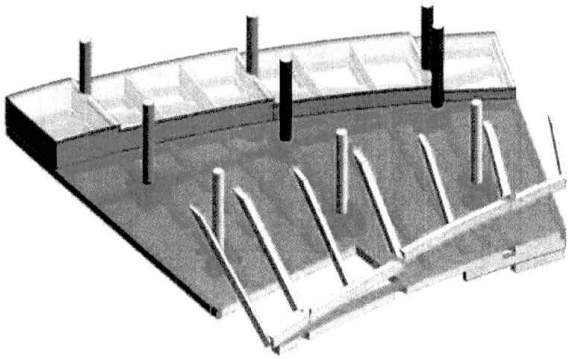

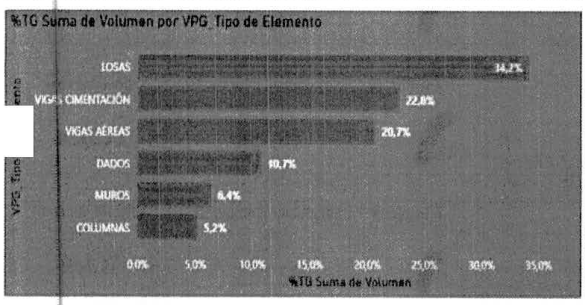


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 19/11/25
☐ 22/11/25
☐ 17/12/25
☐ 23/12/25
☐ 15/01/26
☐ 28/01/26
☐ 29/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
■ Módulo 04
☐ Módulo 05
☐ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 5


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
323,012	102,029	31.59 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
836,86	327,25	39.10 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
951,17	252,58	26.55 %



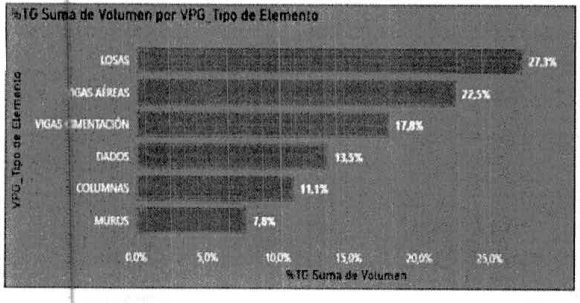


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 6/12/25
☐ 9/12/25
☐ 13/12/25
☐ 16/12/25
☐ 24/12/25
☐ 30/12/25
☐ 10/01/26
☐ 13/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
■ Módulo 05
☐ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 6


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
318,075	104,663	32.91 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
839,01	277,38	33.06 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.058,64	264,74	25.01 %

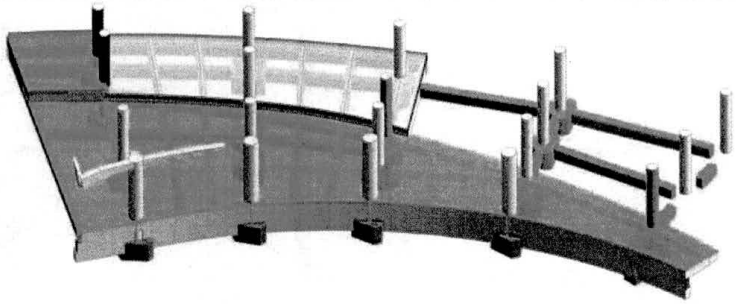

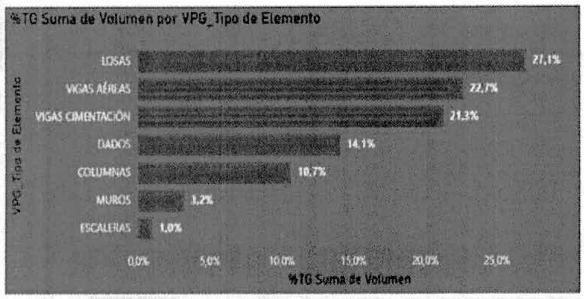


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 15/11/25
☐ 19/11/25
☐ 22/11/25
☐ 24/11/25
☐ 17/12/25
☐ 29/12/25
☐ 31/12/25
☐ 5/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
■ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	435,703	48.45 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	40.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.494,50	971,40	38.94 %

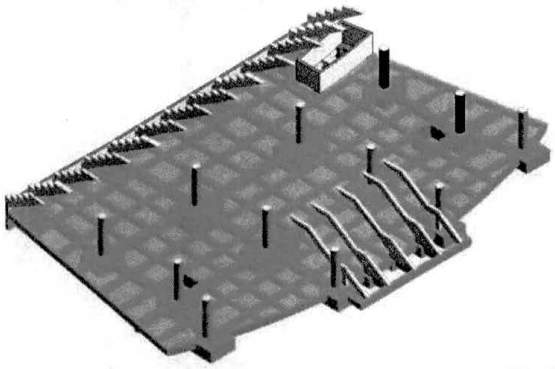

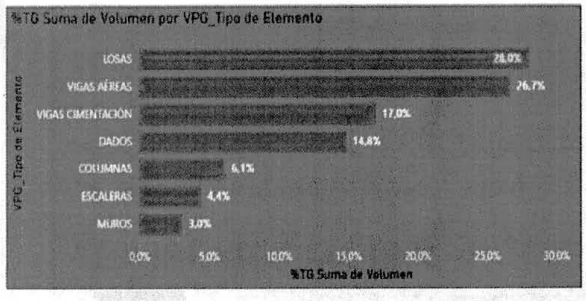


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ ESCALERAS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 20/11/25
☐ 22/11/25
☐ 25/11/25
☐ 26/11/25
☐ 3/12/25
☐ 10/12/25
☐ 12/12/25
☐ 15/12/25

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
☐ Módulo 05
☐ Módulo 06
■ Módulo 07
☐ Módulo 08

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 12


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
191,718	8,558	0.00 % 4.46 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
559,51	--	0.00 % (En blanco) 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
600,72	30,87	0.00 % 5.14 % 100.00 %

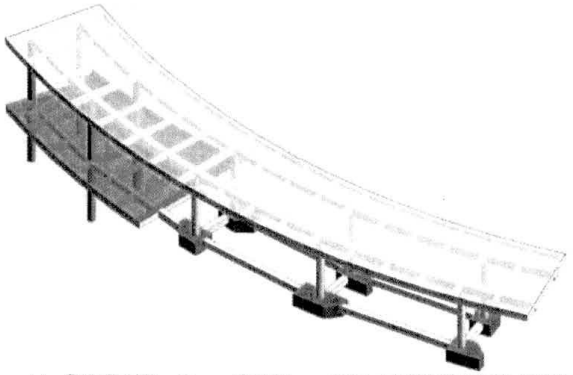

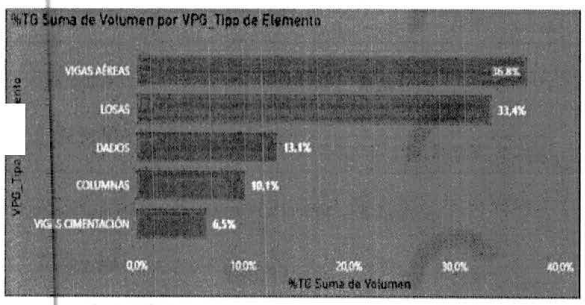

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	(En blanco)	Módulo 08
DADOS	23/01/26	Módulo 09
LOSAS	30/01/26	Módulo 10
VIGAS AÉREAS		Módulo 11
VIGAS CIMENTACI...		Módulo 12 - Pas...
		Módulo 13 - Pas...
		Módulo 14 - Pas...
		Módulo 15 - Pas...
		Módulo 16 - Pas...

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
628,937	485,431	0.00 % 77.18 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.529,70	1.465,23	0.00 % 57.92 % 100.00 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.033,98	818,53	0.00 % 79.16 % 100.00 %

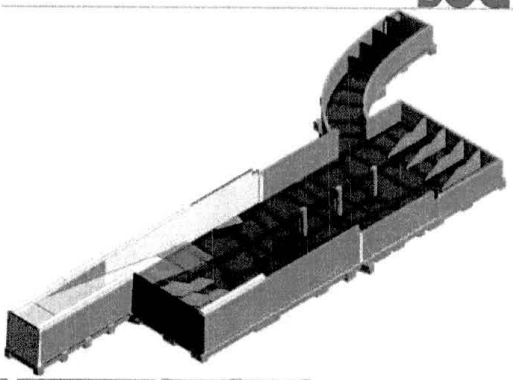

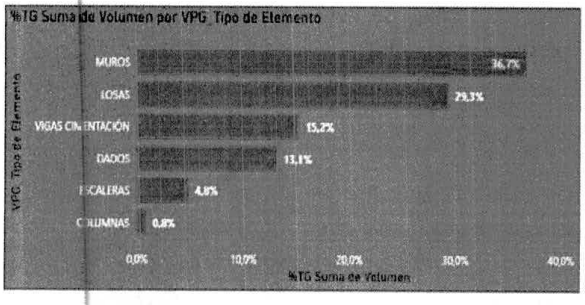

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	(En blanco)	Módulo 14 - Pas...
DADOS	20/11/25	Módulo 15 - Pas...
ESCALERAS	28/11/25	Módulo 16 - Pas...
LOSAS	16/12/25	Pista
MUROS	29/12/25	Rampa Peatonal
RAMPAS	2/01/26	Torre grúa
VIGAS CIMENTACI...	6/01/26	Tunel Administra...
	7/01/26	Túnel de Ambula...
	13/01/26	Túnel Deportivo

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – COMPONENTE HIDROSANITARIO

AVANCE GENERAL

BOGOTÁ

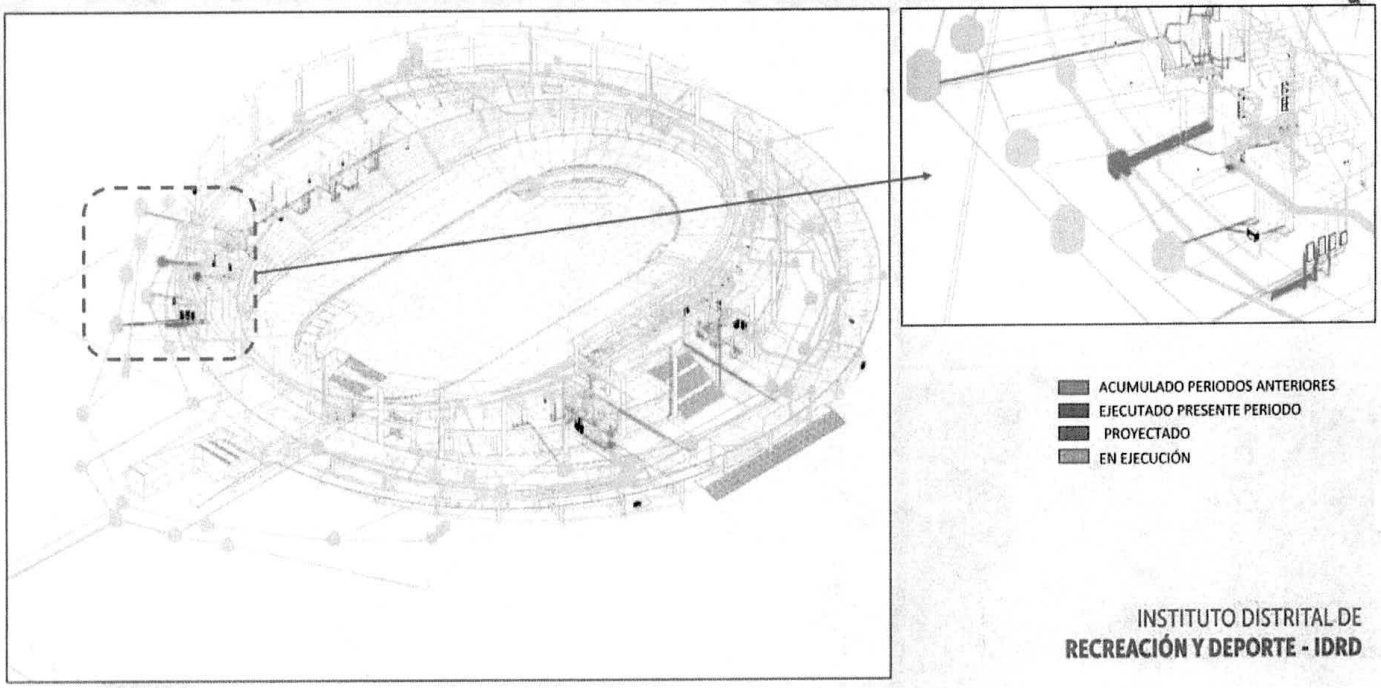


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D

PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A 28 DE FEBRERO DE 2026

BOGOTÁ

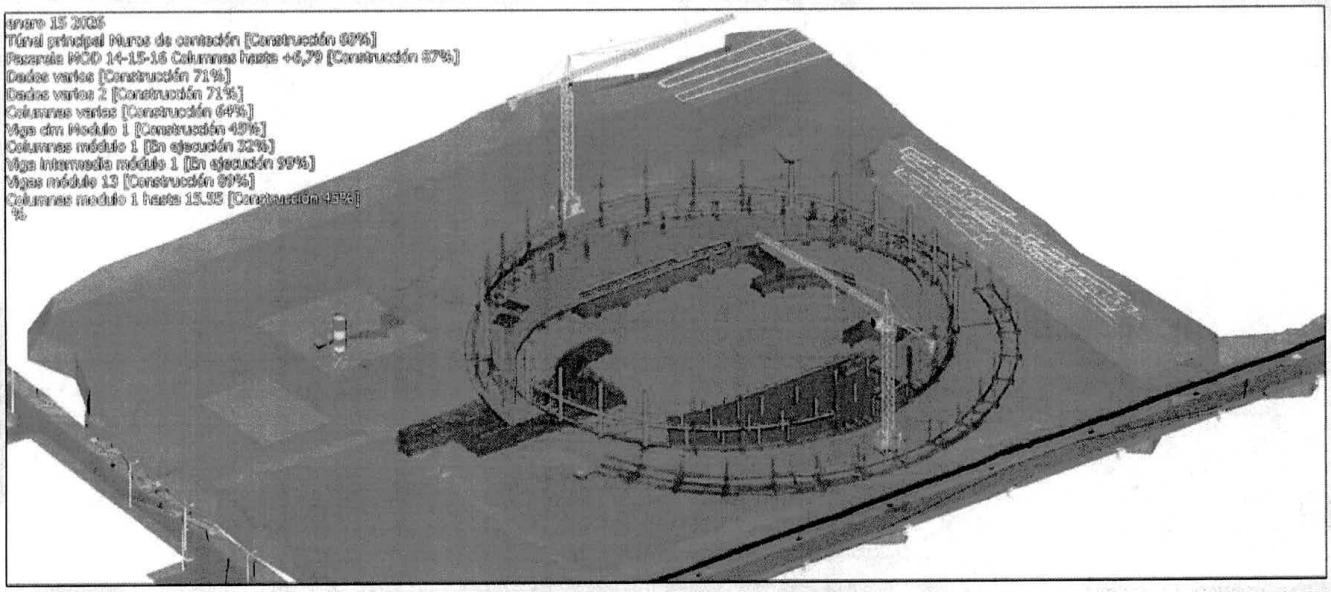

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SI PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. (*)	UTMP	15/01/2026	PENDIENTE
Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (**)	UTMP	22/01/2026	Pendiente
Remisión de borrador de modificatorio No 3 Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD (**)	UTMP – CIG - IDRD	28/11/2025	CUMPLIDO
Remisión de borrador de modificatorio No 3 Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador por parte de interventoría CIG el 04/02/2026			
Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(***) Pendiente Respuesta IDRD.	UTMP – CIG - IDRD	16/01/2025	PENDIENTE

(*) Para el Modificatorio No 3 UTMP Oficios de Obra No CE-206-126- 2196 (Concretos) 2190 (Eléctricos) 2198 (Cubierta) 2186 (Hidráulicos) 2202 (Insumos) .

(**) Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link

(*** Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORMES INTERVENTORIA


BOGOTÁ


		INFORMES TÉCNICOS DE INTERVENTORIA													
e_No	Fecha Rad. IDRD	Técnico	Fecha	Fauna	Fecha	Forestal	Fecha	SST	Fecha	Social	Fecha	Ambiental	Fecha	Calidad	Fecha
18	12/08/2025	Obs. IDRD	2/02/2026	OK	20/01/2025	OK	15/12/2025	OK	27/12/2025	OK	26/08/2025	OK	26/12/2025	Obs. IDRD	31/12/2025
19	10/09/2025	PR-IDRD		OK	20/01/2026	OK	24/12/2025	OK	16/01/2026	OK	10/09/2025	OK	19/01/2026	PR-IDRD	
20	16/10/2025	PR-IDRD		Sub. CIG	14/01/2026	OK	27/01/2026	PR-IDRD		OK	7/01/2026	OK	22/01/2026	PR-IDRD	
21	11/11/2025	PR-IDRD		Obs. IDRD	19/01/2026	Sub. CIG	29/01/2026	PR-IDRD		OK	7/01/2026	Sub. CIG	30/01/2026	PR-IDRD	
22	12/12/2025	PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		OK	7/01/2026	PR-IDRD		PR-IDRD	
23		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		OK		PR-IDRD		PR-IDRD	
(*)		7/01/2026		15/01/2026		16/01/2026		16/01/2026		2/01/2026	Pre-Aprobado	15/01/2026		15/01/2026	
24						PR-IDRD				PR-IDRD	3/02/2026				
(*)						4/02/2026				29/01/2026					

PR-IDRD	Pendiente Revision IDRD
Obs. IDRD	Observaciones IDRD (Sin Atender CIG)
Sub. CIG	Subsanacion CIG
OK	Aprobado

(*) De acuerdo a lineamiento de la entidad contratante se inicia remision via correo electronico de los informes por Componente para revision PRELIMINAR antes de radicacion FORMAL.

Fecha: Corresponde a la fecha de Revision y/o Aprobacion por parte del IDRD



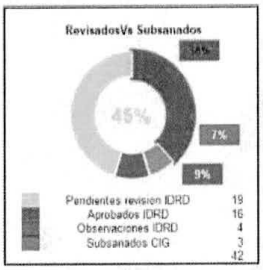

Mes	Desde	Hasta	No	Acta_Obra	Acta_Interventoria	Vr_Fasctura_Interventoria
jul-25	26/06/2025	25/07/2025	15	OK	PENDIENTE	$ 189.405.670,00
ago-25	26/07/2025	25/08/2025	16	OK	PENDIENTE	$ 11.096.625,00
sep-25	26/08/2025	25/09/2025	17	OK	PENDIENTE	$ 9.116.564,00
oct-25	26/09/2025	25/10/2025	18	OK	PENDIENTE	$ 47.440.544,00
nov-25	26/10/2025	25/11/2025	19	OK	PENDIENTE	$ 118.316.394,00
dic-25	26/11/2025	25/12/2025	20	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 59.987.253,00
			21	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 61.713.965,00
ene-26	26/12/2025	25/01/2026	22	PENDIENTE	PENDIENTE	$ 73.608.840,00
	Valor de Actas parciales de interventoria a presentar					$ 570.684.855,00

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


05/02/2026

REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 86.604.721.831	58,60%
% EJECUCIÓN	$ 78.546.551.319	53,15%
% COSTO	$ 78.546.551.319	53,15%

AVANCE	-5,45%

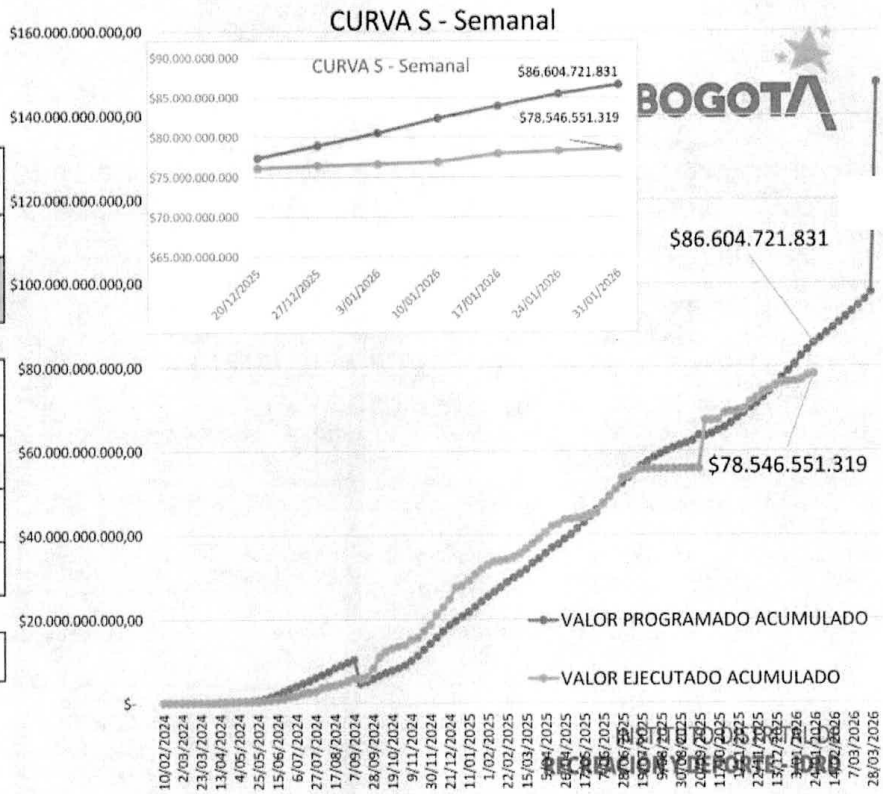

BOGOTÁ

31/01/2026 **programación v3**

RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE-001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE-011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE-012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE-013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE-014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE-015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE-016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681 163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE-018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE-019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE-020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE-021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE-022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 588.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
FE-025	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE-026	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO

MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

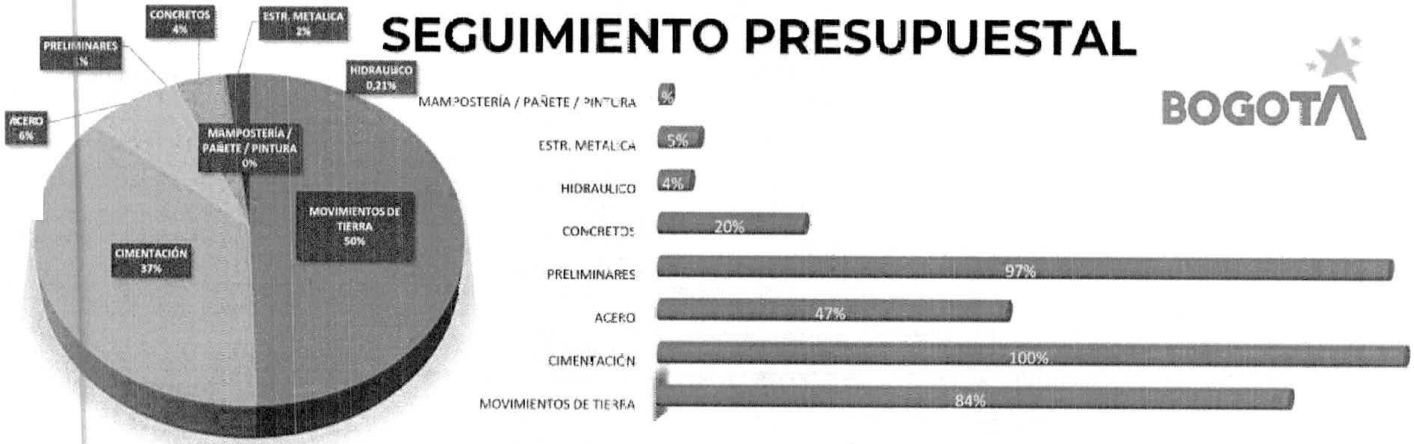

BOGOTÁ

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METALICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	**$ 61.010.761.815,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.868.397.139,00**	**$ 6.285.143.403,00**	**$ 72.523.644.111,00**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA
	IMPERMEABILIZACION MUROS DE CONTENCION CON IGOL IMPRIMANTE + IGOL DENSO O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, EQUIPOS, TRASIEGO, MANO DE OBRA).	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULOS 1, 2, 4, 5 Y 6	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 100 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	



RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (*) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP	UTMP-CIG-IDRD	Sin fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	27,09 Ton
ene-26	05 de Enero al 11 de Enero de 2026	11,33 Ton
ene-26	12 de Enero al 18 de Enero de 2026	9,15 Ton
ene-26	19 de Enero al 25 de Enero de 2026	10,57 Ton
ene-26	26 de Enero al 01 de Febrero de 2026	17,86 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	303,90 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***303,90 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **27,96%**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					28 Unds		**Total**	250,84 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA




Elementos Ingresados del 26 al 01 de febrero de 2026:

2 Unds para 19,96 TON

TOTAL : 250,84 TON.






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 25 al 27



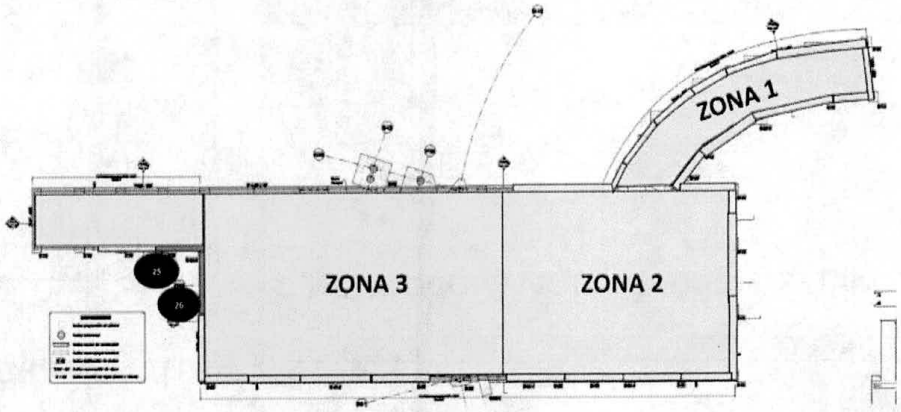


Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS TÚNEL DE AMBULANCIA

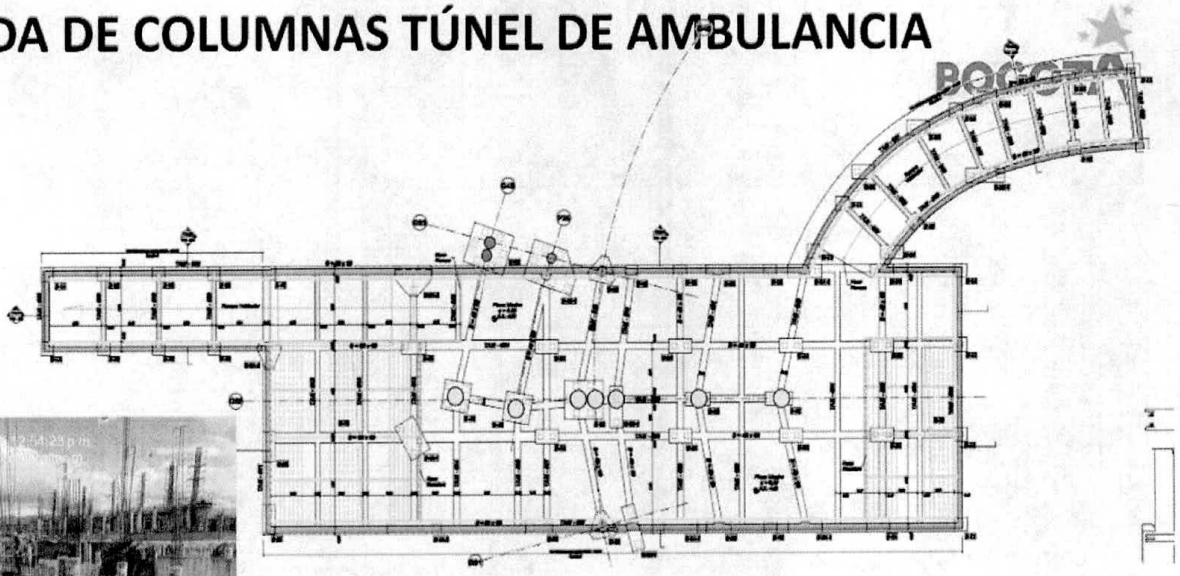




Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

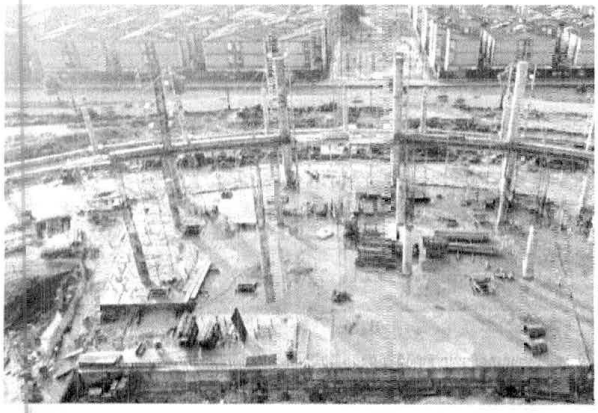

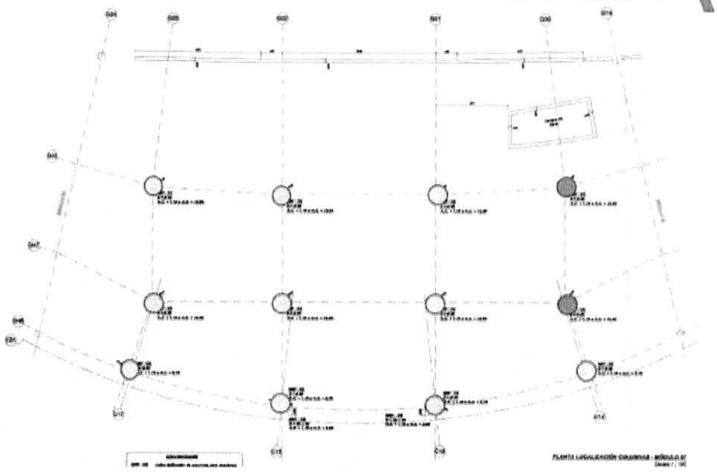

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08

INSTITUTO DISTRITAL DE **RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

FUNDIDA DE PLACA MÓDULO 5






Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE **RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**


FUNDIDA DE COLUMNA DE CUBIERTA MÓDULO 1

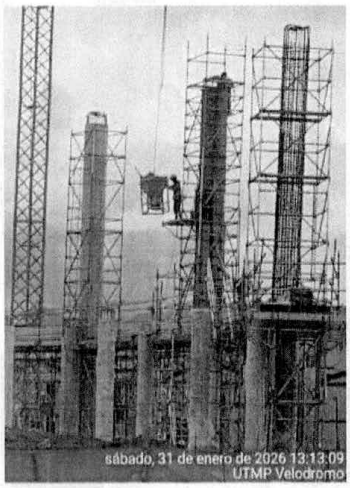

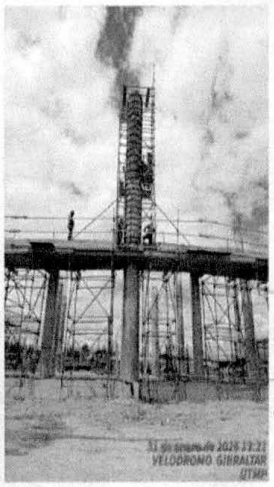

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

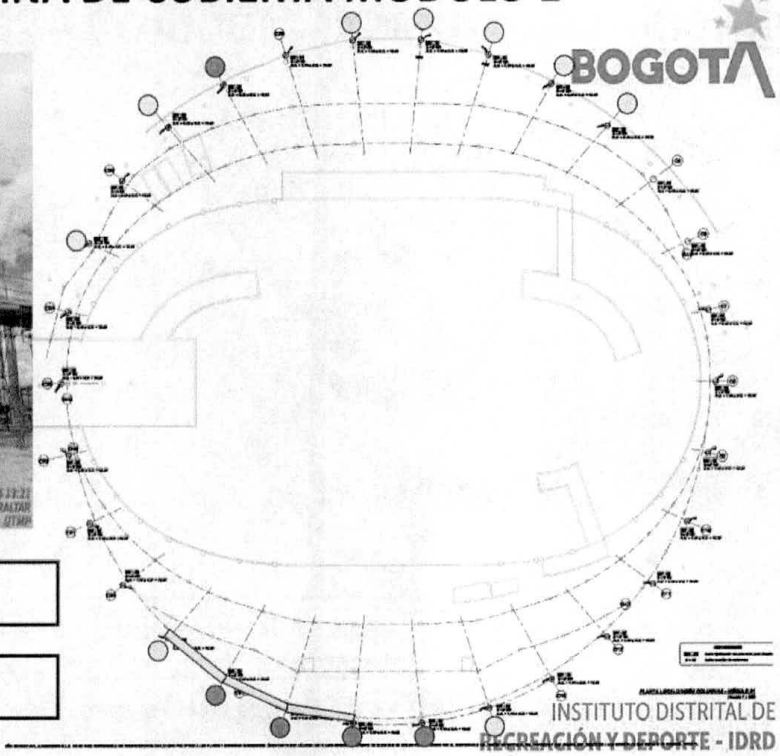


BOGOTÁ


INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS, VIGAS MÓDULO 6– ZONA DE EDIFICIO

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

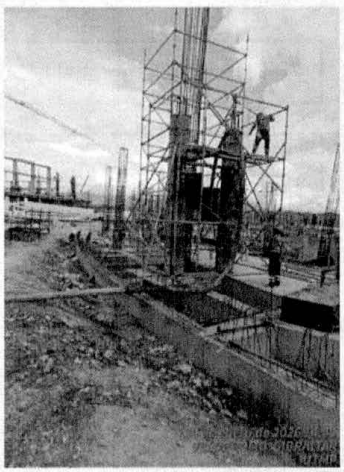

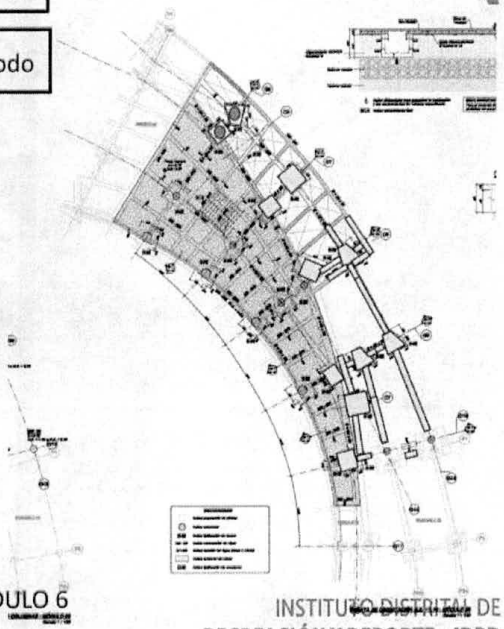


BOGOTÁ

PLANO M6-E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 6

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS– MÓDULO 4

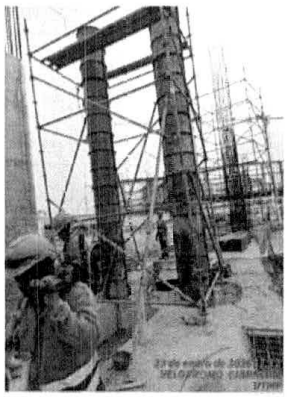

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo



PLANO M4 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 Y LOCALES – MÓDULO 04


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MURO TUNEL DEPORTIVO Y COLUMNA MÓDULO 2 ZONA DE EDIFICIO

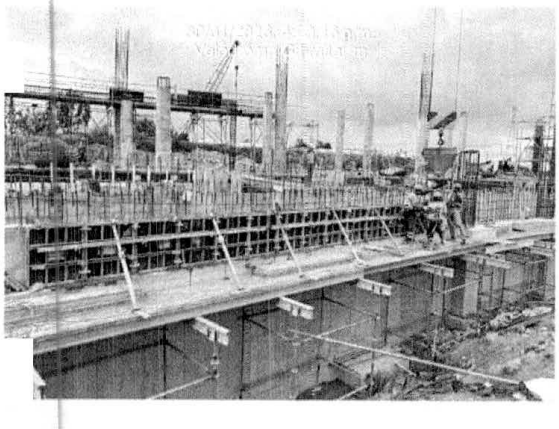

Zona Funcida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

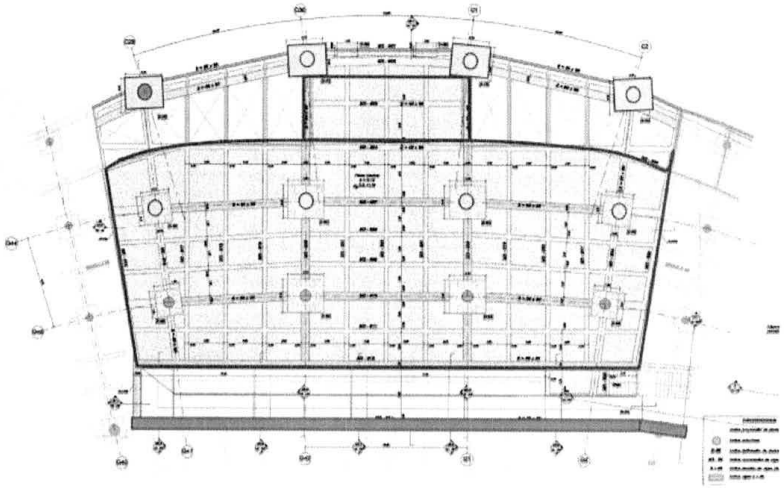


PLANO M2 – E02 PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLUMNA EN TUNEL ADMINISTRATIVO– ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ



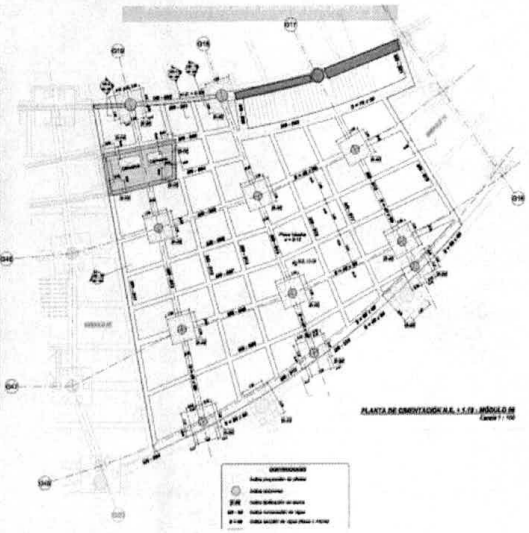

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M9 – E01 PLANTAS ESTRUCTURALES MÓDULO 9

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

BOGOTÁ

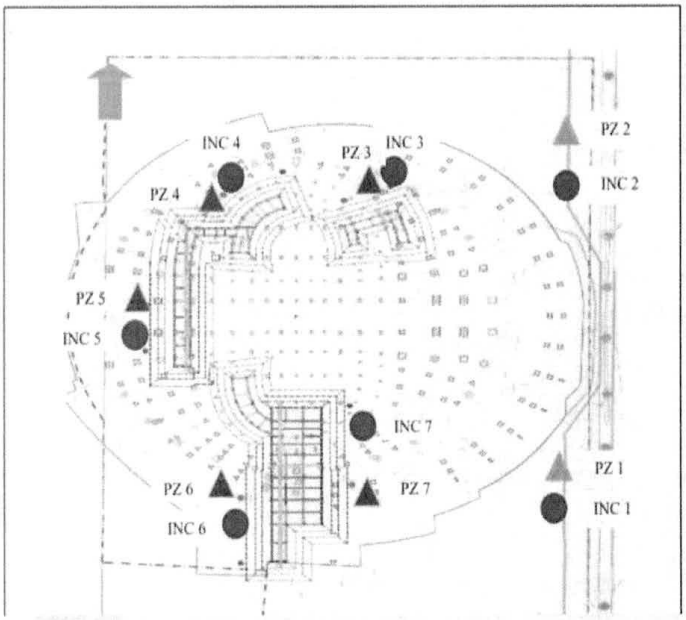

INCLINOMETRO

PIEZOMETRO CASAGRANDE

PIEZOMETRO DE HILO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

BOGOTÁ

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 16 al 23 de enero de 2026; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 36.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.20 m y 8.83 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 2 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.31 y 6.22 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE ASENTAMIENTOS

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 31 DE ENERO DE 2026

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO		DESCRIPCION	
		PARCIAL	ACUMULADO		
N-1	2541,662	-0,001	0,001	PARAMENTO	
N-2	2541,663	0,001	0,015	PARAMENTO	
N-3	2541,575	0,006	0,009	PARAMENTO	
N-4	2542,431	0,000	-0,018	CERRAMIENTO	
N-5	2542,216	-0,002	0,011	CERRAMIENTO	
N-6	2543,937	0,002	-0,023	CERRAMIENTO	
N-7	2545,962	0,002	0,015	CERRAMIENTO	
N-8	2543,816	0,002	0,020	CERRAMIENTO	
N-9	2544,446	0,002	0,013	CERRAMIENTO	
N-10	2547,608	0,001	-0,028	CERRAMIENTO	
N-11	2546,930	0,001	-0,023	CERRAMIENTO	
MA-12	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-13	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-14	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-15	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-16	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-17	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-18	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-19	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-20	2542,183	0,000	-0,013	PERIMETRO	
P-21	2541,007	0,000	0,007	BORDILLO	
P-22	2540,973	0,000	0,010	BORDILLO	
N-23	2541,603	0,000	0,010	PARAMENTO	
P-24	2540,724	0,000	0,003	SUMIDERO	
P-25	2540,983	0,001	0,013	POZO	
P-26	2540,966	0,004	0,016	POZO	
P-27	2540,705	-0,002	0,015	SUMIDERO	
P-28	2540,725	0,006	0,002	POZO	
P-29	2540,952	0,001	0,019	POZO	
P-30	2540,676	0,004	0,021	SUMIDERO	
N-31	2541,579	0,004	0,011	PARAMENTO	
P-32	2540,968	-0,001	0,009	BORDILLO	
P-33	2541,052	0,000	0,011	BORDILLO	
N-34	2541,946	-0,002	0,010	PARAMENTO	
N-35	2540,875	0,005	0,008	PARAMENTO	
P-36	2541,090	0,000	0,011	BORDILLO	
P-37	2541,135	0,000	0,014	BORDILLO	
N-38	2542,147	0,000	0,013	REJAS PARQUE	
N-39	2542,288	0,001	0,012	REJAS PARQUE	
P-40	2541,171	0,001	0,017	BORDILLO	
P-41	2541,194	0,000	0,018	BORDILLO	
N-42	2541,671	0,000	0,018	PARAMENTO	
N-43	2541,637	0,042	0,053	PARAMENTO	
P-44	2541,200	0,001	0,025	BORDILLO	
P-45	2540,988	0,002	0,022	POZO	
P-46	2540,941	0,002	0,021	POZO	
P-47	2541,161	0,001	0,022	BORDILLO	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 31 DE ENERO DE 2026

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO		DESCRIPCION	
		PARCIAL	ACUMULADO		
N-48	2541,569	0,004	0,014	PARAMENTO	
N-49	2541,547	0,003	0,016	PARAMENTO	
P-50	2541,099	-0,008	0,005	BORDILLO	
P-51	2541,083	0,002	0,012	BORDILLO	
N-52	2541,489	0,002	0,019	PARAMENTO	
P-53	N/A	N/A	N/A	BORDILLO	PERDIDA
P-54	2541,186	0,000	-0,005	ANDEN	
N-55	2541,744	-0,003	-0,006	PARAMENTO	
P-56	2540,859	0,000	-0,001	ANDEN	
N-57	2541,735	-0,000	-0,005	PARAMENTO	
P-58	2541	-0,002	-0,003	ANDEN	
P-59	2540,751	-0,001	0,000	ANDEN	
N-60	2541,348	0,002	0,007	PARAMENTO	
N-61	2540,673	-0,001	0,005	PARAMENTO	
P-62	2540,547	-0,001	0,004	ANDEN	
C-63	2541,908	-0,004	-0,005	[illegible]	
C-64	2541,786	0,001	-0,002	[illegible]	
C-65	2541,592	-0,002	-0,001	[illegible]	
C-66	2541,616	0,000	-0,002	[illegible]	
C-67	2541,690	-0,004	-0,006	[illegible]	
C-68	2541,716	0,004	0,003	[illegible]	
C-69	2541,717	-0,004	0,004	[illegible]	
C-70	2541,678	-0,001	0,008	[illegible]	
C-71	2541,813	-0,001	0,001	[illegible]	
C-72	2541,951	0,001	0,000	[illegible]	
C-73	2542,089	-0,001	-0,005	[illegible]	
C-74	2542,226	0,000	-0,004	[illegible]	
C-75	2541,654	-0,003	0,008	[illegible]	
C-76	2541,714	0,003	0,014	[illegible]	
C-77	2541,718	-0,005	0,048	[illegible]	
C-78	2541,767	-0,002	0,014	[illegible]	
C-79	2541,757	0,000	0,012	[illegible]	
C-80	2541,732	0,001	0,015	[illegible]	
C-81	2541,743	0,006	0,019	[illegible]	
C-82	2541,740	0,002	0,018	[illegible]	
C-83	2541,680	0,003	0,005	[illegible]	
C-84	2541,664	0,002	0,010	[illegible]	
P-85	2540,987	-0,003	0,024	PARQUE	
P-86	2541,006	0,000	0,011	PARQUE	
P-87	2540,912	0,004	-0,007	PARQUE	
P-88	2540,952	0,004	0,012	PARQUE	
P-89	2543,460	-0,003	-0,006	TACO 1	
P-90	2543,316	-0,002	-0,013	TACO 2	
P-91	2542,219	-0,002	-0,013	TACO ADMI	
P-92	2542,232	0,008	0,[illegible]	TACO ADMI	
P-93	2542,450	-0,002	-0,[illegible]	TACO APOYO	
P-94	2542,295	0,002	-0,021	TACO APOYO	

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo. (*)	UTMP	29-01-2026	pendiente

(*) Se remite por parte del contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO


Durante la semana 26 al 31 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Esta semana no se presenta avance en las redes eléctricas y de comunicaciones, se espera avance en la estructura para continuar en el modulo 10.

- Se hace revisión de la ubicación de las cajas de paso que hay en ese modulo No 10 con su respectiva red de ductos para que no interfieran con la estructura de concreto.


CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Imagen 1. Diseño de ubicación de cajas de paso sin visualización de estructura de concreto

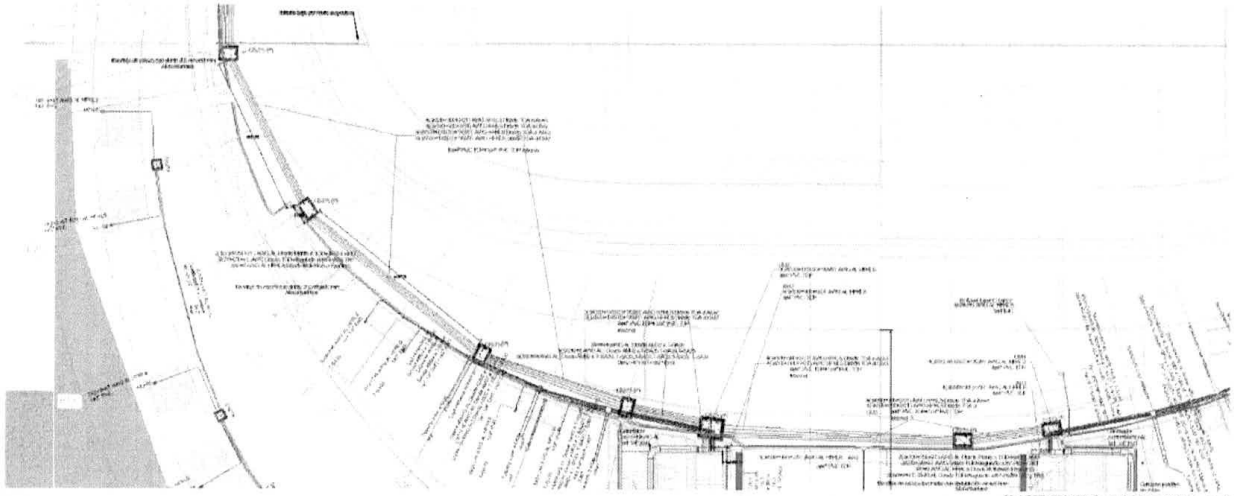

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Imagen 2. Posible reubicación de las cajas de paso CS275 para que estén dentro de la estructura de concreto sin ser afectada.

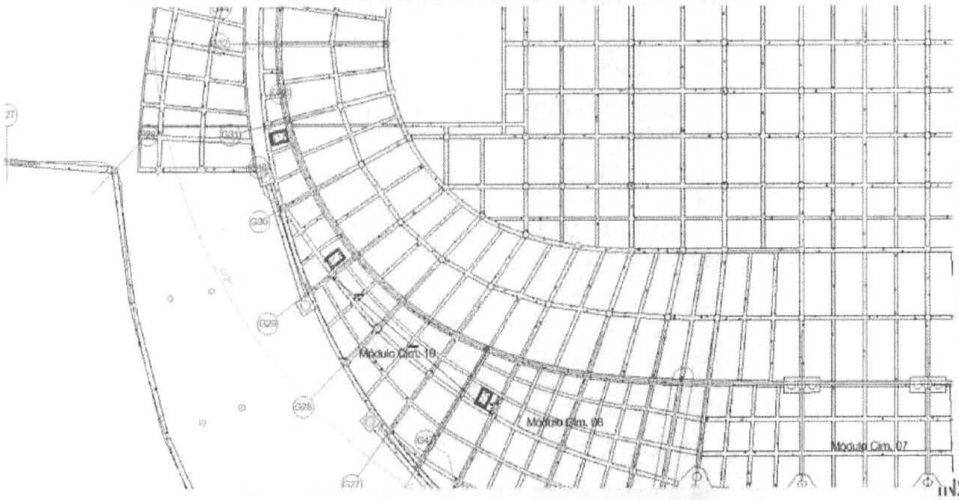

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Componente
Hidrosanitario

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (*)	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP	IDRD – CIG -UTMP	22/01/2026	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE


(*) Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-0034-2026 (19/01/2026) Rad. IDRD No 20262100023932.

(**) Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025)

REDES HIDROSANITARIAS

Avance de Obra:

Se termina la instalación del material granular en la base del geodrén en el Túnel Administrativo.

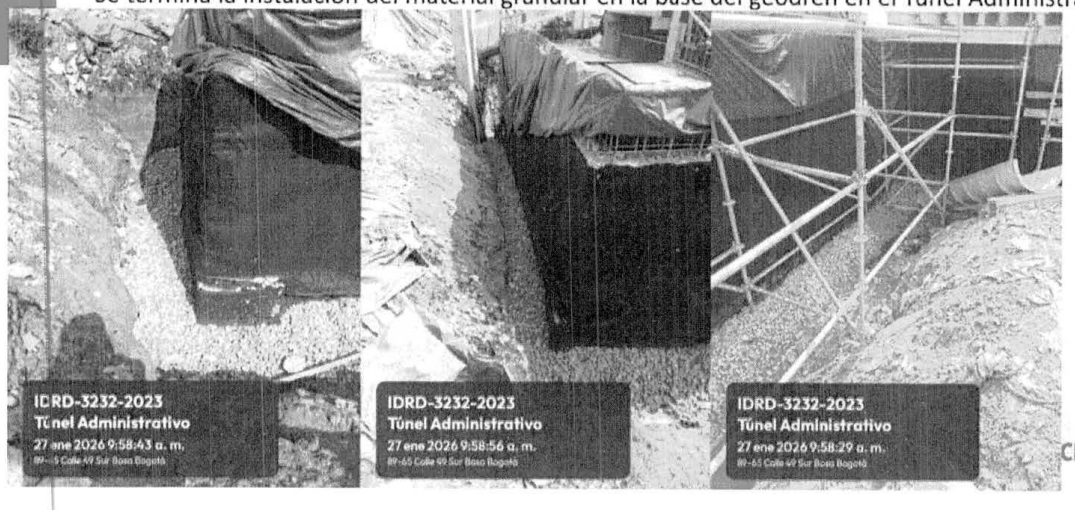


REDES HIDROSANITARIAS

BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se continúa con la instalación del geodrén y el tecdrén del Túnel Apoyo a la competición y la conformación del material granular en el fondo del geodrén.

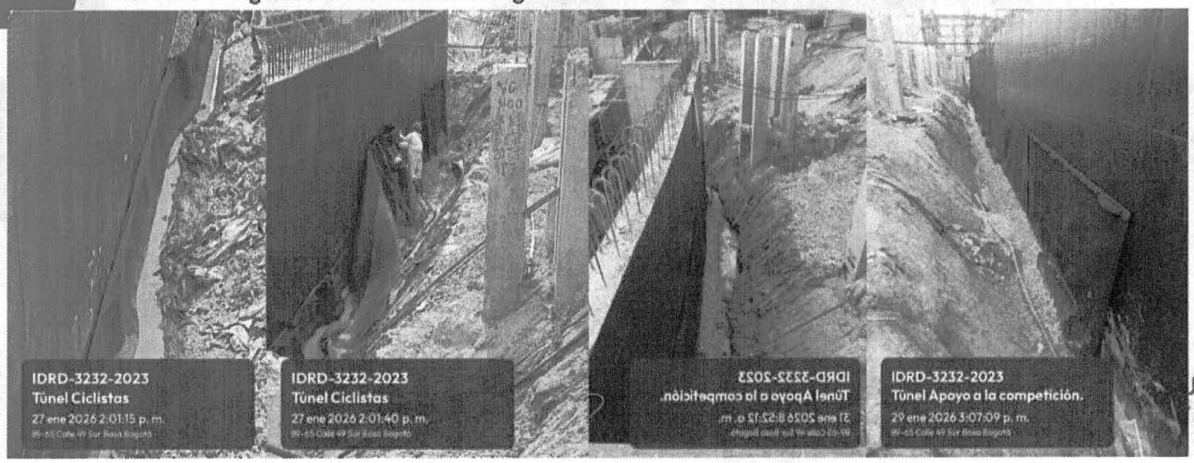

UTO DISTRITAL DE
DEPORTE - IDRD

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N A	Comité Técnico/Transversal Velodromo Cto Obr. 3232-2023 y Cto. Int 3219-2023	DD	MM	AA
ACTA No. 97		12	2	2026

LUGAR:	virtual Plataforma Teams enlace:	HORA DE INICIO:	10:00	HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se adjunta Listado de Asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de Componentes Transversales	4.
2. Presentacion de Componentes Técnicos	5.
3. Observaciones Varias.	6.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TRANVERSAL

Se solicita permiso a los asistentes para grabar la cesion los cuales no tienen objecion y se inicia comité con autorizacion respectiva de los firmantes de la presenta Acta.

Componente Social: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD

Pendiente, se reprograma para despues del 8 Marzo/26. Sup. IDRD.

2) Remisión de Acta de comité de participación ciudadana No 22

Cumplido el 6/2/26.

3) Remisión por parte de CIG respuesta de veredicto de la Tutela descrita en el comité anterior.

Cumplido el 6/2/26 Rad IDRD # 20262100062972.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La Supervision indica que la Visita programada por parte de La Universidad nacional por lineamiento de la entidad será reprogramada para despues de 8/Marto/2026 y se comunicara proxima fecha.

Componente Ambiental: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de interventoría no CIG-IDRD-VEL-79-2026 de Respuesta Oficio CE-206-125-2163 Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles – Velódromo Gibraltar. (05/02/2025)) Pendiente respuesta UTMP

Pendiente.

2) Propuesta de manejo de ZONAS VERDES pendiente respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de Interventoría CIG-IDRD-VEL-0081-2026 (Rta UTMP) y Rad. IDRD No 20262100083002 (06/06/2026)) Se da respuesta a la UTMP y se da traslado a la entidad contratante IDRD.

Pendiente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

la Sup. da recomentaciones durante recorrido a obra:

- Protección a acopio de aceros
- Proteccion materiales granulares para la Planta Concreto
- Mantenimiento a la Motobomba.

Se informa tambien la actualizacion efectuada a los Formatos de revision "lista de chequeo" de mensuales para ser aplicados en consecuencia a los informes mensuales de obra como se esta haciendo con los de interventoria, se explica que son actualizaciones normativos entre otros.

Se reafirma la revision de los informes bajo estos parametros actualizados.

Componente Riesgos: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1)Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente

Pendiente.

2) Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD

Pendiente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Comp. Forestal: La Sup. informa que en el IDRD se tiene profesional xra revision de Informes.

Comp. Fauna: Se realiza exposicion al respecto.

Primer comite mensual recorrido Ambiental IDRD-UTMP-CIG.

Componente SST: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23. PENDIENTE en avance según lo reportado en las diapositivas del presente comité.

En avance segun relacion expuesta en comité.

2) Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Umaña

Hoy se remite documentacion a la interventoria por parte UTMP

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se hace reporte por parte de la interventoria
- Informe Nº 20 aprobacion IDRD
- Observacion Nº 21 por parte IDRD
- Aprobacion Informe de Obra Nº 24 (Ene.)
- Observaciones puntuales a la UTMP y recomendaciones segun visita U.Nacional. al IDRD segun protocolos, se envia email con el listado de Personal.

Componente CALIDAD: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **así:**

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad – anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar -

Cumplido. Se comunica por parte de la interventoria que la información fue subsanada según Rad. IDRD No 20262100071112 del 10/02/2026. (Plan de Inspección y Ensayo interventoría V.4)

2) Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026.

Cumplido: Se comunica por parte de la Interventoria quese hace subsanacion según rad. IDRD No 20262100082982 del 05/02/2026

3) Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD

Cumplido: Rad. IDRD No 20264200033121 del 06-02-2026 Aprobación de Profesional de Calidad Interventoría del 06/02/2026 y (*) Rad. IDRD No 20262100067662 del 09-02-2026 del 09/02/2026.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

> Ca Sup. Realiza observaciones entrega de Formato de Inspecciones visua a la estructura Metalica, sera remitido por parte de CIG el dia de hoy.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TÉCNICO

Componente BIM: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **así:**

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (Red perimetral Ajuste/Diseño)

PENDIENTE: Se completara una vez se tengan diseños aprobados UNTI.

2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026.Revisado por CIG y se generan Observaciones. Se espera Rta. UTMP.
CUMPLIDO: Se comunica por parte de la Interventoria que se da remicion de Oficio de Interventoría No CIG-IDRD-VEL-83-2026 de Respuesta Oficio Obra No 2188 Referente a Planos de Taller (06/02/2026) y se espera respuesta respectiva durante el desarrollo de la construccion respectiva.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
- Por parte de la UTMP se realiza exposicion de detalle de avance y control que se tiene desde el Software PowerBI. - Generar conceptualización por parte de CIG dando respuesta a la UTMP con copia a la UTMP.
Componente PROGRAMACIÓN: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **así:**
1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 se hace remisión de los INSUMOS a la entidad contratante IDRD (*) En espera de comentarios y/o aprobación de INSUMOS para remisión APU´S
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes entre las partes UTMP-CIG-IDRD. Se comparte por medio de WETRANFER por parte de la UTMP los archivos actualizados de los APU´s del Modificatorio No 3 de Obra (Adición No 2 Prorroga No 1) . Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra
2) Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026
PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta y observaciones de manera Digital y se remitira de manera oficial por la entidad contratante IDRD. Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra
3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 (Adición No 2 Prorroga No 1) Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD Pendiente Observaciones IDRD Documento.
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes por parte de la entidad contratante IDRD. Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_ Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 (Adición No 2 Prorroga No 1)Obra.
4) Remisión de borrador de modificatorio No 1 (Adicion No 1 Prorroga No 1) Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador actualizado según observaciones por parte de interventoría CIG el 04/02/2026. Pendiente Observaciones IDRD.
PENDIENTE: La supervision informa que esta en revision de los documentos remitidos
5) Remisión al IDRD de borrador de VIABILIDAD al modificatorio No 3 (Adicion No 2 y Prorroga No 1) por parte de CIG al contratista de Obra UTMP – Pendiente Observaciones IDRD

PENDIENTE: La supervisian informa que esta en revisión de los documentos remitidos.

6) Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica. Pendiente Respuesta IDRD

CUMPIDO: Se da Respuesta IDRD Rad. No No 20264200033881 del 06-02-2026 y trasladado por CIG Oficio No CIG-IDRD-VEL-87-2026. Pendiente pronunciamiento de la UTMP.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La interventoria manifiesta el RIESGO que se tiene al desembolso presentado por parte de UTMP de Anticipo para pago de la pista teniendo en cuenta que el contrato de obra vence el proximo 4 de Abril 2026 de manera contractual por ende este desembolso no seria conveniente por tiempos.

Se presenta por parte de CIG el Balance a la fecha de las revisiones efectuados a los informes MENSUALES por parte del IDRD y los valores de actas parciales PENDIENTES de acuerdo al avance a la fecha.

Componente TÉCNICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP

PENDIENTE: La sup. indica que fue radicada el dia de ayer y Sera radicada ante DADEP el dia de Hoy, pte # Radicado.

2) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD

PENDIENTE.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La supervisian solicita claridad en las sumatorias entre cantidades en Tonelajes sumados al 100%. La UTMP realiza clavidades y la Supervisian remitira Formato para empezar a implementar en la Presentacion Semanal.

Componente ELECTRICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Según la Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo remitida por el contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión.

- La sup. Solicita el plano de Fibra optica el remitido corresponde al Rack se debe definir la ubicacion del cuarto de Comunicaciones hacia afuera del edificio

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La UTMP solicita a la Supervisión la visita del operador de Red para que se establezca un punto de ingreso y asi mismo el contratista planteará el recorrido interno, esto manifestado por parte de CIG, queda Pendiente tambien la licencia (de acuerdo la radicacion ante ENEL)

Componente Hidraulico: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (*) Trasladado a la UTMP

PENDIENTE. Se da respuesta por parte del IDRD mediante Rad. IDRD No 20264200030721 del 10/02/2026 - Traslado Oficio CIG-IDRD-VEL-102-2026 el 11/02/2026. Pendiente Rta. De la UTMP

2) Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025))

PENDIENTE.

3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.

PENDIENTE. Se continua con gestiones por parte del IDRD.


El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

- Se informa que VANTI Agendo el 18 de Marzo para Revision de Diseño.
- Se Solicita por parte del IDRD concertar una fecha Para reunion preliminar en curaduria Estructura y Arquitectura de manera independiente.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Compromisos descritos y patados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO	UTMP-CIG	Según documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las __ m___ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N-A	N-A
NOMBRE	Arq. Rubén Darío Crespo	NOMBRE	N-A	N-A
CARGO	Director de interventoría	CARGO	N-A	N-A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Torres Residente de Interventoria	Arturo Rojas T.

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
12/02/2026 11:08:39	Astrid Viviana Rojas	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Profesional de riesgo de	Consorcio Interventores	3157994502
12/02/2026 11:09:51	Oscar Javier Sora Ortega	80761720	oscar.sora@idrd.gov.co	Apoyo Hidrosanitario	IDRD	3003101408
12/02/2026 11:12:28	César David Hernández (	80186483	cesard.hernandez@idrd.gov.co	Apoyo transversal SST	IDRD	3506290062
12/02/2026 14:43:55	Bibiana Paola Sosa Linar	52996077	Bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo a la supervision S	IDRD	3134649125

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Tecnico / Transversal Nº 97

FECHA: 12/02/2026 HORA INICIAL (*): 10:30 HORA FINAL: 11:45am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edwar Escaño	9448762	Apoyo STC	IDRD		IDRD	edw...@idrd.gov.co	3116059747
2	Francy Murillo	52968323	Apoyo Tec. STC	IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043000755
3	Raimundo Tulio Velez Mendivelso	85777925	Apoyo S. Social	STC		IDRD	raimundo.velez@idrd.gov.co	
4	Daniela Prieto Rodriguez	1018440798	Ap. STC Paisaj	IDRD-STC		IDRD	daniela.prieto@idrd.gov.co	3022472354
5	Jhon F Espitia B.	80794111	Ap. STC	STC-IDRD		IDRD	Jhon.espitia@idrd.gov.co	3118103339
6	Rubén Darío Crespo B.	19496690	Dtor Interv.	CIG		IDRD	directora.consorciointerv@gmail.com	
7	Carlos H. Castro	79'340835	Apoyo Sup.	IDRT STC		IDRD	carlosh.castro@idrd.gov.co	3107542732
8	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Ap. Supervisión	STC		IDRD	Jaime.Canon@idrd.gov.co	
9	Javier O Sanchez Lagos	10 14177632	Apoy Tec. Sup	STC		IDRD	javier.sanchez@idrd.gov.co	3184596655
10	Juan Pablo Vilbate Diaz	1014010537	Apo Sup	STC		IDRD	juan.vilbate@...	3197071374
11	Diego Alejandro León	1018487557	Ing. Estructural	Interventoría		CIG	—	—
12	Tatiana Ortegón Pinilla	1018487557	Ing. Ambiental	STC - IDRD		IDRD	leidy.ortegon@idrd.gov.co	3138646385
13	Iniay Rubiano Moyano.	1051954740	Res. SG-SST	CIG		CIG.	Interventoria velodro.	3202349811
14	Paula Blanco Alagón	1073356730	Res Amb	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cig.com.co	
15	Henry Luz Ramirez	52424604	Prof. Social	CIG		CIG	...	3137205...
16	Diana Marcela Ortiz D.	1015212007	Res Social	UTMP		UTMP	Soc.velodromo.	3153934827
17	Yoiles Chavez	79695717	Rp. Legal	UTMP		UTMP	...@...	3152338...
18	Juan Javier Espinel Silva	1020956933	R. Forestal	UTMP		UTMP	R.forestal.velodromo@...	3178...

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

(*) Se realiza recorrido en obra a partir de las 10:00 am

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.6

1/2

192

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Tecnico Kraners N° 97

FECHA: 12/02/2026 HORA INICIAL: 10:30 HORA FINAL: 11:45am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	Wilber Ricardo Sánchez	10 53806239	Prof. BIM	Interventoría		CIG	bimvelo@ciodirng.com	
2	JOHN RAMOS	80002268	COORDINADOR	UTMP		UTMP	coordinador-tem@cyg.com.co	
3	Andres Galeano Gonzalez	1022362548	Res Ppto y Prog	CIG		CIG		3147385295
4	Andrés Lengua R.	1063002731	Prof HS-QCI	Interventoría		CIG	— — —	3206846
5	Samer Arcas Sepulveda	7562.770	Prof Electrica	Interventoria		CIG		
6	David Paredes	80821514	Prof Presup	Intervent.	David	CIG		
7	Fernando Rodriguez Torres	80219815	Residente	interventoría		CIG		
8	Diego Leon							
9	Carlos Eduardo Duarte Bautista	1010412999	COORDINADOR	Interventoría		CIG		3147744462
10	Julian Ricardo Agudelo Niño.	80767393.	R. Ambiental	interventoría		CIG	—	—
11	Alvaro Forero B	79946427	R. HSG	UTMP		CIG	hidraulico.velodromocyg...	3023912997
12	Alejandro Tello Cerquera	1070604368	Prof Presup y Prog	UTMP		CIG	Programacion.velodromo@gmail.com	3017415942
13	Diego F Costa O	1110455570	Prof Calidad	UTMP		CIG	Calidadvelodromocyg...	3176151524
14	Edvard Antonio Comedor	80383913	Residente electrico	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290201
15	Luz Stella Rodriguez	3143775	Res SST	UTMP		UTMP	SST.velodromo@cyg.com.co	3214893334
16	Jose M. Galeano	80031382	Residente	UTMP		UTMP	residente.velodromo@cyg.com.co	3105570274
17	CARLOS EDUARDO GOTMAN SANCHEZ	79617588	RESIDENTE	UTMP		UTMP	—	—
18	Arturo Rojas Torres	13873537	Residente	UTMP		CIG	interventoria.velodromo@gmail.com	3166426035

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL-V.5

(x) Se realiza recorrido en obra a partir de los 10:00 am



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD	UTMP- CIG	12/02/2026	VIGENTE
Remisión de Acta de comité de participación ciudadana No 22	UTMP	12/02/2026	CUMPLIDO
Remisión por parte de CIG respuesta de veredicto de la Tutela descrita en el comité anterior.	CIG	06/02/2026	CUMPLIDO

Actividades ejecutadas por el componente social

COMPROMISOS COMITÉ DE PARTICIPACIÓN No. 22

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN	TRAZABILIDAD	ESTADO
Enviar el acta y la presentación del comité de participación No. 22	Unión temporal metropolitano Porvenir	Una vez se cuente con la aprobación del acta por parte de la interventoría	06/02/2026	Cumplido

SOLICITUD DE PTT A LOS PROFESIONALES TRANSVERSALES

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 23


20 DE ENERO DEL 2026	HORA 9:00	SALÓN COMUNAL BARRIO LAS VEGAS

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (*) Pendiente respuesta UTMP	UTMP	-.-	PENDIENTE
Propuesta de manejo de ZONAS VERDES pendiente respuesta CIG y/o traslado IDRD (**) Se da respuesta a la UTMP y se da traslado a la entidad contratante IDRD.	CIG	05/02/2026	CUMPLIDO


(*) Oficio de interventoría no CIG-IDRD-VEL-79-2026 de Respuesta Oficio CE-206-125-2163 Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles – Velódromo Gibraltar. (05/02/2025)

(**) Oficio de Interventoría CIG-IDRD-VEL-0081-2026 (Rta UTMP) y Rad. IDRD No 20262100083002 (06/06/2026)

COMPONENTE AMBIENTAL



Capacitación: Manejo de kit de derrames contención de emergencias (06/02/2026)



Retiro de chatarra y madera



Retiro de sobrantes de concreto y RESPEL



Mantenimiento de árboles



Retiro de lodos cajas pluviales



COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.744.719**	**85,56%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.658.459**	**86,35%**

EXCAVACIÓN	134.400 kg

Retiro de 21 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,82%
Circularidad: 19,33%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE
Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo y Reducción del Riesgo/Manejo de Desastres Escenarios de Riesgo ER07-ER14/ PDCA – Ficha 3



Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)



Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención
No fue requerida la activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank



Bombeo agua lluvia

Bombeo de agua lluvia en pozo de achique de zona central, dadas las fuertes lluvias registradas

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
