

Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ



Monitoreo de Precipitación in situ


Verificación de precipitación acumulada diariamente mediante pluviómetro instalado en obra

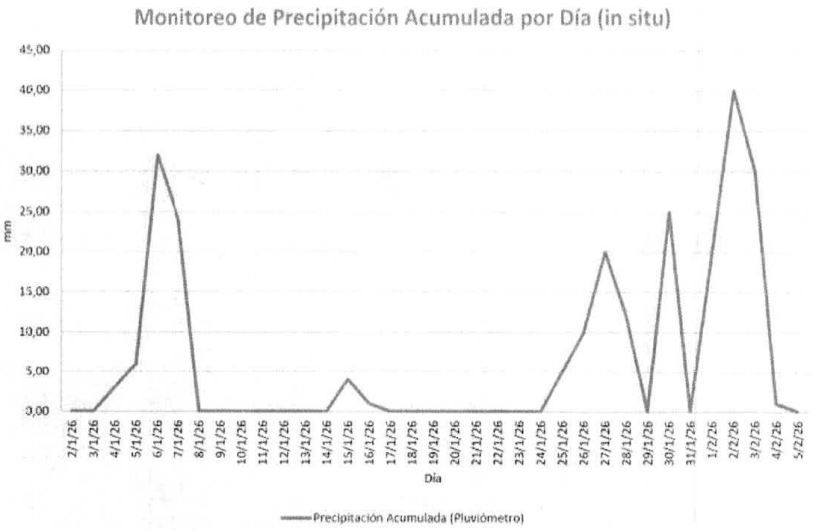

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13-ER16
Reducción del riesgo ER07-ER09-ER14

BOGOTÁ

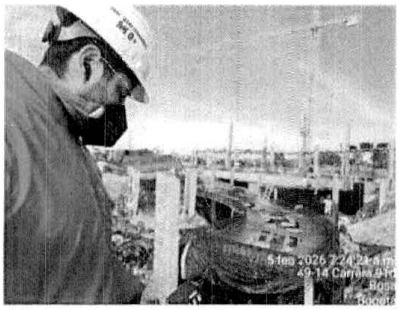


Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

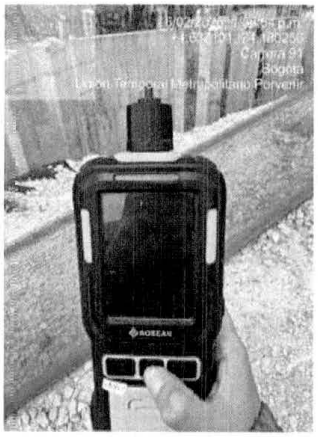

Se notifica ingreso del Detector de Gases Portátil BOSEAN K-600, que se encontraba en proceso de calibración (Fecha Calibración: 2/2/2026)

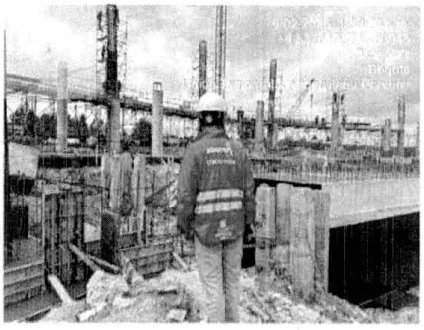

Inspección de taludes

Inspección visual de taludes con acompañamiento de geotecnia, identificando condiciones normales de estabilidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2026.03.26 09:30:46 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

201


Monitoreo del Riesgo ER07
Reducción del Riesgo ER09-ER10-ER15

BOGOTÁ



Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra

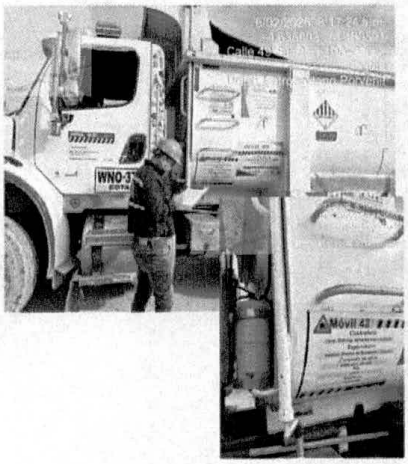

Inspección de vehículos

Inspección de vehículo carro cisterna, dispuesto para transporte y disposición final de lixiviados



Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE FORESTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO

El día 4 de febrero de 2026 se efectuó recorrido en conjunto con la interventoría, en la revisión del arbolado de protección permanente (conservación), se verificó el estado actual físico y sanitario del arbolado, así como la adecuada instalación de la malla azul para el aislamiento, como se observa a continuación los individuos cuentan con un apropiado estado en su lugar de emplazamiento, excepto el árbol No. 70 (quemado):




Árbol No. 70



Árbol No. 71



Árbol No. 72




Árbol No. 73

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO

El día 4 de febrero de 2026 se evidenció habitante de calle en la base del árbol de la especie Acacia morada NO. 73 de la Resolución.

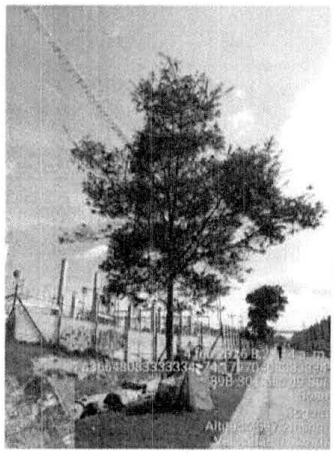



Árbol No. 73

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO



Árbol No. 77



Árbol No. 78



Árbol No. 79



Árbol No. 80

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO

Revisión de árboles (Falsos pimientos) Costado Sur Anden Perimetral – Calle 49 Sur.



Árbol No. 1



Árbol No. 2



Árbol No. 3



Árbol No. 4


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PROTECCIÓN PERMANENTE ARBOLADO


Revisión de árboles (Falsos pimientos) Costado Sur Anden Perimetral – Calle 49 Sur.



Árbol No. 5

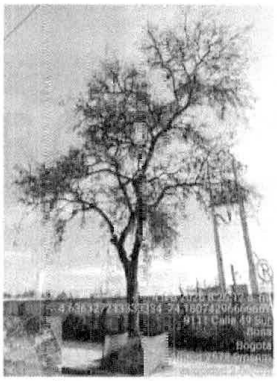

Árbol No. 3

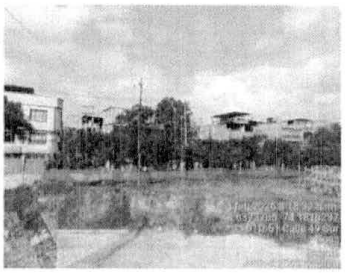



OTRAS ACTIVIDDES

- APROBACIÓN INFORME MENSUAL No. 24 (APROBADO CIG-IDRD-VEL-077-2026)
- En espera de información frente a la reliquidación método de compensación Resolución 1639 de 2023 teniendo en cuenta el acta WR WR 1388ª de 2024.
- Comunicado CIG-IDRD-VEL-981-2025, la tala la ejecuta directamente el Jardín Botánico de Bogotá. En espera de nuevas indicaciones.

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

FAUNA SILVESTRE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Recorridos de seguimiento mensual

BOGOTÁ

7 ene. 2026 08:19 A.M.

92-39 Calle 49 Sur, Bogotá, Bogotá, CO (4.638, -74.181)
Distrito Capital de Bogotá, Colombia



Claudia Infante Jaimes

Con Desplazamiento · 82min · 0,68 Km

7 Species

53	Zenaida auriculata
18	Orochelidon murina
2	Troglodytes musculus







Actividades pendientes en el componente fauna para el periodo	
Recorridos de seguimiento mensual	0
Liberación de áreas de desarrollo del proyecto	0
Especies registradas en el predio (residentes)	7

DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

SST

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Umaña	UTMP-CIG	12-02-2026	Pendiente


PROMEDIO PERSONAL


REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	PROMEDIO 02/02/26 - 08/02/26
PROFESIONALES	27
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	3
SUPERVISOR/ENCARGADOS	2
OFICIALES	26
AYUDANTES	39
HERREROS	16
OPERADORES	9
BACHEROS	2
CONDUCTORES	1
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	133

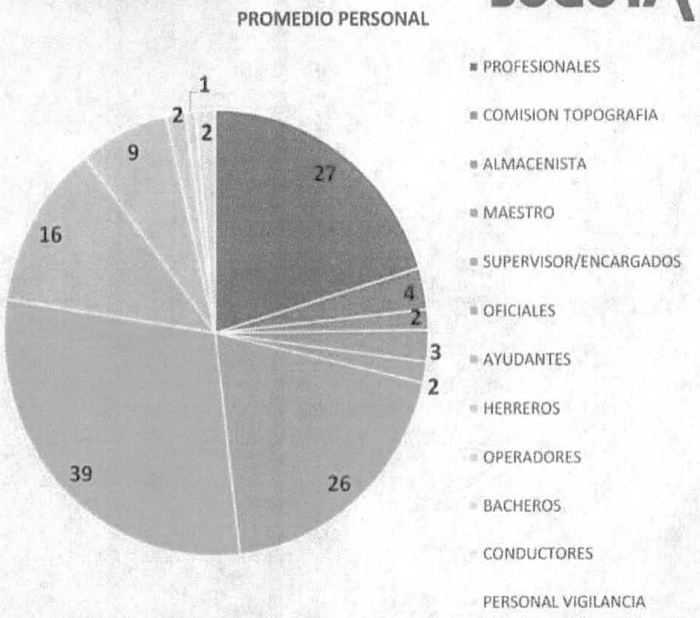

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

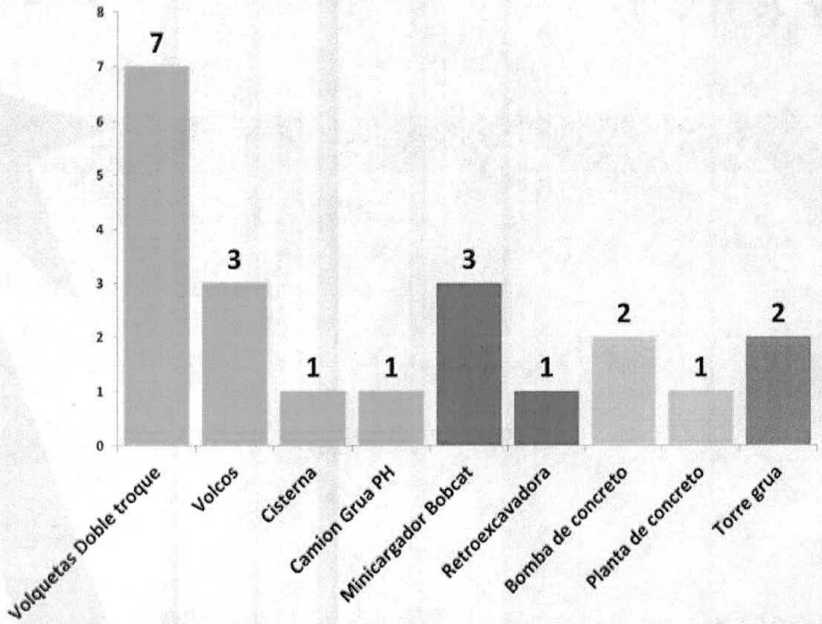



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

BOGOTÁ

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	CERRADO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	ABIERTOS
ene-26	0	N/A
TOTAL ACCIDENTES	8	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
ene-26	6
TOTAL AUSENTISTAS	62

NOTA: **A la fecha se cuenta con 4 accidentes cerrados y 4 abiertos**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Capacitación personal administrativo



Inducción al personal

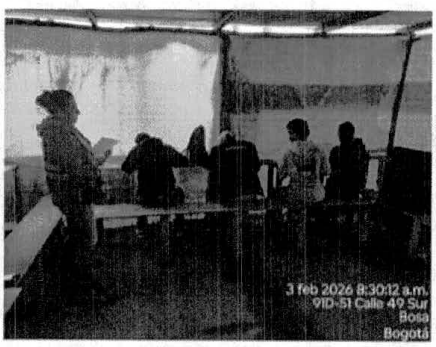




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspección e identificación de andamios

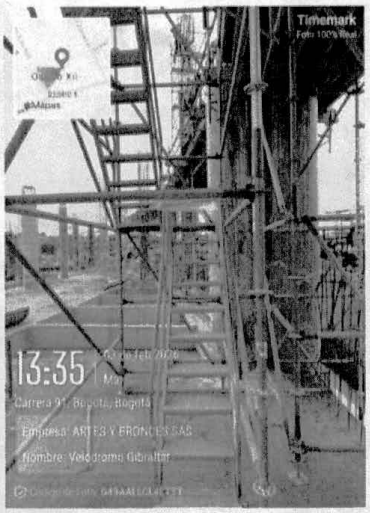



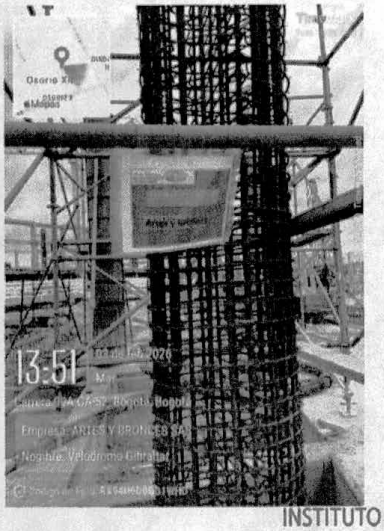


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST


BOGOTÁ

Inspeccion actividades en alturas

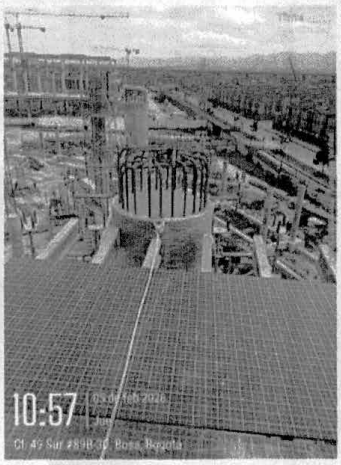



Pausas activas

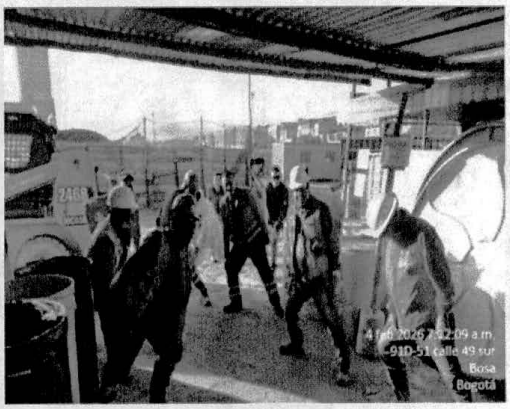


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspeccion uso de EPP y EPCC en frente de obra

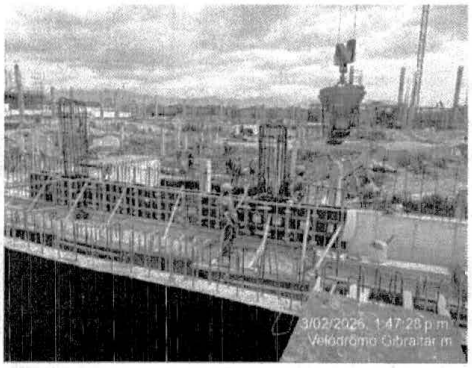

Inspeccion maquinaria, vehiculos y equipo

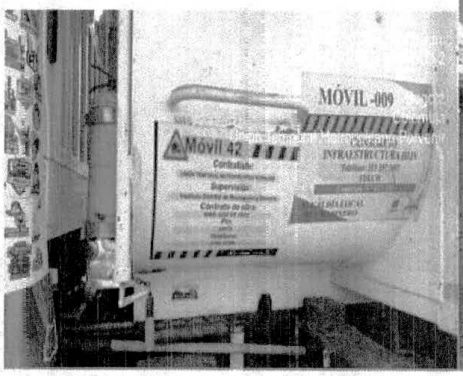



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Señalización de guayas tensoras





HALLAZGO

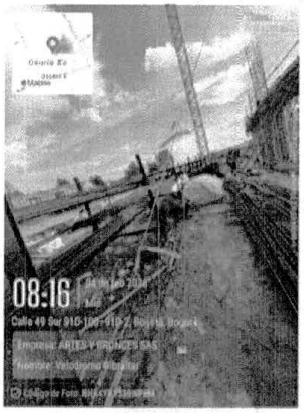

ACCION CORRECTIVA

Andamios sin señalizacion

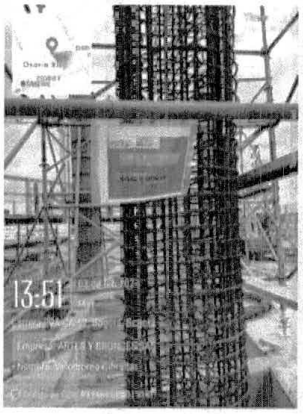

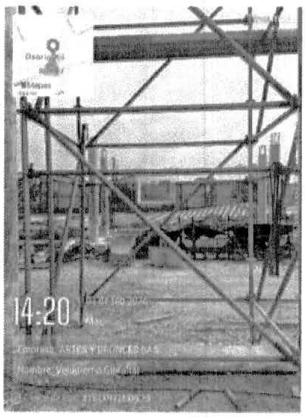

ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente
De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad – anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar - (*)	UTMP	13/01/2026	CUMPLIDO
Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (**)	CIG	26/12/2025	CUMPLIDO
Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD. (***)	CIG	20/01/2025	CUMPLIDO

(*) Rad. IDRD No 20262100071112 del 10/02/2026. (Plan de Inspección y Ensayo interventoría V.4)

(**) Rad. IDRD No 20262100082982 del 05/02/2026

(***) Rad. IDRD No 20264200033121 del 06-02-2026 Aprobación de Profesional de Calidad Interventoría del 06/02/2026 y (*) Rad. IDRD No 20262100067662 del 09-02-2026 del 09/02/2026.

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2804,11 m3

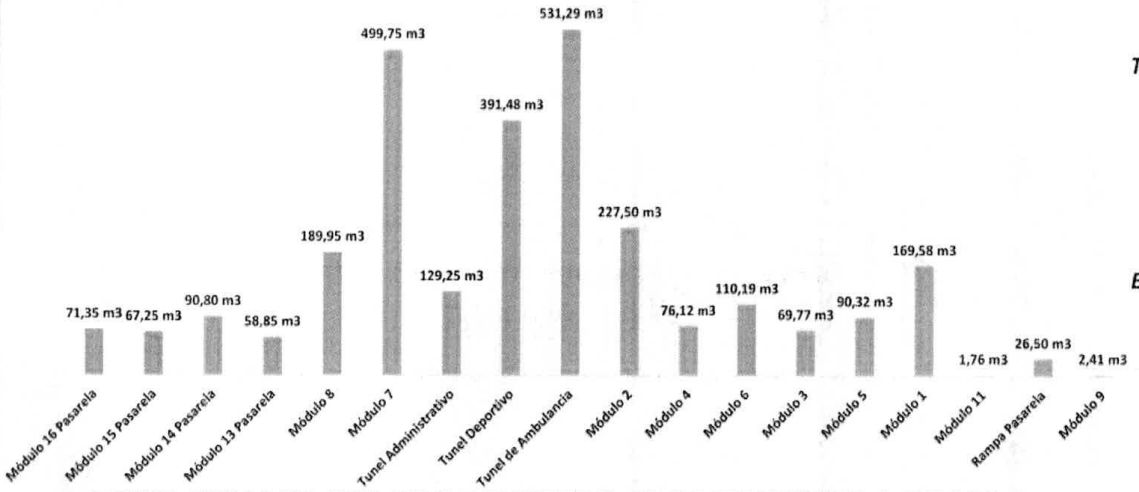

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana
92,03 m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673



TOTAL SEMANA DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DE 2026.


Concreto Estructural: *92,03* m3 **Muros** (Túnel de Ambulancia y Túnel Deportivo) **Columnas** (Módulo 1, Módulo 3, Módulo 5, Módulo 6 y Rampa) y **Viga** (Viga de Cubierta C30/C29) y **Dados Vigas y Ménsula** (Módulo 6 y Módulo 3)

CEMEX **0 m3** *0%*

ALTARA **92,03 m3** *100%*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **546,65 Ton**

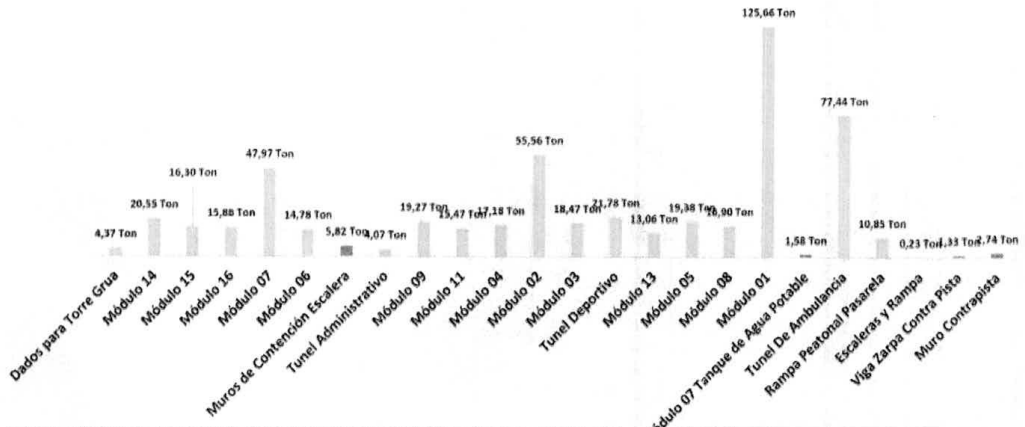

BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD





Del 02 de Febrero al 09 de Febrero de 2025


Se ingresaron ***5,65 ton*** *para* ***Viga Aerea, Dados, Puntales y Vigas Túnel de Ambulancia y Muros Contrapista***




INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	15-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		15-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
24	15	8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
25		8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					30 Unds		Total	270,77 Ton





CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA



Elementos Ingresados del 02 al 08 de febrero de 2026:

2 Unds para 19,28 TON

TOTAL : 270,77 TON.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


UBICACIÓN DE SECCIONES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

Sección	Cantidad
CHP6	2 Unds
CHP2	2 Unds
CHP1	2 Unds
CHP5	2 Unds
PVC1	1 Unds
PVC2	1 Unds
CHP3	5 Unds
CHP4	5 Unds
CHP7	5 Unds
CHP8	5 Unds
Total	30 Unds

CHP6 - CHP6
CHP2 – CHP2

CHP1 – CHP1
CHP5 – CHP5



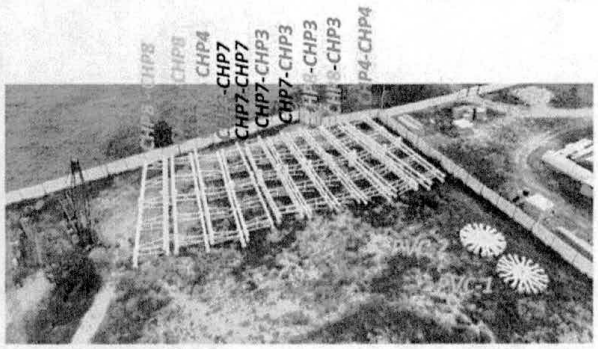

TOTAL **30 Unidades**
para
270,77 Ton

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Modulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Modulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 12 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-2163 mediante CIG-IDRD-VEL-0079-2026 del 05 de Febrero de 2026	Contratista
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 22 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG--DRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobacion del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
		Pista Velodromo	Pendiente	Se responde comunicado CE-206-125-2188 mediante comunicado CIG--DRD-VEL-0083-2026 del 06 de Febrero de 2026	Contratista
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoría
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilacion Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado
10	Mecánico	**Ascensores**	Pendiente	Se radicó oficio CE-206-125-2176 del 27 de enero de 2026	Interventoría

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MATERIAL DE LLENO PARA LOS TRASDÓS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN

BOGOTÁ

Mediante oficio **CIG-IDRD-VEL-0039-2026** del 22 de enero de 2026 se aprobó la caracterización para el material de lleno de los trasdós de los muros de contención que conforman los túneles del proyecto

No	ENSAYO	REQUISITO	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
1	Desgaste de la máquina de los Angeles	< 50%	38%	OK
2	Degradación en el Equipo de Micro Deval	< 45%	25%	OK
3	Límites Líquido	< 30%	0%	OK
4	Indice de Plasticidad	< 6%	NP	OK
5	Equivalente de Arena	>20%	22%	OK
6	Contenido de Terrones de Arcillas y Partículas Deleznable	< 2%	0,6%	OK

Trasdos Túneles

Material Granular Tipo PEA	390,00 m3

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (Red perimetral Ajuste/Diseño)	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026. (*) Revisado por CIG y se generan Observaciones. Se espera Rta. UTMP.	UTMP	22/01/2025	PENDIENTE

(*) Oficio de Interventoría No CIG-IDRD-VEL-83-2026 de Respuesta Oficio Obra No 2188 Referente a Planos de Taller (06/02/2026)

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


AVANCE GENERAL


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.167,428	3.000,103	0.00 % 36.73 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
22.847,04	6.787,79	0.00 % 29.71 % 100.00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
20.407,72	6.395,32	0.00 % 31.34 % 100.00 %

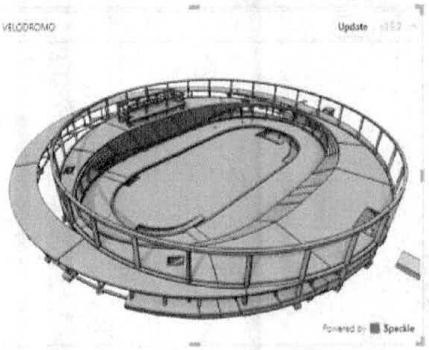

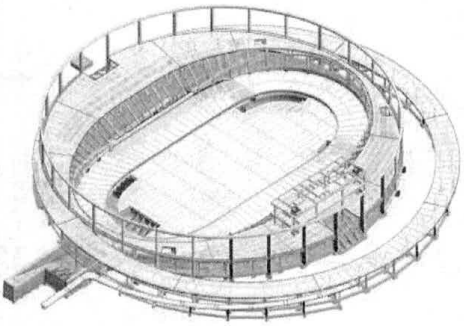



Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	01/12/2025	Graderia
DADOS	02/01/2026	Módulo 01
ESCALERAS	02/02/2026	Módulo 02
GRADERIAS	03/01/2026	Módulo 03
LOSAS	03/10/2025	Módulo 04
MUROS	03/12/2025	Módulo 05
RAMPAS	04/02/2026	Módulo 06

EJECUTADO PRESENTE PERIODO | ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES | PROYECTADO | EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	361,768	0.00 % 47.96 % 100.00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	0.00 % 100.00 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	751,45	0.00 % 48.44 % 100.00 %



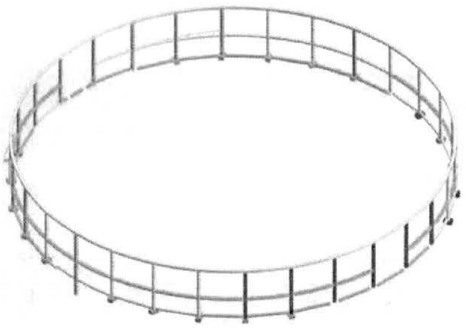



Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	02/01/2026	Graderia
LOSAS	04/02/2026	Módulo 01
VIGAS AÉREAS	05/01/2026	Módulo 02
VIGAS CIMENTACI...	06/01/2026	Módulo 03
	11/11/2025	Módulo 04
	12/12/2025	Módulo 05
	13/12/2025	Módulo 06



EJECUTADO PRESENTE PERIODO | ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES | PROYECTADO | EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 3


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
350,452	107,852	


Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
1.104,12	317,37	

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
995,68	300,58	



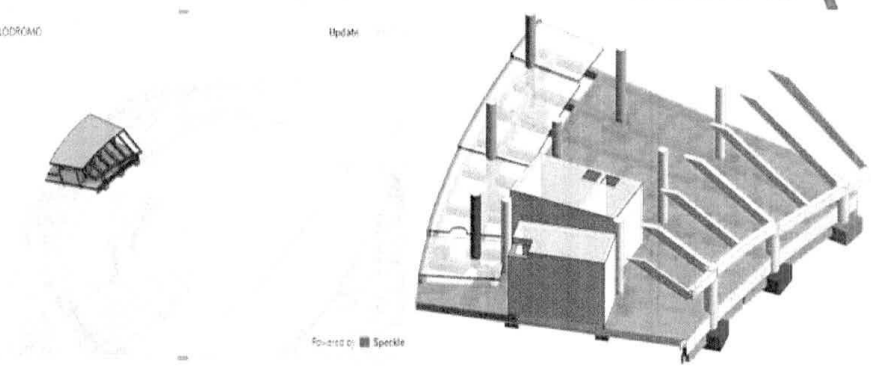

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	04/02/2026	Graderia
DADOS	05/12/2025	Módulo 01
LOSAS	06/02/2026	Módulo 02
MUROS	06/12/2025	Módulo 03
VIGAS AÉREAS	07/01/2026	Módulo 04
VIGAS CIMENTACI...	13/12/2025	Módulo 05
	20/12/2025	Módulo 06



EJECUTADO PRESENTE PERIODO | ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES | PROYECTADO | EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 6


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
14,885	116,962	


Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
789,33	281,88	

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.058,64	300,54	



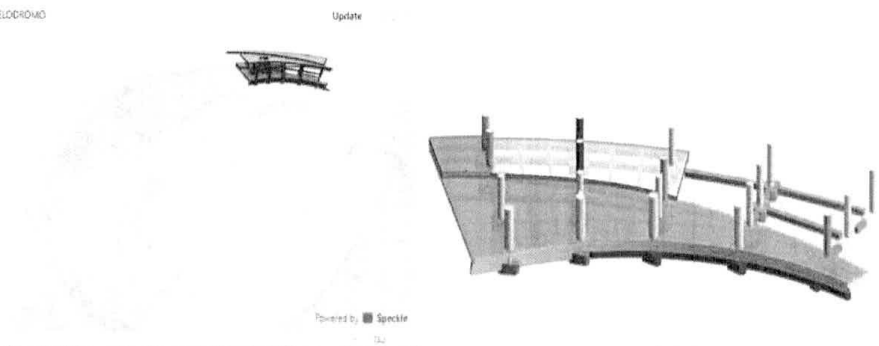

Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	02/02/2026	Graderia
DADOS	05/01/2026	Módulo 01
ESCALERAS	05/02/2026	Módulo 02
LOSAS	15/01/2026	Módulo 03
MUROS	15/11/2025	Módulo 04
VIGAS AÉREAS	17/12/2025	Módulo 05
VIGAS CIMENTACI...	19/01/2026	Módulo 06



EJECUTADO PRESENTE PERIODO | ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES | PROYECTADO | EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


RAMPA PEATONAL

BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
142,135	25,538	17,97 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
573,49	6,80	1,19 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
221,93	80,97	36,48 %

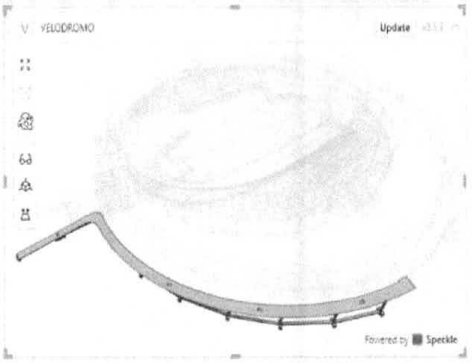





Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	04/02/2026	Módulo 13 - Pas...
DADOS	05/02/2025	Módulo 14 - Pas...
LOSAS	06/02/2026	Módulo 15 - Pas...
VIGAS AÉREAS	14/01/2026	Módulo 16 - Pas...
VIGAS CIMENTACI...	16/01/2026	Pista
		Rampa Peatonal
		Torre grúa
		Túnel Administra...



EJECUTADO PRESENTE PERIODO | ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES | PROYECTADO | EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
585,695	521,922	89,13 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
1.847,89	1.568,20	84,86 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
982,91	848,08	86,28 %

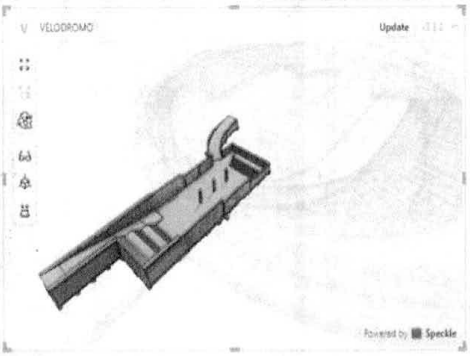

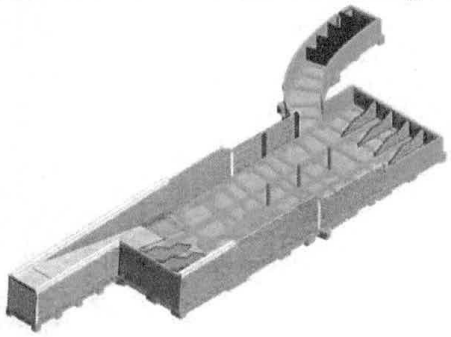



Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	02/01/2026	Módulo 16 - Pas...
DADOS	05/02/2026	Pista
ESCALERAS	06/01/2026	Rampa Peatonal
LOSAS	07/01/2026	Torre grúa
MUROS	08/01/2026	Túnel Administra...
RAMPAS	13/01/2026	Túnel de Ambula...
VIGAS CIMENTACI...	16/12/2025	Túnel Deportivo
		Zona Central



EJECUTADO PRESENTE PERIODO | ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES | PROYECTADO | EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL DEPORTISTAS


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
199,698	195,670	97,98 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
590,15	561,17	95,09 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
330,06	318,84	96,60 %







Tipo Elemento	Fecha Fundida	Ubicación
COLUMNAS	07/11/2025	Módulo 16 - Pas...
DADOS	09/12/2025	Pista
ESCALERAS	11/11/2025	Rampa Peatonal
LOSAS	11/12/2025	Torre grúa
MUROS	16/12/2025	Túnel Administra...
RAMPAS	22/11/2025	Túnel de Ambula...
VIGAS CIMENTACI...	26/11/2025	Túnel Deportivo
		Zona Central



EJECUTADO PRESENTE PERIODO | ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES | PROYECTADO | EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 se hace remisión de los INSUMOS a la entidad contratante IDRD (*) En espera de comentarios y/o aprobación de INSUMOS para remisión APU´S	UTMP	15/01/2026	PENDIENTE
Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (**)	UTMP	22/01/2026	PENDIENTE
Remisión de borrador de modificatorio No 3 Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD (**) Pendiente Observaciones IDRD Documento.	UTMP – CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Remisión de borrador de modificatorio No 1 Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador actualizado según observaciones por parte de interventoría CIG el 04/02/2026. Pendiente Observaciones IDRD.	CIG- IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Remisión al IDRD de borrador de VIABILIDAD al modificatorio No 3 (Adicion No 2 y Prorroga No 1) por parte de CIG al contratista de Obra UTMP – Pendiente Observaciones IDRD	CIG- IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE
Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(***) Pendiente Respuesta IDRD.	UTMP – CIG - IDRD	16/01/2025	PENDIENTE

(*) Se comparte por medio de WETRANFER por parte de la UTMP los archivos actualizados de los APU´s del Modificatorio No 3 de Obra Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra.

(**) Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra.

(*** Respuesta IDRD Rad. No No 20264200033881 del 06-02-2026 y trasladado por CIG Oficio No CIG-IDRD-VEL-87-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORMES INTERVENTORIA

		INFORMES TÉCNICOS DE INTERVENTORIA													
e_No	Fecha Rad. IDRD	Técnico	Fecha	Fauna	Fecha	Forestal	Fecha	SST	Fecha	Social	Fecha	Ambiental	Fecha	Calidad	Fecha
18	12/08/2025	Sub. CIG	7/02/2026	OK	20/01/2025	OK	15/12/2025	OK	27/12/2025	OK	26/08/2025	OK	26/12/2025	Obs. IDRD	31/12/202
19	10/09/2025	PR-IDRD		OK	10/02/2026	OK	24/12/2025	OK	16/01/2026	OK	10/09/2025	OK	19/01/2026	PR-IDRD	
20	16/10/2025	PR-IDRD		Sub. CIG	28/01/2026	OK	27/01/2026	OK	9/02/2026	OK	7/01/2026	OK	22/01/2026	PR-IDRD	
21	11/11/2025	PR-IDRD		Sub. CIG	11/01/2026	Sub. CIG	29/01/2026	Obs. IDRD	11/02/2026	OK	7/01/2026	Sub. CIG	30/01/2026	PR-IDRD	
22	12/12/2025	PR-IDRD		PR-IDRD		Obs. IDRD	9/02/2026	PR-IDRD		OK	7/01/2026	Obs. IDRD	22/02/2026	PR-IDRD	
23		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		OK		PR-IDRD		PR-IDRD	
(*)		7/01/2026		15/01/2026		16/01/2026		16/01/2026		2/01/2026	Pre-Aprobado	15/01/2026		15/01/2026	
24		PR-IDRD				PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD	3/02/2026	PR-IDRD			
(*)		7/02/2026				4/02/2026		11/02/2026		29/01/2026		11/02/2026			





(*)	De acuerdo a lineamiento de la entidad contratante se inicia remision via correo electronico de los informes por Componente para revision PRELIMAR, antes de radicacion FORMAL

Fecha.	Corresponde a la fecha de Revision y/o Aprobacion por parte del IDRD


PR-IDRD	Pendiente Revision IDRD
Obs. IDRD	Observaciones IDRD (Sin Atender CIG)
Sub. CIG	Subsanacion CIG
OK	Aprobado


INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

11/02/2026

ACTAS PARCIALES
OBRA / INTERVENTORIA

Mes	Desde	Hasta	No	Acta_Obra	Acta_Interventoría	Vr_Fasctura_Interventoria
jul-25	26/06/2025	25/07/2025	15	OK	PENDIENTE	$ 189.405.670,00
ago-25	26/07/2025	25/08/2025	16	OK	PENDIENTE	$ 11.096.625,00
sep-25	26/08/2025	25/09/2025	17	OK	PENDIENTE	$ 9.116.564,00
oct-25	26/09/2025	25/10/2025	18	OK	PENDIENTE	$ 47.440.544,00
nov-25	26/10/2025	25/11/2025	19	OK	PENDIENTE	$ 118.315.394,00
dic-25	26/11/2025	10/12/2025	20	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 59.987.253,00
	11/12/2025	25/12/2025	21	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 61.713.965,00
ene-26	26/12/2025	25/01/2026	22	Rev. CIG	PENDIENTE	$ 73.608.840,00
	Valor de Actas parciales de interventoria a presentar					$ 570.684.855,00



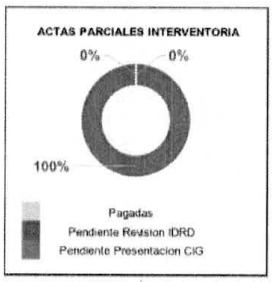

05/02/2026


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REPORTE

.OR CONTRACTUAL	$	132.821.645.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 87.840.726.655	59,44%
% EJECUCIÓN	$ 78.829.180.899	53,34%
% COSTO	$ 78.829.180.899	53,34%

AVANCE	6,10%

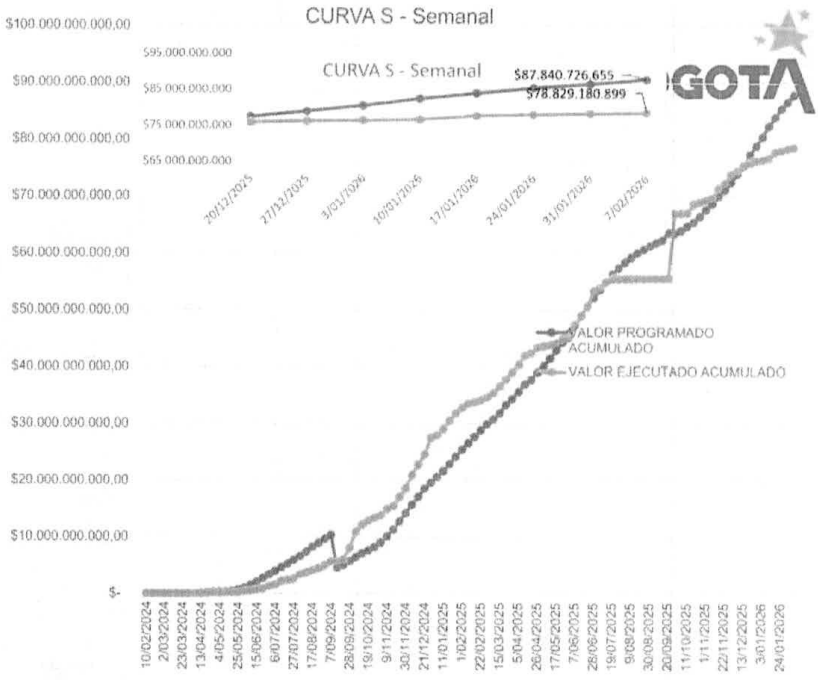

07/02/2026 programación v3

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20
No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011 A F-026	2025	ENERO-DICIEMBRE	$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -027	2026	ENERO	$ 1.427.894.875,00	$ 428.368.463,00	$ 999.526.412,00
TOTAL VELODROMO			$ 74.028.680.886,00	$ 22.185.461.698,80	$ 51.843.219.187,20

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO


MES DE ENERO DE 2026

FACTURACIÓN: 50,09%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

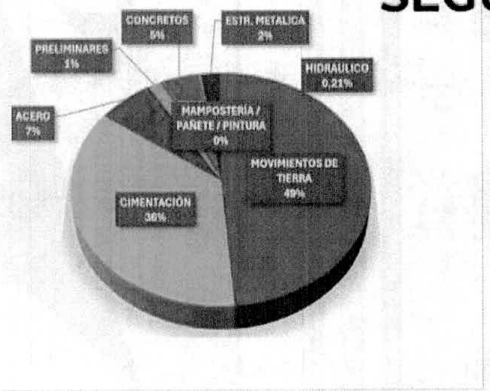

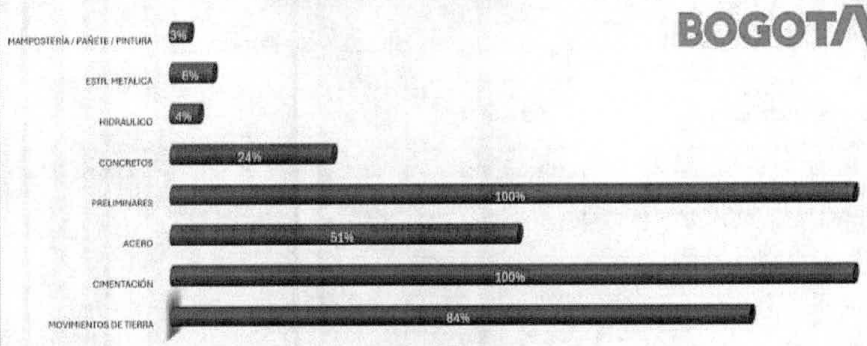

Etiquetas de fila	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.150.555.965,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.990.496.857,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.628.375.264,00		$ 218.700.322,00		$ 4.847.075.586,00
CONCRETOS	$ 3.127.320.457,00		$ 368.981.716,00		$ 3.496.302.173,00
ESTR. METALICA	$ 1.638.670.171,00				$ 1.638.670.171,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 353.433.659,00	$ 1.018.517.717,00
HIDRAULICO	$ 156.446.427,00				$ 156.446.427,00
MAMPOSTERÍA / PAÑETE / PINTURA	$ 27.584.811,00				$ 27.584.811,00
Total general	**$ 62.255.618.170,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.980.974.140,00**	**$ 6.307.796.780,00**	**$ 73.903.730.844,00**

BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA
	IMPERMEABILIZACION MUROS DE CONTENCION CON IGOL IMPRIMANTE + IGOL DENSO O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, EQUIPOS, TRASIEGO, MANO DE OBRA).	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULOS 1, 2, 4, 5 Y 6	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 100 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

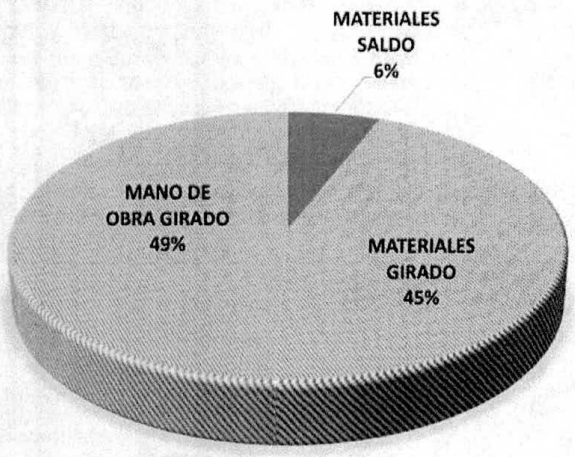

Solicitud de anticipo pista CE-206-125-2208
ORDEN DE GIRO No. 35 $ 2.319.000.095,49

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (*) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP	UTMP-CIG-IDRD	Sin fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942.

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	27,09 Ton
ene-26	05 de Enero al 01 de Febrero de 2026	48,91 Ton
feb-26	02 de Febrero al 08 de Febrero de 2026	9,31 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	313,21 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***313,21 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **28,81%**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
24	15	8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
25		8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					30 Unds		Total	270,77 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA




Elementos Ingresados del 02 al 08 de febrero de 2026:

2 Unds para 19,28 TON

TOTAL : 270,77 TON.







INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 28 al 29

BOGOTÁ

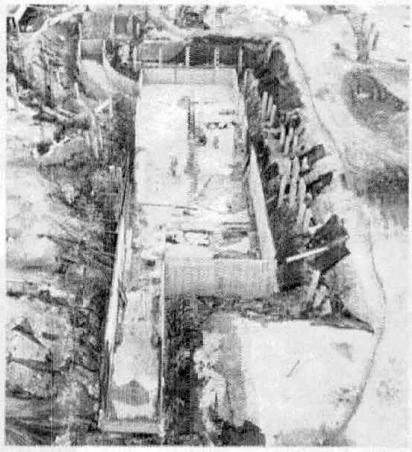

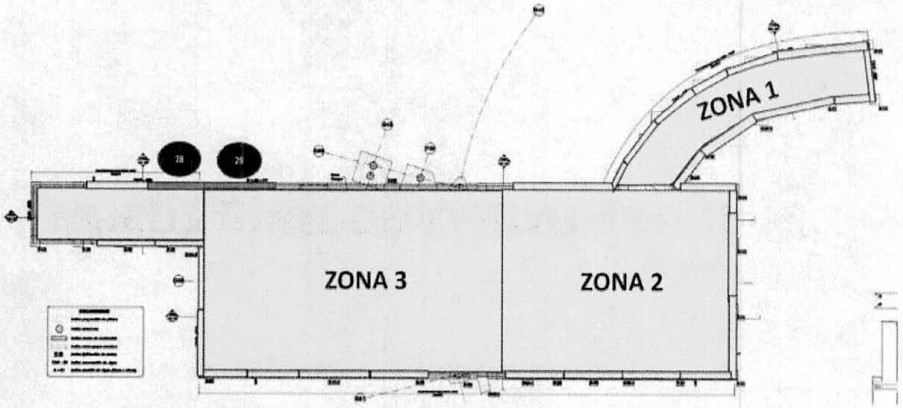

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo


PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS TUNEL DEPORTIVO – 3er Tramo

BOGOTÁ

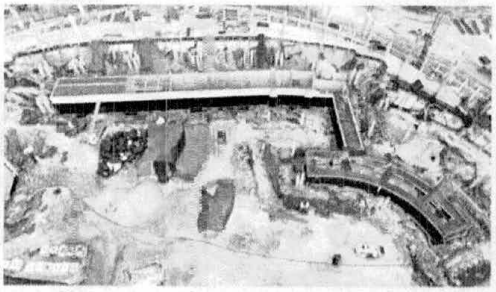

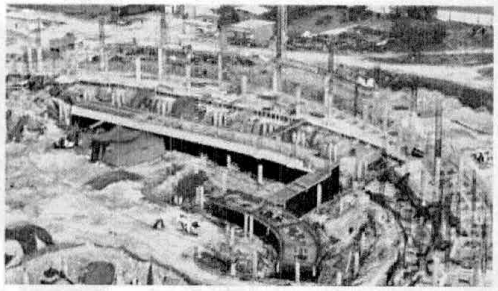

PLANO TD – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E – 3,60
TÚNEL DEPORTIVO

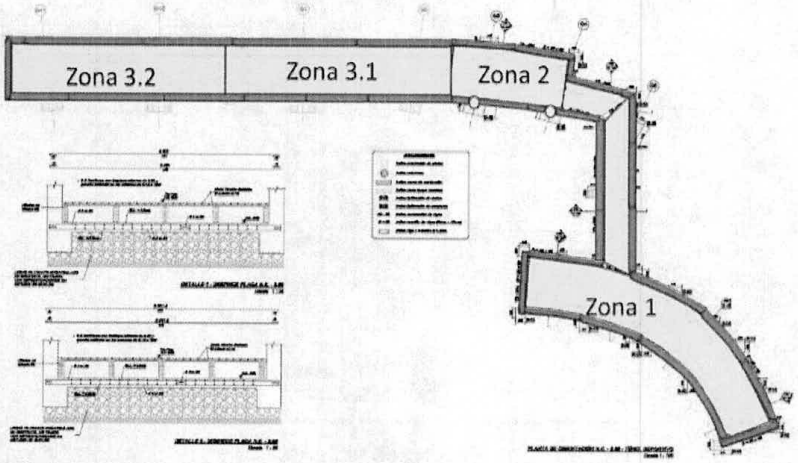


Zona Impermeabilizada Previamente

Zona Impermeabilizada en el Periodo

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 5

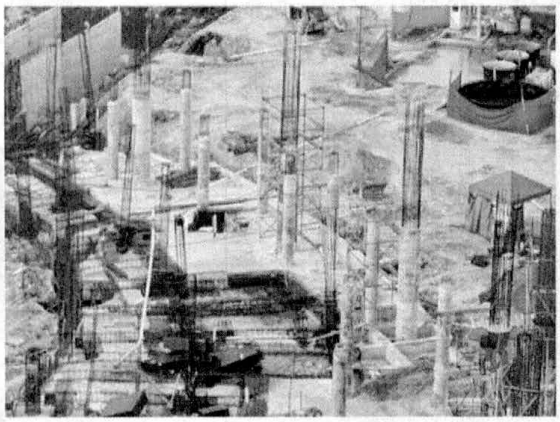



Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo


PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COLUMNAS MÓDULO 1 – Segundo Tramo y VIGA AEREA





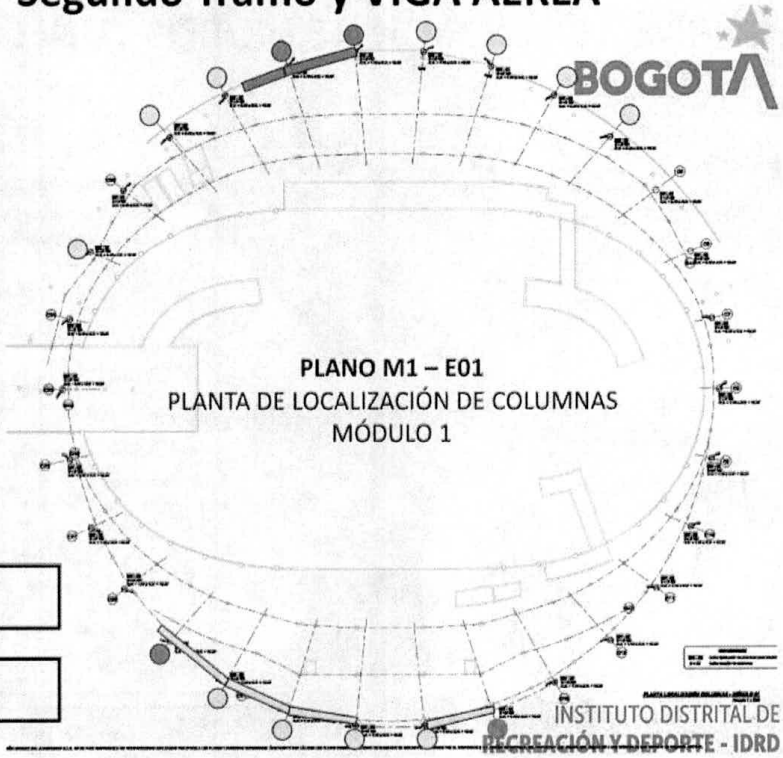

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

PLANO M1 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS
MÓDULO 1


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS C9, C12 Y C13 - MÓDULO 1



Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

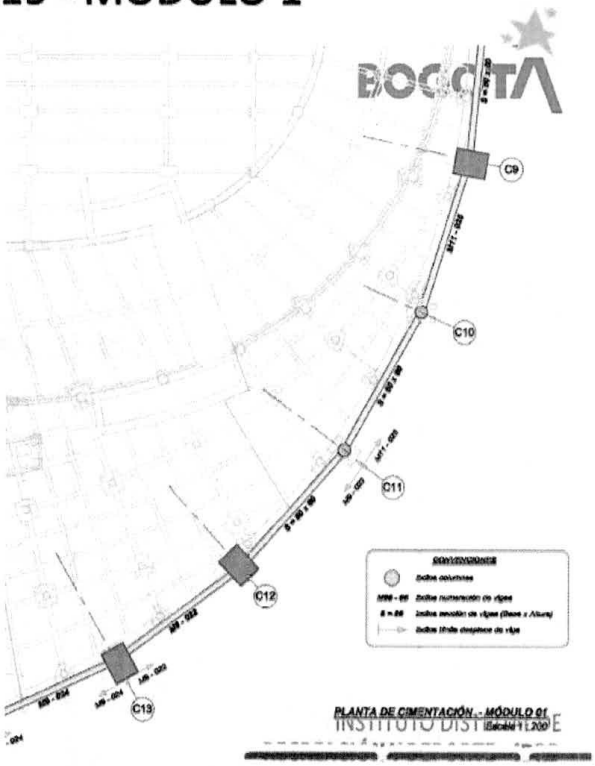


PLANO M1 – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN – MÓDULO 1


FUNDIDA DE COLUMA, VIGAS, DADOS Y MENSULA MÓDULO 3 – ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

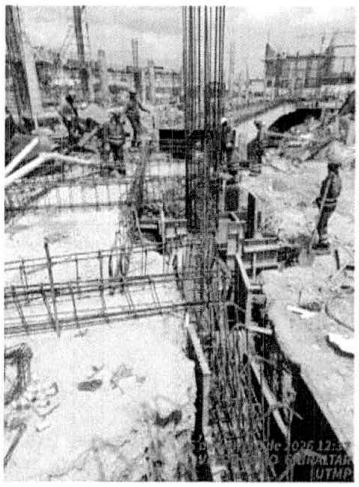

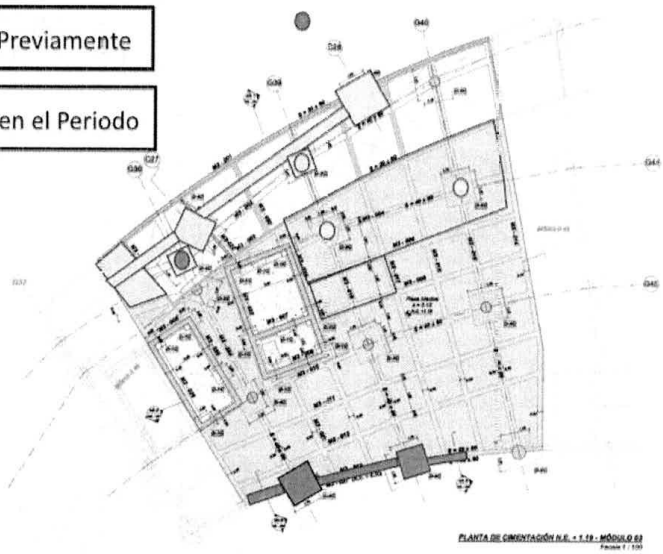

PLANO M3 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N E + 1,19 MÓDULO 3

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS, VIGAS Y DADOS MÓDULO 6
ZONA DE EDIFICIO


BOGOTÁ

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo





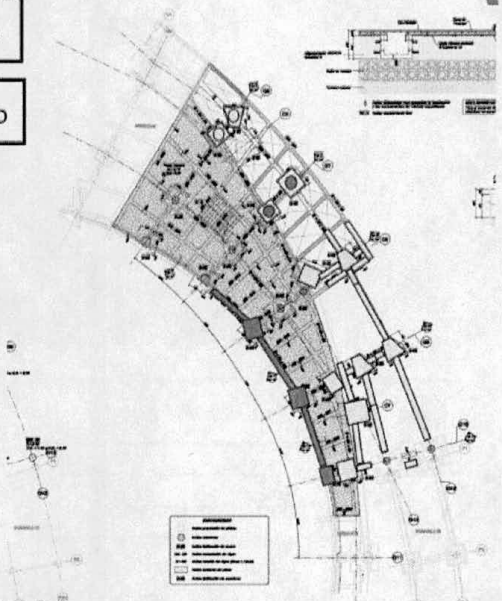

PLANO M6-E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 6


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


FUNDIDA DE DADOS, VIGAS RAMPA PEATONAL – TRAMOS 1 Y 2

BOGOTÁ

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

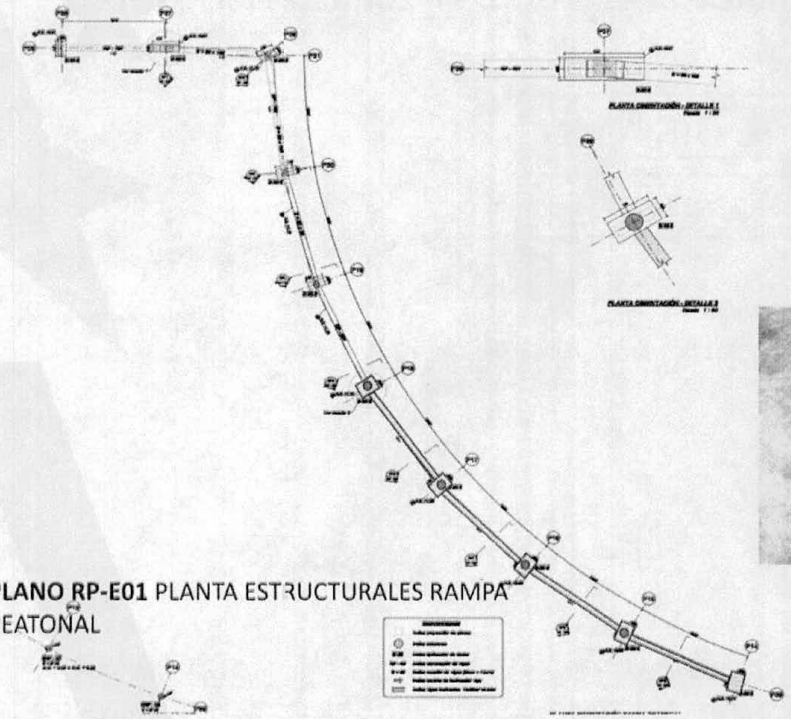


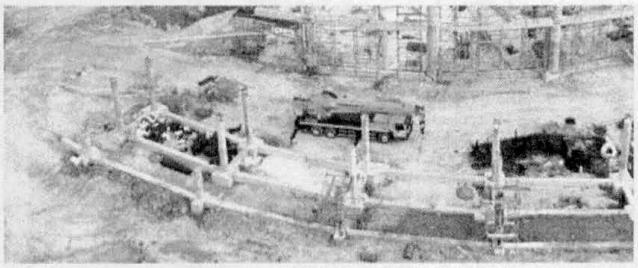

PLANO RP-E01 PLANTA ESTRUCTURALES RAMPA PEATONAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

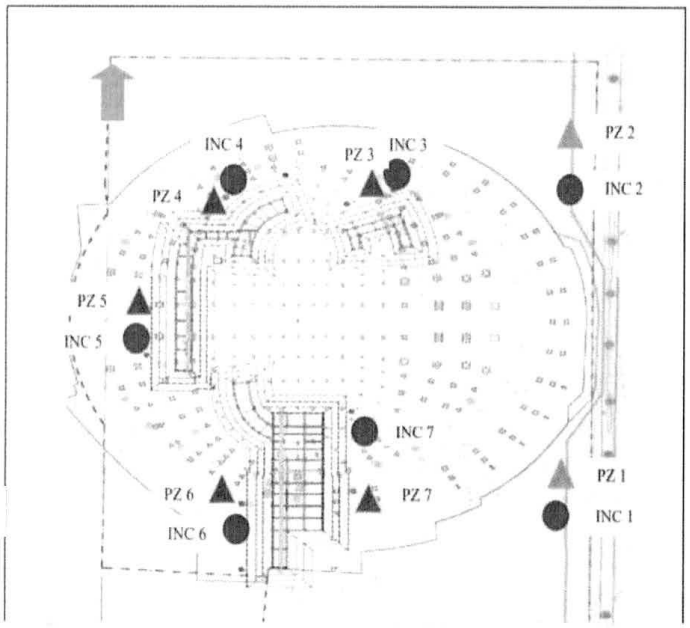

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 16 al 23 de enero de 2026; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 36.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.20 m y 8.83 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 2 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.31 y 6.22 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo. (*)	IDRD	29-01-2026	pendiente

(*) Se remite por parte del contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Durante la semana 2 al 7 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó recepción y envío del plano en PDF de conexiones de fibra óptica entre racks.
- esta pendiente visita de operador de red para confirmar punto de conexión del proyecto.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Imagen : plano de conexiones de fibra óptica

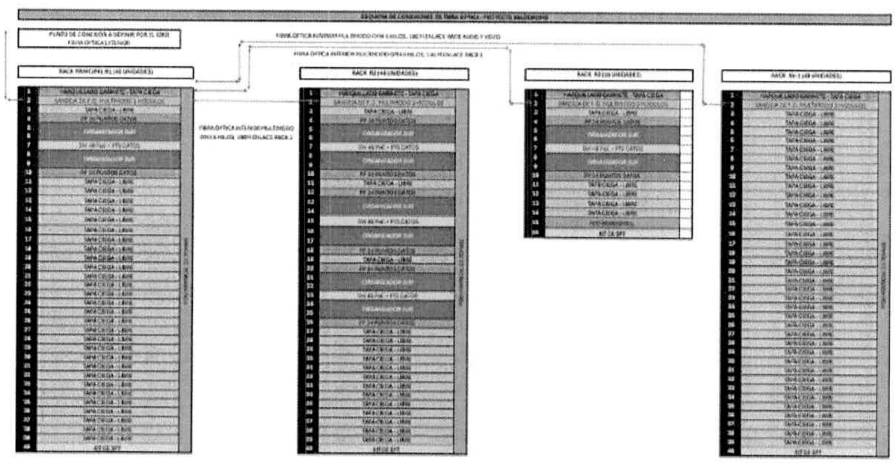

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

- Se realizó segunda radicación de documentos para aprobación de serie 3 en Enel.
- No de radicación: 1500889847
- Caso: 930211127
- Consulta de seguimiento No 84889428
- Se recuerda que se requiere actualización de licencia de construcción para su aprobación.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

- Imagen de correo respuesta de Enel sobre radicado.

Logotipo Descripción generada automáticamente
Bogotá D.C. 06 de febrero de 2026

Señor
Jorge Hernando Perez
Bogotá D.C.

Asunto: Proyecto de conexión radicado nro. 1500889847
Caso nro. 930211127

Respetado Señor Perez, reciba un cordial saludo.

Hemos recibido su requerimiento del día 06/02/2026 en el cual solicita radicación del diseño de proyecto de conexión VELODROMO-PARQUE GIBRALTAR.

Al respecto, le informamos que hemos iniciado las gestiones correspondientes bajo tarea 1094936.

Tenga presente que puede descargar las cartas de respuesta a las etapas de nuevas conexiones a través de Mi Enel (clic aquí), basta con registrarse (Tracking de NNCC) y realizar la consulta con el consecutivo 84889428.

Vale la pena aclarar, que su solicitud fue radicada un día hábil después de la recepción. Lo anterior, debido a que fue enviada después del cierre de nuestro horario hábil, el cual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recuerde que la conexión del servicio requiere cumplir con los requisitos previstos en la normatividad vigente. Una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos documentales y técnicos, solo el personal técnico autorizado por la empresa es quien realizará la puesta en servicio de la conexión evitando generar situaciones de riesgo para la salud, la vida de las personas, la seguridad de la misma instalación y las edificaciones contiguas.



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

Hidrosanitario

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (*) Trasladado a la UTMP	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP	IDRD – CIG -UTMP	22/01/2026	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Rad. IDRD No 20264200030721 del 10/02/2026 - Traslado Oficio CIG-IDRD-VEL-102-2026 el 11/02/2026


(**) Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025)

REDES HIDROSANITARIAS

BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se sigue con las instalación de los filtros perimetrales en el Túnel de Ciclistas, dejando culminada la cara exterior del túnel en la conformación del geodren, el tecdrén y la matriz granular.








INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REDES HIDROSANITARIAS


BOGOTÁ

Avance de Obra:

Así mismo, se inicia instalación de geodrén y tecdrén en los muros curvos exteriores del túnel de Apoyo.

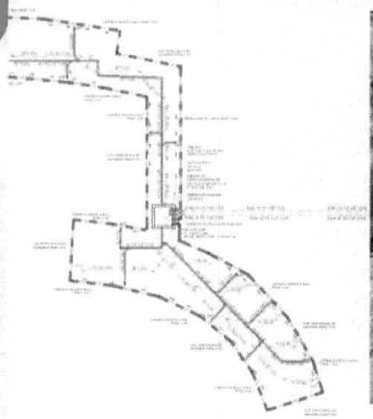

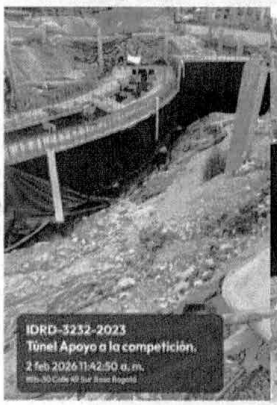

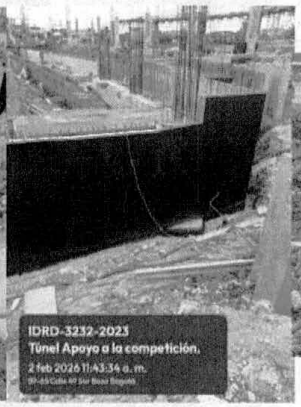



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
GRACIAS
INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.			DD	MM	AA
ACTA No. 98	Comite Transversal & Tecnico Velodromo	3232/23 3219/23	14	02	2026

LUGAR: Presencial Obra Velodromo. **HORA DE INICIO:** 8:00 am **HORA FIN:** 10:30 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
* Se adjunta Listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Presentacion Componentes Transv.	4.
2. Presentacion Componentes Tecnicos	5.
3. Observaciones Varias	6.

TEMAS TRATADOS

Se da inicio al comite solicitando a los asistentes permiso para realizar Grabacion Pertinente del encuentro con respuesta positiva, la metodologia utilizada es la lectura de los compromisos por componente, su desarrollo y de manera posterior el avance semanal respectivo.

TRANVERSAL

Componente Social: Lectura de los compromisos

1) Reunion de apoyo a programa de la Universidad Nacional (Visitas tecnicas) Proyecto IDRD (CDR y Velodromo) Cumplido el dia 13/02/2026 en la Universidad Nacional de manera presencial a partir de las 9:00am.

Desarrollo Semanal:

- Convocatoria y radicacion del comite de participacion ciudadana N° 23 dirigido a entidades distritales y locales y actores del sector ciclistico
- Publicacion informativa en carteles (Margarita Etapa 1 y 2) como parte del programa de divulgacion del CPC # 23.
- Desarrollo de actividades de Atencion al ciudadano en el area de

TEMAS TRATADOS

"influencia del Proyecto fortaleciendo la gestion participativa y alcance acompañamiento ciudadano.

Por parte de la Supervisión del componente se solicita:

* Manejar las presentaciones la información precisa teniendo en cuenta la ley de Garantías por procesos electorales.
* A partir del Informe #26 hacer revisión e implementación de los formatos actualizados (Por Calidad) del IDRD.
* Por parte de la Dependencia de Comunicaciones IDRD en caso de solicitar apoyo informativo, en el proximo evento de rendición de cuentas a ejecutarse el 15/Marzo/2025, estar pendientes de la remisión de Información en oportunidad.
* Proximo CPC #23 tener presencia equipos tecnicos/Ambientales durante reunion para responder Dudos de la Comunidad. teniendo en cuenta PQRS Asociadas y derecho tutela radicado.

Componente Ambiental: Lectura de los compromisos.

1) Propuesta de Diseño de Pasos elevados para propuesta segun lineamiento para tratamiento y disposicion de los lixiviados.

Pendiente: Interventoria socializa lo desarrollado en reunion efectuado en el IDRD al respecto del Tema, la UTMP manifiesta que los propuesta efectuada se remite con el suficiente sustento Tecnico. La supervision solicita establecer fechas y un analisis multidisiplinario economico/Tecnico analisis integral para estableer fecha respectiva de cumplimiento del Compromiso

2) Subsanacion de Recomendacion (Recorrido 12/02/2026) Proteccion de Material Granular en Obra Subsanado por la UTMP.

3) Subsanacion de recomendaciones (Recorrido 12/02/2026) refuerzo estructura de cerramiento en el sistema de acopio de material para suministro en Planta de Concreto (Obra) UTMP manifiesta que actualmente no tiene personal actualmente pero se compromete a mas tardar Jueves 26/02/2026.

4) Subsanacion de recomendaciones (Recorrido 12/02/2026) mantenimiento

TEMAS TRATADOS

de emergencia Bomba estacionaria Planta de Concreto, UTMP realizo el viernes 13/02/2026 el soporte de mantenimiento sera incluida en el informe de Obra Nº 25 por parte del area ambiental.

Por parte de la supervisión: se solicita integrar un compromiso al respecto de la adecuacion y correcto acopio de los aceros acopiados, de los aceros en obra estan sobre el terreno y los burros existentes no dan a basto se necesita un plan de contingencia para estos acopios.

Componente Riesgos: Lectura de los compromisos

1) Entrega a la interventoria de la radicacion a la SDA de los resultados del Segundo monitoreo realizado a la red adyacente del Proyecto y del soporte SDA asociado a la radicacion del plan de trabajo del tercer monitoreo a realizar a la red Adyacente.
Avance: Por parte de la Supervision manifiesta que estos radicados les enviaran a traves de oficio a la interventoria.

2) Verificacion y/o veitacion de la respuesta del Concepto tecnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD.
Avance: La supervision manifiesta que se esta atento a la definicion por parte de la SDA para llevar a cabo mesa de trabajo y definir los puntos de monitoreo y la periodicidad respectiva de ejecucion.

Desarrollo Semanal:

Desde el Area ambiental se realizaron capacitaciones en:
- Capacitacion de Residuos aprovechables / adecuacion de acopios de Chatarra y madera, mantenimiento de sumideros, limpieza de canecas y proteccion de materiales.
- Retiro de RCD (Residuos de Construccion y Demolicion) ejecutado: 65.683,519 Kg Programado: 76.040.380 Kg Avance Global: 86,37%. Retiro adicional de 7m³ de RCD de Demolicion. Metas alcanzadas

3|

TEMAS TRATADOS

Aprovechamiento 99,82% y Circularidad 19,53% Gestion de Lixiviados 25.090 Kg

Desde el Area de Riesgos se continua implementando acciones de mantenimiento y reduccion del Riesgo en escenarios EP07-EE06

- Evacuacion Lixiviados mediante activacion de Motobombas y Uso del Catch tang disposicion final mediante carro cisterna 25.090 Kg el pasado 12/02/2026.
- Monitoreo datos de precipitacion con pluviometros instalados en obra.
- Inspeccion tecnica de taludes control de daños
- Proteccion de materiales granulares y RESPEL.

Componente Calidad: Lectura de Compromisos:

1) Plan de Calidad presentado ante el IDRD.
Pendiente: En Revisión
2) Procedimiento para Manejo Estructura Metalica
Cumplido: Aprobado IDRD.
3) Plan de Inspeccion y Ensayo N5
Cumplido: Aprobado IDRD.
4) Remisa de Formato de Inspecion Visual de Estructura Metalica. Cumplido: Aprobado IDRD y en implementación en Obra.

Desarrollo Semanal del componente:

- Respecto al concreto estructual se socializa la fundida semana de 142,79 m3 (muros, columnas, placas y vigas en diferentes modulos y tuneles). Total ejecutado a la fecha 2942,67 m3 Se realizaran ensayos de asentamiento (NTC 396), toma de muestras de Concreto (NTC 673) Como parte de los controles de Calidad del Contratista de Obra UTM.
- Control de Aceros: Ingreso semana 29,7 Toneladas (Para Armado de Vigas de Cubierta Mod.1 y viga Aerea Total de Acero ingresado a Obra 470,77 Toneladas (30 Unidades entre cerchas y pivotes centrales).
- Control de Cambios y Redisaños. Segun el Resumen presentado, en diapositiva, la mayoria de los com

4|

ponentes estructurales, arquitectonicos, electricos y de sistemas se encuentran aprobados mediante oficios formales, asi mismo se identificos los componentes que estan pendientes, en avance y/o subsanando.

- Material de lleno: Trades de Muros de Tuneles se tiene caracterizacion de Tipo de Material Grande tipo PEA ($6.15 m^3$) y ensayos de compactacion respectivos cuyos resultados estan en un rango entre el 87% y 93,56% dentro del seguimiento de control de densidades.

Componente SST: Lectura de Compromisos:

1) Observaciones de Revisión Informes mensuales por parte del IDRD: En Avance; el IDRD revisa la información generada a la fecha y radicada ante la entidad informa las observaciones y gestiona.

2) Presentacion de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr Hecto Umaña Completo se remite información UTMP el dia 12/2/26.

Desarrollo Semanal:

- Personal y Recursos en Obra:

Se registro el promedio de personal operativo y tecnico incluyendo profesionales, maestros, oficiales, ayudantes, operadores, conductores y personal de vigilancia. Se presenta el seguimiento a maquinaria, equipos y vehiculos asignados al proyecto Velodromo por parte de la UTMP.

- Accidentalidad y Ausentismo: Total de accidentes reportados Estado Actual 5 Cerrados y 3 Abiertas no se registraron accidentes enero 2026 Total ausentismo acumulado 62 Se mantiene seguimiento mensual a indicadores de accidentalidad y ausentismo.

- Actividades de Prevencion y Control con la entrega y verificacion de usos EPP y EPCC, inducciones a personal inspección de andamios y trabajo en altura, inspeccion frecuentes en frentes de obra y accesos a tuneles

5/

TEMAS TRATADOS

Acciones correctivas: Se avanzó en subsanacion respectivos generando acciones correctivas en accesos tuneles sin barandos, andamios sin señalizacion, solicitud de retiro de formaleto, señalizacion en excavacion de piletes y demas.
La supervision recomiendo realizar una jornada de orden y aseo alrededor de los campamentos debido a que se evidencio durante el recorrido muchos residuos tambien solicita que el personal se mantuviera anclado durante las actividades en alturas especialmente en los tuneles, la interventoria informo que para el caso de los placas que ya estan totalmente fundidos en tuneles se instalaría barandos en los bordes de placa para evitar el uso de Arnes.
La interventoria manifesto que se deben instalar los rodapies en el ultimo nivel de la viga acrea de la cubierta del Modulo 1. para evita cardos de material adicional se solicito la instalacion de los vientos para reforzar la estabilidad de lo estructura del modulo 1.
Total personal para hoy es de Operativos 94 Administrativos 47 para total de 141.
Componente BIM: Lectura de los compromisos TECNICO
1) Entrega CDA planos construccion componente Gas (JANTI) Segun diseños planteados: Pendiente segun revisio en JANTI el 10 de Marzo 2026.
Desarrollo Semanal: La UTMP Presenta ante el comite el reporte de seguimiento y control de avance constructivo del Proyecto Veledrama mediante la modelacion y verificacion digital estructurado bajo cuatro variables de control 1) Ejecutado en el presente periodo (%) acumulado en Periodos Anteriores 3) Proyectado 4) En ejecucion

61

TEMAS TRATADOS

- Seguimiento Estructural: Se realiza control detallado por frentes en modulos Constructivos involucrados Modulo 1,3,5,6 Zona central, rampa peatonal, tunel principal y tunel de departistes.
- Seguimiento Hidrosanitario: Se incluyo y explico el Manejo del componente en Marcha bajo la Metodologia de control (ejecutado, acumulado y proyectado)

Componente programación: Lectura de Compromisos:

1) Revisión de Proyección de Insumos y Apu's para modificato 3 Obra (Adicion 2 Prorroga 1): La supervisión manifiesto que al interior esta en revisión por parte del area encargada, en Avance.
2) Revision Proyeccion Documento Modificatorio 3 Obra (Adicion 2 Prorroga 1): La supervision manifiesta que esta en revisión por parte de la entidad e informara cualquie novedad al respecto.
3) Revisión de Proyeccion documento Modificatorio 1 de Interventoria: La supervisin manifiesto que esta en revisión por parte de la entidad e informaran cualquier novedad al respecto.
4) Revisión de Borrador de Viabilidad al modificatorio Nº 3 (Adicion 2 y Prorroga 1) de Obra por parte de interventoria: La Supervisión manifiesta que esta en revisión cualquier novedad sera informada.

Desarrollo semanal: Se expone por parte de la OTMP el estado financiero, Fisico y presupuesto con base a la Programacion V-3 14/02/2026 y el proyecto adicionado. Programado 60.28% vs Ejecutado 53,85% con una desviación (atrazo) -6,42% evidenciado en diferencia entre el avance proyectado y el avance real lo que requiere seguimiento del control por parte de los involucrados

- A la Fecha la Facturacion acumulado es de $74.028.680.886 Valor por pagar acumulado $51.843.219.187 a Enero el acta presentado en revisión asciende a $1487.894.875 el

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

TEMAS TRATADOS

Porcentaje facturado a la fecha es del 50,89%.
Los principales Rubros ejecutados ascienden a Movimiento de tierra (Mayor Participación presupuestal, cimentación, acero, anclajes, estructura metálica, hidráulica y preliminares.
Se expone las actividades mas relevantes en ejecución de corresponde a la construcción de columnas, muros y vigas en tuneles y modulos 1 al 7, losa y vigas de Fundación, impermeabilización de muros y juntas, inicio de vigas aereas en modulo 7 y la continuidad en estructura metálica y remisión a obra.

Componente Técnico: Lectura de los compromisos:

1) Tramite DADEP para prorroga y modificación de licencia de Construcción: La supervisión informa que fue radicado el documento de Solicitud de Anuencia y se espera respuesta pertinente por parte de la entidad (tiempos administrativos).

2) Visita Construcción Pista Velódromo de Mosquera: La supervisión manifiesta que este compromiso debe ser retirado teniendo en cuenta a que es externo a obra.

Desarrollo Semanal:

a) Estructura Metálica de Cubierta: El total proyectado corresponde a la fecha a 1.087 Toneladas el material en planta es de 912,42 Toneladas (83,93% allegado) el total de producción 357,01 Ton (32,84% de Avance PCC)®

® % Cumplimiento Contractual

Se describe que en obra hay acopiado 270,77 Toneladas (24,91%) En producción en planta 86,24 Ton (7,93%) y por llegar a obra 729,99 Ton (67,16%)

a) Avance de frentes de fundidos en Concreto

Se reporta por parte de la UTMP en Fundidos en el Tunel Antabanca (muros e impermeabilización - Zona 30 a 32) Vigas) perimetrales Tunel deportivo, modulos 1, 3, 5, 6 (muros, columnas, dados, cuellos de columna y placa), rampa peatonal (Columna eje P14!, Placa superior Tunel administrativo.

@1

TEMAS TRATADOS

• Informe de Instruumentacion - Control de Acentamiento Velodrom
Se realiza monitreo de asentamientos en plataformas, parapetos, bordillos, pozos y zonas perimetrales, al respecto:
1.- Los valores parciales y acumulados reportan variaciones milimetricas.
2.- No se evidencian desplazamientos que indiquen comportamiento critico estructural
3.- Se mantiene seguimiento Tecnico permanente en puntos de control y ejes estructurales

Componente Electrico: Lectura de Compromisos:
1) Remisio de Plano de ubicacion del cuarto de comunicaciones y ruta de conexion hacia afuera del edificio esto pendiente teniendo en cuenta que es necesaria gestion institucional IDRD para visita de operado de telecomunicaciones a asignar para el punto de conexion: La supervision del IDRD manifiesta que se realiza Solicitud ante ERB con 6553088 numero de Solicitud.

Desarrollo Semanal:
- Se informa por parte de la UTMP que esta en avance en la instalacion de pases de tuberia en el tunel de deportistas estos destinados a la canalizacion de Redes electricas y de comunicaciones
- Ejecucion de salidas de Comunicaciones asociados a la pista preparando la infraestructura para futuros sistemas electricos y tecnologicos.

Componente Hidrosanitario: Lectura de Compromisos:
1) Actualizacion economica (Precios 2027) de la alternativa planteada de Conexion de Gas pq la Kra. 71: El contratista de Obra manifiesta que ante Vanti fue radicada la Solicitud de actualizacion de los 3 Cotizaciones entregados pq esta empresa de servicios publicos el dia 16/12/2025 y se esta en espera de Respuesta, se tiene programado por VANTI Agenda al diseñad. el dia 03/03/2026 para revision de los diseños

91

TEMAS TRATADOS

Conforme a los actualizaciones realizadas.
2) Mesa Tecnica conjunta IDRD orientada al analisis de la constructividad y la validacion de los escenarios asociados a las alternativas de manejo y conduccion de aguas subterraneas (lixiviados) que se generan (afloran) durante la operacion del Proyecto Velodromo: Por parte de la interventoria se informa que el dia lunes 16/02/2026 se llevo a cabo una mesa de trabajo con participacion de profesionales CAR y velodromo en donde se reviso tecnicamente la viabilidad de que Velodromo se pueda conectar a la PTAR proyectada en el sitio segun plano entregado por CAR el cual cuenta con las coordenadas de localizacion, este plano fue socializado con la UTMP mediante oficio 102 del 11/02/2026, asi mismo la interventa solicita a la UTMP realizar una revision Tecnica y economica de la red de conduccion de estos lixiviados con el fin de verificar la viabilidad de conectarnos a la peor teniendo en cuenta que esta conexi se encuentra a un nivel superior (Cota) lo cual, al parecer, quedaria en contrapendiente pa eso se debe revisar bien este tema, la supervision al respecto manifiesta que el dia miercoles 11/02/2026 se tuvo reunion inicial la idea es establecer fechas (2) para cuadrar un cronograma teniendo como base un analisis hidro/Geologico y se genere un Documento base para sustentar las proyecciones tecnicas a implementar en Velodromo con el fin de estableces si se hace la conexion a la PTAR planteada o una Solucion alternativa, la UTMP manifiesta que cuando se tengan estas reuniones sean convocados tambien para analisar en conjuntos los situaciones

10

TEMAS TRATADOS
3) Viabilidad y aprobacion de conexion definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües sanitario y pluvial ante la EAAB: La supervisión manifiesta que se tuvo reunion la semana anterior donde se plantearon de manera inicial la situación y se informarán los avances al respecto, la interventoria ve con preocupación los tiempos para las conexiones de servicios publicos, alcantarillado gas, no obstante la supervisión informa que ya viene haciendo gestiones con ambas empresas y que nos mantendra informados de los avances al respecto.
Desarrollo Semanal:
Se reporta por parte de la UTMP presenta actividades enfocadas a la adecuacion de infraestructura para las redes electricas y de comunicaciones en el proyecto, se avanza en la instalacion de Pases de tuberia en el tunel de depatistes destinados a la canalizacion de redes eledricas y de comunicaciones, se ejecutan los salidos de comunicaciones asociadas a la pista preparando la infraestructura para futuros sistemas electricos y Tecnologicos.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
los compromisos descritos y plasmados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO.	UTMP-CIG-IDRD	Según los documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

Se hace presentacion por parte de la Supervision de Apoyos en el componente Forestal y Ambiento SST para el proyecto Velaomo.

Siendo las 17:30 **se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:**

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Arq. Rubén Darío Crespo Botero	NOMBRE		
CARGO	Director de Interventoría	CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Torres Residente	PROCONTEC

12

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Transversal Técnico Nº 98 - Velodromo

FECHA: 19/Feb/2026 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: 10:30am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIADO POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Apoyo Supervisión	STC		IDRD	Jaime.Canon@idrd	3164116578
2	Juan Pablo Villate Diaz	1018010883	Apoy Sup.	STC		IDRD	juan.villate@	3147011324
3	Franci Liliana Murillo	52960323	Apoy. Tec. Sup	STC		IDRD	franci.murillo@idrd.gov.co	3043088785
4	Edwin Escobar	94459429	Apoyo Tec	STC		IDRD	edwin.escobar@idrd.gov.co	3116056145
5	Carmen Lucia Velez Maldonado	65777928	APOYO J. Social	STC		IDRD	carmen.vtlez@idrd.gov.co	
6	Javier O Sanchez Lagos	1014277632	Apoyo Tec Super	STC		IDRD	javier.sanchez@idrd.gov.co	
7	Jhon F. Espitia	80794111	Contratista	STC		IDRD	Jhon.espitia@idrd.gov.	3168107776
8	Rubén D. Crespo B.	19496690	Dtor Interv.	CIG		CIG	directora.consorcio interventoria@gmail.com	3103231119
9	Diego F Castro	1116955575	Prof. Calidad	UTMP		UTMP	Calidad.velodromo @cig.com.co	3125751014
10	Carlos Eduardo Duarte B.	1010712398	prof. Calidad	CIG		CIG	calidad.gibraltar2@gmail.com	3142784467
11	Edison Andrey Pena Reyes	1030541456	Contratista	STC		IDRD	edison.pena@idrd.gov.co	3132284969
12	Luz Stella Rodriguez Marin	21432956	Prof SG-SST	UTMP		UTMP	sst2.velodromo@cyg.com.co	3214693331
13	CESAR DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ	80196483	SST	SIC		IDRD	cesar.d.hernandez@idrd.gov.co	3506690062
14	Tatiana Ortegon Pinilla	1018487557	Ing Ambiental	STC-IDRD		IDRD	leidy.ortegon@idrd.gov.co	3138643385
15	Andrés Duque Rodriguez	1065002731	Prof HS-ACIGAS	Interventoría		CIG		3106684608
16	Astrid V Rojas C.	52932504	Prof GRD	Interventoría		CIG		3157444502
17	Mary Luz Ramirez C.	52448409	Prof social	Interventoría		CIG	social.velodromo@gmail.com	3132203175
18	Eduard Antonio Castro del	80883913	Residente Inst. Eléctricas	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290201

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.2

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Transversal / Técnico Nº 98 Velodromo

FECHA: 19/Feb/2026 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: 10:30am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Cesar Fernandez Soler	80109419	Director Técnico (Coordinador)	UTMP		UTMP	Contractual.velodromo@cvg.com.	3002662060
2	Diana Marcela Ortiz D	1014202007	Res. Social	UTMP		UTMP	social.velodromo@cvg.com.co	3533354[illegible]
3	Jindy Rubiano Moyano.	1053954740	Res. JGSIT INT.	CIG		CIG	Interventoria.velodromo@gm	3002391911
4	Andrés Galeano González	1022362548	Res Apoyo y Prog	CIG.		CIG		3192385243
5	Julian Ricardo Agudelo M.	80707393	R. Ambiental	CIG		CIG	—	
6	Jairo Parra Reyes	1143882208	IDRD(Apoyo)	IDRD		IDRD	jairo.parra@idrd.gov.co	3052150830
7	Alfonso Penaranda Juarez	80735391	Director	UTMP		UTMP	—	—
8	Ingrid Johanna Bermudez Munoz	1090495553	Prof. GRD	UTMP		UTMP	riesgos.velodromo@cvg.com.co	3125567967.
9	Ivone Liliana Aguja Gutierrez	1013601027	Apoyo Técnico	OTC		IDRD	ivone.aguja@idrd.gov.co	3114022656
10	Oscar Javier Sosa Ortega	80761772	Apoyo Hidraulico	STC		IDRD	oscar.sosa@idrd.	7005, 101405.
11	Rubiano Rodriguez Sosa Juan S	52996077	Apoyo Técnico	STC - IDRD		IDRD		
12	Alfredo Ferreira B.	79946424	Asistente Redes	UTMP		UTMP	hidraulico.velodromo@cvg.com.co	3135496915
13	Samer Andres Sepulveda 79-627743		Profesional Electricidad	INTERVENTORIA		CIG		3222912997
14	Fernando Rodriguez - IDRD	80198117	Residente	CIG.		CIG		3126794450
15	Wilmer Rivera Sanchez	1053806234	Prof BIM	Interventoria		CIG	—	—
16	JOHN H. RAMOS P.	80002268	COORD INTEROP	UTMP		CIG	bimvelodromo@cvg.com.co	
17	CARLOS EDUARDO CAMACHO SANCHEZ	79615088	INTERVENTOR TEC	UTMP		UTMP	coordinador.bim@cvg.com.co	
18	Diego Leiva Bello	1026582084	Ing Estructural	Interventoria		UTMP	—	—
						CIG	asistencia.velodromo@gmail.com.	

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL V.6

T22

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Transversal / Técnico Nº 98 - Velodromo

FECHA: 19/Feb./2026 HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: 10:30 am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Alejandra Tello Cerquera	[illegible]	Profesional	UTMP		UTMP		3017415442
2	Jose Galeano	80031322	Residente	UTMP		UTMP		3105570274
3	Paula Blanco	1073383630	Res. Ambiental	UTMP		UTMP	—	3024219943
4	Arturo Rojas Torres	15873937	Residente	C16		C16	—	3166420036
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.1

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono	Comentarios
19/02/2026 9:59:20	YEISON EFREN OSPINA (	80134003	yeison.ospina@idrd.gov.co	CONTRATISTA	IDRD	3104310298	
19/02/2026 10:01:24	Daniela Prieto Rodriguez	1018490798	daniela.prieto@idrd.gov.co	Apoyo presupuestal STC	IDRD	3022922354	
19/02/2026 10:02:35	Carlos Hector Castro	79340835	carlosh.castro@idrd.gov.co	Contratista STC-IDRD	IDRD	3107542732	
19/02/2026 10:34:51	Ivonn Pérez Téllez	1026279000	ivonn.perez@idrd.gov.co	Apoyo a ala supervisión	IDRD	3223578250	

822



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD	UTMP- CIG	Sin Fecha	VIGENTE

Actividades ejecutadas por el componente social

CONVOCATORIA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN NO. 23

- Alcaldía Local de Bosa.
- Junta Administradora Local de Bosa.
- Alcaldía Local de Kennedy.
- Junta Administradora Local de Kennedy.
- Personería Local de Kennedy.
- Federación Colombiana de Ciclismo.
- Presidente Liga de Ciclismo de Bogotá.
- Secretaría de seguridad, convivencia y justicia.
- Departamento administrativo del espacio público.
- Contraloría de Bogotá
- Secretaría Distrital de Ambiente
- Secretaría de Integración Social
- Secretaría Distrital de Hábitat


CONVOCATORIA
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NRO. 23
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".

Radicación viernes 13 de febrero de 2026

Programa de divulgación

BOGOTÁ

PUBLICACIÓN CARTELERA MARGARITA ETAPA 1 Y ETAPA 2







Correo electrónico | Redo Social - WhatsApp

Se emítela invitación a los 40 miembros del CPC el día jueves 12 de febrero.


PIEZA DE DIVULGACION	FECHA DE ENTREGA	PIEZAS ENTREGADAS
Comité de participación ciudadana No. 23	12/02/26	49
TOTAL		49


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Programa de divulgación

BOGOTÁ

PRESENTACIÓN CPC No. 23





El día viernes 13 de febrero se envía la presentación para revisión de la interventoría


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**

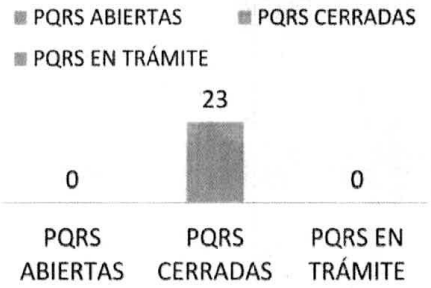

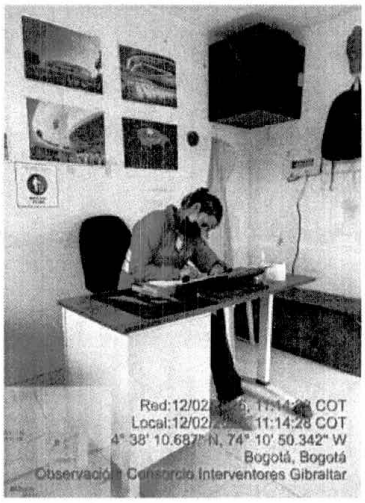

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (*) Pendiente respuesta UTMP	UTMP	-,-	PENDIENTE
Subsanación de recomendación según recorrido (12/02/2026) Protección de material granular en obra	UTMP	19/02/2026	CUMPLIDO
Subsanación de recomendación según recorrido (12/02/2026) Refuerzo estructura de sistemas de acopio de material para suministro en Planta de Concreto.	UTMP	19/02/2026	PENDIENTE
Subsanación de recomendación según recorrido (12/02/2026) (**) Mantenimiento de emergencia Bomba estacionaria Planta de Concreto	UTMP	19/02/2026	CUMPLIDO

(*) Oficio de interventoría No CIG-IDRD-VEL-79-2026 de Respuesta Oficio CE-206-125-2163 Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles – Velódromo Gibraltar. (05/02/2025) y Oficio No CIG-IDRD-VEL-79-2026 de lineamientos para el tratamiento o disposición de Lixiviados.

(**) Se realizó el viernes 13/02/2026, el soporte de mantenimiento será incluido en el Informe 25 por parte del área ambiental de la UTMP.

COMPONENTE AMBIENTAL



Capacitación: Tipo de residuos aprovechables



Adecuación acopios de chatarra y madera



Retiro de sobrantes de concreto



Mantenimiento de sumideros



Protección de materiales



Limpieza cárcamo

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.769.809**	**85,6%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.683.549**	**86,37%**

Lixiviado	25.090 kg

Retiro de 7 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,82%
Circularidad: 19,33%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE
Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo y Reducción del Riesgo/Manejo de Desastres Escenarios de Riesgo ER07-ER14/ PDCA – Ficha 3

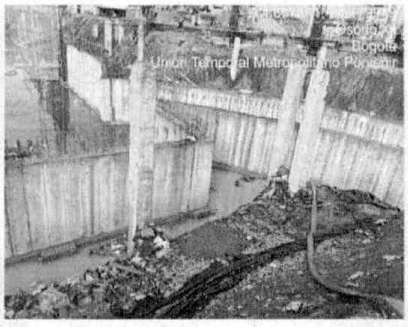


Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)



Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención

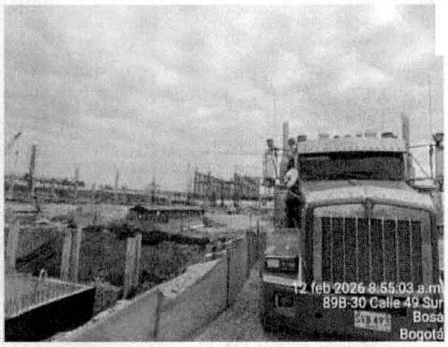


Disposición final de lixiviados

Activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank (12-02-26: 25.090 kg)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ

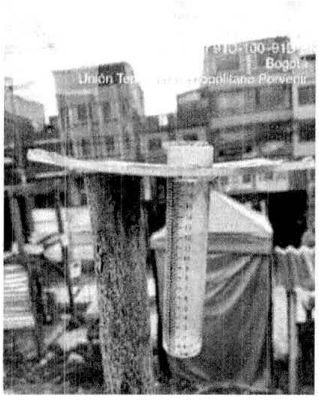

Monitoreo de Precipitación in situ

Verificación de precipitación acumulada diariamente mediante pluviómetro instalado en obra

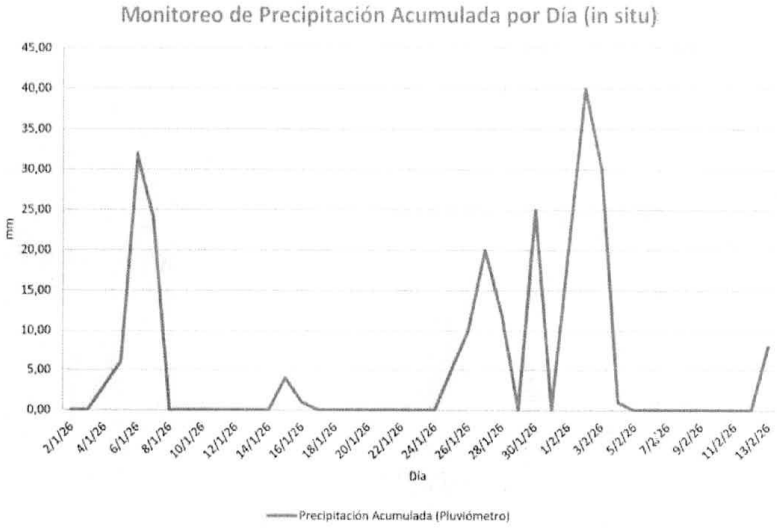

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13-ER16
Reducción del riesgo ER07-ER09-ER14-ER15

BOGOTÁ



Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

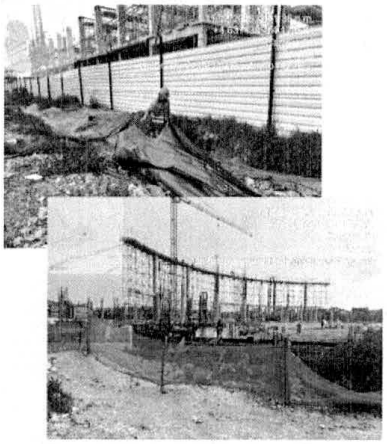

Mantenimiento de canal perimetral y cerramiento

Limpieza de canal perimetral norte y reemplazo de polietileno
Mantenimiento de cerramientos de túneles con polimalla azul



Inspección de taludes

Inspección visual de taludes con acompañamiento de gectecnia, identificando condiciones normales de estabilidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER07
Reducción del Riesgo ER09-ER10

BOGOTÁ



Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra



Protección de RESPEL

Protección de materiales granulares y acopios temporales de RESPEL con plástico



Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente
SST


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Umaña	UTMP-CIG	12-02-2026	Cumplido

PROMEDIO PERSONAL

PROFESION	PROMEDIO 09/02/26 - 15/02/26
PROFESIONALES	25
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	3
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	28
AYUDANTES	42
HERREROS	15
OPERADORES	9
BACHEROS	2
CONDUCTORES	1
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**136**

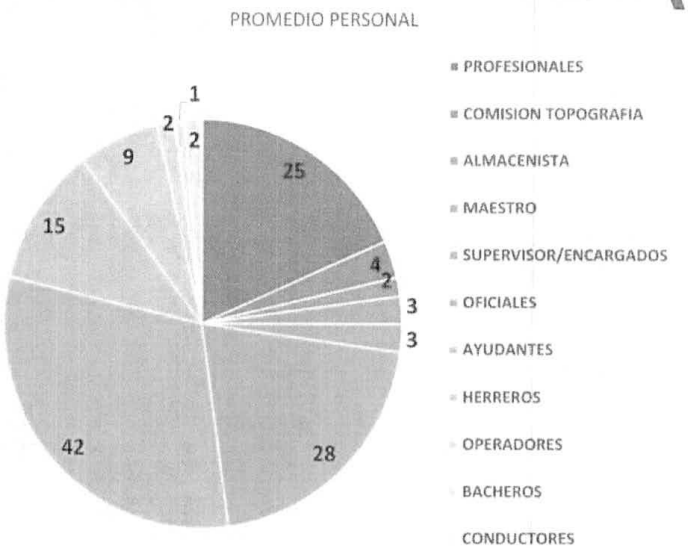

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

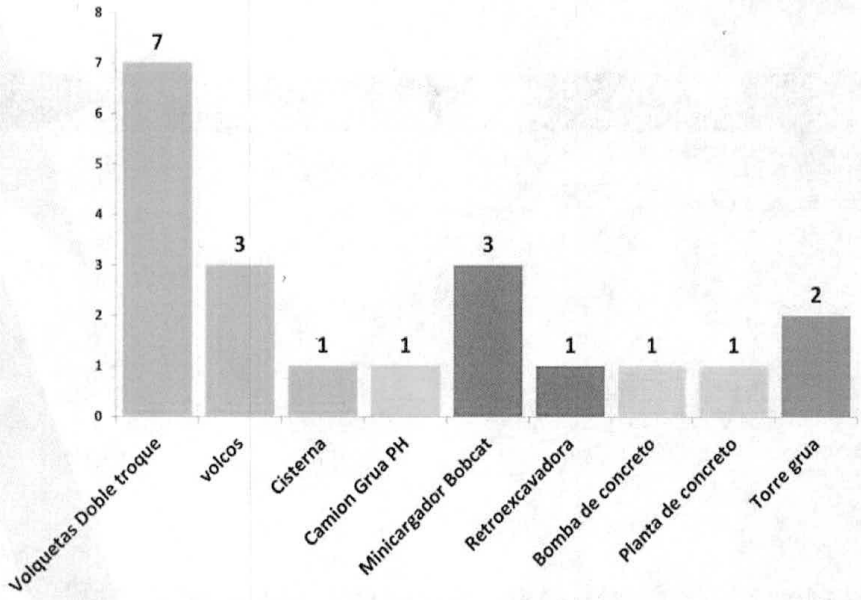



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	CERRADO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	1 CERRADO 2 ABIERTOS
ene-26	0	N/A
TOTAL ACCIDENTES	8	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
ene-26	6
TOTAL AUSENTISTAS	62


NOTA: **A la fecha se cuenta con 5 accidentes cerrados y 3 abiertos**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST


BOGOTÁ

Inducción al personal

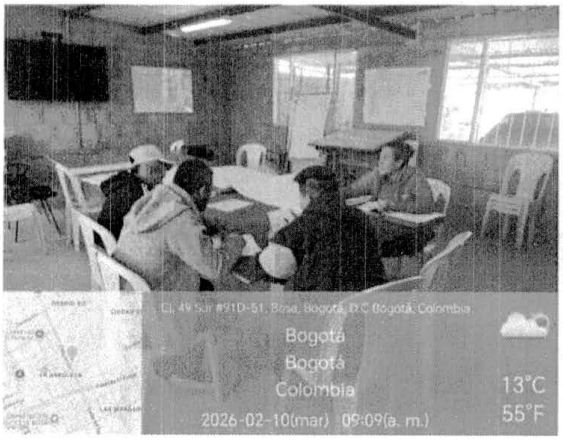

Entrega de EPP

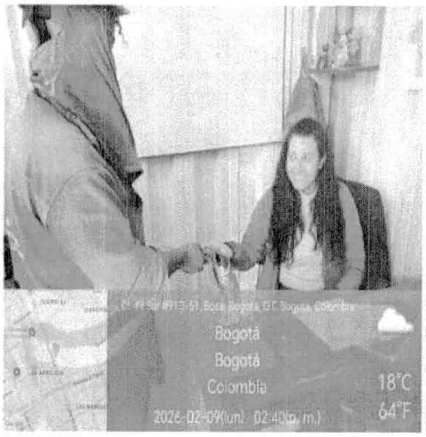

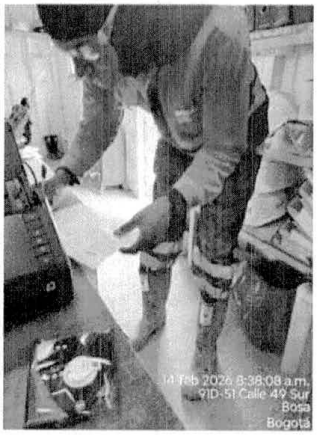


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspección de andamios

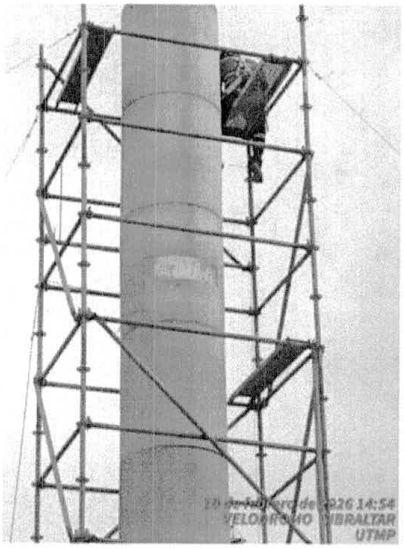



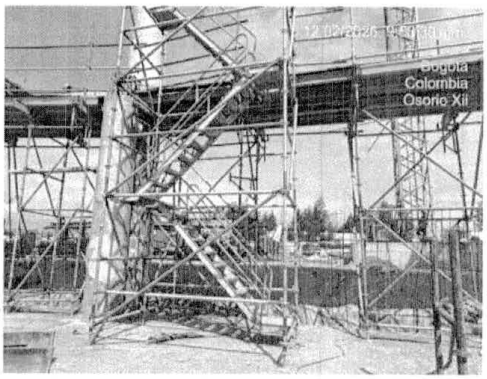

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspección actividades en alturas





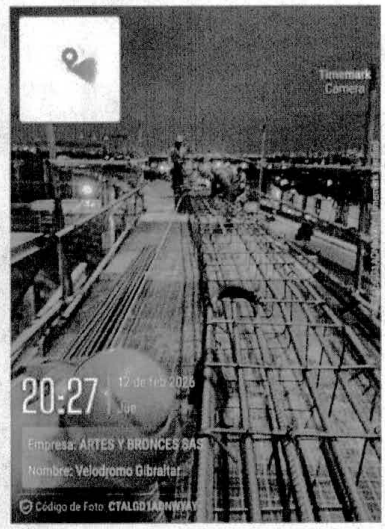


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspección uso de EPP y EPCC en frente de obra



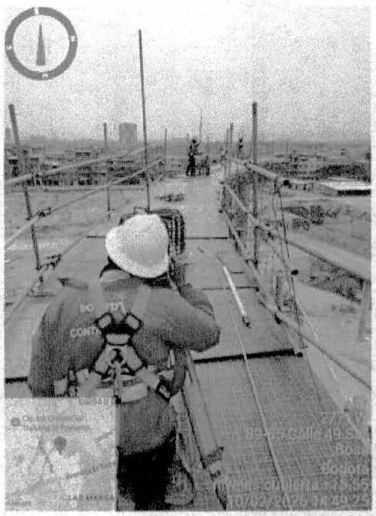




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Acceso a túneles sin barandas

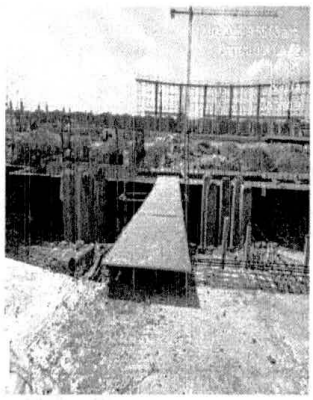


HALLAZGO




ACCION CORRECTIVA

Solicitud retiro de formaleta

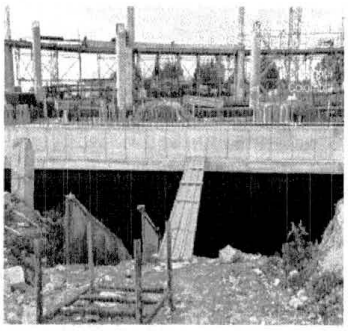

HALLAZGO

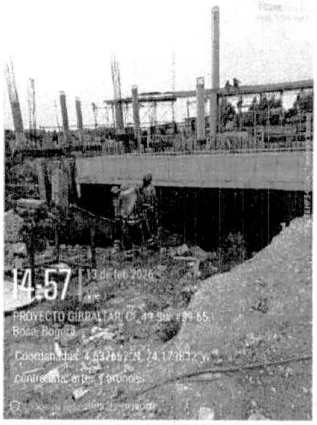


ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Solicitud señalización de excavación pilotes

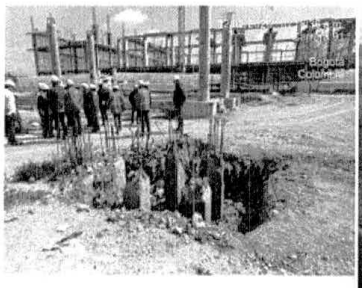


HALLAZGO



ACCION CORRECTIVA

Andamios sin señalización

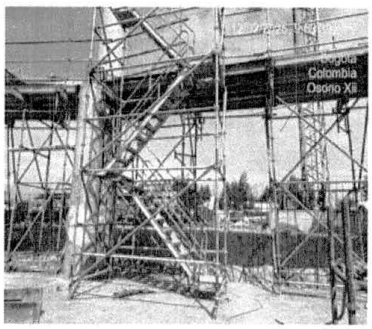

HALLAZGO



ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente
De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad actualizado–" Proyecto Velódromo Gibraltar - (*) Pendiente Revisión y/o comentarios IDRD	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (**) Pendiente Revisión y/o comentarios IDRD	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Presentación Plan de Inspección y Ensayo interventoría V.5 (***)	IDRD	18/02/2026	CUMPLIDO
Remisión al IDRD de Formato de inspección visual a la Estructura Metálica en Obra (****) Pendiente Revisión y/o comentarios IDRD	IDRD	Sin Fecha	Pendiente


(*) Rad. IDRD No 20262100071112 del 10/02/2026. (Plan de Inspección y Ensayo interventoría V.4)

(**) Rad. IDRD No 20262100082982 del 05/02/2026

(***) Rad. IDRD No 20262100067662 del 09-02-2026 del 09/02/2026 y aprobado IDRD por email el 18/02/2026.

(****) Rad. IDRD No 20262100079962 del 13/02/2026

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2942,67 m3

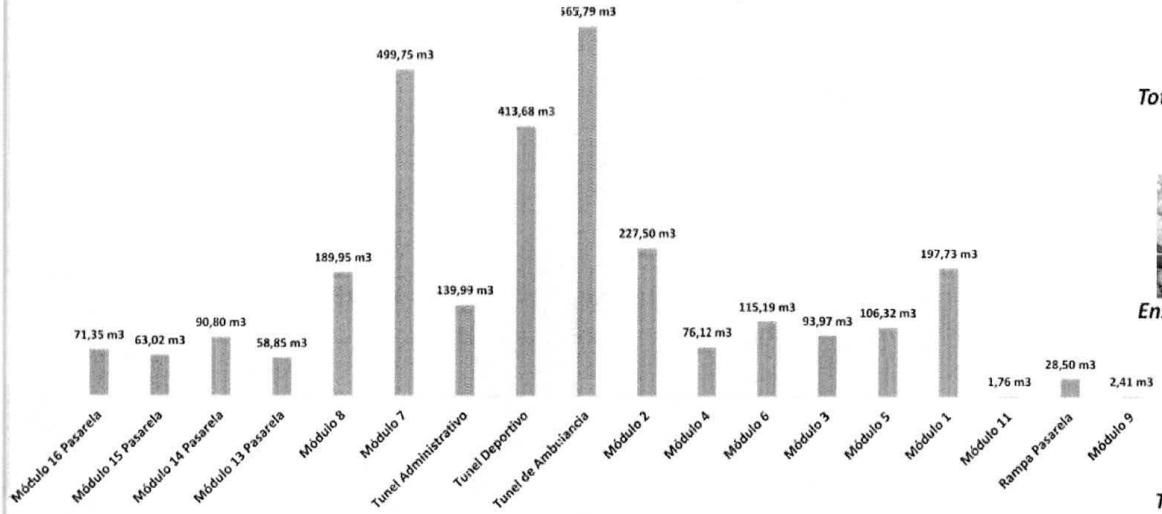

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos
Última Semana
142,79 m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673



TOTAL SEMANA DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026.


ncreto Estructural: *142,79* m3 **Muros** (Túnel de Ambulancia, Módulo 3, Módulo5, Módulo 6, Túnel de ambulancia) **Columnas** (Módulo 1, Módulo 3, Módulo 5 y Rampa) **Placa** (Placa superior Túnel Administrativo, y Módulo 3) **Vigas** (Módulo 1, Módulo 5 y Vigas Perimetrales Túnel Deportivo)

CEMEX **0 m3** *0%*

ALTARA **142,79 m3** *100%*

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **546,65 Ton**

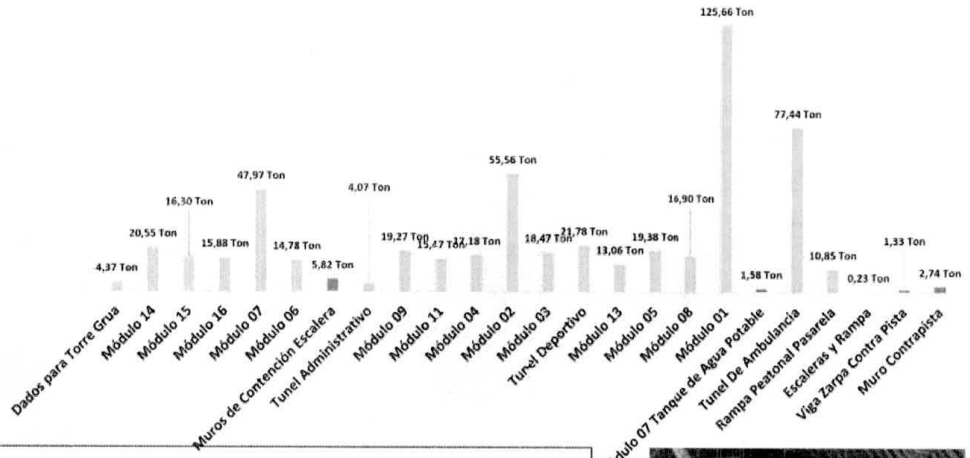

BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD





Del 09 de Febrero al 15 de Febrero de 2025

Se ingresaron ***29,7 ton*** *para* ***Viga de Cubierta Módulo 1, y Viga Aerea Graderías***




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unicad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
24	15	8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
25		8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					30 Unds		Total	270,77 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA




Elementos Ingresados del 09 al 15 de febrero de 2026:

No se Allegó Elementos durante el periodo

TOTAL : 270,77 TON.






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


UBICACIÓN DE SECCIONES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

Sección	Cantidad
CHP6	2 Unds
CHP2	2 Unds
CHP1	2 Unds
CHP5	2 Unds
PVC1	1 Unds
PVC2	1 Unds
CHP3	5 Unds
CHP4	5 Unds
CHP7	5 Unds
CHP8	5 Unds
Total	30 Unds

CHP6 - CHP6
CHP2 – CHP2

CHP1 – CHP1
CHP5 – CHP5

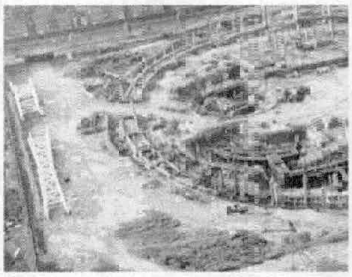

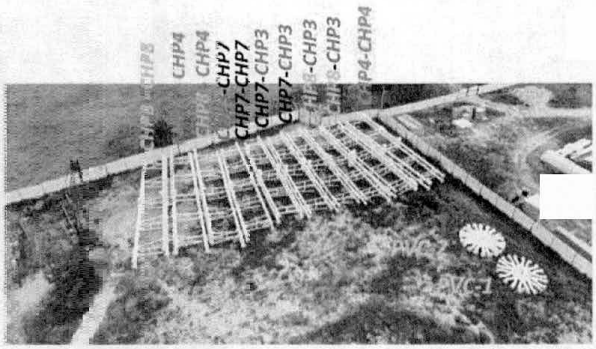

TOTAL **30 Unidades**
para
270,77 Ton

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo alta Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderias	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderias Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-2163 mediante CIG-IDRD-VEL-0079-2026 del 05 de Febrero de 2026	Contratista
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 22 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 05 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
		Pista Velodromo	Pendiente	Se responde comunicado CE-206-125-2188 mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0083-2026 del 06 de Febrero de 2026	Contratista
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado
10	Mecánico	**Ascensores**	Pendiente	Se responde comunicado CE-206-125-2176 mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0068-2026 del 12 de febrero de 2026	Contratista

INSTITUTO DI
RECREACIÓN Y DEPO


MATERIAL DE LLENO PARA LOS TRASDÓS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN

BOGOTÁ

- Mediante oficio **CIG-IDRD-VEL-0039-2026** del 22 de enero de 2026 se aprobó la caracterización para el material de lleno de los trasdós de los muros de contención que conforman los túneles del proyecto.

Trasdos Túneles

Material Granular Tipo PEA	615,00 m3

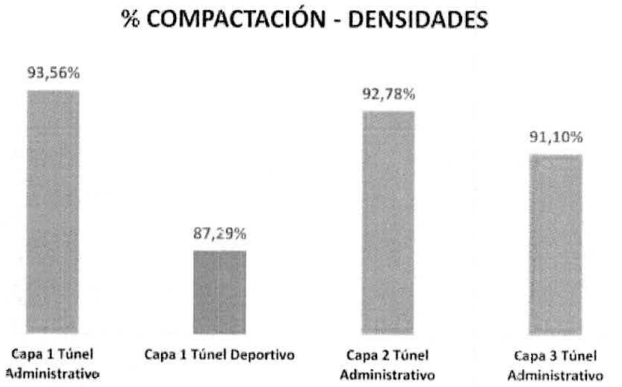

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
