AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD	UTMP- CIG	Sin Fecha	VIGENTE

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

CONVOCATORIA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN NO. 23

- Alcaldía Local de Bosa.
- Junta Administradora Local de Bosa.
- Alcaldía Local de Kennedy.
- Junta Administradora Local de Kennedy.
- Personería Local de Kennedy.
- Federación Colombiana de Ciclismo.
- Presidente Liga de Ciclismo de Bogotá.
- Secretaría de seguridad, convivencia y justicia.
- Departamento administrativo del espacio público.
- Contraloría de Bogotá
- Secretaría Distrital de Ambiente
- Secretaría de Integración Social
- Secretaría Distrital de Hábitat


CONVOCATORIA
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NRO. 23
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".

Radicación viernes 13 de febrero de 2026

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Programa de divulgación

BOGOTÁ

PUBLICACIÓN CARTELERA MARGARITA ETAPA 1 Y ETAPA 2







Correo electrónico

Redo Social - WhatsApp

Se emitela invitación a los 40 miembros del CPC el día jueves 12 de febrero.


PIEZA DE DIVULGACION	FECHA DE ENTREGA	PIEZAS ENTREGADAS
Comité de participación ciudadana No. 23	12/02/26	49
TOTAL		49


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Programa de divulgación

BOGOTÁ

PRESENTACIÓN CPC No. 23





El día viernes 13 de febrero se envía la presentación para revisión de la interventoría


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**



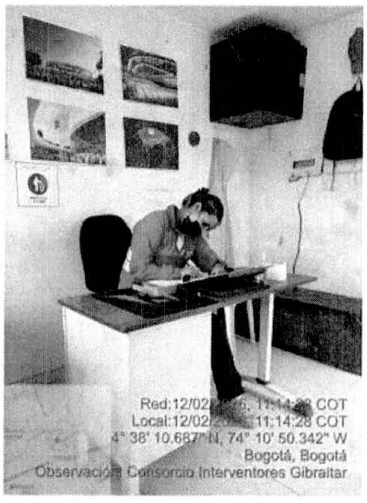

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (*) Pendiente respuesta UTMP	UTMP	-,-	PENDIENTE
Subsanación de recomendación según recorrido (12/02/2026) Protección de material granular en obra	UTMP	19/02/2026	CUMPLIDO
Subsanación de recomendación según recorrido (12/02/2026) Refuerzo estructura de sistemas de acopio de material para suministro en Planta de Concreto.	UTMP	19/02/2026	PENDIENTE
Subsanación de recomendación según recorrido (12/02/2026) (**) Mantenimiento de emergencia Bomba estacionaria Planta de Concreto	UTMP	19/02/2026	CUMPLIDO

(*) Oficio de interventoría No CIG-IDRD-VEL-79-2026 de Respuesta Oficio CE-206-125-2163 Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles – Velódromo Gibraltar. (05/02/2025) y Oficio No CIG-IDRD-VEL-79-2026 de lineamientos para el tratamiento o disposición de Lixiviados.

(**) Se realizó el viernes 13/02/2026, el soporte de mantenimiento será incluido en el Informe 25 por parte del área ambiental de la UTMP.


COMPONENTE AMBIENTAL



Capacitación: Tipo de residuos aprovechables



Adecuación acopios de chatarra y madera

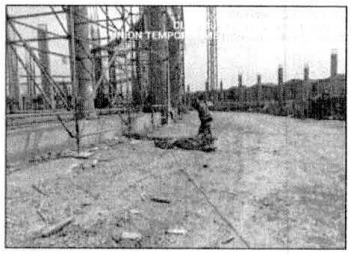

Retiro de sobrantes de concreto



Mantenimiento de sumideros



Protección de materiales



Limpieza cárcamo

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.769.809**	**85,6%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.683.549**	**86,37%**

Lixiviado	25.090 kg

Retiro de 7 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,82%
Circularidad: 19,33%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE
Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE

Monitoreo y Reducción del Riesgo/Manejo de Desastres
Escenarios de Riesgo ER07-ER14/ PDCA – Ficha 3

BOGOTÁ

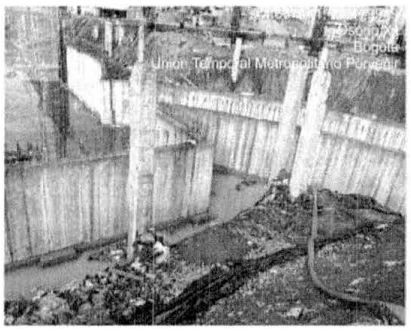


Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)



Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención

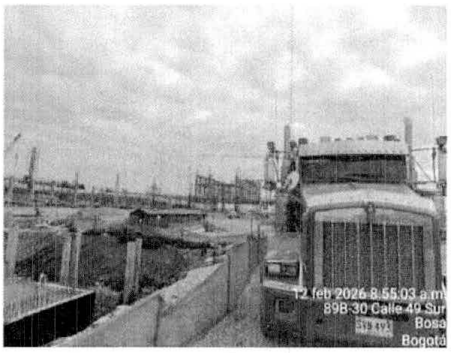


Disposición final de lixiviados

Activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank (12-02-26: 25.090 kg)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ

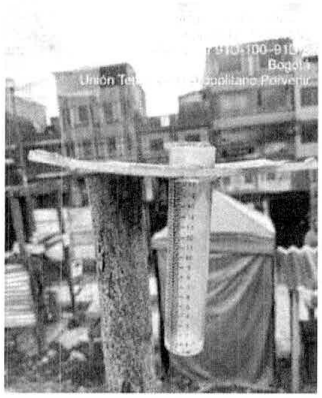

Monitoreo de Precipitación in situ

Verificación de precipitación acumulada diariamente mediante pluviómetro instalado en obra

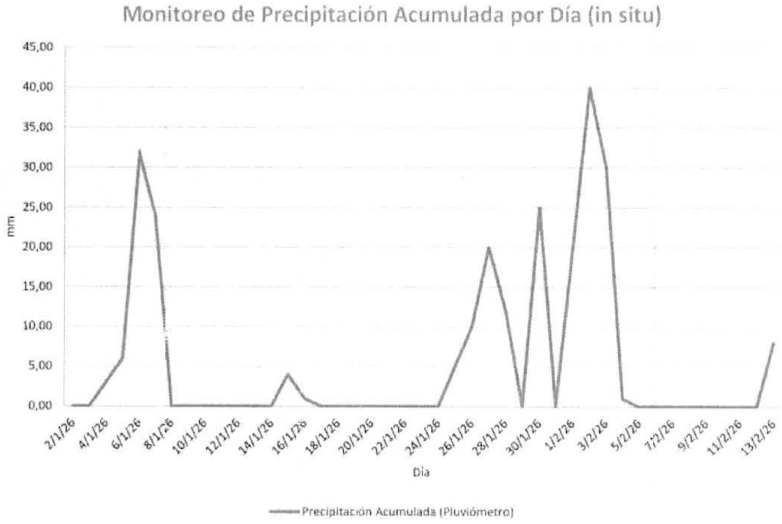

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13-ER16
Reducción del riesgo ER07-ER09-ER14-ER15

BOGOTÁ



Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

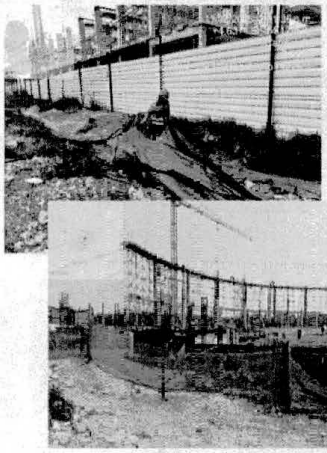

Mantenimiento de canal perimetral y cerramiento

Limpieza de canal perimetral norte y reemplazo de polietileno
Mantenimiento de cerramientos de túneles con polimalla azul



Inspección de taludes

Inspección visual de taludes con acompañamiento de geotecnia, identificando condiciones normales de estabilidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER07
Reducción del Riesgo ER09-ER10

BOGOTÁ




Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra



Protección de RESPEL

Protección de materiales granulares y acopios temporales de RESPEL con plástico

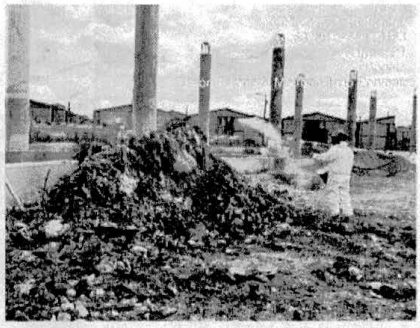

Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SI PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

SST

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Umaña	UTMP-CIG	12-02-2026	Cumplido


PROMEDIO PERSONAL


PROFESION	PROMEDIO 09/02/26 - 15/02/26
PROFESIONALES	25
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	3
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	28
AYUDANTES	42
HERREROS	15
OPERADORES	9
BACHEROS	2
CONDUCTORES	1
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	**136**

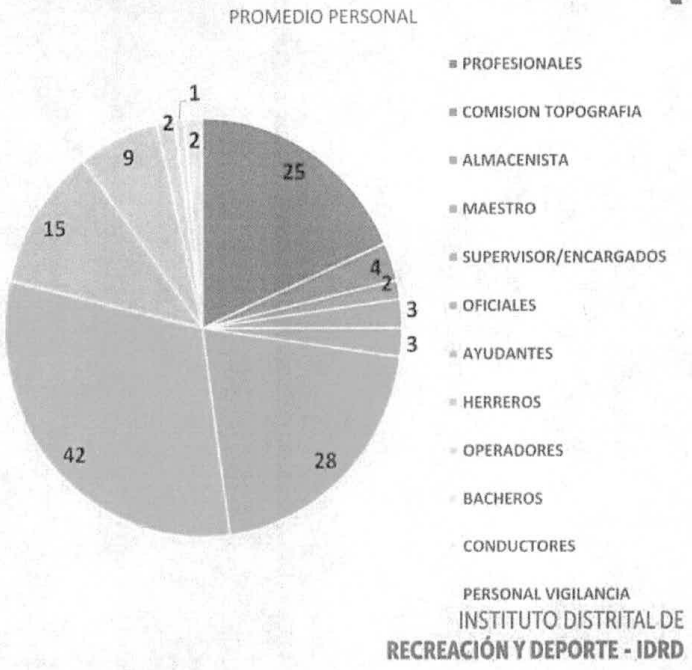

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

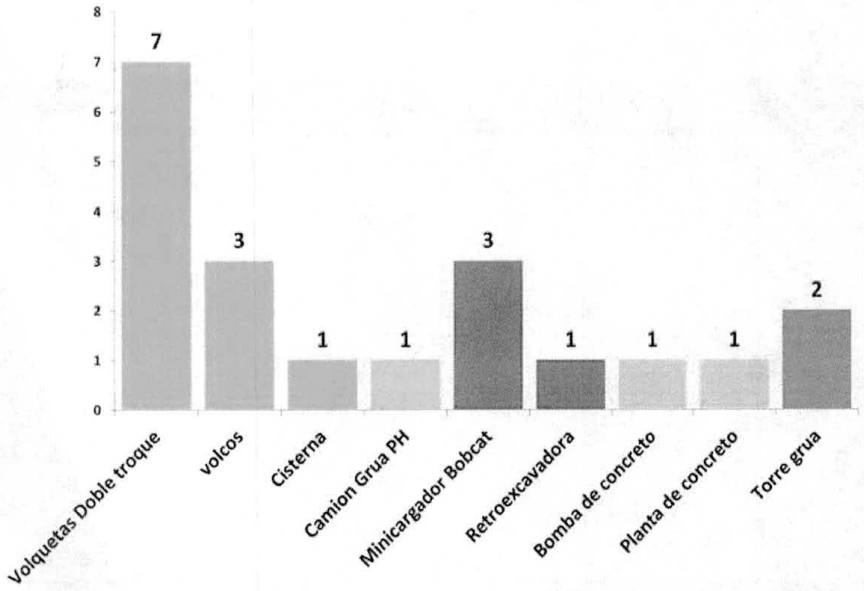



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	CERRADO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	1 CERRADO 2 ABIERTOS
ene-26	0	N/A
TOTAL ACCIDENTES	8	


REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
ene-26	6
TOTAL AUSENTISTAS	62

NOTA: **A la fecha se cuenta con 5 accidentes cerrados y 3 abiertos**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

Inducción al personal

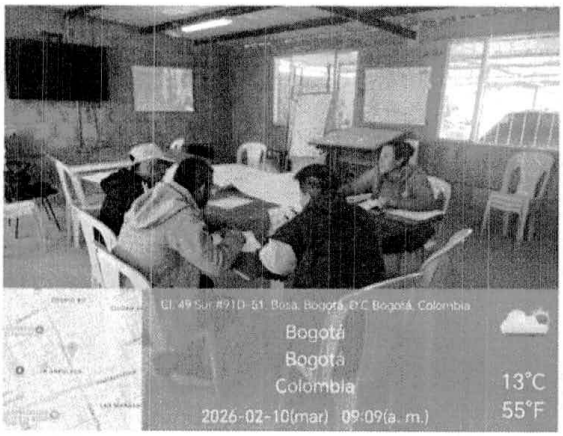

Entrega de EPP



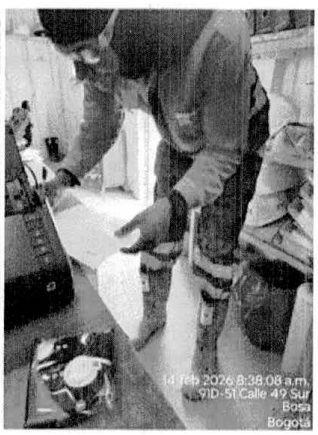


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspección de andamios

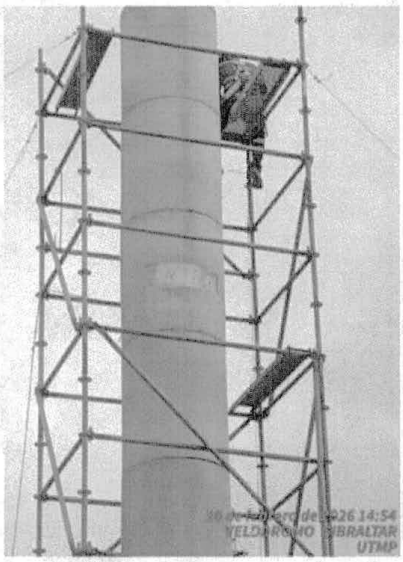



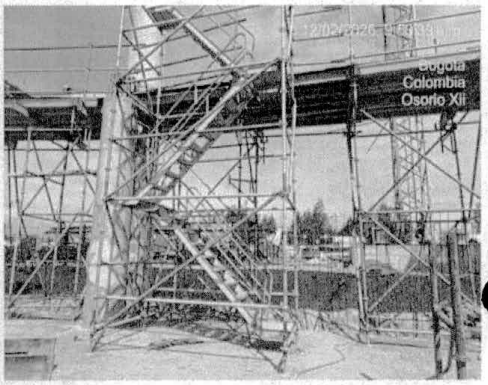


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspección actividades en alturas



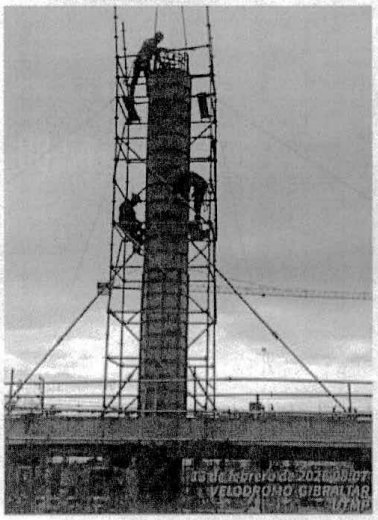

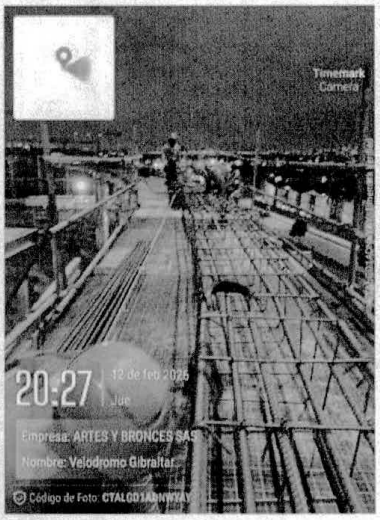


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Inspección uso de EPP y EPCC en frente de obra



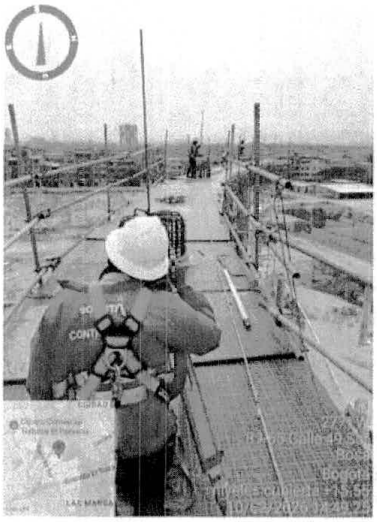




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Acceso a túneles sin barandas

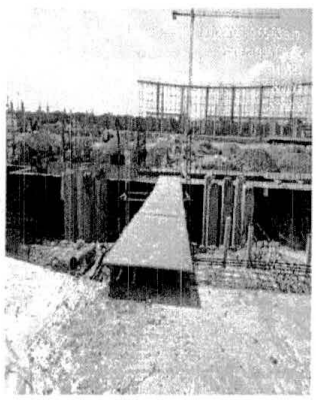


HALLAZGO




ACCION CORRECTIVA

Solicitud retiro de formaleta

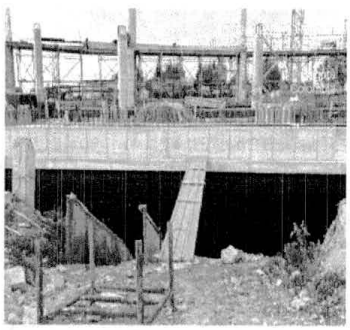

HALLAZGO

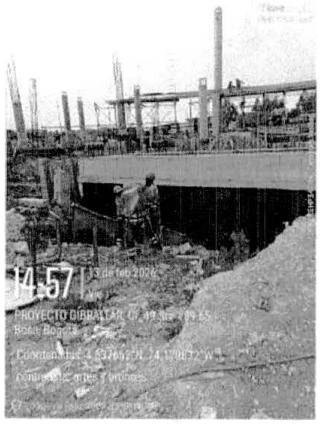

ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Solicitud señalización de excavación pilotes




HALLAZGO



ACCION CORRECTIVA

Andamios sin señalización

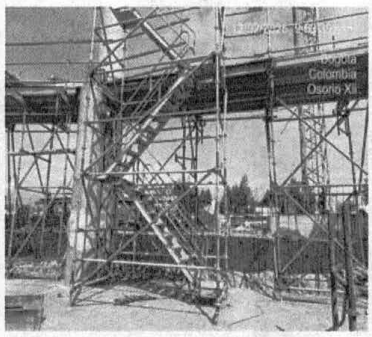

HALLAZGO



ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

Componente
De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad actualizado–" Proyecto Velódromo Gibraltar - (*) Pendiente Revisión y/o comentarios IDRD	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (**) Pendiente Revisión y/o comentarios IDRD	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Presentación Plan de Inspección y Ensayo interventoría V.5 (***)	IDRD	18/02/2026	CUMPLIDO
Remisión al IDRD de Formato de inspección visual a la Estructura Metálica en Obra (****) Pendiente Revisión y/o comentarios IDRD	IDRD	Sin Fecha	Pendiente

(*) Rad. IDRD No 20262100071112 del 10/02/2026. (Plan de Inspección y Ensayo interventoria V.4)


(**) Rad. IDRD No 20262100082982 del 05/02/2026

(***) Rad. IDRD No 20262100067662 del 09-02-2026 del 09/02/2026 y aprobado IDRD por email el 18/02/2026.

(****) Rad. IDRD No 20262100079962 del 13/02/2026

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2942,67 m3

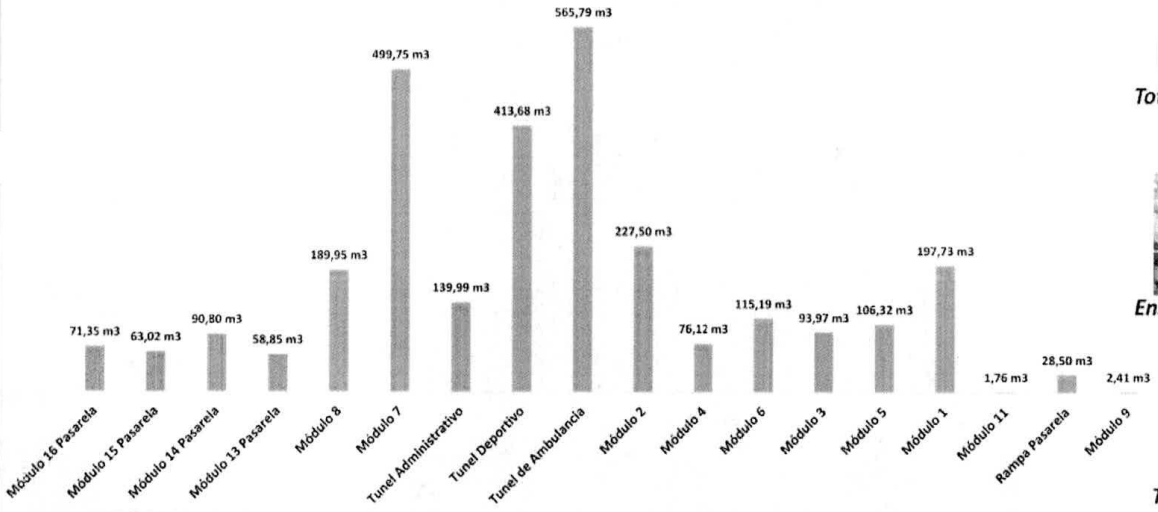

TOTAL SEMANA DEL 09 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026.

Concreto Estructural: *142,79* m3 **Muros** (Túnel de Ambulancia, Módulo 3, Módulo5, Módulo 6, Túnel de ambulancia) **Columnas** (Módulo 1, Módulo 3, Módulo 5 y Rampa) **Placa** (Placa superior Túnel Administrativo, y Módulo 3) **Vigas** (Módulo 1, Módulo 5 y Vigas Perimetrales Túnel Deportivo)

CEMEX **0 m3** *0%*

ALTARA **142,79 m3** *100%*

Total Concreto Fundidos Última Semana
142,79 m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396




Toma de Muestras de Concreto NTC 673



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **546,65 Ton**

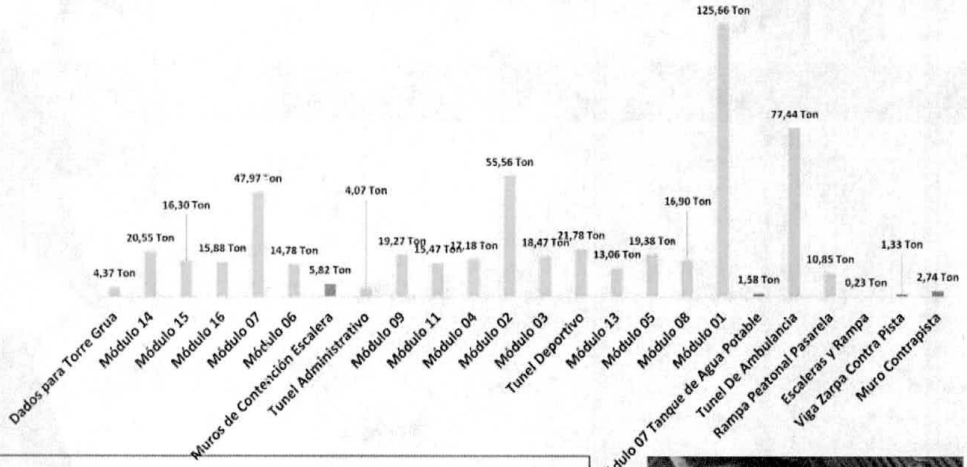

Del 09 de Febrero al 15 de Febrero de 2025

*Se ingresaron **29,7 ton** para **Viga de Cubierta Módulo 1, y Viga Aerea Graderías***



BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
24	15	8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
25		8-feb-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					30 Unds		**Total**	270,77 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA





Elementos Ingresados del 09 al 15 de febrero de 2026:

No se Allegó Elementos durante el periodo

TOTAL : 270,77 TON.

BOGOTÁ







INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UBICACIÓN DE SECCIONES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

Sección	Cantidad
CHP6	2 Unds
CHP2	2 Unds
CHP1	2 Unds
CHP5	2 Unds
PVC1	1 Unds
PVC2	1 Unds
CHP3	5 Unds
CHP4	5 Unds
CHP7	5 Unds
CHP8	5 Unds
Total	30 Unds

CHP6 - CHP6
CHP2 – CHP2
CHP1 – CHP1
CHP5 – CHP5

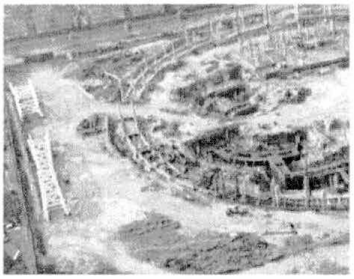

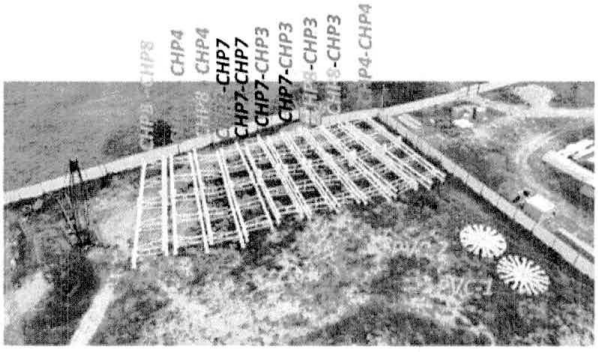

TOTAL **30 Unidades**
para
270,77 Ton

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderias	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Modulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderias Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-2163 mediante CIG-IDRD-VEL-0079-2026 del 05 de Febrero de 2026	Contratista
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 22 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
		Pista Velodromo	Pendiente	Se responde comunicado CE-206-125-2188 mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0083-2026 del 06 de Febrero de 2026	Contratista
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado
10	Mecánico	**Ascensores**	Pendiente	Se responde comunicado CE-206-125-2176 mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0068-2026 del 12 de febrero de 2026	Contratista


MATERIAL DE LLENO PARA LOS TRASDÓS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN

BOGOTÁ

✓ Mediante oficio **CIG-IDRD-VEL-0039-2026** del 22 de enero de 2026 se aprobó la caracterización para el material de lleno de los trasdós de los muros de contención que conforman los túneles del proyecto.

Trasdos Túneles

Material Granular Tipo PEA	615,00 m3

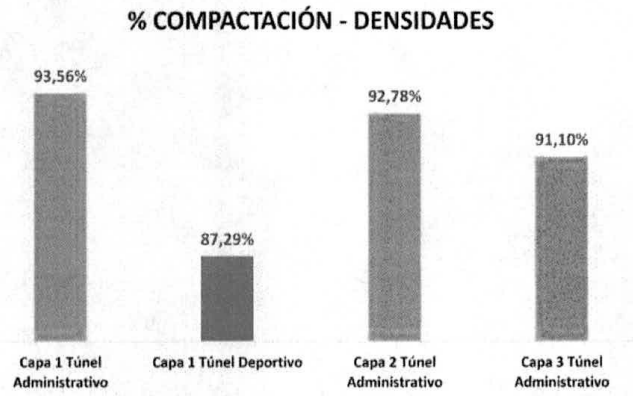

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

TRAZABILIDAD Y APROBACIÓN DE INFORME No. 24

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C.,29 de enero de 2026
CE-206-125-2184

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802
Ciudad

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: Remisión Informe mensual V1 No. 24 del componente social.

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir (el "Contratista" o la "Unión Temporal") dentro del marco jurídico del Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023 (el "Contrato") se permite hacer entrega del Informe mensual V1 No. 24 del componente social.

El informe con sus respectivos soportes de verificación los puede descargar a través del siguiente enlace: https://we.tl/t-hNzJfiRPmq

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos a disposición para cualquier requerimiento adicional

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP® - PMI-ACP®
Director de Proyecto
Velódromo Gibraltar.

Anexos: Lo enunciado

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
NIT: 901.781.400-1
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No. RADICADO CE-206-128 1207
RECIBIDO POR: Claudia G
FECHA: 29-01-26
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Bogotá D.C.,29 de enero de 2026

CIG-IDRD-VEL-0061-2026

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELODROMO GIBRALTAR -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Rta. Oficio de obra CE-206-125-2184– asunto: Remisión Informe mensual No. 24 V1 del componente social, 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026.

Respetado Arquitecto:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, nos permitimos informar que, una vez realizada la revisión del informe y anexos; esta interventoría emite lista de chequeo con concepto de No aprobación en donde se relacionan las observaciones, las cuales deben ser atendidas en la versión 2 del informe en mención.

Sin otro particular.

Cordialmente

Arq. Rubén Dario Crespo
Director de Interventoría

Elaboró: TS Mary Luz Ramírez Carvajal Profesional Social de Interventoría.
Revisó: Arq. Rubén Dario Crespo- Director de Interventoría.
Aprobó: Ing. Edgar Solorzano Medina – Coordinador de Interventoría.

Anexos: 1 folios

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL	CIG-SC-F-G-005-IDRD REVISIÓN: 0 FECHA: 03/05/2024

COMPONENTE SOCIAL

INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N. 3232 DEL 2023 *Parque: Velódromo*

Objeto contractual: CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ

Supervisión: Katherine Amaya Roa **N° Radicado** CE-206-125-2184 **N° Informe:** 24 **N° Revisión** 01

Apoyo a Supervisión: Carmen Lucia Vélez Cárdenas **Revisa:** Mary Luz Ramírez

Periodo del Informe: Entre: 26-diciembre 2025 al 25 enero-2026 **Fecha Revisión:** jueves, 29 enero de 2026

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las pólizas * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)					PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* martes, 6 de febrero de 2024 *Fecha Final:* martes, 5 de mayo de 2026 *Plazo Actual:* 27 MESES *Ejecutor:* UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR *Interventoría:* CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Contratista e interventoría) Consolidado actividades ejecutadas, revisiones y aprobaciones por parte de la interventoría a productos y entregables.					
Gestión Social Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Consultoría e interventoría), de acompañamiento y seguimiento por parte de la interventoría en cumplimiento del Plan de Gestión Social					
ANEXO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL **Programa de Información** Soportes de verificación reuniones de socialización Inicio, Avance, Finalización, Extraordinaria (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).					
Programa de Divulgación Soporte de verificación entrega de volantes informativos, convocatorias, plegables, radicación de oficios institucionales, correos electrónicos (planillas de divulgación, registros fotográficos)					
Acompañamiento a las actividades técnicas de la Obra Actas de inspección preliminar- inventario de elementos existentes, Actas de					

vecindad de Inicio (Volantes comunicado de visita informada, Plano de ubicación de predios, vías y espacio público involucrados en el levantamiento de las actas, actas de vecindad suscritas, CD- medio magnético con registros fílmicos y fotográficos del levantamiento).						
Programa de Atención al Ciudadano Registros de atención de preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (formatos de atención PQRS debidamente firmados por los peticionarios, consolidado de atenciones ciudadanas).						Ajustar la palabra durante luego de la fotografía del PAC En la tabla 16 ajustar la fecha de envio del traslado de competencia fue el 26/12/2025 Incluir los soportes del oficio Incluir firmas de los profesionales de interventoria en el consolidado PQRS
Programa de Control Social - Comités de participación Ciudadana Soportes de la reunión comité de participación ciudadana; capacitación inicial y sesión mensual (acta de reunión, registro fotográfico, listado de asistencia, presentación, formato de evaluación de evento).						Incluir la pregunta sobre la manzana del cuidado Tabla 14 ajustar los convocados del comité (37) sin los nuevos ingresos; corregir el % Ajustar el párrafo, corregir el número total de asistentes
Programa de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental						
Soportes de verificación Talleres prevención de violencia de género (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).						
Soportes de verificación reporte de vinculación laboral población diferencial (Certificaciones de vinculación, planillas pago de aportes seguridad social, Certificados de residencia, copia recibo de servicios publicos).						
Soportes de verificación Talleres Uso, mantenimiento y conservación (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).						
Soportes de verificación capacitación y entrega Manuales de mantenimiento responsable de la administración de los parques.						
Soportes de verificación Aplicación Encuestas de Satisfacción						
Programa de Evaluación y Seguimiento						
Comité de seguimiento semanal (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos).						Revisar la intención del párrafo después de la fotografía del comité del 22/01/2026
Informes mensuales (Trazabilidad de revisión de productos y entregables consultoría- interventoría y supervisión: Listas de chequeo, correspondencia, correos electrónicos).						
OBSERVACIONES GENERALES						
El informe presentado, *NO CUMPLE* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y calidad *NO SE APRUEBA* EL INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL No.24 V1 **VoBo. Profesional Social Interventoria**						

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

Bogotá D.C.,29 de enero de 2026
CE-206-125-2189

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. ARQ. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Calle 120A No. 7 – 36 Oficina 802
Ciudad

REF: CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*"

ASUNTO: Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0061-2026 -Remisión Informe mensual V2 No. 24 del componente social

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir (el "Contratista" o la "Unión Temporal") dentro del marco jurídico del Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023 (el "Contrato") se permite hacer entrega del Informe mensual V2 No. 24 del componente social.

El informe con sus respectivos soportes de verificación los puede descargar a través del siguiente enlace: https://we.tl/t-PmADBFTKdb

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos a disposición para cualquier requerimiento adicional

Atentamente,

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
ING. ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ, PMP® - PMI-ACP®
Director de Proyecto
Velódromo Gibraltar.

Anexos: Lo enunciado

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
NIT. 901.781.400-1
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
No RADICADO CE-206-128 1209
RECIBIDO POR: CLAUDIA G
FECHA: 29-01-26
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Bogotá D.C.,29 de enero de 2026

CIG-IDRD-VEL-0064-2026

Señores
UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
José Luis Clavijo
Representante Legal
Utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELODROMO GIBRALTAR** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Rta. Oficio de obra CE-206-125-2189– asunto: Aprobación Informe Social Mensual No. 24 Versión 2.0 _ 26 diciembre 2025 al 25 de enero de 2026

Respetado Arquitecto:

En virtud de nuestras obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de referencia y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, esta interventoría emite concepto de Aprobación del informe de Gestión Social No. 24 versión 2.0 remitido por ustedes; dado que el documento detalla de manera clara y completa todas las actividades sociales ejecutadas en el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026

LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA	**VERIFICACIÓN**
Descripción general del contrato	CUMPLE
Descripción de actividades programa acompañamiento a las actividades técnicas de la obra.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de información	CUMPLE
Descripción de actividades programa de divulgación	CUMPLE
Descripción de actividades programa de control social- comités de participación ciudadana	CUMPLE
Descripción de actividades programa de atención a la comunidad.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de sostenibilidad social, económica y ambiental.	CUMPLE
Descripción de actividades programa de evaluación y seguimiento.	CUMPLE
Anexos soportes de las actividades sociales ejecutadas	CUMPLE

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

La interventoría solicita que el contratista haga llegar lo más pronto posible el informe social mensual No.24 versión 2.0 aprobado debidamente impreso, carta de aprobación de la interventoría y en magnético (CD), para proceder a la radicación ante la entidad.

Sin otro particular.

Cordialmente

Arq. Rubén Dario Crespo
Director de Interventoría

Elaboró: TS Mary Luz Ramirez Carvajal Profesional Social de Interventoria.
Revisó: Arq. Rubén Dario Crespo - Director de Interventoria.
Aprobó: Ing. Edgar Solorzano Medina – Coordinador de Interventoria.

Anexos: Lista chequeo aprobación _ 1 folio

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL	CIG-SC-F-G-005-IDRD REVISIÓN: 0 FECHA: 03/05/2024

COMPONENTE SOCIAL
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N. 3232 DEL 2023 *Parque:* ***Velódromo***

Objeto contractual: CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ

Supervisión: Katherine Amaya Roa **N° Radicado** CE-206-125-2189 **N° Informe:** 24 **N° Revisión** 02

Apoyo a Supervisión: Carmen Lucia Vélez Cárdenas **Revisa:** Mary Luz Ramirez

Periodo del Informe: Entre: 26-diciembre 2025 al 25 enero-2026 **Fecha Revisión:** jueves, 29 enero de 2026

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las pólizas * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)					PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de inicio:* martes, 6 de febrero de 2024 *Fecha Final:* martes, 5 de mayo de 2026 *Plazo Actual:* 27 MESES *Ejecutor:* UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR *Interventoría:* CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Contratista e interventoría) Consolidado actividades ejecutadas, revisiones y aprobaciones por parte de la interventoría a productos y entregables.					
Gestión Social Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (Consultoría e interventoría), de acompañamiento y seguimiento por parte de la interventoría en cumplimiento del Plan de Gestión Social					
ANEXO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL **Programa de Información** Soportes de verificación reuniones de socialización Inicio, Avance, Finalización, Extraordinaria (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).					
Programa de Divulgación Soporte de verificación entrega de volantes informativos, convocatorias, plegables, radicación de oficios institucionales, correos electrónicos (planillas de divulgación, registros fotográficos)					
Acompañamiento a las actividades técnicas de la Obra Actas de inspección preliminar- inventario de elementos existentes, Actas de					

vecindad de Inicio (Volantes comunicado de visita informada. Plano de ubicación de predios, vías y espacio público involucrados en el levantamiento de las actas, actas de vecindad suscritas, CD- medio magnético con registros fílmicos y fotográficos del levantamiento).						
Programa de Atención al Ciudadano Registros de atención de preguntas, quejas, reclamos y solicitudes (formatos de atención PQRS debidamente firmados por los peticionarios, consolidado de atenciones ciudadanas).						
Programa de Control Social - Comités de participación Ciudadana Soportes de la reunión comité de participación ciudadana; capacitación inicial y sesión mensual (acta de reunión, registro fotográfico, listado de asistencia, presentación, formato de evaluación de evento).						
Programa de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental						
Soportes de verificación Talleres prevención de violencia de género (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).						
Soportes de verificación reporte de vinculación laboral población diferencial (Certificaciones de vinculación, planillas pago de aportes seguridad social, Certificados de residencia, copia recibo de servicios públicos).						
Soportes de verificación Talleres Uso, mantenimiento y conservación (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos, presentación, formato de evaluación de evento).						
Soportes de verificación capacitación y entrega Manuales de mantenimiento responsable de la administración de los parques.						
Soportes de verificación Aplicación Encuestas de Satisfacción						
Programa de Evaluación y Seguimiento						
Comité de seguimiento semanal (Acta de reunión, listado de asistencia, registros fotográficos).						
Informes mensuales (Trazabilidad de revisión de productos y entregables consultoría- interventoría y supervisión: Listas de chequeo, correspondencia, correos electrónicos).						
OBSERVACIONES GENERALES						
El informe presentado, *CUMPLE* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y calidad. *SE APRUEBA* EL INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL No.24 V2 **VoBo. Profesional Social Interventoria**						

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20262100147152 Código Web: 58@Bdv
FECHA: 16-03-2026 09:34:52 FOLIOS: 252
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MESA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA 25 - CO
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX 660 5400

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2026

CIG-IDRD-VEL-0199-2026

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Atte. Dra. Katherin Amaya Roa
Subdirectora Técnica de Construcciones
Gerente del Proyecto
Supervisora Designada
Katherin.amaya@idrd.gov.co
La ciudad

REFERENCIA. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232- 2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

ASUNTO: Remisión Informe **MENSUAL DE OBRA NO 25** – Correspondiente al mes **de FEBRERO 2026 (26/01/2026 al 25/02/2026)** – **COMPONENTE SOCIAL** - Proyecto Velódromo Gibraltar

Respetada Doctora

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 3219-2023, nos permitimos remitir a la entidad contratante **IDRD** el **INFORME MESNUAL DE OBRA DEL COMPONENTE SOCIAL.** correspondiente al mes de **FEBRERO 2026 (26/01/2026 al 25/02/2026)** entregado por la **Unión Temporal Metropolitano Porvenir** el cual fue revisado, avalado y aprobado por esta interventoría según se relaciona, a continuación:

ITEM	COMPONENTE	TOMOS	FOLIOS	CD	ESTADO
1	**SOCIAL No 25**	2	1 - 251	1	**APROBADO**

Cordialmente

Arq. Rubén Darío Crespo Botero
Director de Interventoría

Elaboró y Proyectó: Arq. Arturo Rojas Torres – Residente 2 de Interventoría
Revisó: Ing. Rubén Darío Crespo Botero – Director Interventoría
Aprobó: Ing. Javier Rojas – Coordinador Interventoría

Anexo: Informe Mensual de Obra No 25 en DOS (2) Carpetas, 1 CD y 251 Folios en total.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

252
