BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20264200118143

Bogotá D.C. 20-03-2026

PARA: **DANIELA BARRERA PEDRAZA**
Subdirección de Contratación

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME TÉCNICO No. 25 DEL CONTRATO DE OBRA No. 3232 DE 2023 – VELÓDROMO GIBRALTAR.**

EXPEDIENTE VIRTUAL No. 2024800701600035E

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir el informe técnico No. 25 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026, del contrato de obra No. 3232 de 2023, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR. Revisado y aprobado por la interventoría contrato No. 3219 de 2023 CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR.

Lo anterior, para que repose en la carpeta del contrato y en el expediente virtual.

Sin ningún otro particular,



KATHERIN AMAYA ROA
Supervisora del Contrato de Interventoría No. 3219 de 2023

Anexos: Lo enunciado en ciento diez (110) folios y dos (2) CDS.
Copia: N/A
Elaboró: Arq. Francy Liliana Murillo Agudelo – Apoyo a la supervisión – CTO 3617/2025
Proyectó: Arq. Francy Liliana Murillo Agudelo – Apoyo a la supervisión – CTO 3617/2025
Revisó: Katherin Amaya Roa – Supervisora del Contrato de Interventoría No. 3219 de 2023
Aprobó: N/A

Fecha de firmado:
2026.03.20 09:36:10 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

BOGOTÁ

CONTRATO IDRD -CTO-3232-2023

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

INFORME TÉCNICO MENSUAL 25

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO
PORVENIR

CONSORCIO INTERVENTORIAS GIBRALTAR
CONTRATO IDRD -CTO-3219-2023



PERICDO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026
BOGOTÁ

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2026.03.26 09:00:16 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

INFORME TÉCNICO

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
1	02/03/2026	Versión inicial del documento	
2	05/03/2026	Ajuste observaciones interventoría	
3	10/03/2026	Ajuste observaciones interventoría	

Firmas Contratista		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Arq. John H. Ramos Coordinador BIM/Obra	Ing. Alfonso Peñaranda S. Director de proyecto	Arq. José Luis Clavijo Representante Legal



Firmas Interventoría		
Validado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Ing. Armando Rodríguez Profesional Interventoría	Arq. Rubén Darío Crespo Director de Interventoría	Arq. Andrés Martínez Representante legal interventoría

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 8
2. OBJETIVOS 8
2.1. OBJETIVOS GENERALES 8
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 9
3.1. LOCALIZACION 9
3.2. DATOS DEL PROYECTO 9
3.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 10
3.3.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 10
4. ETAPA DE DIAGNOSTICO 12
4.1. RECORRIDO INICIAL DE OBRA 12
4.2. REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 12
4.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 12
4.4. VISITAS AL PREDIO 12
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATO DE OBRA 13
5.1. CONTROL DE POLIZAS 13
5.2. POLIZAS SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO 13
5.3. TRÁMITE ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 13
5.4. ENTREGA HOJAS DE VIDA 15
5.5. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO 15
5.6. RELACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE A PARAFISCALES 16
5.7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 19
5.8. ACTAS DE COMITÉ Y RECORRIDOS 33
6. COMPONENTE TECNICO DE OBRA 33
6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 33
6.1.1. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y DESVIOS 33
6.1.2. ELECTRICO 34

2

6.1.3. HIDROSANITARIO 39
6.1.4. SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE 44
6.1.5. GEOTECNIA 44
6.1.6. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 46
6.1.7. PAISAJISMO 58
6.1.8. PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 58
6.1.9. PLAN DE CONSTRUCCION Y COORDINACION LOGISTICA (METODOLOGIA PARA LA EJECUCCION DE OBRA) 59
6.1.10. ESTUDIO DE TRAFICO Y TRANSITO DEL VELODROMO 59
6.1.11. PROGRAMACION DE OBRA, GANTT DE SEGUIMIENTO 59
6.1.12. FLUJO DE INVERSION 62
6.1.13. ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 65
6.1.14. INFORME PRELIMINAR DE COORDINACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA BIM 65
6.1.15. PLAN DE EJECUCCION BIM-BEP 65
6.1.16. TOPOGRAFIA 65
6.1.17. ARQUITECTURA 66
6.1.18. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 66
6.2. REGISTRO DE TIME LAPSE 93
7. COMPONENTE FINANCIERO DEL CONTRATO 94
7.1. PROGRAMACION DE EJECUCCION DE OBRA 94
7.2. ACTAS PARCIALES DE OBRA 101
8. PLANES Y PROGRAMAS PERIODO 102
9. OTROS INFORMES 103
10. CONCLUSIONES 103
11. ANEXOS 105

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Datos del proyecto 10
Tabla 2.Detalle de pólizas, vigencia y valores. 13
Tabla 3 .Personal a cargo del proyecto 16
Tabla 4.Relación de pagos seguridad social 16
Tabla 5. Pagos parafiscales 17
Tabla 6. Ingresos personal subcontratistas 19
Tabla 7. Correspondencia enviada 25
Tabla 8. Correspondencia recibida 33
Tabla 9. Resumen de suministro estructura metálica en obra 56
Tabla 10.Entregables de programación 60
Tabla 11.Versiones de programación 60
Tabla 12. Adición presupuestal 61
Tabla 13. Modificatorios velódromos 61
Tabla 14. Flujo de inversión 63
Tabla 15.Programación ejecución de obra 94
Tabla 16. % de avance por capítulos en el periodo 96
Tabla 17.Actividades no programadas ejecutadas en el periodo 99
Tabla 18.Valores programados y ejecutados 100
Tabla 19.Actas parciales de obra 102

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general 9
Ilustración 2.Datos del proyecto 9
Ilustración 3 Localización 11
Ilustración 4.Correo de radicación documentos de ENEL. 14
Ilustración 5.Respuesta de ENEL a la radicación de la aprobación del serie 3. 14
Ilustración 6.Plano de ubicación señalización PMT 34
Ilustración 7.Diseño de ubicación de cajas de paso sin visualización de estructura de concreto. 34
Ilustración 8.Posible reubicación de las cajas de paso CS275 para que estén dentro de la estructura de concreto sin ser afectada. 35
Ilustración 9.Plano de conexiones de fibra óptica 35
Ilustración 10.Correo respuesta de Enel de la radicación proyecto serie 3. 36
Ilustración 11.Pases de tubería salidas comunicaciones de la pista. 36
Ilustración 12.Tuberia instalada en módulo 5 para salidas de tomacorrientes hacia pista y división en madera de caja CS276. 37
Ilustración 13.Tuberia salidas alimentadores alumbrado público. 38

Ilustración 14.Tuberia para pases de alumbrado y tomacorrientes en túnel deportistas. 38
Ilustración 15. Instalación geodrén y tecdren del túnel de apoyo en el segmento recto externo.... 40
Ilustración 16. Instalación geodrén y tecdren del túnel de apoyo en el segmento curvo 41
Ilustración 17. Instalación geodrén y tecdren del túnel principal. 42
Ilustración 18. Colector Aguas Lluvias Tramo 19-21 42
Ilustración 19. Colector Aguas Lluvias Tramo 17-19 43
Ilustración 20. Colector Aguas Lluvias Tramo 15-17 43
Ilustración 21.Estado de túnel de ambulancias 44
Ilustración 22.Rellenos túneles. 46
Ilustración 23 Planta túnel administrativo 47
Ilustración 24. despiece viga M9-003 48
Ilustración 25. Detalle desde el modelo estructural REvit 48
Ilustración 26. Despiece propuesto para la viga M9-003 49
Ilustración 27. despiece viga M9-024 49
Ilustración 28. Detalle desde el modelo viga M9-023 50
Ilustración 29. Detalle desde el modelo viga M9-023 corte 50
Ilustración 30. Detalle de conexión propuesto 51
Ilustración 31. Remumen despacho 11 53
Ilustración 32. Imagen descarga estructura metálica 29/01/2026 54
Ilustración 33. Remumen despacho 12 54
Ilustración 34. Imagen descarga estructura metálica 09/02/2026 55
Ilustración 35. Remumen despacho 13 55
Ilustración 36. Imagen descarga estructura metálica 23/02/2026 56
Ilustración 37. Cercha principal 57
Ilustración 38. Pivote Viga Central PVC1 57
Ilustración 39. Pivote Viga Central PVC2 58
Ilustración 40. Viga Pratt 58
Ilustración 41.Programación de obra vigente 62
Ilustración 42. Curva S 2024 64
Ilustración 43 .Curva S 2025 - 2026 64
Ilustración 44 .Organigrama 65
Ilustración 45.Resumen de actividades área eléctrica de febrero. 67
Ilustración 46. Excavación de dados de módulo 1 en zona de graderías módulo 10. 70
Ilustración 47. Avance del descabece de pilotes en el módulo 10. 71
Ilustración 48. Avance de llenos al respaldo de los muros del túnel administrativo. 72
Ilustración 49. Rellenos en material de excavación en zona de rampa de pasarela hacia la estructura de la pasarela. 73

Ilustración 50. Rellenos en recebo en zona de módulo 6..... 74
Ilustración 51. Fundida de solados de limpieza bajo dados de módulo 10..... 75
Ilustración 52. Fundida de columnas de 60 cm en los módulos 4 y 6..... 76
Ilustración 53. Avance de fundida de columnas en módulos 3 y 5..... 77
Ilustración 54. Fundida de segundo tramo de columna de 100 cm. de Módulo 1 frente a módulos 4 y 2..... 78
Ilustración 55. Fundida de vigas de 40x60 en la corona del túnel administrativo..... 79
Ilustración 56. Viga aérea de Módulo 1 frente a módulos 2 y 4..... 80
Ilustración 57. Viga aérea nivel superior de Módulo 1 frente a módulos 7 y 8..... 81
Ilustración 58. Instalación de aceros de refuerzo en vigas aéreas perimetrales..... 82
Ilustración 59. Mallas electrosoldadas ya instaladas y en proceso de vaciado para módulo 6..... 83
Ilustración 60.Fundida de dados de cimentación en zona de graderías Modulo 6..... 84
Ilustración 61.Fundida de vigas del módulo 6 de graderías..... 85
Ilustración 62.Fundida de muros de contención en el túnel de principal..... 86
Ilustración 63. Vaciado de concreto en placa de cimentación del módulo 6 de graderías..... 87
Ilustración 64. Vaciado de concreto en placa de túnel deportivo N. +0.00..... 88
Ilustración 65. Avance en fundida de muros hacia pista en zona del módulo 6..... 89
Ilustración 66.Imagen del inicio de la actividad en el túnel principal..... 90
Ilustración 67.Caseton instalado en modulo 6..... 91
Ilustración 68.Imagen de nuevas secciones de estructura metálica de cubierta llegando a obra..... 92
Ilustración 69. Fundida columna rampa pasarela eje P14..... 93
Ilustración 70. Programación de obra..... 95
Ilustración 71.Actividades para el mes de febrero de 2026..... 97
Ilustración 72. Curva S del proyecto..... 99
Ilustración 73.Planes y programas del periodo..... 103

4

1. INTRODUCCION

En el presente documento se dan a conocer las actividades del componente técnico desarrolladas en el periodo comprendido del 26 de enero 2026 al 25 de febrero de 2026 en el marco del Contrato IDRD 3232 de 2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.", organizado por cada una de las especialidades establecidas en el componente Técnico presentado por el contratista, con el cual se da cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato para el desarrollo del proyecto; se presentan las actividades desarrolladas con el objeto de garantizar la entrega de información oportuna y veraz conforme a las actividades realizadas durante este periodo.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El presente informe técnico será un mecanismo de informar el avance mensual de las actividades ejecutadas objeto del contrato IDRD-CTO-3232-2023 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ" en sus dos (2) etapas ejecutables en veintiséis (26) meses establecidos en el Anexo técnico capítulo 4 Plazo para la ejecución del contrato.

Los informes mensuales irán reflejando paulatinamente el desarrollo de las actividades propias de cada una de las especialidades del componente técnico.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de cada una de las actividades contempladas en el componente técnico del contratista, evidenciando el cumplimiento de la ejecución de las actividades. Estas actividades dentro del periodo del 26 de enero 2026 al 25 de febrero 2026, corresponden a temas administrativos, tales como la elaboración de documentos, la gestión de recursos y la coordinación con las entidades involucradas. De la misma manera, se abordan las actividades ejecutadas en obra durante el periodo y se presentan las diferentes actividades relacionadas con los ajustes y coordinación de diseños.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy, en la UPL Patio Bonito en el barrio Osorio XII, en la dirección Calle 49 Sur N° 98B-76, en el parque de categoría Estructurante El Porvenir (Gibraltar).

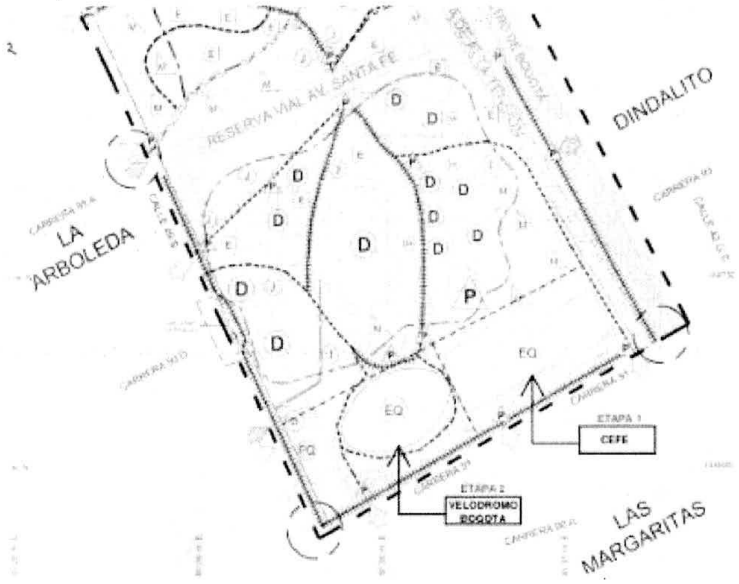


Ilustración 1. Localización general

3.2. DATOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los datos generales del proyecto de acuerdo a lo definido por la Consultoría de diseño en el plano A-02 – PLANO POR ETAPAS:

ETAPA 2 VELODROMO			
VELODROMO BOGOTA		Calle 49 sur con KR91	
AREA TOTAL CONSTRUIDA VELODROMO		18.638,41	M2
AREA PISO 1		11.373,57	M2
AREA PISO 2		5.009,44	M2
AREA RAMPA + PASARELA		2.255,40	M2
TOTAL A CONSTRUIR		18.638,41	M2
TOTAL AREA LIBRE- RELACIÓN LOTE PARQUE		496.252,63	M2

Ilustración 2.Datos del proyecto

Adicionalmente se presentan los datos correspondientes a la información del Contratista de obra:

Contratista	Unión Temporal Metropolitano Porvenir
NIT	901781400-1
Contrato	3232 de 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.
Representante legal:	José Luis Clavijo Olmos (P), Ernesto Yugueros Rodríguez (S)
Fecha de firma del contrato:	21 de diciembre de 2023
Fecha de firma de acta de inicio:	6 de febrero de 2024
Plazo de ejecución:	26 meses
Fecha de terminación del contrato:	5 de abril de 2026
Etapas del contrato:	Etapa de inicio Etapa de obra
Valor del contrato:	$ 132.821.646.606,00
Adición modificatorio No.002	$14.965.010.422
Valor total del contrato:	$ 147.786.657.028
ARL	Axa Colpatria
Riesgo	V - I

Tabla 1. Datos del proyecto

3.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

3.3.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Esta etapa fue realizada en el contrato de Consultoría IDRD N° 2758 de 2021, en la cual se desarrollaron los documentos base para la elaboración de planes y ejecución de obra. Se toman las especificaciones técnicas inicialmente planteadas para la etapa constructiva. Como resultado de esta etapa se obtiene el diseño del Velódromo con las siguientes características: El VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR) cuenta con un área construida de edificación de 18.638.41 m2 y áreas exteriores de 25.299,67 m2 (aproximadamente). El Velódromo está diseñado como un escenario internacional, será uno de los más rápidos de Latinoamérica y un sitio ideal para el entrenamiento en altura, contará con espacios especiales para el comercio relacionado

con la economía del deporte y una zona central para hacer eventos culturales y deportivos de alto rendimiento[1].



Ilustración 3 Localización

El Velódromo está diseñado como un escenario internacional, será uno de los más rápidos de Latinoamérica y un sitio ideal para el entrenamiento en altura, contará con espacios especiales para el comercio relacionado con la economía del deporte y una zona central para hacer eventos culturales y deportivos de alto rendimiento.

La importancia del Velódromo se centra en que el ciclismo de pista es uno de los deportes que le ha brindado grandes logros deportivos a Bogotá y al país, haciendo presencia en los eventos del ciclo olímpico y paralímpico con el paracycling; teniendo una gran atracción por sus pruebas que son de gran capacidad técnica y táctica. Actualmente en Colombia es uno de los deportes base y guía para el ciclismo de ruta.

Entre tanto las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Actividades administrativas y de coordinación del proyecto, así como la construcción de la edificación del VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR). La edificación tiene los siguientes espacios:
- Zona Central Velódromo
- Zona de apoyo a la competición
- Zona de juzgamientos
- Zona VIP, prensa
- Gradería y servicios de gradería

[1] Tomado del Anexo 1 – Anexo Técnico Proceso No. IDRD-SG-SAMC-071-2023

- Zona Administrativa
- Zona técnica
- Zona para servicios complementarios graderías
- Zona cubierta verde
- Zona para servicios complementarios primer piso cubiertos
- Zona exterior

Adicionalmente, en el marco del desarrollo del contrato se deberán adelantar las siguientes actividades administrativas y de coordinación del proyecto:

- Revisión de la información y validación de los documentos entregados por la consultoría presentados mediante un informe de conformidad a lo descrito en la etapa inicial del proyecto.
- Implementación de metodología BIM (Building Information Modeling).
- Revisión y Validación de los tratamientos silviculturales frente a estudios y diseños.
- Plan de Construcción y Coordinación Logística.
- Solicitud de Permisos o actualización de estos.
- Y todos los trámites respectivos que se requieran para recibir el aval o aprobación por parte de las diferentes Entidades.

4. ETAPA DE DIAGNOSTICO

4.1. RECORRIDO INICIAL DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al presente informe NO se realizó el recorrido inicial de obra. Fue en enero de 2024.

4.2. REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Para el periodo del presente informe no se realizaron actividades del componente.

4.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Durante el periodo de febrero de 2024 se realizó el levantamiento topográfico inicial de acuerdo con los parámetros establecidos para la ejecución de la actividad. Para el presente periodo se tiene vigente la versión inicial del levantamiento presentado y avalado por la Interventoría.

4.4. VISITAS AL PREDIO

Durante el periodo se llevaron a cabo varias visitas al predio por parte de la Supervisión del contrato, el 29 de enero de 2026 y 5,12 y 19 de febrero de 2026.

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATO DE OBRA

5.1. CONTROL DE POLIZAS

Las pólizas de responsabilidad y garantía única correspondientes al contrato fueron presentadas a la interventoría en febrero de 2024. Posteriormente, con la suscripción del Modificatorio N.º 1, se remitieron las pólizas actualizadas mediante el comunicado CE-206-125-684 del 23 de septiembre de 2025. A la fecha, se encuentra suscrito el Modificatorio N.º 2, a través del cual se envió la respectiva actualización mediante el comunicado CE-206-125-1912 del 7 de octubre de 2025.

CONCEPTO	N° PÓLIZA	TIPO	REFERENCIA	VIGENCIA		FECHA EMISIÓN	VALOR
				DESDE	HASTA		
ACTA DE INICIO	64234	RESPONSABILIDAD	12006423400001	6/02/2024	5/04/2026	22/02/2024	-
	72127	CUMPLIMIENTO	21007212700001	21/12/2023	5/04/2031	22/02/2024	-
PÓLIZAS N°1	64234	RESPONSABILIDAD	12006423400000	21/12/2023	20/02/2026	21/12/2023	$ 68.607.016,00
	72127	CUMPLIMIENTO	21007212700000	21/12/2023	20/02/2031	21/12/2023	$ 1.256.378.602,01
MODIFICATORIO N°01	64234	RESPONSABILIDAD	12006423400002	5/09/2024	5/04/2026	20/09/2024	-
	72127	CUMPLIMIENTO	21007212700002	21/12/2023	5/04/2031	20/09/2024	-
MODIFICATORIO N°02	64234	RESPONSABILIDAD	12006423400003	24/09/2025	5/04/2026	7/10/2025	$ 1.897.575,00
	72127	CUMPLIMIENTO	21007212700005	21/12/2023	5/04/2031	7/10/2025	$ 59.760.116,09

Tabla 2.Detalle de pólizas, vigencia y valores.

5.2. POLIZAS SEGÚN SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Las pólizas de responsabilidad y garantía única de suscripción del contrato se presentaron en el informe correspondiente al periodo de febrero de 2024.

5.3. TRÁMITE ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el mes de febrero entre los tramites realizados ante en operador de red de red energía eléctrica Enel-Colombia se informa que se realizó radicación No 2 del proyecto serie 3 para la aprobación del proyecto Velodromo

A continuación, se enuncian los números de radicación de esta radicación.

- No de radicación: 1500889847
- Caso: 930211127
- Consulta de seguimiento No 84889428
- Se recuerda que se requiere actualización de licencia de construcción para su aprobación. 0

Imagen del correo de radicación de los documentos.

7

---------- Forwarded message ---------
De: **Andrés Castellanos Toro** <afcastellanost@gmail.com>
Date: mié, 4 feb 2026 a la(s) 7:41 a.m.
Subject: PROYECTO VELÓDROMO Factibilidad 1500805286
To: B2B - Servicio al cliente <servicioalcliente.empresarial@enel.com>

Cordial saludo
Adjunto encontrarán el link con los archivos adjuntos necesarios para la solicitud de revisión N° 2 del proyecto PROYECTO VELÓDROMO GIBRALTAR, con factibilidad 1500805286.

Agradecemos la atención prestada y quedamos a la espera de la respuesta de recibido por parte de Enel Codensa.

Link de descarga wetransfer:
https://we.tl/t-cYOs4x7NgO

Link de descarga drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1Wg9OhYJBV-ki-80siBE6BMUD9Ocq11bC?usp=sharing

Cordialmente,

Ilustración 4.Correo de radicación documentos de ENEL.

Imagen de la respuesta de Enel-Colombia a la radicación de solicitud de aprobación de serie 3 de proyecto Velodromo.

Logotipo Descripción generada automáticamente
Bogotá D.C. 05 de febrero de 2026

Señor
Jorge Hernando Perez
Bogotá D.C.

Asunto: Proyecto de conexión radicado nro. **1500889647**
Caso nro. **930211127**

Respetado Señor Perez, reciba un cordial saludo

Hemos recibido su requerimiento del día **05/02/2026** en el cual solicita radicación del diseño de proyecto de conexión **VELODROMO PARQUE GIBRALTAR**

Al respecto, le informamos que hemos iniciado las gestiones correspondientes bajo tarea 1094936

Tenga presente que puede descargar las cartas de respuesta a las etapas de nuevas conexiones a través de Mi Enel (clic aquí), basta con registrarse (Tracking de NNGG) y realizar la consulta con el consecutivo 946894926

Vale la pena aclarar que su solicitud fue radicada un día hábil despues de la recepción. Lo anterior, debido a que fue enviada después del cierre de nuestro horario hábil, el cual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recuerde que la conexión del servicio requiere cumplir con los requisitos previstos en la normatividad vigente. Una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos documentales y técnicos, solo el personal técnico autorizado por la empresa es quien realizará la puesta en servicio de la conexión evitando generar situaciones de riesgo para la salud, la vida de las personas, la seguridad de la misma instalación y las edificaciones contiguas.

Ilustración 5.Respuesta de ENEL a la radicación de la aprobación del serie 3.

Por otra parte, en cuanto al componente hidráulico, se obtuvo Certificado de Disponibilidad Inmediata del servicio de Gas Natural actualizada expedida por VANTI S.A. ESP. Simultáneamente, se adelantó agendamiento para la revisión de los diseños de las redes de gas natural, la cual quedó programada para el día 3 de marzo.

Por otra parte, se sigue a la espera de la gestión que adelante la Entidad con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP para los diseños de las redes externas de Acueducto, aprobación de los mismos por parte de la ESP y plan de acción correspondiente en el marco del contrato de obra entre la UTMP y el IDRD.

5.4. ENTREGA HOJAS DE VIDA

Durante el periodo comprendido en el presente informe, se presentó a la interventoría el comunicado CE-206-125-2156 del 19 de enero de 2026 mediante el cual se hace la solicitud de cambio de hoja de vida de del Residente en Programación y Presupuesto, la cual fue aprobada por Interventoría el 20 de enero de 2026, mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0037-2026.

5.5. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la tabla del personal presentado y aprobado por la Interventoría:

	CARGO	PROFESIONAL APROBADO
1	DIRECTOR DE OBRA	ALFONSO PEÑARANDA SUAREZ
2	PROFESIONAL AUXILIAR DE OBRA	CLAUDIA NATHALY GUALTEROS ALVAREZ
3	PROFESIONAL AUXILIAR DE OBRA	JULIO CESAR SÁNCHEZ SUAREZ
4	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	CARLOS EDUARDO GUZMÁN SÁNCHEZ
5	INGENIERO ESTRUCTURAL	JOSE MANUEL GALEANO VALENZUELA
6	RESIDENTE EN GEOTECNIA	MARIO FELIPE ORTIZ PATIÑO
7	RESIDENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIANA ALEJANDRA TELLO CERQUERA
8	RESIDENTE DE ACABADOS	MARCELA INÉS CLAVIJO OLMOS
9	RESIDENTE INSTALACIÓN HIDRÁULICAS	ALFREDO FERREIRA
10	RESIDENTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	EDUARD ANTONIO CORREDOR REYES
11	RESIDENTE INSTALACIONES MECÁNICAS	REINALDO SALAMANCA SANABRIA
12	PROFESIONAL EN PISTAS VELÓDROMO	RAFAEL ROMAY REYGADAS
13	PROFESIONAL AMBIENTAL EN MANEJO DE SUELOS CONTAMINADOS	CESAR WILLREÑN FERNANDEZ SOLER
14	RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA	PAULA ALEJANDRA BLANCO ALARCON
15	MAESTRO O INSPECTOR DE OBRA	OMAR CRUZ
16	MAESTRO O INSPECTOR DE OBRA	LUIS EVELIO CARDOZO FONSECA
17	ALMACENISTA	PEDRO ANTONIO UBAQUE RODRÍGUEZ
18	AUXILIAR DE ALMACÉN	YEISON ALEXANDER BUSTOS PERDOMO
29	SECRETARIA DE OBRA	NELLY ESPERANZA CARREÑO RIVEROS
20	PERSONAL OPERARIO (ASEO GENERAL)	JIMENA DEYANIRA CAMACHO
21	MENSAJERO DE OBRA	JOSE ANTONIO BUSTACARA FUENTES
22	ABOGADO	YOLANDA MARGARITA SANCHEZ GOMEZ
23	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	DIANA MARCELA ORTIZ DOMÍNGUEZ
24	PROFESIONAL DE CALIDAD	DIEGO FERNANDO CASTRO GONZALEZ
25	RESIDENTE DISEÑO CONTROL DE OBRA (PROFESIONAL DE COMPRAS)	ORLANDO YESID HERNÁNDEZ AMORTEGUI
26	PROFESIONAL FORESTAL	JUAN JAIVER ESPINEL SILVA

8

27	PROFESIONAL PAISAJISTA	GUSTAVO ADOLFO BARRETO ALVARADO
28	PROFESIONAL EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INGRID JOHANNA BARRIENTOS MURCIA
29	PROFESIONAL SG - SST	LUZ STELLA RODRÍGUEZ MARÍN
30	INSPECTOR SST	ANGIE LORENA CARRILLO PRIETO
31	PROFESIONAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MARTHA ROCIO CASTILLO FERNÁNDEZ
32	INGENIERO REDES CONTRA INCENDIOS	DIEGO ALEXIS ROJAS HERRERA
33	RESIDENTE DISEÑO Y CONTROL DE OBRA – PROFESIONAL BIM	JOHN HAWUART RAMOS PEÑA
34	PROFESIONAL HIDROGEÓLOGO	SARA EULALIA CHAPARRO GORDILLO
35	PROFESIONAL BIÓLOGO	CLAUDIA INFANTE JAIMES
36	RESIDENTE ESTRUCTURAS METÁLICAS	SANDRA MILENA PARRA MOLANO

Tabla 3 .Personal a cargo del proyecto

5.6. RELACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTE A PARAFISCALES

Para el periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2026 el personal vinculado laboralmente a la UT y con cada uno de los subcontratistas, se le realizó el pago al sistema general de seguridad social, el cual se realiza mes vencido, según lo establecido en el decreto 1273 de 2018, por lo tanto, el periodo de cotización de ARL es enero de 2026, el cual se cancela en el mes de febrero de 2026, como se relaciona en el siguiente cuadro:

PERSONAL	CANTIDAD	Periodo de pago de ARL	Periodo de pago de EPS
PERSONAL CONTRACTUAL UTMP	33	Enero de 2026	Febrero de 2026
PERSONAL DE APOYO UTMP	8	Enero de 2026	Febrero de 2026
PERSONAL OPERATIVO UTMP	8	Enero de 2026	Febrero de 2026
PERSONAL OPERATIVO SUBCONTRATISTAS	131	Enero de 2026	Febrero de 2026
PERSONAL VIGILANCIA	6	Enero de 2026	Febrero de 2026

Tabla 4.Relación de pagos seguridad social

Nota:

- En la tabla 3 solo se relaciona el personal que estuvo activo durante el periodo del informe 25.
- De acuerdo al cuadro de "Perfiles y Dedicaciones" de los pliegos de condiciones del proyecto, el especialista paisajista está programado durante el 2 al 7 mes del proyecto (febrero a julio 2024) y durante el periodo final del 21 al 26 (septiembre 2025 a febrero 2026); sin embargo, dicho especialista no ha ingresado, dado que, por el avance de obra actual, no se amerita su asistencia.

ACTIVIDAD	PERSONAL	PERIODO
Pago de salarios y/o paz y salvos	186	26 Enero - 25 Febrero 2026

Tabla 5. Pagos parafiscales

Como evidencia de lo relacionado en la tabla 4, el consorcio Unión Temporal Metropolitano porvenir, cumplió con la obligación de pagar el salario correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2026 y la primera quincena del mes de febrero de 2026, a los profesionales y el personal de apoyo vinculado laboralmente. Así mismo garantiza el pago de honorarios en los tiempos de pago acordados en cada uno de los contratos, al personal que ejecuta sus labores mediante contrato de prestación de servicios (OPS) y verifica el pago de salarios al personal de los diferentes subcontratistas.

Nota: Se aclara que, debido a la fecha de corte del informe, algunos contratistas presentan pagos del mes de enero de 2026, puesto que estos se realizan de manera mensual y dado que al 25 de febrero de 2026 no se ha realizado el pago del mes corriente; a continuación, relacionamos los subcontratistas que realizan pagos de manera mensual:

- Castillo y Asociados – Personal Contractual
- EMECON – Personal Contractual
- COLOMBIA BIM CONSULTING S.A.S. – Personal Apoyo UTMP
- Seguridad Ralco - Subcontratistas
- Altara - Subcontratistas
- Veolia – Subcontratista
- Geotam – Subcontratista
- P&E Consultores – subcontratista

Por otra parte, se informa que los siguientes subcontratistas no soportan pagos de salarios, teniendo en cuenta las siguientes aclaraciones:

- Transgruas y logísticas – subcontratista: el pago se realiza de manera mensual; por lo cual no se presenta soporte dado que el colaborador ingreso en el mes de febrero de 2026.
- Pragma consultoría y construcciones – subcontratista: el pago se realiza de manera quincenal; sin embargo, no se presenta soporte de pago dado que el los colaboradores ingresaron a partir del 18 de febrero de 2026)

Así mismo se informa que en el periodo del informe 25, se presentan 41 ingresos por parte de personal de subcontratistas, los cuales se relacionan a continuación:

#	TRABAJADOR	No. Identificación	Cargo	Fecha de Ingreso
1	DIANA ALEJANDRA TELLO CERQUERA	1070604368	Residente de Programación y Presupuestos	26-ene-26

#	TRABAJADOR	No. Identificación	Cargo	Fecha de Ingreso
2	NEYDER BRAVO MORLES	1070820125	Ayudante de Obra	26-ene-26
3	DAIRO PIMIENTA ESPEJO	1007857874	Oficial	28-ene-26
4	REINALDO GIL MARTINEZ	73015573	AYUDANTE	28-ene-26
5	JOHN ALEXANDER GONZALEZ DIAZ	1023871003	Oficial	28-ene-26
6	CARLOS HUMBERTO ROJAS TAFURT	1046428414	Oficial	28-ene-26
7	JEVINSON GONZALEZ OSPINO	1004500728	Oficial	28-ene-26
8	DIOMEDES DE JESUS MENDOZA HERNADEZ	1005575552	AYUDANTE	29-ene-26
9	VICTOR MANUEL HERNANDEZ CRISTANCHO	1023895339	AYUDANTE	30-ene-26
10	LEO DAN VANEGAS RANGEL	85442811	Oficial	30-ene-26
11	ARGENIS RAFAEL RANGEL PEREZ	77143393	Oficial	30-ene-26
12	CRISTIAN ARLEY QUIÑONEZ DIAZ	1016074069	Auxiliar planta de concreto	2-feb-26
13	OVIDIO CIFUENTES RODRIGUEZ	3118939	Operador	2-feb-26
14	JOSE ALBERTO CHACON ARIAS	1048873089	Ayudante	3-feb-26
15	EMERSON CHACON ARIAS	1046427645	Ayudante	3-feb-26
16	JUAN CARLOS FREYLE TEHERAN	1010121749	Oficial	3-feb-26
17	LEYDER ORLANDO DELGADILLO TORRES	91018388	Oficial	3-feb-26
18	JESUS DAVID RODRIGUEZ RANGEL	1085037258	Oficial	3-feb-26
19	ENDER ENRIQUE NEWMAN RAMIREZ	6230990	Vigilante	4-feb-26
20	ADOLFO GONZALEZ RONCANCIO	9499173	Ayudante	5-feb-26
21	ONEDIS MANUEL ARROYO PEREZ	1003069839	Ayudante	5-feb-26
22	NESTOR ALFONSO BARRIOS VELASQUEZ	1001934698	Ayudante	5-feb-26
23	JESER YESID RODRIGUEZ DUARTE	1006855817	Vigilante	7-feb-26
24	MONICA ANDREA QUINTERO CARDONA	1024497071	Ayudante de Obra	10-feb-26
25	ARIEL ALFONSO FERREIRA YERA	1004323282	Ayudante de Obra	10-feb-26
26	JOSE VARGAS MENDEZ	1004904157	Ayudante de Obra	10-feb-26
27	JOSE CARLOS SIERRA AGUILERA	1099964481	Oficial	18-feb-26
28	ALEX RODRIGUEZ MENDOZA	1002379367	Oficial	18-feb-26
29	JAMER MEJIA MORALES	1082473264	Oficial	18-feb-26
30	ARNETH BOLAÑOS MORALES	1003561869	Encargado	18-feb-26
31	ALVARO JOSE MONTERO ATENCIO	1127665582	Oficial	18-feb-26
32	JAINER CHAVEZ RUZ	1216694309	Oficial	18-feb-26
33	JOSE LUIS VILLALOBOS AVENDAÑO	1051657583	Oficial	18-feb-26
34	MARIANA CAMILA DUQUE JARAMILLO	1000334982	Auxiliar de ingeniería	18-feb-26
35	ESNEIDER ROBLES TOLOZA	1003335649	Oficial	18-feb-26
36	JADER CHAVEZ RUZ	1085102167	Oficial	18-feb-26
37	CARLOS ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ	80853551	Inspector SST	18-feb-26
38	GILBERTO DIAZ TORRES	1085180608	Oficial	18-feb-26
39	ANGEL RODRIGUEZ IPUANA	1124023473	Ayudante de Obra	20-feb-26
40	JAIME ALBERTO ARIZA ROBLES	1082469946	Ayudante de Obra	20-feb-26
41	REINALDO JOSE RODRIGUEZ IPUANA	1124009783	Ayudante de Obra	20-feb-26

Tabla 6. Ingresos personal subcontratistas

5.7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

A continuación, se presenta la correspondencia enviada durante el periodo:

CE-206	125	2172	26/01/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0043-2025. RADICADO 1196 de 23-01-2026. Observaciones diseños hidrosanitarios
CE-206	125	2173	26/01/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta Comunicado CIG-IDRD-VEL-0041-2026 "Respuesta Oficio de obra CE-206-125-2155 con respecto a la revisión efectuada a las ACTAS DE RECIBO PARCIAL No 20 – Velódromo Gibraltar.
CE-206	125	2174	26/01/2026	INTERVENTORÍA	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 03 Y ADICIÓN No. 02 AL CONTRATO DE OBRA IDRD No. 3232 de 2023
CE-206	125	2175	27/01/2026	INTERVENTORÍA	Entrega física del informe mensual N°19 del componente ambiental, aprobado por Interventoría.
CE-206	125	2176	27/01/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN PLANOS DE ASCENSORES MÓDULO 7
CE-206	125	2177	27/01/2026	INTERVENTORÍA	Informe de despacho estructura metálica de cubierta No. 5 enero 2026
CE-206	125	2178	27/01/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 39 APROBADO
CE-206	125	2179	27/01/2026	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual N°24 del componente de Fauna Silvestre
CE-206	125	2180	27/01/2026	INTERVENTORÍA	Pronunciamiento – Acción de tutela
CE-206	125	2181	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión para conocimiento – Pronunciamiento a la Acción de Tutela con radicado N° 11001311002920250080200.
CE-206	125	2182	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Solicitud cambio de personal clave de obra – Profesional en Pistas Velódromo.
CE-206	125	2183	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Entrega física del informe mensual N°20 V.3 del componente ambiental, aprobado por Interventoría.
CE-206	125	2184	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual V1 No. 24 del componente social.
CE-206	125	2185	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual N°24 del componente de Forestal.
CE-206	125	2186	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión NPS Eléctricos - Modificatorio 3
CE-206	125	2187	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Informe Mensual Componente Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres N° 24 - Período del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026

CE-206	125	2188	28/01/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN PLANOS DE TALLER PISTA VERSIÓN 1.
CE-206	125	2189	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual V1 No. 24 del componente social. V
CE-206	125	2190	28/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión NPS Eléctricos - Modificatorio 3
CE-206	125	2191	29/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual No. 24 V1 – Componente SST
CE-206	125	2192	30/01/2026	INTERVENTORÍA	Informe mensual N°24 componente de calidad
CE-206	125	2193	29/01/2026	INTERVENTORÍA	Entrega Informe mensual No. 24 V.1 del componente técnico.
CE-206	125	2194	02/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega cotizaciones de diseños para parqueaderos CAR.
CE-206	125	2195	3/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega de informes de Instrumentación geotécnica No. 59 y 60, control de asentamientos e informe de análisis y conclusiones del periodo del 16 al 30 de enero de 2026.
CE-206	125	2196	30/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión NPS Concretos - Modificatorio 3
CE-206	125	2197	31/01/2026	INTERVENTORÍA	Entrega fisica del informe mensual N°24 del componente social, aprobado por interventoría
CE-206	125	2198	31/01/2026	INTERVENTORÍA	Remisión NPS Cubierta - Modificatorio 3
CE-206	125	2199	02/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega avance Timelapse – enero 2026.
CE-206	125	2200	02/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta al Radicado CIG-IDRD–VEL-045-2026 "Respuesta comunicaciones CE-206-125-1533 del 18 de julio de 2025, confirmación respuesta a oficio CE-206-125-1708 y CE-206-125-1709 del 15 de agosto de 2025 – Medidas PMA y PGRDEPP".
CE-206	125	2201	03/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega fisica del informe mensual N°24 del componente forestal, aprobado por interventoría
CE-206	125	2202	03/02/2026	INTERVENTORÍA	Remisión Insumos modificatorio 3
CE-206	125	2203	04/02/2026	INTERVENTORÍA	Plano conexiones fibra optica
CE-206	125	2204	04/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0075_2026 - Atención de observaciones Informe mensual No. 24V1 – Componente SST
CE-206	125	2205	04/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega de sentencia acción de tutela N°. 110013110029 2025-00802-00. Juzgado veintinueve de familia de Bogotá
CE-206	125	2206	04/02/2026	INTERVENTORÍA	RESPUESTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0021-2026 y CIG-IDRD-VEL-0050-2025 AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN PLAN DE CALIDAD – PROYECTO VELODROMO GIBRALTAR
CE-206	125	2207	05/02/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 40.
CE-206	125	2208	05/02/2026	INTERVENTORÍA	REMISIÓN ORDEN DE GIRO No.35 Y PLAN Y FLUJO DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO V.11

CE-206	125	2209	05/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0062-2025. RADICADO 1206 de 28-01-2026. Entrega Ficha Técnica de sistema de bombeo RCI ajustada.
CE-206	125	2210	06/02/2026	INTERVENTORÍA	AMPLIACIÓN ALCANCE COMUNICADO CE-206-125-2206 INFORMECIÓN PLAN DE CALIDAD - PROYECTO VELODROMO GIBRALTAR.
CE-206	125	2211	06/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta al Comunicado No. CIG-IDRD-VEL-0081-2026. Subsanación de observaciones al Informe Mensual del Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres N° 24, Período del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026 - Radicación Versión 2
CE-206	125	2212	06/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta al Comunicado No. CIG-IDRD-VEL-0071-2026. Subsanación de observaciones al Informe Mensual del Componente Técnico N° 24, Período del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026 - Radicación Versión 2.
CE-206	125	2213	06/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio obra CIG-IDRD-VEL-0063-2026 según revisión Informe Mensual Componente fauna N° 24 (enero 2026) V.01 -Observaciones
CE-206	125	2214	06/02/2026	INTERVENTORÍA	Certificado Disponibilidad Inmediata de Gas Natural Domiciliario actualizado.
CE-206	125	2215	07/02/2026	INTERVENTORÍA	RADICACION PROYECTO SERIE 3 VELODROMO EN ENEL
CE-206	125	2216	07/02/2026	INTERVENTORÍA	ACTA 22
CE-206	125	2217	07/02/2026	INTERVENTORÍA	AMPLIACIÓN ALCANCE COMUNICADOS CE-206-125-2206 Y CE-206 - 125-2210 INFORMACIÓN PLAN DE CALIDAD – PROYECTO VELODROMO GIBRALTAR.
CE-206	125	2218	07/02/2026	INTERVENTORÍA	RESPUESTA AL COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0088-2026 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO MENSUAL N°24 V.02
CE-206	126	2219	12/02/2026	ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2220	12/02/2026	JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE BOSA	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2221	12/02/2026	ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2222	12/02/2026	JUNTA ADMINISTRADORA	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo

				LOCAL DE KENNEDY	
CE-206	126	2223	12/02/2026	PERSONERÍA LOCAL DE KENNEDY	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2224	12/02/2026	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2226	12/02/2026	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2227	12/02/2026	DADEP	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2228	12/02/2026	CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2229	12/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2230	12/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	126	2231	12/02/2026	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	Invitación comité de participación ciudadana N°23-Velódormo
CE-206	125	2232	10/02/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA AMPLIACIÓN DE TIEMPO DEL PMT.
CE-206	125	2233	10/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-0086-2026 - Entrega del informe mensual N°24V2 del componente SST – Aprobado por Interventoría.
CE-206	125	2234	10/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega física del informe mensual N°24 del componente técnico, aprobado por interventoría
CE-206	125	2235	10/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega física del informe mensual N°24 del componente ambiental, aprobado por interventoría.
CE-206	125	2236	10/02/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 40 APROBADO.
CE-206	125	2237	12/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio obra CIG-IDRD-VEL-0099-2026 según revisión Informe Mensual Componente fauna N° 24 (enero 2026) V.02 -Observaciones

CE-206	125	2238	12/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-094-2026 Observaciones al informe de calidad N°24
CE-206	125	2239	12/02/2026	INTERVENTORÍA	Solicitud cambio de personal clave de obra – Mensajero de Obra.
CE-206	125	2240	12/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-058-2026 - Formatos de Calidad para el procedimiento de Maniobra Estructura metálica en el Proyecto Velodromo.
CE-206	125	2241	13/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega de informes de Instrumentación geotécnica No. 61, control de asentamientos e informe de análisis y conclusiones del periodo del 31 de enero al 08 de febrero de 2026
CE-206	125	2242	13/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega física del informe mensual N°24 del componente de Fauna Silvestre, aprobado por interventoría.
CE-206	125	2243	13/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio CIG-IDRD-VEL-0538-2025 Cartillas de acero módulos de estructura del Velódromo
CE-206	125	2247	16/02/2026	INTERVENTORÍA	RESPUESTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0115-2026 INFORME MENSUAL N°24 IMPRESO
CE-206	124	2248	16/02/2026	INTERVENTORÍA	Solicitud de análisis de requerimientos de inclusión de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) – Amigable Componedor y Arbitraje.
CE-206	125	2249	16/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta al Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0097-2026 del 09-02-2026. Alcance al Informe Mensual del Componente Ambiental N° 22 (Entrega V3), período del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025.
CE-206	125	2250	17/02/2026	INTERVENTORÍA	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-VEL-0083-2026 ENTREGA PROPUESTA DE PLANIMETRÍA DE PISTA.
CE-206	125	2251	17/02/2026	INTERVENTORÍA	ENSAYO DE PROCTOR LLENOS DE TRASDOS DE LOS TÚNELES
CE-206	125	2252	18/02/2026	INTERVENTORÍA	Ajustes constructivos vigas de cimentación MODULO 1 en MODULO 9.
CE-206	125	2253	18/02/2026	INTERVENTORÍA	Solicitud actualización de cotizaciones VANTI.
CE-206	125	2254	19/02/2026	INTERVENTORÍA	RESPUESTA A DENUNCIA SOBRE CONTRATACIÓN DE EMPRESA EN DISEÑO DE VELODROMOS.
CE-206	125	2255	18/02/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 41
CE-206	125	2256			asuntos material de reclamación

12

CE-206	125	2257	19/02/2026	INTERVENTORÍA	SEXTA ENTREGA DOSSIER DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA - VELODROMO GIBRALTAR
CE-206	125	2258	19/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta a comunicado CIG-IDRD-978-2025. Traslado prórroga TPO EAAB-Velodromo
CE-206	125	2259	20/02/2026	INTERVENTORÍA	Alcance insumos eléctricos – modificatorio 3.
CE-206	125	2260	22/02/2026	INTERVENTORÍA	REMISIÓN PMT APROBADO POR PARTE DE SDM.
CE-206	125	2261	21/02/2026	INTERVENTORÍA	RESPUESTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0017-2025 – Lista de Chequeo Informe Mensual de Calidad No. 18 V2
CE-206	125	2262	23/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta oficio CIG-IDRD-VEL-0134-2026 de asunto "Definición técnica y plan de manejo para la reorientación de escuadras en columnas del módulo 1 – interferencia con anclajes de la cercha principal de cubierta.
CE-206	125	2263	23/02/2026	INTERVENTORÍA	RADICACIÓN INFORME QUINCENAL BIM No. 41 APROBADO
CE-206	125	2264			fidecomiso
CE-206	125	2265	25/02/2026	INTERVENTORÍA	REMISIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO Y PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL MODIFICATORIO N.° 3.
CE-206	125	2266	25/02/2026	INTERVENTORÍA	RPTA COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-0069-2026-Realización ensayopor ultrasonido unión entre elementos T19 y T24 cordon inferior cercha CHP1.
CE-206	125	2267	25/02/2026	INTERVENTORÍA	Remisión Informe mensual V.2 No. 25 del componente social, 26 enero al 25 de febrero de 2026.
CE-206	125	2268	25/02/2026	INTERVENTORÍA	Respuesta Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0140-2026 "Respuesta al Comunicado CE-206-125-1922 "Respuesta Radicado No. CIG-IDRD-VEL-0759-2025 - Respuesta a comunicados CE-206-125-1583 del 11/07/2025 y CE-206125-1831 del 16/09/2025 – Solicitud de concepto de aprobación u observaciones RAD. No. CE-206-128-1583 de julio de 2025. Informe final de análisis de res0ultados del monitoreo de los escenarios de riesgos ERR08, ER12 Y ER13 durante la ejecución de la etapa de cimentación profunda – versión 3".
CE-206	125	2269	25/02/2026	INTERVENTORÍA	Entrega física del informe mensual N°21 V.3 del componente ambiental, aprobado por Interventoría.

Tabla 7. Correspondencia enviada

A continuación, se presenta la correspondencia recibida durante el periodo:

CE-206-128-1200	CIG-IDRD-VEL-0049-2026	26/01/2026	INTERVENTORIA	Aprobación informe mensual ambiental número 19 V3 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de julio y el 25 de agosto de 2025, radicado CE-206-125-2128 del 7 de enero de 2026.
CE-206-128-1202	CIG-IDRD-VEL-0052-2026	26/01/2026	INTERVENTORIA	Rta Of. CE-206-125-2150 Confirmación procedimiento para maniobra y acopio de la estructura metálica
CE-206-128-1204	CIG-IDRD-VEL-0055-2026	27/01/2026	INTERVENTORIA	Aval al diseño del sistema de puesta a tierra subestación eléctrica - Proyecto Velódromo Gibraltar
CE-206-128-1205	CIG-IDRD-VEL-0057-2026	28/01/2026	INTERVENTORIA	Aprobación informe mensual Ambiental número 20 V3 correspondiente al periodo comprendido entre el26 de agosto y el 25 de septiembre
CE-206-128-1206	CIG-IDRD-VEL-0062-2026	28/01/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado CE-206-125-2170 con asunto " Presentación Ficha Técnica Equipo de bombeo RCI"
CE-206-128-1207	CIG-IDRD-VEL-0061-2026	29/01/2026	INTERVENTORIA	Rta oficio de obra CE-206-125-2184 - Asunto Remisión informe mensual N°24 V1 del componente social, 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026
CE-206-128-1208	CIG-IDRD-VEL-0063-2026	29/01/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio obra N° CE-206-125-2179 según revisión informe mensual componente fauna N°24 (enero de 2026V,1 - Observaciones
CE-206-128-1209	CIG-IDRD-VEL-0064-2026	29/01/2026	INTERVENTORIA	Rta oficio de obra CE-206-125-2189 - Asunto: Aprobación informe social mensual N°24 Versión 2.0_26 DICIEMBRE 2025 AL 25 DE ENERO DE 2026.

CE-206-128-1210	CIG-IDRD-VEL-0069-2026	29/01/2026	INTERVENTORIA	Rta Of. CE-206-125-2148 Realización Ensayo por ultrasonido unión entre elementos T19 y T24 Cordón inferior Cercha CHP1.
CE-206-128-1211	CIG-IDRD-VEL-0070-2026	29/01/2026	INTERVENTORIA	Rta Of. CE-206-125-1758 Remisión planos Estructura metálica de Cubierta
CE-206-128-1212	CIG-IDRD-VEL-0071-2026	2/02/2026	INTERVENTORIA	Revisión N°01 Mal informe técnico mensual N°24 V1 contrato de obra N°. IDRD-CTO-3232-2023 radicado por el contratista bajo consecutivo CE-206-125-2193 del día 29 de enero de 2026.
CE-206-128-1213	CIG-IDRD-VEL-0075-2026	2/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta Oficio CE-206-125-2191 - Revisión Informe Mensual SST No. 24
CE-206-128-1214	CIG-IDRD-VEL-0076-2026	3/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta comunicados CE-206-125-2113, CE-206-125-2153 y CE-206-125-2165 correspondiente a los Informes de instrumentación Geotécnica de diciembre 2025 y enero 2026.
CE-206-128-1215	CIG-IDRD-VEL-0077-2026	2/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio Obra No. CE-206-125-2185 – Revisión Informe Mensual Componente Forestal No. 24 V.1 - Aprobación.
CE-206-128-1216	CIG-IDRD-VEL-0050-2026	4/02/2026	INTERVENTORIA	Alcance Oficio CIG-IDRD-VEL-0050-2025 13/01/2026 respecto al Traslado radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad - Proyecto Velódromo Gibraltar
CE-206-128-1217	CIG-IDRD-VEL-0042-2026	4/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta al Oficio CE-206-125-2116 del 30 de diciembre de 2025 – "Atrasos Programación de Obra No Imputables al contratista de obra UTMP
CE-206-128-1219	CIG-IDRD-VEL-0080-2026	5/02/2026	INTERVENTORIA	Aprobación informe quincenal BIM N°80 con observaciones

CE-206-128-1220	CIG-IDRD-VEL-0081-2026	5/02/2026	INTERVENTORIA	Revisión informe mensual ambiental número 24 V,1 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2026 y el 25 de enero de 2025
CE-206-128-1221	CIG-IDRD-VEL-0083-2026	6/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio de obra N°CE-206-125-2188 referente a los planos de taller pista de madera versión 1-Proyecto Velódromo Gibraltar
CE-206-128-1222	CIG-IDRD-VEL-0086-2026	6/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta Oficio CE-206-125-2204 Revisión Informe Mensual SST No. 24 V2
CE-206-128-1223	CIG-IDRD-VEL-0088-2026	9/02/2026	INTERVENTORIA	Revisión N°01 al informe técnico mensual N°24 V2contrato de obra N°. IDRD-CTO-3232-2023 radicado por el contratista bajo consecutivo CE-206-125-2212 del día 06 de febrero de 2026.
CE-206-128-1224	CIG-IDRD-VEL-0090-2026	9/02/2026	INTERVENTORIA	Aprobación informe mensual ambiental númro 24 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de diciembre y el 25 de enero de 2026 V1 radicado CE-206-125-2187 del 28 de enero de 2026; V2-Radicado CE-206-125-2211 del 06 de febrero de 2026.
CE-206-128-1225	CIG-IDRD-VEL-0091-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a los comunicados CE-206-125-1455 y CE-206-125-2079 - Solicitud de inclusión de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC)
CE-206-128-1226	CIG-IDRD-VEL-0092-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Revisión informe técncio mensual 24 Versión 3, contrato de obra N°.IDRD-CTO-3232-2023 radicado por el contratista bajo consecutivo CE-206-125-2218 del 08 de enero de 2025.
CE-206-128-1227	CIG-IDRD-VEL-0093-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado CE-206-125-2182_ Aprobación profesional en construcción de pistas.

CE-206-128-1228	CIG-IDRD-VEL-0059-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Trámite de la modificación N°3, AdiciónN°2 y prórroga N°1 del contrato de obra como de la prórroga N°1 y adición N°1 del contrato de interventoría.
CE-206-128-1229	CIG-IDRD-VEL-0058-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Revisión formatos de calidad para el procedimiento de maniobra estructura metálica en el proyecto Velódromo
CE-206-128-1230	CIG-IDRD-VEL-0094-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado CE-206-125-2192_ Observaciones al informe de calidad N°24
CE-206-128-1231	CIG-IDRD-VEL-0095-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta comunicados CE-206-125-2206, CE-206-125-2210 y CE-206-125-2217 Atención observaciones Plan de Inspección y Ensayo (PIE) Vr.5-Proyecto Velódromo Gibraltar - Aprobación del Plan de Inspección y Ensayo.
CE-206-128-1232	CIG-IDRD-VEL-0096-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado CE-206-125-2209 con asunto "Entrega ficha técnica de sistema de bombeo RCI ajustada"
CE-206-128-1233	CIG-IDRD-VEL-0097-2026	10/02/2026	INTERVENTORIA	Solicitud de alcance informe mensual ambiental número 22 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025
CE-206-128-1234	CIG-IDRD-VEL-0098-2026	11/02/2026	INTERVENTORIA	Rta of. CE-206-125-2100 y CE-206-125-2177 Informes de despacho de la estructura metálica de cubierta N°4 y N°5.
CE-206-128-1235	CIG-IDRD-VEL-0099-2026	11/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio Obra N° CE-206-125-2213 según revisión informe mensual componente fauna N°24 (enero 2026) V.2-Observaciones
CE-206-128-1236	CIG-IDRD-VEL-0101-2026	11/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta comunicados CE-206-125-2160 referente al proceso constructivo rellenos posteriores túneles - Proyecto Velódromo Gibraltar

CE-206-128-1237	CIG-IDRD-VEL-0102-2026	11/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficios de obra N° CE-206-125-2095 con traslado oficio radicado IDRD N°Rad. IDRD N°20264200030721 del 10-02-2026 REFERENTE A LAS COTIZACIONES vanti DE INSTALACIONES DE Gas Natural - Proyecto Velodromo Gibraltar.
CE-206-128-1238	CIG-IDRD-VEL-0087-2026	11/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio de Obra N°CE-206-125-2102, CE-0206-125-2066, CE-206-125-2023 con traslado oficio radicado IDRD N°20264200033881 del 06-02-2026 referente a la respuesta dada desde la entidad contratante a la aprobación del reconocimiento de la membrana FLEXLIGTH STREM TX30 TII de SERGE FERRARI - Proyecto Velódromo Gibraltar.
CE-206-128-1239	CIG-IDRD-VEL-0103-2026	12/02/2026	INTERVENTORIA	Revisión a documento Plan de Manejo de Tránsito - respuesta oficio CE-206-125-2232
CE-206-128-1240	CIG-IDRD-VEL-0104-2026	11/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio CE-206-125-2171 Respuesta Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades 2026 - Componente SST.
CE-206-128-1241	CIG-IDRD-VEL-0068-2026	12/02/2026	INTERVENTORIA	Observaciones CE-206-125-2176 Radicación planos ascensores.
CE-206-128-1242	CIG-IDRD-VEL-0107-2026	12/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado CE-206-125-2239. Aprobación hoja de vida mensajero de obra.
CE-206-128-1243	CIG-IDRD-VEL-0107-2026	12/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta comunicado CE-206-125-2240 Respuesta comunicado CIG-IDRD-VEL-058-2026 - Aprobación formato formato de calidad para el procedimiento de maniobra estructura metálica en el Proyecto Velódromo.
CE-206-128-1244	CIG-IDRD-VEL-0110-2026	12/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado CE-206-125-2208 del 05 de febrero de 2026 Consideraciones respecto a la

				aprobación a la aprobación de la orden de Operación N°35.
CE-206-128-1245	CIG-IDRD-VEL-0111-2026	13/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio obra N° CE-206-125-2120 según revisión informe mensual componente fauna N°24 (enero de 2026) V.2.
CE-206-128-1246	CIG-IDRD-VEL-0105-2026	13/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta CE-206-125-1473 Radicación documentos teja traslucida domo cubierta
CE-206-128-1247	CIG-IDRD-VEL-0114-2026	13/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio CE-206-125-2010 Actualización datos meta de circularidad.
CE-206-128-1248	CIG-IDRD-VEL-0115-2026	13/02/2026	INTERVENTORIA	Rta oficio de obra N°CE-206-125-2238 con aprobación informe de calidad N° 24 del periodo del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026 contrato de obra IDRD 3232 de 2023
CE-206-128-1249	CIG-IDRD-VEL-0116-2026	14/02/2026	INTERVENTORIA	Rta a Oficio CE-206-125-1503 Presentación posibles medidas de mitigación de los riesgos identificados por la exposición de elementos estructurales en plataforma de cimentación.
CE-206-128-1250	CIG-IDRD-VEL-0126-2026	16/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicado CE-206-125-1472 - Solicitud de actualización informe bioclimático para el desarrollo del proyecto II.
CE-206-128-1251	CIG-IDRD-VEL-0124-2026	16/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta radicado IDRD N°. 20254200415381 asunto " Respuesta comunicado N. 20252100499862 Traslado oficio CE-206-125-1935 - RTA - CIG-IDRD-VEL-0803-2025-Pago compensación por tala de árboles"
CE-206-128-1252	CIG-IDRD-VEL-0113-2026	16/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta a comunicaciones CE-206-125-1729, CE-206-125-1741 y CE-206-125-1801 dando alcance al comunicado CIG-IDRD-VEL-0714-2025 y CIG-IDRD-VEL-0750-2025.

CE-206-128-1253	CIG-IDRD-VEL-0128-2026	17/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta al comunicado CE-206-125-2085 y CE-206-125-2161. LINEAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN DE LIXIVIADOS.
CE-206-128-1254	CIG-IDRD-VEL-0127-2026	17/02/2026	INTERVENTORIA	Solicitud aclaración materiales cicloruta calle 49 sur.
CE-206-128-1255	CIG-IDRD-VEL-0129-2026	17/02/2026	INTERVENTORIA	Solicitud actualización modelo arquitectura subcapítulo E,10,5,0 ventanería en aluminio /PVC.
CE-206-128-1256	CIG-IDRD-VEL-0130-2026	18/02/2026	INTERVENTORIA	URGENTE-Traslado de comunicado IDRD N° 20264200052481-Denuncia frente a contratación de subcontratista.
CE-206-128-1257	CIG-IDRD-VEL-0131-2026	20/02/2026	INTERVENTORIA	Aprobación informe quincenal BIM N°41 - Proyecto Velodromo Gibraltar
CE-206-128-1258	CIG-IDRD-VEL-0134-2026	23/02/2026	INTERVENTORIA	Definición técnica y plan de manejo para la reorientación de escuadras (ganchos) en columnas del Módulo 1 - Interferencia con anclajes de la cercha principal de cubierta.
CE-206-128-1259	CIG-IDRD-VEL-0136-2026	23/02/2026	INTERVENTORIA	Rta a oficio CE-206-125-2252 Ajustes constructivos vigas de cimentación módulo 1 en módulo 9.
CE-206-128-1260	CIG-IDRD-VEL-0137-2026	23/02/2026	INTERVENTORIA	Traslado oficio radicado IDRD N° Rad . IDRD N° 20264200033491 del 21 - 02-2026 referente al informe de análisis de los resultados de laboratorio de la segunda campaña de la red adyacente de aguas subterránea - Proyecto Velódromo Gibraltar.
CE-206-128-1261	CIG-IDRD-VEL-0139-2026	24/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta CE-206-125-2200 Respuesta al radicado CIG-IDRD-VEL-045-2026 Respuesta comunicaciones CE-206-125-1533 del 18 de julio de 2025, confirmación respuesta a oficio CE-206-125-1708 y CE-206-125-1709

				de agosto de 2025 - Medidas PMA y PGRDEPP.
CE-206-128-1262	CIG-IDRD-VEL-0142-2026	24/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficio CE-206-125-2251 Revisión ensayo de Proctor – Llenos de trasdós de los túneles
CE-206-128-1263	CIG-IDRD-VEL-0143-2026	24/02/2026	INTERVENTORIA	Traslado Rad. IDRD No 20264200042001 del 23/02/2026 - Remisión comunicación Secretaría Distrital de Ambiente – Reprogramación tercer monitoreo red de pozos adyacentes - Contrato de Obra No. 3203 de 2023 – Centro de Alto Rendimiento - CAR Gibraltar y Contrato de Obra No. 3232 de 2023 – Velódromo Gibraltar- Proyecto Velódromo Gibraltar
CE-206-128-1264	CIG-IDRD-VEL-0145-2026	25/02/2026	INTERVENTORIA	Respuesta oficios CE-206-125-2259 y CE-206-125-2202 Traslado Rad. IDRD N° 20264200063151 del 25-02-2026 Revisión de insumos presentados -Poyecto Velódromo Gibraltar
CE-206-128-1265	CIG-IDRD-VEL-0146-2026	25/02/2026	INTERVENTORIA	Rta oficio CE-206-125-2243 Aclaración procedimiento de verificación y trazabilidad cartillas de acero módulos estructura del Velódromo.
CE-206-128-1266	CIG-IDRD-VEL-0144-2026	25/02/2026	INTERVENTORIA	Rta. Oficio de obra CE-206-125-2267 - asunto: Aprobación informe social mensual N°25 Versión 2.0_ 26 enero al 25 de febrero de 2026
CE-206-128-1267	CIG-IDRD-VEL-0147-2026	25/02/2026	INTERVENTORIA	Aprobación informe mensual ambiental número 21 V3 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 25 de octubre de 2025, radicado CE-206-125-2168 del 22 de enero de 2026

Tabla 8. Correspondencia recibida

5.8. ACTAS DE COMITÉ Y RECORRIDOS

Las actas de comité reposan en la interventoría quien es la encargada del control y manejo de las actividades, durante el periodo que comprende el presente informe, se realizó comité técnico de seguimiento semanal los días 29 de enero de 2026 y 5, 12 y 19 de febrero de 2026.

6. COMPONENTE TECNICO DE OBRA

6.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A continuación, se relacionan las especialidades del COMPONENTE TÉCNICO.

El contenido mínimo según el Anexo Técnico, como estado del Contrato, porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado y seguimiento a tramites, gestiones etc., ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del Distrito, etc., se relaciona en cada uno de los componentes a continuación, de acuerdo a la pertinencia o actividad realizada durante la duración del periodo correspondiente al presente informe (26 de enero del 2026 al 25 de febrero de 2026).

6.1.1. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACION Y DESVIOS

Dentro de los alcances del contrato, El contratista UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR, en su cometido de CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ, y dando cumplimiento a los requisitos legales para ello, debe presentar el Plan de Manejo de Tránsito a la Secretaría Distrital de Movilidad, documento con el cual se pretende mostrar de manera clara y organizada las actividades tendientes a disminuir el impacto negativo en el tránsito del sector que podría ocasionarse por las actividades constructivas requeridas para la obra. Se realizo la prorroga del PMT la cual salió en el COI. 08 de febrero 19 de 2026 la cual entra en vigencia desde 27 de febrero de 2026 al 2 de abril de 2026.

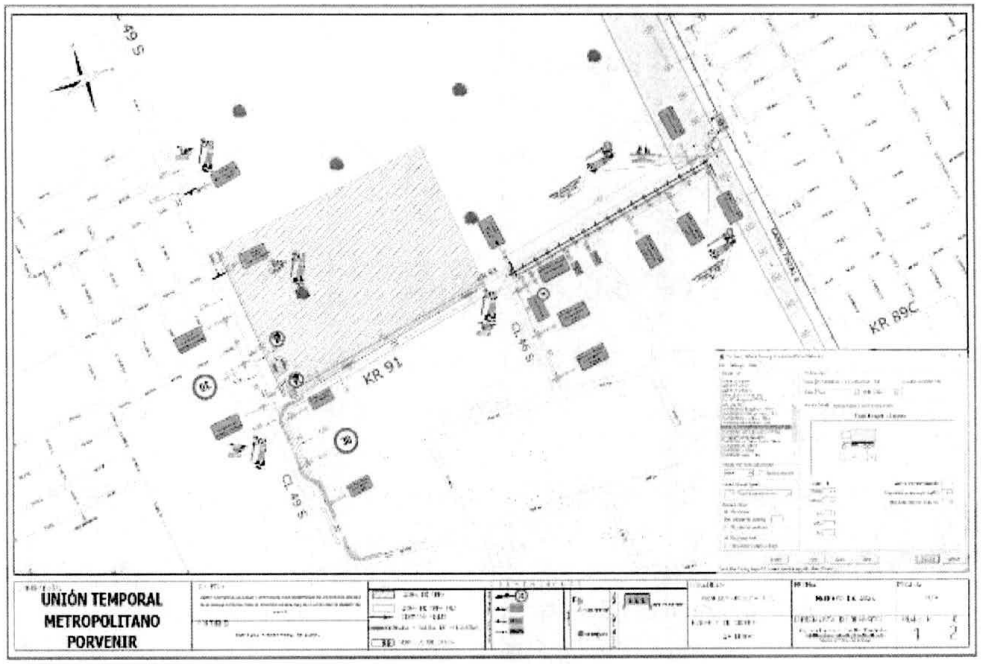


Ilustración 6.Plano de ubicación señalización PMT

6.1.2. ELECTRICO

Semana del 26 al 31 de enero de 2026.

Durante la semana 26 al 31 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Esta semana no se presenta avance en las redes eléctricas y de comunicaciones, se espera avance en la estructura para continuar en el módulo 10.
- Se hace estudio de coordinación Bim sobre la ubicación de las cajas de paso que hay en ese modulo No 10 con su respectiva red de ductos para que no interfieran con la estructura de concreto

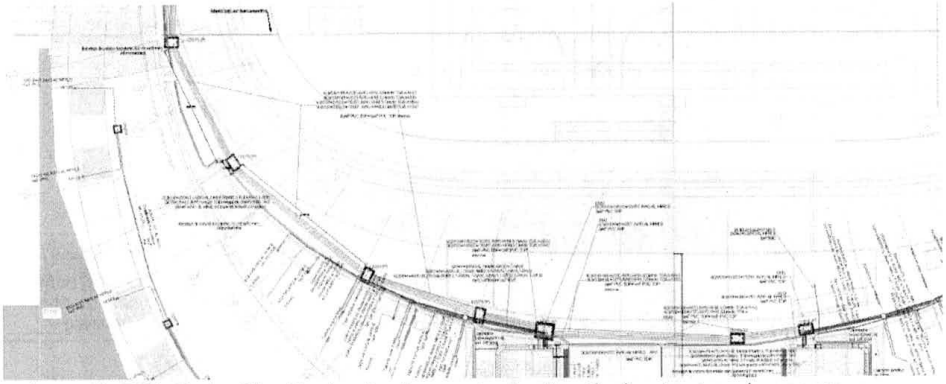


Ilustración 7.Diseño de ubicación de cajas de paso sin visualización de estructura de concreto.

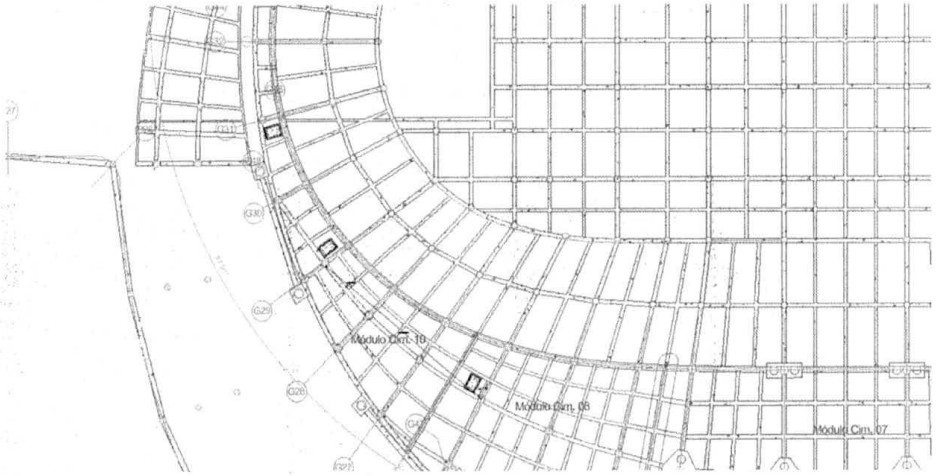


Ilustración 8.Posible reubicación de las cajas de paso CS275 para que estén dentro de la estructura de concreto sin ser afectada.

Semana del 02 al 07 de febrero de 2026.

Durante la semana 2 al 7 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó recepción y envío del plano en PDF de conexiones de fibra óptica entre racks.
- Está pendiente visita de operador de red para confirmar punto de conexión del proyecto.

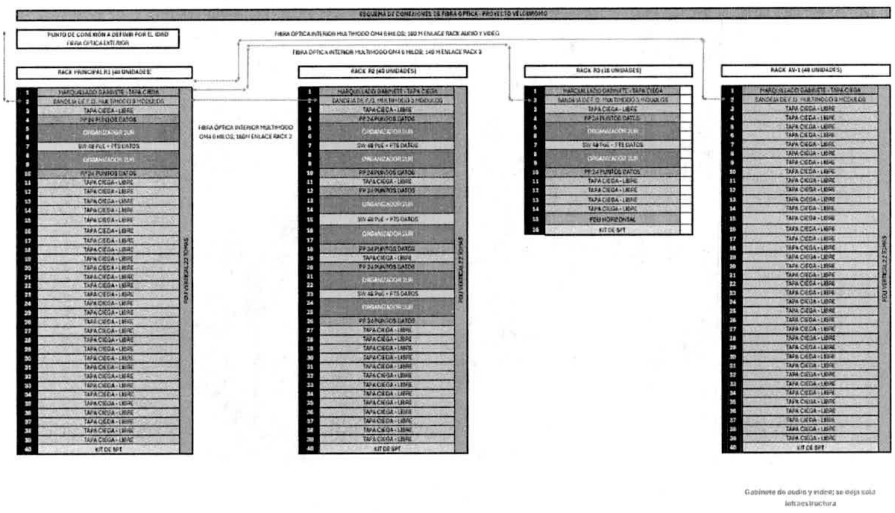


Ilustración 9.Plano de conexiones de fibra óptica.

- Se realizó segunda radicación de documentos para aprobación de serie 3 en Enel.

18

- No de radicación: 1500889847
- Caso: 930211127
- Consulta de seguimiento No 84889428
- Se recuerda que se requiere actualización de licencia de construcción para su aprobación.


Logotipo Descripción generada automáticamente
Bogotá D.C. 05 de febrero de 2026

Señor
Jorge Hernando Perez
Bogotá D.C.

Asunto: Proyecto de conexión radicado nro: 1500889847
Caso nro: 930211127

Respetado Señor Perez, reciba un cordial saludo

Hemos recibido su requerimiento del día 05/02/2026 en el cual solicita radicación del diseño de proyecto de conexión VELODROMO-PARQUE GIBRALTAR

Al respecto, le informamos que hemos iniciado las gestiones correspondientes bajo tarea 1994936

Tenga presente que puede descargar las cartas de respuesta a las etapas de nuevas conexiones a través de Mi Enel (clic aquí), basta con registrarse (Tracking de NNCC) y realizar la consulta con el consecutivo 84889428

Vale la pena aclarar, que su solicitud fue radicada un día hábil después de la recepción. Lo anterior, debido a que fue enviada después del cierre de nuestro horario hábil, el cual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recuerde que la conexión del servicio requiere cumplir con los requisitos previstos en la normatividad vigente. Una vez se verifique el cumplimento de los requisitos documentales y técnicos, solo el personal técnico autorizado por la empresa es quien realizará la puesta en servicio de la conexión evitando generar situaciones de riesgo para la salud, la vida de las personas, la seguridad de la misma instalación y las edificaciones contiguas.

Ilustración 10.Correo respuesta de Enel de la radicación proyecto serie 3.

Semana del 09 al 14 de febrero de 2026.

Durante la semana 9 al 14 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Avance de obra en la semana se enfoca en instalación de pases en el túnel de deportistas para las redes eléctricas y de comunicaciones.

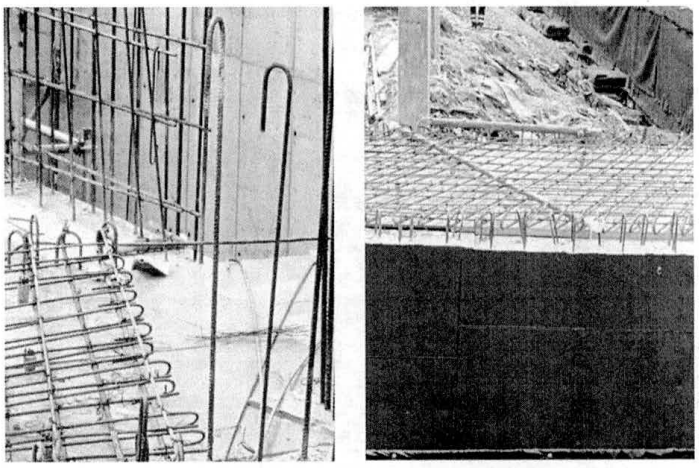


Ilustración 11.Pases de tubería salidas comunicaciones de la pista.

Semana del 16 al 21 de febrero de 2026.

Durante la semana 16 al 21 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Avance de obra en la semana se enfoca en instalación de un pequeño tramo de tubería en el módulo 5 y acondicionamiento de caja CS276 con división en madera para fundición en ese sector.

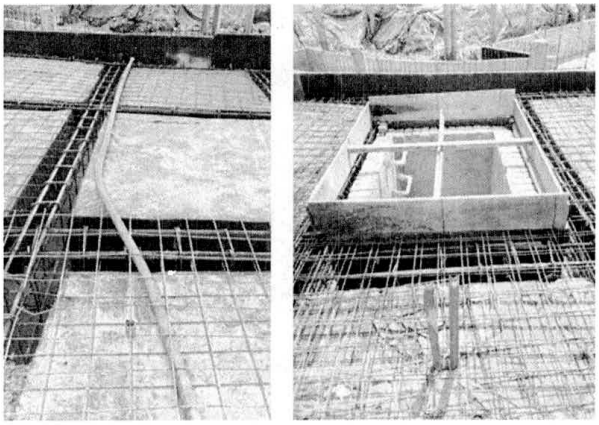


Ilustración 12.Tuberia instalada en módulo 5 para salidas de tomacorrientes hacia pista y división en madera de caja CS276.

Se realizó reunión el viernes 20 de febrero de 2026 en las instalaciones del IDRD, donde estaban presentes el área de presupuestos y costos del IDRD, el área de presupuestos de la interventoría y el área eléctrica y de presupuesto para revisar temas sobre algunos NPs del área eléctrica en donde se solicita lo siguiente:

Se realizó un análisis de los NPS y se solicita que ningún elemento o equipo lleve asociado o sugiera alguna marca en especial, solo deben cumplir con las condiciones técnicas que se requieran. A continuación, dos (2) ejemplos revisados.

- Verificar del modificatorio 3 el NP de la bandeja cablofill, se debe cambiar la descripción ya que esta hace referencia a una marca especifica. Se cambia por "bandeja tipo malla".
- Para el modificatorio 4 en los tableros eléctricos se aclara que estos se solicitan con determinadas medidas, pero las empresas que cotizan les pueden cambiar las dimensiones, lo importante es que el contenido interno si sea lo realmente solicitado según el requerimiento técnico.

Semana del 23 al 25 de febrero de 2026.

Durante la semana 23 al 25 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Avance de obra en la semana se enfoca en la ubicación por parte de topografía del cuarto eléctrico No 3 y la instalación de 2 tuberías que son para la alimentación del alumbrado publico
- Instalación de pases en el túnel deportistas para tomacorrientes y alumbrado

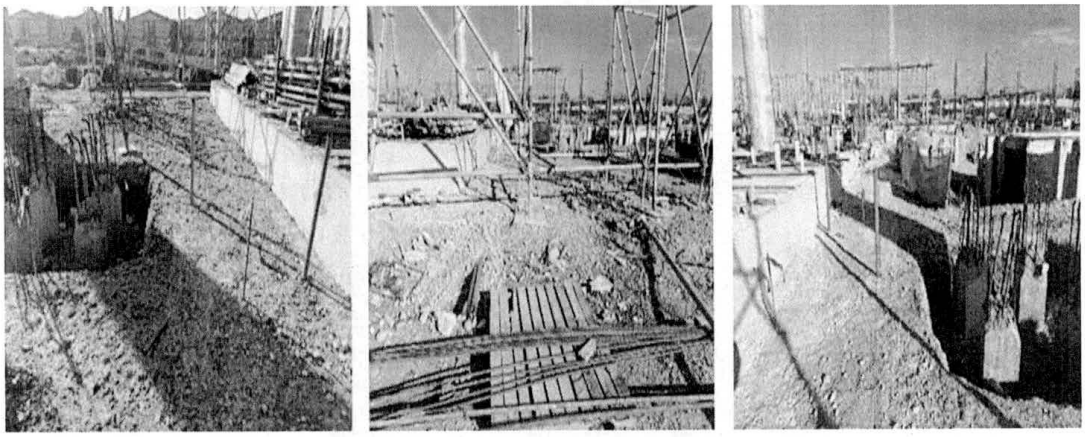


Ilustración 13.Tuberia salidas alimentadores alumbrado público.

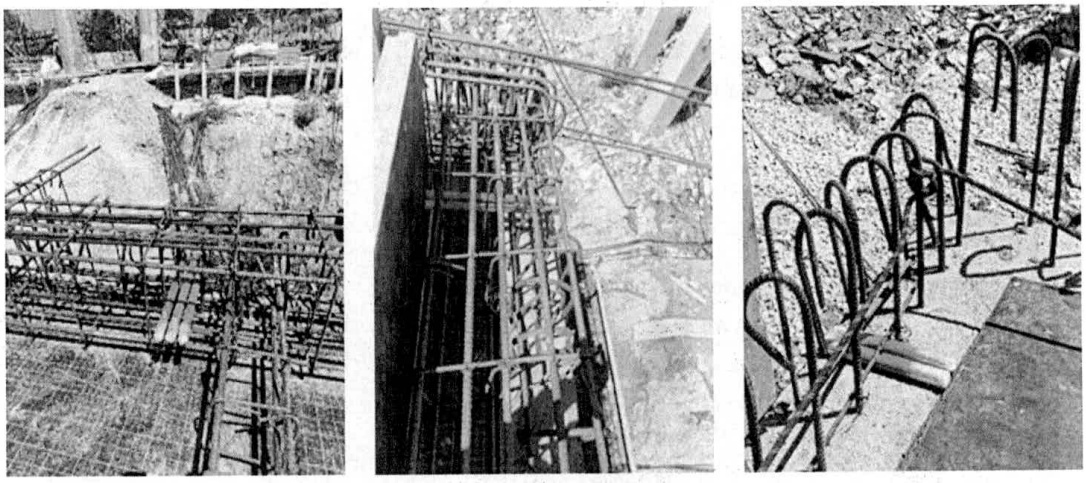


Ilustración 14.Tuberia para pases de alumbrado y tomacorrientes en túnel deportistas.

COMITÉS REALIZADOS DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

- COMITÉ DEL 29 DE ENERO DE 2026.

Durante este comité se informó de que en el área eléctrica el avance de obra ha sido lento debido a que en las zonas de avance de estructura de concreto no hay instalaciones eléctricas.

En esa semana se instalaron los pases de 4 pulgadas en PVC en los dos muros del túnel principal para las tuberías que llevan las redes de baja tensión a los tableros ML2 y ML3 de los módulos 8 y 9.

- COMITÉ DEL 5 DE FEBRERO 2026.

El comité programado para este día se informa que se realizaron estudios de coordinación con la infraestructura eléctrica que hay en el módulo 10 de tuberías y cajas, modulo que pronto inicia actividades de cimentación

- COMITÉ DEL 12 DE FEBRERO DE 2026.

En el comité de este día se informó de la recepción y envío del plano de fibra óptica solicitado por el IDRD, sin embargo, se reafirmó que para determinar el punto de conexión se debe solicitar visita del operador de red para que determine el punto e conexión.

- COMITÉ DEL 19 DE FEBRERO DE 2026.

En este comité se informa que se realizaron instalaciones de tubo y pases en el túnel de deportistas en la placa que se va a instalar.

6.1.3. HIDROSANITARIO

Para el periodo que comprende del 26 de enero al 25 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades del componente hidrosanitario:

- Ajustes a los diseños:

Se continua con el proceso de ajuste a los diseños. En ese sentido, VANTI S.A.-ESP agendó revisión de diseños del proyecto para el día 3 de marzo. Los ajustes a los diseños comprenden principalmente, la acometida sobre la KR 91, la regulación de primera etapa en el paramento sobre esta misma carrera y las conducciones a cada Centro de medición.

- Ejecución de obra:

Para el presente período se ejecutaron los siguientes frentes:

- Instalación de geodrén y tecdrén en el túnel de apoyo a la competición. Actividad ejecutada y terminada completamente para este frente a la fecha de corte.
- Instalación de geodrén y tecdrén en el túnel principal. Actividad ejecutada de manera parcial conforme al avance de la imprimación con Igol Denso del trasdós de túnel.
- Colector de Alcantarillado Pluvial Externo. Tramos 15-17, 17-19 y 19-21. Tubería PVC-Novafort de 8" a 10".

El avance para el presente corte se hizo en función de los frentes disponibles para ejecución.

Sigue pendiente ejecutar un extremo de los baños No.3 y No.2, que se encuentra en el actual talud constructivo del túnel de ciclistas. De igual manera ocurre con el baño No.6 que se localiza en el módulo 8, donde queda pendiente la instalación de algunas salidas que alcanzan a interferir en el módulo 9. En el mismo módulo 9 también queda pendiente el descole del cárcamo de desagüe del Tanque de agua Potable y el baño No.7. Así mismo, se espera la apertura de más frentes de trabajo en el módulo 10 el cual tiene un baño y una bajante de agua Residuales por ejecutar.

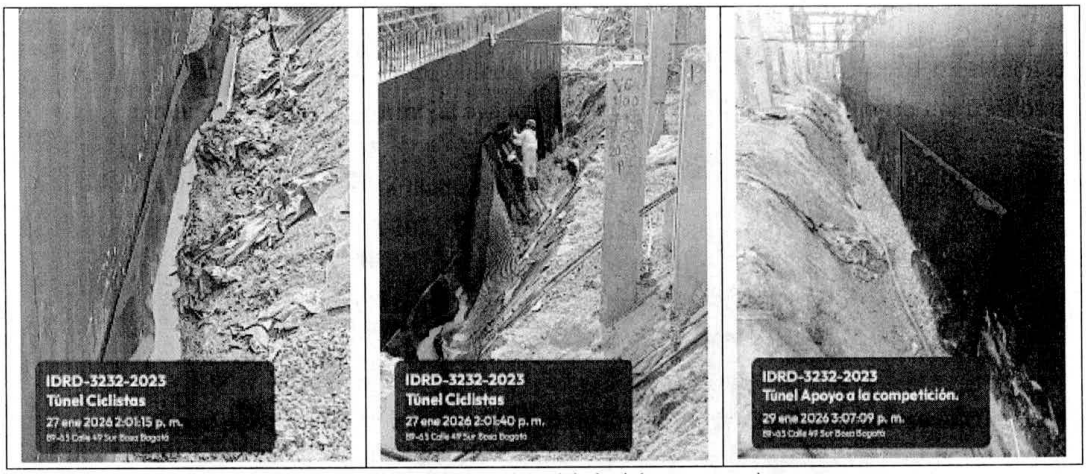


Ilustración 15. Instalación geodrén y tecdren del túnel de apoyo en el segmento recto externo.

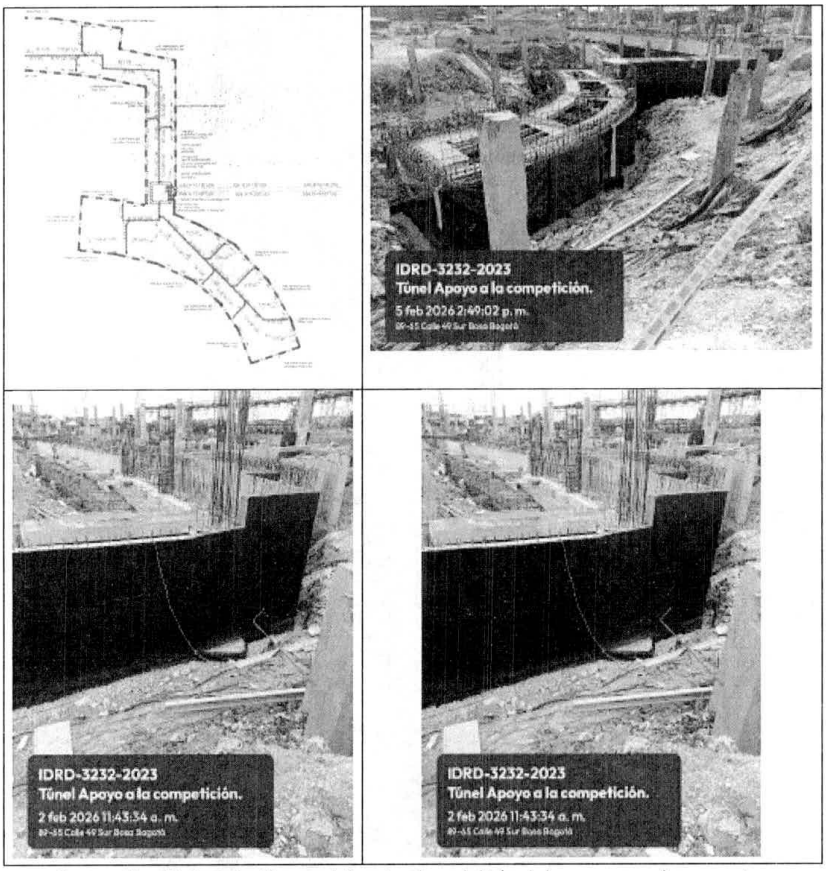


Ilustración 16. Instalación geodrén y tecdren del túnel de apoyo en el segmento curvo

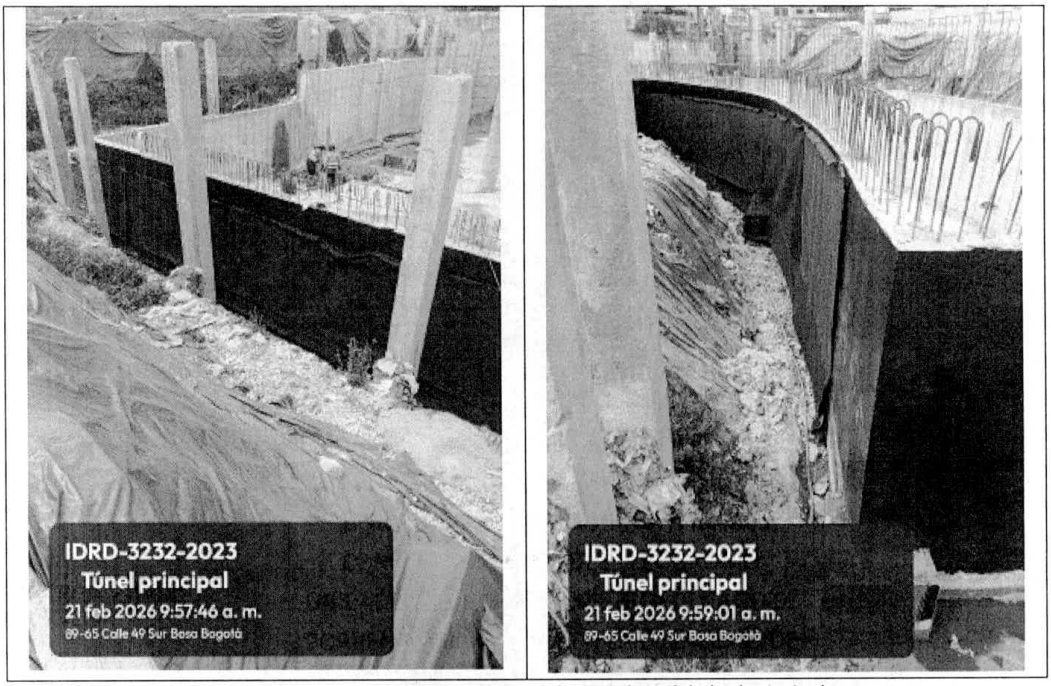


Ilustración 17. Instalación geodrén y tecdren del túnel principal.

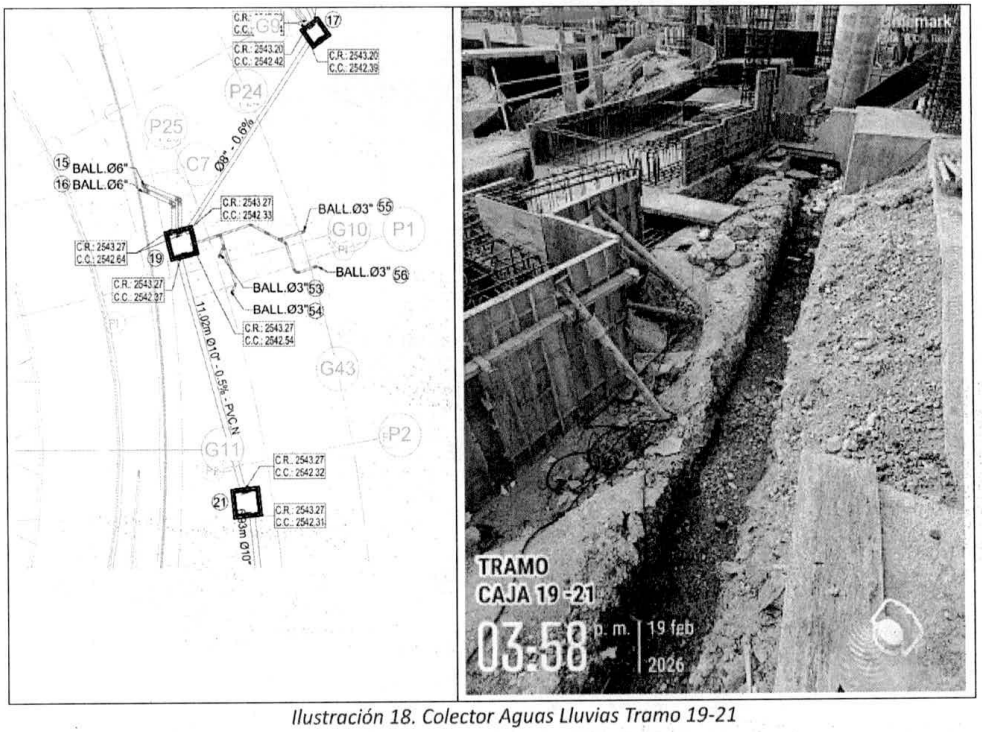


Ilustración 18. Colector Aguas Lluvias Tramo 19-21

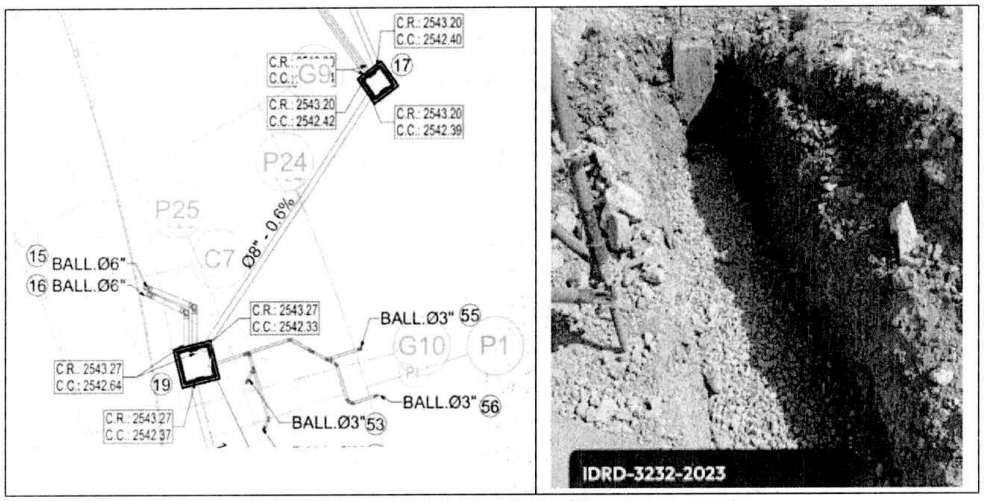


Ilustración 19. Colector Aguas Lluvias Tramo 17-19

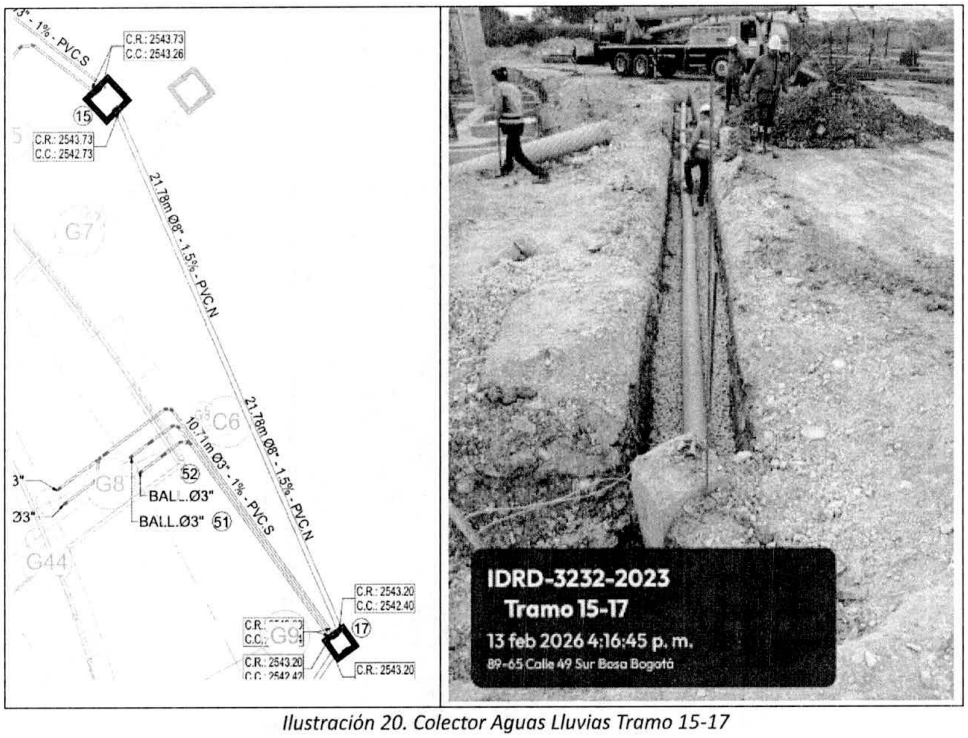


Ilustración 20. Colector Aguas Lluvias Tramo 15-17

6.1.4. SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE

Se está a la espera de avanzar en el diseño de urbanismo de manera que se hagan los ajustes que se requieran en los diseños de SUDS. Hay que aclarar que desde el punto de vista hidráulico estos diseños no tendrán cambios significativos ya que los cuerpos de retención hidráulica (Zona de bio-retención y cunetas verdes) se mantendrán, más allá de los ajustes que se hagan desde el enfoque a las zonas verdes y al urbanismo en general del proyecto.

6.1.5. GEOTECNIA

A partir del avance obra durante el mes de febrero se describen las condiciones evidenciadas a continuación:

EXCAVACION Y ESTRUCTURA DE TUNELES

Se completaron la totalidad de los muros de contención de los tres túneles (administrativo, apoyo a competición y principal), dando inicio a los rellenos en la parte posterior para dar confinamiento a los taludes temporales. El material dispuesto como relleno compactado consiste en una Subbase Granular TIPO PEA, instalada por capas no mayores a 0,20 m. Con respecto a los taludes temporales perimetrales de todos los túneles se mantiene un comportamiento estable. A continuación, se ilustran algunas imágenes de las actividades descritas:

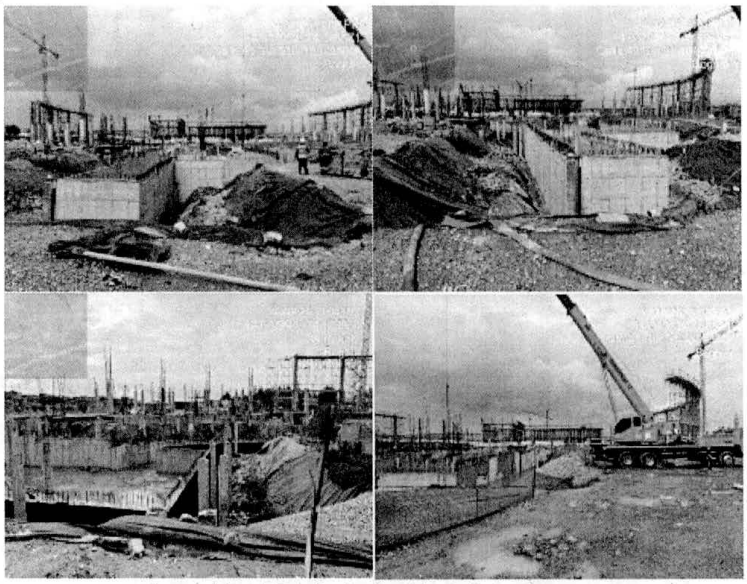
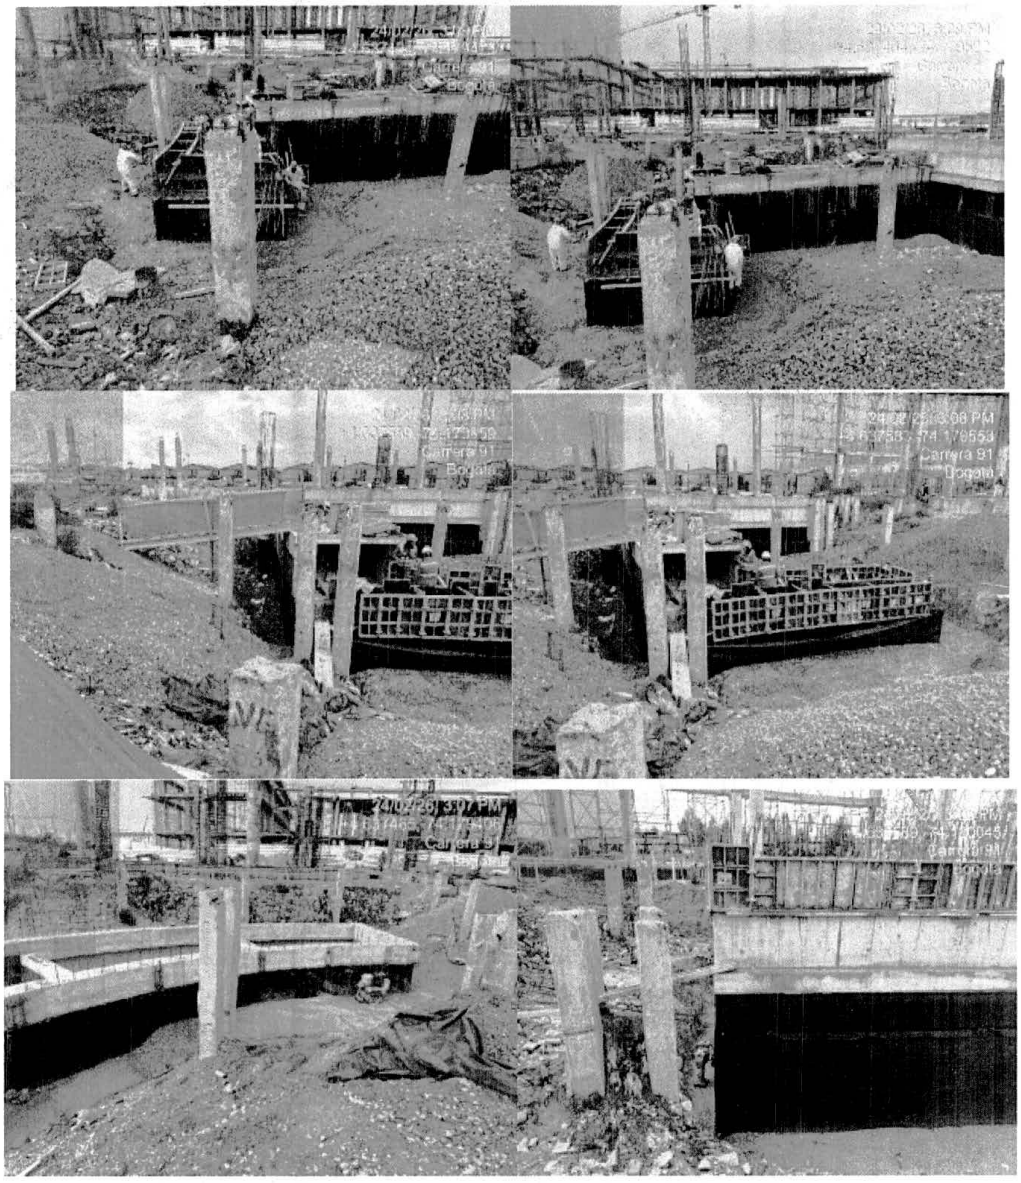


Ilustración 21.Estado de túnel de ambulancias.



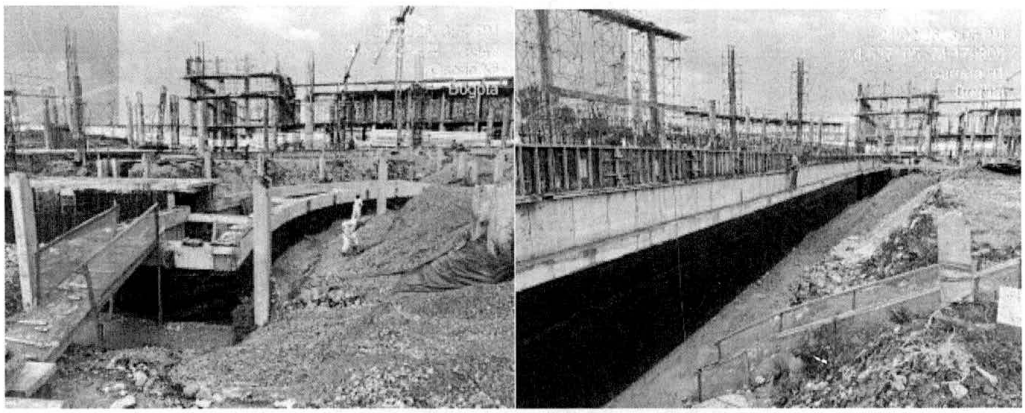


Ilustración 22.Rellenos túneles.

CONTROL TOPOGRAFICO

Se lleva a cabo el monitoreo de las niveletas ya instaladas para un período de análisis entre el 31 de enero y 15 de febrero del presente año, encontrando en las niveletas variaciones máximas en el período hasta de 6,0 mm en rebote y 12 mm en asentamiento. Dichos valores máximos son comportamientos puntuales que no marcan una tendencia en algún sector. De esta manera se observa que se mantiene una tendencia a le estabilidad. Así mismo, los acumulados se mantienen dentro de los valores ya alcanzados en lecturas anteriores y se consideran normales.

INSTRUMENTACION GEOTECNICA

A partir de los resultados de la instrumentación geotécnica de las lecturas tomadas en el mes de febrero, se identifica una tendencia a la estabilidad en todos los taludes, reflejado en el comportamiento evidenciado en campo. Así mismo, los niveles piezométricos mantienen la tendencia a la estabilidad tanto en los elementos de tubo abierto, como en los de hilo vibrátil. De esta manera, los trabajos de rellenos en el trasdós se desarrollan con normalidad y siguiendo las recomendaciones indicadas en el estudio de suelos del proyecto.

6.1.6. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Durante el período objeto del presente informe, el área de estructuras ha prestado apoyo técnico a una parte significativa del equipo interdisciplinario establecido contractualmente para la ejecución del proyecto. En la fase constructiva actual, dicho acompañamiento ha sido requerido para el seguimiento y control de las actividades desarrolladas por los diferentes frentes de trabajo, incluyendo el componente presupuestal, las disciplinas hidráulica y eléctrica, así como las labores propias de la ejecución de obra. Las actividades adelantadas presentan una relación directa entre sí y se describen de manera discriminada a continuación.

Como parte de las actividades desarrolladas se emitieron los siguientes comunicados.

Comunicado CE-206-125-2252, de asunto "Ajustes constructivos vigas de cimentación MODULO 1 en MODULO 9", con fecha de radicado del 18/02/2026.

De manera atenta y respetuosa, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir (el "Contratista" o la "Unión Temporal") dentro del marco jurídico del Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023 (el "Contrato"), manifiesta que, tiene como prioridad cumplir con lo establecido en el alcance del objeto contractual y desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas cumpliendo con la normatividad nacional e internacional aplicables en nuestro territorio.

Así las cosas, como informe a los evidenciado en campo, se presentan dos observaciones de carácter constructivo que deben ser atendidas de forma técnica y evidenciadas en los planos as-built de acuerdo al procedimiento definido para ello, en el presente documento se informa la observación y la forma técnica como será atendida.

1. Ajuste Viga M9-003

En la zona entre el túnel administrativo y el módulo 9 está diseñada la viga M9 – 003 (70x60) ubicada fundamentalmente sobre uno de los muros del túnel.

Se solicitó aclaración al diseñador, verificando si el armado de la viga se debe realizar solo sobre el muro del túnel, como aparece en el despiece o, si la viga 003 se extiende hasta la viga ortogonal que va por el eje G18, como aparece en la planta estructural.

Se solicito adicionalmente ya que el acero de refuerzo está pedido según el despiece y si se tiene que pedir acero adicional si la viga se extendiera hasta el eje 18, los ajustes estén sujetos al acero con que se encuentra en este momento en obra.

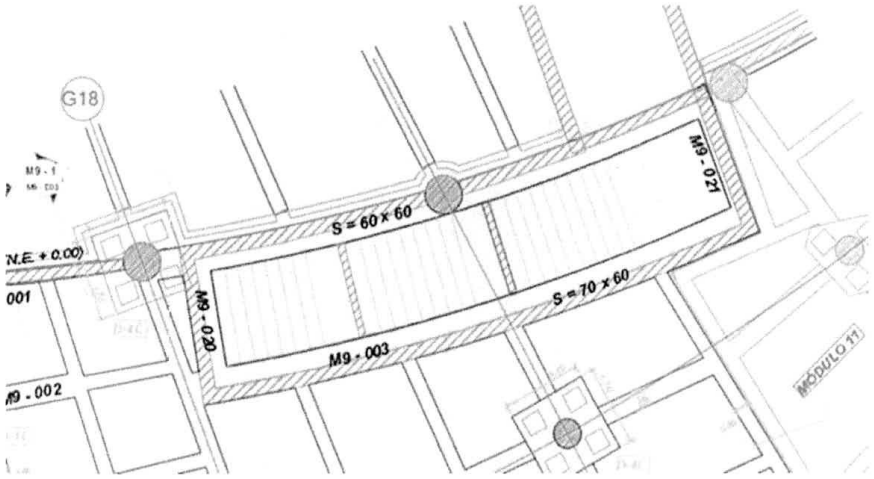


Ilustración 23 Planta túnel administrativo

29

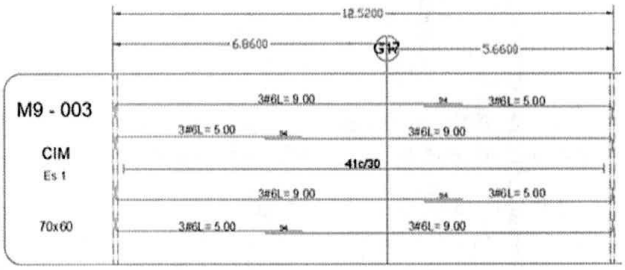


Ilustración 24. despiece viga M9-003

En esta imagen se indica que la viga llega hasta el muro del túnel al igual que en el despiece.

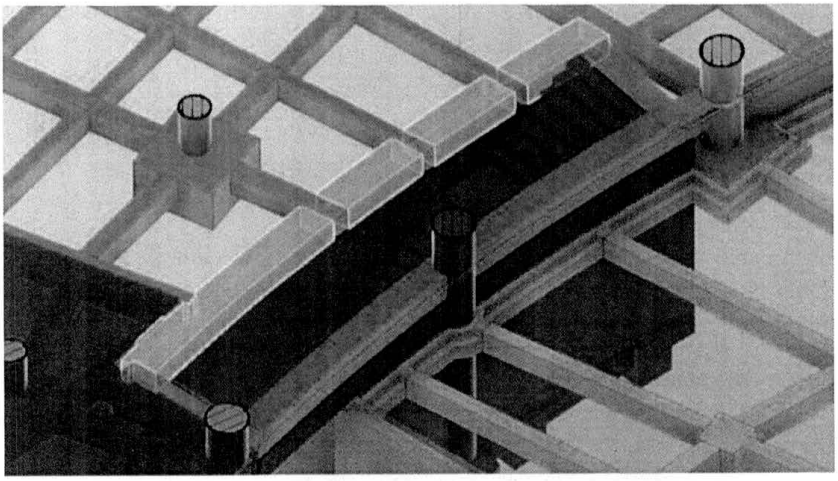


Ilustración 25. Detalle desde el modelo estructural REvit

En esta imagen tomada del modelo se observa que la viga sobre el túnel llega hasta la viga del eje G18 vinculándose completamente al módulo 9.

La observación fue atendida por el diseñador estructural quien indico realizar el ajuste de acuerdo al siguiente detalle.

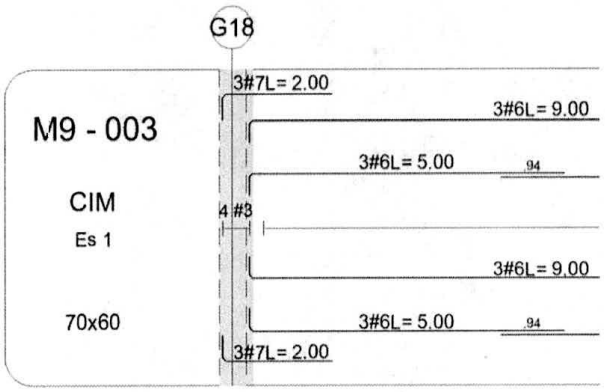


Ilustración 26. Despiece propuesto para la viga M9-003

O el equivalente por área de otro número de varilla que se tenga en obra.

2. Revisando los despieces de las vigas de amarre del módulo 1 se muestra el detalle de conexión de la viga articulada entre los módulos 7 y 9, se presenta la siguiente inconsistencia, no se ve conveniente generar una llave en la columna pues reduce el área neta del elemento:

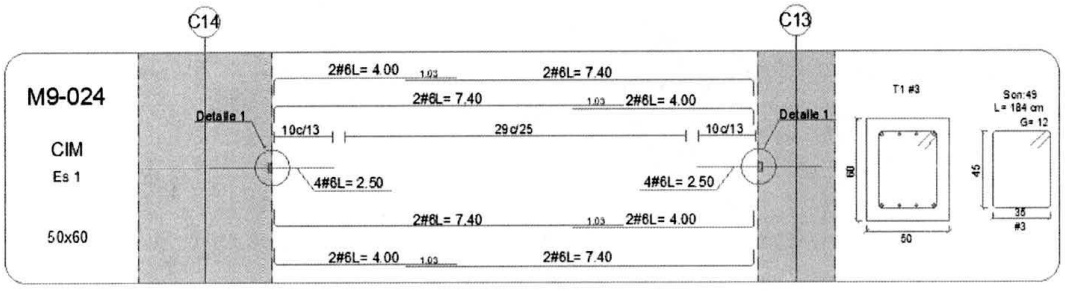


Ilustración 27. despiece viga M9-024

25

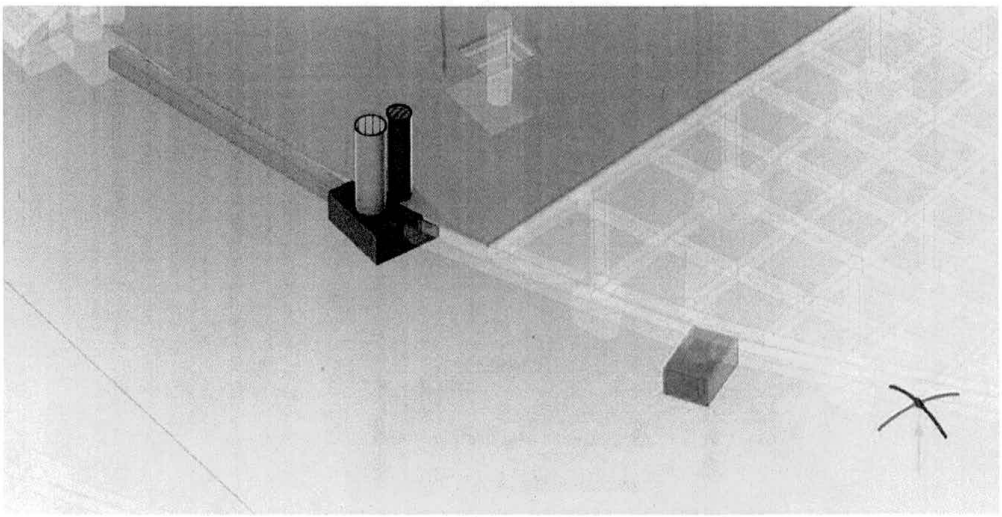


Ilustración 28. Detalle desde el modelo viga M9-023

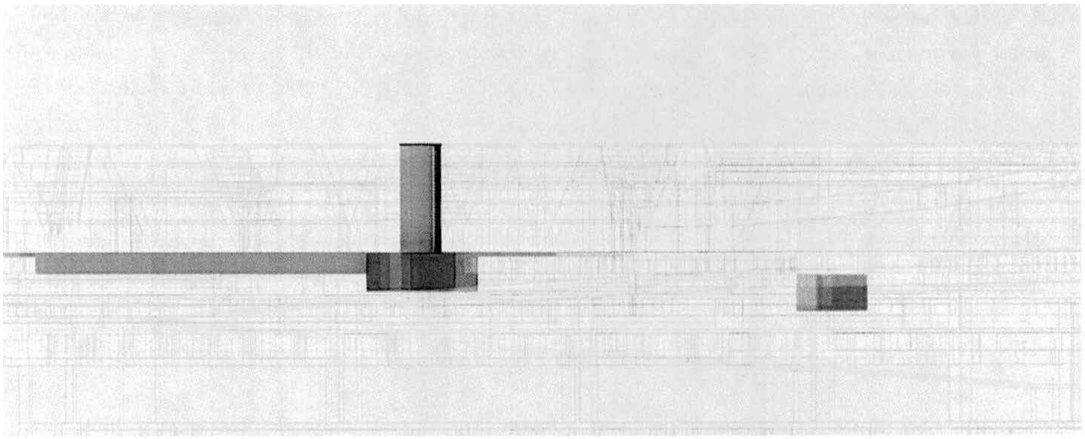


Ilustración 29. Detalle desde el modelo viga M9-023 corte

- Se encuentra fundida toda la cimentación del módulo 7. Dados y vigas
- Dado del eje C13 del módulo 1.
- La viga M9-024 no se encuentra fundida entre los ejes C13 y C14 y muestra llave de corte.
- la viga está a un mismo nivel, pero sale del dado del eje C14 y llega a la columna del C13; de llegar a la columna.
- Se solicita, el detalle del refuerzo y el detalle general para conectar a la columna.

En respuesta a la solicitud, el diseñador remite el ajuste a realizar según la siguiente detalle.

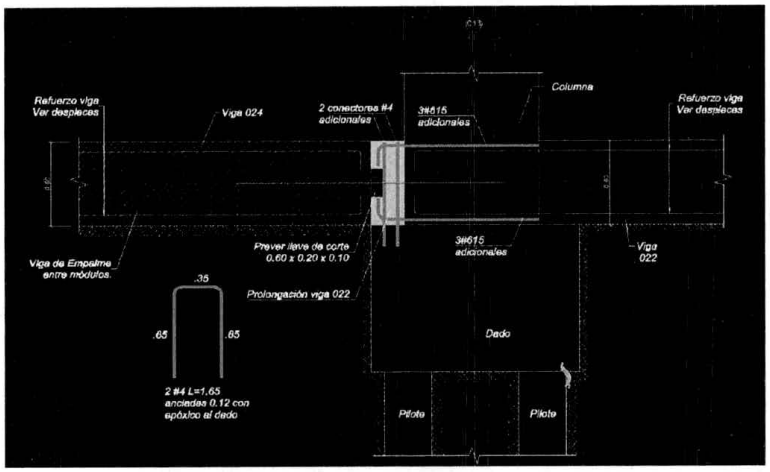


Ilustración 30. Detalle de conexión propuesto

Ser remiten los detalles a realizar por el área técnica identificados durante el proceso constructivo, para validación de la interventoría, se aclara de antemano que el diseñador realizara las respectivas notas en bitácora y las firmara como señal de aprobación a los ajustes, los cambios mencionados serán plasmados en los planos as-Built y no requieren de una nueva versión de planos.

Comunicado CE-206-125-2262 respuesta oficio CIG-IDRD-VEL-0134-2026 de asunto "Definición técnica y plan de manejo para la reorientación de escuadras en columnas del módulo 1 – interferencia con anclajes de la cercha principal de cubierta", con fecha de radicado del 23/02/2026.

De manera atenta y respetuosa, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir (el "Contratista" o la "Unión Temporal") dentro del marco jurídico del Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023 (el "Contrato"), manifiesta que, tiene como prioridad cumplir con lo establecido en el alcance del objeto contractual y desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas cumpliendo con la normatividad nacional e internacional aplicables en nuestro territorio.

Así las cosas, y de acuerdo al cuestionamiento planteado al proceso constructivo definido para las estructuras en concreto, se tienen los siguientes comentarios:

Durante ejecución de obra se identificó la necesidad de redireccionar el gancho final de columnas, que constan longitudinalmente de 24 barras No. 8, columna vinculada con la viga del nudo estructural, con el fin de conformar correcta configuración geométrica y continuidad constructiva de la viga de cubierta del módulo 1, se hace necesario aclarar que esta actividad no se está realizando a todo el acero de la columna, solo a aquellos elementos que interfieran en la instalación del apoyo de la estructura metálica de cubierta.

El capítulo CR7.3.2 indica *"Las condiciones de la construcción pueden hacer necesario doblar barras que se encuentran embebidas en el concreto, Tal doblez en la obra no se puede efectuar sin la autorización del profesional facultado para diseñar"*, así las cosas, consientes de los requerimientos especiales necesarios para desarrollar esta actividad, se siguieron las recomendaciones del personal calificado, indicando lo siguiente:

Dado que el proyecto se encuentra en zona de amenaza sísmica intermedia, se deben seguir las siguientes recomendaciones

- No se permite recalentar el acero.
- No se permite que la longitud de desarrollo y anclaje requerida, sea menor a la requerida por norma.
- Enderezamiento único y controlado.
- Sin ciclos repetidos de doblado.
- Reconfiguración inmediata del gancho cumpliendo radio mínimo.
- No se puede modificar la cuantía de diseño.
- No comprometer el recubrimiento de los elementos.
- Deben respetarse radios mínimos de doblado.
- Inspección visual al concreto posterior a la ejecución de la actividad, para descartar fisuración.

En cumplimiento de estas recomendaciones se establece que:

Con base en la verificación simplificada de desarrollo, el confinamiento del nudo y las condiciones de ejecución establecidas, se concluye que:

Es técnicamente viable autorizar el redireccionamiento y refiguración del gancho de la barra longitudinal No. 8 embebida en la viga, siempre que se garantice el cumplimiento estricto de radios mínimos, longitud de extensión reglamentaria y adecuada supervisión técnica y demás requerimientos mencionados.

La intervención no compromete la capacidad resistente ni el desempeño sísmico del elemento bajo las condiciones aquí descritas.

Se han tomado medidas adicionales para la protección del concreto, como realizar la actividad desde el inicio del gancho, es decir, retirado 70 cm del concreto, sin retirar los estribos de la columna lo que impide su libre desplazamiento, fricción y desgaste, evitando la fisuración y desprendimiento concreto y acero en la columna.

Se menciona de antemano que el diseñador realizara las respectivas notas en bitácora y las firmara como señal de aprobación a los ajustes, los cambios mencionados serán plasmados en los planos as-Built y no requieren de una nueva versión de planos.

Comunicado CE-206-125-2270 de asunto "Definición técnica y plan de manejo para la reorientación de escuadras en columnas del módulo 1 – interferencia con anclajes de la cercha principal de cubierta", con fecha de radicado del 25/02/2026.

De manera atenta y respetuosa, la Unión Temporal Metropolitano Porvenir (el "Contratista" o la "Unión Temporal") dentro del marco jurídico del Contrato de Obra IDRD No. 3232 de 2023 (el "Contrato"), manifiesta que, tiene como prioridad cumplir con lo establecido en el alcance del objeto contractual y desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas cumpliendo con la normatividad nacional e internacional aplicables en nuestro territorio.

Así las cosas, como informe de avance de la fabricación, pintura y transporte final hasta la obra, se remite el informe de despacho No. 6, donde se agrupan las remisiones y despachos realizados en el mes de enero de 2026, presentando al final la cantidad estimada en kg de estructura metálica puesta en obra en el presente periodo.

Despacho No 11.

EMECON

9586-VELODROMO GIBRALTAR
FECHA DESCARGUE EN OBRA :29-01-2026
DESPACHO_011

DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	PLANO GENERAL DE LOCALIZACION	PLANO TALLER	CANTIDAD	PESO POR UNIDAD	PESO ELEMENTO
				und	kg	kg
CERCHA PRINCIPAL	CHP4	9586MA01-0	9586TA51C-1	1	9.995,85	9.995,85
CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586MA01-0	9586TA54C-0	1	9.964,20	9.964,20
					TOTAL (kg)	19.960,05

Ilustración 31. Remumen despacho 11

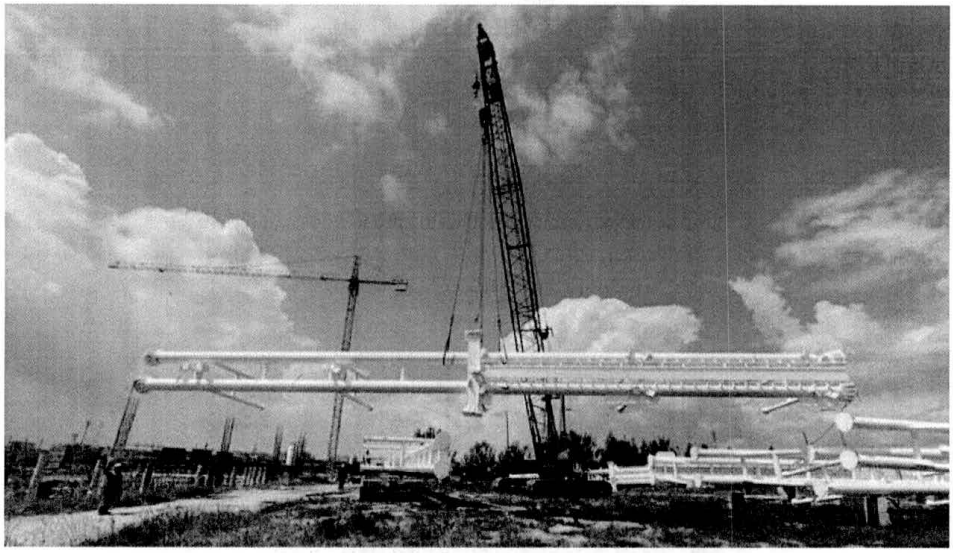


Ilustración 32. Imagen descarga estructura metálica 29/01/2026

Despacho No 12.

EMECON

9586-VELODROMO GIBRALTAR
FECHA DESCARGUE EN OBRA :09-02-2026
DESPACHO_012

DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	PLANO GENERAL DE LOCALIZACION	PLANO TALLER	CANTIDAD	PESO POR UNIDAD	PESO ELEMENTO
				und	kg	kg
CERCHA PRINCIPAL	CHP8	9586MA01-0	9586TA54C-0	2	9.964,20	19.928,40
					TOTAL (kg)	19.928,40

Ilustración 33. Remumen despacho 12

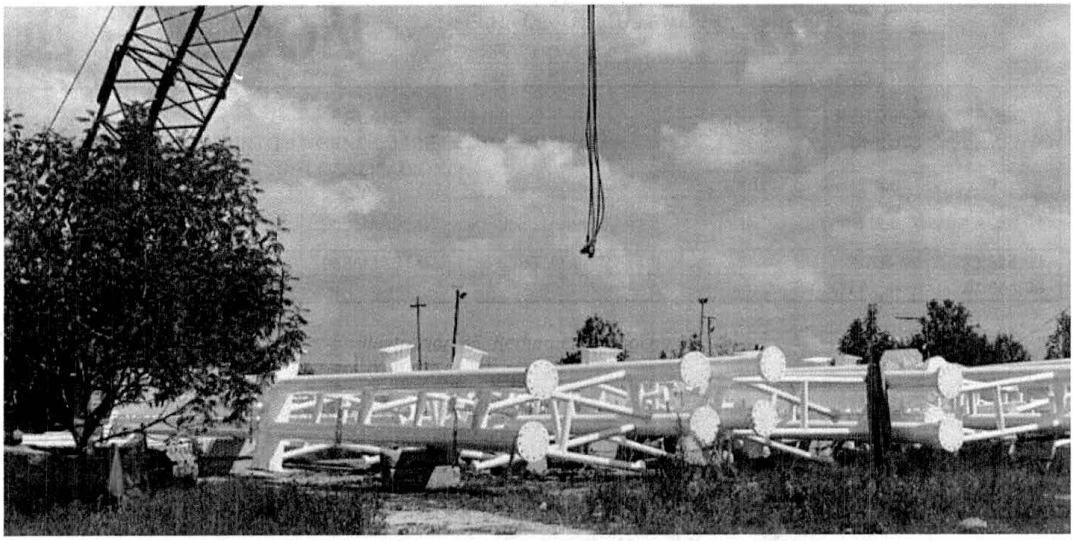


Ilustración 34. Imagen descarga estructura metálica 09/02/2026

Despacho No 13.

EMECON

9586-VELODROMO GIBRALTAR
FECHA DESCARGUE EN OBRA :23-02-2026
DESPACHO_013

DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	PLANO GENERAL DE LOCALIZACION	PLANO TALLER	CANTIDAD	PESO POR UNIDAD	PESO ELEMENTO
				und	kg	kg
CERCHA PRINCIPAL	CHP1	9586MA01-0	9586TA49C-1	1	13.980,01	13.980,01
VIGA PRATT	VP1	9586MA01-0	9586TA62A-0	5	2.764,99	13.824,95
					TOTAL (kg)	27.804,96

Ilustración 35. Remumen despacho 13

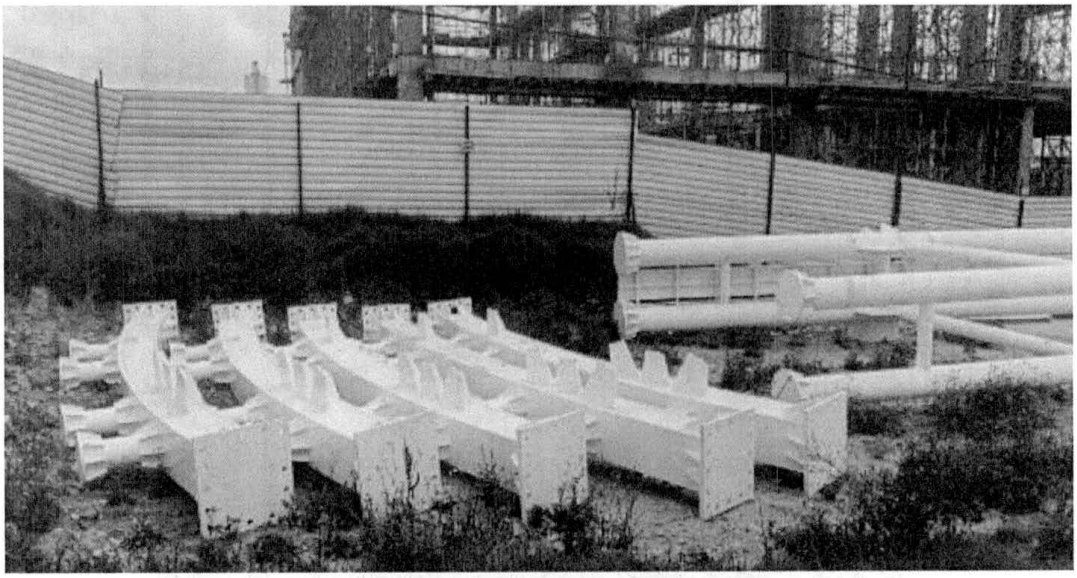


Ilustración 36. Imagen descarga estructura metálica 23/02/2026

Para la fecha del presente documento se tienen las siguientes cantidades:

ELEMENTO	CONJUNTO	UNID	CANT	PESO T.
CERCHA PRINCIPAL	CHP3	5.00	6619.18	33095.9
CERCHA PRINCIPAL	CHP7	5.00	6649.76	33248.8
CERCHA PRINCIPAL	CHP1	3.00	13980.01	41940.03
CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2.00	7021.29	14042.58
CERCHA PRINCIPAL	CHP4	5.00	9995.85	49979.25
CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2.00	13980.01	27960.02
CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2.00	7021.29	14042.58
CERCHA PRINCIPAL	CHP8	5.00	9964.2	49821
VIGA PRATT	VP1	5.00	2764.99	13824.95
PIVOTE VIGA CENTRAL	PVC1	1.00	8417.42	8417.42
PIVOTE VIGA CENTRAL	PVC2	1.00	12199.3	12199.3
Total				**298,571.83**

Tabla 9. Resumen de suministro estructura metálica en obra

De acuerdo a los diseños presentados y aprobado por la interventoría, la cercha principal se divide en dos tramos que confluyen en el pivote central, cada uno de estos tramos se encuentra a su vez dividido en 4 secciones, de acuerdo al siguiente esquema:

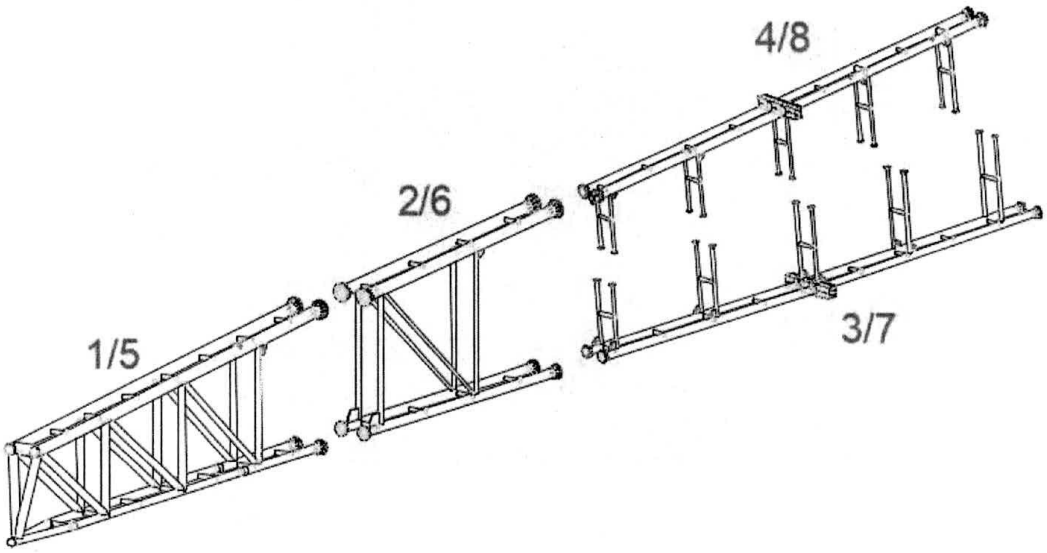


Ilustración 37. Cercha principal

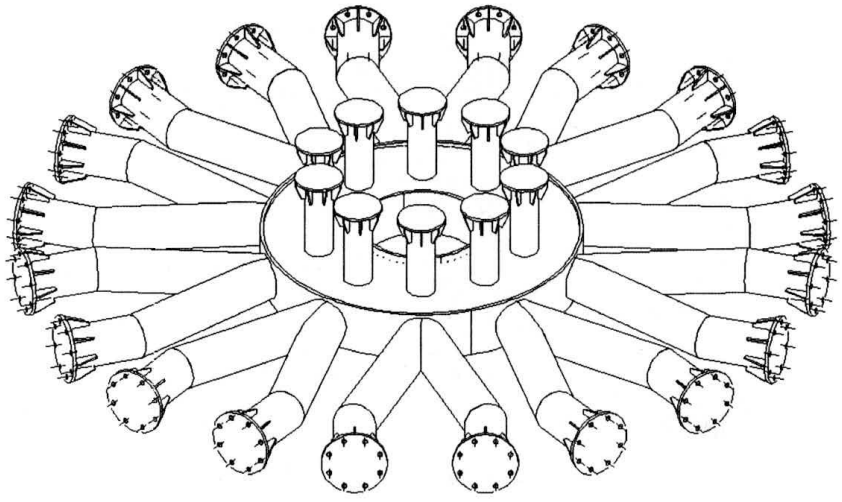


Ilustración 38. Pivote Viga Central PVC1

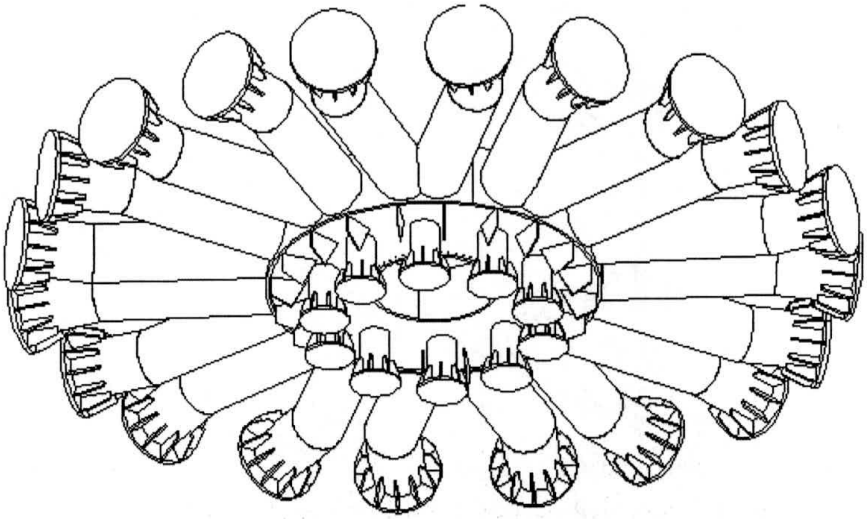


Ilustración 39. Pivote Viga Central PVC2

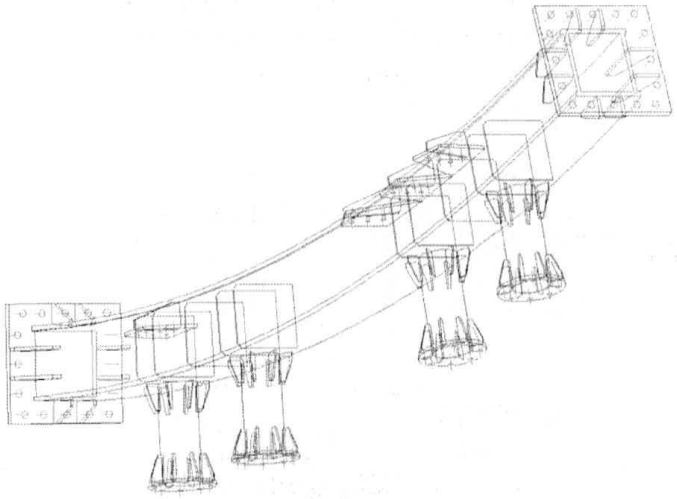


Ilustración 40. Viga Pratt

6.1.7. PAISAJISMO

Para el periodo del presente informe no se realizaron actividades del componente.

6.1.8. PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Para el periodo del presente informe no se realizaron avances del Programa de Gerencia de Proyectos. Sin embargo, se relaciona la primera entrega del programa de gerencia de proyectos el día 10 de marzo de 2024 con el comunicado CE-206-125-112.

6.1.9. PLAN DE CONSTRUCCION Y COORDINACION LOGISTICA (METODOLOGIA PARA LA EJECUCCION DE OBRA)

Para el plan de Construcción y coordinación logística remitido el día 21 de marzo de 2024 mediante oficio CE-206-125-155 versión 2, la interventoría remitió observaciones mediante oficio CIG IDRD-VEL-0116-2024 el día 26 de marzo de 2024, en cuanto al complemento de actividades que deberían estar incluidas dentro del documento, en atención a estas observaciones, se remite una nueva versión del documento (versión 3) el día 01 de abril de 2024 mediane oficio CE-206-125-137 el cual fue finalmente aprobado por la interventoría el día 4 de abril de 2024 mediante oficio CIG IDRD-VEL-0131-2024, documento que se encuentra vigente y sin ningún tipo de modificación a la fecha de cierre del presente informe.

6.1.10. ESTUDIO DE TRAFICO Y TRANSITO DEL VELODROMO

Para el periodo del presente informe no se realizaron avances del Estudio de tráfico y tránsito del Velódromo. Se está evaluando la necesidad de la presentación de este informe, dado que es un requerimiento que se debió establecer en la etapa de estudios y diseños.

6.1.11. PROGRAMACION DE OBRA, GANTT DE SEGUIMIENTO

Para el periodo del presente informe se relaciona la trazabilidad del componente Programación de obra:

- Radicación de la versión 1 de la programación de obra el **17 de febrero de 2024** con el oficio **CE-206-125-048**.
- Se recibe observaciones en el oficio **CIG IDRD-VEL-039-2024**, se da respuesta a las observaciones emitiendo la Versión 2 con el comunicado **CE-206-125-086** y alcance con el oficio **CE-206-125-090 el día 04 de marzo 2024.**
- Se emite la tercera programación con la subsanación de las observaciones del oficio **CIG-IDRD-VEL-067-2024** cuyo radicado es **CE-206-125-129** y alcance con el oficio **CE-206-125-131** el 15 de marzo de 2024.
- Se emite programación V3 con el comunicado **CE-206-125-1860** del cual corresponde al modificatorio # 2

A continuación, se relacionan las fechas de entrega del seguimiento:

FECHA DE REPORTE	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
19/02/2024 AL 24/02/2024	6%	7%
26/02/2024 AL 02/03/2024	55%	57%
04/03/2024 AL 09/03/2024	65%	66%
11/03/2024 AL 16/03/2024	76%	77%

18/03/2024 AL 23/03/2024	84%	87%
25/03/2024 AL 30/03/2024	93%	94%
30/03/2024 AL 04/04/2024	100%	100%

Tabla 10.Entregables de programación

La unión temporal hasta el periodo que comprende el presente informe ha cumplido con éxito la entrega total de toda la documentación requerida en el Anexo técnico 1 "PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN A PLANES Y PROGRAMAS", marcando así el cierre de la etapa inicial del proyecto, Sin embargo, es importante señalar que el avance hacia la etapa de inicio de obra está sujeto a la aprobación de todos los planes y programas por parte de la entidad por tal razón en el mes de mayo se recibió la aprobación, generando el comienzo a la etapa de inicio de Obra el 14/05/2024.

Actualmente se han socializado las siguientes versiones de programación:

PROGRAMACIÓN	VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR -IDRD V0	V0	15/03/2024	Programación contractual (KELLY)
PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR -IDRD V1	V1	12/04/2024	Programación para tramité de modificatorio contractual v1
PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR -IDRD V2	V2	12/09/2024	Programación para NP001 al 005 – balance unitario 1.
PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR -IDRD V3	V3	26/09/2025	Programación para tramité de modificatorio contractual v2 que contempla una adición de $14.965.010.422

Tabla 11.Versiones de programación

Es importante, aclarar que este mes se está trabajando con la programación PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR -IDRD V3 presentada el comunicado **CE-206-125-1860** del 26 de septiembre de 2025, es importante mencionar que esta programación es transitoria y se realizó para cubrir las necesidades de mayores cantidades y la incorporación de los 15 ítems no previstos que integran el acta modificatoria # 2. Dentro del oficio se dejan varias salvedades para la culminación del velódromo.

La programación V3 está sujeta a la adición presupuestal realizada en el modificatorio # 2:


PRESUPUESTO CONTRACTUAL	$ 132.821.646.606,00
ADICIÓN PRESUPUESTAL	$ 14.965.010.422,00
PRESUPUESTO TOTAL MOD # 2	**$ 147.786.657.028,00**

Tabla 12. Adición presupuestal

Dentro de esta programación se realizó el siguiente ajuste de acuerdo con el modificatorio # 2:

CAPÍTULO	MODIFICATORIO 1+AIU	MODIFICATORIO 2+AIU	ADICIÓN
PRELIMINARES	$ 1.022.595.510,00	$ 1.022.361.676,00	-$ 233.834,00
CIMENTACIÓN	$ 24.121.713.133,00	$ 26.844.904.023,00	$ 2.723.190.890,00
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 39.231.255.196,00	$ 42.621.903.944,00	$ 3.390.648.748,00
CONCRETO	$ 11.218.302.074,00	$ 14.674.309.189,00	$ 3.456.007.115,00
ACERO/MALLAS	$ 18.160.390.368,00	$ 9.548.194.506,00	-$ 8.612.195.862,00
ESTRUCTURA METÁLICA	$ 13.434.795.000,00	$ 26.024.337.020,00	$ 12.589.542.020,00
CUBIERTA	$ 7.909.811.667,00	$ 8.117.728.708,00	$ 207.917.041,00
CARPINTERÍA	$ 9.234.682.282,00	$ 7.064.994.464,00	-$ 2.169.687.818,00
PISOS	$ 1.291.343.798,00	$ 1.244.071.882,00	-$ 47.271.916,00
ELÉCTRICAS	$ 2.249.278.929,00	$ 5.426.457.278,00	$ 3.177.178.349,00
HIDRÁULICA	$ 2.292.248.689,00	$ 3.678.167.777,00	$ 1.385.919.088,00
MAMPOSTERÍA / PAÑETE / PINTURA	$ 1.227.658.568,00	$ 974.031.120,00	-$ 253.627.448,00
HVAC	$ 413.876.395,00	$ 4.138.767,00	-$ 409.737.628,00
VIDEO	$ 320.117.179,00	$ 3.201.171,00	-$ 316.916.008,00
DOTACIÓN CONTRACTUAL	$ 225.472.626,00	$ 225.472.626,00	$ -
SONIDO	$ 21.789.817,00	$ 217.897,00	-$ 21.571.920,00
APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES	$ 15.038.188,00	$ 38.378,00	-$ 14.999.810,00
ACABADOS	$ 101.563.657,00	$ 21.423,00	-$ 101.542.234,00
CERRAMIENTO Y PINTURA	$ 4.373.827,00	$ 43.740,00	-$ 4.330.087,00
EQUIPAMIENTO URBANO	$ 2.217.235,00	$ 22.171,00	-$ 2.195.064,00
SEÑALETICA	$ 6.770.574,00	$ 67.705,00	-$ 6.702.869,00
SILVICULTURA	$ 4.424.574,00	$ 44.243,00	-$ 4.380.331,00
SUB-TOTAL	**$ 132.509.719.286,00**	**$ 147.474.729.708,00**	**$ 14.965.010.422,00**
REEMBOLSABLE	**$ 311.927.320,00**	**$ 311.927.320,00**	
TOTAL	**$ 132.821.646.606,00**	**$ 147.786.657.028,00**	

Tabla 13. Modificatorios velódromos

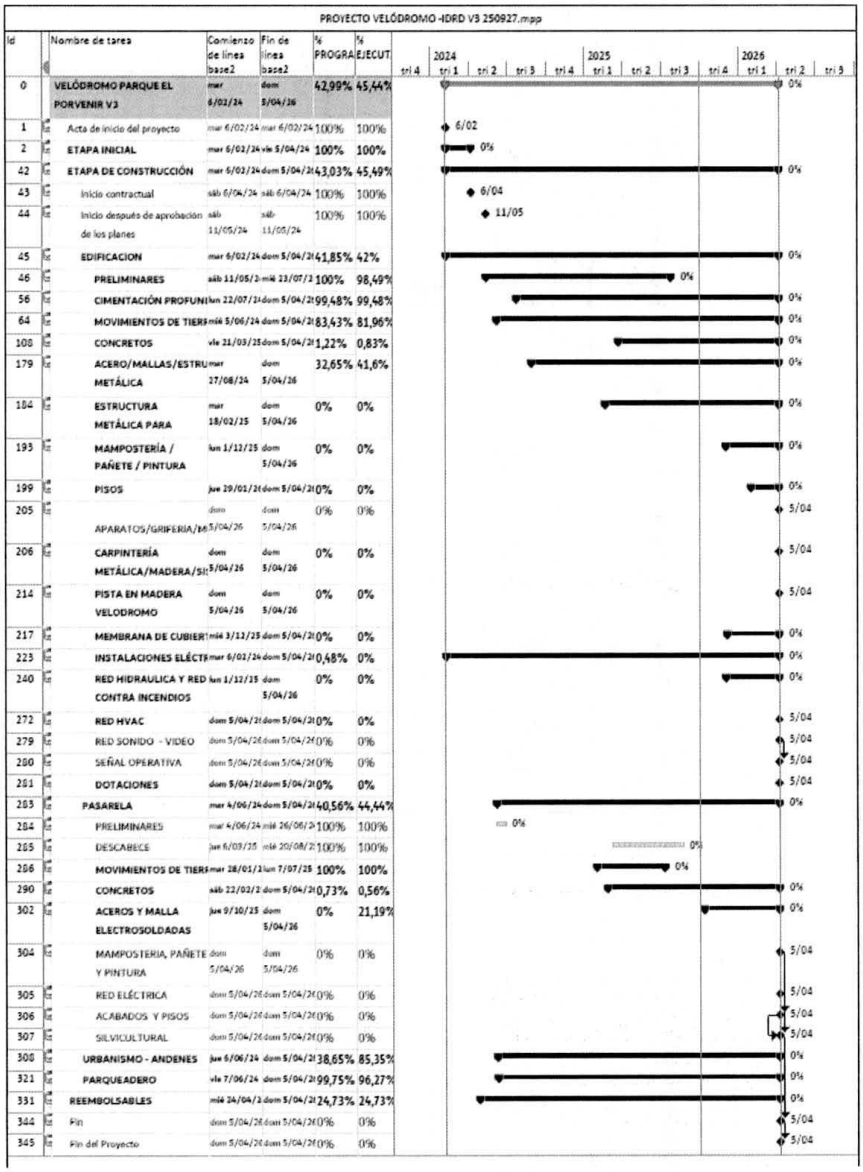

Id	Nombre de tarea	Comienzo de línea base2	Fin de línea base2	% PROGRA	% EJECUT
0	VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR V3	mar 6/02/24	dom 5/04/26	42,99%	45,44%
1	Acta de inicio del proyecto	mar 6/02/24	mar 6/02/24	100%	100%
2	ETAPA INICIAL	mar 6/02/24	vie 5/04/24	100%	100%
42	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	mar 6/02/24	dom 5/04/26	43,03%	45,49%
43	Inicio contractual	sáb 6/04/24	sáb 6/04/24	100%	100%
44	Inicio después de aprobación de los planes	sáb 11/05/24	sáb 11/05/24	100%	100%
45	EDIFICACION	mar 6/02/24	dom 5/04/26	41,85%	42%
46	PRELIMINARES	sáb 11/05/24	mié 23/07/25	100%	98,49%
56	CIMENTACIÓN PROFUNI	lun 22/07/24	dom 5/04/26	99,48%	99,48%
64	MOVIMIENTOS DE TIERR	mié 5/06/24	dom 5/04/26	83,43%	81,96%
108	CONCRETOS	vie 21/03/25	dom 5/04/26	1,22%	0,83%
179	ACERO/MALLAS/ESTRU METÁLICA	mar 27/08/24	dom 5/04/26	32,65%	41,6%
184	ESTRUCTURA METÁLICA PARA	mar 18/02/25	dom 5/04/26	0%	0%
193	MAMPOSTERÍA / PAÑETE / PINTURA	lun 1/12/25	dom 5/04/26	0%	0%
199	PISOS	jue 29/01/26	dom 5/04/26	0%	0%
205	APARATOS/GRIFERIA/BA	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
206	CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SI	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
214	PISTA EN MADERA VELODROMO	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
217	MEMBRANA DE CUBIER	mié 3/12/25	dom 5/04/26	0%	0%
223	INSTALACIONES ELÉCTR	mar 6/02/24	dom 5/04/26	0,48%	0%
240	RED HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS	lun 1/12/25	dom 5/04/26	0%	0%
272	RED HVAC	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
279	RED SONIDO - VIDEO	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
280	SEÑAL OPERATIVA	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
281	DOTACIONES	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
283	PASARELA	mar 4/06/24	dom 5/04/26	40,56%	44,44%
284	PRELIMINARES	mar 4/06/24	mié 26/06/24	100%	100%
285	DESCABECE	jue 6/03/25	mié 20/08/25	100%	100%
286	MOVIMIENTOS DE TIERR	mar 28/01/25	lun 7/07/25	100%	100%
290	CONCRETOS	sáb 22/02/25	dom 5/04/26	0,73%	0,56%
302	ACEROS Y MALLA ELECTROSOLDADAS	jue 9/10/25	dom 5/04/26	0%	21,19%
304	MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PINTURA	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
305	RED ELÉCTRICA	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
306	ACABADOS Y PISOS	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
307	SILVICULTURAL	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
308	URBANISMO - ANDENES	jue 6/06/24	dom 5/04/26	38,65%	85,35%
321	PARQUEADERO	vie 7/06/24	dom 5/04/26	99,75%	96,27%
331	REEMBOLSABLES	mié 24/04/24	dom 5/04/26	24,73%	24,73%
344	Fin	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%
345	Fin del Proyecto	dom 5/04/26	dom 5/04/26	0%	0%

Ilustración 41.Programación de obra vigente

6.1.12. FLUJO DE INVERSION


Para el periodo del presente informe se presenta el avance del Flujo de Inversión del proyecto, de acuerdo con la programación aprobada de obra:

AÑO	MES	COSTO PREVISTO MES	COSTO PREVISTO MES ACUMULADO	VALOR MES ACTA	VALOR ACUMULADO ACTAS	PROGRAMACIÓN
2024	FEBRERO	$ -	$ -	$ 0	$ 0	PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR - IDRD V0
	MARZO	$ 321.624	$ 321.624	$ 0	$ 0	
	ABRIL	$ 270.265.453	$ 270.587.078	$ 0	$ 0	
	MAYO	$ 707.407.080	$ 977.994.158	$ 221.733.196	$ 221.733.196	
	JUNIO	$ 2.412.572.982	$ 3.390.567.140	$ 1.028.375.326	$ 1.250.108.522	
	JULIO	$ 2.556.847.626	$ 5.947.414.766	$ 2.003.748.449	$ 3.253.856.971	
	AGOSTO	$ 3.689.188.469	$ 9.636.603.235	$ 1.701.371.215	$ 4.955.228.186	
	SEPTIEMBRE	$ 2.147.544.251	$ 5.730.678.422	$ 2.489.895.734	$ 7.445.123.920	PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR - IDRD V2
	OCTUBRE	$ 3.275.631.123	$ 9.006.309.545	$ 4.540.879.078	$ 11.986.002.998	
	NOVIEMBRE	$ 5.202.351.005	$ 14.208.660.551	$ 6.630.719.538	$ 18.689.860.759	
	DICIEMBRE	$ 5.407.998.034	$ 19.616.658.584	$ 8.757.395.805	$ 27.374.118.342	
2025	ENERO	$ 5.797.810.527	$ 25.414.469.111	$ 7.209.929.320	$ 34.584.047.660	
	FEBRERO	$ 3.822.227.114	$ 29.236.696.225	$ 3.367.328.780	$ 37.951.376.440	
	MARZO	$ 4.447.016.785	$ 33.683.713.011	$ 5.546.297.095	$ 43.497.673.535	
	ABRIL	$ 5.333.595.033	$ 39.017.308.044	$ 9.368.946.249	$ 52.866.619.784	
	MAYO	$ 5 459.811.184	$ 44.477.119.228	$ 2.543.110.525	$ 55.409.730.311	
	JUNIO	$ 7 010.059.042	$ 51.487.178.270	$ 7.681.163.025	$ 63.090.893.334	
	JULIO	$ 5.901.651.923	$ 57.388.830.193	$ 3.674.169.910	$ 66.765.063.247	
	AGOSTO	$ 3.481.928.194	$ 60.870.758.386	$ 215.256.944	$ 66.980.320.189	
	SEPTIEMBRE	$ 2.666.617.619	$ 63.537.376.005	$ 176.846.896	$ 67.157.167.085	PROYECTO VELÓDROMO PARQUE EL PORVENIR - IDRD V3
	OCTUBRE	$ 2.992.418.461	$ 66.529.794.466	$ 787.676.923	$ 67.944.844.008	
	NOVIEMBRE	$ 5.086.523.068	$ 71.616.317.534	$ 2.295.131.185	$ 70.239.975.192	
	DICIEMBRE	$ 6.830.541.618	$ 78.446.859.152	$ 1.163.657.669	$ 71.403.632.861	
				$ 1.197.153.149	$ 72.600.786.011	
2026	ENERO	$ 7.007.197.575	$ 85.454.056.727	$ 1.427.894.875	$74.028.680.885	
	FEBRERO	$ 5.581.043.931	$ 91.035.100.658	$ 1.733.864.995	$ 75.762.545.875	
	MARZO	$ 5.356.126.372	$ 96.391.227.030			
	ABRIL	$ 51.395.429.998	$ 147.786.657.028			

Tabla 14. Flujo de inversión


Notas:

1. El reporte correspondiente al mes de febrero de 2026 corresponde a un proyectado, su verificación se dará en la aprobación del Acta # 23.

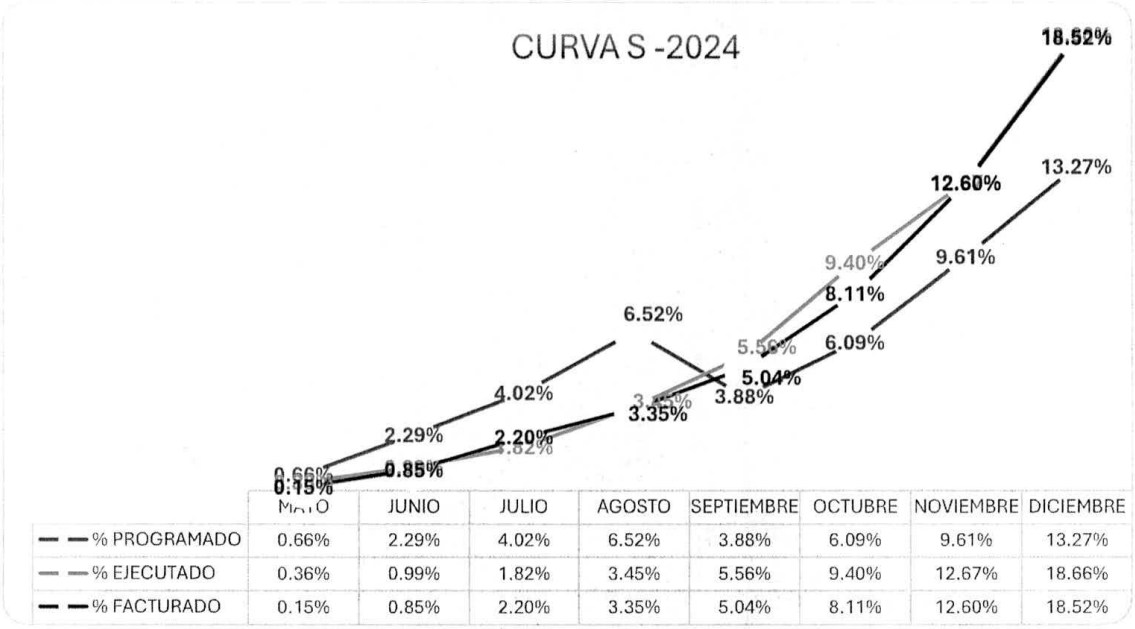

	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% PROGRAMADO	0.66%	2.29%	4.02%	6.52%	3.88%	6.09%	9.61%	13.27%
% EJECUTADO	0.36%	0.99%	1.82%	3.45%	5.56%	9.40%	12.67%	18.66%
% FACTURADO	0.15%	0.85%	2.20%	3.35%	5.04%	8.11%	12.60%	18.52%

Ilustración 42. Curva S 2024

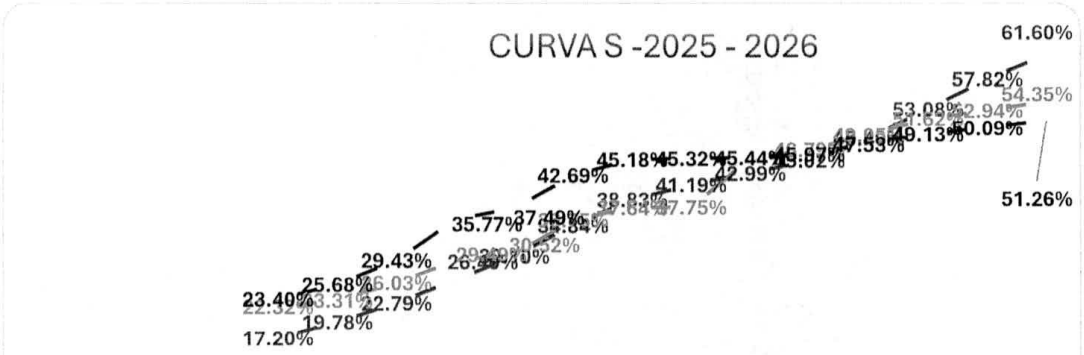

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
% PROGRAMADO	17.20%	19.78%	22.79%	26.40%	30.10%	34.84%	38.83%	41.19%	42.99%	45.02%	48.46%	53.08%	57.82%	61.60%
% EJECUTADO	22.32%	23.31%	26.03%	29.49%	30.52%	35.75%	37.64%	37.75%	45.44%	46.79%	49.05%	51.62%	52.94%	54.35%
% FACTURADO	23.40%	25.68%	29.43%	35.77%	37.49%	42.69%	45.18%	45.32%	45.44%	45.97%	47.53%	49.13%	50.09%	51.26%

Ilustración 43 .Curva S 2025 - 2026

El avance de la facturación estimada para este mes corresponde a un aproximado de $5.581.043.931 que representa un valor de 3.78% del proyecto. Por lo anterior, el proyecto

cuenta con un avance de $ 1.733.864.995,00 (1,17%) que representa un acumulado en actas de 51,26% del proyecto y un valor acumulado de $ 75.762.545.875.

6.1.13. ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

Para el periodo del presente informe se relaciona el organigrama aprobado en el comunicado CIG IDRD-VEL-0117-2024 el 26 de marzo de 2024, mediante la aprobación del plan de Calidad.

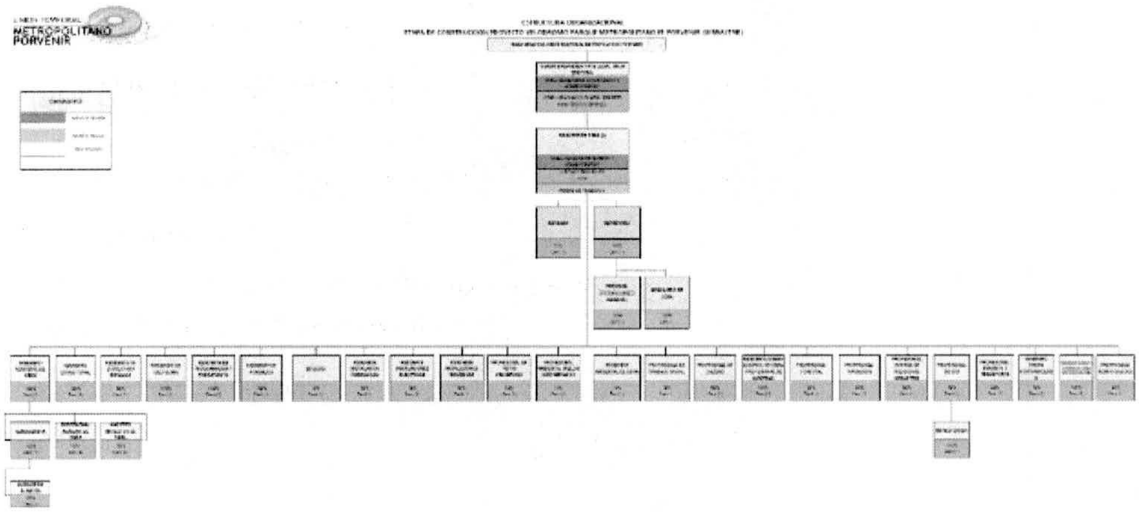


Ilustración 44 .Organigrama

6.1.14. INFORME PRELIMINAR DE COORDINACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, IMPLEMENTANDO LA METODOLOGIA BIM

Para el presente periodo se presenta el informe de coordinación BIM como documento anexo al Informe técnico mensual.

6.1.15. PLAN DE EJECUCCION BIM-BEP

Para el presente periodo no se presenta actualización al Plan de ejecución BIM. Se sigue trabajando con la versión aprobada a la fecha que corresponde al número 6.

6.1.16. TOPOGRAFIA

Para el presente periodo, las actividades del componente de Topografía se presentan como documento Anexo al Informe técnico Mensual.

6.1.17. ARQUITECTURA

Para el periodo del presente informe no se realizaron actividades del componente.

6.1.18. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES COMPONENTE ELECTRICO

ÍTEM: E.12.1.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO DB DE 4" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL, BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO Y/O RESANE, PEGA PVC, CURVAS, ADAPTADORES, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ítem	Descripción	UNIDAD	acumulado mes anterior	semana del 9 al 14 de febrero	TOTAL
E12.1.1	Tubería de 4" PVC	ML	1015,02	8,5	1023,52

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
8,5 metros	1023,52 metros

ÍTEM: E.12.1.6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1-1/2" POR PISO. INCLUYE OBRA CIVIL CON BOTADA DE MATERIAL, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LLENO, PEGA PVC MAS LIMPIADOR, CURVAS, ADAPTADORES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ítem	Descripción	UNIDAD	acumulado mes anterior	semana del 9 al 14 de febrero	semana del 16 al 21 de febrero	TOTAL
E12.1.6	Tubería de 1-1/2" PVC	ML	89,9	3,5	1,5	94,9

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
5,00 metros	94,9 metros

RESUMEN DE ACTIVIDADES AREA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2026										
item	Descripcion	UNIDAD	acumulado mes anterior	Modulo	semana del 9 al 14 de febrero	Modulo	semana del 16 al 21 de febrero	Modulo		TOTAL
E12.1.1	Tuberia de 4 " PVC	ML	1015,02	7 y 8	8,5	TUNEL PRINC			0	1023,52
E12.1.2			0							0
E12.1.3	Tuberia de 2 " PVC	ML	151	7 y 8					0	151
E12.1.4	Tuberia de 1" PVC	ML	33	7 y 8					0	33
E12.1.5	Tuberia de 1-1/4" PVC	ML	420,6	7 y 8					0	420,6
E12.1.6	Tuberia de 1-1/2" PVC	ML	89,9	7 y 8	3,5	TUNEL DEPT	1,5	5	0,0	94,9
E12.1.7	Tuberia de 3/4" PVC	ML	304,5	7 y 8					0	304,5
E12.1.8		ML	0							0
E12.1.9			0							0
E 12.1.5	CAJA CS274	UND	0							0
E 12.1.11.22	CAJA DE PASO 60X80	UND	0,5						0	0,5
E12.1.12.2	CAJA CS276	UND	3,25	7 y 8					0	3,25
E 12.1.12.2	CAJA CS275	UND	0						0	0
E 12.1.12.3	TUBERIA 6Ø6" PVC	UND	27,907						0	27,907

Ilustración 45.Resumen de actividades área eléctrica de febrero.

ACTIVIDADES COMPONENTE HIDROSANITARIO

Las cantidades reportadas tanto en el periodo anterior como en el presente están reflejadas en los formatos de liberación con consecutivos 228, 229, 230, 231, 232, 251, 271, 292, 293, 295 y 314:

ITEMS 13.1_15.1.41 y 13.1_15.4.42 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN.

Se realizaron excavaciones para las redes hidrosanitarias y de suministro de Agua tratada en los frentes relacionados en el numeral 6.1.3. Se tienen tres (3) ítems de excavación según el tipo de red. Siendo el ítem 15.1.41 para excavaciones de redes sanitarias y de suministro, 15.3.31 para redes de aguas grasas y 15.4.42 para redes pluviales

Ítem	Descripción	UNIDAD	TOTAL
13.1_15.1.41 13.1_15.4.42	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	64.29

ITEMS 13.1_15.1.43, 13.1_15.3.32 y 13.1_15.4.44 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO.

Se realizaron rellenos con recebo para las redes descritas en el numeral 6.1.3, principalmente los tramos de alcantarillado pluvial instalados. Se tienen tres (3) ítems de

relleno en recebo según el tipo de red. Siendo el ítem 15.1.43 para excavaciones de redes sanitarias y de suministro, 15.3.32 para redes de aguas grasas y 15.4.44 para redes pluviales

Ítem	Descripción	UNIDAD	TOTAL
13.1_15.1.43 13.1_15.3.32 13.1_15.4.44	RELLENO EN RECEBO	M3	21.51

ITEMS 13.1_15.1.42, 13.1_15.3.31 y 13.1_15.4.43 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN.

Se realizaron rellenos con materiales provenientes de la excavación en tramos de redes internas. Se tienen tres (3) ítems de relleno en material común de la excavación según el tipo de red.

Ítem	Descripción	UNIDAD	TOTAL
13.1_15.1.42 13.1_15.3.31 13.1_15.4.43	RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN	M3	4.06

ITEMS E 3.2.2 SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA LECHO FILTRANTE LIMPIO DE 1" A 1½" PARA FILTROS, CAMAS DE TRITURADO, REEMPLAZOS DE SUELO O LA APLICACIÓN PARA LA CUAL SEA NECESARIO

Este ítem se utilizó para matriz porosa de los filtros perimetrales de los túneles y la cama de cimentación de la tubería de alcantarillado externo.

Ítem	Descripción	UNIDAD	TOTAL
E 3.2.2	MATERIAL GRANULAR PARA LECHO FILTRANTE LIMPIO DE 1" A 1½"	M3	34.95

ITEM 13.1_15.4.08 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 8"

Este ítems se instaló en los tramos 15-17 (21.78 ml), 17-19 (10.84 ml) y 19-21 (11.02 ml) todos de alcantarillado pluvial.

Ítem	Descripción	UNIDAD	TOTAL
13.1_15.4.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA NOVAFORT 8"	ML	32.62

ITEM NP-20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN DE LÁMINA NODULAR HDPE CON GEOTEXTIL TERMOFUNDIDO

Este ítem se ejecutó principalmente en el Túnel apoyo a la competición, el cual en cuanto a este ítem fue ejecutado en su totalidad. Comprende la zona baja (geodren vial) con 211,07 m2 ejecutados y la parte superior (geodren nodular) con 422,15 m2 para un total de 633,21 m2.

Ítem	Descripción	UNIDAD	TOTAL
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN DE LÁMINA NODULAR HDPE CON GEOTEXTIL TERMOFUNDIDO	M2	786.21

ACTIVIDADES COMPONENTE ESTRUCTURA

Se relaciona a continuación el registro fotográfico y la descripción de las actividades ejecutadas en el periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2026:

ÍTEM: E 3.1.2. *EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA PROCESO DE MEJORAMIENTO DE SUELOS EN PROFUNDIDAD DE 0-1 M, EN MATERIAL ESPECIAL BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE: ROCA DESCOMPUESTA, BOLAS DE ROCA DE VOLUMEN INFERIOR A 0.35 M³., EL CARGUE, TRANSPORTE INTERNO.:*

Durante el periodo se realizó la excavación requerida para la ejecución de los dados de módulo 1 en las áreas compartidas con los módulos 10 de graderías.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
287,55 m3	16.793,09 m3



Ilustración 46. Excavación de dados de módulo 1 en zona de graderías módulo 10.

ÍTEM: E 3.1.6. *DESCABECE DE PILOTES DE CONCRETO, A UNA ALTURA DE 1,00 MTS DESCUBRIENDO EL ACERO DE REFUERZO.:*

Durante el periodo se retomó la actividad de descabece de pilotes, particularmente en la zona de los módulos 9 y 10.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
30,00 Un	1046,00 Un



Ilustración 47. Avance del descabece de pilotes en el módulo 10.

ÍTEM: E 3.2.1. *LLENOS EN ARENILLA, COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD DEL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO. INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE LA ARENILLA, LA COMPACTACIÓN DE LA MISMA Y TRANSPORTE INTERNO. Y SU MEDIDA SERÁ EN SITIO YA COMPACTADO.:*

Durante el periodo se iniciaron los llenos en el perímetro exterior de los túneles administrativo y deportivo.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
280,94 m3	280,94 m3



Ilustración 48. Avance de llenos al respaldo de los muros del túnel administrativo.

ÍTEM: E 13.1_16.1.34 *SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.:*

Se avanzó en el relleno con material seleccionado en la zona entre dados de pasarela y rampa pasarela

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
97,06 m3	11.811,56 m3

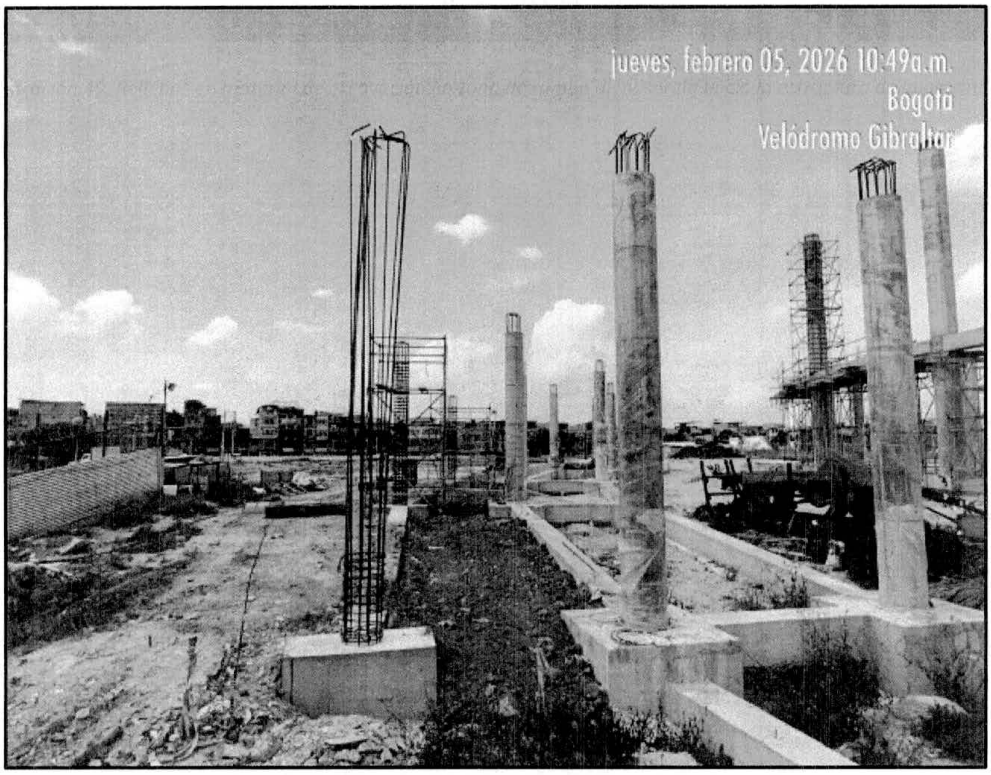


Ilustración 49. Rellenos en material de excavación en zona de rampa de pasarela hacia la estructura de la pasarela.

ÍTEM: E 13.1_16.1.35 *SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENO EN RECEBO INCLUYE LA HERRAMIENTA, MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.:*

Se avanzó en el relleno con recebo bajo vigas y placa de cimentación en los módulos 5 y 6.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
34,25 m3	12.897,03 m3



Ilustración 50. Rellenos en recebo en zona de módulo 6

ÍTEM: E 4.1.2 *COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADO, CON UN ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE EL SUMINISTRO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACARREO INTERNO.NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.:*

Durante el periodo se realizó la fundida de solados de limpieza en varias zonas del proyecto acorde con el avance de las actividades programadas. Incluyendo el inicio de los solados bajo los dados estructurales del módulo 10.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
295,31 m2	4.550,25 m2



Ilustración 51. Fundida de solados de limpieza bajo dados de módulo 10.

ÍTEM: E 4.2.3.1 *CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.:*

Durante el periodo se realizó la fundida de columnas de 60 cm ubicadas en los módulos 4 y 6.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
109,78 m	213,46 m

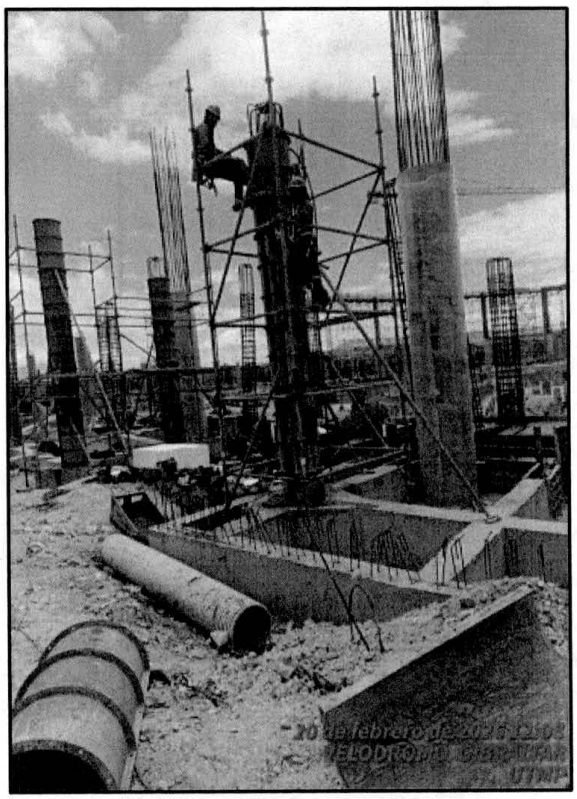


Ilustración 52. Fundida de columnas de 60 cm en los módulos 4 y 6.

ÍTEM: E 4.2.3.2 *CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.:*

Se avanzó en la fundida del primeros tramos de columnas de 80 cm en los módulos 3 y 5.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
32,89 m	138,42 m

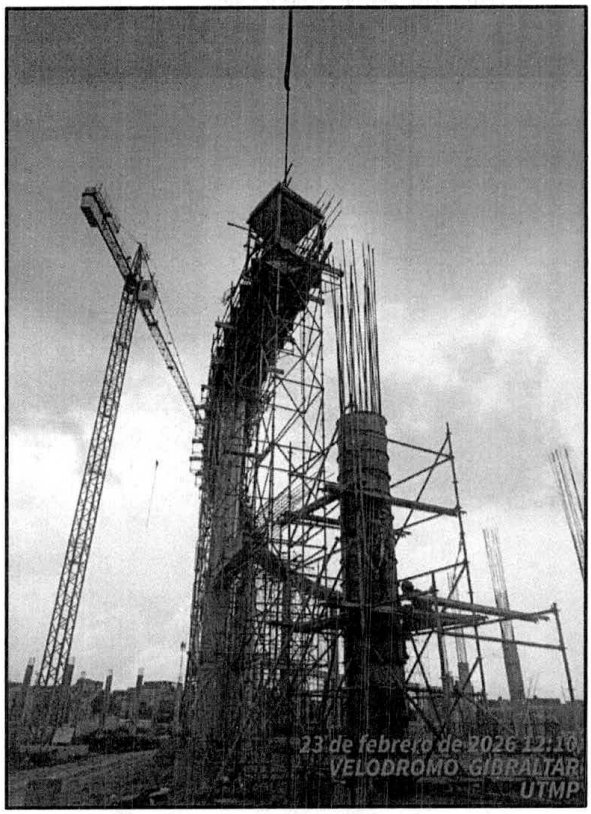


Ilustración 53. Avance de fundida de columnas en módulos 3 y 5.

ÍTEM: E 4.2.3.3 *CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 100 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.:*

Se continuó el avance en fundida de primeros tramos de columnas de 100 cm en la zona de los módulos 2 y 4 y se dio inicio a la fundida de los tramos de segundo nivel en esta misma zona.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
123,40 m	205,27 m



Ilustración 54. Fundida de segundo tramo de columna de 100 cm. de Módulo 1 frente a módulos 4 y 2.

ÍTEM: E 4.2.4.3 *CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.40 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 3,21M HASTA 5,50M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.:*

Se realizó la fundida de los primeros tramos de vigas de 40x60 en la zona del módulo 9 en el perímetro de la parte superior del túnel administrativo.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
3,10 m	3,10 m



Ilustración 55. Fundida de vigas de 40x60 en la corona del túnel administrativo.

ÍTEM: E 4.2.4.6 *CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU*

RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.:

Se inició la fundida de las vigas aéreas del nivel intermedio (N.+6.79) del módulo 1 (cubierta) con el armado y vaciado del tramo ubicado sobre los módulos 2 y 4.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
113,42 m	141,48 m

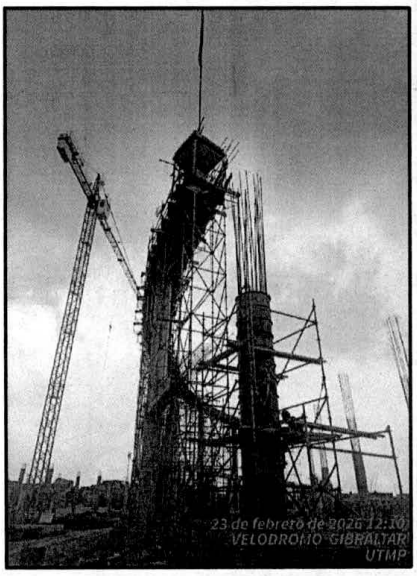


Ilustración 56. Viga aérea de Módulo 1 frente a módulos 2 y 4.

ÍTEM: E 4.2.4.7 *CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00 M HASTA 14.00 M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL*

VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.:

Se inició la fundida de las vigas aéreas del nivel superior (N.+15.55) del módulo 1 (cubierta) con el armado y vaciado del tramo ubicado sobre los módulos 7 y 8.

CANTIDADES EJECUTADAS	
PERIODO	**ACUMULADAS**
36,77 m	36,77 m

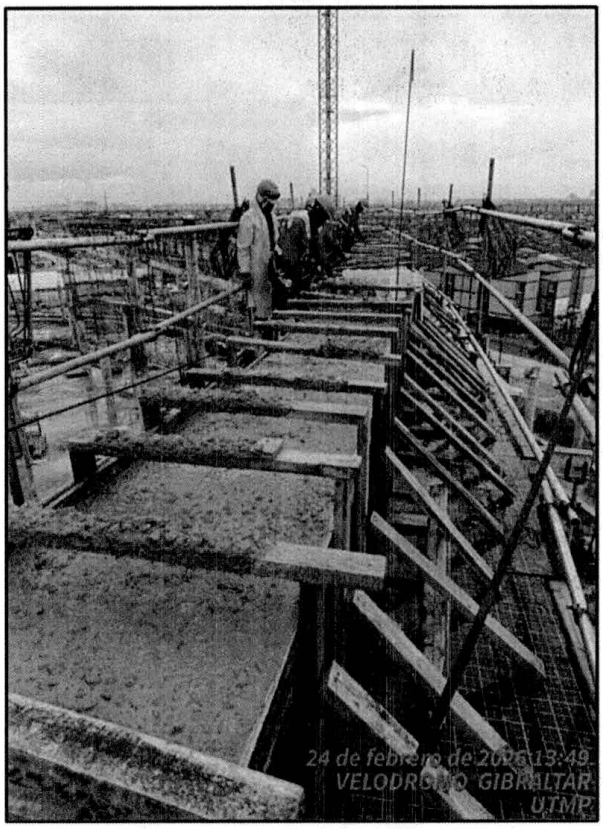


Ilustración 57. Viga aérea nivel superior de Módulo 1 frente a módulos 7 y 8.

ÍTEM: E 5.1.1. *SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE CON DESCARGA,*
