BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20264200127363

Bogotá D.C. 30-03-2026

PARA: **DANIELA BARRERA PEDRAZA**
Subdirección de Contratación

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**

ASUNTO: **REMISIÓN DEL INFORME MENSUAL DE CALIDAD No. 25 DEL CONTRATO DE OBRA No. 3232 DE 2023 – VELÓDROMO GIBRALTAR.**

EXPEDIENTE VIRTUAL No. 2024800701600035E

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir el Informe Mensual de Calidad No. 25 correspondiente al periodo del 26 de enero de 2026 al 25 de febrero de 2026, del Contrato de Obra No. 3232 de 2023, suscrito con el Unión Temporal Metropolitano Porvenir. Revisado y aprobado por la interventoría Contrato No. 3219 de 2023 CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR.

Lo anterior, para que repose en la carpeta del contrato y en el expediente virtual.

Sin ningún otro particular,

KATHERIN AMAYA ROA
Supervisora del Contrato de Interventoría No. 3219 de 2023

Anexos: Lo enunciado en Setecientos setenta y siete (777) folios y un (1) CD.
Copia: N/A

Elaboró: Hernán Darío Pardo Gómez - Contratista STC.
Proyectó: Hernán Darío Pardo Gómez - Contratista STC.

Revisó: Ing. Javier Oswaldo Sánchez Lagos – Apoyo a la Supervisión

Aprobó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de firmado:
2026.03.30 13:54:19 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2026.05.15 12:21:05 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDRD

BOGOTÁ

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".

CONTRATO IDRD N° 3232 DE 2023

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD N° 25

CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDRD N° 3219 DE 2023

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

26 de enero al 25 de febrero de 2026

BOGOTÁ D.C

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2026.05.15 12:18:27 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

INFORME MENSUAL DE CALIDAD N° 25

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
1	25/02/2026	Versión inicial del documento	42
2	04/03/2026	Versión conforme a subsanación oficio CIG-IDRD-VEL-0161-2026 del 03 de enero de 2026	42

Firmas Contratista		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Diego Fernando Castro Profesional Calidad	Ing. Alfonso Peñaranda. Director de obra PMP	Ing. Alfonso Peñaranda. Director de obra PMP

Firmas Interventoría		
Validado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing Carlos Duarte Profesional de Calidad	Arq Ruben Dario Crespo Director de Interventoría	Andrés Martínez Representante Legal

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS 7

OBJETIVO GENERAL 7
OBJETIVOS ESPECIFICOS 7

1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS 8

1.1 INFORMACIÓN ENTIDAD CONTRATANTE 8
1.2 INFORMACIÓN CONTRATISTA 8
1.3 INFORMACIÓN INTERVENTORÍA 9

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 11

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 11

3 SEGUIMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN 13

4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 16

5 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD 20

6 SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 20

6.1 ACTAS DE COMITÉ 21
6.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 21
6.3 BITACORA 21

7 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 21

8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 22

9 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 23

10 PLAN DE ADQUISICIONES ASOCIADO A PLAN INVERSIÓN DE ANTICIPO 23

11 SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN. 24

12 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PROYECTO 25

13 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 27

14 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 33

15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 36

16 CONTROL DE CAMBIOS 40

17 SALIDAS NO CONFORMES 41

18 AUDITORIAS INTERNAS 41

LISTADO DE ANEXOS 42

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. *Entidad Contratante* 8
Tabla 2. *Información contratista* 8
Tabla 3. *Información interventoría* 9
Tabla 4. Medición de Indicadores 13
Tabla 5. Personal Contractual 17
Tabla 6. Listado de Zonas Infraestructura del Proyecto 24
Tabla 7. Control Metrológico 27

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. *Localización del proyecto*..... 12
Ilustración 2. *Render del proyecto*..... 12
Ilustración 3 Registro Fotográfico Infraestructura del Proyecto. 24

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe describe las actividades correspondientes al componente de Calidad, según los requerimientos del contrato de obra IDRD No 3232 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ", durante el veinteunavo mes de la etapa denominada "Construcción" en el periodo de ejecución de obra comprendido entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026. Dichas actividades corresponden a la gestión documental adelantada en el período de reporte

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reportar las gestiones realizadas desde el componente Calidad en el proyecto IDRD 3232-2023, en el período comprendido entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Reportar el cumplimiento y seguimiento de las actividades ejecutadas en el periodo.

1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

1.1 INFORMACIÓN ENTIDAD CONTRATANTE

Tabla 1. *Entidad Contratante*

ENTIDAD CONTRATANTE	
NOMBRE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
DIRECCIÓN	CALLE 63 Nro. 59 A – 06
DIRECTOR GENERAL	DANIEL ANDRÉS GARCÍA CAÑÓN
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA	KATHERINE AMAYA ROA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	FRANCY MURILLO AGUDELO
	JAVIER OSWALDO SANCHEZ
	CAMILO ALVAREZ
PROFESIONAL DE CALIDAD	BIBIANA PAOLA SOSA LINARES

Fuente: *Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2024*

1.2 INFORMACIÓN CONTRATISTA

Tabla 2. *Información contratista*

CONTRATISTA	
NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
DIRECCIÓN	CARRERA 7 NO.75 – 51 OFICINA 602, BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO	(+57) 601 6401500
N° DE CONTRATO	3232 DEL 2023

CONTRATISTA	
OBJETO DE CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 132.821.646.606,00
MODIFICATORIO No 2	$ 14.965.010.442,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 147.786.657.048,00
PLAZO DEL CONTRATO	26 MESES (2 MESES PRELIMINARES Y 24 MESES CONSTRUCCIÓN)
FECHA DE INICIO	6 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE ABRIL DE 2026

Fuente: *Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2024*

1.3 INFORMACIÓN INTERVENTORÍA

Tabla 3. *Información interventoría*

INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
DIRECCIÓN	CALLE 120 A # 7- 36 OFI. 802
TELÉFONO	(601) 2456144

INTERVENTORÍA	
N° DE CONTRATO	3219-2023
OBJETO DE CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"
VALOR DEL CONTRATO	$ 7'607.817.556
PLAZO DEL CONTRATO	27 MESES (2 MESES PRELIMINARES, 24 MESES CONSTRUCCIÓN Y 1 MES LIQUIDACIÓN)
FECHA DE INICIO	6 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE MAYO DE 2026

Fuente: *Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2024*

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy, en la UPL Patio Bonito en el barrio Osorio XII, en la dirección Calle 49 Sur N° 98B-76, en el parque de categoría Estructurante El Porvenir (Gibraltar)

Ilustración 1. ***Localización del proyecto***



Fuente: *Unión Temporal Metropolitano Porvenir, 2024*

Ilustración 2. ***Render del proyecto***

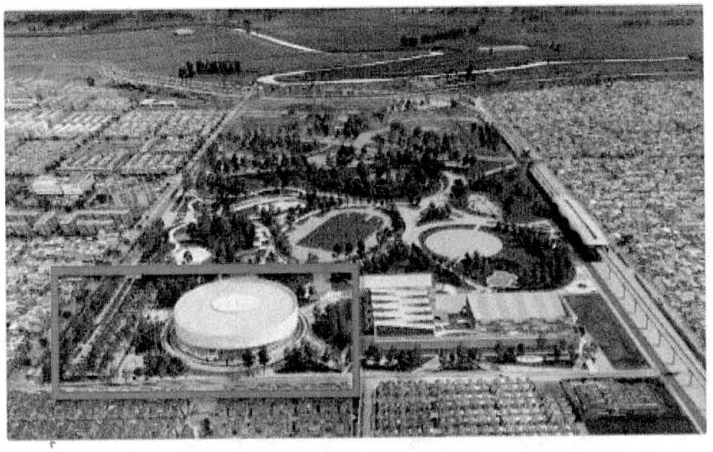

Fuente: *Paralelo 621, 2023.*

3 SEGUIMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el período de reporte, se realizó la medición de indicadores aplicables a la etapa de obra así:

Tabla 4. Medición de Indicadores

OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	INDICE	Frecuencia	META	Enero 2026	Observaciones	Plan de Acción
Dar respuesta a las quejas presentadas por el cliente y las partes interesadas durante la ejecución del proyecto	Quejas	(Quejas respondidas / Quejas presentadas) *100	Mensual	>=90%	$\frac{23\ PQRS}{23\ PQRS} = 100\%$	Durante el periodo del mes del 26 de enero al 25 de febrero de 2026. No se presentaron PQRs para tramitar.	No Aplica
Mantener la satisfacción del cliente durante el desarrollo del proyecto	Satisfacción del cliente	Resultado de la evaluación.	Semestral	>=9 puntos	9 puntos	La encuesta de satisfacción se realizó el 23 de enero de 2026 generando resultados satisfactorios.	No Aplica
Cumplir con la programación de la obra aprobada por el cliente	Programación de obra	IG= AEP/APP*100 Donde: AEP: % de avance de actividades ejecutadas en el proyecto a la fecha de corte. APP: % de avance de actividades programadas en el proyecto a la fecha de corte.	Mensual	Si IG es > = al 100%, la gestión se considerará excelente. Si IG está entre el 80% y el 99%, la gestión se considerará buena. Si IG está entre el 70% y el 79%, la gestión será regular. Si IG es menor o igual a 69%, la gestión será deficiente.	AEP=54,55% APP=62,02% $IG = \frac{54{,}55\%}{62{,}02\%} * 100$ **IG=87,95%**	Durante el periodo del mes del 26 de enero al 25 de febrero de 2026, se trabajó conforme a aprobación de los ítems del modificatorio No 2 referente a la instalación de los concretos especiales. A lo anterior se realiza el cálculo de los indicadores, evidenciando una buena gestión. Se aclara que los porcentaje de avance se calcularon con base en la programación actual, estando	No Aplica

OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	INDICE	Frecuencia	META	Enero 2026	Observaciones	Plan de Acción
						en trámite una posible adición.	
Cumplir la planeación del PIME	PIME	# Ensayos realizados / #Ensayos Planeados	Mensual	>=80%	$\frac{16\ Ens\ realizados}{16\ Ens\ planeados} = 100\%$	Durante el periodo del presente informe se realizaron las mediciones del monitoreo de gases, se realizaron ensayos de asentamiento y ensayos a compresión a los concretos allegados para la fundida de los diferentes módulos del edificio y pasarela, se realizaron ensayos de la Estructura Metálica en planta de emecon.	No Aplica.
Asegurar las mediciones de los equipos de seguimiento y medición	Programa mantenimiento de equipos medición y laboratorio	# Equipos verificados y/o Certificados / # de equipos programados para verificación y/o calibración	Semestral	100%	$\frac{49\ certificados}{49\ Equipos} = 100\%$	Los equipos de seguimiento y medición utilizados en el periodo del presente informe corresponden a equipos de topografía, equipos de medición de gases, equipos de ensayos a compresión, equipos de ensayos de tracción de aceros, Equipos de seguimiento y medición de fabricación de estructura	No Aplica

OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	INDICE	Frecuencia	META	Enero 2026	Observaciones	Plan de Acción
						metálica de cubierta, Equipos para ensayos de caracterización etc	
Mejorar Continuamente	No Conformidades	# No conformidades cerradas / # No conformidades programadas para cierre	Bimensual	80%	$\frac{7\ NC}{7\ NC} = 100\%$	Durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026, no se generaron No Conformidades.	No Aplica
Cumplimiento entrega de productos y/o informes contractuales	Productos y/o Informes Mensuales por componente	# de productos y/o informes entregados oportunamente en el plazo contractual / # de productos y/o informes programados para entregar	Mensual	100%	$\frac{5\ Inf\ Entr}{5\ Inf\ Prog} = 100\%$	Los Informes del periodo comprendido entre el 26 de diciembre al 25 de enero de 2026 se entregaron previo al finalizar el día 28 de enero de 2026 y se aprobaron previo al 05 de febrero de 2026. Lo anterior en cumplimiento al plan de acción el cual consistía en realizar corte los primeros 25 días de cada mes.	No Aplica

OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	INDICE	Frecuencia	META	Enero 2026	Observaciones	Plan de Acción
Cumplimiento del Plan de adquisiciones basado en el cumplimiento del plan de inversión de anticipo	Plan de adquisiciones	Cumplimiento del plan de adquisiciones	Mensualmente	80%	8%	Ya una vez aprobado el Modificatorio No 2 se evidencia recursos para ejecución de actividades relacionadas con los concretos especiales, los cuales, sin embargo no se estableció adición en tiempo y/o prorroga. A lo anterior y debido a que el Plan de Compras se basa en la programación, se hace necesario esperar al modificatorio No 3 a fin de evidenciar fechas previstas realistas para las adquisiciones	Debido a que no se tiene una adición en tiempo y/o prorroga no es posible obtener una fecha definitiva de las adquisiciones. A lo anterior se está a la espera del modificatorio No 3 con el cual se actualizaría el Plan de Adquisiciones a fecha realistas y definitivas.

Ver Anexo 13. Soporte Gestión de Indicadores

4 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

El organigrama del contrato fue presentado en el numeral 4 del Plan de Calidad, el cual relaciona el equipo mínimo obligatorio. A la fecha de corte del presente informe, los profesionales se encuentran aprobados por parte de la interventoría, los documentos son elaborados por parte de los profesionales de apoyo de la Unión

Temporal y revisados y aprobados por el Director de Obra quién actualmente ya se encuentra aprobado.

A continuación, se relaciona el listado de personal contractual donde se describen todos los cargos contractuales establecidos para el proyecto, con el nombre del profesional contratado al periodo del informe.

Tabla 5. Personal Contractual

PROFESIONAL CONTRATISTA OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VELODROMO					
CANT	**Perfil No**	**CARGO**	**% DE DEDICACIÓN FEBERO 2026**	**PERSONAL CONTRATADO A LA FECHA**	**COMUNICADO DE APROBACIÓN**
1	1	**Director de Obra**	100%	Alfonso Peñaranda	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	2	**Profesional auxiliar de obra.**	65,00%	Julio Cesar Sanchez Suárez	CIG-IDRD-VEL-214-2024
1	3	**Profesional Auxiliar de Obra**	65,00%	Claudia Nathaly Gualteros Álvarez	CIG-IDRD-VEL-214-2024
1	4	**Ingeniero Residente de Obra**	100,00%	Carlos Eduardo Guzman	CIG-IDRD-VEL-0224-2024
1	5	**Ingeniero Estructural**	100,00%	Jose Galeano	CIG-IDRD-VEL-082-2024
1	6	**Residente estructura metálica**	100%	Sandra Milena Parra Molano	CIG-IDRD-VEL-0295-2025
1	7	**Residente en Geotecnia**	50,00%	Mario Ortiz	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	8	**Residente de programación y presupuesto**	100,00%	Diana Alejandra Tello	CIG-IDRD-VEL-0037-2026
1	9	**Residente de Acabados**	0%	PENDIENTE	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	10	**Residente Instalación Hidráulicas**	45,00%	Alfredo Ferreira Barrios	CIG-IDRD-VEL-0223-2024
1	11	**Residente de Instalación Eléctricas**	45,00%	Eduard Antonio Corredor Reyes	CIG-IDRD-VEL-048-2024

PROFESIONAL CONTRATISTA OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VELODROMO					
CANT	**Perfil No**	**CARGO**	**% DE DEDICACIÓN FEBERO 2026**	**PERSONAL CONTRATADO A LA FECHA**	**COMUNICADO DE APROBACIÓN**
1	12	**Residente Instalaciones Mecánicas.**	45,00%	Rosario del Pilar Silve - Caro	CIG-IDRD-VEL-0631-2025
1	13	**Profesional en pistas Velódromo**	65%	Pablo Echavarría Rico	CIG-IDRD-VEL-093-2026
1	14	**Profesional ambiental en manejo de suelos contaminados.**	75,00%	Cesar Fernández Soler	CIG-IDRD-VEL-082-2024
1	15	**Residente ambiental de obra**	75,00%	Paula Blanco	CIG-IDRD-VEL-082-2024
1	16	**Maestro o Inspector de Obra**	100,00%	Luis Evelio Cardozo	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	17	**Maestro o Inspector de Obra**	100,00%	Omar Cruz	CIG-IDRD-VEL-0379-2024
1	18	**Almacenista**	100,00%	Pedro Antonio Ubaque Rodriguez	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	19	**Auxiliar de almacén**	100,00%	Yeison Alexander Bustos Perdomo	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	20	**Secretaria de obra**	100,00%	Nelly Esperanza Carreño Riveros	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	21	**Personal operario (Aseo general)**	100,00%	Jimena Deyanira Camacho	CIG-IDRD-VEL-0299-2025
1	22	**Mensajero de obra.**	100,00%	Jose Antonio Bustacara Fuentes	CIG-IDRD-VEL-0107-2026
1	23	**Abogado**	65,00%	Yolanda Margarita Sanchez	CIG-IDRD-VEL-0224-2024
1	24	**Profesional en Trabajo Social**	75,00%	Diana Ortíz	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	25	**Profesional de calidad**	65,00%	Diego F Castro	CIG-IDRD-VEL-0223-2024
1	26	**Residente diseño control de obra (profesional de compras)**	100,00%	Orlando Yesid Hernandez Amortegui	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	27	**Profesional Forestal**	50,00%	Juan Javier espinel silva	CIG-IDRD-VEL-048-2024

PROFESIONAL CONTRATISTA OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VELODROMO					
CANT	**Perfil No**	**CARGO**	**% DE DEDICACIÓN FEBERO 2026**	**PERSONAL CONTRATADO A LA FECHA**	**COMUNICADO DE APROBACIÓN**
1	28	**Profesional Paisajista**	50,00%	Gustavo Barreto	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	29	**Profesional en Gestión del Riesgo de Desastres**	65,00%	Johanna Barrientos	CIG-IDRD-VEL-082-2024
1	30	**Profesional SG – SST**	45,00%	Luz Stella Rodriguez	CIG-IDRD-VEL-0306-2024
1	31	**Inspector SST**	100,00%	Yeimmy Lorena León Gonzalez	CIG-IDRD-VEL-0271-2024
1	32	**Profesional tránsito y transporte**	25,00%	Martha Castillo	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	33	**Ingeniero redes contra incendios**	45%	Diego Rojas	CIG-IDRD-VEL-0887-2025
1	34	**Residente y diseño control de obra - profesional BIM**	100,00%	John Ramos	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	35	**Profesional Hidrogeólogo**	25,00%	Sara Chaparro	CIG-IDRD-VEL-048-2024
1	36	**Profesional Biólogo**	15,00%	Claudia Infante	CIG-IDRD-VEL-048-2024

Durante el periodo del mes del 26 de enero al 25 de febrero de 2026, se presentó la traslado del mensajero Edilson Yesit Savedra Monroy a otro proyecto, a lo cual en su reemplazo se incluyó a Jose Antonio Bustacara Fuentes el cual fue aprobado mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0107-2026 del 12 de febrero de 2026. Adicionalmente se presentó la hoja de vida del profesional de construcción de pistas del velódromo, Arquitecto Pablo Echavarría Rico, el cual fue aprobado mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-093-2026 del 10 de febrero de 2026.

Para el cargoo pendientes por contratar tal como el Residente de Acabados, no se hace evidente una necesidad de contratación del mismos para la etapa en la que se encuentra el proyecto.

5 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

El plan de Calidad se encuentra aprobado mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0117-2024 del 26 de marzo de 2024. El cumplimiento del Plan de Calidad se refleja en el presente informe que reporta la planificación, ejecución, verificación y acción de cada uno de los aspectos de aseguramiento y control de Calidad del contrato.

6 SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

En el *Procedimiento de comunicaciones SC-002-024* se detallan los elementos a comunicar, quién comunica, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar, bien sea internos y externos.

En esta etapa se han establecido los destinatarios así:

INTERVENTORIA

Arq. Andrés Martínez Vesga

Representante legal

Dirección: Calle 120ª N° 7-36 Oficina 802

CONTRATISTA

Ing. Alfonso Peñaranda Suarez

Director de Proyecto

Cra 7 N° 75-51 Oficina 602

Correo electrónico: utmetropolitanoporvenir@cyg.com.co

6.1 ACTAS DE COMITÉ

Se adjuntan las actas del comité realizadas en el Periodo ***(Ver Anexo 1)***. Es importante resaltar que el cumplimiento de compromisos es revisado en cada uno de los comités y registrado en las actas de reunión.

6.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Adjunto se anexa el control de correspondencia actualizado **(Ver Anexo 2).**

6.3 BITACORA

Se adjunta el escáner de las bitácoras de obra en las cuales se registra actividades realizadas en el mes durante el periodo del presente informe, tales como armado y fundida de placas de los módulos 3, 5 y 6, placas aéreas de los túneles administrativo y apoyo a la competición, muros 3 , 5, 6 y túneles, Dados y Vigas Módulo 1, Módulo 2, Módulo 5, Módulo 6, Túnel Deportivo, Túnel Administrativo y Módulo 11, Columnas Módulo 1 al Módulo 7, Rampa, Túnel de Ambulancia y Módulo 16. Impermeabilizaciones de los túneles Deportivo y ambulancia, Instalación de Geodren Vial y Tecdrén en túnel de apoyo a la competición e Instalación de Desagues de aguas lluvias en módulos de la pasarela.

(Ver Anexo 3).

7 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Durante el desarrollo del periodo del 26 de enero al 25 de febrero de 2026 se realizaron seguimiento a los compromisos establecidos con la entidad, con el fin de

dar trámite a los mismos en pro de avanzar las actividades pendientes, lo anterior se puede evidenciar en el **Anexo 9** Seguimiento a compromisos.

8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

A la fecha de corte del presente informe, y conforme a la matriz de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos suministrada por la entidad, se evidencia mediante la aprobación por parte de la entidad del modificatorio de pilotes preexcavados y fundidos en sitio por pilotes hincados un tratamiento eficaz a la variación de la especificación técnicas para dicho proceso constructivo relacionado con la cimentación, se aprobó los Nps de los concretos especiales mediante el modificatorio No 2 por parte del IDRD a fin de iniciar con el vaciado de concretos estructurales. En referencia al riesgo evidenciado relacionado con las inconsistencias en los diseños evidenciadas, luego de realizar mesas de trabajo presenciales y virtuales, se optó por llevar a cabo los diseños por parte de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir, con el fin de garantizar continuidad de la obra. A la fecha de corte del presente informe ya se tienen avalados los ajustes y/o modificaciones a los diseños del componente de Estructura en Concreto, Arquitectura, Eléctrico, Hidrosanitario Suministro y RCI, Paisajismo y HVAC, Estructura Metálica y Sistema de apoyos, quedando solamente pendiente, la pasarela de mantenimiento, el diseño de fachada, el componente de Gas y Aprobación de paisajismo, diseño de la pista y Ascensores. Finalmente en servicios públicos, ya se cuenta con provisional eléctrica e hidrosanitaria una vez surtidos los respectivos trámites ante las empresas de servicios públicos (Codensa y Acueducto). (**Ver Anexo 8** – Matriz de Riesgos).

9 SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

En el registro SC-003-009 se encuentra relacionada la información documentada interna y externa del proyecto, durante el periodo del mes de 26 de enero al 25 de febrero de 2026 no se presentaron actualizaciones a formatos ni formatos nuevos para registro.

En referencia al listado maestro de planos, el mismo se actualizará conforme a la aprobación de los diseños estructurales de fachada, los cuales se presentará por parte de la Unión Temporal Metropolitano Porvenir para revisión y aval de la interventoría.

El registro actualizado de la información documentada se encuentra en el **Anexo 4.** del presente Informe.

10 PLAN DE ADQUISICIONES ASOCIADO A PLAN INVERSIÓN DE ANTICIPO.

Conforme con lo solicitado por la entidad, el plan de adquisiciones se basará en el cumplimiento del plan de inversión del anticipo. A la fecha de corte se presenta el Plan de Compras y Adquisiciones relacionado en el **Anexo 12** del presente informe.

Es de aclarar que las gestiones realizadas conforme a lo descrito en el Anexo 12 Plan de Gestión de Adquisiciones, presenta fechas de inicio y finalización bajo el modificatorio No 2 el cual incluye adición para el inicio de actividades referentes a Concretos Especiales. Se está a la espera de surtir el modificatorio No 3 el cual incluiría adición en tiempo y/o prorroga con el fin de tener fechas realistas definitivas.

11 SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN.

Durante el desarrollo del presente periodo se continuó haciendo uso de la infraestructura provisional suministrada por la Unión Temporal tales como los baños, contenedores como uso de oficina para el personal administrativo, planta eléctrica etc.

Se adjunta registro fotográfico de infraestructura del proyecto.

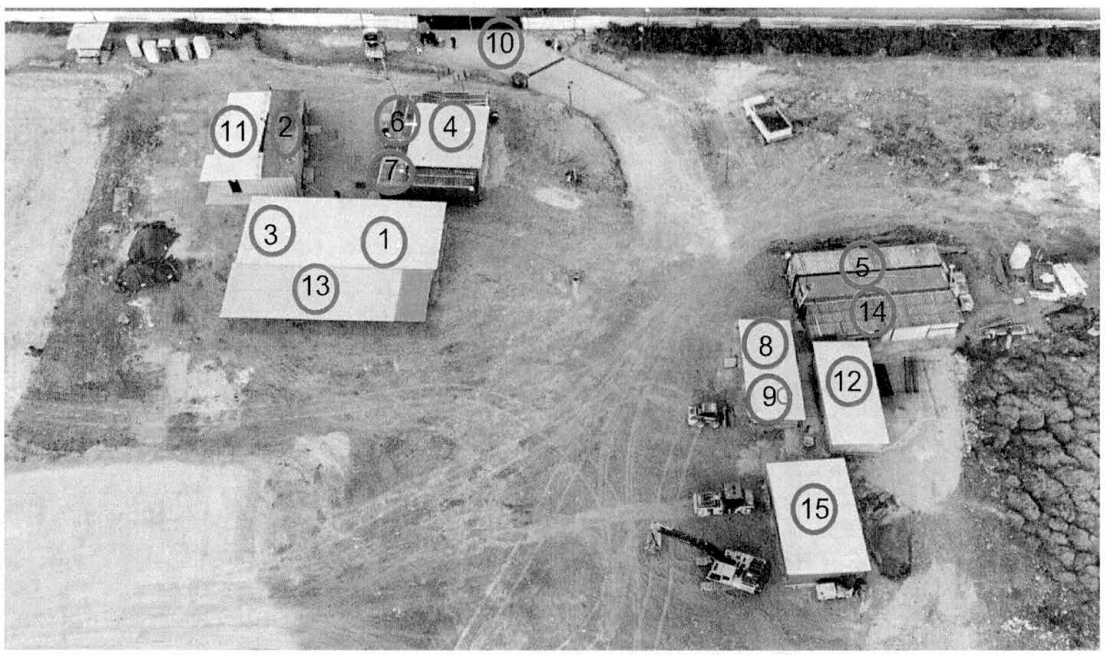



Ilustración 3 Registro Fotográfico Infraestructura administrativa del Proyecto.

Tabla 6. Listado de Zonas administrativa Infraestructura del Proyecto

No	Zona
1	Sala de Juntas
2	Contenedores Componentes Administrativos

No	Zona
3	Oficinas Directores y Auxiliar Administrativa
4	Contenedores Interventoría
5	Contenedor Almacén
6	Contenedor Compras y Adquisiciones
7	Contenedor Componente Técnico
8	Laboratorio de Toma de Muestras de Concreto.
9	Zona de Depósito de Sustancias Químicas
10	Entrada Provisional No 1.
11	Baños Provisionales Personal Administrativo
12	Cuarto de Almacenamiento de Cemento
13	Parqueadero Provisional
14	Cuartos para Personal Operativo
15	Comedor para personal Operativo

Ilustración 4 Registro Fotográfico Infraestructura Técnica del Proyecto.

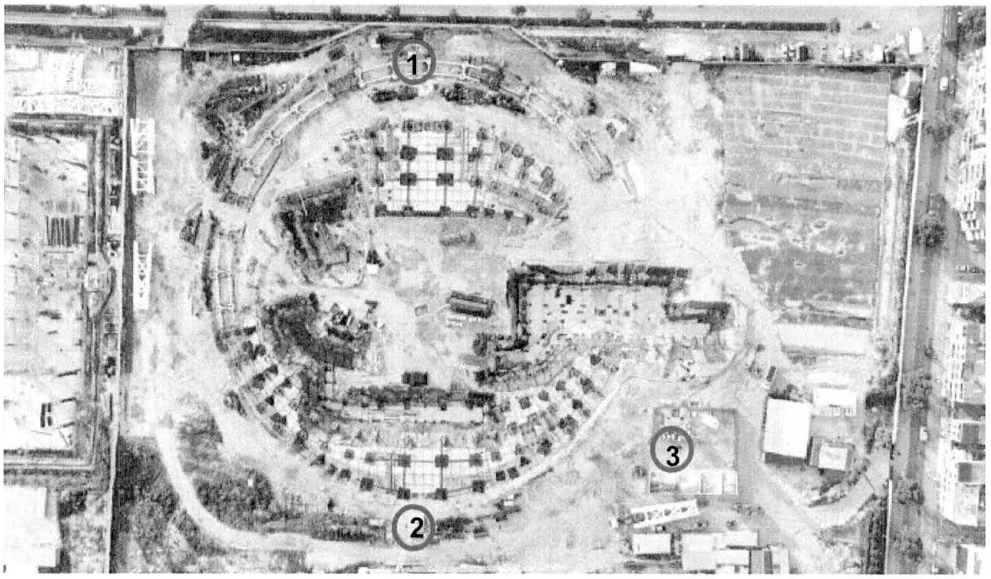

No	Zona
1	Torre Grúa No 1
2	Torre Grúa No 2
3	Zona de Instalación Planta de Concreto

12 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO DEL PROYECTO

Durante el periodo del mes de 26 de enero al 25 de febrero de 2026, Se realizaron ensayos de asentamiento y compresión para las diferentes fundidas de concreto en Módulo 1, Módulo 2, Módulo 3, Módulo 4, Módulo 5, Módulo 6, Módulo 7, Módulo 8 Túnel Deportivo, Túnel de Ambulancia, Túnel de Apoyo a la competición, Módulo 16 y Rampa de Pasarela, se realizaron monitoreos de gases, ensayos a la estructura metálica de cubierta en planta de Emecon, se operó la planta de concreto conforme a los diseños de mezcla presentados a la interventoría y se verificaron los certificados de calidad de los aceros de refuerzo suministrados por nuestro proveedor Grupo Siderurgico Reina. Adicionalmente se realizaron ensayos de caracterización y toma de densidades para la Subbase Granular Tipo PEA como material reciclado para los llenos de los trasdos de los túneles administrativos y de apoyo a la competición.

Ver Anexo 10. Seguimiento al PIE.

13 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Unión Temporal Metropolitano Porvenir relaciona los certificados de calibración de los equipos utilizados durante el mes del 26 de enero al 25 de febrero de 2026, los cuales fueron utilizados para la realización de mediciones que impacten la conformidad del producto o de algún requisito, conforme a los establecido en el contrato pactado con el IDRD o alguna norma respectiva. **(Ver Anexo 5)**

Tabla 7. Control Metrológico

No	Uso	Equipos	Marca	No de Serie	Certificado	Modelo	Fecha Última Calibración	Vencimiento
1	Localización y Replanteo	ESTACION TOTAL	TOPCON	1Y007794	CVC20250929-1242	GM-55	29-sep-25	Vigente
2	Localización y Replanteo	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	X24065	CVC20250929-1243	At_B4	29-sep-25	Vigente
3	Localización y Replanteo	ESTACION SOKKIA SET650X NS 111935	SOKKIA	111935	CVC20251125-1288	SET650X	25-nov-25	Vigente
4	Localización y Replanteo	NIVEL AUTO TOPCON AT-B4A NS 180727	TOPCON	180727	CVC20251125-1289	At_B4A	25-nov-25	Vigente
5	Medidor Gases	DETECTOR DE GAS	BOSEAN	22113485	PSDGA-028171-RO	K600	2-feb-26	Vigente
6	Bascula RESPEL	CAMIONERA BÁSCULA PROMETALICOS SA	Prometalicos S.A	170217/2536	28759	80460 BP	9-ago-25	Vigente
7	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	TINIUS OLSEN	74619	CFA-25-31311-2	K587D26244	27-ago-25	Vigente
8	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	53341 C1168 V 1.1	CFA-25-31310-S	SUPERI	26-ago-25	Vigente
9	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	552	CFA-25-30680-S	SARTURN Plus	10-feb-26	Vigente
10	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	C2414	CFA-25-30684-S	MIL-M-MUE-100Kn	10-feb-26	Vigente
11	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3138F	CT-1500	12-feb-26	Vigente
12	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3139F-S	CT-1500	12-feb-26	Vigente
13	Ensayos de Soldadura	EQUIPO DE ULTRASONIDO SONOWALL	SONOTEC	10362	RVM4360126	SONOWALL	19-ene-26	Vigente
14	Control Dimensional	PIE DE REY/CALIBRADOR PIE DE REY	MITUTOYO	BD055821	D18826-29551-R_E	530-104BR	18-mar-24	Vigente
15	Ajuste de equipos de ultrasonido	BLOQUE METÁLICO IIW TYPE 2	HIGH TECH	120910	D18288-46019-INF	1018 STELL	10-feb-26	Vigente
16	Control Dimensional	REGLA GRADUADA	SHINWA	No Registra	L-35969-001 RO	201F	10-dic-25	Vigente
17	Medición de Temperatura y Humedad	TERMOHIGRÓMETRO	AMPROBE	9007100	T-35969-003 RO	THWD-1	5-dic-25	Vigente
18	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-002	D22323-36048-R_E	CAM TYPE GAUGE	27-ene-25	Vigente
19	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-003	D22324-36049-R_E	WEB FILLET GAUGE	27-ene-25	Vigente
20	Medidor de Espesores	GALGA DE ESPESORES	ELCOMETER	NO PRESENTA	NA-35514-001 RO	NO PRESENTA	27-oct-25	Vigente

No	Uso	Equipos	Marca	No de Serie	Certificado	Modelo	Fecha Última Calibración	Vencimiento
21	Pruebas de Presión - Redes Hidraúlicas	MANOMETRO BOURDON TIPO C	SUMMA	24100470	530864	NO PRESENTA	8-abr-25	Vigente
22	Ensayo de Densidades	DENSIMETRO NUCLEAR	HUMBOLT	5146	D021-25	HUMBOLT	30-may-25	Vigente
23	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	PINZUAR	64469	5903D	MARCO 12 IN	1-mar-25	Vigente
24	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA A COMPRESIÓN MARSHALL	ELEVAC	C-1180	CF-4430	MCIL-MULTI-70KN-P	27-mar-25	Vigente
25	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	ELEVAC	C-1180	2897F	MCIL-MULTI-70KN-P	28-mar-25	[redacted]
26	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS221601	4317M	FENIX	8-abr-25	Vigente
27	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 100	GRANOTEST	93991	6019D	MARCO 8 IN	8-abr-25	Vigente
28	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 16	GRANOTEST	93202	6060D	MARCO 8 IN	7-abr-25	Vigente
29	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3	GRANOTEST	89869	6119D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
30	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2 1/2	GRANOTEST	89729	6120D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
31	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2	GRANOTEST	89718	6121D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
32	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1 1/2	GRANOTEST	88463	6122D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
33	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1	GRANOTEST	89548	6124D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
34	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/4	GRANOTEST	89493	6125D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
35	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1/2	GRANOTEST	89615	6126D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
36	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/8	GRANOTEST	89738	6127D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
37	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	95956	6158D	MARCO 8 IN	7-may-25	Vigente
38	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	NT220515	4327M	MARCO 8 IN	10-may-25	Vigente
39	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 30	NO PORTA	61406	6170D	MARCO 8 IN	16-may-25	Vigente
40	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 10	GRANOTEST	95850	6248D	MARCO 8 IN	16-jun-25	Vigente
41	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO	PINZUAR	102	TE-0325-25	PT-1901	17-jun-25	[redacted]
42	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO ELÉCTRICO DIGITAL	PINZUAR	116	FET 12	PG-2003	5-ago-25	Vigente
43	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	OHAUS	B517861530	4417M	SP602	16-oct-25	Vigente
44	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 50	NO PORTA	NO PORTA	6583D	MARCO 8 IN	3-dic-25	Vigente
45	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 8	GRANOTEST	1000	6596D	MARCO 8 IN	15-dic-25	Vigente
46	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 5	GRANOTEST	94263	6677D	MARCO 8 IN	21-ene-26	Vigente
47	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	94665	6678D	MARCO 8 IN	15-ene-26	Vigente
48	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 40	NO PORTA	62833	6680D	MARCO 8 IN	24-ene-26	Vigente
49	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 200	NO PORTA	NO PORTA	6685D	MARCO 8 IN	26-ene-26	Vigente
1	Localización y Replanteo	ESTACION TOTAL	TOPCON	1Y007794	CVC20250929-1242	GM-55	29-sep-25	Vigente
2	Localización y Replanteo	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	X24065	CVC20250929-1243	At_B4	29-sep-25	Vigente
3	Localización y Replanteo	ESTACION SOKKIA SET650X NS 111935	SOKKIA	111935	CVC20251125-1288	SET650X	25-nov-25	Vigente
4	Localización y Replanteo	NIVEL AUTO TOPCON AT-B4A NS 180727	TOPCON	180727	CVC20251125-1289	At_B4A	25-nov-25	Vigente

No	Uso	Equipos	Marca	No de Serie	Certificado	Modelo	Fecha Última Calibración	Vencimiento
5	Medidor Gases	DETECTOR DE GAS	BOSEAN	22113485	PSDGA-028171-RO	K600	2-feb-26	Vigente
6	Bascula RESPEL	CAMIONERA BÁSCULA PROMETALICOS SA	Prometalicos S.A	170217/2536	28759	80460 BP	9-ago-25	Vigente
7	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	TINIUS OLSEN	74619	CFA-25-31311-2	K587D26244	27-ago-25	Vigente
8	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	53341 C1168 V 1.1	CFA-25-31310-S	SUPERL	26-ago-25	Vigente
9	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	552	CFA-25-30680-S	SARTURN Plus	10-feb-26	Vigente
10	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	C2414	CFA-25-30684-S	MIL-M-MUE-100Kn	10-feb-26	Vigente
11	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3138F	CT-1500	12-feb-26	Vigente
12	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3139F-S	CT-1500	12-feb-26	Vigente
13	Ensayos de Soldadura	EQUIPO DE ULTRASONIDO SONOWALL	SONOTEC	10362	RVM4360126	SONOWALL	19-ene-26	Vigente
14	Control Dimensional	PIE DE REY/CALIBRADOR PIE DE REY	MITUTOYO	BD055821	D18826-29551-R_E	530-104BR	18-mar-24	Vigente
15	Ajuste de equipos de ultrasonido	BLOQUE METÁLICO IIW TYPE 2	HIGH TECH	120910	D18288-46019-INF	1018 STELL	10-feb-26	Vigente
16	Control Dimensional	REGLA GRADUADA	SHINWA	No Registra	L-35969-001 RO	201F	10-dic-25	Vigente
17	Medición de Temperatura y Humedad	TERMOHIGRÓMETRO	AMPROBE	9007100	T-35969-003 RO	THWD-1	5-dic-25	Vigente
18	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-002	D22323-36048-R_E	CAM TYPE GAUGE	27-ene-25	Vigente
19	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-003	D22324-36049-R_E	WEB FILLET GAUGE	27-ene-25	Vigente
20	Medidor de Espesores	GALGA DE ESPESORES	ELCOMETER	NO PRESENTA	NA-35514-001 RO	NO PRESENTA	27-oct-25	Vigente
21	Pruebas de Presión - Redes Hidraúlicas	MANOMETRO BOURDON TIPO C	SUMMA	24100470	530864	NO PRESENTA	8-abr-25	Vigente
22	Ensayo de Densidades	DENSIMETRO NUCLEAR	HUMBOLT	5146	D021-25	HUMBOLT	30-may-25	Vigente
23	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	PINZUAR	64469	5903D	MARCO 12 IN	1-mar-25	Vigente
24	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA A COMPRESIÓN MARSHALL	ELEVAC	C-1180	CF-4430	MCIL-MULTI-70KN-P	27-mar-25	Vigente
25	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	ELEVAC	C-1180	2897F	MCIL-MULTI-70KN-P	28-mar-25	Vigente
26	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS221601	4317M	FENIX	8-abr-25	Vigente
27	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 100	GRANOTEST	93991	6019D	MARCO 8 IN	8-abr-25	Vigente
28	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 16	GRANOTEST	93202	6060D	MARCO 8 IN	7-abr-25	Vigente
29	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3	GRANOTEST	89869	6119D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
30	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2 1/2	GRANOTEST	89729	6120D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
31	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2	GRANOTEST	89718	6121D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
32	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1 1/2	GRANOTEST	88463	6122D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
33	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1	GRANOTEST	89548	6124D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
34	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/4	GRANOTEST	89493	6125D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
35	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1/2	GRANOTEST	89615	6126D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
36	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/8	GRANOTEST	89738	6127D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
37	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	95956	6158D	MARCO 8 IN	7-may-25	Vigente

No	Uso	Equipos	Marca	No de Serie	Certificado	Modelo	Fecha Última Calibración	Vencimiento
38	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	NT220515	4327M	MARCO 8 IN	10-may-25	Vigente
39	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 30	NO PORTA	61406	6170D	MARCO 8 IN	16-may-25	Vigente
40	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 10	GRANOTEST	95850	6248D	MARCO 8 IN	16-jun-25	Vigente
41	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO	PINZUAR	102	TE-0325-25	PT-1901	17-jun-25	Vigente
42	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO ELÉCTRICO DIGITAL	PINZUAR	116	FET 12	PG 2003	5-ago-25	[redacted]
43	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	OHAUS	B517861530	4417M	SP602	16-oct-25	Vigente
44	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 50	NO PORTA	NO PORTA	6583D	MARCO 8 IN	3-dic-25	Vigente
45	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 8	GRANOTEST	1000	6596D	MARCO 8 IN	15-dic-25	Vigente
46	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 5	GRANOTEST	94263	6677D	MARCO 8 IN	21-ene-26	Vigente
47	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	94665	6678D	MARCO 8 IN	15-ene-26	Vigente
48	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 40	NO PORTA	62833	6680D	MARCO 8 IN	24-ene-26	Vigente
49	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 200	NO PORTA	NO PORTA	6685D	MARCO 8 IN	26-ene-26	Vigente
1	Localización y Replanteo	ESTACION TOTAL	TOPCON	1Y007794	CVC20250929-1242	GM-55	29-sep-25	Vigente
2	Localización y Replanteo	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	X24065	CVC20250929-1243	At_B4	29-sep-25	Vigente
3	Localización y Replanteo	ESTACION SOKKIA SET650X NS 111935	SOKKIA	111935	CVC20251125-1288	SET650X	25-nov-25	Vigente
4	Localización y Replanteo	NIVEL AUTO TOPCON AT-B4A NS 180727	TOPCON	180727	CVC20251125-1289	At_B4A	25-nov-25	Vigente
5	Medidor Gases	DETECTOR DE GAS	BOSEAN	22113485	PSDGA-028171-RO	K600	2-feb-26	Vigente
6	Bascula RESPEL	CAMIONERA BÁSCULA PROMETALICOS SA	Prometalicos S.A	170217/2536	28759	80460 BP	9-ago-25	Vigente
7	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	TINIUS OLSEN	74619	CFA-25-31311-2	K587D26244	27-ago-25	Vigente
8	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	53341 C1168 V 1.1	CFA-25-31310-S	SUPERL	26-ago-25	Vigente
9	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	552	CFA-25-30680-S	SARTURN Plus	10-feb-26	[redacted]
10	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	C2414	CFA-25-30684-S	MIL-M-MUE-100Kn	10-feb-26	Vigente
11	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3138F	CT-1500	12-feb-26	Vigente
12	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3139F-S	CT-1500	12-feb-26	Vigente
13	Ensayos de Soldadura	EQUIPO DE ULTRASONIDO SONOWALL	SONOTEC	10362	RVM4360126	SONOWALL	19-ene-26	Vigente
14	Control Dimensional	PIE DE REY/CALIBRADOR PIE DE REY	MITUTOYO	BD055821	D18826-29551-R_E	530-104BR	18-mar-24	Vigente
15	Ajuste de equipos de ultrasonido	BLOQUE METÁLICO IIW TYPE 2	HIGH TECH	120910	D18288-46019-INF	1018 STELL	10-feb-26	Vigente
16	Control Dimensional	REGLA GRADUADA	SHINWA	No Registra	L-35969-001 RO	201F	10-dic-25	Vigente
17	Medición de Temperatura y Humedad	TERMOHIGRÓMETRO	AMPROBE	9007100	T-35969-003 RO	THWD-1	5-dic-25	Vigente
18	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-002	D22323-36048-R_E	CAM TYPE GAUGE	27-ene-25	Vigente
19	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-003	D22324-36049-R_E	WEB FILLET GAUGE	27-ene-25	Vigente
20	Medidor de Espesores	GALGA DE ESPESORES	ELCOMETER	NO PRESENTA	NA-35514-001 RO	NO PRESENTA	27-oct-25	Vigente
21	Pruebas de Presión - Redes Hidraúlicas	MANOMETRO BOURDON TIPO C	SUMMA	24100470	530864	NO PRESENTA	8-abr-25	Vigente

No	Uso	Equipos	Marca	No de Serie	Certificado	Modelo	Fecha Última Calibración	Vencimiento
22	Ensayo de Densidades	DENSIMETRO NUCLEAR	HUMBOLT	5146	D021-25	HUMBOLT	30-may-25	Vigente
23	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	PINZUAR	64469	5903D	MARCO 12 IN	1-mar-25	Vigente
24	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA A COMPRESIÓN MARSHALL	ELEVAC	C-1180	CF-4430	MCIL-MULTI-70KN-P	27-mar-25	Vigente
25	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	ELEVAC	C-1180	2897F	MCIL-MULTI-70KN-P	28-mar-25	Vigente
26	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS221601	4317M	FENIX	8-abr-25	Vigente
27	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 100	GRANOTEST	93991	6019D	MARCO 8 IN	8-abr-25	Vigente
28	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 16	GRANOTEST	93202	6060D	MARCO 8 IN	7-abr-25	Vigente
29	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3	GRANOTEST	89869	6119D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
30	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2 1/2	GRANOTEST	89729	6120D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
31	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2	GRANOTEST	89718	6121D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
32	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1 1/2	GRANOTEST	88463	6122D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
33	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1	GRANOTEST	89548	6124D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
34	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/4	GRANOTEST	89493	6125D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
35	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1/2	GRANOTEST	89615	6126D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
36	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/8	GRANOTEST	89738	6127D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
37	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	95956	6158D	MARCO 8 IN	7-may-25	Vigente
38	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	NT220515	4327M	MARCO 8 IN	10-may-25	Vigente
39	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 30	NO PORTA	61406	6170D	MARCO 8 IN	16-may-25	Vigente
40	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 10	GRANOTEST	95850	6248D	MARCO 8 IN	16-jun-25	Vigente
41	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO	PINZUAR	102	TE-0325-25	PT-1901	17-jun-25	Vigente
42	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO ELÉCTRICO DIGITAL	PINZUAR	116	FET 12	PG-2003	5-ago-25	Vigente
43	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	OHAUS	B517861530	4417M	SP602	16-oct-25	Vigente
44	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 50	NO PORTA	NO PORTA	6583D	MARCO 8 IN	3-dic-25	Vigente
45	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 8	GRANOTEST	1000	6596D	MARCO 8 IN	15-dic-25	Vigente
46	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 5	GRANOTEST	94263	6677D	MARCO 8 IN	21-ene-26	Vigente
47	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	94665	6678D	MARCO 8 IN	15-ene-26	Vigente
48	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 40	NO PORTA	62833	6680D	MARCO 8 IN	24-ene-26	Vigente
49	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 200	NO PORTA	NO PORTA	6685D	MARCO 8 IN	26-ene-26	Vigente
1	Localización y Replanteo	ESTACION TOTAL	TOPCON	1Y007794	CVC20250929-1242	GM-55	29-sep-25	Vigente
2	Localización y Replanteo	NIVEL AUTOMATICO	TOPCON	X24065	CVC20250929-1243	At_B4	29-sep-25	Vigente
3	Localización y Replanteo	ESTACION SOKKIA SET650X NS 111935	SOKKIA	111935	CVC20251125-1288	SET650X	25-nov-25	Vigente
4	Localización y Replanteo	NIVEL AUTO TOPCON AT-B4A NS 180727	TOPCON	180727	CVC20251125-1289	At_B4A	25-nov-25	Vigente
5	Medidor Gases	DETECTOR DE GAS	BOSEAN	22113485	PSDGA-028171-RO	K600	2-feb-26	Vigente

No	Uso	Equipos	Marca	No de Serie	Certificado	Modelo	Fecha Última Calibración	Vencimiento
6	Bascula RESPEL	CAMIONERA BÁSCULA PROMETALICOS SA	Prometalicos S.A	170217/2536	28759	80460 BP	9-ago-25	Vigente
7	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	TINIUS OLSEN	74619	CFA-25-31311-2	K587D26244	27-ago-25	Vigente
8	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	53341 C1168 V 1.1	CFA-25-31310-S	SUPERL	26-ago-25	Vigente
9	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	552	CFA-25-30680-S	SARTURN Plus	10-feb-26	Vigente
10	Ensayos de Tensión (Aceros)	MAQUINA DE ENSAYOS DE TENSIÓN	ELEVAC	C2414	CFA-25-30684-S	MIL-M-MUE-100Kn	10-feb-26	[redacted]
11	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3138F	CT-1500	12-feb-26	Vigente
12	Ensayos a Compresión (Concretos)	MAQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN (LABORATORIO CONCRELAB)	DIRIMPEX	42424265	3139F-S	CT-1500	12-feb-26	Vigente
13	Ensayos de Soldadura	EQUIPO DE ULTRASONIDO SONOWALL	SONOTEC	10362	RVM4360126	SONOWALL	19-ene-26	Vigente
14	Control Dimensional	PIE DE REY/CALIBRADOR PIE DE REY	MITUTOYO	BD055821	D18826-29551-R_E	530-104BR	18-mar-24	Vigente
15	Ajuste de equipos de ultrasonido	BLOQUE METÁLICO IIW TYPE 2	HIGH TECH	120910	D18288-46019-INF	1018 STELL	10-feb-26	Vigente
16	Control Dimensional	REGLA GRADUADA	SHINWA	No Registra	L-35969-001 RO	201F	10-dic-25	Vigente
17	Medición de Temperatura y Humedad	TERMOHIGRÓMETRO	AMPROBE	9007100	T-35969-003 RO	THWD-1	5-dic-25	Vigente
18	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-002	D22323-36048-R_E	CAM TYPE GAUGE	27-ene-25	Vigente
19	Medidor de Espesores	GALGA METÁLICA DE SOLDADURA	STAINLESS	EMC-003	D22324-36049-R_E	WEB FILLET GAUGE	27-ene-25	Vigente
20	Medidor de Espesores	GALGA DE ESPESORES	ELCOMETER	NO PRESENTA	NA-35514-001 RO	NO PRESENTA	27-oct-25	Vigente
21	Pruebas de Presión - Redes Hidraúlicas	MANOMETRO BOURDON TIPO C	SUMMA	24100470	530864	NO PRESENTA	8-abr-25	Vigente
22	Ensayo de Densidades	DENSIMETRO NUCLEAR	HUMBOLT	5146	D021-25	HUMBOLT	30-may-25	Vigente
23	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	PINZUAR	64469	5903D	MARCO 12 IN	1-mar-25	Vigente
24	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA A COMPRESIÓN MARSHALL	ELEVAC	C-1180	CF-4430	MCIL-MULTI-70KN-P	27-mar-25	Vigente
25	Caracterización Material Llenos Estructurales	MÁQUINA DE ENSAYO A COMPRESIÓN	ELEVAC	C-1180	2897F	MCIL-MULTI-70KN-P	28-mar-25	Vigente
26	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS221601	4317M	FENIX	8-abr-25	[redacted]
27	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 100	GRANOTEST	93991	6019D	MARCO 8 IN	8-abr-25	Vigente
28	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 16	GRANOTEST	93202	6060D	MARCO 8 IN	7-abr-25	Vigente
29	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3	GRANOTEST	89869	6119D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
30	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2 1/2	GRANOTEST	89729	6120D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
31	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 2	GRANOTEST	89718	6121D	MARCO 8 IN	2-may-25	Vigente
32	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1 1/2	GRANOTEST	88463	6122D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
33	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1	GRANOTEST	89548	6124D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
34	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/4	GRANOTEST	89493	6125D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
35	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 1/2	GRANOTEST	89615	6126D	MARCO 8 IN	3-may-25	Vigente
36	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 3/8	GRANOTEST	89738	6127D	MARCO 8 IN	28-abr-25	Vigente
37	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	95956	6158D	MARCO 8 IN	7-may-25	Vigente
38	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	NT220515	4327M	MARCO 8 IN	10-may-25	Vigente

No	Uso	Equipos	Marca	No de Serie	Certificado	Modelo	Fecha Última Calibración	Vencimiento
39	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 30	NO PORTA	61406	6170D	MARCO 8 IN	16-may-25	Vigente
40	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 10	GRANOTEST	95850	6248D	MARCO 8 IN	16-jun-25	Vigente
41	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO	PINZUAR	102	TE-0325-25	PT-1901	17-jun-25	Vigente
42	Caracterización Material Llenos Estructurales	HORNO ELÉCTRICO DIGITAL	PINZUAR	116	FET 12	PG-2003	5-ago-25	Vigente
43	Caracterización Material Llenos Estructurales	BALANZA DIGITAL	OHAUS	B517861530	4417M	SP602	16-oct-25	Vigente
44	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 50	NO PORTA	NO PORTA	6583D	MARCO 8 IN	3-dic-25	Vigente
45	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 8	GRANOTEST	1000	6596D	MARCO 8 IN	15-dic-25	Vigente
46	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 5	GRANOTEST	94263	6677D	MARCO 8 IN	21-ene-26	Vigente
47	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 4	GRANOTEST	94665	6678D	MARCO 8 IN	15-ene-26	Vigente
48	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 40	NO PORTA	62833	6680D	MARCO 8 IN	24-ene-26	Vigente
49	Caracterización Material Llenos Estructurales	TAMIZ MALLA No 200	NO PORTA	NO PORTA	6685D	MARCO 8 IN	26-ene-26	Vigente

Durante el periodo del mes del 26 de enero al 25 de febrero de 2026 se verificaron los equipos utilizados para actividades de localización replanteo, medición de gases, básculas de residuos peligrosos, equipos de tensión de aceros allegados a obra, equipos para ensayos a compresión de muestras de concreto, equipos utilizados para las mediciones y ensayos de los elementos y/o secciones de las cerchas principales de la estructura metálica de cubierta, equipos para pruebas de presión de redes hidrosanitarias, equipos para ensayos de caracterización de materiales de llenos. Los cuales fueron verificados identificando vigencia en sus certificados de calibración.

Ver Anexo 5 Equipos de Seguimiento y Medición.

14 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

✓ ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA

Durante el periodo del mes del 26 de enero al 25 de febrero de 2026 se ingresaron 61,62 toneladas de acero de refuerzo para Muros de Contrapista, Puntales y Vigas de Túnel de

Ambulancia, Viga Aerea del Módulo 1, Dados Túnel de Ambulancia, Viga de Cubierta, Viga Aerea Graderías, Columnas y Dados y vigas de cimentación del Módulo 10.

Ver Anexo 11. Control y Seguimiento de Materiales

- ✓ **CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO**

Durante el periodo correspondiente entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026 se suministró al proyecto 542,51 m3 de concreto premezclado, los cuales fueron destinado a elementos estructurales y solados de limpieza.

Para el vaciado de los concretos se hizo uso de la central de mezclas Cemex, el cual provisionó al proyecto un total de 57 m3. Así mismo se ejecutó operaciones con la planta de concreto Altara con la cual se vaciaron 485,51 m3 para los diferentes concretos estructurales intervenidos durante el periodo.

Ver Anexo 11. Control y Seguimiento de Materiales

- ✓ **REDES ELÉCTRICAS**

Durante el periodo del presente informe correspondiente del 26 de enero al 25 de febrero de 2026, no se realizaron actividades eléctricas representativas dentro del proyecto. Se está a la espera de la finalización del armado y vaciado de los diferentes módulos de la zona del edificio para continuar con instalación de tubería de baja tensión de la subestación al túnel principal y del módulo 8 a módulo 10 entre otros.

- ✓ **REDES HIDRAÚLICAS**

Durante el periodo del presente informe se desarrollaron actividades de instalación de Geodren y Tecdren Vial para la conformación de los filtros perimetrales de los túneles. Así

mismo se realizó la instalación de tubería Novafort para desagües de aguas lluvias de los módulos de la pasarela.

- ✓ **ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA**

A corte del 25 de febrero de 2026, se han ingresado a planta de Emecón 912,42 toneladas de las cuales se ha ingresado a producción para procesos de corte, armado, soldadura y pintura un total de 368,40 toneladas, de las cuales, a fecha de corte del 25 de febrero de 2026 se han ingresado 298,57 toneladas a la obra.

Tabla 8 Dossier de Calidad Estructura Metálica

No	FECHA	ENTREGA
1	09 MAYO 2025	PRIMERA ENTREGA DOSSIER DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.
2	31 JULIO 2025	SEGUNDA ENTREGA DOSSIER DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.
3	23 SEPT 2025	TERCERA ENTRGA DOSSIER DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.
4	31 OCT 2025	CUARTA ENTREGA DOSSIER DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA
5	05 ENE 2026	QUINTA ENTREGA DOSSIER DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA
6	19 FEB 2026	SEXTA ENTREGA DOSSIER DE CALIDAD ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA.

El 19 de febrero de 2026 se radicó la sexta entrega del Dossier de Calidad de Estructura Metálica de Cubierta mediante comunicado CE-206-125-2257, en la cual se puede evidenciar ensayos a las soldaduras, controles dimensionales y ensayos a pintura de las diferentes secciones de estructura metálica allegadas al proyecto.

Ver Anexo 10. Seguimiento al PIE/2. Estructura Metálica.

- ✓ **LLENOS ESTRUCTURALES TRADOS TÚNELES ADMINISTRATIVO Y DEPORTIVO.**

Durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026, se realizaron llenos estructurales para la conformación de los trasdos de los túneles mediante, la instalación y compactación del material Subase Granular Tipo PEA, conforme a oficio de aprobación CIG-IDRD-VEL-0039-2026 del 22 de enero de 2026. A fecha de corte del presente informe se ha ingresado al proyecto un total de 705 m3, bajo los cuales se ha realizado dos caracterizaciones evidenciando resultados conformes. Así mismo se está a le espera de resultados de una tercera caracterización de la cual se tendría resultados para inicios del mes de marzo de 2026.

Mediante el suministro de Subbase Granular Tipo PEA, se realizó la conformación de llenos bajo capas de espesores de 0,20 mtros, realizando ensayos de compactación bajo un Proctor de 1911 kg/m3, el cual fue aprobado mediante oficio CIG-IDRD-VEL-0142-2026 del 24 de febrero de 2026. A la fecha de corte del presente informe se han realizado ensayos de densidades a 5 capas del túnel administrativo y 5 capas del túnel deportivo, evidenciándose ensayos satisfactorios.

Ver Anexo 10. Seguimiento al PIE/4. Llenos Estructurales

15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el Periodo correspondiente al presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ **NP-010 Construcción de viga de fundación y dados de fundación en concreto durabilidad a/c 0,4 resistencia minima 350kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.**

- ✓ **NP-006 Construcción de dados en concreto durabilidad a/c 0,4 resistencia minima 350kg/cm2. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.**

- ✓ **NP-007 Construcción de vigas de fundación, en concreto durabilidad a/c 0,4 resistencia mínima 350 kg/cm2. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye acarreo interno. No incluye refuerzo. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem**

- ✓ **NP-008 Construcción de muro en concreto de durabilidad a/c 0,40 resistencia mínima 350 kg/cm2 - producto bombeable, con un espesor de 0,30 m. Para altura hasta 4.60 m, incluye formaleta súper t, vibrado, transporte externo e interno y colocación de la formaleta en su sitio de acuerdo a los hilos, medidas y trazos indicados en los planos, lo mismo que el suministro, transporte externo e interno y colocación dentro del molde por medios manuales o mecánicos, del concreto necesario, en las características, secciones y especificaciones indicadas en los planos estructurales de la obra. El contratista debe suministrar también todos los elementos necesarios para asegurar la formaleta en su sitio, tales como tacos, parales, pasadores,**

tensores, etc., que se requiera. Deberá también dar el curado necesario y retirar las formaletas cuando el concreto haya alcanzado su curado inicial. La interventoría indicará donde y cuando deben hacerse reparaciones u ordenará la demolición y reposición, por cuenta del contratista, del elemento cuando este lo considere necesario. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.

- ✓ **NP-011 construcción de losa de fundación en concreto durabilidad a/c 0,4 resistencia minima 350 kg/cm2 -. con un espesor de 0.12m. incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. no incluye refuerzo.el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem**

- ✓ **E 4.2.3.1 Construcción de columnas circulares en concreto de 35 mpa. diámetro de 60 cm. incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, fluidificante para mezclas de concreto, formaleta metálica para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.**

- ✓ **E 4.2.3.2 Construcción de columnas circulares en concreto de 35 mpa. diámetro de 80 cm. incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, fluidificante para mezclas de concreto, formaleta metálica para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.**

- ✓ **E 4.2.3.3 Construcción de columnas circulares en concreto de 35 mpa. diámetro de 100 cm. incluye suministro, transporte y la colocación del**

concreto, fluidificante para mezclas de concreto, formaleta metálica para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.

- ✓ **NP-018 Impermeabilización muros de contención con igol imprimante + igol denso o similar. (incluye suministro de materiales, aplicación del producto según especificaciones del fabricante, equipos, trasiego, mano de obra).**

- ✓ **R 2.6 Construcción de columnas circulares en concreto de 35 mpa. diámetro de 60 cm. incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, fluidificante para mezclas de concreto, formaleta metálica para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.**

- ✓ **NP-012 Junta tanque en Cinta PVC Sika O-22 o similar CDRC.**

- ✓ **NP-019 Suministro e instalación de casetón perdido para losa de contrapiso y/o fundació¿n, fabricados en polietileno expandido con material tipo icopor, densidad 8 kg/m3 recubierto exteriormente en polietileno cal 3.**

- ✓ **E 5.1.1 Suministro, transporte y puesta en obra de acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corrugado. incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion, según diseño y recomendaciones estructurales.**

- ✓ **E 3.1.2 Excavación mecánica para proceso de mejoramiento de suelos en profundidad de 0-1 m, en material especial bajo cualquier grado de humedad.**

incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno.

- ✓ **E 12.1.6 Suministro, transporte e instalación de tubería pvc de 1-1/2" por piso. incluye obra civil con botada de material, excavación y/o demolición, lleno, pega pvc mas limpiador, curvas, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación.**

- ✓ **E 3.3.1 Manejo de material especial proveniente de la excavacion consistente en material de tierras varias mezclado con basuras, actividad de retiro de material mixto de tierra mezclado con basuras, considerado como material peligroso, incluye el costo del manejo y disposicion final del material grueso y liquido existente al lugar de manejo adecuado y pertinente. incluye herramienta , equipo, mano de obra y dotacion especial de proteccion para el personal a cargo de la actividad. (peso estimado del material aproximado de 1 m³ = 1750 kg) se hace necesario realizar el recalculo de la actividad y del peso del material al momento de realizar la obra, por las caractieristicas particulares de este.**

Se verificó junto con Interventoría el grado de conformidad de las actividades ejecutadas respecto a lo establecido en los diseños y decisiones en obra avaladas por especialistas. **(Ver Anexo 6).**

16 CONTROL DE CAMBIOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe se presentó la propuesta de la planimetría de la pista mediante comunicado CE-206-125-2188 del 28 de enero de 2026, el cuál fue observado por la interventoría mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0083-2026 del 06 de febrero de 2026, encontrándose en proceso de

aprobación. Así mismo se presentaron los diseños de los ascensores del Módulo 7 y se solicitó la actualización del componente de bioclimática mediante comunicado CIG-IDRD-VEL-0126-2026 del 16 de febrero de 2026.

Se presentarán los diseños de la estructura metálica de la fachada para finales del mes de enero a fin de que por parte de la interventoría se realice una revisión y aprobación del mismo.

Los Controles de cambio pendientes por aprobación, así como los ya aprobados se pueden evidenciar en el registro SC-003-322 Matriz de Seguimiento Ajustes a Diseños.

Ver Anexo 7. Control de Cambios de Diseño.

17 SALIDAS NO CONFORMES

Durante el periodo del mes del 26 de enero al 25 de febrero de 2026, no se presentaron No Conformidades.

Ver Anexo 14. Control de Salidas no Conformes.

18 AUDITORIAS INTERNAS

Conforme a lo establecido en el apéndice de calidad del contrato, se realizará la segunda auditoría interna cuando se presente un avance cercano al 70% de ejecución.

LISTADO DE ANEXOS

1. **Anexo 1. Actas de Comité.**
2. **Anexo 2. Control de Correspondencia.**
3. **Anexo 3. Bitácora de Obra.**
4. **Anexo 4. Información Documentada.**
5. **Anexo 5. Equipos de Seguimiento y Medición.**
6. **Anexo 6. Control de Seguimiento y Actividades.**
7. **Anexo 7. Control de Cambios.**
8. **Anexo 8. Matriz de Riesgos.**
9. **Anexo 9. Seguimiento a Compromisos.**
10. **Anexo 10. Seguimiento al Plan de Inspección y Ensayos.**
11. **Anexo 11. Control y Seguimiento de Materiales**
12. **Anexo 12. Plan de Compras y Adquisiciones.**
13. **Anexo 13. Soporte de Gestión de Indicadores.**
14. **Anexo 14. Control de Salidas No Conformes.**

ANEXO 1
ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N A.	Comité Técnico/Transversal Velodromo Cto Obr. 3232-2023 y Cto. Int 3219-2023	DD	MM	AA
ACTA No. 95		29	1	2026

LUGAR: Obra Velodromo Gibraltar HORA DE INICIO: 8:05 am HORA FIN: 10:46 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se adjunta Listado de Asistencia	—	—

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de Componentes Transversales	4. Recorrido en obra CIG-IDRD-UTMP
2. Presentacion de Componentes Técnicos	5.
3. Observaciones Varias.	6.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TRANVERSAL

Se solicita permiso a los asistentes para grabar la cesion los cuales no tienen objecion y se inicia comité con autorizacion respectiva de los firmantes de la presenta Acta.

Componente Social: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Ejecución de Comité de Participación Ciudadana No 22 (Indicaciones según recomendaciones ley de garantías)

Cumplido

2) Ejecución de actas de vecindad en zonas según posible ampliación de Parqueaderos verificar (dada la definición de intervención de la zona de parqueaderos verificar si habrá alguna posible afectación para el asentamiento actual del habitante de calle y los caninos.)

Pendiente

3) Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD

Vigente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se comenta por parte de CIG que el dia de hoy se recibe Informe mensual N° 24 (Enero) el cual se tuvo revisión mediante mesa de trabajo y posterior aprobación segun cumplimiento, este validado 29/01/2026 y aprobado este mismo dia.

Componente Ambiental: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles (Oficio Obra No CE-206-125-2163 del 21/01/2026 respuesta CIG y/o traslado IDRD

Cumplido. Entregado por la UTMP y en revisión CIG (Especifica capacidad) para Ets o traslado

2) Propuesta de manejo de ZONAS VERDES (Oficio Obra No CE-206-125-2164 del 21/01/2026) respuesta CIG y/o traslado IDRD

Cumplido: Entregado por la UTMP y en revisión CIG. (Especificar capacidad) producto Plano vía traslado IDRD a SDA.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se hace explicación de las aclaraciones de medidas, recorrido etc que se dio como respuesta al derecho de Petición presentado y respondido por parte de la UTMP, la interventoría CIG manifiesta que se recibió la notificación de la respuesta y se indaga sobre la información la supervisión solicita se de radicado como informativo esta respuesta dada para seguimiento en caso tal, esta tutela fue radicada por el peticionario ante el IDRD. (*)

Componente Riesgos: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución asi:

1) Radicación oficio de notificación de actividades Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y traslado CIG a la entida contratante IDRD.

Cumplido, el IDRD hace traslado a Parques IDRD y se tendrá seguimiento respectivo.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se recomienda por parte de la Supervisión hacer el mantenimi. del Cortafuegos y registrarlo en debida forma en los informes, la UTMP manifiesta que se desarrolla y la ultima vez fue mantenimiento preventivo vía recomendación remitida por parte del IDRD soporte Red SDA referente 3er Monitoreo Red Adyacente (*) Muestreo Calidad Aire el IDRD Reitera a la SDA por que a la fecha no se ha recibido Rta.
Se remitirá por parte del IDRD el Nº Rad. del 2do Monitoreo de Red Adya Sinte

Componente SST: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución asi:

1) Se continuá en espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23

Pendiente: Se remiten Obs. Inf. Nº 20 de manera Informal (Alcance). por parte del IDRD y se remitirán formalmente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La supervisión solicita que en las presentaciones se mejore el tema visual (Tamaño letra) de acuerdo al personal del Periodo.
La interventoría CIG informa el reporte de Personal a la fecha y describe las capacitaciones al Personal de interventoría y se describe que el Plan de trabajo se extiende a todo el 2026 previendo el modificatorio de los Contratos (**)

Componente CALIDAD: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad - Proyecto Velódromo Gibraltar (Plan de inspección y ensayo)

Pendiente: Por parte de la UTMP se manifiesta que se esta en revisión esta semana se remitirá la Nº 5.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La Supervisión solicita revisar del formato del plan de calidad al respecto de la encuesta (Tema de indicadores)

2) Procedimiento Maniobra (Pendiente) Revisión CIG.

3) Pendiente: Se han presentado 2 PU de manera informal desde CIG al IDRD los cuales no han sido validados, se continua basando.

(**) La evaluación se remitirá por parte del IDRD de manera digital y se manejara el tema al interior, encuesta de satisfacción al cliente (2do Semestre 2025)

La Supervisión recuerda que hay que levantar una no conformidad teniendo en cuenta que no se tiene profesional de calidad Interventoría.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TÉCNICO

Componente BIM: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones red de GAS .

Parcial: Se presenta el desarrollo respectivo en Comité por parte de la UTMP.

2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026.

Cumplido: Entregado Versión 1 por la UTMP a la interventoría CIG

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La Supervisión manifiesta que si se verificó la entrada de la fibra optica, se explica por parte de la UTMP (en concordancia con los planos actualizado) asi mismo se presenta observaciones de transparencia y detalles en la presentaciones.

1. Revit + Navisworks: Remitir al IDRD de manera semanal
2. Planos de Pista remitir via email al IDRD.

Componente PROGRAMACIÓN: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG.

Parcial: Se remite de manera informal (Digital) a (la Supervisión y se radico por parte de la UTMP a (A los insumos

2) Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (Insumos)

Avance: Se radican por parte de la UTMP y esta en revisión CIG filtrado para el Modificatorio Nº3.

3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD.

Cumplido: Se remite al IDRD - Borrador de Modificatorio de el contratista de Obra.

4) Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(*) Pendiente Respuesta IDRD.

Pendiente: Se trabaja en la respuesta por parte del IDRD.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

*La supervisión ratifica que el alcance para el Modificatorio Nº3 según remisión No Formal y el Borrador de Modificatorio de la Interventoría. (Compromiso)
La UTMP manifiesta la Firma del Contrato de la Pista el día 25/01/2026.
Se aclara por Parte de CIG

Se presenta por parte de CIG el Balance a la fecha de las revisiones efectuados a los informes MENSUALES por parte del IDRD y los valores de actas parciales PENDIENTES de acuerdo al avance a la fecha.

Componente TÉCNICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **así:**

1) Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (radicado al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942.) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP

Avance: Se tramita internamente en el IDRD y sera entregada el 2/2/2026 para autenticación Respectiva

2) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD

Pendiente: No hay fecha.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

El día de Hoy se allega estructura metalica Aprox 20 ton.
CIG = 92%. Tiempo transcurrido del Contrato.
Se avanza en revisión de Acta Parcial Nº22 y del informe mensual Obra Nº24 y del avance de la consolidación del informe de interventoría Acumulado a la fecha Estructura Metalica 250,84 Ton

Componente ELECTRICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo. Se entregara el dia de Mañana 30/01/2026 por parte de la UTMP

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La Supervision indaga sobre un ajuste (Reubicacion) de la malla de Puesta tierra de la Subestacion, esto es explicado por parte del Profesional CIG. En el tema de los pases la supervision indaga de los refuerzos en los Pasamuros electricos la UTMP manifiesta que estan previstos (Reforzamiento).

Componente Hidraulico: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (Rad. IDRD No 20262100023932 19-01-2026)

Pendiente. Se actualizo información ante VANTI. (*)

2) Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revisión interna CIG-IDRD

Pendiente.

3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión IDRD

Pendiente: Según mesas tecnicas y Administrativas se refieren por parte del IDRD, se continua proceso.

4) ropuesta de Trazado CIG -UTMP al respecto de alternativas de CONDUCCION manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo (Punto de Conexión) . Espera de Respuesta UTMP .(Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025))

Pendiente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Derechos de Conexion se prevee a 2027. (*) Se solicita realizar una estimacion de estos Costos. La UTMP manifiesta optimizar gestiones ante la EAAB con el tema de Diseño, contruccion de Redes a donde se debe conectar el Velodromo, La supervision manifiesta que se avanza en cabeza de la Sub-Directora Segun Plan directo, formulacion y Proceso segun el Enfoque buscando con las Gerencias EAAB

COMPROMISOS		GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN

Compromisos descritos y patados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO	UTMP-CIG	Según documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

Por parte de la Supervisión se da lineamiento que el proximo comite de Obra se realizara de manera virtual 05/febrero/2026.

Siendo las 10:46 a.m. se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N-A	N-A
NOMBRE	Arq. Rubén Darío Crespo	NOMBRE	N-A	N-A
CARGO	Director de interventoría	CARGO	N-A	N-A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Torres Residente de Interventoria	

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Transversal / Tecnica Nº 95

FECHA: 29/01/2026 HORA INICIAL: 8:00am HORA FINAL: 10:46am. LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ivonn Pérez Tafur	1026279000	Apy Supervs	STC		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	—
2	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Apy. Supervs	STC		IDRD		
3	Francy Murillo	52968323	Apoy Sup.	STC		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043800525
4	EDWIN ESCOBAR	9442627	Apoy Tec	STC		IDRD	edwin.escobar@idrd.gov.co	3116058775
5	Jairo Parra Perez	1143829208	Apoyo STC	STC		IDRD	jairo.parra@idrd.gov.co	3082150330
6	Alfonso Peñaranda Suarez	80235391	Director	UTMP		UTMP	a.penaranda@cmg.com.co	
7	LINA JOHANNA FALLA	52.517.090	Ap. Sup. AMB	STC.		IDRD	linafalla@idrd.gov.co	3103432772
8	Daniela Prieto Rodriguez	1018490798	Apy. Sup Predial	STC.		IDRD	daniela.prieto@idrd.gov.co	3022922354
9	Juan Pablo Villate Diaz	1019010893	Apo. Sup. Est	STC		IDRD	juan.villate@idrd.gov.co	3142077334
10	EDGAR E. SOLORZANO PEDRAZA	19077971	Coor. Tec. Interv.	C.I.G.		C.I.G.	coordi.cerved.2@gmail.com	
11	Ruben D. Crespo. B.	19496690	Dtor Interv.	C.I.G.		C I G.	Directorainterv.	3160323111
12	Bibiana Paola Sosa Unoel	52996017	Apy. Sup. SST y C	IDRD-STC		IDRD	bibiana.sosa@idrd.gov.co	3135449225
13	Oscar Javier Soto Ortega	80161420	Apoy. Hidro.	STC		IDRD	oscar.soto@idrd	3007174408
14	Julian Acuelo	80767393	R Ambiental	Interventoria		C I G		2202326374
15	Linday Rubiano Mayorga.	1051954740	R. SGSST INT.	CIG.		C I G.	Interventoria.velodromo	3202548911
16	Diego Fernando Castro G	1110453570	Prof Calidad	UTMP		UTMP	Calidad.velodromo@cmg.com.co	3175751027
17	Astrid Viviana Rojas C	52982500	Prof GRD	CIG		CIG		
18	Luz Stella Rodriguez	31432456	Apo SST	UTMP		UTMP	sst2.velodromo@cmg.com.co	3157994507
								3214593737

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

27

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Transversal / Tecnico Nº 95

FECHA: 29/01/2026 HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: 10:46 am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Andrés Galeano Gonzalez	1022362548	Res Pato y Prog	CIG		CIG		3192385243
2	Diana Marcela Ortiz D.	1014212007	Res Social	UTMP		UTMP	Social.velodromo@	3153853472
3	Mary luz Ramirez C	52494804	Res. Social	CIG		CIG	Social.velodromo@	3132203775
4	Carmen Lucía Vélez Mercedes	65777928	Apoyo Sup. S	STC		IDRD	carmen.velez@idrd.gov.co	3204054770
5	Paola Blanco Alarcon	1073383030	Res. Ambiental	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
6	Alfredo Ferreira Borros	79946424	Res. Hidraulico	UTMP		UTMP	hidraulico.velodromo@cyg.com.co	3223912997
7	Eduard Antonio Corredor	80383913	Residente Inst. Electricas	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290201
8	Alejandro Tello Cerquera	1070604369	Prof preparacion y alistamiento	UTMP				3017413942
9	Lilibet Pierre Sanchez	1053806239	Prof. BIM	Interventoria		CIG	b.m.velo@gmail.com	
10	Diego Alejandro Leon Bello	1075652	Dg Estructural	Interventoria		CIG	—	—
11	Andres Veya	79882814	Director Tec.	UTMP		UTMP	averga@cyg.com.co	
12	Samer Arrds	79627415	Prof Electrical	INTERVENTORIA		CIG		
13	Fernando Rodriguez Torres	80219857	Residente	CIG		CIG	—	—
14	Andres Felipe Ingua Rodriguez	1065002731	Prof Hidraul	Interventoría		CIG	—	—
15	CAMILO EDUARDO GUZMAN SANCHEZ	79647388	RESIDENTE T.	UTMP		UTMP	—	—
16	Arturo Rojas Tolves	13875937	Residente	CIG		CIG	interventoria.velodromo@Gmail.com	3166450035
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa-politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.1

Marca temporal	Nombre	Cedula:	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
29/01/2026 9:17:59	Carlos Héctor Castro	79340835	carlosh.castro@idrd.gov.co	Ingeniero contratista	IDRD	3107542732
29/01/2026 8:18:45	Abdres Martinez	79780393	gerencia@andresmartinez.com.co	Representante Legal	CIG	3153897045



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente social

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Ejecución de Comité de Participación Ciudadana No 22 (Indicaciones según recomendaciones ley de garantías)	UTMP- CIG	23/01/2026	CUMPLIDO
Ejecución de actas de vecindad en zonas según posible ampliación de Parqueaderos verificar (*)	UTMP	Sin fecha	-
Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD	UTMP- CIG	09/02/2026	VIGENTE

(*) NOTA: dada la definición de intervención de la zona de parqueaderos verificar si habrá alguna posible afectación para el asentamiento actual del habitante de calle y los caninos.

Actividades ejecutadas por el componente social

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN NO. 22





27 ASISTENTES

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES

- Secretaría De Ambiente
- Secretaría Hábitat
- JAC Barrios Jardín Y Arboleda
- ASOJUNTAS
- IDRD (Recreación y deporte – subdirección técnica de construcciones)
- Emprendimiento Deportivo
- Secretaría De Convivencia, Seguridad Y Justicia Localidad De Kennedy
- Secretaría Distrital De Planeación
- Secretario De Deporte De La Asociación Comunal De Bosa
- La Federación Comunal De Bosa
- Comunidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

PRINCIPALES INQUIETUDES

1. Adicional a los túneles habrá una entrada alterna para acceder al velódromo
2. Finalidad y/o servicio que ofrecerá el proyecto a las escuelas deportivas y comunidades para acceder al escenario deportivo.
3. Tiempo faltante para la culminación del proyecto.
4. Destinación del proyecto para implementación de manzana del cuidado.

3 PERSONAS SE INSCRIBIERON AL CPC

TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS 40


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**

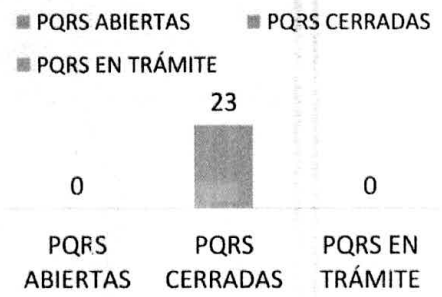

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles (Oficio Obra No CE-206-125-2163 del 21/01/2026) respuesta CIG y/o traslado IDRD	CIG	29/01/2026	PENDIENTE
Propuesta de manejo de ZONAS VERDES (Oficio Obra No CE-206-125-2164 del 21/01/2026) respuesta CIG y/o traslado IDRD	CIG	29/01/2026	PENDIENTE

COMPONENTE AMBIENTAL



Capacitación: Medidas de protección de RCD (24/01/2026)



Protección de materiales



Mantenimiento de sumideros



Mantenimiento de árboles



Control de carpado de volqueta



Retiro RESPEL

COMPONENTE AMBIENTAL

BOGOTÁ

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56.658.139**	**85,43%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65.571.879**	**86,23%**

RESPEL EXCAVACIÓN	64.970
LIXIVIADOS	24.870
TOTAL SEMANAL	**89.840**

Retiro de 14 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,80%
Circularidad: 20,02%

COMPONENTE AMBIENTAL

BOGOTÁ

PENDIENTES DOCUMENTALES

- Consulta del estado de radicación informe segundo monitoreo de la red adyacente a SDA.

- Consulta de notificación a SDA del tercer monitoreo de la red adyacente, teniendo en cuenta que la carta fue remitida desde el 1]/12/2025 y debe notificarse a la SDA 30 días antes. Inicio proyectado el 12/02/2026

- Consulta respuesta a Concepto técnico 06540 del 27/07/2025 (monitoreo de calidad del aire y olores ofensivos)

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Radicación oficio de notificación de actividades Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y traslado CIG a la entidad contratante IDRD (*)	CIG	22/01/2026	CUMPLIDO

(*) Rad. 202621000035422 IDRD No del 23/01/2026


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ

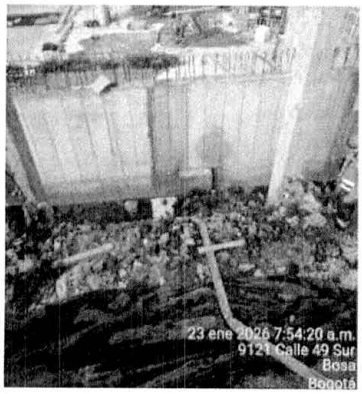

Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)

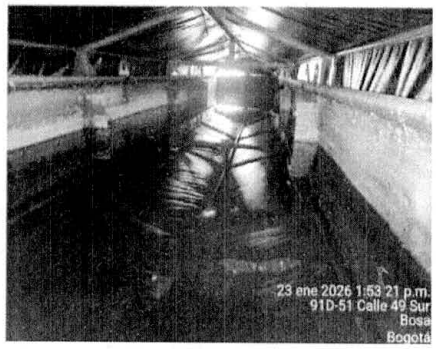

Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención



Retiro de lixiviados

Activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank, para su transporte y disposición final el 19/01/2026 (24.870 kg)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ




Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra

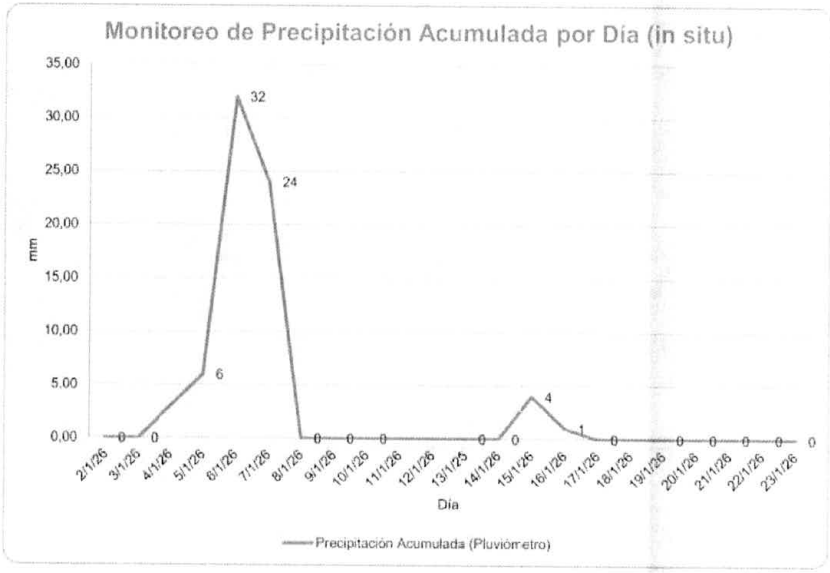

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo del Riesgo ER16
Reducción del Riesgo ER09-ER10

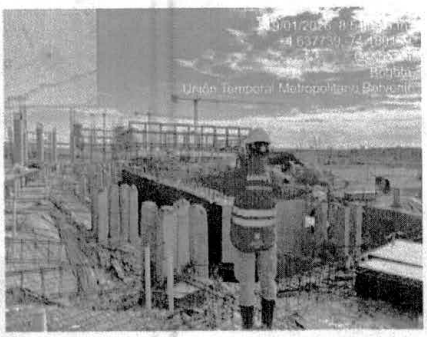

Inspección de taludes

Inspección visual de taludes con acompañamiento de geotecnia, identificando condiciones normales de estabilidad



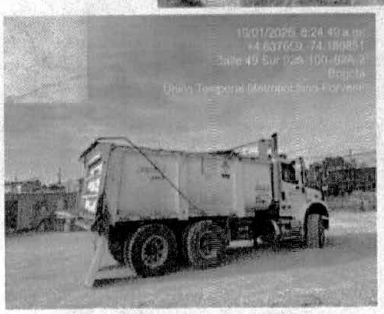

Inspección de vehículos

Inspección de vehículo Volqueta de transporte de RESPEL por Operador Logístico VEOLIA, verificando buen carpado




Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13
Comunicación y Seguimiento

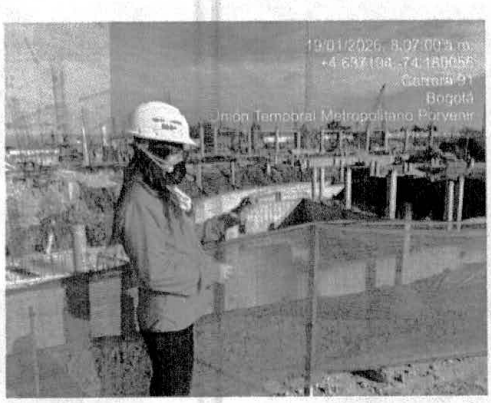


Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)



Comité de Participación Ciudadana No. 22

Socialización del avance de gestión del componente del PGRDEPP- PDCA

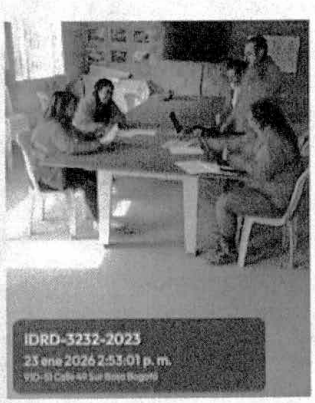



Comité de Emergencias

Seguimiento a la ejecución del PGRDEPP y PDCA año 2025 y proyección del año 2026

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER04
Reducción del Riesgo ER04-ER16

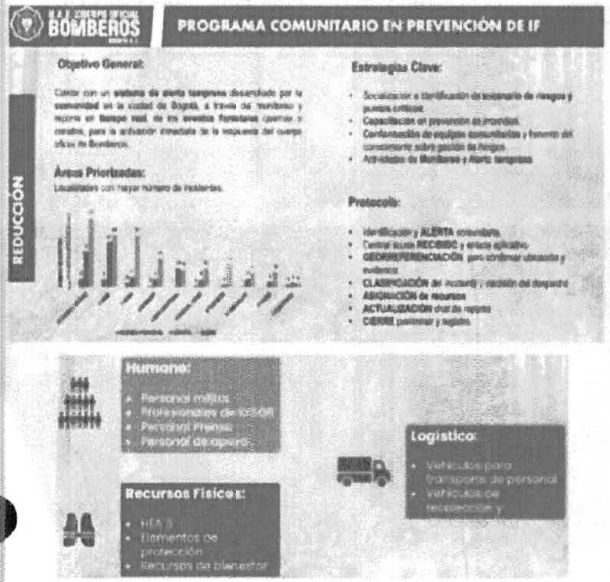

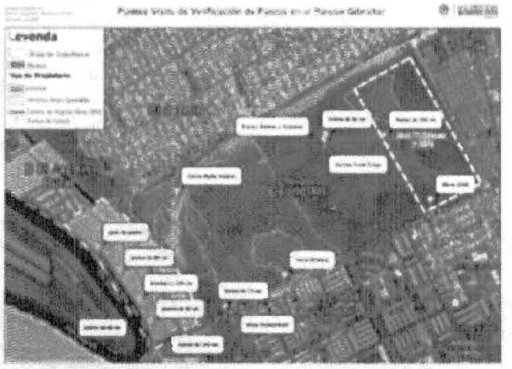

RESPONSABLE	TEMA
BRIAD	1. Coordinar la cantidad de personal que se tendrá para la ejecución de las actividades 2. Coordinar los horarios de realización de las labores 3. Coordinar el transporte de personal 4. Coordinar seguridad
IDRD	1. Solicitar un enlace que gestione permisos de acceso al predio. 2. Coordinar con la seguridad del predio para el acceso de personal que ejecuta la tarea
UAESP	1. Recolección del material vegetal. 2. Disposición Final de material vegetal
UAECOB	1. Establecer y definir zonas a intervenir 2. Recursos de bienestar 3. Efectuar el registro fotográfico y fílmico de las actividades
UMV	1. Préstamo de herramientas y equipos para la actividad

Radicado CE-206-125-2167: Comunicación del alcance del Programa Comunitario de Prevención de incendios forestales del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

COMPONENTE SST


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23	IDRD	Sin Fecha	Pendiente


PROMEDIO PERSONAL

REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	**PROMEDIO 19/01/26 - 25/01/26**
PROFESIONALES	27
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	3
SUPERVISOR/ENCARGADOS	2
OFICIALES	21
AYUDANTES	31
HERREROS	12
OPERADORES	9
BACHEROS	2
CONDUCTORES	2
PERSONAL VIGILANCIA	1
TOTAL	**116**

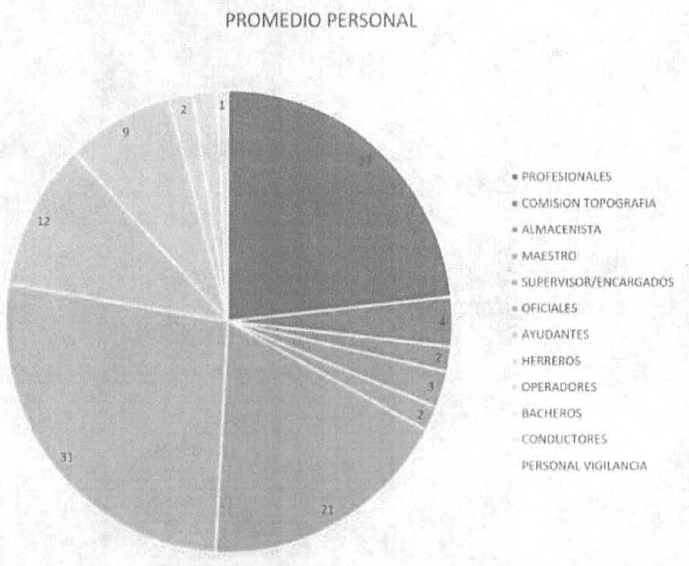

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

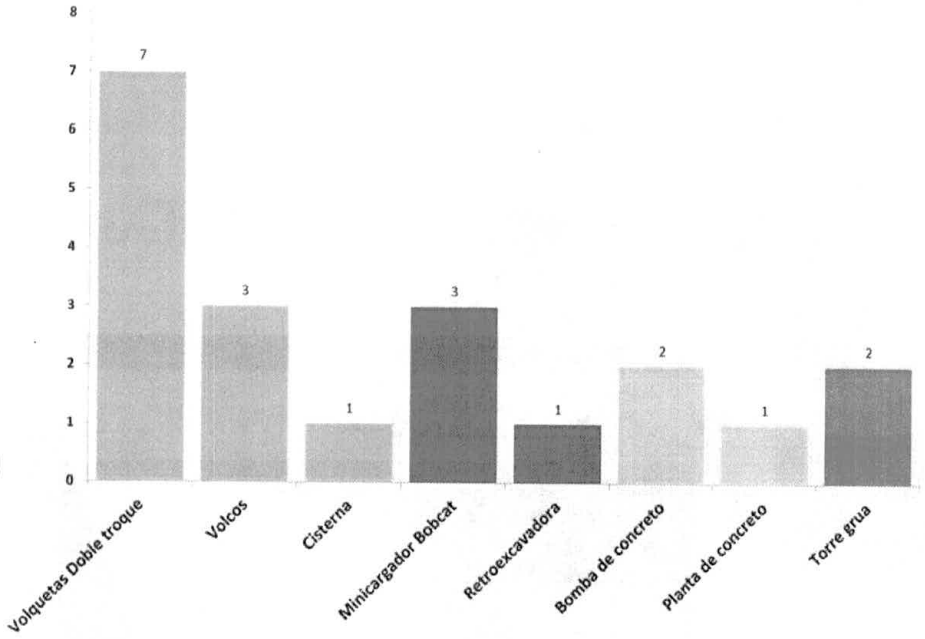

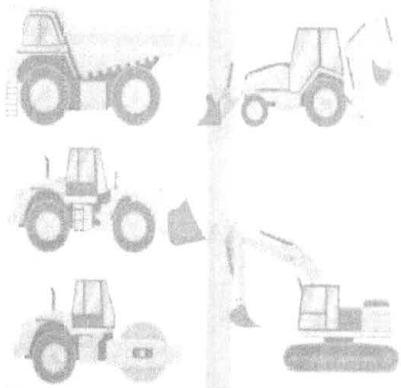

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	CERRADO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	ABIERTOS
TOTAL ACCIDENTES	**8**	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
TOTAL AUSENTISTAS	**56**

NOTA: **A la fecha se cuenta con 4 accidentes cerrados y 4 abiertos**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST


BOGOTÁ

Mantenimiento a la delimitacion excavaciones



Inspeccion actividades trabajo en alturas

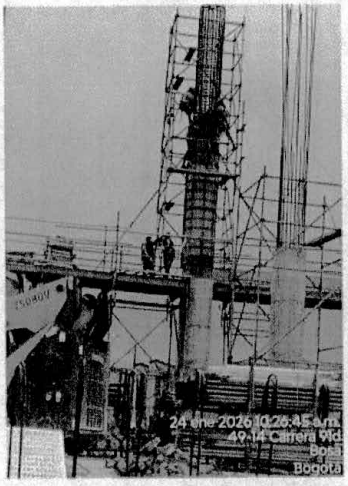

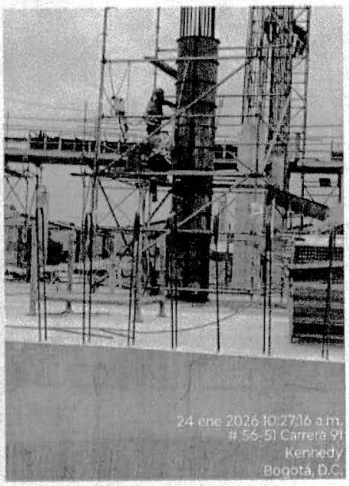

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Mantenimiento señalización interna





Aseo area de comedor




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST


BOGOTÁ

Adecuación accesos a túneles

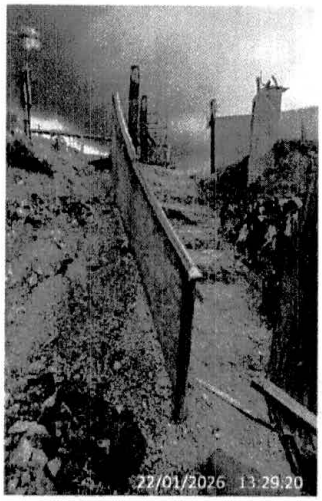



Entrega de EPP al personal operativo

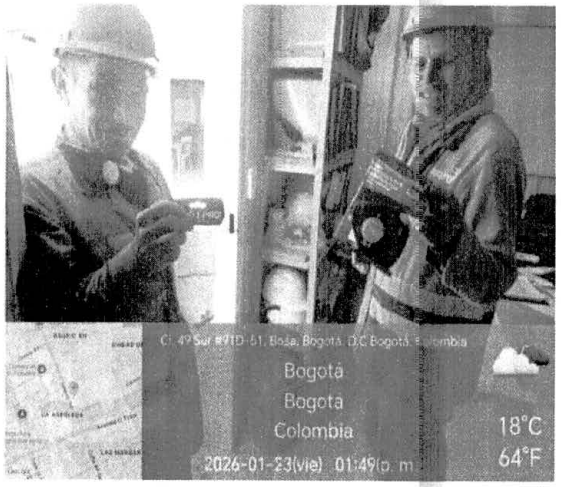


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Induccion al personal

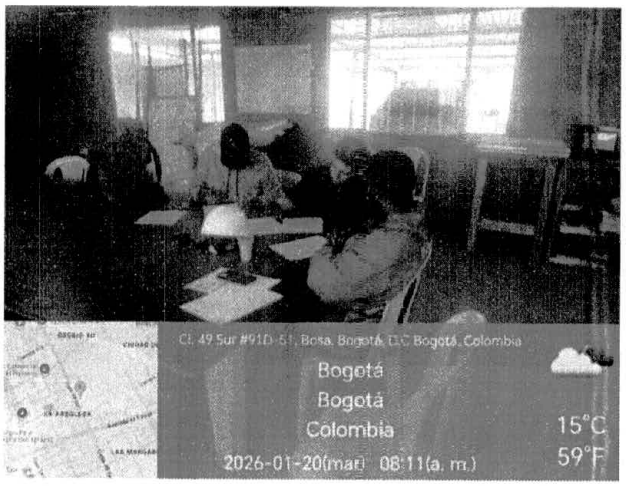

Mantenimiento rotulos de ACPM

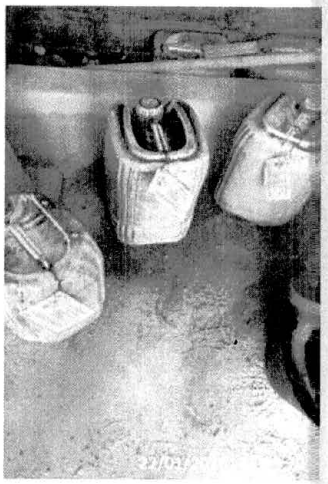

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Pasamanos sendero peatonal roto



HALLAZGO

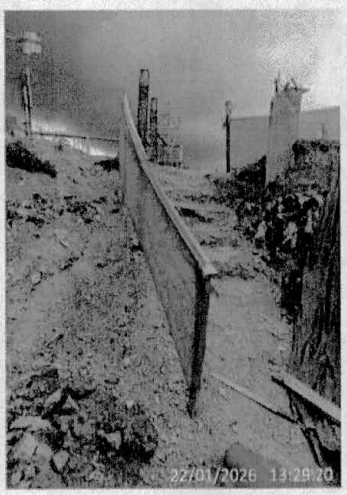


ACCION CORRECTIVA

Delimitacion de excavaciones caido



HALLAZGO

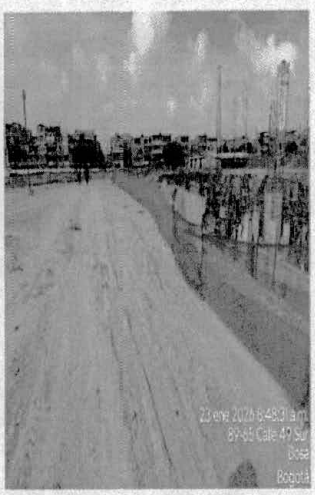


ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Acceso a frente de obra inadecuado

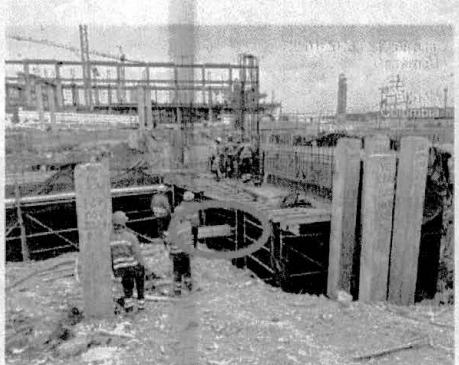


HALLAZGO



ACCION CORRECTIVA

Solicitud desmonte plataforma provisional para apoyo tuberia

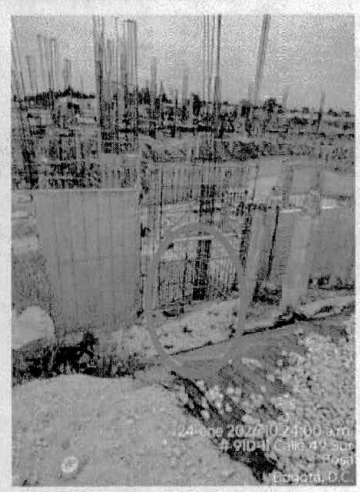

ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION Plan de Inspección y Ensayos - Proyecto Velódromo Gibraltar (*)	UTMP	13/01/2026	Pendiente
Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (**) Revisión por parte de la Interventoría	CIG	26/12/2025	Pendiente
Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD.	CIG	20/01/2025	Pendiente

(*) Rad. CIG No CIG-IDRD-VEL-21-2026 del 13/01/2026 Y Alcance

(**) Rad. IDRD No 20264200013601 del 20/01/2025 Oficio Contratista de obra No CE-206-125-2150 del 13/01/2026

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2588,64 m3

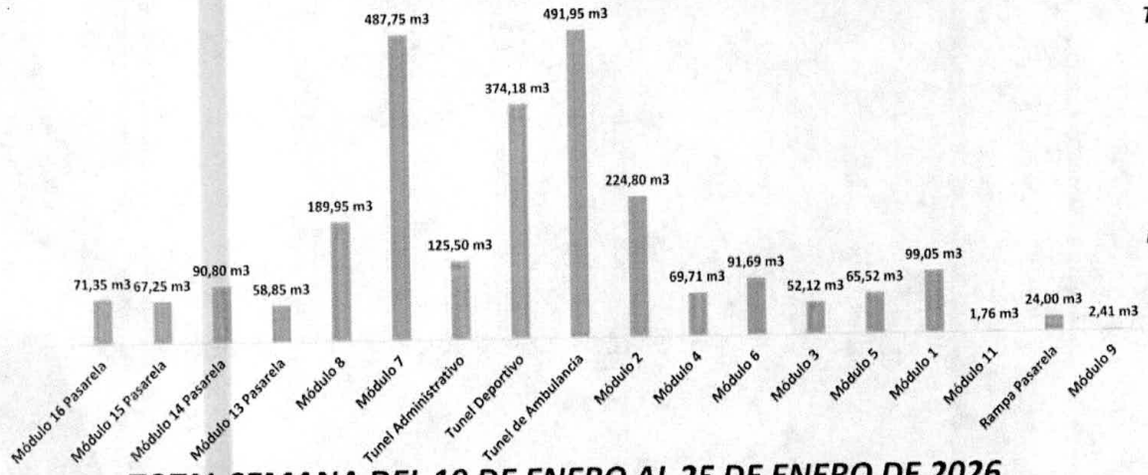

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos Última Semana
88,91 m3



Ensayo de Asentamiento Conforme NTC 396



Toma de Muestras de Concreto NTC 673




TOTAL SEMANA DEL 19 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2026.

Concreto Estructural: *88,91* m3 **Muros** (Túnel de Ambulancia 21 al 24avo Tramo) **Columnas** (Túnel de ambulancia, Módulo 1, Módulo 5, Módulo 7 y Módulo 16) y **Vigas y Dados** (Módulo 6) **Placa** (Módulo 3) y **Ménsula** (Túnel Deportivo y Túnel Administrativo)

CEMEX **0 m3** *0%* ALTARA **88,91 m3** *100%*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **527,03 Ton**

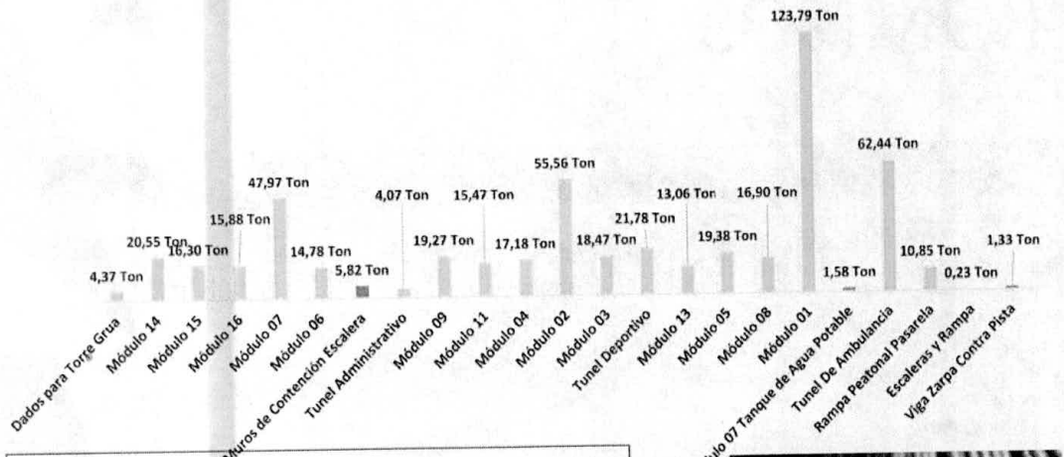

BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD





Del 19 de Enero al 25 de Enero de 2025

Se ingresaron ***55,97 ton*** *para* ***Módulo 1, Túnel de Ambulancia y Viga Zarpa contra pista***




INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
					26 Unds		Total	230,88 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA




Elementos Ingresados del 19 al 25 de Enero de 2026:

0 Unds

TOTAL : 230,88 TON.







INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UBICACIÓN DE SECCIONES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

Conjunto	Cantidad
CHP6	2 Unds
CHP2	2 Unds
CHP1	2 Unds
CHP5	2 Unds
CHP4	2 Unds
CHP8	1 Unds
CHP8	1 Unds
CHP3	1 Unds
CHP7	1 Unds
CHP3	1 Unds
CHP7	1 Unds
CHP3	1 Unds
CHP3	1 Unds
CHP3	1 Unds
CHP7	1 Unds
CHP7	1 Unds
CHP7	1 Unds
PVC2	1 Unds
CHP4	1 Unds
CHP4	1 Unds
PVC1	1 Unds
	26 Unds

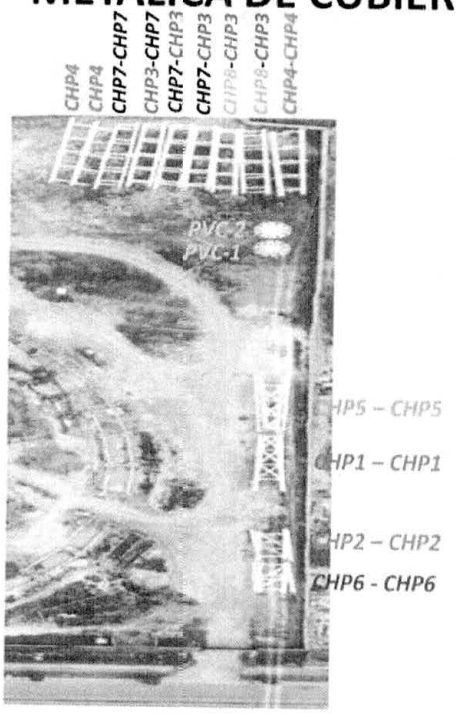

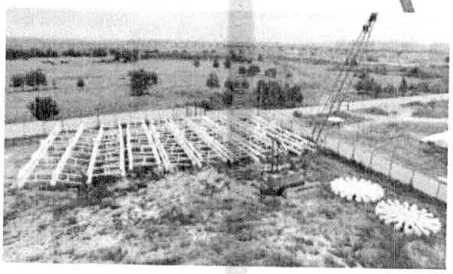

TOTAL

26 Unidades

para

230,88 Ton

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-2036 mediante CIG-IDRD-VEL-0020-2026 del 13 de enero de 2026	Contratista
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 22 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado

APROBACION DE MATERIAL DE LLENO PARA LOS TRASDÓS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN

✓ Mediante oficio **CIG-IDRD-VEL-0039-2026** del 22 de enero de 2026 se aprobó la caracterización para el material de lleno de los trasdós de los muros de contención que conforman los túneles del proyecto.

No	ENSAYO	REQUISITO	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
1	Desgaste de la máquina de los Angeles	< 50%	38%	OK
2	Degradación en el Equipo de Micro Deval	< 45%	25%	OK
3	Límites Líquido	< 30%	0%	OK
4	Indice de Plasticidad	< 6%	NP	OK
5	Equivalente de Arena	>20%	22%	OK
6	Contenido de Terrones de Arcillas y Partículas Deleznable	< 2%	0,6%	OK

Material Granular Tipo PEA — **75 m3**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026. (*)	UTMP	22/01/2025	PENDIENTE

(*) Radicado UTMP Versión 1 planos de la Pista Velódromo el 28-01-2026 para revisión CIG.

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


AVANCE GENERAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.325,093	2.772,351	0,00 % 33,30 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
25.242,36	6.603,55	0,00 % 26,16 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
20.459,34	5.858,96	0,00 % 28,64 % 100,00 %

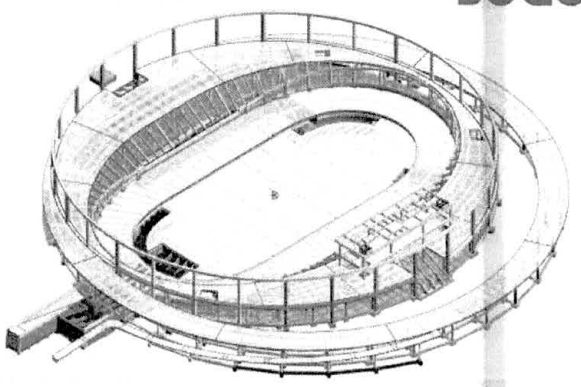

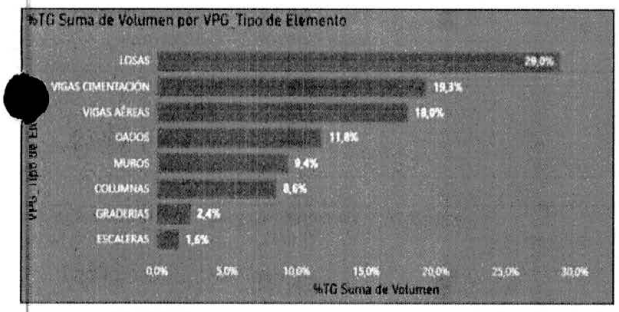

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
GRADERIAS
LOSAS
MUROS
RAMPAS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
9/01/25
3/10/25
6/10/25
9/10/25
11/10/25
16/10/25
20/10/25
24/10/25

Ubicac
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	214,247	0,00 % 28,40 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	0,00 % (En blanco) 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	317,42	0,00 % 20,46 % 100,00 %

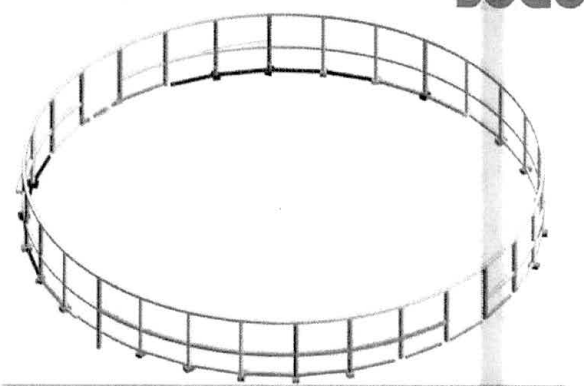

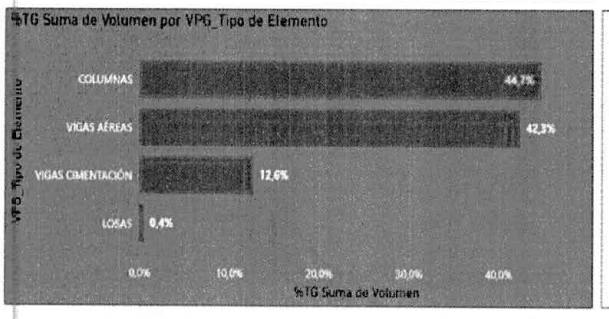


Tipo Elemento
COLUMNAS
LOSAS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
19/12/25
20/12/25
22/12/25
23/12/25
29/12/25
2/01/26
6/01/26
15/01/26

Ubicac
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 5


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
323,012	65,290	0,00 % 20,21 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
836,86	325,32	0,00 % 38,87 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
964,77	42,40	0,00 % 4,39 % 100,00 %



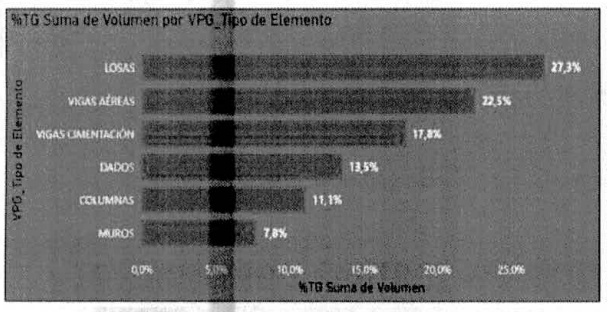


Tipo Elemento
- ☐ COLUMNAS
- ☐ DADOS
- ☐ LOSAS
- ☐ MUROS
- ☐ VIGAS AÉREAS
- ☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- ☐ (En blanco)
- ☐ 6/12/25
- ☐ 9/12/25
- ☐ 13/12/25
- ☐ 16/12/25
- ☐ 24/12/25
- ☐ 30/12/25
- ☐ 10/01/26
- ☐ 13/01/26

Ubicac
- ☐ Módulo 04
- ■ Módulo 05
- ☐ Módulo 06
- ☐ Módulo 07
- ☐ Módulo 08
- ☐ Módulo 09
- ☐ Módulo 10
- ☐ Módulo 11

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 6


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
318,075	64,676	0,00 % 20,33 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
839,01	277,38	0,00 % 33,06 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.055,70	22,30	0,00 % 2,11 % 100,00 %

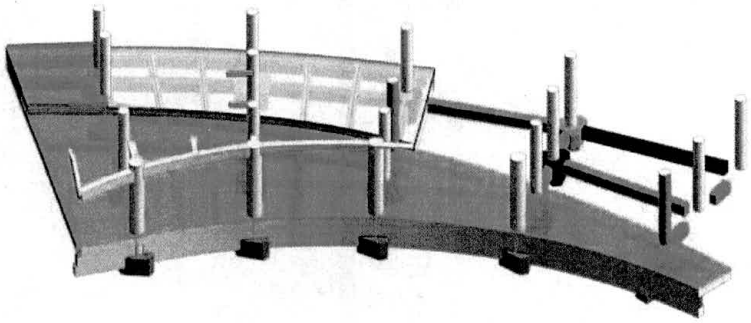

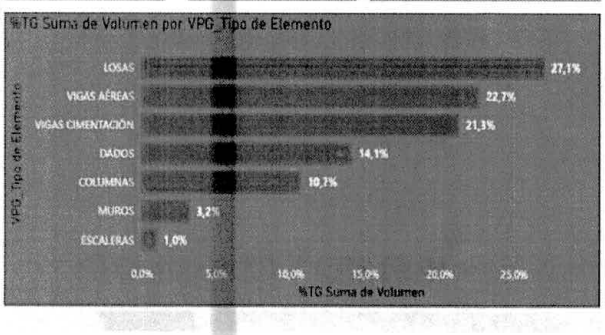


Tipo Elemento
- ☐ COLUMNAS
- ☐ DADOS
- ☐ ESCALERAS
- ☐ LOSAS
- ☐ MUROS
- ☐ VIGAS AÉREAS
- ☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- ☐ (En blanco)
- ☐ 15/11/25
- ☐ 19/11/25
- ☐ 22/11/25
- ☐ 24/11/25
- ☐ 17/12/25
- ☐ 29/12/25
- ☐ 31/12/25
- ☐ 5/01/26

Ubicac
- ☐ Módulo 04
- ☐ Módulo 05
- ■ Módulo 06
- ☐ Módulo 07
- ☐ Módulo 08
- ☐ Módulo 09
- ☐ Módulo 10
- ☐ Módulo 11

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	284,302	0,00 % 31,62 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	0,00 % 40,00 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.488,74	142,82	0,00 % 5,74 % 100,00 %

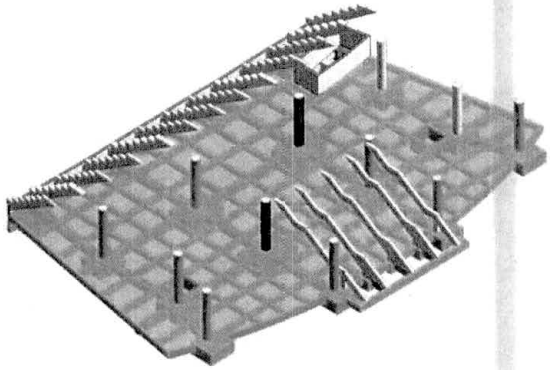

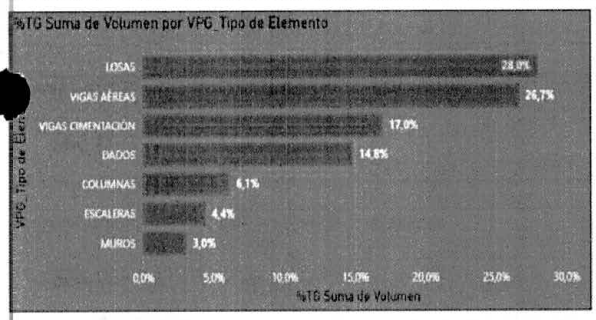

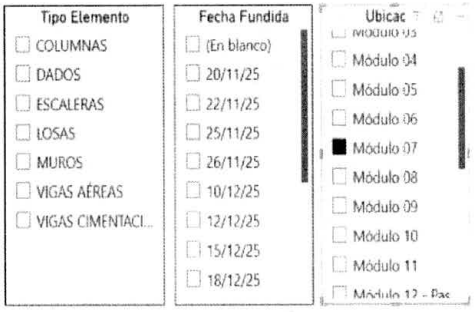

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 10


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
224,762	5,062	0,00 % 2,25 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
566,12	--	0,00 % (En blanco) 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
624,14	10,19	0,00 % 1,63 % 100,00 %

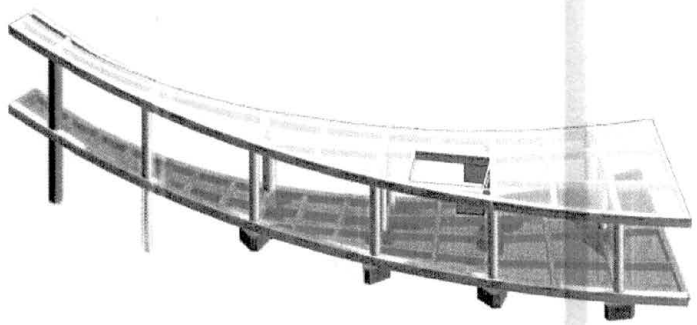

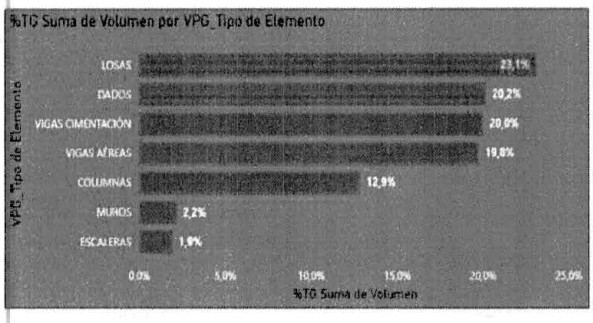



ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 12


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
191,718	5,679	0,00 % 2,96 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
559,51	--	0,00 % (En blanco) 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
600,72	20,58	0,00 % 3,43 % 100,00 %

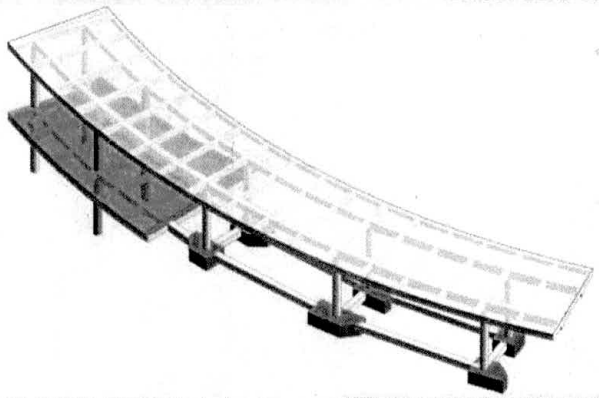

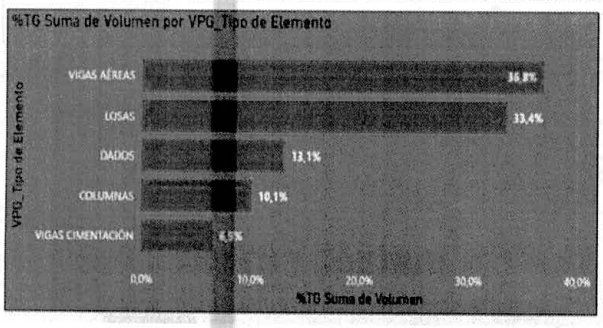

Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- LOSAS
- VIGAS AÉREAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 23/01/26

Ubicac
- Módulo 07
- Módulo 08
- Módulo 09
- Módulo 10
- Módulo 11
- Módulo 12 - Pas...
- Módulo 13 - Pas...
- Módulo 14 - Pas...
- Módulo 15 - Pas...

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 16 - PASARELA


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
167,936	62,374	0,00 % 37,14 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
425,65	36,24	0,00 % 8,51 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
683,60	303,64	0,00 % 44,42 % 100,00 %

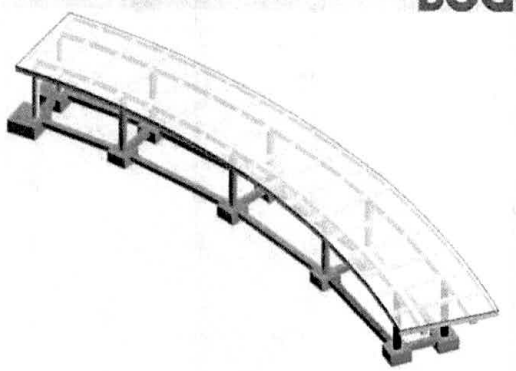

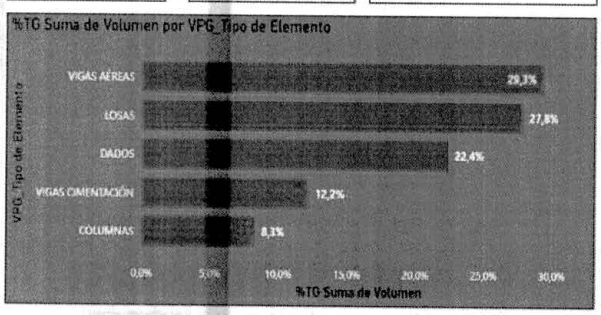


Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- LOSAS
- VIGAS AÉREAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 3/10/25
- 6/10/25
- 29/10/25
- 23/12/25
- 27/12/25
- 31/12/25
- 3/01/26
- 5/01/26

Ubicac
- Módulo 10
- Módulo 11
- Módulo 12 - Pas...
- Módulo 13 - Pas...
- Módulo 14 - Pas...
- Módulo 15 - Pas...
- Módulo 16 - Pas...
- Pista
- Rampa Peatonal

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
644,624	485,729	75,35 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.585,58	1.406,74	54,41 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
986,63	807,19	81,81 %

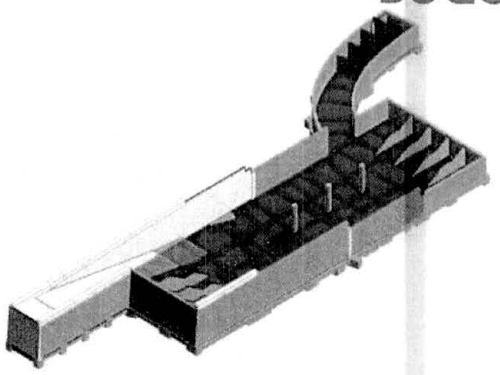

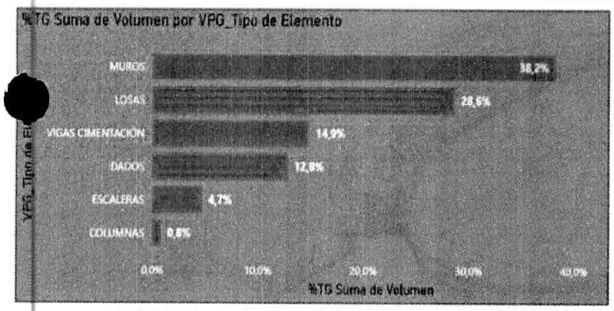

Tipo Elemento
- COLUMNAS
- DADOS
- ESCALERAS
- LOSAS
- MUROS
- RAMPAS
- VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
- (En blanco)
- 16/10/25
- 20/10/25
- 19/11/25
- 20/11/25
- 28/11/25
- 12/12/25
- 13/12/25
- 16/12/25

Ubicac
- Modulo 15 - Pas...
- Modulo 16 - Pas...
- Pista
- Rampa Peatonal
- Torre grua
- Tunel Administra
- Tunel de Ambula
- Tunel Deportivo
- Zona Central

- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – COMPONENTE ELÉCTRICO

AVANCE GENERAL

BOGOTÁ

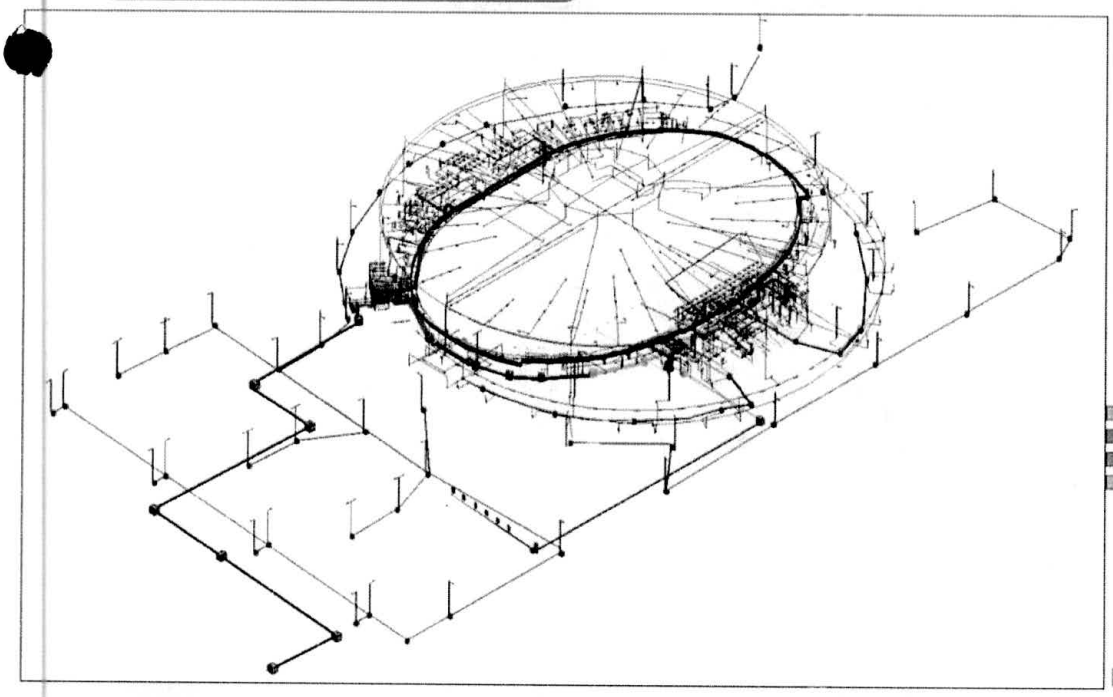


- ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
- EJECUTADO PRESENTE PERIODO
- PROYECTADO
- EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – COMPONENTE COMUNICACIONES


AVANCE GENERAL

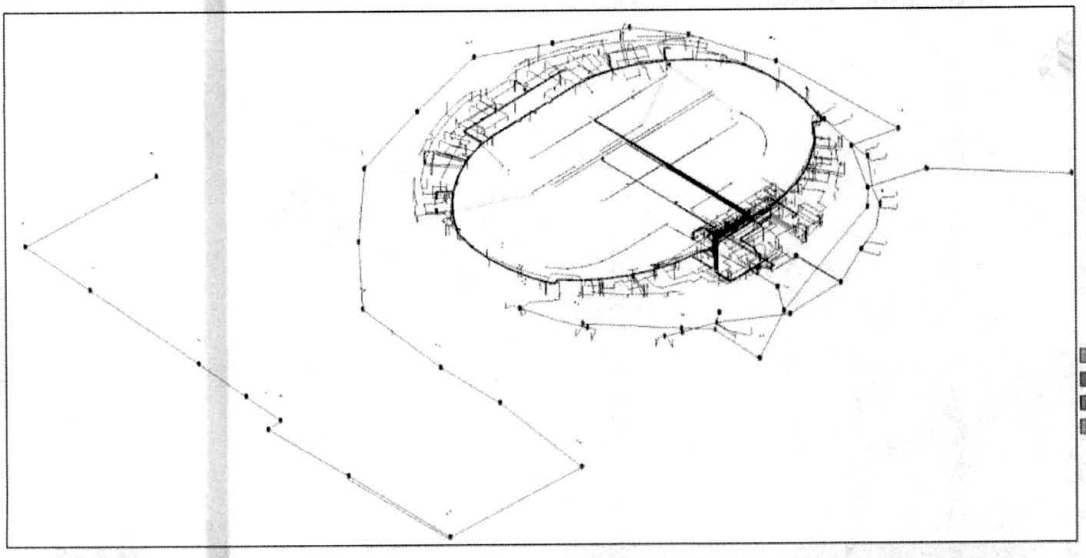

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


MODELO INTEGRADO

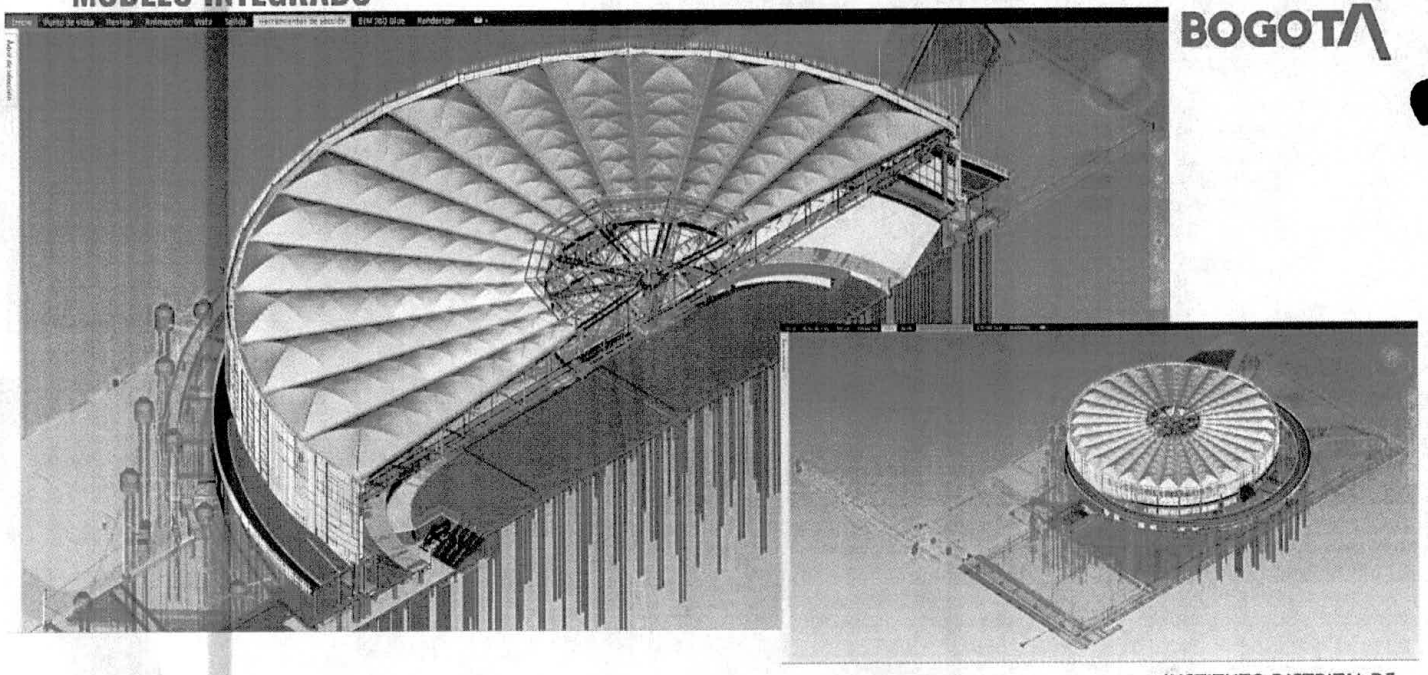

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

PLANOS PISTA

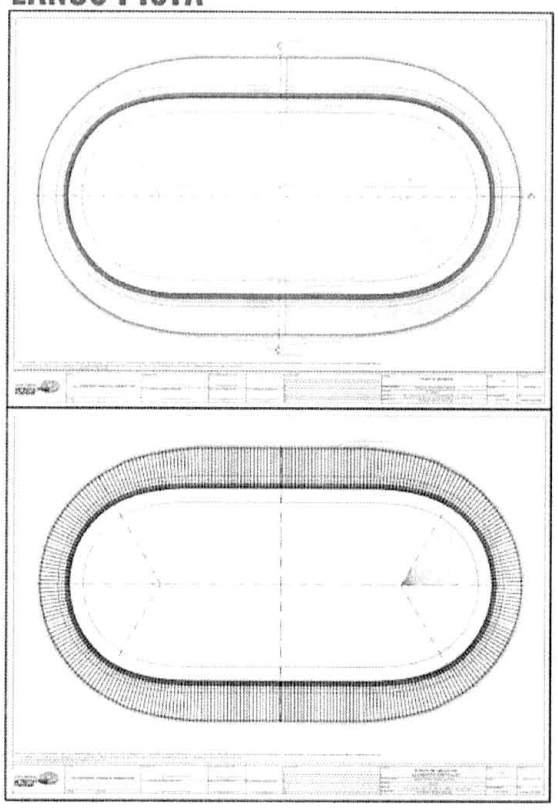

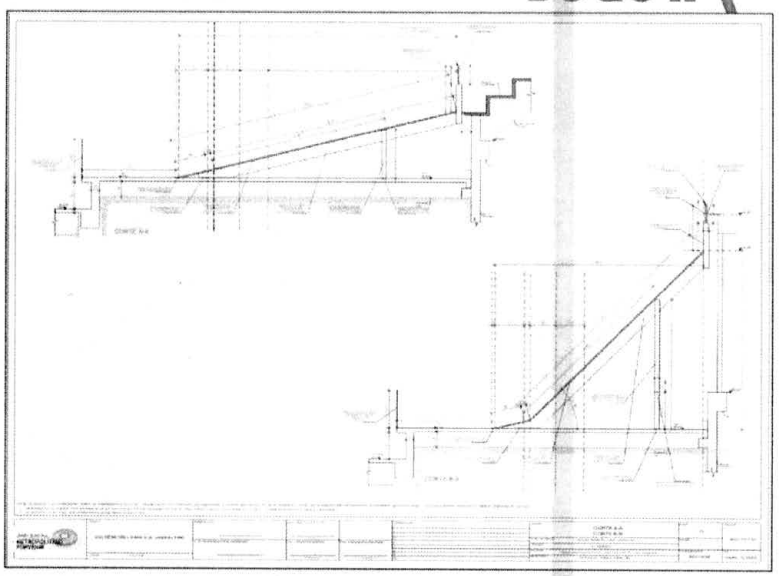

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG.	UTMP	15/01/2026	PENDIENTE
Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (Insumos)	UTMP	22/01/2026	Pendiente
Remisión de borrador de modificatorio No 3 – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD	UTMP – CIG - IDRD	28/11/2025	CUMPLIDO
Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(*) Pendiente Respuesta IDRD.	UTMP – CIG - IDRD	16/01/2025	PENDIENTE

(*) Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 85.454.056.727	57,82%
% EJECUCIÓN	$ 78.244.496.078	52,94%
% COSTO	$ 78.244.496.078	52,94%

AVANCE	-4,88%

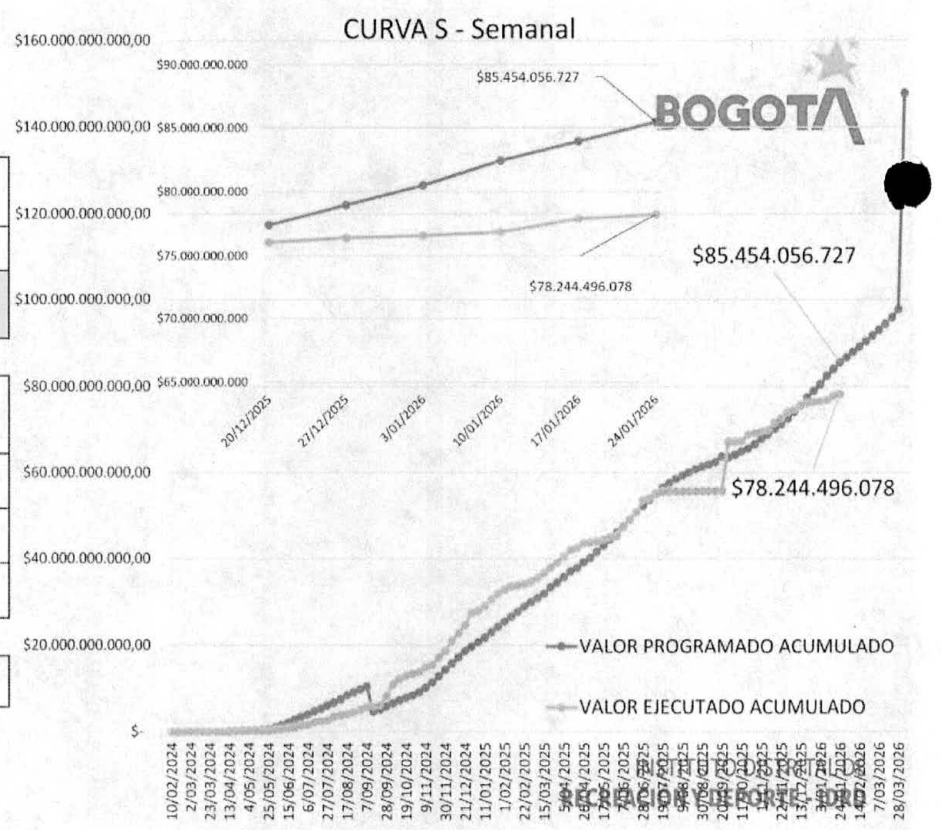

24/01/2026 **programación v3**

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
FE -025	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE -026	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ

FACTURACIÓN DEL PROYECTO

MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METÁLICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	**$ 61.010.761.815,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.868.397.139,00**	**$ 6.285.143.403,00**	**$ 72.523.644.111,00**

BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA
	IMPERMEABILIZACION MUROS DE CONTENCION CON IGOL IMPRIMANTE + IGOL DENSO O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, EQUIPOS, TRASIEGO, MANO DE OBRA).	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULOS 1, 2, 4, 5 Y 6	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 100 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

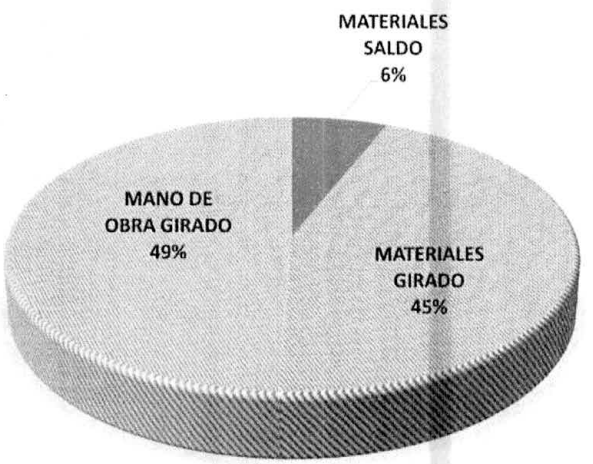

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

INFORMES INTERVENTORIA

BOGOTÁ

					INFORMES TÉCNICOS DE INTERVENTORIA													
Mes	Desde	Hasta	e_No	Fecha Rad. IDRD	Técnico	Fecha	Fauna	Fecha	Forestal	Fecha	SST	Fecha	Social	Fecha	Ambiental	Fecha	Calidad	Fecha
jul-25	26/06/2025	25/07/2025	18	12/08/2025	PR-IDRD		OK	20/01/2025	OK	15/12/2025	OK	27/12/2025	OK	26/08/2025	OK	26/12/2025	Obs. IDRD	31/12/2026
ago-25	26/07/2025	25/08/2025	19	10/09/2025	PR-IDRD		OK	20/01/2026	OK	24/12/2025	OK	16/01/2026	OK	10/09/2025	OK	19/01/2026	PR-IDRD	
sep-25	26/08/2025	25/09/2025	20	16/10/2025	PR-IDRD		Sub. CIG	14/01/2026	OK	27/01/2026	PR-IDRD		OK	7/01/2026	OK	22/01/2026	PR-IDRD	
oct-25	26/09/2025	25/10/2025	21	11/11/2025	PR-IDRD		Obs. IDRD	19/01/2026	Obs. IDRD	19/01/2026	PR-IDRD		OK	7/01/2026	Obs. IDRD	19/01/2026	PR-IDRD	
nov-25	26/10/2025	25/11/2025	22	12/12/2025	PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		OK	7/01/2026	PR-IDRD		PR-IDRD	
dic-25	26/11/2025	25/12/2025	23		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		OK		PR-IDRD		PR-IDRD	
			(*)		7/01/2026		15/01/2026		16/01/2026		16/01/2026		2/01/2026	Pre-Aprobado	15/01/2026		15/01/2026	

(*)	De acuerdo a lineamiento de la entidad contratante se inicia remision via correo electronico de los informes por Componente para revision PRELIMAR antes de radicacion FORMAL
Fecha:	Corresponde a la fecha de Revision y/o Aprobacion por parte del IDRD

PR-IDRD	Pendiente Revision IDRD
Obs. IDRD	Observaciones IDRD (Sin Atender CIG)
Sub. CIG	Subsanacion CIG
OK	Aprobado

ACTAS PARCIALES			
No	Acta_Obra	Acta_Interventoria	Vr_Fasctura_Interventoria
15	OK	PENDIENTE	$ 189.405.670,00
16	OK	PENDIENTE	$ 11.096.625,00
17	OK	PENDIENTE	$ 9.116.564,00
18	OK	PENDIENTE	$ 47.440.544,00
19	OK	PENDIENTE	$ 118.315.394,00
20	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 59.987.253,00
21	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 61.713.965,00
			$ 497.076.015,00

Saldo CIG Pendien Informes

28/01/2026

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (*) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP	UTMP-CIG-IDRD	Sin fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	27,09 Ton
ene-26	05 de Enero al 11 de Enero de 2026	11,33 Ton
ene-26	12 de Enero al 18 de Enero de 2026	9,15 Ton
ene-26	19 de Enero al 25 de Enero de 2026	10,57 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	286,04 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***286,04 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **26,31%**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
					26 Unds		Total	230,88 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA




Elementos Ingresados del 19 al 25 de Enero de 2026:

0 Unds


TOTAL : 230,88 TON.






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 21 al 24

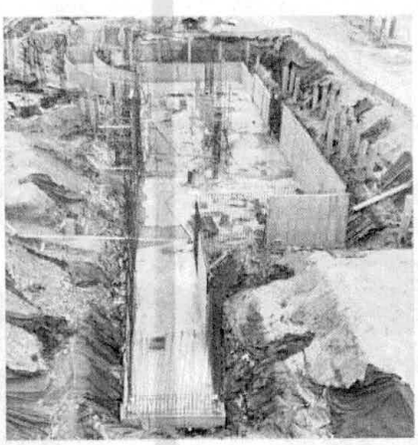

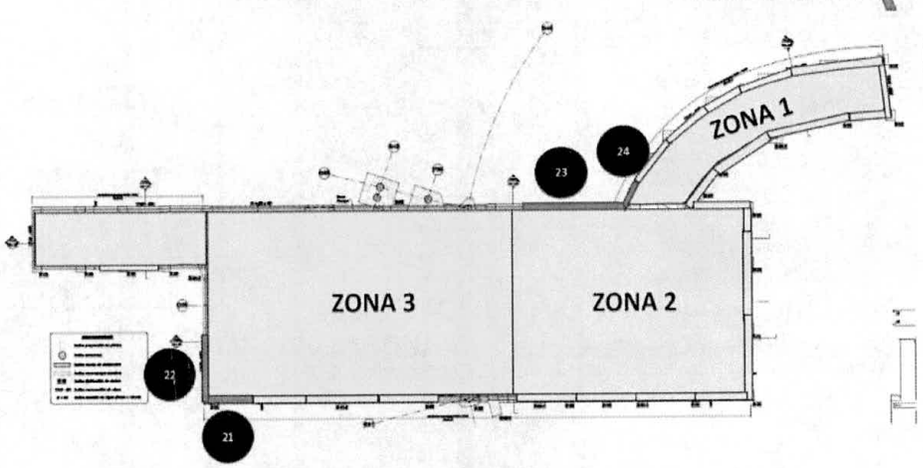

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS TÚNEL DE AMBULANCIA



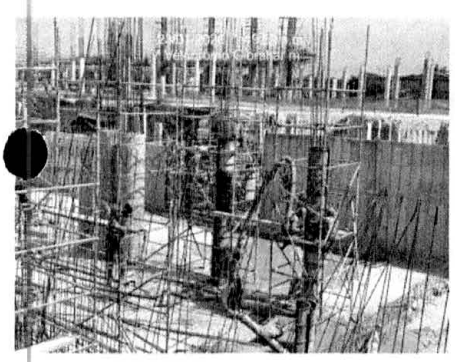


Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

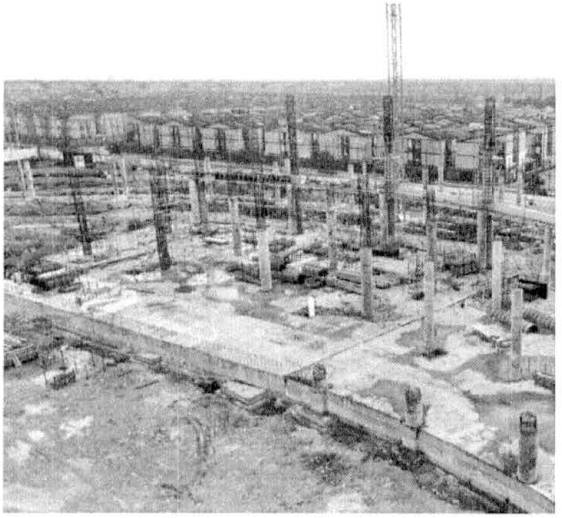

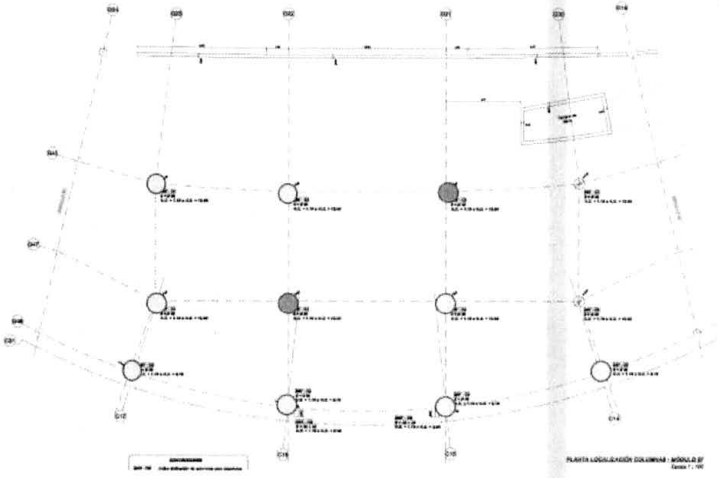


Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE CUELLO Y COLUMNA MÓDULO 5

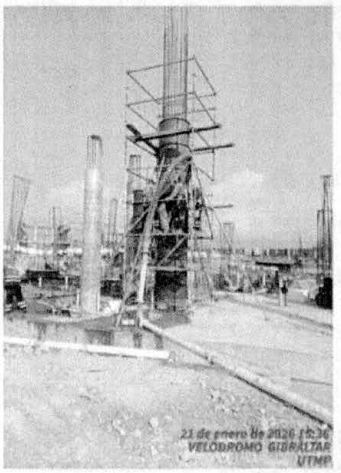




Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNA DE CUBIERTA MÓDULO 1

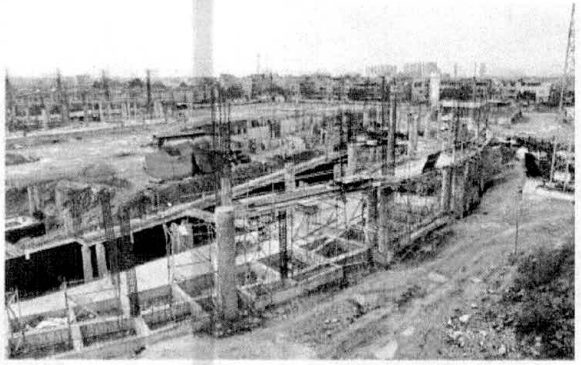

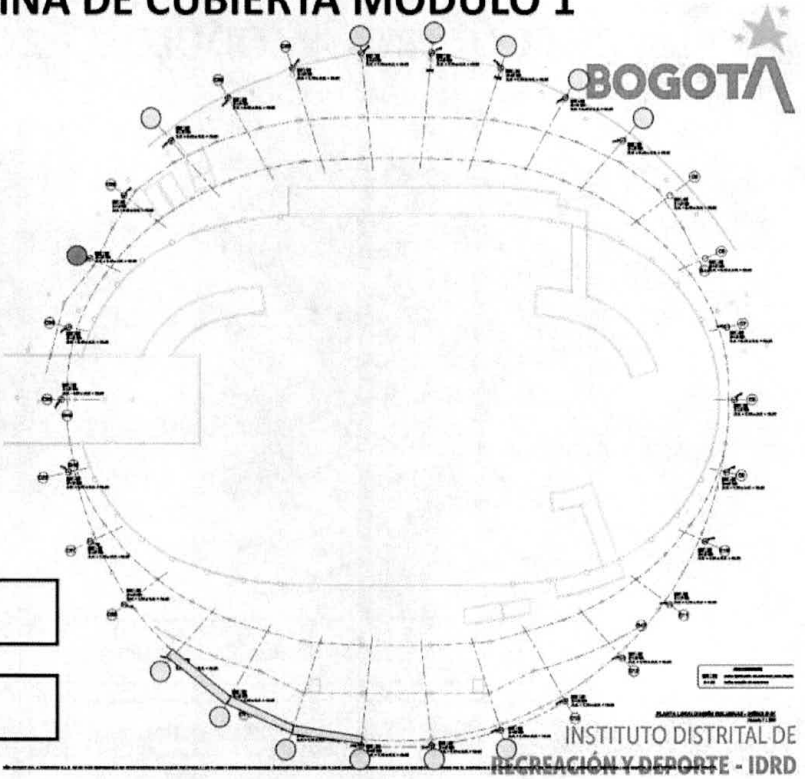

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS, VIGAS MÓDULO 6– ZONA DE EDIFICIO

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo



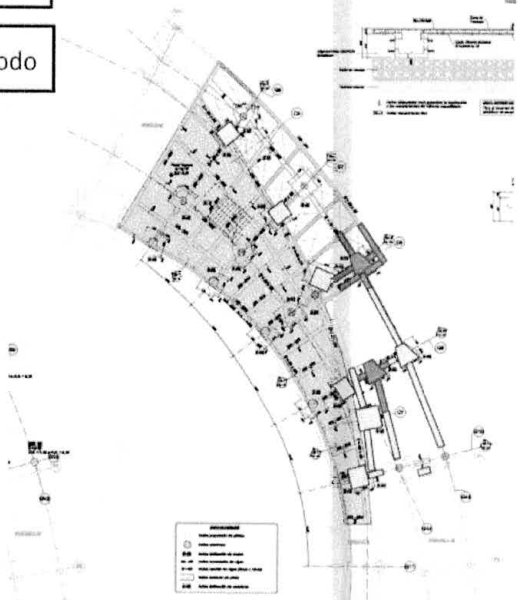


PLANO M6-E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 6

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 16 – ZONA DE PASARELA

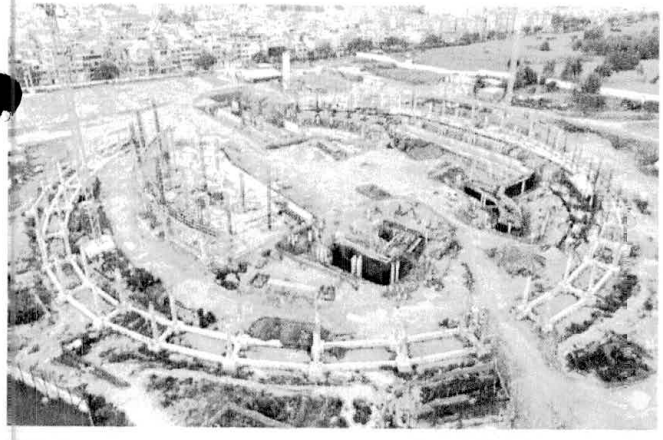



Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

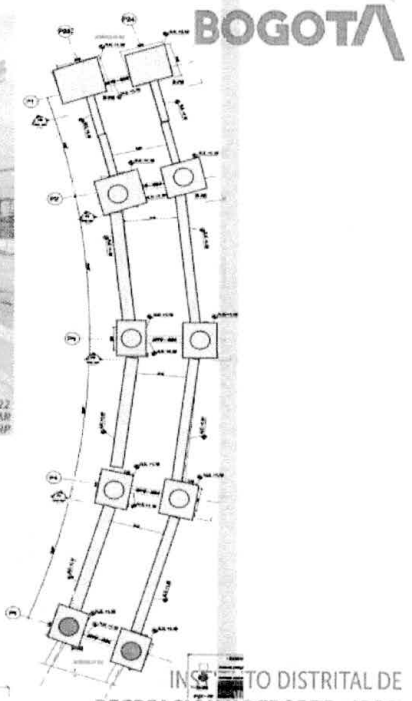

PLANO M16-E01

PLANTA ESTRUCTURALES MÓDULO 16 -PASARELA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 3 – ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo



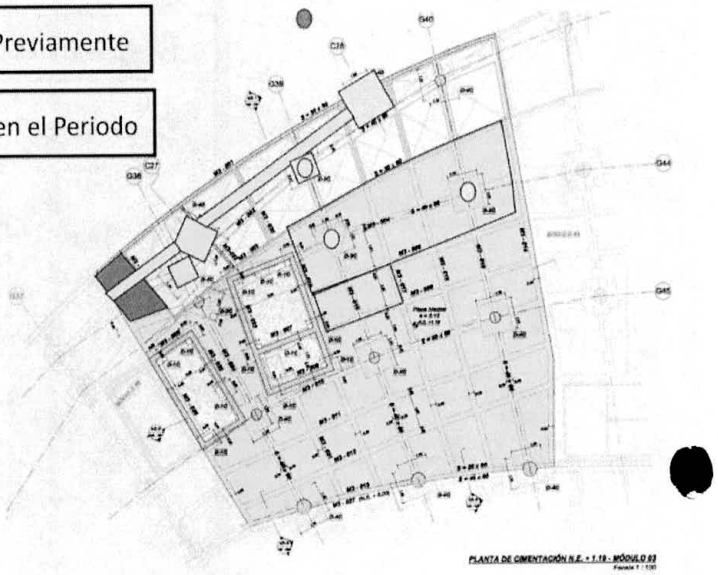



PLANO M3 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 3

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MENSULA MÓDULO 2 - TUNEL DEPORTIVO ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ

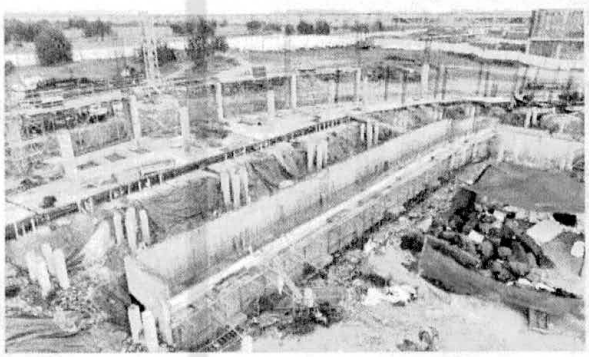

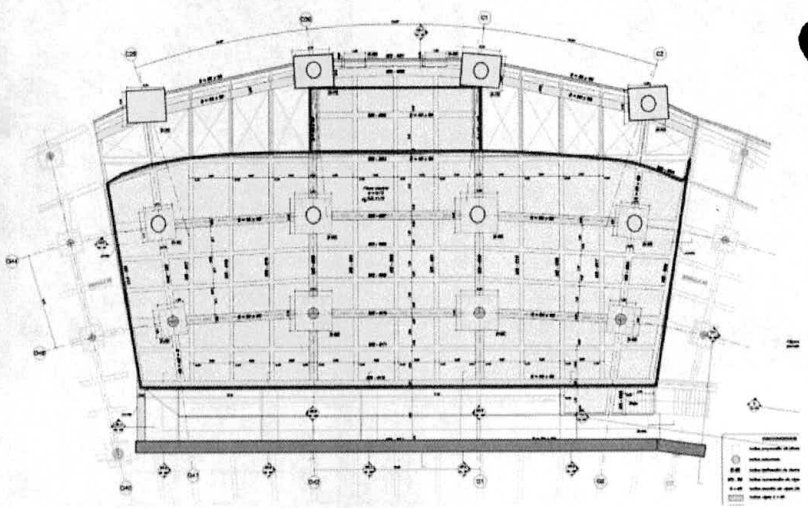

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M2 – E02 PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


FUNDIDA DE MENSULA Y COLUMNA EN TUNEL ADMINISTRATIVO MÓDULO 9 – ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ

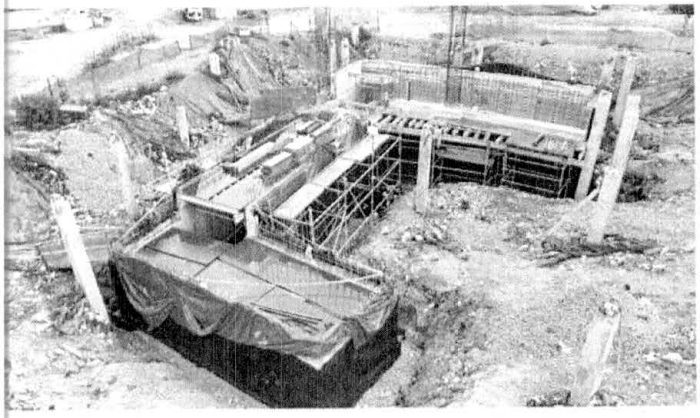

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

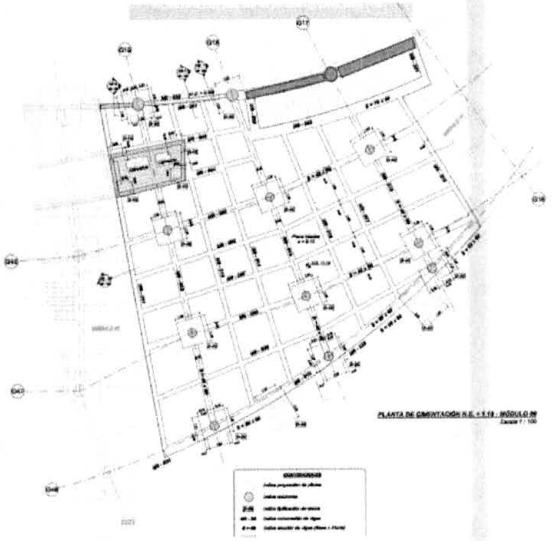


PLANO M9 – E01 PLANTAS ESTRUCTURALES MÓDULO 9

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

BOGOTÁ

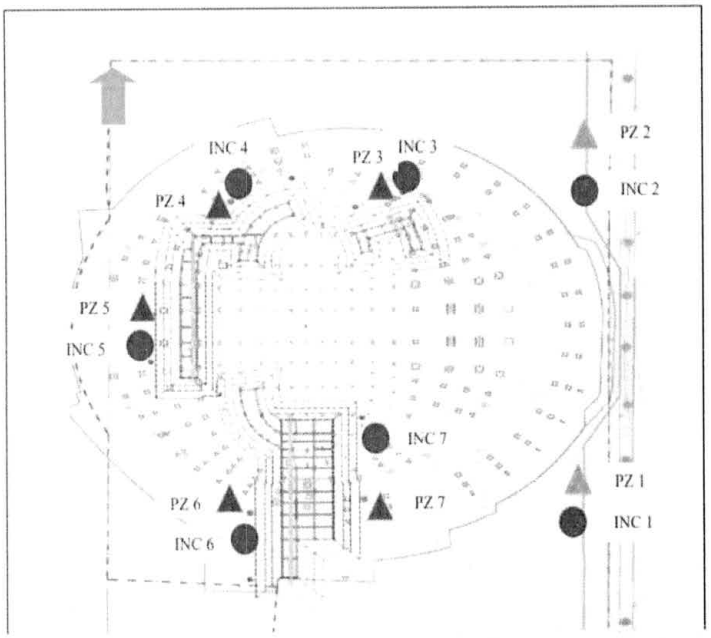

INCLINOMETRO

PIEZOMETRO CASAGRANDE

PIEZOMETRO DE HILO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

CONCLUSIONES

BOGOTÁ

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 05 al 09 de enero de 2026; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 34.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.20 m y 8.90 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 3 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.33 y 6.23 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo.	UTMP	29-01-2026	pendiente

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

Durante la semana 19 al 24 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- Se evidencia que las instalaciones del área eléctrica y de comunicaciones están en un lapso de espera ya que el avance de la obra en lo que se refiere a la estructura de concreto, construcción de muros para oficinas y pasillos se demora un tiempo para poder reiniciar con esos trabajos. Sin embargo hay que estar pendientes ya que en algunos muros se requiere instalar pases como los de las siguientes imágenes del túnel principal para las redes de baja tensión.


En la siguiente imagen se aprecian los pases para las redes de baja tensión en el túnel principal. Imagen 1.

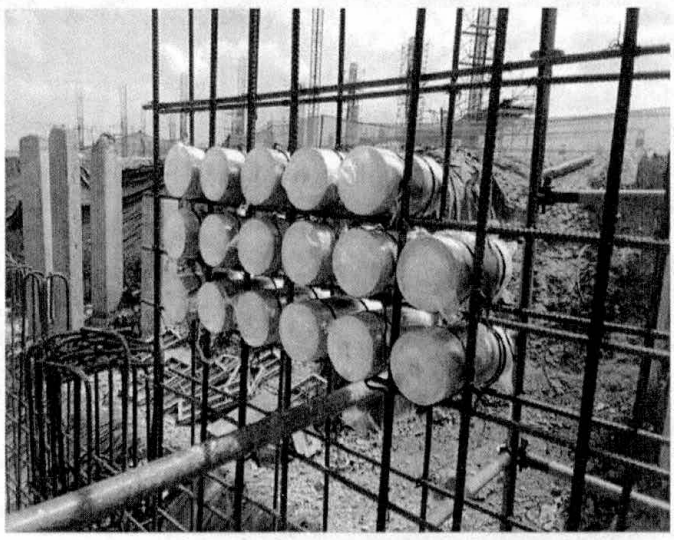

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Imagen 2.

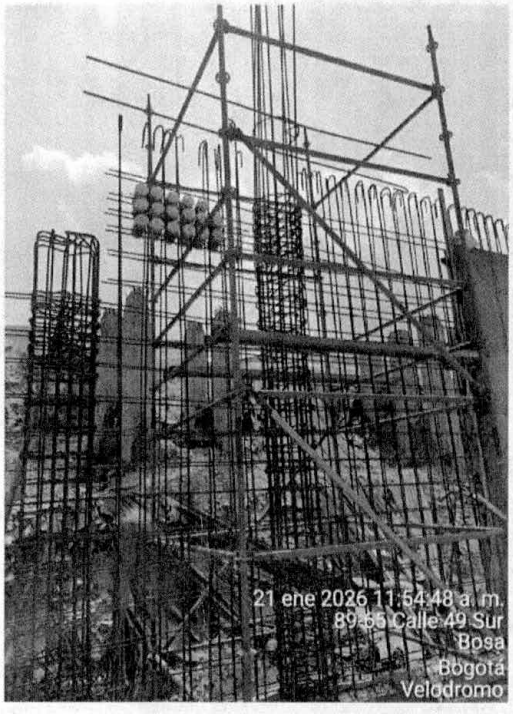

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

Hidrosanitario

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (*)	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta IDRD – Subdirección Técnica y Subdirección de Parques para análisis de constructibilidad y/o validación escenarios AMBIENTALES de alternativas de manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo - revisión interna CIG-IDRD	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE
Propuesta de Trazado CIG -UTMP al respecto de alternativas de CONDUCCION manejo de Aguas subterráneas (lixiviados) que afloren durante la operación del proyecto velódromo (Punto de Conexión) . Espera de Respuesta UTMP .(**)	UTMP-CIG	22/01/2026	PENDIENTE

(*) Oficio C G No CIG-IDRD-VEL-0034-2026 (19/01/2026) Rad. IDRD No 20262100023932.
(**) Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025)


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


BOGOTÁ


REDES HIDROSANITARIAS

Avance de Obra:

Se continúa con la instalación del geodrén perimetral del Túnel Apoyo a la competición.

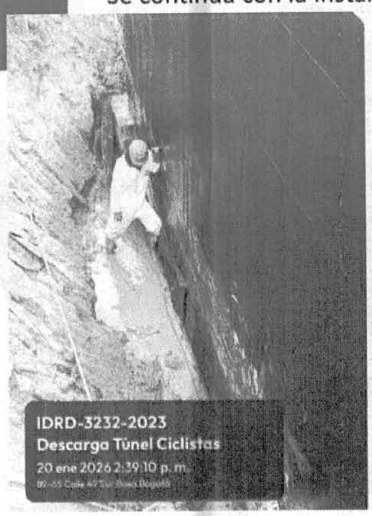

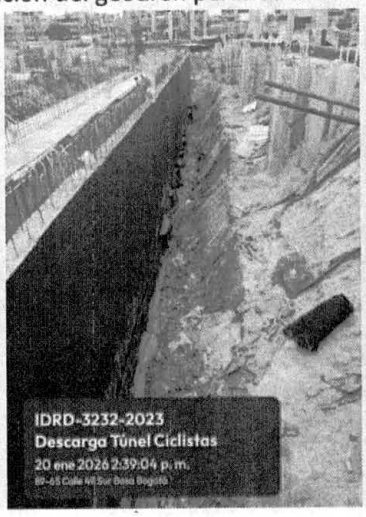

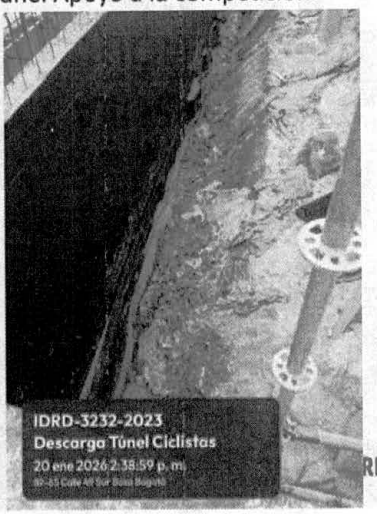

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	Comité Técnico/Transversal Velodromo Cto Obr. 3232-2023 y Cto. Int 3219-2023	DD	MM	AA
ACTA No. 96		5	2	2026

LUGAR:	virtual Plataforma Teams enlace:	HORA DE INICIO:	8:00	HORA FIN:	10:30

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se adjunta Listado de Asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de Componentes Transversales	4.
2. Presentacion de Componentes Técnicos	5.
3. Observaciones Varias.	6.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TRANVERSAL

Se solicita permiso a los asistentes para grabar la cesion los cuales no tienen objecion y se inicia comité con autorizacion respectiva de los firmantes de la presenta Acta.

Componente Social: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Ejecución de actas de vecindad en zonas según posible ampliación de Parqueaderos verificar (dada la definición de intervención de la zona de parqueaderos verificar si habrá alguna posible afectación para el asentamiento actual del habitante de calle y los caninos.)

PENDIENTE - Se aclara y se informa que este compromiso sera retirado teniendo en cuenta que no se tiene definición materializada para efecto de las respectivas visitas a predios.

2) Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD

PENDIENTE - Por parte de el Apoyo a la supervisión del IDRD se informa que la visita queda reprogramada para el 13/02/2026.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Por parte de la Interventoria CIG se socializa a los participantes que el Inf. No 24 de interventoria fua pre-aprobado por parte de la supervisión del componente el pasado 03/02/2026. Y el tema te la respuesta de la Tutela sera remitida al IDRD.

Se desarrollaron actividades asociadas a la gestión comunitaria, atención al ciudadano y participación ciudadana, destacándose:
• Aprobación del Informe Mensual No. 24 del componente social, una vez atendidas las observaciones formuladas por la Interventoría.
• Emisión del Acta No. 22 del Comité de Participación Ciudadana.
• Atención integral de 23 PQRS, las cuales fueron gestionadas y cerradas en su totalidad dentro del periodo.
• Trámite y respuesta institucional a una acción de tutela, articulando las áreas ambiental, SST y jurídica, con notificación formal a la Interventoría.

Componente Ambiental: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de Obra No CE 206-125-2163 (21/06/2025))

PENDIENTE: Por parte de la interventoría CIG se aclara que se ha revisado el tema y se dará una respuesta a la UTMP. Se llevará a cabo el traslado respectivo a la entidad contratante, respecto al estado de como quedará con la ruta de descarga hacia el sitio de la PTAR del proyecto CAR.

2) Propuesta de manejo de ZONAS VERDES Pendiente respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de Obra No CE-206-125-2164 (21/06/2026)

PENDIENTE - Por parte de la interventoría CIG se manifiesta que se hicieron las aclaraciones pertinentes junto al contratista UTMP el día de hoy y se informará a la entidad contratante.
Se adelantaron actividades de control, mitigación y seguimiento ambiental, entre las que se destacan: • Jornadas de capacitación ambiental enfocadas en determinantes ambientales, protección de materiales, mantenimiento de sumideros, manejo de árboles y control de sedimentación. • Gestión integral del retiro y aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), alcanzando un avance acumulado del 86,30%, con metas de aprovechamiento del 99,82% y circularidad del 19,33%. • Manejo, control y evacuación de 27.310 kg de lixiviados, mediante sistemas de contención, bombeo, almacenamiento temporal y disposición final controlada. • Implementación de medidas de control ambiental preventivo, tales como lavado de cárcamos, control de olores, monitoreo de gases y mantenimiento de sistemas de contención.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Componente Riesgos: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a l red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente
Por parte del IDRD se comunica que el Radicado SDA No 2026ER10476(23/0/2026) programacion de la tercera campaña, por parte de la Interventoria (Profesional de Hidrogeologia) se indaga a la supervision sobre la fecha propuesta para la tercera campaña de monitoreo ante la SDA propuesta para este mes de Febrero , el apoyo a la supervision manifiesta que no se ha tenido respuesta, se revisara el dia de mañana comunicacion o se tendra que correr la fecha, se queda de compromiso dar una razon por parte del IDRD a mas tardar el dia 09/02/2026 para iniciar o no trabajos preliminares al respecto.
2) Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD
Por parte del IDRD se manifiesta que calidad de aire esta radicado hace varios meses y la interventoria CIG tiene conocimiento respectivo, no depende de IDRD y depende derespuesta expresa de la SDA en dos terminos 1) Propuesta presentada para UNICO monitoreso del Parque (incluido dos proyectos CAR y Velodromo- Parque metropolitano) y 2) Concepto tecnico 6540 indica claramente que la ubicacion de puntos de monitoreo se debe hacer en conjunto con la SDA) Se esta realizando gestion por parte del IDRD ante la SDA, se aclara por parte de la UTMP que lo que se solicita es la reiteracion ante la SDA, segun lo descrito se están agotando las instancias interinstitucionales.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Se ejecutaron acciones sistemáticas orientadas al control y reducción del riesgo, principalmente en escenarios asociados a excavaciones, aguas subterráneas y condiciones climáticas, incluyendo: • Monitoreo permanente del nivel freático en los pozos eyectores. • Control de precipitación mediante pluviómetro en sitio. • Activación de sistemas de bombeo, diques de contención, isotanques y catch tank para manejo de lixiviados. • Aplicación de cal en zonas excavadas como medida preventiva frente a generación de olores ofensivos. • Monitoreo de gases volátiles en frentes activos, sin detección de niveles críticos.
Por parte de la interventoria CIG se manifiesta que fue remitida al IDRD que se remite subsanacion del Informe No 21, se recibe lista de chequeo de aprobación del informe No 20 el cual fue remitido en fisico ante la entidad contratante.

Componente SST: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23. PENDIENTE en avance según lo reportado en las diapositivas del presente comité.
2) Subsanación de observaciones efectuadas durante recorrido preliminar a comité de Obra No 96. (05/02/2026). Por parte de la UTMP y CIG se remite a la entidad contratante registro fotografico pertinente al respecto de los ajustes según observaciones efectuadas y se presentan durante el comite.
3) Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Humaña . Por parte de la UTMP se solicito el cierre respectiva, se tiene seguimiento respectivo teniendo que esta activo en obra.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Durante el periodo se mantuvo el control permanente en frentes de trabajo, mediante: • Inspecciones en excavaciones, trabajos en altura, uso de EPP, orden y aseo. • Implementación de pausas activas, inducciones y charlas de seguridad. • Seguimiento a indicadores de accidentalidad, registrándose 8 accidentes acumulados, de los cuales 4 se encuentran cerrados y 4 abiertos. • Control del ausentismo laboral, con un acumulado histórico de 62 eventos.
Por parte de la Interventoria CIG se manifiesta que dentro de las actividades administrativas de la semana se reporta la presentacion del informe mensual No 24 de obra y la respuesta con observaciones por parte de CIG, se subsanara el dia 05/02/2026. En cuanto a la subsanacion del informe No 20 mediante correo electronico se remitio el 04/02/2026, el cual incluye el plan de trabajo 2026 tanto de obra como de interventopria. La supervision informa que se dara respuesta a la remision digital si es el caso se tendra mesa de trabajo o aval respectivo pasra remision en Fisico.
Componente CALIDAD: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad – anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar -
Cumplido. Se comunica por parte de la interventoria que la información fue recibido y esta informacion sera base del documento a presentar como respuesta a las observaciones dadas de parte de la entidad contratante IDRD.
2) Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (Rad. IDRD No 20264200013601 del 20/01/2025 Oficio Contratista de obra No CE-206-125-2150 del 13/01/2026) Revisión por parte de la Interventoría CIG
PENDIENTE: Se comunica por parte de la Interventoria que se hará revision respectiva de la respuesta a la entidad contratante.
3) Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD. (Rad. IDRD No 20262100054772 02/02/2026 Hoja de vida Prof. Calidad Interventoría)
PARCIAL - Se presenta para aprobacion profesional de interventoria componente Calidad, de esto depende la respuesta al requerimiento teniendo en cuenta que este profesional firmará dicho documento (PLAN DE CALIDAD interventoria)
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes. GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

Se realizó seguimiento a los sistemas de control de calidad, destacando:

• Control de concretos estructurales, con una ejecución semanal de 123,44 m³, y un acumulado total de 2.712,08 m³, bajo protocolos de ensayo y control normativo.
• Ingreso y control de aceros estructurales, con un acumulado total de 540,99 toneladas.
• Seguimiento al suministro e instalación de la estructura metálica de cubierta, con un total acumulado de 250,84 toneladas, correspondiente a 28 unidades estructurales.
• Control documental y trazabilidad técnica de rediseños, modificaciones y componentes aprobados del proyecto.

Se ejecutaron actividades relevantes en:

- Muros estructurales.
- Columnas.
- Placas.
- Vigas aéreas.
- Estructura metálica principal.

Asimismo, se consolidó el avance en túneles, módulos estructurales, graderías y pasarelas, con seguimiento permanente a rediseños y ajustes técnicos previamente aprobados.

Respecto de los materiales y rellenos estructurales, se aprobó la caracterización técnica del material granular tipo PEA (proveniente de CTA) para el lleno del trasdós de los muros de contención, cumpliendo con la totalidad de los ensayos normativos exigidos, garantizando la estabilidad geotécnica de los túneles del proyecto.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TÉCNICO

Componente BIM: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones red de GAS

PENDIENTE: Se manifiesta por parte de la interventoria que se solicito al contratista UTMP que se realice el ajuste a la red perimetral y de manera posterior se hara revision aceptacion y/o observaciones pertinentes.

2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026. (Oficio de Obra No CE-206-125-2188 del 28/01/2026) Revisión y respuesta CIG – remitido a la entidad contratante vía Email 29/01/2026.

PENDIENTE: Se remitirá 06/02/2026 al contratista de obra la respuesta a la UTMP al respecto de la revision de la informacion presentada y se espera comentarios respectivos por parte del IDRD.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se socializa al respecto de la implementación progresiva de la metodología BIM como herramienta integral de planificación, coordinación, control técnico y seguimiento del proyecto, orientada a mejorar la eficiencia constructiva, la detección temprana de interferencias y la trazabilidad de la información.

Las actividades desarrolladas en este componente incluyen:
• Modelación tridimensional de los sistemas estructurales, arquitectónicos y técnicos, permitiendo la verificación geométrica, espacial y funcional de los diferentes elementos del proyecto.
• Coordinación interdisciplinaria mediante modelos federados, facilitando la identificación y resolución de interferencias (clash detection) entre estructura, redes técnicas y arquitectura.
• Validación de geometrías complejas, especialmente en zonas de alta complejidad constructiva como graderías, cubiertas, túneles y estructura principal.
• Soporte a la planeación de obra mediante la vinculación del modelo BIM con la programación de actividades (4D) y la

• Soporte a la planeación de obra mediante la vinculación del modelo BIM con la programación de actividades (4D) y la estimación de cantidades de obra, mejorando la precisión en la secuencia constructiva y el control de tiempos. • Actualización progresiva de modelos conforme al avance real de obra (modelos as-built parciales), fortaleciendo la trazabilidad técnica y documental del proyecto. La implementación de BIM contribuye de manera directa al control técnico de la ejecución, la reducción de reprocesos, la optimización de recursos y la mejora en la toma de decisiones, consolidándose como una herramienta clave
Componente PROGRAMACIÓN: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. (Para el Modificatorio No 3 UTMP Oficios de Obra No CE-206-126- 2196 (Concretos) 2190 (Eléctricos) 2198 (Cubierta) 2186 (Hidráulicos) 2202 (Insumos)
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes entre las partes UTMP-CIG-IDRD.
2) Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link)
PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta y observaciones de manera Digital y se remitira de manera oficial por la entidad contratante IDRD.
3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD (Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link)
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes por parte de la entidad contratante IDRD.
4) Remisión de borrador de modificatorio No 1 Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador por parte de interventoría CIG el 04/02/2026
PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta la proxima respuesta.
5) Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)) Pendiente Respuesta IDRD.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Se manifiesta por parte de la interventoria y obra que se debe tener en cuenta que para el Modificatorio No 3 de obra la secuencia de aceptacion de los insumos por parte del IDRD asi como de los APUS y de ahí se procede a consolidar el presupuesto y la programacion de acuerdo a los alcances planteados y el valor de la adicion disponible y comunicada por parte de la Supervision que es aproximadamente de $ 6,500,000.
Se presenta por parte de CIG el Balance a la fecha de las revisiones efectuados a los informes MENSUALES por parte del IDRD y los valores de actas parciales PENDIENTES de acuerdo al avance a la fecha.
Componente TÉCNICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP
PENDIENTE: Se informa por parte del IDRD que se encuentra en la consolidacion de la información al respecto, según la reunion en curaduria Urbana No 2 ejecutada el dia 04/02/2026 entre la partes.
2) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD
PENDIENTE.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
El seguimiento estructural se realiza de forma desagregada por módulos (1, 2, 4, 5, 6, 7 y 12) y por elementos especiales como el Túnel Principal. Durante el periodo se ejecutaron actividades continuas de cimentación profunda y superficial, incluyendo: • Fundida de dados, vigas y losas de fundación. • Construcción de columnas circulares en concreto de 35 MPa con diferentes diámetros. • Ejecución de muros estructurales y muros de contención. • Avance en vigas aéreas de gran altura en el Módulo 7. Estas actividades consolidan el desarrollo progresivo de la superestructura y permiten habilitar frentes para actividades posteriores. En los túneles (principal, administrativo, deportivo y de ambulancias) se avanzó en: • Fundida de muros estructurales. • Fundida de columnas. • Impermeabilización de muros de contención y juntas de construcción.
Estructura Metálica de Cubierta La estructura metálica de cubierta presenta un avance significativo en fabricación y suministro: • Material total en planta: 912,42 toneladas. • Avance de material allegado: 83,93% frente al total proyectado (1.087 t). • Material en producción: 303,90 toneladas. Durante el periodo se registró el ingreso de elementos estructurales correspondientes a cerchas principales y pivotes centrales, consolidando el inventario necesario para el montaje progresivo en obra.
Instrumentación y Control Geotécnico El informe de instrumentación evidencia el control de asentamientos en plataforma, paramentos, bordillos y elementos perimetrales. Los registros parciales y acumulados muestran variaciones controladas dentro de rangos aceptables, sin alertas críticas, lo que indica un comportamiento geotécnico estable de las estructuras y del entorno intervenido a la fecha de corte
Componente ELECTRICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo. (Se remite por parte del contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión)


CUMNPLIDO: Se remitio por parte de la UTMP, la supervision solicita sea remitida a la entidad contratante IDRD por medio de correo electronico.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Durante la semana evaluada no se registró avance físico en la ejecución de redes eléctricas y de comunicaciones. Las actividades se concentraron en: • Revisión técnica de la localización de cajas de paso. • Ajustes de coordinación espacial con la estructura de concreto para evitar interferencias futuras
Componente Hidraulico: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-0034-2026 (19/01/2026) Rad. IDRD No 20262100023932.)
PENDIENTE. Teniendo en cuenta que se haria para el 2027 de acuerdo a las cotizaciones remitidas de VANTI.
2) Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025))
PENDIENTE. Conforme a lo determinado en el Comité Técnico No. 94 del 22 de enero de 2026, la postura oficial del IDRD es la unificación del tratamiento de lixiviados mediante una única planta compartida con el proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR), priorizando la sostenibilidad operativa de la entidad. Con el fin de materializar esta postura del IDRD, la Interventoría está finalizando la elaboración de un archivo técnico en formato .CAD, que pretende unificar la planimetría de ambos proyectos, señalando los posibles puntos de inicio en el Velódromo, el punto de entrega en la futura PTAR del CAR y una propuesta esquemática de trazado preliminar para una red de impulsión. Este archivo se entregará al contratista para que sirva de base en el desarrollo de la alternativa.
3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.
PENDIENTE.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
El componente hidrosanitario presenta avance general asociado a la ejecución de redes embebidas en estructuras ya construidas y a la coordinación técnica con los frentes de obra civil. Las actividades ejecutadas se concentran en: • Instalación y preparación de redes hidráulicas en zonas estructuralmente habilitadas. • Articulación técnica con el avance de cimentaciones y muros para evitar reprocesos.
Se informa la radicación de la solicitud certificación disponibilidad de servicio Vanti – VELODROMO GIBRALTAR No Dad. No 007378-2026 del 03/02/2026.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Compromisos descritos y patados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO	UTMP-CIG	Según documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
La supervision recomienda a la Interventoria la respuesta de los comunicados pendientes teniendo en cuenta los compromisos entre las partes.				

Siendo las __10:30 am___ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N-A	N-A
NOMBRE	**Arq. Rubén Darío Crespo**	NOMBRE	N-A	N-A
CARGO	Director de interventoría	CARGO	N-A	N-A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	**Ing. Arturo Rojas Torres** Residente de Interventoria	

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
5/02/2026 8:22:17	Javier sanchez	1014177632	Javier.sanchez@idrd.gov.co	Apoyo técnico a la super	IDRD	3014394635
5/02/2026 8:22:21	Juan Pablo Villate Diaz	1019010837	Juan.villate@idrd.gov.co	Apoyo transversal	IDRD	3197021334
5/02/2026 8:22:51	James Otalvaro	75091421	james.otalvaro@ehidrogeologicos.com	Hidrogeólogo	CIG	3117972537
5/02/2026 8:22:55	JULIAN RICARDO AGUDELO	80767393	julianagudeloingeniero@gmail.com	Residente Ambiental	CIG	3202336372
5/02/2026 8:23:07	Francy Murillo	52968323	francy.murillo@idrd.gov.co	Apoyo a la Supervision	IDRD	3043808785
5/02/2026 8:23:28	CARLOS H. CASTRO	79340835	carlosh.castro@idrd.gov.co	Ingeniero Contratista ST(	IDRD	3107542732
5/02/2026 8:23:28	Edgar Solórzano Medina	19222971	corint.carvel.2@gmail.com	Coordinador Técnico de I	Consorcio Interventores	3124326589
5/02/2026 8:23:42	Sara Eulalia Chaparro G	1057581903	sarageology19@gmail.com	hidrogeologa	UTMP	3204386100
5/02/2026 8:23:49	Tatiana Ortegon	1018487557	Ltortegonpinilla@gmail.com	Ingeniera ambiental - IDF	IDRD	3138646385
5/02/2026 8:24:09	Edwin Escobar	94487629	edwin.escobar@idrd.gov.co	Apoyo tecnico STC	IDRD	3116058975
5/02/2026 8:26:34	JAIRO PARRA REYES	1143829208	jairo.parra@idrd.gov.co	Asesor STC	idrd	3052150830
5/02/2026 8:29:00	Mary Luz Ramírez Carvajal	52494809	ramirezmalu09@gmail.com	Profesional social	Interventoría	3132205175
5/02/2026 8:31:04	RUBEN DARIO CRESPO B	19496690	directora.consorciointervg@gmail.com	DIRECTOR INTERVENTOI	CONSORCIO INTERVENT	3103231119
5/02/2026 8:31:59	JHON FREDY ESPITIA BERN	80794111	jhon.espitia@idrd.gov.co	Contratista IDRD	IDRD - STC	3118103338
5/02/2026 8:32:43	Carmen Lucía Vélez Cárden	65777928	carmen.velez@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión c	Instituto Distrital de Recr	3204054770
5/02/2026 8:33:50	Jaime Andrés Cañón Vergar	80096733	jaime.canon@idrd.gov.co	Contratista	IDRD	3164116578
5/02/2026 8:33:56	JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS	79685757	JCLAVIJO@CYG.COM.CO	REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL METI	3153336978
5/02/2026 8:34:32	Lina Johanna Falla Lozano	52517090	lina.falla@idrd.gov.co	Apoyo supervisión Ambi	IDRD	3103143272
5/02/2026 8:39:38	ALFONSO PEÑARANDA SUA	88235391	a.penaranda@cyg.com.co	DIRECTOR DEL PROYECT	UTMP	3008620623
5/02/2026 8:41:14	LUZ STELLA RODRIGUEZ	31432956	sst2.velodromo@cyg.com.co	Residente SG-SST	UTMP	3214693331
5/02/2026 8:46:22	Diana Marcela Ortiz	1014212007	Social.velodromo@cyg.com.co	Residente social	UTMP	3153935487
5/02/2026 8:46:26	Astrid Viviana Rojas Cangrej	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Profesional Gestión de R	Consorcio Interventores	3157994502
5/02/2026 8:46:57	Lindy Rubiano Moyano	1051954740	interventoria.sgsstvelodromo@gmail.com	Residente SGSST Interve	Consorcio Interventores	3202548911
5/02/2026 8:49:08	Diego Alejandro León Bello	1075652081	estructural.gibraltar1@gmail.com	Ingeniero Estructural	C.I.G	3165293927
5/02/2026 8:50:46	Bibiana Paola Sosa Linares	522996077	bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo a la supervisión S	IDRD	3134649125

55

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
5/02/2026 8:50:53	Samer Arias Sepúlveda	79627749	elecgibraltar@yahoo.com	Profesional en instalacio	Consorcio Interventoría (	202979450
5/02/2026 8:52:38	Daniela Prieto Rodriguez	1018490798	Daniela.prieto@idrd.gov.co	Apoyo presupuestal STC	IDRD	3022922354
5/02/2026 8:55:42	Cesar Fernandez Soler	80109419	contingencias.velodromo@ceroimpacto.com	Profesional ambiental de	UTMP	3002662060
5/02/2026 9:10:10	Andrés Galeano González	1022362548	presupuestosintergibraltar2@gmail.com	Residente de presupuest	CIG	3192385243
5/02/2026 9:12:11	Arturo Rojas Torres	13873937	interventoria.velodromo@gmail.com	Residente	CIG	3166420036
5/02/2026 9:24:22	Ivonn Pérez Téllez	1026279000	ivonn.perez@idrd.gov.co	Apoyo supervisión	IDRD	3223578250
5/02/2026 9:26:22	Andres Lengua	1065002731	profesionalvelhidraulico@gmail.com	PROFESIONAL HS-RCI	CONSORCIO INTERVENT	3106684608
5/02/2026 9:26:36	Ivonne Aguilar	1013601022	ivonne.aguilar@idrd.gov.co	Apoyo Transversal	IDRD-STC	3114002656
5/02/2026 9:27:13	Oscar Javier Sora Ortega	80761720	oscar.sora@idrd.gov.co	Apoyo Hidrosanitario STI	IDRD	3003101408
5/02/2026 9:42:57	Paula Blanco	1073383630	ambiental.velodromo@cyg.com.co	Residente ambiental	UTMP	3024219947
5/02/2026 9:51:12	CARLOS EDUARDO GUZMAI	79617588	residente1.velodromo@cyg.com.co	Residente Técnico	UTMP	3108685944



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

social

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Ejecución de actas de vecindad en zonas según posible ampliación de Parqueaderos verificar (*)	UTMP	Sin fecha	-
Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD	UTMP- CIG	09/02/2026	VIGENTE


(*) NOTA: dada la definición de intervención de la zona de parqueaderos verificar si habrá alguna posible afectación para el asentamiento actual del habitante de calle y los caninos.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

INFORME MENSUAL No. 24

FECHA	ACTIVIDAD
29 de enero del 2026	Se remite informe mensual del componente social mediante el radicado CE-206-125-2184.
	Se reciben observaciones mediante lista de chequeo por parte de la interventoría mediante el radicado CIG-IDRD-VEL-0061-2026
	Se realiza mesa de trabajo de revisión
	La firma contratista emite el informe con la atención a las recomendaciones. Mediante el oficio CE-206-125-2189
	Interventoría **aprueba** el informe mediante el numero de radicado CIG-IDRD-VEL-0064-2026

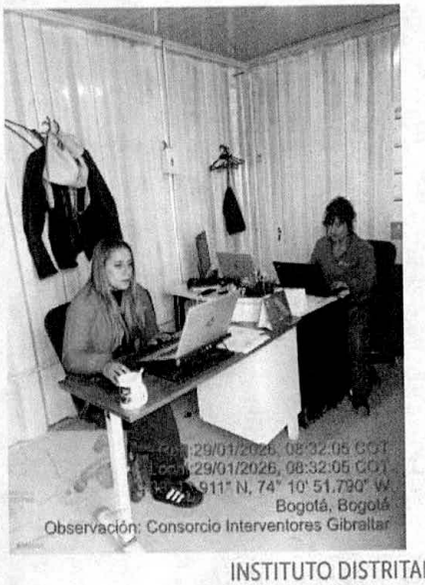

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

RELACIÓN PERSONAL – ENERO 2026

HISTÓRICO								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	535	41	46	10	14	0	60	475

REPORTE MENSUAL (Corte 25 de enero)								
Contratista	Empleos totales	Empleos mujeres	Empleos Jóvenes (18-28 años)	Población Extranjera	Empleo local	Personas con discapacidad	Empleos Directos (Temporales y Permanentes)	Empleos Indirectos
	146	24	24	1	12	0	48	98

ACTA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 22

El día lunes 26 de enero del 2026 se emite el acta para revisión de la interventoría


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

BOGOTÁ

ATENCIÓN AL CIUDADANO

SOLICITUDES	CANTIDAD
PQRS ABIERTAS	0
PQRS CERRADAS	23
PQRS EN TRÁMITE	0
TOTAL	**23**



El día lunes 26 de enero del 2026 se recibe tutela, la cual fue respondida por el área ambiental, SST y el área jurídica y notificada a interventoría mediante radicado CE-206-125-2180

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE AMBIENTAL

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (*)	CIG	29/01/2026	PENDIENTE
Propuesta de manejo de ZONAS VERDES (Oficio Obra No CE-206-125-2164 del 21/01/2026) respuesta CIG y/o traslado IDRD (**)	CIG	29/01/2026	PENDIENTE

(*) Oficio de Obra No CE-206-125-2163 (21/06/2025)

(**) Oficio de Obra No CE-206-125-2164 (21/06/2026)

COMPONENTE AMBIENTAL



Capacitación: Determinantes Ambientales (30/01/2026)



Protección de materiales




Mantenimiento de sumideros



Mantenimiento de árboles



Lavado de cárcamo y sedimentador

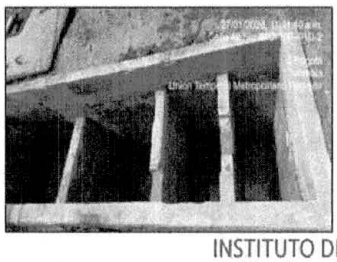

lavado de llantas

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	**56 710.319**	**85,51%**
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.500.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		**76.040.380**	**65 624.059**	**86,30%**

LIXIVIADOS	27.310 kg

Retiro de 7 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,82%
Circularidad: 19,33%

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS


BOGOTÁ


DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE
Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo y Reducción del Riesgo/Manejo de Desastres
Escenarios de Riesgo ER07-ER14/ PDCA – Ficha 3

BOGOTÁ

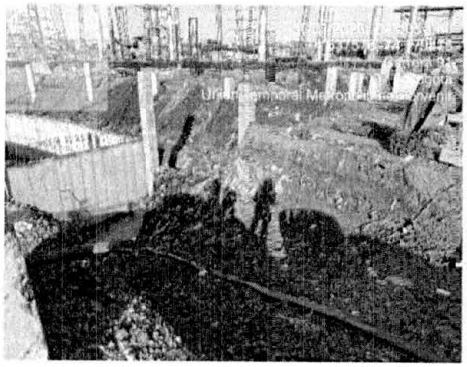

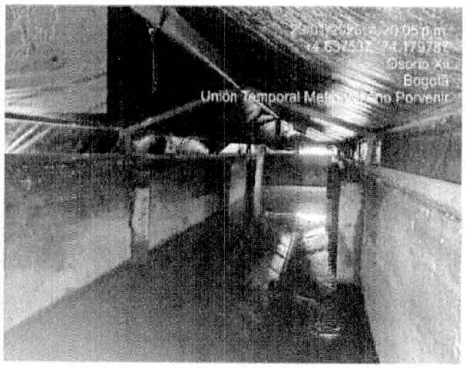



Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)

Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención

Retiro de lixiviados

Activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank, para su transporte y disposición final el 29/01/2026 (27.310 kg)

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14

BOGOTÁ



Monitoreo de Precipitación in situ

Verificación de precipitación acumulada diariamente mediante pluviómetro instalado en obra

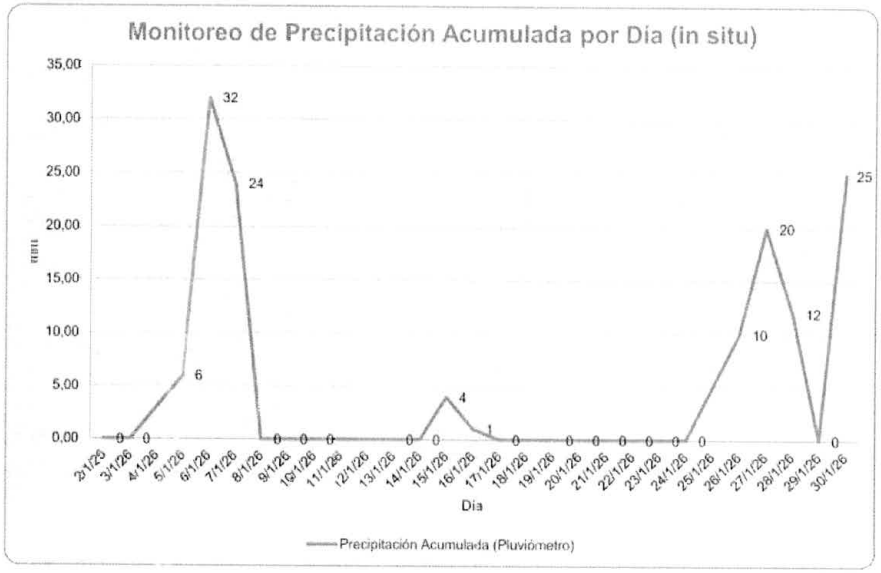

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER07
Reducción del riesgo ER07-ER09-ER14

BOGOTÁ




Abatimiento de nivel freático

Medición de nivel freático en los cuatro (4) pozos eyectores instalados en obra



Dique de contención perimetral de Catch Tank

Mantenimiento de dique de contención perimetral, evacuando agua lluvia empozada

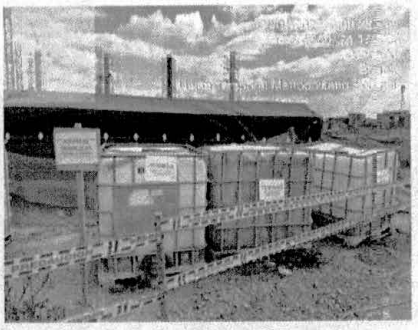


Cerramiento y señalización de zona de contención de lixiviados

Acopio de isotanques y catch tank

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13
Reducción del Riesgo ER09-ER10-ER15

BOGOTÁ

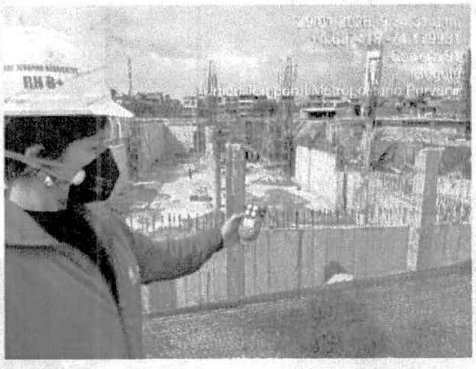

Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)



Inspección de vehículos

Inspección de vehículo carro cisterna, dispuesto para transporte y disposición final de lixiviados



Control de Olores

Jornadas de aplicación de CAL en zona excavadas como medida preventiva ante fuertes olores

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE SST

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


COMPROMISOS

BOGOTÁ


DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23	IDRD	Sin Fecha	Pendiente
Subsanación de observaciones efectuadas durante recorrido preliminar a comité de Obra No 96. (05/02/2026)	UTMP-CIG	12-06-2026	CUMPLIDO
Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Humana	UTMP-CIG	12-06-2026	Pendiente

PROMEDIO PERSONAL

REPORTE DE PERSONAL	
PROFESION	PROMEDIO 26/01/26 - 01/02/26
PROFESIONALES	26
COMISION TOPOGRAFIA	4
ALMACENISTA	2
MAESTRO	3
SUPERVISOR/ENCARGADOS	3
OFICIALES	24
AYUDANTES	31
HERREROS	11
OPERADORES	9
BACHEROS	2
CONDUCTORES	1
PERSONAL VIGILANCIA	2
TOTAL	118

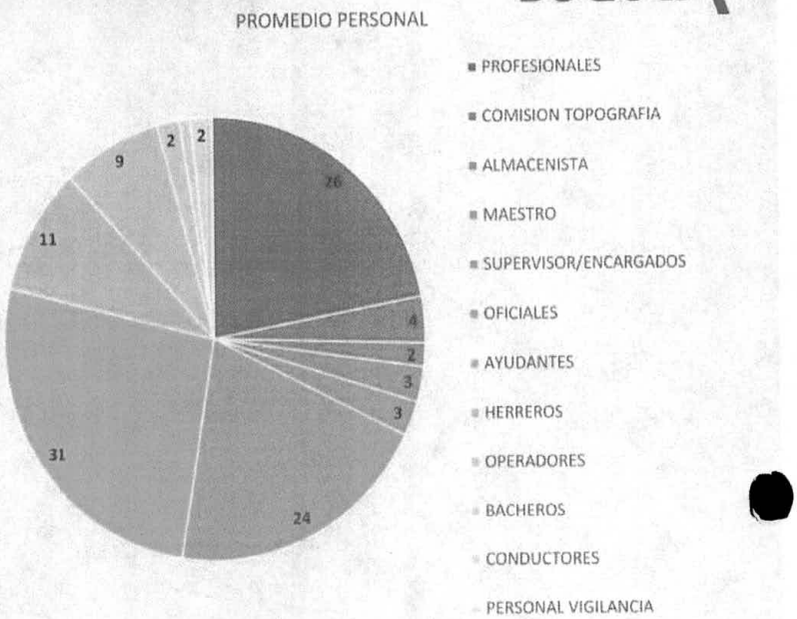

MAQUINARIA – EQUIPO Y VEHICULOS

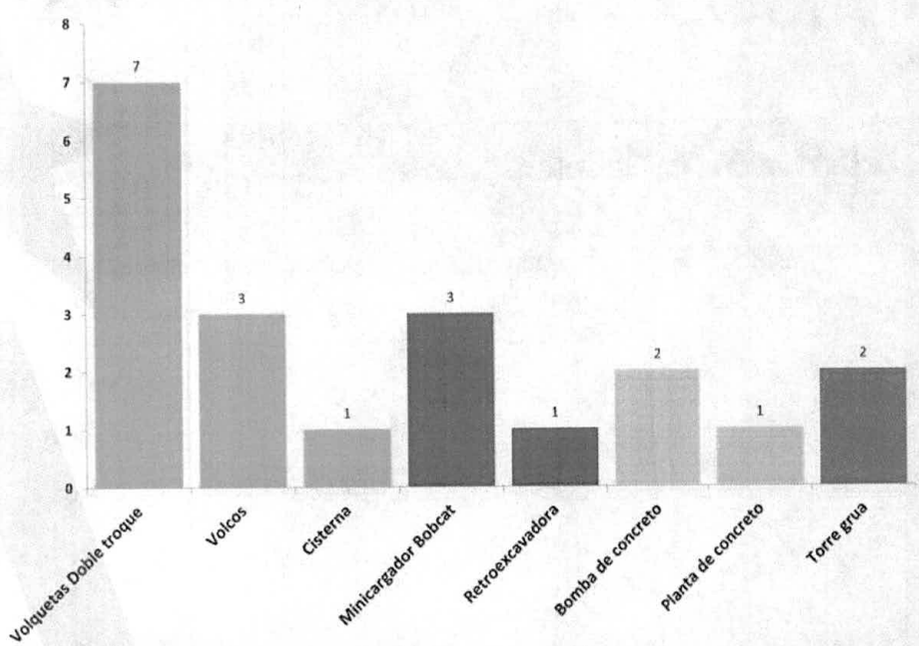



ACCIDENTALIDAD Y REPORTE DE AUSENTISMO

BOGOTÁ

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD		
MES	ACCIDENTES REPORTADOS	ESTADO ABIERTO/ CERRADO
feb -24 a dic - 24	3	CERRADOS
ene-25	0	N/A
feb-25	0	N/A
mar-25	1	CERRADO
abr-25	0	N/A
may-25	0	N/A
jun-25	0	N/A
jul-25	0	N/A
ago-25	0	N/A
sep-25	0	N/A
oct-25	0	N/A
nov-25	1	ABIERTO
dic-25	3	ABIERTOS
ene-26	0	N/A
TOTAL ACCIDENTES	8	

REPORTE DE AUSENTISMO	
MES	CANTIDAD AUSENTISTAS
feb -24 a dic - 24	11
ene-25	3
feb-25	3
mar-25	4
abr-25	3
may-25	4
jun-25	5
jul-25	5
ago-25	3
sep-25	2
oct-25	2
nov-25	4
dic-25	7
ene-26	6
TOTAL AUSENTISTAS	62

NOTA: **A la fecha se cuenta con 4 accidentes cerrados y 4 abiertos**

REGISTRO ACTIVIDADES SST


BOGOTÁ

Charlas en frente de obra





Induccion al personal

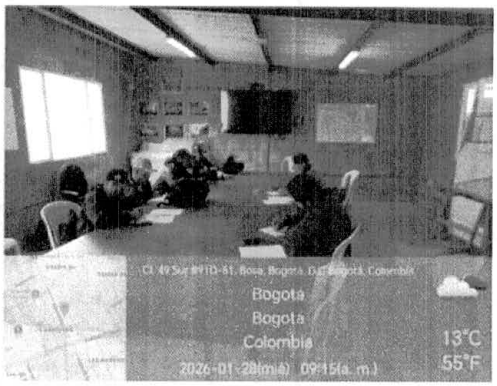


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Pausas activas

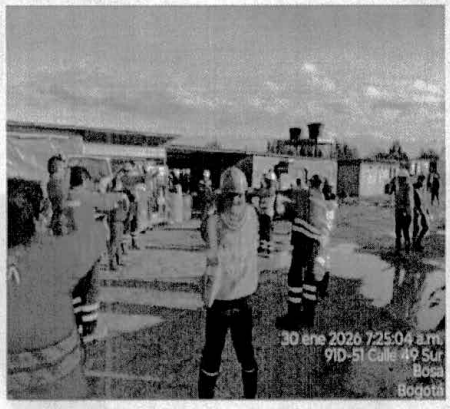







INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST


BOGOTÁ

Inspeccion actividades en alturas

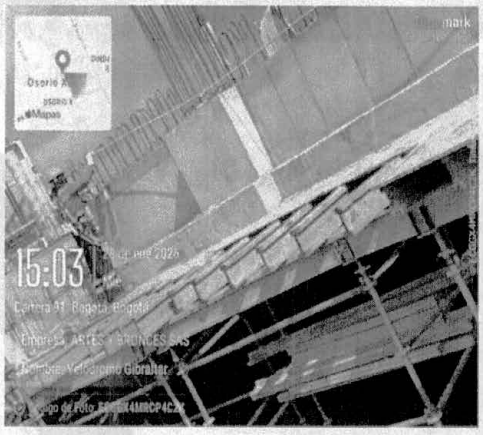

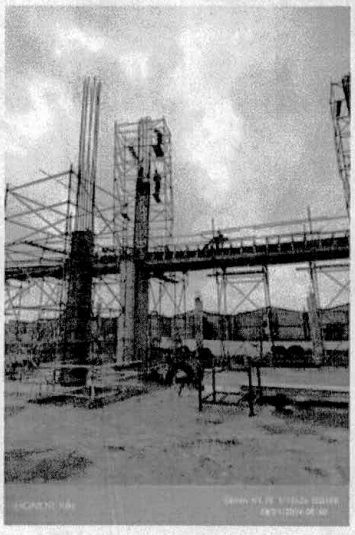

Inspeccion actividddes en excavaciones

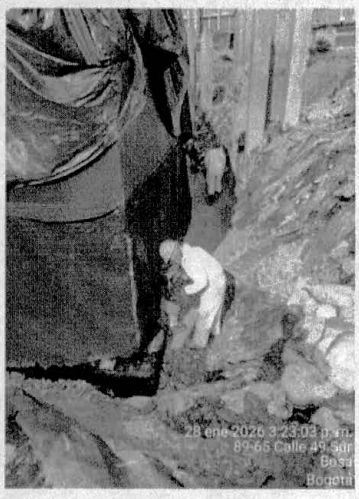


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACTIVIDADES SST

BOGOTÁ

Aseo unidades sanitarias





Inspeccion uso de dotacion y EPP en frente de obra




INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Niveladores sin soporte

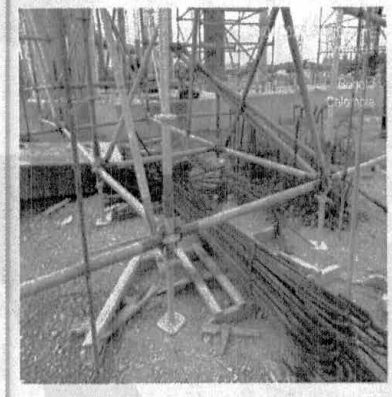


HALLAZGO



ACCION CORRECTIVA

Personal sin Tyvek compactando con el talud expuesto

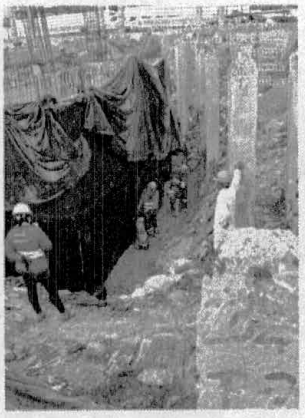

HALLAZGO




ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REGISTRO ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ

Personal sin línea de vida

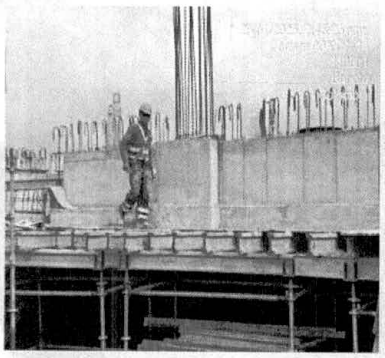


HALLAZGO




ACCION CORRECTIVA

Solicitud retiro de formaleta

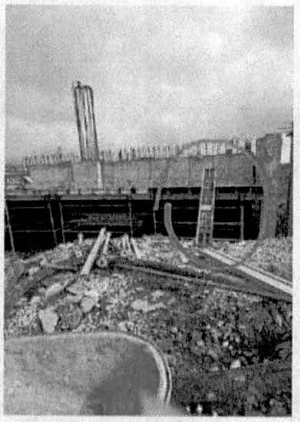

HALLAZGO

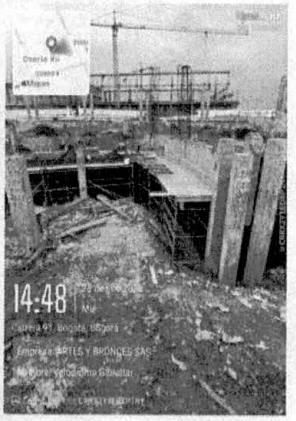

ACCION CORRECTIVA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

Componente
De Calidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad – anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar - (*)	UTMP	13/01/2026	Pendiente
Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (**) Revisión por parte de la Interventoría CIG	CIG	26/12/2025	Pendiente
Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD. (***)	CIG	20/01/2025	Pendiente


(*) Rad. CIG No CIG-IDRD-VEL-21-2026 del 13/01/2026 Y Alcance CIG-IDRD-VEL-42-2026 del 04/02/2026

(**) Rad. IDRD No 20264200013601 del 20/01/2025 Oficio Contratista de obra No CE-206-125-2150 del 13/01/2026

(***) Rad. IDRD No 20262100054772 02/02/2026 Hoja de vida Prof. Calidad Interventoría.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONCRETOS ESTRUCTURALES - TOTAL REAL 2712,08 m3

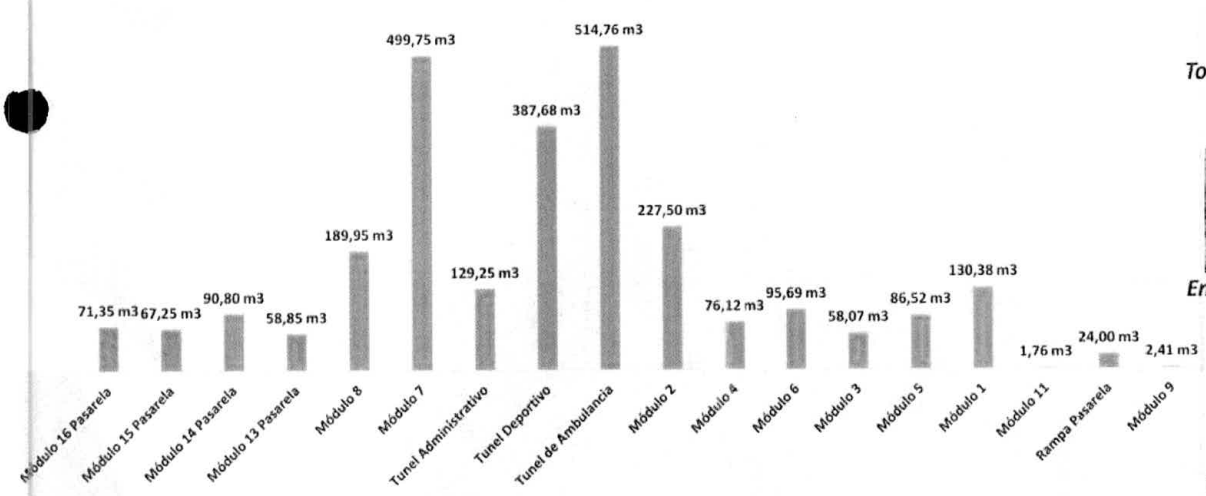

TOTAL SEMANA DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2026.

Concreto Estructural: *123,44* m3 **Muros** (Túnel de Ambulancia y Túnel Deportivo) **Columnas** (Módulo 1, Módulo 2, Módulo 4, Módulo 6 y Módulo 7 y Túnel de Ambulancia) y **Placa** (Módulo 5) y **Viga Aérea** (Módulo 1 en Módulo 7)

CEMEX **0 m3** *0%* ALTARA **123,44 m3** *100%*

BOGOTÁ

Total Concreto Fundidos
Última Semana
123,44 m3



Ensayo de Asentamiento
Conforme NTC 396




Toma de Muestras de
Concreto NTC 673



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Control de Aceros allegados al Proyecto
Total **540,99 Ton**

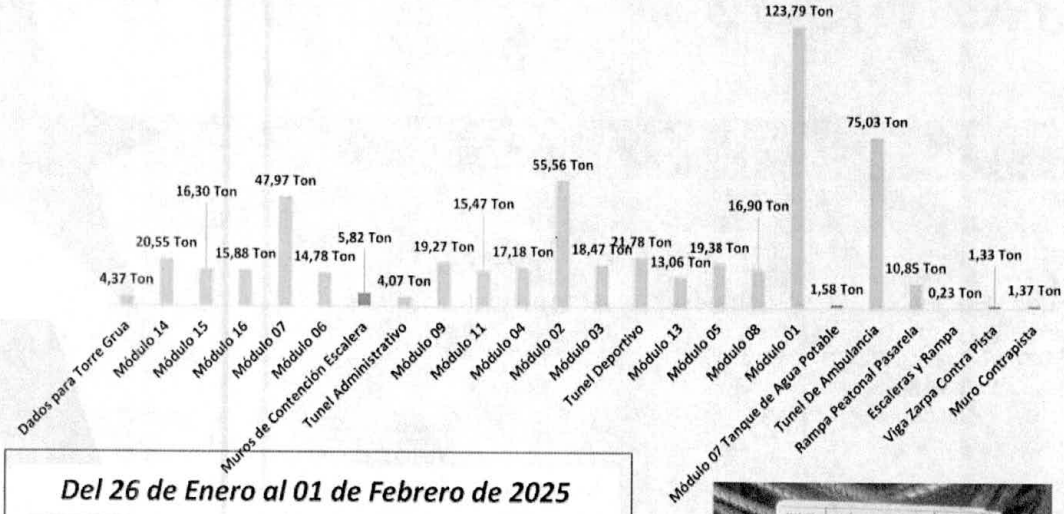

Del 26 de Enero al 01 de Febrero de 2025

*Se ingresaron **19,95 ton** para*
Muros Contrapista y Puntales y Vigas Túnel de Ambulancia



BOGOTÁ

CERTIFICADOS DE CALIDAD






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					28 Unds		**Total**	250,84 Ton

CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA





Elementos Ingresados del 26 al 01 de febrero de 2026:

2 Unds para 19,96 TON

TOTAL : 250,84 TON.

BOGOTÁ







INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UBICACIÓN DE SECCIONES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

Sección (tipo)	Cantidad (Unds)
CHP1	2 unds
CHP2	2 unds
CHP3	5 unds
CHP4	5 unds
CHP5	2 unds
CHP6	2 unds
CHP7	5 unds
CHP8	3 unds
PVC1	1 unds
PVC2	1 unds
Total	28 unds

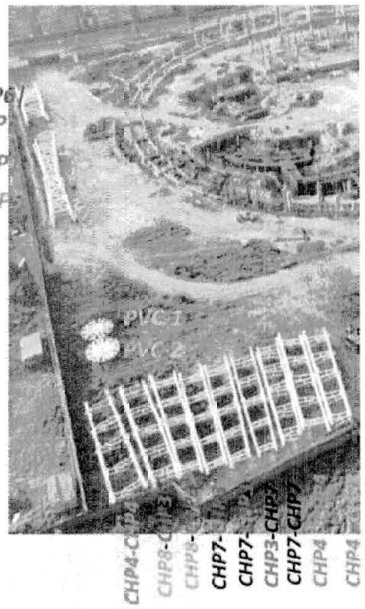

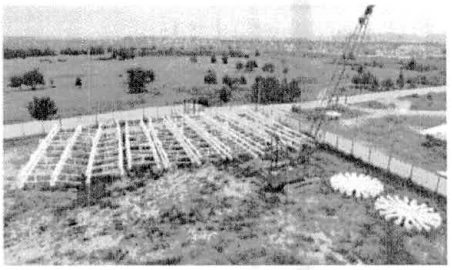

TOTAL

28 Unidades

para

250,84 Ton

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE CAMBIOS REDISEÑOS VELODROMO

No	COMPONENTE	ELEMENTOS	ESTADO	SOPORTE	En función de:
1	Estructura en Concreto	Módulo 14, 15 y 16 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-186-2025 del 14 de Marzo de 2025	Aprobado
		Tunel Administrativo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 7, 9 y 11	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-587-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulos 2 y 4	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-595-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulo 6 y tunel de apoyo a la Competición	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-594-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Módulos 3 y 8	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 5 y Módulo 10 Graderías	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-591-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Módulo 1	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-593-2026 del 01 de Agosto de 2025	Aprobado
		Modulos 12-13-Pista-Zc-T. Principal	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0539-2025 del 23 de Julio de 2025	Aprobado
		Rampa Peatonal Módulo 13 Pasarela	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-590-2026 del 31 de Julio de 2025	Aprobado
		Graderías Prefabricadas	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-642-2025 del 15 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diseño Estructural Pozos Eyectores Túneles	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-2036 mediante CIG-IDRD-VEL-0020-2026 del 13 de enero de 2026	Contratista
2	Estructura Metálica	Planos Estructurales (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0569-2025 del 26 de Julio de 2025	Aprobado
		Planos de Taller (Cerchas, Riostras, Correas, Lucarna)	Aprobado	Aprobado mediante Comunicado CIG-IDRD-VEL-0620-2025 del 08 de agosto de 2025	Aprobado
		Sistema de Apoyo (Conexión a la Estructura en concreto)	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0857-2025 del 30 de Octubre de 2025	Aprobado
		Pasarela de Mantenimiento	Pendiente	Se responde oficio CE-206-125-1918 mediante CIG-IDRD-VEL-830-2025 del 20 de Octubre de 2025	Contratista
		Estructura de Fachada	Pendiente	Rpta a oficio CE-206-125-2015 mediante CIG-IDRD-VEL-910-2025 del 27 de Noviembre de 2025	Contratista
3	Suministro RCI, Gas y Desgues	**Suministro**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0704 del 06 de Septiembre de 2025	Aprobado
		RCI	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0742 del 18 de Septiembre de 2025	Aprobado
		Gas	Pendiente	Se realizó Mesa de Trabajo 136 del 11 de Septiembre de 2025	Contratista
		Desagues	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0766-2025 del 30 de Septiembre de 2025	Aprobado
5	Paisajismo	**Paisajismo**	Pendiente	Aprobación Parcial **Pendiente definición de SUDS** - Comunicado CIG-IDRD-VEL-0778-2025 del 03 de Oct de 2025	Contratista
6	Eléctrico, Seguridad, Voz y Datos Comunicaciones, Apantallamiento y CCTV	**Tomas Alumbrado y Redes Eléctricas**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Detección, Seguridad, Voz Y Datos Y Comunicaciones	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
		Diagrama Unifilar y Memorias de Cálculo	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0430-2025 del 12 de Junio de 2025	Aprobado
		Diseño de Apantallamiento	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0488-2025 del 07 de Julio de 2025	Aprobado
		CCTV	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0686-2025 del 30 de Agosto de 2025	Aprobado
7	Arquitectura	**Componente de Arquitectura y Urbanismo del Proyecto**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025	Aprobado
		Cubierta Teja Domo Principal	Aprobado	Mediante la aprobación del componente de arquitectura oficio CIG-IDRD-VEL-0612-2025 del 06 de agosto de 2025 Se da aprobación a la cubierta del domo principal	Aprobado
		Pista Velodromo	Pendiente	Se radicó oficio CE-206-125-2188 de 28 de enero de 2026	Interventoria
8	Bioclimática	**Informe Componente Bioclimático**	Pendiente	Se radicó Oficio CE-206-125-1472 del 10 de Junio de 2025	Interventoria
9	HVAC	**Componente Aires Acondicionados y Ventilación Mecánica**	Aprobado	Oficio de Aprobación CIG-IDRD-VEL-0895-2025 del 12 de noviembre de 2025	Aprobado
10	Mecánico	**Ascensores**	Pendiente	Se radicó oficio CE-206-125-2176 del 27 de enero de 2026	Interventoria

MATERIAL DE LLENO PARA LOS TRASDÓS DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN

BOGOTÁ

✓ Mediante oficio **CIG-IDRD-VEL-0039-2026** del 22 de enero de 2026 se aprobó la caracterización para el material de lleno de los trasdós de los muros de contención que conforman los túneles del proyecto.

No	ENSAYO	REQUISITO	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
1	Desgaste de la máquina de los Angeles	< 50%	38%	OK
2	Degradación en el Equipo de Micro Deval	< 45%	25%	OK
3	Límites Líquido	< 30%	0%	OK
4	Indice de Plasticidad	< 6%	NP	OK
5	Equivalente de Arena	>20%	22%	OK
6	Contenido de Terrones de Arcillas y Partículas Deleznable	< 2%	0,6%	OK

Trasdos Túnel Administrativo

Material Granular Tipo PEA	285,00 m3

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

BIM

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS	UTMP - VANTI	26/08/2025	PENDIENTE
Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026. (*) Revisión y respuesta CIG – remitido a la entidad contratante vía Email 29/01/2026.	CIG	22/01/2025	PENDIENTE


(*) Oficio de Obra No CE-206-125-2188 del 28/01/2026,


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA

AVANCE GENERAL

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
8.309,397	2.878,500	0,00 % 34,64 % 100,00 %
Área total (m2)	**Área total fundida (m2)**	**% Avance**
25.186,48	6.663,97	0,00 % 26,46 % 100,00 %
Longitud total (m)	**Longitud total fundida (m)**	**% Avance**
20.458,84	6.158,50	0,00 % 30,10 % 100,00 %

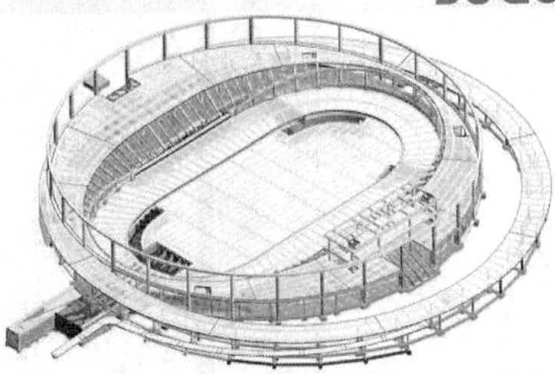

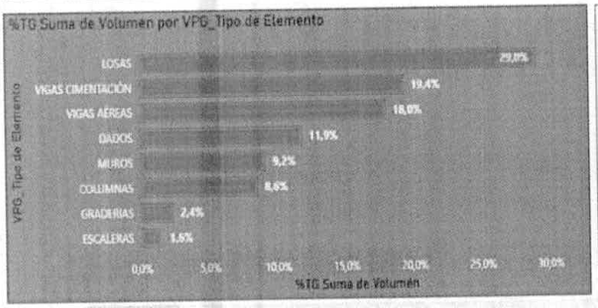



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 1


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
754,260	317,013	42.03 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
23,36	--	(En blanco)

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.551,26	651,02	41.97 %

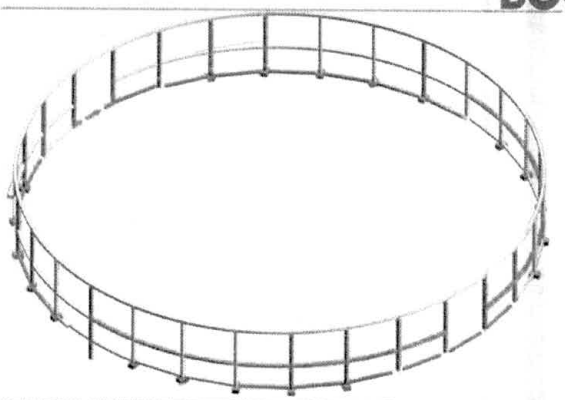

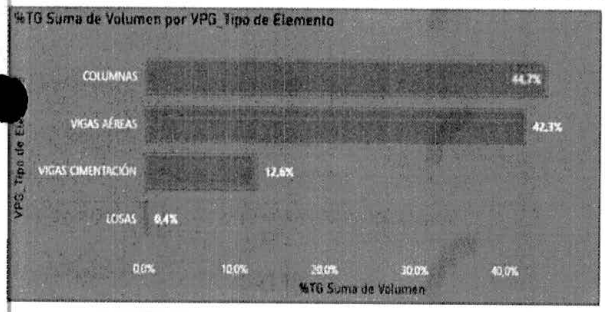


Tipo Elemento
COLUMNAS
LOSAS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
11/11/25
22/11/25
26/11/25
12/12/25
13/12/25
16/12/25
17/12/25
18/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 2


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
842,755	467,554	55.48 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.919,30	1.342,23	45.98 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.912,30	941,10	49.21 %

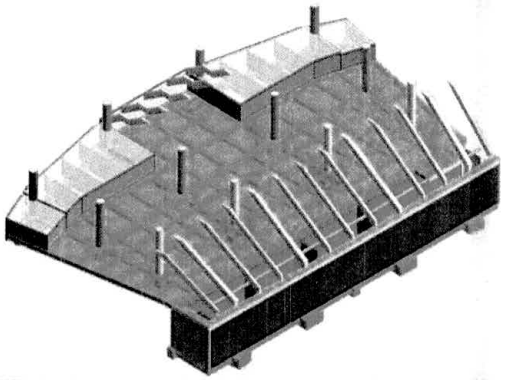

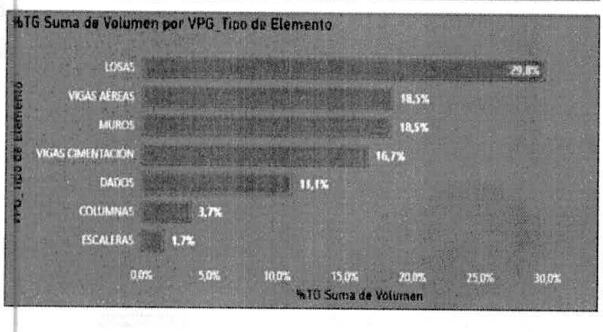

Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
9/01/25
11/11/25
13/11/25
20/11/25
28/11/25
5/12/25
6/12/25
9/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 4


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
265,440	97,635	36,78 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
860,39	311,24	36,17 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
868,91	273,03	31,42 %

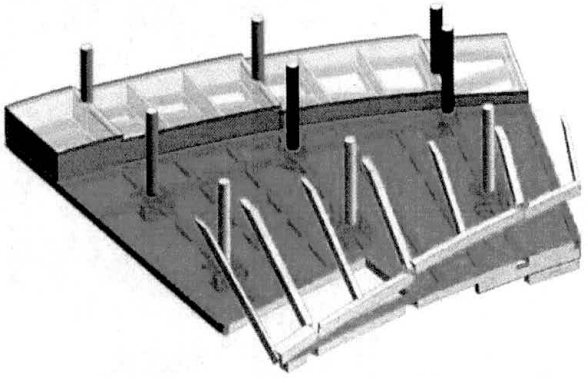

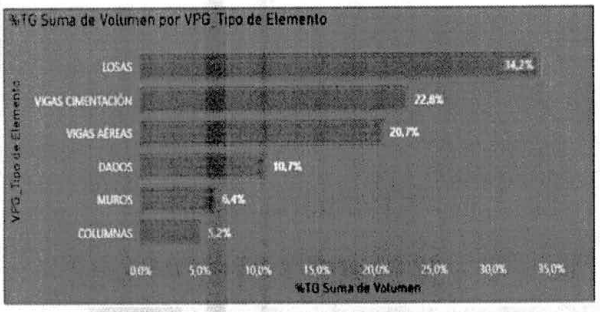


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 19/11/25
☐ 22/11/25
☐ 17/12/25
☐ 23/12/25
☐ 15/01/26
☐ 28/01/26
☐ 29/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
■ Módulo 04
☐ Módulo 05
☐ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 5


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
323,012	102,029	31,59 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
836,86	327,25	39,10 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
951,17	252,58	26,55 %



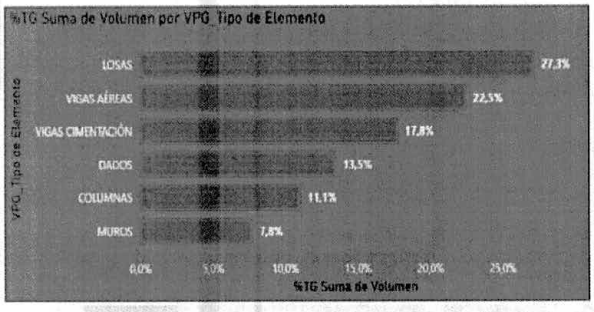


Tipo Elemento
☐ COLUMNAS
☐ DADOS
☐ LOSAS
☐ MUROS
☐ VIGAS AÉREAS
☐ VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
☐ (En blanco)
☐ 6/12/25
☐ 9/12/25
☐ 13/12/25
☐ 16/12/25
☐ 24/12/25
☐ 30/12/25
☐ 10/01/26
☐ 13/01/26

Ubicación
☐ Graderia
☐ Módulo 01
☐ Módulo 02
☐ Módulo 03
☐ Módulo 04
■ Módulo 05
☐ Módulo 06
☐ Módulo 07
☐ Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 6


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
318,075	104,663	0,00 % 32,91 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
839,01	277,38	0,00 % 33,06 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.058,64	264,74	0,00 % 25,01 % 100,00 %

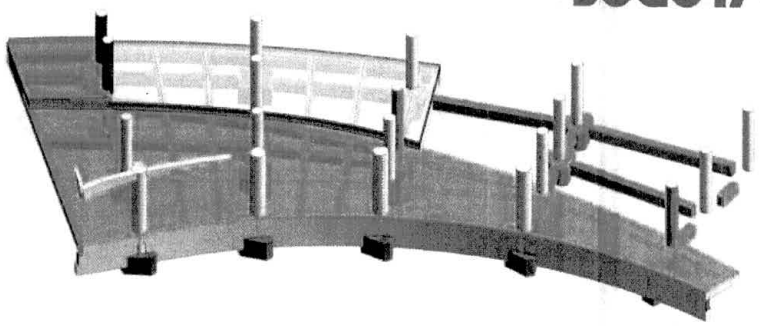

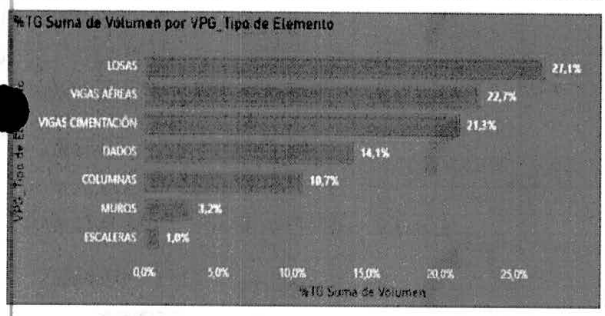


Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
15/11/25
19/11/25
22/11/25
24/11/25
17/12/25
29/12/25
31/12/25
5/01/26

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 7


BOGOTÁ

Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
899,227	435,703	0,00 % 48,45 % 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.863,22	1.145,34	0,00 % 40,00 % 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
2.494,50	971,40	0,00 % 38,94 % 100,00 %

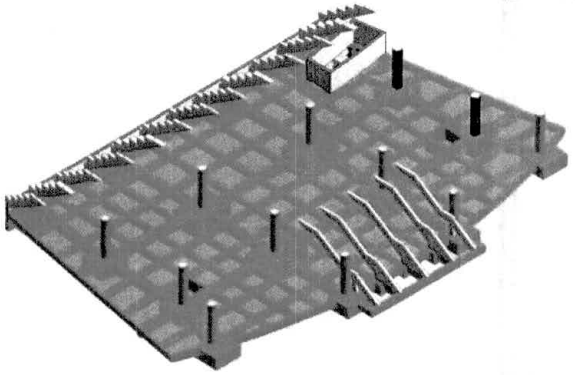

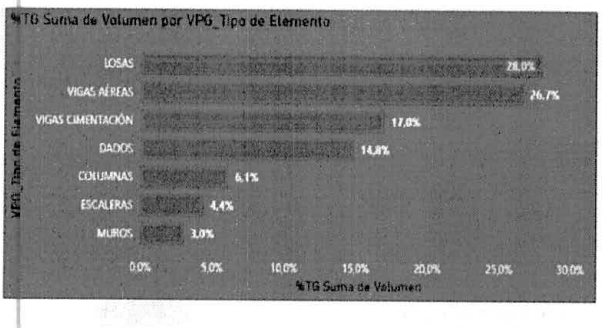


Tipo Elemento
COLUMNAS
DADOS
ESCALERAS
LOSAS
MUROS
VIGAS AÉREAS
VIGAS CIMENTACI...

Fecha Fundida
(En blanco)
20/11/25
22/11/25
25/11/25
26/11/25
3/12/25
10/12/25
12/12/25
15/12/25

Ubicación
Graderia
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08

ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


MÓDULO 12


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
191,718	8,558	0,00 % — 4,46 % — 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
559,51	--	0,00 % — (En blanco) — 100,00 %

Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
600,72	30,87	0,00 % — 5,14 % — 100,00 %

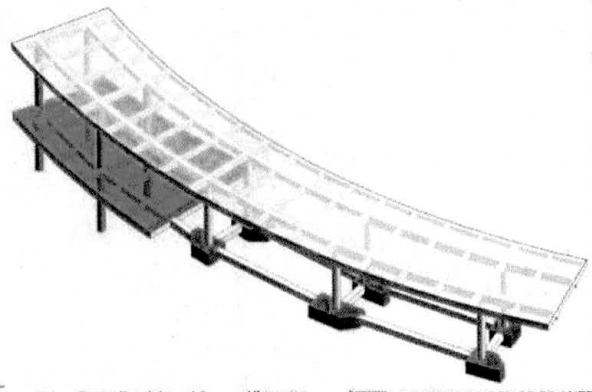

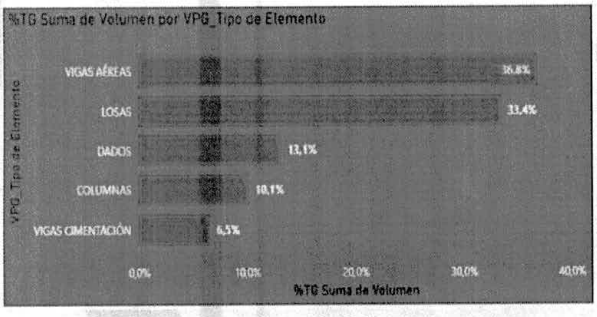



ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL - ESTRUCTURA


TÚNEL PRINCIPAL


BOGOTÁ


Volumen total (m3)	Volumen total fundido (m3)	% Avance
628,937	485,431	0,00 % — 77,18 % — 100,00 %

Área total (m2)	Área total fundida (m2)	% Avance
2.529,70	1.465,23	0,00 % — 57,92 % — 100,00 %


Longitud total (m)	Longitud total fundida (m)	% Avance
1.033,98	818,53	0,00 % — 79,16 % — 100,00 %

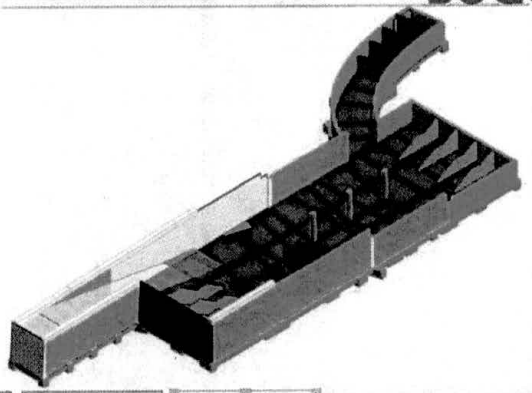

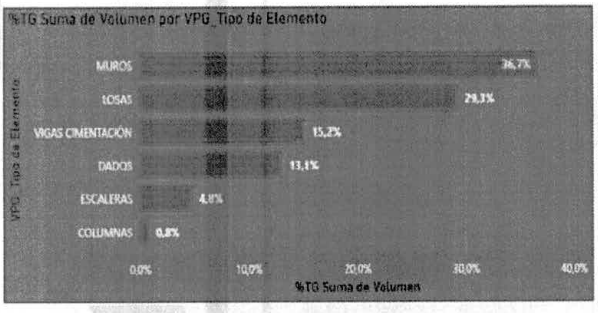

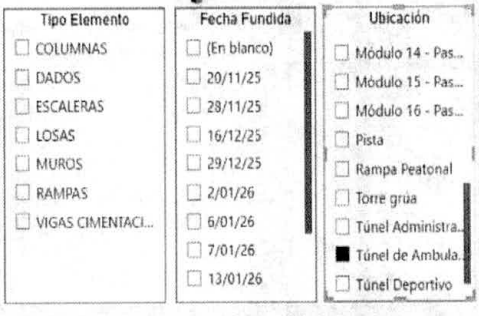


ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES
EJECUTADO PRESENTE PERIODO
PROYECTADO
EN EJECUCIÓN



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO Y CONTROL – COMPONENTE HIDROSANITARIO


AVANCE GENERAL

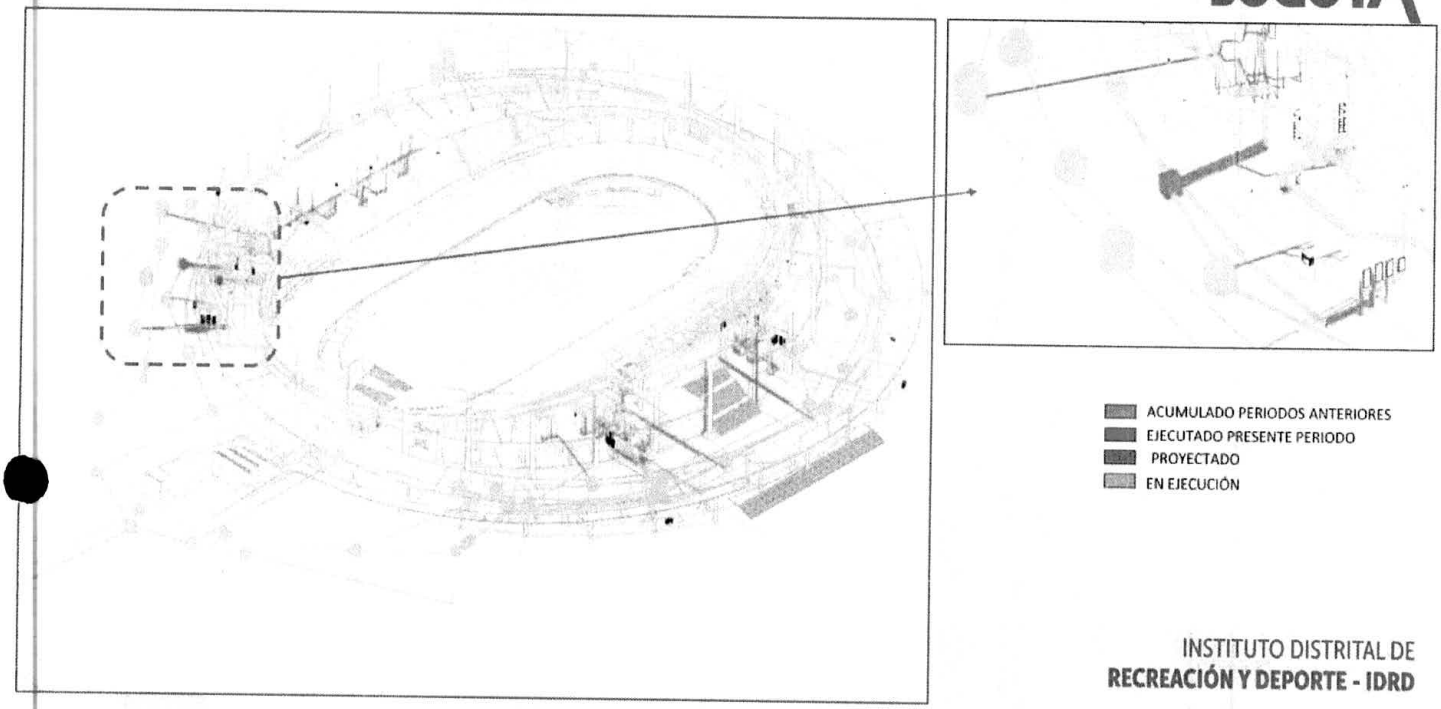

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SIMULACIÓN 4D

PROYECCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A 28 DE FEBRERO DE 2026

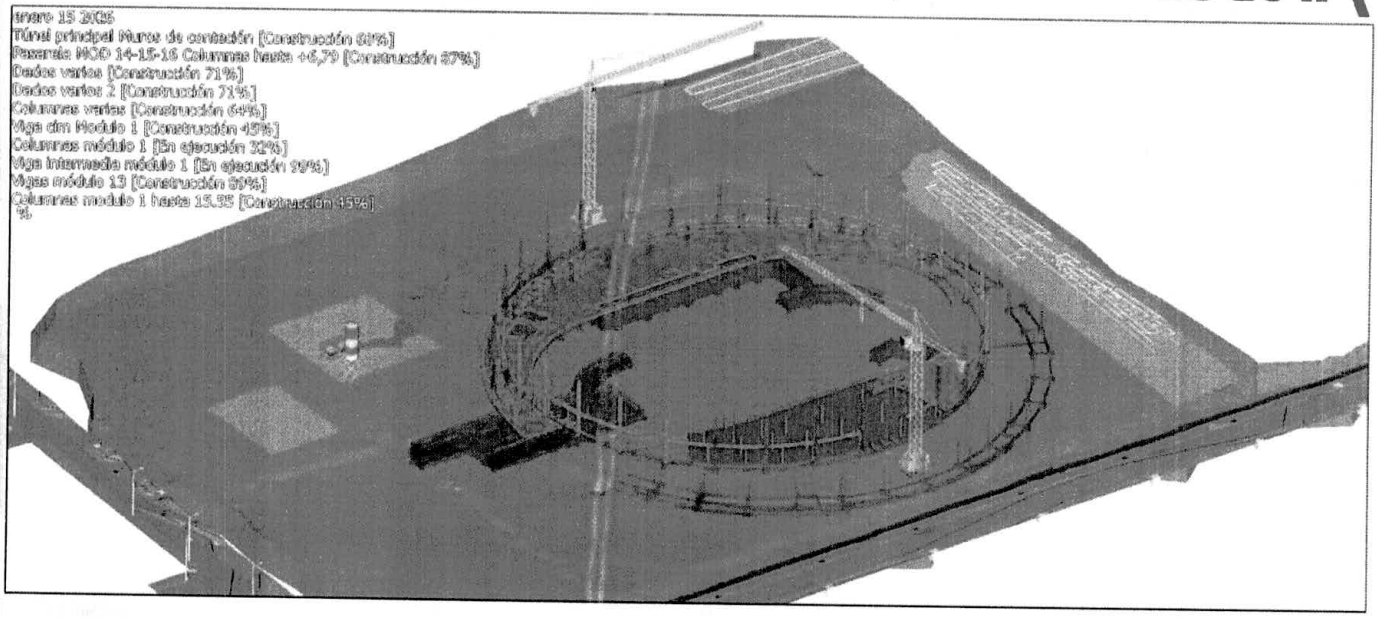

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE
DE PROGRAMACIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. (*)	UTMP	15/01/2026	PENDIENTE
Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (**)	UTMP	22/01/2026	Pendiente
Remisión de borrador de modificatorio No 3 Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD (**)	UTMP – CIG - IDRD	28/11/2025	CUMPLIDO
Remisión de borrador de modificatorio No 3 Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador por parte de interventoría CIG el 04/02/2026			
Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(***) Pendiente Respuesta IDRD.	UTMP – CIG - IDRD	16/01/2025	PENDIENTE

(*) Para el Modificatorio No 3 UTMP Oficios de Obra No CE-206-126- 2196 (Concretos) 2190 (Eléctricos) 2198 (Cubierta) 2186 (Hidráulicos) 2202 (Insumos) .

(**) Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link

(*** Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)


INFORMES INTERVENTORIA


		INFORMES TÉCNICOS DE INTERVENTORIA													
e_No	Fecha Rad. IDRD	Técnico	Fecha	Fauna	Fecha	Forestal	Fecha	SST	Fecha	Social	Fecha	Ambiental	Fecha	Calidad	Fecha
18	12/08/2025	Obs. IDRD	2/02/2026	OK	20/01/2025	OK	15/12/2025	OK	27/12/2025	OK	26/08/2025	OK	26/12/2025	Obs. IDRD	31/12/2025
19	10/09/2025	PR-IDRD		OK	20/01/2026	OK	24/12/2025	OK	16/01/2026	OK	10/09/2025	OK	19/01/2026	PR-IDRD	
20	16/10/2025	PR-IDRD		Sub. CIG	14/01/2026	OK	27/01/2026	PR-IDRD		OK	7/01/2026	OK	22/01/2026	PR-IDRD	
21	11/11/2025	PR-IDRD		Obs. IDRD	19/01/2026	Sub. CIG	29/01/2026	PR-IDRD		OK	7/01/2026	Sub. CIG	30/01/2026	PR-IDRD	
22	12/12/2025	PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		OK	7/01/2026	PR-IDRD		PR-IDRD	
23		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		PR-IDRD		OK		PR-IDRD		PR-IDRD	
(*)		7/01/2026		15/01/2026		16/01/2026		16/01/2026		2/01/2026	Pre-Aprobado	15/01/2026		15/01/2026	
24						PR-IDRD				PR-IDRD	3/02/2026				
(*)						4/02/2026				29/01/2026					

PR-IDRD	Pendiente Revision IDRD
Obs. IDRD	Observaciones IDRD (Sin Atender CIG)
Sub. CIG	Subsanacion CIG
OK	Aprobado

(*) De acuerdo a lineamiento de la entidad contratante se inicia remision via correo electronico de los informes por Componente para revision PRELIMINAR antes de radicacion FORMAL.

Fecha: Corresponde a la fecha de Revision y/o Aprobacion por parte del IDRD



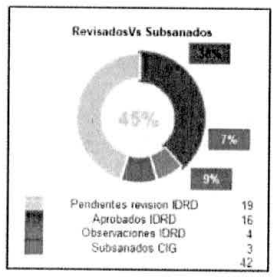

Mes	Desde	Hasta	No	Acta_Obra	Acta_Interventoria	Vr_Fasctura_Interventoria
jul-25	26/06/2025	25/07/2025	15	OK	PENDIENTE	$ 189.405.670,00
ago-25	26/07/2025	25/08/2025	16	OK	PENDIENTE	$ 11.096.625,00
sep-25	26/08/2025	25/09/2025	17	OK	PENDIENTE	$ 9.116.564,00
oct-25	26/09/2025	25/10/2025	18	OK	PENDIENTE	$ 47.440.544,00
nov-25	26/10/2025	25/11/2025	19	OK	PENDIENTE	$ 118.315.394,00
dic-25	26/11/2025	25/12/2025	20	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 59.987.253,00
			21	PR-IDRD	PENDIENTE	$ 61.713.965,00
ene-26	26/12/2025	25/01/2026	22	PENDIENTE	PENDIENTE	$ 73.608.840,00
	Valor de Actas parciales de interventoria a presentar					$ 570.684.855,00

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


05/02/2026

REPORTE

VALOR CONTRACTUAL	$	132.821.646.606
ADICIÓN	$	14.965.010.422
VALOR ACTUAL	$	147.786.657.028

	VALOR	%
% PROGRAMACIÓN	$ 86.604.721.831	58,60%
% EJECUCIÓN	$ 78.546.551.319	53,15%
% COSTO	$ 78.546.551.319	53,15%

AVANCE	-5,45%

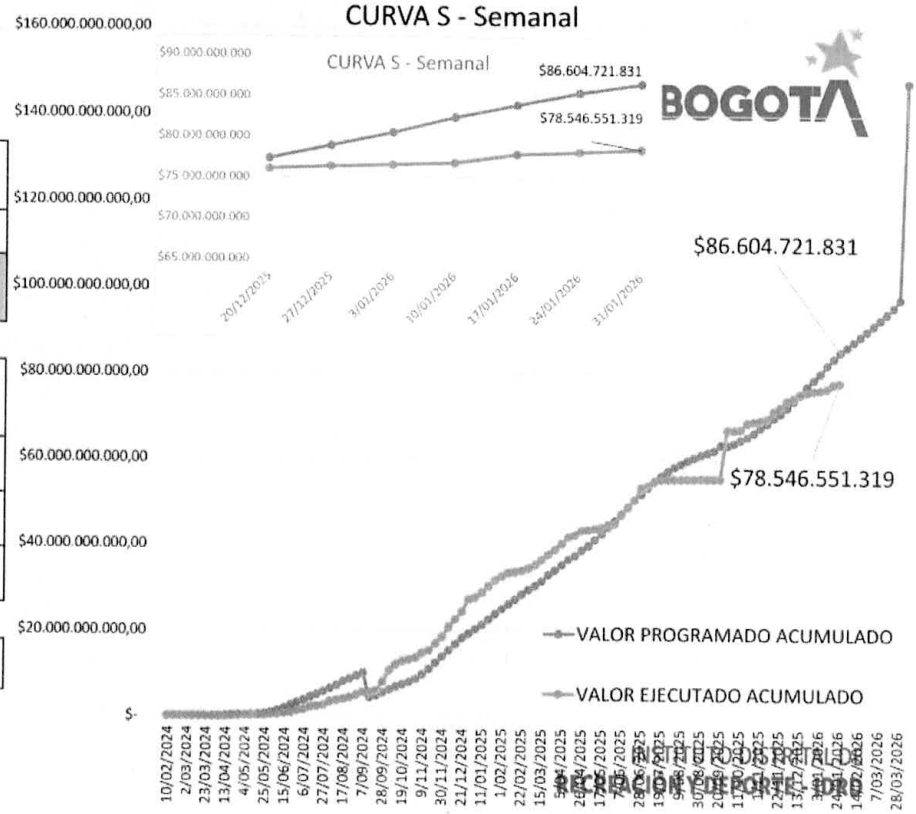

31/01/2026 **programación v3**

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -001 A FE-010	2024	MAYO - DICIEMBRE	$ 27.374.118.341,00	$ 8.212.235.501,80	$ 19.161.882.839,20

No	AÑO	MES	VALOR TOTAL ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR POR PAGAR
FE -011	2025	ENERO	$ 7.209.929.320,00	$ 2.162.978.796,00	$ 5.046.950.524,00
FE -012	2025	FEBRERO	$ 3.367.328.780,00	$ 1.010.198.634,00	$ 2.357.130.146,00
FE -013	2025	MARZO	$ 5.546.297.095,00	$ 1.663.889.129,00	$ 3.882.407.966,00
FE -014	2025	ABRIL	$ 9.368.946.249,00	$ 2.810.683.875,00	$ 6.558.262.374,00
FE -015	2025	MAYO	$ 2.543.110.525,00	$ 762.933.158,00	$ 1.780.177.367,00
FE -016 FE-017	2025	JUNIO	$ 7.681.163.025,00	$ 2.281.206.338,00	$ 5.399.956.687,00
FE -018	2025	JULIO	$ 3.674.169.910,00	$ 1.102.250.973,00	$ 2.571.918.937,00
FE -019	2025	AGOSTO	$ 215.256.944,00	$ 64.577.083,00	$ 150.679.861,00
FE -020	2025	SEPTIEMBRE	$ 176.846.897,00	$ 53.054.069,00	$ 123.792.828,00
FE -021	2025	OCTUBRE	$ 787.676.923,00	$ 236.303.077,00	$ 551.373.846,00
FE -022	2025	NOVIEMBRE	$ 2.295.131.185,00	$ 688.539.356,00	$ 1.606.591.829,00
FE -025	2025	DICIEMBRE (1)	$ 1.163.657.669,00	$ 349.097.301,00	$ 814.560.368,00
FE -026	2025	DICIEMBRE (2)	$ 1.197.153.149,00	$ 359.145.945,00	$ 838.007.204,00
TOTAL 2025			$ 45.226.667.670,00	$ 13.544.857.734,00	$ 31.681.809.936,00
TOTAL VELODROMO			$ 72.600.786.011,00	$ 21.757.093.237,00	$ 50.843.692.774,00

BOGOTÁ


FACTURACIÓN DEL PROYECTO


MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURACIÓN: 49,13%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

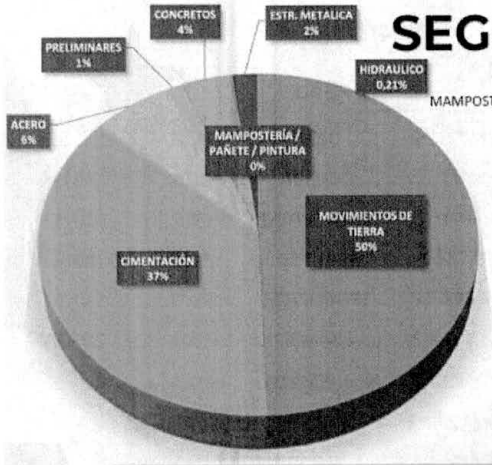

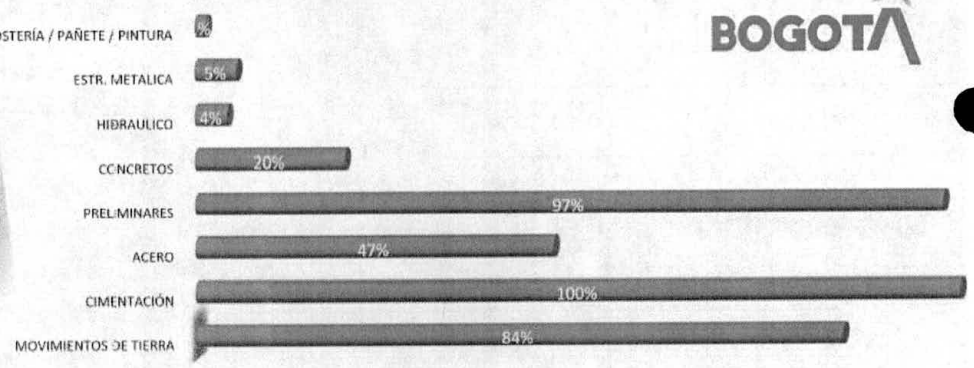

CAPITULO	EDIFICIO	PARQUEADERO	PASARELA	URBANISMO	Total general
MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 29.039.811.739,00	$ 2.027.520.332,00	$ 1.328.771.833,00	$ 3.483.648.727,00	$ 35.879.752.631,00
CIMENTACIÓN	$ 22.926.493.134,00	$ 1.282.506.870,00	$ 48.922.704,00	$ 2.470.714.394,00	$ 26.728.637.102,00
ACERO	$ 4.281.404.655,00		$ 178.635.272,00		$ 4.460.039.927,00
CONCRETOS	$ 2.583.091.466,00		$ 296.469.765,00		$ 2.879.561.231,00
ESTR. METALICA	$ 1.410.193.053,00				$ 1.410.193.053,00
PRELIMINARES	$ 600.171.941,00	$ 49.314.552,00	$ 15.597.565,00	$ 330.780.282,00	$ 995.864.340,00
HIDRAULICO	$ 155.364.820,00				$ 155.364.820,00
MAMP/PAÑETE/PINTURA	$ 14.231.007,00				$ 14.231.007,00
Total general	**$ 61.010.761.815,00**	**$ 3.359.341.754,00**	**$ 1.868.397.139,00**	**$ 6.285.143.403,00**	**$ 72.523.644.111,00**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
TUNEL DE APOYO TUNEL ADMINISTRATIVO TUNEL PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO DE DURABILIDAD A/C 0,40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 - PRODUCTO BOMBEABLE, CON UN ESPESOR DE 0,30 M. PARA ALTURA HASTA 4.60 M, INCLUYE FORMALETA SÚPER T, VIBRADO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DE LA FORMALETA EN SU SITIO DE ACUERDO A LOS HILOS, MEDIDAS Y TRAZOS INDICADOS EN LOS PLANOS, LO MISMO QUE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE EXTERNO E INTERNO Y COLOCACIÓN DENTRO DEL MOLDE POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, DEL CONCRETO NECESARIO, EN LAS CARACTERÍSTICAS, SECCIONES Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE LA OBRA. EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA FORMALETA EN SU SITIO, TALES COMO TACOS, PARALES, PASADORES, TENSORES, ETC., QUE SE REQUIERA. DEBERÁ TAMBIÉN DAR EL CURADO NECESARIO Y RETIRAR LAS FORMALETAS CUANDO EL CONCRETO HAYA ALCANZADO SU CURADO INICIAL. LA INTERVENTORÍA INDICARÁ DONDE Y CUANDO DEBEN HACERSE REPARACIONES U ORDENARÁ LA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN, POR CUENTA DEL CONTRATISTA, DEL ELEMENTO CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	JUNTA TANQUE EN CINTA PVC SIKA O-22 O SIMILAR CDRC	CONTINUA
	IMPERMEABILIZACION MUROS DE CONTENCION CON IGOL IMPRIMANTE + IGOL DENSO O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, EQUIPOS, TRASIEGO, MANO DE OBRA).	CONTINUA

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

BOGOTÁ

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULOS 1, 2, 4, 5 Y 6	CONSTRUCCIÓN DE DADOS EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 RESISTENCIA MINIMA 350KG/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0,4 Resistencia mínima 350 KG/cm2. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. INCLUYE ACARREO INTERNO. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN EN CONCRETO DURABILIDAD A/C 0.40 RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 0,20 M. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, VIBRADO, PROTECCIÓN Y CURADO, PARA ESTRUCTURAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y DISEÑOS. NO INCLUYE REFUERZO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 60 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 80 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO DE 35 MPA. DIÁMETRO DE 100 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FLUIDIFICANTE PARA MEZCLAS DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA PARA ACABADO A LA VISTA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISEÑO. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.	CONTINUA
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (DUCTOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y REDES)	CONTINUA


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

ZONA	ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	INICIO
MODULO 7	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.60 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS DE 0.70 X 0.70 M. EN CONCRETO DE 35 MPA, CON UNA ALTURA DESDE 8.00M HASTA 14.00M MEDIDOS DESDE EL NIVEL DE APOYO DE LA OBRA FALSA HASTA EL NIVEL INFERIOR DE LA VIGA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, FORMALETA DE PRIMERA CALIDAD EN SÚPER T DE 19 MM O EQUIVALENTE, PARA ACABADO A LA VISTA, ARISTAS BISELADAS, SUMINISTRO, TRANSPORTE, ARMADO Y DESARMADO DE LA OBRA FALSA REQUERIDA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS. EN EL VACIADO SE DEBEN DEJAR LOS HIERROS PARA EL AMARRE DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES QUE SE REQUIERAN, POR NINGÚN MOTIVO SE PAGARÁN ANCLAJES.	INICIA
ESTRUCTURA METÁLICA	ESTRUCTURA METALICA CDRC (MATERIALES, FABRICACIÓN Y MONTAJE)+LIMPIEZA+IMPRIMANTE+ACABADO (SUM+INST).	CONTINUA

ANTICIPO

ANTICIPO	$ 39.846.493.982,00	
ANTICIPO (RETENCIONES)	$ 37.854.169.283,00	
	VALOR	%
VALOR GIRADO	$ 35.535.169.187,51	94%
SALDO	$ 2.319.000.095,49	6%
AMORTIZACIÓN EN ACTAS	$ 21.048.849.991	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 18.797.643.991,00	

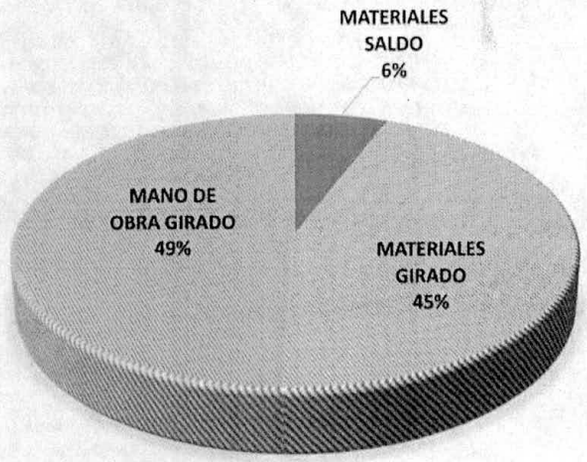

RUBRO PLAN	GIRADO	SALDO
MATERIALES	$ 19.151.336.220,49	$ 2.319.000.095,49
MANO DE OBRA	$ 18.702.833.062,51	

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

TÉCNICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (*) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP	UTMP-CIG-IDRD	Sin fecha	PENDIENTE
Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socia izar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD	UTMP - CIG - IDRD	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942.

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

MATERIAL EN PLANTA

MES	CANTIDAD
Abril 2025	60,90 Ton
Mayo 2025	230,10 Ton
Junio 2025	36,98 Ton
Julio 2025	97,53 Ton
Agosto 2025	486,91 Ton
Septiembre 2025	0,00 Ton
Octubre 2025	0,00 Ton
TOTAL	**912,42 Ton**

TOTAL EN PLANTA: ***912,42 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton

% AVANCE ALLEGADO: **83,93%**

MATERIAL INGRESADO A PRODUCCIÓN

Mes	PERIODO	CANTIDAD
jun-25	02 al 29 de Junio de 2025	23,34 Ton
jul-25	29 de Junio al 27 de Julio de 2025	11,14 Ton
ago-25	28 de Julio al 31 de Agosto de 2025	37,85 Ton
sep-25	01 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2025	67,96 Ton
oct-25	29 de Septiembre al 26 de Octubre de 2025	35,74 Ton
nov-25	27 de Octubre al 20 de Noviembre de 2025	51,87 Ton
dic-25	01 de Diciembre al 04 de Enero de 2026	27,09 Ton
ene-26	05 de Enero al 11 de Enero de 2026	11,33 Ton
ene-26	12 de Enero al 18 de Enero de 2026	9,15 Ton
ene-26	19 de Enero al 25 de Enero de 2026	10,57 Ton
ene-26	26 de Enero al 01 de Febrero de 2026	17,86 Ton
	TOTAL EN PRODUCCIÓN A LA FECHA	303,90 Ton

TOTAL EN PRODUCCIÓN: ***303,90 Ton***

TOTAL PROYECTADO: 1087 Ton


% AVANCE PCC: **27,96%**

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA

No	Remisión	Fecha de Ingreso	Elemento	Conjunto	Cantidad	Peso/Unidad	Total Kg	Total (Ton)
1	1	16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP6	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
2		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP2	2 Unds	7021,29 Kg	14042,58 Kg	14,04 Ton
3		16-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP1	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
4	2	27-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP5	2 Unds	13980,01 Kg	27960,02 Kg	27,96 Ton
5	3	31-oct-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	2 Unds	9995,85 Kg	19991,70 Kg	19,99 Ton
6	4	1-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
7	5	12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,96 Ton
8		12-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
9	6	20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
10		20-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
11	7	28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
12		28-nov-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
13	8	7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
14		7-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP3	1 Unds	6619,18 Kg	6619,18 Kg	6,62 Ton
15	9	16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
16		16-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
17	10	23-dic-25	CERCHA PRINCIPAL	CHP7	1 Unds	6649,76 Kg	6649,76 Kg	6,65 Ton
18		23-dic-25	PIVOTE CENTRAL	PVC1	1 Unds	8417,42 Kg	8417,42 Kg	8,42 Ton
19	11	10-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
20	12	18-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
21	13	18-ene-26	PIVOTE CENTRAL	PVC2	1 Unds	12199,30 Kg	12199,30 Kg	12,199 Ton
22	14	28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP4	1 Unds	9995,85 Kg	9995,85 Kg	9,996 Ton
23		28-ene-26	CERCHA PRINCIPAL	CHP8	1 Unds	9964,20 Kg	9964,20 Kg	9,964 Ton
					28 Unds		**Total**	250,84 Ton


CONTROL DE INGRESO ESTRUCTURA METÁLICA




Elementos Ingresados del 26 al 01 de febrero de 2026:

2 Unds para 19,96 TON


TOTAL : 250,84 TON.






INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MUROS TÚNEL DE AMBULANCIA– Zonas 25 al 27

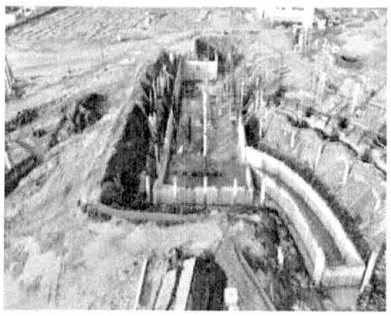

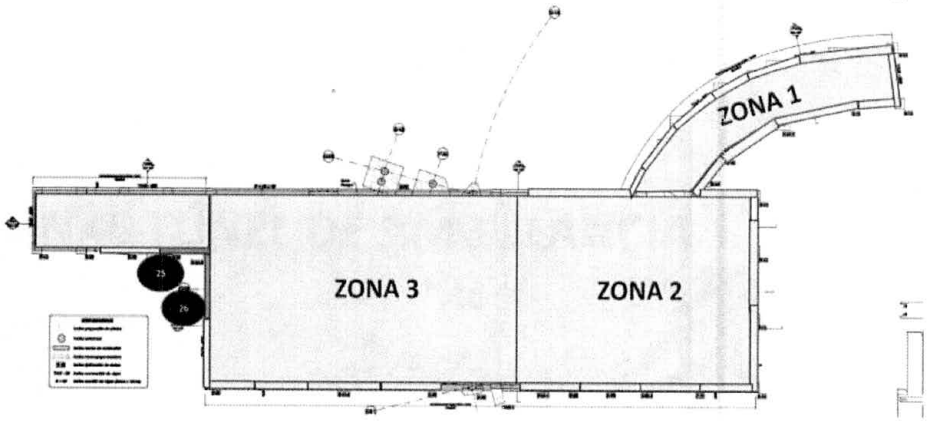

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS TÚNEL DE AMBULANCIA



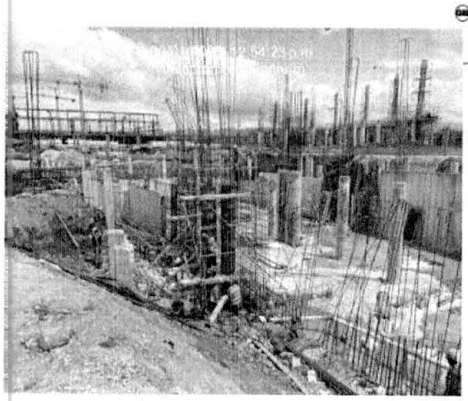


Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO TAM – E03
PLANTA DE CIMENTACIÓN TUNEL DE AMBULANCIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS MÓDULO 7 – ZONA DE EDIFICIO

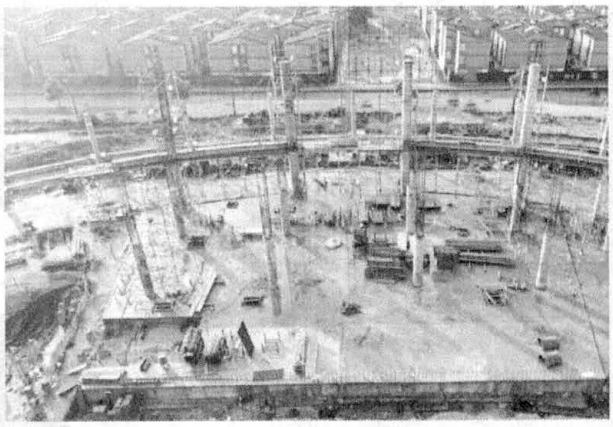

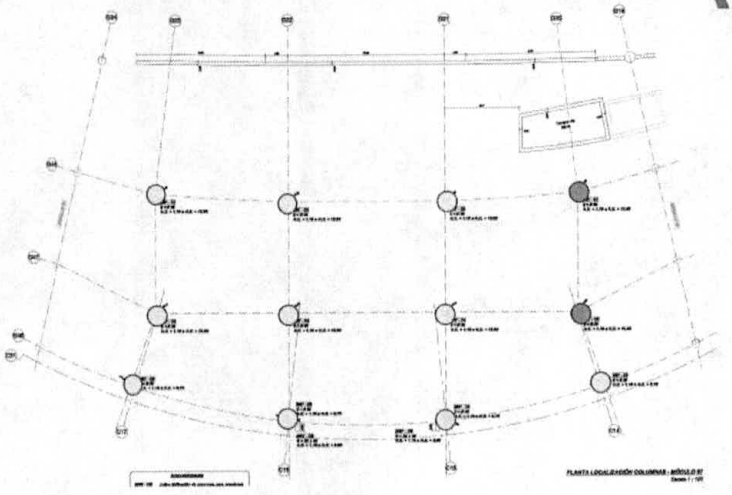

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

PLANO M7 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS – MÓDULO 08

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE PLACA MÓDULO 5






Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M5 – E01
PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 05

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD


FUNDIDA DE COLUMNA DE CUBIERTA MÓDULO 1

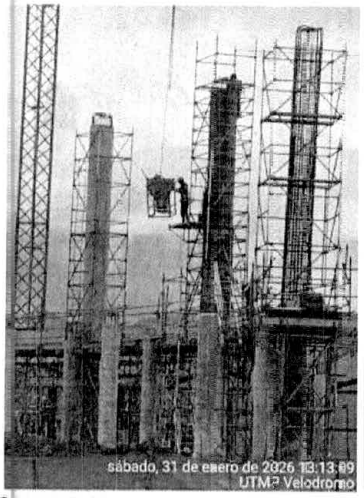

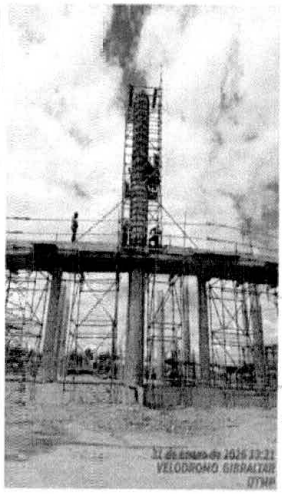

Zona Vaciada en el Periodo

Zona Vaciada Previamente

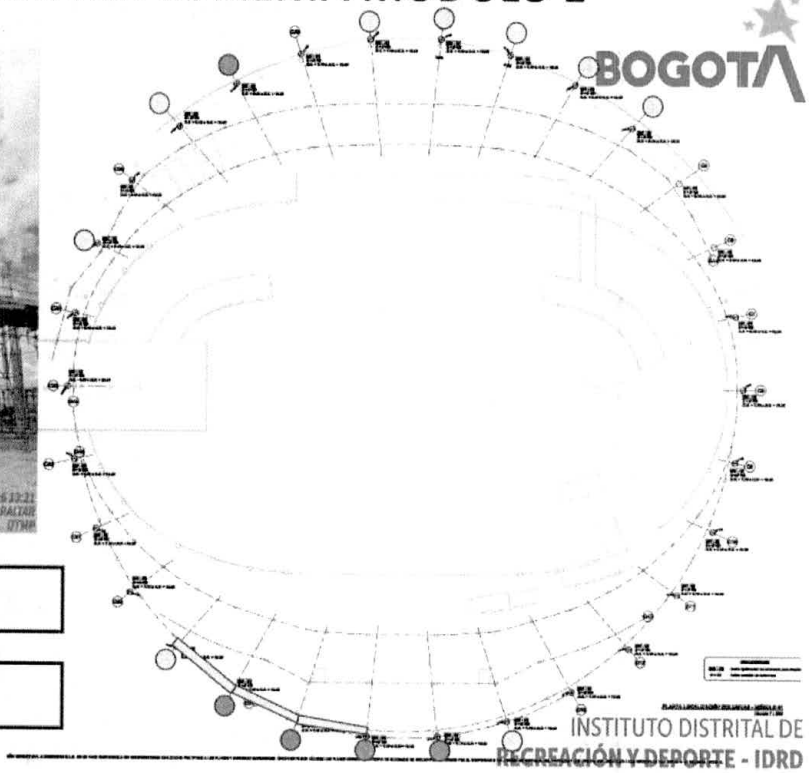


BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE DADOS, VIGAS MÓDULO 6– ZONA DE EDIFICIO

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

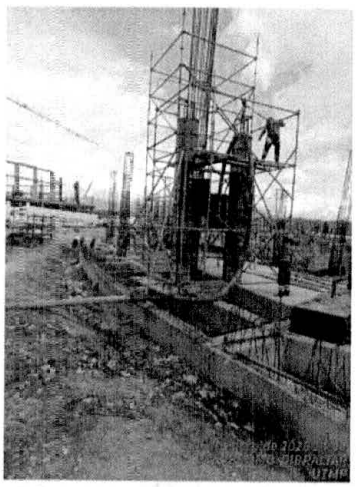




BOGOTÁ

PLANO M6-E01

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS Y MUROS Y CIMENTACIÓN – MÓDULO 6

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE COLUMNAS– MÓDULO 4

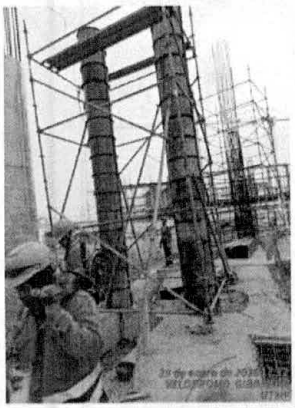

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo



PLANO M4 – E02
PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 Y LOCALES – MÓDULO 04


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MURO TUNEL DEPORTIVO Y COLUMNA MÓDULO 2 ZONA DE EDIFICIO

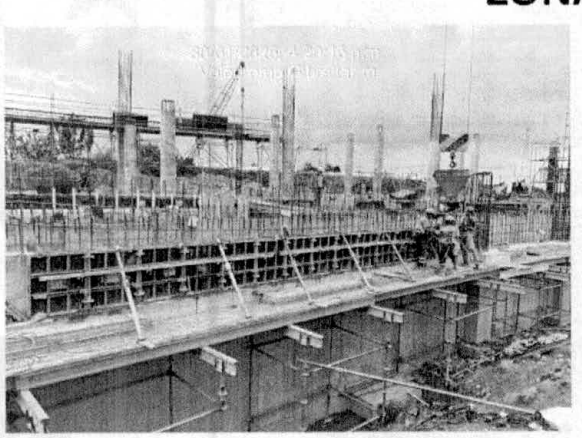

Zona Fundida Previamente

Zona Fundida en el Periodo

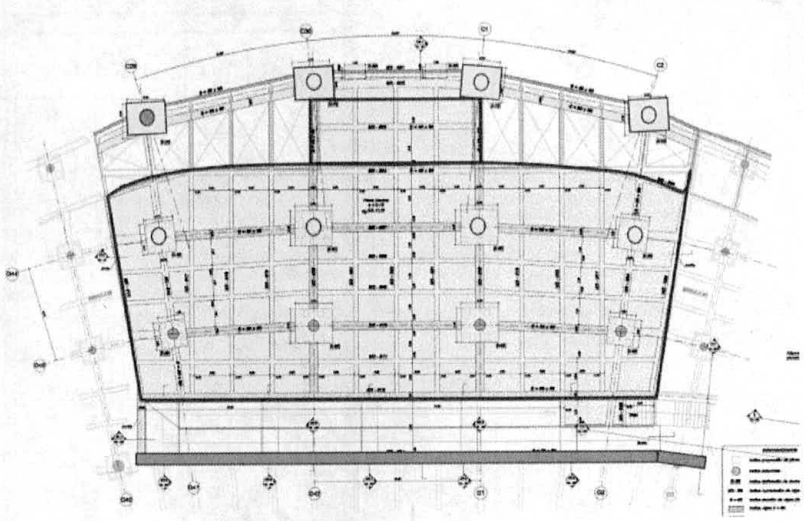


PLANO M2 – E02 PLANTA DE CIMENTACIÓN N.E + 1,19 MÓDULO 2

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

FUNDIDA DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLUMNA EN TUNEL ADMINISTRATIVO– ZONA DE EDIFICIO

BOGOTÁ



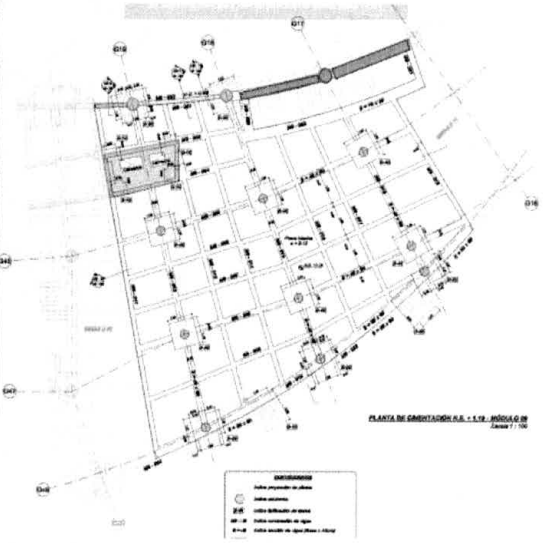

Zona Fundida Previamente


Zona Fundida en el Periodo

PLANO M9 – E01 PLANTAS ESTRUCTURALES MÓDULO 9

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN

BOGOTÁ

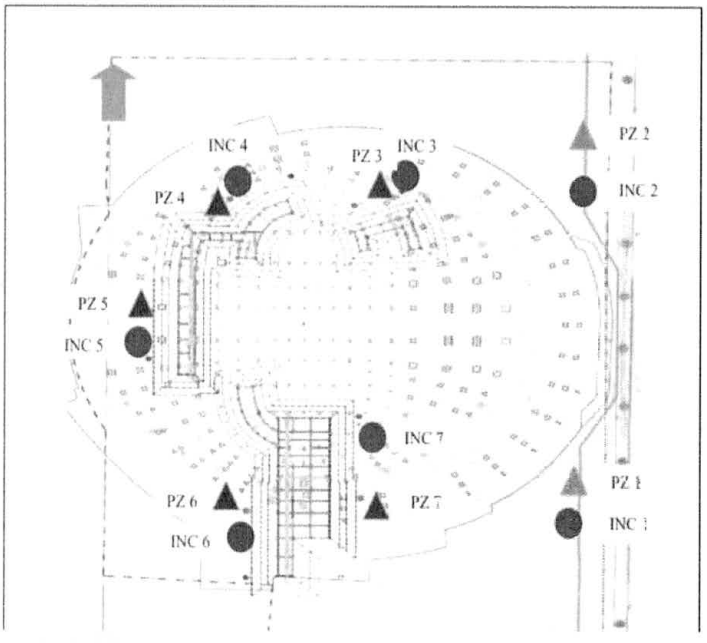

INCLINOMETRO

PIEZOMETRO CASAGRANDE

PIEZOMETRO DE HILO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

INFORME DE INSTRUMENTACIÓN
CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo comprendido desde el 16 al 23 de enero de 2026; los inclinómetros monitoreados siguen reflejando un comportamiento estable con deformaciones normales. Las variaciones acumuladas alcanzan a la fecha el orden de 36.1 mm.

- ✓ Los piezómetros de hilo muestran estabilidad en el nivel freático. Las columnas de agua oscilan entre 6.20 m y 8.83 m

- ✓ Los piezómetros tipo casagrande reflejan variaciones con tendencia al descenso hasta de 2 cm, las columnas de agua se encuentran entre 4.31 y 6.22 m de profundidad.

- ✓ Es importante proteger toda la instrumentacion instalada para su correcto funcionamiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

CONTROL DE ASENTAMIENTOS

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 31 DE ENERO DE 2026

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO PARCIAL	ASENTAMIENTO ACUMULADO	DESCRIPCION	
N-1	2541,662	-0,001	0,001	PARAMENTO	
N-2	2541,663	0,001	0,015	PARAMENTO	
N-3	2541,575	0,006	0,009	PARAMENTO	
N-4	2542,431	0,000	-0,018	CERRAMIENTO	
N-5	2542,216	-0,002	0,011	CERRAMIENTO	
N-6	2543,937	-0,002	-0,023	CERRAMIENTO	
N-7	2543,962	0,002	0,015	CERRAMIENTO	
N-8	2543,816	0,003	0,020	CERRAMIENTO	
N-9	2544,448	0,002	0,013	CERRAMIENTO	
N-10	2547,608	0,001	-0,028	CERRAMIENTO	
N-11	2546,930	0,001	-0,023	CERRAMIENTO	
MA-12	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-13	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-14	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-15	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-16	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-17	N/A	N/A	N/A	PERIMETRO	PERDIDA
MA-18	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-19	N/A	N/A	N/A	PLATAFORMA	PERDIDA
MA-20	2542,183	0,000	-0,013	PERIMETRO	
P-21	2541,007	0,000	0,007	BORDILLO	
P-22	2540,973	0,000	0,010	BORDILLO	
N-23	2541,603	0,000	0,010	PARAMENTO	
P-24	2540,724	0,000	0,003	SUMIDERO	
P-25	2540,983	0,001	0,013	POZO	
P-26	2540,966	0,003	0,018	POZO	
P-27	2540,705	-0,002	0,015	SUMIDERO	
P-28	2540,725	0,006	0,002	POZO	
P-29	2540,952	0,001	0,019	POZO	
P-30	2540,676	0,004	0,021	SUMIDERO	
N-31	2541,579	0,004	0,011	PARAMENTO	
P-32	2540,983	-0,001	0,009	BORDILLO	
P-33	2541,052	0,000	0,011	BORDILLO	
N-34	2541,540	-0,002	0,010	PARAMENTO	
N-35	2540,875	0,005	0,008	PARAMENTO	
P-36	2541,090	0,000	0,011	BORDILLO	
P-37	2541,135	0,000	0,014	BORDILLO	
N-38	2542,147	0,000	0,013	REJAS PARQUE	
N-39	2542,288	0,001	0,012	REJAS PARQUE	
P-40	2541,171	0,001	0,017	BORDILLO	
P-41	2541,194	0,000	0,018	BORDILLO	
N-42	2541,671	0,000	0,018	PARAMENTO	
N-43	2541,637	0,042	0,053	PARAMENTO	
P-44	2541,200	0,001	0,025	BORDILLO	
P-45	2540,988	0,002	0,022	POZO	
P-46	2540,941	0,002	0,021	POZO	
P-47	2541,161	0,001	0,022	BORDILLO	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL ASENTAMIENTOS PLATAFORMA Y PARAMENTOS
CONSORCIO UTMP
PROYECTO: VELODROMO
FECHA: 31 DE ENERO DE 2026

NUMERACION	COTA CONTROL	ASENTAMIENTO PARCIAL	ASENTAMIENTO ACUMULADO	DESCRIPCION	
N-48	2541,569	0,004	0,014	PARAMENTO	
N-49	2541,537	0,003	0,016	PARAMENTO	
P-50	2541,099	-0,008	0,005	BORDILLO	
P-51	2541,083	0,002	0,012	BORDILLO	
N-52	2541,489	0,002	0,019	PARAMENTO	
P-53	N/A	N/A	N/A	BORDILLO	PERDIDA
P-54	2541,184	0,000	-0,005	ANDEN	
N-55	2541,744	-0,003	-0,006	PARAMENTO	
P-56	2540,859	0,000	-0,001	ANDEN	
N-57	2541,735	0,000	-0,005	PARAMENTO	
P-58	2541	-0,002	-0,003	ANDEN	
P-59	2540,751	-0,001	0,000	ANDEN	
N-60	2541,848	0,002	0,007	PARAMENTO	
N-61	2540,673	-0,001	0,005	PARAMENTO	
P-62	2540,547	-0,001	0,004	ANDEN	
C-63	2541,908	-0,004	-0,005	[illegible]	
C-64	2541,760	0,001	-0,002	[illegible]	
C-65	2541,592	-0,002	-0,003	[illegible]	
C-66	2541,616	0,000	-0,002	[illegible]	
C-67	2541,650	-0,004	-0,006	[illegible]	
C-68	2541,716	0,004	0,003	[illegible]	
C-69	2541,717	-0,004	0,004	[illegible]	
C-70	2541,678	-0,001	0,006	[illegible]	
C-71	2541,811	-0,001	0,001	[illegible]	
C-72	2541,951	0,001	0,000	[illegible]	
C-73	2542,089	-0,001	-0,006	[illegible]	
C-74	2542,226	0,000	-0,004	[illegible]	
C-75	2541,654	-0,003	0,008	49-42	
C-76	2541,714	-0,003	0,014	43-34	
C-77	2541,718	-0,003	0,048	33-32	
C-78	2541,767	-0,002	0,014	90-83	
C-79	2541,757	0,000	0,012	82-75	
C-80	2541,732	0,001	0,015	66-59	
C-81	2541,743	0,006	0,019	58-57	
C-82	2541,740	0,002	0,018	25-18	
C-83	2541,680	0,003	0,005	17-10	
C-84	2541,664	0,002	0,010	9-2	
P-85	2540,987	-0,003	0,024	PARQUE	
P-86	2541,006	0,000	0,011	PARQUE	
P-87	2540,912	0,004	-0,007	PARQUE	
P-88	2540,952	0,003	0,012	PARQUE	
P-89	2543,460	-0,003	-0,006	TACO 1	
P-90	2543,316	-0,002	-0,013	TACO 2	
P-91	2542,219	-0,002	-0,013	TACO ADMI	
P-92	2542,232	0,008	0,0[illegible]	TACO ADMI	
P-93	2542,450	-0,002	-0,0[illegible]	TACO APOYO	
P-94	2542,295	0,002	-0,021	TACO APOYO	

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

COMPONENTE

ELÉCTRICO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo. (*)	UTMP	29-01-2026	pendiente

(*) Se remite por parte del contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO

BOGOTÁ

Durante la semana 26 al 31 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:


- Esta semana no se presenta avance en las redes eléctricas y de comunicaciones, se espera avance en la estructura para continuar en el modulo 10.

- Se hace revisión de la ubicación de las cajas de paso que hay en ese modulo No 10 con su respectiva red de ductos para que no interfieran con la estructura de concreto.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OBRA VELODROMO


BOGOTÁ

Imagen 1. Diseño de ubicación de cajas de paso sin visualización de estructura de concreto

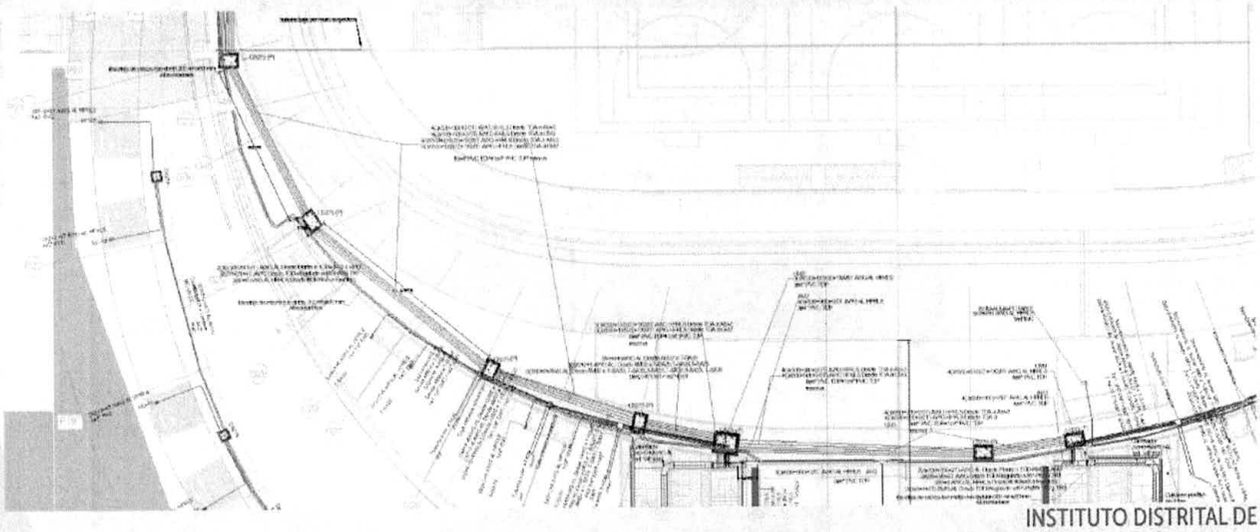

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Imagen 2. Posible reubicación de las cajas de paso CS275 para que estén dentro de la estructura de concreto sin ser afectada.

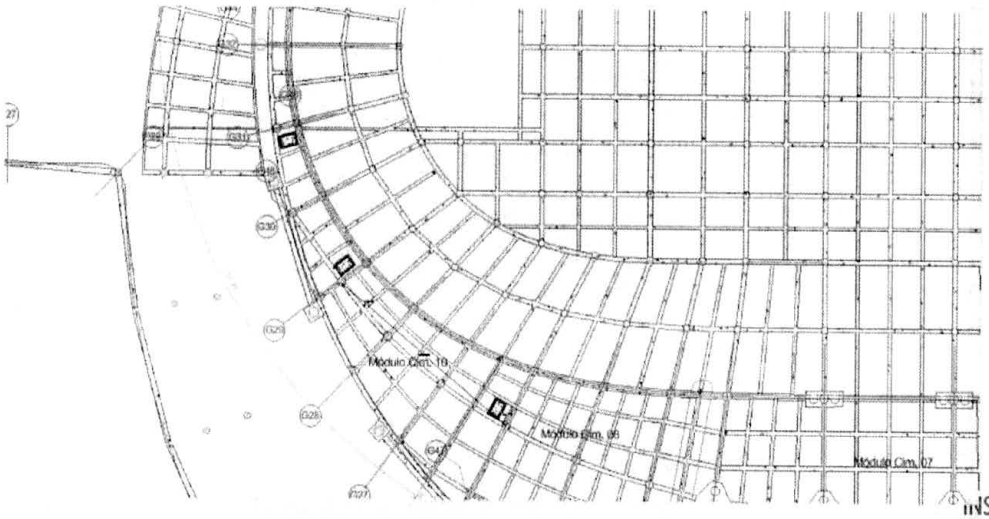

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Componente
Hidrosanitario

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (*)	UTMP	Sin fecha	PENDIENTE
Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP	IDRD – CIG -UTMP	22/01/2026	PENDIENTE
Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.	IDRD – CIG	Sin Fecha	PENDIENTE

(*) Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-0034-2026 (19/01/2026) Rad. IDRD No 20262100023932.

(**) Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025)


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REDES HIDROSANITARIAS

BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se termina la instalación del material granular en la base del geodrén en el Túnel Administrativo.

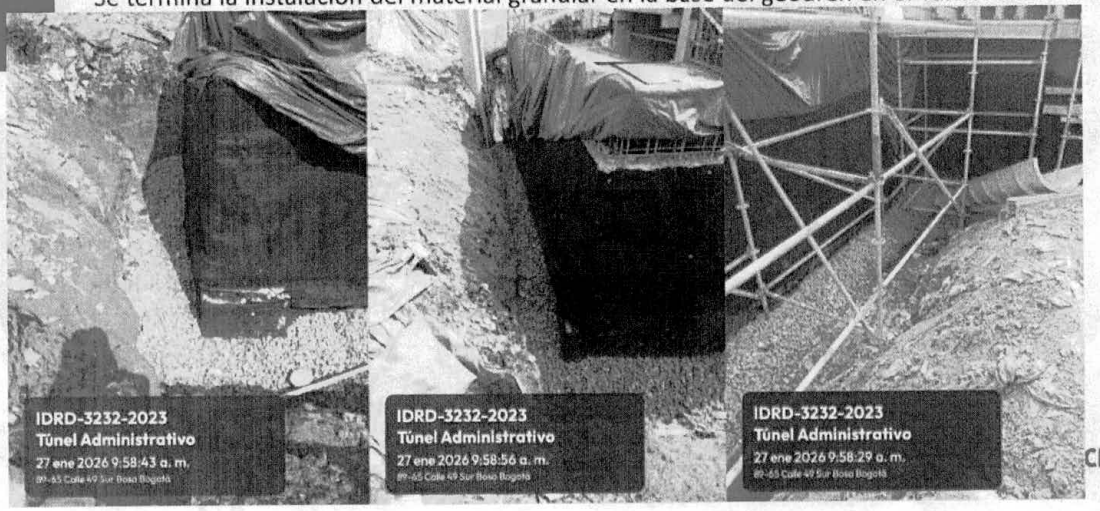


INSTITUTO DISTRITAL DE
CREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

REDES HIDROSANITARIAS

BOGOTÁ

Avance de Obra:

Se continúa con la instalación del geodrén y el tecdrén del Túnel Apoyo a la competición y la conformación del material granular en el fondo del geodrén.

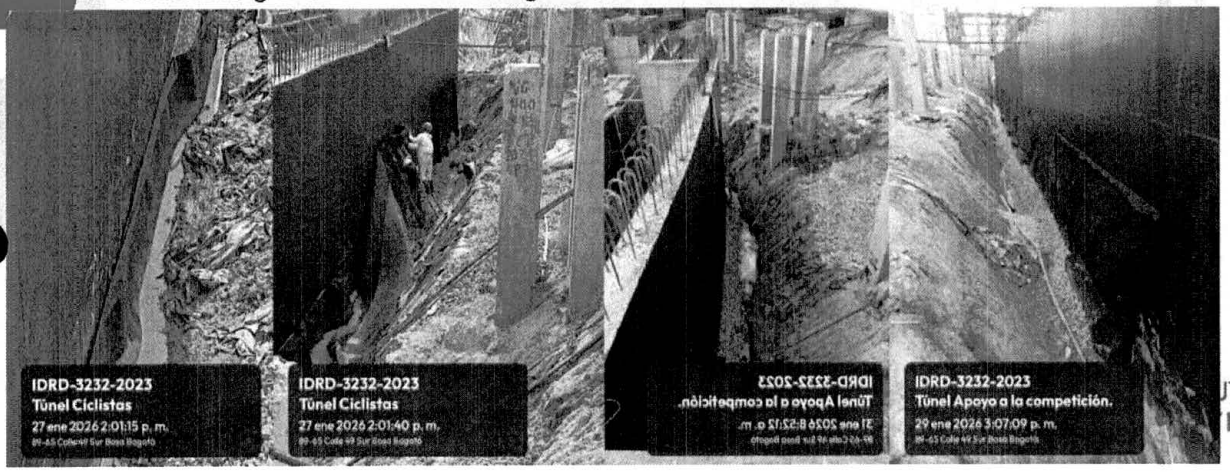

UTO DISTRITAL DE
DEPORTE - IDRD

AQUÍ SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

GRACIAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	Comité Técnico/Transversal Velodromo Cto Obr. 3232-2023 y Cto. Int 3219-2023	DD	MM	AA
ACTA No. 97		12	2	2026

LUGAR:	virtual Plataforma Teams enlace:	HORA DE INICIO:	10:00	HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se adjunta Listado de Asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de Componentes Transversales	4.
2. Presentacion de Componentes Técnicos	5.
3. Observaciones Varias.	6.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TRANVERSAL

Se solicita permiso a los asistentes para grabar la cesion los cuales no tienen objecion y se inicia comité con autorizacion respectiva de los firmantes de la presenta Acta.

Componente Social: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD

Pendiente, se reprograma para despues del 8 Marzo/26. Sup. IDRD.

2) Remisión de Acta de comité de participación ciudadana No 22

Complido el 6/2/26.

3) Remisión por parte de CIG respuesta de veredicto de la Tutela descrita en el comité anterior.

Complido el 6/2/26 Rad IDRD # 20262100062972.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La Supervision indica que la Visita programada por parte de La Universidad nacional por lineamiento de la entidad será reprogramada para despues de 8/Marzo/2026 y se comunicara proxima fecha.

Componente Ambiental: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de interventoría no CIG-IDRD-VEL-79-2026 de Respuesta Oficio CE-206-125-2163 Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles – Velódromo Gibraltar. (05/02/2025)) Pendiente respuesta UTMP

Pendiente.

2) Propuesta de manejo de ZONAS VERDES pendiente respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de Interventoría CIG-IDRD-VEL-0081-2026 (Rta UTMP) y Rad. IDRD No 20262100083002 (06/06/2026)) Se da respuesta a la UTMP y se da traslado a la entidad contratante IDRD.

Pendiente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

la Sup. da recomentaciones durante recorrido a obra:
- Protección a acopio de aceros
- Protecaion materiales granulayes para la Planta Concreto
- Mantenimiento a la Motobomba.

Se informa tambien la actualizacion efectuada a los Formatos de revision "lista de chequeo" de mensuales para ser aplicados en consecuencia a los informes mensuales de obra como se esta haciendo con los de interventoria, se explica que son actualizaciones normativos entre otras.

Se reafirma la revision de los informes bajo estos parametros actualizados.

Componente Riesgos: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1)Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente

Pendiente.

2) Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD

Pendiente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Comp. Forestal: La Sup. informa que en el IDRD se tiene profesional xra revision de Informes.

Comp. Fauna: Se realiza exposicion al respecto.

Primer comite mensual recorrido Ambiental IDRD-UTMP-CIG.

Componente SST: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23. PENDIENTE en avance según lo reportado en las diapositivas del presente comité.

En avance segun relación expuesta en comité.

2) Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Umaña

Hoy se remite documentacion ala. interventoria por parte UTMP

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se hace reporte por parte de la interventoria
- Informe Nº 20 aprobacion IDRD
- Observacion Nº 21 por parte IDRD
- Aprobacion Informe de Obra Nº 24 (Enero)
- Observaciones puntuales a la UTMP y recomendaciones Segun visita U.Nacional. al IDRD Segun protocolos, se envia email con el listado de Personal.

Componente CALIDAD: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad -- anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar -

Cumplido. Se comunica por parte de la interventoria que la información fue subsanada según Rad. IDRD No 20262100071112 del 10/02/2026. (Plan de Inspección y Ensayo interventoría V.4)

2) Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026.

Cumplido: Se comunica por parte de la Interventoria quese hace subsanacion según rad. IDRD No 20262100082982 del 05/02/2026

3) Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD

Cumplido: Rad. IDRD No 20264200033121 del 06-02-2026 Aprobación de Profesional de Calidad Interventoría del 06/02/2026 y (*) Rad. IDRD No 20262100067662 del 09-02-2026 del 09/02/2026.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

→ Ca Sup. Realiza observaciones entrega de Formato de Inspecciones visua a la estructura Metalica, sera remitido por parte de CIG el dia de hoy.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TÉCNICO

Componente BIM: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (Red perimetral Ajuste/Diseño)

PENDIENTE: Se completava una vez se tengan diseños aprobados UNTI.

2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026.Revisado por CIG y se generan Observaciones. Se espera Rta. UTMP.

CUMPLIDO: Se comunica por parte de la Interventoria que se da remicion de Oficio de Interventoría No CIG-IDRD-VEL-83-2026 de Respuesta Oficio Obra No 2188 Referente a Planos de Taller (06/02/2026) y se espera respuesta respectiva durante el desarrollo de la construccion respectiva.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

- Por parte de la UTMP se realiza exposicion de detalle de avance y control que se tiene desde el Software PowerBI.
- Generar conceptualización por parte de CIG dando respuesta a la UTMP con copia a la UTMP.

Componente PROGRAMACIÓN: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 se hace remisión de los INSUMOS a la entidad contratante IDRD (*) En espera de comentarios y/o aprobación de INSUMOS para remisión APU´S

PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes entre las partes UTMP-CIG-IDRD. Se comparte por medio de WETRANFER por parte de la UTMP los archivos actualizados de los APU´s del Modificatorio No 3 de Obra (Adición No 2 Prorroga No 1) . Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra

2) Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026

PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta y observaciones de manera Digital y se remitira de manera oficial por la entidad contratante IDRD. Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra

3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 (Adición No 2 Prorroga No 1) Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD Pendiente Observaciones IDRD Documento.

PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes por parte de la entidad contratante IDRD. Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_ Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 (Adición No 2 Prorroga No 1)Obra.

4) Remisión de borrador de modificatorio No 1 (Adicion No 1 Prorroga No 1) Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador actualizado según observaciones por parte de interventoría CIG el 04/02/2026. Pendiente Observaciones IDRD.

PENDIENTE: La supervision informa que esta en revision de los documentos remitidos

5) Remisión al IDRD de borrador de VIABILIDAD al modificatorio No 3 (Adicion No 2 y Prorroga No 1 por parte de CIG al contratista de Obra UTMP – Pendiente Observaciones IDRD

PENDIENTE: La supervisión informa que esta en revisión de los documentos remitidos.

6) Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica. Pendiente Respuesta IDRD

CUMPIDO: Se da Respuesta IDRD Rad. No No 20264200033881 del 06-02-2026 y trasladado por CIG Oficio No CIG-IDRD-VEL-87-2026. Pendiente pronunciamiento de la UTMP.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La interventoria manifiesta el RIESGO que se tiene al desembolso presentado por parte de UTMP de Anticipo para pago de la pista teniendo en cuenta que el contrato de obra vence el proximo 4 de Abril 2026 de manera contractual por ende este desembolso no seria conveniente por tiempos.

Se presenta por parte de CIG el Balance a la fecha de las revisiones efectuados a los informes MENSUALES por parte del IDRD y los valores de actas parciales PENDIENTES de acuerdo al avance a la fecha.

Componente TÉCNICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución así:

1) Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP

PENDIENTE: La sup. indica que fue radicada el dia de ayer y sera radicada ante DADEP el dia de Hoy, pte # Radicado.

2) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD

PENDIENTE.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La supervisión solicita claridad en las Sumatorias entre cantidades en Tonelajes sumados al 100%. La UTMP realiza clavidades y la Supervisión remitira Formato para empezar a implementar en la Presentacion Semanal.

Componente ELECTRICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución así:

1) Según la Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo remitida por el contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión.

- La sup. Solicita el plano de Fibra optica el remitido corresponde al Rack se debe definir la ubicacion del cuarto de Comunicaciones hacia afuera del edificio

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La UTMP solicita a la Supervigida la visita del operador de Red para que se establezca un punto de ingreso y asi mismo el contratista planteará el recorrido interno, esto manifestado por parte de CIG, queda Pendiente tambien la licencia (de acuerdo la radicacion ante ENEL)

Componente Hidraulico: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (*) Trasladado a la UTMP

PENDIENTE. Se da respuesta por parte del IDRD mediante Rad. IDRD No 20264200030721 del 10/02/2026 - Traslado Oficio CIG-IDRD-VEL-102-2026 el 11/02/2026. Pendiente Rta. De la UTMP

2) Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025))

PENDIENTE.

3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.

PENDIENTE. Se continua con gestiones por parte del IDRD.


El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

- Se informa que VANTI Agendo el 18 de Marzo para Revision de Diseño.
- Se solicita por parte del IDRD concertar una fecha Para reunion preliminar en curaduria Estructura y Arquitectura de manera independiente.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Compromisos descritos y patados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO	UTMP-CIG	Según documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las __ m___ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N-A	N-A
NOMBRE	Arq. Rubén Darío Crespo	NOMBRE	N-A	N-A
CARGO	Director de interventoría	CARGO	N-A	N-A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Torres Residente de Interventoria	Arturo Rojas T.

Marca temporal	Nombre	Cedula	Correo electrónico	Cargo	Entidad	Número de teléfono
12/02/2026 11:08:39	Astrid Viviana Rojas	52982509	profriesgosvelodromo@gmail.com	Profesional de riesgo de	Consorcio Interventores	3157994502
12/02/2026 11:09:51	Oscar Javier Sora Ortega	80761720	oscar.sora@idrd.gov.co	Apoyo Hidrosanitario	IDRD	3003101408
12/02/2026 11:12:28	César David Hernández (	80186483	cesard.hernandez@idrd.gov.co	Apoyo transversal SST	IDRD	3506290062
12/02/2026 14:43:55	Bibiana Paola Sosa Linar	52996077	Bibiana.sosa@idrd.gov.co	Apoyo a la supervision S	IDRD	3134649125

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite Tecnico / Tranversal Nº 97

FECHA: 12/02/2026 HORA INICIAL (X) 10:30 HORA FINAL 11:45am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

CONTRATO: 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Edwar Esteban	9448762	Apoyo STC	IDRD		IDRD	edw.e.l@idrd.gov.co	3116059175
2	Francy Murillo	52962323	Apoyo Tec. STC	IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3045555555
3	Raimon Lucio Velez Maldonado	85777428	Apoyo S. Social STC.	IDRD		IDRD	raimon.velez@idrd.gov.co	
4	Daniela Prieto Rodriguez	1018440772	Ap. STC Paisaje	IDRD-STC		IDRD	daniela.prieto@idrd.gov.co	3022922354
5	Jhon F Espitia B.	80794111	Ap-STC	STC-IDRD.	Jhon F. Espitia	IDRD	jhon.espitia@idrd.gov.co	3118103339
6	Rubén Darío Crespo B.	19496690	Dfor Interv.	CIG		IDRD.	directora.consorciointerv@gmail.com	
7	Carlos H. Castro	79'340835	Apoyo Sup	IDRT STC		IDRD	carlosh.castro@idrd.gov.co	3107542732
8	Jaime Andrés Cañón Vergara	80096733	Ap. Supervisión	STC		IDRD	Jaime.Canon@idrd.gov.co	
9	Javier O Sanchez Lagos	10141772532	Apoy Tec. Sup	STC		IDRD	javier.sanchez@idrd.gov.co	3209496655
10	Juan Pablo Villate Diaz	1014012837	Apo Sup	STC		IDRD	juan.j.villate@	3197071374
11	Diego Alejandro León	1018482655	Ing. Estructural	Interventoría		CIG		
12	Tatiana Ortegón Pinilla	1018487557	Ing. Ambiental	STC - IDRD		IDRD	leidy.ortegon@idrd.gov.co	3138646385
13	Linay Rubiano Moyano.	1051954740	RED. SG-SST	CIG		CIG.	Interventoria.velodro.	3202549811
14	Paula Blanco Alarcón	1073335637	Res Amb	UTMP		UTMP	ambiental.velodromo@cyg.com.co	
15	Yeny Luz Ramirez	52441804	Prof Social	CIG		CIG		3137205176
16	Diana Maria Ortiz D.	1016220007	Pos Social	UTMP		UTMP	Soc.velodromo.	3153933421
17	Yoelvis Conejo	79695717	Ap. Legal	UTMP		UTMP		3153338947
18	Juan Javier Espinel Silva	1070956933	R. Forestal	UTMP		UTMP	N.correo.velodromo@	3778278598

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

(*) Se realiza recorrido en obra a partir de las 10:00 am.

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.6

1/2

82

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comité Tecnico Transversal Nº 97

RESPONSABLE DEL EVENTO: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

FECHA: 12/02/2026 HORA INICIAL (x) 10:30 HORA FINAL 11:45am LUGAR: PROYECTO VELÓDROMO CONTRATO 3219-2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Wilber Pierre Sánchez	10 53806239	Prof. BIM	Interventoría		CIG	bimvelo@ciodigital.com	
2	JOHN RAMOS	80002276X	COORDINADOR	UTMP		UTMP		
3	Andres Galeano Gonzalez	1022362548	Res Ppto y Prog	CIG		CIG	coordinador-bim@cyg.com.co	
4	Andrés Lengua R.	1063002731	Prof HS-RCI	Interventoría		CIG		3173852495
5	Jamer Arcos Sepúlveda	1052771770	Prof Eléctrico	Interventoría		CIG	—	3006846085
6	David Paredes	80821514	Prof Presup	Intervent.	David	CIG		
7	Fernando Rodriguez Torres	80219815	Residente	Interventor		CIG		
8	Diego Leon							
9	Carlos Eduardo Duarte Barrero	1010112398	Coordinador	Interventoría		CIG		3147744462
10	Julian Ricardo Agudelo Niño.	80767393.	R. Ambiental	Interventoría		CIG	—	—
11	Alfredo Ferreira B	79946427	R. HSG	UTMP		CIG	hidrosolucs.velodromocyg...	3023912997
12	Alejandra Tello Cerquera	1070604368	Prof Presup y Prog	UTMP		CyG	Programacion.velodromo@cyg.com	3017415942
13	Diego F Castro G	1116457570	Pix Calidad	UTMP		UTMP	Calidadvelodromocyg.com	3170451524
14	Eduard Antonio Camador	80383913	Residente Electrico	UTMP		UTMP	electrico.velodromo@cyg.com.co	3004290201
15	Luz Stella Rodriguez	31437755	Pres SST.	UTMP		UTMP	SST.velodromo@cyg.com.co	3214693331
16	Jose M. Galeano	80031382	Residente	UTMP		UTMP	residente.velodromo@cyg.com.co	3105570274
17	CARLOS EDUARDO GUZMAN SANCHEZ	79617588	RESIDENTE	UTMP		UTMP	—	—
18	Arturo Rojas Torres	13873537	Residente	UTMP		CIG	interventoria.velodromo@gmail.com	3166426035

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL-V.5

(x) Se realiza recorrido en obra a partir de los 10:00 am



AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ

Componente

social

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD	UTMP- CIG	12/02/2026	VIGENTE
Remisión de Acta de comité de participación ciudadana No 22	UTMP	12/02/2026	CUMPLIDO
Remisión por parte de CIG respuesta de veredicto de la Tutela descrita en el comité anterior.	CIG	06/02/2026	CUMPLIDO

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Actividades ejecutadas por el componente social

COMPROMISOS COMITÉ DE PARTICIPACIÓN No. 22

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN	TRAZABILIDAD	ESTADO
Enviar el acta y la presentación del comité de participación No. 22	Unión temporal metropolitano Porvenir	Una vez se cuente con la aprobación del acta por parte de la interventoría	06/02/2026	Cumplido

SOLICITUD DE PTT A LOS PROFESIONALES TRANSVERSALES

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA No. 23

20 DE ENERO DEL 2026	HORA 9:00	SALÓN COMUNAL BARRIO LAS VEGAS

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

COMPONENTE AMBIENTAL

RETIRO DE RCD

ZONA	ÍTEM	CANTIDADES SEGÚN PRESUPUESTO (kg)	CANTIDADES EJECUTADAS (kg)	% EJECUTADO
EDIFICIO	E 3.3.1	66.319.560	56.744.719	85,56%
PASARELA	R 2.3	2.376.470	2.376.470	100%
URBANISMO	U 1.5	6.407.410	5.600.330	87%
PARQUEADERO	P 4.5	936.940,00	936.940,00	100%
TOTAL		76.040.380	65.658.459	86,35%

EXCAVACIÓN	134.400 kg

Retiro de 21 m3 de RCD de demolición

Metas RCD:
Aprovechamiento: 99,82%
Circularidad: 19,33%

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD



COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO
Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE
Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD	IDRD	31/01/2026	PENDIENTE

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo y Reducción del Riesgo/Manejo de Desastres Escenarios de Riesgo ER07-ER14/ PDCA – Ficha 3



Evacuación de lixiviados

Activación de motobombas en zonas excavadas (Túnel Administrativo, Principal y Deportistas)



Uso de Catch Tank

Inspección del llenado y verificación de buen estado de mangueras y de la geomembrana como dique de contención
No fue requerida la activación de servicio de carro cisterna para evacuación de lixiviados contenidos en Catch Tank




Bombeo agua lluvia

Bombeo de agua lluvia en pozo de achique de zona central, dadas las fuertes lluvias registradas


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo y Reducción del Riesgo
Escenarios de Riesgo ER07-ER14




Monitoreo de Precipitación in situ

Verificación de precipitación acumulada diariamente mediante pluviómetro instalado en obra

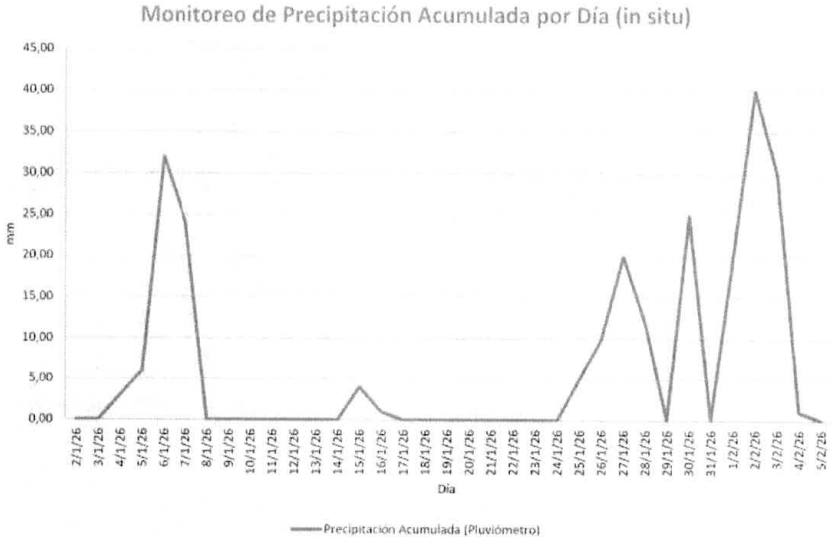


INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Monitoreo del Riesgo ER08-ER12-ER13-ER16
Reducción del riesgo ER07-ER09-ER14

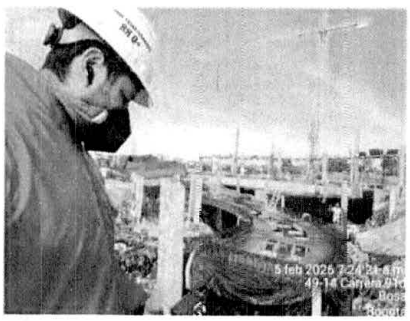

Medición de gases volátiles

Monitoreo de gases en zonas excavadas con un total de 11 jornadas de monitoreo en frentes de trabajo activos (%LEL CH4: 0)

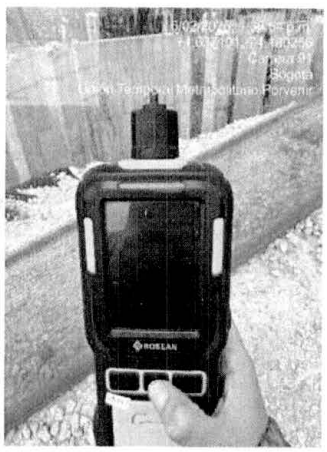

Se notifica ingreso del Detector de Gases Portátil BOSEAN K-600, que se encontraba en proceso de calibración (Fecha Calibración: 2/2/2026)



Inspección de taludes

Inspección visual de taludes con acompañamiento de geotecnia, identificando condiciones normales de estabilidad

INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
