UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10
DEL: 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ". BPIN 20243218000007

ENTIDAD CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF

FEBRERO DEL 2026

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 4
DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 5
INFORMACION ADMINISTRATIVA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 6
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 7
PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 7
PERSONAL DEL CONTRATISTA 8
CORRESPNDENCIA 8
PROGRAMACIÒN Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO 9
ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
VERIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR 10
INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 17
INFORMACIÓN LEGAL. 17
INFORMACIÓN FINANCIERA. 19
ACTIVIDADES FINANCIERAS 20
PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 22
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental del proyecto denominado “construcción de estufas ecoeficientes como medida de mitigación al cambio climático en zona rural del departamento de la guajira”.

La interventoría tiene como propósito verificar el cumplimiento integral del objeto contractual, asegurando que las obras se ejecuten conforme a los diseños, especificaciones técnicas, normativas ambientales vigentes y condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se realiza seguimiento al manejo administrativo y financiero del proyecto, garantizando una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos institucionales.

Este informe presenta el seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 hasta 28 de febrero de 2026, incluyendo los anexos pertenecientes al presente contrato; de igual forma presenta la información general del contrato y una descripción del avance de las obras adelantadas en los diferentes frentes de obra, actividades administrativas, como el estado financiero del contrato, así como las observaciones y recomendaciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

OBJETIVO GENERAL.

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", con el fin de garantizar que su ejecución se realice conforme a los términos contractuales, especificaciones técnicas, normativas vigentes y principios de eficiencia, transparencia, calidad y sostenibilidad ambiental, velando por el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento de las diferentes actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato.
- Mostrar el avance que presenta la obra.
- Informar la gestión de la Interventoría.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.

DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

El contrato de obra 0051 DE 2025 el cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA la construcción de 1200 estufas ecoeficientes, ubicados en zonas rurales de 9 municipios, distribuidos de la siguiente manera:


1. 266 estufas ecoeficientes en Riohacha
2. 225 estufas ecoeficientes en el municipio de Barrancas
3. 252 estufas ecoeficientes en el municipio de Distracción
4. 223 estufas ecoeficientes en el municipio de la jagua del Pilar
5. 66 estufas ecoeficientes en el municipio de Hatonuevo
6. 61 estufas ecoeficientes en el municipio de Maicao
7. 51 estufas ecoeficientes en el municipio de Villa nueva
8. 29 estufas ecoeficientes en el municipio de Uribia
9. 27 estufas ecoeficientes en el municipio de Manaure

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la Zona rural de 9 municipios del departamento de la Guajira, A continuación, se relaciona la localización de los sitios donde se ejecutará el proyecto.

Uribia, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Manaure, Villanueva y La Jagua del Pilar

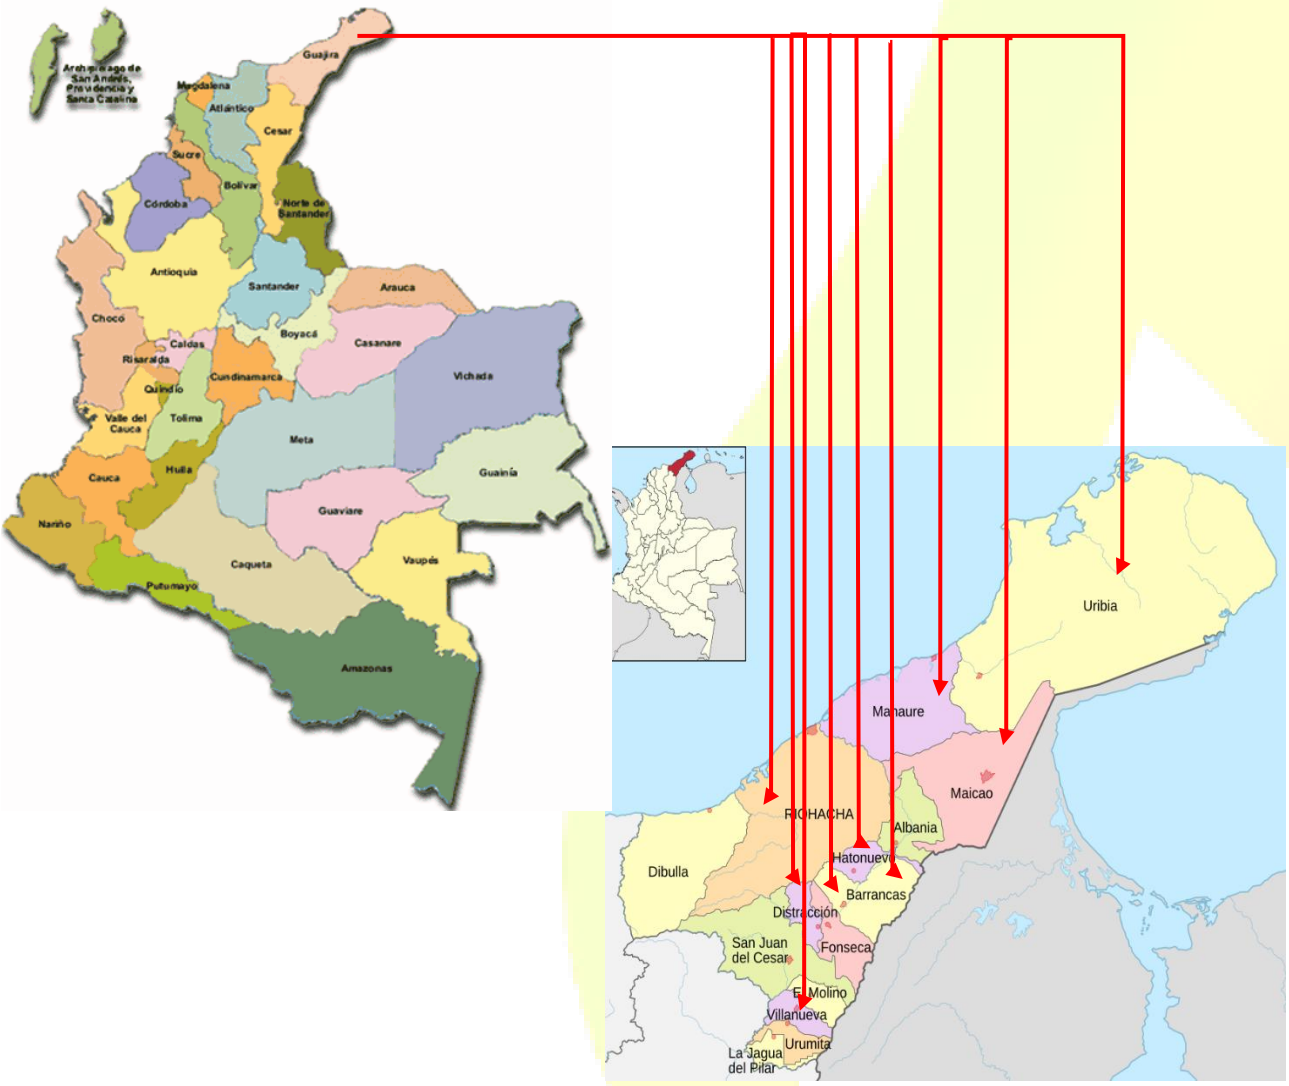

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

INFORMACION ADMINISTRATIVA
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 0051 DE 2025.	
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
INTERVENTORÍA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
SUPERVISOR:	KIANA VALBUENA MEJÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007
CONTRATO NO:	0051 - 2025
CONTRATISTA DE LA OBRA:	FUNDACIÓN AGUA LUNA Nit. 900345569-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERALD BRISSON MENDOZA CC. 19.486.085 de Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 5.656.614.670.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 MARZO DE 2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-0060-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA NIT: 892.115.314-9
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF NIT: 901941657-4
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR CONTRATO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($409.937.150,00) M/L
SUPERVISOR	KIANA VALBUENA MEJÍA
FECHA DE INICIACIÓN	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	13 MARZO DE 2026

PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Relación del personal técnico y administrativo afiliado a la seguridad social del contratista e interventoría asignado al proyecto.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Samir Jose Cardozo Solano	1118806268	DIRECTOR
Bielca Silena Pimienta Padilla	40.928.933	RESIDENTE
Zunilda Amaya Uriana	40951297	PROFESIONAL SOCIAL
Carlos Antonio Brito Avila	84090164	CONTADOR
Loranis Maxiel Diaz Mercado	1118838660	TECNICO DE CAMPO
Yenifer Soto Vargas	1124409653	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Marianne Mejia Cardozo	1118800355	AUXILIAR DE OFICINA

PERSONAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	PERFIL	CARGO
Daniel Quintero Manotas	1122818210	ING. CIVIL	Director
Luisa Fernanda Guerra	1062401355	ING. AMBIENTAL	Residente de obra
María Fernanda Vargas	56078712	TRABAJADORA SOCIAL	Trabajadora social

CORRESPNDENCIA

Se realizaron las siguientes solicitudes:

- ✓ Solicitud de cronograma de obra – enviado el 20 de mayo de 2025
- ✓ solicitud de aprobación del plan de inversión de anticipo – recibido el 26 de mayo de 2025
- ✓ Aprobación de plan de inversión de anticipo por interventoría – enviado el 27 de mayo de 2025
- ✓ Informe Nº1 contrato de obra 0051 de 2025- enviado a supervisión el 31 de mayo de 2025
- ✓ Informe Nº1 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 05 de junio de 2025
- ✓ Solicitud de anticipo del contrato de interventoría CI-0060-2025- enviado a la supervisión el 06 de junio del 2025
- ✓ Modificaciones salariales de planilla de seguridad social del contrato de interventoría CI-0060-2025 - enviado a supervisión el 10 de junio de 2025
- ✓ Programación de obra – recibida el 10 de junio de 2025
- ✓ Solicitud de programación semanal de actividades – enviada el 17 de junio de 2025
- ✓ INFORME Nº2 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 01 de junio de 2025
- ✓ Informe Nº2 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 02 de julio de 2025
- ✓ INFORME Nº3 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 31 de julio de 2025
- ✓ Informe Nº3 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 01 de agosto de 2025
- ✓ INFORME Nº4 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 29 de agosto de 2025
- ✓ Documentos acta parcial Nº1 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 02 de septiembre
- ✓ Informe Nº4 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 02 de septiembre de 2025
- ✓ INFORME Nº5 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 30 de septiembre de 2025
- ✓ Solicitud de rendimientos financieros – enviado el 02 de octubre de 2025
- ✓ Informe Nº5 contrato de interventoría CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 08 de octubre de 2025

- ✓ Documentos acta parcial Nº1 CI-0060-2025 – enviado a supervisión el 14 de octubre de 2025
- ✓ INFORME Nº6 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 27 de octubre de 2025
- ✓ Documentos acta parcial Nº2 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 28 de octubre
- ✓ INFORME Nº6 contrato de obra 0060-2025 - enviado a supervisión el 06 de noviembre de 2025
- ✓ INFORME Nº7 contrato de obra 0060-2025 - enviado a supervisión el 12 de diciembre de 2025
- ✓ Documentos acta parcial Nº3 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 15 de diciembre
- ✓ INFORME Nº8 contrato de obra 0060-2025 - enviado a supervisión el 15 de diciembre de 2025
- ✓ INFORME Nº9 contrato de obra 0051 de 2025- recibido el 11 de febrero de 2026
- ✓ INFORME Nº9 contrato de obra 0060-2025 - enviado a supervisión el 12 de febrero de 2025

PROGRAMACIÒN Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

Detalle Actividad	Unidad	tidad T	2025 / 05	2025 / 06	2025 / 07	2025 / 08	2025 / 09	2025 / 10	2025 / 11	2025 / 12	2026 / 01	2026 / 02	2026 / 03
REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	und	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	und	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REALIZAR MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES	und	1										1	
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (0.73 M X 1.05 M) H0.83 M.	und	1156		70	150	150	165	165	156	150	150		
CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (1.00 M X 3.00 M) H0.40 M.	und	44					22	22					
REALIZAR LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO	und	1		0,2			0,4					0,4	
REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COCCIÓNEFICIENTE.	und	34				5	10		10			9	
REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LACOMUNIDAD Y FAMILIAS BENEFICIADAS.	und	28	7	7									14

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizó acompañamiento TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO del proyecto mediante el seguimiento permanente a las actividades realizadas por el contratista.

En el mes de febrero el contratista en su informe presenta un avance en su ejecución del 11,93% detallado de la siguiente manera:

- ✓ Verificación de predios a intervenir


- ✓ Distribución de material
- ✓ Construcción de estufas
- ✓ Talleres de capacitación
- ✓ Divulgación del proyecto
- ✓ Monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes

VERIFICACIÓN DE PREDIOS A INTERVENIR

En el periodo de corte se continuo con el proceso de verificación de los predios correspondientes a los nuevos beneficiarios, en atención a que algunos de los beneficiarios incluidos en el listado anterior no cumplían con los requisitos técnicos y administrativos exigidos o se encontraban duplicados. Esta verificación tuvo como objetivo validar la información, corroborando las condiciones mínimas necesarias para la instalación de las estufas ecoeficiente. Se revisaron aspectos como:

- ✓ Que el predio este habitado.
- ✓ Que cuente con una pared de soporte para la construcción de la estufa
- ✓ Que cuente con techo de cubierta para la estufa
- ✓ Disponibilidad y aceptación del beneficiario para participar en el proceso constructivo

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL

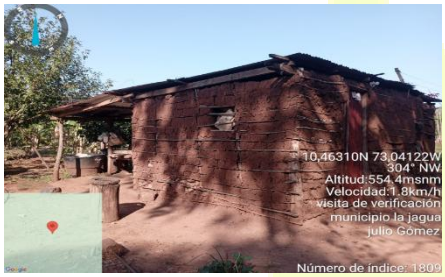Paralelamente, se realizó durante el presente periodo la entrega de materiales a las comunidades beneficiarias, garantizando que los insumos suministrados fueran acordes con las especificaciones requeridas para la correcta ejecución de la actividad. La interventoría realizó seguimiento a estas entregas, verificando cantidades, calidad y oportunidad.

Relación de material en el periodo	
Entregado/ beneficiario	Acumulado
98	1200

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

Durante el presente período se llevó a cabo la construcción de las 98 estufas ecoeficientes que habían quedado pendientes de ejecución en el mes de enero. Dichas actividades no pudieron desarrollarse oportunamente debido a las dificultades presentadas en ese período, principalmente asociadas a las condiciones de acceso y logística en las comunidades beneficiarias.

No obstante, durante el mes de febrero, estas situaciones fueron gestionadas y subsanadas, lo que permitió retomar las actividades programadas y avanzar con la ejecución de las estufas pendientes. Gracias a la superación de estas limitaciones, se logró completar la construcción de las 98 unidades previstas, contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas dentro del proyecto.

ESTUFAS CONSTRUIDAS FEBRERO 0,73 m x 1,05 m	
MUNICIPIO	**CANT.**
Riohacha	32
Maicao	1
La Jagua del Pilar	63
Barrancas	2
TOTAL	**98**

TALLERES DE CAPACITACIÓN

Durante el periodo del mes de febrero se realizaron 9 jornadas de capacitación según la programación en los municipios de Distracción, Riohacha, Maicao, la Jagua del Pilar, Hatonuevo y Villanueva dirigidas a los beneficiarios del proyecto, con el fin de brindarles conocimientos prácticos y teóricos sobre el uso adecuado, cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente. Durante la capacitación se explicaron las principales características del sistema, las recomendaciones para su correcto funcionamiento, las medidas de seguridad que deben tener en cuenta y las prácticas de limpieza y mantenimiento preventivo que prolongan la vida útil del equipo.

Asimismo, se promoverá la adopción de hábitos responsables que contribuyan a la reducción del consumo de leña, la disminución de emisiones contaminantes y la mejora de la salud de las familias beneficiadas. La capacitación se llevará a cabo mediante talleres participativos, demostraciones prácticas y entrega de material informativo, garantizando que los usuarios cuenten con las herramientas necesarias para un manejo adecuado y sostenible del sistema de cocción eficiente. A continuación, se relacionan los municipios donde se llevaron a cabo las capacitaciones:

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÓN		
Facha	**Municipio**	**comunidad**
Fecha	Municipio	Comunidad
23/02/2026	Riohacha	Ariptaure
23/02/2026	Riohacha	Colon
23/02/2026	Hatonuevo	Varias
25/02/2026	Maicao	Garrapatero
25/02/2026	Maicao	Yalayaloo
25/02/2026	Distraccion	La Duda
27/02/2026	Villanueva	Las Flores
27/02/2026	Villanueva	El eneal
27/02/2026	La Jagua del Pilar	8 de Marzo











CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS

Teléfono Celular: 310 5118311

Email:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

DIVULGACIÓN

Durante el período evaluado, la interventoría verificó la realización de las actividades de producción de un video institucional con una duración aproximada de cinco (5) minutos, desarrollado por el contratista con el propósito de socializar los avances del proyecto y promover la conciencia ambiental frente al uso de estufas ecológicas y su aporte a la protección de los ecosistemas.

El material audiovisual contó con la participación de beneficiarios del proyecto, quienes compartieron sus experiencias y manifestaron los beneficios percibidos a partir de la implementación de las estufas ecoeficientes en sus hogares, evidenciando los impactos positivos en términos ambientales y sociales.

Como soporte de esta actividad, el contratista suministró el enlace para la visualización y descarga del video, el cual fue revisado por la interventoría como parte del seguimiento a las acciones de divulgación del proyecto.


MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista relacionadas con el monitoreo de los impactos generados por la implementación y uso de las estufas ecoeficientes en los hogares beneficiarios del proyecto. Esta actividad tuvo como propósito evaluar los efectos ambientales, energéticos y sociales derivados del uso de esta tecnología en las comunidades intervenidas.

En el marco de esta actividad se verificó la recolección de información en campo, mediante la aplicación de instrumentos de seguimiento y observación directa en las viviendas donde fueron instaladas las estufas. Lo anterior permitió identificar aspectos relacionados con el funcionamiento de las estufas, el consumo de leña, las condiciones de ventilación en los espacios de cocción y la percepción de los beneficiarios frente a los beneficios obtenidos.

Durante el período evaluado, el proyecto alcanzó un avance físico del 11,93% frente a un 4,37% programado, lo que evidencia cumplimiento de las metas establecidas en la programación vigente.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO	
% PROGRAMADO MAYO	0,34%
% EJECUTADO MAYO	0,34%
% PROGRAMADO JUNIO	5,80%
% EJECUTADO JUNIO	5,80%
% PROGRAMADO JULIO	11,57%
% EJECUTADO JULIO	11,57%
% PROGRAMADO AGOSTO	11,91%
% EJECUTADO AGOSTO	11,91%
% PROGRAMADO SEPTIEMBRE	15,14%
% EJECUTADO SEPTIEMBRE	15,14%
% PROGRAMADO OCTUBRE	14,34%
% EJECUTADO OCTUBRE	14,27%
% PROGRAMADO NOVIEMBRE	12,71%
% EJECUTADO NOVIEMBRE	12,78%
% PROGRAMADO DICIEMBRE	11,57%
% EJECUTADO DICIEMBRE	11,57%
% PROGRAMADO ENERO	11,57%
% EJECUTADO ENERO	4,01%
% PROGRAMADO FEBRERO	4,37%
% EJECUTADO FEBRERO	11,93%
AVANCE TOTAL EJECUTADO	**99,32**

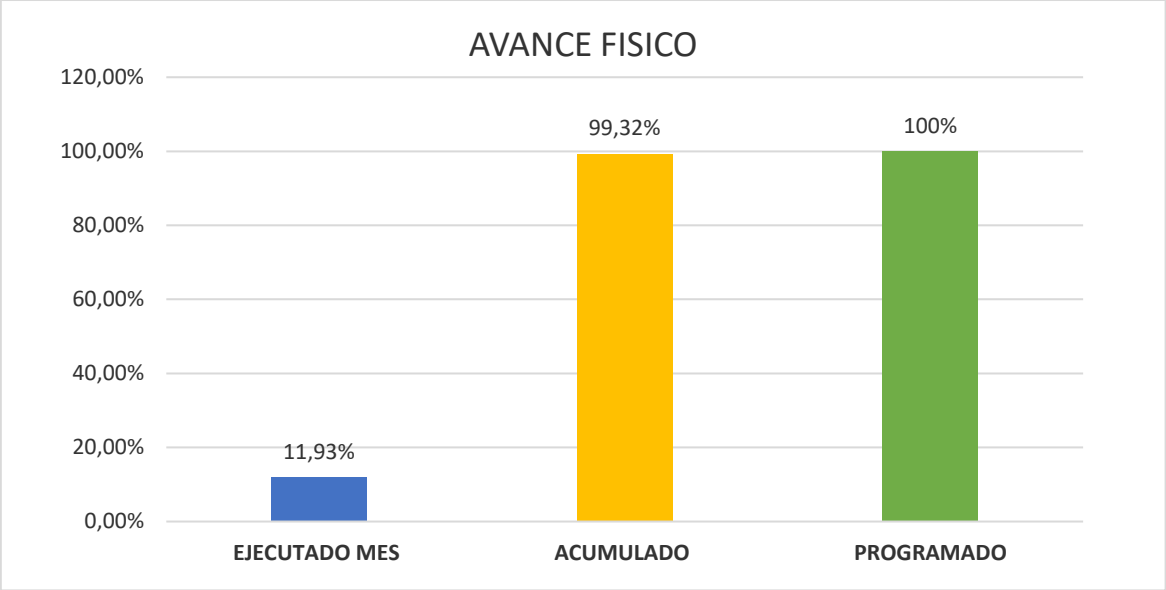

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

INFORMACIÓN LEGAL.

Pólizas contrato de Obra.

Se aprueban las garantías únicas establecida en la póliza de cumplimiento No. 47-44-101030695 y responsabilidad civil extracontractual No. 47-40-101009486, expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, para garantizar las obligaciones adquiridas en virtud del contrato electrónico de obra pública Nº 0051 del 2025 14 de mayo del 2025, celebrado entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA y FUNDACION AGUA LUNA, cuyas características se describen a continuación:

Póliza según contrato

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/03/2025	20/05/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/03/2025	20/05/2026	$2,828,307,335

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/03/2025	20/01/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/01/2026	14/01/2031	$282,830,733.50
RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/03/2025	20/01/2026	$569,400,000

Actualización de póliza según acta de inicio

PÓLIZAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$565,661,467
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	47-44-101030695	14/05/2025	20/07/2026	$2,828,307,335
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47-44-101030695	14/05/2025	22/03/2029	$282,830,733.50
CALIDAD DEL SERVICIO	47-44-101030695	16/03/2026	16/03/2031	$282,830,733.50
RSPONSABILIDAD CIVIL	47-40-101009486	14/05/2025	22/03/2026	$569,400,000

Pólizas contrato de Interventoría.

Se presenta en su orden: Aprobación de garantías de cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y calidad del servicio de la obra del Contrato de interventoría No. CI-0060-2025, amparados según pólizas de garantía de cumplimiento No. 46-44-101013376 y responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Compañía de Seguros SEGUROS DEL ESTADO, como se detalla a continuación:

Póliza según contrato

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	**Nº DE POLIZA**	**VIGENCIAS**		**VALOR**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	30/04/2025	30/08/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	30/04/2025	30/08/2026	$204,968,575

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	30/04/2025	28/02/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	28/02/2026	28/02/2031	$81,987,430.00
RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	30/04/2025	28/02/2026	$284,700,000

Actualización de póliza según acta de inicio

PÓLIZAS: SEGUROS DELESTADO S.A				
AMPAROS	Nº DE POLIZA	VIGENCIAS		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$81,987,430
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	46-44-101013376	14/05/2025	13/09/2026	$204,968,575
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	46-44-101013376	14/05/2025	14/03/2029	$20,496,857.50
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101013376	14/03/2026	14/03/2031	$81,987,430.00
RSPONSABILIDAD CIVIL	46-40-101006756	14/05/2025	14/03/2026	$284,700,000

INFORMACIÓN FINANCIERA.
Contrato de Obra:

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL
1	CONSTRUIR ESTUFAS FIJAS ECOEFICIENTES				
1,1	Construir estufa fija ecoeficiente (0.73 m x 1.05 m) h=0.83 m	Un	1.156,0	3.332.598,00	3.852.483.288,00
1,2	Construir estufa fija ecoeficiente (1.00 m x 3.00 m) h=0.40 m.	Un	44,0	3.171.628,00	139.551.632,00
	Subtotal costos directos				**3.992.034.920,00**
	Administración			24%	958.088.381,00
	Imprevistos			1%	39.920.349,00
	Utilidades			5%	199.601.746,00
	Iva sobre Utilidad			19%	37.924.332,00
	SUBBTOTAL 1				**5.227.569.728,00**
2	REALIZAR TALLERES Y CAPACITACIÓN PARA FAMILIAS BENEFICIADAS				
2,1	Realizar talleres de socializacion del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas.	Un	28,0	2.202.285,00	61.663.980,00
2,2	Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento del sistema de cocción eficiente.	Un	34,0	3.077.285,00	104.627.690,00
2,3	Realizar la divulgacion del proyecto	Un	1,0	13.350.000,00	13.350.000,00
	Subtotal costos directos				**179.641.670,00**
	Administración			24%	43.114.001,00
	SUBBTOTAL 2				**222.755.671,00**
3	MONITOREO Y SEGUIMIENTO				
3,1	Realizar monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes	Und	1,0	166.362.315,00	166.362.315,00
	Subtotal costos directos				**166.362.315,00**
	Administración			24%	39.926.956,00
	SUBBTOTAL 3				**206.289.271,00**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**5.656.614.670,00**

Contrato de Interventoría:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.								
		A	B	C	D	E	F	G
N°	CONCEPTO	SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN	F.M.	VALOR MES	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (A*B*C*D*E * F)
1	PERSONAL							
1.1	PERSONAL DE SUPERVISIÓN							
1.1.1	Director de Interventoría	$ 5.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 5.775.000	10,0	$ 57.750.000
1.1.2	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00	1	100%	210,00%	$ 8.400.000	10,0	$ 84.000.000
1.1.3	Tecnico de campo	$ 2.800.000,00	1	100%	210,00%	$ 5.880.000	10,0	$ 58.800.000
1.1.4	Profesional social	$ 3.500.000,00	1	50%	210,00%	$ 3.675.000	10,0	$ 36.750.000
1.3	PERSONAL DE APOYO							
1.3.1	Contador	$ 4.500.000,00	1	15%	210,00%	$ 1.417.500	10,0	$ 14.175.000
1.3.2	Auxiliar administrativo	$ 2.700.000,00	2	15%	210,00%	$ 1.701.000	10,0	$ 17.010.000
						SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$268.485.000
OTROS COSTOS DIRECTOS								
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND	CANTIDAD	%DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO		N° DE MESES	TOTAL PARCIAL
2.1	Papelería y copias	glb	1	100%	$ 100.000,00		10,0	$ 1.000.000
2.2	Transporte (Alquiler de vehiculo)	un	1	100%	$ 7.500.000,00		10,0	$ 75.000.000
						SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		$76.000.000
RESUMEN GENERAL								
						COSTO TOTAL (1 + 2)		$344.485.000
						IVA (19%)		$65.452.150
								$409.937.150

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el presente período de reporte, la interventoría registra un avance físico del 10%, correspondiente a las actividades desarrolladas en el marco del seguimiento y control del proyecto de construcción de estufas ecoeficientes. Con este avance, se alcanza un porcentaje acumulado del 96,25% en la ejecución de las actividades de interventoría.

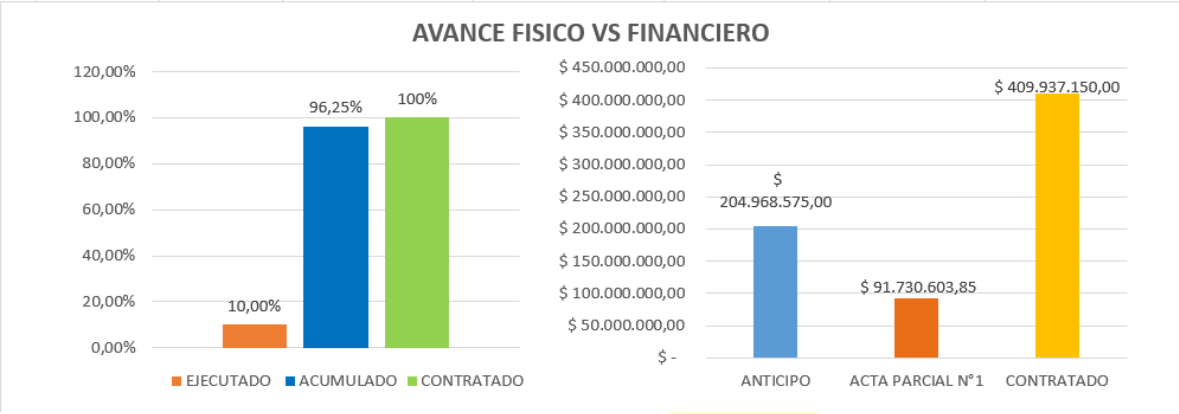

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

Control Financiero Inversión Anticipo de obra

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0051 DE 2025
	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
OBJETO DEL CONTRATO:	BPIN 20243218000007
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 5.656.614.670,00
VALOR DEL ANTICIPO 50%:	$ 2.828.307.335,00
CONTRATISTA:	FUNDACION AGUA LUNA
NIT:	900.345.569-5
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF
NIT:	901.941.657-4

Nota: Es de aclarar que CORPOGUAJIRA realizo un descuento del 5% por un valor de $ 141.415.367,00 al valor correspondiente del anticipo quedando un valor neto de $ 2.686.891.968,00. esto soportado por la liquidacion de cuenta con numero de registro interno N° 531 con fecha 30 de mayo de 2025.

En la siguiente tabla lista de ítems en los cuales se programa invertir el anticipo de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	MANO DE OBRA				$ 227.266.000	8,46%
1,1	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	250	466.187	$ 116.546.750	*20,83%*
1,2	Mano de obra de instalacion KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	250	442.877	$ 110.719.250	*20,83%*
2	TRANSPORTE				$ 225.065.750	8,38%
2,1	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (0.73 m x 1.05 m)	UND	250	558.018	$ 139.504.500	20,83%
2,2	Transporte al sitio de la obra de KIT de Herrajes (1.00 m x 3.00 m)	UND	250	342.245	$ 85.561.250	20,83%
3	MATERIALES				$ 2.223.855.469	82,77%
3,1	Ladrillo tipo bocadillo 5X10X20	UND	160.000	3.200	$ 256.000.000	35,09%
3,2	Ladrillo Macizo de 10*20*30 cm	UND	32.487	2.800	$ 45.482.245	43,90%
3,3	kit de herraje (0.73 m x 1.05 m)	UND	1.156	1.617.354	$ 1.869.661.224	100,00%
3,4	kit de herraje (1.00 m x 3.00 m)	UND	44	1.198.000	$ 52.712.000	100,00%
4	GMF (4X1000)				$ 10.704.749	
	TOTAL		-	-	2.686.891.968,00	100%

Control Financiero Inversión Anticipo interventoría

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO


CONTRATO No	**CI-0060-2025**	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". BPIN 20243218000007	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF	NIT. 901941657-4
VALOR CONTRATADO	CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	
	$	**409.937.150,00**
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES	
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA	
SUPERVISOR	ING. KIANA RAFAELA VALBUENA MEJIA	
ANTICIPO (50%) :	**$**	**204.968.575,00**

PROGRAMACION INICIAL

ITEM	DESCRIPCION / DETALLE	CANTIDAD A EJECUTAR CON ANTICIPO	VALOR A EJECUJAR CON ANTICIPO	VALOR NETO A GIRAR
1	HONORARIOS PROFESIONALES	65%	$ 133.229.573,75	$ 133.229.573,75
2	TRANSPORTE	35%	$ 71.739.001,25	$ 71.739.001,25
	TOTAL	100%	$ 204.968.575,00	**$ 204.968.575,00**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA


CONCEPTO PAGO	Valor Total	Amortizado	Valor del Pago	Saldo pendiente
ANTICIPO	$ 2.828.307.335,00			
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1	$ 1.675.315.354,57	$ 837.657.677,29	$ 837.657.677,29	$3.981.299.314,43
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº2	$1.663.501.785,97	831.750.892,98	831.750.892,98	2.317.797.529.46
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº3	$ 1.377.706.927,65	$ 688.853.463,83	$ 688.853.463,83	$ 940.090.601,81

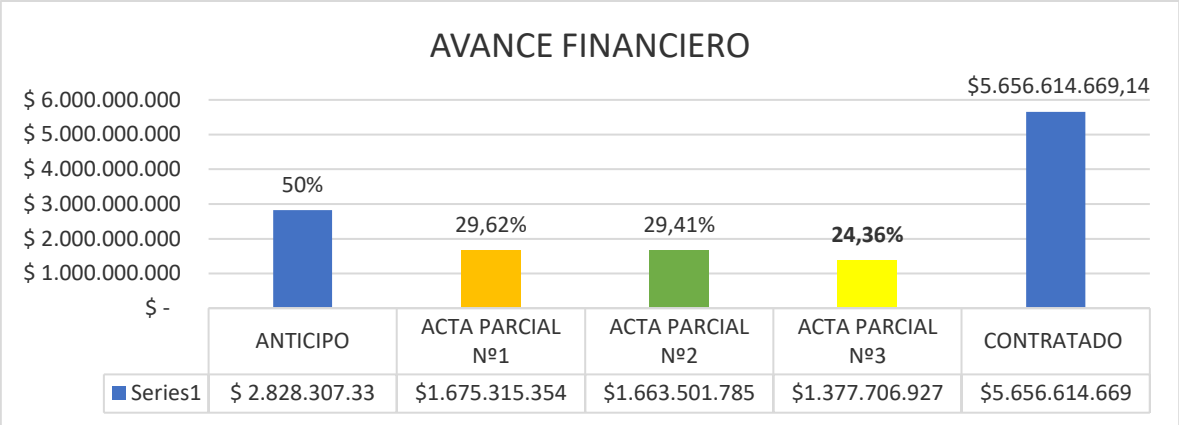

PAGOS REALIZADOS A LA INTERVENTORIA

el presente período se presenta la Cuenta de Cobro Parcial N.° 2, la cual corresponde a los servicios de interventoría prestados durante el período evaluado, conforme a las actividades de verificación, seguimiento técnico, administrativo y documental realizadas al proyecto.

CONCEPTO PAGO	Valor Total	Amortizado	Valor del Pago	Saldo pendiente
ANTICIPO	$ 204.968.575,00			
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1	$ 183.461.207,35	$ 91.730.603,50	$ 91.730.603,50	$ 226.475.942,65

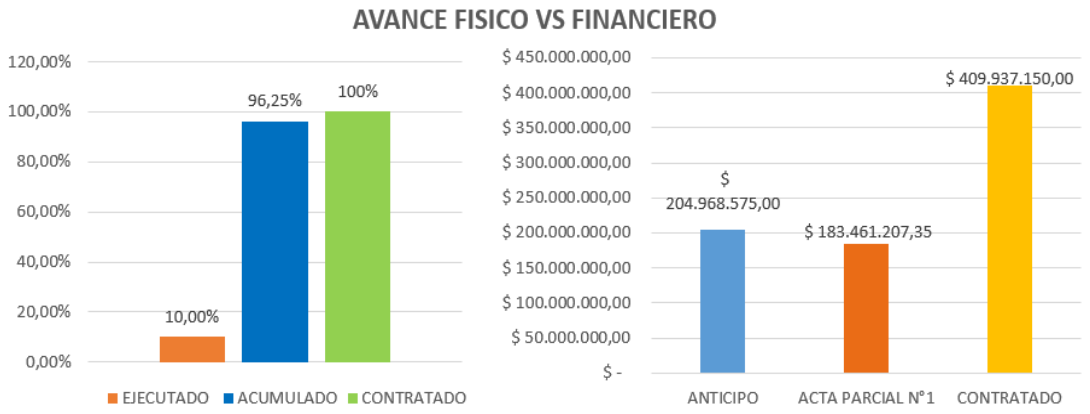

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

Durante el período evaluado se logró avanzar de manera significativa en la ejecución del proyecto, destacándose la construcción de noventa y ocho (98) estufas ecoeficientes que habían quedado pendientes del mes de enero debido a las dificultades presentadas en dicho período. Con la ejecución de estas actividades fue posible subsanar los inconvenientes previamente identificados y dar cumplimiento a las metas establecidas para el proyecto.

De manera complementaria, durante el período también se desarrollaron actividades orientadas a las capacitaciones, divulgación del proyecto mediante la producción de material audiovisual que permite visibilizar las acciones adelantadas y los beneficios generados en las comunidades beneficiarias. Así mismo, se realizó el monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes, con el fin de evaluar los efectos ambientales y sociales derivados de su implementación, así como la percepción de los beneficiarios frente a su funcionamiento y aportes en la mejora de las condiciones de vida.

Con las actividades ejecutadas durante el presente período se alcanzó un avance del 11,93%. En consecuencia, el acumulado general del proyecto, que incluye las actividades de obra, interventoría y supervisión, alcanza un 98,56% de ejecución, evidenciando que el proyecto se encuentra en su fase final y próximo al cumplimiento total de los objetivos planteados.

LUIS VICENTE SOCARRAS BERTY
Interventor
UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCA – POSO ONDO - CASTILLETE		
BENEFICIARIO:	NUVIS BOLIVAR - CC. 26984604		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	BARRANCA – CASTILLETE		
BENEFICIARIO:	ALES BOLIVAR AMAYA - CC. 8400618		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	MAICAO - GARRAPATERO		
BENEFICIARIO:	ROSARIO HENRIQUEZ – CC. 40793103		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en "V" para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½" x 1/8" de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	EDUARDO SANTOS – CC. 84.030.250		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	WILSON BRITO – CC: 84033920		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – KM 18 VIA VALLEDUPAR – COMUNIDAD EL PARAISO		
BENEFICIARIO:	CARMEN MARIA GAMEZ PIMIENTA – CC 40.912.438		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COMUNIDAD PARAISO		
BENEFICIARIO:	BELINDA EPIAYU FONSECA – CC: 1118804313		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COMUNIDAD EL PARAISO		
BENEFICIARIO:	ELVIA YANET MOVIL – CC: 40932626		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – FINCA BELLA ADRIANA		
BENEFICIARIO:	MIGUEL ARIZA – CC: 1124401847		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COMUNIDAD SHURUIPA		
BENEFICIARIO:	LILIBETH URIANA – CC. 1006616039		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	JOSE PINTO – CC: 3803120		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – LA LOMA		
BENEFICIARIO:	LUIS GRIEGO – CC 84088866		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – LOMA LARGA		
BENEFICIARIO:	YORQUIS OROZCO – CC. 84083065		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – VILLA M		
BENEFICIARIO:	EMEILA OJEDA LOPEZ – CC: 40922375		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COMUNIDAD GUAYACANAL		
BENEFICIARIO:	EUFEMIA CALDERON – CC 1118814891		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





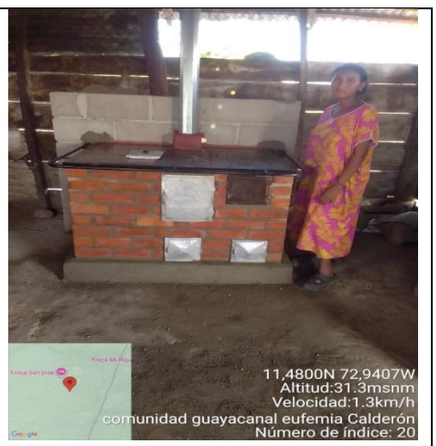

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – ARHUACO		
BENEFICIARIO:	MERY BRUS DIAZ – CC. 42490053		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – ARHUACO
BENEFICIARIO:	LENIS RODRIGUEZ – CC: 36554150

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





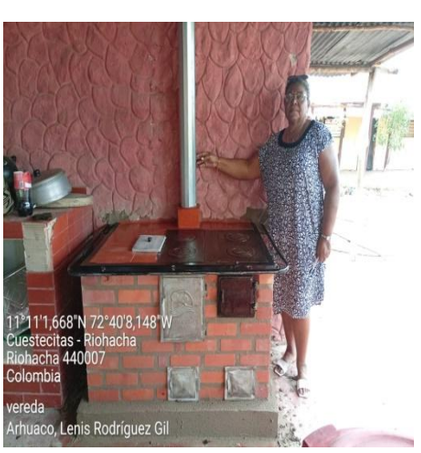

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – CHARALITO		
BENEFICIARIO:	EMEL RODRIGUEZ – CC 84027475		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – CHARALITO		
BENEFICIARIO:	LUIS EMIRO MAGDANIEL – CC 17843354		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



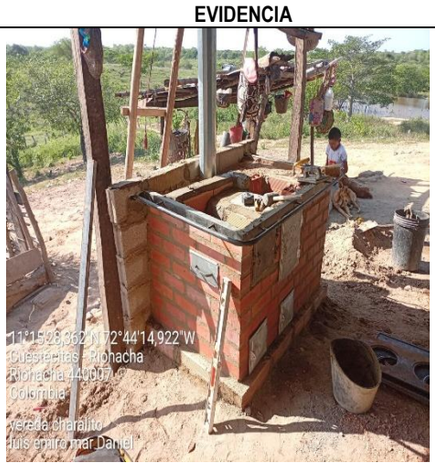



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	24-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – LA GLORIA		
BENEFICIARIO:	JOHAN PAUL SARMIENTO – CC: 84008777		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

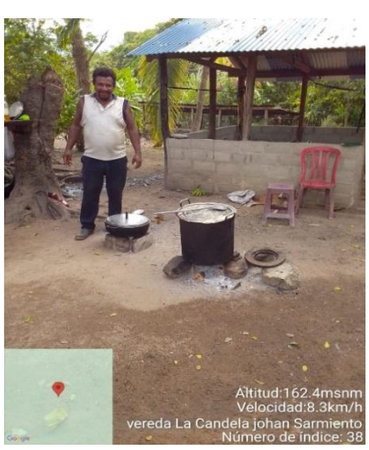





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	22-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – KM 18 VIA VALLEDUPAR – COMUNIDAD EL PARAISO		
BENEFICIARIO:	JOHN ENDRIS RAMIREZ SAPUANA – CC 1119698872		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COMINUDAD SHURUIPA		
BENEFICIARIO:	SENIA URIANA – CC. 56062692		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – PILLAYA		
BENEFICIARIO:	JIMMIS MARTINEZ – 77007944		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – CUCURUMANA		
BENEFICIARIO:	MARIA TERESA GAMEZ – CC 56099849		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – KATCHII		
BENEFICIARIO:	JUDITH ROJAS IPUANA– CC. 40937857		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	NAHUM HERRERA – CC: 17808496		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	04-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	LILA MORELA BRITO – CC 40932236		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	ROBERTO BOLIVAR – CC 84008163		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

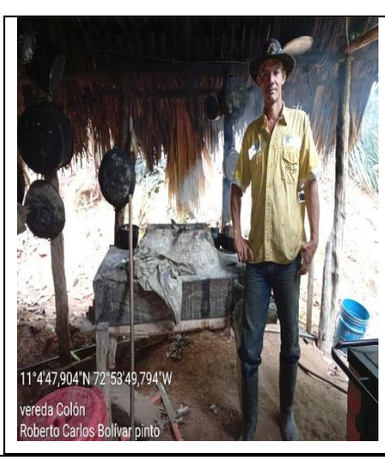

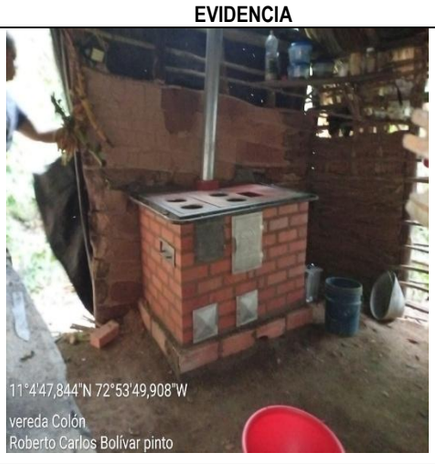



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – VILLA MARTIN		
BENEFICIARIO:	JUAN PABLO CAMARGO – CC: 1124059193		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



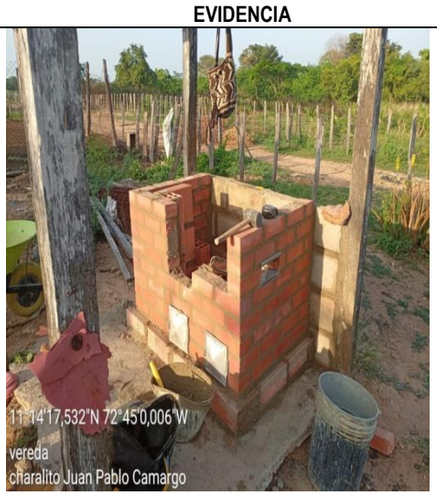



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – APALASAMANA		
BENEFICIARIO:	BLAS ALFONSO QUINTERO – CC. 84032962		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	8-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – WIRACAL		
BENEFICIARIO:	ARNULFO LUNA MENDOZA – CC. 84026671		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



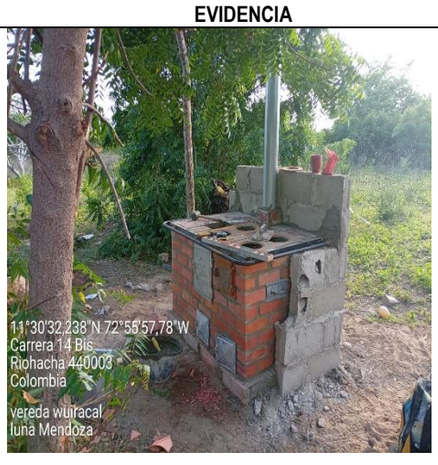



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	2-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	CARLOS GRIEGO – CC: 17804670		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	1-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COLON		
BENEFICIARIO:	JORGE CARRILLO – CC 84006474		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	22-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – PUNTA SIERRA		
BENEFICIARIO:	NUBIA MARQUEZ URIANA – CC 40877123		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	RIOHACHA – COMUNIDAD URIAKATH		
BENEFICIARIO:	FANY FIDELIA IGUARAN – CC: 40929914		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

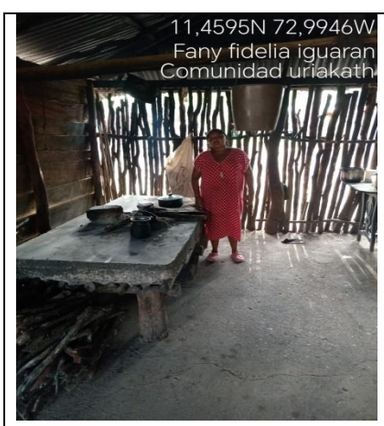





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	01-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	MANUEL ACUÑA CASTELLAR – CC. 12589364		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	28-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	EDUARDO JOSE PEÑARANDA – CC: 1003233086		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	27-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	SIMON CONTRERAS – CC 9268599		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



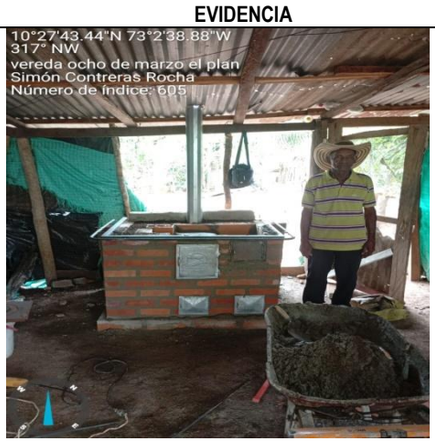



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	DIOSA DIAZ – CC: 49775561		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





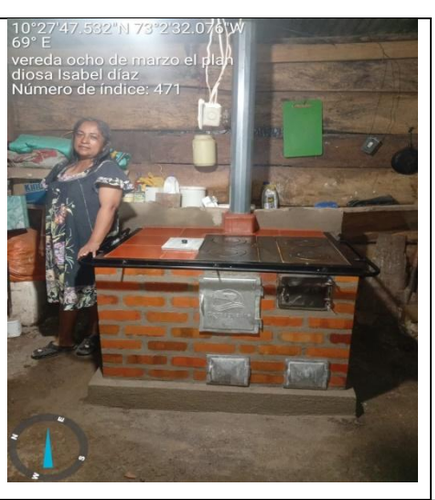

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	25-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	LINEYI CARVAJAL – CC: 1119836815		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	LUIS FELIPE CASTRO – CC: 5007491		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	PEDRO MANUEL CARDENAS – CC. 17975725		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	JOSE RAMIREZ – CC: 17970543		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	WILBER IGLESIA – CC 5092057		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



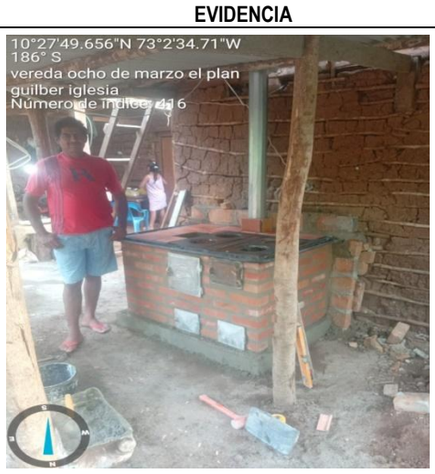



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	NORELVIS ARENAS – CC. 49780086		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	ZORAIDA ROMERO – CC: 1065610865		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	LUZ MARINA BARBOSA – CC 42404638		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	HERNAN SAURITH – CC. 5092147		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	MARIELA NAVARRO – CC: 36496609		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	FREDY CARVAJAL – CC 1062398418		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

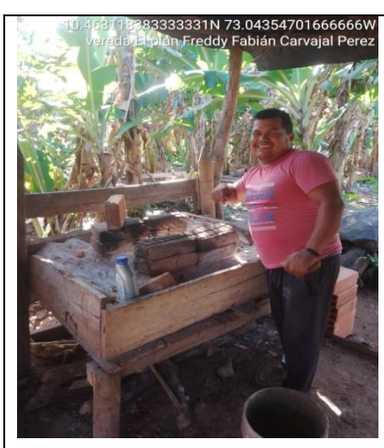





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	CIRO GARCIA LEON – CC 18930450		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	OSCAR ACOSTA – CC: 12501581		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	JULIA ROSA CARDENAS – CC 50960926		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	GLORIA RANGEL SANGUINO – CC. 1065138226		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	ROSA ANELIA SIERRA – CC. 42485735		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	17-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	IBETH SOTO – CC: 1065203076		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

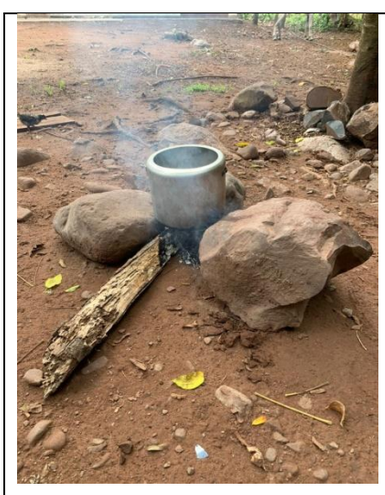





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	ALBEIRO ANGARITA – CC 7573095 (VERIFICAR CC)		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

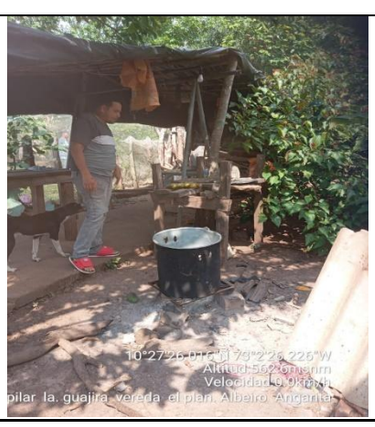

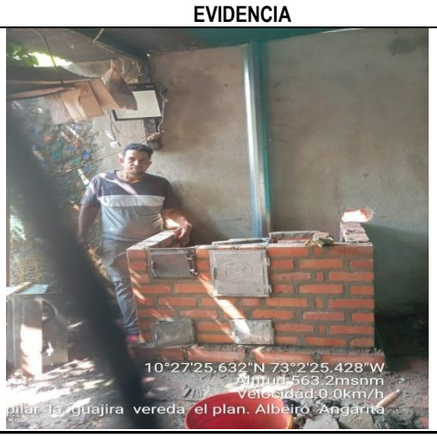



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL EDEN		
BENEFICIARIO:	LILIANA LAGO – CC. 26871184		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – BERLIN		
BENEFICIARIO:	GLADIS PEREZ – CC: 49691274		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – PANTANITO		
BENEFICIARIO:	LUIS GUILLERMO RUMBO – CC 17970372		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



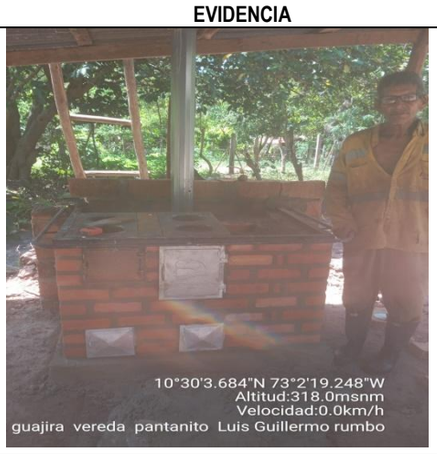



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	ROSANA HINOJOSA – CC. 56097236		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	INGRID PAOLA DAMIAN – CC: 1061451790		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	24-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – LOS PIÑONES		
BENEFICIARIO:	YANETH TERAN – CC 36676413		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

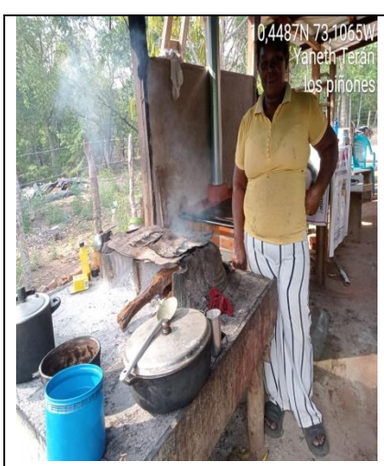





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	25-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – LA MONTAÑA		
BENEFICIARIO:	ENRIQUE APONTE – CC. 17089402		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	26-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	AMYNEIDIS CARDENAS – CC: 1119816491		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – SIERRA MONTANA		
BENEFICIARIO:	HUGO TORRES – CC 5174896		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	21-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – BERLIN		
BENEFICIARIO:	LUIS JOSE RAVELO GARCIA – CC. 77179384		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – BERLIN		
BENEFICIARIO:	NEURU PEREZ – CC: 1062354392		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	ANGIE LAZARO – CC 1065846396		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	19-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – BERLIN		
BENEFICIARIO:	DALGY MOYA – CC. 4976134		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	20-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – BERLIN		
BENEFICIARIO:	CESAR ALFONSO PEREZ – CC: 1003427751		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

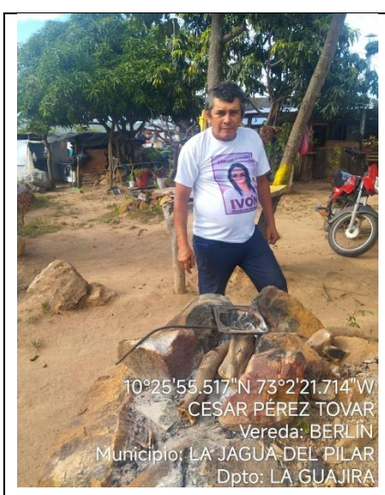

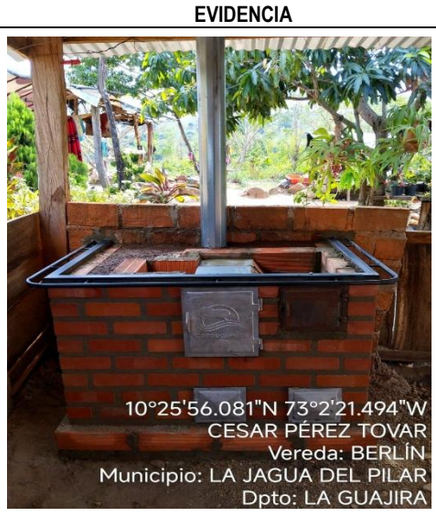



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – SAN JOSE		
BENEFICIARIO:	LUIS RAFAEL CARRILLO – CC 1070073185		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

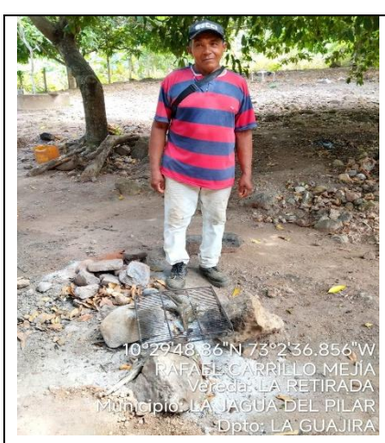





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	16-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – SAN JOSE		
BENEFICIARIO:	MANUEL FRANCISCO ROMERO – CC. 6866019		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – LOS PIÑONES		
BENEFICIARIO:	BEATRIZ LOPEZ – CC: 41389662		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	14-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EDEN		
BENEFICIARIO:	JOSE CARLOS LAGO – CC 17971037		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

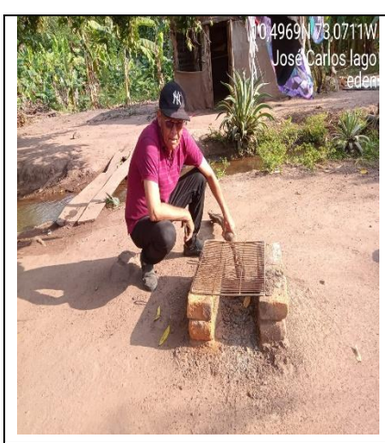





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	ARIAL ROJAS – CC. 5135355		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	ELIODORO GOMEZ – CC: 18971464		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	11-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	JOSE ROJAS – CC 85203283		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	10-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	XIMENA CARDENAS – CC. 1119816012		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

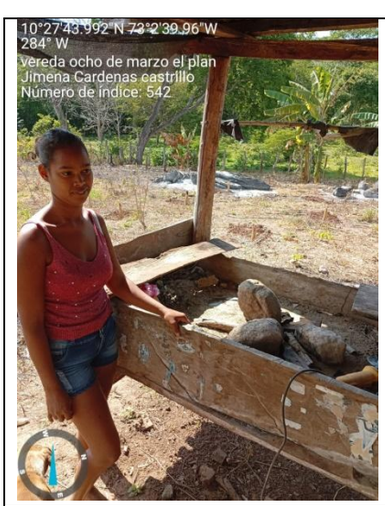





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	9-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	MIGUEL ANGEL CARDENAS – CC: 5181390		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	8-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR		
BENEFICIARIO:	RAMETH REALES ROY – CC 1082881247		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	7-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – SAN JOSE		
BENEFICIARIO:	ENRIQUE LOPEZ LORA – CC. 19051383		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	6-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	JULIO GABRIEL GOMEZ – CC: 5013037		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



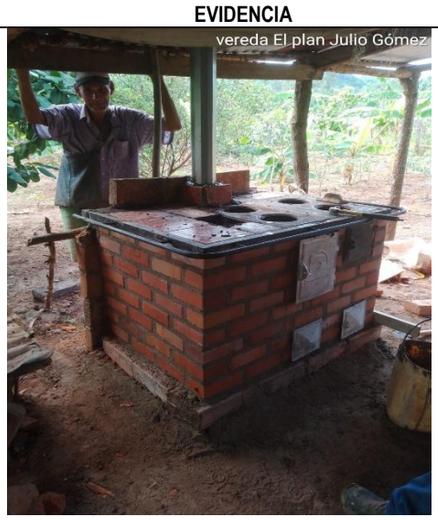



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PLAN		
BENEFICIARIO:	JOVANY CAMELO – CC 5092257		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	02-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL EDEN		
BENEFICIARIO:	ESTEBAN DE JESUS CANALES – 77036142		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

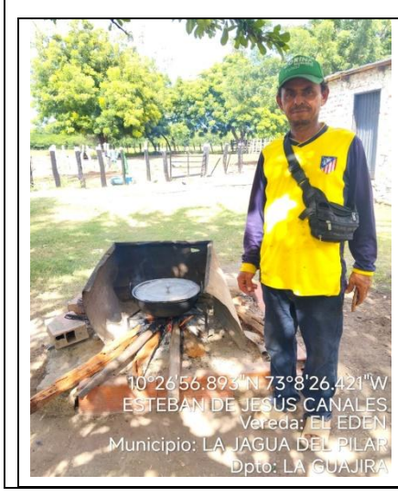





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	18-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – LA LOMA		
BENEFICIARIO:	ARMANDO LOPEZ SIERRA – CC. 77196259		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI


VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA





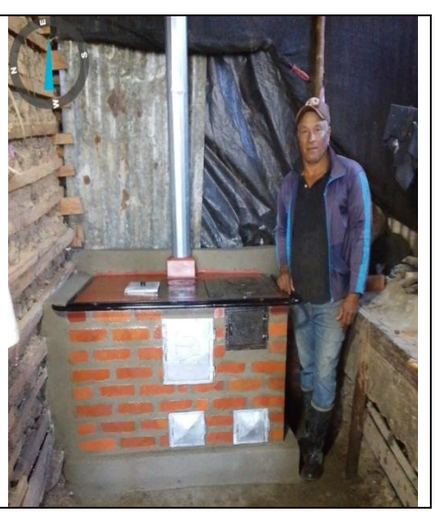

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	13-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – LA PIÑA		
BENEFICIARIO:	LUZ ESTELLA OSORIO – CC: 36594640		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	09-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	MEREDITH ESCOBAR – CC. 49796728		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

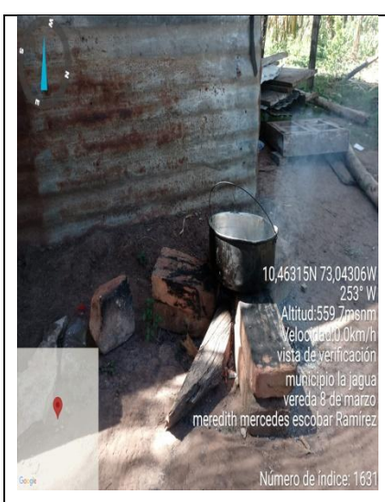





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	MAIRA TERAN – CC: 1121326551		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	03-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	CRISANTO CABALLERO – CC 6792473		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	RAFAEL CARDENAS – CC. 17970860		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

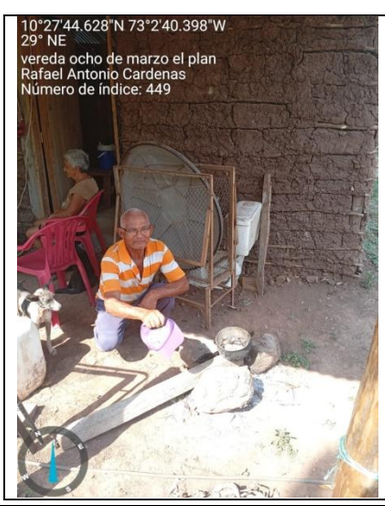





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	MIGUEL SANTIAGO – CC: 6794037		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	07-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – BERLIN		
BENEFICIARIO:	ANDRES FELIPE TORRES – CC 1065206206		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA



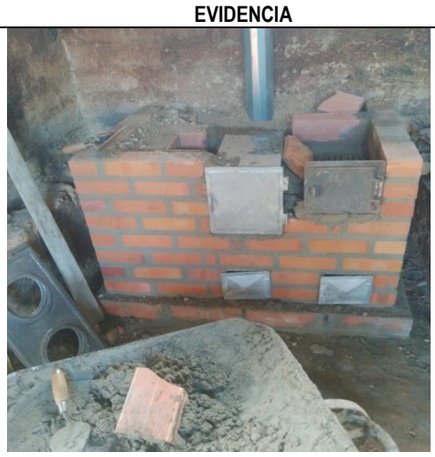



UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	05-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL EDEN		
BENEFICIARIO:	CARLOS HERRERA – CC. 5091681		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	15-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL EDEN		
BENEFICIARIO:	JOSE PEÑATE – CC: 1067806262		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	08-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	LUIS DIAZ MORON – CC 77160539		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	12-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PIÑAL		
BENEFICIARIO:	JAIRO SAUDITH – CC. 12711657		


VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA

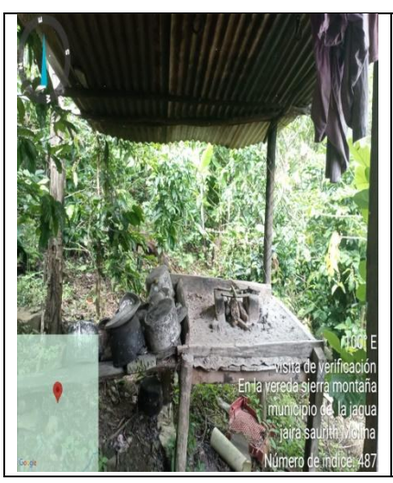





UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	06-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – EL PIÑAL		
BENEFICIARIO:	FABIAN PEREZ – CC: 1119816112		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

N° CONTRATO DE OBRA:	0051 DE 2025	**FECHA:**	-02-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
MUNICIPIO/ VEREDA:	LA JAGUA DEL PILAR – 8 DE MARZO		
BENEFICIARIO:	DIONEL ABRIL – CC 1003122899		

VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ITEM	Actividad	Cumple (Sí/No)
1	Nivelación base, colocación de dos primeras hiladas, juntas 2.5 cm y capa de mortero	SI
2	Tercera hilada con registros el registro (cenizas y tiro 18 cm c/u), del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho	SI
3	Cuarta hilada, fijación de registros, depósito de cenizas y parrilla	SI
4	Guía para chimenea en parte posterior (interno de la estufa 47,5 cm aprox), espacio entre ladrillos (8-10 cm)	SI
5	Quinta y sexta hilada, H= 42 cm, sobre la sexta hilada espacio para horno a 33 cm del borde derecho	SI
6	Séptima hilada, espacio horno (25 cm), demarcación compuerta combustión y entrada de aire	SI
7	Ladrillos en “V” para chimenea, ladrillo acostado para soporte horno, cierre contra fugas	SI
8	Octava hilada, ventanilla entrada de aire (18 cm), instalación puerta de combustión	SI
9	Puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.	SI
10	Últimas hiladas hasta alcanzar altura 75 cm respecto del suelo, colocación del horno	SI
11	Instalación de planchas y separador, distancia interna 4,5 cm, instalación escuadra	SI
12	Medidas de estufa L=1,05 cm A=0,73 cm h=0,83	SI

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

Cant.	Componente	Cumple con medidas y material (Sí/No)
2	Planchas (Hierro fundido) L= 56 cm, A=29 cm, e= 15 cm	SI
1	Separador (Hierro fundido) L= 57 cm, A=11 cm, e= 14 cm	SI
1	Parrilla (Hierro fundido) L= 37,5 cm, A=19,5 cm, e= 17 mm	SI
1	Puerta leñera (Hierro fundido) L= 19 cm, A=17 cm, e= 6 cm	SI
1	Tapa puerta leñera (Hierro fundido) L= 21,5 cm, A=18,5 cm, e= 6 mm	SI
1	Tanque (Aluminio) L= 15 cm, A=21,5 cm, e= 5 mm	SI
1	Tapa del tanque (Aluminio) L= 24 cm, A=18 cm	SI
1	Horno (Aluminio) L= 27 cm, A=23 cm, e= 42 cm	SI
1	Tapa del horno (Aluminio) L= 32 cm, A=27 cm	SI
1	Bandeja horno (Lámina cold rolled) L= 39,5 cm, A=22 cm, e= 2 cm	SI
2	Registros (Aluminio) L= 15 cm, A=12 cm, e= 10 cm	SI
2	Tapa de registro (Aluminio) L= 20,5 cm; A=19 cm	SI
1	Oído (Aluminio) L= 20 cm; A=11 cm	SI
1	Gorro chino, Ø 35 cm, altura. boca con platina 1" x 1/8 diámetro 14 cm.	SI
1	Tubo para chimenea L= 3.6 metros; Ø 12,7 cm	SI
1	protector en ángulo de hierro de 1 ½” x 1/8” de 1.37 metros x 0.97 metros con un tubo separador a 11 cm de 7/8 redondo calibre 18.	SI

EVIDENCIA







UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 23-02-2026. LUGAR: Monguí

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Yeinor Epiayu	1149697040	Aiipraure		Yeinor
2	Deiberson Epiayu	1134182989	"		Deiberson Epiayu.
3	Robinson Epiayu	1006.582.717	"		Robinson Epiayu
4	Elizabeth Epiayu	1.118.818.900	"		Elizabeth Epiayu
5	Maritza Epiayu	26.925.247	"		martza Epayu.
6	Marbelis Epiayu		"		Marbelis
7	Diocleia Epiayu		"		Diocleia
8	Milena Gonzalez		"		Milena
9	Ana Maria Castro	1.118.803.400	"		Ana Maria
10	Gonzalo Epiayu	17.903.129	"		Gonzalo
11	Elias Epiayu				Elias Epiayu
12	Vicente Epiayu				Vicente Epayu
13					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 23-02-2026. **LUGAR:** Riohacha

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Nistel Palacio G.	77.014611	Colon	3135144095	Nistel Palacio G
2	Eduardo Zenteb Bonilla S.	1123993756	"	3213961447	
3	Edwar Pitto Bitto	84 030 250	"		Edwar Pitto
4	Iglo Beto Penaranda	1093722	"	3043593431	Ceb Pinto
5	Jorge Carrillo	84006474	"	3154958214	Jorge C
6	FRANKLIN	8P086PF5	"	3127323917	Franklin
7	Etelvina Nild	40929781	"		etelvina Nild
8	José Pinto	3803120	"	3243961411	
9	Luis Aldo Gnes C.	84.088.866	"	3116675822	
10	Manuel Antonio Diaz B	77029450	"	3013459020	
11	Eagles E Carriego C.	1984672	"	3218418620	
12	Wilson Brito	84035920	"	3004252119	Wilson Brito
13					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 23-02-2026. LUGAR: Hatonuevo

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Margareth Ortiz	1.121.298049	Varias	3159788431	Margareth Ortiz.
2	Lnes Pacheco	40 798 542	"	3156626298	Lnes Pacheco
3	Dagoberto Pushaina.	84008.115	"	3187003653	Dago Pushaina
4	Ana maria pushana p	26 986 592	"	3215834214	Ana maria P.
5	María Alejandra Guillot	1006714165	"	3134272738	Maru Guillot
6	Jose Felix Brito F	84006118	"		Jose Felix Brito F
7	Calixto Fonseca	51537442	"	3026266953	Yamicas
8	Victor Guaji Pushaina	5.153.797	"	3007998206	Victor Pushaina.
9					
10					
11					
12					
13					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 25-09-2016 LUGAR: Maicao

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Ramona Acevedo D	8.701091	Garrapatero	3145066547	
2	Silvia T. Pushaina	11.93522345	"	3216076024	
3	Rosita Epiayú	56.090977	"	3135457709	
4	Libia Pearl Case.	26.036.634	"	3106585023	
5	Ariel M. Acevedo T.	15.672834	"	3106585023	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 25-09-2026 LUGAR: Maicao

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Carla Uriana Apushana	1149184449	Yalayalou	3052704756	Carla Uriana
2	Alfredo Epinayu	17.828.749	"		Alfredo Epinayu.
3	Carmen Uriana E.	40.975.079	"		carmen
4	Vicente Uriana	5.141.871	"	321 6875234	Vicente
5	Amer Uriana	1121531685	"		Amer
6	Vicente Uriana	BU 107.097	"		
7	Cladis Apushana	40.954.468	"		Cladis
8	Marilys Uriana P.	1124.378.363	"		Marilis Uriana Apushana
9	Juan Uriana	84.077.525	"		Juan
10	Ramon Bernal	5990 425	"		Ramon
11	Yeyo Uriana	84.077.151	"		Yeyo
12	Jose. Uriana	1-124.378.366	"		Jose
13	Aura Apushana	1-124.495	"		Aura

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-09-2026 **LUGAR:** Villanueva

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Aníbal Gonzalez	56056471	El enea	3022185347	
2	Jesus Fragoz S.	17974028	"	3217412643	
3	EFRAIN VEGA DIAZ	1) 970.523	"	3106757169	
4	HABEL M BAQUERO DIAZ	27615857	"	3157038094	
5	Ever Hinojosa M	17970684	"	3005993210	
6	Felix Ortega Mata	17972781	"	3145392427	
7	Rafael Ramirez	17976624	"	3159954048	
8	JORGE ANDRES PECCO C.	1010056742	"	3102477874	
9	GLEN ALBERTO ARIZA M	17976911	"	3023779494	
10	Ruben Hernandez	17972668	"	3107020246	
11	Luis Rumbo Ramirez	17971510	"	3017881380	Luis Rumbo 06-03-26
12	EDGAR JOSÉ Cotera R.	17974700	"	3216500899	
13	Margalita Ortiz	27015704	"	3003754941	Margalita Ortiz

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-09-2016 LUGAR: La Jagua del Pilar

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Ingris Damian	1051451790	8 de Marzo	3108914730	Ingris Damian
2	Eduardo José Peñaranda	1003233086	"	3008234707	Eduardo Peñaranda
3	Luz marina Barbosa	42404638	"	3222638202	Luz Marina Barbosa
4	Maribel Contreras	33220303	"		Maribel Contreras
5	Ariel Rojas	513 5355	"	3244108 2471	Ariel Rojas
6	Meredith Escobar R	49796728	"	3133790923	Meredith Escobar R.
7	Anellys Carvajal Perez	1149836615	"	3015333781	Anellys.
8	Freddy Carvajal Perez	1062398418	"	3145634828	
9	Javier Carmona	17976628	"	3116861246	Javier Carmona.
10	Mayra Teran Suarez	1121726571	"	3241829174	Mayra.
11	Jairo Crespo	3235169846	"	1192778441	Jairo Crespo
12	Luis Fdo Diaz M	77160539	"	3122141213	
13	Fidia Palmar B	33224209	"	3145403648	Fidia Palmar B

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF

TALLERES DE CAPACITACIÒN

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA: 27-02-2026 LUGAR: Villanueva

No.	Nombre Completo	Cédula de Ciudadanía	Cominidad	Teléfono / Correo	Firma
1	Molly Real soto	56057306	las flores	3116194437	Molly Real Soto
2	Kenelma Garcia S.	40940811	"	3017773685	Kenelma G. S.
3	Miguel R. Guaa	17975266	"	3186872273	M. G
4	JUAN. S. VILLAMIL POINTO	17970293.	"	3162066284	Juan Villamil
5	Jose Guerra	17976298	"	3615763107	Jose Guerra
6	Jose Guillermo Luna	17973002	"	3127790143	Jose Luna
7	Eva Tellez. S.	17643794	"	3206271412	Eva Tellez. S.
8	Silano Diaz	24.069624	"	3002058325	Silano Diaz
9	Sandra Reyes			3197151197	Sandra Reyes
10					
11					
12					
13					

CLL 18 NO. 7 85 BARRIO LAS VILLAS
Teléfono Celular: 310 5118311
E mail:inversionesysolucioneslvsb@hotmail.com
Riohacha – La Guajira.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941657	4	UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 18 7-85	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3014373959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	00651906	9500651906	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCO AV VILLAS		$4,377,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	40951297	AMAYA ZUNILDA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
2	CC	84090164	BRITO CARLOS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
3	CC	1118806268	CARDOZO SAMIR																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF30	30	$2,750,000	$110,000	14-23	30	$2,750,000	$67,000	30	$0	$0	Si	$727,000
4	CC	1118838660	DIAZ LORAINIS																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS041	30	$2,800,000	$112,000	CCF30	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	$68,300	30	$0	$0	Si	$740,300
5	CC	1118800355	MEJIA MARIANNE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
6	CC	40928933	PIMIENTA BIELCA																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF30	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0	Si	$1,057,500
7	CC	1124409653	SOTO YENIFER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC33	30	$1,750,905	$70,100	CCF30	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Total	**Afiliados(7)**																						$16,553,620	$2,648,800			$16,553,620	$662,400			$16,553,620	$662,400			$16,553,620	$403,600		$0	$0		$4,377,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941657	4	UNION TEMPORAL INTER ECOESTUF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 18 7-85	RIOHACHA-LA GUAJIRA	3014373959	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	00651906	9500651906	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCO AV VILLAS		$4,377,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,648,800	$0	$2,648,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$920,200	$0	$920,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,728,600	$0	$1,728,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$403,600	$0	$403,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$403,600	$0	$403,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$662,400	$0	$662,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	7	$662,400	$0	$662,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$662,400	$0	$662,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$70,100	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$182,100	$0	$182,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$340,100	$0	$340,100
TOTAL				7	$4,377,200	$0	$4,377,200
