PENDIENTE - Por parte de la interventoría CIG se manifiesta que se hicieron las aclaraciones pertinentes junto al contratista UTMP el día de hoy y se informará a la entidad contratante.
Se adelantaron actividades de control, mitigación y seguimiento ambiental, entre las que se destacan: • Jornadas de capacitación ambiental enfocadas en determinantes ambientales, protección de materiales, mantenimiento de sumideros, manejo de árboles y control de sedimentación. • Gestión integral del retiro y aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), alcanzando un avance acumulado del 86,30%, con metas de aprovechamiento del 99,82% y circularidad del 19,33%. • Manejo, control y evacuación de 27.310 kg de lixiviados, mediante sistemas de contención, bombeo, almacenamiento temporal y disposición final controlada. • Implementación de medidas de control ambiental preventivo, tales como lavado de cárcamos, control de olores, monitoreo de gases y mantenimiento de sistemas de contención.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Componente Riesgos: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a l red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente
Por parte del IDRD se comunica que el Radicado SDA No 2026ER10476(23/0/2026) programacion de la tercera campaña, por parte de la Interventoria (Profesional de Hidrogeologia) se indaga a la supervision sobre la fecha propuesta para la tercera campaña de monitoreo ante la SDA propuesta para este mes de Febrero , el apoyo a la supervision manifiesta que no se ha tenido respuesta, se revisara el dia de mañana comunicacion o se tendra que correr la fecha, se queda de compromiso dar una razon por parte del IDRD a mas tardar el dia 09/02/2026 para iniciar o no trabajos preliminares al respecto.
2) Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD
Por parte del IDRD se manifiesta que calidad de aire esta radicado hace varios meses y la interventoria CIG tiene conocimiento respectivo, no depende de IDRD y depende derespuesta expresa de la SDA en dos terminos 1) Propuesta presentada para UNICO monitoreso del Parque (incluido dos proyectos CAR y Velodromo- Parque metropolitano) y 2) Concepto tecnico 6540 indica claramente que la ubicacion de puntos de monitoreo se debe hacer en conjunto con la SDA) Se esta realizando gestion por parte del IDRD ante la SDA, se aclara por parte de la UTMP que lo que se solicita es la reiteracion ante la SDA, segun lo descrito se están agotando las instancias interinstitucionales.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Se ejecutaron acciones sistemáticas orientadas al control y reducción del riesgo, principalmente en escenarios asociados a excavaciones, aguas subterráneas y condiciones climáticas, incluyendo: • Monitoreo permanente del nivel freático en los pozos eyectores. • Control de precipitación mediante pluviómetro en sitio. • Activación de sistemas de bombeo, diques de contención, isotanques y catch tank para manejo de lixiviados. • Aplicación de cal en zonas excavadas como medida preventiva frente a generación de olores ofensivos. • Monitoreo de gases volátiles en frentes activos, sin detección de niveles críticos.
Por parte de la interventoria CIG se manifiesta que fue remitida al IDRD que se remite subsanacion del Informe No 21, se recibe lista de chequeo de aprobación del informe No 20 el cual fue remitido en fisico ante la entidad contratante.

Componente SST: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23. PENDIENTE en avance según lo reportado en las diapositivas del presente comité.
2) Subsanación de observaciones efectuadas durante recorrido preliminar a comité de Obra No 96. (05/02/2026). Por parte de la UTMP y CIG se remite a la entidad contratante registro fotografico pertinente al respecto de los ajustes según observaciones efectuadas y se presentan durante el comite.
3) Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Humaña . Por parte de la UTMP se solicito el cierre respectiva, se tiene seguimiento respectivo teniendo que esta activo en obra.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Durante el periodo se mantuvo el control permanente en frentes de trabajo, mediante: • Inspecciones en excavaciones, trabajos en altura, uso de EPP, orden y aseo. • Implementación de pausas activas, inducciones y charlas de seguridad. • Seguimiento a indicadores de accidentalidad, registrándose 8 accidentes acumulados, de los cuales 4 se encuentran cerrados y 4 abiertos. • Control del ausentismo laboral, con un acumulado histórico de 62 eventos.
Por parte de la Interventoria CIG se manifiesta que dentro de las actividades administrativas de la semana se reporta la presentacion del informe mensual No 24 de obra y la respuesta con observaciones por parte de CIG, se subsanara el dia 05/02/2026. En cuanto a la subsanacion del informe No 20 mediante correo electronico se remitio el 04/02/2026, el cual incluye el plan de trabajo 2026 tanto de obra como de interventopria. La supervision informa que se dara respuesta a la remision digital si es el caso se tendra mesa de trabajo o aval respectivo pasra remision en Fisico.
Componente CALIDAD: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad – anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar -
Cumplido. Se comunica por parte de la interventoria que la información fue recibido y esta informacion sera base del documento a presentar como respuesta a las observaciones dadas de parte de la entidad contratante IDRD.
2) Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026. (Rad. IDRD No 20264200013601 del 20/01/2025 Oficio Contratista de obra No CE-206-125-2150 del 13/01/2026) Revisión por parte de la Interventoría CIG
PENDIENTE: Se comunica por parte de la Interventoria que se hará revision respectiva de la respuesta a la entidad contratante.
3) Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD. (Rad. IDRD No 20262100054772 02/02/2026 Hoja de vida Prof. Calidad Interventoría)
PARCIAL - Se presenta para aprobacion profesional de interventoria componente Calidad, de esto depende la respuesta al requerimiento teniendo en cuenta que este profesional firmará dicho documento (PLAN DE CALIDAD interventoria)
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes. GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

Se realizó seguimiento a los sistemas de control de calidad, destacando:

• Control de concretos estructurales, con una ejecución semanal de 123,44 m³, y un acumulado total de 2.712,08 m³, bajo protocolos de ensayo y control normativo.
• Ingreso y control de aceros estructurales, con un acumulado total de 540,99 toneladas.
• Seguimiento al suministro e instalación de la estructura metálica de cubierta, con un total acumulado de 250,84 toneladas, correspondiente a 28 unidades estructurales.
• Control documental y trazabilidad técnica de rediseños, modificaciones y componentes aprobados del proyecto.

Se ejecutaron actividades relevantes en:

• Muros estructurales.
• Columnas.
• Placas.
• Vigas aéreas.
• Estructura metálica principal.

Asimismo, se consolidó el avance en túneles, módulos estructurales, graderías y pasarelas, con seguimiento permanente a rediseños y ajustes técnicos previamente aprobados.

Respecto de los materiales y rellenos estructurales, se aprobó la caracterización técnica del material granular tipo PEA (proveniente de CTA) para el lleno del trasdós de los muros de contención, cumpliendo con la totalidad de los ensayos normativos exigidos, garantizando la estabilidad geotécnica de los túneles del proyecto.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TÉCNICO

Componente BIM: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones red de GAS

PENDIENTE: Se manifiesta por parte de la interventoria que se solicito al contratista UTMP que se realice el ajuste a la red perimetral y de manera posterior se hara revision aceptacion y/o observaciones pertinentes.

2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026. (Oficio de Obra No CE-206-125-2188 del 28/01/2026) Revisión y respuesta CIG – remitido a la entidad contratante vía Email 29/01/2026.

PENDIENTE: Se remitirá 06/02/2026 al contratista de obra la respuesta a la UTMP al respecto de la revision de la informacion presentada y se espera comentarios respectivos por parte del IDRD.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se socializa al respecto de la implementación progresiva de la metodología BIM como herramienta integral de planificación, coordinación, control técnico y seguimiento del proyecto, orientada a mejorar la eficiencia constructiva, la detección temprana de interferencias y la trazabilidad de la información.

Las actividades desarrolladas en este componente incluyen:
• Modelación tridimensional de los sistemas estructurales, arquitectónicos y técnicos, permitiendo la verificación geométrica, espacial y funcional de los diferentes elementos del proyecto.
• Coordinación interdisciplinaria mediante modelos federados, facilitando la identificación y resolución de interferencias (clash detection) entre estructura, redes técnicas y arquitectura.
• Validación de geometrías complejas, especialmente en zonas de alta complejidad constructiva como graderías, cubiertas, túneles y estructura principal.
• Soporte a la planeación de obra mediante la vinculación del modelo BIM con la programación de actividades (4D) y la

• Soporte a la planeación de obra mediante la vinculación del modelo BIM con la programación de actividades (4D) y la estimación de cantidades de obra, mejorando la precisión en la secuencia constructiva y el control de tiempos. • Actualización progresiva de modelos conforme al avance real de obra (modelos as-built parciales), fortaleciendo la trazabilidad técnica y documental del proyecto. La implementación de BIM contribuye de manera directa al control técnico de la ejecución, la reducción de reprocesos, la optimización de recursos y la mejora en la toma de decisiones, consolidándose como una herramienta clave
Componente PROGRAMACIÓN: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 y radicado IDRD No 20254000418611 del 26/12/2025 recibidos el 26/12/2025 trasladados el 31/12/2025 por parte de CIG. (Para el Modificatorio No 3 UTMP Oficios de Obra No CE-206-126- 2196 (Concretos) 2190 (Eléctricos) 2198 (Cubierta) 2186 (Hidráulicos) 2202 (Insumos)
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes entre las partes UTMP-CIG-IDRD.
2) Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026 (Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link)
PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta y observaciones de manera Digital y se remitira de manera oficial por la entidad contratante IDRD.
3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD (Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link)
PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes por parte de la entidad contratante IDRD.
4) Remisión de borrador de modificatorio No 1 Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador por parte de interventoría CIG el 04/02/2026
PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta la proxima respuesta.
5) Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica.(Rad. IDRD No 20252100566762 del 19/12/2025 y Rad. IDRD No 20252100574532 del 29/12/2025 y Rad. IDRD No 20262100013902 del 06/01/2026 (membrana en canales y Faldón Perimetral)) Pendiente Respuesta IDRD.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Se manifiesta por parte de la interventoria y obra que se debe tener en cuenta que para el Modificatorio No 3 de obra la secuencia de aceptacion de los insumos por parte del IDRD asi como de los APUS y de ahí se procede a consolidar el presupuesto y la programacion de acuerdo a los alcances planteados y el valor de la adicion disponible y comunicada por parte de la Supervision que es aproximadamente de $ 6,500,000.
Se presenta por parte de CIG el Balance a la fecha de las revisiones efectuados a los informes MENSUALES por parte del IDRD y los valores de actas parciales PENDIENTES de acuerdo al avance a la fecha.
Componente TÉCNICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

118.

1) Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP
PENDIENTE: Se informa por parte del IDRD que se encuentra en la consolidacion de la información al respecto, según la reunion en curaduria Urbana No 2 ejecutada el dia 04/02/2026 entre la partes.
2) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD
PENDIENTE.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
El seguimiento estructural se realiza de forma desagregada por módulos (1, 2, 4, 5, 6, 7 y 12) y por elementos especiales como el Túnel Principal. Durante el periodo se ejecutaron actividades continuas de cimentación profunda y superficial, incluyendo: • Fundida de dados, vigas y losas de fundación. • Construcción de columnas circulares en concreto de 35 MPa con diferentes diámetros. • Ejecución de muros estructurales y muros de contención. • Avance en vigas aéreas de gran altura en el Módulo 7. Estas actividades consolidan el desarrollo progresivo de la superestructura y permiten habilitar frentes para actividades posteriores. En los túneles (principal, administrativo, deportivo y de ambulancias) se avanzó en: • Fundida de muros estructurales. • Fundida de columnas. • Impermeabilización de muros de contención y juntas de construcción.
Estructura Metálica de Cubierta La estructura metálica de cubierta presenta un avance significativo en fabricación y suministro: • Material total en planta: 912,42 toneladas. • Avance de material allegado: 83,93% frente al total proyectado (1.087 t). • Material en producción: 303,90 toneladas. Durante el periodo se registró el ingreso de elementos estructurales correspondientes a cerchas principales y pivotes centrales, consolidando el inventario necesario para el montaje progresivo en obra.
Instrumentación y Control Geotécnico El informe de instrumentación evidencia el control de asentamientos en plataforma, paramentos, bordillos y elementos perimetrales. Los registros parciales y acumulados muestran variaciones controladas dentro de rangos aceptables, sin alertas críticas, lo que indica un comportamiento geotécnico estable de las estructuras y del entorno intervenido a la fecha de corte
Componente ELECTRICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo. (Se remite por parte del contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión)


CUMNPLIDO: Se remitio por parte de la UTMP, la supervision solicita sea remitida a la entidad contratante IDRD por medio de correo electronico.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
Durante la semana evaluada no se registró avance físico en la ejecución de redes eléctricas y de comunicaciones. Las actividades se concentraron en: • Revisión técnica de la localización de cajas de paso. • Ajustes de coordinación espacial con la estructura de concreto para evitar interferencias futuras
Componente Hidraulico: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**
1) Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-0034-2026 (19/01/2026) Rad. IDRD No 20262100023932.)
PENDIENTE. Teniendo en cuenta que se haria para el 2027 de acuerdo a las cotizaciones remitidas de VANTI.
2) Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025))
PENDIENTE. Conforme a lo determinado en el Comité Técnico No. 94 del 22 de enero de 2026, la postura oficial del IDRD es la unificación del tratamiento de lixiviados mediante una única planta compartida con el proyecto del Centro de Alto Rendimiento (CAR), priorizando la sostenibilidad operativa de la entidad. Con el fin de materializar esta postura del IDRD, la Interventoría está finalizando la elaboración de un archivo técnico en formato .CAD, que pretende unificar la planimetría de ambos proyectos, señalando los posibles puntos de inicio en el Velódromo, el punto de entrega en la futura PTAR del CAR y una propuesta esquemática de trazado preliminar para una red de impulsión. Este archivo se entregará al contratista para que sirva de base en el desarrollo de la alternativa.
3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.
PENDIENTE.
El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.
El componente hidrosanitario presenta avance general asociado a la ejecución de redes embebidas en estructuras ya construidas y a la coordinación técnica con los frentes de obra civil. Las actividades ejecutadas se concentran en: • Instalación y preparación de redes hidráulicas en zonas estructuralmente habilitadas. • Articulación técnica con el avance de cimentaciones y muros para evitar reprocesos.
Se informa la radicación de la solicitud certificación disponibilidad de servicio Vanti – VELODROMO GIBRALTAR No Dad. No 007378-2026 del 03/02/2026. GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Compromisos descritos y patados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO	UTMP-CIG	Según documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				
La supervision recomienda a la Interventoria la respuesta de los comunicados pendientes teniendo en cuenta los compromisos entre las partes.				

Siendo las __10:30 am___ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N-A	N-A
NOMBRE	Arq. Rubén Darío Crespo	NOMBRE	N-A	N-A
CARGO	Director de interventoría	CARGO	N-A	N-A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Torres Residente de Interventoria	Arturo Rojas T.

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	Comité Técnico/Transversal Velodromo Cto Obr. 3232-2023 y Cto. Int 3219-2023	DD	MM	AA
ACTA No. 97		12	2	2026

LUGAR:	virtual Plataforma Teams enlace:	HORA DE INICIO:	10:00	HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se adjunta Listado de Asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de Componentes Transversales	4.
2. Presentacion de Componentes Técnicos	5.
3. Observaciones Varias.	6.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TRANVERSAL

Se solicita permiso a los asistentes para grabar la cesion los cuales no tienen objecion y se inicia comité con autorizacion respectiva de los firmantes de la presenta Acta.

Componente Social: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Reunión de apoyo a programa de Universidad nacional (Visitas técnicas) proyecto CAR/Velódromo) Lecciones aprendidas en proyectos IDRD

Pendiente, se reprograma para despues del 8 Marzo/26. Sup. IDRD.

2) Remisión de Acta de comité de participación ciudadana No 22

Complido el 6/2/26.

3) Remisión por parte de CIG respuesta de veredicto de la Tutela descrita en el comité anterior.

Complido el 6/2/26 Rad IDRD # 20262100062972.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La Supervision indica que la Visita programada por parte de La Universidad nacional por lineamiento de la entidad será reprogramada para despues de 8/Marzo/2026 y se comunicara proxima fecha.

Componente Ambiental: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Propuesta de diseños de pozos eyectores para los 3 túneles respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de interventoría no CIG-IDRD-VEL-79-2026 de Respuesta Oficio CE-206-125-2163 Remisión diseños de pozos eyectores para los 3 túneles – Velódromo Gibraltar. (05/02/2025)) Pendiente respuesta UTMP

Pendiente.

2) Propuesta de manejo de ZONAS VERDES pendiente respuesta CIG y/o traslado IDRD (Oficio de Interventoría CIG-IDRD-VEL-0081-2026 (Rta UTMP) y Rad. IDRD No 20262100083002 (06/06/2026)) Se da respuesta a la UTMP y se da traslado a la entidad contratante IDRD.

Pendiente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

la Sup. da recomentaciones durante recorrido a obra:
- Protección a acopio de aceros
- Protecaion materiales granulayes para la Planta Concreto
- Mantenimiento a la Motobomba.

Se informa tambien la actualizacion efectuada a los Formatos de revision "lista de chequeo" de mensuales para ser aplicados en consecuencia a los informes mensuales de obra como se esta haciendo con los de interventoria, se explica que son actualizaciones normativas entre otras.

Se reafirma la revision de los informes bajo estos parametros actualizados.

Componente Riesgos: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1)Entrega a Interventoría del soporte de la radicación a la SDA de los resultados del segundo monitoreo realizado a la red adyacente del proyecto, y del soporte SDA asociado a la radicación del plan de trabajo del Tercer monitoreo a realizar a la Red adyacente

Pendiente.

2) Verificación y /reiteración respuesta Concepto técnico 06540 (Monitoreo calidad de aire/olores ofensivos) por parte del IDRD

Pendiente.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Comp. Forestal: La Sup. informa que en el IDRD se tiene profesional xra revision de Informes.

Comp. Fauna: Se realiza exposicion al respecto.

Primer comite mensual recorrido Ambiental IDRD-UTMP-CIG.

Componente SST: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Espera de Observaciones según revisión Informes mensuales por parte del IDRD No 20-21-22-23. PENDIENTE en avance según lo reportado en las diapositivas del presente comité.

En avance segun relación expuesta en comité.

2) Presentación ante el IDRD de los documentos necesarios para el cierre administrativo al accidente del Sr. Héctor Umaña

Hoy se remite documentacion ala interventoria por parte UTMP

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

Se hace reporte por parte de la interventoria
- Informe Nº 20 aprobacion IDRD
- Observacion Nº 21 por parte IDRD
- Aprobacion Informe de Obra Nº 24 (Enero)
- Observaciones puntuales a la UTMP y recomendaciones segun visita O.Nacional. al IDRD segun protocolos, se envia email con el listado de Personal.

Componente CALIDAD: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCION dadas desde la entidad contratante Radicado IDRD No Rad. IDRD No 202642000008361 del 13-01-2026 al respecto de la Ampliación de INFORMACION plan de calidad -- anexo "Plan de Inspección y Ensayos " Proyecto Velódromo Gibraltar -

Cumplido. Se comunica por parte de la interventoria que la información fue subsanada según Rad. IDRD No 20262100071112 del 10/02/2026. (Plan de Inspección y Ensayo interventoría V.4)

2) Respuesta respecto a MAYOR ALCANCE Dada desde la entidad contratante IDRD radicado No 20254200408791 del 26-12-2025 - Procedimiento para Maniobra Estructura metálica del PROYECTO VELODROMO. Visita a obra EMECOM el 16/01/2026.

Cumplido: Se comunica por parte de la Interventoria quese hace subsanacion según rad. IDRD No 20262100082982 del 05/02/2026

3) Presentación profesional de Calidad de interventoría y Respuesta requerimiento IDRD

Cumplido: Rad. IDRD No 20264200033121 del 06-02-2026 Aprobación de Profesional de Calidad Interventoría del 06/02/2026 y (*) Rad. IDRD No 20262100067662 del 09-02-2026 del 09/02/2026.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

> Ca Sup. Realiza observaciones entrega de Formato de Inspecciones visua a la estructura Metalica, sera remitido por parte de CIG el dia de hoy.

TEMAS TRATADOS - COMPONENTE TÉCNICO

Componente BIM: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Entrega y registro en el CDE (Entorno Común de Datos) los planos para construcción por Componente ajustados según observaciones GAS (Red perimetral Ajuste/Diseño)

PENDIENTE: Se completara una vez se tengan diseños aprobados UNTI.

2) Planos de Taller Pista - Velódromo (Preliminares) - Según reunión de presentación profesional subcontratista para piste de madera TEAM SHARK (26-11-2025) – Presentación Versión 1 comité 29/01/2026.Revisado por CIG y se generan Observaciones. Se espera Rta. UTMP.

CUMPLIDO: Se comunica por parte de la Interventoria que se da remicion de Oficio de Interventoría No CIG-IDRD-VEL-83-2026 de Respuesta Oficio Obra No 2188 Referente a Planos de Taller (06/02/2026) y se espera respuesta respectiva durante el desarrollo de la construccion respectiva.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

- Por parte de la UTMP se realiza exposicion de detalle de avance y control que se tiene desde el Software PowerBI.
- Generar conceptualización por parte de CIG dando respuesta a la UTMP con copia a la UTMP.

Componente PROGRAMACIÓN: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Alcance por parte de la UTMP respecto a DEVOLUCIONES dadas desde la entidad contratante IDRD Ítems NO Previstos e Insumos Rad. IDRD No IDRD No 20254000415511 del 23/12/2025 se hace remisión de los INSUMOS a la entidad contratante IDRD (*) En espera de comentarios y/o aprobación de INSUMOS para remisión APU´S

PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes entre las partes UTMP-CIG-IDRD. Se comparte por medio de WETRANFER por parte de la UTMP los archivos actualizados de los APU´s del Modificatorio No 3 de Obra (Adición No 2 Prorroga No 1) . Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra

2) Remisión de información referente a los Insumos y APUS para modificatorio de acuerdo al alcance según rubro anunciado disponible para la adición del Modificatorio No 3 indicado por la supervisión IDRD. Se remite Digital al IDRD 28/01/2026

PENDIENTE: Se informa por parte de la supervisión que se remitira respuesta y observaciones de manera Digital y se remitira de manera oficial por la entidad contratante IDRD. Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_link Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 Obra

3) Remisión de borrador de modificatorio No 3 (Adición No 2 Prorroga No 1) Obra – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición. Se remite Inicialmente IDRD – CIG 16/01/2026 y complementado parte Jurídica 28/01/2026 en revisión CIG-IDRD Pendiente Observaciones IDRD Documento.

PENDIENTE: Se avanza en las revisiones pertinentes por parte de la entidad contratante IDRD. Compartida información mediante drive con el IDRD https://drive.google.com/drive/folders/1D1aao56glcmP3IGhQrX_uVc4BKQUDK-2?usp=drive_ Rad. IDRD No 20262100065662 del 06/02/2026 Remisión de INSUMOS base de APU´s Modificatorio No 3 (Adición No 2 Prorroga No 1)Obra.

4) Remisión de borrador de modificatorio No 1 (Adicion No 1 Prorroga No 1) Interventoría – según lineamientos dados y valor proyectado para la adición a Obra. Se comparte borrador actualizado según observaciones por parte de interventoría CIG el 04/02/2026. Pendiente Observaciones IDRD.

PENDIENTE: La supervision informa que esta en revisión de los documentos remitidos

5) Remisión al IDRD de borrador de VIABILIDAD al modificatorio No 3 (Adicion No 2 y Prorroga No 1) por parte de CIG al contratista de Obra UTMP – Pendiente Observaciones IDRD

PENDIENTE: La supervisión informa que esta en revisión de los documentos remitidos.

6) Respuesta a oficios tramitados CIG sobre reconocimiento de la membrana de cubierta según concepto técnico, financiero y jurídica. Pendiente Respuesta IDRD

CUMPIDO: Se da Respuesta IDRD Rad. No No 20264200033881 del 06-02-2026 y trasladado por CIG Oficio No CIG-IDRD-VEL-87-2026. Pendiente pronunciamiento de la UTMP.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La interventoria manifiesta el RIESGO que se tiene al desembolso presentado por parte de UTMP de Anticipo para pago de la pista teniendo en cuenta que el contrato de obra vence el proximo 4 de Abril 2026 de manera contractual por ende este desembolso no seria conveniente por tiempos.

Se presenta por parte de CIG el Balance a la fecha de las revisiones efectuados a los informes MENSUALES por parte del IDRD y los valores de actas parciales PENDIENTES de acuerdo al avance a la fecha.

Componente TÉCNICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **así:**

1) Respuesta por parte del IDRD respecto a remisión de documentos para ANUENCIA documento requerido para tramite PRORROGA Y MODIFICACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PROYECTO VELODROMO. Se remite a la entidad contratante IDRD (Se hace remisión al IDRD el día 19/01/2025 Rad No 20262100023942) Pendiente Tramite interadministrativo IDRD - DADEP

PENDIENTE: La sup. indica que fue radicada el dia de ayer y sera radicada ante DADEP el dia de Hoy, pte # Radicado.

2) Visita a avance de construcción de Pista Velódromo en Mosquera - objetivo de socializar el trabajo efectuado por la empresa TEAM SHARK en Avance. Solicitud Tema interadministrativo por parte del IDRD

PENDIENTE.

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La supervisión solicita claridad en las Sumatorias entre cantidades en Tonelajes sumados al 100%. La UTMP realiza claridades y la Supervisión remitira Formato para empezar a implementar en la Presentacion Semanal.

Componente ELECTRICO: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **así:**

1) Según la Remisión de plano de ingreso de fibra Óptica al proyecto Velódromo remitida por el contratista UTMP el PLANO DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA de Gabinete (Rack de Comunicaciones), pendiente Visita de operador de telecomunicaciones a asignar por parte del IDRD para el Punto de Conexión.

- La Sup. Solicita el plano de Fibra optica el remitido corresponde al Rack se debe definir la ubicacion del cuarto de Comunicaciones hacia afuera del edificio

El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

La UTMP solicita a la Supervigida la visita del operador de Red para que se establezca un punto de ingreso y asi mismo el contratista planteará el recorrido interno, esto manifestado por parte de CIG, queda Pendiente tambien la licencia (de acuerdo la radicacion ante ENEL)

Componente Hidraulico: La Interventoría CIG presenta ante los participante los compromisos del componente objeto de seguimiento y describe el avance correspondiente, de acuerdo con el estado de desarrollo y ejecución **asi:**

1) Actualización económica (Precios 2026) de la alternativa para la conexión de GAS por la Carrera 91– Proyecto Velódromo – según remisión efectuada de Cotizaciones VANTI Instalaciones de gas (*) Trasladado a la UTMP

PENDIENTE. Se da respuesta por parte del IDRD mediante Rad. IDRD No 20264200030721 del 10/02/2026 - Traslado Oficio CIG-IDRD-VEL-102-2026 el 11/02/2026. Pendiente Rta. De la UTMP

2) Mesa técnica conjunta entre el IDRD, la Subdirección Técnica y la Subdirección de Parques, con participación de la Interventoría CIG, orientada al análisis de la constructibilidad y a la validación de los escenarios ambientales asociados a las alternativas de manejo y conducción de aguas subterráneas (lixiviados) que puedan aflorar durante la operación del Proyecto Velódromo, incluyendo la revisión interna CIG–IDRD y la evaluación de la propuesta de trazado presentada por el Consorcio CIG–UTMP para la definición del punto de conexión. (**) Pendiente Respuesta UTMP (Oficio CIG No CIG-IDRD-VEL-00964-2025 (12/12/2025))

PENDIENTE.

3) Viabilidad y aprobación de conexión definitiva de la acometida de agua potable y las redes de desagües, sanitario y pluvial ante la entidad prestadora de servicio EAAB. Este trámite es interinstitucional. Se informarán avances respectivos por parte de la Supervisión.

PENDIENTE. Se continua con gestiones por parte del IDRD.


El Contratista de Obra, Unión Temporal Metropolitano Porvenir (UTMP), presenta la continuidad en el desarrollo del componente, así como los avances evidenciados a la fecha, de acuerdo con la presentación adjunta, incorporándose los comentarios y observaciones adicionales que resulten pertinentes.

- Se informa que VANTI Agendo el 18 de Marzo para Revision de Diseño.
- Se solicita por parte del IDRD concertar una fecha para reunion preliminar en curaduria Estructura y Arquitectura de manera independiente.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Compromisos descritos y patados dentro del presente documento y los reflejados dentro de las diapositivas presentadas y que hacen parte del documento en comento como ADJUNTO	UTMP-CIG	Según documentos descritos.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las __ m___ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	N-A	N-A
NOMBRE	Arq. Rubén Darío Crespo	NOMBRE	N-A	N-A
CARGO	Director de interventoría	CARGO	N-A	N-A

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Ing. Arturo Rojas Torres Residente de Interventoria	Arturo Rojas T.

B. Soportes de seguimiento de fichas PMA

B1. Soporte capacitaciones ambientales

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 de 26. OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Determinantes Ambientales en el Proyecto. DURACIÓN: 10 mn

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☒

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP.	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Milton Quesadas	Ayudante	U.T.M.P	
2	E F [illegible] sierra	AY	Ciomo	EFacM
3	Jose Bustacara	Residente	UTMP	Jose Bustacara
4	OMAR CRUZ	M/OBRA	UTMP	
5	Francisco	Ayudante	UTMP	
6	Carlos Florian	Opemini	EyP	
7	Juan Carlos Caldera	Op Torre Grua	UTMP	
8	Miguel AM	OP: Mini	AITARA	Miguel
9	ALEXANDER RIVAS	APAREJADOR	UTMP	AL
10	Camilo Castro	Laboratorista	UTMP	
11	Steven Diaz	Ayudante T.C	utmp	
12	Vision Bolo	Ofici	UTMP	
13	Luis Cordoba Fonseca	M/obra	UTMP	
14	Pedro Ubaque	Almacen	UTMP	
15	Carlos Mauricio A	Oficial	AITARA	
16	Jimena Camacho	UTMP	Auxiliar	Jimena Camacho
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 1-4 Total participantes: 70

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30-01-26 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar

TEMA TRATADO: DETERMINANTES AMBIENTALES DEL PROYECTO

DURACIÓN: 10 min

INDUCCION	[X]	CHARLA / DIVULGACION	[ ]	CAPACITACIÓN	[ ]
REINDUCCIÓN	[ ]	NOTIFICACIÓN	[ ]	REUNIÓN	[ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva.	A y B.	Rte SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Enet Castro	OF	AyB	Enet
2	Jeodon Vanegas	Hseso	A-YB	Jeodon
3	Johnson Gonzalez Chaves	AYu.	AyB.	
4	Ribaldo Ospino	A-Y	AYB	
5	Yeimi Suarez Ficio	07	A y B	Yeimi S.
6	Angel Soto G	OF	AyB	Angel Soto.
7	Miguel Tovar	AYU	AyB	
8	Fabian Cano	AYU	AyB	
9	Sergio LOZ	OF	AyB	
10	Henry Castellon	AYU	AyB	Henry
11	Juan Freyle	AY	AyB	Juan Freyle
12	Johnathan Urdaneta	AYU	AyB	
13	Cuervo nieto	OF	AyB	
14	Jorge Adriano Ospino	OF	AyB	
15	Cristian A. Bermudez	Ejero	AyB	
16	Alvaro Reyes	INGR	AyB	
17	Sotelo Rueda	OF	AyB	
18	Freddy Yomayusa	AY	AyB	

OBSERVACIONES: Hoja 2-4 Total de participantes: 70

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30-01-26 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Determinantes, del Proyecto Ambientales DURACIÓN: 10 min.

INDUCCION [x] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]
REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]
OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva	AyB	Dte Sst	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Cer	Oficial	AYB	Jose Cer
2	Luis cortes	OF	AYB	Luis cortes
3	Shar F Rica	N/O	AYB	Shar F Rica
4	Dairo Pimienta	OF	AYB	Dairo
5	Emerson Chacon A	AY	AYB	Emerson
6	Edgar orlando	AY	AYB	
7	John Cagley	Oficial	AYB	John
8	José Alberto Ardila	Ayudante	AyB	José Alberto
9	Jorge Ramos	oficial	AyB	Jorge
10	Pablo Wilder Fonseca Ortiz	Ay	AYB	Pablo
11	Socorro Soares	Ayb	AYB	Socorro
12	Diomedes Mendoza H	Oficial de obra	AYB	Diomedes
13	Kevin SOTELO	MAESTRO	AYB	Kevin
14	OMAR BLANCO	OF	AyB	Omar
15	VICTOR ESTEPA	Ay	AyB	Victor
16	Fabian	Ay	Ayb	Fabian
17	Jesus	Ay	AyB	Jesus
18	Jairo	OF	AyB	Jairo

OBSERVACIONES: Hoja 3-4 Total participantes: 70

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 en 26 OBRA / PROYECTO: Velódromo

TEMA TRATADO: Determinantes Ambientales en el proyecto

DURACIÓN: 10 min

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☒

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Lictor M Estrada	OF	AYB	
2	Diego Nova	Of	AYB	
3	Edgar Nieto	OF	AYB	
4	Arley Bastidas	Hewero	AYB	
5	Leonardo Venegas	Hewero	AYB	
6	Andrés Perez	EBeme	AYB	
7	Isidoro Pedroza	AY	AYB	
8	Carlos Rojas Fabra	Oficial	AYB	
9	Reinaldo Gil	Oficial	AYB	
10	Cristian A. Bermudez	Ejero	AyB	
11	Darwis Gutierrez	Oficial	AyB	
12	Jose Peñaranda	AYU	AYB	
13	Victor Hernandez	Ayu	AYB	
14	Juan Carlos Fraile	AYU	AyB	Juan Fraile
15	Pablo E Ballesteros	Ayu	AyB	Pablo E
16	Diogenes Moreno	Ayudante	AyB	
17	Alfredo Vides	Oficial	AyB	
18	Cremen Soto	Ofic	AyB	Cremen

OBSERVACIONES: Hoja 4-4 Total de participantes: 20

(1).

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogota 6 feb 26 OBRA / PROYECTO: Velodromo.

TEMA TRATADO: Manejo de Kit de Derrames. Contención De emergencia. DURACIÓN: 10 min.

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACIÓN	☒
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco	UTMP.	Res. Ambiental.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	. EFRAIN SIERRA	AY	UTMP	
2	Milton Quesada	Ayudante	UT-MP	
3	Miguel Angel	OB MIN	ALTARA	
4	PEDRO VASQUEZ	ALMACEN	UTMP	
5	OMAR CRUZ	M/OBRA	UTMP	
6	Carlos Florian	op mini	EVP	
7	Camilo Castro	Lubricentrista	UTMP	
8	Juan Carlos Calderon	op. Torre Grua	UTMP.	
9	Yeison Bata	Ofi V.	UTMP	
10	ALEXANDER RIVAS	APARENTADOR	UTMP	
11	Silvia Diaz	Oficio T.C.	UT MP	
12	Mario Jimenez	Aparejador	UT MP.	
13	EDILBER HERNANDEZ	OP retro	ALTARA	
14	Jimena Camacho	Auxiliar	UTMP	Jimena Camacho
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 1-4 Total de participantes: 68

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 06-02-26 OBRA / PROYECTO: Veloorama

TEMA TRATADO: Manejo de Vilt de derrames. Contención de. Emergencias. DURACIÓN: 10 min

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [X]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar salcedo.	AyB	Rte SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Deodan Vanegas	Ayudante	AyB	Deodan
2	Isidoro Pedroza	Ayudante	AyB	
3	Anejenis Perez	OF.	AyB	
4	Diego Navas	Of	AyB	
5	Oscar M. Cte	Of	AyB	
6	Omar Rui, Blanco	OF	AyB	
7	Alex Bastidas	Herrero	AyB	
8	Vidal Hedida	Hellero	AyB	
9	E Mecastro	Ayudo	AyB	
10	Eliel Barrios	Herrero	AyB	
11	Nestor Barrios	Herrero	AyB	
12	Amin Jose	OFI	AyB	
13	Elemer castro	OF	AyB	
14	Jesus Rodriguez	OF	AyB	
15	Ricardo Salazar	of	AyB	
16	Darwin Pinto	of	AyB	
17	Jorge Ospino	Ay	AyB	
18	Jurtem Bernal	OF	AyB	

OBSERVACIONES: Hoja 3-4 Total de participantes: 68

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 06-02-2026 OBRA / PROYECTO: Velodromo Cazucá.

TEMA TRATADO: Manejo de Kit. de derrame Contención. De Emergencia. DURACIÓN: 10 min.

INDUCCIÓN [X] CHARLA / DIVULGACIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X]
REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]
OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Soler.	A y B.	Dte SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Gloria Beltran	OF	AYB	
2	Benti Jimenez	OF	AYB	
3	Jose Perez Tunay	AYU	AYB	
4	Nelson Calderon	FABCvid	AYB	Nelson C
5	Edilson Riaño P	OFi	AYB	
6	Arturo Ureda	OF	AYB	
7	Juan David Marriaga	AY	AYB	
8	Jan de Lopez	Ayudante	AYB	
9	William Solano	OP.C.OC	AyB	W. Wom S.
10	Jagbante	AYyb aute	AYB	
11	Johnathan Urdanta	Ayudanti	AyB	
12	DANIEL OSORIO	OF	AyB	
13	ALBERTO ARDILA	AYUDANTE	AyB	
14	Pablo Emilio	AYT	AyB	Pablo E
15	Juan marriaga	Ay	AyB	
16	Diego ORTIZ.	Dte.	AyB	
17	Alex ARTURO	Dte.	AyB	
18	Juan de dios	Ay	AyB	

OBSERVACIONES: Hoja 3-4 Total participantes 68

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: CC-02-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Manejo Kit de derrame contension emergencia. DURACIÓN: 10mn

INDUCCION [X] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [X]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva	A y B.	Rte SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Querneto	of	A Y B	
2	Diego Navas	of	A Y B	
3	Victor Estrada	OF	A y B	
4	Eliel Barrios	Herrero	A, Y B	
5	Amin Jesp	U T	A y B	
6	Omar Ruiz	OF	A Y B	
7	Arley Bahida	Herrero	A Y B	
8	Nestor Barrios	Herrero	A y B	
9	Jacobo Pedroza	A y	A y B	
10	Angel Perez	ERC.	A y B	
11	Leoban Varela	Herrero	A y B	
12	Elmer castro	ofi.	A y B	
13	Emer castro	oficial	A y B	
14	Cristian Bermudez	Tarro	A y B	
15	Carlos Valderrama	Maestro	A y B	
16	Carlos Prieto	almacenista	A y B	
17	Oscar Silva	SSP.	A B	
18	Ricardo Salazar	Rto	A B	

OBSERVACIONES: Hoja 4-4 Total de participantes: 68

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 13 Feb 26 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Tipo de Residuos Aprovechables.

DURACIÓN: 10 min.

INDUCCION [ ] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [X]
REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]
OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paola Blanco.	UTMP.	Res. Ambiental	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	OMAR CRUZ	M/OBRA	UTMP	
2	Miguel Angel	OP MINI	AITARA	
3	Carlos Florian	Op mini	EYP	
4	EFRAIN Sierra			EFRAIN
5	José Bustacara	Ayudante	UTMP	José Bustacara
6	Francisco Suarez	Ayudante	UTMP	
7	Camilo Castro	Laboratorista	UTMP	
8	Santiago Castellanos G	Tec residente	Ateva	
9	ALEXANDER RIVAS	APAREJADOR	UTMP	
10	Mario Jimenez	Aparejador	UTMP	
11	Ernesto Hernandez	Op retro	AITARA	
12	Juan Carlos Calderon	Op. torre grua	UTMP.	
13	Oxidio Cifuentes		TST	
14	Pedro Alejo	Almacen.	UTMP	
15	Maicol Soto	Of V.	UTMP	
16	Milton Quesada S	Ayudante	UTMP	
17	Jimena Comacho	Auxiliar	UTMP	Jimena Comacho
18				

OBSERVACIONES: Hoja 1-4 Total de participantes 71

UNIÓN TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 13-02-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Tipos de Residuos Aprovechables en Obra

DURACIÓN: 10 min.

INDUCCION [ ] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [X]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva.	AyB	Rto SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Benito Jimenez	Of	AYB	
2	Aurde Verdin	Ayudante	AYB	
3	Edilson Riaño P	Ofi	AYB	
4	Nelson Cadena	Of.	AYB	Nelson C
5	Wilmer Moncaleano	Of	AYB	
6	Daniel Escobar	Of	AyB	
7	Alberto Ardila	Of	AyB	
8	Alfredo Vides	Of	AyB	
9	Diego Moncilla	Ay	AyB	
10	Jose Perez	Ayu	AyB	
11	William Urbano	Ap.	AyB	
12	Pablo Emilio	Op.	AyB	
13	Cristian A Bermudez	Ejero	AyB	
14	Eliel oviedo	Herrero	AyB	
15	Eder nieto	Herrero	AyB	
16	Diego Rocas	Herrero	AyB	
17	Amin Burgos	Herrero	AyB	
18	Jose Nieto	Cob	AyB	

OBSERVACIONES: Hoja 2-4 Total de participantes: 71

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 13-02-26 OBRA / PROYECTO: Velódromo Bicentenario.

TEMA TRATADO: Tipos de Residuos Aprovechables en obra

DURACIÓN: 10 min.

INDUCCION [ ] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [X]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar silva.	AyB	Rte SST	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis cortes	DF	AYB	Luis corte
2	Jose Gene	OF	AYB	Jose Gen
3	Karl SOTELO	MAESTRO	AYB	
4	Brayan yasmin	Of	AYB	
5	Jhon Cayoly	Of	AYB	
6	JORGE Luis Julio	AY	AYB	Jorge
7	Wander cor	AY	AYB	Wander
8	CRYDR oslando	ay	AYB	
9	Jorge Rodriguez	oficial	AyB	
10	Steve Flores	AY	AYB	Steve Flores
11	Dairo Pimienta	OF	AYB	Dairo
12	Carlos Perez	OF	AYB	Carlos Perez
13	Solmeg Suarez	Ite	AYB	Solmeg
14	pablo William Fontalvo	AYU	AYB	
15	Nelson calderon	SEBCiud	AYB	Nelson C
16	Edilson Riaño P	AYB OFi	AYB	
17	Brando Jimenez	Ofi	AYB	
18	Alfredo Ulloa	Of	AYB	

OBSERVACIONES: Hoja 3-4 Total de participantes: 11

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 13-02-26 OBRA / PROYECTO: Veloarcmo Glisea/Har.

TEMA TRATADO: Tipos de Residuos Aprovechables en obra.

DURACIÓN: 10 min

INDUCCION [ ] CHARLA / DIVULGACION [ ] CAPACITACIÓN [ ]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Sikes.	AyB.	Rte Ost	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Luis Carlos	Ayudante	AyB	
2	Dagoberto Manilla	Ayudante	AyB	
3	William Urbano	Of.	AyB	
4	Jose Perez	AYU	AyB	
5	elmer castro	of.	AyB	
6	Victor Estrada	OF	AyB	
7	Diego Navas	OF	AyB	
8	Wilmer Manzanarez	OF	AyB	
9	DANIEL ESCOBAR	OF	AyB	
10	ALBERTO AREVALA	AYU.	AyB	
11	Eliel Barrios	Oficial	AyB	
12	Amin Jose	ofo	AyB	
13	Danis Gutierrez	OF	AyB	
14	Victor Hernandez	of	AyB	
15	Hernando	OF	AyB	
16	Suvenplazamiento	OF	AyB	
17	Carlos Diaz	OF	AyB	
18	Angel	of	AyB	

OBSERVACIONES: Hoja 4 - 4 Total de participantes: 71

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá DC 20-02-2026 OBRA / PROYECTO: Velódromo Gibraltar

TEMA TRATADO: Tipos de residuos no aprovechables en obra

DURACIÓN: 10min.

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACION	☒
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Paula Blanco	UTMP	Res Ambtal	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Milton Ruiz Soto	Ayudante	UTMP	
2	Francisco Suarez	Ayudante	UTMP	
3	José Antonio Bustacara	Ayudante	UTMP	
4	Vivian Bota	OfV	UTMP	
5	Carlos Florian	operario	PYE	
6	Camilo Castro	laboratorio	UTMP	
7	Carmen Herrero	op retro	AITANA	
8	Miguel Angel	OO MM	AITANA	
9	Neider Bravo	Auxiliar	MINS	
10	Monica Quintero C	Ayudante	Manos obra	Andrea cardona
11	Silvia Diaz	Obrero 1.C	UTMP	
12	Mario Jimenez	Aparejador	UTMP	
13	Alexander Rivas	Aparejador	UTMP	
14	Juan Garboa Calderon	op Torre Grua	UTMP	
15	OHS CRR	H/OBRA	UTMP	
16	Brayan Andrey Silva	Ayudante	Manos a la obra	
17	Dayana Durán Silva	Aprendiz	mano de obra	Dayana Silva
18	Shanis Andrea Lozano	Ayudante	Manos a la obra	Shanis Lozano

OBSERVACIONES: Hoja 1-5 Total de participantes: 84

UNION TEMPORAL
METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 20-02-26 OBRA / PROYECTO: Levantamiento Gibraltar.

TEMA TRATADO: Tipos de residuos no aprovechables en obra.

DURACIÓN: 10min.

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☒
REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐
OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva	A y B.	SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Gen	OF	A Y B	Jose Gen
2	Compo Elicos	of	A y B	Compo Elicos
3	Duis cortes	OF	A y B	Duis cortes
4	Reinaldo Fernandez	A y.	A y B	
5	José Alberto chucón	AY	A y B	
6	Emerson Chacon A	AY	A y B	Emerson
7	Dairo Pimienta	OF	A y B	
8	Jorge Segura	AY	A y B	
9	~~Jorge~~ Luis Julio	AY	A y B	
10	Ceyder orlando	A y	A y B	
11	Jhon F Hoyos	A y	A y B	
12	Wandercon	AY	A y B	
13	John Copelo	Oficial	A y B	
14	Brayan Yesid	OF	A y B	
15	Jorge Jhon	oficial	A y B	
16	Rafael Soto	MAESTRO	A y B	
17	Oscar Silva	SST.	A y B	
18	Juan Manrique	Ay	A y B	

OBSERVACIONES: Hoja 2-3 Total participantes 31

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 20-02-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo Giberti.

TEMA TRATADO: Tipos de residuos no aprovechables en obra.

DURACIÓN: 1 hr.

INDUCCION [ ] CHARLA / DIVULGACIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X]

REINDUCCIÓN [ ] NOTIFICACIÓN [ ] REUNIÓN [ ]

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva.	A y B.	Pto ost.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Victor Hernandez	Andante	A Y B	
2	Juan Carlos Freyle	Ayudante	A Y B	Juan freyle
3	JUVENAL SARMIENTO	OF	A Y B	
4	Jairon Cortes Otero	Ayu -	A Y B	
5	MARTIN PADILLA	AY	A Y B	martin
6	Sergio L RINCON	OF	A Y B	
7	Luis Alfonso OSPINO	Of	A Y B	
8	[illegible]	OF	A Y B	
9	Reynaldo OSPINO	AY	A Y B	
10	Jeuinson Gonzalez	ch	A Y B	
11	HENRY CASTELLON	AYU	A Y B	HENRY JOSE
12	ADLEY GUIO G.	OF	A Y B	ADLEY GUIO
13	Miguel Tovar Galindo	AYU	A Y B	
14	adolfo GONZÁLEZ	AYB Oficial	A Y B	
15	Yeinu Suarez Ferro	Oficial	A Y B	Yeinu Suarez
16	angelo ARROYO PEREZ	AYUDANTE	A Y B	angelo ARROYO
17	Oscar Silva	SST	A y B	
18	Valentina Amado	-SST.	A y B	

OBSERVACIONES: Hoja 3-5 Total de participantes: 84

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: 20-02-26 OBRA / PROYECTO: Volcadero Guasmitan

TEMA TRATADO: Residuos no aprovechables en obra.

DURACIÓN: 10 min

INDUCCION ☐ CHARLA / DIVULGACION ☐ CAPACITACIÓN ☒

REINDUCCIÓN ☐ NOTIFICACIÓN ☐ REUNIÓN ☐

OTRO/ CUAL?

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Silva.	A y B.	Rte SST.	
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	JeisonGonzalez	Of	A y B	
2	Yeimer Suarez Ficito	Of	A y B	Yeimer S
3	JUVENALSARMIENTO	OF	A y B	
4	Luis Adriano Ospino	of	A y B	
5	ONELIS MOSO PEREZ	oy	A y B	onelis moso
6	adolfo Gonzalez	of	A y B	
7	Sergio Rincon	OF	A y B	
8	Fruitelo Ory	Of	A y B	
9	Carlos de Sa	Of	A y B	
10	ABEL Guio Gonzalez	Of	A y B	ABEL Guio
11	Miguel Tovar	Ay	A y B	Miguel T
12	Yeimer Leal	Ay	A y B	
13	Henry CASTELLON	A y B		Henry Jose
14	Victor Hurtado	Auxiliar	A y B	
15	Juan Frayle	Ay	A y B	Juan Frayle
16	Danys Gotiano	Oficial	A y B	
17	Rubelis Ospino	A y	A y B	
18	Luis Nieto	Of	A y B	

OBSERVACIONES: Hoja 4-5 Total de participantes: 21

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

LISTADO DE ASISTENCIA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 20-07-26 OBRA / PROYECTO: Velodromo

TEMA TRATADO: Tipo de residuos no aprovechables en obra DURACIÓN: 10 min

INDUCCION	☐	CHARLA / DIVULGACION	☐	CAPACITACIÓN	☑
REINDUCCIÓN	☐	NOTIFICACIÓN	☐	REUNIÓN	☐
OTRO/ CUAL?					

N°	EXPOSITOR	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Vásquez	PRAGMA	Inspector SST	Carlos V.
2				

PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Jose Sima	oficial	pragma	
2	Edwar Díaz	oficial	Pragma	
3	Jader Chaver	OF	Pragma	
4	Jaiwar Chavez	Of	Pragma	
5	Alvaro Serrato	OF	Pragma	
6	Fonseida Robles	oficial	Pragma	
7	Alex Rodriguez M	Of	Pragma	
8	Jorge Wilches	Of	Pragma	
9	Jamer Mejia	OF	1082973264	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

OBSERVACIONES: Hoja 5 - 5 Total de participantes 81

Powered by CamScanner

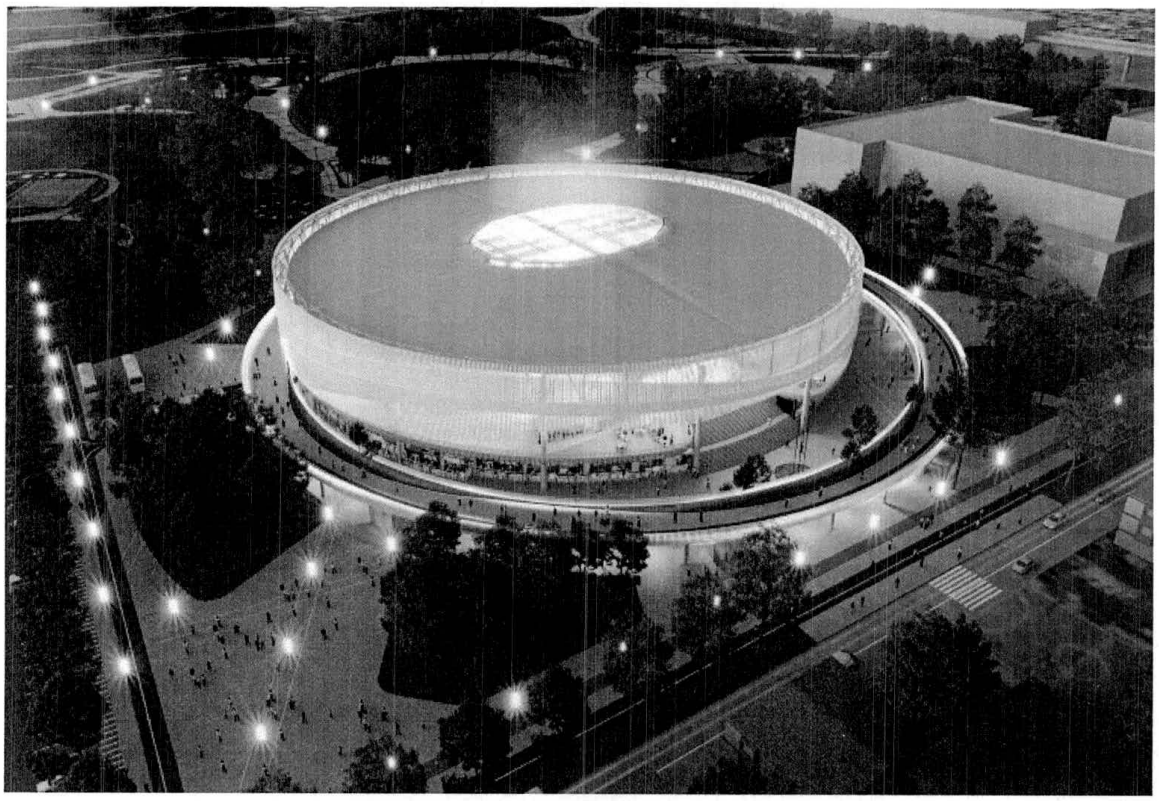
B2. Evaluación capacitaciones ambientales

EVALUACIÓN CAPACITACIONES AMBIENTALES - Del 26 de Enero al 25 de Febrero del 2026

Temas tratados durante el periodo:
30/01/2026: Determinantes ambientales del proyecto
06/02/2026: Manejo de kit de derrames contención de emergencias
13/02/2026: Tipos de residuos aprovechables en obra
20/02/2026: Tipos de residuos no aprovechables en obra

* Indica que la pregunta es obligatoria

CONTRATO IDRD - 3232 DE 2023 - UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR



136

1. FECHA

Ejemplo: 7 de enero del 2019

2. NOMBRE COMPLETO * 0 puntos

3. EMPRESA: *

4. CARGO: *

5. 1. ¿ Cuál de los siguientes es un determinante ambiental en la obra del predio Gibraltar- Velódromo? * 25 puntos

Marca solo un óvalo.

- La cantidad de trabajadores contratados.
- Medidas de control de olores y control de gases
- El salario de los empleados.
- La duración del contrato de obra.

6. 2. ¿Para qué se usa un kit de derrames en obra? * 25 puntos

Marca solo un óvalo.

- Para limpiar cualquier tipo de residuos de comida.
- Para controlar y contener derrames de sustancias peligrosas.
- Para lavar herramientas y equipos de trabajo.
- Para recoger basura común.

7. 3. ¿Qué se debe hacer con los residuos aprovechables en la obra? * 25 puntos

Marca solo un óvalo.

- Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o reciclaje.
- Mezclarlos con la basura común.
- Enterrarlos para evitar que ocupen espacio.
- Quemarlos para reducir su volumen.

8. 4. ¿Cuál de los siguientes es un residuo NO aprovechable en obra? * 25 puntos

Selecciona todos los que correspondan.

- [ ] Plásticos contaminados con químicos
- [ ] Residuos de concreto limpio.
- [ ] Tablones de madera sin tratar.
- [ ] Recortes de tubería en buen estado.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

B3. Soporte resultados capacitaciones ambientales

Marc	Puntuación	FECHA	NOMBRE COMPLETO	EMPRESA:	CARGO:	1. ¿ Cuál de los siguientes es un determinante amb	2. ¿Para qué se usa un kit de derrames en obra?	3. ¿Qué se debe hacer con los residuos aprovechat	4. ¿Cuál de los siguientes es un residuo NO aprove
1	100 / 100	24/02/2026	QUESADA SANTA MILTON	UTMP	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
2	50 / 100	24/02/2026	Francisco Suarez	UTMP	ayudante	La cantidad de trabajadores contratados.	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
3	100 / 100	24/02/2026	Jose antonio Bustacara	UTMP	ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
4	100 / 100	24/02/2026	Yeison Bustos	UTMP	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
5	100 / 100	24/02/2026	CARLOS FLORIAN	PYE	Operario	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
6	50 / 100	24/02/2026	Camilo Castro	UTMP	Laboratorio	Medidas de control de olores y control de gases	Para recoger basura común.	Mezclarlos con la basura común.	Plásticos contaminados con químicos
7	100 / 100	24/02/2026	EDILBER HERREÑO ARENGAS	ALTARA	Operador	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
8	75 / 100	24/02/2026	MIGUEL ANGEL NUÑEZ RUIZ	ALTARA	Operador	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
9	100 / 100	24/02/2026	Neiler Navarro	Manos a la obra	Auxiliar	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
10	100 / 100	24/02/2026	Monica Quintero	Manos a la obra	ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
11	100 / 100	24/02/2026	Stiven Diaz	UTMP	operario	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
12	100 / 100	24/02/2026	Mario Jimenez	UTMP	aparejador	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
13	100 / 100	24/02/2026	alexander rivas	UTMP	aparejador	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
14	100 / 100	24/02/2026	JUAN GARBOA CALDERON	UTMP	operario torre grua	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
15	75 / 100	24/02/2026	Omar Cruz	UTMP	Maestro de obra	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
16	100 / 100	24/02/2026	Brayan Andrey Silva	Manos a la obra	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
17	100 / 100	24/02/2026	MERSON DARLEY SILVA DUA	Manos a la obra	ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
18	75 / 100	24/02/2026	Jhonis Andres	Manos a la obra	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
19	75 / 100	24/02/2026	jose geles	ARTES Y BRONCES	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
20	100 / 100	24/02/2026	CAMPO ELIAS	artes y bronces	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
21	100 / 100	24/02/2026	Luis Cortes	ARTES Y BRONCES	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
22	100 / 100	24/02/2026	Pablo William	ARTES Y BRONCES	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
23	100 / 100	24/02/2026	JOSE ALBERTO CHACÓN	ARTES Y BRONCES	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
24	100 / 100	24/02/2026	EMERSON CHACON	ARTES Y BRONCES	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
25	100 / 100	24/02/2026	Dairo Pimienta	AYB	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
26	75 / 100	24/02/2026	José Suarez	artes y bronces	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
27	100 / 100	24/02/2026	Jose Luis Julio	ARTES Y BRONCES	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
28	100 / 100	24/02/2026	LEDER ORLANDO	AYB	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
29	100 / 100	24/02/2026	Jhon F Perez	artes y bronces	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
30	100 / 100	24/02/2026	WANDER ANDRES COA	AYB	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
31	100 / 100	24/02/2026	JONH FREY MUÑOZ MELO	ARTES Y BRONCES	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
32	75 / 100	24/02/2026	BRAYAN GUZMAN	AYB	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
33	100 / 100	24/02/2026	Jorge Rodriguez	artes y bronces	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
34	100 / 100	24/02/2026	Rafael Sotelo	ARTES Y BRONCES	Maestro de obra	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
35	100 / 100	24/02/2026	Oscar Silva	ARTES Y BRONCES	SST	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
36	75 / 100	24/02/2026	JUAN FREYLE TEHERAN	ARTES Y BRONCES	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
37	100 / 100	24/02/2026	Arley Gui Gonzalez	artes y bronces	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
38	100 / 100	24/02/2026	MIGUEL TOVAR	ARTES Y BRONCES	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
39	100 / 100	24/02/2026	MILTON LEÓN	ARTES Y BRONCES	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
40	100 / 100	24/02/2026	hener Castellon	AYB	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
41	75 / 100	24/02/2026	VICTOR HERNANDEZ	ARTES Y BRONCES	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
42	100 / 100	24/02/2026	Juan Ferrer	artes y bronces	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
43	100 / 100	24/02/2026	Damis Gutierrez	ARTES Y BRONCES	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos

Marc	Puntuación	FECHA	NOMBRE COMPLETO	EMPRESA:	CARGO:	1. ¿ Cuál de los siguientes es un determinante amb	2. ¿Para qué se usa un kit de derrames en obra?	3. ¿Qué se debe hacer con los residuos aprovechat	4. ¿Cuál de los siguientes es un residuo NO aprove
44	100 / 100	24/02/2026	Ribaldo Ospina	AYB	ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
45	100 / 100	24/02/2026	Luis Nileo	AYB	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
46	100 / 100	24/02/2026	JOSE SIERRA	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
47	100 / 100	24/02/2026	Gilberto Diaz	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
48	75 / 100	24/02/2026	JADER CHAVEZ	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
49	100 / 100	24/02/2026	Jainer Chavez	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
50	100 / 100	24/02/2026	ALBERTO JOSÉ	AYB	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
51	100 / 100	24/02/2026	Esneider Robles	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
52	100 / 100	24/02/2026	Alex Rodriguez	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
53	100 / 100	24/02/2026	Jose Galvis	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
54	75 / 100	24/02/2026	James Mejia	ARTES Y BRONCES	oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
55	100 / 100	24/02/2026	victor hernandez	AYB	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
56	100 / 100	24/02/2026	juan carlos freyle	AYB	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
57	100 / 100	24/02/2026	Juvenas sarmiento	ARTES Y BRONCES	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
58	100 / 100	24/02/2026	EVINSON GONZALEZ OSPIN(	ARTES Y BRONCES	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
59	75 / 100	24/02/2026	MARTIN PEDRAZA	ARTES Y BRONCES	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
60	75 / 100	24/02/2026	SERGIO RINCON	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
61	100 / 100	24/02/2026	Luis Ospino	ARTES Y BRONCES	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
62	100 / 100	24/02/2026	Rodolfo	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
63	100 / 100	24/02/2026	Ribaldo Ospina	ARTES Y BRONCES	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
64	100 / 100	24/02/2026	Jevinson Gonzales	ARTES Y BRONCES	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
65	100 / 100	24/02/2026	Henry Castellon	AYB	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
66	100 / 100	24/02/2026	Arley Guio	AYB	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
67	100 / 100	24/02/2026	Miguel Tovar	AYB	Oficial	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
68	100 / 100	24/02/2026	Adolfo Gonzalez	ARTES Y BRONCES	Ayudante	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
69	100 / 100	24/02/2026	Yeiny Suarez Fierro	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
70	75 / 100	24/02/2026	Oneliz Anojo Perez	ARTES Y BRONCES	AYUDANTE	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
71	100 / 100	24/02/2026	Oscar Silva	ARTES Y BRONCES	SST	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
72	100 / 100	24/02/2026	Valentina Amado	AYB	SST	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
73	100 / 100	24/02/2026	Jevinson Gonzales	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
74	100 / 100	24/02/2026	Yeiner Suarez Fierro	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
75	100 / 100	24/02/2026	Juvenas sarmiento	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
76	100 / 100	24/02/2026	Luis Adrian Ospina	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
77	100 / 100	24/02/2026	Odelis Perez	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
78	100 / 100	24/02/2026	Adolfo Gonzalez	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
79	75 / 100	24/02/2026	sergio rincón	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Residuos de concreto limpio.
80	100 / 100	24/02/2026	Ricardo Coy	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilización o re	Plásticos contaminados con químicos
81	100 / 100	24/02/2026	Carlos Rosa	AYB	OFICIAL	Medidas de control de olores y control de gases	Para controlar y contener derrames de sustancias	Clasificarlos y destinarlos para su reutilizacion o re	Plásticos contaminados con químicos

C. Seguimiento a la ejecución del período reportado

C1. Trámites ambientales

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20264200033491

Bogotá D.C. 21-02-2026

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. Arq. Andrés Humberto Martínez Vesga
Representante
Dirección: Calle 120 A No 7-36 Of. 802
Correo electrónico: gerencia@andresmartinez.com.co; interventoria.velodromo@gmail.com
Teléfono: (601)2456144
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de interventoría No 3219 de 2023 Objeto "Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras y actividades complementarias de los proyectos 1 y 2 a cargo de la subdirección técnica de construcciones - STC del IDRD para el predio El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá". Expediente No. 2024800701600015E y 2024800701600026E.

Contrato de obra No. 3232 de 2023, objeto "Contratar las obras y actividades complementarias del Velódromo ubicado en el Parque Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la Localidad de Kennedy en Bogotá."

Contrato de obra No. 3203-2023, objeto "Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento en el marco de la manzana del cuidado El Porvenir (Gibraltar), en la Localidad de Kennedy en Bogotá."

ASUNTO: Respuesta Radicado IDRD No. 20252100521802, Informe de análisis de los resultados de laboratorio de la segunda campaña de la red adyacente de agua subterránea.

Cordial saludo Ingeniero,

La Subdirección Técnica de Construcciones (STC) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, de conformidad con las obligaciones estipuladas en el desarrollo del contrato de interventoría No 3219 de 2023 Objeto "Realizar la interventoría técnica,

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

Fecha de firmado:
2026.02.21 00:45:55 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

142

administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras y actividades complementarias de los proyectos 1 y 2 a cargo de la subdirección técnica de construcciones - STC del IDRD para el predio El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá", y las obligaciones adquiridas de acuerdo con el seguimiento al contrato de obra IDRD No. 3232 de 2023, que tiene por objeto "Contratar las obras y actividades complementarias del Velódromo ubicado en el Parque Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la Localidad de Kennedy en Bogotá.", y del Contrato de obra IDRD No. 3203-2023, que tiene por objeto "Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento en el marco de la manzana del cuidado El Porvenir (Gibraltar), en la Localidad de Kennedy en Bogotá.", se permite indicar que dio traslado oficial a la autoridad ambiental de la remisión de resultados del informe de monitoreo de red adyacente desarrollado en el marco de la implementación del PGRDEPP y el PDCA del Centro de Alto Rendimiento y el Velódromo (Gibraltar), en atención al comunicado SDA 2025EE66710.

En este sentido, la SDA evaluó la documentación allegada por la STC del IDRD en la que se informaba la segunda caracterización de la red adyacente a razón de la finalización de cimentación de obra, y en el cual indica *"(...) esta autoridad ambiental, considera adecuada la propuesta para el segundo muestreo y análisis de la red de monitoreo de agua, adyacente al predio Gibraltar, de acuerdo con el cronograma allegado, bajo las mismas condiciones avaladas mediante oficios 2024EE97425 del 06/05/2024 y 2024EE126181 del 14/06/2024.(...)"*; La mencionada información fue radicada a la SDA con comunicado IDRD N. 20264200007231, radicado Forest N. 2026ER03872, documentos anexos a la presente comunicación por lo cual se le solicita a la interventoría hacer seguimiento al mencionado comunicado y trasladar a los contratistas de obra con el fin de atender visitas de seguimiento de la autoridad ambiental, y que repose en los archivos de contrato.

Cordialmente,

KATHERINE AMAYA ROA
Supervisora Contrato de Interventoria CTO-IDRD 3219 de 2023.

Anexos: Comunicado 20264200007231, documento PDF seis (6) folios.
Radicado Forest N. 2026ER03872, documento PDF dos (2) fólios.

Copia: N/A

Elaboró: Ing. Ivonne Liliana Aguilar G – Contratista STC
Proyectó: Ing. Ivonne Liliana Aguilar G – Contratista STC
Revisó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59° -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20264200007231

Bogotá D.C. 09-01-2026

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECTOR DE RECURSO HIDRICO
Carlos Arturo Álvarez
atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co,
Dirección: Av Caracas No. 54-38
La Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de interventoría No 3219 de 2023 Objeto "Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras y actividades complementarias de los proyectos 1 y 2 a cargo de la subdirección técnica de construcciones - STC del IDRD para el predio El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá". Expediente No. 2024800701600015E y 2024800701600026E.

Contrato de obra No. 3203 de 2029, objeto "Contratar las obras y actividades complementarias del Centro De Alto Rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá"

Contrato de obra No. 3232 de 2023, objeto "Contratar las obras y actividades complementarias del Velódromo ubicado en el Parque Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la Localidad de Kennedy en Bogotá."

ASUNTO: Remisión resultados informe monitoreo de red adyacente desarrollado en el marco de la implementación del PGRDEPP y el PDCA del Centro de Alto Rendimiento y el Velódromo (Gibraltar).

Cordial saludo respetado Dr. Álvarez,

La Subdirección Técnica de Construcciones (STC) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, de conformidad con las obligaciones estipuladas en el radicado SDA 2023EE70895, a través del cual remiten al IDRD el concepto técnico No. 03441 y su anexo LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

143

PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PM 10 EL PORVENIR, en el cual se indica:

> *"(...) que podrá adelantar las actividades constructivas para el desarrollo del proyecto Parque Metropolitano (PM-10) El Porvenir dentro de los predios con CHIP AAA0138ZKFZ, AAA0138ZKBS y AAA0138ZKCN, siempre y cuando, previo al inicio de la mencionada etapa constructiva, se presente Plan de Contingencia Ambiental (PDCA) para la construcción del proyecto mencionado al interior del predio Gibraltar, (...)"*

En el marco de la ejecución de los contratos de obra No. IDRD-CTO-3203-2023, que tiene por objeto *"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ" y* Contrato de obra No. 3232 de 2023, objeto "*CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.*", dadas las funciones de control y vigilancia a las actividades que generan impacto en los recursos naturales del Distrito Capital, por parte de la Dirección de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente y a la respuesta emitida bajo comunicado SDA 2025EE66710, bajo la cual evaluó la información allegada por la STC del IDRD en la que se informaba la segunda caracterización de la red adyacente a razón de la finalización de cimentación de obra, y en el cual indica *"(...) esta autoridad ambiental, considera adecuada la propuesta para el segundo muestreo y análisis de la red de monitoreo de agua, adyacente al predio Gibraltar, de acuerdo con el cronograma allegado, bajo las mismas condiciones avaladas mediante oficios 2024EE97425 del 06/05/2024 y 2024EE126181 del 14/06/2024.(...)"*

Así las cosas, en atención a los requerimientos y lineamientos establecidos por la SDA, se hace entrega del informe de resultados correspondiente a la segunda campaña de monitoreo de aguas subterráneas de la red de monitoreo adyacente al predio Gibraltar.

El documento presentado consolida el desarrollo y la evaluación del segundo monitoreo de la red circundante al predio, el cual fue realizado durante la fase de ejecución de las actividades constructivas y caracterizado en época de mayor precipitación, de conformidad con la dinámica hidrológica del área de estudio. Esta campaña forma parte del seguimiento ambiental al componente hídrico subterráneo, considerando la variabilidad climática propia de un año hidrológico.

El monitoreo incluyó el análisis de parámetros fisicoquímicos y de calidad del agua subterránea, así como la medición de niveles piezométricos en los puntos que conforman la red de monitoreo adyacente. La definición de la frecuencia de medición se estableció con base en los lineamientos técnicos de la SDA y en la información secundaria

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

3

144

disponible de la línea base ambiental, la cual reconoce el carácter bimodal del régimen de precipitaciones del área.

La evaluación presentada contempla tanto el análisis de los resultados obtenidos en esta segunda caracterización frente a la normatividad colombiana y referentes técnicos internacionales aplicables, como el contraste con los resultados registrados durante la primera campaña de monitoreo, permitiendo establecer tendencias y variaciones en el comportamiento del sistema hídrico subterráneo del área de influencia. Es importante señalar que el mencionado informe fue debidamente revisado, validado y aprobado por la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR.

En conclusión, del informe presentado y de acuerdo con lo indicado, encontramos importante resaltar que:

"El segundo monitoreo se llevó a cabo bajo las mismas condiciones metodológicas y directrices estipuladas en el Plan de Monitoreado de Aguas subterráneas, previamente avalado por la SDA y para el actual monitoreo tenido en cuenta el plan de trabajo avalado mediante radicado 2025EE66710.(…)

(…) En general la similitud mayoritaria registrada tanto en los piezómetros como en sus concentraciones para el segundo monitoreo sugieren una condición imperante de contaminantes que afectan el acuifero somero antes del inicio de actividades del proyecto y que persisten en condiciones similares al primer monitoreo, que además se derivan principalmente de los lixiviados dispuestos previamente al desarrollo del proyecto y de las actividades antrópicas producto del desarrollo industrial y de infraestructura que se ha desarrollado en la zonas aledañas al predio Gibraltar, por ejemplo la zona norte del predio donde actualmente se desarrolla una obra de gran dimensión.(…)

(…) De acuerdo con los análisis desarrollados se infiere que las concentraciones de metales mayoritarias encontradas ratifican la condición contaminante que presentaba el acuífero somero antes de la ejecución de actividades para el Parque Estructurante El Porvenir, y aun cuando se han llevado a cabo actividades constructivas y de desarrollo del actual proyecto, el carácter contaminante es similar en las dos campañas, con diferenciales de movilidad del metal dada la evaluación en la condición hidrometeorológica de mayor precipitación.(…)"

Dicho lo anterior, se remite el informe referido con los siguientes anexos:

- Documento PDF SEGUNDO MONITOREO DE AGUA SUBTERRÁNEA - PLAN DE MONITOREO DE AGUA SUBTERRÁNEA

- Anexo 1. Video inspección
  - Anexo 1.A Videos de pozos de monitoreo
  - Anexo 1.B Registro fotográfico

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

- Documento PDF Informe de Diagnostico
- Síntesis secciones ciegas y filtros.

- Anexo 2. Topografía
  - Certificado Estación Topográfica Pag 1
  - Certificado Estación Topográfica Pag 2
  - Certificado de Nivel
  - Informe de levantamiento topográfico de piezómetros

- Anexo 3. Dispersor de Arcillas
  - 3.1 Reporte Diario de actividades – Limpieza de pozos de monitoreo red adyacente parque el Porvenir
  - 3.2 Ficha Técnica – Tripolifosfato de sodio
  - 3.3 Registro fotográfico

- Anexo 4. Registros Purga
  - Documento PDF Informe de actividades previas
  - Registros de campo
  - Reporte diario de purgados pozos
  - Carpeta: Disposición CGS
  - Carpeta: Registro Fotográfico

- Anexo 5. Resultados Laboratorio
  - 5.1 Registro Fotográfico
  - 5.2 Resultados CG – Correspondiente al informe de resultados de los Pozos 01, 5R, 06 y 07
    - Documento PDF Informe de caracterización de Agua Subterránea Consorcio Gibraltar
      - Acreditación IDEAM
      - Cadenas de custodia
      - Certificados de calibración
      - Planillas de Campo
      - Registro Fotográfico
      - Resultados de Laboratorio
      - Tabla de métodos
  - 5.3 Resultados UTMP – Correspondiente al informe de resultados de los Pozos 02, 03, 04.
    - Documento PDF Informe de caracterización de Agua Subterránea Unión Temporal Metropolitano el Porvenir
      - Acreditación IDEAM
      - Cadenas de custodia
      - Certificados de calibración

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

- Planillas de Campo
- Registro Fotográfico
- Resultados de Laboratorio
- Tabla de métodos

Ahora bien, dada la observación emitida por la SDA frente al laboratorio encargado " (...) *es importante tener en cuenta que el laboratorio encargado, deberá contar con acreditación vigente al momento del muestreo y análisis de compuestos. Esto, dado que la vigencia de la Resolución IDEAM 0186 del 08/03/2021 del laboratorio SGS Colombia S.A.S., finalizó el 25/03/2025.*", nos permitimos indicar que como soporte a la veracidad de la vigencia del laboratorio SGS Colombia SAS, en los anexos 5.2 y 5.3, subcarpeta Acreditación IDEAM, se hace entrega de copia de los comunicados IDEAM N 20256010039901 y 20256010039911, bajo los cuales el representante Legal del laboratorio contratado requiere al ente certificador " *Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar acogimiento a la resolución 651 de 2020 para nuestros laboratorios ubicados en Bogotá y Soledad así:*

1. *Para efectos de nuestra acreditación en la sede de Bogotá según resoluciones 1061 del 26 de octubre de 2020; 0186 del 08 de marzo de 2021; 1028 del 24 de septiembre de 2024.*

2. *Para efectos de nuestra resolución en la sede de Soledad según resolución 0490 del 08 de junio de 2021.*

Lo anterior en virtud de que la gestión de solicitud de renovación y ampliación de acreditación fue radicada en sus instalaciones dentro de los plazos indicados en la regulación aplicable (...)"

Y en respuesta, el IDEAM indica en cada uno de sus comunicados respectivamente que:

1. *"(...) En este contexto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, por medio del presente considera procedente y prorroga la vigencia del acto administrativo Resolución No. 0186 del 08 de marzo de 2021 la cual resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.1061 del 26 de octubre de 2020 y de todas las demás resoluciones que modificaron, en algún sentido, el alcance de la acreditación otorgado a la sociedad* ***SGS COLOMBIA S.A.S. - SUCURSAL BOGOTÁ.****, para producir información cuantitativa fisica, quimica y biótica, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, hasta tanto exista un pronunciamiento de fondo por parte de la administración, desde la programación, hasta el cierre de acciones correctivas y consecuente emisión y notificación del acto administrativo que decida de fondo respecto del trámite de Renovación de la acreditación, es decir, no se interrumpe el término de vigencia de la acreditación. (...)*

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

2. *"(...) En este contexto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, por medio del presente considera procedente y prorroga la vigencia del acto administrativo Resolución No. 0490 del 08 de junio de 2021 y de todas las demás resoluciones que modificaron, en algún sentido, el alcance de la acreditación otorgado a la sociedad* ***SGS COLOMBIA S.A.S. - SUCURSAL SOLEDAD.****, para producir información cuantitativa física, química y biótica, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, hasta tanto exista un pronunciamiento de fondo por parte de la administración, desde la programación, hasta el cierre de acciones correctivas y consecuente emisión y notificación del acto administrativo que decida de fondo respecto del trámite de Renovación de la acreditación, es decir, no se interrumpe el término de vigencia de la acreditación. (...)"*

En este sentido, la validez de la acreditación vigente para el momento del muestro y análisis de los compuestos presentados en el informe entregado se entiende por renovada hasta tanto se decida de fondo el acto administrativo.

De esta manera desde la STC del IDRD, estamos atentos a cualquier solicitud de información o claridad, para lo que agradecemos comunicarse al correo electrónico Ivonne.aguilar@idrd.gov.co, o a teléfono 311-4002656.

Cordialmente,



KATHERINE AMAYA ROA
Subdirectora Técnica de Construcciones

Anexos: Lo enunciado con anterioridad en (1) un DVD.

Copia: N/A

Elaboró: Ing. Ivonne Liliana Aguilar G – Contratista STC

Proyectó: Ing. Ivonne Liliana Aguilar G – Contratista STC
Revisó: Omar Reinaldo Acevedo Castro – Asesor STC.
Aprobó:

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

Envio No. RA551409464CO

Tipo de Servicio: CORREO CERTIFICADO NACIONAL 2025 Fecha de Envío: 09/01/2026 17:25:57

Cantidad: 1 Peso: 200.00 Valor: 10.250 Orden de servicio: 19116791

Valor de recaudo: 0

Datos del Remitente

Nombre: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD Ciudad: BOGOTA D.C.
Agencia Cuenta de Recreación y Deporte IDRD

Dirección: Calle 63 # 59F - 06 Teléfono: 3233766299

Datos del Destinatario

Nombre: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 20244200007231 Ciudad: BOGOTA D.C. Quien recibe: *SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - 20244200007231*

Dirección: Av Caracas No. 54 38 Teléfono:

Observaciones: Carlos Arturo Alvarez

Carta asociada: Código envío paquete: Envío de ida/Regreso Asociado

Fecha del Evento	Objeto	Código	Centro Operativo	Evento	Destino	Funcionario	Sector de Distribución	Cod Sector	Distribuidor	Razón retorno	Centro Operativo Entrega	Cambio cuenta (entrega)	Centro Operativo Recibe	Cambio cuenta Recibe	Motivo Novedad
09/01/2026 17:26:57	GUIA	RA551409464C O	UAC CENTRO	ADMITIDO		sandra puga									
10/01/2026 04:02:58	BACA	111787111169 65AC305154R 1	CTP CENTRO A	CONFECCION DE PIEZA POSTAL	CD MURILLO TORO	andrea ruthj uiti									
10/01/2026 04:24:15	DESPAC HO	7250524369	CTP CENTRO A	FORMACION DE DESPACHO	CD MURILLO TORO	andrea ruthj uiti									
10/01/2026 04:27:28	VIAJE	109A426231 A 2876527	CTP CENTRO A	SALIDA DE RUTA	CD MURILLO TORO	andrea ruthj uiti									
10/01/2026 05:39:44	VIAJE	109A426221 1A 2876527	CD MURILLO TORO	LLEGADA DE RUTA		oscar mejia f									
10/01/2026 05:40:11	DESPAC HO	7250524369	CD MURILLO TORO	RECEPCION DE DESPACHO	CD MURILLO TORO	oscar mejia f									
10/01/2026 06:00:23	BACA	111787111169 65AC305154R 1	CD MURILLO TORO	APERTURA DE PIEZA POSTAL		oscar mejia f									
12/01/2026 08:36:46	CAMBIO CUSTO DIA X DISTRIB UIDOR	0017831858	CD CHAPINERO	CARGA A CARTERO		jose bernal	452		DU452 CLAUDIA ESPERANZA JUVAR PINZON						
13/01/2026 16:22:11	GUIA	RA551409464C O	Redi	DIGITALIZADO		Redi									
13/01/2026 16:22:11	CAMBIO CUSTO DIA X DISTRIB UIDOR	0017831858	CD CHAPINERO	ENVIO ENTREGADO			452		DU452 CLAUDIA ESPERANZA JUVAR PINZON	ENTREGAD O					
13/01/2026 15:06:12	GUIA	RA551409464C O	CD CHAPINERO	DIGITALIZADO		edgar suarez fa									
19/01/2026 11:41:54	CAMBIO CUSTO DIA	0014781		CAMBIO DE CUSTODIA		paola pedraz a					CC CHAPINER O	ANGIE PEDRAZ A	UDA_ARCH CEN A	UDA ARCH CEN A	

Imagen Guia cumplida



Planilla

Documentos adicionales

Demuestra

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20264200042001

Bogotá D.C. 23-02-2026

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Atn. Arq. Andrés Martínez Vesga
REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: Calle 120 A No. 7 – 36 Of. 802
Correo electrónico: gerencia@andresmartinez.com.co, interventoria.velodromo@gmail.com, car.interventoria@gmail.com
Teléfono: 2456144
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. 3219 de 2023 *"Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras y actividades complementarias de los proyectos 1 y 2 a cargo de la subdirección técnica de construcciones – STC del IDRD para el predio el porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá".*

ASUNTO: Remisión comunicación Secretaría Distrital de Ambiente – Reprogramación tercer monitoreo red de pozos adyacentes - Contrato de Obra No. 3203 de 2023 – Centro de Alto Rendimiento - CAR Gibraltar y Contrato de Obra No. 3232 de 2023 – Velódromo Gibraltar.

EXPEDIENTE VIRTUAL No. 2024800701600026E

Respetado Arq. Martínez:

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD remite, para su conocimiento y fines pertinentes, copia de la comunicación emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente, con radicado SDA No. 2025EE303609, y radicado IDRD el No. 20262100021252, mediante la cual dicha Autoridad Ambiental se pronuncia frente a la reprogramación del tercer monitoreo de agua subterránea correspondiente al Programa de Monitoreo de Agua Subterránea – Red de pozos adyacentes al Parque Estructurante El Porvenir (Gibraltar).

Al respecto, se informa que, en el marco de las gestiones adelantadas ante la Secretaría Distrital de Ambiente, el IDRD puso en conocimiento de dicha Autoridad en primera instancia la reprogramación del tercer monitoreo y posteriormente remitió la programación detallada de actividades.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


Fecha de firmado:
2026.02.23 17:11:11 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo

148

Así mismo, la Secretaría Distrital de Ambiente manifestó que el pronunciamiento emitido frente a la reprogramación resulta suficiente para dar inicio a la ejecución del tercer monitoreo de agua subterránea.

En consecuencia, se solicita a esa Interventoría tener en cuenta lo anterior y adelantar las verificaciones correspondientes en el marco de sus funciones, así como realizar el seguimiento a la ejecución del tercer monitoreo por parte del contratista, dejando los respectivos soportes en los informes de gestión ambiental.

Cordialmente,



KATHERIN AMAYA ROA
Supervisora Contrato IDRD-CTO-3219-2023

Anexos: Radicado IDRD el No. 20262100021252 – 2 folios.
Copia: N/A

Elaboró: Ing. Lina Johanna Falla Lozano – Contratista STC
Proyectó: Ing. Lina Johanna Falla Lozano – Contratista STC

Revisó: Ing. Jairo Parra – Contratista STC
Aprobó: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 3 Anexos: 0
Proc. # 6806333 Radicado # 2025EE303609 Fecha: 2025-12-22
Tercero: 860061099-1 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE-IDRD
Dep.: SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO SUELO
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20262100021252 Código Web: g(Q2kM
FECHA:16-01-2026 10:03:31 FOLIOS: 1
RADICADOR: ROOSEVELT BERRIOS PAEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
ASUNTO: RADICADO SDA 2025ER258303 DEL 30/10/2025
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá DC

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
KATHERINE AMAYA ROA
Subdirección Técnica de Construcciones (E)
Dirección correspondencia: Calle 63 No 59ª- 06
Correo electrónico: idrdcorrespondencia@idrd.gov.co
Teléfono: 6605400 Ext. 404
Ciudad,

Referencia: Radicado SDA 2025ER258303 del 30/10/2025
Radicado IDRD No. 20254200332501.
Reprogramación tercer monitoreo de agua, programa de monitoreo de agua subterránea – Red de pozos adyacentes al parque estructurante El Porvenir (Gibraltar).

Cordial Saludo,

Le informo que la Dirección de Control Ambiental - Subdirección del Recurso Suelo, en cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia a las actividades que generan impacto en los recursos naturales del Distrito Capital, evaluó la información allegada bajo el radicado de la referencia, en donde informa que "*...la tercera caracterización de la red de pozos adyacentes debía realizarse en época seca del presente año. Sin embargo, debido a ajustes y retrasos en el cronograma de obra inicialmente establecido, se comunica que el tercer monitoreo se llevará a cabo durante el primer trimestre del año 2026 (enero – marzo)...*"

Adicionalmente, puntualiza que "*...El primer monitoreo fue realizado el 8 de julio de 2024, previo al inicio de las actividades constructivas, en época seca. Por su parte, el segundo monitoreo se desarrolló en época de altas precipitaciones, iniciando las actividades preliminares el 14 de abril de 2025, de acuerdo con el cronograma presentado a la SDA mediante radicado 2025ER51702 del 07 de marzo de 2025 y radicado IDRD No. 20254200057981, al cual la SDA dio respuesta mediante oficio 2025EE66710 del 30 de marzo de 2025...*"

Teniendo en cuenta que mediante radicados 2024ER74038 del 05/04/2024 y 2024ER80584 del 15/04/2024, el IDRD indicó que:

De esta forma, se indica que se realizaría:

- La primera caracterización antes del inicio de obras.
- La segunda en condiciones de estiaje, además teniendo en cuenta que se proyecta la finalización de la cimentación de la obra para el 31 de enero de 2025.
- Tercer muestreo en temporada seca durante la fase constructiva.
- Cuarto muestreo al terminar el proyecto.

Lo cual fue avalado por esta autoridad ambiental mediante oficio 2024EE97425 del 06/05/2024, además considerando que la época seca corresponde a los meses entre diciembre y marzo/abril, la propuesta del tercer muestreo durante el primer trimestre del 2026, se considera adecuado.

Lo anterior, **bajo las mismas condiciones avaladas** mediante oficios 2024EE97425 del 06/05/2024 y 2024EE126181 del 14/06/2024. Es importante tener en cuenta que el laboratorio encargado, deberá contar con acreditación vigente al momento del muestreo y análisis de compuestos.

Cualquier duda o inquietud el usuario podrá acercarse a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente ubicada en la Av. Caracas No. 54 – 38 primer piso, oficina de atención al usuario de 8:00 am a 5:00 pm o si lo desea podrá comunicarse al teléfono 3778899 Ext: 8876.

Atentamente,

Diana M Rincón D

DIANA MILENA RINCON DAVILA
SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO SUELO

Expediente: SDA-06-1998-03

Elaboró:

JULIO CESAR REYES VARGAS CPS: SDA-CPS-20250562 FECHA EJECUCIÓN: 18/12/2025

Revisó:

C2. Actas AAC

CONSORCIO INTERVENTORES
GIBRALTAR

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2026

Señores
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO
José Luis Clavijo Olmos Representante legal
La ciudad

Referencia. Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR - CONTRATO DE OBRA IDRD- CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: CERTIFICACIÓN VISITAS AUTORIDADES Y TRÁMITES AMBIENTALES.

Desde la Interventoría Consorcio Interventores Gibraltar se certifica que, durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2026, NO se recibieron visitas por parte de Autoridades Ambientales, ni se realizaron tramites asociados al proyecto ante las mismas.

Arq. Rubén Darío Crespo
Director de Interventoría

Elaboró: Ing. Julián Ricardo Agudelo - Residente Ambiental de Interventoría.
Revisó y aprobó Arq. Rubén Darío Crespo – Director de Interventoría.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

151

C3. Mantenimientos Unidades sanitarias fijas

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jimena Camacho.

LUGAR: Administrativo.

PERIODO DE REPORTE: 26 ene - al 25 Febrero 2026.

SEMANA: 26/01/26 al 30/01/26.

N° Baños hombres: 3

N° Orinales: 3

N° Baños mujeres: 3

Califique , el estado del lugar de acuerdo a los siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 26-01-26	FECHA : 27-01-26	FECHA : 28-01-26	FECHA : 29-01-26.	FECHA : 30/01-26
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jimena Camacho	Jimena Camacho	Jimena Camacho	Jimena Camacho	Jimena Camacho
OBSERVACIONES	Solo se realiza aseo de baños de lunes a viernes unicamente.				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jimena camacho

LUGAR: Administrativo

PERIODO DE REPORTE: 26 ene - al 25 Feb 2026

SEMANA: 2/02/26 al 6/02/26

N° Baños hombres: 3

N° Orinales: 3

N° Baños mujeres: 3

Califique , el estado del lugar de acuerdo a los siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 2/02/2026	FECHA : 3/02/2026.	FECHA : 4/02/26.	FECHA : 5/02/26	FECHA : 6/02/26.
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jimena camacho	Jimena camacho	Jimena camacho	Jimena camacho	Jimena camacho
OBSERVACIONES	Se realiza aseo baños de lunes a viernes unicamente				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jimena Camacho

LUGAR: Administrativo

PERIODO DE REPORTE: 26 ene al 25 feb 2026

SEMANA: 9/02/26 al 13/02/26

N° Baños hombres: 3

N° Orinales: 3

N° Baños mujeres: 3

Califique , el estado del lugar de acuerdo a los siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 4/02/26	FECHA : 10/02/26	FECHA : 11/02/26	FECHA : 12/02/26	FECHA : 13/02/26
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jimena Camacho	Jimena camacho	Jimena camacho	Jimena camacho	Jimena camacho
OBSERVACIONES	Se realiza aseo baño de hombres unicamente				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jimena Camacho LUGAR: Administrativo.

PERIODO DE REPORTE: 26 ene - al 25 Feb 2026 SEMANA: 16/02/26 al 20/02/26

N° Baños hombres: 3 N° Orinales: 3 N° Baños mujeres: 3

Califique , el estado del lugar de acuerdo a los siguientes referencias:
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA: 16/02/26	FECHA: 17/02/26.	FECHA: 18/02/26	FECHA: 19/02/26.	FECHA: 20/02/26.
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jimena Camacho	Jimena Camacho	Jimena Camacho	Jimena Camacho	Jimena Camacho
OBSERVACIONES	Se realiza aseo. baños de lunes a viernes Unicamente.				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jimena Comacho. LUGAR: Administrativo.

PERIODO DE REPORTE: 26 ene al 25 Feb 2026 SEMANA: 23/02/26 al 25/02/26.

N° Baños hombres: 3 N° Orinales: 3 N° Baños mujeres: 3

Califique , el estado del lugar de acuerdo a las siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 23/02/26	FECHA : 24/02/26.	FECHA : 25/02/26	FECHA :	FECHA :
PISOS	B	B	B		
PAREDES	B	B	B		
TECHOS	B	B	B		
SANITARIOS	B	B	B		
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B		
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B		
LAVAMANOS	B	B	B		
DUCHAS	B	B	B		
ORINALES	B	B	B		
ESPEJO	B	B	B		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Jimena Comacho	Jimena Comacho	Jimena Com		
OBSERVACIONES					

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yelson Bustos.

LUGAR: Operativo

PERIODO DE REPORTE: 26-ene al 25 Feb 2026

SEMANA: 26/01/26 al 30/01/26.

N° Baños hombres: 10

N° Orinales: 10

N° Baños mujeres: 2

Califique , el estado del lugar de acuerdo a los siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 26-01-26	FECHA : 27-01-26	FECHA : 28-01-26	FECHA : 29-01-26	FECHA : 30-01-26
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yelson Bustos	Yelson Bustos	Yelson Bustos.	Yelson Bustos	Yelson Bustos.
OBSERVACIONES	Solo se realiza aseo baños de lunes a Viernes Unicamente.				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yelson Bootes. LUGAR: Operativo

PERIODO DE REPORTE: 26 ene al 25 Feb. 2026 SEMANA: 2/02/26 al 6/02/26.

N° Baños hombres: 10 N° Orinales: 10 N° Baños mujeres: 2

Califique , el estado del lugar de acuerdo a las siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 2-02-26	FECHA : 3-02-26	FECHA : 4-02-26	FECHA : 5-02-26	FECHA : 6-02-26
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yelson Bootes	Yelson Bootes	Yelson Bootes	Yelson Bootes	Yelson Bootes
OBSERVACIONES	Solo se realiza aseo de lunes a viernes Unicamente				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yelson Bootes

LUGAR: Operativo

PERIODO DE REPORTE: 26 ene al 25 Feb 2026

SEMANA: 9/02/26 al 13/02/26

N° Baños hombres: 10

N° Orinales: 10

N° Baños mujeres: 2

Califique , el estado del lugar de acuerdo a las siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA: 9/02/26	FECHA: 10/02/26	FECHA: 11/02/26	FECHA: 12/02/26	FECHA: 13/02/26.
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yelson Bootes	Yelson Bootes	Yelson Bootes	Yelson Bootes	Yelson Bootes
OBSERVACIONES	Solo se realiza aseo de lunes a viernes unicamente				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yeison Bustos

LUGAR: Operativo

PERIODO DE REPORTE: 26 ene al 25 Feb 2026. SEMANA: 16/02/26 al 20/02/26

N° Baños hombres: 10 N° Orinales: 10 N° Baños mujeres: 2

Califique , el estado del lugar de acuerdo a las siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 16-02-26	FECHA : 17-02-26	FECHA : 18-02-26	FECHA : 19-02-26	FECHA : 20-02-26
PISOS	B	B	B	B	B
PAREDES	B	B	B	B	B
TECHOS	B	B	B	B	B
SANITARIOS	B	B	B	B	B
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B	B	B
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B	B	B
LAVAMANOS	B	B	B	B	B
DUCHAS	B	B	B	B	B
ORINALES	B	B	B	B	B
ESPEJO	B	B	B	B	B
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yeison Bustos	Yeison Busto	Yeison Busto	Yeison Busto	Yeison Busto
OBSERVACIONES	Solo se realiza aseo de lno a viernes. Unicamente				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	CONTROL DE LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yelson Bustos

LUGAR: Operativo

PERIODO DE REPORTE: SEMANA: 23-02-26 al 25-02-26.

N° Baños hombres: 10 N° Orinales: 10 N° Baños mujeres: 2

Califique , el estado del lugar de acuerdo a las siguientes referencias :
MALO - M
REGULAR - R
BUENO - B
DIA FESTIVO NO APLICA - NA

	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
	FECHA : 23-02-26	FECHA : 24-02-26	FECHA : 25-02-26.	FECHA :	FECHA :
PISOS	B	B	B		
PAREDES	B	B	B		
TECHOS	B	B	B		
SANITARIOS	B	B	B		
ELEMENTOS DE ASEO	B	B	B		
CANECA CON SU RESPECTIVA BOLSA	B	B	B		
LAVAMANOS	B	B	B		
DUCHAS	B	B	B		
ORINALES	B	B	B		
ESPEJO	B	B	B		
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Yelson Bustos	Yelson Bustos	Yelson Bustos		
OBSERVACIONES	Solo se realiza aseo de lunes a viernes unicamente				

FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL DEL PROYECTO :

C4. Proveedores agua potable

CONSORCIO INTERVENTORES
GIBRALTAR

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2026

Señores
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO
José Luis Clavijo Olmos
Representante legal
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: **CERTIFICACIÓN COMPRA DE AGUA EN BLOQUE.**

Desde la Interventoría Consorcio Interventores Gibraltar se certifica que, durante el periodo comprendido entre el 26 de enero el 25 de febrero de 2026, **no se hizo compra** de Agua en Bloque para la ejecución de actividades propias de obra, toda vez que en el proyecto cuenta con el servicio de suministro de agua potable por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Arq. Rubén Darío Crespo
Director de Interventoría

Elaboró: Ing. Julián Ricardo Agudelo - Residente Ambiental de Interventoría
Revisó y aprobó Arq. Rubén Darío Crespo – Director de Interventoría.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente. Autorretenedor

NAG
Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 5 CICLO: W5 RUTA: W55980

MENSUAL

49112424	42135468611
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Periodo facturado DIC/21/2025 - ENE/20/2026

Pago oportuno FEB/26/2026

Suspensión MAR/03/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
MAR/19/2026	FEB/10/2026 06:49:17	FEB/10/2026 11:07:17

¡Hola!

Factura a nombre de

VELODROMO DEL PARQUE METROPOLI

Dirección del predio

KR 91 43 SUR 22 LT 0

Barrio: LAS Localidad: KENNEDY

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Industrial
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca MADDALENA Tipo VELO020R200
Serie 2431016454 Diámetro pulgadas ¾

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓


Llámanos 116 Acueducto

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de Internet.

cadena. Nit. 830.930.534-0

Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue **234m³**



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 534.000

Promedio al día 17.226

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	2349	Facturado con	Alto consumo
Lectura anterior	1815	Base promedio	
Tu consumo este periodo	534	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	MADDALENA	Tipo	VELO020R200
Serie	2431016454	Diámetro pulgadas	¾

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros
$2.713.124,24		$2.973.510,37		$3.396
A		B		C D E F

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $5.690.030

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 8209e10e03384bcad190b8580de1efead85859ddb1e9a2414b58a6bef4852f7a964674a4c939de3da16869128a6c1add

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto						B Alcantarillado					
	Cant. ×	Valor unitario ×	Aporte (+) o Subsidio (-)** % =	Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)	Cant. ×	Valor unitario ×	Aporte (+) o Subsidio (-)** % =	Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)												
Consumo residencial básico (m³)												
Consumo residencial superior básico (m³)												
Cargo fijo no residencial (mes)	1,00	$9.795,62	30	$2.939	$12.734,31	$12.734,62	1,00	$4.656,05	31	$1.443	$6.099,43	$6.099,05
Consumo no residencial (m³)	534,00	$3.664,43	38	$743.584	$5.056,91	$2.700.389,62	534,00	$3.885,98	43	$892.298	$5.556,95	$2.967.411,32
Subtotal				$746.523		$2.713.124,24				$893.741		$2.973.510,37

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$43,54	$153,35
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$43,54	$153,35
Total por consumo facturado	$23.250	$81.889

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada periodo facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4-
I-intereses de mora	$3.400
Subtotal	3.396

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$5.690.030

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/02/24 | Hora Ingreso: 15:19 IP: 190.24.8.10

Ana Patricia Paez Walteros

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/24 10:03

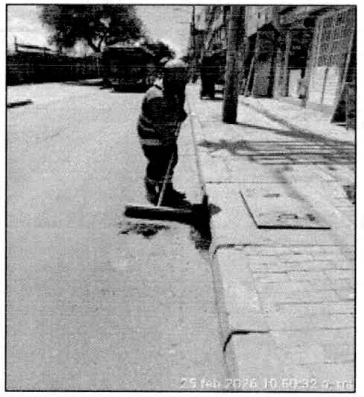
DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE8461
Nro. Producto	*****8461
Fecha	2026/02/24
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	236
Desc. Oficina	LA SALLE
Nro. Documento	N/A

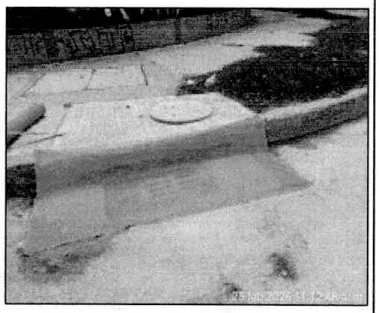
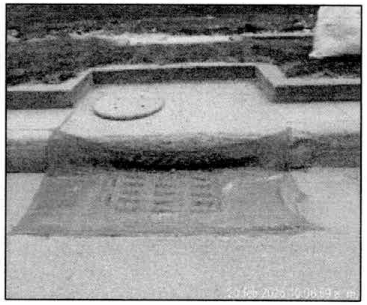
Débitos	$5,690,030.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$5,690,030.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

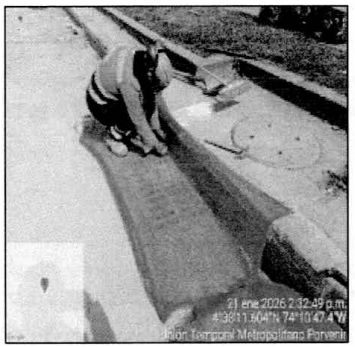
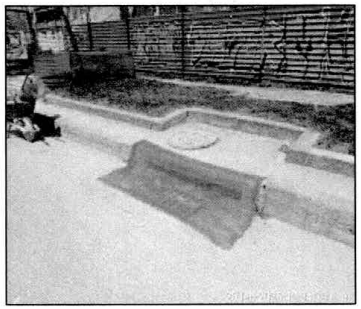
162

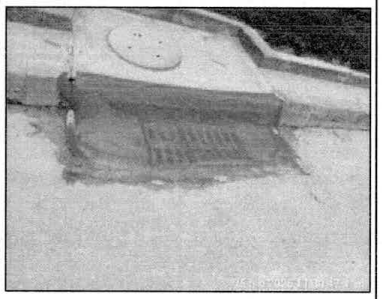
C5. Estructuras hidráulicas

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	4/02/2026	Calle 49 Sur # 92-11	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos, no se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	
2	25/02/2026	Sin dirección, costado parque	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos y residuos sólifos, se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	

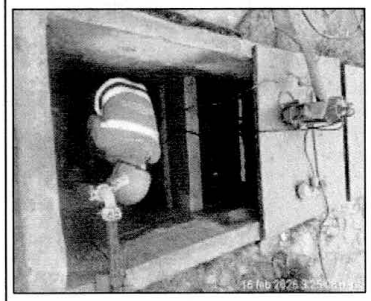
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3	4/02/2026	Calle 49 Sur # 91-21	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos, no se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	
4	4/02/2026	Calle 49 Sur # 91A-07	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos y residuos sólifos, se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	

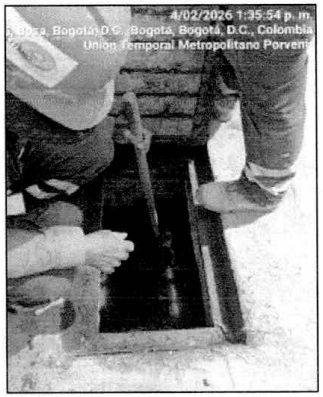
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024	
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
5	25/02/2026	Carrera 91 # 49Sur -05	SUMIDERO	Sumidero lateral, con sedimentos, no se evidencia presencia de olores	Protección con polisombra azul	
6	20/02/2026	Carrera 91 # 49Sur -30	SUMIDERO	Sumidero de tipo convencional, con presencia de residuos, sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
7	4/02/2026	Carrera 91 # 49Sur -30	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral, con presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	
8	4/02/2026	Carrera 91 # 49Sur -30	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral, sin presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR	REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024	
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
9	25/02/2026	Carrera 91 # 49 Sur- 51	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral,con presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	
10	25/02/2026	Carrera 91 # 49 Sur- 51	SUMIDERO	Sumidero tipo convencional y lateral,con presencia de sedimentos y sin evidencia de olores	Protección con polisombra azul	

991

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
11	10/02/2026	Calle 49 Sur #92A	CÁRCAMO LAVADO DE LLANTAS	Cárcamado construido para recolección de lodos sistema de lavado de llantas	Protección con polisombra azul y retiro de lodos	
12	16/02/2026	Calle 49 Sur #92A	SEDIMENTADOR	Sedimentador sistema de lavado de llantas	Retiro de lodos	

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR			REGISTRO MANTENIMIENTOS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS (SUMIDEROS, CÁRCAMOS, SEDIMENTADOR)			CÓDIGO: SC-003-308 FECHA: 29/03/2024
N°	**FECHA**	**UBICACIÓN**	**ESTRUCTURA HIDRÁULICA**	**ESTADO INICIAL**	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
13	4/02/2026	Calle 49 Sur #92A	POZOS DE RED PLUVIAL CARRERA 91 y calle 49 Sur	Acumulación de aproximadamente 20 cm de lámina de lodos	Retiro de lodos	

691

C6. Cortadora de ladrillo

CONSORCIO INTERVENTORES
GIBRALTAR

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO
José Luis Clavijo Olmos
Representante legal
La ciudad

Referencia. **Proyecto VELÓDROMO GIBRALTAR -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3232-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: **CERTIFICACIÓN CORTADORA DE LADRILLO.**

Desde la Interventoría Consorcio Interventores Gibraltar se certifica que, durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2026 **no se requirieron** equipos cortadores de ladrillo, toda vez que no se han iniciado actividades constructivas en las cuales sea necesario su utilización.

Arq. Rubén Darío Crespo
Director de Interventoría

Elaboró: Ing. Julián Ricardo Agudelo - Residente Ambiental de Interventoría
Revisó y aprobó: Arq. Rubén Darío Crespo – Director de Interventoría.

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

C7. Seguimiento vehículos de carga, maquinaria y equipos

C7.1 Vehículos de carga

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTROL DOCUMENTAL DE VOLQUETAS

PERÍODO DE REPORTE: 26 ENERO DE 2026 AL 25 FEBRERO 2026

PROVEEDOR / CONTRATISTA	VEHICULO					VERIFICACIÓN DOCUMENTAL			
	PLACA	PIN	MODELO	CLASE	MARCA	SOAT	VENCIMIENTO SOAT	NÚMERO TÉCNICOMECÁNICA	FECHA DE VENCIMIENTO TÉCNICO MECÁNICA
VEOLIA	WFG819	7916	2015	VOLQUETA	INTERNATIONAL	10573000193030	5/11/2026	185177403	11/11/2026
VEOLIA	WNO377	16380	2015	VOLQUETA	FREIGHTLINER	10573000162850	27/3/2026	181790376	14/6/2026
VEOLIA	SVB493	27330	2007	CARGA O MIXTO	KENWORTH	3600041413	13/3/2026	183310844	19/8/2026
VEOLIA	TAL534	4776	2013	CARGA O MIXTO	INTERNATIONAL	93479104-600110188	18/11/2026	183358211	20/8/2026
VEOLIA	NHR974	27721	2024	VOLQUETA	INTERNATIONAL	42027401	11/7/2026	NO APLICA	NO APLICA
T &T TECNIMONTAJES Y TRANSPORTES	KPK328	NA	2012	CARGA O MIXTO	XCMG	3308006180589000	21/12/2026	181313582	21/5/2026

CONTROL DE FIRMAS:

RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA
PAULA BLANCO

RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA
JULIAN AGUDELO

172

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025-11-04			2025-11-06			2026-11-05		

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10573000193030	WFG819	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHICUL: WORKSTAR 7600 SBA 6X4

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35325313	3HTWYAHT6FN536245	3HTWYAHT6FN586245	16.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MORENO SANCHEZ, OSCAR EFREN	3118173271	CC	80272552	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	96	4013	0	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1061500	$ 551900	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1615800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8.77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en 1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185177403

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA

NIT: 900081626

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-026-003

Fecha de expedición: 2025/11/11

Fecha de vencimiento: 2026/11/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFG819	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10831	**NRO. MOTOR:**	35325313
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT6FN586245	**VIN:**	3HTWYAHT6FN586245
LÍNEA:	WORKSTAR 7600 SBA 6X4		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: OSCAR E. MORENO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HELVER RAFAEL NIÑO ALVAREZ

PLACA	PIN AMBIENTAL	CONDUCTOR A CARGO	No. CELULAR
WFG 819	7916	GILBERTO ARIZA	3106476767

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2025-03-27	2025-03-28	2026-03-27

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
10573000162850	WNO377	CARGA O MIXTO	PUBLICO	12800	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	PLATON
	LÍNEA VEHICUL: M2-112	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
460908U0985516	3ALHC5CV7FDGN5486	3ALHC5CV7FDGN5486	15.35

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MORENO SANCHEZ, OSCAR EFREN	3118173271	CC	80272552	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	96	4013	0	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1061500	$ 551900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1615500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	HASTA 263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181790376

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS MIX

NIT: 901448044

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-091

Fecha de expedición: 2025/06/14

Fecha de vencimiento: 2026/06/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WNO377

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FREIGHTLINER

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12800

NRO. MOTOR: 460908U0985516

NRO. CHASIS: 3ALHC5CV7FDGN5486

VIN: 3ALHC5CV7FDGN5486

LÍNEA: M2-112

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: OSCAR E. MORENO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

175



SOAT

Aseguradora Solidaria de Colombia

¡Siempre cuente con Ti!

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA
2025 | 5 | 13	2025 | 5 | 14 — 2026 | 5 | 12

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3600941413	SVB493	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	15000	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	KENWORTH	SRS

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
T800	79220238	198103	0	52,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SANCHEZ BOLIVAR ANDRES	3124878864	CC	79545985	BOGOTÁ, D.C.

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1502	360	9208	AT1502 3600941413	BOGOTÁ, D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1.061.500,00	$ 551.900,00	$ 2.100,00

TOTAL A PAGAR $ 1.615.500,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o IOS.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183310844

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA EXPRESS LTDA

NIT: 900192331

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-104-001

Fecha de expedición: 2025/08/19

Fecha de vencimiento: 2026/08/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SVB493

CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 15000

NRO. MOTOR: 79220238

NRO. CHASIS: 198103

VIN:

LÍNEA: T800

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: ANDRES SANCHEZ B.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SEBASTIAN CAMILO ESCOBAR PLAZAS

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Ingreso de Datos de Obras Públicas y Privadas
Número de radicación	2025ER133465
Fecha inicio	2025-06-20 16:04:08
Fecha fin	2025-06-20 16:07:04
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas



177

SOAT

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2025 11 18	2025 11 19		2026 11 18	

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
93479104 - 600110188	TAL534	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	INTERNATIONAL	PLATON
LINEA VEHICULO	7600	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
35305710	3HTWYAHT4DN300681	3HTWYAHT4DN300681	16,50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CARMEN ROSA CHITIVA DE ROJAS	3107999847	CC	20666118	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	469	13158	93479104	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.800


FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.seguroterCero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT,

la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales, la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 910, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numerales 1 del Art.2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art.2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.18 11:26:16 -05:00

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183358211

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA AURORA

NIT: 901393137

No. de Certificado de Acreditación: 24-CDA-006

Fecha de expedición: 2025/08/20

Fecha de vencimiento: 2026/08/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TAL534

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35305710

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT4DN300681

VIN: 3HTWYAHT4DN300681

LÍNEA: 7600

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: CARMEN R. CHITIVA D. R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

LIBARDO CARREÑO CASTRO

178

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA								
AÑO	MES	DIA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DIA
2025	07	11		2025	07	12		2026	07	11

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
42027401	NHR974	VOLQUETA	PUBLICO INTERMUNICIPAL	8900	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: HV607SBA6X4

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
99185415	3HAEKTAT6RL235587	3HAEKTAT6RL235587	17.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ALEIDA YANIRA GONZALEZ RODRIGUEZ	3133462611	CEDULA	52332911	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2425	10676		BOGOTA D.C.

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1,061,500	$ 551,900	$ 2,400

TOTAL A PAGAR $ 1,615,800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



Con el SOAT SURA
vamos más allá.

Conoce nuestra red de prestadores en salud en caso de accidente.

Haz clic aquí

Recibe acompañamiento a través del #888



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

179
