	FORMATO INFORME SEMANAL		
	Código: GEP-F1310-18	Versión: 02	Página 1 de 2

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA

Informe semanal N°:	16	Fecha de informe:	23 JULIO AL 29 JULIO 2026.	Proyecto:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR – ANTIOQUIA
		Fecha acta de inicio:	10 ABRIL DE 2026.	Contrato N°:	051 DE 2025

	OBRA	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	051 de 2025	25SS122C2695 de 2025
PROCESO:	Invitación Pública	Contrato interadministrativo
OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR – ANTIOQUIA	Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera y legal) a los contratos de obra de escenarios deportivos.
CONTRATISTA:	MIGUEL ROBLES S.A.S	Renting de Antioquia - RENTAN EICE
NIT:	901.252.893-1	900.285.704-4
INMUEBLE A INTERVENIR CON EL CONTRATO:	COLISEO MUNICIPAL	COLISEO MUNICIPAL
SUPERVISOR:	Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia	Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia
ESTADO:	EN EJECUCIÓN. RETRASADA	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	$ 367.985.194,00	$ 25.776.676.198
PLAZO TOTAL:	19 DE AGOSTO DE 2026.	Catorce (14) meses según acta de ejecución no. 2
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2026.	27 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE FIN:	19 DE AGOSTO DE 2026.	27 DE ABRIL DEL 2027.

EJECUCIÓN DE OBRA DEL:

OBRA ACTUAL	PROGRAMADA	EJECUTADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	EJECUTADO A COSTO DIRECTO ACUMULADO A LAFECHA		
				EJECUTADO	PROGRAMADO	BALANCE OBRA
Obra Financiera %	3,00%	0,15%	Obra ejecutada acumulada %	22,00%	25%	-3,00%
Valor de la Obra programada:	$ 11.039.556,00	$ 556.525,50	Obra ejecutada acumulada a la fecha	$ 80.952.784,96	$ 91.996.299,00	-$ 11.043.514,04
Valor de interventoría			Valor interventoría.	$ -		
			Ejecución física programada	0%		-3%

ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR – ANTIOQUIA	**Supervisor del proyecto:**	Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia

PERSONAL EN PROYECTO

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA		
ITEM	**CANTIDAD**	**ESTADO**
SOLDADOR	2	BUENO
HERRAMIENTA MENOR	1	BUENO
PULIDORA	1	BUENO
COMPRESOR	1	BUENO
COMPRESOR	1	MALO
FLEJADORA	1	BUENO
CONCRETADORA	1	BUENO
CARRETA	5	BUENO
VIBRADOR	1	BUENO
CIZALLA	2	BUENO
TALADRO ELECTRICO	1	BUENO
TOTAL EQUIPOS	17	

PERSONAL OBRA		
ITEM	**CANTIDAD (#)**	**% DEDICACIÓN**
Director de obra	1	40%
Residente de obra	1	100%
Auxiliar de obra		
Profesional Social		
Profesional Ambiental		
Profesional SST		
Topógrafo		
Conductor		
Practicante	1	
Auxiliar administrativo		
Otros		
Visitantes		
Pintores		
Mantenimiento de Reja		
Cubierta		
Maestro	1	100%
Oficiales	1	
Encargado		
Almacenista		
Celadores		
Ayudantes	4	100%
Operadores		
TOTAL LABORNADO	9	

PERSONAL INTERVENTORÍA	
ITEM	**CANTIDAD**
Director de interventoría	
Profesional Civil	1
Profesional Social	
Profesional Ambiental	1
Profesional SST	1
Auxiliar Civil	1
Auxiliar SST	
Auxiliar Ambiental	
Auxiliar Social	
Conductor	
Topógrafo	
Auxiliar Administrativo	
Otros	
Visitantes	
TOTAL INTERVENTORÍA	4


INFORMACIÓN TÉCNICA

BALANCE DE OBRA EJECUTADA SEMANAL Y ACUMULADA


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ACTUAL	VALOR ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	ABSCISA INTERVENIDA	ESTADO
1,1	Localización y replanteo	m²	$ 2.322,00		$ -	606,20	$ 1.407.596,40		
1,2	Demolición con medios mecánicos de placas en concreto (e = 0.15 m), incluye retiro de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.	m²	$ 57.247,00		$ -	41,28	$ 2.363.156,16		
1,3	Demolición de muros en mampostería en bloque de ladrillo o cemento, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	m²	$ 90.519,00		$ -	4,96	$ 448.974,24		
1,4	Demolición de mesones en concreto, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	m²	$ 56.319,00		$ -	2,20	$ 123.901,80		
1,5	Demolición de enchapes en cerámica (pisos y paredes), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	m²	$ 48.235,00		$ -	24,81	$ 1.196.710,35		
1,6	Retiro de aparatos sanitarios (lavamanos, orinal, duchas, sanitarios), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	Und	$ 40.151,00		$ -	5,00	$ 200.755,00		
1,7	Demolición de pañetes, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	m²	$ 29.758,00		$ -	30,25	$ 900.179,50		
1,8	Retiro de puertas metálicas, con medios manuales, incluye acarreo interno y retiro de escombros	m²	$ 35.301,00		$ -	5,19	$ 183.212,19		
1,9	Desmonte de cubierta existente en coliseo, con medios manuales o mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	m²	$ 24.973,00		$ -	501,61	$ 12.526.581,67		
1,10	Demolición de elementos estructurales, con medios mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	m³	$ 260.259,00		$ -	0,10	$ 26.025,90		
1,12	Desmonte de estructura metálica existente (correas principales) para repotenciación	mL	$ 25.200,00		$ -	244,32	$ 6.156.864,00		
2,1	Excavación manual (inc. retiro de sobrantes)	m³	$ 72.897,00		$ -	16,72	$ 1.218.837,84		
2,2	Vigas cimentación y zapatas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	m³	$ 825.359,00		$ -	8,19	$ 6.760.928,25		
2,4	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	kg	$ 7.295,00		$ -	2953,26	$ 21.544.027,32		
2,5	Malla electrosoldada de 4 mm 15x15 D84	m2	$ 9.397,00		$ -	18,71	$ 175.817,87		
2,6	Relleno con material seleccionado	m3	$ 74.206,00		$ -	18,16	$ 1.347.580,96		
2,7	Vigas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	m³	$ 965.224,00		$ -	8,55	$ 8.249.962,57		
2,8	Columnas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	m³	$ 938.137,00		$ -	3,38	$ 3.169.683,48		
3,8	Estuco Plástico Interiores / exterior	m2	$ 23.752,00	13,18	$ 313.051,36	13,18	$ 313.051,36		
3,9	Suministro e instalación de cerámica para baños (piso /pared), incluye alistado, pegante cerámico, espaciadores y emboquillado	m2	$ 115.327,00		$ -	49,11	$ 5.663.708,97		
3,10	Pintura Vinilo 3 manos	m2	$ 18.473,00	13,18	$ 243.474,14	13,18	$ 243.474,14		
4,1	Estructura metálica para cubierta	kg	$ 20.100,00		$ -	152,71	$ 3.069.471,00		
6,1	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de porcelana sanitaria, con alimentación superior, color Blanco, con grifo de paso, con grifería de monocontrol, incluye silicona para sellado de juntas	Und	$ 184.277,00		$ -	3,00	$ 552.831,00		
6,2	Suministro, transporte e instalación de sanitario de porcelana sanitaria, con alimentación superior color Blanco, con grifo de paso, incluye silicona para sellado de juntas.	Und	$ 320.099,00		$ -	3,00	$ 960.297,00		
6,3	Suministro, transporte e instalación de orinal de llave color blanco, incluye grifería	Und	$ 261.075,00		$ -	2,00	$ 522.150,00		
6,4	Poceta + Llave tipo jardín	Und	$ 134.177,00		$ -	1,00	$ 134.177,00		
6,5	Grifería ducha sencilla con mezclador	Und	$ 214.146,00		$ -	1,00	$ 214.146,00		
8,1	Tubería PVC presión, diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	mL	$ 7.377,00		$ -	11,87	$ 87.564,99		
8,2	Salidas hidráulicas PVC presión de diámetro 1/2", capacidad de 21-200 psi.	Und	$ 44.854,00		$ -	11,00	$ 493.394,00		
8,3	Salidas sanitarias PVC de diámetro 2", incluye soportes y accesorios	Und	$ 59.075,00		$ -	7,00	$ 413.525,00		
8,5	Salidas sanitarias PVC de diámetro 4", incluye soportes y accesorios	Und	$ 94.733,00		$ -	3,00	$ 284.199,00		
					$ -	0,00	$ -		
					$ -	0,00	$ -		
					$ -	0,00	$ -		
					$ -	0,00	$ -		

					$ -	0,00	$ -			
		EJECUCIÓN SEMANAL			**$ 556.525,50**	0,00	EJECUCIÓN ACUMULADA	**$ 80.952.784,96**		
TOTAL EJECUTADO COSTO DIRECTO					$ 80.952.784,96					

CURVA S: AVANCE FÍSICO ACUMULADO

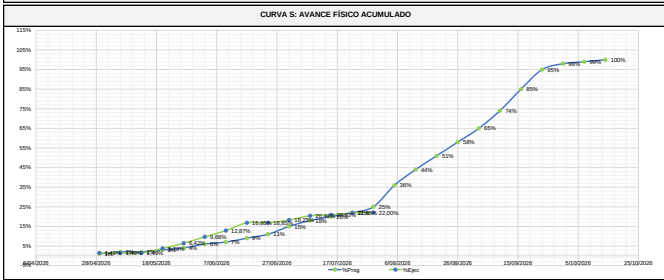

CURVA S: AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

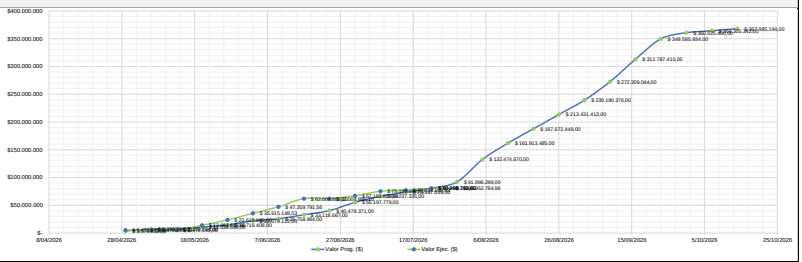

Semana	Fecha corte	%Prog	%Ejec	Valor Prog. ($)	Valor Ejec. ($)
1, 2, 3	29/04/2026	1,00%	1,49%	$ 3.679.852,00	$ 5.472.645,08
4	6/05/2026	2,00%	1,49%	$ 7.359.704,00	$ 5.472.645,08
5	13/05/2026	2,00%	1,49%	$ 7.359.704,00	$ 5.472.645,08
6	20/05/2026	3,00%	3,79%	$ 11.039.556,00	$ 13.964.610,60
7	27/05/2026	4,00%	6,42%	$ 14.719.408,00	$ 23.619.885,06
8	3/06/2026	6,00%	9,68%	$ 22.079.112,00	$ 35.615.148,53
9	10/06/2026	7,00%	12,87%	$ 25.758.964,00	$ 47.359.791,56
10	17/06/2026	9,00%	16,85%	$ 33.118.667,00	$ 62.004.886,10
11	24/06/2026	11,00%	16,85%	$ 40.478.371,00	$ 62.004.886,10
12	1/07/2026	15,00%	18,25%	$ 55.197.779,00	$ 67.151.823,94
13	8/07/2026	18,00%	20,44%	$ 66.237.335,00	$ 75.199.133,91
14	15/07/2026	20,00%	20,93%	$ 73.597.039,00	$ 77.033.108,43
15	22/07/2026	22,00%	21,85%	$ 80.956.743,00	$ 80.396.259,46
16	29/07/2026	25,00%	22,00%	$ 91.996.299,00	$ 80.952.784,96
17	5/08/2026	36,00%		$ 132.474.670,00	
18	12/08/2026	44,00%		$ 161.913.485,00	
19	19/08/2026	51,00%		$ 187.672.449,00	
20	26/08/2026	58,00%		$ 213.431.413,00	
21	2/09/2026	65,00%		$ 239.190.376,00	
22	9/09/2026	74,00%		$ 272.309.044,00	
23	16/09/2026	85,00%		$ 312.787.415,00	
24	23/09/2026	95,00%		$ 349.585.934,00	
25	30/09/2026	98,00%		$ 360.625.490,00	
26	7/10/2026	99,00%		$ 364.305.342,00	
27	14/10/2026	100,00%		$ 367.985.194,00	

Observaciones: En la obra se adelantan actividades de soldado en cubierta, pero se contaulizaran una vez finalizadas, se contabilizan items 3,8 y 3,10 que no se habian tenido en cuenta.


II. GESTIÓN AMBIENTAL

Fuentes de materiales		Permisos ambientales		
Ubicación:	6°56'4.2"N - 75°51'28.67"O	Zonas de depósito:		Predio Autorizado por Secretaria de Planeación
Permiso minero:	No. 6768			
Licencia ambiental:	130CA4405 DE 08/06/2006			
Ubicación:		Licencia ambiental:		DONACION
Permiso minero:		Aprovechamiento forestal:		N/A
Licencia ambiental:		Ocupación de cauce:		N/A
Ubicación:		Vertimientos:	(Protección de aguas)	N/A
Permiso minero:		Emisiones: (polvo, tecno mecánica):		N/A
Licencia ambiental:		Concesión de aguas:		N/A
Observaciones:	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S. - CONYTRAC RUCOM 2023080125115	Ocupación de cauce:		N/A
		Observaciones:		el predio donde se hacen las disposicion de RCD es un predio privado el cual la autorizacion fue suministrada por el municipio.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	DÍAS CON AUSENCIA DE LLUVIA (0)	DÍAS CON LLUVIAS LEVES (1)	DÍAS LLUVIAS MODERADAS (2)	DIAS CON LLUVIAS FUERTES (3)
1/02/2026	0			
2/02/2026	0			
3/02/2026	0			
4/02/2026	0			
5/02/2026	0			
6/02/2026	0			
7/02/2026	0			

GRÁFICO ESTADO DEL TIEMPO



ACTIVIDADES GESTION AMBIENTAL:

Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental:	Durante el periodo reportado, se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal de obra sobre la prevención de derrames, con el fin de fortalecer la implementación de medidas de manejo ambiental y atención oportuna de posibles contingencias. De igual manera, se mantuvo una coordinación permanente con el profesional ambiental del cntratista, quien brindó el acompañamiento técnico necesario para atender las inquietudes y requerimientos surgidos durante la ejecución del proyecto. Por otra parte, de acuerdo con la programación de obra y el avance de las actividades constructivas, durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades en el escenario deportivo urbano del municipio de Salgar, Antioquia, Etapa II. En consecuencia, las actividades desarrolladas se limitaron a labores de soldadura en el Coliseo Cubierto Municipal.
Actividades constructivas:	Se realizó el seguimiento al manejo de los materiales e insumos utilizados en la obra, verificando que su almacenamiento se efectuara en las áreas autorizadas por la interventoría. De igual manera, se efectuó el control periódico de los insumos y sustancias químicas presentes en el frente de trabajo, con el propósito de optimizar su consumo y prevenir la generación de excedentes y residuos peligrosos. Asimismo, se sensibilizó al personal sobre la importancia de rotular adecuadamente los recipientes utilizados en el trasvase de sustancias químicas, con el fin de prevenir accidentes y promover buenas prácticas de manejo, recordando además que cualquier actividad de trasvase de combustible o sustancias químicas debe realizarse conforme al protocolo establecido y aprobado por la interventoría.
Gestión del recurso hídrico:	Durante el periodo de seguimiento se continuó garantizando al personal de obra el acceso a las unidades sanitarias ubicadas en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Salgar, como medida orientada a preservar las condiciones de saneamiento básico, higiene y bienestar durante la ejecución de las actividades. Asimismo, se realizó seguimiento a las condiciones de limpieza y mantenimiento de las instalaciones para asegurar su adecuado estado de uso. En cuanto a las actividades constructivas que requieren uso hídrico en el presente periodo de seguimiento no se desarrollaron, debido que únicamente se están realizando actividades de soldadura en el Coliseo Cubierto Municipal. En cuanto al uso del recurso hídrico, durante el presente periodo no se desarrollaron actividades constructivas que requirieran su utilización, ya que las labores ejecutadas se limitaron a actividades de soldadura en el Coliseo Cubierto Municipal.
Biodiversidad y servicios ecosistémicos:	No aplica. De acuerdo con el alcance del proyecto, las actividades constructivas se desarrollan sobre una superficie previamente intervenida (suelo duro) al interior del coliseo, destinada al almacenamiento de materiales pétreos y herramientas. En consecuencia, durante el periodo reportado no fue necesario realizar actividades relacionadas con el manejo de descapote y cobertura vegetal, recuperación de áreas afectadas, protección de fauna ni manejo de ecosistemas sensibles, al no generarse intervención sobre coberturas naturales o áreas ambientalmente sensibles.
Manejo de instalaciones temporales:	Se verificaron las condiciones de orden, aseo y señalización de las áreas destinadas al almacenamiento temporal de materiales, insumos y herramientas. Asimismo, se realizó seguimiento al adecuado funcionamiento y uso del punto ecológico, verificando la separación de los residuos sólidos generados, así como las condiciones de limpieza de las áreas de apoyo a la obra. Los residuos sólidos generados corresponden a las actividades ejecutadas en el Coliseo Cubierto Municipal, los cuales se continuaron entregando a la Empresa Públicas de Salgar S.A. E.S.P., de acuerdo con la ruta de recolección establecida por el prestador del servicio público de aseo.

Observaciones:

III. GESTIÓN SOCIAL

Total empleos proyecto (contratista):	Mano de obra local: 7	Mano de obra foránea: 2	N° de socializaciones realizadas:	0
Empleos nuevos generados (última semana):	N/A		N° de capacitaciones realizadas:	0
Total actas de vecindad (última semana):	N/A		N° de inducciones realizadas:	0
Total actas de entorno (última semana);	N/A		N° de PQRSF atendidas:	0
Dirección punto de atención a la comunidad:	EN LA OBRA		Canales de atención a la comunidad virtual:	miguelroblessagerencia@gmail.com

Observaciones: se mantuvo operativo el Buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), garantizando un canal permanente de comunicación y atención para la comunidad y demás partes interesadas.

ACTIVIDADES GESTION SOCIAL:

Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria y servicios públicos:	Durante el periodo reportado se realizaron actividades preventivas orientadas a la protección de la infraestructura social y comunitaria ubicada en el área de influencia directa del proyecto, especialmente sobre los elementos urbanos existentes alrededor del Coliseo Municipal de Salgar y Gimnasio Barrio la Habana.
Programa para el reconocimiento del entorno:	en el periodo no se realizo el reconocimiento del entorno ya que se realizo en semanas anteriores
Programa de contratación de mano de obra:	En el periodo no se realizo contratacion de mano de obra.
Información y divulgación:	Durante el periodo reportado no se realizó impresiones, entregas de volantes informativos y piezas digitales tipo E-card, debido a que la etapa inicial del proyecto se concentró en la organización operativa del frente de obra y la instalación de mecanismos informativos prioritarios.
Atención a la comunidad e interesados en el proyecto:	Este programa tiene como finalidad garantizar la atención efectiva de las comunidades del área de influencia directa del proyecto a través de estrategias y espacios para la exposición, reconocimiento y solución de dudas, expectativas y reclamos que se generen como consecuencia de las actividades constructivas del proyecto.
Protección del patrimonio arqueológico y cultural:	Durante el periodo reportado se implementaron acciones iniciales orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad social y operativa del proyecto, principalmente mediante la organización adecuada del frente de obra, la contratación de mano de obra local, el control preventivo del entorno y la generación de mecanismos de participación comunitaria.
Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria:	Durante el periodo reportado se implementaron acciones iniciales orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad social y operativa del proyecto, principalmente mediante la organización adecuada del frente de obra.
Capacitación y participación comunitaria:	Este programa tiene como finalidad garantizar la atención efectiva de las comunidades del área de influencia directa del proyecto a través de estrategias y espacios para la exposición, reconocimiento y solución de dudas, expectativas y reclamos que se generen como consecuencia de las actividades constructivas del proyecto.

IV. GESTIÓN SST

N° de inducciones realizadas:	0	N° de charlas realizadas:	3
N° inspecciones de seguridad realizadas:	2	N° de capacitaciones realizadas:	0
N° de accidentes de trabajo ocurridos :	0	N° de días ausentismo por enfermedad	0
N° de días perdidos por AT:	0		

TEMAS FORMACIÓN DIARIA

Día	TEMA
1	Importancia de la planificacion diaria antes de iniciar las actividades
2	Como identificar cambios en las condiciones de trabajo durante la jornada
3	Prevención de errores por exceso de confianza
4	
5	
6	

HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LA SEMANA COMPONENTE SST

Día	HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	FECHA CIERRE	ESTADO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

ACTIVIDADES GESTION SST

Se realizó seguimiento a las actividades de corte, instalación y soldadura de perfiles y ángulos para la repotenciación de las cerchas, verificando el uso adecuado de los elementos de protección personal y el cumplimiento de las medidas de seguridad para trabajos en caliente.

Se inspeccionaron las labores de instalación y retiro de formaletas, así como el vaciado de concreto para la reposición de muros, verificando la estabilidad de los elementos, el uso seguro de herramientas y el control de los riesgos asociados a la actividad.


Se efectuó supervisión al desarme, traslado y armado de andamios, verificando la correcta instalación de la estructura, la inspección previa de sus componentes y el cumplimiento de las medidas de seguridad para trabajos en alturas.

Se verificó la correcta delimitación y señalización de las áreas donde se ejecutaron actividades de repotenciación de la estructura metálica, con el fin de controlar el acceso de personal no autorizado y prevenir la caída de objetos.

Se realizaron inspecciones de orden y aseo en el frente de obra, promoviendo la limpieza permanente de las áreas intervenidas y la adecuada disposición de materiales y residuos para reducir la ocurrencia de incidentes.


ACCIDENTALIDAD SEMANAL

TASA DE ACCIDENTALIDAD



Análisis:

TASA DE SEVERIDAD DEL ACCIDENTE



Análisis:

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. corte de platinas



Foto 2. Armado de formaletas



Foto 3. Soldado de cerchas en cubierta



Foto 4. Vaciado de muro en reemplazo de muro en ladrillo - Uso de andamio multidireccional



Foto 5. Desencofrado de muro



Foto 6. Vaciado de muro



Foto 7. Soldado de cerchas en cubierta



Foto 8. Soldado de cerchas en cubierta



Foto 9. Desencofrado de muro

		
Foto 10. Soldado de cerchas en cubierta	Foto 11. Soldado de cerchas en cubierta	Foto 12.
		
Foto 13. Soldado de cerchas en cubierta	Foto 14. Labores de orden y aseo en obra	Foto 15. Labores de corte - uso adecuado de EPP
		
Foto 16. Uso de andamio Multidireccional para labores de soldadura	Foto 17.	Foto 18.

IX. OBSERVACIONES			
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JOSE MARTINEZ ORTEGA	NOMBRE: LUIS RAMOS GUERRERO	NOMBRE: LUIS RAMOS GUERRERO	NOMBRE: ALVARO DORIA PEREIRA
CARGO: PROFESIONAL TÉCNICO	CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL	CARGO: PROFESIONAL SOCIAL	CARGO: PROFESIONAL SST

Informe de la Accidentalidad Semanal

Código: GEP-F1310-18	Versión: 02	Página 1 de 2

Fecha de actualización:	29/07/2026
Contratista / Proyecto:	MIGUEL ROBLES S.A.S / COLISEO MUNICIPAL
Año	2026
Horas Diarias Laboradas	8

Fecha	Semana	Accidentes de Trabajo	Días perdidos AT	Días laborados	Cantidad Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas (HHT)	Tasa de accidentalidad	Tasa de Severidad	Teórico At
10 al 15 de abril de 2026	1	0	0	6	3	144	0,0	0,0	1
16 al 22 de abril de 2026	2	0	0	6	10	480	0,0	0,0	1
23 al 29 de abril de 2026	3	0	0	6	10	480	0,0	0,0	1
30 de abril al 06 de mayo de 2026	4	0	0	6	6	288	0,0	0,0	1
07 al 13 de mayo de 2026	5	0	0	6	5	240	0,0	0,0	1
14 al 20 de mayo de 2026	6	0	0	6	5	240	0,0	0,0	1
21 al 27 de mayo de 2026	7	0	0	6	6	288	0,0	0,0	1
28 de mayo a 03 de junio de 2026	8	0	0	6	11	528	0,0	0,0	1
04 al 10 de junio de 2026	9	0	0	6	10	480	0,0	0,0	1
11 al 17 de junio de 2026	10	0	0	6	16	768	0,0	0,0	1
18 al 24 de junio de 2026	11	0	0	6	16	768	0,0	0,0	1
25 de junio al 01 de julio de 2026	12	0	0	6	4	192	0,0	0,0	1
02 al 08 de julio de 2026	13	0	0	6	8	384	0,0	0,0	1
09 al 15 de julio de 2026	14	0	0	6	6	288	0,0	0,0	1
16 al 22 de julio de 2026	15	0	0	6	8	384	0,0	0,0	1
23 al 29 de abril de 2026	16	0	0	6	8	384	0,0	0,0	1
	17					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	18					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	19					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	20					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	21					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	22					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	23					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	24					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
	25					0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1
