Outlook

Solicitud de modificación del Convenio 928-2024 – Suscrito entre el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), y Mindeporte

Desde secretariadeinfraestructura secretariadeinfraestructura <secretariadeinfraestructura@elcarmen-bolivar.gov.co>

Fecha Lun 10/08/2026 17:06

Para Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>

6 archivos adjuntos (3 MB)

SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGA.pdf; REINICIO 1 CANCHA (1).pdf; RESPUESTA INTERVENTORIA.pdf; CamScanner 10-08-2026 15.42.pdf; SOLICITUD PRORROGA CONVENIO 928-2024 El Carmen de Bolívar (2)-scan.pdf; PROGRAMACION_SEMANAL_10AGOSTO_HOJA1hh.pdf;

Cordial saludo,

En mi calidad de alcalde del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), me permito presentar ante ustedes la solicitud de modificar la Cláusula Tercera (3) – Plazo del Convenio Interadministrativo No. 928-2024, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR”. La presente solicitud tiene por finalidad prorrogar el plazo del convenio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, de conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones:

ALCALDÍA DE
EL CARMEN DE BOLÍVAR

El Carmen de Bolívar, 06 de agosto de 2026

Señores
MINISTERIO DEL DEPORTE
Atn. José Albeiro Grisales Valencia.
Ministerio del Deporte.
Supervisor Convenio 928-2024.
Av. Calle 63 # 59ª 06
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de modificación del Convenio 928-2024 – Suscrito entre el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), y Mindeporte.

Cordial saludo,

En mi calidad de alcalde del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), me permito presentar ante ustedes la solicitud de modificar la Cláusula Tercera (3) – Plazo del Convenio Interadministrativo No. 928-2024, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR". La presente solicitud tiene por finalidad prorrogar el plazo del convenio hasta el treinta y uno (31) de enero de 2027, de conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones:

- Que el 15 de noviembre de 2024 se suscribió el Convenio Interadministrativo 928-2024, por valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CATORCE PESOS M/CTE ($5.476.300.014,00).
- Que el día 12 de diciembre de 2024 se suscribió acta de inicio del convenio interadministrativo 928-2024, con un plazo de ejecución de 20 días; es decir hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Que el 19 de diciembre de 2024 se suscribió la modificación No. 1 del convenio, donde se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025.
- Que el 28 de marzo de 2025, se suscribió la modificación No. 2 del convenio, donde se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Que el 21 de julio de 2025 se suscribió la modificación No. 3 del convenio, donde se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de agosto de 2026 y adicionalmente se modificó la forma de desembolso del convenio.
- Que el 20 de agosto de 2025, el municipio suscribió el contrato de obra No. LP-003-2025 con el CONSORCIO LYMH identificado con NIT No. 901.976.908-7, y representado legalmente por Reinadlo Brieva Ochoa, por valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.846.077.839,00).

- Que el 15 de septiembre de 2025, se suscribió acta de inicio del contrato de obra, con fecha inicial de terminación del 15 de marzo de 2026.
- Que el 17 de octubre de 2025, se suscribió la modificación No. 1 del contrato de obra, donde se adicionó el valor de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($361.143.133,00), quedando el valor del contrato por la suma de a CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.207.220.972,00), adición realizada para llevar a cabo la ejecución de las mayores cantidades de obra e ítems no previstos.
- Que el 13 de marzo de 2026, se suscribió la modificación No. 2 del contrato de obra, donde se prorrogó el plazo de ejecución, quedando como plazo final de siete (7) meses y ocho (8) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- Que, de acuerdo con el último reporte semanal de interventoría con corte al 05 de abril de 2026, el contrato presenta un avance de ejecución del 96,06%, contra un avance programado del 98,90%.
- Que el 09 de abril de 2026, se suscribió la suspensión No. 1 del contrato de obra, debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en la región, la necesidad de adelantar trámites técnicos ante terceros, particularmente ante el operador de red, para la obtención de la certificación del proyecto conforme a la normativa RETIE y RETILAP, así como el análisis para la ejecución de algunas actividades adicionales que requerían una adición presupuestal, la cual fue evaluada por este municipio y se decidió ejecutar en una segunda fase. Circunstancias técnicas y administrativas sobrevinientes no imputables a las partes, que han incidido directamente en la programación y normal ejecución del contrato, estableciéndose como fecha de reinicio el 06 de agosto de 2026 (ver anexo), quedando como nueva fecha de terminación el 19 de agosto de 2026, adicionalmente, nos encontramos evaluando una posible prórroga al contrato de obra por un (1) mes más; es decir hasta el 19 de septiembre de 2026 la cual se encuentra en trámite. Evidenciándose que la terminación del contrato de obra se dará con posterioridad al vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 928-2024 (15 de agosto de 2026). En consecuencia, resulta indispensable que el Convenio permanezca vigente durante el tiempo necesario para culminar la ejecución del contrato derivado, adelantar su liquidación bilateral dentro del plazo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y efectuar posteriormente la liquidación del convenio interadministrativo, garantizando así el adecuado cierre técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos modificar la Cláusula Tercera (3) – Plazo de Ejecución del Convenio Interadministrativo No. 928-2024, prorrogando su plazo hasta el treinta y uno (31) de

enero de 2027, con el fin de culminar las actuaciones contractuales y postcontractuales derivadas de la ejecución del proyecto, incluyendo la finalización y liquidación del contrato de obra, así como la posterior liquidación del convenio interadministrativo, garantizando el adecuado cierre técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto.

En mérito de lo expuesto, la presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la culminación integral del proyecto y el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. 928-2024, asegurando su adecuado cierre técnico, administrativo, financiero y jurídico, así como la correcta entrega y puesta en funcionamiento de la infraestructura deportiva en beneficio de la comunidad del municipio de El Carmen de Bolívar.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional para su respectivo trámite.

Cordialmente,

PEDRO JOSÉ VÁSQUEZ DÍAZ
Alcalde Municipal
El Carmen de Bolívar

Proyecto:
Alexander Deuloufeut Cantillo
Secretario de Infraestructura

Anexo:
Concepto interventoría respecto prorroga de obra.
Reprogramación de obra.
Acta de Suspensión de obra No. 1.
Acta de Reinicio de obra No. 1.
Informe semanal de interventoría No. 29.

REPROGRAMACION DE OBRAS Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREACION Y/O DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR

ITEM	ACTIVIDADES	VALOR PARCIAL INICIAL	VALOR PARCIAL FINAL OTRO SI 001	TIEMPO EN MESES					
				MES 7		MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
				SUSPESION 1 DEL 09/04/2026 AL 05/08/2026	SEMANA DEL 06 AL 19 DE AGOSTO	DEL 20/08/2026 AL 19/09/2026	DEL 20/09/2026 AL 19/10/2026	DEL 20/10/2026 AL 19/11/2026	DEL 20/11/2026 AL 19/12/2026	DEL 20/12/2026 AL 19/1/2027
1	PRELIMINARES	94.801.112	94.801.112				LIQUIDACION			
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	781.872.185	1.041.594.887							
3	GRADERIAS	197.064.742	197.064.742							
4	BAÑOS Y CAMERINOS	355.796.754	355.796.754							
5	CANCHA DE FUTBOL	2.208.854.524	2.208.854.524							
6	ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL	707.435.883	707.435.883		44.214.743					
7	SISTEMA ELECTRICO	321.554.354	321.554.354		7.542.400					
8	ITEMS NO PREVISTOS	-	101.420.431							
COSTO DIRECTO MAS A.I.U 30%	$ 4.667.379.554,00		$ 5.028.522.687,00		$ 51.757.142,69					
INTERVENTOIRA	$ 266.158.024,00		$ 266.158.024,00		$ 5.544.958,83					
PMA	$ 118.750.745,00		$ 118.750.745,00		$ 1.649.315,90					
PMT	$ 59.947.540,00		$ 59.947.540,00		$ 832.605,54					
INVERSION PARCIAL	$ 4.846.077.839,00		$ 5.473.378.996,00		$ 59.784.022,97					
INVERSION ACUMULADA	$ 4.846.077.839,00		$ 5.473.378.996,00		$ 5.473.378.996,00					

Reinaldo Brieva Ochoa
REP. LEGAL Consorcio LYMH
CONTRATISTA DE OBRA

Leonor María Zamora Montes
REP. LEGAL Rijenis Consultorías y Construcciones S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

ALEXANDER DE J. OFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR

ACTA DE REINICIO No.1 – CONTRATO DE OBRA LP-003-2025.

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO No.	LP-003-2025
OBJETO	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.
CONTRATISTA	CONSORCIO LYMH NIT: 901.976.908-9 R.L REINALDO BRIEVA OCHOA CC. N° 73.551.028
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 4.846.077.839,00
ADICIONAL SEGÚN OTRO SI No 001.	$ 361.143.133,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 5.207.220.972
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PRORROGA N° 1	TREINTA (30) DIAS HABILES.
PLAZO FINAL	SIETE (7) MESES y OCHO (8) DIAS.
FECHA DE SUPENSIÓN N° 1.	09 ABRIL DEL 2026.
FECHA DE REINICIO N° 1.	06 AGOSTO DEL 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE AGOSTO DE 2026.

En El Carmen de Bolívar, a los Seis (06) días del mes de agosto de 2026 se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, los señores: **ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO,** secretario de Infraestructura; **REINALDO BRIEVA OCHOA** identificado con C.C. No. 73.551.028, representante legal de **CONSORCIO LYMH** en calidad de Contratista; y **LEONOR MARIA ZAMORA MONTES**, representante legal de **RIJENIS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** en calidad de Interventor, con el fin de suscribir **EL REINICIO** de la obra en referencia, atendiendo a las consideraciones que dieron origen a la suspensión:

1. **JUSTIFICACIÓN DE SUPERACIÓN DE LA CAUSAL POR LLUVIAS**

   En atención al punto referente a las condiciones climáticas, siendo esta una de las razones por la cual se efectuó la suspensión temporal de la ejecución de la obra, se deja constancia de que, a la fecha de reinicio de las actividades, dicha causal ha sido superada, teniendo en cuenta que en la actualidad, la región se encuentra en temporada de verano, presentando condiciones meteorológicas favorables, caracterizadas por la ausencia de precipitaciones y un estado de tiempo estable, lo que permite poder continuar con el normal desarrollo de las actividades constructivas sin las limitaciones que anteriormente generaban las lluvias.

   En consecuencia, al mejorar las condiciones ambientales requeridas para la ejecución segura y eficiente de la obra, se da por superada una de las circunstancias que dio origen a la suspensión,

siendo procedente el reinicio de los trabajos conforme al cronograma establecido y a las disposiciones contractuales vigentes.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERACIÓN DE LA CAUSAL RELACIONADA CON LA CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP.

Otro de los puntos que originó la suspensión de la ejecución de la obra, está relacionada con la obtención de las certificaciones de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), la cual ha sido superada, teniendo en cuenta lo siguiente:

Durante el período de suspensión se desarrollaron de manera conjunta mesas de trabajo entre el contratista de obra, la interventoría y la empresa certificadora de Retie y Retilap, con el propósito de revisar los aspectos técnicos de las instalaciones eléctricas ejecutadas, atender las observaciones formuladas y definir las acciones requeridas para el cumplimiento de la normatividad vigente.

Asimismo, se realizaron visitas técnicas al proyecto por parte del personal competente de la empresa certificadora, en las cuales se verificó el estado de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos RETIE y RETILAP y la implementación de las adecuaciones técnicas necesarias para la conformidad del sistema.

Como resultado de las mesas de trabajo, las inspecciones efectuadas y el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos, la empresa certificadora se manifestó emitir la conformidad correspondiente y otorgar la certificación requerida para la energización del proyecto para finales del mes de agosto de 2026, desapareciendo así la causal que impedía la continuidad de la ejecución contractual.

En consecuencia, luego de las visitas realizadas por la empresa certificadora y poder evidenciar el cumplimiento del RETIE Y RETILAP, se considera superado el motivo de la suspensión, siendo procedente el reinicio de las actividades de obra, de conformidad con las obligaciones contractuales y el cronograma actualizado.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERACIÓN DE LA CAUSAL RELACIONADA CON LA ADICIÓN DE RECURSOS

En el marco de las mesas de evaluación técnica realizadas por las partes intervinientes en el proyecto, se efectuó un análisis integral del alcance contractual, el estado de ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue formulada la necesidad de inversión.

Como resultado de dicha evaluación, se determinó que el proyecto ejecutado cumple de manera satisfactoria con el alcance contractual y satisface plenamente la necesidad que dio origen a su formulación, garantizando la funcionalidad de la infraestructura y las condiciones requeridas para su adecuada operación y puesta en servicio.

Si bien durante las mesas técnicas se identificaron posibles intervenciones complementarias que podrían fortalecer las condiciones de uso, confort y aprovechamiento de la infraestructura por parte

de la comunidad beneficiaria, se concluyó que dichas actividades no constituyen un requisito para la funcionalidad del proyecto ni hacen parte del alcance inicialmente contratado. En consecuencia, estas intervenciones corresponderían a una eventual segunda fase de inversión, cuya planificación, financiación y ejecución podrá ser asumida por el municipio con recursos propios o mediante otras fuentes de financiación, sin comprometer recursos adicionales del Ministerio del Deporte.

En virtud de lo anterior, se establece que no existe la necesidad técnica, financiera ni contractual de realizar una adición de recursos al contrato vigente, toda vez que el proyecto cumple con los fines para los cuales fue concebido y permite su normal funcionamiento.

Por lo tanto, se considera superada la causal relacionada con la eventual adición de recursos, al haberse determinado técnicamente que la obra es funcional, cumple con el alcance contractual y satisface la necesidad inicialmente planteada, siendo procedente la continuidad y culminación de las actividades contractuales conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad aplicable.

En aceptación de lo anterior, se firma la presente acta a los Seis (06) días del mes de agosto de 2026, por quienes en ella han intervenido.

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL CARMEN DE BOLIVAR

REINALDO BRIEVA OCHOA
R.L: CONSORCIO LYMH
CONTRATISTA

LEONOR MARIA ZAMORA MONTES
R.L: RIJENIS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTORIA

Deporte	PROCESO:	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
	FORMATO:	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Código: ATC-FR-046
			Fecha:

1. INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 29 **DEL** lunes, 30 de marzo de 2026 **AL** domingo, 05 de abril de 2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA: 202,00 **MUNICIPIO:** EL CARMEN DE BOLIVAR

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 10,00 **DEPARTAMENTO: BOLIVAR** **BARRIO/VEREDA: NARIÑO**

NOMBRE DEL SUPERVISOR ENTE TERRITORIAL **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CARMEN DE BOLIVAR**

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA: **RIJENIS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTRVENTORIA O CONSULTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORIA

Interventor o Consultor:	RIJENIS CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	CMA-003-2025
Valor Inicial:	$ 266.158.024,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A
Valor adición(es) MinDeporte:	
Valor adición(es) Ente territorial	
Valor Actualizado:	$ 266.158.024,00
Plazo Inicial (dias):	210 DIAS SIETE(07) MESES
Fecha de Inicio:	SEPT 15 DE 2025
Prórroga No.	N/A
Suspensión No. y fecha:	N/A
Reinicio No. y fecha:	N/A
Fecha de Terminación Actualizada	15 DE ABRIL DE 2026
Plazo Actualizado:	212

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO LYMH
Contrato No.	LP-003-2025
Valor Inicial:	$ 4.846.077.839,00
Valor anticipo :(si aplica)	N/A
Valor adición(es) MinDeporte:	$ 361.143.133,00
Valor adición(es) Ente territorial	$ -
Valor Actualizado:	$ 5.207.220.972,00
Plazo Inicial (dias):	181 DIAS SEIS (06) MESES
Fecha de Inicio:	SEPTIEMBE 15 DE 2015
Prórroga No.	30 DIAS
Suspensión No. y fecha:	N/A
Reinicio No. y fecha:	N/A
Fecha de Terminación Actualizada	15 DE ABRIL DE 2026
Plazo Actualizado:	210

2. PROGRAMACIÓN

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO	% DE AVANCE OBRA EJECUTADO	ACUMULADO	% DE ATRASO	ACUMULADO
	98,90%		96,06%		-2,84%

% DE AVANCE OBRA

CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% PESO ACTIVIDAD	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% ATRASO
PRELIMINARES	**lunes, 15 de septiembre de 2025**	**lunes, 29 de septiembre de 2025**	**14**	**1,82%**	**1,82%**	**1,82%**	**0,00%**
CERRAMIENTO DE OBRA EN LAMINA ZINC Y VERTICALES EN LISTON DE 3"X2"	lunes, 15 de septiembre de 2025	lunes, 22 de septiembre de 2025	7	0,94%	0,94%	0,94%	**0,00%**
LOCALIZACION Y REPLANTEO	lunes, 15 de septiembre de 2025	lunes, 29 de septiembre de 2025	14	0,88%	0,88%	0,88%	**0,00%**
MOVIMIENTO DE TIERRA	**lunes, 15 de septiembre de 2025**	**lunes, 13 de octubre de 2025**	**28**	**20,00%**	**20,00%**	**20,00%**	**0,00%**
DESCAPOTE Y LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO	lunes, 15 de septiembre de 2025	lunes, 6 de octubre de 2025	21	1,34%	1,34%	1,34%	**0,00%**
MOVIMIENTO DE TIERRA A MAQUINA Y NIVELACION DE TERRENO CON MATERIAL SELECCIONADO	domingo, 21 de septiembre de 2025	lunes, 13 de octubre de 2025	22	18,67%	18,67%	18,67%	**0,00%**
GRADERIAS	**lunes, 3 de noviembre de 2025**	**viernes, 5 de diciembre de 2025**	**32**	**3,78%**	**3,78%**	**3,78%**	**0,00%**
EXCAVACION MANUAL	lunes, 3 de noviembre de 2025	miércoles, 5 de noviembre de 2025	2	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	miércoles, 5 de noviembre de 2025	miércoles, 5 de noviembre de 2025	0	0,02%	0,02%	0,02%	**0,00%**
LOSA EN CONCRETO 4000 PSI E=0.10 M	miércoles, 29 de octubre de 2025	sábado, 8 de noviembre de 2025	10	0,51%	0,51%	0,51%	**0,00%**
VIGA CIMIENTO EN CONCRETO 4000 PSI DE 0.30X0.30 M (INCLUYE FORMALETA)	martes, 4 de noviembre de 2025	lunes, 10 de noviembre de 2025	6	0,34%	0,34%	0,34%	**0,00%**
MURO EN BLOCK #6 VIBRADO CON DOVELAS EN VARILLAS DE 1/2" CADA 60 CMS	sábado, 8 de noviembre de 2025	viernes, 28 de noviembre de 2025	20	0,32%	0,32%	0,32%	**0,00%**
PAÑETE ALLANADO EN MURO 1:4	lunes, 24 de noviembre de 2025	lunes, 24 de noviembre de 2025	0	0,18%	0,18%	0,18%	**0,00%**
VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 O SIMILAR NUEVA	martes, 25 de noviembre de 2025	viernes, 5 de diciembre de 2025	10	0,10%	0,10%	0,10%	**0,00%**
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETERIA EN PVC CON ESPALDAR	miércoles, 26 de noviembre de 2025	viernes, 5 de diciembre de 2025	9	0,69%	0,69%	0,69%	**0,00%**
BARANDA DE SEGURIDAD EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 5 de diciembre de 2025	8	0,54%	0,54%	0,54%	**0,00%**
ACERO DE REFUERZO PDR DE 60000 PSI	miércoles, 5 de noviembre de 2025	jueves, 20 de noviembre de 2025	15	1,07%	1,07%	1,07%	**0,00%**
BAÑOS Y CAMERINOS	**lunes, 3 de noviembre de 2025**	**lunes, 1 de diciembre de 2025**	**28**	**6,83%**	**6,83%**	**6,46%**	**-0,37%**
EXCAVACION MANUAL	martes, 21 de octubre de 2025	sábado, 25 de octubre de 2025	4	0,03%	0,03%	0,03%	**0,00%**
VIGA DE PISO Y ZAPATAS EN CONCRETO	lunes, 27 de octubre de 2025	jueves, 6 de noviembre de 2025	10	0,47%	0,47%	0,47%	**0,00%**
COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI	lunes, 3 de noviembre de 2025	domingo, 16 de noviembre de 2025	13	0,20%	0,20%	0,20%	**0,00%**
VIGA AEREA EN CONCRETO 4000 PSI	martes, 11 de noviembre de 2025	miércoles, 19 de noviembre de 2025	8	0,25%	0,25%	0,25%	**0,00%**
PLACA MACIZA E=0.12 CONCRETO 4000 PSI	miércoles, 19 de noviembre de 2025	miércoles, 26 de noviembre de 2025	7	0,49%	0,49%	0,49%	**0,00%**
ACERO DE REFUERZO PDR 60000 PSI	lunes, 27 de octubre de 2025	miércoles, 19 de noviembre de 2025	23	1,65%	1,65%	1,65%	**0,00%**
PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	miércoles, 26 de noviembre de 2025	jueves, 11 de diciembre de 2025	15	0,34%	0,34%	0,34%	**0,00%**
PARED EGEO EN CERAMICA 20.5X20.5 EN PRIMERA CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR	jueves, 11 de diciembre de 2025	lunes, 5 de enero de 2026	25	0,62%	0,62%	0,62%	**0,00%**
ESTUCO	jueves, 11 de diciembre de 2025	domingo, 21 de diciembre de 2025	10	0,17%	0,17%	0,17%	**0,00%**

VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR NUEVA	martes, 16 de diciembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	10	0,17%	0,17%	0,17%	**0,00%**
PROTECCION FACHADAS CON SIKA TRTANSPARENTE 5 LIQUIDO INCOLORO CON BASE EN SILICONAS QUE PROTEGE CONTRA LA PENETRACION DEL AGUA LLUVIAS EN FACHADAS	jueves, 11 de diciembre de 2025	sábado, 13 de diciembre de 2025	2	0,15%	0,15%	0,15%	**0,00%**
PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M, INCLUYE MALLLA ELECTROSOLDADA	lunes, 6 de abril de 2026	martes, 21 de abril de 2026	15	0,30%	0,30%	0,30%	**0,00%**
PISO EN CERASMICA DUROPISO 0.30X0.30 DE PRIMERA CALIDAD ALTO TRAFICO TIPO CORONA O SIMILAR	viernes, 12 de diciembre de 2025	martes, 10 de febrero de 2026	60	0,18%	0,18%	0,18%	**0,00%**
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	viernes, 12 de diciembre de 2025	martes, 10 de febrero de 2026	60	0,03%	0,03%	0,03%	**0,00%**
PUNTO SANITARIO PVC 3" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,02%	0,02%	0,02%	**0,00%**
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,02%	0,02%	0,02%	**0,00%**
RED SANITARIA PVC 2" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
RED SANITARIA PVC 3" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
RED SANITARIA PVC 4" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,07%	0,07%	0,07%	**0,00%**
RED SANITARIA PVC 6" -INCLUYE EXCAVACION Y TAPE	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION 1/2"	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,03%	0,03%	0,03%	**0,00%**
RED SUMINISTRO PVC 1/2"	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
RED SUMINISTRO PVC 3/4"	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
RED SUMINISTRO PVC 1"	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
RED SUMINISTRO PVC 1 1/4"	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,02%	0,02%	0,02%	**0,00%**
RED SUMINISTRO PVC 2 1/2"	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,05%	0,05%	0,05%	**0,00%**
CAJAS DE INSPECCION 0.60X0.60 M	viernes, 12 de diciembre de 2025	lunes, 26 de enero de 2026	45	0,11%	0,11%	0,11%	**0,00%**
CAJAS DE INSPECCION 0.80X0.80 M	viernes, 12 de diciembre de 2025	lunes, 26 de enero de 2026	45	0,01%	0,01%	0,01%	**0,00%**
SANITARIO ACUACER BLANCO O SIMILAR	viernes, 12 de diciembre de 2025	lunes, 2 de marzo de 2026	80	0,07%	0,07%	0,07%	**0,00%**
LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA	viernes, 12 de diciembre de 2025	lunes, 2 de marzo de 2026	80	0,04%	0,04%	0,04%	**0,00%**
GRIFERIA LLAVE AUTOMATICA qk23051 PARA LAVAMANOS O SILILAR	viernes, 12 de diciembre de 2025	lunes, 2 de marzo de 2026	80	0,05%	0,05%	0,05%	**0,00%**
MESON FUNDIDO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=6 CM, RECUBIERTO CON PLACA DE GRANITO NATURAL VERDE UVATUVA	viernes, 12 de diciembre de 2025	viernes, 20 de febrero de 2026	70	0,06%	0,06%	0,06%	**0,00%**
VENTANAS EN ALUMINIO BLANCO, INSTALADA	viernes, 12 de diciembre de 2025	viernes, 20 de febrero de 2026	70	0,07%	0,07%	0,03%	**-0,04%**
PUERTAS LAMINA CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,08%	0,08%	0,04%	**-0,04%**
REJAS TUBO CUADRADO DE 1", INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,04%	0,04%	0,04%	**0,00%**
IMPERMEABILIZACION DE PLACA EN MANTO O SIMILAR	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 27 de diciembre de 2025	15	0,09%	0,09%	0,09%	**0,00%**

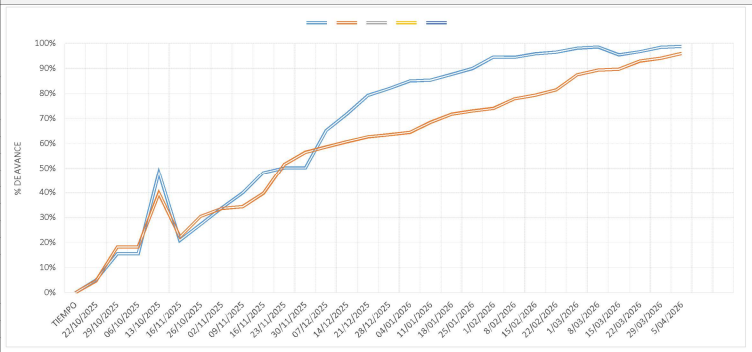
DISPENSADOR DE JABON TIPO INSTITUCIONAL PLASTICO	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,02%	0,02%	0,02%	**0,00%**
DISPENSADOR PAPEL HIGUIENICO PLASTICO TIPO INSTITUCIONAL	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,02%	0,02%	0,02%	**0,00%**
SECADORA DE MANOS ELECTRICA 110 V	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,06%	0,06%	0,06%	**0,00%**
SISTEMA DE BOMBEO DE Q=3.02 L/S CDT 35 M Y POTENCIA 2.0 HP	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,13%	0,13%	0,00%	**-0,13%**
SISTEMA HIDRONEUMATICO DE VOLUMEN MIN 170 L/MIN 30 PSI MIN Y 50 PSI MAX	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,12%	0,12%	0,00%	**-0,12%**
SUMINISTRO E INSTALACCION DE ORINAL INSTITUCIONAL, INCLUYE FLUXOMETRO	viernes, 12 de diciembre de 2025	sábado, 7 de marzo de 2026	85	0,06%	0,06%	0,03%	**-0,03%**
MURO EN BLOCK #6 VIBRADO	martes, 21 de octubre de 2025	miércoles, 26 de noviembre de 2025	36	0,49%	0,49%	0,49%	**0,00%**
CANCHA DE FUTBOL	**lunes, 15 de diciembre de 2025**	**lunes, 2 de febrero de 2026**	**49**	**42,42%**	**42,42%**	**40,20%**	**-2,22%**
SUMINISTRO, TRNASPORTE Y COLOCACION GEOTEXTIL NT	lunes, 3 de noviembre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	91	2,02%	2,02%	2,02%	**0,00%**
SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE TRITURADO CALIZA TAMAÑO (1/4 - 1 1/4") E=20 CMS	viernes, 24 de octubre de 2025	lunes, 24 de noviembre de 2025	31	4,36%	4,36%	4,36%	**0,00%**
SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE TRITURADO CALIZA TAMAÑO (1/4 - 3/4") E=10 CMS	viernes, 24 de octubre de 2025	viernes, 12 de diciembre de 2025	49	2,18%	2,18%	2,18%	**0,00%**
SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE ARROCILLO (ARENA CALIZA) E=0.06	viernes, 24 de octubre de 2025	miércoles, 17 de diciembre de 2025	54	1,37%	1,37%	1,37%	**0,00%**
VIGA CIMENTACION DE 0.30X0.30 CONCRETO 3000 PSI	lunes, 3 de noviembre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	91	1,10%	1,10%	1,10%	**0,00%**
VIGA SUPERIOR DE 0.25X0.25 CONCRETO 3000 PSI	viernes, 24 de octubre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	101	0,87%	0,87%	0,87%	**0,00%**
CONSTRUCCION DE FILTRO DE 60X60 CM CON TUBERIA PERFORADA DE 6" RECUBIERTA CON GEOTEXTIL Y PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE 1/2"	lunes, 3 de noviembre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	91	3,38%	3,38%	3,38%	**0,00%**
PLANILLA EN CONCRETO POBRE E=0.05 PARA APOYO DE TUBERIA DE DRENAJE	viernes, 24 de octubre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	101	0,53%	0,53%	0,53%	**0,00%**
CAJAS DE INSPECCION 1.00X1.00 PARA TUBERIA DE DRENAJE	lunes, 3 de noviembre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	91	0,07%	0,07%	0,07%	**0,00%**
PORTERIAS EN TUBERIA DE PRESION 4" MOVIBLES SEGÚN REGLAMENTACION FIFA	viernes, 24 de octubre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	101	0,46%	0,46%	0,46%	**0,00%**
SUMINISTRO E INSTALACCION DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBIERTO EN PINTURA DE POLIESTER BLANCO DE 4.75 MM DE DIAMETRO CON PUNTOS DE	lunes, 3 de noviembre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	91	6,02%	6,02%	6,00%	**-0,02%**
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO A CAMPO	viernes, 24 de octubre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	101	0,10%	0,10%	0,05%	**-0,05%**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA REF. MONO FILAMENTO DE 50 MM, DETEX MINIMO DE 12000 DE 320 MICRONEZ MINIMO GALGA DE 5/8 PESO	lunes, 3 de noviembre de 2025	lunes, 2 de febrero de 2026	91	19,95%	19,95%	17,80%	**-2,15%**
ZONAS DURAS, ZONAS VERDES Y PARQUE INFANTIL	**lunes, 15 de diciembre de 2025**	**domingo, 15 de marzo de 2026**	**90**	**13,59%**	**13,59%**	**12,99%**	**-0,60%**
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Y ACABADOS EN	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	0,91%	0,91%	0,91%	**0,00%**
SUMINISTRO Y SIEMBRA ARBOLES NATIVOS	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	0,04%	0,04%	0,00%	**-0,04%**
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DIDACTICOS EN MADERA (	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	1,04%	1,04%	1,04%	**0,00%**
PARQUE DE EJERCICIOS	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	1,62%	1,62%	1,62%	**0,00%**
BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	0,85%	0,85%	0,83%	**-0,02%**
PLANTILLA EN CONCRETO E=0.06 MTS	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	2,91%	2,91%	2,86%	**-0,05%**
PISO PASEOS PEATONALES EN LOSETA DE CEMENTO DE COLORES	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	5,86%	5,86%	5,50%	**-0,36%**
SUMINISTRO DE MATERIAL ARENA O CHINA LAVADA PARA ZONA DE PARQUES	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	0,07%	0,07%	0,00%	**-0,07%**
PISO PASEOS PEATONALES EN LOSETA PODOTACTIL GUIA 0.20X0.20	jueves, 27 de noviembre de 2025	viernes, 26 de diciembre de 2025	**29**	0,28%	0,28%	0,23%	**-0,06%**
SISTEMA ELECTRICO	**sábado, 15 de noviembre de 2025**	**miércoles, 11 de febrero de 2026**	**88**	**6,03%**	**6,03%**	**5,90%**	**-0,13%**
SALIDAS ELECTRICAS	lunes, 12 de enero de 2026	domingo, 1 de febrero de 2026	20	1,47%	1,47%	1,47%	**0,00%**
Iluminación (Ver esp. Tecnica, los reflectores deberán cumplir conforme a las fotometrias de diseño e incluyen todos los elementos tales como Driver, fuente y soporte)	martes, 27 de enero de 2026	sábado, 21 de febrero de 2026	25	1,57%	1,57%	1,57%	**0,00%**
Tableros	martes, 27 de enero de 2026	jueves, 26 de febrero de 2026	30	0,17%	0,17%	0,17%	**0,00%**
Canalizaciones y parciales a tableros (Incluyen tuberias, accesorios y cableado)	martes, 18 de noviembre de 2025	sábado, 22 de noviembre de 2025	4	1,52%	1,40%	1,40%	**0,00%**
MALLA PUESTA A TIERRA	martes, 18 de noviembre de 2025	viernes, 28 de noviembre de 2025	10	0,88%	0,88%	0,88%	**0,00%**
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO (APLICA PARA LOS 4 NIVELES DE RIESGO	martes, 18 de noviembre de 2025	viernes, 28 de noviembre de 2025	10	0,42%	0,42%	0,42%	**0,00%**

TRÁMITES ANTE OPERADOR DE RED Y CERTIFICACIONES DE PROYECTO	martes, 18 de noviembre de 2025	viernes, 28 de noviembre de 2025	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS	**lunes, 27 de octubre de 2025**	**domingo, 15 de marzo de 2026**	**139**	**1,95%**	**1,95%**	**1,65%**	**-0,30%**
PMA	**lunes, 15 de septiembre de 2025**	**domingo, 15 de marzo de 2026**	**181**	**2,28%**	**2,18%**	**2,18%**	**0,00%**
PMT	**lunes, 15 de septiembre de 2025**	**domingo, 15 de marzo de 2026**	**181**	**1,15%**	**1,08%**	**1,08%**	**0,00%**
TOTAL				**100,00%**	**98,90%**	**96,06%**	**-2,84%**

3. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA:

PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD (DIAS)
ARMANDO LOPEZ TAMARA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	202,00
CAMILO CARMONA MARTINEZ	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	202,00
ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	

4. CURVA DE AVANCE



DUI

5. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se continúa con la ejecución de las actividades finales del proyecto, toda vez que ya fueron recibidos algunos de los suministros esenciales requeridos para la culminación de la obra, tales como las sillas para la cancha, elementos de parque y parte de la ventanería, los cuales habían presentado demoras en su entrega por parte de los proveedores.

En atención a lo anterior, actualmente se han iniciado los procesos de instalación de dichos elementos en los frentes correspondientes, permitiendo avanzar progresivamente en la ejecución de las actividades pendientes contempladas dentro del proyecto. No obstante, aún se requiere continuar con las labores complementarias y de ajuste necesarias para garantizar la correcta terminación de la obra conforme a las especificaciones técnicas y al cumplimiento integral del objeto contractual.

De igual manera, se continúa evaluando la situación contractual y técnica del proyecto, con el propósito de determinar la necesidad de una prórroga del plazo contractual, que permita culminar adecuadamente las actividades restantes, efectuar las instalaciones pendientes y asegurar la entrega final de la obra en óptimas condiciones de funcionalidad y calidad.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

continuar con la toma final de detalles. Y actividades de detalles

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Interventoría manifiesta que a fecha de corte del presente informe contratista realiza presencia realizando las actividades contractuales estipuladas en el contrato de obras,cumpliendo con las especificaciones y el cronograma estipulado por el contratista. el avance de la obra va de acuerdo con el cronograma presentado por el consorcio contratista.

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA

La Interventoría deja constancia de que se continúa con la ejecución de las actividades finales del proyecto, teniendo en cuenta que durante la presente semana fueron recibidos algunos de los suministros esenciales requeridos para la culminación de la obra, tales como las sillas para la cancha, elementos de parque infantil y parte de la ventanería, los cuales habían presentado demoras en su entrega por parte de los proveedores.

En atención a lo anterior, se verificó el inicio de los procesos de instalación de dichos elementos en los frentes de trabajo correspondientes, permitiendo avanzar de manera progresiva en la ejecución de las actividades pendientes contempladas dentro del alcance contractual. No obstante, aún se requiere continuar con labores complementarias, ajustes e instalaciones adicionales necesarias para garantizar la correcta terminación de la obra conforme a las especificaciones técnicas establecidas y al cumplimiento integral del objeto contractual.

Así mismo, la Interventoría informa que continúa realizando el seguimiento técnico y contractual correspondiente, evaluando la necesidad de una eventual prórroga del plazo contractual, con el fin de permitir la culminación adecuada de las actividades restantes, la instalación total de los suministros pendientes y la entrega final de la obra en óptimas condiciones de calidad, funcionalidad y operatividad.

Diligenciar el presente formato, según intructivo del presente informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en (Lugar), a los

LUNES	(6)	días del mes de	Abril	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes)		(Año)

INTERVENTORÍA O CONSULTORIA:

Firma:

Nombre y Cédula:ARMANDO LOPEZ TAMARA 92506944

Cargo:Director de interventoría

Original: Municipio


1era copia : Interventor

2da copia : Supervisor Ente Territorial

Deporte	**PROCESO:**			**Versión: 1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA			**Código: ATC-FR-046**
	FORMATO: **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**			**Fecha:** **5-Apr-26**
EL CARMEN DE BOLIVAR	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR**		**REVISIÓN:**	
FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DIA:lunes 05**	**DE: Abril de 2026**	**CONTRATO No.** LP-003-2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LYMH	

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 15 DE 2025	**FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: MARZO 15 DE 2026**	**formular**


REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
INTALACION DE SILLAS PARA GRADAS	GRAMA DE CANCHAS	ZONA DE PARQUE

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Deporte	**PROCESO:**			**Versión: 1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA			**Código: ATC-FR-046**
	FORMATO: **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA**			**Fecha:** **5-Apr-26**
EL CARMEN DE BOLIVAR	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREACIONAL Y/O DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR**		**REVISIÓN:**	
FECHA DE CORTE DEL INFORME	**DIA:lunes 05**	**DE: Abril de 2026**	**CONTRATO No.** LP-003-2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LYMH	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
INSTALACION DE GRAMA	INSTALACION DE SILLAS PARA GRADAS	INSTALACION DE SILLAS PARA GRADAS
		
CERRAMIENTO	INSTALACION DE GRAMA	INSTALACION DE GRAMA

FIRMA: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
