PERSONAL

Domingo, noviembre 16, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:







ACTIVIDADES

Domingo, noviembre 16, 2025

Descripción:

1. Desmonte de cubierta antigua en alar #1. Montaje de perfiles metálicos nuevos prepintados. Montaje de tejas upvc nuevas. Se avanza con el segundo alar de cubierta. #2. Montaje de perfiles metálicos nuevos prepintados.
2. Se ejecuta la instalación del cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, con su respectiva estructura de soporte metálica. La actividad se realiza en las zonas programadas con el fin de garantizar la continuidad del proyecto, ya que el desmonte de la cubierta tuvo que ser suspendido temporalmente por condiciones climáticas adversas (lluvias y humedad que impiden un trabajo seguro en altura).

Registro fotográfico:

















MATERIALES

Domingo, noviembre 16, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico.

Registro Fotográfico:














50%


Pintuco
Pintulux
3EN1



PERSONAL

Lunes, noviembre 17, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:















ACTIVIDADES

Lunes, noviembre 17, 2025

Descripción:

1. Desmonte de cubierta antigua en alar #1. Montaje de perfiles metálicos nuevos prepintados. Montaje de tejas upvc nuevas. Se avanza con el segundo alar de cubierta. #2. Montaje de perfiles metálicos nuevos prepintados.#3 Montaje de tejas upvc nuevas.

Registro fotográfico:

















MATERIALES

Lunes, noviembre 17, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Pintuco
Pintulux
3EN1





PERSONAL

Martes, noviembre 18, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:














EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA



ACTIVIDADES

Martes, noviembre 18, 2025

Descripción:

Se realiza la instalación del manto asfáltico impermeabilizante Zetal Fiberglass de 3 mm con foil de aluminio, iniciando con la limpieza y preparación de la superficie para asegurar su adecuada adherencia. Posteriormente se aplica imprimante asfáltico y se posicionan las piezas de manto, garantizando la correcta unión entre paños y el adecuado solape en las juntas. Finalmente, se verifica la adherencia general y el sellado perimetral, asegurando una impermeabilización continua y efectiva conforme a las especificaciones del proyecto.

Registro fotográfico:





















MATERIALES

Martes, noviembre 18, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1



PERSONAL

Miércoles, noviembre 19, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:











ACTIVIDADES

Miércoles, noviembre 19, 2025

Descripción:

1. Se realiza el montaje de los perfiles metálicos nuevos prepintados en el alar #1, seguido de la instalación de las tejas UPVC nuevas con su respectivo kit de tornillería, garantizando la fijación adecuada según las especificaciones del sistema.
2. Se realiza el mantenimiento de las bajantes de aguas lluvias de 4”**,** iniciando con la inspección del estado general de las tuberías para identificar obstrucciones, deterioros o filtraciones. Se procede con la limpieza interna, retirando sedimentos, hojas, residuos y cualquier material que afecte el flujo adecuado del agua. Posteriormente, se realiza una prueba de flujo con agua para verificar el correcto funcionamiento de cada bajante, garantizando su operatividad y evitando posibles represamientos o rebosamientos en la cubierta.
   Recomendación: Se recomienda realizar mantenimientos preventivos periódicos a las bajantes de aguas lluvias de 4”, especialmente en temporadas de alta precipitación, con el fin de evitar obstrucciones, filtraciones y saturación de la cubierta.
3. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 12,35 m^2)

Registro fotográfico:














MATERIALES

Miércoles, noviembre 19, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1



PERSONAL

Jueves, noviembre 20, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:

















ACTIVIDADES

Jueves, noviembre 20, 2025

Descripción:

1. Se realiza la instalación del caballete tipo flanche se posiciona sobre la línea de encuentro de las pendientes y se fija mediante amarre para teja con tapa metálica adecuada para cubierta.
2. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 12,35 m^2)

Registro fotográfico:












MATERIALES

Jueves, noviembre 20, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, perfiles metálicos y laminas para a instalación de cielo raso.

Registro Fotográfico:














50%


Alumanto Autoadhesivo




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1






TECHO EN PVC
BLANCO MATTE
250 *1.5* 3950 MM
10PC
MADE IN CHINA (GP0410)
I.A.S.A.S.





PERSONAL

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:



















ACTIVIDADES

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

1. Se realiza la instalación del caballete tipo flanche se posiciona sobre la línea de encuentro de las pendientes y se fija mediante amarre para teja con tapa metálica adecuada para cubierta.
2. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 16,13 m^2)

Registro fotográfico:



















MATERIALES

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, perfiles metálicos y laminas para a instalación de cielo raso.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1






TECHO EN PVC
BLANCO MATTE
I.A.S.A.S.
MADE IN CHINA (COP0416)







PERSONAL

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:



















ACTIVIDADES

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

1. Se realiza la instalación del caballete tipo flanche se posiciona sobre la línea de encuentro de las pendientes y se fija mediante amarre para teja con tapa metálica adecuada para cubierta.
2. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 16,13 m^2)

Registro fotográfico:



















MATERIALES

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, perfiles metálicos y laminas para a instalación de cielo raso.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1






TECHO EN PVC
BLANCO MATTE
I.A.S.A.S.
MADE IN CHINA (COP0416)







PERSONAL

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:



















ACTIVIDADES

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

1. Se realiza la instalación del caballete tipo flanche se posiciona sobre la línea de encuentro de las pendientes y se fija mediante amarre para teja con tapa metálica adecuada para cubierta.
2. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 16,13 m^2)

Registro fotográfico:



















MATERIALES

Viernes, noviembre 21, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, perfiles metálicos y laminas para a instalación de cielo raso.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1






TECHO EN PVC
BLANCO MATTE
I.A.S.A.S.
MADE IN CHINA (COP0416)







PERSONAL

Lunes, noviembre 24, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:



































ACTIVIDADES

Lunes, noviembre 24, 2025

Descripción:

Se realiza la instalación del cielo raso, iniciando con la verificación de la estructura metálica previamente instalada para garantizar su nivelación y correcta sujeción. Posteriormente, se procede a colocar las láminas de PVC dentro del sistema modular, asegurándolas sobre los perfiles principales y secundarios, cuidando la alineación y el encastre adecuado de cada módulo. Durante la instalación se verifica la uniformidad de los acabados, el correcto apoyo de las piezas y la continuidad del sistema, dejando el cielo raso completamente instalado conforme a las especificaciones del proyecto. (Área trabajada: 16,13 m^2)

Registro fotográfico:





















MATERIALES

Lunes, noviembre 24, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1



PERSONAL

Martes, noviembre 25, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:
























ACTIVIDADES

Martes, noviembre 25, 2025

Descripción:

Se realiza la instalación del cielo raso, iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados. iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados

Registro fotográfico:
























MATERIALES

Martes, noviembre 25, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo hexsa


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1



PERSONAL

Miércoles, noviembre 26, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:































ACTIVIDADES

Miércoles, noviembre 26, 2025

Descripción:

Se realiza la instalación del cielo raso, iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados. iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados. (Área trabajada: 9,99 m^2)

Registro fotográfico:































MATERIALES

Miércoles, noviembre 26, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete.

Registro Fotográfico:














ACRONAL
50%




2 705441 191911
CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTEX


Pintuco
Pintulux
3EN1





PERSONAL

Jueves, noviembre 27, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:








Panel LED 48W
60x60
IP
20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W




30













ACTIVIDADES

Jueves, noviembre 27, 2025

Descripción:
Se realiza la instalación del cielo raso, iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados. iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados. (Área trabajada: 4,82 m^2)

Registro fotográfico:








Panel LED 48W
60x60
IP
20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W




30













MATERIALES

Jueves, noviembre 27, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60


Titanium
LIGHTING
2 AÑOS
*2 Unidades
Panel LED
60X60
Backlight
48W

PERSONAL

Viernes, noviembre 28, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:





























ACTIVIDADES

Jueves, noviembre 28, 2025

Descripción:

1. Se realiza la instalación del cielo raso, iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados. iniciando con el armado y fijación de la estructura metálica portante, la cual se monta mediante perfiles principales, secundarios y rieles perimetrales anclados a la losa con elementos de sujeción adecuados. (Área trabajada: 5,26 m^2)
2. Se colocan tres hiladas de bloque en la ventana del patio, asentándolas con mortero cemento–arena y garantizando su correcta nivelación, plomo y alineación.

Registro fotográfico:





























MATERIALES

Jueves, noviembre 28, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60


Titanium
LIGHTING
*2 Unidades
Panel LED
60X60
Backlight
48W

PERSONAL

Sábado, noviembre 29, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:































ACTIVIDADES

Sábado, noviembre 29, 2025

Descripción:

1. Se realiza el suministro e instalación de luminarias LED 60x60, iniciando con la verificación de los puntos eléctricos y la compatibilidad del sistema de cielo raso para su montaje.
2. Se realiza la aplicación de pañete impermeabilizado en muros con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena)**,** iniciando con la limpieza y humedecimiento de la superficie. Se prepara el mortero con aditivo impermeabilizante según especificaciones y se aplica de manera uniforme sobre el muro, controlando el espesor y asegurando un acabado compacto y continuo. Durante la ejecución se verifica la correcta nivelación del paño y el adecuado sellado de posibles fisuras o poros, dejando la superficie lista para su posterior curado y acabado final conforme a los requerimientos del proyecto.

Registro fotográfico:































MATERIALES

Sábado, noviembre 29, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60


Titanium
LIGHTING
*2 Unidades
Panel LED
60X60
Backlight
48W

PERSONAL

Sábado, noviembre 29, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:































ACTIVIDADES

Sábado, noviembre 29, 2025

Descripción:

1. Se realiza el suministro e instalación de luminarias LED 60x60, iniciando con la verificación de los puntos eléctricos y la compatibilidad del sistema de cielo raso para su montaje.
2. Se realiza la aplicación de pañete impermeabilizado en muros con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena)**,** iniciando con la limpieza y humedecimiento de la superficie. Se prepara el mortero con aditivo impermeabilizante según especificaciones y se aplica de manera uniforme sobre el muro, controlando el espesor y asegurando un acabado compacto y continuo. Durante la ejecución se verifica la correcta nivelación del paño y el adecuado sellado de posibles fisuras o poros, dejando la superficie lista para su posterior curado y acabado final conforme a los requerimientos del proyecto.

Registro fotográfico:































MATERIALES

Sábado, noviembre 29, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led.

Registro Fotográfico:














50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60


Titanium
LIGHTING
*2 Unidades
Panel LED
60X60
Backlight
48W

PERSONAL

Lunes, diciembre 01, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:



















































ACTIVIDADES

Lunes, diciembre 01, 2025

Descripción:

1. Se realiza el suministro e instalación de luminarias LED 60x60, iniciando con la verificación de los puntos eléctricos y la compatibilidad del sistema de cielo raso para su montaje.
2. Se realiza la aplicación de pañete impermeabilizado en muros con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena)**,** iniciando con la limpieza y humedecimiento de la superficie. Se prepara el mortero con aditivo impermeabilizante según especificaciones y se aplica de manera uniforme sobre el muro, controlando el espesor y asegurando un acabado compacto y continuo. Durante la ejecución se verifica la correcta nivelación del paño y el adecuado sellado de posibles fisuras o poros, dejando la superficie lista para su posterior curado y acabado final conforme a los requerimientos del proyecto.
3. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
4. Se instala la salida para luminaria en techo en PVC, habilitando el punto eléctrico y fijando en soporte sobre la estructura antes del montaje del cielo raso, dejando los conductores protegidos y listos para la conexión sin afectar la instalación posterior del PVC.
5. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 13,20 m^2)

Registro fotográfico:








1000
aviva





























MATERIALES

Lunes, diciembre 01, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W

PERSONAL

Martes, diciembre 02, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:





















































ACTIVIDADES

Martes, diciembre 02, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 13,20 m^2)
3. Se realiza la aplicación de pintura vinílica en muros interiores, aplicando tres manos de vinilo tipo 1, garantizando cubrimiento uniforme, buena adherencia y un acabado limpio y homogéneo en toda la superficie.

Registro fotográfico:









































MATERIALES

Martes, diciembre 02, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W

PERSONAL

Miércoles, diciembre 03, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:


















ACRONAL-295 D

































































ACTIVIDADES

Miércoles, diciembre 03, 2025

Descripción:

1. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 25,31 m^2)
2. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
3. Se realiza la aplicación de pintura vinílica en muros interiores, aplicando tres manos de vinilo tipo 1, garantizando cubrimiento uniforme, buena adherencia y un acabado limpio y homogéneo en toda la superficie.
4. Se realiza la aplicación de pañete impermeabilizado en muros con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena)**,** iniciando con la limpieza y humedecimiento de la superficie. Se prepara el mortero con aditivo impermeabilizante según especificaciones y se aplica de manera uniforme sobre el muro, controlando el espesor y asegurando un acabado compacto y continuo. Durante la ejecución se verifica la correcta nivelación del paño, dejando la superficie lista.
5. Se realiza el mantenimiento de los aires acondicionados existentes, incluyendo el desmontaje, limpieza, revisión y reposición de los elementos necesarios, para garantizar su correcto funcionamiento y operación continua.

Registro fotográfico:

























































MATERIALES

Miércoles, diciembre 03, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W

PERSONAL

Jueves, diciembre 04, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:





















































ACTIVIDADES

Jueves, diciembre 04, 2025

Descripción:

1. Se realiza el mantenimiento de los aires acondicionados existentes, incluyendo el desmontaje, limpieza, revisión y reposición de los elementos necesarios, para garantizar su correcto funcionamiento y operación continua.
2. Se realiza la instalación de la estructura metálica que servirá de soporte para el cielo raso modular en láminas de PVC blanco mate, iniciando con el replanteo y nivelación del área para garantizar la correcta altura y alineación del sistema. Se procede con la fijación de los rieles perimetrales y posteriormente el montaje de las suspensiones y perfiles principales y secundarios, asegurando su anclaje adecuado. (Área trabajada: 25,31 m^2)
3. Se realiza la aplicación de pintura vinílica en muros interiores, aplicando tres manos de vinilo tipo 1, garantizando cubrimiento uniforme, buena adherencia y un acabado limpio y homogéneo en toda la superficie.

Registro fotográfico:















































MATERIALES

Jueves, diciembre 04, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W

PERSONAL

Viernes, diciembre 05, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:












































< 30
ICO
PINTA
MÁS


PRECIO ESPECIAL
KOLOR
PINTURA SÚPER LAVABLE


Pintuco
ESMALTE
DOMÉSTICO
METALES Y MADERAS







ACTIVIDADES

Viernes, diciembre 05, 2025

Descripción:

1. Se realiza la aplicación de pañete impermeabilizado en muros con mortero en proporción 1:4 (cemento–arena)**,** iniciando con la limpieza y humedecimiento de la superficie. Se prepara el mortero con aditivo impermeabilizante según especificaciones y se aplica de manera uniforme sobre el muro, controlando el espesor y asegurando un acabado compacto y continuo. Durante la ejecución se verifica la correcta nivelación del paño y el adecuado sellado de posibles fisuras o poros, dejando la superficie lista para su posterior curado y acabado final conforme a los requerimientos del proyecto.
2. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
3. Se realiza la aplicación de pintura esmalte doméstico a color en puertas, ventanas, rejas y estructura metálica, aplicando tres manos para garantizar un acabado uniforme, resistente y de buena adherencia, cumpliendo las especificaciones del proyecto.

Registro fotográfico:









































MATERIALES

Viernes, diciembre 05, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
Backlight
48W


ICO
PINTA
MÁS


PRECIO ESPECIAL
KOLOR


Pintuco
ESMALTE
DOMÉSTICO

PERSONAL

Sábado, diciembre 06, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:























ACTIVIDADES

Sábado, diciembre 06, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se realiza la aplicación de pintura esmalte doméstico a color en puertas, ventanas, rejas y estructura metálica, aplicando tres manos para garantizar un acabado uniforme, resistente y de buena adherencia, cumpliendo las especificaciones del proyecto.
3. Se realiza la revisión y desmonte de los puntos eléctricos existentes, incluyendo tomas, interruptores, plafones y tramos de cableado. La actividad consiste en verificar el estado de cada elemento, desconectar la energía, retirar las piezas de manera segura y dejar los conductores aislados y debidamente señalizados para su posterior intervención según el diseño eléctrico del proyecto.

Registro fotográfico:





















MATERIALES

Sábado, diciembre 06, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W

PERSONAL

Domingo, diciembre 07, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:






7 dic 2025 12:43:25 p. m.
3° 44'57.492"N 74° 55'49.698"W
Delegación Dptal C/marca

ACTIVIDADES

Domingo, diciembre 07, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se realiza la aplicación de pintura esmalte doméstico a color en puertas, ventanas, rejas y estructura metálica, aplicando tres manos para garantizar un acabado uniforme, resistente y de buena adherencia, cumpliendo las especificaciones del proyecto.
3. Se realiza la revisión y desmonte de los puntos eléctricos existentes, incluyendo tomas, interruptores, plafones y tramos de cableado. La actividad consiste en verificar el estado de cada elemento, desconectar la energía, retirar las piezas de manera segura y dejar los conductores aislados y debidamente señalizados para su posterior intervención según el diseño eléctrico del proyecto.

Registro fotográfico:





















MATERIALES

Domingo, diciembre 07, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W

PERSONAL

Lunes, diciembre 08, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:






7 dic 2025 12:43:25 p. m.
3° 44'57.492"N 74° 55'49.698"W
Delegación Dptal C/marca

ACTIVIDADES

Domingo, diciembre 07, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se realiza la aplicación de pintura esmalte doméstico a color en puertas, ventanas, rejas y estructura metálica, aplicando tres manos para garantizar un acabado uniforme, resistente y de buena adherencia, cumpliendo las especificaciones del proyecto.
3. Se realiza la revisión y desmonte de los puntos eléctricos existentes, incluyendo tomas, interruptores, plafones y tramos de cableado. La actividad consiste en verificar el estado de cada elemento, desconectar la energía, retirar las piezas de manera segura y dejar los conductores aislados y debidamente señalizados para su posterior intervención según el diseño eléctrico del proyecto.

Registro fotográfico:






Pintuco
ESMALTE
DOMÉSTICO
METALES Y MADERAS















MATERIALES

Domingo, diciembre 07, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W

PERSONAL

Martes, diciembre 09, 2025


Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:







ACTIVIDADES

Martes, diciembre 09, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se realiza la aplicación de pintura esmalte doméstico a color en puertas, ventanas, rejas y estructura metálica, aplicando tres manos para garantizar un acabado uniforme, resistente y de buena adherencia, cumpliendo las especificaciones del proyecto.
3. Se realiza la revisión y desmonte de los puntos eléctricos existentes, incluyendo tomas, interruptores, plafones y tramos de cableado. La actividad consiste en verificar el estado de cada elemento, desconectar la energía, retirar las piezas de manera segura y dejar los conductores aislados y debidamente señalizados para su posterior intervención según el diseño eléctrico del proyecto.
4. Se adelantan trabajos de fachada en los bajantes pluvial
5. Se avanza en labores de estuco y pintura vinilo tipo en muros internos en zona de atención al publico
6. Se avanza en labores de cielo pvc en la misma zona de atención.

Registro fotográfico:




10 dic 2025 4:54:49 p. m.
3°44'57.402"N 74°55'49.908"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 4:53:56 p. m.
3°44'57.15"N 74°55'49.8"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 3:34:39 p. m.
3°44'57.456" N 74°55'49.596" W
Delegación Dptal C/marca


12 dic 2025 5:56:58 p. m.
3°44'57.576" N 74°55'49.68" W
Delegación Dptal C/marca

MATERIALES

Martes, diciembre 09, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca

PERSONAL

Miércoles, diciembre 10, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA

PERSONAL

Miércoles, diciembre 10, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:





Operativos: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:





ACTIVIDADES

Miércoles, diciembre 10, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se realiza la aplicación de pintura esmalte doméstico a color en puertas, ventanas, rejas y estructura metálica, aplicando tres manos para garantizar un acabado uniforme, resistente y de buena adherencia, cumpliendo las especificaciones del proyecto.
3. Se realiza la revisión y desmonte de los puntos eléctricos existentes, incluyendo tomas, interruptores, plafones y tramos de cableado. La actividad consiste en verificar el estado de cada elemento, desconectar la energía, retirar las piezas de manera segura y dejar los conductores aislados y debidamente señalizados para su posterior intervención según el diseño eléctrico del proyecto.
4. Se adelantan trabajos de fachada en los bajantes pluvial
5. Se avanza en labores de estuco y pintura vinilo tipo en muros internos en zona de atención al publico
6. Se avanza en labores de cielo pvc en la misma zona de atención.

Registro fotográfico:




10 dic 2025 4:54:49 p. m.
3°44'57.402"N 74°55'49.908"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 4:53:56 p. m.
3°44'57.15"N 74°55'49.8"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 3:34:39 p. m.
3°44'57.456" N 74°55'49.596" W
Delegación Dptal C/marca


12 dic 2025 5:56:58 p. m.
3°44'57.576" N 74°55'49.68" W
Delegación Dptal C/marca

MATERIALES

Miércoles, diciembre 10, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca

PERSONAL

Jueves, diciembre 11, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA

PERSONAL

Jueves, diciembre 11, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:





- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:






10 dic 2025 4:54:16 p. m.
3°44'57.258"N 74°55'49.974"W
Delegación Dptal C/marca

ACTIVIDADES

Jueves, diciembre 11, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico sobre los muros interiores, preparando la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se realiza la aplicación de pintura esmalte doméstico a color en puertas, ventanas, rejas y estructura metálica, aplicando tres manos para garantizar un acabado uniforme, resistente y de buena adherencia, cumpliendo las especificaciones del proyecto.
3. Se realiza la revisión y desmonte de los puntos eléctricos existentes, incluyendo tomas, interruptores, plafones y tramos de cableado. La actividad consiste en verificar el estado de cada elemento, desconectar la energía, retirar las piezas de manera segura y dejar los conductores aislados y debidamente señalizados para su posterior intervención según el diseño eléctrico del proyecto.
4. Se adelantan trabajos de fachada en los bajantes pluvial
5. Se avanza en labores de estuco y pintura vinilo tipo en muros internos en zona de atención al publico
6. Se avanza en labores de cielo pvc en la misma zona de atención.

Registro fotográfico:




10 dic 2025 3:35:46 p. m.



10 dic 2025 4:54:49 p. m.
3°44'57.402"N 74°55'49.908"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 4:53:56 p. m.
3°44'57.15"N 74°55'49.8"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca


10 dic 2025 3:34:39 p. m.
3°44'57.456"N 74°55'49.596"W
Delegación Dptal C/marca


12 dic 2025 5:56:58 p. m.
3°44'57.576"N 74°55'49.68"W
Delegación Dptal C/marca



MATERIALES

Jueves, diciembre 11, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca

PERSONAL

Viernes, diciembre 12, 2025


Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:







ACTIVIDADES

Viernes, diciembre 12, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico y pintura acrílica – Koraza sobre los muros exteriores**,** de fachada **preparando** la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se avanza en labores de instalación de lámparas led en zona de atención
3. Se avanza en labores en ajustes de cielo pvc en la misma zona de atención

Registro fotográfico:






12 dic 2025 5:57:19 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.92"W
Delegación Dptal C/marca


Delegación Dptal C/marca

MATERIALES

Viernes, diciembre 12, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca

PERSONAL

Sabado, diciembre 13, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:






13 dic 2025 3:28:09 p. m.
3°44'57.666"N 74°55'49.68"W
Delegación Dptal C/marca

ACTIVIDADES

Sábado, diciembre 13, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico y pintura acrílica – Koraza sobre los muros exteriores**,** de fachada **preparando** la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se avanza en labores de instalación de lámparas led en zona de atención
3. Se avanza en labores en ajustes de cielo pvc en la misma zona de atención
4. Se avanza en labores de aplicación de manto frio en aleros de concretos de cubierta en fachada y patio
5. Se avanza en labores de mantenimiento de ventanas y puertas en espacios internos

Registro fotográfico:









13 dic 2025 3:28:09 p. m.
3°44'57.666"N 74° 55'49.68"W
Delegación Dptal C/marca









MATERIALES

Sábado, diciembre 13, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca

PERSONAL

Domingo, diciembre 14, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:

PERSONAL

Domingo, diciembre 14, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:









ACTIVIDADES

Domingo, diciembre 14, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico y pintura acrílica – Koraza sobre los muros exteriores**,** de fachada **preparando** la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se avanza en labores de instalación de lámparas led en zona de atención
3. Se avanza en labores en ajustes de cielo pvc en la misma zona de atención
4. Se avanza en labores de aplicación de manto frio en aleros de concretos de cubierta en fachada y patio
5. Se avanza en labores de mantenimiento de ventanas y puertas en espacios internos
6. Se avanza en la aplicación de mortero de pañete en muros de jardinera sobre fachada
7. Se avanza en labores e aplicación de logo para personas PMR en inicio de rampa
8. Se avanza en mantenimiento de electrobomba
9. Se avanza en conexión entre bomba y tanques de pvc

Registro fotográfico:




15 dic 2025 5:17:08 p. m.
3°44'57.21" N 74°55'50.034" W
Delegación Dptal C/marca


14 dic 2025 11:50:57 a. m.
3°44'57.822" N 74°55'49.297" W
Delegación Dptal C/marca


15 dic 2025 4:11:00 p. m.
3°44'54.222" N 74°55'43.883" W
Delegación Dptal C/marca


15 dic 2025 4:11:00 p. m.
3°44'54.222"N 74°55'43.883"W
Delegación Dptal C/marca




13 dic 2025 3:25:14 p. m.
3°44'57.594"N 74°55'49.848"W
Delegación Dptal C/marca

MATERIALES

Domingo, diciembre 14, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca

PERSONAL

Lunes, diciembre 15, 2025


Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:







ACTIVIDADES

Lunes, diciembre 15, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico y pintura acrílica – Koraza sobre los muros exteriores**,** de fachada **preparando** la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se avanza en labores de instalación de lámparas led en zona de atención
3. Se avanza en labores en ajustes de cielo pvc en la misma zona de atención
4. Se avanza en labores de aplicación de manto frio en aleros de concretos de cubierta en fachada y patio
5. Se avanza en labores de mantenimiento de ventanas y puertas en espacios internos
6. Se avanza en la aplicación de mortero de pañete en muros de jardinera sobre fachada
7. Se avanza en labores e aplicación de logo para personas PMR en inicio de rampa
8. Se avanza en mantenimiento de electrobomba
9. Se avanza en conexión entre bomba y tanques de pvc
10. Se avanza en labores de mantenimiento y actualización de tablero eléctricos de circuito eléctrico de la sede (cambio de brakers de diferentes amperajes

Registro fotográfico:




15 dic 2025 3:17:08 p. m.
3°44'57.21"N 74°55'50.034"W
Delegación Dptal C/marca


15 dic 2025 3:39:10 p. m.
3°44'57.233"N 74°55'49.725"W
Delegación Dptal C/marca


TIGO
TIGO
15 dic 2025 3:39:01 p. m.
3°44'57.233"N 74°55'49.725"W
Delegación Dptal C/marca


16 dic 2025 12:14:18 p. m.
3°44'57.264"N 74°55'50.052"W
Delegacion Dptal C/marca

MATERIALES

Lunes, diciembre 15, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca

PERSONAL

Martes, diciembre 16, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:

PERSONAL

Martes, diciembre 16, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:









16 dic 2025 12:14:39 p. m.
3°44'57.258" N 74°55'49.932" W
Delegación Dptal C/marca


16 dic 2025 12:14:18 p. m.
3°44'57.264" N 74° 55' 50.052" W
Delegación Dptal C/marca




Delegación Dptal C/marca


Delegación Dptal C/marca



ACTIVIDADES

Martes, diciembre 16, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico y pintura acrílica – Koraza sobre los muros exteriores**,** de fachada **preparando** la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se avanza en labores de instalación de lámparas led en zona de atención
3. Se avanza en labores en ajustes de cielo pvc en la misma zona de atención
4. Se avanza en labores de aplicación de manto frio en aleros de concretos de cubierta en fachada y patio
5. Se avanza en labores de mantenimiento de ventanas y puertas en espacios internos
6. Se avanza en la aplicación de mortero de pañete en muros de jardinera sobre fachada
7. Se avanza en labores e aplicación de logo para personas PMR en inicio de rampa
8. Se avanza en mantenimiento de electrobomba
9. Se avanza en conexión entre bomba y tanques de pvc
10. Se avanza en labores de mantenimiento y actualización de tablero eléctricos de circuito eléctrico de la sede (cambio de brakers de diferentes amperajes
11. Se avanza en pintura acrílica tipo Koraza color azul institucional en muros de jardinera
12. Siembra de especies nativas para la jardinera
13. Instalación del aviso institucional de la sede según nuevo logo
14. Instalación de lámparas led tipo aplique muro en fachadas frontal y posterior

Registro fotográfico:




16 dic 2025 12:15:37 p. m.
Delegación Dptal C/marca

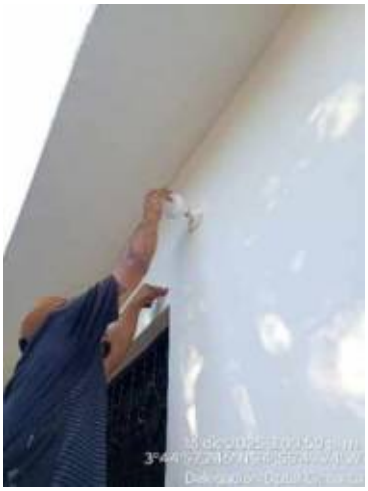

Delegación Dptal C/marca


16 dic 2025 12:39:08 p. m.
3°44'57.162"N 74°55'49.794"W
Delegación Dptal C/marca






Titanium
Bombillo LED
30W
16 dic 2025 3:01:16 p. m.
3°44'57.15"N 74°55'49.674"W
Delegación Dptal C/marca







MATERIALES

Martes, diciembre 16, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:
















50%




2 709441 151911
CABALLETE SUPERIOR uPVC
BLANCO 1.07 m


Alumanto Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA
ASFALTELA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60
IP 20


Titanium
*2 Unidades
Panel LED
60X60
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca


LIGHTING
Bombillo LED
Alta Potencia
30W
2 AÑOS
Titanium



PERSONAL

Miércoles, diciembre 17, 2025

Descripción:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

Registro fotográfico:








Delegación Dptal C/marca




16 dic 2025 12:43:30 p. m.
3°44'57.204"N 74°55'49.986"W
Delegación Dptal C/marca

ACTIVIDADES

Miércoles, diciembre 17, 2025

Descripción:

1. Se aplica estuco plástico y pintura acrílica – Koraza sobre los muros exteriores**,** de fachada **preparando** la superficie y extendiendo el material de forma uniforme para obtener un acabado liso y listo para pintura.
2. Se avanza en labores de instalación de lámparas led en zona de atención
3. Se avanza en labores en ajustes de cielo pvc en la misma zona de atención
4. Se avanza en labores de aplicación de manto frio en aleros de concretos de cubierta en fachada y patio
5. Se avanza en labores de mantenimiento de ventanas y puertas en espacios internos
6. Se avanza en la aplicación de mortero de pañete en muros de jardinera sobre fachada
7. Se avanza en labores e aplicación de logo para personas PMR en inicio de rampa
8. Se avanza en mantenimiento de electrobomba
9. Se avanza en conexión entre bomba y tanques de pvc
10. Se avanza en labores de mantenimiento y actualización de tablero eléctricos de circuito eléctrico de la sede (cambio de brakers de diferentes amperajes
11. Se repinta zona de antepecho de barra de atención al publico en color azul institucional con pintura acrílica tipo Koraza
12. Aseo general

Registro fotográfico:




16 dic 2025 12:15:37 p. m.
Delegación Dptal C/marca

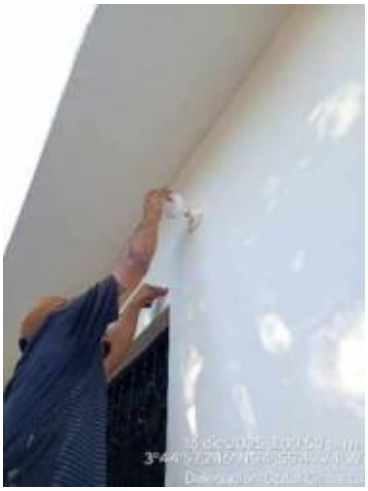

Delegación Dptal C/marca


16 dic 2025 12:39:08 p. m.
3°44'57.162"N 74°55'49.794"W
Delegación Dptal C/marca






Titanium
Bombillo LED
30W
16 dic 2025 3:01:16 p. m.
3°44'57.15"N 74°55'49.674"W
Delegación Dptal C/marca








16 dic 2025 12:43:30 p. m.
3°44'57.204"N 74°55'49.986"W
Delegación Dptal C/marca


15 dic 2025 5:40:48 p. m.
3°44'57.396"N 74°55'50.01"W
Delegación Dptal C/marca



MATERIALES

Miércoles, diciembre 17, 2025

Descripción:

Llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc, Manto Asfaltico, emulsión asfáltica fibrosa, caballete, lámparas led, Sika mortero.

Registro Fotográfico:


Aluminio Autoadhesivo


TECHOS
klar
TK5


METÁLICA
FIJACION










50%




CABALLETE SUPERIOR UPVC
BLANCO 1.07 m


Aluminio Autoadhesivo


EMULSIÓN ASFÁLTICA FIBROSA


Pintuco
Pintulux
3EN1








Panel LED 48W
60x60


Titanium
LIGHTING
2 AÑOS
*2 Unidades
Panel LED
60X60
Backlight
48W


10 dic 2025 3:35:02 p. m.
3°44'57.426"N 74°55'49.626"W
Delegación Dptal C/marca
