REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME TECNICO MENSUAL DE OBRA No. 01
PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2025

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

INDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCION 5
2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 6
2.1 Localización del Proyecto. 6
2.2 Obras Contempladas en el Proyecto 8
3 ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO 11
3.1 Información contractual 11
3.2 Garantías constituidas por el contratista 11
3.3 Ejecución del contrato 12
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO 13
4.1 Seguimiento de avance del contrato 13
4.2 Relación de actividades ejecutadas 13
4.3 Gestión social 14
4.3.1 Información, divulgación y participación comunitaria 15
4.3.2 PGS, Infraestructura de predios. 16
4.3.3 PGS, sostenibilidad social 17
4.3.4 PGS, Política de empleo. 18
4.3.5 PGS atención a la comunidad 19
4.3.6 Conclusiones 20
4.4 Control de personal de obra 20
4.4.1 Contratista 20
4.5 Solicitudes entre contratista e interventoría 21
4.6 Requerimientos efectuados 21
4.7 Pagos de tributos 21
4.8 Gestiones realizadas con empresas de servicio publico 21
5 ASPECTOS TECNICOS 22
5.1 Plano récord 22
5.2 Análisis de precios y actividades no previstas 22
5.3 Control de los equipos 22
5.4 Pruebas y resultados 22
5.5 Evidencias fotográficas 22
5.6 Cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad 28
6 ASPECTOS AMBIENTALES 29

6.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. 29
6.1.1 Objetivo general 29
6.1.2 Objetivos específicos: 29
6.1.3 Actividades ejecutadas durante el periodo 29
6.1.4 Identificación de peligros y riesgo 30
6.1.5 Seguridad social 30
6.1.6 Uso y entrega de epp 30
6.1.7 Inspecciones y equipos de emergencia 30
6.1.8 Accidentalidad 31
6.1.9 Preoperacionales de máquinas, equipo herramientas manuales y de poder 31
6.1.10 Servicios de higiene – orden y aseo 32
6.1.11 Señalizaciones 32
6.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental 33
6.2.1 Cumplimiento Legal y Contractual Ambiental 33
6.2.2 Manejo Ambiental en Obra 33
6.2.3 Manejo de Residuos Sólidos 33
6.2.4 Campamentos e Instalaciones Temporales 33
6.2.5 Contaminación Atmosférica y Ruido 34
6.2.6 Manejo de Aguas Residuales 34
6.2.7 Manejo de Maquinaria 35
6.2.8 Manejo de Vegetación 35
7 ASPECTO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 36
7.1 Resumen del manejo del anticipo y estado de la amortización 36
7.2 Resumen sobre el rendimiento financiero del anticipo 36
8 ASPECTOS LEGALES 37
8.1 Aporte a seguridad social y parafiscales 37
8.2 Cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación 38
8.3 Desviación del contratista o la interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 38
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39
10 ANEXOS 40
10.1 CANTIDADES EJECUTADAS 40

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Áreas totales de parques intervenidos 7
Tabla 2. Información del contrato. 11
Tabla 3. Información de pólizas. 11
Tabla 4. Cobertura de pólizas. 12
Tabla 5. Información del presente Acta #1. 12
Tabla 6. Divulgación y participación comunitaria. 15
Tabla 7. Asistencia a socialización de proyecto. 16
Tabla 8. Tipos de predios. 17
Tabla 9. Conformación comité de participación comunitaria. 17
Tabla 10. Relación inclusión de personal. 18
Tabla 11. Generación de empleo. 18
Tabla 12. Empleados en Urbanización La Playa 19
Tabla 13. Empleados en Juan Mina y Los Muñecos 19
Tabla 14. Relación de puntos de atención a la comunidad. 20
Tabla 15. Relación de quejas y/o reclamos. 20
Tabla 16. Personal del contratista. 20
Tabla 17. Información de maquinaria y equipos 22

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa del departamento del Atlántico. 6
Figura 2. Mapa de Barranquilla y su área Metropolitana. 8
Figura 3. Socialización de inicio de obra. 16
Figura 4. Actas de vecindad. 17
Figura 5. Evidencia fotográfica de actividades ejecutadas. 27
Figura 6. Uso de EPP 30
Figura 7. Equipos de emergencias. 31
Figura 8. Activaciones en el trabajo. 31
Figura 9. Servicio de higiene. 32
Figura 10. Uso de Señalizaciones. 32
Figura 11. Campamento e instalaciones temporales. 34
Figura 12. Cerramiento. 34
Figura 13. Manejo de aguas residuales. 35
Figura 14. Planilla de aporte a seguridad social y parafiscales. 37

1 INTRODUCCION

Como es ya conocido, el Distrito de Barranquilla cuenta aproximadamente con 320 espacios entre parques, plazoletas, bulevares, zonas verdes, que representan un total de 1.755.672 m2 de área, con aproximadamente un 60% de áreas duras, lo cual, ha impactado positivamente con respecto a años anteriores la vulnerabilidad ante el cambio climático, creando una red verde que permite la mejora en el medioambiente, en el paisajismo que tienen los parques y además, incentiva aspectos como la práctica del deporte, la integración de las familias y comunidades enteras.

Se hace necesario que se sigan construyendo e interviniendo esta clase de espacios para lograr fortalecer a Barranquilla como una ciudad amigable con el medio ambiente, alineándose con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está propendiendo la Agenda Mundial 2030, especialmente su objetivo de prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Busca implementar medidas en los territorios que minimicen los efectos del cambio climático de acuerdo con las necesidades propias. Con el objetivo de transformar los espacios públicos en áreas de recreación, encuentro y esparcimiento, esta iniciativa busca no solo embellecer la ciudad, sino también mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, consideró necesario y oportuno la celebración de un contrato para llevar a cabo la séptima fase de ejecución de las obras correspondientes al mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores de la ciudad.

Este proyecto no solo se trata de plantar árboles y construir juegos, sino de diseñar espacios inclusivos que reflejen la diversidad y la identidad cultural de Barranquilla. Desde la selección de especies vegetales autóctonas hasta la instalación de infraestructuras para personas con movilidad reducida, cada detalle se cuidará meticulosamente para garantizar que los parques sean accesibles y acogedores para todos.

En resumen, la ejecución de los parques en el Distrito de Barranquilla no solo transformará el paisaje urbano, sino que también promoverá la cohesión social, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible. Es un paso crucial hacia una ciudad más verde, más saludable y feliz para las generaciones presentes y futuras.

2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Lote 3 por parte de CONSORCIO ESCENARIO EP, en el periodo comprendido del 16 de mayo de 2025 al 15 de junio de 2025, durante el desarrollo de las actividades contenidas en Contrato de Obra No. **LP-031-2024 LOTE 3** que tiene por objeto el **MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).**

2.1 Localización del Proyecto.

El proyecto de MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). Se encuentra localizado dentro de cuatro de las cinco localidades del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Siendo estas:

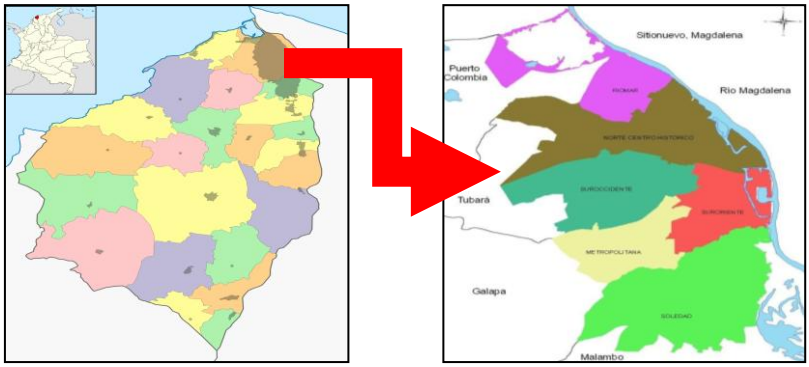


Figura 1. Mapa del departamento del Atlántico.

- **Sur Oriente:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con la carrera 38, al suroriente con el río Magdalena, al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo y al sur con los límites del municipio de Soledad.

- **Sur Occidente:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38, al suroriente con la acera oeste de la vía de la Cordialidad. Al este con la acera oeste de la calle Murillo y al sur occidente con los límites del municipio de Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina.
- Metropolitana: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al suroriente con la acera este de la vía de la Cordialidad empalmando con la acera oeste de la calle Murillo (45) con carrera 21. Al suroeste con la avenida de la Circunvalar. Incluye zonas de expansión urbana y rural.

- **Riomar:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con río Magdalena, al occidente con los límites del municipio de Puerto Colombia, al sur con la acera norte de la carrera 46- Autopista Paralela al Mar hasta la calle 84, y al oriente de la carrera 46 con calle 84 siguiendo hasta la calle 82 y la calle 84, finalizando en el río Magdalena. Incluye zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de La Playa.

- **Norte- Centro Histórico:** Al nororiente con el río Magdalena; al norte con la acera sur de la carrera 46 autopista el mar hasta la calle 84, siguiendo hasta la calle 82 con carrera 64 hasta empalmar con el río Magdalena, y al occidente con la avenida la Circunvalar, incluyendo zona de expansión urbana y rural.

A continuación, se presenta la distribución de los parques a intervenir dentro del Distrito de Barranquilla, según el contrato No. LP-031-2024 LOTE 3.

Tabla 1. Áreas totales de parques intervenidos

LOTE 3	1	MALECON DEL SURORIENTE TRAMO 6 - CALLE 30	8.000	2.400	SURORIENTE	C 29 Y 30 K 21B	LOS TRUPILLOS
	2	ECOPARQUE METROPOLITANO	7.400	2.500	METROPOLITANA	C 46 Kk 12A SUR	CIUDADELA 20 DE JULIO
	3	PARQUE URBANIZACIÓN LA PLAYA	2.382	525	RIOMAR	K 24 C 9 Y 9A	LA PLAYA
	4	PARQUE LOS MUÑECOS	1.275	383	SURORIENTE	K 1B Y 1C C 42	CIUDADELA 20 DE JULIO
	5	CANCHA CEVILLAR	10.950	3.285	METROPOLITANA	K 14 C 54	CEVILLAR
	6	CANCHA JUAN MINA	8.795	1.169	SUROCCIDENTE	CL8 K7	JUAN MINA
	7	PARQUE PRADITO	2.750	825	METROPOLITANA	C 46A K 1C	CIUDADELA 20 DE JULIO
	8	PARQUE CAMPO ALEGRE 3	850	255	NORTE - CENTRO HISTORICO	K 41A - CL 84B	CAMPO ALEGRE
	9	PARQUE VILLAS DE SAN PABLO - EXTENCIÓN	2.280	684	SUROCCIDENTE	K 9G C 134	VILLAS DE SAN PABLO
	10	CANCHA VILLA SAN PEDRO	1.170	351	SUROCCIDENTE	K 6P Y 6Q - C 102 Y 102A	SAN PEDRO
	11	PARQUE LA ESMERALDA - DIAGONAL 77 K21B	1.110	333	SUROCCIDENTE	DIAGONAL 77 K21B	LA ESMERALDA
	12	PLACITA LOS PESCADORES	415	125	RIOMAR	K 87 Y 88 C 109	LAS FLORES
	13	CRISTO RECUSITADO LA PLAYA	690	207	RIOMAR	K 10 C 15	LA PLAYA
	14	ESPACIO RESIDUAL SANTA MARIA	865	260	METROPOLITANA	KR 1 CL 79	SANTA MARIA
	15	PARQUE VILLA SAN PEDRO 1	230	69	SUROCCIDENTE	C 96A K 6C Y 6D	SAN PEDRO
	16	PARQUE MIRAMAR - CICLOMONTAÑISMO	720	100	NORTE - CENTRO HISTORICO	K 42F C99A	MIRAMAR

La siguiente imagen, se encuentra la ubicación en KMZ de los parques priorizados por la Alcaldía de Barranquilla a la fecha:

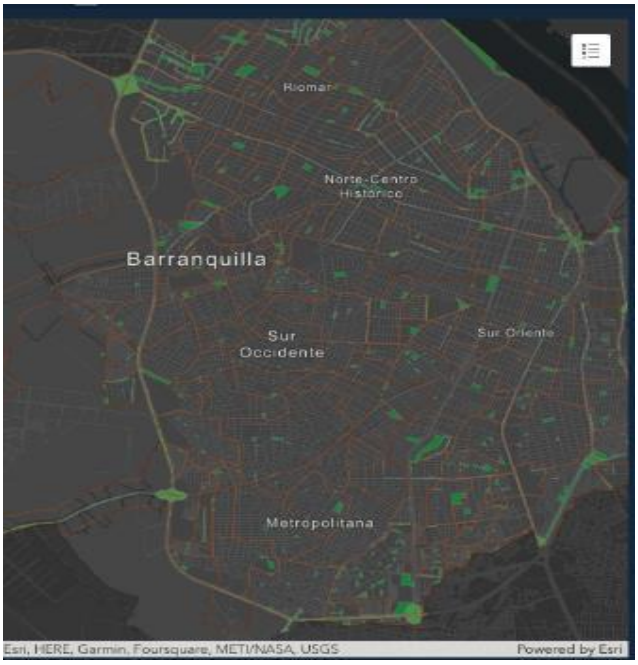


Figura 2. Mapa de Barranquilla y su área Metropolitana.

2.2 Obras Contempladas en el Proyecto.

- **MALECON DEL SURORIENTE TRAMO 6:** Área a intervenir. 8.000 m^2
  - Construcción de andenes.
  - Instalación de grama sintética.
  - Construcción de zona de juegos infantiles.
  - Instalación de monumentos.
  - Construcción de cicloruta.
  - Siembra de paisajismo.
  - Construcción de plazoletas.
  - Instalación de bolardos.
  - Construcción de pompeyano.

- **ECOPARQUE METROPOLITANO:** Área 7.400 m^2
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, gradas, bordillos,
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido
  - Columnas en concreto
  - Levante en bloque estructural y abuzardado
  - Construcción de cárcamos
  - Construcción de registros
  - Construcción de alfajías

- Instalación de grama sintética
- Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

- **PARQUE URBANIZACIÓN LA PLAYA:** Área 2.382 m^2
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, gradas, bordillos,
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido
  - Levante en bloque estructural y abuzardado
  - Construcción de cárcamos
  - Construcción de registros
  - Construcción de alfajías
  - Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

- **PARQUE LOS MUÑECOS:** Área 1.275 m^2
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, bordillos,
  - Excavación a mano
  - Relleno de material seleccionado
  - Construcción de vigas de cimiento
  - Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

- **CANCHA JUAN MINA:** Área 8.795 m^2
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, gradas, bordillos
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Desmonte de marcos de portería
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido
  - Levante en bloque estructural y abuzardado
  - Construcción de cárcamos
  - Construcción de registros
  - Construcción de alfajías
  - Instalación de arena para cancha
  - Instalación de mobiliarios

- **PARQUE PRADITO:** Área 2.750 m^2
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, gradas, bordillos,
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Desmonte de marcos de portería
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido

- Levante en bloque estructural y abuzardado
- Construcción de cárcamos
- Construcción de registros
- Construcción de alfajías
- Instalación de grama sintética
- Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

- **PARQUE LA ESMERALDA – DIAGONAL 77 K21B:** Área 1.110 m^2
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, gradas, bordillos,
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Desmonte de marcos de portería
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido
  - Levante en bloque estructural y abuzardado
  - Construcción de cárcamos
  - Construcción de registros
  - Construcción de alfajías
  - Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

3 ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO

3.1 Información contractual

A continuación, se muestra aspectos generales del contrato:

Tabla 2. Información del contrato.

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-031-2024 LOTE 3
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ – ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
NIT	901.924.784
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).
PLAZO	16 MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2026

3.2 Garantías constituidas por el contratista

A continuación, se muestra las pólizas adquiridas:

Tabla 3. Información de pólizas.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO	400062962
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	400062958
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
FECHA DE EXPEDICIÓN POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	24/04/2025
FECHA DE EXPEDICION RESPONSABILIDAD CIVIL	31/03/2025

Tabla 4. Cobertura de pólizas.

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2025	27/01/2027	$ 2.418.564.565,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/03/2025	27/09/2029	$ 4.837.129.130,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	27/09/2026	27/09/2026	$ 7.255.693.695,60
CALIDAD DEL SERVICIO	27/03/2025	27/09/2027	$ 2.418.564.565,20

3.3 Ejecución del contrato

A continuación, se muestra la información generar de las actas cobradas:

Tabla 5. Información del presente Acta #1.

ACTA PARCIAL	FECHA	VALOR	SALDO
			$ 24.185.645.652
Acta de recibo Parcial No.1	15 de junio 2025	$ 1.279.434.745,88	$ 22.906.210.906,12

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

4.1 Seguimiento de avance del contrato

Teniendo en cuenta el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, se tuvo un avance de obra ejecutado de 5.29 % frente a un 5.46% de avance de obra programado. Donde por cada parque en ejecución durante este periodo de tiempo se tiene los siguientes porcentajes de ejecución:

- **Parque Urbanización La Playa:** 7.95 % avance ejecutado real vs 8.22 % avance ejecutado programado.
- **Parque Juan mina:** 13.66 % avance ejecutado real vs 14.11 % avance ejecutado programado.
- **Parque Los Muñecos:** 14.59 % avance ejecutado real vs 15.07 % avance ejecutado programado.

4.2 Relación de actividades ejecutadas

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, se han ejecutado las siguientes actividades en cada parque:

- **Parque Urbanización La Playa**
  - Excavación de terreno a mano
  - Figurado de acero
  - Vaciado de concreto para viga cimentación
  - Relleno con material seleccionado
  - Cerramiento perimetral en lamina de zinc
  - Desmonte de juegos infantiles
  - Desmonte de biosaludables
  - Demolición de placa e=10 cm
  - Demolición de placa espesores entre 10 cm y 30 cm
  - Tala de arboles
  - Descapote del terreno
  - Demolición de gradas
  - Demolición de jardineras
  - Demolición de bordillos
  - Nivelación, trazado y replanteo para cimentación
  - Excavación a maquina
  - Desmonte de marcos

- **Parque Juan mina**
  - Excavación de terreno a mano
  - Relleno con material seleccionado
  - Cerramiento perimetral en lamina de zinc
  - Desmonte de biosaludables

- Demolición de placa e=10 cm
- Demolición de placa espesores entre 10 cm y 30 cm
- Tala de arboles
- Descapote del terreno
- Demolición de gradas
- Demolición de jardineras
- Demolición de bordillos
- Nivelación, trazado y replanteo para cimentación
- Excavación a maquina
- Desmonte de marcos

- **Parque Los Muñecos**
  - Excavación de terreno a mano
  - Figurado de acero
  - Vaciado de concreto para viga cimentación
  - Relleno con material seleccionado
  - Cerramiento perimetral en lamina de zinc
  - Desmonte de juegos infantiles
  - Desmonte de biosaludables
  - Demolición de placa e=10 cm
  - Demolición de placa espesores entre 10 cm y 30 cm
  - Tala de arboles
  - Descapote del terreno
  - Demolición de jardineras
  - Demolición de bordillos
  - Nivelación, trazado y replanteo para cimentación
  - Desmonte de adoquín

4.3 Gestión social

El Plan de Gestión Social es un instrumento diseñado para plantear acciones que permitan prevenir, reducir, mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución del CONTRATO: No. LP-031-2024 Lote 3° cuyo objeto es “Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. Fase VIII”. En él están planteadas las recomendaciones que se deben atender para el manejo adecuado y la mitigación de los impactos sociales causados en la comunidad por la obra.

Con su implementación el contratista ha mantenido la adecuada interlocución con los grupos de interés, generando sentido de pertenencia, apropiación y corresponsabilidad por parte de la comunidad con respecto a la obra y su producto final. Las acciones desarrolladas desde la implementación del Plan de Gestión Social tienen un enfoque participativo logrando de este modo el fortalecimiento del tejido social. Las actividades de este programa de gestión social se desarrollan con el seguimiento y acompañamiento de la interventoría y líderes sociales de los sectores beneficiados.

El presente documento corresponde al informe mensual de Gestión Social periodo comprendido entre el 16 de mayo al 15 de junio de 2025, el cual se estructura de acuerdo con las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social (PGS). Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a cada uno de los programas relacionados a continuación:

- Componente de Atención a la Comunidad
- Componentes de Información y Divulgación.
- Componentes de Manejo de la Infraestructura de Predios y servicios públicos.
- Componentes de Participación Comunitaria.
- Componentes de Contratación de Mano de Obra

A continuación, se describen de manera detallada las actividades y resultados obtenidos durante la ejecución del Plan de Gestión Social, en cada uno de los ejes de intervención antes mencionados.

4.3.1 Información, divulgación y participación comunitaria

4.3.1.1 Instalación Punto de Atención a la comunidad -PAC

Tabla 6. Divulgación y participación comunitaria.

DIVULGACIÓN PRD LOS MUÑECOS				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
Mayo 16 al 15 de junio de 2025	Se atendió el PAC en su horario establecido, los martes y jueves de los meses de mayo y junio de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atención del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

DIVULGACIÓN PRD URBANIZACIÓN LA PLAYA				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
Mayo 16 al 15 de junio de 2025	Se atendió el PAC en su horario establecido, los lunes y miércoles de los meses de mayo y junio de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atención del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

DIVULGACIÓN PRD JUAN MINA				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
Mayo 16 al 15 de junio de 2025	Se atendió el PAC en su horario establecido, los días martes y jueves de los meses de mayo y junio de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atención del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

4.3.1.2 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Con el objetivo de suministrar a la comunidad de influencia directa y autoridades municipales, información directa, clara y oportuna sobre los impactos y manejos socio-ambientales del Proyecto y los aspectos técnicos que puedan ser del interés de la comunidad o las autoridades municipales se realizaron reuniones informativas para la socialización del inicio de obra en los siguientes frentes:

Tabla 7. Asistencia a socialización de proyecto.

FRENTE DE OBRA	FECHA DE REUNIÓN	N°. DE ASISTENTES
Urb. La Playa	13/05/25	52
Los Muñecos	14/05/25	14
Juan Mina	14/05/25	17



Figura 3. Socialización de inicio de obra.

4.3.2 PGS, Infraestructura de predios.

Con el fin de dejar evidencia del estado físico de los predios colindantes con la obra se realizó el levantamiento de las actas de vecindad inicial en los siguientes frentes de obra:

Tabla 8. Tipos de predios.

SECTORES	TIPOS DE PREDIOS					TOTAL PREDIOS	FIRMADA	POR FIRMAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
	RESIDENCIAL	COMERCIAL	MIXTO	RECREACIONAL	INSTITUCIONAL				
Urb. La Playa	40	0	2	0	0	42	42	0	100%
Juan Mina	17	0	2	0	0	19	19	0	100%
Los Muñecos	18	0	1	0	0	19	19	0	100%
TOTAL	**75**	**0**	**5**	**0**	**0**	**57**	**57**	**0**	**100%**



Figura 4. Actas de vecindad.

4.3.3 PGS, sostenibilidad social

Con el objetivo de viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social, de manera que se apliquen adecuadamente las medidas preventivas y correctivas de acuerdo con los impactos de la obra y de este modo garantizar su sostenibilidad se diseñó el plan de capacitaciones dirigidas al personal de la obra, miembros del comité de participación comunitaria y a la comunidad en general.

4.3.3.1 Programa de participación comunitaria.

Durante las reuniones de socialización de inicio de obra se creó el comité de participación comunitaria con personas situadas el área de influencia directa de los sectores:

Tabla 9. Conformación comité de participación comunitaria.

FRENTE DE OBRA	FECHA DE REUNIÓN
Urb. La Playa	13/05/25

Los Muñecos	14/05/25
Juan Mina	14/05/25

Así mismo se reforzará la divulgación de la información relacionada con las actividades ejecutadas por el contratista de obra en los componentes técnico, social, SST y ambiental a través de folletos enviados a través de medio virtual.

4.3.4 PGS, Política de empleo.

Para dar cumplimiento a los requerimientos contractuales de este componente el contratista de obra vinculó a dos mujeres registradas en el Centro de oportunidades del Distrito de Barranquilla como madre cabeza de hogar, una persona en condición de discapacidad y una persona que hace parte de la población afrodescendiente. Según se establece en el contrato No. LP-031-2024 Lote 3. CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ***el CONTRATISTA se obliga con EDUBAR S.A. a lo siguiente: 1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto.***

- Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto.
- De acuerdo con la información antes mencionada el contratista cumple en la contratación población vulnerable definida en el contrato.

Tabla 10. Relación inclusión de personal.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE INCLUSIÓN
Yaira Caicedo	Profesional Social	Madre cabeza de hogar
Manuel Ojeda	Coord. SST	Comunidad Afrodescendiente
Jesús Rodriguez	Asistente Administrativo	Población con discapacidad

Durante este periodo se registraron laborando personas entre operativos y técnicos. A continuación, resumen de generación de empleos:

Tabla 11. Generación de empleo.

PERIODO	MONC	MOC	P. VULNERABLE	TOTAL
may-25	13	20	3	36

Tabla 12. Empleados en Urbanización La Playa.

URBANIZACION LA PLAYA		
NOMBRE	CÉDULA	CARGO
VALERIA CASSIANI	1140905323	ARQUITECTA RESIDENTE
YAIRA CAICEDO	22493098	TALENTO HUMANO
ROSIBELL CASTRO	1001965553	INGENIERA AMBIENTAL
MERLIN DIAZ	22618946	TRABAJADORA SOCIAL
MARIA MOLINARES	1002073483	AUXILIAR SST
LENIN MONTERO	72282672	MAESTRO DE OBRA
ANDRES THOMAS	1001893231	OPERARIO
LUIS MARTINEZ	1002154607	OPERARIO
MOISES LUNA	1001914127	TOPOGRAFO
JOSSY BARRAZA	1043440210	CADENERO
BRYAN CAICEDO	1045741539	CADENERO
ENJAR MIRANDA	73552134	OFICIAL
JOSE CABRERA	72012420	OFICIAL
DANIEL MEDINA	1081913795	OFICIAL HERRERIA
ROBINSON CASTRO	8794338	AYUDANTE DE OBRA
ERIS LEON	85127229	AYUDANTE DE OBRA
JHON TORRES	72256556	AYUDANTE DE OBRA
CARLOS MONTERO	1143134819	AYUDANTE DE OBRA
YOVANIS INSIGNARES	3715303	AYUDANTE DE OBRA

Tabla 13. Empleados en Juan Mina y Los Muñecos

CANCHA JUAN MINA			
No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	EVARISTO DOMINGUEZ	72143830	INGENIERO RESIDENTE
2	ROSIBELL CASTRO	1001965553	INGENIERA AMBIENTAL
3	DANIELA HERNANDEZ	1001965733	AUXILIAR SST
4	FERNANDO GUERERO	8778976	OFICIAL
5	MARIO CAMPANELLA	73562928	AYUDANTE DE OBRA
6	CRISTIAN CANTILLO	1046696844	AYUDANTE DE OBRA
7	RICARDO RODRIGUEZ	1047040130	AYUDANTE DE OBRA
8	DANIEL SALGADO	1048278680	AYUDANTE DE OBRA
LOS MUÑECOS			
No	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	YEISNI CAICEDO	1007205077	INSPECTOR DE OBRA
2	ROSIBELL CASTRO	1001965553	INGENIERA AMBIENTAL
3	DANIELA HERNANDEZ	1001965733	AUXILIAR SST
4	NELSON MENDOZA	9255123	MAESTRO DE OBRA
5	MILTON VARGAS	7602717	OFICIAL
6	RICHARD PADILLA	1043141621	AYUDANTE DE OBRA
7	JOSUE HERRERA	114137888	AYUDANTE DE OBRA
8	ISACC HERRERA	1143126031	AYUDANTE DE OBRA

4.3.5 PGS atención a la comunidad

Dentro del periodo reportado no se recibieron manifestaciones ciudadanas (Peticiones, quejas, quejas reclamos o solicitudes)

Tabla 14. Relación de puntos de atención a la comunidad.

FECHA DE APERTURA	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE
13/05/2025	Urb. La Playa	Lunes y miércoles de 8:00a.m. a 10:00a.m.	Profesional Social Contratista
14/05/2025	Los Muñecos	Lunes y miércoles de 8:00a.m. a 10:00a.m.	Profesional Social Contratista
14/05/2025	Juan Mina	Lunes y miércoles de 8:00a.m. a 10:00a.m.	Profesional Social Contratista

Tabla 15. Relación de quejas y/o reclamos.

FRENTE DE OBRA	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO
Urb. La Playa	0	0	0
Los Muñecos	0	0	0
Juan Mina	0	0	0

4.3.6 Conclusiones

En el presente informe se consolidó la puesta en marcha de las actividades sociales realizadas en cumplimiento a los parámetros de la interventoría y que fueron establecidas en el plan de gestión social propuesto por parte contratista de obra, para dar cumplimiento a las estrategias de intervención con el fin de crear las condiciones que permitieron la interrelación entre la comunidad y los actores locales, dentro de un contexto de creación participativa y de sostenibilidad, potenciando los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto, y generando bienestar para la comunidad beneficiada por las obras.

4.4 Control de personal de obra

4.4.1 Contratista

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, el siguiente personal estuvo involucrado en el contrato.

Tabla 16. Personal del contratista.

N°	NOMBRE	CARGO
1.	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA	GERENTE DEL PROYECTO

2.	OSCAR MAYA	DIRECTOR DE OBRA-URBANISTA
3.	EDGAR PIEDRAHITA HERNANDEZ	RESIDENTE DE OBRA
4.	EVARISTO DOMINGUEZ	RESIDENTE DE OBRA
5.	MANUEL OJEDA DORIA	PROFESIONAL SISO
6.	YAIRA CAICEDO PINTO	TRABAJADOR SOCIAL

4.5 Solicitudes entre contratista e interventoría

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han realizado solicitudes entre contratista e interventoría, y viceversa.

4.6 Requerimientos efectuados

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han realizado requerimientos.

4.7 Pagos de tributos

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han realizado requerimientos.

4.8 Gestiones realizadas con empresas de servicio publico

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han realizado gestiones frente a empresas de servicio público.

5 ASPECTOS TECNICOS

5.1 Plano récord

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han realizado plano récord.

5.2 Análisis de precios y actividades no previstas

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han realizado actividades no previstas.

5.3 Control de los equipos

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, se han utilizado los siguientes equipos y maquinaria:

Tabla 17. Información de maquinaria y equipos.

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
MINICARGADOR	1
RETROEXCAVADORA	1
MEZCLADORA DE CEMENTO	3
VIBRADOR TIPO RANA	1
PLANTA ELECTRICA	1

5.4 Pruebas y resultados


Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han realizado ningún tipo de actividad la cual se necesite realizar algún tipo de prueba.

5.5 Evidencias fotográficas

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, se han tomado los siguientes registros fotográficos de las actividades ejecutadas:

PARQUES URBANIZACION LA PLAYA, JUAN MINA Y LOS MUNECOS.	
	
Cerramiento en lamina de zinc, urbanización la playa.	*Cerramiento en lamina de zinc, Juan mina.*

 *Cerramiento en lamina de zinc, los muñecos.*	 *Nivelación, trazado y replanteo, urbanización la playa.*
 *Nivelación, trazado y replanteo, los munecos.*	 *Nivelación, trazado y replanteo, Juan mina.*
 *Descapote a máquina urbanización la playa.*	 *Descapote a máquina Juan mina.*

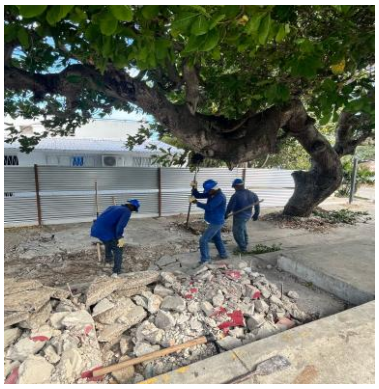 *Demolición de gradas urbanización la playa.*	 *Demolición de gradas Juan mina.*
 *Demolición de jardineras urbanización la playa.*	 *Pañete interior de muros oficina administrativa*
 *Demolición de vigas de cimentación urbanización la playa.*	 *Demolición de vigas de cimentación los muñecos.*


 *Demolición de placa espesor de 0,10 mts a 0,30 mts, urbanización la playa.*	 *Demolición de placa espesor de 0,10 mts a 0,30 mts, los muñecos.*
 *Demolición de bordillos los muñecos.*	 *Demolición de placa espesor de 0,10 mts los muñecos.*
 *Demolición de placa espesor de 0,10 mts urbanización la playa.*	 Desmonte de adoquin los munecos.



Desmonte de marcos urbanización la playa.



Desmonte de marcos Juan mina.

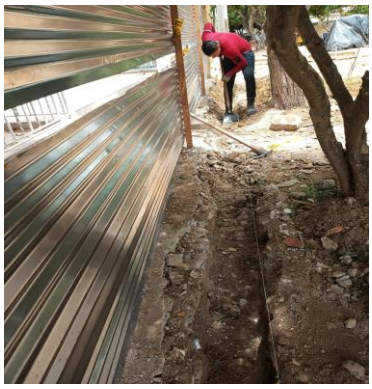

Excavación viga 30 x 30 los muñecos.



Excavación a máquina juan mina.



Relleno material seleccionado, urbanización la playa.



Relleno material seleccionado, Juan mina.



Relleno material seleccionado, Juan mina.



Fundida de viga de 30 x 30 cm, urbanización la playa.



Fundida de viga de 30 x 30 cm, Los muñecos.



Instalación de lona banner, Juan mina.



Instalación de lona banner, los muñecos.

Figura 5. Evidencia fotográfica de actividades ejecutadas.

5.6 Cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han adquirido ningún tipo de compromiso por parte del contratista hacia la comunidad.

6 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, se presenta un breve informe de las normas de higiene y seguridad industrial.

6.1.1 Objetivo general

- Promover, mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, preservando el buen estado de salud, físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes e incidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

6.1.2 Objetivos específicos:

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgos y peligros, para la salud de los trabajadores, que mitiguen la probabilidad de ocurrencia y consecuencias de los AT y EL.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.
- Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.
- Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo Laboral
- Fortalecer el compromiso y liderazgo de todos los funcionarios.
- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

6.1.3 Actividades ejecutadas durante el periodo

En el periodo se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente del profesional y una auxiliar SST, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.

Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

6.1.4 Identificación de peligros y riesgo

Se cuenta con la matriz IPEVR según las actividades realizadas en los trabajos incluyendo las actividades como figurado de hierro, fundición de solado en concreto, relleno, demolición de andenes, toma de puntos topográficos, compactación de los terrenos, levantamiento de muros, fundición de placas, excavaciones para contenedor de raíz, impermeabilización de muros.

6.1.5 Seguridad social

Para este periodo se encuentra en cumplimiento las planillas pagas de consorcio escenarios, ep, alemán constructores, el personal vinculado cuenta con afiliaciones al sistema de riesgo laborales.

6.1.6 Uso y entrega de epp

Se evidencia cumplimiento en la entrega oportuna de los epp (casco, guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos) y se cuenta con reserva de estos en los centros de trabajo habilitados.



Figura 6. Uso de EPP

6.1.7 Inspecciones y equipos de emergencia

Para este periodo el realizaron inspecciones planeadas de herramientas, equipos, y preoperacionales de maquinaria y se evidencia las herramientas que deben llevar guardas de seguridad en total cumplimiento, se implementa jornadas de aseo antes de iniciar labores, para así disminuir el riesgo locativo, en los puestos de trabajo.

Para este periodo se realizó entrega de las camillas, extintores, botiquines de emergencias a los frentes de trabajo habilitados, dando cumplimento a los equipos de emergencia (en gestión los equipos aún faltan en algunos centros de trabajo.



Figura 7. Equipos de emergencias.

6.1.8 Accidentalidad

Para el periodo no se reportan accidentes de trabajo, se continúa trabajando en la prevención y concientización, reuniendo al personal y realizándoles charlas con el objetivo de dar a conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos y las medias para disminuir el nivel de exposición, así mismo se aplican pausas activas durante las actividades, para evitar fatigas labores y mayor productividad y concentración en las diferentes áreas.



Figura 8. Activaciones en el trabajo.

6.1.9 Preoperacionales de máquinas, equipo herramientas manuales y de poder

Como medida preventiva diariamente se le realizas preoperacionales a la herramientas y equipo en uso, El contratista debe garantizar la implementación de un programa de mantenimiento preventivo/correctivo para toda la maquinaria y equipo usado en obra, en donde se establezca que toda actividad mecánica.

Todos los vehículos y maquinaria deben ser sometidos a revisión periódica de: luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas, presencia de fugas, funcionalidad de partes hidráulicas, y estado de los aditamentos y elementos de carga y/u operación.

6.1.10 Servicios de higiene – orden y aseo

Para este periodo el contratista realizo entrega de baterías sanitarias, puntos ecológicos, a los frentes de trabajo habilitados. Se implementan jornadas de orden y aseo antes de iniciar actividades con el fin de disminuir el riesgo locativo y tener frentes de trabajo seguro e higiénicos.



Figura 9. Servicio de higiene.

6.1.11 Señalizaciones

Se realiza instalación de señalizaciones de ruta d evacuación y puntos de encuentro en los centros de trabajo habilitados así mismo se realizan instalaciones provisionales, en las zonas de corte o áreas que lo requieran.



Figura 10. Uso de Señalizaciones.

6.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental

6.2.1 Cumplimiento Legal y Contractual Ambiental

Se tramitaron los permisos requeridos:

- El radicado de inscripción como nuevo generador de RCD a nombre de la razón social del contratista es el siguiente:
  - Radicado: EXT-BV-2025-06171Entidad receptora: EPA Barranquilla Verde
  - Fecha: 14 de junio de 2025
- El radicado de inscripción como nuevo generador de RCD a nombre del proyecto Lote 3 es:
  - Radicado: EXT-BV-2025-06603
  - Entidad receptora: EPA Barranquilla Verde
  - Fecha: 14 de junio de 2025

6.2.2 Manejo Ambiental en Obra

El contratista implementa las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en todos los frentes de fase 8 lote 3.

6.2.3 Manejo de Residuos Sólidos

Implementado el código de colores según la Resolución 2184 de 2019:

- Blanco: residuos aprovechables.
- Negro: no aprovechables.
- Verde: orgánicos.

Disposición a través de la empresa Triple A S.A. E.S.P.

6.2.4 Campamentos e Instalaciones Temporales

Establecidos en todos los frentes con servicios básicos: sanitarios, Vestier, comedor, oficina de control.

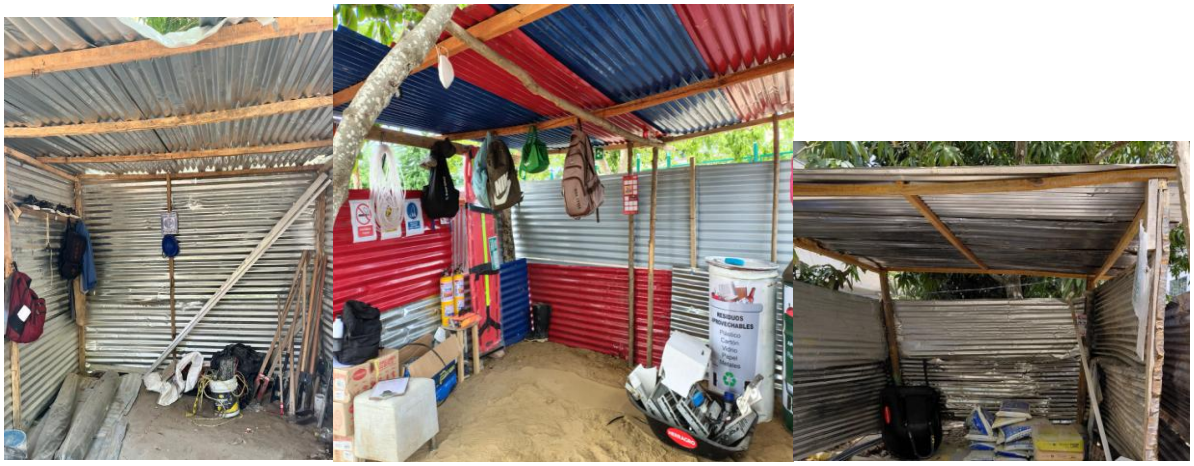


Figura 11. Campamento e instalaciones temporales.

6.2.5 Contaminación Atmosférica y Ruido

- Control de polvo: cerramientos perimetrales con lámina de zinc, cubrimientos plásticos en acopios.
- No se realizaron actividades generadoras de ruido fuera de horario laboral



Figura 12. Cerramiento.

6.2.6 Manejo de Aguas Residuales

- Sin vertimientos a cuerpos de agua o suelo.
- Baños conectados a red en algunos frentes; en otros, uso te baterías sanitarias proporcionadas por la empresa Maken.



Figura 13. Manejo de aguas residuales.

6.2.7 Manejo de Maquinaria

- Listado de maquinaria en uso (minicargadores, volquetas, bulldozer).
- Riesgos por derrames atendidos con medidas de precaución.

6.2.8 Manejo de Vegetación

No se contemplan intervenciones forestales en la fase 8 lotes 3.

7 ASPECTO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

7.1 Resumen del manejo del anticipo y estado de la amortización

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, para este contrato no se maneja ningún tipo de anticipo.

7.2 Resumen sobre el rendimiento financiero del anticipo.


Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, para este contrato no se maneja ningún tipo de anticipo.

8 ASPECTOS LEGALES

8.1 Aporte a seguridad social y parafiscales

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, se han realizado los siguientes aportes a la seguridad social y parafiscales:

Figura 14. Planilla de aporte a seguridad social y parafiscales.

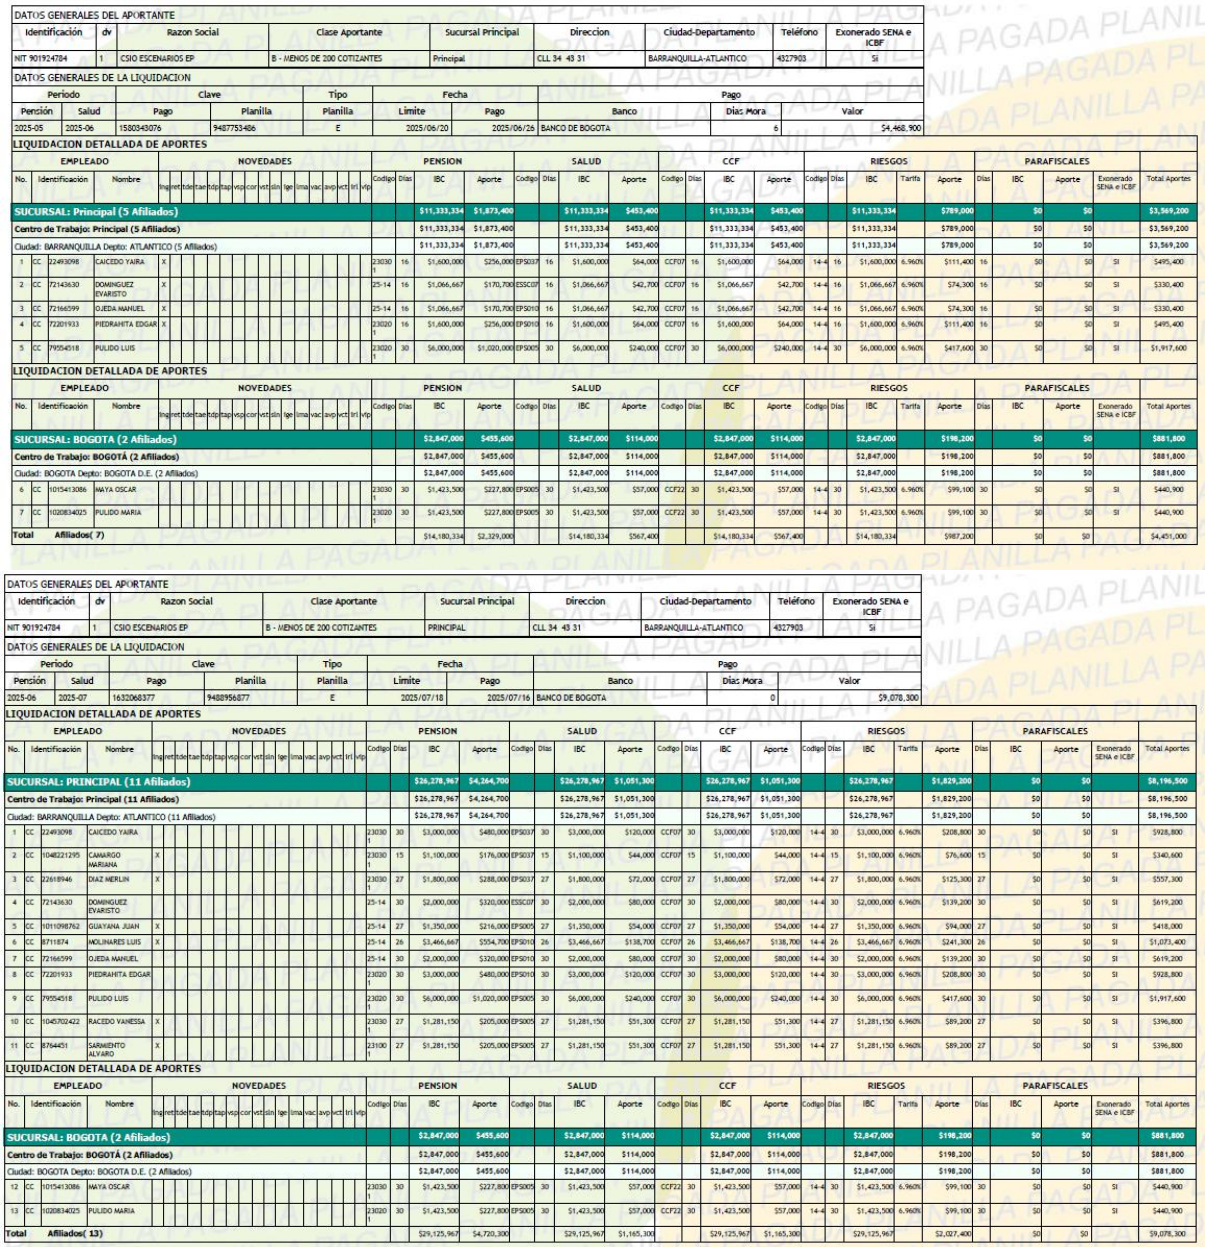

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901924784	1	CSIO ESCENARIOS EP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CLL 34 43 31	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4327903	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1580343076	9487753486	E	2025/06/20	2025/06/26	BANCO DE BOGOTA	6	$4,468,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (5 Afiliados)						$11,333,334	$1,873,400			$11,333,334	$453,400			$11,333,334	$453,400			$11,333,334		$789,000		$0	$0		$3,569,200
Centro de Trabajo: Principal (5 Afiliados)						$11,333,334	$1,873,400			$11,333,334	$453,400			$11,333,334	$453,400			$11,333,334		$789,000		$0	$0		$3,569,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (5 Afiliados)						$11,333,334	$1,873,400			$11,333,334	$453,400			$11,333,334	$453,400			$11,333,334		$789,000		$0	$0		$3,569,200
1	CC	22493098	CAICEDO YAIRA	23030 1	16	$1,600,000	$256,000	EPS037	16	$1,600,000	$64,000	CCF07	16	$1,600,000	$64,000	14-4	16	$1,600,000	6.960%	$111,400	16	$0	$0	SI	$495,400
2	CC	72143630	DOMINGUEZ EVARISTO	25-14	16	$1,066,667	$170,700	ESSC07	16	$1,066,667	$42,700	CCF07	16	$1,066,667	$42,700	14-4	16	$1,066,667	6.960%	$74,300	16	$0	$0	SI	$330,400
3	CC	72166599	OJEDA MANUEL	25-14	16	$1,066,667	$170,700	EPS010	16	$1,066,667	$42,700	CCF07	16	$1,066,667	$42,700	14-4	16	$1,066,667	6.960%	$74,300	16	$0	$0	SI	$330,400
4	CC	72201933	PIEDRAHITA EDGAR	23020 1	16	$1,600,000	$256,000	EPS010	16	$1,600,000	$64,000	CCF07	16	$1,600,000	$64,000	14-4	16	$1,600,000	6.960%	$111,400	16	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	79554518	PULIDO LUIS	23020 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF07	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: BOGOTÁ (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
6	CC	1015413086	MAYA OSCAR	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1020834025	PULIDO MARIA	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(7)**					$14,180,334	$2,329,000			$14,180,334	$567,400			$14,180,334	$567,400			$14,180,334		$987,200		$0	$0		$4,451,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901924784	1	CSIO ESCENARIOS EP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 34 43 31	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4327903	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1632068377	9488956877	E	2025/07/18	2025/07/16	BANCO DE BOGOTA	0	$9,078,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$26,278,967	$4,264,700			$26,278,967	$1,051,300			$26,278,967	$1,051,300			$26,278,967		$1,829,200		$0	$0		$8,196,500
Centro de Trabajo: Principal (11 Afiliados)						$26,278,967	$4,264,700			$26,278,967	$1,051,300			$26,278,967	$1,051,300			$26,278,967		$1,829,200		$0	$0		$8,196,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (11 Afiliados)						$26,278,967	$4,264,700			$26,278,967	$1,051,300			$26,278,967	$1,051,300			$26,278,967		$1,829,200		$0	$0		$8,196,500
1	CC	22493098	CAICEDO YAIRA	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF07	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
2	CC	1048221295	CAMARGO MARIANA	23030 1	15	$1,100,000	$176,000	EPS037	15	$1,100,000	$44,000	CCF07	15	$1,100,000	$44,000	14-4	15	$1,100,000	6.960%	$76,600	15	$0	$0	SI	$340,600
3	CC	22618946	DIAZ MERLIN	23030 1	27	$1,800,000	$288,000	EPS037	27	$1,800,000	$72,000	CCF07	27	$1,800,000	$72,000	14-4	27	$1,800,000	6.960%	$125,300	27	$0	$0	SI	$557,300
4	CC	72143630	DOMINGUEZ EVARISTO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC	1011098762	GUAYANA JUAN	25-14	27	$1,350,000	$216,000	EPS005	27	$1,350,000	$54,000	CCF07	27	$1,350,000	$54,000	14-4	27	$1,350,000	6.960%	$94,000	27	$0	$0	SI	$418,000
6	CC	8711874	MOLINARES LUIS	25-14	26	$3,466,667	$554,700	EPS010	26	$3,466,667	$138,700	CCF07	26	$3,466,667	$138,700	14-4	26	$3,466,667	6.960%	$241,300	26	$0	$0	SI	$1,073,400
7	CC	72166599	OJEDA MANUEL	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC	72201933	PIEDRAHITA EDGAR	23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF07	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
9	CC	79554518	PULIDO LUIS	23020 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF07	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
10	CC	1045702422	RACEDO VANESSA	23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF07	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	SI	$396,800
11	CC	8764451	SARMIENTO ALVARO	23100 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF07	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	SI	$396,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: BOGOTÁ (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
12	CC	1015413086	MAYA OSCAR	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	1020834025	PULIDO MARIA	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(13)**					$29,125,967	$4,720,300			$29,125,967	$1,165,300			$29,125,967	$1,165,300			$29,125,967		$2,027,400		$0	$0		$9,078,300

8.2 Cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han presentado cesión y/o subcontrataciones del proyecto.

8.3 Desviación del contratista o la interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales

Entre el periodo de 16 de mayo al 15 de junio del 2025, no se han presentado cesión desviaciones por parte de la interventoría con relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades desarrolladas corresponden a la fase inicial de un proyecto de construcción, enfocadas principalmente en la preparación y adecuación del terreno. Se llevaron a cabo labores de desmonte, demolición y tala para liberar el área de intervención, seguidas de procesos de descapote, excavación, nivelación, trazado y replanteo, que permitieron definir correctamente el espacio para la cimentación. Posteriormente, se ejecutó el vaciado de concreto para la viga de cimentación y el relleno con material seleccionado, garantizando una base estructural estable. Adicionalmente, se realizó la instalación de un cerramiento perimetral en lámina de zinc, asegurando el área de trabajo. Estas actividades sientan las bases para el desarrollo estructural del proyecto, cumpliendo con los requerimientos técnicos y preparativos necesarios para avanzar hacia etapas constructivas posteriores.

En este periodo el contratista se encuentra en un avance por obra de, Urbanización La Playa, Juan Mina, y Los Muñecos con valor de 5.29 %

10 ANEXOS

10.1 CANTIDADES EJECUTADAS

PRESUPUESTO PARQUE LOS MUÑECOS

Producto	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidades
		CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES		
	1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	174.87
	1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	1,943.44
	1.04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	51.86
	1.09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	125.88
	1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	418.10
	1.15	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	62.25
	1.18	DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M	M2	157.30
	1.23	DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICIÓN FINAL	M2	166.59
	1.33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO.	UN	2.67
	1.39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	896.43
		CAPITULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA		
	2.01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	153.54
	2.02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	42.09
	2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	239.71
		CAPITULO ESTRUCTURA		
	3.01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	88.36
		CAPITULO - OTROS		
	10.14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	117.57

PRESUPUESTO PARQUE JUAN MINA

Producto	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidades
		CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES		
	1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	266.69
	1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	9,124.93
	1.04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	207.85
	1.06	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	68.67
	1.09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	243.85
	1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	463.67
	1.34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	1.33
	1.39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	6,785.94
		CAPITULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA		
	2.01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	153.54
	2.03	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	2,080.31
	2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	2,820.23
	2.08	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA	M3	120.53
		CAPITULO - OTROS		
	10.14	SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ	M2	141.33

PRESUPUESTO PARQUE URBA PLAYA

Producto	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidades
		CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES		
	1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	142.15
	1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	2,777.58
	1.04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	154.85
	1.06	DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL	ML	21.37
	1.09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	335.25
	1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	162.76
	1.15	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	153.23
	1.18	DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M	M2	265.49
	1.33	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO.	UN	2.67
	1.34	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	1.33
	1.39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	1,024.00
		CAPITULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA		
	2.01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	21.63
	2.02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	108.27
	2.03	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3	307.20
	2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	22.97
		CAPITULO ESTRUCTURA		
	3.01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	79.40

Se hace apertura a la bitacora de obra para el contrato LP-031-2024 Lote 3 de 2024.
Deacuerdo al formato de acta de inicio, codigo: MA-GC-F-003 de la alcaldia de Barranquilla D.E.I.P.
Se suscribio como fecha de inicio el dia 28 de mes de Mayo de 2025.

- Contratista: Consorcio Escenarios ED
  NIT: N°. 901.924.784-1
- Interventor: Empresa de desarrollo urbano de Barranquilla.
  EDUBAR S.A NIT: Nº 800.091.140-4
- Supervisor: Secretaria Distrital de obras publicas
  Profesional Especializado -
- objeto: Mejoramiento y construccion de parques publicos, canchas deportivas, Malecones, zonas verdes, y Boulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla (Fase VIII).

Plazo: El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de dieciocho (18) meses, contadas apartir de la suscripcion del acta de inicio del mismo, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
No obstante, la vigencia de financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2032, periodo dentro del cual permanecerán vigentes las obligaciones relativas al pago y cierre financiero del contrato, sin prejuicio de las demas obligaciones pos-contractuales exigibles al contratista.

Powered by CamScanner

28 de mayo de 2025 (Miercoles)

Personal
1 Residente
2 Ayudantes

Actividades:
* Demolicion de terrazas
* instalacion de listones para cerramiento
* instalacion de pendon informativo.

---

29 de mayo 2025 (jueves)

Personal
1 Maestro
1 oficial
1 Ayudante

Actividades
* Demolicion de anden dentro de obra.
* instalacion de listones de madera para cerramiento
* Demolicion de terrazas.

Powered by CamScanner

Viernes 30 de Mayo 2025
personal
1 Residente
1 Maestro
4 Ayudantes

Actividades.
* instalacion de madera para cerramiento perimetral

* Demolicion de anden dentro del area que sera la plazdeta y juego de niños

* Se continua la de molición de terrazas salientes (pisos de concreto y baldosa de arcilla grapilado)

Sabado 31 de Mayo 2025
Personal.
1 Residente
4 Ayudantes
1 Maestro.

Actividades.
* Se continua demolicion de terrazas salientes (pisos de concreto y baldosas de arcilla grapilados con granito)

* Desinstalacion de separadores de concreto.

Domingo 1 de junio 2025
Dia no laboral.

Powered by CamScanner

Lunes 02 de junio 2025
* Dia festivo no laboral.

Martes 03 de junio 2025
Personal
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes

Actividades.
* instalacion de cerramiento perimetral de obra.

* Retiro de Material RCD de obra.

* Visita de interventoria y la sra catalina: se realizo la revision de cotas de nivel y dimensiones del area en la zona de juegos infantiles. Se realizara unas actualizaciones en los planos debido a que se respetara el area actual del parqueadero existente.
* Desinstalacion e instalacion de pendon

Miercoles 04 de junio 2024

Personal
1 Residente
1 Maestro
2 Ayudantes.

Actividades.
* se continua instalacion de cerramiento perimetral.

* Retiro de Material RCD de obra.

* instalacion de pendon

Powered by CamScanner

Jueves 05 de junio 2025.

Personal
1 Residente
1 Maestro
4 Ayudantes

Actividades
* Colocacion de puntos coordenadas de area infantil

* Desinstalacion de castillo de madera con respaladero.

* Acarreo de material (gravilla) para acopio.

* Excavacion de orificios para madera de porton.

Viernes 06 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes

Actividades.
* Excavacion para viga de 30 x 30

* instalacion de listones para cerramiento.

* Desmonte de maquinas de biosaludables.

* Demolicion de placas de concreto en area biosaludable.

Powered by CamScanner

Sabado 7 de junio 2025

Personal.
1 Residente
1 Maestro
1 oficial
5 Ayudantes.

Actividades
* instalacion de cerramiento perimetral area Gym biosalu dable.
* Se continua la desinstalacion de maquina de Gym bio saludable.
* se continua demolicion de placas en concreto
* Construccion de portones y puertos para cacceso de obra
* Desinstalación de adoquines.
Nota: Se realiza la entrega al señor Luis ibarguen con cedula de ciudadania n° 72097032, pertenece al comited de convivencia y consiliacion de la junta de accion comunal.
Elementos: Maquinas de Gym biosaludables 5

72097032

Domigo 8 de junio 2024

* Dia no laboral.

Lunes 9 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Aux. SST
1 Maestro
1 oficial
5 Ayudantes

Actividades
* Desinstalacion de adoquines
* Construccion de base para figurar acero.
* Excavacion de viga 30x30
* Trazado de viga 30 x 30

Martes 10 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
5 Ayudantes

Actividades
Se realizo visita por parte de la interventoria para verificación de ejecución de actividades, además se realizo levantamiento de cantidades.

Nayeth V.

Se solicito socialización de obra, equipos de emergencia, botiquin sanitario y suministro dotación al personal.

Sandra Martinez
SST EDUBAR S.A

* Corte y figurado de acero para viga 30 x 30

Powered by CamScanner

* Excavaciones para rieles
* Demolicion de vigas 15 x 20 en area Biosalvolable.

Miercoles 11 de junio 2025

personal
1 Residente
1 Maestro
1 oficial
5 Ayudantes

Actividades.
* Figurado de acero para viga 30 x 30
* Excavaciones para colocacion de rieles
* arreglo de acometidas de agua potable de viviendas
* Arreglo de tuberia sanitaria
* Extension de material seleccionado.


Jueves 12 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Maestro
3 Ayudantes

Equipos y Maquinaria
- Compactador manual (Rana)

Actividades
* Excavaciones para colocacion de rieles
* Extension de material seleccionado.
- Visitor del Sr Edgar Mejia. Informa que la viga de 30 x 30 que esta frente a las viviendas queda de tal forma.

Bloque Abuzardado.

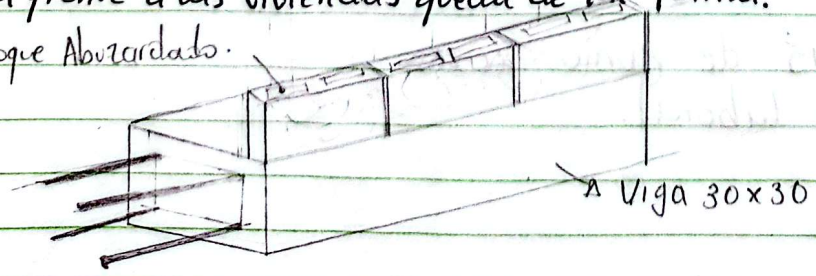

Powered by CamScanner

Viernes 13 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
4 Ayudantes

Actividades
* instalacion de veles para viga 30x30.
- lluvia a las 2:30 hasta las
* Excavacion viga 15 x 20
* Excavacion para conexion de punto de agua
* instalacion de punto hidrahulico

11

Sabado 14 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Maestro
2 Ayudantes

Actividades
* Excavacion de contenedores de raiz
* Excavacion viga de 15 x 20

Domigo 15 de junio 2025
* Dia no laboral.

Powered by CamScanner

Lunes 16 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Maestro
1 oficial
3 Ayudantes

Equipos y Maquinaria
- Mezcladora de concreto
- pulidora

Actividades
* Encofrado de viga 30 x 30
* Fundicion de viga de concreto (3000 psi) 30x30 para zona de juego infantil.

Martes 17 de junio 2025

personal
1 Residente
1 Maestro
1 oficial
5 Ayudantes

Equipos y Maquinaria
- Mezcladora de concreto
- pulidora

Actividades
* Encofrado para viga 30 x 30
* Fundicion de viga 30 x 30 en concreto de 3000psi
* Excavacion para contenedores de raiz

Powered by CamScanner

Miercoles 18 de junio 2025

Personal
1 Maestro
1 Oficial
1 Residente
5 Ayudantes

Equipos y Maquinaria
- Mezcladora de concreto
-

Actividades
* Encofrado de viga 30 x 30
* Fundicion de viga 30 x 30 en concreto
* Excavación de contenedores de raiz

Jueves 19 de junio 2025

Personal
1 Maestro
1 Residente.
4 Ayudantes

Equipos y Maquinaria
- Pulidora.

Actividades
* Corte y Figurado de acero. para contenedores de raiz
* Excavacion de contenedores de raiz.

Powered by CamScanner

Viernes 20 de junio 2025

Personal
1 Residente
1 Maestro
5 Ayudantes

Equipo y Maquinaria
- poliodora

Actividades.
* Excavaciones para contenedor de raiz.
* corte, armado y Figuraolo de acero.

Sabado 21 de junio 2025

Personal
1 Maestro
1 Resodente
6 Ayudantes

Equipo y Maquinaria
- Mezcladora de concreto

Actividades
* Fundicion de viga 30 x 30 para contenedo res de raiz
* Retiro de muterial RCD
* instalacion de dovelas

Domigo 22 de junio 2025
* Dia no laboral

Lunes 23 de junio 2025
* Dia no laboral (Festivo)

Powered by CamScanner

Iniciamos labores 15 de Mayo 2025.
Construccion de Cerramiento en lamina de Zinc.
Acometida de Agua Potable.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 operador.
1 oficial.
3 Ayudantes
1 Vigilante.

Ing. Evaristo Dominguez P.

16 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 oficial.
3 Ayudantes - 1 Vigilante.
Actividades.
Construccion de Cerramiento.
Descapote de la Cancha.
Demolicion de los Graderos.

Ing. Evaristo Dominguez P.

17 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
3 Ayudantes. - 1 Vigilante
Actividades.
Construccion de Cerramiento.
Descapote de la Cancha.
Demolicion de Graderios - Muros.
Acopio de Material Seleccionado.

18 de Mayo 2025. Domingo.
Personal. 1 Vigilante.

Ing. Evaristo Domínguez

19 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
3 Ayudantes.
1 Vigilante

Actividades.
Demolición Cadenas - Muros.
Recibo de Material Seleccionado.
Descapote de la Cancha.

Ing. Evaristo Domínguez P.

20 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 oficial.
3 Ayudantes
1 Vigilante

Actividades.
Colocación del Pendon.
Recibo de Material Seleccionado.
Demolición Cadenas - Muros - Cimientos.
Colocacion Primera Piedra.
Lluvias en el Sector.

Ing. Evaristo Domínguez P.

21 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes
1 Vigilante.

Actividades.
Demolicion Gradas - Muros - Cimientos.
Recibo de Material Seleccionado.
Descapote cancha de futball.

Ing. Evaristo Dominguez P.

22 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes
1 Vigilante.

Actividades.
Demolicion Gradas - Muros - Cimientos.
Recibo Material Seleccionado.
Descapote de la Cancha.

Ing. Evaristo Dominguez P.

23 de Mayo 2025.
Personal de Obra.
1 Ing. Residente
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes.

Fuertes Vientos.
Actividades.
Demolición Gradas - Cimientos - Muros.
Recibo de Material Seleccionado.
Encofrado de la Cancha.
Reparación Cerramiento.

Ing. Ernesto Domínguez P.

24 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 SST.
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes.
1 Vigilante
Actividades.
Demolición Gradas - Cimientos - Muros.
Recibo Material Seleccionado.
Desmonte de Marcos.

Ing. Ernesto Domínguez P.

25 de Mayo 2025. Domingo.
Personal 1 Vigilante

Ing. Ernesto Domínguez P.

26 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes
1 Vigilante

Actividades.
Demolición. Muros Perimetrales - Cimiento.
Descapote Zona de Camerinos.
Recibo Material Seleccionado.

Ing. Evaristo Domínguez P.

27 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes.
1 Vigilante.

Actividades.
Descapote Zona de Camerinos.
Recibo de Material Seleccionado.
Demolición Muros - Cimientos

Ing. Evaristo Domínguez P.

28 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes
1 Vigilante.

Actividades.
Recibo de Material Seleccionado.
Demolición Muros Perimetrales Cimientos

Ing. Evaristo Domínguez P.

29 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes.
1 Vigilante.

Actividades.
Demolición Muros Perimetrales.
Recibo de Material Seleccionado.
Reparación Camellón.

Ing. Eduardo Domínguez P.

30 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
4 Ayudantes.
1 Vigilante.

Actividades.
Visita Supervición de CO.PP.MM.
Demolición Muros Perimetrales.
Recibo Material Seleccionado.

Visita Supervición
Secretaría de Infraestructura.

Ing. Eduardo Domínguez P.

31 de Mayo 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Oficial.
4 Ayudantes
1 Vigilante.
1 SST.

Actividades.
Demolición Muros Perimetrales.
Recibo de Material Seleccionado.

Ing. Ernesto Domínguez P.

1 de Junio 2025 Domingo.
Personal 1 vigilante

Ing. Ernesto Domínguez P.

2 de Junio 2025. Lunes Festivo.
Personal 1 Vigilante

Ing. Ernesto Domínguez P.

3 de Junio '2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Oficial.
4. Ayudantes
1. Vigilante.

Actividades.
Demolición Cimientos de Gradas.
Recibo Material Seleccionado.

Ing. Ernesto Domínguez P.

4 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 SST.
1 oficial.
4 Ayudantes
1. Vigilante.

Actividades.
Demoliciones de Cimientos Losas.
Recibo de Material Seleccionado.
Inspeccionado Mon halls para conectar baños.

Ing. Ernesto Dominguez P.

5 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 oficial.
4 Ayudantes.
1 Vigilante

Visita 1 SST EDUBAR.

Actividades.
Demolición de Cimientos de Losas.
Recibo de Material Seleccionado.
Muros en todo el Sector de Juan Ling.

Ing. Ernesto Dominguez P.

6 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Oficial.
4 Ayudantes
1 Vigilante.

Actividades.
Demolición de Cimentación de Gradas.
Recibo de Material Seleccionado.
Visita Gerencia de Ciudad.
Sergio Perez.

Ing. Ernesto Domínguez P.

7 de Junio.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Topografo.
1 oficial.
4 Ayudantes.
Actividades.
Trazado de la Cancha.

Ing. Ernesto Domínguez P.

8 de Junio 2025. Domingo.

9 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Oficial
3 Ayudantes.

Actividades.
Demoliciones.
Recibo de Material Seleccionado
Topografia.

10 de Junio 2025.
10 Junio/25
Se realiza visita de inventario para verificación de actividades y toma de medidas de actividades en ejecución. Ver Anexo 4.
Se solicito instalación de señalización de obra, equipos de emergencia, punto ecológico, baterio sanitario, colocación del campamento y entrega dotación al personal.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Oficial.
3 Ayudantes.

Sandra Martinez
SST EDUBAR S.A

Ing. Ernesto Domínguez P.

10

11 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 oficial.
3. Ayudantes.

Actividades.
Demolición cimentación de Gradas.
Demolición. Muros de Cerramiento.
Recibo Material Seleccionado.
Visita. Interventoría. Infraestructura, Barranquilla.

Ing. Ernesto P. Domínguez P.

12 de Junio
Recibo de Material Seleccionado.
Excavaciones Zona Plazoleta.
Relleno con Material Seleccionado.

Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 oficial.
3. Ayudantes.
1 Vigilante.

Visita Gerencia de Ciudad.
Sergio Perez.

Ing. Ernesto Domínguez P.

13 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente. 1 SOCIAL.
1 SST
1 oficial. 1 Vigilante.
3 Ayudantes

Actividades
Recibo Material Seleccionado.
Llenado en todo el Sector de Juan Mina
Demoliciones Vigas Perimetrales.
Excavaciones Plazoletas.

Ing. Evaristo Domingo P.

14 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Oficial.
3. Ayudantes.
1. Vigilante.
1 Operador.
Actividades.
Recibo de Material Seleccionado.
Demoliciones. Vigas Perimetrales.
Excavaciones Plazoletas.
Rellenos con material Seleccionado.

Ing. Evaristo Domingo P.

15 de Junio 2025. Domingo.
1 Vigilante.

16 de Junio
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 Oficial.
1 Operador.
3. Ayudantes.
1 Vigilante.

Actividades.
Recibo Material Seleccionado.

Descapote.
Relleno Con material Seleccionado.
Excavaciones.

Ing. Evaristo Domínguez P.

17 de Junio 2025.
Personal en Obra.
2 Ing. Residente.
1 Oficial.
1 Operador.
3 Ayudantes.
1 Vigilante.

Actividades.
Recibo Material Seleccionado.
Rellenos Material Seleccionado.
Excavaciones.
Descapote.
Visita de la ADI se solicita Revición de Violación
Arquitecto. Edgar. de la ADI

Ing. Evaristo Domínguez P.

18 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
3 Operadores.
1 Oficial.
3. Ayudantes.
1. Vigilante.

Actividades.
Recibo de Material Seleccionado.
Excavaciones para Subbase.
Rellenos Con Material Seleccionado.

Compactación Subbases
Derrapote.

Ing. Ernesto Domínguez P.

19 de Junio 2025
Personal en Obra
1 Ing. Residente
2 Operadores
1 Oficial
3. Ayudantes
1 Vigilante

Actividades
Recibo Material Seleccionado.
Rellenos con Material Seleccionado.
Derrapote.
Compactación de Subbases.

Ing. Ernesto Domínguez P.

20 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
2 Operadores.
1 Oficial,
3. Ayudantes,
1 Vigilante.

Actividades.
Recibo de Material Seleccionado.
Rellenos con material Seleccionado.
Compactación de Subbases.

Ing. Ernesto Domínguez P.

21 de Junio 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 oficial
1 Operadpr.
3. Ayudantes.
1 Vigilante.

Actividades.
Recibo de Material Seleccionado.
Compactación de Subbase.
Rellenos con material Seleccionado.

Ing. Fausto Dom

22 de Junio 2025 Domingo.
1 Vigilante.

23 de Junio Feriado.
1 Vigilante Ing. Fausto Domingo

24 de Junio.
Personal en Obra.
1 Ing. Residente.
1 oficial.
1 operador.
2 Ayudantes
1 Vigilante.

Actividades.
Lluvias en todo el Sector de Juan Tinoco

Ing. Fausto Doming

25 de Junio. 2025.
Personal en Obra.
1 Ing. Director.
1 Ing. Residente.
1 Operador.

1 Ayudante.
1 Topografo.
Actividades. Retiro de Aguas Lluvias.
Reunion. 9:00 Am.
Edgar Mejia. ADI
Rita Cabana. Obra Publica.
Armando Murillo. Obra Publica.
Greg Manjarrez EQUIBAR.
Edgar Piedrahita Contratista. CONCHA.
Edwin Nieto, Contratista. VIAS.
Verificacion de Trazados y Niveles.

Ing. Evaristo Dominguez R.

26 de Junio 2025.
1 Ing. Residente.
1 Operador.
1 Oficial.
1 Ayudante.
1 SST.

Actividades:
Recibo de Material Seleccionado.
Compactacion de Subbase.
Rellenos Con material Seleccionado.
Recibir Concreto por Fraguado de Via.
Visita Gerencia de Ciudad.
Sergio Perez.

Ing. Evaristo R. Dominguez R.

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE JUAN MINA CORTE								
ESTACION		AREAS (M2)	DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00		34,07		0,00	0,00	0,00		
0+020,00		34,44		20,00	688,80	688,80		
0+040,00		34,39		20,00	687,80	1376,60		
0+060,00		34,69		20,00	693,80	2070,40		
0+080,00		34,28		20,00	685,60	2756,00		
0+091,30		32,25		11,30	364,46	3120,46		

TOTAL VOLUMEN CORTE	**3120,46**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

MOVIMIENTO DE TIERRA PARQUE JUAN MINA RELLENO								
ESTACION		AREAS (M2)	DISTANCIA		VOLUMENES (M3)		RELLENO	
	RELLENO	CORTE	RELLENO	CORTE	CORTE	CORTE ACUMULADO	RELLENO	RELLENO ACUMULADO
0+000,00	46,24		0,00				0	0
0+020,00	46,58		20,00				931,60	931,60
0+040,00	46,47		20,00				929,40	1861,00
0+060,00	46,51		20,00				930,20	2791,20
0+080,00	46,45		20,00				929,00	3720,20
0+091,30	45,15		11,30				510,15	4230,35

TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN	**4230,35**	**M3**
COEFICIENTE DE EXPANSION	**1,20**	

EDGAR JAVIER BLANCO LINERO.
T.P. 01-17145 del **C.P.N.T**
TOPOGRAFO PROFESIONAL

Fabio Ruiz Bolivar
N° = 08202-3373326 ATL
COPNIA

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS S.A.S	CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION	FECHA: 11/12/2024
		NIVEL AUTOMATICO
		N°. DIC2024-941

NA-941

Cliente: ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S **CC/NIT:** 900583541-9

Dirección: CALLE 76B No. 42F-122, OF 35, BARRANQUILLA **Télefono:** 3205557886

Email: jeison.a.js@gmail.com

Fecha recomendada prox. Ajuste: 10/06/2025

IMPRESO 11/12/2024

Datos Equipo

Marca: LUFKIN **Modelo:** LUFKIN 20X **Serie:** 5M537G

Aumento telescopio o Magnificador: **20X**

Ajustes realizados

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Códigos 1. Optimo 2. Corregida o Aplicada 3. No corregida 4. No aplica

Limpieza exterior	2
Mantenimiento interno	1
Mantenimiento y/o Ajuste del compensador	1
Ajuste nivel circular	2
Ajuste sistema de enfoque	1
Ajuste retículo	2
Ajuste colimación	2
Ajuste mirilla de punteria	2
Verticalidad	1
Mantenimiento base nivelante	2
Tornillo movimiento lento	1
Revision display/teclado	4

ASB EQUIPOS TOPOGRÁFICOS S.A.S

Ajuste en colimador

Descripción		Tolerancia	Error	Descripción		Tolerancia	
Rango de compensación		± 15'	<30"	Verticalidad		<20"	<10"
Nivel circular		<5'	<5'	Línea de visión		<5"	<5"
Lectura 1-1	18,00	cm	Lectura 1-2	17,80	cm	1mm	0,20
Lectura 2-1	18,00	cm	Lectura 2-2	18,00	cm	1mm	0,00

Se ejecutan los procesos de ajuste y pruebas de acuerdo a los parámetros técnicos de precisión establecidos por el fabircante, y que este se encuentra en optimas condiciones para ejecutar trabajos.

El procedimiento de ajuste y verificación realizado al equipo contará con una garantía de un (1) mes, posterior a la revisión y corrección del error obtenido, previendo que este no se deba a defectos o daños físicos del equipo.

Patrones utilizados: Estación total KOLIDA KTS-442UT serie K169413, nivel KOLIDA KL-C32 serie X242212

Realizó

Andrés Santiago Bolívar
Técnico Especializado

CALLE 72 No. 66-173, OF 211 323-4065020
asbequipostopograficos@gmail.com
ASB_equitop ASB Equipos Topográficos
Barranquilla - Atlántico

ASB EQUIPOS TOPOGRÁFICOS S.A.S	CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACION	FECHA: 11/12/2024 ESTACION TOTAL N°. NOV2024-751

Cliente: ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S **CC/NIT:** 900583541-9

Dirección: CALLE 76B No. 42F-122 OF 35, BARRANQUILLA **Télefono:** 3205557886

Email: jeison.a.js@gmail.com

ET-751

Fecha recomendada prox. Ajuste: 10/06/2025

Datos del Instrumento

Marca: SOUTH **Modelo:** N6+ **Serie:** S160950

Precisión: 2" **Aumento telescopio o Magnificador:** 30X

Ajustes realizados

Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Códigos 1. Optimo 2. Corregida o Aplicada 3. No corregida 4. No aplica

Limpieza exterior	2	Plomada óptica o laser	2
Mantenimiento interno	1	Mantenimiento base nivelante	2
Ajuste del compensador	1	Tornillos movimineto lento Hz-V	1
Ajuste nivel tubular y/o circular	2	Chequeo teclado y/o display	1
Ajuste sistema enfoque	1	Ajuste mirillas puntería	2
Ajuste retículo	2	Ajuste distanciómetro	2
Ajuste verticalidad	1	Ajuste infrarrojo o laser con respecto al retículo	1
Ajuste de colimación	2		

Datos logrados en comprobación inicial del instrumento

Referencia	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Residuo	Guía	Error
Horizontal	0° 00' 00"	180° 00' 17"	0,0002"	00° 00' 15"	180° 00' 00"	0° 00' 00"
Vertical	90° 00' 00"	270° 00' 13"	0,0002"	00° 00' 11"	360° 00' 00"	0° 00' 00"
Distancia	4,547	18,577	± 0,001	0,004/0,007	4,543/18,583	0,001

Ajuste en colimador

Descripción	Tolerancia	Error	Descripción	Tolerancia	Error
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<10"	<5"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5"	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	<1mm
Colimación horizontal	<10"	<5"			

Se ejecutan los procesos de ajuste y pruebas de acuerdo a los parámetros técnicos de precisión establecidos por el fabircante, y que este se encuentra en optimas condiciones para ejecutar trabajos.

El procedimiento de ajuste y verificación realizado al equipo contará con una garantía de un (1) mes, posterior a la revisión y corrección del error obtenido, previendo que este no se deba a defectos o daños físicos del equipo.

Patrones utilizados: Estación total KOLIDA KTS-442UT serie K169413, nivel KOLIDA KL-C32 serie X242212

Realizó

Andrés Santiago Bolívar
Técnico Especializado

CALLE 72 No. 66-173, OF 211 323-4065020
asbequipostopograficos@gmail.com
ASB_equitop ASB Equipos Topográficos
Barranquilla - Atlántico

IMPRESO 11/12/2024

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

DENSIDADES - MEDIANTE METODOS NUCLEARES INV - E - 164 - 2013

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)

EMPRESA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

DESCRIPCIÓN: Terraplen Material Seleccionado (Caliche) **UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO** **FECHA: 12-6-2025**

% De Humedad optima laboratorio 11,3 **Densidad maxima seca laboratorio (lb/pie 3)** 119,5

Densidad No	1	2	3	4
Ubicacion	Parque Cancha de Futbol de Juan Mina	Parque Cancha de Futbol de Juan Mina	Parque Cancha de Futbol de Juan Mina	Parque Cancha de Futbol de Juan Mina
Profundidad en cm	15	15	15	15
Densidad Humeda (lb/pie 3)	119,1	119,8	120,1	121
Densidad Seca (lb/pie 3)	114,2	116,8	117,9	119,1
% De Humedad	7,1	6,8	8,4	6,9
% De Compactacion Terreno	95,1	95,8	97,4	98,7
% De Compactacion Especificada	95	95	95	95

OBSERVACIONES:

LUIS BARRAZA M.
TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

DENSIDADES - MEDIANTE METODOS NUCLEARES INV - E - 164 - 2013

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)

EMPRESA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

DESCRIPCIÓN: Terraplen Material Seleccionado (Caliche) **UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO** **FECHA: 20-6-2025**

%De Humedad optima laboratorio 11,3 **Densidad maxima seca laboratorio (lb/pie 3)** 119,5

Densidad No	1	2		
Ubicacion	Parque Los Muñecos	Parque Los Muñecos		
Profundidad en cm	15	15		
Densidad Humeda (lb/pie 3)	119,7	119,9		
Densidad Seca (lb/pie 3)	117,4	118,8		
%De Humedad	6,7	5,9		
%De Compactacion Terreno	95,8	96,1		
%De Compactacion Especificada	95	95		

OBSERVACIONES:

LUIS BARRAZA M.
TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

DENSIDADES - MEDIANTE METODOS NUCLEARES INV - E - 164 - 2013

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)

EMPRESA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

DESCRIPCIÓN: Terraplen Material Seleccionado (Caliche) **UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO** **FECHA: 20-6-2025**

% De Humedad optima laboratorio 11,3 **Densidad maxima seca laboratorio (lb/pie 3)** 119,5

Densidad No	1	2		
Ubicacion	Parque Los Muñecos	Parque Los Muñecos		
Profundidad en cm	15	15		
Densidad Humeda (lb/pie 3)	119,7	119,9		
Densidad Seca (lb/pie 3)	117,4	118,8		
% De Humedad	6,7	5,9		
% De Compactacion Terreno	95,8	96,1		
% De Compactacion Especificada	95	95		

OBSERVACIONES:



LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.045.687.255



Apellidos
RUIZ BOLIVAR

Nombres
FABIO ENRIQUE

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.70	M

Fecha de nacimiento
15 MAR 1990

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Fecha y lugar de expedición
28 MAR 2008, BARRANQUILLA

Firma

Fecha de expiración
02 SEPT 2032

Powered by CamScanner

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
08202-337326 ATL
Fecha de Expedición: **12/08/2016**

Nombre:
FABIO ENRIQUE
RUIZ BOLIVAR
Cédula:
C.C. 1045687255
Profesión:
INGENIERO CIVIL

Institución:
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA



Escaneado con CamScanner
