REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME TECNICO MENSUAL DE OBRA No. 03
PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2025

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

INDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCION 5
2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 6
2.1 Localización del Proyecto. 6
2.2 Obras Contempladas en el Proyecto 8
3 ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO 10
3.1 Información contractual 10
3.2 Garantías constituidas por el contratista 10
3.3 Ejecución del contrato 11
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO 12
4.1 Seguimiento de avance del contrato 12
4.2 Relación de actividades ejecutadas 12
4.3 Gestión social 15
4.3.1 Información, divulgación y participación comunitaria 16
4.3.2 PGS, Infraestructura de predios. 17
4.3.3 PGS, sostenibilidad social 18
4.3.4 PGS, Política de empleo. 19
4.3.5 PGS atención a la comunidad 19
4.3.6 Conclusiones 20
4.4 Control de personal de obra 20
4.4.1 Contratista 20
4.5 Solicitudes entre contratista e interventoría 21
4.6 Requerimientos efectuados 21
4.7 Pagos de tributos 22
4.8 Gestiones realizadas con empresas de servicio publico 22
5 ASPECTOS TECNICOS 23
5.1 Plano récord 23
5.2 Análisis de precios y actividades no previstas 23
5.3 Control de los equipos 23
5.4 Pruebas y resultados 23
5.5 Evidencias fotográficas 23
5.6 Cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad 36
6 ASPECTOS AMBIENTALES 37

6.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. 37
6.1.1 Objetivo general 37
6.1.2 Objetivos específicos: 37
6.1.3 Actividades ejecutadas durante el periodo 37
6.1.4 Identificación de peligros y riesgo 37
6.1.5 Seguridad social 38
6.1.6 Uso y entrega de epp 38
6.1.7 Inspecciones y equipos de emergencia 38
6.1.8 Accidentalidad 39
6.1.9 Preoperacionales de máquinas, equipo herramientas manuales y de poder 39
6.1.10 Servicios de higiene – orden y aseo 40
6.1.11 Señalizaciones 40
6.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental 41
6.2.1 Cumplimiento Legal y Contractual Ambiental 41
6.2.2 Manejo Ambiental en Obra 41
6.2.3 Manejo de Residuos Sólidos 41
6.2.4 Campamentos e Instalaciones Temporales 41
6.2.5 Contaminación Atmosférica y Ruido 42
6.2.6 Manejo de Aguas Residuales 42
6.2.7 Manejo de Maquinaria 43
6.2.8 Manejo de Vegetación 43
7 ASPECTO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 44
7.1 Resumen del manejo del anticipo y estado de la amortización 44
7.2 Resumen sobre el rendimiento financiero del anticipo. 44
8 ASPECTOS LEGALES 45
8.1 Aporte a seguridad social y parafiscales 45
8.2 Cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación 45
8.3 Desviación del contratista o la interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 45
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46
10 ANEXOS 47
10.1 Cantidades ejecutadas 47

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Áreas totales de parques intervenidos 7
Tabla 2. Información del contrato. 10
Tabla 3. Información de pólizas. 10
Tabla 4. Cobertura de pólizas. 11
Tabla 5. Información del presente Acta #3. 11
Tabla 6. Divulgación y participación comunitaria. 16
Tabla 7. Asistencia a socialización de proyecto. 17
Tabla 8. Tipos de predios. 18
Tabla 9. Conformación comité de participación comunitaria. 19
Tabla 10. Relación inclusión de personal. 19
Tabla 11. Relación de puntos de atención a la comunidad. 20
Tabla 12. Relación de quejas y/o reclamos. 20
Tabla 13. Personal del contratista. 21
Tabla 14. Comunicaciones entre contratista e interventoría. 21
Tabla 15. Comunicaciones entre contratista y Distrito 21
Tabla 16. Información de maquinaria y equipos 23

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa del departamento del Atlántico. 6
Figura 2. Mapa de Barranquilla y su área Metropolitana. 8
Figura 3. Socialización de inicio de obra. 17
Figura 4. Actas de vecindad. 18
Figura 5. Evidencia fotográfica de actividades ejecutadas. 36
Figura 6. Uso de EPP. 38
Figura 7. Equipos de emergencias. 39
Figura 8. Activaciones. 39
Figura 9. Manejo de aguas residuales. 40
Figura 10. Señalizaciones. 40
Figura 11. Campamento e instalaciones temporales. 42
Figura 12. Cerramiento. 42
Figura 13. Manejo de aguas residuales. 43
Figura 14. Planilla de aporte a seguridad social y parafiscales. 45

1 INTRODUCCION

Como es ya conocido, el Distrito de Barranquilla cuenta aproximadamente con 320 espacios entre parques, plazoletas, bulevares, zonas verdes, que representan un total de 1.755.672 m2 de área, con aproximadamente un 60% de áreas duras, lo cual, ha impactado positivamente con respecto a años anteriores la vulnerabilidad ante el cambio climático, creando una red verde que permite la mejora en el medioambiente, en el paisajismo que tienen los parques y además, incentiva aspectos como la práctica del deporte, la integración de las familias y comunidades enteras.

Se hace necesario que se sigan construyendo e interviniendo esta clase de espacios para lograr fortalecer a Barranquilla como una ciudad amigable con el medio ambiente, alineándose con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está propendiendo la Agenda Mundial 2030, especialmente su objetivo de prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Busca implementar medidas en los territorios que minimicen los efectos del cambio climático de acuerdo con las necesidades propias. Con el objetivo de transformar los espacios públicos en áreas de recreación, encuentro y esparcimiento, esta iniciativa busca no solo embellecer la ciudad, sino también mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, consideró necesario y oportuno la celebración de un contrato para llevar a cabo la séptima fase de ejecución de las obras correspondientes al mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores de la ciudad.

Este proyecto no solo se trata de plantar árboles y construir juegos, sino de diseñar espacios inclusivos que reflejen la diversidad y la identidad cultural de Barranquilla. Desde la selección de especies vegetales autóctonas hasta la instalación de infraestructuras para personas con movilidad reducida, cada detalle se cuidará meticulosamente para garantizar que los parques sean accesibles y acogedores para todos.

En resumen, la ejecución de los parques en el Distrito de Barranquilla no solo transformará el paisaje urbano, sino que también promoverá la cohesión social, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible. Es un paso crucial hacia una ciudad más verde, más saludable y feliz para las generaciones presentes y futuras.

2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Lote 4 por parte de CONSORCIO ESCENARIO EP, en el periodo comprendido del 16 de julio de 2025 al 15 de agosto de 2025, durante el desarrollo de las actividades contenidas en Contrato de Obra No. **LP-031-2024 LOTE 4** que tiene por objeto el **MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).**

2.1 Localización del Proyecto.

El proyecto de MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). Se encuentra localizado dentro de cuatro de las cinco localidades del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Siendo estas:

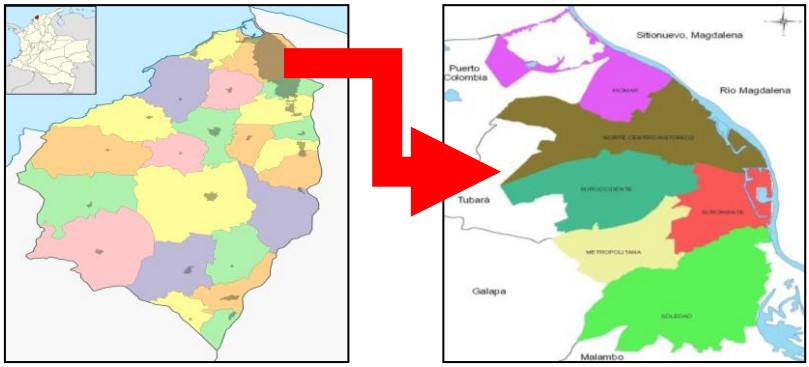


Figura 1. Mapa del departamento del Atlántico.

- **Sur Oriente:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con la carrera 38, al suroriente con el río Magdalena, al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo y al sur con los límites del municipio de Soledad.

- **Sur Occidente:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38, al suroriente con la acera oeste de la vía de la Cordialidad. Al este con la acera oeste de la calle Murillo y al sur occidente con los límites del municipio de Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina.
- Metropolitana: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al suroriente con la acera este de la vía de la Cordialidad empalmando con la acera oeste de la calle Murillo (45) con carrera 21. Al suroeste con la avenida de la Circunvalar. Incluye zonas de expansión urbana y rural.

- **Riomar:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con río Magdalena, al occidente con los límites del municipio de Puerto Colombia, al sur con la acera norte de la carrera 46- Autopista Paralela al Mar hasta la calle 84, y al oriente de la carrera 46 con calle 84 siguiendo hasta la calle 82 y la calle 84, finalizando en el río Magdalena. Incluye zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de La Playa.

- **Norte- Centro Histórico:** Al nororiente con el río Magdalena; al norte con la acera sur de la carrera 46 autopista el mar hasta la calle 84, siguiendo hasta la calle 82 con carrera 64 hasta empalmar con el río Magdalena, y al occidente con la avenida la Circunvalar, incluyendo zona de expansión urbana y rural.

A continuación, se presenta la distribución de los parques a intervenir dentro del Distrito de Barranquilla, según el contrato No. LP-031-2024 LOTE 4.

Tabla 1. Áreas totales de parques intervenidos

LOTE 4	1	PARQUE CIUDAD MODESTO	1.411,13 m^2
	2	PARQUE JHON JAIRO HURTADO	5.139,98 m^2
	3	PARQUE LA NORIA MALECON	36.973,27 m^2
	4	PARQUE PLAZA AGUILA	8.887,4 m^2

La siguiente imagen, se encuentra la ubicación en KMZ de los parques priorizados por la Alcaldía de Barranquilla a la fecha:

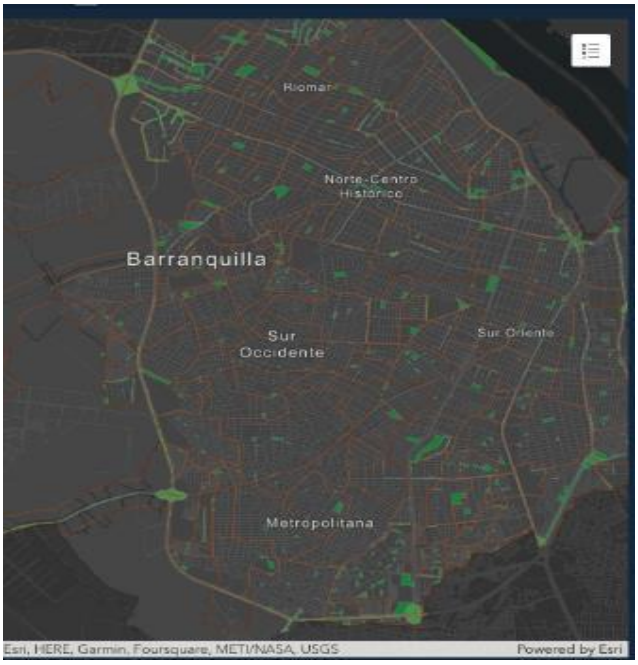


Figura 2. Mapa de Barranquilla y su área Metropolitana.

2.2 Obras Contempladas en el Proyecto.

- **Parque Ciudad Modesto:**

  - Construcción de andenes.
  - Instalación de grama sintética.
  - Construcción de zona de juegos infantiles.
  - Construcción de cicloruta.
  - Siembra de paisajismo.
  - Construcción de plazoletas.
  - Instalación de bolardos.

- **Parque Jhon Jairo Hurtado:**
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, gradas, bordillos,
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido
  - Columnas en concreto
  - Levante en bloque estructural y abuzardado
  - Construcción de cárcamos
  - Construcción de registros

- Construcción de alfajías
- Instalación de grama sintética
- Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

- **Parque La Noria Malecón:**
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, bordillos,
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido
  - Levante en bloque estructural y abuzardado
  - Construcción de cárcamos
  - Construcción de registros
  - Construcción de alfajías
  - Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

- **Parque Plaza Águila:**
  - Demolición de jardineras, placas en concreto, vigas de cimentación, bordillos,
  - Excavación a maquina
  - Relleno de material seleccionado
  - Construcción de vigas de amarre y cimiento
  - Instalación de concreto fluido
  - Levante en bloque estructural y abuzardado
  - Construcción de cárcamos
  - Construcción de registros
  - Construcción de alfajías
  - Instalación de mobiliarios, biosaludables y juegos infantiles

3 ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO

3.1 Información contractual

A continuación, se muestra aspectos generales del contrato:

Tabla 2. Información del contrato.

CONTRATO DE OBRA N°:	LP-031-2024 LOTE 4
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ – ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS EP
NIT	901.924.784
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).
PLAZO	16 MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2026

3.2 Garantías constituidas por el contratista

A continuación, se muestra las pólizas adquiridas:

Tabla 3. Información de pólizas.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO	400062962
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	400062958
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
FECHA DE EXPEDICIÓN POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	24/04/2025
FECHA DE EXPEDICION RESPONSABILIDAD CIVIL	31/03/2025

A continuación, se muestra la cobertura de las pólizas adquiridas:

Tabla 4. Cobertura de pólizas.

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/03/2025	27/01/2027	$ 2.418.564.565,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/03/2025	27/09/2029	$ 4.837.129.130,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	27/09/2026	27/09/2026	$ 7.255.693.695,60
CALIDAD DEL SERVICIO	27/03/2025	27/09/2027	$ 2.418.564.565,20

3.3 Ejecución del contrato

A continuación, se muestra la información generar de las actas cobradas:

Tabla 5. Información del presente Acta #3.

ACTA PARCIAL	FECHA	VALOR	SALDO
			$ 23,366,813,871.00
Acta de recibo Parcial No.1	15 de junio 2025	$ 837,863,161.29	$ 22,528,950,709.71
Acta de recibo Parcial No.2	15 de julio 2025	$ 940,746,700.53	$ 21,588,204,009.18
Acta de recibo Parcial No.3	15 de agosto 2025	$ 1,333,326,080.43	$ 20,254,877,928.75

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

4.1 Seguimiento de avance del contrato

Teniendo en cuenta el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se tuvo un avance de obra ejecutado de 7.87 % frente a un 5.46% de avance de obra programado. Donde por cada parque en ejecución durante este periodo de tiempo se tiene los siguientes porcentajes de ejecución:

- **Parque Ciudad Modesto:** 8.53 % avance ejecutado real vs 8.35 % avance ejecutado programado.
- **Parque Jhon Jairo Hurtado:** 13.68 % avance ejecutado real vs 13.76 % avance ejecutado programado.
- **Parque La Noria Malecón:** 2.54 % avance ejecutado real vs 2.87 % avance ejecutado programado.
- **Parque Plaza Águila:** 8.23 % avance ejecutado real vs 8.86 % avance ejecutado programado.

4.2 Relación de actividades ejecutadas

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se han ejecutado las siguientes actividades en cada parque:

- **Parque Ciudad Modesto:**
  - Suministro e instalación de cerramiento en lamina de zinc, altura 2.00 metros (ver diseño)
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
  - Demolición de vigas de cimentación
  - Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m
  - Demolición de bordillo y retiro de material
  - Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta
  - Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante
  - Relleno en material seleccionado compactado (caliche)
  - Mejoramiento de terreno en suelo cemento 1:20 compactado
  - Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2”, estribos de 3/8" a cada 0.20 mts
  - Viga de amarre en concreto de 3000 psi de 0.15 x 0.20 metros, incluye acero de refuerzo 2 varillas d = 3/8", estribos d = 1/4" a cada 0.20 metros.
  - Acero de refuerzo figurado
  - Zapata en concreto premezclado de 4000 psi.
  - Anclaje epóxido para varillas de muros, vigas, columnetas diámetros entre 1/2" y 5/8”, incluye perforación y epóxido.

- Corte y sello de juntas para zonas de andenes, canchas, pisos estampados, sendero de trote, pistas y zonas expuestas al tráfico.
- Placa en concreto de 3000 psi e: 0,10 mts incluye malla electrosoldada.
- Levante de muro en bloque abuzardado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de pega 1:4.
- pañete allanado sobre muro con mortero 1:4
- Suministro, transporte e instalación de tableta guía y táctil de 20*20 para andenes según mep.
- Levante en bloque estructural abuzardado de cemento, de 20 x 20 x 40 mt, con celdas rellenas en concreto de 3000 psi, mortero de pega 1:4, no incluye acero de refuerzo
- Impermeabilización con igasol
- Alquiler de baño portátil
- Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, dimensión variable entre 0.15 x (0.30 - 0.50) metros, incluye 5 varillas de 3/8", estribos de 1/4" a cada 0.20 metros (ver diseño).
- Construcción de placa en concreto de 3000 psi, para pisos estampadas de color, de 10 cm de espesor promedio, reforzadas con malla electrosoldada, incluye suministro e instalación de plástico de calibre 6 para separación (no incluye corte y sello de juntas).

- **Parque Jhon Hairo Hurtado:**
  - Suministro e instalación de cerramiento en lamina de zinc, altura 2.00 metros (ver diseño)
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
  - Demolición de jardineras y retiro de materiales
  - Demolición de vigas de cimentación
  - Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m
  - Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta
  - Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante
  - Relleno en material seleccionado compactado (caliche)
  - Estabilización de suelo con material pétreo tipo rajón - o piedra ciclopea
  - Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts
  - Acero de refuerzo figurado
  - Zapata en concreto premezclado de 4000 psi.
  - Corte y sello de juntas para zonas de andenes, canchas, pisos estampados, sendero de trote, pistas y zonas expuestas al tráfico.
  - Solado en concreto 2500 psi, e=0,05
  - Placa en concreto de 3000 psi e: 0,10 mts incluye malla electrosoldada.
  - Levante de muro en bloque abuzardado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de pega 1:4.

- Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4
- Impermeabilización con igasol
- Alquiler de baño portátil
- Viga de confinamiento en concreto de 3000psi de 0,2x0,20 metros, incluye acero de refuerzo 4 varilla d = 3/8", estribos d= 3/8" a cada 0,20 metros
- Construcción de placa en concreto de 3000 psi, para pisos estampadas de color, de 10 cm de espesor promedio, reforzadas con malla electrosoldada, incluye suministro e instalación de plástico de calibre 6 para separación (no incluye corte y sello de juntas).

- **Parque Plaza Águila:**
  - Suministro e instalación de cerramiento en lamina de zinc, altura 2.00 metros (ver diseño)
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
  - Demolición de vigas de cimentación
  - Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta
  - Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante
  - Excavación a máquina y retiro de material a lugar certificado
  - Relleno en material seleccionado compactado (caliche)
  - Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts
  - Acero de refuerzo figurado
  - Zapata en concreto premezclado de 4000 psi.
  - Solado en concreto 2500 psi, e=0,05
  - Suministro e instalación de cerramiento provisional con perfil de 100 mm x 50 mm calibre 14 galvanizado lamina de superboard de 6 mm altura 2,4 metros con base en concreto incluye excavación, perfiles a cada 1,2 metros
  - Suministro e instalación de cerramiento provisional cerramiento con perfil de 100 mm x 50 mm calibre 14 galvanizado lamina de zinc de altura 2,4 metros con base en concreto incluye excavación, perfiles a cada 1,2 metros
  - Desmonte de losetas incluye retiro de material
  - Alquiler de baño portátil
  - Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, dimensión variable entre 0.15 x (0.30 - 0.50) metros, incluye 5 varillas de 3/8", estribos de 1/4" a cada 0.20 metros (ver diseño).
- **Parque La Norya:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
  - Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m
  - Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente, incluye retiro de material e= 0.25
  - Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta
  - Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante
  - Relleno en material seleccionado compactado (caliche)

- Viga de amarre en concreto de 3000 psi de 0.15 x 0.20 metros, incluye acero de refuerzo 2 varillas d = 3/8", estribos d = 1/4" a cada 0.20 metros.
- Suministro e instalación de cerramiento provisional con perfil de 100 mm x 50 mm calibre 14 galvanizado lamina de superboard de 6 mm altura 2,4 metros con base en concreto incluye excavación, perfiles a cada 1,2 metros
- Suministro e instalación de cerramiento provisional cerramiento con perfil de 100 mm x 50 mm calibre 14 galvanizado lamina de zinc de altura 2,4 metros con base en concreto incluye excavación, perfiles a cada 1,2 metros
- Desmonte de losetas incluye retiro de material
- Alquiler de baño portátil

- **Parque Barlovento:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
- **Parque La Piñuela:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
- **Parque San Salvador:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
- **Parque Siape:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
- **Parque Puente Carrera 38:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
- **Parque Los Enamorados:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.
- **Parque Los Músicos:**
  - Levantamiento topográfico incluye localización, nivelación y replanteo.

4.3 Gestión social

El Plan de Gestión Social es un instrumento diseñado para plantear acciones que permitan prevenir, reducir, mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución del CONTRATO: No. LP-031-2024 Lote 4° cuyo objeto es “Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. Fase VIII”. En él están planteadas las recomendaciones que se deben atender para el manejo adecuado y la mitigación de los impactos sociales causados en la comunidad por la obra.

Con su implementación el contratista ha mantenido la adecuada interlocución con los grupos de interés, generando sentido de pertenencia, apropiación y corresponsabilidad por parte de la comunidad con respecto a la obra y su producto final. Las acciones desarrolladas desde la implementación del Plan de Gestión Social tienen un enfoque participativo logrando de este modo el fortalecimiento del tejido social. Las actividades de este programa de gestión social se desarrollan con el seguimiento y acompañamiento de la interventoría y líderes sociales de los sectores beneficiados.

El presente documento corresponde al informe mensual de Gestión Social periodo comprendido entre el 16 de julio al 15 de agosto de 2025, el cual se estructura de acuerdo con las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social (PGS). Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a cada uno de los programas relacionados a continuación:

- Componente de Atención a la Comunidad
- Componentes de Información y Divulgación.
- Componentes de Manejo de la Infraestructura de Predios y servicios públicos.
- Componentes de Participación Comunitaria.
- Componentes de Contratación de Mano de Obra
-

A continuación, se describen de manera detallada las actividades y resultados obtenidos durante la ejecución del Plan de Gestión Social, en cada uno de los ejes de intervención antes mencionados.

4.3.1 Información, divulgación y participación comunitaria

4.3.1.1 Instalación Punto de Atención a la comunidad -PAC

Tabla 6. Divulgación y participación comunitaria.

DIVULGACIÓN PRD CIUDAD MODESTO				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
Mayo 16 al 15 de junio de 2025	Se atendiò el PAC en su horario establecido, los dìas martes y jueves de los meses de mayo y junio de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atencion del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

DIVULGACIÓN PRD PLAZA AGUILA				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
Mayo 16 al 15 de junio de 2025	Se atendiò el PAC en su horario establecido, los dìas lunes y miercoles de los meses de mayo y junio de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atencion del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

DIVULGACIÓN PRD JHON JAIRO HURTADO				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
Mayo 16 al 15 de junio de 2025	Se atendiò el PAC en su horario establecido, los dìas martes y jueves de los meses de mayo y junio de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atencion del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

4.3.1.2 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Con el objetivo de suministrar a la comunidad de influencia directa y autoridades municipales, información directa, clara y oportuna sobre los impactos y manejos socio-ambientales del Proyecto y los aspectos técnicos que puedan ser del interés de la comunidad o las autoridades municipales se realizaron reuniones informativas para la socialización del inicio de obra en los siguientes frentes:

Tabla 7. Asistencia a socialización de proyecto.

FRENTE DE OBRA	FECHA DE REUNIÓN	N°. DE ASISTENTES
Jhon Jairo Hurtado	13/05/25	35
Ciudad Modesto	13/05/25	45
Plaza Aguila	21/05/25	26
La Noria	Por confirmar fecha de reunión	



Figura 3. Socialización de inicio de obra.

Con la socialización de las actividades del inicio de la obra se logró promover la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre el proyecto, como la elección del comité de participación comunitaria con el fin de informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto, el alcance, actividades, impactos, y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos.

Así mismo se brindó información amplia sobre los canales de comunicación dispuestos para la atención a la comunidad (línea telefónica o dirección de correo electrónico) para que los ciudadanos puedan expresar sus inquietudes o sugerencias relacionadas con el proyecto en tiempo real y proponer estrategias o recomendaciones basadas en el análisis de las PQRS y los datos sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad.

4.3.2 PGS, Infraestructura de predios.

Con el fin de dejar evidencia del estado físico de los predios colindantes con la obra se realizó el levantamiento de las actas de vecindad inicial en los siguientes frentes de obra:

Tabla 8. Tipos de predios.

SECTORES	TIPOS DE PREDIOS					TOTAL PREDIOS	FIRMADA	POR FIRMAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
	RESIDENCIAL	COMERCIAL	MIXTO	RECREACIONAL	INSTITUCIONAL				
Ciudad Modesto	15	0	0	0	0	15	15	0	100%
Jhon Jairo Hurtado	22	0	2	0	0	24	24	0	100%
Plaza Aguila	15	0	0	0	0	15	15	0	100%
TOTAL	**52**	**0**	**2**	**0**	**0**	**54**	**54**	**0**	**100%**



Figura 4. Actas de vecindad.

4.3.3 PGS, sostenibilidad social

Con el objetivo de viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social, de manera que se apliquen adecuadamente las medidas preventivas y correctivas de acuerdo con los impactos de la obra y de este modo garantizar su sostenibilidad se diseñó el plan de capacitaciones dirigidas al personal de la obra, miembros del comité de participación comunitaria y a la comunidad en general.

4.3.3.1 Programa de participación comunitaria.

Durante las reuniones de socialización de inicio de obra se creó el comité de participación comunitaria con personas situadas el área de influencia directa de los sectores:

Tabla 9. Conformación comité de participación comunitaria.

FRENTE DE OBRA	FECHA DE REUNIÓN
Ciudad Modesto	13/05/25
Jhon Jairo Hurtado	13/05/25
Plaza Aguila	21/05/25
La Noria	Pendiente por conformar comité de participación comunitaria

Así mismo se reforzará la divulgación de la información relacionada con las actividades ejecutadas por el contratista de obra en los componentes técnico, social, SST y ambiental a través de folletos enviados a través de medio virtual.

4.3.4 PGS, Política de empleo.

Para dar cumplimiento a los requerimientos contractuales de este componente el contratista de obra vinculó a dos mujeres registradas en el Centro de oportunidades del Distrito de Barranquilla como madre cabeza de hogar, una persona en condición de discapacidad y una persona que hace parte de la población afrodescendiente. Según se establece en el contrato No. LP-031-2024 Lote 4. CLÁUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ***el CONTRATISTA se obliga con EDUBAR S.A. a lo siguiente: 1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto.***

- Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto.
- De acuerdo con la información antes mencionada el contratista cumple en la contratación población vulnerable definida en el contrato.

Tabla 10. Relación inclusión de personal.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE INCLUSIÓN
Merlin Diaz Charris	Profesional Social	Madre cabeza de hogar
Manuel Ojeda	Coord. SST	Comunidad Afrodescendiente
Jesús Rodriguez	Asistente Administrativo	Población con discapacidad

4.3.5 PGS atención a la comunidad

Dentro del periodo reportado no se recibieron manifestaciones ciudadanas (Peticiones, quejas, quejas reclamos o solicitudes)

Tabla 11. Relación de puntos de atención a la comunidad.

FECHA DE APERTURA	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE
13/05/2025	Ciudad Modesto	Lunes y miércoles de 8:00a.m. a 10:00a.m.	Profesional Social Contratista
13/05/2025	Jhon Jairo Hurtado	Lunes y miércoles de 8:00a.m. a 10:00a.m.	Profesional Social Contratista
21/05/2025	Plaza Aguila	Lunes y miércoles de 8:00a.m. a 10:00a.m.	Profesional Social Contratista

Tabla 12. Relación de quejas y/o reclamos.

FRENTE DE OBRA	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO
Ciudad Modesto	0	0	0
Jhon Jairo Hurtado	0	0	0
Plaza Aguila	0	0	0

4.3.6 Conclusiones

En el presente informe se consolidó la puesta en marcha de las actividades sociales realizadas en cumplimiento a los parámetros de la interventoría y que fueron establecidas en el plan de gestión social propuesto por parte contratista de obra, para dar cumplimiento a las estrategias de intervención con el fin de crear las condiciones que permitieron la interrelación entre la comunidad y los actores locales, dentro de un contexto de creación participativa y de sostenibilidad, potenciando los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del proyecto, y generando bienestar para la comunidad beneficiada por las obras.

4.4 Control de personal de obra

4.4.1 Contratista

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, el siguiente personal estuvo involucrado en el contrato.

Tabla 13. Personal del contratista.

N°	NOMBRE	CARGO
1.	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA	GERENTE DEL PROYECTO
2.	OSCAR MAYA	DIRECTOR DE OBRA-URBANISTA
3.	ALVARO SARMIENTO	RESIDENTE DE OBRA
4.	LUIS MOLINARES	RESIDENTE DE OBRA
5.	VANESSA RACEDO	PROFESIONAL SISO
6.	MERLIN DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL

4.5 Solicitudes entre contratista e interventoría

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se han realizado las siguientes solicitudes entre contratista e interventoría:

Tabla 14. Comunicaciones entre contratista e interventoría.

OFICIOS DE INTERVENTORIA		
FECHA	**RADICADO DE OFICIO**	**ASUNTO**
05/08/2025	IP00928	Punto ecológico Jon Jairo Hurtado
OFICIOS DE CONTRATISTA		
FECHA	**RADICADO DE OFICIO**	**ASUNTO**
23/07/2025	D-12-2025-51	Programación por parque Lote 4

4.6 Requerimientos efectuados

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se han realizado los siguientes requerimientos:

Tabla 15. Comunicaciones entre contratista y Distrito

OFICIOS DE CONTRATISTA		
FECHA	**RADICADO DE OFICIO**	**ASUNTO**
05/08/2025	D-13-2025-51	Respuesta radicado No QUILLA-2025-0146780

4.7 Pagos de tributos

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se aclara que debido a las condiciones del contrato la generación de cuenta de cobro, las cuales con llevan el pago de los tributos asociados a ellas, se da cada 3 meses desde la suscripción del acta de inicio.

Por lo tanto, para este periodo no aplica el pago de tributos.

4.8 Gestiones realizadas con empresas de servicio publico

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no se han realizado gestiones frente a empresas de servicio público.

5 ASPECTOS TECNICOS

5.1 Plano récord

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no aplica.

5.2 Análisis de precios y actividades no previstas

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no se han realizado actividades no previstas.

5.3 Control de los equipos

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se han utilizado los siguientes equipos y maquinaria:

Tabla 16. Información de maquinaria y equipos.

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
MINICARGADOR	1
RETROEXCAVADORA	1
MEZCLADORA DE CEMENTO	3
VIBRADOR TIPO RANA	1
PLANTA ELECTRICA	1

5.4 Pruebas y resultados


Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se han realizado ensayos de compresión para los elementos en concreto de 3.000 psi y 4.000 psi, así mismo ensayo de densidad a las zonas compactadas.


Estos ensayos se relacionan en los ANEXOS.

5.5 Evidencias fotográficas

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se han tomado los siguientes registros fotográficos de las actividades ejecutadas:

PARQUES URBANIZACION CIUDAD MODESTO, JHON JAIRO HURTADO, PLAZA AGUILA, LA NORIA	
 *Cerramiento en lamina, parque Ciudad Modesto*	 *Cerramiento en lamina, parque Jhon Jairo Hurtado*
 *Cerramiento en lamina, parque Plaza Águila*	 *Nivelación y replanteo de área, parque Ciudad Modesto*
 *Nivelación y replanteo de área, parque Jhon Jairo Hurtado*	 *Nivelación y replanteo de área, parque Plaza Águila*

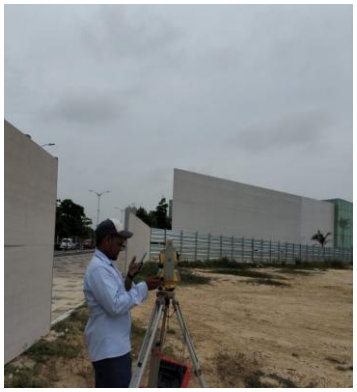 *Nivelación y replanteo de área, parque Noria Malecón*	 *Nivelación y replanteo de área, parque Barlovento*
 *Nivelación y replanteo de área, parque Piñuela*	 *Nivelación y replanteo de área, parque San Salvador*
 *Nivelación y replanteo de área, parque Siape*	 *Nivelación y replanteo de área, parque Puente Carrera 38*

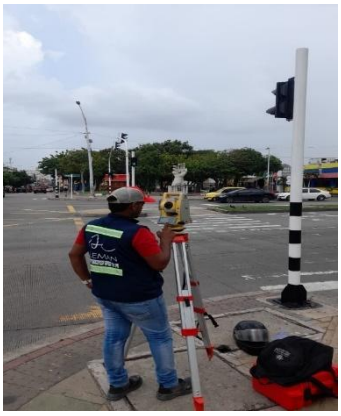
 *Nivelación y replanteo de área, parque Enamorados*	 *Nivelación y replanteo de área, parque De Los Músicos*
 *Demolicion de jardineras, parque Jhon Jairo Hurtado*	 *Demolicion de vigas de cimentacion, parque Ciudad Modesto*
 *Demolicion de vigas de cimentacion, parque Jhon Jairo Hurtado*	 *Demolicion de vigas de cimentacion, parque Aguila*




Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m, parque Ciudad Modesto



Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m, parque Jhon Jairo Hurtado

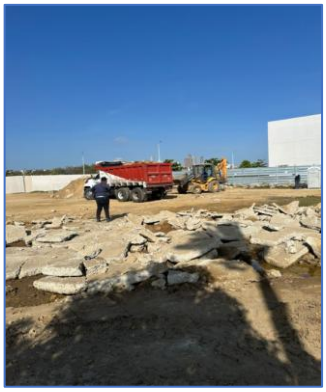

Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m, parque Noria Malecón

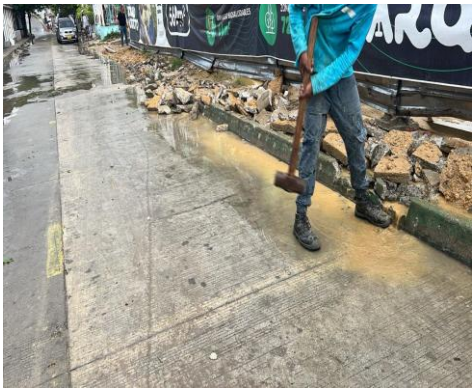

Demolición de bordillo y retiro de material, parque Ciudad modesto



Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente, incluye retiro de material e= 0.25, parque Jhon Jairo Hurtado



Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta, parque Ciudad Modesto



Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta, parque Jhon Jairo Hurtado



Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta, parque Noria Malecón



Excavación a mano y retiro de material sobrante en volqueta, parque Plaza Águila



Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante, parque Ciudad Modesto



Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante, parque Jhon Jairo Hurtado




Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante, parque Noria Malecón



Excavación de 0.30 x 0.30 metros, y retiro de material sobrante, parque Plaza Águila



Excavacion a maquina y retiro de material a lugar certificado, parque Plaza Aguila

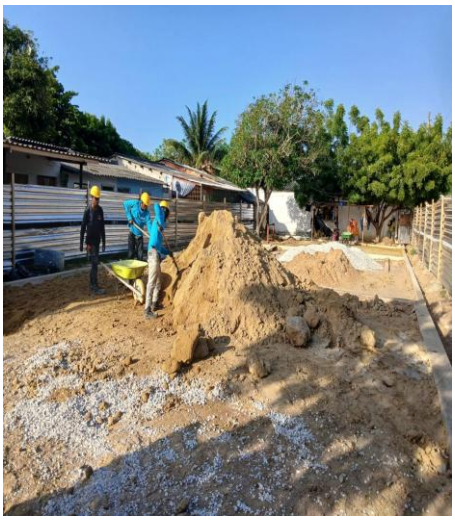

Relleno en material seleccionado compactado (caliche), Ciudad Modesto



Relleno en material seleccionado compactado (caliche), Jhon Jairo Hurtado



Relleno en material seleccionado compactado (caliche), parque Plaza Águila



Relleno en material seleccionado compactado (caliche), parque La Noria Malecón



Estabilización cancha sintética, parque Jhon Jairo Hurtado



Mejoramiento de terreno en suelo cemento 1:20 compactado, parque Ciudad Modesto



levante en bloque estructural abuzardado de cemento, de 20 x 20 x 40 mt, con celdas rellenas en concreto de 3000 psi, mortero de pega 1:4, no incluye acero de refuerzo



Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2" , estribos de 3/8" a cada 0.20 mts, parque Jhon Jairo Hurtado



Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, de o,30 x o,30 mts, incluye 4 varillas de d= 1/2", estribos de 3/8" a cada 0.20 mts, parque Plaza Águila



viga de amarre en concreto de 3000 psi de 0.15 x 0.20 metros, incluye acero de refuerzo 2 varillas d = 3/8", estribos d = 1/4" a cada 0.20 metros, parque Ciudad Modesto

 *viga de amarre en concreto de 3000 psi de 0.15 x 0.20 metros, incluye acero de refuerzo 2 varillas d = 3/8", estribos d = 1/4" a cada 0.20 metros, parque La Noria Malecón*	 *Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, dimensión variable entre 0.15 x (0.30 - 0.50) metros, incluye 5 varillas de 3/8", estribos de 1/4" a cada 0.20 metros (ver diseño), parque Ciudad Modesto*
 *Viga de cimiento en concreto de 3000 psi, dimensión variable entre 0.15 x (0.30 - 0.50) metros, incluye 5 varillas de 3/8", estribos de 1/4" a cada 0.20 metros (ver diseño), parque Plaza Águila*	 *Cerramiento con perfil de 1oomm x 50mm calibre 14 galvanizado, lámina se zinc altura 2,4 metros con base en concreto incluye excavación, perfiles a cada 1,2 metros, parque La Noria Malecón*
 *Alquiler de baños portátil, parque Ciudad Modesto*	 *Alquiler de baños portátil, parque Jhon Jairo Hurtado*



Alquiler de baños portátil, parque Plaza Águila



Alquiler de baños portátil, parque La Noria Malecón



Desmonte de losetas incluye retiro de material, parque La Noria Malecón



Cerramiento con perfil de 1oomm x 50mm calibre 14 galvanizado, lámina se super board de 6mm altura 2,4 metros con base en concreto incluye excavación, perfiles a cada 1,2 metros, parque La Noria Malecón



Viga de confinamiento en concreto de 3000psi de 0,2x0,2 metros, incluye acero de refuerzo 4 varillas de 3/8", estribos de 3/8" a cada 0,20 metros, parque Jhon Jairo Hurtado



Acero de refuerzo figurado, parque Ciudad Modesto



Acero de refuerzo figurado, parque Jhon Jairo Hurtado



Acero de refuerzo figurado, parque Plaza Águila



Zapata en concreto premezclado de 4000 psi, parque Ciudad Modesto



Zapata en concreto premezclado de 4000 psi, parque Jhon Jairo Hurtado



Zapata en concreto premezclado de 4000 psi, parque Plaza Águila



Anclaje epóxico para varillas de muros, vigas, columnetas diámetros entre 1/2" y 5/8", incluye perforación y epóxico, parque Ciudad Modesto



Corte y sello de juntas para zonas de andenes, canchas, pisos estampados, sendero de trote, pistas y zonas expuestas al tráfico, parque Jhon Jairo Hurtado




Corte y sello de juntas para zonas de andenes, canchas, pisos estampados, sendero de trote, pistas y zonas expuestas al tráfico, parque Plaza Águila



Impermeabilización con igasol, parque Jhon Jairo Hurtado




Solado en concreto 2500 psi, e=0,05, parque Jhon Jairo Hurtado

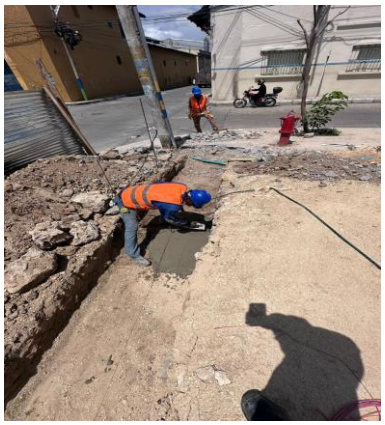

Solado en concreto 2500 psi, e=0,05, parque Plaza Águila



Placa en concreto de 3000-psi e: 0,10 mts incluye malla electrosoldada, parque Ciudad Modesto

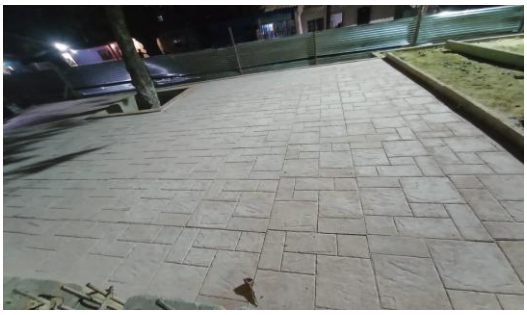 *Placa en concreto de 3000-psi e: 0,10 mts incluye malla electrosoldada, parque Jhon Jairo Hurtado*	 *Construccion de placa en concreto de 3000 psi, para pisos estampados de 10cm de espesor promedio, reforzada con malla electrosoldada, incluye suministro e instalacion de plastico calibre 6mm para separacion, parque Ciudad Modesto*
 *Construccion de placa en concreto de 3000 psi, para pisos emtampadosde 10cm de espesor promedio, reforzada con malla electrosoldada, incluye suministro e instalacion de plastico calibre 6mm para separacion, parque Jhon Jairo Hurtado*	 *Levante de muro en bloque abuzardado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de pega 1:4, parque Ciudad Modesto*
 *Levante de muro en bloque abuzardado de 0.15 x 0.20 x 0.40 metros con celdas rellenas en concreto de 2500 psi, refuerzo central de d = 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de pega 1:4, parque Jhon Jairo Hurtado*	 *Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4, parque Ciudad Modesto*

 *Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4, parque Jhon Jairo Hurtado*	

Figura 5. Evidencia fotográfica de actividades ejecutadas.

5.6 Cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no se han adquirido ningún tipo de compromiso por parte del contratista hacia la comunidad.

6 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se presenta un breve informe de las normas de higiene y seguridad industrial.

6.1.1 Objetivo general

- Promover, mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, preservando el buen estado de salud, físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes e incidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

6.1.2 Objetivos específicos:

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgos y peligros, para la salud de los trabajadores, que mitiguen la probabilidad de ocurrencia y consecuencias de los AT y EL.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.
- Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.
- Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo Laboral
- Fortalecer el compromiso y liderazgo de todos los funcionarios.
- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

6.1.3 Actividades ejecutadas durante el periodo

En el periodo se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente del profesional y una auxiliar SST, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.

Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

6.1.4 Identificación de peligros y riesgo

Se cuenta con la matriz IPEVR según las actividades realizadas en los trabajos incluyendo las actividades como figurado de hierro, fundición de solado en concreto, relleno, demolición de andenes, toma de puntos topográficos, compactación de los terrenos, levantamiento de muros, fundición de placas, excavaciones para contenedor de raíz, impermeabilización de muros.

6.1.5 Seguridad social

Para este periodo se encuentra en cumplimiento las planillas pagas de consorcio escenarios, ep, alemán constructores, el personal vinculado cuenta con afiliaciones al sistema de riesgo laborales.

6.1.6 Uso y entrega de epp

Se evidencia cumplimiento en la entrega oportuna de los epp (casco, guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos) y se cuenta con reserva de estos en los centros de trabajo habilitados.



Figura 6. Uso de EPP.

6.1.7 Inspecciones y equipos de emergencia

Para este periodo el realizaron inspecciones planeadas de herramientas, equipos, y preoperacionales de maquinaria y se evidencia las herramientas que deben llevar guardas de seguridad en total cumplimiento, se implementa jornadas de aseo antes de iniciar labores, para así disminuir el riesgo locativo, en los puestos de trabajo.

Para este periodo se realizó entrega de las camillas, extintores, botiquines de emergencias a los frentes de trabajo habilitados, dando cumplimento a los equipos de emergencia (en gestión los equipos aún faltan en algunos centros de trabajo.



Figura 7. Equipos de emergencias.

6.1.8 Accidentalidad

Para el periodo no se reportan accidentes de trabajo, se continúa trabajando en la prevención y concientización, reuniendo al personal y realizándoles charlas con el objetivo de dar a conocer los riesgos a los que se encuentran expuestos y las medias para disminuir el nivel de exposición, así mismo se aplican pausas activas durante las actividades, para evitar fatigas labores y mayor productividad y concentración en las diferentes áreas.



Figura 8. Activaciones.

6.1.9 Preoperacionales de máquinas, equipo herramientas manuales y de poder

Como medida preventiva diariamente se le realizas preoperacionales a la herramientas y equipo en uso, El contratista debe garantizar la implementación de un programa de mantenimiento preventivo/correctivo para toda la maquinaria y equipo usado en obra, en donde se establezca que toda actividad mecánica.

Todos los vehículos y maquinaria deben ser sometidos a revisión periódica de: luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas, presencia de fugas, funcionalidad de partes hidráulicas, y estado de los aditamentos y elementos de carga y/u operación.

6.1.10 Servicios de higiene – orden y aseo

Para este periodo el contratista realizo entrega de baterías sanitarias, puntos ecológicos, a los frentes de trabajo habilitados. Se implementan jornadas de orden y aseo antes de iniciar actividades con el fin de disminuir el riesgo locativo y tener frentes de trabajo seguro e higiénicos.



Figura 9. Manejo de aguas residuales.

6.1.11 Señalizaciones

Se realiza instalación de señalizaciones de ruta d evacuación y puntos de encuentro en los centros de trabajo habilitados así mismo se realizan instalaciones provisionales, en las zonas de corte o áreas que lo requieran.



Figura 10. Señalizaciones.

6.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental

6.2.1 Cumplimiento Legal y Contractual Ambiental

Se tramitaron los permisos requeridos:

- El radicado de inscripción como nuevo generador de RCD a nombre de la razón social del contratista es el siguiente:
  - Radicado: EXT-BV-2025-06171
  - Entidad receptora: EPA Barranquilla Verde
  - Fecha: 14 de junio de 2025
- El radicado de inscripción como nuevo generador de RCD a nombre de la razón social del contratista es el siguiente:
  - Radicado: EXT-BV-2025-09078
  - Entidad receptora: EPA Barranquilla Verde
  - Fecha: 14 de agosto de 2025

6.2.2 Manejo Ambiental en Obra

El contratista implementa las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en todos los frentes de fase 8 lote 4.

6.2.3 Manejo de Residuos Sólidos

Implementado el código de colores según la Resolución 2184 de 2019:

- Blanco: residuos aprovechables.
- Negro: no aprovechables.
- Verde: orgánicos.

Disposición a través de la empresa Triple A S.A. E.S.P.

6.2.4 Campamentos e Instalaciones Temporales

Establecidos en todos los frentes con servicios básicos: sanitarios, Vestier, comedor, oficina de control.



Figura 11. Campamento e instalaciones temporales.

6.2.5 Contaminación Atmosférica y Ruido

- Control de polvo: cerramientos perimetrales con lámina de zinc, cubrimientos plásticos en acopios.
- No se realizaron actividades generadoras de ruido fuera de horario laboral



Figura 12. Cerramiento.

6.2.6 Manejo de Aguas Residuales

- Sin vertimientos a cuerpos de agua o suelo.
- Baños conectados a red en algunos frentes; en otros, uso te baterías sanitarias proporcionadas por la empresa Maken.



Figura 13. Manejo de aguas residuales.

6.2.7 Manejo de Maquinaria

- Listado de maquinaria en uso (minicargadores, volquetas, bulldozer).
- Riesgos por derrames atendidos con medidas de precaución.

6.2.8 Manejo de Vegetación

No se contemplan intervenciones forestales en la fase 8 lotes 4.

7 ASPECTO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

7.1 Resumen del manejo del anticipo y estado de la amortización

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no aplica debido a que no existe anticipo para este tipo de contrato.

7.2 Resumen sobre el rendimiento financiero del anticipo.

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no aplica debido a que no existe anticipo para este tipo de contrato.

7.3 Patrimonio Autónomo.

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, los recursos utilizados para el pago de mano de obra, proveedores, equipos, herramientas, personal, entre otros aspectos fueron recursos propios de la empresa.


7.4 Bienes nacionales.

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, todos los bienes entre equipos, maquinaria, materiales, entre otros fueron adquiridos dentro del territorio colombiano.

8 ASPECTOS LEGALES

8.1 Aporte a seguridad social y parafiscales

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, se han realizado los siguientes aportes a la seguridad social y parafiscales:

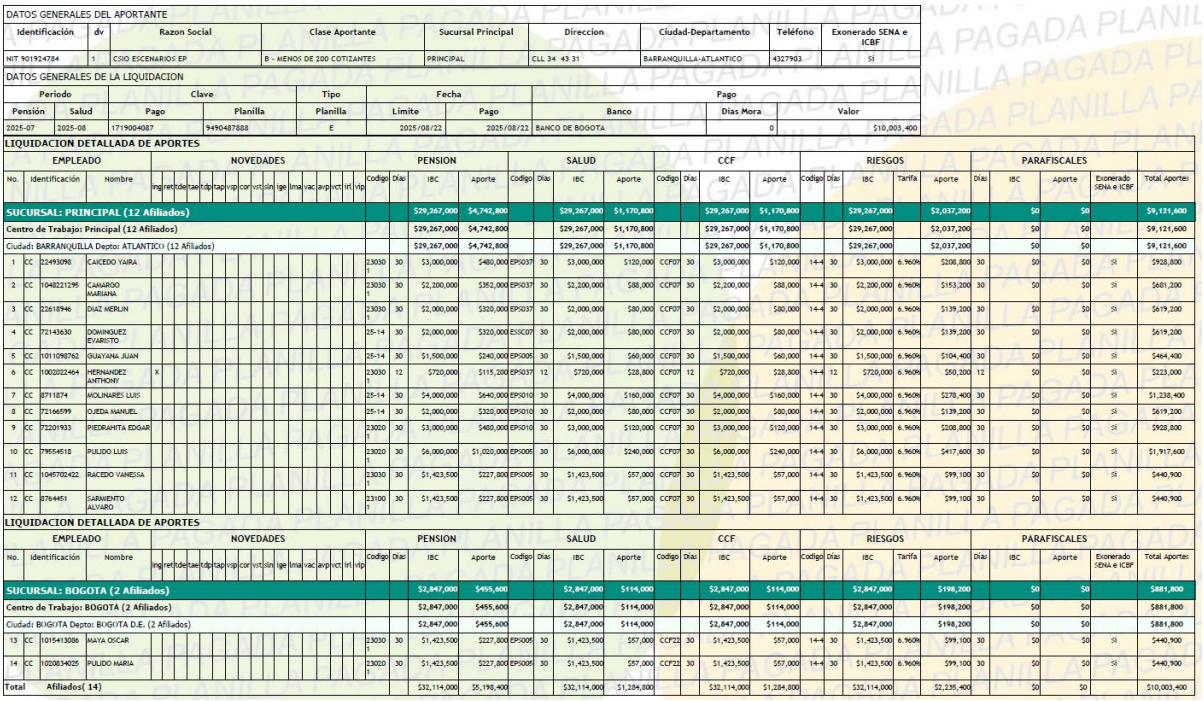

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901924784	1	CSIO ESCENARIOS EP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 34 43 31	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4327903	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1719004087	9490487888	E	2025/08/22	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	0	$10,003,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)						$29,267,000	$4,742,800			$29,267,000	$1,170,800			$29,267,000	$1,170,800			$29,267,000		$2,037,200		$0	$0		$9,121,600
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)						$29,267,000	$4,742,800			$29,267,000	$1,170,800			$29,267,000	$1,170,800			$29,267,000		$2,037,200		$0	$0		$9,121,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (12 Afiliados)						$29,267,000	$4,742,800			$29,267,000	$1,170,800			$29,267,000	$1,170,800			$29,267,000		$2,037,200		$0	$0		$9,121,600
1	CC	21493096	CAICEDO YAIRA	23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF07	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
2	CC	1048221295	CAMARGO MARIANA	23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF07	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	SI	$681,200
3	CC	22618946	DIAZ MERLIN	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
4	CC	72143630	DOMINGUEZ EVARISTO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
5	CC	1011090762	GUAYANA JUAN	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
6	CC	1002022464	HERNANDEZ ANTHONY	X 23030 1	12	$720,000	$115,200	EPS037	12	$720,000	$28,800	CCF07	12	$720,000	$28,800	14-4	12	$720,000	6.960%	$50,200	12	$0	$0	SI	$223,000
7	CC	8711874	MOLINARES LUIS	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF07	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
8	CC	72166599	OJEDA MANUEL	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	72201933	PIEDRAHITA EDGAR	23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF07	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
10	CC	79654518	PULIDO LUIS	23010 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF07	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
11	CC	1045702422	RACEDO VANESSA	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	8764451	SARMIENTO ALVARO	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: BOGOTA (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
13	CC	1015413086	MAYA OSCAR	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	1020834025	PULIDO MARIA	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	Afiliados(14)					$32,114,000	$5,198,400			$32,114,000	$1,284,800			$32,114,000	$1,284,800			$32,114,000		$2,235,400		$0	$0		$10,003,400

Figura 14. Planilla de aporte a seguridad social y parafiscales.

8.2 Cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no se han presentado cesión y/o subcontrataciones del proyecto.

8.3 Desviación del contratista o la interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales

Entre el periodo de 16 de julio al 15 de agosto de 2025, no se han presentado cesión desviaciones por parte de la interventoría con relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, durante el periodo de comprendido por el informe se cumplieron las metas establecidas por el cronograma, presentando un avance significativo respecto a la programado. Así mismo, como el cumplimiento de los requisitos de seguridad, salud, ambientales y sociales del proyecto, para su funcionamiento.

Por otro lado, cada parque en desarrollo presento un avance significativo del proyecto ejecutando actividades entre nivelaciones, conformación de terreno, concreto 3.000 psi, concreto 4.000 psi, levantes de mampostería, pisos estampados, placas de concreto, entre otras actividades contractuales y no previstas para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.

10 ANEXOS

10.1 Cantidades ejecutadas

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE CIUDAD MODESTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	94.11
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	1,411.13
1.09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	120.80
1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	139.20
1.15	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	73.80
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2.01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	57.36
2.02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	207.46
2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	76.89
2.1	MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO	M3	66.13
3	**ESTRUCTURA**		
3.01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	88.44
3.02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.	ML	117.36
3.06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	550.85
3.07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	5.60
3.11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	740.00
3.12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	514.02
4	**MAMPOSTERIA**		
4.01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	368.51
4.03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	34.88
4.05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	34.88
4.11	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.	ML	86.41
4.13	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	99.08
	ITEMS NO PREVISTO		
NP 07	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL	M2	34.88
NP 09	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	UND/MES	6.00
NP 12	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	162.62
NP 13	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADAS DE COLOR , DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE CALIBRE 6 PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M2	137.58

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE JHON JAIRO HURTADO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	29.46
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	596.08
1.04	DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES	ML	6.96
1.09	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	48.79
1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	27.96
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
2.01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	55.69
2.02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	9.53
2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	170.25
2.08	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA	M3	1.06
3	**ESTRUCTURA**		
3.01	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	10.52
3.06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	427.12
3.07	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI.	M3	3.56
3.12	CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.	ML	283.41
3.16	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05	M2	12.37
4	**MAMPOSTERIA**		
4.01	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	163.04
4.03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	0.80
4.05	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	17.21
	ITEMS NO PREVISTO		
NP 07	IMPERMEABILIZACION CON IGASOL	M2	17.21
NP 09	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	UND/MES	2.00
NP 11	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0,2X0,20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLA D = 3/8", ESTRIBOS D= 3/8" A CADA 0,20 METROS	ML	7.73
NP 13	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADAS DE COLOR , DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, REFORZADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO DE CALIBRE 6 PARA SEPARACIÓN (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).	M2	39.10

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE LA NORYA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	5,323.58
1.12	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M	M2	165.35
1.39	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	592.30
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	213.26
2.02	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	67.80
2.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE)	M3	173.20
3	ESTRUCTURA		
3.02	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS.	ML	253.00
	ITEMS NO PREVISTO		
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE SUPERBOARD DE 6 MM ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS	ML	211.00
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CERRAMIENTO CON PERFIL DE 100 MM X 50 MM CALIBRE 14 GALVANIZADO LAMINA DE ZINC DE ALTURA 2,4 METROS CON BASE EN CONCRETO INCLUYE EXCAVACION , PERFILES A CADA 1,2 METROS	ML	130.00
NP 06	DESMONTE DE LOSETAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	749.60
NP 09	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL	UND/MES	6.00

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE LOS MUSICOS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	28,264.16

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE LOS ENAMORADOS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	14,508.31

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE PUENTE LA 38			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	22,307.04

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE DE SIAPE				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	3,245.31	$ 12,267,271.80

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE SAN SALVADOR			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	3,152.70

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE LA PIÑUELA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	1,246.95

CANTIDADES EJECUTADAS PARQUE BARLOVENTO			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.03	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO .	M2	7,157.60

16/07/25

Personal de obra

1 Residente
1 Maestro
4 oficiales
6 Ayudantes

* Excavación a mano
* Excavación Viga 30x30
* Relleno de material seleccionado.

17 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 oficiales
6 Ayudantes

* Excavación a mano
* Excavación viga 30x30
* Relleno de material seleccionado.

18 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 oficial
6 Ayudantes

* Excavación a mano
* Excavación viga 30x30

Powered by CamScanner

19 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 oficial
6 Ayudantes

* Excavación a mano
* Excavación Viga 30x30

21 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

* Excavación a mano
* Excavación Viga 30x30

22 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 oficial
6 Ayudantes

* Demolición de placa
* Demolición de viga de cimentación
* Excavación a mano

Powered by CamScanner

23 Julio 2025

Personal de obra
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 6 Ayudantes

* Excavación a mano
* Demolición de placa
* Demolición viga de cimentación

24 Julio 2025

Personal de obra
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 6 Ayudantes

* Excavación a mano
* Demolición de placa

25 Julio 2025

Personal de obra
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 6 Ayudantes

* Relleno con material seleccionado

Powered by CamScanner

26 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

* Relleno con material seleccionado
* Viga de 30x30 - Fundida

28 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

* Relleno con material seleccionado
* Viga de 30x30 - Fundida

29 Julio 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

* Relleno con material seleccionado
* Viga 30 x30 - Fundida
* Viga 15 x20 - Fundida

Powered by CamScanner

30 Julio 2025

Personal de obra
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 6 Ayudantes

* Viga 30x30 - Fundida
* Viga 15x20 - Fundida

31 Julio 2025

Personal de obra
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 6 Ayudantes

* Viga 15x20 - Fundida
* Viga variable - Fundida

1 Agosto 2025

Personal de obra
- 1 Residente
- 1 Maestro
- 1 Oficial
- 6 Ayudantes

* Viga 15x20 - Fundida
* Viga variable - Fundida

Powered by CamScanner

2 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

x. Viga Variable - Fundida
x. Relleno con material seleccionado

4 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

x. Relleno con material seleccionado.

5 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

x. Fundida de placa
x Fundida de piso estampado.

Powered by CamScanner

6 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudantes

*. Rellenos con material seleccionado
*. Fundida de placa

8 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

*. Fundida de placa.

9 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

*. Fundida de placa
* Fundida de piso estampados
* Mejoramiento de terreno con suelo cemento

Powered by CamScanner

11 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

* Fundida de placa

12 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

*. Relleno de material seleccionado

13 Agosto 2025

Personal de obra
1 residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante


* Corte de Juntas
* Relleno con material seleccionado
* Mejoramiento de terreno con suelo cemento

Powered by CamScanner

14 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante

x Corte de Junta
x Fundido Viga 15x20



15 Agosto 2025

Personal de obra
1 Residente
1 Maestro
1 Oficial
6 Ayudante.

x Corte de Junta.



Powered by CamScanner

SABADO 12/7/25 DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR. 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 5 AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES.

- LEVANTE BLOQUE ABUZARDADO DE 20 EN PLAZOLETA CRA 1.
- SOLADO ZAPATA MURO T1 EN PLAZOLETA CRA 1.
- DEMOLICION DE PLACA EN ZONA DE JUEGOS DE NIÑOS PARA EXCAVACIÓN DE VIGA 30x30.
- RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PARA VIGAS DE 30x30.
- PAÑETE PARA MURO T2 ANDEN.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

LUNES: 14/7/25 DIA SOLEADO.

- PERSONAL: 7:30.

1 RESIDENTE, 1 SST. AUX, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 BENTIN, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTA MENORES.

- ACTIVIDADES:

- RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CONFORMAR VIGA DE 30x30 ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
- EXCAVACION Y PERFILADO PARA ZAPATA MURO T1 (ZONA DE RAMPA Y HUECO).
- APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO TIPO 1 ANDEN.
- IMPERMEABILIZACIÓN MURO T1 ANDEN.
- INSTALACIÓN DE ACEROS EN ZAPATA T1 RAMPA - KIOSILO.
- COMPACTACIÓN RELLENO EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
- EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA 30x30 ZONA JUEGOS INFANTILES.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE

MARTES 15/7/25 DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES

- MAQUINARIA:

1 Mini CARGADOR, 1 BENTIN, 1 VOLQUETA. 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES

- ACTIVIDADES:
- INSTALACIÓN DE ACEROS EN VIGA 30x30 JUEGOS INFANTILES.
- FUNDIDA DE VIGA 30x30 JUEGOS INFANTILES.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

MIERCOLES 16/7/2025 DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 OPERADOR, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 8 AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 BENITIN, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA DE VIGA 20x20 EN ZONA DE ANDEN - RAMPAS SOBRE MURO TL.
- RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA ANDEN-RAMPAS.
- FUNDIDA DE VIGA 30x30 PARA CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS INFANTILES.

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE

JUEVES 17/7/2025 DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETE, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 BENITIN, 1 VOLQUETA, 1 CAMIO... HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- PANGTE SOBRE MURO TIPO 1
- RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA ZO... ANDEN RAMPAS.
- ADECUACIÓN RELLENO CALLHA.
- [illegible]

VERNES 18/7/2025 DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA.

1 BENIPIN, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES.
- FOUDIDA DE VIGA 20x20 SOBRE MURO T 1.
- RELLENO Y COMPACTACIÓN MATERIAL SELECCIONADO EN ANDEN-RAMPAS.
- ADECUACIÓN DE CANCHAS. MANUAL.
- PAÑETE SOBRE MURO EN ZONA DE PLAZOLETAS. CRA 1

LUNES 21/7/2025. DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX. 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR
1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 12 AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- ADECUACIÓN DE CANCHA MANUALMENTE.
- PAÑETE SOBRE MURO JARDINERA. PLAZOLETA CRA1.
- APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE MURO Y JARDINERA.
- COMPACTACIÓN MATERIAL DE RELLENO EN ANDEN-RAMPAS EN LAS CASAS.

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

MIERCOLES 23/7/2025. DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 7:30
- 1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1
- 1 CONDUCTOR.
- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES

- ACTIVIDADES:
- ADECUACIÓN MANUAL DE TERRENO EN CANCHA.
- ADECUACIÓN MANUAL DE TERRENO EN ZONA INFANTIL.
- MAMPOSTERIA EN LA PLZTA DE KIOSKO, BLOQUE ADUZADRADO DE 20.
- FOUDIDA DE VIGA ESCALERA DE 30x30 PLZTA CRA 1.

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

JUEVES 24/7/2025 DIA:

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:
1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES:
- ADECUACION MANUAL EN CANCHA
- ADECUACION MANUAL EN ZONA INFANTIL

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

DIA:

VIERNES 25/7/2025

- PERSONAL: 7:30
1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO - 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES, 1 OPERADOR.
- MAQUINARIA:
1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.
- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO ZONA DE ANDEN RAMPAS
- ADECUACIÓN DE TERRENO MANUALMENTE EN CANCHA.
- FUNDIDA DE VIGA 30x30 EN ZONA JUEGOS INFANTILES.

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE

DIA:

SABADO 26/7/2025

- PERSONAL: 7:30
1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.
- MAQUINARIA:
1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES,
- ACTIVIDADES:
- COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO EN ZONA DE CANCHA.
- INSTALACIÓN DE POLIETILENO Y MALLA PARA PLACA CONTRAPISO CANCHA
- FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO EN CANCHA.
- APLICACIÓN DE ANTISOL

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

LUNES 28/7/2025

DIA.

- PERSONAL: 7:30
1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1

CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES,

- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA DE PLACA CONTRAPISO EN SUELOS INTERIORES.
- IMPERMEABILIZACIÓN MURO +1 EN RAMPA CRA 1A.
- RELLENO Y COMPACTACIÓN FRANJA CANCHA. Y ZONA INTERIOR
- INSTALACIÓN DE POLIETILENO EN MALLAS EN CANCHA
- FUNDIDA DE VIGA 20x20 SOBRE MURO EN P/TA KIOSKO.
- EXCAVACIÓN DE CARCAMO EN CANCHA
- FUNDIDA ESCALERA P/TA CRA 1

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE

MARTES 29/7/2025 DIA:

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- ARMADO DE ACERO EN CÁRCAMO CANCHA
- ADECUACION DE TERRENO PARA PLACA DE CONTRAPISO
- FUNDIDA CONCRETO PREMEZCLADO PLACA CONTRAPISO CANCHA.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE

MIERCOLES 30/07/2025. DIA:

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA PLACA CONTRAPISO CONCRETO PREMEZCLADO.
- APLICACION DE ANTISOL

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

JUEVES 31/7/2025 DIA:

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR

29 julio 2025

En inspección se observa los conos del punto limpio está siendo utilizado para otras actividades, se solicita tomar correctivos, adicionalmente se observa recipientes sin tapa con aceite usado que puede ocasionar derrame. Tomar correctivos y medidas preventivas

Ofelia Izquierdo
EDUBAR SA

Personal en obra.
Actividades → Fundida, excavación

1 arq residente
1 Res. SISO.
2 oficiales
2 trabajadores. Ayudantes.
1 operador de minicargador.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

VIERNES 1/8/2025 DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 7:30
  1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES
- MAQUINARIA:
  1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES
- ACTIVIDADES:
  - COMPACTACIÓN MATERIAL SELECCIONADO EN PLATAFORMA RIGIDA.
  - INSTALACION DE POLIETILENO Y MALLAS PARA PLACA CONTRAPISO CANCHA
  - FUNDIDA DE PLACA CONTRAPISO CON CONCRETO PREMEZCLADO, EN CANCHA

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

SABADO 2/8/2025 DIA:

- PERSONAL 7:30
  1 RESIDENTE, 1 AUX, SST), 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETA

Rog 1 CONDUCTOR, 1 MAESTROS, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- COMPACTACIÓN DE FRANJA PARA PLACA DE CONTRAPISO EN CANCHA
- INSTALACIÓN DE POLIETILENO Y MALLA PRA PLACA CANCHA.
- FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO PREMEZCLADO.

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

LUNES 4/8/25 DIA:.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO, PARA PLACA CONTRAPISO CANCHA
- INSTALACIÓN DE POLIETILENO Y MALLA EN CANCHA.
- FUNDIDA PLACA DE CONTRAPISO, CONCRETO PREMEZCLADO. EN CANCHA.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

MARTES 5/8/25 DIA: LLUVIOSO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMIÓN, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:

- SE INICIÓ ACTIVIDAD FUNDIDA PLACA DE CONTRAPISO. EN CANCHA, PERO SE SUSPENDIÓ POR FUERTES LLUVIAS DURANTE 2:40 HORAS.

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

MIERCOLES 6/8/25. DIA:

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 OPERADOR, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO. 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 MINICARGADOR, 1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO EN CANCHA:
- INSTALACION DE POLIETILENO Y MALLAS PARA PLACA CONTRAPISO EN CANCHA.
- FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO EN CANCHA. Y VIGA ESCALERA.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

VIERNES 8/8/25 DIA:

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA DE PLACA CONTRAPISO CANCHA.
- FUNDIDA DE FONDO @ARCANOS CRA 1.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

SABADO. 9/8/25 DIA: LLUVIOSO

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- EXCAVACIONES PARA CARCAMO CRA 1A.
- EXCAVACIONES PARA VIGA 30X30 EN PLAZOLETA KIOSKO.

NOTA:

- SE PRESENTARON LLUVIAS AL REDEDOR DE LAS 11:45 AM.

DURANTE 2:30 HORAS.
Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

LUNES 11/8/2025. DIA: SOLEADO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES.
- RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO EN PLZTA CRA1
- INSTALACION DE POLIETILENO Y MALLA.
- FUNDIDA DE CONCRETO ESTAMPADO EN PLAZOLETA CRA 1.
- ORGANIZACION Y ASEO DE LABORES EN GENERAL

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

MARTES 12/8/2025. DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES

- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA DE MUROS CACARCAMOS EN CANCHA.
- DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE EN ZONA DE JUEGOS INFANTILES.

Arq. Alvaro Sarmiento
RESIDENTE.

MIERCOLES 13/8/2025. DIA: SOLEADO

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA DE PLACA CONCRETO ESTAMPADO EN PLAZOLETA CRA 1.
- CORTE DE TERRENO PARA MURO T1 RAMPA, CRA 1.
- FUNDIDA DE VIGA EN JARDINERA PLAZOLETA KIOSKO.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE

JUEVES 14/8/2025. DIA: SOLEADO. NUBOSA LLUVIAS TARDE.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA.

1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES.
- DEMOLICIÓN DE VIGA 30X30 EN ZONA DE CARCAMO CANCHA.
- CONFORMACIÓN ESCALERA EN ZONA PLAZOLETA KIOSKO CRA 1A.
- ENCOFRADO MURO CARCAMO.
- PASETE SOBRE MURO EN JARDINERA PLAZOLETA KIOSKO.
- FUNDIDA DE MURO CARCAMO CANCHA.

NOTA:

SE RECIBE VISITA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CIRO LARA, SONY MONCADA Y FELIX SARMIENTO.
SE REVISADON LAS ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN. EL RESIDENTE RECOMENDO LA ENTRADA DE ALUMBRADO PUBLICO Y ORGANIZAR PUNTOS ELECTRICOS.

RESIDENTE (AUX)
EDUARDO BERNAL.

VIERNES 15/8/2025 DIA: LLUVIOSO.

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 AUX SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

- MAQUINARIA:

1 VOLQUETA, 1 CAMION, HERRAMIENTAS MENORES.

- ACTIVIDADES:
- FUNDIDA ESCARGRA CRA 1A. PLAZOLETA KIOSKO.
- FUNDIDA MURO CARCAMO EN CANCHA.
- DEMOLICIÓN DE VIGA 30X30 EN ZONA DE CANCHA.
- CORTE DILATACIONES EN PLACA CANCHA.

NOTA:

SE PRESENTO PRESIPITACIONES A PARTIR DEL MEDIO DIA.
DURACIÓN 3 HORAS.

Arq. Alvaro Sarmiento.
RESIDENTE.

SABADO 16/8/2025. DIA: LLUVIOSO

- PERSONAL: 7:30

1 RESIDENTE, 1 SST AUX, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 VOLQUETERO, 1 CONDUCTOR, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, AYUDANTES.

15/7/23

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO

PERSONAL EN OBRRA: 1 ARQUITECTO, 1 OPERARIO; 1 MAESTRO, 3 AYUDANTES.

EQUIPO PESADO: RETROEXCAVADORA.

HERRAMIENTA MANUAL: PALA, BARRA Y PICOS

ACTIVIDAD: ACOPIO RCD.

SE CONTINUO CON LABORES DE ACOPIO MANUAL DE RCD, BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN MAESTRO DE OBRA Y CON EL APOYO DE TRES AYUDANTES, QUIENE REALIZARON SEPARACIÓN DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTO NO REUTILIZABLES Y SU REUBICACIÓN EN ZONA DE ACOPIO, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTO DEFINIDOS SIGUIENDO LA RESOLUCIÓN 472 DE 2017, DURANTE LA JORNADA SE RECIBIO LA VISITA DEL MECANICO ESPECIALIZADO, QUIEN PROCEDIÓ CON LA INTERVENCIÓN TÉCNICA CORRECTIVA DE LA RETROEXCAVADORA AFECTADA DESDE EL DIA ANTERIOR POR DAÑO EN UNA DE SUS LLANTAS.

16/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTO; OPERARIO; 1 MAESTRO; 2 AUXILIARES.

EQUIPO PESADO: RETROEXCAVADORA

HERRAMIENTA MANUAL: PALA Y BARRA.

ACTIVIDAD: ACOPIO Y RECOLECCIÓN RCD.

DURANTE LA JORNADA SE REPORTO LA SUSTRACCIÓN PARCIAL (APROXIMADAMENTE EL 50%) DE UNO DE LOS BANNERS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA, INSTALADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE VISIBILIDAD DEL PROYECTO.

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS INCLUYERON LA CONTINUACIÓN DEL ACOPIO DE RCD, EJECUTADO MEDIANTE RECOLECCIÓN MANUAL EN FRENTES REDUCIDOS Y CARGUE MECANIZADO CON RETROEXCAVADORA, OPTIMIZANDO LA PRODUCTIVIDAD Y FACILITANDO EL RETIRO DEL MATERIAL ACUMULADO.

SE REALIZO LA COORDINACIÓN LOGISTICA CON UNA VOLQUETA DE $16M^3$, ENCARGADA DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS HACIA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL AUTORIZADO. EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN 472 DE 2017.

17/7/25

ESTADO DEL TIEMPO : M: SOLEADO T: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA : 1 ARQUITECTO ; 1 OPERARIO; 1 MAESTRO; 2 AYUDANTES.

EQUIPO PESADO: RETROEXCAVADORA

HERRAMIENTA MANUAL: PALA, BARRA y PICO.

ACTIVIDAD: ACOPIO y RETIRO DE RESIDUOS.

SE EJECUTARON ACCIONES DE SEGREGACIÓN BÁSICA EN SITIO, PRIORIZANDO RESIDUOS INERTES PARA FACILITAR SU DISPOSICIÓN FINAL CONFORME AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN. 10:30 LA RETROEXCAVADORA FUE RETIRADA DEL FRENTE DE TRABAJO PARA SER ASIGNADA A OTRA OBRA. QUEDANDO LABORES DE RECOLECCIÓN A PARTIR DE ESTE MOMENTO RESTRINGIDAS A EJECUCIÓN MANUAL. EL RETIRO DE LOS RESIDUOS SE REALIZO MEDIANTE VOLQUETA PROGRAMADA, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

18/7/23

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTO; 1 OPERARIO; 1 MAESTRO; 2 AYUDANTES.
HERRAMIENTAS MANUAL: PALA BARRA Y PICO.
ACTIVIDAD: ACOPIO Y RETIRO DE RESIDUOS.

SE REALIZO ACOPIO Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DE MANERA MANUAL EN LA ZONA DE TRABAJO. EL MATERIAL RECOLECTADO FUE SEGREGADO SEGÚN SU NATURALEZA (CONCRETO, CERAMICA Y MATERIAL MIXTO) PARA SU CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 472 DE 2017 Y LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6531. ADEMÁS, SE VERIFICO EL ESTADO DEL ÁREA PARA GARANTIZAR QUE NO QUEDARAN ELEMENTOS SUELTOS QUE PUDIERAN COMPROMETER LA SEGURIDAD LABORAL O AFECTAR EL TRANSITO INTERNO.

19/7/25

ESTADO DEL TIEMPO : M: SOLEADO T: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTO; 1 MAESTRO; 2 AYUDANTES
HERRAMIENTA MANUAL: PALA, CARRETILLA, PICO Y PALA.
ACTIVIDAD: ACOPIO, RETIRO RCD Y TRANSPORTE PLANTA ELECTRICA.

SE CONTINUO CON LAS LABORES DE ACOPIO Y RETIRO MANUAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), ASEGURANDO LA SEGREGACIÓN DE MATERIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN 472 DE 2017 PARA SU CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL, PARALELAMENTE, SE REALIZO LA MOVILIZACIÓN DE UNA PLANTA ELECTRICA HACIA PARQUE VELLA CORDIALIDAD, CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE IZAJE Y ASEGURAMIENTO DE CARGA CONFORME A LA NTC 4786 Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEFINIDA POR EL PROGRAMA DE GESTION SST.

21/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTURA; 1 MAESTRO; 2 AYUDANTES.
HERRAMIENTA MANUAL: PALA, CARRETILLA, pico y Pala.
Actividad: Acopio, Retiro RCD y Transporte.

Se Continuaron las Actividades de Acopio y Retiro de Residuos De Construcción y Demolición (RCD). De manera manual, Priorizando la Segregación Por tipología (Concreto, cerámica y Material mixto). Para su Disposición Final Conforme a los Lineamientos de La Resolución 472 de 2017. Además se Optimizo el Espacio en el Frente De Obra mediante La Organización de los Residuos en Puntos de Acopio temporal, garantizando la Circulación Segura en la Zona y el Cumplimiento de los Protocolos de Seguridad Industrial.

22/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTO; 1 TOPOGRAFO; 1 CADENERO.
HERRAMIENTA Manual: Punto de Mira.
Actividad: Nuevo Trazado.

Se Procedio a Realizar nuevo trazado de Estaciones y Niveles. Por parte del equipo topografico, Utilizando Estación y Equipo GPS Diferencial Para Garantizar la Correcta Ubicación de Ejes Principales y Cotas de Referencia. Este Proceso Permitio Verificar alineamientos, Ajustar Coordenadas y Recalibrar Puntos de Control, Asegurando la Continuidad de la Obra Conforme a los Planos del Diseño y evitando desviaciones geometricas en Ejecución.

23/7/23

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTO; 1 MAESTRO; 2 AYUDANTES.
HERRAMIENTA MANUAL: PALA, PICO, CARRETILLA. TALADRO ELECTRICO.
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN BODEGA Y MATERIAL SELECCIONADO.

SE RECIBIO MATERIAL DE RELLENO TIPO CALICHE POR UN Volumen Aproximado de $28m^3$, EL Cuál Sera Utilizado para La Conformación y Compactación de terraplenes y nivelación de Plataforma, Paralelamente, se Procedio con la instalación de Una estructura Provisional tipo Gambrel, destinada a Funcionar como Bodega temporal Para almacenamiento de Herramientas y área de Resguardo del Personal. la ejecución se realizo Siguiendo las medidas de Seguridad industrial y garantizando la estabilidad estructural de la Cubierta.

24/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTO, 1 MAESTRO; 4 AYUDANTES
Herramienta Manual: Pala, Pico, Carretilla.
Actividad: Nivelar con manguera y compactación del terreno.

Se realizo replanteo de Cotas de nivel mediante nivelación hidraulica con manguera, asegurando la Correcta referenciación de la Rasante Para las Áreas de trabajo. Posteriormente, Se ejecutaron labores de Compactación manual de terreno empleando material de Relleno tipo caliche Previamente extendido, con el Objetivo de mejorar la Capacidad Portante y Garantizar La Uniformidad de La Subrasante. Adicionalmente, Se efectuo la recoleccion y Cargue de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Mediante apoyo de Volqueta, asegurando La disposición final Conforme a normativa ambiental. Finalmente se registro la llegada de nuevos acopios de material caliche Para la Continuidad de los trabajos de Conformación de terraplenes y Rellenos ESTRUCTURALES.

25/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
Personal En Obra: 1 Arquitecto; 1 MAESTRO; 4 AYUDANTES.
Herramienta Manual: Pala, Pico, carretilla.
Actividad: Compactación Manual y RCD.

Se realizo la recolección manual de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) En las Áreas intervenidas, asegurando su adecuada disposición temporal en la zona correspondiente a la Cancha de futbol, se Ejecutaran Labores de Compactación de terreno de manera manual, Sobre todo el Material Granular de Sub-base (Caliche). Garantizando una Correcta densificación del Estrato para mejorar la Capacidad Portante, estas actividades se efectuaron siguiendo líneas de nivel previamente establecidas, Asegurando Uniformidad y Pendiente adecuada.

26/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO.
Personal en Obra: 1 Arquitecto; 1 Maestro; 4 Ayudantes; 1 Topografo.
Herramienta Manual: Pico, Pala, Carretilla,
Equipos: Compactador tipo Canguro.
Actividad: Compactacion y Trazado.

Se realizo ingreso y Puesta en Operacion de la Rana Vibratoria Para la Compactacion mecánica del terreno, en áreas Previamente niveladas, a Fin de Garantizar la densidad requerida Segun especificaciones técnicas. Así mismo, se efectuo La disposición y Armado del trompo mezclador para la preparacion de Morteros y concretos en Sitio conforme a las proporciones de Diseño. A las Zonas Biosaludables, el Sector de Bolita Unter y el área Urbana con fragua, empleando cuerdas de nivel, estacas y Pinturas de Señalizacion para definir ejes.

27/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: Soleado
Personal en Obra: 1 Arquitecto; 1 topograto; 1 Cadenero.
Herramienta: Punto De MIRA.
Actvidad: TRAZADO SOBRE Clle 43 Con CRA 30B.

Se Ejecuto trazado y Replanteo topografico de La Plazoleta, Utilizando instrumentos de Precisión Para garantizar cotas y alineamientos Conforme a los Planos Arquitectónicos. Se Marcaron Ejes principales y Se Definieron Las Referencias para la Futura instalación de Pavimento y Mobiliario Urbano, asegurando la Correcta nivelación y Pendiente Según especificaciones del proyecto.

28 / 7 / 25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
Personal En OBRA: 1 ARQUITECTO; 1 MAESTRO; 7 AYUDANTES
Herramienta Manual: Pico, Pala; Barra, Carretilla.
Equipos: Compactador tipo Canguro.
Actividad: Acopio, Demolición y Compactación de terreno.

Se realizo acopio y Clasificación De residuos de Construcción y Demolición (RCD). Conforme a la normativa ambiental Vigente, Utilizando Zonas de Almacenamiento temporal Debidamente Señalizadas. Se Procedio al Retiro del Cerramiento Provisional, efectuando el Desmontaje de elementos metalicos y Paneles en Orden Secuencial Para evitar Afectaciones al área Perimetral. Posteriormente, se ejecuto La Demolición Controlada del Anden existente, empleando Herramientas mecánicas y manuales, garantizando la Correcta Segregación de materiales Para Su disposición Final y evitando interferencias con Las estructuras adyacentes. Las actividades se desarrollaron Siguiendo las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental.
Reunión 2:30 tenida con addi y Interventoria.

29/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
Personal EN OBRA: 1 ARQUITECTO, 1 MAESTRO; 8 AYUDANTES
Herramienta manual: Pico, Pala, Barra, Carretilla.
EQuipos: Compactador tipo Canguro
Actividad: ACopio; Cerramiento; Demoliciones.

Se realizo instalacion de Cerramiento sobre viga de anden al limite con CRA 51, Asegurando la Correcta nivelación y Alineación de Postes y Paneles Según Plano de Obra; se Continuo con la Demolicion de anden existente realizando Corte y Retiro Controlado; así como el Acopio Manual de RCD Recuperables para Disposición y Reutilizacion Según Normativa ambiental. se realizaron las respectivas Demoliciones de Tacheles utilizando Herramientas manuales y la excavación en puntos estrategicos Para determinación de niveles del terreno.

30/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO
Personal en Obra: 1 Arquitecto; 1 Maestro; 8 Ayudantes
Herramienta manual: Pico, Pala, Barra, Carretilla.
Actividad: Demolicion, Cambio de Planos y Determinación de nivel.

Se Realizaron Ajustes en Planos aprobados por la alcaldía, modificando Las rampas Peatonales para Cumplir con normativa de accesibilidad y garantizar Pendientes adecuadas; Se Continuo Con la Demolición de elementos existentes, Incluyendo retiro controlado de Concreto, Cumpliendo con protocolos de Seguridad; tambien Se realizo acopio de RCD Clasificando materiales de manera Organizada, se Determino de Finalizar el nivel de la Cancha realizando excavaciones puntuales y Mediciones con nivel.

31/7/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: 1 ARQUITECTO; 1 MAESTRO; 3 AYUDANTES.
Herramienta Manual: Pico, Pala, Barra, Carretilla.
Actividad: Demolición, Excavación, Compactación.

Durante la jornada se realizo compactación de Relleno en la áreas Previamente excavadas, Utilizando equipo de Compactación mecánica para garantizar la densidad especificada en el Diseño, Se ejecutó la reparación del Cerramiento perimetral Conformado por Laminas ZINC calibre 24, Asegurando su correcta fijación y Alineación Para mantener la Proteccion de la Obra. Asimismo, se Continuaron las labores de demolición del anden existente, efectuando cortes controlados y retiro de material. De igual Forma se realizo el acopio de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Segregando y almacenando los materiales en la zona destinada Para su disposición.

1/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO
Personal en Obra: 1 Arquitecto, 1 Maestro; 8 Ayudantes
Herramienta manual: Pico, Pala, Carretilla.
Actividad. Demolición, excavación.

Se Avanzo en la demolición del anden Ubicado Sobre CRA 51, Realizando Cortes Controlados y Retiro Progresivo del Concreto existente Conforme a las especificaciones del Diseño, Paralelamente, Se ejecuto la Recolección y Acopio RCD (Residuos de Construcción y Demolición). en La Zona destinada Para almacenamiento temporal, garantizando la Segregación adecuada Para su posterior disposición. Durante la Jornada Se Recibio un viaje de material caliche Para Su utilización en rellenos y mejoramientos de Subrasante, así como un acopio de Arena.

2/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
Personal En obra: 1 Arquitecto; 1 Maestro; 8 Ayudantes.
Herramienta Manual: Pico, Pala, Carretilla.
Actividad: Recolección RCD y Compactación terreno..

Durante la jornada se realizo la recolección y acopio de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). Provenientes de las actividades Previas. Clasificandolos en la zona designada Para disposición temporal, adicional-mente, Se ejecutó la Compactación del Relleno mediante métodos manuales y con el Uso de equipo tipo "RANA" (Compactador de Impacto), Garantizando la Densidad Adecuada Conforme a las especificaciones del Diseño.

4/8/23

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO
Personal en Obra: 1 Arquitecto ; 1 maestro ; 8 Ayudantes.
Actividad: Compactación de terreno, Demolición, RCD, Excavación.
Herramientas Manuales: Pico, Pala, Carretilla.
Equipos: TRONZADORA, RANA.

En la Jornada se recibio Material Caliche Para Relleno, destinado al mejoramiento de Subrasante y Conformación de Capas estables en la Plataforma de trabajo. también se contó Con el Ingreso de Volqueta Para transporte y Retiro de RCD Asegurando la Correcta disposición Según Normativa ambiental. Se ejecutaron Labores de Compactación del terreno Utilizando equipo mecánico Para garantizar la densidad requerida conforme a las especificaciones del proyecto. Adicionalmente Se realizaron excavaciones Puntuales Para Verificación y Ajuste de Niveles del terreno, Empleando Instrumentos topográficos para definir cotas y Pendientes. Finalmente, Se llevo a cabo el figurado de Acero de Refuerzo destinado a la Conformación de zapatas de Cimentación, siguiendo las dimensiones y Detalles indicados en los Planos Estructurales.

5/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: 1 Arquitecto, 1 SST, 1 MESTRO, 8 AYUDANTES.
Actividad: Figurado Hierro Viga 30x30. Excavación de Zarpa y Compactación.
Herramientas manuales: Pico, Pala, Carretilla.
EQUIPO: RANA, TRONZADORA.

Durante La Jornada Se realizaron actividades de Figurado de Acero de Refuerzo para elementos estructurales, Incluyendo el Armado Correspondiente en los Planos Según Indicaciones. Se Ejecutaron Labores de Excavación para la Conformación de Zarpas de Cimentación, asegurando las dimensiones y Profundidades indicadas y Verificando Cotas mediante nivelación topográfica, Posteriormente, se Procedio con la Compactación del terreno en áreas intervenidas, Utilizando equipo mecánico tipo "RANA" y Controlando la Densidad mediante ensayos de Campo.

6/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: Soleado T: Lluvia y Cielo Gris.
Personal en Obra: 2 Arq; 1 SST; 1 MAESTRO; 8 Ayudantes.
Herramientas: Pico, Pala, Carretilla.
EQUIPOS: RANA y TRONZADORA.
Actividad: Recolección RCD, Excavación y Compactación terreno.

Durante la Jornada Se recibio Volqueta Para el Cargue y Retiro de Escombros (RCD) Generados Por las actividades Previas de Demolición, garantizando su disposición conforme a la normativa ambiental. Se Ejecutaron trabajos de Excavación en áreas especificas, orientados a la Conformación de Cimientos, Verificando cotas y Pendientes. Se realizaron labores de Compactación del terreno mediante equipo Mecánico tipo "RANA", Asegurando la densidad Establecida. Cabe Resaltar que a las 15:00 Horas Se Presento lluvia Intensa.

7/8/23

ESTADO DEL TIEMPO: M: Soleado T: Soleado.
Personal en Obra: 1 ARQ; 1 SST; 1 MAESTRO; 8 Ayudantes.
Herramientas: Pico, Pala, Carretilla.
Equipos: RANA y Tronzadora
Actividad: Excavación ZAPATA, Futbol Cancha, Demolición.

* Excavación ZAPATA CORRIDA. Dimension 1.10 m de Ancho x 0.40 m. de Profundidad.
* Control de taludes y estabilización de terreno
* RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO Y TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO TEMPORAL.
* Limpieza de la zona Para Permitir Continuidad de Obra.
* MARCACIÓN y Delimitación del Perimetro mediante Estacas y Cordeles.
* CORTE y RETIRO DE VARILLAS y ARMADO de Refuerzo Según especificaciones.

8/8/23

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
P. Obra: 1 Arq; 1 SST; 1 MAESTRO; 8 Ayudantes.
Herramientas: Pico, Pala, Barra, Carretilla. EQuipos: RANA, TRANSADORA.
Actividad: Llegada de Material; caliche; Varillas. Recolección RCD y Demolición de Placa.

* Ajuster de tiempos de trabajo Según capacidad de drenaje del terreno y Condiciones climaticas.
* Descarga y Distribución del Material en Zonas Previamente Marcadas.
* Retiros de Escombros Provenientes de Demolición y excavaciones.
* corte y Retiro de Losas existentes.
* Nivelación Progresiva del terreno 16,20.

9/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: NUBLADO.
Personal en Obra: 1 ARQ; 1 SST; 1 MAESTRO; 2 Ayudantes
Herramientas: Pico, Pala, Carretilla. Equipos: RANA; TRONZADORA
Actividades del DIA son:

* Retiro controlado de losas existentes para liberar Sección de Cimentación.
* Cortes de Refuerzos metálicos y Disposición de material en RCD.
* Control de niveles y Profundidades mediante nivel topografico.
* Cortes y Doblados de Varillas Conforme a especificaciones del Proyecto.
* Comprobación, Recubrimiento y Nivelación antes del Vertido de Concreto.

11/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: SOLEADO.
Personal en Obra: 1 ARQ; 1 SST) 1 MAESTRO; 7 AYUDANTES.
Herramientas: Pico, Pala; Carretilla, Barra Equipos: RANA, TRONZADORA
LAS ACTIVIDADES DEL DIA SON:

* Excavación en zona de Calzada Para adecuación de Subrasante.
* Delimitación de Ejes y secciones Para Control de Profundidad y alineación
* Medición de Densidad in Situ mediante Prueba Proctor.
* Descargue y almacenamiento Seguro, evitando Humedad y Contaminación
* DISTRIBUCIÓN y Compactación progresiva para garantizar Uniformidad y estabilidad del terreno.

12/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: NUBLADO
Personal en Obra: 1 ARQ, 1 SST; 1 Maestro; 7 Ayudantes
Herramientas: Pico, Pala, Barra, Carretilla. Equipos: PANA.
LAS ACTIVIDADES DE SON:

* RESTAURACIÓN de Cercas perimetrales Afectada y cambio de lugar
* Verificación de anclajes y estabilidad Estructural.
* Ajuste de Nivel y alineación de Cerramiento.
* Excavación de Zapata Corrida, Respetando Dimensiones Del Proyecto.
* Retiro y Acopio De RCD.
* Corte, doblado y amarre de Varillas con alambre recocido.
* Excavación Controlada Para adecuación SUBEASanto.

13/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: SOLEADO T: NUBLADO.
Personal en Obra: 1 ARQ, 1 SST; 1 MAESTRO; 7 Ayudantes.
Herramientas: Pico, Pala, Barra, Carretilla. Equipos: Tranzadora:
LAS ACTIVIDADES DE HOY SON:

* Preparación y colocación de Encofrados Para la Conformación de Zarpas, garantizando dimensiones Según Planos.
* Instalación de Armaduras de Refuerzo, varillas Longitudinales y ESTRIBOS.
* Ejecución DE Excavación con Sección en Forma "C" Para la Cimentación especial o adecuación de Canalización.
* Acopio de Material excavado y Disposición Segun Normatividad ambiental.

14/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: Soleado T: NUBLADO y Llovia.
Personal en Obra: 1 Arq; 1 SST; 1 MAESTRO OBRA, 8 Ayudantes
Herramienta: Pico, Pala, Carretilla, Pico, Equipo: Martillo Demoledor.
Actividad de Hoy:

* Socialización de Avances del Proyecto y Ajustes de Cronograma.
* Registro de Compromisos y Observaciones.
* Colocación de Armaduras Previamente Figuradas en las excavaciones Para Cimentación.
* Retiro de Losa Superior Para exponer estructuras.
* Montaje de Estructura Metálica Para Soporte del Cerramiento Perimetral.
* Interrupción Parcial Por condiciones meteorológicas adversas.

15/8/25

ESTADO DEL TIEMPO: M: Soleado. T: Soleado.
Personal en Obra: 1 Arq, 1 SST; 1 maestro OBra; 8 Ayudantes.
Herramienta: pico, Pala, Carretilla, Equipo: PANA.
Actividades de Hoy.

* Colocación y Aseguramiento del encofrado Para Viga de Sección Variable, garantizando alineación y estabilidad.
* Instalación de tuberías o Ductos embebidos según diseño, antes del Vaciado
* Corte, doblado y Conformación de Varillas Según Refuerzo ESTRUCTURAL.
* Complimiento Mínimo Para Protección contra Corrosión.


Fecha: Junio 16 del 2025. Estado del Tiempo: M. Soleado T. Soleado
Personal en Obra: Arq. Residente, Ing. Contratista, SST, Topografo oficial, Topografo Ayud, Maestro obra, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipos: Estación topográfica.
Actividades: Topografia: trazado y nivelación; visita de funcionario de "Siembra" para pedo de hierros y señalización de arboles a talar.

Arq. Residente

Fecha: Junio 17 del 2025: Estado del tiempo. M. Soleado T. Soleado
Personal en obra: Arq. Residente, Ing. Contratista, SST, oficial de Siembra, Maestro de Obra. Oficial Topografo, Ayudante Topografia.
Equipo: Estación Topografica, Guaraobra.
Actividades: trazado, replanteo, nivelacion, pedos de hierros de parte de Siembra.


Arq. Residente

Fecha: Junio 18 del 2025. Estado del tiempo: M. Soleado T. Soleado
Personal en Obra: Arq. Residente, Ing. Contratista, SST, Topografia: Oficial, Ayudante, oficial Siembra, Maestro de obra, 2 Ayudantes.
Actividades: Levantamiento Altimetrico; pedo de hierros de parte de Siembra; Desmonte de Losetas, Adoquin en área lado cdo de Cantal y via de Servicio.

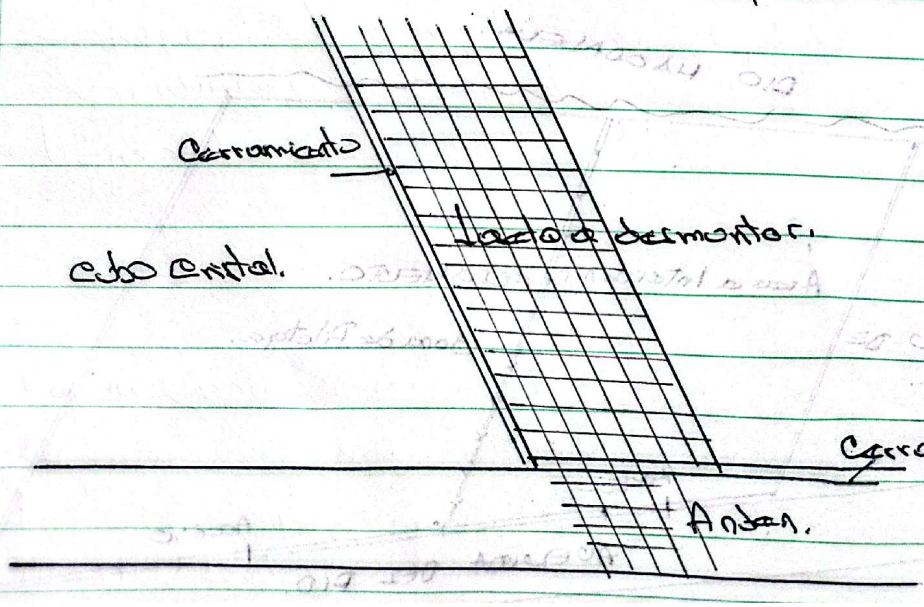

Powered by CamScanner

Personal en Obra: Arq. Residente, Ing. Contratista, SST, Oficial topografía, Ayudante topografía, Maestro obra, Oficial, 3 Ayudantes.
Actividades: Nivelación topográfica, desmonte de losetas adoquín, demolición de placa de concreto; se ejecuta con funcionario de siembra de Arboles a retirar por encontrarse en sendero a construir.

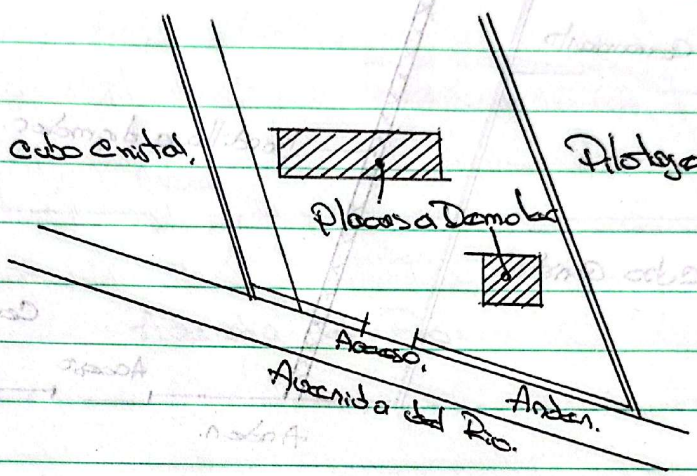

Arq. Resd.

Fecha: Junio 20 del 2025. Estado del tiempo: M. soleado T. soleado
Personal en Obras: Arq. Residente, Ing. Contratista, SST, Oficial topografía, Ayudante topografía, Maestro de Obra, 1 Oficial 3 Ayudantes.
Actividades: Replanteo, desmonte de losetas adoquín, demolición de placa en concreto.


Arq. Resd.

Fecha: Junio 21 del 2025. Estado del tiempo: M. soleado T. Sol
Personal en Obra: Arq. Residente, Ing. Contratista, SST, Maestro 1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades: Desmonte de losetas adoquín, demoliciones de placas en concreto.

Arq. Resd.

Powered by CamScanner

Fecha: Junio 24 del 2025. Estado del tiempo: M. soleado T. soleado.
Personal en obra: Arq. Residente, Ing. Contratista, SST, Topografo-ayudante, Maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Actividades: Nivelación y replanteo topografico, desmonte de losetas de adoquin, demolición de bordillos demolición de placa en concreto:

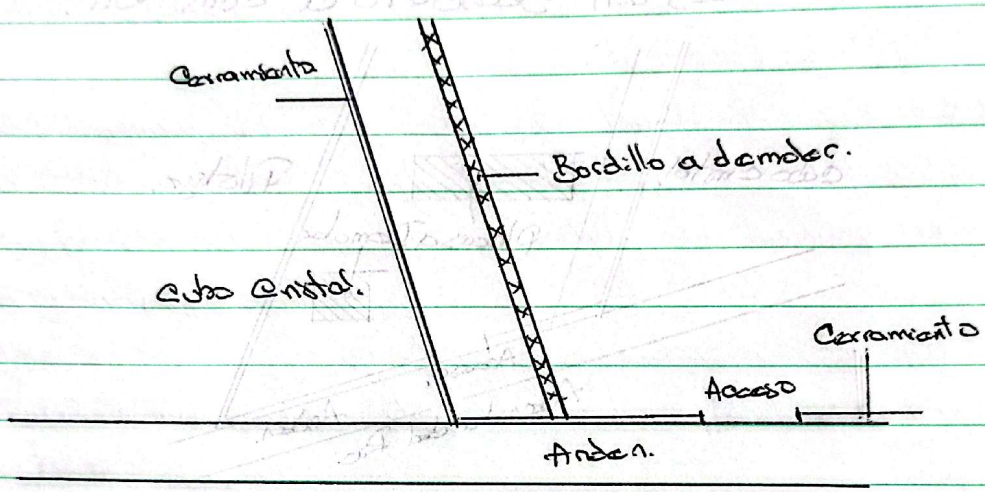


Arq. Residente

Fecha: Junio 25 del 2025. Estado del Tiempo: M. soleado T. soleado
Personal en Obra: Arq. Residente, Ing. Contratista, comision topografica, SST, Maestro Obra, 1 oficial, 3 ayudante, Operador retroexcavadora.
Equipos: Estación topografica, 1 Retroexcavadora
Actividades: Descapote con Retroexcavadora, demolicion de bordillos y placa en concreto

Arq. Resi.

Fecha: Junio 26 del 2025: Estado del Tiempo: M. soleado T. soleado
Personal en obra: Arq. Residente, Ing. contratista, SST, comision topografica, Operador, Maestro obra, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Equipos: Estación Topografica, Retroexcavadora.
Actividades: Descapote en D[illegible]

de Placa en concreto, excavación para bordillo.

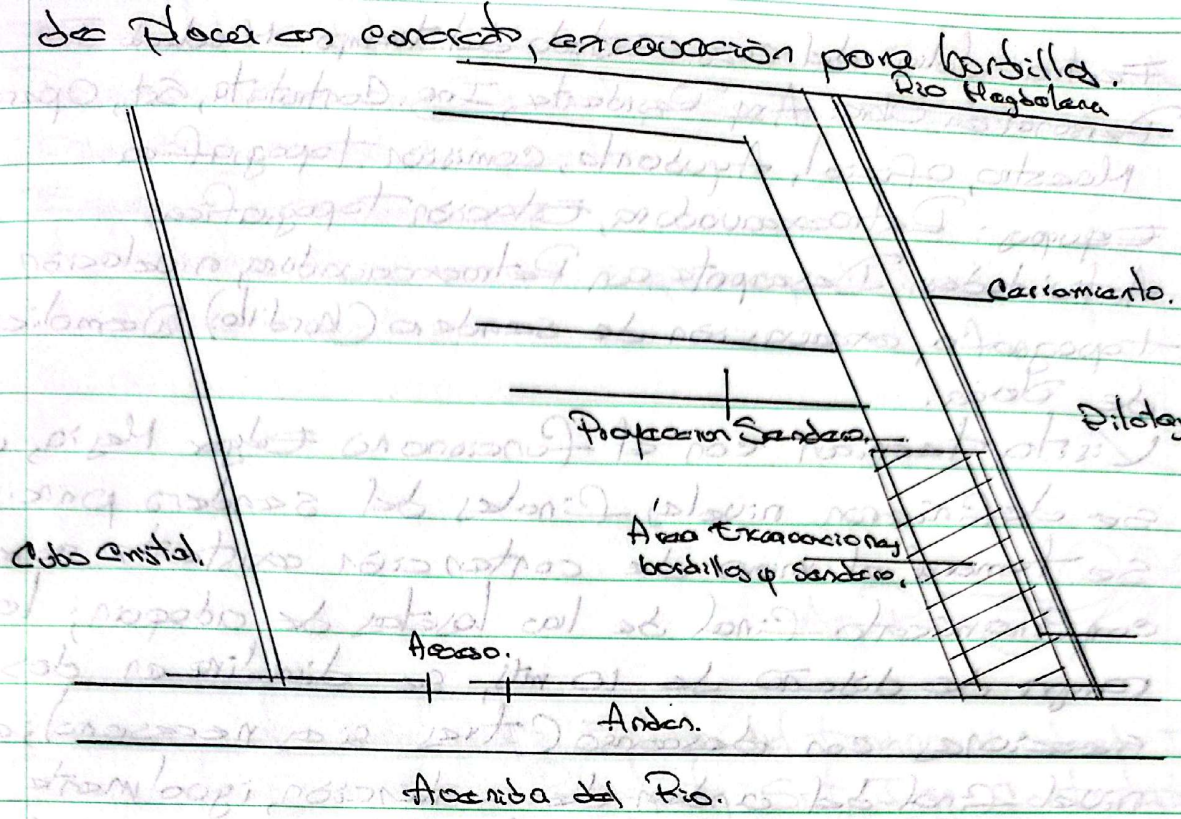

Arq. Resid.


Fecha: Junio 27 del 2025. Estado del tiempo: Nublado T. soleado
Personal: Arq. Residente, Ing. Contratista, Sst. Operador Maquinaria, Maestro de Obra, 2 oficiales, 3 Ayudantes, comisión topografica.
Equipo: Estacion Topografica, Retroexcavadora.
Actividades: Descapote con retroexcavadora, demarte de concreto, demolición de placa, excavación de Bordillo.

Arq. Residente

Fecha: Junio 28 del 2025. Estado del tiempo: Nublado.
Personal: Arq. Residente, Ing. Contratista, Sst, operador, comición topografica, 1 Maestro, 1 Ayudante.
Equipo: Estacion topografica, Retroexcavadora.
Actividades: Descapote, acopio de materiales, toma de cotas de niveles.


Arq Residente

Fecha: Julio 1 del 2025. Estado del tiempo: Mayormente T.
Personal en Obra: Ing. Residente, Ing. Contratista, Sst., Operador, Maestro, oficial, Ayudante, comision topografica.
Equipo: Retroexcavadora, Estacion topografica.
Actividades: Descapote con Retroexcavadora, nivelacion con topografia, excavacion de sendero (bordillos). Demolicion de Boca.
Visita tecnica con el funcionario Edgar Mejia, donde se definieron niveles finales del sendero principal: Se tomará el muro de contención existente como confinamiento final de las losetas de adoquin; la rampa de diseño de 10 mts, se dividirá en dos secciones con descanso (tres si es necesario); el nivel final del anden de contención, igualmente se toma como nivel de empalme, con una viga final contra

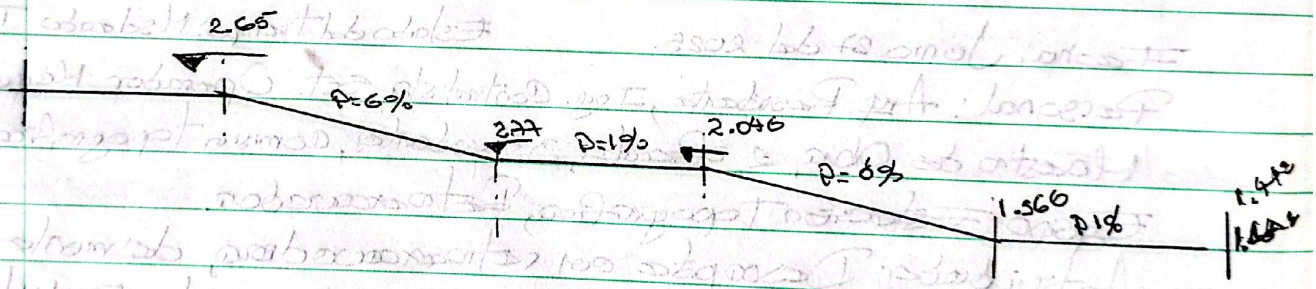

Propuesta 01.

RAMPA SENDERO CENTRAL.

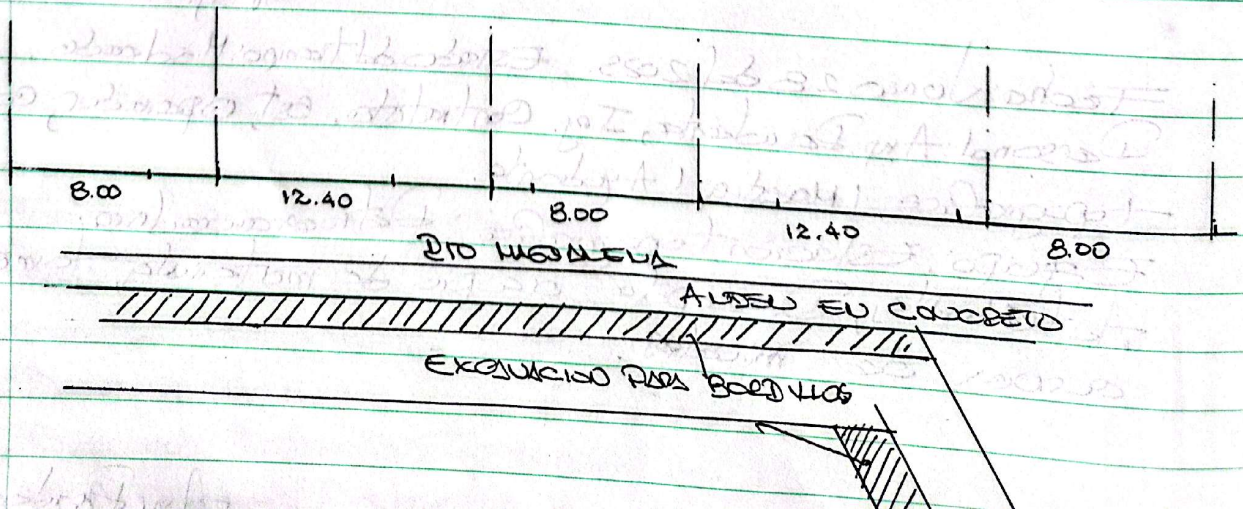


Fecha: Julio 2 del 2025. Estado del Tiempo: M. soleado T. soleado
Personal en Obra: Arq. Residente, SST., Ing. Contratista, Maestro, Operador, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipo: Retroexcavadora.
Actividades: Excavación maquinaria, de sardinel y demolición de placa.


Arq. Resid.

Fecha: Julio 3 del 2025. Estado del tiempo M. soleado T soleado.
Personal en obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operado maquinaria, Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipo: Retroexcavadora.
Actividades: Excavación de Bordillo y perfilacion, excavación de Sendero central.

Arq. Resid.

Fecha: Julio 4 del 2025. Estado del Tiempo: M. soleado T: Nublado
Personal en Obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador Maquinaria, Maestro obra, 1 oficial, 2 Ayudante.
Equipo: Retroexcavadora.
Actividades: Perfilacion excavación de bordillos, lado sendero andén Rio, Excavación de Sendero central, desde muro de Contención al cerramiento.

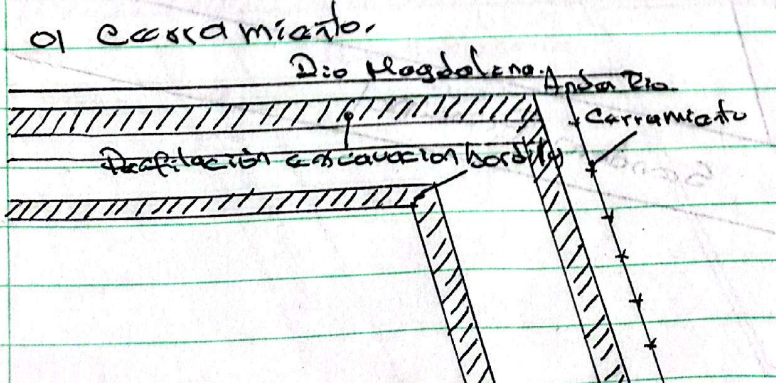


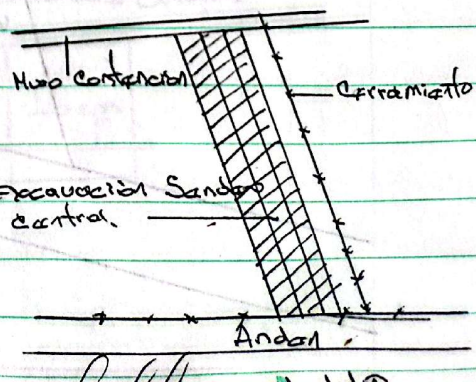

Powered by CamScanner

Fecha: Julio 5/25. Estado del Tiempo: Nublado y Lluvias.
Personal en Obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador maquinaria, Maestro de Obras, 1 oficial, 2 ayudantes.
Equipo: Retroexcavadora.
Actividades: Excavación de Sendero central, entre muro de contención y andén avenida del Rio

Fecha: Julio 7/25. Estado del Tiempo: M. Soleado T. Soleado
Personal en Obra: Arq. Residente, Sst., Ing. Contratista Operador Maquinaria, Maestro de obras, 1 oficial, 2 ayudante
Equipos: Retroexcavadora.
Actividades: Topografía zona luminarias, trazado bordillo confinamiento zona de luces, excavacion Sendero Principal lado andén avenida del rio. Excavación bordillo zona de luces.
Equipo: Retroexcavadora, estación topográfica:

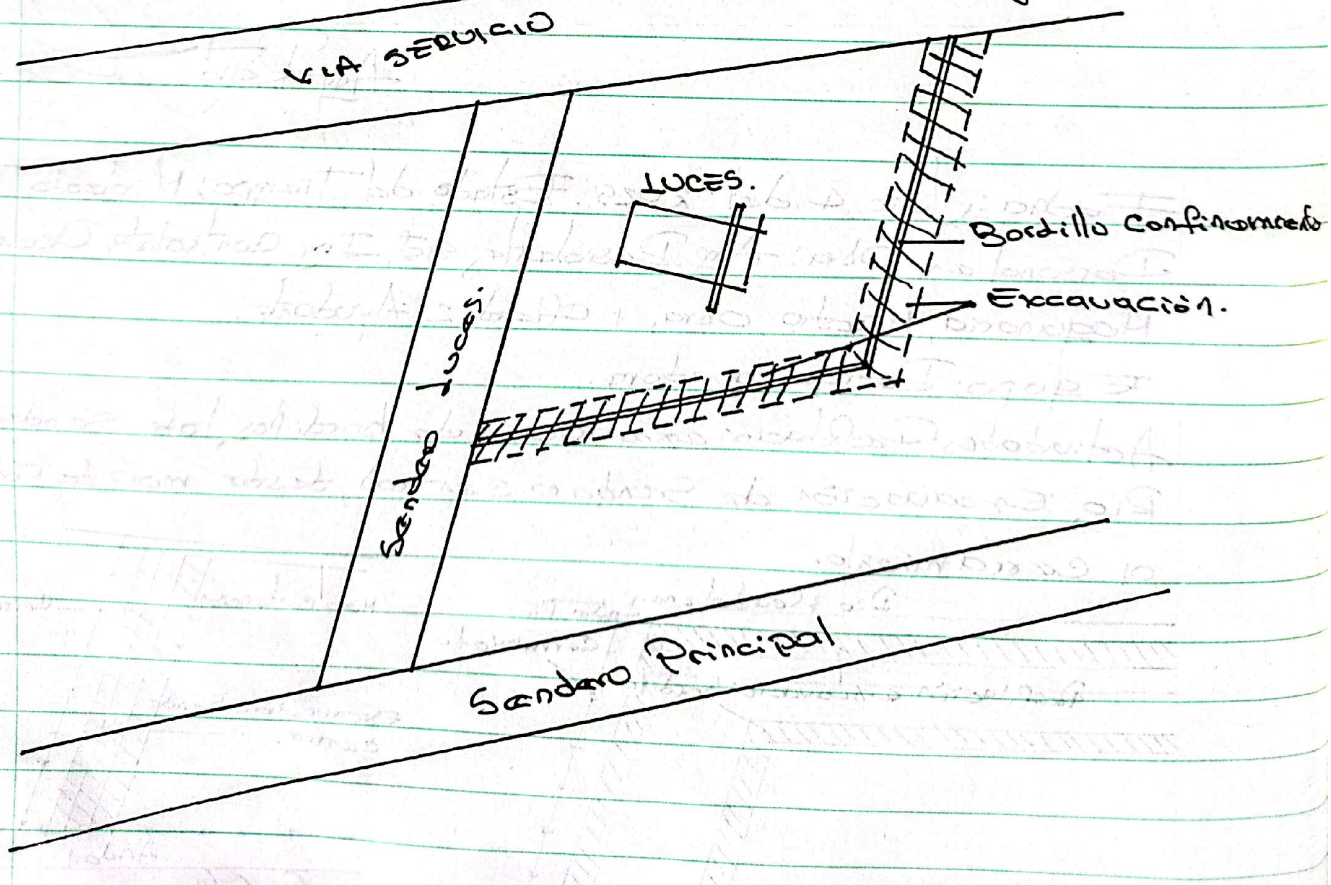



Powered by CamScanner

visto del Funcionario de Siembra Germán Padilla, para inventariar arboles a talar dentro de la zona de bordillos, en Lucas.
Ingreso de Contenedor Bodega

Arq. Residente


Fecha: Julio 8/25. Estado del Tiempo: M: Soleado. T: Soleado.
Personal en Obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador Retroexcavadora, Maestro de Obra, 1 Oficial, 2 ayudantes.
Equipo: Retroexcavadora.
Actividades: Excavación bordillos zona Lucas, excavación Sendero Central, desde anden avenida del Rio hasta Muro de contención.
En recorrido de Obra con el Arq. Edgar de ADI se determino lo siguiente:

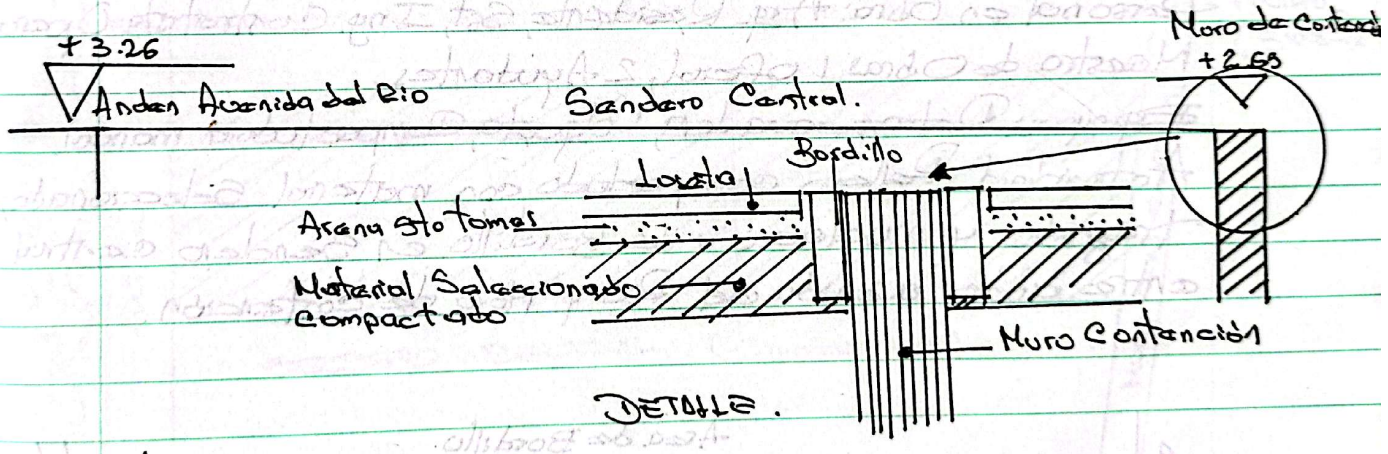

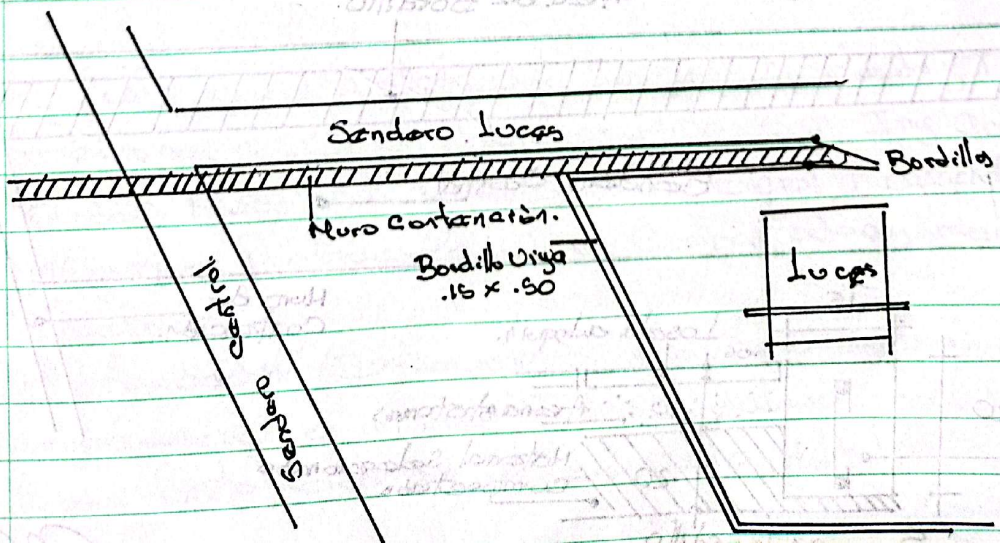


Powered by CamScanner

Fecha: Julio 9/25. Estado del Tiempo: M. soleado; T: Soleado.
Personal en Obra: Arq. Residente, Sst, Ing. Contratista, Operador Maquinaria, Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora, Rana compactadora, 2 Volquetes.
Actividades: Excavación bordillo zona de Losas; Excavación sendero principal; Relleno con material seleccionado Colocha, Sendero Central $e = 0.20$ MTS. desde Arden avenida del Rio a Muro de contención.

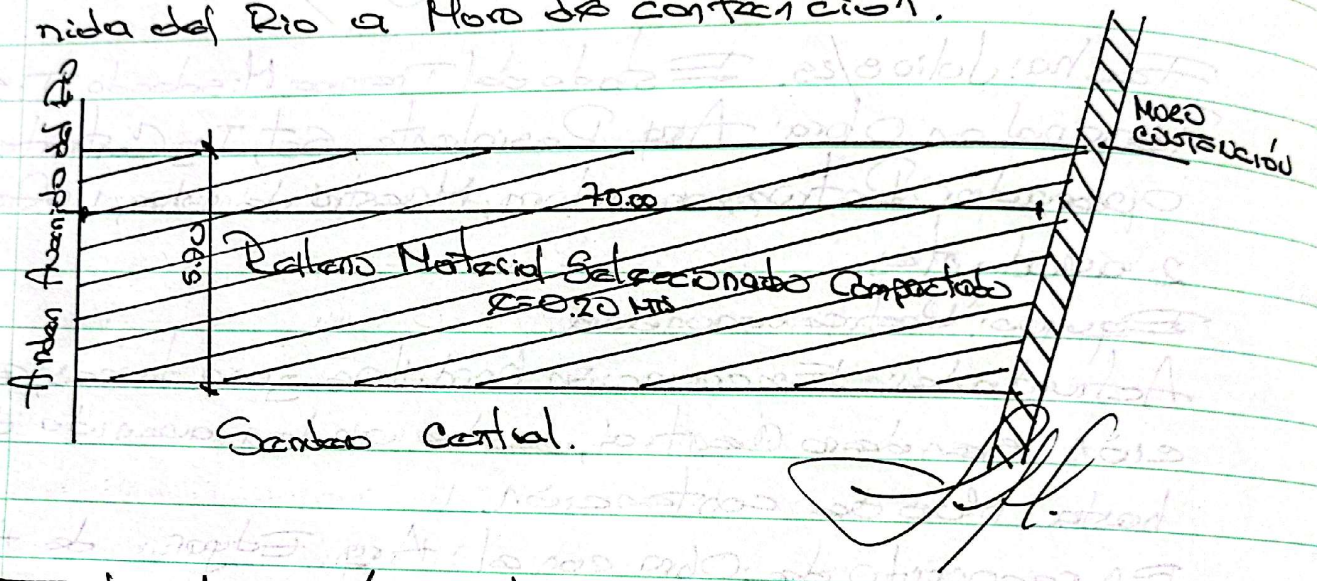


Fecha: Julio 10/25. Estado del Tiempo: M: Nublado; T: Soleado.
Personal en Obra: Arq. Residente, Sst, Ing. Contratista. Operador, Maestro de Obras, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora, Volqueta, Compactadora manual.
Actividad: Relleno compactado con material Seleccionado; trazado y nivelación de Bordillo en Sendero central entre arden avenida del Rio y Muro de contención.

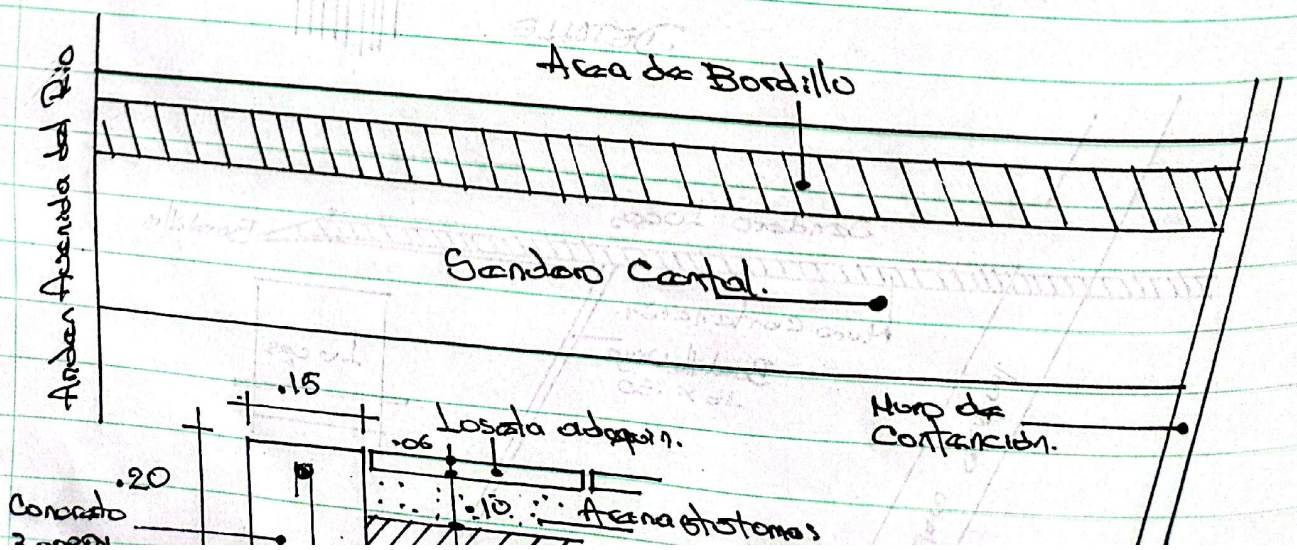

Julio 11/25. Estado del Tiempo: M: Soleado; T: Soleado
Personal en Obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador Maquinaria, Maestro Obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora, Compactadora manual, 1 Volqueta.
Actividades: Relleno compactado con material seleccionado, trazado y nivelación de Bordillos, desde Anden Avenida del Rio, hasta Muro de contención.

Julio 12/25. Estado del Tiempo: M: Soleado.
Personal en Obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador Maquinaria, Maestro de Obra, 1 oficial, 2 Ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora, compactadora manual, 2 Volqueta
Actividades: Relleno compactado Sendero Principal, desde Muro Contención hasta Anden Avenida del Rio; Excavación Sendero Principal desde Muro de Contención hasta anden Rio Magdalena; Retiro de material de excavación en Volquetas dde transporte a disposición final El Triunfo (3 viajes).

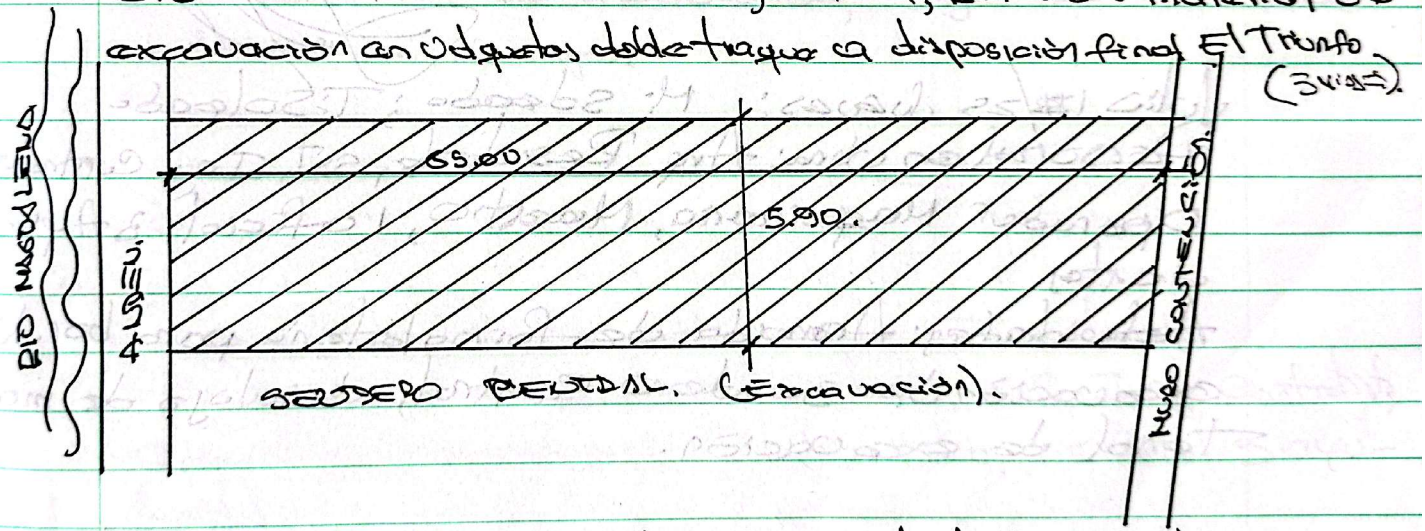

Julio 14/25. Estado del Tiempo: M: Soleado; T: Soleado
Personal en Obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador Maquinaria, Maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.
Equipo: Retroexcavadora, Compactadoras manual, Generador electrico.
Actividades: Excavación Sendero central desde Muro de contención a Anden Rio Magdalena; trazado y nivelacion para instalación de formaleteria Metálica, de Bordillos

Julio 15/25. Martes: Estado del Tiempo: M: Soleado T: Soleado
Personal en obra: Arq. Residente; SST, Ing. Contratista, Operador, Maestro obra, 1 oficial, 3 Ayudantes.
Equipo: Retroexcavadora, Compactadora Manual, Mezcladora, Generador electrico.
Actividades: Compactación material seleccionado en sendero central, trazado Bordillo; Excavación Sendero central, desde Muro de contención a Andén Rio Magdalena

Julio 16/25 Miercoles: M: soleado; T: Soleado
Personal en obra; Arq. Residente; SST; Ing contratista, Operador, Maestro, 1 oficial 3 Ayudantes:
Actividades: Compactación material seleccionado, Excavación sendero central.; Desalojo de material de excavación

Julio 17/25 Jueves: M: Soleado; T: Soleado
Personal en obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador Maquinaria, Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes.
Actividades: Armada de formaleteria para bordillo; excavación de sendero central; desalojo de material de excavación.

Julio 18/25. Viernes: M: soleado T: Soleado
Personal en obra: Arq. Residente, SST, Ing. contratista Operador Maquinaria, Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes
Equipo: Retro excavadora, 2 Volqueta, Mezcladora, Generador electrico.
Actividades: formaleteria bordillo

Julio 19/25 Sabado: M: Sdcado
Personal en Obra: Arq Residente, SST, Ing Contratista, Operador Maquinaria, Maestro obra, 1 oficial, 3 Ayudantes.
Actividades: Corte y figuracion de aceros de bordillo, Desalojo de materiales de excavacion

Julio 21/25. Lunes. M. sdcado T: sdcado
Personal en Obra: Arq Residente, SST, Ing. Contratista, Operador maquinaria, Maestro obra, 1 Oficial, 3 Ayudantes:
Equipos: Retroexcavadora, Generador Electrico, tronzadora.
Actividades: Corte y figuracion de Aceros, Retiro de material de excavacion, viajes, doble trabajo a la fecha: 15 viajes

Julio 22/25. Martes. M: sdcado T: sdcado.
Personal en obra: Arq. Residente, SST, Ing. Contratista, Operador maquinaria, Maestro Obra, 1 oficial 3 ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora. Generador Electrico
Mezcladora.
Actividades: Corte y figuracion de aceros, Formaleteria de bordillos.

Julio 23/25.: M Soleado. T. Soleado.
personal en obra: Arq. Residente, SST, Ing Contralista: Operador Maquinaria, Maestro de obra, 1 oficial 3 Ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora, Generador Electrico, Mezcladora.
Actividades: Corte y figuración de acero, Encofrado de bordillos, Fundido del Mismo.

JUlio 24/25: Jueves: M. Soleado. T: Soleado.
Personal en obra: Arq Residente, SST, Ing Contralista. Operador Maquinaria, Maestro de obra, 1 Oficial 3 Ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora, Generador Electrico, Mezcladora.
Actividades: Corte y figuración de acero, Desencofrado de bordillo, Armado de acero y Encofrado de bordillo. Excavación de Material de sitio, Retiro de Escombro.

Julio 25/25. Viernes: M. Soleado, T: Soleado.
Personal en Obra: Arq residente, SST, Ing contralista. Operador Maquinaria, Maestro de obra, 1 Oficial. 3 Ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora, Generador Electrico, Mezcladora. Herramienta Menor, Vibro compactador (Saca bobo).
Actividades: Corte y figuración de acero, desencofrado. de bordillo, Armado de acero, fundido de bordillo Relleno de material caliche y compactado del material.


Powered by CamScanner

Julio 26-25: M. Soleado, T.: Soleado. - Sabado).
Personal de obra: Arq Residente, Sst, Ing contratista.
Operador Maquinaria, Maestro de obra, 4 oficial,
3 ayudantes.
Equipos: Retroexcavadora., Generador electrico, Mezcladora
Actividades: Corte y figuración de acero, encofrado.
de bordillo, Relleno y compactación de material.
Caliche.

Julio 28-25: M. Soleado, T: Soleado - Lunes.
Personal en obra: Arq. Residente, Sst, Ing contratista.
Operador. Maquinaria., Maestro de obra., 1 oficial,
3 ayudante.
Equipos: Retroexcavadora, Generador Electrico,
Mezcladora. Vibrocompactador (Gato bobo).
Actividades: Corte y. figuración de acero, encofrado de
bordillo, Relleno y Compactación de Material Caliche.
fundido de bordillos., Excavación de Material de Sitio.


Julio 29-25: Mañana: Soleado. Tarde Soleada. (Marks).
Personal en obra: Residente de obra - SST - Maestro.
1 Oficial - 3 Ayudantes - 1 operador.
Actividades: Desencofrado de bordillo, excavación, replanteo
Corte y figurado de acero.

Se hace recorrido en el sendero adyacente al terraminto con la Loria.
el cual quedo de un ancho fijo de 1,83 mt interno y bordillos en
los extremos de 15 cm. y 30cm.
La pendiente del sendero va desde la Aven. del río hasta el muro

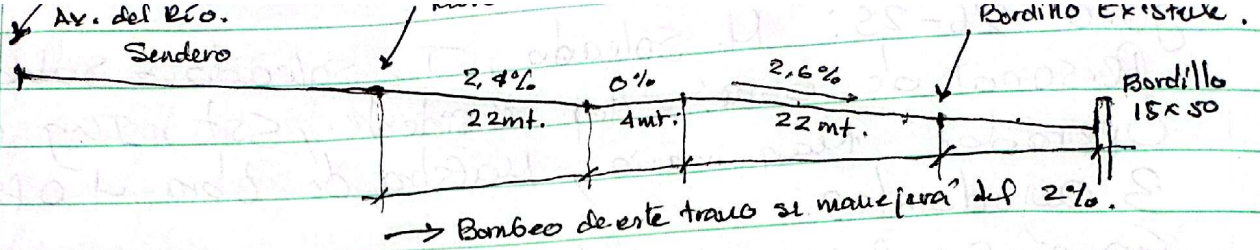

→ Bombeo de este tramo si manejara del 2%.

El sendero paralelo al río se fije de ancho 3,01 con bordillas adyacente de 15x50 cm y el otro 15x30 cm.

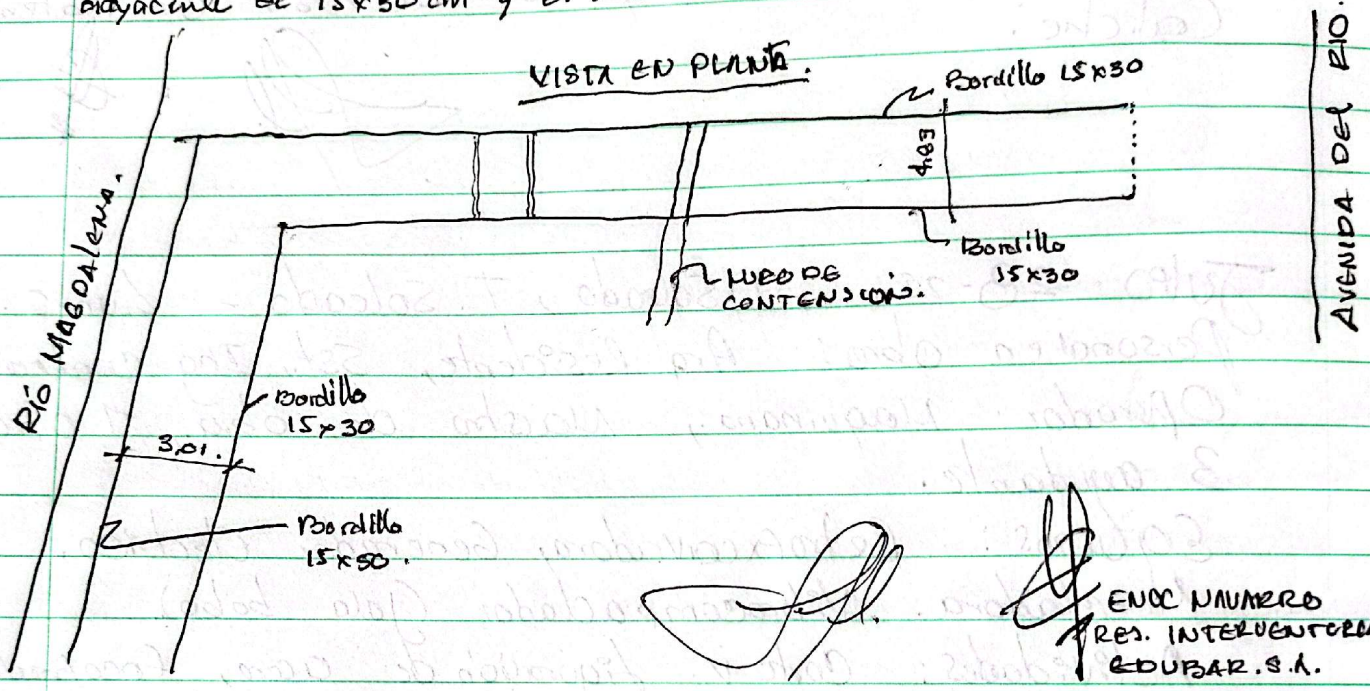

ENOC NAVARRO
RES. INTERVENTORES
EDUBAR S.A.

30 de Julio de 2025 Estado del Tiempo M: Soleado T: Soleada


Personal en obra: Residente de obra - SST - Maestro
1 Oficial - 3 Ayudantes - 1 Operador

Herramientas - Equipos: Herramientas varias - 1 Retro excavadora - 1 Rana.
1 Planta eléctrica - 1 Trompo

Actividades programadas: Excavación para bordillo, conformación de base figurado de acero, formaleta para bordillas con rieles. Limpieza y acopio de material de demolición.

- Se presenta humedad puntual en la zona del sendero, más exactamente en el sendero que va paralelo al río, esta humedad se muestra puntual en esta zona, el resto del área adyacente a esta no presenta humedad.
- Se consulto con la Ing. Nugeth Veras, y su recomendación es que se realicen apiques, para ver hasta donde

Powered by CamScanner

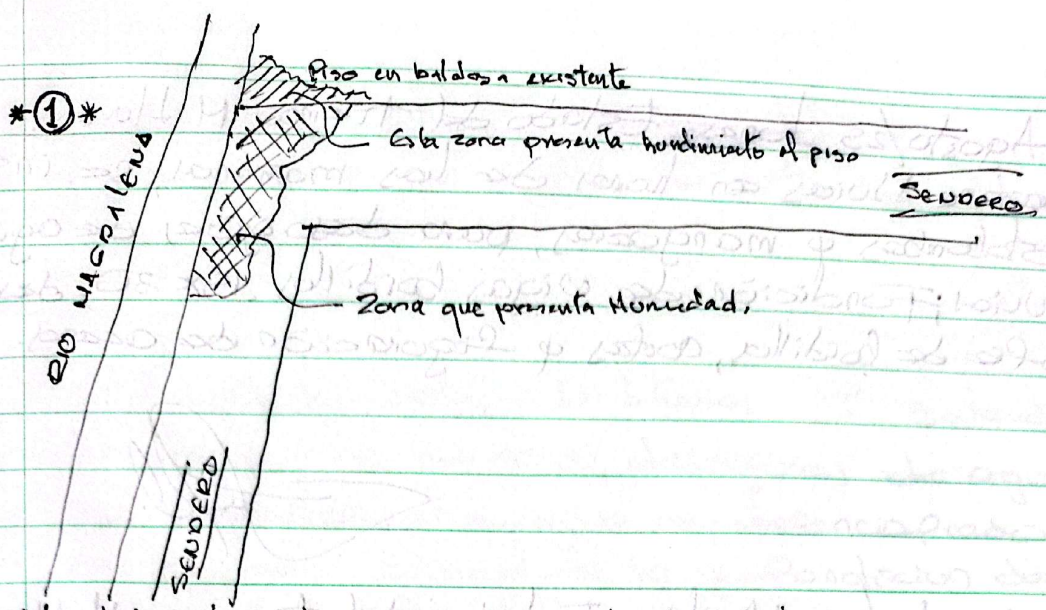

*La Interventoría de EDUBAR S.A. solicita al Contratista nos facilite la información de la cantidad de retiro de material RCD, material producto de la excavaciones, material vegetal, así como los materiales de cantera como gravilla, arena y material de relleno (caliche). Lo anterior es una exigencia ambiental que nos exige la Secretaria de obras públicas (Resolución 0472 de 2017).

(1) Debido al problema de nivel freatico presentado en la zona del sendero, como se muestra en el dibujo de arriba, se le solicita al Contratista presente una solución a esta problemática, para aprobación por parte de EDUBAR. S.A.

ARQ. ENOC NAVARRO
Residente de Interventoría
EDUBAR. S.A.

1 Agosto /25. Viernes Estado del tiempo: M: lluvias T: Soleado
Fundición de bordillos 0.15 x 0.30, excavación y desagues de aguas lluvias, dosificación de bordillos. Cocido y figuración de acero.

2 Agosto /25. Sabado. Estado del tiempo: lluvia intensa. No se pudo laborar por estado de terreno por motivos de lluvias

Norma
Powered by CamScanner

4 Agosto/25 Lunes: Estado del tiempo: Mañana lluvias en horas de la mañana, se instalan motobombas y mangueras, para desagües de aguas lluvias; Fundición de vigas bordillos .15x.30, desencofre de bordillos, codos y figuración de aceros.

5 Agosto/25: Martes. Estado del tiempo: M: lluvias lluvias en la mañana, mejoramiento de terreno con Retroexcavadora, desalojo de material de excavación y demoliciones, Fundición de bordillo 0.15 x 0.30 ; desagües de aguas lluvias con motobombas y mangueras; codos y figuración de aceros para estribos.

6 Agosto/25. Miercoles: M: lluvias T: soleado lluvias por las mañana, desencofre de vigas dintel, excavaciones para bordillos, fundicion de bordillos 0.15 x 0.30 ; desalojo de materiales de excavación; codos y figuración de aceros de estribos ϕ 3/8

8 Agosto/25. Viernes: M: lluvias T: soleado. lluvias en horas de las mañana, desagues de aguas lluvias con motobombas. y mangueras, retiro de material en estado no apto, desalojo de material de excavación, Formaletera para bordillos, rellenos con cal viva en zona de sendero

9 Agosto/25. Sabado Mañana: Lluvias.
No se elaboro por motivo de intensas lluvias

11 Agosto/25. Lunes: M: Lluvias T: Soleado.
Lluvias por la mañana; desagües de aguas lluvias con motobomba y mangueras; desencofrado de bordillos en concreto; formaleteria y fundicion de bordillos 0.15x0.30, concreto 3.000 psi. Cortes y figurados de estribos ϕ 3/8.

EDUBAR S.A.

12 Agosto/25. Martes. M: Soleado T: Soleado.
Encofrado de bordillos, retiro de material de excavacion, corte y figurado de flejes ϕ 3/8", excavacion y preparacion de zona de bordillo

EDUBAR S.A.

13 Agosto Miercoles: M: Soleado T: Soleado
Pulido con pisoteo, area de bordillo, encofrado y fundicion de bordilla 0.15x0.30, en concreto 3.000psi corte y figurado de acero de bordillo, Retiro de material de excavacion; visita de funcionarios de obras publicas.

EDUBAR S.A.

Powered by CamScanner

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 4000 PSI**

UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO **FECHA: 06-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE JHON JAIRO HURTADO ZAPATA MURO DE CONTENCION	09-07-25	16-07-25	7	81.20	4	8.0	17960.3	145.8	2604.9	4000	65.1%	
2		09-07-25	23-07-25	14	81.20	4	8.0	24701.3	200.6	3582.6		89.6%	
3		09-07-25	06-08-25	28	81.20	4	8.0	27545.8	223.7	3995.2		99.9%	

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

DENSIDADES - MEDIANTE METODOS NUCLEARES INV - E - 164 - 2013

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII) LOTE 4

EMPRESA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

DESCRIPCIÓN: Terraplen Material Seleccionado (Caliche) **UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO** **FECHA: 04-08-2025**

% De Humedad optima laboratorio 11.3 **Densidad maxima seca laboratorio (lb/pie 3)** 119.5

Densidad No	1	2	3	4
Ubicacion	Parque Ciudad Modesto- Plazoleta Kiosco	Parque Ciudad Modesto- Zona Juegos Infantiles	Parque Ciudad Modesto- Zona Biosaludable	
Profundidad en cm	15	15	15	
Densidad Humeda (lb/pie 3)	121.3	120.4	122.7	
Densidad Seca (lb/pie 3)	115.4	113.7	116.3	
% De Humedad	5.1	5.9	5.4	
% De Compactacion Terreno	96.6	95.1	97.4	
% De Compactacion Especificada	95	95	95	

OBSERVACIONES:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

DENSIDADES - MEDIANTE METODOS NUCLEARES INV - E - 164 - 2013

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII) LOTE 4

EMPRESA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

DESCRIPCIÓN: Terraplen Material Seleccionado (Caliche) **UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO** **FECHA: 04-08-2025**

% De Humedad optima laboratorio 11.3 **Densidad maxima seca laboratorio (lb/pie 3)** 119.5

Densidad No	1	2		
Ubicacion	Parque Jhon Jairo Hurtado-Cancha Sintetica	Parque Jhon Jairo Hurtado-Plazoleta Kiosco	Parque Jhon Jairo Hurtado-Zona de Juegos Infantiles	Parque Jhon Jairo Hurtado-Plazoletas
Profundidad en cm	15	15	15	15
Densidad Humeda (lb/pie 3)	118.5	121.7	117.3	119.8
Densidad Seca (lb/pie 3)	115.1	117.4	113.5	114.5
% De Humedad	3.0	3.6	3.3	4.6
% De Compactacion Terreno	96.3	98.3	95.0	95.8
% De Compactacion Especificada	95	95	95	95

OBSERVACIONES:

LUIS BARRAZA M.
TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

DENSIDADES - MEDIANTE METODOS NUCLEARES INV - E - 164 - 2013

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII) LOTE 4

EMPRESA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

DESCRIPCIÓN: Terraplen Material Seleccionado (Caliche) **UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO** **FECHA: 26-07-2025**

% De Humedad optima laboratorio 11.3 **Densidad maxima seca laboratorio (lb/pie 3)** 119.5

Densidad No	1	2	3	4
Ubicacion	Parque Plaza Aguila- Area de Carrera 51	Parque Plaza Aguila- Area de Carrera 50B		
Profundidad en cm	15	15		
Densidad Humeda (lb/pie 3)	118.2	120.4		
Densidad Seca (lb/pie 3)	113.4	115.7		
% De Humedad	4.3	4.1		
% De Compactacion Terreno	94.9	96.8		
% De Compactacion Especificada	95	95		

OBSERVACIONES:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

DENSIDADES - MEDIANTE METODOS NUCLEARES INV - E - 164 - 2013

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII) LOTE 4

EMPRESA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

DESCRIPCIÓN: Terraplen Material Seleccionado (Caliche) **UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO** **FECHA: 26-07-2025**

% De Humedad optima laboratorio 11.3 **Densidad maxima seca laboratorio (lb/pie 3)** 119.5

Densidad No	1	2	3	4
Ubicacion	Parque La Norya- Sendero Peatonal	Parque La Norya- Sendero Peatonal	Parque La Norya- Sendero Peatonal	
Profundidad en cm	15	15	15	
Densidad Humeda (lb/pie 3)	124.4	120.1	122.9	
Densidad Seca (lb/pie 3)	119.2	117.2	116.8	
% De Humedad	4.3	2.5	5.2	
% De Compactacion Terreno	99.8	98.1	97.7	
% De Compactacion Especificada	95	95	95	

OBSERVACIONES:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**

UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO **FECHA: 09-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE CIUDAD MODESTO VIGA 30X30	26-07-25	02-08-25	7	81.20	4	8.0	13557.2	110.1	1966.3	3000	65.5%	
2		26-07-25	09-08-25	14	81.20	4	8.0	18526.3	150.4	2687.0		89.6%	
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**			
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**			
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**		**UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO**	**FECHA: 12-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE CIUDAD MODESTO VIGA 15X20	29-07-25	05-08-25	7	81.20	4	8.0	13561.5	110.1	1966.9	3000	65.6%	
2		29-07-25	12-08-25	14	81.20	4	8.0	18710.2	151.9	2713.7		90.5%	
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**

UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO **FECHA: 12-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE CIUDAD MODESTO PLACA DE CONCRETO	05-08-25	12-08-25	7	81.20	4	8.0	13143.5	106.7	1906.3	3000	63.5%	
2													
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**

UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO **FECHA: 12-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE CIUDAD MODESTO PISO ESTAMPADO	05-08-25	12-08-25	7	81.20	4	8.0	13304.9	108.0	1929.7	3000	64.3%	
2													
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**			
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**			
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**		**UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO**	**FECHA: 09-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE JHON JAIRO HURTADO VIGA 30X30	26-07-25	02-08-25	7	81.20	4	8.0	12713.7	103.2	1844.0	3000	61.5%	
2		26-07-25	09-08-25	14	81.20	4	8.0	18771.8	152.4	2722.6		90.8%	
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**

UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO **FECHA: 08-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE JHON JAIRO HURTADO PLACA DE CONCRETO	25-07-25	01-08-25	7	81.20	4	8.0	13971.2	113.4	2026.4	3000	67.5%	
2		25-07-25	08-08-25	14	81.20	4	8.0	19142.0	155.4	2776.3		92.5%	
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**			
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**			
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**		**UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO**	**FECHA: 08-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE JHON JAIRO HURTADO PISO ESTAMPADO	25-07-25	01-08-25	7	81.20	4	8.0	13626.4	110.6	1976.3	3000	65.9%	
2		25-07-25	08-08-25	14	81.20	4	8.0	18801.5	152.7	2726.9		90.9%	
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**			
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**			
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**		**UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO**	**FECHA: 13-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE JHON JAIRO HURTADO VIGA 20X20	16-07-25	23-07-25	7	81.20	4	8.0	13741.0	111.6	1993.0	3000	66.4%	
2		16-07-25	30-07-25	14	81.20	4	8.0	18434.4	149.7	2673.7		89.1%	
3		16-07-25	13-08-25	28	81.20	4	8.0	20298.3	164.8	2944.0		98.1%	

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME

SUELOS & SERVICIOS S.A.S
Tu proyecto, nuestro trabajo

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

PROYECTO :	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**
EMPRESA:	**Consorcio escenarios EP**
DESCRIPCIÓN:	**Concreto mezclado en obra - Fluido - f'c= 3000 PSI**

UBICACIÓN: BARRANQUILLA - ATLANTICO **FECHA: 06-08-25**

CILINDRO No.	LOCALIZACION	FECHA DE TOMA	FECHA DE ROTURA	EDAD (DIAS)	AREA (cm2)	ANCHO (PUL)	ALTURA (PUL)	LECTURA MAQUINA (KN/M2)	LECTURA MAQUINA (KN)	LECTURA MAQUINA (Kg/f)	RESISTENCIA DE DISEÑO (3000 PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA %	OBSERVACION
1	PARQUE LA NORYA VIGA 15X20	23-07-25	30-07-25	7	81.20	4	8.0	13700.0	111.2	1987.0	3000	66.2%	
2		23-07-25	06-08-25	14	81.20	4	8.0	18935.0	153.8	2746.3		91.5%	
3													

OBSERVACIONES:

ELABORO:

LUIS BARRAZA M.

TEC LABORATORISTA

FIN DEL INFORME
