REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME TECNICO MENSUAL DE OBRA No. 02
PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII)"

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS EP

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

INDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCION 5
2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 6
2.1 Localización del Proyecto. 6
3 ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO 9
3.1 Información contractual 9
3.2 Garantías constituidas por el contratista 9
3.3 Ejecución del contrato 10
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO 11
4.1 Seguimiento de avance del contrato 11
4.2 Relación de actividades ejecutadas 11
4.3 Gestión social 12
4.3.1 Información, divulgación y participación comunitaria 13
4.3.2 PGS, Infraestructura de predios. 14
4.3.3 PGS, sostenibilidad social 14
4.3.4 PGS, Política de empleo. 16
4.3.5 PGS atención a la comunidad 16
4.3.6 Conclusiones 17
4.4 Control de personal de obra 18
4.4.1 Contratista 18
4.4.2 Solicitudes entre contratista e interventoría 18
4.5 Requerimientos efectuados 19
4.6 Pagos de tributos 19
4.7 Gestiones realizadas con empresas de servicio publico 19
5 ASPECTOS TECNICOS 20
5.1 Plano récord 20
5.2 Análisis de precios y actividades no previstas 20
5.3 Control de los equipos 20
5.4 Pruebas y resultados 20
5.5 Evidencias fotográficas 20
5.6 Cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad 22
6 ASPECTOS AMBIENTALES 23
6.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. 23

6.1.1 Objetivo general 23
6.1.2 Objetivos específicos: 23
6.1.3 Actividades ejecutadas durante el periodo 23
6.1.4 Identificación de peligros y riesgo 24
6.1.5 Seguridad social 24
6.1.6 Uso y entrega de epp 24
6.1.7 Capacitaciones y pausas activas 25
6.1.8 Inspecciones y equipos de emergencia 27
6.1.9 Accidentalidad 27
6.1.10 Preoperacionales de máquinas, equipo herramientas manuales y de poder 27
6.1.11 Servicios de higiene – orden y aseo 28
6.1.12 Señalizaciones 28
6.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental 29
6.2.1 Cumplimiento Legal y Contractual Ambiental 29
6.2.2 Manejo Ambiental en Obra 29
6.2.3 Manejo de Residuos Sólidos 29
6.2.4 Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) 29
6.2.5 Manejo de materiales 30
6.2.6 Campamentos e Instalaciones Temporales 30
6.2.7 Contaminación Atmosférica y Ruido 31
6.2.8 Manejo de Aguas Residuales 31
6.2.9 Manejo de Maquinaria 31
6.2.10 Manejo de Vegetación 31
7 ASPECTO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 32
7.1 Resumen del manejo del anticipo y estado de la amortización 32
7.2 Resumen sobre el rendimiento financiero del anticipo. 32
7.3 Patrimonio Autónomo. 32
7.4 Bienes nacionales 32
8 ASPECTOS LEGALES 33
8.1 Aporte a seguridad social y parafiscales 33
8.2 Cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación 34
8.3 Desviación del contratista o la interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 34

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35
10 ANEXOS 36

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Áreas totales de parques intervenidos 7
Tabla 2. Información del contrato. 9
Tabla 3. Información de pólizas. 9
Tabla 4. Cobertura de pólizas. 10
Tabla 5. Seguimiento de avance de obra. 11
Tabla 6. Divulgación y participación comunitaria. 13
Tabla 147. Personal del contratista. 18
Tabla 8. Personal del contratista 30

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa del departamento del Atlántico. 6
Figura 2. Mapa de Barranquilla y su área Metropolitana. 8
Figura 3. Evidencia fotográfica de actividades ejecutadas. 22
Figura 4. Uso de EPP 25
Figura 5. Equipos de emergencias. 27
Figura 6. Servicio de higiene. 28
Figura 7. Uso de Señalizaciones. 29
Figura 8. Campamento e instalaciones temporales. 30
Figura 9. Cerramiento. 31
Figura 10. Planilla de aporte a seguridad social y parafiscales. 34

1 INTRODUCCION

Como es ya conocido, el Distrito de Barranquilla cuenta aproximadamente con 320 espacios entre parques, plazoletas, bulevares, zonas verdes, que representan un total de 1.755.672 m2 de área, con aproximadamente un 60% de áreas duras, lo cual, ha impactado positivamente con respecto a años anteriores la vulnerabilidad ante el cambio climático, creando una red verde que permite la mejora en el medioambiente, en el paisajismo que tienen los parques y además, incentiva aspectos como la práctica del deporte, la integración de las familias y comunidades enteras.

Se hace necesario que se sigan construyendo e interviniendo esta clase de espacios para lograr fortalecer a Barranquilla como una ciudad amigable con el medio ambiente, alineándose con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está propendiendo la Agenda Mundial 2030, especialmente su objetivo de prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Busca implementar medidas en los territorios que minimicen los efectos del cambio climático de acuerdo con las necesidades propias. Con el objetivo de transformar los espacios públicos en áreas de recreación, encuentro y esparcimiento, esta iniciativa busca no solo embellecer la ciudad, sino también mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, consideró necesario y oportuno la celebración de un contrato para llevar a cabo la séptima fase de ejecución de las obras correspondientes al mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores de la ciudad.

Este proyecto no solo se trata de plantar árboles y construir juegos, sino de diseñar espacios inclusivos que reflejen la diversidad y la identidad cultural de Barranquilla. Desde la selección de especies vegetales autóctonas hasta la instalación de infraestructuras para personas con movilidad reducida, cada detalle se cuidará meticulosamente para garantizar que los parques sean accesibles y acogedores para todos.

En resumen, la ejecución de los parques en el Distrito de Barranquilla no solo transformará el paisaje urbano, sino que también promoverá la cohesión social, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible. Es un paso crucial hacia una ciudad más verde, más saludable y feliz para las generaciones presentes y futuras.

2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El presente documento resume las actividades ejecutadas en el Lote 3 por parte de CONSORCIO ESCENARIO EP, en el periodo comprendido del 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, durante el desarrollo de las actividades contenidas en Contrato de Obra No. **SA-008-2025 LOTE 2** que tiene por objeto el **MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).**

2.1 Localización del Proyecto.

El proyecto de MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). Se encuentra localizado dentro de cuatro de las cinco localidades del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Siendo estas:

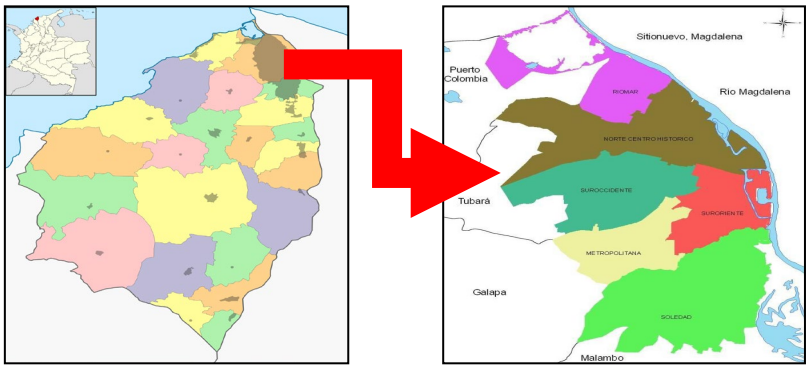


Figura 1. Mapa del departamento del Atlántico.

- **Sur Oriente:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con la carrera 38, al suroriente con el río Magdalena, al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo y al sur con los límites del municipio de Soledad.

- **Sur Occidente:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38, al suroriente con la acera oeste de la vía de la Cordialidad. Al este con la acera oeste de la calle Murillo y al sur occidente con los límites del municipio de Galapa, incluyendo zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de Juan Mina.

- **Metropolitana:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al suroriente con la acera este de la vía de la Cordialidad empalmando con la acera oeste de la calle Murillo (45) con carrera 21. Al suroeste con la avenida de la Circunvalar. Incluye zonas de expansión urbana y rural.

- **Riomar:** Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con río Magdalena, al occidente con los límites del municipio de Puerto Colombia, al sur con la acera norte de la carrera 46- Autopista Paralela al Mar hasta la calle 84, y al oriente de la carrera 46 con calle 84 siguiendo hasta la calle 82 y la calle 84, finalizando en el río Magdalena. Incluye zonas de expansión urbana y rural y el corregimiento de La Playa.

- **Norte- Centro Histórico:** Al nororiente con el río Magdalena; al norte con la acera sur de la carrera 46 autopista el mar hasta la calle 84, siguiendo hasta la calle 82 con carrera 64 hasta empalmar con el río Magdalena, y al occidente con la avenida la Circunvalar, incluyendo zona de expansión urbana y rural.

A continuación, se presenta la distribución de los parques a intervenir dentro del Distrito de Barranquilla, según el contrato No. SA-008-2025 LOTE 2.

Tabla 1. Áreas totales de parques intervenidos

	ITEM	NOMBRE	AREA M2	AREA M2 ZONAS VERDES	LOCALIDAD	DIRECCION	BARRIO
LOTE 2	1	BULEVAR LAS GARDENIAS	10,780	3,234	METROPOLITANA	C 98C K1E 3C	GARDENIAS
	2	CANCHA SANTA CRUZ	2,280	684	METROPOLITANA	K 1B2 - CL 46J Y 46G	CIUDADELA 20 DE JULIO
	3	PARQUE LOS GIRASOLES	1,400	420	METROPOLITANA	K14 SUR CALLE 47A	LOS GIRASOLES
	4	PARQUE LA CEIBA	3,173	952	SUROCCIDENTE	K 14 C 60	LA CEIBA
	5	PARQUE CRISTO RESUCITADO - LA PLAYA	690	207	RIOMAR	K 10 C 15	LA PLAYA
	6	CANCHA ROCA PIEDRA	2,260	678	METROPOLITANA	C45 E K1J	CIUDADELA 20 DE JULIO
	7	CANCHA DE MICROFUTBOL "SOCIEDAD DE CRISTO"	2,634	742	SUROCCIDENTE	K 26C4 C 79	EL SILENCIO
	8	CANCHA SANTA MARIA	11,350	3,405	METROPOLITANA	KR 3B SUR C 77	SANTA MARIA
	9	PARQUE Y CANCHA EL PANA	1,500	222	METROPOLITANA	K 2G 53B 15	LAS AMERICAS
	10	PARQUE LAS PALMAS 2	1,630	652	SURORIENTE	C 33 Y 33A K 8	LAS PALMAS

La siguiente imagen, se encuentra la ubicación en KMZ de los parques priorizados por la Alcaldía de Barranquilla a la fecha:

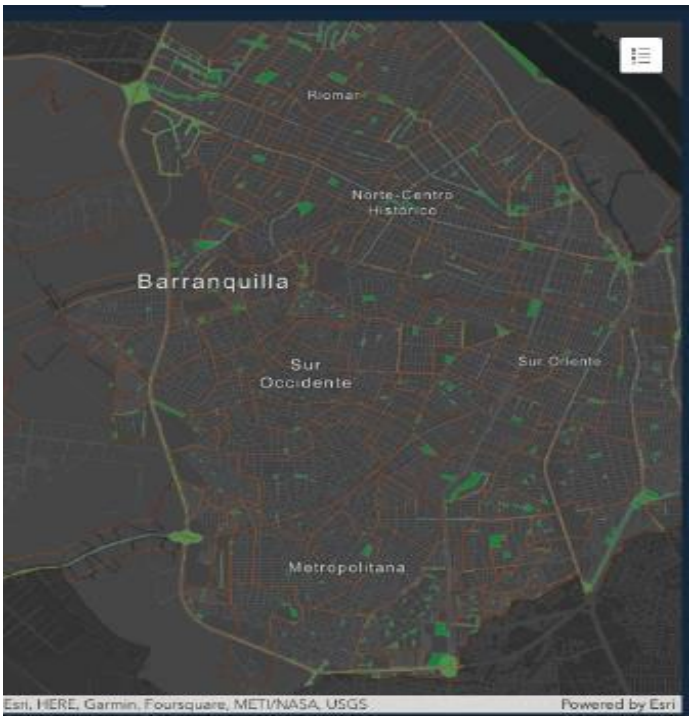


Figura 2. Mapa de Barranquilla y su área Metropolitana.

3 ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO

3.1 Información contractual

A continuación, se muestra aspectos generales del contrato:

Tabla 2. Información del contrato.

CONTRATO DE OBRA N°:	SA-008-2025 LOTE 2
SUPERVISOR:	CIRO LARA ORDOÑEZ – ALCALDIA DE BARRANQUILLA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANQUILLA PG
NIT	901.957.776-2
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII).
PLAZO	18 MESES
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	10 DE ABRIL DE 2027

3.2 Garantías constituidas por el contratista

A continuación, se muestra las pólizas adquiridas:

Tabla 3. Información de pólizas.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO	100026124
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	100006748
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	22/10/2025
FECHA DE EXPEDICION RESPONSABILIDAD CIVIL	22/10/2025

Tabla 4. Cobertura de pólizas.

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/10/2025	10/10/2027	$ 2.495.027.481,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/10/2025	12/04/2030	$ 4.990.054.963,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	12/04/2027	11/04/2032	$ 7.485.082.445,10

3.3 Ejecución del contrato

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no aplica

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

4.1 Seguimiento de avance del contrato

Teniendo en cuenta el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, se tuvo un avance de obra ejecutado de 6,48% frente a un 8,56 % de avance de obra programado. Donde por cada parque en ejecución y avance de contrato durante este periodo de tiempo se tiene los siguientes porcentajes de ejecución:

Tabla 5. Seguimiento de avance de obra.

PORCENTAJE DE AVANCE LOTE 2			
LOTE 2			
PARQUE	% EJECUTADO PERIODO	% ACUMULADO	% PROGRAMADO
CIUDAD CARIBE	3,05 %	20,08%	21,60%
SIAPE	3,39 %	14,18%	16,10%
MUSEO MODERNO	6,45 %	12,67%	14,50%

4.2 Relación de actividades ejecutadas

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, se han ejecutado las siguientes actividades en cada parque:

- Parque Ciudad Caribe
  - Suministro e instalación de cerramiento en lamina de zinc, altura 2.00 metros
  - Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente, incluye retiro de material e= 0.25
  - Excavación a máquina y retiro de material a lugar certificado
  - Relleno en material seleccionado compactado (caliche)
  - Limpieza de obra y retiro de escombros.

- Parque Siape
  - Suministro e instalación de cerramiento en lamina de zinc, altura 2.00 metros
  - Demolición de muros de mampostería y retiro de material
  - Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m
  - Demolición de muro bajo. Incluye retiro de material.
  - Excavación a mano 0,30 x 0,30 ML
  - Armado y figuración de acero
  - Limpieza de obra y retiro de escombros.

- Museo moderno

    - Suministro e instalación de cerramiento en lamina de zinc, altura 2.00 metros (ver diseño)
    - Demolición de muros de mampostería y retiro de material
    - Demolición de placa en concreto, espesores mayores a 0.1 m hasta 0.3 m
    - Excavación a máquina y retiro de material a lugar certificado
    - Relleno en material seleccionado compactado (caliche)
    - Limpieza de obra y retiro de escombros.

4.3 Gestión social

El presente informe detalla la gestión social realizada durante el periodo del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 en el marco del contrato No: SA-008-2025 Lote 2. ° cuyo objeto es “Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. Fase VIII”

El proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través de la creación de un espacio público de calidad para la recreación y el deporte.

La gestión social es un componente fundamental para asegurar la viabilidad, sostenibilidad e integración del proyecto con el entorno y sus habitantes, buscando mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos identificados durante la ejecución de las obras. Este documento resume las acciones clave, los resultados obtenidos y los desafíos enfrentados en relación con la interacción comunitaria y las actividades de sostenibilidad.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades correspondientes a cada uno de los programas relacionados a continuación:

- Componente de Atención a la Comunidad
- Componentes de Información y Divulgación.
- Componentes de Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios públicos.
- Componentes de Participación Comunitaria.
- Componentes de Contratación de Mano de Obra

A continuación, se describen de manera detallada las actividades y resultados obtenidos durante la ejecución del Plan de Gestión Social, en cada uno de los ejes de intervención antes mencionados.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Implementar las actividades contenidas en el Plan de Gestión Social del proyecto, garantizando una comunicación efectiva, la participación comunitaria y la mitigación de impactos socioambientales adversos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Establecer mecanismos claros y accesibles de información y atención ciudadana para resolver dudas, inquietudes, quejas o reclamos generados por la obra.
-
- Promover la participación de la comunidad en el seguimiento del proyecto mediante la conformación de un comité de veeduría ciudadana.
-
- Desarrollar jornadas de sostenibilidad y apropiación del espacio con la comunidad para fomentar el cuidado y uso adecuado de las futuras instalaciones.

4.3.1 Información, divulgación y participación comunitaria

4.3.1.1 Instalación Punto de Atención a la comunidad -PAC

Tabla 6. Divulgación y participación comunitaria.

DIVULGACIÓN PRD CIUDAD CARIBE				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025	Se atendió el PAC en su horario establecido, los martes y jueves de los meses de noviembre y diciembre de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atención del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

DIVULGACIÓN SIAPE				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025	Se atendió el PAC en su horario establecido, los martes y jueves de los meses de noviembre y diciembre de 2025. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS por parte de la comunidad.	Atención del PAC	1	Registro fotográfico de la actividad.

4.3.1.2 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Socialización inicio de obra

Con el objetivo de suministrar a la comunidad de influencia directa y autoridades municipales, información directa, clara y oportuna sobre los impactos y manejos socioambientales del Proyecto y los aspectos técnicos que puedan ser del interés de la comunidad o las autoridades municipales se realizaron reuniones informativas para la socialización del inicio de obra en los siguientes frentes:

Tabla 7. Socializaciones inicio de obra

FRENTE DE OBRA	FECHA DE REUNIÓN	No. DE ASISTENTES
CIUDAD CARIBE	27/10/25	30
SIAPE	29/10/2025	14

4.3.2 PGS, Infraestructura de predios.

Con el fin de dejar evidencia del estado físico de los predios colindantes con la obra se realizó el levantamiento de las actas de vecindad inicial en los siguientes frentes de obra:

Tabla 8. Predios con actas de vecindad de inicio.

SECTORES	TIPOS DE PREDIOS					TOTAL PREDIOS	FIRMADA	POR FIRMAR	% EJECUCIÓN
	RESIDENCIAL	COMERCIAL	MIXTO	RECREACIONAL	INSTITUCIONAL				
CIUDAD CARIBE	10	0	0	0	0	10	10	0	100%
SIAPE	8	1	0	0	0	9	9	0	100%
TOTAL	19	1	0	0	0	19	19	0	100%

4.3.3 PGS, sostenibilidad social

Con el objetivo de viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social, de manera que se apliquen adecuadamente las medidas preventivas y correctivas de acuerdo con los impactos de la obra y de este modo garantizar su sostenibilidad se diseñó el plan de capacitaciones dirigidas al personal de la obra, miembros del comité de participación comunitaria y a la comunidad en general.

Jornadas de Sostenibilidad con la Comunidad

Con el fin de fomentar la apropiación del parque y promover prácticas sostenibles, el día 10 de diciembre se realizó una jornada de apropiación con la comunidad del sector de Ciudad Caribe para socializar la información del Punto de Atención a la comunidad.

FRENTE DE OBRA	TEMA	FECHA	# ASISTENTES
CIUDAD CARIBE	Socialización información del Punto de Atención a la comunidad	10/12/25	8

Charlas con el personal de la obra

Durante el período evaluado se desarrollaron charlas con el personal de la obra las cuales son una estrategia fundamental para garantizar la eficiencia, el cumplimiento normativo y la gestión social del proyecto.

Tabla 9. Charlas con el personal de la obra

FRENTE DE OBRA	TEMA	FECHA	# ASISTENTES
SIAPE	Socialización Plan de trabajo componente social y procedimiento para la atención a la comunidad	24/11/25	5
CIUDAD CARIBE	Socialización Plan de trabajo componente social y procedimiento para la atención a la comunidad	10/12/25	7

4.3.3.1 Programa de participación comunitaria.

Acciones desarrolladas

Durante las reuniones de socialización de inicio de obra se creó el comité de participación comunitaria con personas situadas en el área de influencia directa del sector de Caribe Verde y Siape.

Tabla 10. Conformación comité de participación comunitaria

FRENTE DE OBRA	FECHA DE REUNIÓN
CIUDAD CARIBE	27/10/25
SIAPE	29/10/2025

Así mismo se reforzará la divulgación de la información relacionada con las actividades ejecutadas por el contratista de obra en los componentes técnico, social, SST y ambiental a través de folletos enviados a través de medio virtual.

4.3.4 PGS, Política de empleo.

El contratista dio cumplimiento a los requerimientos contractuales de este componente según se establece en el contrato No. SA-008-2025 Lote 2. CLÁUSULA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, el CONTRATISTA se obliga con EDUBAR S.A. a lo siguiente:

1. ***El contratista cumple en la contratación población vulnerable definida en el contrato.***
Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán personas mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se ejecutará el contrato.

49. Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales.

Durante este periodo se registraron laborando 39 personas entre operativos y técnicos.

Tabla No 11. Generación de empleo

.

PERIODO	MONC	MOC	P. VULNERABLE	TOTAL
OCT-25	4	0	0	4
NOV-25	4	0	0	4
DIC-25	11	24	0	35

4.3.5 PGS atención a la comunidad

Este programa se centró en mantener un canal de comunicación abierto y transparente con los residentes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Puntos de Información: Se instaló un punto de información en la entrada de la obra y se definieron horarios de atención Ciudad Caribe (martes y jueves de 8 a.m. a 10 a.m.) y Siape (martes y jueves de 2 p.m. a 4 p.m.) para atender consultas y recibir peticiones.

Mecanismos de Divulgación: Se realizaron visitas puerta a puerta, se distribuyeron volantes informativos socializando los canales de comunicación para la atención a la comunidad.

Gestión de Quejas y Reclamos: Se hizo la apertura de un correo electrónico y una línea telefónica dedicada para la recepción de quejas, las cuales serán canalizadas al área correspondiente para su seguimiento y respuesta oportuna.

Dentro del periodo reportado no se recibieron manifestaciones ciudadanas (Peticiones, quejas, quejas reclamos o solicitudes.

Tabla No. 12. Relación de puntos de atención a la comunidad

FECHA DE APERTURA	DIRECCIÓN	HORARIO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE
27/10/2025	Ciudad Caribe	Martes y jueves de 8:00a.m. a 10:00a.m.	Profesional Social Contratista
29/10/2025	Siape	Martes y jueves de 2:00p.m. a 4:00p.m	Profesional Social Contratista

Tabla No. 13 Relación de quejas y/o reclamos meses de noviembre y diciembre de 2025

FRENTE DE OBRA	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO
CIUDAD CARIBE	0	0	0
SIAPE	0	0	0

4.3.6 Conclusiones

La gestión social del del contrato No: SA-008-2025 Lote 2. ° cuyo objeto es “Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del distrito de Barranquilla. Fase VIII” ha sido fundamental para asegurar una relación armoniosa entre la obra y la comunidad. Se logró mantener informada a la población y se gestionaron oportunamente sus inquietudes, lo cual contribuyó a la minimización de conflictos y a la generación de confianza.
La participación en las jornadas de sostenibilidad y la conformación del comité de participación comunitaria demuestran un alto grado de interés y compromiso de la comunidad con el proyecto, lo que augura un uso y mantenimiento adecuados de las instalaciones una vez finalizada la obra. El seguimiento continuo y la comunicación abierta seguirán siendo pilares para el cierre exitoso del proyecto.

4.4 Control de personal de obra

4.4.1 Contratista

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, el siguiente personal estuvo involucrado en el contrato.

Tabla 147. Personal del contratista.

N°	NOMBRE	CARGO
1.	LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA	GERENTE DEL PROYECTO
2.	BRAYAN CABALLERO PINEDA	DIRECTOR DE OBRA-URBANISTA
3.	CARLOS JAVIER VILLEGAS HERNANDEZ	RESIDENTE DE OBRA
4.	SHYNDI DAYANA BARRETO DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
5.	KAREN ALEJANDRA HOYOS FLORIAN	PROFESIONAL SISO

4.4.2 Solicitudes entre contratista e interventoría

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, se han realizado los siguientes requerimientos:

Tabla 15. Correspondencia entre contratista e interesados.

Radicado interno	Consecutivo del remitente	Nombre del remitente	Fecha de recibido	Asunto
R-1	QUILLA-2025-014513	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	7/07/2025	TRASLADO DE MEJORAMIENTO Y CONTREUCCION DE PARQUES
R-2	QUILLA-2025-014511	EDUBAR	7/07/2025	TRASLADO DE MEJORAMIENTO Y CONTREUCCION DE PARQUES
R-3	CORREO	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	23/10/2025	DISEÑO DE PARQUES
R-4	CORREO	EDUBAR	10/11/2025	DISEÑO
R-5	CORREO	EDUBAR	14/11/2025	DISEÑO
R-6	QUILLA-2025-02886173	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	18/11/2025	TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL
R-7	25-04361	BARRAQUILLA VERDE	11/11/2025	RESPUESTA RADICADO EXT -BV-2025-11405 DE 7/10/2025
R-8	4639 DEL 06.11.2025	BARRAQUILLA VERDE	24/11/2025	CITACION PARA NOTIFICACION DE RESOLUCION No. 4369

Radicado interno	Fecha de enviado	Asunto	Enviado a
D-1	4/07/2025	RECHAZO CONTRATOS SA-008-2025 LOTE 2	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
D-2	25/07/2025	POLIZAS SEGÚN CONTRATO	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
D-3	20/10/2025	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA	EDUBAR
D-4	30/10/2025	SOLICITUD DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA EDUBAR
D-5	30/10/2025	SOLICITUD DE AJUSTE A LA PERIOCIDAD	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA EDUBAR
D-6	4/11/2025	POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA EDUBAR
D-7	1/12/2025	PLAN DE GERENCIA	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA EDUBAR

4.5 Requerimientos efectuados

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no se han realizado requerimientos.

4.6 Pagos de tributos

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, debido a las condiciones del contrato la generación de cuentas de cobros, las cuales con llevan el pago de los tributos asociados a ellas, se da cada 3 meses desde la suscripción del acta de inicio.

Por lo tanto, para este periodo no aplica el pago de tributos.

4.7 Gestiones realizadas con empresas de servicio publico

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no se han realizado gestiones frente a empresas de servicio público

5 ASPECTOS TECNICOS

5.1 Plano récord

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no aplica.

5.2 Análisis de precios y actividades no previstas

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no se ha realizado ninguna gestión de actividades no previstas.

5.3 Control de los equipos

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no se han utilizado equipos y maquinaria:


5.4 Pruebas y resultados

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no se ha realizado ningún ensayo de densidad o concreto.

5.5 Evidencias fotográficas

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, se han tomado los siguientes registros fotográficos de las actividades ejecutadas:

EVIDENCIA FOTOGRAFICA PARQUES ACTIVOS	
	
Cerramiento perimetral, Parque Ciudad caribe	*Cerramiento perimetral, Parque Siape*

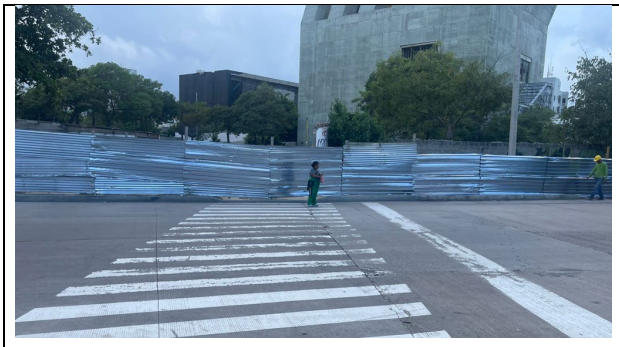

Cerramiento perimetral, Museo moderno



Demolición de muro, Parque Siape



Demolición de muro, Museo moderno



Demolición de placa, Parque Siape



Demolición de placa, Museo moderno



Demolición de muro bajo, Parque Siape



Descapote y limpieza a máquina, Parque Ciudad caribe



Excavación a máquina, Parque Ciudad caribe



Excavación a máquina, Museo moderno



Relleno material seleccionado, Parque Ciudad Caribe





Figura 3. Evidencia fotográfica de actividades ejecutadas.

5.6 Cumplimiento de compromisos adquiridos con la comunidad

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no se han adquirido ningún tipo de compromiso por parte del contratista hacia la comunidad.

6 ASPECTOS AMBIENTALES

6.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, se presenta un breve informe de las normas de higiene y seguridad industrial.

6.1.1 Objetivo general

- Promover, mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, preservando el buen estado de salud, físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes e incidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

6.1.2 Objetivos específicos:

- Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgos y peligros, para la salud de los trabajadores, que mitiguen la probabilidad de ocurrencia y consecuencias de los AT y EL.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.
- Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.
- Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo Laboral
- Fortalecer el compromiso y liderazgo de todos los funcionarios.
- Divulgar y sensibilizar las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

6.1.3 Actividades ejecutadas durante el periodo

En el periodo se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente del profesional, técnicos, tecnólogos y una auxiliar SST, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.
Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

6.1.4 Identificación de peligros y riesgo

Se cuenta con la matriz IPEVR según las actividades realizadas en los trabajos incluyendo las actividades como demolición de andenes, demolición de jardinera, demolición de cancha, toma de puntos topográficos, excavaciones para contenedor de raíz y retiro de RCD.

6.1.5 Seguridad social

Para este periodo se encuentra en cumplimiento las planillas pagas de consorcio barranquilla PG, alemán constructores, el personal vinculado cuenta con afiliaciones al sistema de riesgo laborales.

6.1.6 Uso y entrega de epp

Se evidencia cumplimiento en la entrega oportuna de los epp (casco, guantes, gafas, mascarillas, protectores auditivos, chalecos) y se cuenta con reserva de los mismos en los centros de trabajo habilitados.

Evidencias de entrega de EPP - LOTE 2









Figura 4. Uso de EPP

6.1.7 Capacitaciones y pausas activas

Diariamente se brindas charlas SST con el objetivo de desarrollar la cultura del autocuidado y la identificación de peligros y riesgos asociadas a cada actividad. Adicional se implementan campañas de prevención para reforzar la prevención de accidentes laborales

Charlas SST - LOTE 2














Campañas de promoción y prevención-LOTE 2










6.1.8 Inspecciones y equipos de emergencia

Para este periodo el realizaron inspecciones planeadas de herramientas, equipos, y preoperacionales de maquinaria y se evidencia las herramientas que deben llevar guardas de seguridad en total cumplimiento, se implementa jornadas de aseo antes de iniciar labores, para así disminuir el riesgo locativo, en los puestos de trabajo, se realiza inspección a los equipos de emergencia.





Figura 5. Equipos de emergencias.

6.1.9 Accidentalidad

Para el periodo no se han reportado accidentes laborales.

6.1.10 Preoperacionales de máquinas, equipo herramientas manuales y de poder

Preventiva diariamente se le realizan preoperacionales a la herramientas y equipo en uso

El contratista debe garantizar la implementación de un programa de mantenimiento preventivo/correctivo para toda la maquinaria y equipo usado en obra, en donde se establezca que toda actividad mecánica. Todos los vehículos y maquinaria deben ser sometidos a revisión periódica de: luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas, presencia de fugas, funcionalidad de partes hidráulicas, y estado de los aditamentos y elementos de carga y/u operación.

6.1.11 Servicios de higiene – orden y aseo

para este periodo el contratista realizo entrega de baterías sanitarias, puntos ecológicos, a los frentes de trabajo habilitados.
Se implementan jornadas de orden y aseo antes de iniciar actividades con el fin de disminuir el riesgo locativo y tener frentes de trabajo seguro y higiénicos.



Figura 6. Servicio de higiene.

6.1.12 Señalizaciones

Se realiza instalación de señalizaciones de ruta d evacuación y puntos de encuentro en los centros de trabajo habilitados así mismo se realizan instalaciones provisionales, en las zonas de corte o áreas que lo requieran.







Figura 7. Uso de Señalizaciones.

6.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental

6.2.1 Cumplimiento Legal y Contractual Ambiental

Se tramitaron los permisos requeridos:

- Inscripción de la empresa como nuevo generador de RCD, documento radicado ante EPA Barranquilla Verde, con fecha de 27 de noviembre de 2025 – Rad. EXT-BV-2025-13746.
- Gestor transportador de RCD autorizado bajo resolución 2864 con fecha 31 de octubre de 2023 - 0316 de febrero de 2025.
- Autorización de sitio de disposición final de RCD de la cantera el Triunfo, como receptora de Residuos de Construcción y Demolición, bajo la Resolución 0000701 de 2021, emitida por la CRA.

6.2.2 Manejo Ambiental en Obra

El contratista implementa las medidas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en todos los frentes de fase 8 lote 1.

6.2.3 Manejo de Residuos Sólidos

El contratista no cuenta con la implementación de un código de colores en los frentes de obra.

6.2.4 Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)

El contratista cuenta con un Gestor Transportador autorizado, mediante la Resolución 2864 de 31 de octubre de 2023 AMGO y la resolución 0316 de febrero de 2025 ALEMÁN CONSTRUCTORES.

Donde El contratista se encuentra llevando a cabo el acopio interno de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) como parte de las actividades programadas en el proyecto.

6.2.5 Manejo de materiales

En este periodo se evidenció suministro de materiales pétreos para las actividades de relleno, se cuenta con la documentación de la cantera usada por el contratista, pendiente la entrega de las remisiones de los materiales y las certificaciones de origen. Actualmente el proveedor aprobado registrado por el contratista se relaciona a continuación:

Tabla 8. Personal del contratista

PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	PERMISOS	VIGENCIA
Linda Carvajalino	Materiales de construcción	Res. 000484 de 2013 de CRA	La vida útil
Cantera Sello Rojo		RUCOM NH6-11131	Vigente

En este periodo se adecuó un sitio para el acopio de materiales dentro de las obras, con el fin de minimizar el deterioro de estos y aumentar la demanda de estos.

6.2.6 Campamentos e Instalaciones Temporales

Establecidos en todos los frentes con servicios básicos: sanitarios, Vestier, comedor, oficina de control.



Figura 8. Campamento e instalaciones temporales.

6.2.7 Contaminación Atmosférica y Ruido

- Control de polvo: cerramientos perimetrales con lámina de zinc, cubrimientos plásticos en acopios.
- No se realizaron actividades generadoras de ruido fuera de horario laboral



Figura 9. Cerramiento.

6.2.8 Manejo de Aguas Residuales

- Sin vertimientos a cuerpos de agua o suelo.
- Baños conectados a red en algunos frentes; en otros, uso te baterías sanitarias proporcionadas por la empresa Maken.

6.2.9 Manejo de Maquinaria

En este periodo no se contó con maquinaria y vehículos en los frentes de obra que pueden ser generadores de derrames accidentales durante el reabastecimiento o mantenimiento correctivo.

6.2.10 Manejo de Vegetación

No se contemplan intervenciones forestales en la fase 8 lotes 2.

7 ASPECTO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

7.1 Resumen del manejo del anticipo y estado de la amortización

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no aplica debido a que no existe anticipo para este tipo de contrato.

7.2 Resumen sobre el rendimiento financiero del anticipo.

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no aplica debido a que no existe anticipo para este tipo de contrato.

7.3 Patrimonio Autónomo.

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, los recursos utilizados para el pago de mano de obra, proveedores, equipos, herramientas, personal, entre otros aspectos fueron recursos propios de la empresa.

7.4 Bienes nacionales.

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, todos los bienes entre equipos, maquinaria, materiales, entre otros fueron adquiridos dentro del territorio colombiano.

8 ASPECTOS LEGALES

8.1 Aporte a seguridad social y parafiscales

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, se han realizado los siguientes aportes a la seguridad social y parafiscales:

aportes en línea


Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900583541	9	ALEMAN CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOTE 12	CRA 10 # 19 52 Urb la playa	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3106501379	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1042994083	ACOSTA REALES JORGE LUIS	231001	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF05	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
2	CC 1193373784	ANAYIS LEMUS CRISTIAN DAVID	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF05	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
3	CC 19872328	ATENCIA MACIA JOSE GREGORIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC 12642915	BERDUGO OSUNA DAGOBERTO	230301	18	$854,100	$136,700	ESSC07	18	$854,100	$34,200	CCF05	18	$854,100	$34,200	14-25	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
5	CC 72264318	BUZON ARIAS GIOVANY ALBERTO	230901	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF05	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
6	CC 1143449837	CAMELO PEREZ MAURICIO	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF05	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
7	CC 1140833017	CANTILLO DE LA HOZ KLISMAN JOSE	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF05	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
8	CC 8505863	CARVAJAL VALLEJA MANUEL ANTONIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC 1001799572	CERVANTES CABALLERO LUIS MIGUEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC 1041891715	CERVANTES PADILLA LUIS FERNANDO	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF05	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
11	CC 1043584376	CERVANTES DE LA HOZ VLADIMIR RAFAEL	230201	24	$1,138,800	$182,300	ESSC24	24	$1,138,800	$45,600	CCF05	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
12	CC 1002134224	CHUNGA NIÑO KENETH ANDRES	230301	5	$237,250	$38,000	ESSC07	5	$237,250	$9,500	CCF05	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
13	CC 8747372	DE LA HOZ MENDOZA FRANCISCO DE SALES	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF05	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
14	CC 72428562	DE LA HOZ MARIN RONALD LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
15	CC 72129165	DIAZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF05	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
16	CC 8673060	FIGUEROA HERRERA ARMANDO		0	$0	$0	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF05	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
17	CC 1128329238	FONTALVO GAMARRA EMERSON DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
18	CC 72056648	GALVAN FREITE LUIS ALBERTO	231001	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF05	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
19	CC 1002096964	GONZALEZ CARREÑO MARIO LUIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC 72163582	GUETTE INSIGNARES EVER ANTONIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
21	CC 1044217951	GUTIERREZ ALTAMAR LIBARDO JUNIOR	230301	23	$1,091,350	$174,700	ESSC07	23	$1,091,350	$43,700	CCF05	23	$1,091,350	$43,700	14-25	23	$1,091,350	$76,000	23	$0	$0
22	CC 1193083844	HIDALGO CARDOZA JOSE JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
23	CC 1002034055	HURTADO MUÑOZ STIVEN ALFONSO	230201	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF05	18	$854,100	$34,200	14-25	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
24	CC 1042418260	JIMENEZ BONNETT RUBEN DARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC 72121492	JINETE GOMEZ DARIO ANTONIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
26	CC 1041693202	JULIO LOGREIRA LUIS EDUARDO	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF05	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
27	CC 1043439173	LAMBRAÑO CONTRERAS OWEN JESUIT	230301	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF05	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
28	CC 72434813	MARRIAGA MONTERO LUIS CARLOS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF05	2	$94,900	$3,800	14-25	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
29	CC 1044621620	MENDOZA VARGAS GREGORIO ALEJANDRO	230301	21	$996,450	$159,500	CCFC55	21	$996,450	$39,900	CCF05	21	$996,450	$39,900	14-25	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
30	CC 1082044761	MEZA CABALLERO LUIS MANUEL	231001	24	$1,138,800	$182,300	ESSC24	24	$1,138,800	$45,600	CCF05	24	$1,138,800	$45,600	14-25	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0

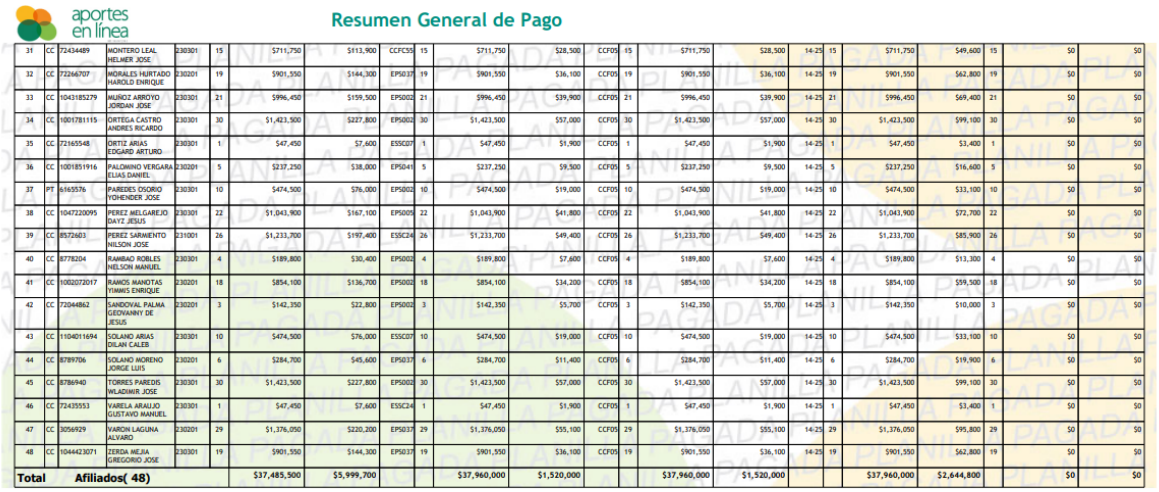

aportes en línea

Resumen General de Pago

31	CC	72434489	MONTERO LEAL HELMER JOSE	230301	15	$711,750	$113,900	CCFC55	15	$711,750	$28,500	CCF05	15	$711,750	$28,500	14-25	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
32	CC	72266707	MORALES HURTADO HAROLD ENRIQUE	230201	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF05	19	$901,550	$36,100	14-25	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
33	CC	1043185279	MUÑOZ ARROYO JORDAN JOSE	230301	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF05	21	$996,450	$39,900	14-25	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
34	CC	1001781115	ORTEGA CASTRO ANDRES RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
35	CC	72165548	ORTIZ ARIAS EDGARD ARTURO	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF05	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
36	CC	1001851916	PALOMINO VERGARA ELIAS DANIEL	230201	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF05	5	$237,250	$9,500	14-25	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
37	PT	6165576	PAREDES OSORIO YOHENDER JOSE	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF05	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
38	CC	1047220095	PEREZ MELGAREJO DAYZ JESUS	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF05	22	$1,043,900	$41,800	14-25	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
39	CC	8572603	PEREZ SARMIENTO NILSON JOSE	231001	26	$1,233,700	$197,400	ESSC24	26	$1,233,700	$49,400	CCF05	26	$1,233,700	$49,400	14-25	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
40	CC	8778204	RAMBAO ROBLES NELSON MANUEL	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF05	4	$189,800	$7,600	14-25	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
41	CC	1002072017	RAMOS MANOTAS YIMMIS ENRIQUE	230201	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF05	18	$854,100	$34,200	14-25	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
42	CC	72044862	SANDOVAL PALMA GEOVANNY DE JESUS	230201	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF05	3	$142,350	$5,700	14-25	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
43	CC	1104011694	SOLANO ARIAS DILAN CALEB	230301	10	$474,500	$76,000	ESSC07	10	$474,500	$19,000	CCF05	10	$474,500	$19,000	14-25	10	$474,500	$33,100	10	$0	$0
44	CC	8789706	SOLANO MORENO JORGE LUIS	230201	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF05	6	$284,700	$11,400	14-25	6	$284,700	$19,900	6	$0	$0
45	CC	8786940	TORRES PAREDES WLADIMIR JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF05	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
46	CC	72435553	VARELA ARAUJO GUSTAVO MANUEL	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF05	1	$47,450	$1,900	14-25	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
47	CC	3056929	VARON LAGUNA ALVARO	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF05	29	$1,376,050	$55,100	14-25	29	$1,376,050	$95,800	29	$0	$0
48	CC	1044423071	ZERDA MEJIA GREGORIO JOSE	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF05	19	$901,550	$36,100	14-25	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
Total			**Afiliados(48)**			**$37,485,500**	**$5,999,700**			**$37,960,000**	**$1,520,000**			**$37,960,000**	**$1,520,000**			**$37,960,000**	**$2,644,800**		**$0**	**$0**

Figura 10. Planilla de aporte a seguridad social y parafiscales.

8.2 Cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación

Entre el periodo de 10 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, no se han presentado cesión y/o subcontrataciones del proyecto.

8.3 Desviación del contratista o la interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales

Entre el periodo de 10 de octubre de 2025 al 10 de noviembre de 2025, no se han presentado cesión desviaciones por parte de la interventoría con relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del anterior informe podemos concluir que el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 6,48%, cuyos trabajos técnicos se concentran actualmente en tres parques específicos: Ciudad Caribe, Siape y el Museo Moderno.

De estos parques se mantienen y han finalizado satisfactoriamente la mayoría de las actividades preliminares de adecuación necesarias para el inicio de las obras mayores en cada frente dándole paso a nuevas actividades siguiendo los diferentes procesos constructivos que requiere cada una, con un ritmo de trabajo proporcionado al contenido de cada parque, en este periodo se dio inicio a actividades de movimientos de tierra e inicio de armado de estructuras de las cuales las actividades ejecutadas se han realizado con mano de obra calificada y a la vez involucrando y haciendo participe a miembros de la comunidad con mano de obra no calificada para el desarrollo y ejecución del proyecto.

10 ANEXOS

Se anexa bitácora de obra de los parques a continuación:

- Parque Siape
- Parque Ciudad Caribe
- Museo moderno

PARQUE SIAPE.

Se hace apertura a la Bitacora de obra para el Contrato.

De acuerdo al formato de Acta de Inicio, codigo: de la Alcaldia de Barranquilla.
Se suscribio como Fecha de Inicio el dia del mes.

- Contratista: Consorcio Barranquilla P6.

- Interventor: EDUBAR SA.

- objeto: Mejoramiento y construccion de Parques publicos. Canchas deportivas. Malecones, Zonas Verdes y. Boulevares en diferentes sectores del distrito. de Barranquilla.

- Plazo: El plazo estimado para la Ejecucion del Contrato sera de.
Contratados a Partir de la Suscripcion del Acta de Inicio del mismo, Previo al Cumplimiento de los Requisitos de. Perfeccionamiento y Ejecucion y Aprobacion de los Documentos Previstos en el pliego de Condiciones. No obstante la Vigencia de financiamiento de Proveedor sera hasta el. Periodo dentro del cual. Permaneceran Vigentes las obligaciones Relativas. el Pago y cierre financiero. del Contrato. Sin Perjuicio de los demas obligaciones Pro- Contractuales exigibles al contrato.

Scanned with CamScanner

Fecha: 05/11/25.
obra: Parque Siopè fase 8 - foto 2.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 1 oficial
- 3 Ayudantes.

Actividades:
- Cerramiento Perimetral.

Reporte:
- Se Recibeni 70 laminas de Zinc

Yilena PR.
Residente de obra.

Fecha: 06-11-25.
obra: Parque Siopè fase 8. foto 2.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 1 oficial.
- 6 Ayudantes.

Actividades:
- Cerramiento Perimetral.
- Demolicion de Muro Existente

Yilena PR.
Residente de obra.

Fecha: 07-11-2025.
obra: Parque Siopè fase 8 foto 2.
Personal en obra
- 1 Residente
- 1 oficial
- 5 Ayudantes.

Scanned with CamScanner

Actividades:

- Cerramiento Perimetral.
- Demolicion de Muro Existente.

Yilena PR
Residente de obra.

Fecha: 8-11-2025.
obra: Riapi fase 8 - lote 2.
Reporte: se Realizo Primera Reunia con el Alcalde Alex Chas.

Yilena PR
Residente de obra.

Fecha: 10-11-25.
obra: Parque Riapi, fase 8 lote 2.
Personal en obra:

- 1 Residente.
- 1 oficial.
- 4 Ayudantes.

Actividades.

- Demolicion Muro y Bordillos Existentes.

Yilena PR.
Residente de obra.

Fecha: 12-11-25.
obra: Parque Riapi fase 8 lote 2.
Personal en obra:

- 1 Residente.
- 1 oficial
- 5 Ayudantes

Scanned with CamScanner

Actividades:

- Demolicion de Muro Existente, Anden y Placas y Placa Existente.

Ylena PR.
Residente de obra.

Fecha: 13-11-25
obra: Parque Etapa Lote 2 Fase 8.
Personal en obra:

- 1 Residente.
- 1 oficial
- 5 Ayudantes

Actividades:

- Cerramiento Perimetral
- Demolicion de Muro Existente, Anden y Placa Existente.

Ylena PR.
Residente de obra.

Fecha: 14-11-25. Etapa Lote 2 Fase 8.
Personal en obra:

- 1 Residente
- 1 oficial
- 2 Ayudantes.

Actividades:

- Cerramiento Perimetral.
- Demolicion de Muro Existente, Anden y Placas Existentes.
- Armado de Andamios Para desmonte y demolicion

Ylena PR.
Residente de obra.

Scanned with CamScanner

Fecha: 15/11/25.
obra: Parque Siapé Soto 2 fase 8.
Personal en obra:
- 1 Residente Tecnico.
- 1 Residente SST.
- 1 oficial
- 5 Ayudantes.

Actividades:
- Cerramiento Perimetral.
- Demolicion de Muro Existente, Andenes y placas.

Existente demolicion Muros de Casa.

YolenaPR
Residente de obra.

Fecha: 18-11-25.
obra. Parque Siepe Soto 2 fase 8.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 1 oficial.
- 5 Ayudantes.

Actividades:
- Demolicion y Desmonte.

Fecha: 15/11/25.
obra: Parque Riapé Lote 2 Fase 8.
Personal en obra:
- 1 Residente Tecnico.
- 1 Residente SST.
- 1 oficial
- 5 Ayudantes.

Actividades:
- Cerramiento Perimetral.
- Demolicion de Muro Existente, Andenes y placas.

Existente demolicion Muros de Casa.

YilenaPR
Residente de obra.

Fecha: 18-11-25.
obra. Parque Riapie Lote 2 Fase 8.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 1 oficial.
- 5 Ayudantes.

Actividades:
- Demolicion y Desmonte.

Yilena PR
Residente de obra.

Fecha: 19-11-25.
obra: Parque Riapie Lote 2 Fase 8.
Personal en obra:
- 1 Residente
- 1 SST.
- 1 Oficial
- 5 Ayudantes

Actividades:

- Demolicion de Muro Existente, Andenes y Placas. Existentes, demolicion de Casa existente.

Residente de obra.

Fecha: 05-11-25.

obra: Parque Sispe lote 2- fase 8.

Personal en obra:

- Residente 1
- Oficial 1.

Actividad.

- Llegada de Arena a obra (8m3).

Residente de obra.

Fecha: 27-11-25

obra: Parque Sispe - lote 2. fase 8.

Personal en obra:

- 1 Residente
- 1 SA.
- 1 Oficial
- 4 Ayudantes.

Actividades:

- Trazado y Replanteo.
- Excavacion de Viga Plataforma
- Demolicion de placa Existente

Reporte.

Retiro de RCD en ejecucion

Residente de obra.

Fecha: 28-11-25.
obra: Parque Biapò - Lote 2 fase 8.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 1 oficial
- 4 Ayudantes.

Actividades:
- Excavacion para Viga plataleta
- Demolicion de placa Existente en Cimiento.

Reporte.
- Retiro de RCD.
- Se Recibe 50 Varillas de 1/2 y 20 de 3/8.

Yelena PR.
Residente de obra.

Fecha: 29-11-25.
obra: Parque Biapè - Lote 2 fase 8.
Estado del dia: Lluvioso.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 1 SST.
- 1 oficial.
- 5 Ayudantes.

Actividades:
Excavacion para Viga plataleta
Demolicion de placa Existente en Cimiento.
Reporte:
Retiro de RCD.
Yelena PR.
Residente de obra.

Fecha: 01-12-25.
obra: Parque Riapè, lote 2 fase 8.
Estado del clima: Nublado.
personal en, obra:
- 1 Residente.
- 1 SST.
- 3 Ayudantes.

Actividades:
- Excavacion para Viga Plataforma
- Demolicion de placa Existente

Reporte:
- Retiro de RCD.

Residente obra.

Fecha: 02-12-25.
obra: Parque Riapè, lote 2 fase 8
Estado del clima: Nublado.
Personal en obra:
- 1 oficial
- Sin Actividades.

Reporte:
- de Requiere Retiro RCD.

Residente de obra.

Fecha: 03-12-25.
obra: Parque Riapè, lote 2 fase 8.
Estado del clima: Soleado.
Personal en obra.
- 1 oficial
- 3 Ayudantes

Actividades:
- Retiro de PCD.
- Armado de Refuerzo para figurado.
- Excavacion.

Yelena PR.
Residente de obra.

Fecha: 05-12-25.
obra: Siapa, fase 2 fase 8.
Estado del clima: Soleado
Personal en obra:
- 1 oficial.
- 2 Ayudantes.

Actividades
- Excavacion.

Yelena PR.
Residente de obra.

Fecha: 09-12-25.
obra: Siapa, fase 2 fase 8,
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra.
- 1 oficial.
- 3 Ayudantes.

Actividades.
- Excavacion.

Yelena PR.
Residente de obra

Fecha: 10-12-25.
obra: Parque Riapie - lote 2 fase 8.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 1 SST.
- 1 oficial.
- 3 Ayudantes.

Actividades:
- Orden y Aseo.
- Excavacion
- Toma de Niveles

Yelena PR.
Residente de obra.

Fecha: 11-12-25.
obra: Parque Riapie - lote 2 fase 8;
Personal en obra:
- 1 Residente
- 1 electricista

Actividades:
- Instalacion de Puntos electrica.
- Topografia en sitio.

Yelena PR.
Residente de obra.

Fecha: 12-12-25.
obra: Parque Riapie lote 8 fase 2.
Estado de clima: Soleado.
Personal en obra:
- 1 Residente.
- 2 oficial
- 1 Ayudantes.

Actividades:
- Figurado de Acero.

Ribeiro PR
Residente de obra.

Fecha: 13-12-25.
obra: Parque Riaje lote 2 fase 8.
Estado de clima: Soleado.
Personal de obra:
- 1 Residente.
- 2 oficiales.
- 4 Ayudantes.

Actividades:
- Figurado de Acero.
- Fundido de Viga 30x30.

Ribeiro PR
Residente de obra.

Fecha: 15-12-25
obra: Parque Riaje lote 8 fase 8
Estado del clima: Soleado.
Actividades:
- Figurado de Acero.
- Fundido de Viga 30x30
- Excavacion para Viga

Ribeiro PR.
Residente de obra

JU. 8/25 PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO 1 OFICIAL 5 AYUDANTES.

ACTIVIDADES

- SEMBRADO DE LISTONES DE MADERA. PARA CERRAMIENTO
- INSTALACION DE LAMINAS DE ZINC A CERRAMIENTO
- DESMONTE DE MARCOS Y JUEGOS INFANTILES EXISTENTES
- DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE

JV 10/25 PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO 2 OFICIALES 10 AYUDANTES

ACTIVIDADES

- CONTINUAMOS CON INSTALACION DE LAMINAS ZINC A CERRAMIENTO
- INSTALACION DE BANNER PUBLICIDAD OBRA
- DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE 10M X 8.0 X 0.10

NOTA: VISITA DE ALCALDE DE BARRANQUILLA

Norma

Powered by CamScanner

POR MOTIVO DE COLOCACION 1ERA PIEDRA Y PRESENTACION PROYECTO A LA COMUNIDAD

NOV 11/25 PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO 1 OFICIAL 1 AUXILIARES

ACTIVIDADES.

- DESCAPOTE DE ZONAS VERDES NO HABITADAS (MONTE) USANDO MAQUINARIA BULLDOZER D4G
- DEMOLICION DE PLAZOLETA.

NOV 12/25 PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO 1 OFICIAL 1 AUXILIARES

ACTIVIDADES:

- DESCAPOTE CON MAQUINARIA (BULLDOZER)
- INGRESO DE MATERIAL CALICHE
- SEMBRADO Y COMPACTADO DE MATERIAL INGRESADO

NOV 13/25 PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO 1 OFICIAL Y AUXILIARES

ACTIVIDADES.

- INGRESO MATERIAL
- SEREADO Y COMPACTADO MATERIAL
- SEMBRADO DE LISTONES DE MADERA E INSTALACIÓN DE LAMINAS ZINC CERRAMIENTO

NOV 14/25 PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO 1 OFICIAL Y AUXILIARES.

ACTIVIDADES.

- INGRESO MATERIAL
- SEREADO Y COMPACTADO MATERIAL
- SEMBRADO LISTONES DE MADERA. PARA CERRAMIENTO
- INSTALACIÓN DE LAMINAS ZINC
- CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN.

Norma

Powered by CamScanner

Nov 19/25. PERSONAL EN OBRA.

1 MAESTRO 1 OFICIAL [AUXILIARES.

1 RESIDENTE 1 SST.

ACTIVIDADES

- SEMBRADO LISTONES CERRAMIENTO
- INSTALACIÓN DE LAMINAS ZINC
- INGRESO MATERIAL.

Nov 27/25 PERSONAL EN OBRA.

PERSONAL EN OBRA

1 MAESTRO [AUXILIARES 1 RESIDENTE 1 SST.

ACTIVIDADES

RECONSTRUCCION DE CERRAMIENTO POR MOTIVOS DE FUERTES BRISAS

- INGRESO DE MATERIAL

NOV 28/25 PERSONAL EN OBRA.
1 AUXILIARES 1 SST 1 PRESIDENTE
ACTIVIDAD.
- INGRESO DE MATERIAL SELECCIONADO

DIC 02/25 PERSONAL EN OBRA.
1 MAESTRO 1 OFICIAL 1 AUX.
ACTIVIDAD
- MONTAJE PORTON INGRESO VOLQUETAS.
- INGRESO DE MATERIAL SELECCIONADO

DIC/03/25 PERSONAL EN OBRA.

1 RESIDENTE 1 INSPECTOR 1 SST 1 MAESTRO 1 OFICIAL

4 AUXILIARES

ACTIVIDADES:

- CONSTRUCCION ALMACEN Y OFICINAS
- ARMADO DE POSTON INGRESO VOLQUETAS.

DIC 04/25 PERSONAL EN OBRA.

1 RESIDENTE 1 INSPECTOR 1 SST 1 MAESTRO 1 OFICIAL

4 AUXILIARES.

ACTIVIDADES:

- PLANTILLA INTERNA DE ALMACEN - BODEGA.
- CONTINUAMOS CON MONTAJE DE PORTÓN.

DIC 05/25 Personal en obra:

1 Inspector Residente 1 SST 1 Maestro 1 Oficial

4 Auxiliares

Actividades

- Ingreso material relleno
- Montaje de cerramiento caído por brisas
- Plantilla almacen.
- Montaje puerta ingreso personal.

DIC 6/25. Personal en obra.

1 Inspector 1 Maestro 3 Auxiliares

Actividades

- Ingreso material de relleno
- Replanteo topografico.

Norma

Powered by CamScanner

DIC 9/25. PERSONAL EN OBRA

1 INSPECTOR RESIDENTE 1 MAESTRO 3 AUXILIARES

ACTIVIDADES:

INGRESO MATERIAL DE RELLENO.

DIC 10/25 PERSONAL EN OBRA.

1 INSP. RESIDENTE 1 MAESTRO 4 AUXILIARES

ACTIVIDADES.

INGRESO MATERIAL DE RELLENO.

DECONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

Noviembre 07/2025, Viernes, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra y 1 Sst
Actividades programadas:
- Acopio de material seleccionado

Jose Orozco Cervera

Noviembre 08/2025, Sábado, Mañana: soleado, Tarde: soleado.

Personal en obra: 1 Residente y 1 Sst
Actividades programadas:
- Acopió de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera

Noviembre 10/2025, Lunes, Mañana: nublado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra y 1 Sst
Actividades ~~personal~~ programadas:
- Acopió y suministro de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera

Noviembre 11/2025, Martes, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 2 Residentes de obra y 1 Sst
Actividades programadas:
- Acopió y suministro de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera

Powered by CamScanner

Noviembre 12/2025, Miércoles, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, y 1sst y 1 minicargador
Máquinarias, equipos y herramientas: 1 minicargador, palas, picos, martillos
Actividades programadas:
- Suministro de material seleccionado
- Relleno y compactación de material seleccionado.

Jose Orozco Cenen

Noviembre 13/2025, Jueves, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1sst y 1 operador de minicargador.
Maquinarias, equipos y herramientas: palas, barras y 1 minicargador
Actividades programadas:
- Retiro y disposición final de RCD
- Relleno y compactación de material seleccionado.

Jose Orozco Cenen.

Noviembre 14/2025, Viernes, Mañana: Nublado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residentes de obra, 1sst y 1 operador de minicargador
Máquinarias, equipos y herramientas: Palas, picos, barras y 1 minicargador
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado

Jose Orozco Cenen

Noviembre 15/2025, Sábado, Mañana: Nublado, Tarde: Nublado y soleado

Personal en obra: 1 Residente, 1 sst, 1 maestro y 1 operador de mini cargador y 1 Operador de vibro-compactador de 2Tn
Maquinarias, equipos y herramientas: palas, picos, naves y 1 mini cargador y 1 vibro-compactador.
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado
- suministro de material seleccionado.

Jose Orxco Ceren.

Noviembre 19/2025, Martes, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 2 Residentes de obra, 1 sst y 1 Operador de mini cargador.
Maquinarias, equipos y herramientas: 1 Mini cargador, palas, picos barras
Actividades programadas:
- suministro de material seleccionado
- Relleno y compactación de material seleccionado.

Jose Orxco Ceren.

Noviembre 19/2025, Miércoles, Mañana: soleado, Tarde: soleado.

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 sst y 1 operador de mini cargador
Máquinarias, equipos y herramientas: 1 mini cargador, palas, picos y barras
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado.

Jose Orxco Ceren.

Noviembre 20/2025, Jueves, Mañana: soleado, tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST y 1 operador de minicargador
Maquinarias, equipos y herramientas: 1 minicargador, palas, picos y barras.
Actividades programadas:
- Suministro de material seleccionado
- Relleno y compactación de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera.

Noviembre 21/2025, Viernes, Mañana: soleado, tarde: soleado.

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST y 1 operador de minicargador y 1 ayudante de obra.
Maquinarias, equipos y herramientas: 1 minicargador, palas, picos y barras, vibro-compactador.
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado.
- Suministro de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera.

Noviembre 22/2025, Sábado, Mañana: soleado, tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST y ayudante de obra
Máquinarias, equipos y herramientas: Vibro-compactador, minicargador, picos, carretillas y palas.
Actividades Programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado.
- Suministro de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera.

Noviembre 24/2025, Lunes mañana: soleado, tarde: soleado.

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 sst y 2 ayudantes
Máquinaria, equipos y herramientas: palas, picos, barras, carretillas, martillos
palustragos, nivel-completador.
Actividades programadas:
- Amarre de cerramiento por frentes bruto ya retirado.
- Suministro y acopio de material seleccionado

Jose Orozco Cervera.

Noviembre 25/2025, Martes, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 sst y 1 ayudante de obra
Máquinaria, equipos y herramientas: Palas, picos, barras, nivel-completador
martillos, palustragos.
Actividades programadas:
- Suministro de acopio de material seleccionado
- Retiro y completación de material seleccionado

Jose Orozco Cervera.

Noviembre 26/2025, Miércoles, mañana: soleado, tarde: soleado.

Personal en obra: 1 Residente de obra y 1 sst
Actividades programadas:
- Suministro de material seleccionado y su respectivo acopio.

Jose Orozco Cervera.

Noviembre 27/2025, Jueves, Mañana: soleado, tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra y 1 SST
Actividades programadas:
- ~~no se ejecuta~~
- suministro y acopió de material seleccionado

Jose Orozco Cervera

Noviembre 28/2025, Viernes, Mañana: Nublado, tarde: Nublado

Personal en obra: 1 Residente y 1 SST
Actividades programadas:
- suministro y acopió de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera

Noviembre 29/2025, sábado, mañana: nublado.

Personal en obra: 1 Residente de obra.
Actividades programadas
- Suministro y acopió de material seleccionado.

Jose Orozco Cervera

Diciembre 01/2025, Lunes, Mañana: soleado, tarde: nublado

Personal en obra: 1 Residente de obra y 1 SST
Actividades programadas:
- Suministro de material seleccionado con su respectivo acopió

Jose Orozco Cervera

Diciembre 02/2025, Martes, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST y 10 operador de minicargador
Máquinas, equipos y herramientas: Minicargador, vibro-compactador pobas, picos, barras,
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado
- Suministro y acopió de material seleccionado

Jose Orozco cervera

Diciembre 03/2025, Miércoles, Mañana: soleado, Tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST, 10 operador de minicargador y ayudante de obra.
Máquinas, equipos y herramientas: Minicargador, vibro-compactador pobas, picos, cavetillas, barras, mones, martillos.
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado
- Suministro y acopió de material seleccionado
- Arreglo de cadenamiento por fuertes lluvias

Jose Orozco cervera

Diciembre 04/2025, Jueves, mañana: soleado, Tarde: soleado.

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST, 10 operador de minicargador y 1 ayudante de obra.
Máquinas, equipos y herramientas: Minicargador, vibrocompactador, pulidora, palas, picos, cavetillas, mones, martillos, pobadoras
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado.

Jose Orozco cervera

Diciembre 05/2025, Viernes, Mañana: Soleado, Tarde: Soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST y 1 ayudante de obra.
Máquinaria, equipos y herramientas: Minicargador, vibro-compactador, Palas, picos, carretillas, mazas, martillos
Actividades programadas
- Retiro y carguío de material seleccionado
- Desmonte de techo de bodega
- suministro y acopio de material seleccionado.

Jose Orozco Cerero

Diciembre 06/2025, sábado, mañana: soleado, tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST y ayudante de obra.
Maquinaria, equipos y herramientas: vibro-compactador, minicargador, palas, picos, barras, carretillas
Actividades programadas:
- Desmonte de techo de bodega
- Suministro de material seleccionado con su respectivo acopio

Jose Orozco Cerero

Diciembre 09/2025, Martes, mañana: soleado, tarde: nublado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 operador de minicargador
Máquinaria equipos y herramientas: Vibro-compactador, minicargador, palas, barras, picos, carretillas, mazas, martillos

Actividades programadas:
- suministro de material seleccionado con su respectivo

acopio
- Relleno y compactación de material seleccionado

José Orozco Cornejo

Diciembre 10/2025, Miércoles, mañana: soleado, tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 SSt, 1 operador de minicargador y 1 ayudante de obra.
Maquinaria, equipos y herramientas: Minicargador, vibrocompactador, palas, picos, carretillas, mazos, martillos y pintas.
Actividades programadas:
- Demolición de pared de bodega
- Relleno y compactación de material seleccionado
- Suministro y acopio de material seleccionado

José Orozco Cornejo

Diciembre 11/2025, Jueves, mañana: soleado, tarde: soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 ayudante de obra.
Maquinaria, equipos y herramientas: Minicargador, vibrocompactador, palas, picos, carretillas, mazos, martillos y pintas
Actividades programadas:
- Relleno y compactación de material seleccionado

Diciembre 12/2025, viernes, mañana: soleado, tarde: soleado.

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 operador de minicargador, 1 ayudante de obra
Maquinaria, equipos y herramientas: Minicargador, vibrocompactador, picos, palas, mazos, martillos y pintas
Actividades programadas:
