Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER No. 180 de 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	10/11/2025
Tipo de contrato	Consultoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	Ocho (8) meses							**Número de Cédula o NIT:**	NIT: 830.146.665-6
Periodo del Informe:	16	5	2026	al	15	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO CAMARGO C.C: 79.334.503
Interventor (si Aplica)	Consorcio Interventoría lotes							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT: 902.017.353-1 FLABIO SOLER C.C: 79.505.743
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	N/A							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 1,767,427,406	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	N/A	Número CDP	N/A	Fecha CDP	N/A	Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 1,767,427,406	Número CDP	4356	Fecha CDP	15/08/2025	Fuente de Recursos	Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del cambio climatico y sus efectos
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	8		Valor RP	$ 1,767,427,406	Número RP	12640	Fecha RP	9/12/2025		
		Valor Total	$ 1,767,427,406							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción** **No Aplica**					
		Valor Total	$ 1,767,427,406							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 1,767,427,406							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción** **No se han requerido ni adiciones ni prórrogas**					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	8	**Valor Total**	$ 1,767,427,406							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	No Aplica	**Valor disminución :**	No Aplica

Descripción del motivo de la disminución

No Aplica

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

No Aplica

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**		**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 1,767,427,406	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	8

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER No. 180 de 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	10/11/2025
Tipo de contrato	Consultoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	Ocho (8) meses							**Número de Cédula o NIT:**	NIT: 830.146.665-6
Periodo del Informe:	16	5	2026	al	15	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO CAMARGO C.C: 79.334.503
Interventor (si Aplica)	Consorcio Interventoría lotes							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT: 902.017.353-1 FLABIO SOLER C.C: 79.505.743
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	N/A							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS.

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo (Si Aplica)	No Aplica	**Porcentaje de Amortización (Si Aplica)**	No Aplica	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
16 de febrero al 23 de febrero de 2026	16/04/2026	$ 123,719,918.00	Primer pago contra entrega y aprobación del informe No. 1 Recopilación, revisión y análisis de información secundaria y Plan de exploración de la consultoría, correspondiente al 7% del contrato.

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	123,719,918	23/04/26 No. 31963	Primer pago contra entrega y aprobacion del producto 1 de consultoría, Correspondiente al 7% del contrato
TOTALES			

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
23/04/2026	**$ 2,079,326.00**	**Estampilla para el Bienestar de adulto mayor**
23/04/2026	**$ 1,143,629.00**	**Estampilla Univ. Francisco Jose de Caldas 1.1**
23/04/2026	**$ 519,832.00**	**Estampilla Procultura**
23/04/2026	**$ 519,832.00**	**Estampilla pro Universidad Pedagogica 0.5%**
23/04/2026	**$ 900,348.31**	**RETENCION ICA**
23/04/2026	**$ 11,436,294.98**	**RETEFUENTE**
TOTAL	**$ 16,599,262.29**	

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A			

8. Garantías

8.1 Antes de Acta de Inicio

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Responsabilidad Civil Extracontractual	**Seguros del Estado S.A**	**18-40-101081454**	**10/11/2025**	**20/07/2026**	**13/01/2026**	**$ 284,700,000.00**
Cumplimiento del contrato		**18-44-101110431**	**10/11/2025**	**20/07/2028**	**13/01/2026**	**$ 353,485,481.20**
Calidad del servicio		**18-44-101110431**	**10/07/2026**	**20/07/2029**	**13/01/2026**	**$ 353,485,481.20**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		**18-44-101110431**	**10/11/2025**	**20/07/2029**	**13/01/2026**	**$ 176,742,740.60**

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER No. 180 de 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	10/11/2025
Tipo de contrato	Consultoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	Ocho (8) meses							**Número de Cédula o NIT:**	NIT: 830.146.665-6
Periodo del Informe:	16	5	2026	al	15	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO CAMARGO C.C: 79.334.503
Interventor (si Aplica)	Consorcio Interventoría lotes							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT: 902.017.353-1 FLABIO SOLER C.C: 79.505.743
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	N/A							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS.

Ajuste con el inicio del Contrato

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Responsabilidad Civil Extracontractual	**Seguros del Estado S.A**	**18-40-101081454**	**16/02/2026**	**26/10/2026**	**27/03/2026**	**$ 284,700,000.00**
Cumplimiento del contrato		**18-44-101110431**	**16/02/2026**	**26/10/2028**	**27/03/2026**	**$ 353,485,481.20**
Calidad del servicio		**18-44-101110431**	**16/10/2026**	**26/10/2029**	**27/03/2026**	**$ 353,485,481.20**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		**18-44-101110431**	**16/02/2026**	**26/10/2029**	**27/03/2026**	**$ 176,742,740.60**

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	x	No	

De acuerdo con la matriz de riesgos del contrato, durante el periodo de seguimiento se evidenció la materialización de los riesgos No. 12 y No. 15.

En relación con el riesgo No. 12, asociado a la ocurrencia de condiciones sociales o de seguridad que afecten el desarrollo de actividades de campo fundamentales para la ejecución del contrato, el consultor informó mediante el Oficio No. 079-26-GDING-PROY194 que no fue posible dar inicio a las actividades de exploración del subsuelo programadas en el Polígono 10 – Usaquén, debido a la oposición manifestada por miembros de la comunidad y algunos conjuntos residenciales del sector.

De acuerdo con lo informado por la Consultoría, la comunidad manifestó que no permitiría la ejecución de las actividades hasta tanto el IDIGER realizara una reunión de socialización en la que se aclararan el alcance, los objetivos y las actividades contempladas en el proyecto. Adicionalmente, algunos conjuntos residenciales indicaron que no autorizarían el ingreso para la ejecución de las exploraciones hasta contar con una presentación oficial del consultor por parte del IDIGER.

Como consecuencia de estas situaciones, se presentó una afectación directa sobre la programación de las actividades de campo previstas para el Polígono 10, impidiendo el inicio oportuno del plan de exploración del subsuelo y generando una afectación sobre el cronograma contractual, situación que se relaciona igualmente con el riesgo No. 15, correspondiente a los retrasos en el cumplimiento del cronograma de trabajo derivados de causas externas.

En atención a esta situación, el 11 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión de socialización con participación de la comunidad del sector Las Delicias del Carmen, el IDIGER, la Consultoría y la Interventoría, con el propósito de atender las inquietudes manifestadas por los habitantes, explicar el alcance del contrato, las actividades de exploración geotécnica programadas y los objetivos de los estudios orientados a la reducción del riesgo por movimientos en masa.

Durante la reunión se aclaró que las perforaciones corresponden a actividades de carácter investigativo y preventivo y se atendieron las inquietudes relacionadas con posibles afectaciones a las viviendas y eventuales procesos de reasentamiento. Como resultado, se establecieron compromisos orientados a facilitar el desarrollo de las actividades de campo, entre ellos la elaboración de actas de vecindad, la comunicación previa de la programación de las perforaciones y el fortalecimiento del proceso de socialización con la comunidad.

Frente al riesgo asociado a condiciones hidrometeorológicas adversas, si bien durante el periodo objeto de seguimiento no se reportó una materialización que impidiera directamente la ejecución de las actividades de campo, este se mantiene como un factor de riesgo para la programación de las actividades pendientes, por lo cual deberá continuar siendo objeto de seguimiento y gestión preventiva por parte de la Consultoría, mediante la programación oportuna de las actividades de campo, el seguimiento a las condiciones climáticas y la adopción de medidas de reprogramación cuando las condiciones impidan técnicamente su ejecución.

En consecuencia, se continuará realizando seguimiento a los riesgos materializados y a aquellos identificados con alta probabilidad de ocurrencia, verificando la efectividad de las medidas implementadas y su incidencia sobre la recuperación del cronograma contractual.

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de junio de 2026, la interventoría adelantó actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual al Contrato de Consultoría FONDIGER-180-2025, cuyo objeto corresponde a la elaboración del estudio detallado integral y al planteamiento de medidas para la reducción del riesgo por movimientos en masa en los polígonos del Grupo 1 (Usaquén y Santa Fe). Durante el periodo evaluado se realizó el seguimiento permanente a los productos, informes y demás entregables presentados por el consultor, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los requisitos técnicos y los plazos establecidos. En desarrollo de esta labor, la interventoría revisó los documentos radicados por la consultoría, emitió las observaciones técnicas, administrativas y financieras correspondientes, efectuó el seguimiento a su atención y verificó las subsanaciones presentadas, con el fin de asegurar que los productos cumplieran las condiciones necesarias para su aprobación por parte de la supervisión del IDIGER.
En el componente financiero se registró la aprobación del Producto No. 1, correspondiente a la recopilación, revisión y análisis de información secundaria, mediante los oficios CONS-IL1-2026-0034 para el Polígono 10 y CONS-IL1-2026-0035 para el Polígono 11. Posteriormente, la interventoría revisó los soportes correspondientes al Pago No. 1 de la consultoría, los cuales fueron remitidos al IDIGER mediante el oficio CONS-IL1-2026-0037, y emitió el acta de aprobación del Producto No. 1 mediante el oficio CONS-IL1-2026-0039.

En relación con el seguimiento financiero de la oferta económica de la consultoríase obteniendo un valor parcial ejecutado de $367.462.916,00 antes de IVA, equivalente a $437.280.870,00, incluido el IVA del 19 %. El mayor porcentaje de ejecución corresponde al componente de personal especialista, profesional y de apoyo, seguido de las actividades de investigación de campo asociadas a perforaciones mecánicas, mientras que otros componentes, como las exploraciones geofísicas, los ensayos de laboratorio y las pruebas de infiltración, aún no registran ejecución durante el periodo evaluado. Este seguimiento constituye un control sobre la ejecución presupuestal reportada por la consultoría y no implica la aprobación de pagos ni la aceptación técnica de los productos entregados.

En el componente técnico,los productos del consultor se encuentran en el siguiente estado: El Producto No. 1 se encuentra aprobado; el Producto No. 2 (version 3 el 21 de mayo CONS-IL1-2026-0057 Observaciones_Producto11_Version3), correspondiente a la actualización y complemento de los estudios temáticos, continúa en proceso de revisión y subsanación por parte de la consultoría; y el Producto No. 4 (version 1 6 abril CONS-IL1-2026-0032 Producto 4) igualmente se encuentra en etapa de revisión y ajuste. Lo anterior evidencia que el avance físico del contrato depende no solo de la ejecución de actividades de campo, sino también del cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad exigidos para la aprobación de cada uno de los productos contractuales. El consultor en el periodo comprendido del informe periodico estuvo adelantando actividades de campo con la ejecución de la exploración del subsuelo del poligono 11 SANTAFE

En cuanto al avance del proyecto, se evidencia una diferencia entre el porcentaje programado y el porcentaje ejecutado. Para la fecha de corte, el cronograma establecía un avance acumulado del 43,6 %, mientras que el avance ejecutado alcanzó el 27,0 %, representando una desviación de 16,6 puntos porcentuales respecto a la programación inicialmente aprobada. Este comportamiento obedece principalmente al desfase presentado en la aprobación del Producto No. 1, condición que retrasó el inicio de las actividades de exploración del subsuelo, así como a los tiempos requeridos para la revisión, ajuste y subsanación de los productos contractuales presentados por la consultoría. Adicionalmente, durante el periodo persistieron retrasos en la ejecución de actividades como las exploraciones geofísicas, los ensayos de laboratorio y otras actividades de campo contempladas en la programación, las cuales aún no registran ejecución.
La Interventoría realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por la Consultoría y a los aspectos que presentaban incidencia sobre la programación contractual. En desarrollo de este seguimiento, se formularon requerimientos y observaciones mediante el Oficio CONS-IL1-2026-0057, “Observaciones Producto 11 – Versión 3”, de fecha 21 de mayo de 2026, mediante el cual se comunicaron a la Consultoría las observaciones identificadas sobre el producto y se solicitaron los ajustes correspondientes.

De igual manera, durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades asociadas a la exploración geotécnica y a los ensayos de laboratorio. Como parte de este seguimiento, mediante comunicación de fecha 25 de mayo de 2026, se solicitó a la Consultoría la remisión de la solicitud de ensayos correspondiente a las perforaciones ejecutadas en el Polígono 11, evidenciando la necesidad de mantener la trazabilidad y seguimiento sobre las actividades requeridas para el desarrollo de los productos contractuales.

Los anteriores requerimientos constituyen antecedentes documentales de las gestiones adelantadas por la Interventoría durante el periodo evaluado frente al avance de las actividades y la atención de los productos pendientes.

Adicionalmente, durante el periodo objeto del presente informe, la Interventoría adelantó acciones de acompañamiento y apoyo técnico a la Consultoría, orientadas a facilitar el desarrollo y fortalecimiento de los productos contractuales. Como evidencia de estas gestiones, el 2 de junio de 2026 se compartió con la Consultoría información cartográfica disponible a través de los servicios de IDECA, correspondiente a información urbana de 2025, indicando la posibilidad de acceder a la información mediante servicio WMS y utilizarla como insumo para el desarrollo y complementación de sus productos.

Esta gestión se realizó con el propósito de proporcionar a la Consultoría información técnica disponible que pudiera contribuir al avance de las actividades y a la mejora de los productos en proceso de elaboración, en el marco del acompañamiento efectuado por la Interventoría durante la ejecución contractual.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.


Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER No. 180 de 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	10/11/2025
Tipo de contrato	Consultoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	Ocho (8) meses							**Número de Cédula o NIT:**	NIT: 830.146.665-6
Periodo del Informe:	16	5	2026	al	15	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO CAMARGO C.C: 79.334.503
Interventor (si Aplica)	Consorcio Interventoría lotes							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT: 902.017.353-1 FLABIO SOLER C.C: 79.505.743
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	N/A							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS.

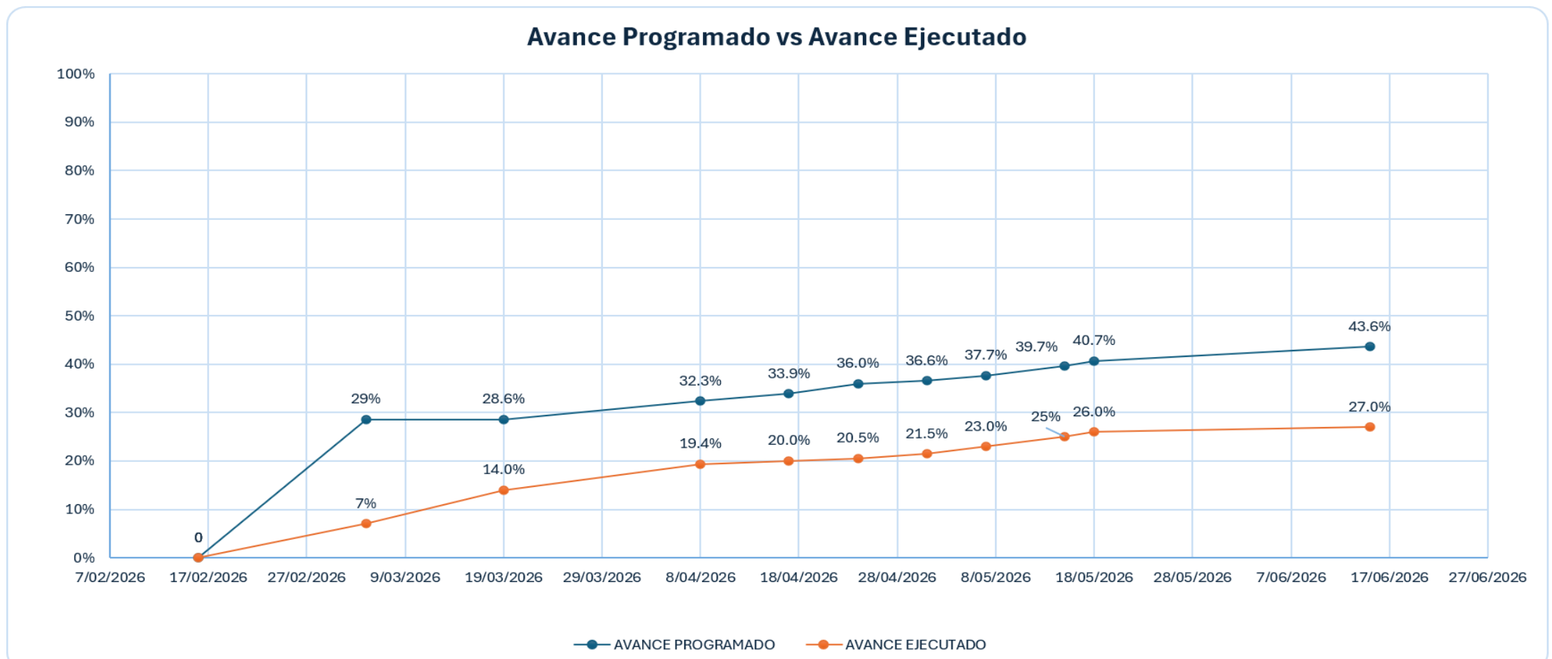

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER No. 180 de 2025							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	10/11/2025
Tipo de contrato	Consultoría							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A
Plazo de Ejecución (meses)	Ocho (8) meses							**Número de Cédula o NIT:**	NIT: 830.146.665-6
Periodo del Informe:	16	5	2026	al	15	6	2026	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO CAMARGO C.C: 79.334.503
Interventor (si Aplica)	Consorcio Interventoría lotes							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT: 902.017.353-1 FLABIO SOLER C.C: 79.505.743
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	N/A							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO INTEGRAL Y PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INCLUYENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN 11 POLÍGONOS QUE INCLUYEN LAS 22 LADERAS PRIORIZADAS PARA EL CORTO PLAZO POR EL POT, EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 1 - USAQUÉN Y SANTA FE - 2 POLÍGONOS.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

En proceso de consolidación del seguimiento, teniendo en cuenta que se recibieron por parte de la consultoría las planillas anexas al pago del Entregable No. 1, las cuales actualmente se están contrastando con el plan de cargas y el avance de la oferta económica

Fecha emisión de Informe	3	7	2026

GONZALO DIAZ

GONZALO DIAZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA LOTES

Cargo Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.
