SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS	CONTRATO No.SAMC 06 DE 2026	FECHA DE CONTRATACIÓN:	21 DE MAYO DE 2026	ACTA FINAL
		PLAZO INICIAL:	DOS (2) MES	
	"ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE"	FECHA ACTA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2026	
		VALOR INICIAL:	$ 281.330.557,00	
		VALOR ADICIÓN:	$ -	
CONTATANTE : LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO - SUCRE. NIT. 800.165.944-8	CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS R/L: DANCY EDILIA TOVAR DE OBEID. NIT. 901,531,888-1	VALOR TOTAL:	$ 281.330.557	
	INTERVENTOR: JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA / SUPEVISOR: Ing. FRANCY LORENA HERNÁNDEZ ARRIETA	FECHA PRESENTA ACTA:	10 DE AGOSTO DE 2026	

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICATORIA N° 1			ACTA FINAL		
Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01	DESMONTE DE CERRAMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR ELABORADO CON LÁMINAS DE ETERBOARD Y ACABADO EN GRANIPLAST	M2	96,00	$ 324.121,00	$ 31.115.616,00	79,52	324.121,00	25.774.102,00	79,52	$ 324.121,00	$ 25.774.102,00
1,02	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DESMONTES Y DEMOLICIONES (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	M3	21,66	$ 99.351,00	$ 2.151.943,00	12,65	99.351,00	1.256.790,00	12,65	$ 99.351,00	$ 1.256.790,00
1,03	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE	UND	1,00	$ 535.682,00	$ 535.682,00	1,00	535.682,00	535.682,00	1,00	$ 535.682,00	$ 535.682,00
1,04	FACHADA FLOTANTE DE PANEL DE 4 MM COMPUESTO DE ALUMINIO (ACP) QUE CONSISTE EN DOS CAPAS EXTERIORES DE ALUMINIO Y UN NÚCLEO INTERNO DE POLIETILENO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M2	96,00	$ 2.075.580,00	$ 199.255.680,00	87,11	2.075.580,00	180.803.774,00	87,11	$ 2.075.580,00	$ 180.803.774,00
1,05	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA DEL FOSO DEL ASCENSOR, INCLUYE LIMPIEZA, REPARACIÓN INTEGRAL A PERFILES, CONEXIONES Y ACABADO FINAL	M2	118,85	$ 267.862,00	$ 31.835.399,00	0,00	267.862,00	0,00	0,00	$ 267.862,00	$ 0,00
1,06	DESMONTE DE BAÑO EXTERIOR 1.60M X 2.30M, MUROS ELABORADOS EN LÁMINAS DE ETERBOARD Y CUBIERTA EN TEJA TRASLÚCIDADESMONTE DE BAÑO EXTERIOR 1.60M X 2.30M, MUROS ELABORADOS EN LÁMINAS DE ETERBOARD Y CUBIERTA EN TEJA TRASLÚCIDA	M2	21,84	$ 55.813,00	$ 1.218.956,00	0,00	55.813,00	0,00	0,00	$ 55.813,00	$ 0,00
1,07	DEMOLICIÓN PISO EN TABLÓN DE GRES	M2	23,36	$ 22.530,00	$ 526.301,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	$ 22.530,00	$ 0,00
1,08	PISO EN TABLÓN DE GRES VITRIFICADO Y JUNTA EN GRANITO LAVADO	M2	23,36	$ 221.738,00	$ 5.179.800,00	0,00	221.738,00	0,00	0,00	$ 221.738,00	$ 0,00
INP 1	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL DE PERFILERÍA METÁLICA EXISTENTE MEDIANTE SOLDADURA, INCLUYE CORTE, ALINEACIÓN, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA MECÁNICA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL.	KG				2.529,02	23.311,00	58.953.985,00	2.529,02	$ 23.311,00	$ 58.953.985,00
INP 2	BORDILLO EN CONCRETO DE 3500 PSI. (INCLUYE REFUERZO, SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	ML				4,60	107.873,00	496.216,00	4,60	$ 107.873,00	$ 496.216,00
INP 3	GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA BORDILLO EXTERNO DEL ASCENSOR	ML				4,60	107.275,00	493.465,00	4,60	$ 107.275,00	$ 493.465,00
INP 4	PINTURA PARA FACHADA EXTERIOR EN GRANOTEX, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE MENOR, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO Y DOS MANOS DE REVESTIMIENTO TIPO GRANOTEX, HERRAMIENTA, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	M2				5,46	94.040,00	513.458,00	5,46	$ 94.040,00	$ 513.458,00
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA CRISTAL CALIBRE 27 (275) LISA, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.	M2				5,72	480.228,15	2.746.905,00	5,72	$ 480.228	$ 2.746.905,00
INP 6	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO	UND				1,00	245.000,00	245.000,00	1,00	$ 245.000,00	$ 245.000,00
Subtotal											
				SUBTOTAL OBRAS	$ 271.819.377,00			$ 271.819.377,00			$ 271.819.377,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 1.941.567,00		19%	$ 1.941.567,00		19%	$ 1.941.567,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 273.760.944,00			$ 273.760.944,00			$ 273.760.944,00
	PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				$ 7.569.613,00			$ 7.569.613,00			$ 7.569.613,00
	VALOR TOTAL				$ 281.330.557,00			$ 281.330.557,00			$ 281.330.557,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	27%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

Ing. FRANCY LORENA
SUPERVISORA


Ing. EDGAR VERGARA
SUPERVISOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	1,01	DESMONTE DE CERRAMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR ELABORADO CON LÁMINAS DE ETERBOARD Y ACABADO EN GRANIPLAST	UNID.	M2	UBICACIÓN	



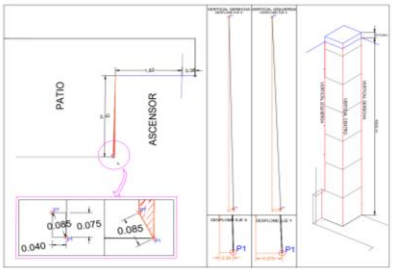

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Caras exteriores foso ascensor 1	2,42	18,55	0,00	1,00	44,89
Caras exteriores foso ascensor 2	1,82	18,55	0,00	1,00	33,76
Caras exteriores foso ascensor 2	0,36	2,40	0,00	1,00	0,86
					79,52
					79,52

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	1,02	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DESMONTES Y DEMOLICIONES (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	UNID.	M3	UBICACIÓN	



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Área/Volumen	Espesor/Altura	Expansión		
Láminas eterboard existentes del foso	79,52	0,12	1,30	1,00	12,41
Cubierta patio	1,82	0,10	1,30	1,00	0,24
					12,64
					12,65

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	1,03	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE	UNID.	UND	UBICACIÓN	



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Patio exterior				1,00	1,00
					1,00
					1,00

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS **CONTRATISTA DE OBRA**	**JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA** **INTERVENTOR**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	1,04	FACHADA FLOTANTE DE PANEL DE 4 MM COMPUESTO DE ALUMINIO (ACP) QUE CONSISTE EN DOS CAPAS EXTERIORES DE ALUMINIO Y UN NÚCLEO INTERNO DE POLIETILENO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UNID.	M2	UBICACIÓN	

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Caras exteriores foso ascensor 1	2,42	19,19	0,00	1,00	46,44
Caras exteriores foso ascensor 2	1,82	19,19	0,00	1,00	34,93
area superior para cubir	2,42	1,82	0,00	1,00	4,40
longitud para cubir ventanas pios 1	2,52	0,32	0,00	1,00	0,79
longitud para cubir ventanas pios 2	1,36	0,10	0,00	1,00	0,14
longitud para cubir ventanas pios 3	1,36	0,10	0,00	1,00	0,14
longitud para cubir ventanas pios 4	1,36	0,10	0,00	1,00	0,14
longitud para cubir ventanas pios 5	1,36	0,10	0,00	1,00	0,14
					87,11
					87,11

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS **CONTRATISTA DE OBRA**	**JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA** **INTERVENTOR**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE N°		ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO
CONTRATISTA	
NIT O C.C.	
CONTRATO DE OBRA N°	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	INP 1,01	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL DE PERFILERÍA METÁLICA EXISTENTE MEDIANTE SOLDADURA, INCLUYE CORTE, ALINEACIÓN, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA MECÁNICA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL.	UNID.	KG	UBICACIÓN



Localización	Dimensiones			Medida Total
	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (kg/m)	
COLUMNA HEA 100	18,71	3	16,7	937,37
VIGA HEA 100 LATERAL	1,57	26	16,7	681,69
VIGA HEA 100 FRONTAL	2,14	13	16,7	464,59
CANAL UPN 100 LATERAL	1,57	7	10,6	116,49
CANAL UPN 100 FRONTAL	2,14	7	10,6	158,79
CANAL UPN 160 SUPERIOR	1,57	2	18,8	59,03
CANAL UPN 160 SUPERIOR	2,14	1	18,8	40,23
PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50	2,54	1	3,08	7,82
PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50	2,37	1	3,08	7,30
PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50	1,66	3	3,08	15,34
PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50	1,97	1	3,08	6,07
PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50	1,57	3	3,08	14,51
PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 50X50	2,14	3	3,08	19,77
				2.529,01
				2.529,02

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	INP 1,02	BORDILLO EN CONCRETO DE 3500 PSI. (INCLUYE REFUERZO, SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	UNID.	ML	UBICACIÓN	

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Caras exteriores foso ascensor 1	2,42				2,42
Caras exteriores foso ascensor 2	2,18				2,18
					4,60
					4,60

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS **CONTRATISTA DE OBRA**	**JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA** **INTERVENTOR**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	INP 1,03	GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA BORDILLO EXTERNO DEL ASCENSOR	UNID.	ML	UBICACIÓN	

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Caras exteriores foso ascensor 1	2,42				2,42
Caras exteriores foso ascensor 2	2,18				2,18
					4,60
					4,60

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Sincelejo – Sucre

VERSIÓN:01

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	INP 1,04	PINTURA PARA FACHADA EXTERIOR EN GRANOTEX, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANE MENOR, APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO Y DOS MANOS DE REVESTIMIENTO TIPO GRANOTEX, HERRAMIENTA, EQUIPOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	UNID.	ML	UBICACIÓN	

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
LONGITUD DEL EDIFICIO	1,60	3,41			5,46
					5,46
					5,46

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	INP 1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA CRISTAL CALIBRE 27 (275) LISA, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.	UNID.	M2	UBICACIÓN	

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
CUBIEERTA EXTERIOR	2,20	2,60			5,72
					5,72
					5,72

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS **CONTRATISTA DE OBRA**	**JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA** **INTERVENTOR**	

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Consejo Superior de la Judicatura** **Dirección Seccional de Administración Judicial** **Sincelejo – Sucre**	**VERSIÓN:01**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	DD		MM	7	AA	2026		CORTE Nº		ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO										
CONTRATISTA							NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA Nº	

1	ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE FOSO DE ASCENSOR TORRES A Y B DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO	ITEM:	INP 1,06	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO	UNID.	UND	UBICACIÓN	

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
PUERTA PATIO					1,00
					1,00
					1,00

R/L SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS SAS CONTRATISTA DE OBRA	JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA INTERVENTOR	
