

EDILBERTO CUELLARBAUTISTA
E.C.B
SERVICIOS TECNICOS
EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA NIT.86046408-2
Email: edilbertocuellarbaurista@gmail.com



Fecha: Villavicencio agosto 5 de 2026

Licenciado:
MG. LEONARDO HERNANDO TORRES RODRIGUEZ
Rector Institución Educativa Miguel Ángel Martin.

INFORME DE ACTIVIDADES Y ENTREGA.

Estimada Rector:

De la manera mas atenta nos permitimos informarle a usted las actividades realizadas en la Institución educativa a la cual usted dirige.

POR CONCEPTO DE:

32	Se realizo el mantenimiento de las salidas de iluminación de los salones 1, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 2, se instaló 1 bombillos LED de 30W, salón 3, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 4, se instaló 2 bombillos LED de 30W,salón 5, se instaló 4 bombillos LED de 30W, salón 6, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 7, se instaló 2 bombillos LED de 30W, salón 8, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 9, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 10, se instaló 2 bombillos LED de 30W, salón 11, se instalaran 3 bombillos LED de 30W, salón 12, se i instaló 3 bombillos LED de 30W.
2	Se realizo el mantenimiento de las tomas corrientes del salón 8 y se cambiara 1 toma corriente. se remplazará un breaker al tablero de distribución principal del plantel.
2	Se realizo mantenimiento eléctrico, revisión de dos tomas corrientes y se remplazará 2 tomas corrientes, se realizará dos salidas de tomas corrientes y se instalaran dos ventiladores en coordinación de la institución.
1	Se realizo la demolición del filo del muro que sostiene la ventana del salón 6-2 y se reconstruye el filo pañetado, pintado de color blanco por la parte interna del salón y se recogen los escombros.
8	Se retiraron 8 tabletas partidas y se instalarán 8 nuevas con (alistado, cemento, arena y pega col) en el pasillo del segundo piso.
1	Se desmonto cartelera en aluminio de 1.00X1.60 y se retiran 4 vidrios de 1.00X80 que se encuentra en la coordinación y se trasladara a la rectoría.
16	Se realizo mantenimiento a los 8 lavamanos internos de la unidad sanitaria de las niñas y 8 lavamanos de las unidades de los niños, se cambió 5 llaves de agua, se hizo la adecuación en tubería muro por ruptura de tubo de las llaves de los lavamanos internos de los niños, se pintó de



EDILBERTO CUELLARBAUTISTA
E.C.B
SERVICIOS TECNICOS
EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA NIT.86046408-2
Email: edilbertocuellarbaurista@gmail.com



	blanco y se recogió escombros, se cambió los sifones de los dos lavamanos de la parte exterior de las unidades sanitarias.
4	Se realizo mantenimiento de dos tanques aéreos de 1000 litros, se desmontan, se lavan y se les cambio los flotadores a cada tanque.
8	Se retiro el tanque lavadero, se limpió la poceta de recolección de aguas, se son dio la tubería, se rompió 1 mts y profundidad 50cmt piso para destapar tubería, se hizo los resanes del piso, se lavó la tubería y se instaló de nuevo el tanque lavadero.
4	Se realizo la reparación de la hoja de puerta de 1.00X1.80, se desmonto la hoja metálica, corte de 5.00cm de lámina se instaló perfil en la hoja de la puerta, se instalarán tres bisagras nuevas y se corrige el marco de la puerta del salón 8 del grado 11-2.
8	Se realizo el mantenimiento a los tres lavamanos portátiles, se cambió las tres llaves del agua y se cambió los dos sifones de los lavamanos portátiles y se reparó conexión de agua de los mismos.
160	Se realizo limpieza a las canales metálica de 80mts aéreas de toda la institución, y a las canales desagüe de piso 80mts, dos cajas de paso y lavado de tubería.
4	Se realizo el retiro de 4 panales de avispas en árboles de pumarrozo.
7	Se realizo el mantenimiento eléctrico a los tacos del segundo piso, se realizó el cambio de un taco, cambio de dos bombillos en la secretaría y dos en la sala de juntas, cuatro en el pasillo.
2	Se realizo el desmonte de una teja Eternit, para correctivo de gotera, y se realizó la instalación de la misma y se taparon goteras con cinta asfáltica en cubierta sobre tanque lavadero.
16	Se realizo la poda de 11 árboles pumarroso, cada árbol mide 7mts de altura por 8mts de radio y cinco árboles Xilopias con una altura 7mts con un radio de 3mts, se utilizará escaleras metálicas de extensión, machetes y una motosierra, se retirarán veinte (20) viajes de escombro en moto carguero y tres viajes de escombros en camión.

Agradezco la atención prestada, y estaremos atentos a cualquier sugerencia en la calidad del servicio.

A continuación, presento informe fotográfico.

EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA
NIT.86046408-2
Email: edilbertocuellarbaurista@gmail.com
Cel.: 3058124155





EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026

ACTIVIDAD 1.

Se realizo el mantenimiento de las salidas de iluminación de los salones 1, se instalaran 3 bombillos LED de 30W, salón 2, se instaló 1 bombillos LED de 30W, salón 3, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 4, se instalaran 2 bombillos LED de 30W,salón 5, se instaló 4 bombillos LED de 30W, salón 6, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 7, se i instaló 2 bombillos LED de 30W, salón 8, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 9, se instaló 3 bombillos LED de 30W, salón 10, se i instaló 2 bombillos LED de 30W, salón 11, se instalaran 3 bombillos LED de 30W, salón 12, se i instaló 3 bombillos LED de 30W



















EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin



AGOSTO 05 DEL 2026





ACTIVIDAD 2.

Se realizo el mantenimiento de las tomas corrientes del salón 8 y se cambiara 1 toma corriente. se remplazará un breaker al tablero de distribución principal del plantel.









Se realizo mantenimiento eléctrico, revisión de dos tomas corrientes y se remplazará 2 tomas corrientes, se realizará dos salidas de tomas corrientes y se instalaran dos ventiladores en coordinación de la institucionn.









EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026



ACTIVIDAD 4.

Se realizo la demolición del filo del muro que sostiene la ventana del salón 6-2 y se reconstruye el filo pañetado, pintado de color blanco por la parte interna del salón y se recogen los escombros.







EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026









ACTIVIDAD 5.

Se retiraron 8 tabletas partidas y se instalarán 8 nuevas con (alistado, cemento, arena y pega col) en el pasillo del segundo piso







ACTIVIDAD 6.

Se desmonto cartelera en aluminio de 1.00X1.60 y se retiran 4 vidrios de 1.00X80 que se encuentra en la coordinación y se trasladara a la rectoría.













EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin



AGOSTO 05 DEL 2026

ACTIVIDAD 7.

Se realizo mantenimiento a los 8 lavamanos internos de la unidad sanitaria de las niñas y 8 lavamanos de la unidades de los niños, se cambió 5 llaves de agua, se hizo la adecuación en tubería muro por ruptura de tubo de las llaves de los lavamanos internos de los niños, se pintó de blanco y se recogió escombros, se cambió los sifones de los dos lavamanos de la parte exterior de las unidades sanitarias..



















EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026

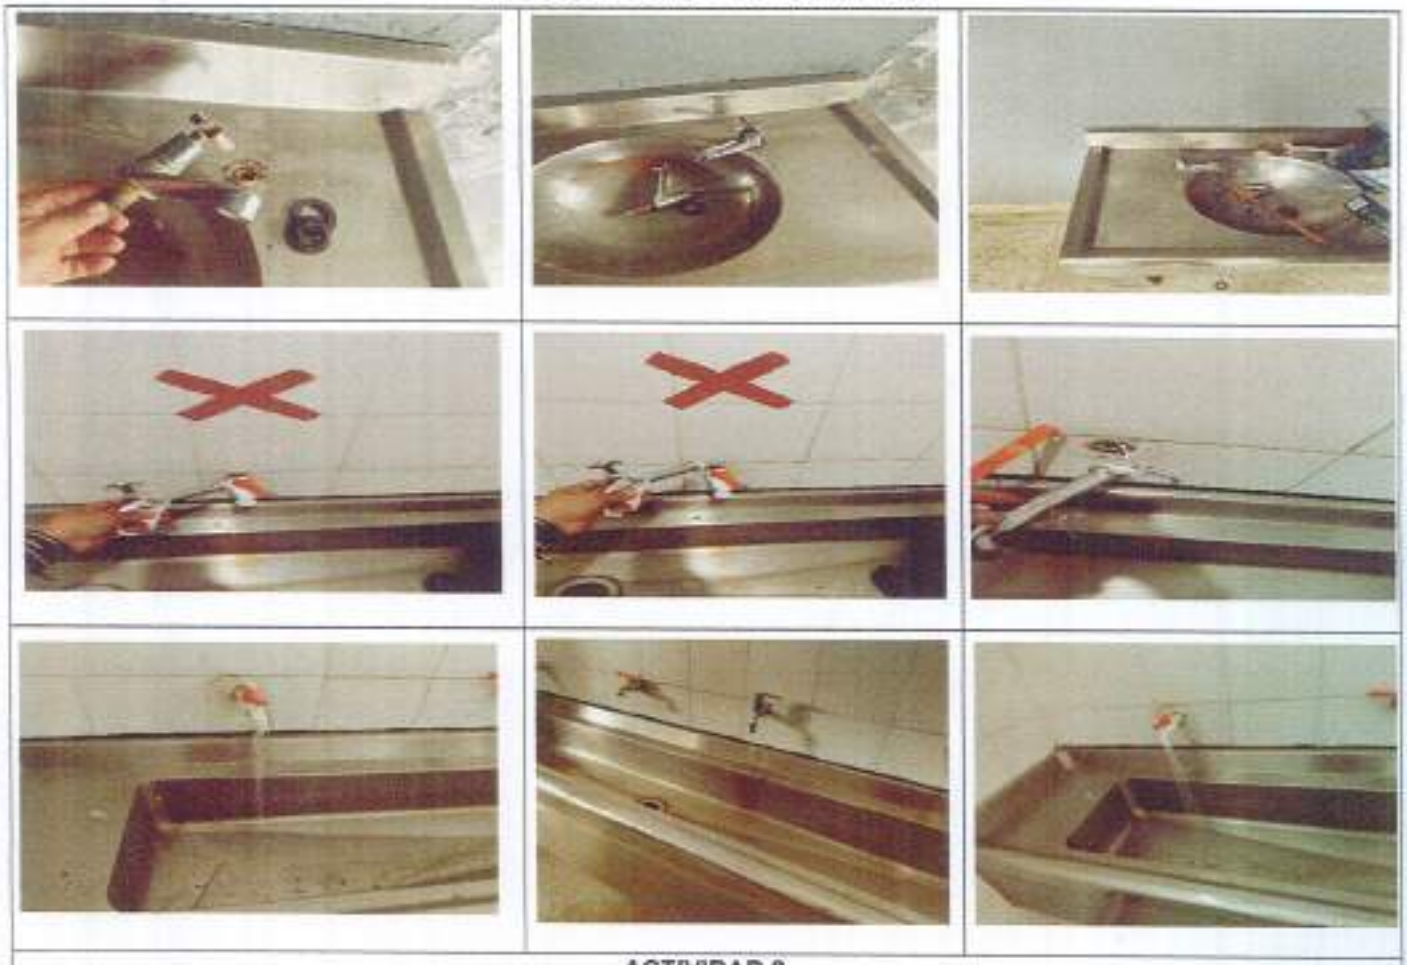

ACTIVIDAD 8.

Se realizo mantenimiento de dos tanques aéreos de 1000 litros, se desmontan, se lavan y se les cambio los flotadores a cada tanque



ACTIVIDAD 9.

Se retiro el tanque lavadero, se limpió la poceta de recolección de aguas, se son dio la tubería, se rompió 1 mts y profundidad 50cmt piso para destapar tubería, se hizo los resanes del piso, se lavó la tubería y se instaló de nuevo el





EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026





















EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026







ACTIVIDAD 10.

Se realizo la reparación de la hoja de puerta de 1.00X1.80, se desmonto la hoja metálica, corte de 5.00cm de lámina se instaló perfil en la hoja de la puerta, se instalarán tres bisagras nuevas y se corrige el marco de la puerta del salón 8 del grado 11-2





















EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin



AGOSTO 05 DEL 2026

ACTIVIDAD 11.

Se realizo el mantenimiento a los tres lavamanos portátiles, se cambió las tres llaves del agua y se cambió los dos sifones de los lavamanos portátiles y se reparó conexión de agua de los mismos.








ACTIVIDAD 12.

Se realizo limpieza a las canales metálica de 80mts aéreas de toda la institución, y a las canales desagüe de piso 80mts, dos cajas de paso y lavado de tubería












EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026


















EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026

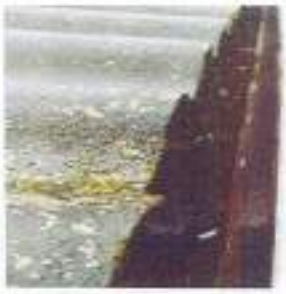








ACTIVIDAD 13.

Se realizo el retiro de 4 panales de avispas en árboles de pumarrozo.








EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin



AGOSTO 05 DEL 2026

ACTIVIDAD 14.

Se realizo el mantenimiento eléctrico a los tacos del segundo piso, se realizó el cambio de un taco, cambio de dos bombillos en la secretaria y dos en la sala de juntas, cuatro en el pasillo












EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin



AGOSTO 05 DEL 2026

ACTIVIDAD 15.

Se realizo el desmonte de una teja Eternit, para correctivo de gotera, y se realizó la instalación de la misma y se taparon goteras con cinta asfáltica en cubierta sobre tanque lavadero







ACTIVIDAD 16

Se realizo la poda de 11 árboles pumarroso, cada árbol mide 7mts de altura por 8mts de radio y cinco árboles Xilopias con una altura 7mts con un radio de 3mts, se utilizará escaleras metálicas de extensión, machetes y una motosierra, se retirarán veinte (20) viajes de escombro en moto carguero y tres viajes de escombros en camión












EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026







EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA

Trabajos realizados al Colegio Miguel Ángel Martin

AGOSTO 05 DEL 2026







EDILBERTO CUELLAR BAUTISTA
NIT.86046408-2
Email: edilbertocuellarbaurista@gmail.com
Cel.: 3058124155
