	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

INFORME MENSUAL No. CUATRO (4) **MES O PERIODO:** NOVIEMBRE DE 2022

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	691
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	693
1	**INTRODUCCIÓN**		695
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		696
2.1	Localización		696
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		697
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		698
2.4	Características técnicas del proyecto		699
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		701
3.1	Información general del contrato		701
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		702
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		702
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		702
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		703
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	704
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	714
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	717
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	719
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	724
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	730
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	732
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	740
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		742
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	745
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	747
	• Seguimiento Programa de Obra		750
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	768
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	770
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	772
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	776
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		904
5.1	Información general del contrato		904
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		905
5.3	Informes especialistas y profesionales		911
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1000
5.5	Informe matriz de riesgos.		1001
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1002
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		1006
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1007
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1029
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1043
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1045
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1056
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1058
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1060
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1062
7	**Conclusiones y recomendaciones**		782
8	**Anexos**		783
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		784
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		788
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		790
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		792

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/12/2021 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** nov-22

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

PLAZO INICIAL: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2022
PLAZO ACUMULADO: 8 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.121.889.999,40
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.121.889.999,40
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	5300
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 8.016.404.815,00		$ 8.016.404.815,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 41.265.012,10	$ 7.840.352,30	$ 49.105.364,40
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.105.047.827,10	$ 16.842.172,30	$ 8.121.889.999,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 220.451.132,41		220.451.132,41	$ 220.451.132,41
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	220.451.132,41	0,00	220.451.132,41	220.451.132,41

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2021 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	8.016.404.815,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	220.451.132,41
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		2,75%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**23**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Labores de explanación 30/11/2022



Labores de explanación 30/11/2022

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Mediante comunicado CVRIMG-287-2022, se recomienda al municipio de San Bernado del Viento la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra

Firma

Nombre: FREDY ROBERTO PEZOIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto **CMA-DTE-SEP-196-2021** y número ID del SECOP CO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".** Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto, es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Bernardo del Viento, mediante el convenio interadministrativo No. 1876 de 2021. Es por ello que mediante el proceso de licitación pública **LP-MSBV-006-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO", El cual fue adjudicado al CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, cuyo plazo inicial es de ocho (8) meses a partir del 24 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $ 8.121.889.999,00.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de noviembre de 2022; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Este proyecto se localiza en la vía que conduce desde la intersección que lleva San Bernardo del Viento - Moñitos hasta el Corregimiento del El Castillo y consiste en el mejoramiento de la vía con la construcción de 5300 metros de placa huella.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Bernardo del Viento.

San Bernardo del Viento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Está situado sobre la costa norte de Colombia en la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe y dista 78 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento. El territorio corresponde a un bosque seco tropical, con predominio de relieve bajo, baja altitud y alta temperatura, con un promedio de 30 °C, una humedad relativa del 80%, dos épocas de lluvias durante el año, entre abril – mayo y octubre – noviembre, en donde se precipita el 76% de la lluvia anual que es de unos 1.300 mm y una época de verano, que corresponde al resto del año. La mayor parte del territorio, al norte, sur y este, es plano, el resto presenta alturas cercanas a los 100 msnm, posee 34,2 km de playas de los cuales algunos tramos presentan condiciones adecuadas para el turismo y ecoturismo.



Ilustración 3. Vía al corregimiento el Castillo.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales presentada por el contratista, se encuentra ubicada en la vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba. Esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



Ilustración 4. Ubicación de la fuente de materiales.

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Se benefician principalmente la zona rural del municipio de San Bernardo del viendo, principalmente la población que habita en el corregimiento de El Castillo.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de la vía; es por ello que se realiza el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de placa huella.



Estado inicial de la Vía, 24/08/2022



Estado de la la via Actual 25/11/202



Estado de la la via Actual 25/11/202



Estado de la la via Actual 30/11/202

Ilustración 5. Estado inicial de la Vía. Cto. LP-MSBV-006-2022

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5 con una longitud de 7 metros.

Contrato LP-MSBV-006-2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	5300 metros
Ancho Calzada	5,3 metros
Losa de concreto	0,15 metros
Subbase	0,15 metros
Afirmado (mejoramiento)	0,20 metros

A la fecha el contrato aún se encuentra en la etapa de estudios y diseños, por tanto, no se tiene definido los diseños del Box Coulvert.

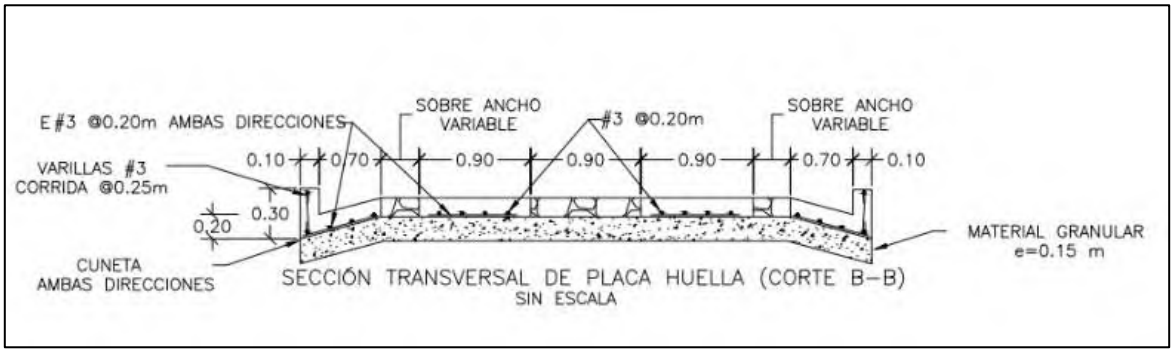


Ilustración 6. Sección típica placa huella

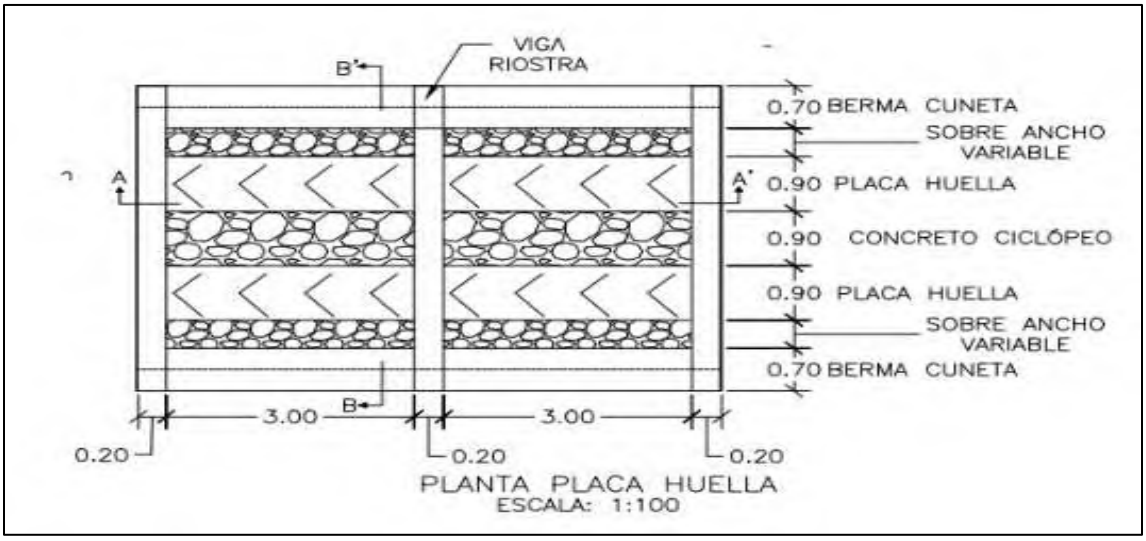


Ilustración 7. Sección típica en planta de la placa huella.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-MSBV-006-2022
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022/07/13
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
NIT	901611859-1
INTEGRANTES	• ALEXANDER THEVENING GARCÉS • C.C. 721.485.658 • Participación: 90%
	• CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S. • NIT. 900.506.559-2 • Participación: 10%
DIRECCIÓN	Cra 11 N 10-31 Pueblo Nuevo – Córdoba
TELEFONO	3107193787
CORREO	consorciovial.sanbernardo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.121.889.999,00
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA INICIO	24/08/2022
FECHA TERMINACIÓN	24/04/2023

Tabla 1. Información Cto. LP-MSBV-006-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Se continúa con la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños. A la fecha se cuenta con la aprobación del diseño de pavimento y con la aprobación del estudio geotécnico.
ii. Replanteo topográfico en conjunto entre la interventoría y contratista
iii. Se continua con las Excavaciones de material común y canales
iv. Se continua con el Relleno con material de afirmado

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El contratista entregó el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA y está en revisión por parte de esta interventoría.

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El contratista instalo el punto de atención al usuario ubicado en el Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar.

Se realiza socialización con la comunidad el día 18 de noviembre de 2022.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

i. A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. A la fecha, semana N°15, se tiene una inversión de obra programada de $ 1.283.755.049,15 correspondiente al $ 15,70% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 220.451.132,41 correspondiente al 2,75%; lo que representa un atraso del 13,26%.
ii. La interventoría continuará realizando seguimiento de la revisión y/o actualización de los estudios y diseños, mediante mesas de trabajo entre los pares de los especialistas.
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iv. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xi. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 11 del 28/10/2022 al 3/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de pavimento rígido y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de pavimento rígido.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%			INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/04/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 24.939.026,20	0,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (24.939.026,20)	-0,31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.939.026,20	0,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.939.026,20)	-0,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.337.629,74	0,27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0,31% Avance o Atraso Físico %: -0,31%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5300			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5300			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5300			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5300			Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, no se tienen definidos todos los criterios que aplican.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vias-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Traslado de maquinarías y suministro de señalización
3. Replanteo topográfico en conjunto entre la interventoría y contratista

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Excavación en material común de la explanación y canales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

La programación se encuenta ajustada al flujo de caja y programa de inversiones. En cuanto a la meta fisica ejecutada, se deja claridad que el proyecto se encuentra en la etapa de la revisión y ajustes a los estudios y diseños, por lo cual no se ha iniciado la ejecución de la obra fisica

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento Topográfico en conjunto Interventoría - Contratista



Traslado de maquinaría



Suministro de señalización

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitacora de obra 4. Realizar seguimiento y control a las actividades de obra	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 12 del 4/11/2022 al 10/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de pavimento rígido y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de pavimento rígido.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%			INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/04/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 238.592.647,25	2,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (238.592.647,25)	-2,98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 238.592.647,25	2,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (238.592.647,25)	-2,98%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 213.653.621,05	2,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,98% Avance o Atraso Físico %: -2,98%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100			Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5300			Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5300			Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5300			Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5300			Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	1	
Cortadora de Pavimento	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vias-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Traslado de maquinarías y suministro de señalización
3. Adecuación de campamento
4. Suministro de materiales petreos

Obseravación 1: se ha dado inicio a las actividades constructivas, debido a que se cuenta con una probación parcial de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
Observación 2: Durante la semana no se realizaron actividades por la saturación que presenta el terreno, generada por la presencia constante de lluvias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

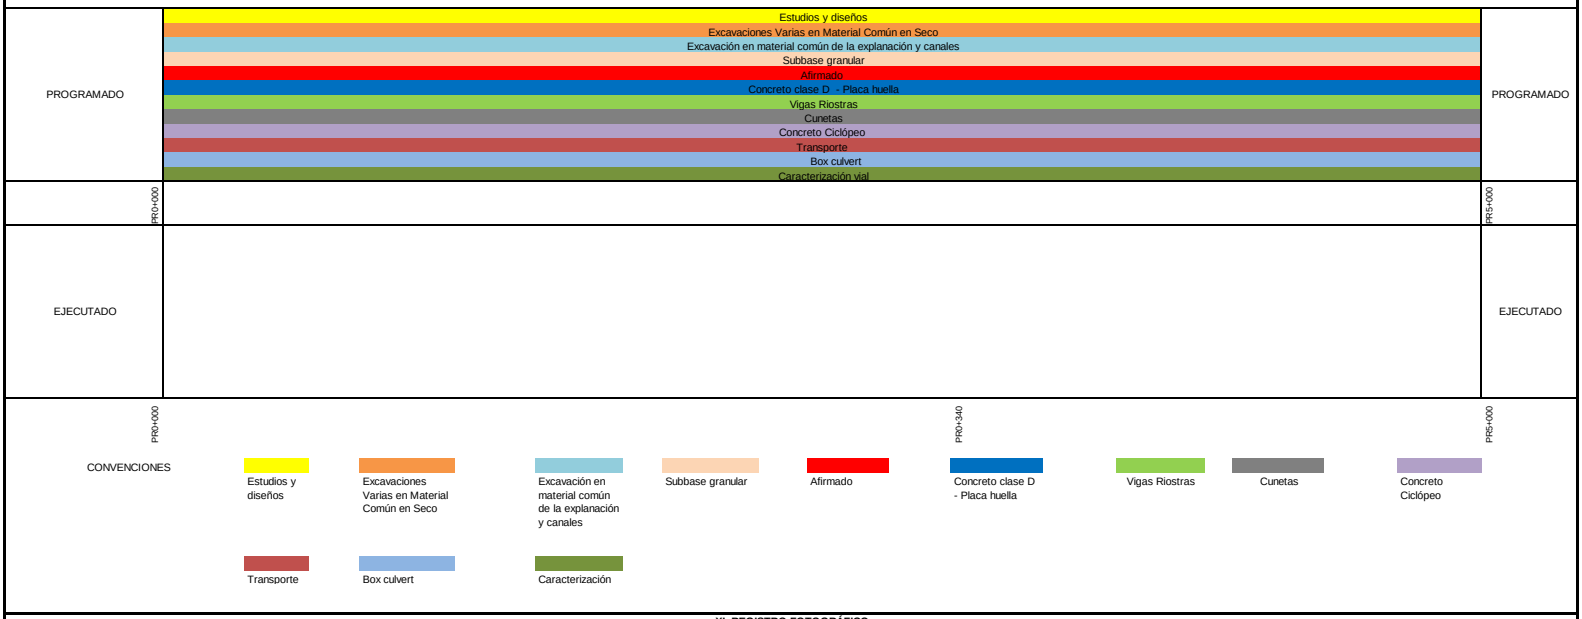

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maquinaria disponible en obra



Suministro de materiales pétreos



Estado del terreno por la presencia de lluvias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 13 del 11/11/2022 al 17/11/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de pavimento rígido y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de pavimento rígido.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1			INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7		
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%			INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)		
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/04/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 585.426.572,96	7,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (585.426.572,96)	-7,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 585.426.572,96	7,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	-
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (585.426.572,96)	-7,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 346.833.925,71	4,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,30% Avance o Atraso Físico % -7,30%
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	
Volqueta 6 m3	1	
Cortadora de Pavimento	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías -INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado


Obseravación 1: se ha dado inicio a las actividades constructivas, debido a que se cuenta con una probación parcial de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

Observación 2: Durante la semana no se realizaron actividades por la saturación que presenta el terreno, generada por la presencia constante de lluvias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

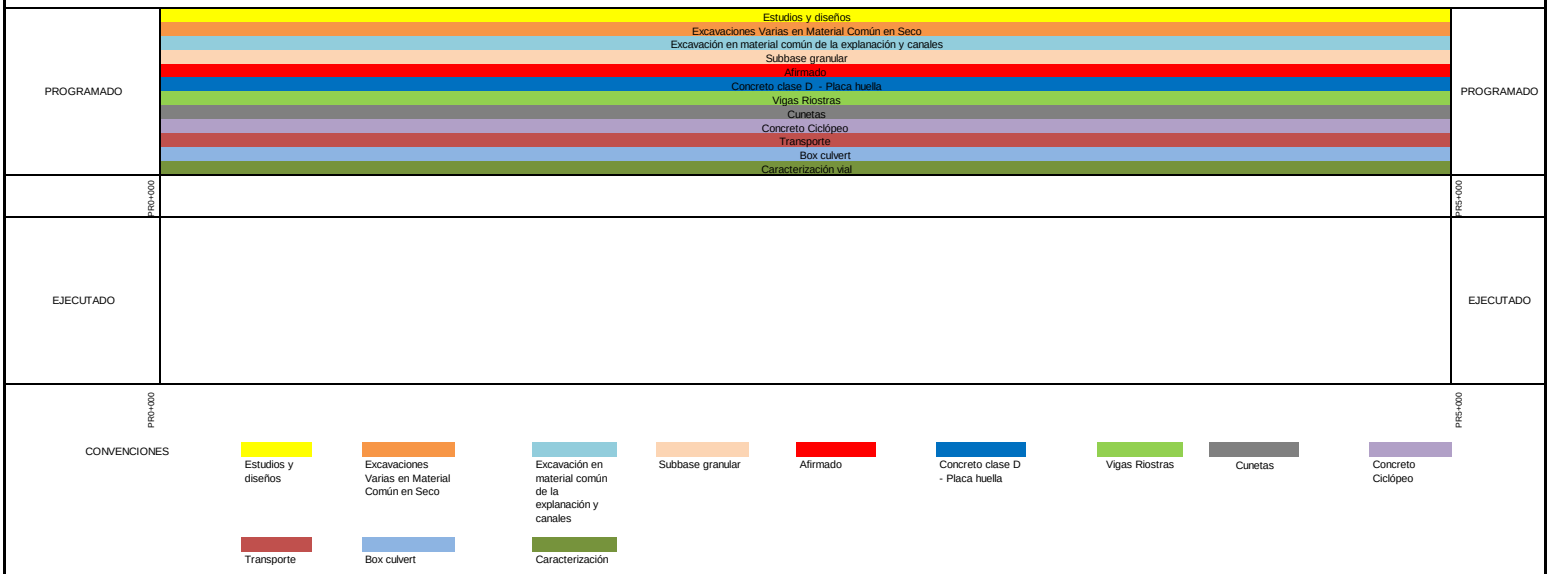

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado del terreno por la presencia de lluvias



Perfilación y adecuación de tramos en mal estado



Perfilación y adecuación de tramos en mal estado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO

Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/11/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 14 del 18/11/2022 al 24/11/2022 **Último Informe Semanal SI** _ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES: 1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%; 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022 — VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/04/2023 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%); 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%); 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022 — **VALOR INICIAL:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE INICIO: 22/08/2022 — **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 — **VALOR ACUMULADO:** $ 4.564.284.660,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024 — **VALOR ANTICIPO:** $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 881.823.968,85	11,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 220.535.700,00	2,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (661.288.268,85)	-8,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 881.823.968,85	11,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 220.535.700,00	2,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (661.288.268,85)	-8,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 296.397.395,88	3,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 220.535.700,00	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 11,00% — Avance o Atraso Físico % -8,25%

Meta Física Ejecutada % 2,75%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El el documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vias-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)
4.Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

Obseravación 1: se ha dado inicio a las actividades constructivas, debido a que se cuenta con una probación parcial de la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Continuar con la Excavación en material común de la explanación y canales
3. Continuar con la ejecucion de Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
4. Continuar con el Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

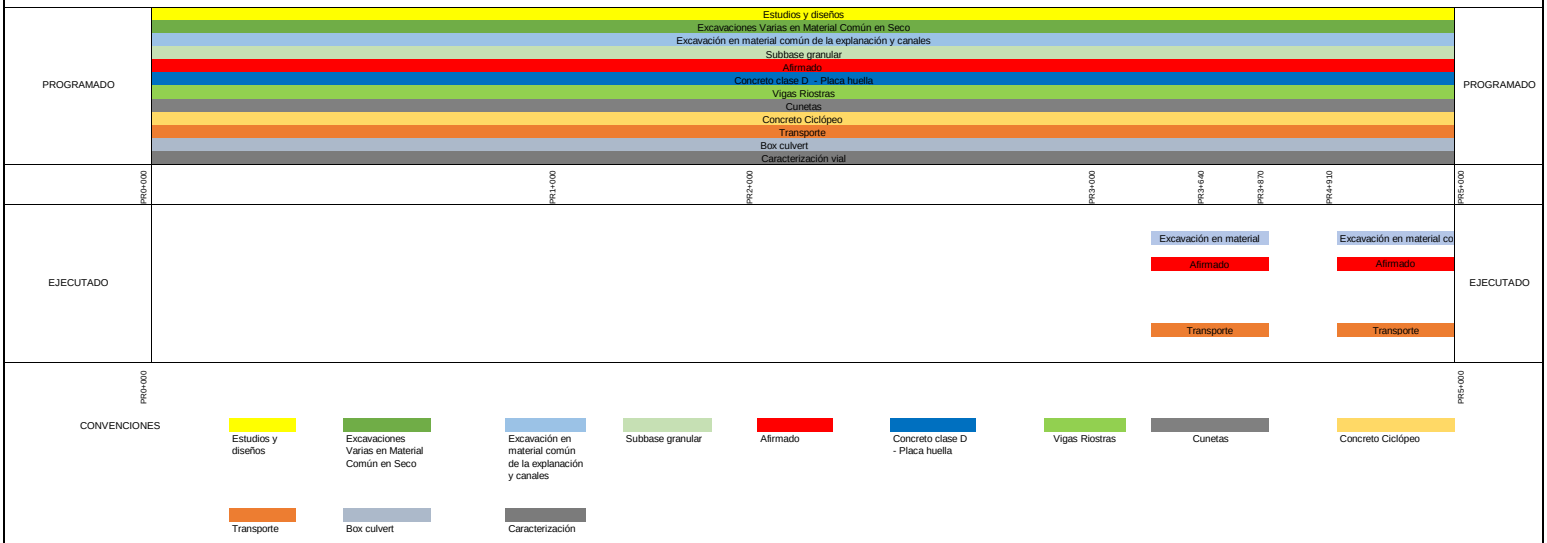

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion con la comunidad



Excavaciones de material comun y perfilado de la via



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Compactacion de Material Afirmado



Señalizacion en obra-Cumplimiento PMT



Adecuación de tramos en mal estado por Lluvias

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitacora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/12/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 15 del 25/11/2022 al 1/12/2022 (Numeración consecutiva) **Último Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El obejto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5300 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%		INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/04/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.283.755.049,16	16,01%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 220.451.132,41	2,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.063.303.916,74)	-13,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.283.755.049,16	16,01%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 220.451.132,41	2,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.063.303.916,74)	-13,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 401.931.080,31	5,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 220.451.132,41	2,75%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 16,01% Avance o Atraso Físico %: -13,26%
Meta Física Ejecutada %: 2,75%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2022__	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog					
					Ejec					
Explanación	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Afirmado	m	5000	5000		Prog					
					Ejec					
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog					
					Ejec					
Box Coulvert	Und	1		1	Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:		NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:		NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:		NO X	N/A
VERTIMIENTOS:		NO X	N/A
EMISIONES:		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)		NO X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Entregado. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

OBSERVACIONES: El documento PAGA se encuentra en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES: el día 29 de septiembre de 2022 se realizó socialización con la comunidad, por parte del Contratista de obra, Municipio, Interventoría e Instituto Nacional de Vías-INVIAS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Se continua con la revisión del documento PAGA, por parte de la interventoría


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Se continua con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños.
2. Perfilación y adecuación de tramos en mal estado
2. Excavación en material común de la explanación y canales
3. Afirmado (Material para Mejoramiento)
4.Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la etapa de revisión y/ o ajustes a los estudios y diseños
2. Continuar con la Excavación en material común de la explanación y canales
3. Continuar con la ejecucion de Relleno con Afirmado (Material para Mejoramiento)
4. Continuar con el Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

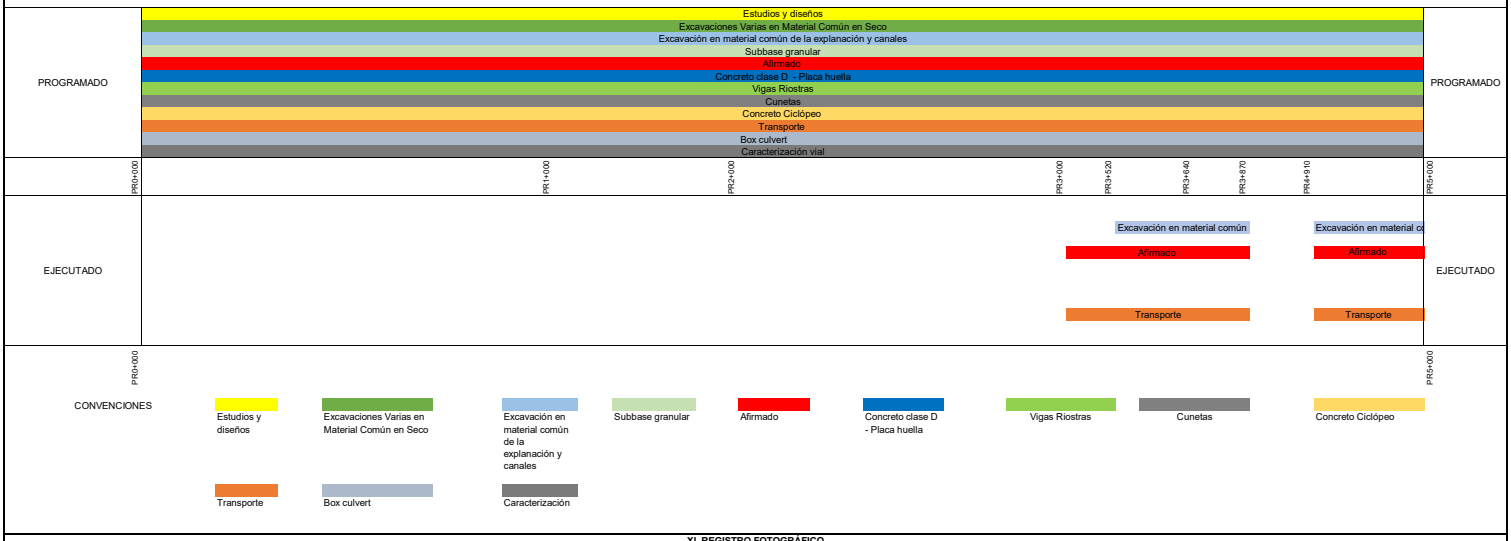

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavaciones de material comun y perfilado de la via




Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Suspensiones de actividades- vias de acceso mal estado de por Lluvias



Adecuación de tramos en mal estado por Lluvias



Relleno con Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante



Afirmado para Mejoramiento de la Subrasante

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Hacer seguimiento a los compromisos. 2. Revisar información entregada por el contratista 3. Gestionar la bitacora de obra 4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción	FIRMA NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: noviembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** ONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETRO EXCAVADORA DE ORUGA	DOOSAN-DX 225 LCA		K3+680 - K3+520	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	
RETRO EXCAVADORA DE LLANTA	JCB-3CX		K3+680 - K3+521	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	
VIBRO COMPACTADOR	CAT-CP 433C		K3+680 - K3+522	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	
MINICARGADOR	BOTCAT-S570		K3+680 - K3+523	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	
MOTONIVELADORA	CAT 720 A		K3+680 - K3+524	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	R	R	R	R	R	R	R	I	R	R	R	I	I	I	
VOLQUETA			K3+680 - K3+525	A	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	
VOLQUETA			K3+680 - K3+526	A	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
TOTAL ACTIVO				3	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	4	5	0	5	5	5	6	6	6	6	0	6	6	6	0	0	0	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				4	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	7	3	1	7	1	1	1	1	0	0	0	7	0	0	0	7	7	7	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	209	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	105	50%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	17	8%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	87	42%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): **La que se indica inactiva, es porque no se realizaron actividades donde esta se requería o por ser domigo, un día no laborado.**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: No.: : 25202154872 CN

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Porvenir, Protección, Colpensiones.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO	84094056	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO													
2	ANDRÉS FABIÁN VILLALBA BARRIOS	10772157	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO													
3	DAYANA MARCELA GONZALEZ FUENTES	1003459220	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO													
4	JOSE CAMILO ALTAMIRANDA ALVAREZ	1067842072	TOPÓGRAFO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO													
5	LUIS MANUEL AVILA RAMOS	1070821962	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO													
6	JORGE ALEXANDER DURANGO OVIEDO	1067971701	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO													
7	MEILYN BALANTA APONTE	1118844042	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO													
8	JORGE ELIECER MOORALES PERALTA	1003459220	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
9	Manuel cervantes machacan	73595024	Chofer Volqueta	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
10	Amaurys Martinez Martinez	73091534	Obrero	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
11	Alcides De La Hoz Villar	1123405092	Operario	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
12	Eris Hurbano De La Hoz Pacheco	85..463.491	Operario	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
15	Emerita Gonzales Madera	1070811981	Paletera	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														
16	Milena Isabel Gomez Arteaga	50072082	Paletera	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A la fecha el contratista, aún no realiza la entrega de las pplanillas de aportes correspondientes al mes de noviembre de 2022, debido a que no ha podido realizar el pago en la plataforma, según lo manifiesta. Esta interventoría realizara el debido seguimiento al cumplimiento de dicha obligación.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ANDRÉS FABIÁN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES INFORME MENSUAL: Nov-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	210343	Vias Terciarias Mejoradas	220117	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 1.350.000.000,00	
2023	210344	Vias Terciarias Mejoradas	220119	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 6.771.889.999,00	
TOTAL						$ 8.121.889.999,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.121.889.999.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/12/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES			
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nit: 800.096.804-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Usuario: Margela03
Estado: Guardado

Número: 210343 | Fecha: 2022-07-13 | Valor Compromiso: $1,350,000,000.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.L.

C.D.P No. 220117 | de Fecha: 2022-02-10 | Solicitud No: 220117

Contrato de Obra Publica | LP-MSBV-006-2022 | Supervisa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 819 DE 2003, EL ARTICULO 26 DE LA LEY 1508 DE 2012,

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL AMPARADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD # 220117 DE FECHA 2022-02-10 , QUE PERMITE CONSTITUIR COMPROMISO CON: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO**, IDENTIFICADO CON CC/NIT: **901611859-1** CUYO OBJETO ES **COMPROMISO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO** POR LA SUMA DE: **1,350,000,000.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.L.)**

Conceptos	Certificado $
2.3.2.02.02.005.09.03 Transporte - Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitacion Vias Fuente: 1.3.1.1.07.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL - VIGENCIA ACTUAL Sector: 24.02.041 TRANSPORTE - Infraestructura red vial regional - Vía terciaria mejorada Tercero: 901611859 CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	1,350,000,000.00

Firma Autorizada
MARGELA MARIA HERNANDEZ ZURITA
Analista de Presupuesto

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Nit: 800.096.804-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Usuario: Margela03
Estado: Guardado

Número: 210344 | Fecha: 2022-07-13 | Valor Compromiso: $6,771,889,999.00

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.L.

C.D.P No. 220119 | de Fecha: 2022-02-10 | Solicitud No: 220119

Contrato de Obra Publica | LP-MSBV-006-2022 | Supervisa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 819 DE 2003, EL ARTICULO 26 DE LA LEY 1508 DE 2012,

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL AMPARADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD # 220119 DE FECHA 2022-02-10 , QUE PERMITE CONSTITUIR COMPROMISO CON: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO**, IDENTIFICADO CON CC/NIT: **901611859-1** CUYO OBJETO ES **COMPROMISO MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO, DERIVADO DEL CONVENIO INTERARDMINISTRATIVO NO.1893 DE 2021, SUSCRITO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** POR LA SUMA DE: **6,771,889,999.00 (SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.L.)**

Conceptos	Certificado_$
2.3.2.02.02.005.09.03 Transporte - Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitacion Vias Fuente: 1.3.1.1.07.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL - VIGENCIA FUTURA Sector: 24.02.041 TRANSPORTE - Infraestructura red vial regional - Vía terciaria mejorada Tercero: 901611859 CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	6,771,889,999.00

Firma Autorizada
MARGELA MARIA HERNANDEZ ZURITA
Analista de Presupuesto

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	22	21	22	20,5	21,5	21,5	21,5	24	24	22,5	22	21	24	21	22	24	22	22	24	24	24	24	22	24	24	22	1	22	23		656,5
Lluvias moderadas	0	2	3	2	0	0	0	2,5	0	0	1,5	2	3	0	3	0	0	1,5	1,5	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0		26
Lluvias intensas	0	0	0	0	3,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1		14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,5	23,5	24	24	24	24	24	24	24	24	4	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202154872CND

Firma
Nombre: ARMANDO DAVID ALDANA ALDANA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria
13/08/5030	SAN BERNARDO DEL VIENTO [13085030]	9.37	-75.95	22	ClimÃ¡tica Ordinaria

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)
San Bernardo Del Viento	15/11/1964 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)

Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
Diaria	1/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	2/11/2022 0:00	12	50		900
Diaria	3/11/2022 0:00	48	50		900
Diaria	4/11/2022 0:00	3	50		900
Diaria	5/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	6/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	7/11/2022 0:00	33	50		900
Diaria	8/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	9/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	10/11/2022 0:00	9.2	50		900
Diaria	11/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	12/11/2022 0:00	15	50		900
Diaria	13/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	14/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	15/11/2022 0:00	7	50		900
Diaria	16/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	17/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	18/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	19/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	20/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	21/11/2022 0:00	5.2	50		900
Diaria	22/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	23/11/2022 0:00	45	50		900
Diaria	24/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	25/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	26/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	27/11/2022 0:00	32	50		900
Diaria	28/11/2022 0:00	0	50		900
Diaria	29/11/2022 0:00	66.2	50		900
Diaria	30/11/2022 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

Durante el periodo el contratista no presenta resultado de ensayos

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	23	8	2022	23	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	23	8	2022	23	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	23	8	2022	23	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	4	2023	23	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	4	2023	23	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100217190

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 500.000.000,00	23	8	2022	23	4	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100049452 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5 (Día)	12 (Mes)	2022 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	Día Mes Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.09.08 16:48:44 -05:00

Código de Seguridad: 1rQy5BD8ejN1H/0ZLqNrXg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS20000000859-D001

No. PÓLIZA	NB-100217190	**No. ANEXO**	2	**No. CERTIFICADO**	71357226	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	08/09/2022	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	**TELÉFONO**	3114061089
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	**TELÉFONO**	7758011
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	**TELÉFONO**	7758011

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.. LP-MSBV-006-2022. , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

ACLARAMOS BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 23/08/2022	24:00 Horas Del 23/08/2023	812.188.999,90	1.624.378,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 23/08/2022	24:00 Horas Del 23/08/2023	2.436.566.999,70	4.873.134,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 23/08/2022	24:00 Horas Del 23/04/2026	1.624.377.999,80	11.918.039,13
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 23/04/2023	24:00 Horas Del 23/04/2028	16.913.946,80	169.324,82
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 23/04/2023	24:00 Horas Del 23/04/2028	2.436.566.999,70	24.392.372,10
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.326.614.945,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	42.977.248,05
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	42.977.248,05
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	8.166.627,13
TOTAL A PAGAR	$	51.148.875,18

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVA - AMP
Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71357226	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NIT. NO. 800.215.807-2

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ACLARAMOS QUE EL AMPARD DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- ALEXANDER THEVENING GARCES 72148565 PARTICIPACION 90%

GILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100217190** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2 / MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2** , expedida por la Compañía en **08/09/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **08** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Scanned with CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.09.08 16:49:12 -05:00

Código de Seguridad: 4SysevY277o989KIqiySXg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSA0000000827-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71357231	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114861089
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114861089
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICAR.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO. LP-MSBV-006- 2022. MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO.

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- ALEXANDER THEVENING GARCES 72148565 PARTICIPACION 90%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	250,000,000.00	500,000,000.00	500.000.000,00	665.753,42
PATRONAL	150,000,000.00	150,000,000.00	150.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	150,000,000.00	150,000,000.00	150.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	150,000,000.00	150,000,000.00	150.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 500.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	665.753,42
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	665.753,42
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	127.443,15
TOTAL A PAGAR	$	798.196,57

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/09/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Scanned with CamScanner

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71357231	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2022	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	23/04/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

GILADO
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
DOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF
Scanned with CamScanner

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/12/2022
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

FECHA DE INICIO: 24/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	.....	**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**	.....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**	.....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	.....	**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**	.....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS	Nombre:	Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO
Vial San Bernardo

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

DPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento

PÁGINA	1

DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	7	9	2022

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LP-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL:X** **PLAN No.1** **MODIFICACIÓN:**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANBERNARDO

REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

REP.LEGAL FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO

VR. CONTRATO:	8.121.889.999		PORCENTAJE DE ANTICIPO :	30,0%
VR. ANTICIPO:	1.350.000.000	1.350.000.000	% IMP. MUNICIPALES	0,0%
VR. IMPUESTOS:	0			
VR. ANTICIPO RECIBIDO:	0			

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Mano de Obra	100.000.000,00	7,41%	150.000.000,00	11,11%	49.200.000,00	3,64%	299.200.000,00	22,16%
2	Transporte de Materiales	340.800.000,00	25,24%	100.000.000,00	7,41%		0,00%	440.800.000,00	32,65%
3	Suministro de Materiales	300.000.000,00	22,22%	150.000.000,00	11,11%		0,00%	450.000.000,00	33,33%
4	Alquiler de equipos y herramientas	100.000.000,00	7,41%	60.000.000,00	4,44%		0,00%	160.000.000,00	11,85%
TOTAL		840.800.000,00	62,28%	460.000.000,00	34,07%	49.200.000,00	3,64%	1.350.000.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO
Representante Legal
Consorcio Vial San Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Interventor

Scanned with CamScanner

MEPI-MN1-IN-2-FR-2, INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN

MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 **MES:** noviembre-2022 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15593 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 687-000021-91 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.350.000.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	AVANZAR CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	Mano de obra
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	INTEGRA2 SAS	$ 340.800.000,00	2	Transporte de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	356	6-oct-22	JANNE MIQUEL ROQUEME RAFAEL	$ 300.000.000,00	3	Suministro de matariales
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.	$ 100.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Mano de Obra	$ 299.200.000,00	$ 399.200.000,00		$ 399.200.000,00	$ (100.000.000,00)
2	Transporte de Materiales	$ 440.800.000,00	$ 781.600.000,00		$ 781.600.000,00	$ (340.800.000,00)
3	Suministro de Materiales	$ 450.000.000,00	$ 750.000.000,00		$ 750.000.000,00	$ (300.000.000,00)
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 160.000.000,00	$ 260.000.000,00		$ 260.000.000,00	$ (100.000.000,00)
	TOTALES	$ 1.350.000.000,00	$ 2.190.800.000,00	$ -	$ 2.190.800.000,00	**$ (840.800.000,00)**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (octubre) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 06-OCT-22 **Hasta:** 06-OCT-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1037647440
Fecha: 08-NOV-2022
Página: 1 de 1

Producto: 15593 P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 68700002217 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505510953

Tipo de Egreso: GZT GIRO A TERCEROS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
06-OCT-22	356	1	ROQUE RAFAEL JANNE MIGUEL		1538995. 2. GIRO A TERCEROS JMT	300,000,000.00	.00	Pagado		1538995

Total Tipo de Egreso:	300,000,000.00	.00
Total por Cuenta:	300,000,000.00	.00
Total por Moneda:	300,000,000.00	.00

Powered by CamScanner

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 06-OCT-22 **Hasta:** 06-OCT-22

Reporte: CAJR_002
Usuario: 1037647440
Fecha: 08-NOV-2022
Página: 1 de 1

Producto: 15593 P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 68700002217 **Emisor:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta Contable:** 111505510953


Tipo de Egreso: GZT GIRO A TERCEROS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
06-OCT-22	670	2	INTEGRA2 SAS		1538998 YCAR OP 1 GIRO A TERCEROS	340,800,000.00	.00	Pagado		1538998
06-OCT-22	670	3	TOPOGRAFIA TOTAL ALTAMIRANDA SAS		1538998 YCAR OP 1 GIRO A TERCEROS	100,000,000.00	.00	Pagado		1538998
06-OCT-22	670	4	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS		1538998 YCAR OP 1 GIRO A TERCEROS	100,000,000.00	.00	Pagado		1538998
					Total Tipo de Egreso:	540,800,000.00	.00			
					Total por Cuenta:	540,800,000.00	.00			
					Total por Moneda:	540,800,000.00	.00			

Powered by CamScanner

• Seguimiento Programa de Obra

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VÍA DEL CORREGIMIENTO DEL CASTILLO**	**290 días**	**mar 23/08/22**	**mar 23/05/23**
2			INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 23/08/22	mar 23/08/22
3			**EXPLANACIONES**	**30 días**	**mar 20/09/22**	**mar 18/10/22**
4		600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco.	1 día	lun 17/10/22	mar 18/10/22
5		210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	29 días	mar 20/09/22	lun 17/10/22
6			**ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER DE 2.5X2.5 L=7M**	**12 días**	**vie 5/05/23**	**mar 16/05/23**
7		600.2.3	Excavaciones varias en materia común en seco a mano	1 día	sáb 6/05/23	dom 7/05/23
8			Demolición de estructuras	1 día	vie 5/05/23	sáb 6/05/23
9		201,6	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	1 día	dom 7/05/23	lun 8/05/23
10		630,6	Concreto clase C (280kg/cm2 ó 4000 PSI)	5 días	jue 11/05/23	mar 16/05/23
11		630,3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	8 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23
12		640,1	Relleno para Estructuras con material excavación	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23
13		610,1	Relleno para Estructuras con recebo	1 día	vie 12/05/23	sáb 13/05/23
14			**PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5.3M Y LONGITUD DE 5300M**	**144 días**	**mar 20/12/22**	**vie 5/05/23**
15		320.3	Subbase Granular Clase C.	35 días	lun 26/12/22	sáb 28/01/23
16		311,1	Afirmado (Material para Mejoramiento)	11 días	mar 20/12/22	sáb 31/12/22
17		630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	46 días	lun 13/02/23	mar 28/03/23

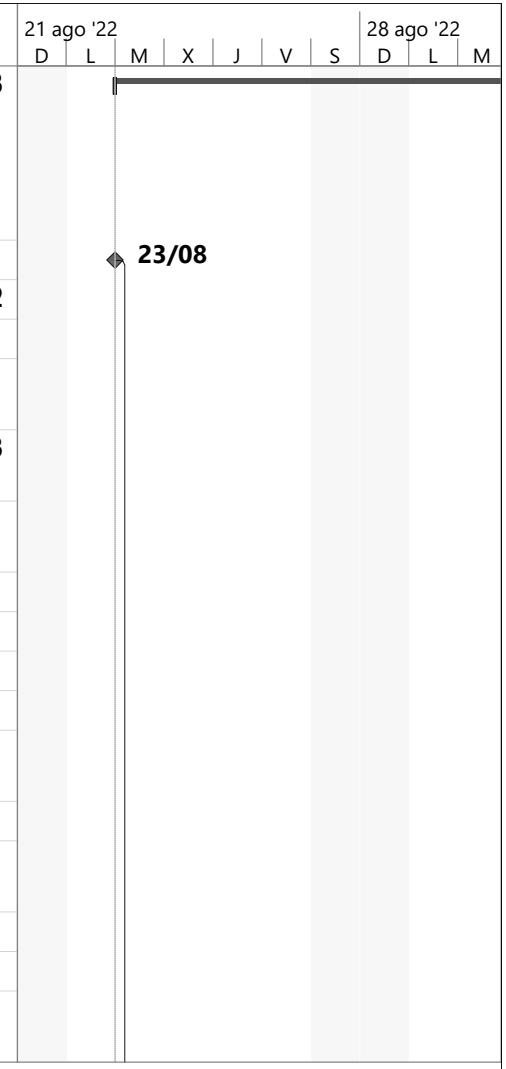


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea — Resumen — Hito externo — División crítica
División — Tarea inactiva — Fecha límite — Progreso
Hito — Tareas externas — Tareas críticas — Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18		630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	36 días	dom 29/01/23	sáb 4/03/23
19		630.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	44 días	vie 24/03/23	vie 5/05/23
20		640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	46 días	mié 4/01/23	vie 17/02/23
21		630.7	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	29 días	mar 28/02/23	lun 27/03/23
22			**TRANSPORTE**	**78 días**	**lun 17/10/22**	**vie 30/12/22**
23		900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	78 días	lun 17/10/22	vie 30/12/22
24			**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**10 días**	**sáb 13/05/23**	**mar 23/05/23**
25			Caracterización del corredor	10 días	sáb 13/05/23	mar 23/05/23
26			**REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**290 días**	**mar 23/08/22**	**mar 23/05/23**
27			REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	mar 23/08/22	mar 20/09/22
28			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	10 días	sáb 13/05/23	mar 23/05/23
29			FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23

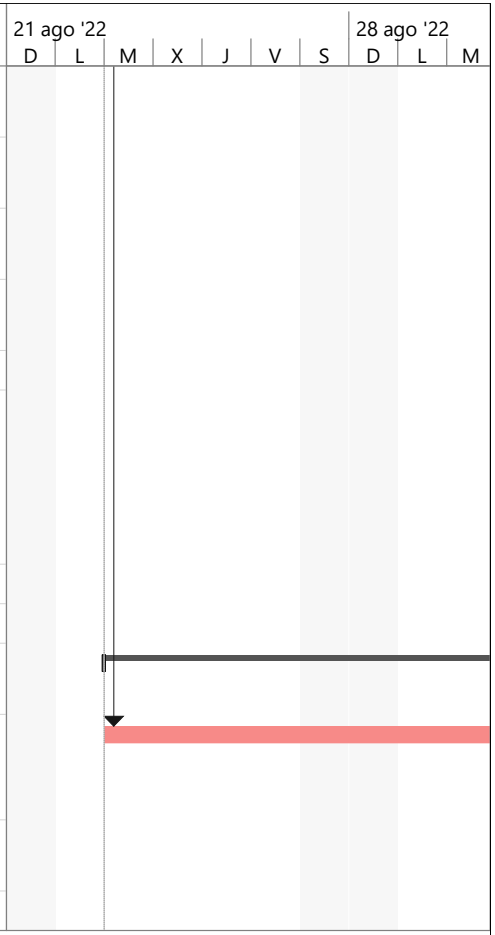


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea
División
Hito
Resumen
Tarea inactiva
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

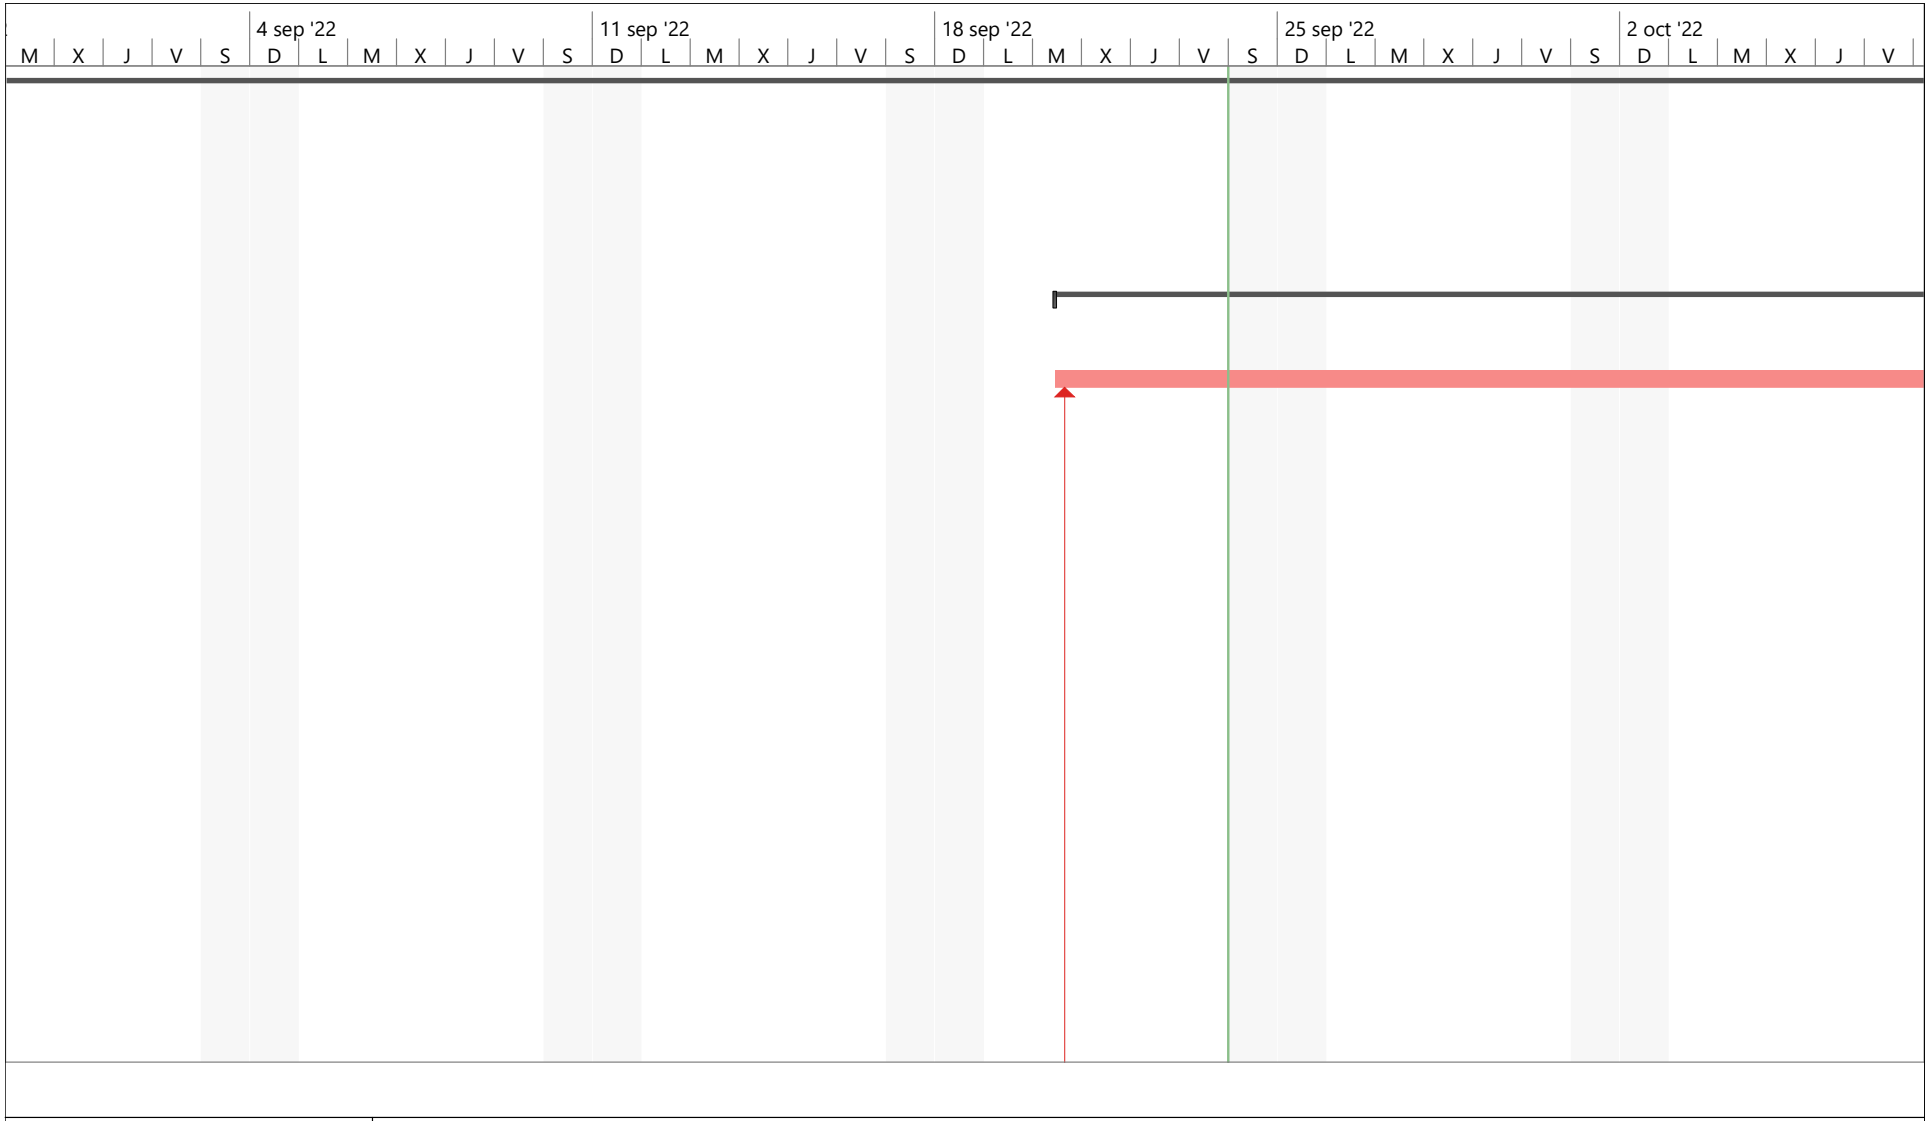


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

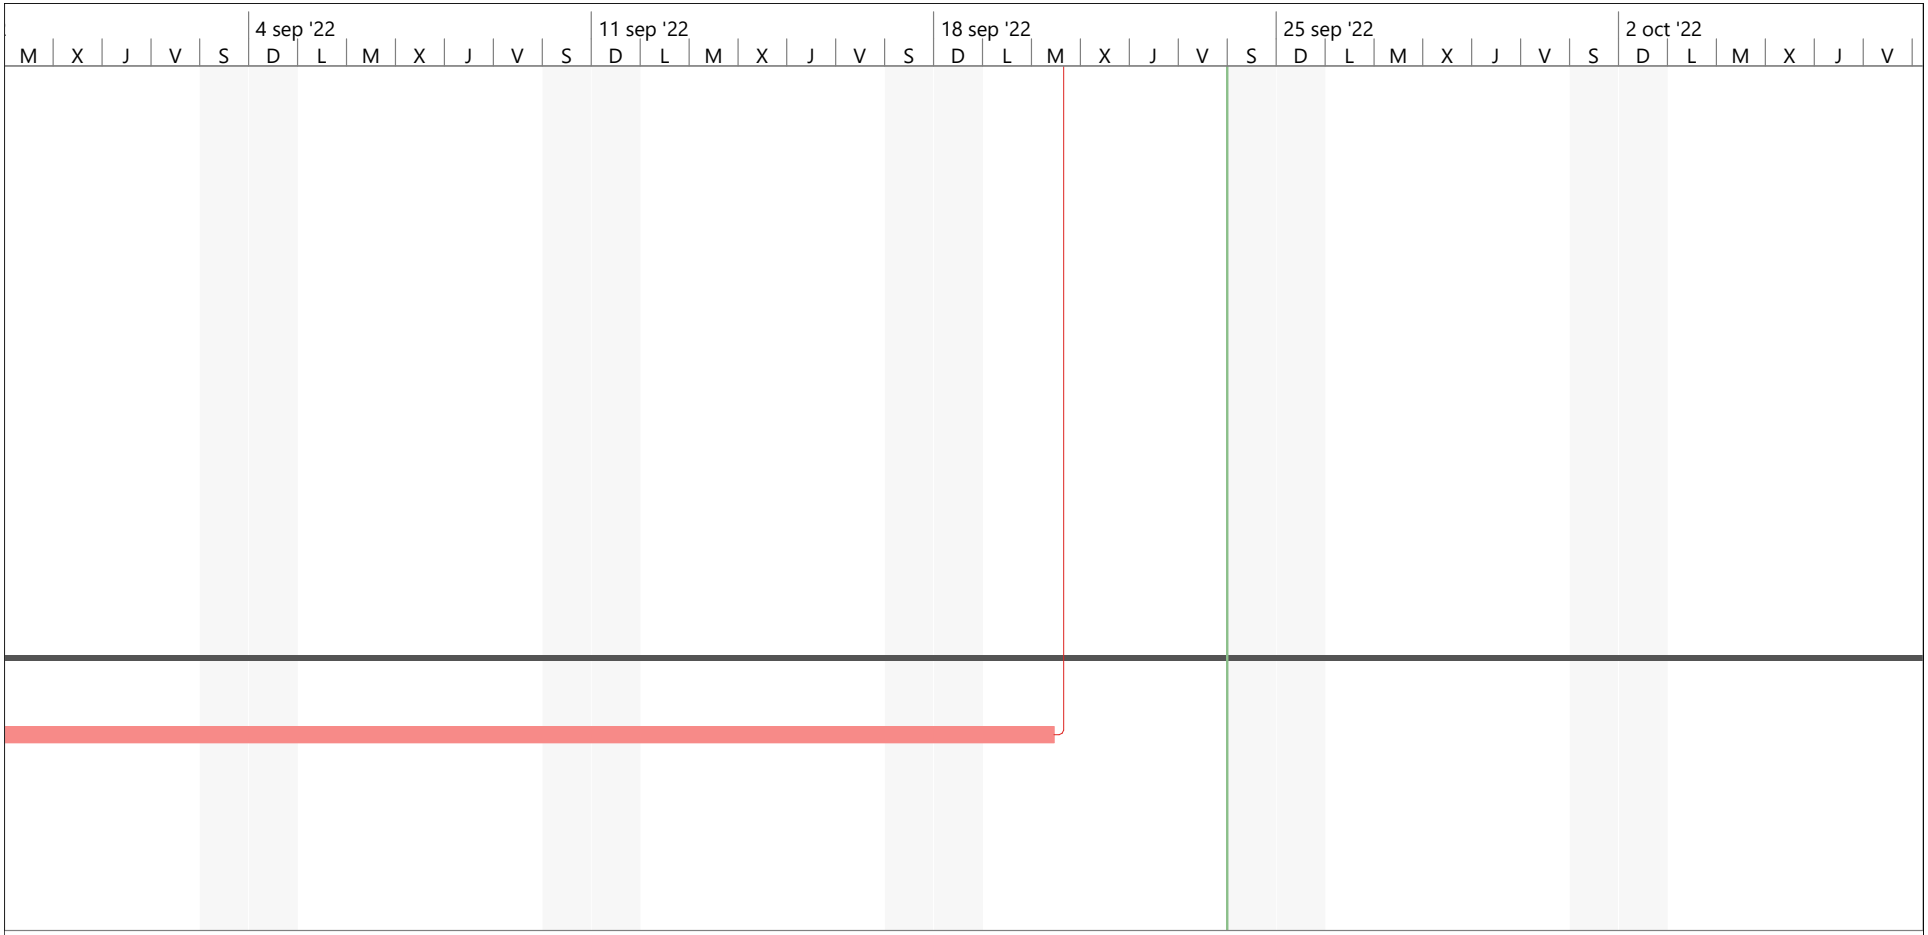


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

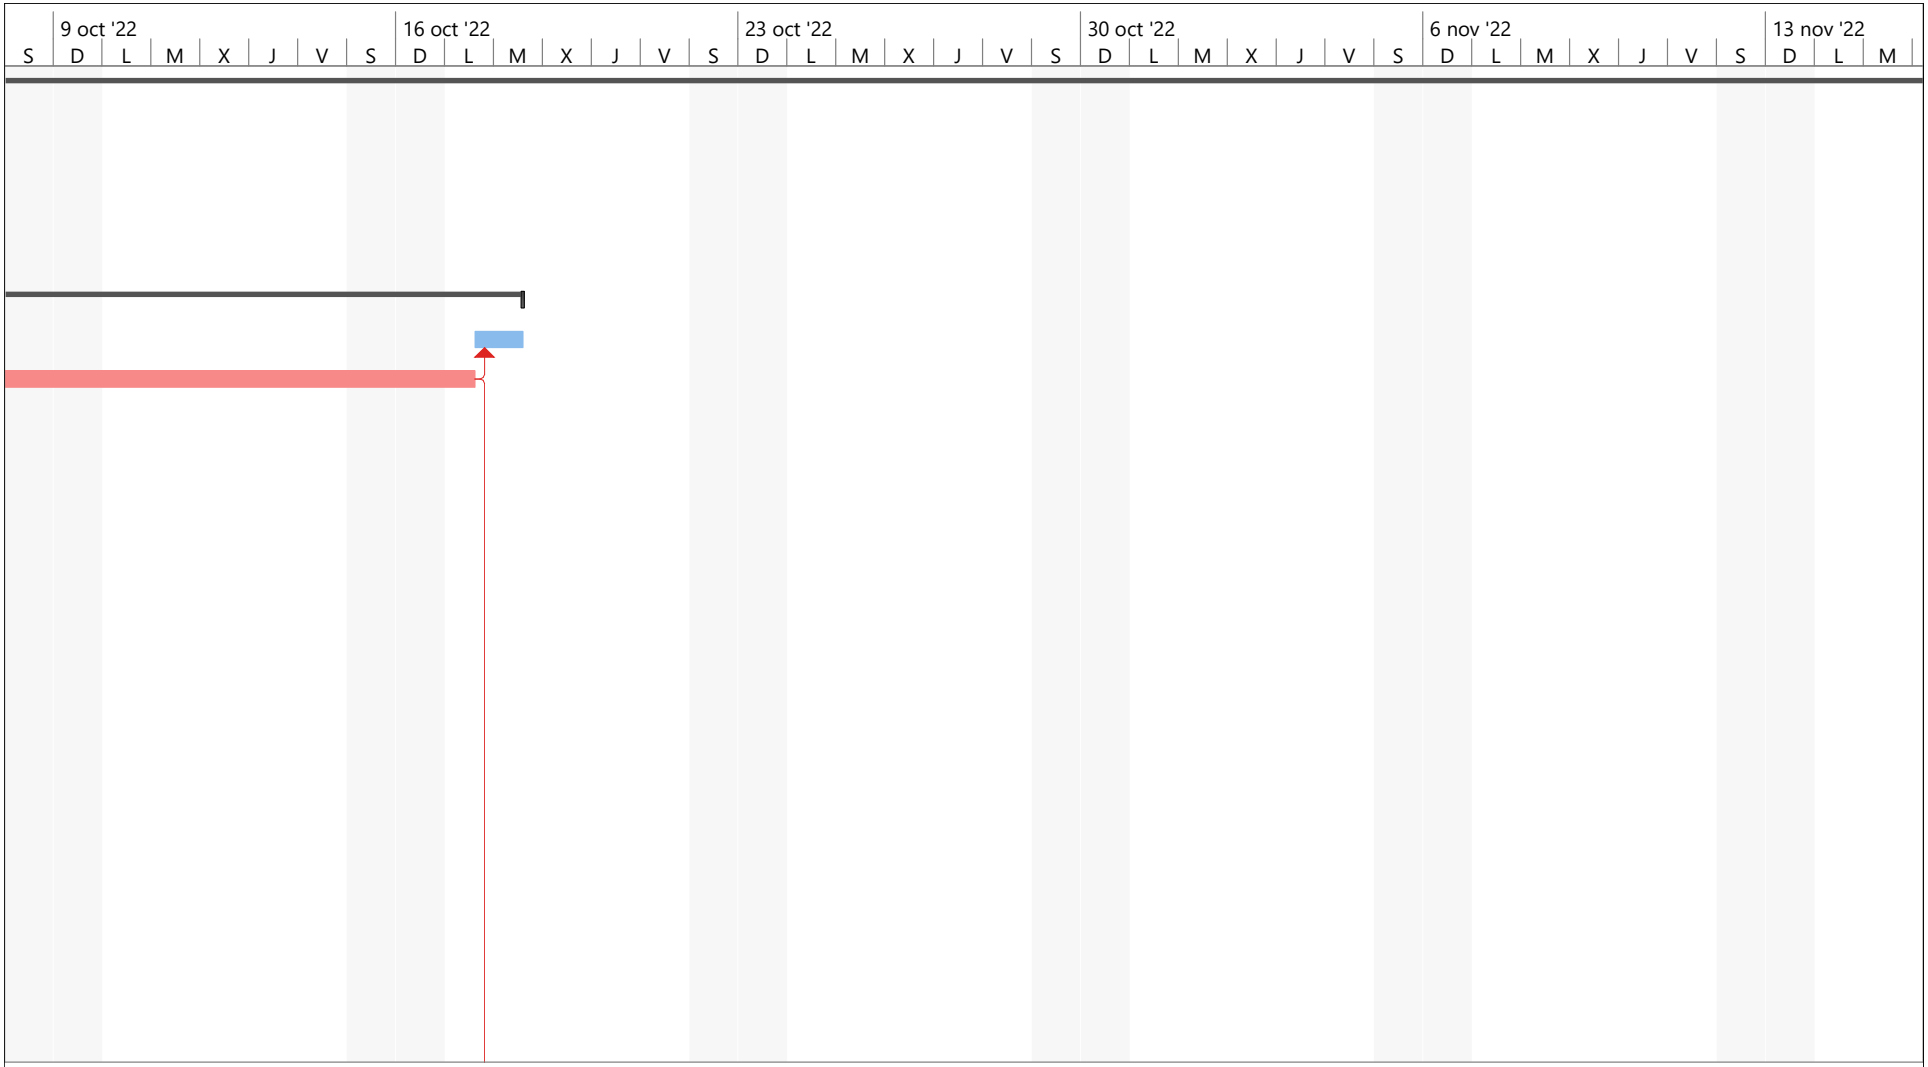

PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo




PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

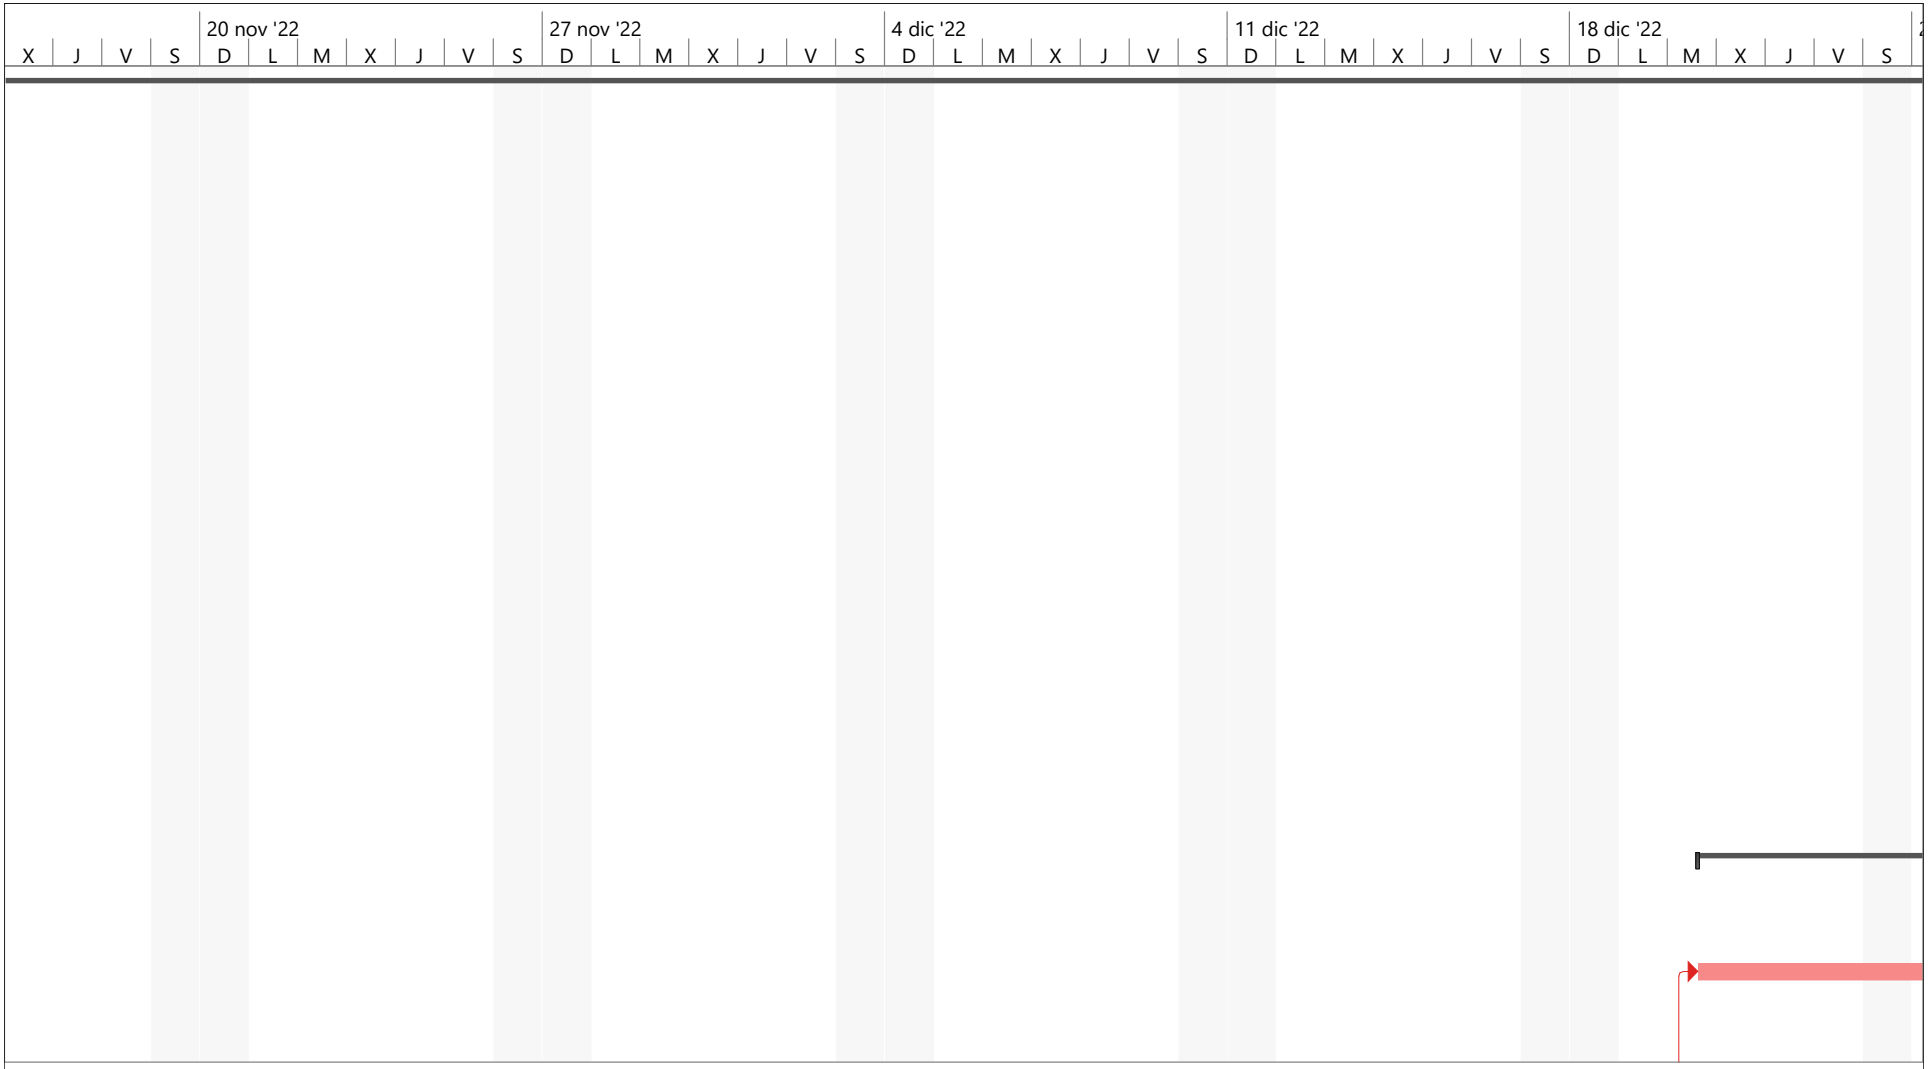


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

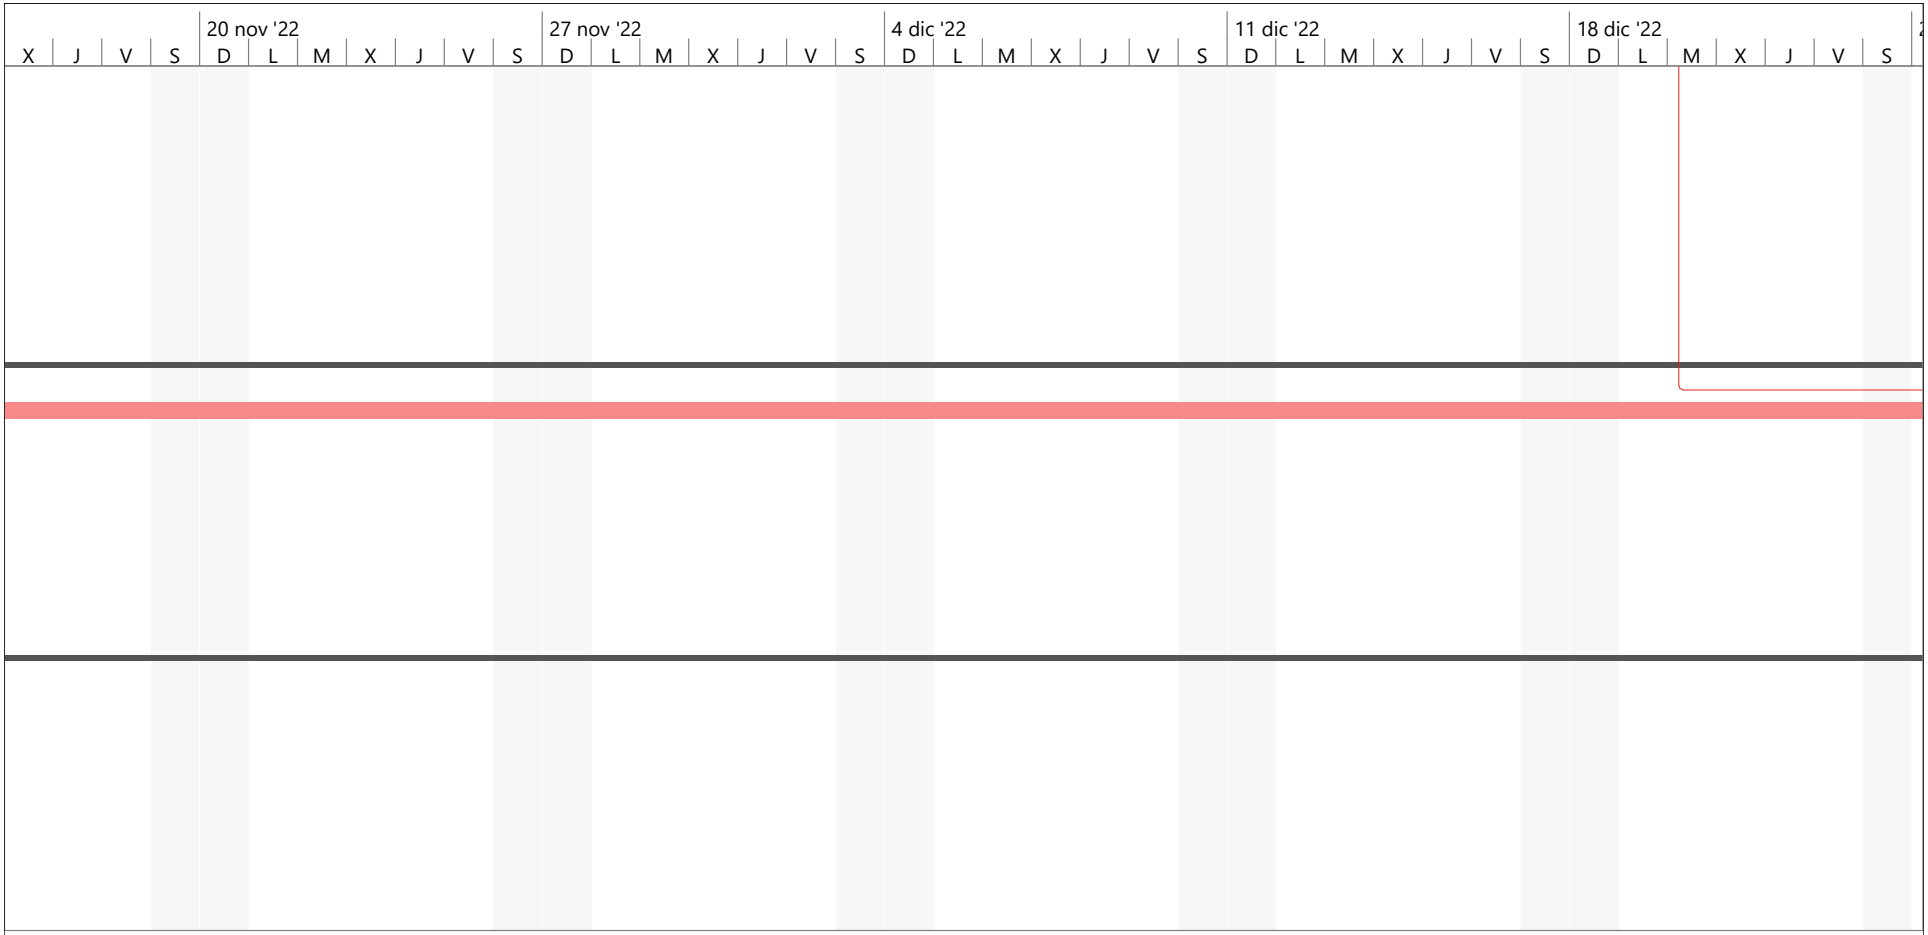


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

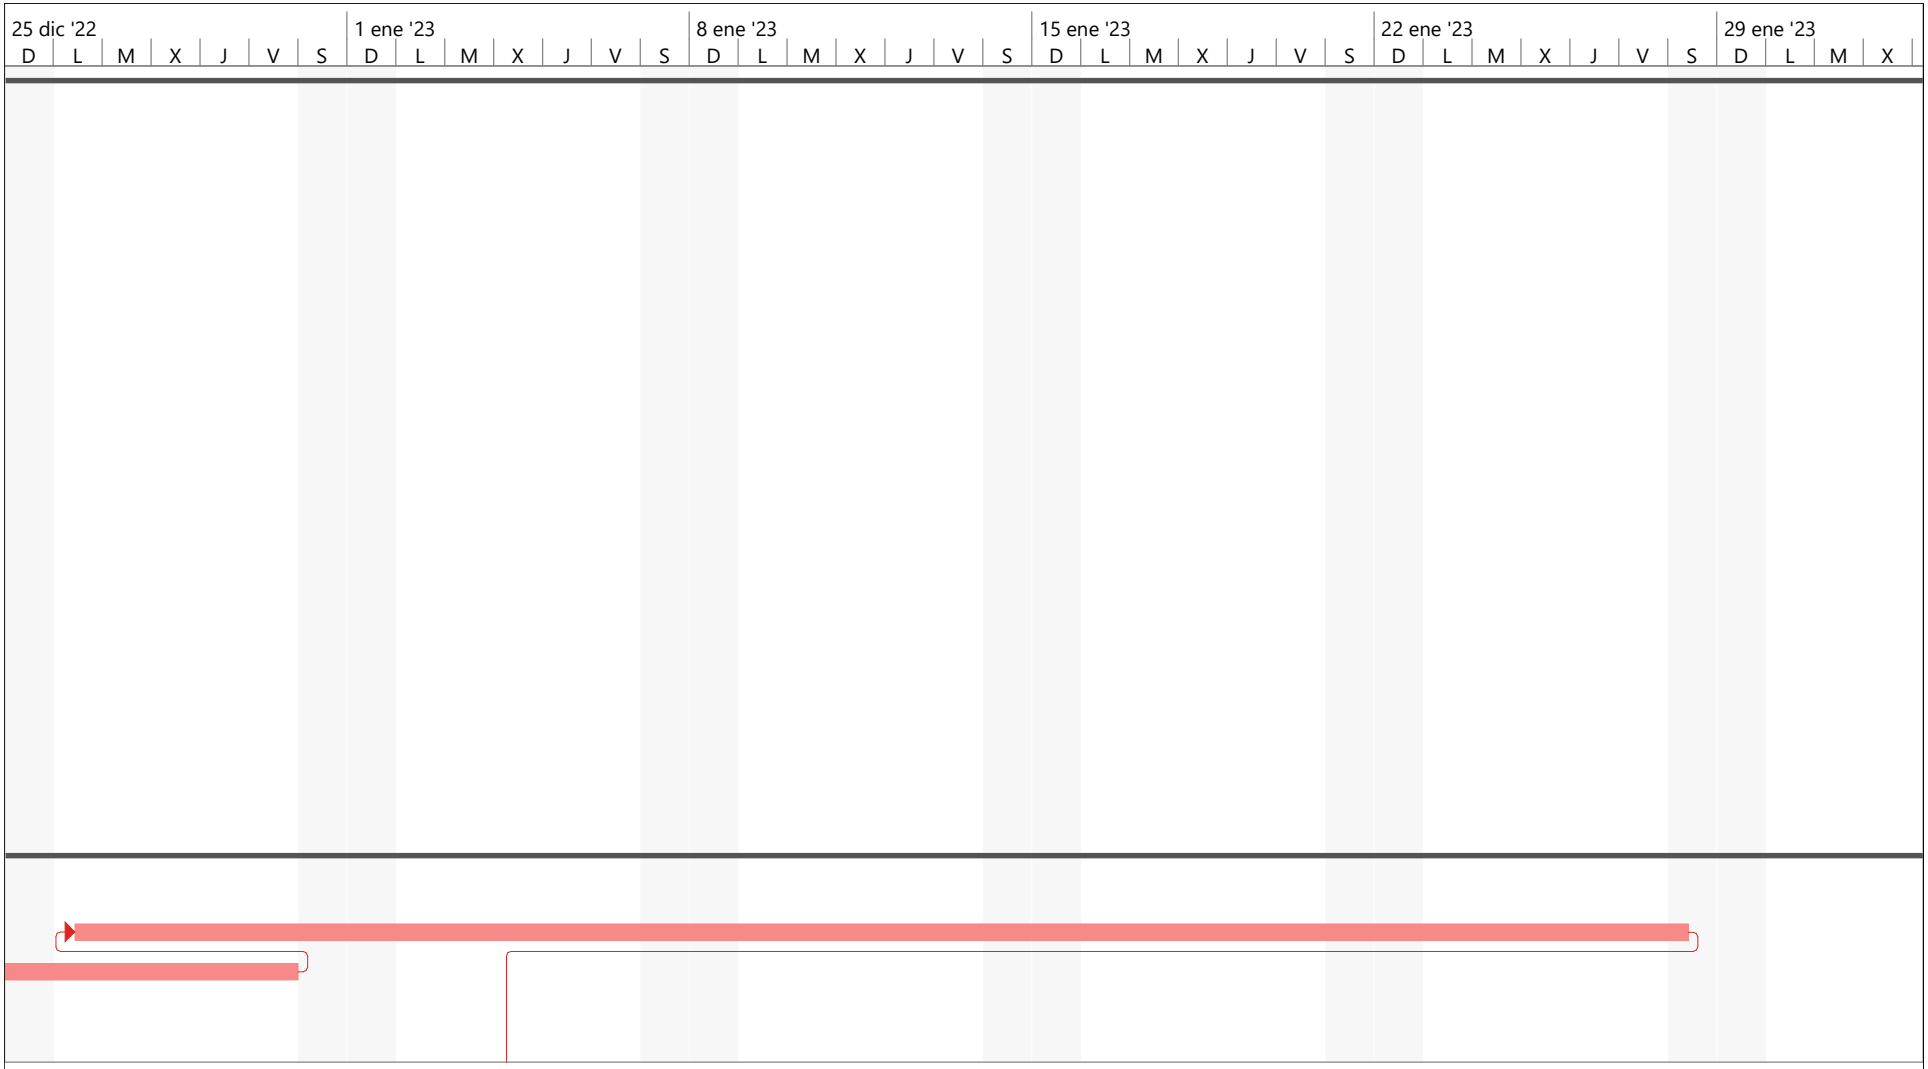

PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo



PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo




PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

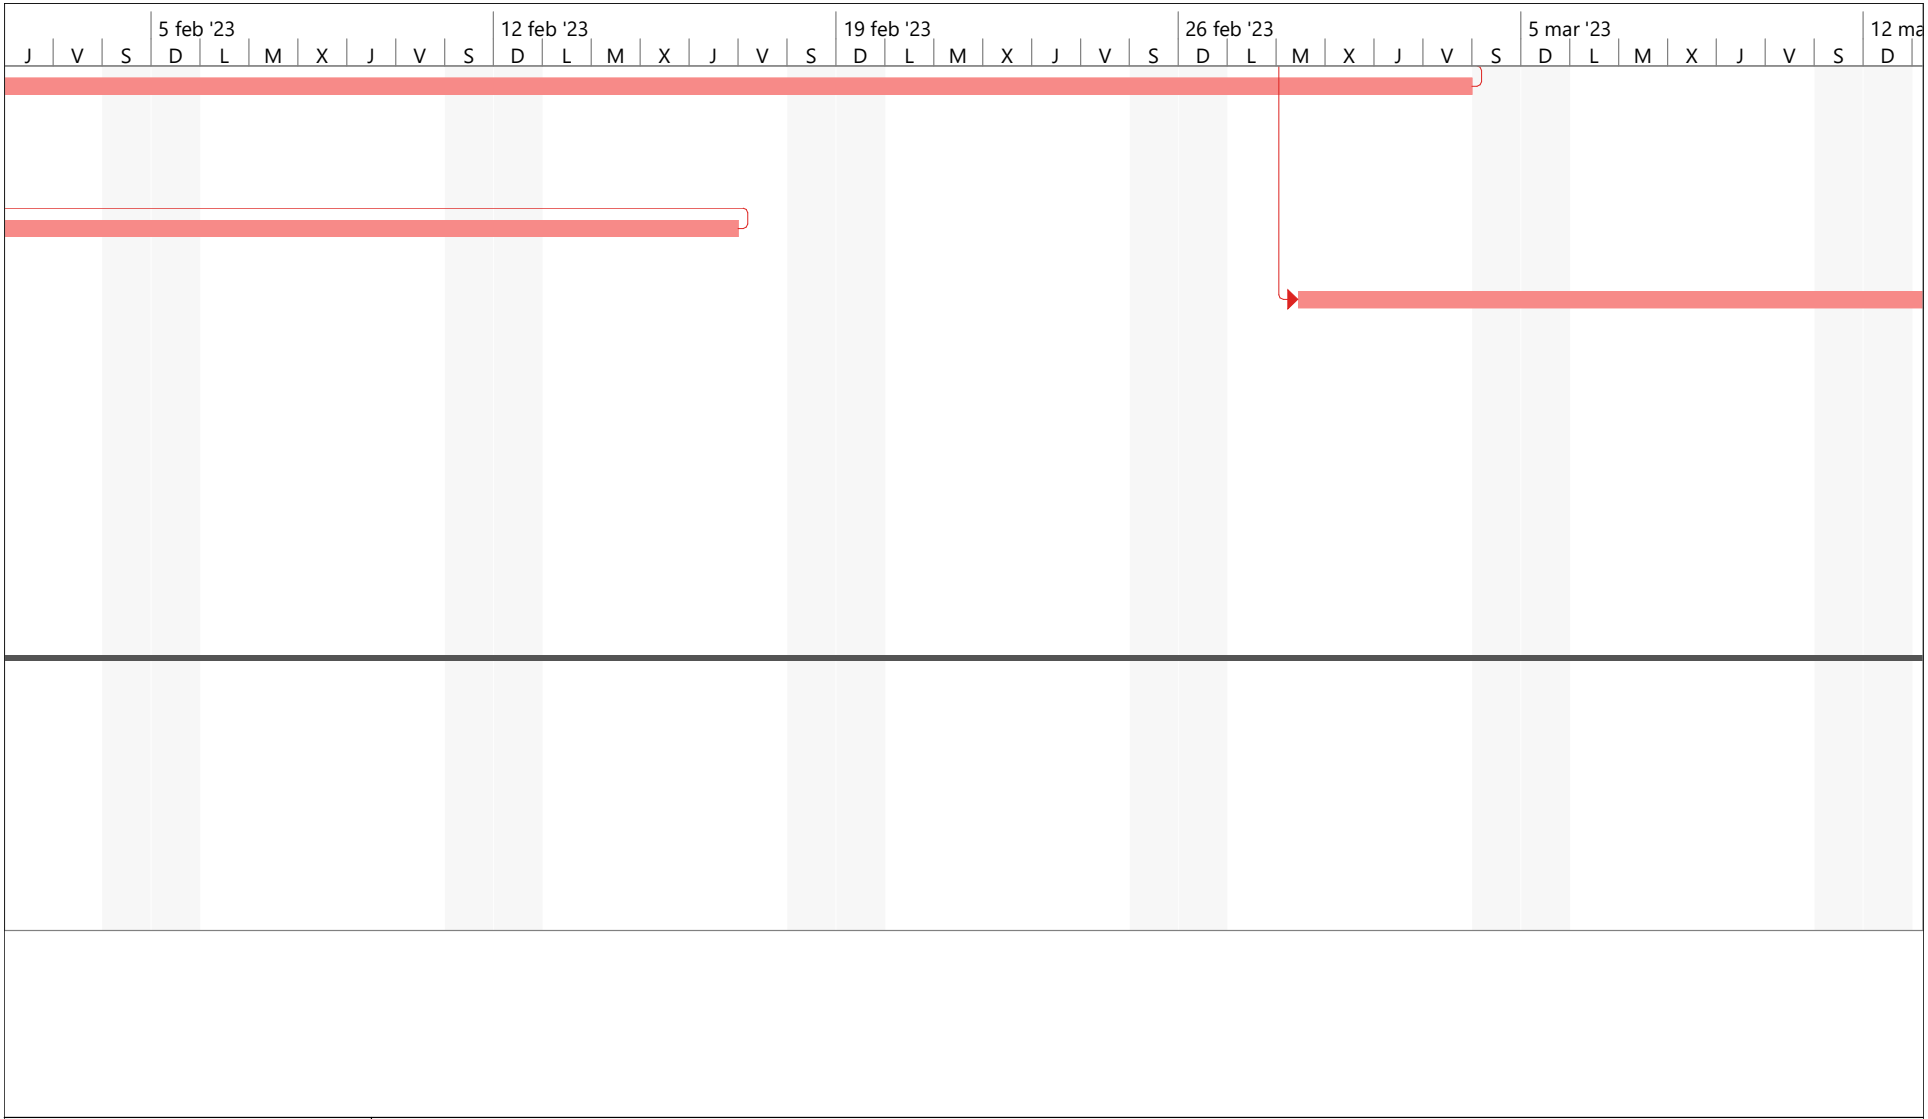


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

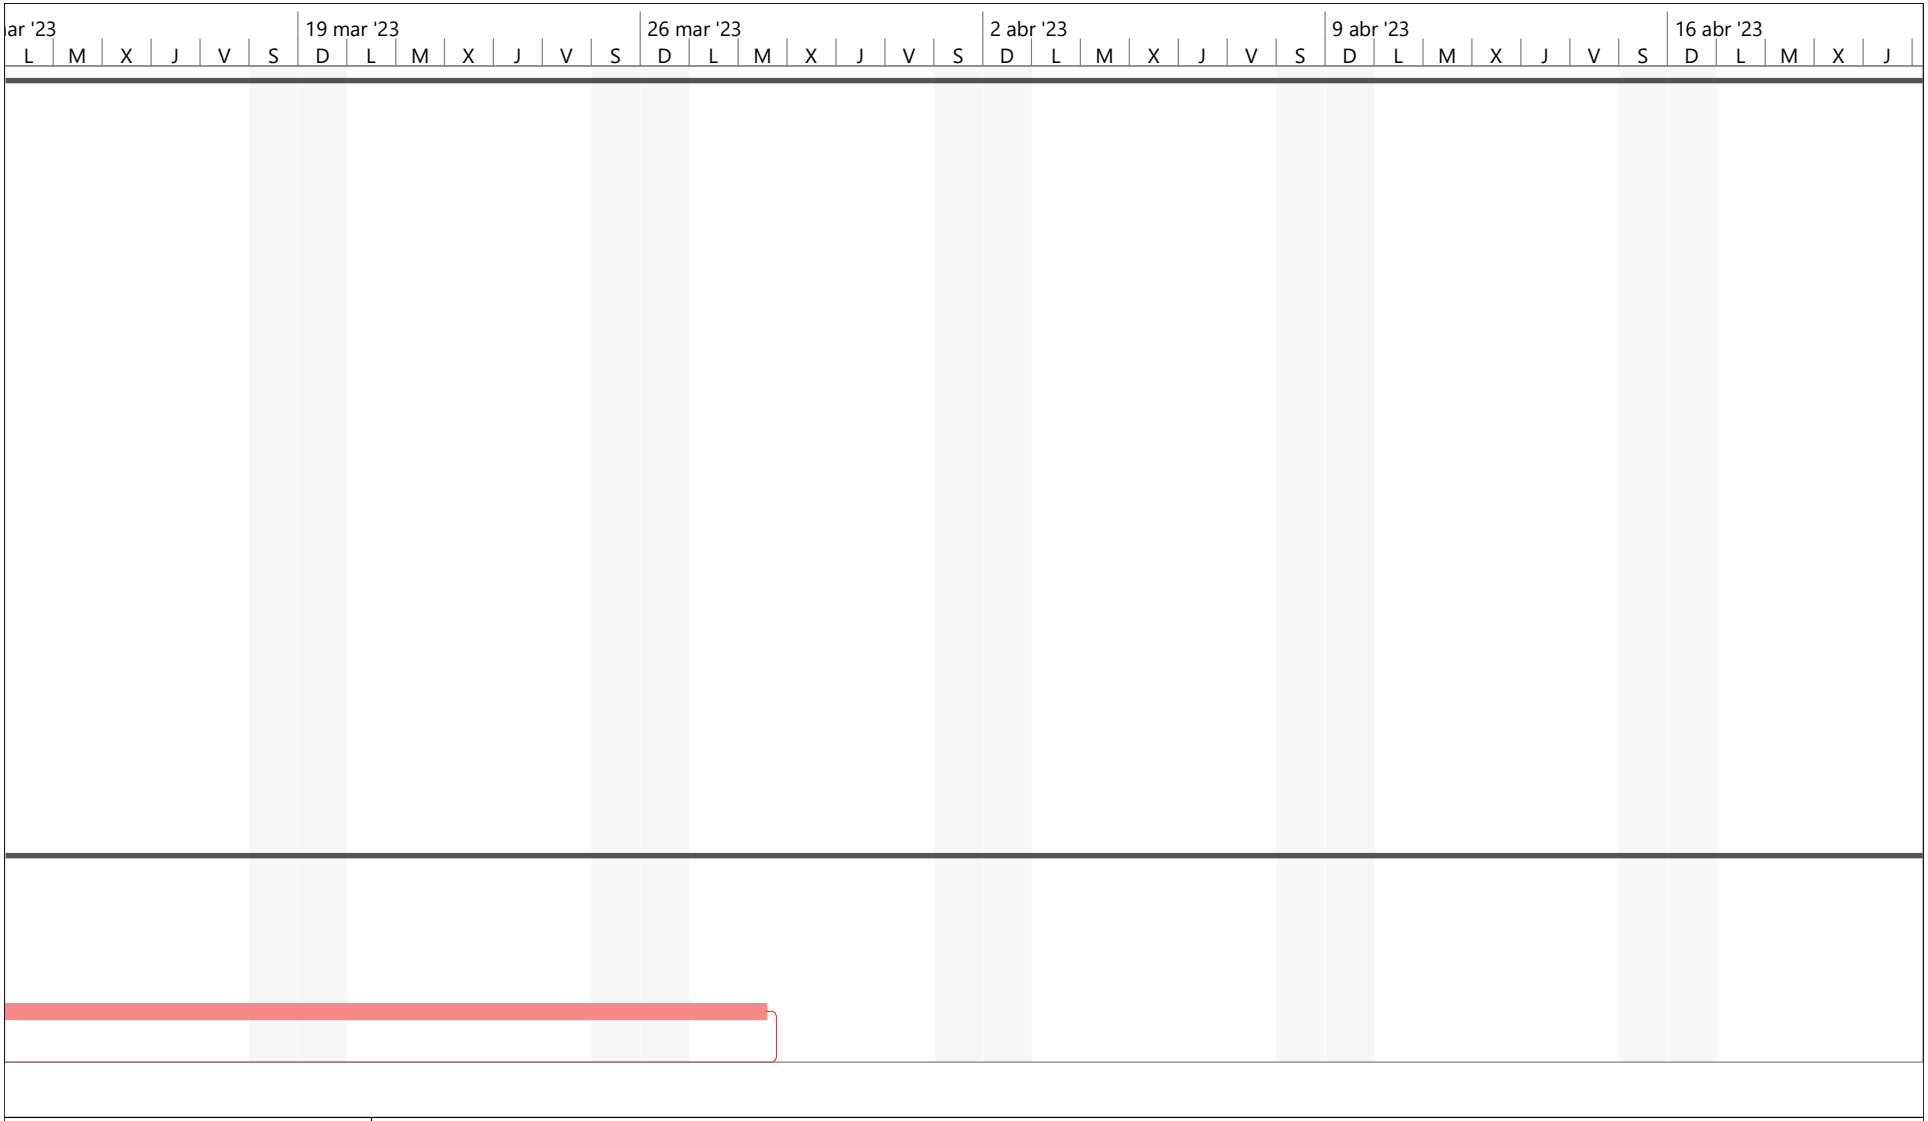


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

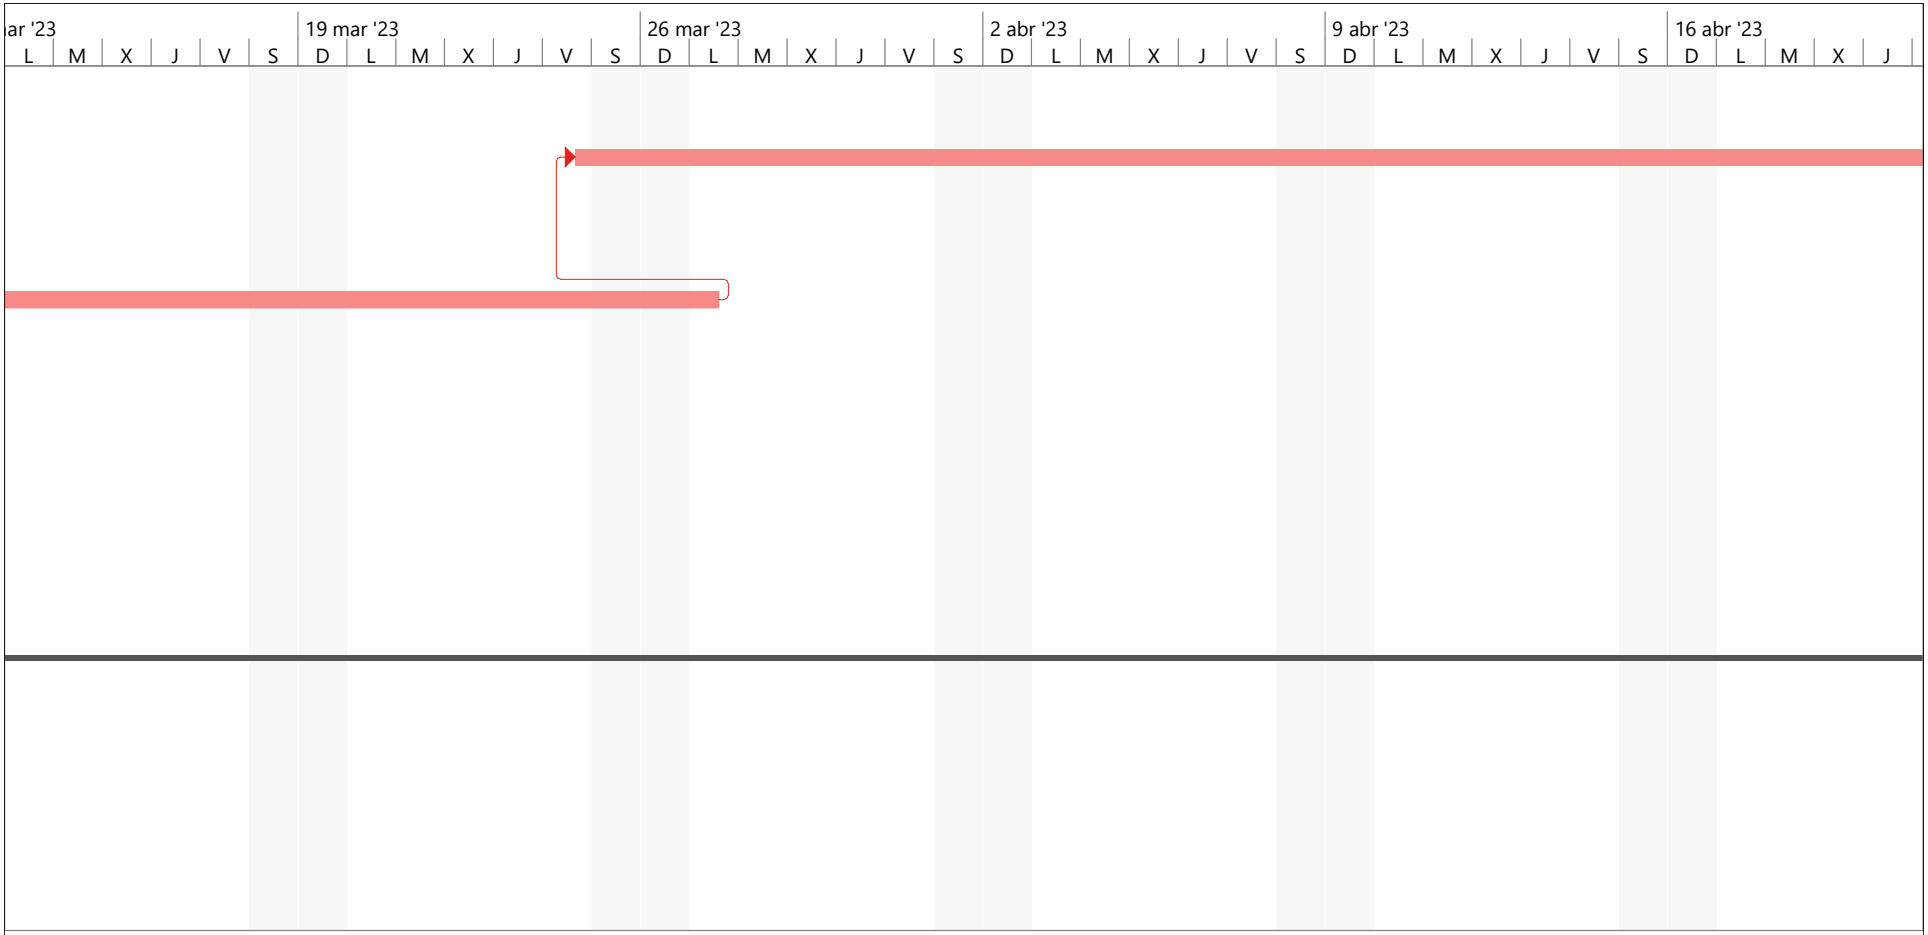


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

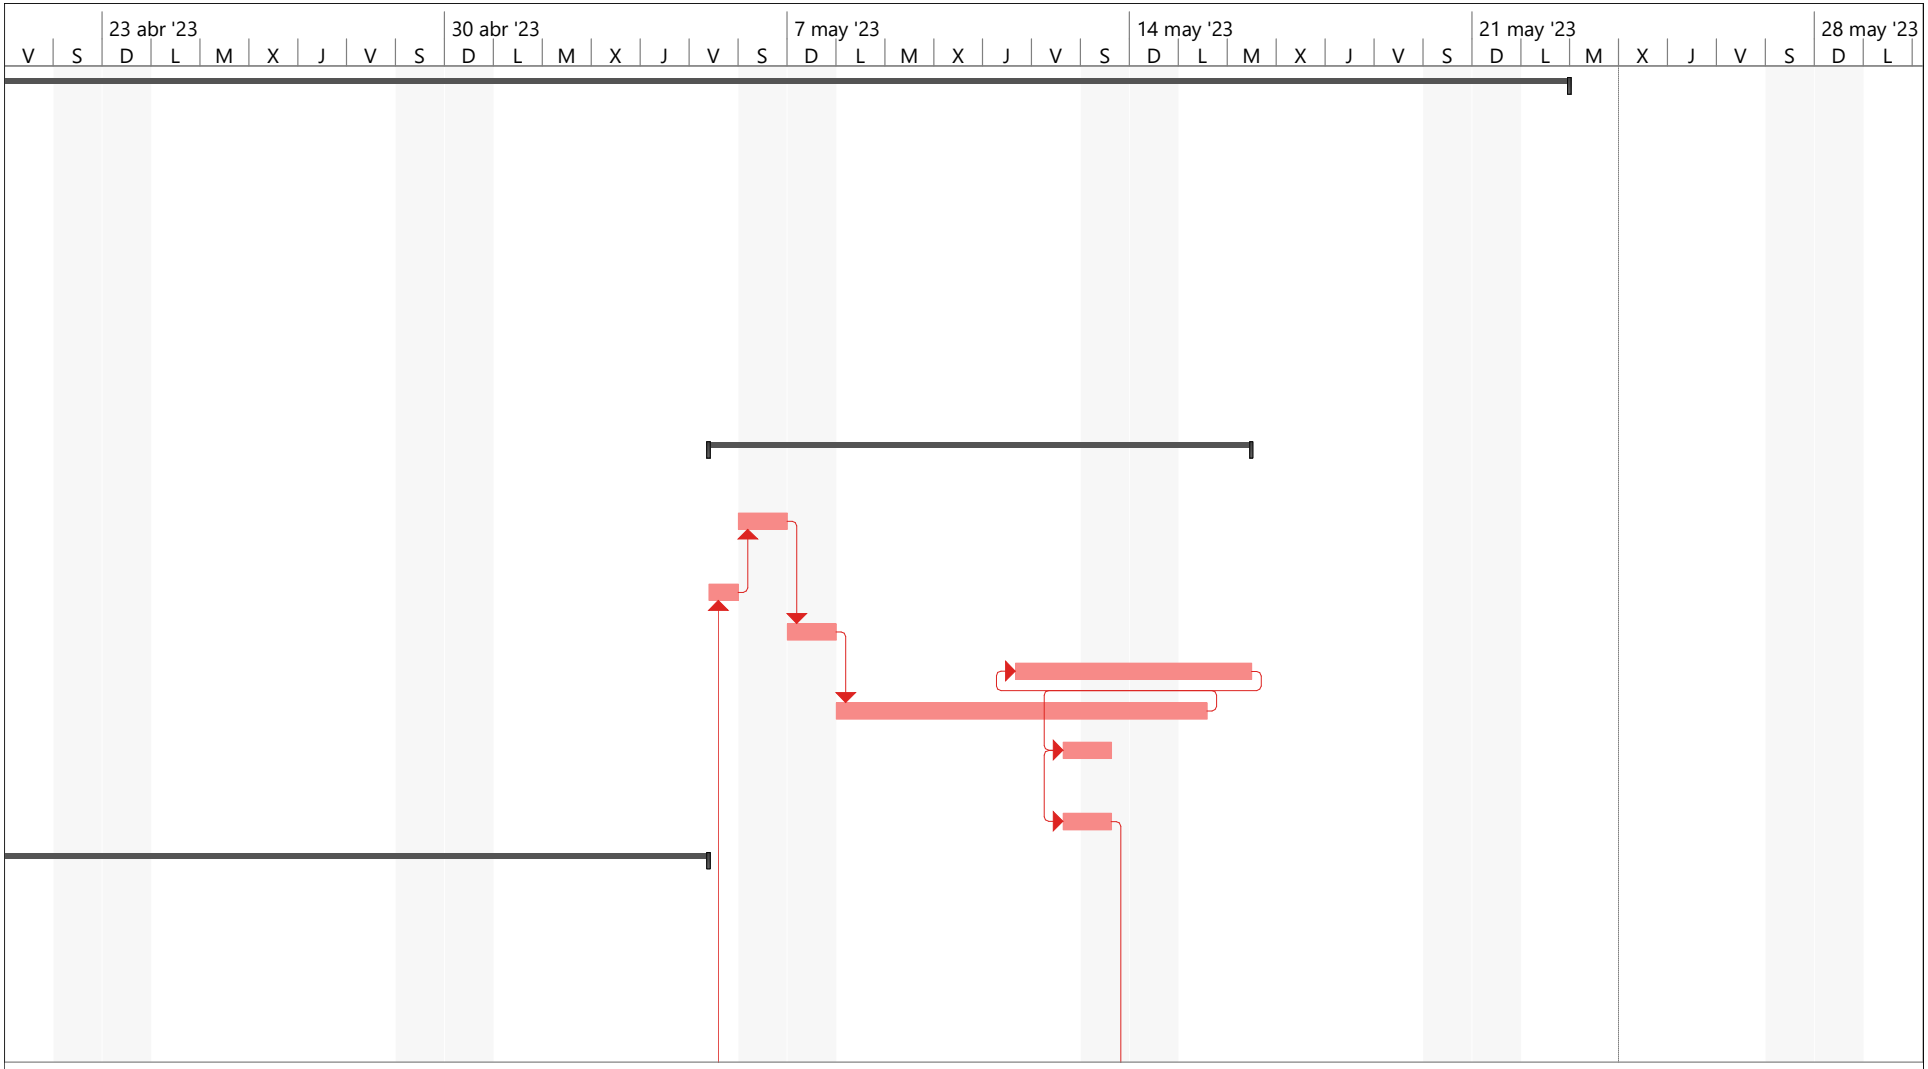


PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

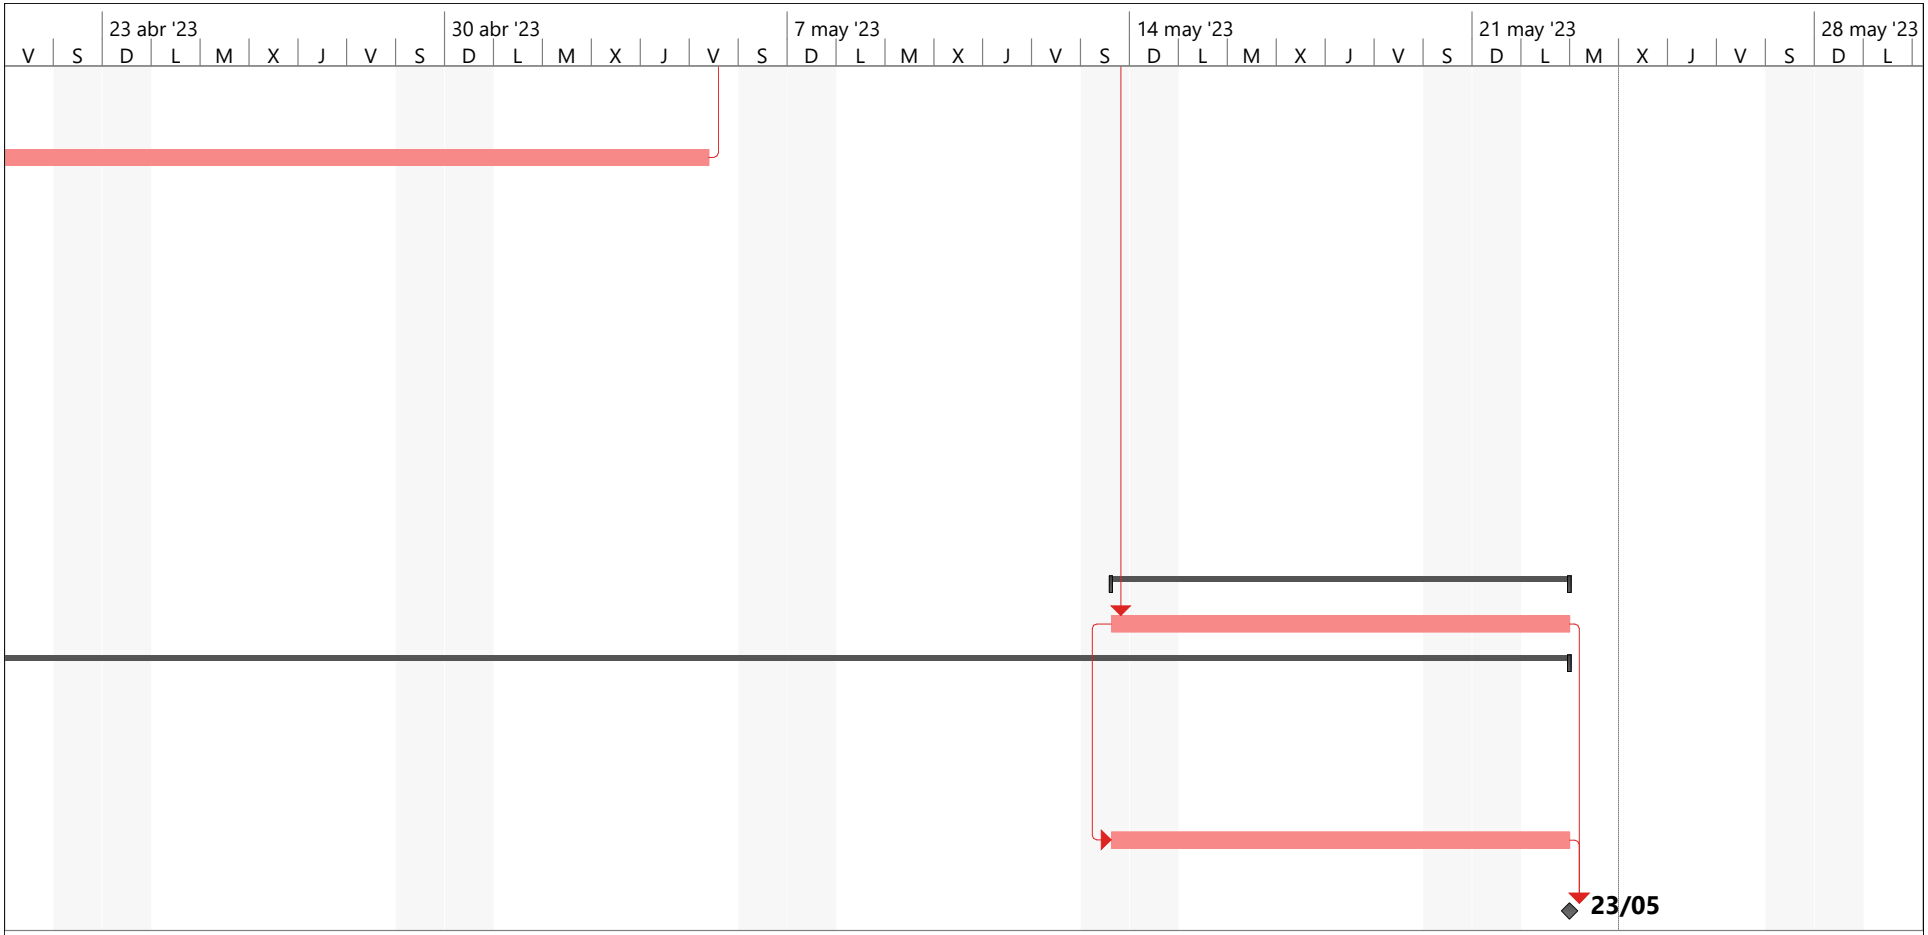

PLACA HUELLA EL CASTILLO
SAN BERNARDO DEL VIENTO

Tarea	Resumen	Hito externo	División crítica
División	Tarea inactiva	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

LUIS A. MEJÍA TURIZO
R/L Consorcio Vial San Bernardo

ANDRÉS F. VILLALBA BARRIOS
Director de obra Consorcio Vial San Bernardo

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES,

MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/10/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MSBV-006-2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.121.889.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023	8 marzo/2023	9 abril/2023	
EXPLANACIONES	$ 100.839,10	1,26%	0%	% P			0,13%	0,36%	0,36%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P			$ 10.804,19	$ 28.811,17	$ 28.811,17	$ 32.412,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
BOX CULVERT 2,5X2,5 L =7M (CANTIDAD 1UND)	$ 106.553,21	1,33%	0%	% P			0,05%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P			$ 4.198,99	$ 102.354,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,3 M Y LONGITUD DE 5300 M	$ 7.527.098,90	93,90%	0%	% P			0,00%	13,08%	19,57%	21,81%	21,68%	15,10%	2,67%	
				$ P			$ 0,00	$ 1.048.163,89	$ 1.568.682,18	$ 1.748.189,24	$ 1.737.908,16	$ 1.210.239,74	$ 213.915,67	
				$ E										
				% E										
TRANSPORTE	$ 278.203,61	3,47%	0%	% P			0,12%	0,99%	0,99%	1,24%	0,12%	0,00%	0,00%	
				$ P			$ 9.935,84	$ 79.486,75	$ 79.486,75	$ 99.358,43	$ 9.935,84	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3.710,00	0,05%	0%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
				$ P			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.710,00	
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 8.016.404,82**	**100%**	**0%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	15,70%	20,92%	23,45%	21,80%	15,10%	2,71%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.939,03	$ 1.258.816,02	$ 1.676.980,10	$ 1.879.960,26	$ 1.747.844,00	$ 1.210.239,74	$ 217.625,67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	16,01%	36,93%	60,38%	82,19%	97,29%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.939,03	$ 1.283.755,05	$ 2.960.735,15	$ 4.840.695,41	$ 6.588.539,41	$ 7.798.779,15	$ 8.016.404,82	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 49.105.364,00 / $ -	$ -	%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00 / $ -	$ -	%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00 / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 105.485.184,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.121.889.999,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. ____ **DE** ____ (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: ____
SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-MSBV-006-2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/08/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.121.889.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023	8 marzo/2023	9 abril/2023	
EXPLANACIONES	$ 100.839,10	1,26%	0,30%	% P			0,13%	0,36%	0,36%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	
			$24.260	$ P			$ 10.804,19	$ 28.811,17	$ 28.811,17	$ 32.412,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E				$24.260						
				% E				0,30%						
BOX CULVERT 2,5X2,5 L =7M (CANTIDAD 1UND)	$ 106.553,21	1,33%	0,00%	% P			0,05%	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			$0	$ P			$ 4.198,99	$ 102.354,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E										
				% E										
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,3 M Y LONGITUD DE 5300 M	$ 7.527.098,90	93,90%	2,43%	% P			0,00%	13,08%	19,57%	21,81%	21,68%	15,10%	2,67%	
			$194.941	$ P			$ 0,00	$ 1.048.163,89	$ 1.568.682,18	$ 1.748.189,26	$ 1.737.908,16	$ 1.210.239,74	$ 213.915,67	
				$ E				$194.940,85						
				% E				2,43%						
TRANSPORTE	$ 278.203,61	3,47%	0,02%	% P			0,12%	0,99%	0,99%	1,24%	0,12%	0,00%	0,00%	
			$1.250	$ P			$ 9.935,84	$ 79.486,75	$ 79.486,75	$ 99.358,43	$ 9.935,84	$ 0,00	$ 0,00	
				$ E				$1.250						
				% E				0,02%						
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3.710,00	0,05%	0,00%	% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
			$0	$ P			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.710,00	
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 8.016.404,82	100%	2,75%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 220.451,13											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	15,70%	20,92%	23,45%	21,80%	15,10%	2,71%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$24.939	$1.258.816	$1.676.980	$1.879.960	$1.747.844	$1.210.240	$217.626	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	16,01%	36,93%	60,38%	82,19%	97,29%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$24.939	$1.283.755	$2.960.735	$4.840.695	$6.588.539	$7.798.779	$8.016.405	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$220.451,13						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$220.451,13						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 49.105.364,00 / $ -	$ -	0%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ -	0%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00	$ -	0%
	$ - / $ -	$ -	0%
	$ - / $ -	$ -	0%
	$ - / $ -	$ -	0%
	$ - / $ -	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 105.485.184,00	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.121.889.999,00**	**$ 220.451,13**	**2,75%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: ____
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Aprueba Firma: ____
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3
		FECHA	29/11/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Indicar el sitio de atención al usuario: cumplió
Notificar la fecha de inicio de las actas de vecindad: no cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1.Avance en la ejecución de la obra
2. Seguridad Social.
3. Canteras de suministro de materiales.
4. Sitio de depósito de materiales de excavación y demolición.
5. Actas de vecindad.
6. Valla informativa.
7. Giros del anticipo
8. Prórroga del convenio
9. Aprobación PMT
10. Punto de atención al usuario.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1.) Avance en la ejecución de la obra. El contrato de obra presenta una programación ejecutada del 2,75 % versus una programación programada del 11% lo que representa un atraso en obra del 8,25%, ante lo anterior interventoría le solicita al contratista que implemente un plan de contingencia que ayude a nivelar la programación mediante la mejora de los rendimientos en obra. Se deja constancia por parte de la Interventoría que ya se radicó la solicitud de recomendación de apremio de multa ante el municipio por el atraso a la programación de la obra.
2.) Seguridad Social. Interventoría expone que el contratista está incumpliendo con la entrega de los recibos de pagos de la seguridad social del personal de obra. De continuar con dicho incumplimiento se recomendará al municipio iniciar el debido proceso para la aplicación de las multas correspondientes.
3.) Canteras de suministro de materiales. Interventoría manifiesta que ya el contratista entregó los ensayos de los materiales tipo subbase, y para el afirmado se realizaron observaciones a los ensayos de los cuales el contratista no a presentado respuesta de las observaciones.
4.) Sitio de depósito de materiales de excavación y demolición. El contratista entregó a interventoría la autorización dada por el municipio de San bernardo del viento para la donación a la comunidad del material de excavación.
5.) Actas de vecindad. El contratista aún no ha hecho entrega en su totalidad las actas de vecindad, es de anotar que el contratista realiza observación con respecto al puesto de salud, puesto que hasta la fecha no hay claridad quien presentara la firma de aprobación del mismo.
6.) Valla informativa. A la fecha el INVIAS no ha entregado el diseño o arte definitivo de la valla informativa, por lo que el contratista no ha podido mandarla a realizar.
7.) Giros del anticipo. Esta semana se dispone hacer el desembolso del saldo pendiente del anticipo.
8.) Prórroga del convenio, esta no aplica puesto que el este contrato tiene vigente el convenio hasta 31 de diciembre de 2023.
9.) Aprobación PMT. La interventoría manifiesta no contar con la aprobación del plan de manejo de tránsito por parte del municipio.
10.) Punto de atención al usuario. El contratista presento la información correspondiente del punto de atención, e instalo el punto de atención.

El contratista manifiesta que para el diseño estructural de las obras de artes “alcantarillas “no sea necesario realizar el análisis estructural de las mismas, debido a que estas estructuras se acogen a los diseños de las cartillas de Colombia rural el cual presentan estas modelaciones, por lo que manifiesta presentar memorial de responsabilidad acogiéndose a lineamientos de esta cartilla.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Implementación de Plan de contingencia	30/11/2022	Contratista
Entregar soportes de seguridad social	30/11/2022	Contratista
Entregar Caracterización de los materiales de Afirmado, Cantera el Esfuerzo	02/12/2022	Contratista
Entregar los formatos de donación del material correspondientes ala entrega a la Comunidad.	02/12/2022	Contratista
Entregar Actas de Vecindad del Proyecto	02/12/2022	Contratista
Entregar los Rendimientos financieros	02/12/2022	Municipio
Entregar Aprobación del PMT del proyecto.	02/12/2022	Municipio
Realizar Reunión con los Especialistas estructurales , definir el tema de las obras de arte "Alcantarillas"	01/12/2022	Interventoría

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 21/12/2022 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	Representante Legal	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
JESUS DAVID SALGADO	Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	
DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ	Secretario de Infraestructura - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **ACTAS DE REUNIÓN**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/11/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Avance y ejecucion del Contrato

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Avance y ejecucion del contrato
2. Seguimiento ala seguridad social de contrato
3 Caracterizacion del material

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance del contrato de obra LP-MSBV-006-2022: a la fecha se cuenta con un porcentaje programado correspondiente al 2,67%, un ejecutado del 0,00%, lo cual representa un atraso del 2,98%, por lo que la interventoria recomieda presentar un plan de accion para alcanzar la programacion del proyecto y asi evitar multas y sanciones por parte de la entidad contratante.

2. Actividades realizadas:
El contratista manifiesta que ha pensar de contar con la logistica y la maquinaria ya puesta en obra , al inicio de la semana logro realizar actividades de mejoramiento de los accesos en los puntos criticos, pero en lo que va corrido de este periodo las fuertes lluvias an imposibilitado la ejecucion de las actividades, por lo que sugiere ala inteventoria y entidad contratante tener en cuenta la situacion presentada por la ola invernal en todo el pais con el aumento de las lluvias por el fenomeno de la niña, y que debido a esto las actividades previas en la ejecucion del contrato como las explanaciones no se han podido inciar debido a esta situacion.

3.fuente de materiales :El contratista presento la documentacion de las canteras a utilizar , titulo minero y licencias ambientales de la cantera el esfuerzo, corregimiento del municipio de lorica, por lo que la interventoria solicita que se presente la caracterizacion de los materiales como lo son afirmado y subbase granular a utilizar.

4. Seguridad social: la interventoría solicita al contratista, colocarse al día con los soportes de afiliación y pagos a seguridad social del personal que labora en obra.

5. la interventoria manifiesta que ala fecha no cuenta la informacion de la localizacion del punto de atencion al usuario

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar caracterizacion de los materiales de afirmado y Subbase	martes, 8 de noviembre de 2022	Contratista
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato	lunes, 7 de noviembre de 2022	Contratista
Entregar la localizacion del punto de atencion al usurio para su aprobacion	lunes, 7 de noviembre de 2022	Contratista



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/11/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ARMANDO ALDANA ALDANA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/11/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. Avance y ejecucion del Contrato

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Revision de los compromisos Realizados
2.Avance y ejecucion del contrato
3. Seguimiento ala seguridad social de contrato
4.Caracterizacion del material
5. Valla del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revision de lo compromisos Realizados:
Entregar caracterizacion de los materiales de afirmado y Subbase: Cumplio
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato: Cumplio Parcialmente
Entregar la localizacion del punto de atencion al usurio para su aprobacion: No cumplio

2. Avance del contrato de obra LP-MSBV-006-2022: a la fecha se cuenta con un porcentaje programado correspondiente al 4,33 %, un ejecutado del 0,00%, lo cual representa un atraso del 7,30 %, por consiguiente, se les informa que esta interventoría procedecio a recomendar al Municipio de San Bernardo del Viento, iniciar el proceso de apremios de multas, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. LP-MSBV-006-2022.

3. Actividades realizadas:
El contratista manifiesta que realizado actividades de mejoramiento de los accesos en los puntos criticos, adecuacion de centro de acopio de materiales petreos pero las fuertes lluvias an imposibilitado la ejecucion de las actividades, por lo que sugiere ala inteventoria y entidad contratante tener en cuenta la situacion presentada por la ola invernal en todo el pais con el aumento de las lluvias por el fenomeno de la niña, y que las actividades previas en la ejecucion del contrato como las explanaciones no se han podido inciar debido a esta situacion.

4.fuente de materiales :El contratista presento la caracterizacion de los materiales como lo son afirmado y subbase granular pero esta no ha sido aprobada , puesto que se le debe dar tramite alas observaciones presentadas, por lo que se recomienda actar las observaciones y darle tramite lo mas pronto posible

4. Seguridad social: la interventoría solicita al contratista, colocarse al día con los soportes de afiliación y pagos a seguridad social del personal que labora en obra.

5. la interventoria manifiesta que ala fecha no cuenta la informacion de la localizacion del punto de atencion al usuario

6. Valla del proyecto: la interventoria reitera que ala fecha no se tiene el diseño de arte definitivo por para del INVIAS, debio a las modificaciones de Cambio de gobierno, pero solicita al contratista instalar la Estructura donde se va instalar.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar caracterizacion de los materiales de afirmado y Subbase	lunes, 21 de noviembre de 2022	Contratista
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato	viernes, 18 de noviembre de 2022	Contratista
Entregar la localizacion del punto de atencion al usurio para su aprobacion	viernes, 18 de noviembre de 2022	Contratista


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/11/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
DAYANA GONZALEZ	AUX. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ARMANDO ALDANA ALDANA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
EVER LEONARDO OLIVA RHENALS	AUX. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/11/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. Avance y ejecucion del Contrato

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Revision de los compromisos Realizados
2.Avance y ejecucion del contrato
3. Seguimiento ala seguridad social de contrato
4.Caracterizacion del material
5. Valla del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Revision de lo compromisos Realizados:
Entregar caracterizacion de los materiales de afirmado y Subbase: No Cumplio
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato: Cumplio Parcialmente
Entregar la localizacion del punto de atencion al usurio para su aprobacion: cumplio

2. Avance del contrato de obra LP-MSBV-006-2022: a la fecha se cuenta con un porcentaje programado correspondiente al 3,70 %, un ejecutado del 0,59%, lo cual representa un atraso del 7,30 %, por consiguiente, se les informa que esta interventoría procedecio a recomendar al Municipio de San Bernardo del Viento, iniciar el proceso de apremios de multas, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra pública No. LP-MSBV-006-2022.

3. Actividades realizadas:
El contratista apesar de que se iniciaron las actividades de excavacion, durante este periodo se presentaron lluvias que an retrasado las proramacion, por lo que no se loro alcanzar la meta propuesta en la semana, tambien manifiesta el compromiso de continuar con el plan de accion de aumentar las actividades el fin de semana, una vez las condiciones climaticas lo permitan.

4.fuente de materiales : la interventoria reitera al contratista dar cumplimiento de los compromisos pactados y entregar las correcciones presentadas alos materiales presentados como lo son material para afirmado y subbase granular ya que estos no cumplen y no ha sido aprobados por esta interventoria , por lo que se recomienda actar las observaciones y darle tramite lo mas pronto posible

4. Seguridad social: la interventoría solicita al contratista, colocarse al día con los soportes de afiliación y pagos a seguridad social del personal que labora en obra.

5. Valla del proyecto: la interventoria reitera que ala fecha no se tiene el diseño de arte definitivo por para del INVIAS, debio a las modificaciones de Cambio de gobierno, pero solicita al contratista instalar la Estructura donde se va instalar.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar caracterizacion de los materiales de afirmado y Subbase	viernes, 25 de noviembre de 2022	Contratista
Entregar los soportes de seguiridad social asociado al personal administrativo y tecnico del contrato	martes, 22 de noviembre de 2022	Contratista



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 24/11/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
DAYANA GONZALEZ	AUX. RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ARMANDO ALDANA ALDANA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
EVER LEONARDO OLIVA RHENALS	AUX. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

i. A la fecha, semana N°15, se tiene una inversión de obra programada de $ 1.283.755.049,15 correspondiente al 15,70% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 220.451.132,41 correspondiente al 2,75%; lo que representa un atraso del 13,26%.

ii. Se le recomienda al contratista atender los oficios enviados por interventoría donde se le requiere el envío de la seguridad social completa del personal en obra.

iii. Se recomienda al contratista replantear y materializar el eje de la vía, con la finalidad de tener certeza del correcto alineamiento del corredor vial y revisar conjuntamente entre las comisiones topográficas de obra y de la interventoría; así de esta forma, obtener el aval por parte de esta interventoría, para continuar con los trabajos con maquinaría y para el recibo de volúmenes posteriormente.

iv. Se recomienda al contratista, atender en la fecha establecida, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados

v. Se recomienda a la alcaldía del municipio de San Bernardo del viento, la aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra, específicamente por el atraso en el avance de ejecución de obra.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO	ENTREGADO A
CVRIMG-164-2022	1/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de caracterización de materiales y diseños de mezclas de concreto.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-183-2022	4/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de replantear y materializar el eje de la vía.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-196-2022	5/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	ORDENES DE GIRO ANTICIPO No 1 y 2	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-199-2022	8/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Observaciones a la caracterización de materiales presentados.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-212-2022	10/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Inicio de actividades en obra.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-219-2022	15/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Atraso del contrato de obra.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-224-2022	15/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Observaciones a la caracterización de materiales presentados.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-227-2022	16/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Verificación de cumplimiento de requisitos, para cambio del profesional residente de obra.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-236-2022	17/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Aprobación de cambio del profesional residente de obra.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-243-2022	18/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Requerimiento de soportes de afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo

CVRIMG-249-2022	21/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración de solicitud de notificación de la dirección exacta de la sede de servicio de atención al usuario.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-262-2022	21/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración de atraso del contrato de obra.	tn. Ing. Luis Antonio Mejía Turizo
CVRIMG-267-2022	22/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Buen manejo del anticipo	Atn. Ing. Luis Antonio Mejia Turizo
CVRIMG-273-2022	22/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Respuesta a notificación de dirección de la sede de servicio establecida para atención al usuario	Atn. Ing. Luis Antonio Mejia Turizo
CVRIMG-292-2022	28/11/2022	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Aprobacion cambio de topógrafo	Atn. Ing. Luis Antonio Mejia Turizo

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	RADICADO	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	1/11/2022	NA	1-nov.-22	CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	5/11/2022	NA	5-nov.-22	Retraso en la obra por condiciones climáticas.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	11/11/2022	NA	11-nov.-22	Envío de documentos (estudio hidrológico e hidráulico)
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	15/11/2022	NA	15-nov.-22	Cambio de Ingeniero residente de obra.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	15/11/2022	NA	15-nov.-22	Respuesta al oficio CVRIMG-219-2022.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	16/11/2022	NA	16-nov.-22	Implantación de obras de artes.
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	17/11/2022	NA	17-nov.-22	Envío de documentos. (inf. Hidráulico y planos)

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	11 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-006-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**				



Descripción: Excavación en material común de la explanación y canales



Descripción: Excavación en material común de la explanación y canales



Descripción: Compactacion de material común de la explanación y canales



Descripción: Extendido de material de afirmado.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	30 (Día) / 11 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-006-2022	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**				



Descripción: Socialización del proyecto (18/11/2022)



Descripción: Socialización del proyecto (18/11/2022)



Descripción: Socialización del proyecto (18/11/2022)



Descripción: Socialización del proyecto (18/11/2022)

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Domingo, 30 de octubre de 2022.
No se laboró por ser domingo.

Lunes, 31 de octubre de 2022
Actividades realizadas:
1. Revisión y/o ajustes a los estudios y diseños
2. Gestión administrativa

Martes, 01 de noviembre de 2022.


Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador.
Maquinaria y equipo: 1 Retroexcavadora.
Actividades:
1. Se continua con la etapa de revision y/o ajustes a los diseños.
2. Traslado de maquinarias y Suministro de señales.
3. Replanteo topografico en conjunto entre el contratista e interventoria.

Miercoles, 02 de noviembre de 2022

Clima: Nublado 10:00 am - 3:00 pm, lluvias moderada 9:00 AM - 11:00
personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador.

Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora.
Actividades:
1. Se continua con la etapa de revision y/o ajustes a los diseños.
2. Traslado de maquinarias y Suministro de señales.
3. Replanteo topografico en conjunto entre el contratista e interventoria.






Jueves, 03 de Noviembre de 2022

Clima: lluvia fuerte: 1:00AM-4:00AM, lluvia leve 5:00am-8:00AM
personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo 1 cadenero, 1 operador.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora.
Actividades:
1. Se continua con la etapa de revision y/o ajustes a los diseños.
2. Traslado de maquinarias y Suministro de señales.
3. Replanteo topografico en conjunto entre el Contratista e Interventoria.







Viernes, 04 de noviembre de 2022

Clima: lluvia fuerte: 1:00AM-3:30PM, lluvia leve 4:00AM-6:30AM
personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 operadores, 2 volqueteros.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 pajarita, 2 volquetas.


Actividades:
1. Se continua con la etapa de revision y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Traslado de maquinarios y suministro de señales.
3. Adecuacion de campamento.
4. Suministro de materiales petreos.






Sabado, 05 de noviembre de 2022.

Clima: Lluvia fuerte: 1:00 AM - 3:30 AM, lluvia leve 4:00 AM - 12:15 PM
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 operadores, 2 volqueteros.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora, 1 payaita, 2 volquetas.
Actividades:
1. Se continua con la etapa de revision y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. Adecuacion de campamento.
3. Suministro de materiales petreos.
4. Labores topograficas en campo.






Domingo, 06 de noviembre de 2022

Clima: Lluvias fuertes 2:00 AM - 4:20 AM, lluvias leves 4:00 AM - 6:00 AM
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 operadores, 2 volqueteros.
Maquinaria y Equipo: 1 retroexcavadora, 1 payaita

2 volquetas.
Actividades:
No se realizaron actividades en el dia de hoy domingo dia no laboral.






Lunes, 07 de noviembre de 2022

Clima: Lluvias fuertes 2:00 AM - 4:20 AM, Lluvias leves 4:30 AM - 6:00 AM
personal en obra: el personal del contratista no hizo presencia en la obra, Lunes Festivo dia no laboral
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora (inactiva), 1 pajarita (inactiva), 2 volquetas (inactivas).
Actividades:
En el presente dia no se realizaron actividades Lunes Festivo.






Martes, 08 de noviembre de 2022.

Clima: Lluvias fuertes 2:00 am - 4:20 AM, Lluvias Moderadas 4:30 AM - 6:00 AM
personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 operadores, 2 volqueteros.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora (activa), 1 pajarita (activa), 2 volquetas (activas).
Actividades:
1. se continua con la etapa de revision y los ajustes a los estudios y diseños.

2. adecuacion del campamento.
3. Suministro de materiales petreos.
4. Labores topograficas en campo.






Miercoles, 09 de noviembre de 2022.

Clima:
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 operadores, 2 volqueteros.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora (activa), pajarita (activa), 2 volquetas (activas).
Actividades:
1. se continua con la etapa de revision y/o ajustes a los estudios y diseños.
2. adecuacion del campamento.
3. Suministro de materiales petreos.
4. Labores topograficas en campo.





Jueves, 10 de noviembre de 2022

Clima: soleado.
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 operadores, 2 volqueteros.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora (activa), 1 pajarita (activa), 2 volquetas (activas)
Actividades:
En el presente dia el contratista continua con el

Suministro de los materiales petreos (arena y triturado), asimismo la ampliacion del sitio de acopio de materiales, la cuadrilla topografica del contratista continua la ubicacion del eje de la via, Se solicita al contratista iniciar de manera inmediata la ejecucion de las actividades que generen avance en la obra, asimismo se requiere la implementacion del PMT contratado, sistema de seguridad y salud en el trabajo, al igual ingresar la maquinaria faltante (bulldozer, motoniveladora, vibrocompactador) segun lo especificado en los anexos tecnicos del presente contrato.

Residente de Interventoria

Viernes, 11 de noviembre de 2022

Clima: Se presentaron fuertes lluvias de 3:30am a 5:00 am, resto del dia soleado

personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 operadores, 2 volqueteros.

Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora (activa), 1 pajarita (activa), 2 volquetas (activas)

Actividades:

En el presente dia se continuo con el suministro de los materiales petreos (arena y triturado), asimismo la ampliacion del lugar de acopio de los materiales, la cuadrilla topografica del contratista continua con la ubicacion y levantamiento del eje de la via, en el presente dia se realizo recorrido en obra por parte del contratista e interventoria con el fin de verificar las obras de drenaje existentes, el contratista manifesto iniciar las excavaciones para la construccion de la placa

huella, se solicita al contratista que previo a la iniciacion de las excavaciones para la construccion de la placa huella se debe hacer la implementacion del PMT, asimismo se requiere la entrega de las afiliaciones a seguridad social y parafiscales del personal en obra y que ingresara, al igual se requiere la entrega de la dotacion personal de los trabajadores en campo ya que se evidencio que no poseen.

Residente de Interventoria.

Sabado, 12 de Noviembre de 2022

Clima: Se presentaron Fuertes lluvias de 8:00 am a 10:00 am, 9:00 pm - 12:00 m lluvias moderadas.
Personal en obra: 1 Residente de obra.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora (inactiva), 1 pajorita (inactiva), 2 volquetas (inactivas).
Actividades:
En el presente dia no se realizaron actividades en la obra, debido a la fuertes lluvias presentadas en la mañana del presente dia, las cuales saturaron el terreno, impidiendo laborar en el dia de hoy.

Residente de Interventoria.

Domingo, 13 de Noviembre de 2022

Clima: Se presentaron lluvias moderadas de 12:00 pm - 5:00 am, resto del dia nublado.
En el presente dia no se realizaron actividades, domingo dia no laboral.

Residente Interventoria.

Lunes, 14 de Noviembre de 2022


Clima: Soleado.
personal en obra: 1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 2 volqueteros, 3 operadores.
Maquinaria y Equipo: 1 Retroexcavadora (activa), 1 pajarita (activa), 1 minicargador (activo), 2 volquetas (activas).
Actividades:
En el presente dia el contratista realizo mejoramiento y adecuacion de la via para mejorar la transitabilidad de (la) volqueta, asimismo la limpieza de los laterales de la via.

Residente Interventoria

Martes 15 de Noviembre de 2022

Clima: Mañana: lluvias, tarde: lluvias
personal en obra:
1 Residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero
1 Retro operador, 2 conductores Volqueta, 1 operador Retrocargador
MAQUINARIA Y EQUIPO:
1 Retroexcavadora (Activa), 1 pajaritta (Activa), 1 minicargador (ACTIVO), 1 Motoniveladora (NO ACTIVO)
ACTIVIDADES REALIZADAS:
- En el presente dia no se realizaron Actividades la obra, debido a las fuertes lluvias presentadas en la mañana 4:00AM - 7:30 AM del presente dia, las cuales saturaron el terreno, impidiendo Labora el dia de hoy.

Miercoles, 16 de Noviembre de 2022
Estado de tiempo:
Mañana: Nublado
tarde: lluvias - 7:30 AM hasta 10: AM
ACTIVIDADES REALIZADAS:
- No se realizaron Actividades debido a las Fuerte lluvias, que imposibilitaron el Acceso de la Maquinaria





Jueves, 17 de Noviembre de 2022
Estado DEL TIEMPO:
MAÑANA: Nublado
TARDE: Nublado
EQUIPOS Y MAQUINARIAS:
1 Retroexcavadora, Payretta, 2 volquetas, 1 minicargador
1 motoniveladora. (NO ACTIVA)
PERSONAL EN OBRA:
R. de obra, Auxiliar de obra, Auxiliar de Interventoria, R de interventoria, 2 operadores Maquinaria, 2 conductores Volquetas
ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Se Realizaron labores de mejoramiento y Adecuación de la via para mejorar la transibilidad de la Maquinaria Asi mismo la limpieza de los Caterales de la via.





Viernes 18 de Noviembre de 2022
ESTADO DEL TIEMPO
Mañana: Soleado Noches: Lluvias 3:00 AM - 4:30 AM
TARDE: Soleado
Equipos y Maquinarias:
1 Retroexcavadora, 1 pajanta, 1 minicargador, 2 Volquetas, 1 Motoniveladora (NO Activa), 1 camioneta
PERSONAL EN OBRA:
R. de Interventoria, R. de obra, Auxiliar de obra, Aux de Interventoria, 1 Obrero, 2 Operadores, 2 conductores
ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Se continuaron con las labores de Acopio de Materiales Petreos (Arena y Triturado)
- Se continuaron con la ampliación de lugar de Acopio de Material asi como su cerramiento en lona.
- Las Actividades se INIARON a las 11:AM por lluvias en las Madrugada.
- Socialización con la Comunidad del castillo

Sabado, 19 de Noviembre de 2022
ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: Nublado Noche: Lluvias 4:00 AM - 5:30 AM
TARDE: Soleado
EQUIPOS Y MAQUINARIAS:
1 Retroexcavadora, 1 pajanta, 1 minicargador, 1 camioneta
1 motoniveladora (NO ACTIVA), Equipo de topografia
PERSONAL EN OBRA:
Residente de obra, Auxiliar de Interventoria, Aux de obra, Director de obra, topografo, 1 Cadenero, 2 Obreros 2 Paleteros
ACTIVIDADES REALIZADAS
- Las actividades se iniciaron a las 2:00 PM debido a que en horas de la mañana se presentaron lluvias

- Se Iniciaron labores de excavaciones y Explanacion de material comun para la construcción de placa Huella, desde la Abcsisa K3+850 - K3+730

-





Domingo, 20 de noviembre de 2022.
No se Realizaron Labores, DIA No Laboral






LUNES, 21 de NOVIEMBRE de 2022
ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA:
TARDE:
PERSONAL EN OBRA: 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, Auxiliar de obra, 1 topografo, 1 Cadenero, Auxiliar de Interventoria., Director de Interventoria, 2 palcteras, 2 obreros, 2 operadores, 2 conductores
EQUIPOS Y MAQUINARIAS:
1 Retroexcavadora, 1 Pajarita, 1 minicargador, 2 Volquet 1 motoniveladora, (NO ACTIVA), Equipo de topografia
ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Se Suspenden las Actividades por fiestas patronale en el Corregimiento el Castillo.






MARTES, 22 de Noviembre de 2022
ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
EQUIPOS Y MAQUINARIA:
1 Retroexcavadora, 1 minicargador, 2 volquetas, 1 Motoniveladora (NO ACTIVA), 1 pajarita., Equipo de topografia
PERSONAL EN OBRA:
R. de obra, Auxiliar de obra, Aux. de Interventoria, R. de Interventoria, 2 topografo, 2 Paleteros, 2 obreros, 2 Cadeneros, 3 operadores, 3 conductors
ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Se iniciaron con las labores de Excavación y Explanación de material comun para la placa Huella desde Km0+000 - Km0+930
- Se realizo el retiro de material producto de la excavacion, el cual fue donado alla Comunidad en peticion realiza en ultima Socialización
- Se continuo con el replanteo y localización del eje de la via.
-
Observaciones: Se le Solicito al contratista presentar formatos de entrega a la comunidad del material entregado. de acuerdo a lo pactado en la ultima socializacion con la comunidad

Miercoles 23 de Noviembre de 2022
Estado del tiempo:
Mañana: Soleada
Tarde: Soleada
Equipos y Maquinarias:
1 Vibro compactador, 1 Retroexcavadora, 1 Pajarita
2 Volquetas, 1 minicargador, Equipo de topografia
PERSONAL EN OBRA
R. de obra, R. de Interventoria, Auxiliar de obra, topografo
2, Cadeneros, 4 operadores, 2 conductores de camioneta,
2 Paleteras, 4 obreros
ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Se continuaron con la excavaciones de Material Comun y canales entre las Abcisas K8+000 hasta K4+930
- Se iniciarón con las labores de Relleno con material de Afirmado compactado entre Las Abcisas K5+000 hasta K4+960, espesor de la capa 0,10 m



Jueves 24 de Noviembre de 2022

Actividades Realizadas: No se realizaron Actividades por Lluvias constantes en la mañana 4:00 AM - 6:30 AM que Imposibilitaron la ejecución de las Actividades por Saturación del terreno.




Viernes 25 de Noviembre de 2022
Estado del tiempo
Mañana:
Tarde:
Equipos y Maquinarias
1 Retroexcavadora, 1 pajarita, 1 marcayador, 2 Volquetas, 1 vibro compactador, 1 motoniveladora (NO ACTIVA)
PERSONAL EN OBRA
R. de obra, R. Interventoria, topografo, 2 cadeneros 2 Palcteras, 2 obreros, 30 poradores, 1 Conductor camioneta, 2 conductores volquetas.
ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Se continuo con las Excavaciones de Material comun Abcisas K3+870 hasta K3+780
- se continuo con las labores de localizacion del eje del proyecto
- Se continuo con el ACOPIO de MAterial Para Afirmado.


Sabado 26 de Noviembre de 2022.
ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
Equipos y MAQUINARIAS
1 vibro compactador, 1 motoniveladora (NO Activa), 1 RetroExcavadora, 1 pajarita, 2 Volquetas, Equipo de topografia
Personal en obra:
R. de Interventoria, R. de obra, Aux Interventoria, Aux. de obra, 2 Topografos, 4 obreros, 2 cadeneros

2 paleteras, 3 operadores, 2 conductores volquetas

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continuaron con las Labores de excavación y Relleno con material Afirmado en las Abscisas K3+860 hasta K3+780, espesor de capa 0,10m Compactada
- Se continuaron con las Labores de Replanteo y localización del eje del proyecto.
- Se continuo con el acopio del Material para Afirmado.





Domingo 27 de Noviembre 2022

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Lluvias entre 12:00 PM - 2:30 PM

Equipo y Maquinarias:

1 RetroExcavadora, 1 Vibrocompactador, 2 volquetas 1 motoniveladora (INACTIVA); Equipo de topografía


Personal en obra:

R. de obra, R. de Interventoria, Aux. Interventoria, topografo, 2 Cadeneros, 3 operadores

Actividades Realizadas:

- Se continuaron con la Actividades de Relleno con Material de Afirmado K3+780 hasta K3+680

Observaciones: Se Suspendieron Actividades por las lluvias en las horas de la tarde.





Lunes 28 de Noviembre de 2022

Actividades Realizadas: No se Realizaron Actividades debido a las lluvias en horas de la Madrugada. 4:00 AM - 7:00 AM

Martes 29 de Noviembre de 2022
MAÑANA: Nublado
TARDE. lluvias

ACTIVIDADES REALIZADAS: No se Realizaron Actividades por las lluvias presentados

Miercoles 30 de Noviembre de 2022
MAÑANA: lluvias 6:30 - 7:30 AM
TARDE: Nublado

ACTIVIDADES REALIZADAS:
- No se Realizaron Actividades por la Saturación del terreno producto de las lluvias en las horas de la mañana.
