
	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 5**


CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**5**	**DEL**	10/08/2026	**AL**	15/08/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	32


AVANCE DEL CONTRATO

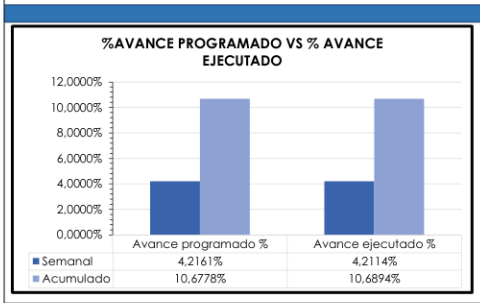

Semanal	Acumulado	
4,2161%	10,6778%	Avance programado %
$ 77.854.658,36	$ 197.178.304,25	Valor programado
4,2114%	10,6894%	Avance ejecutado %
$ 197.392.501,85	$ 197.392.501,85	Valor ejecutado

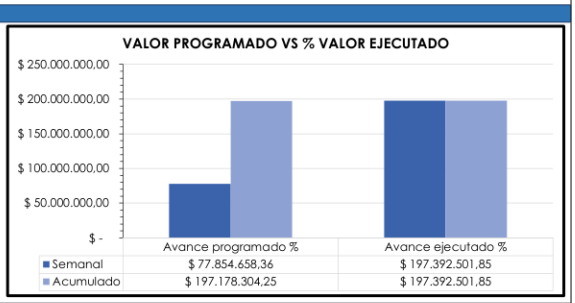

GRAFICA DE AVANCE

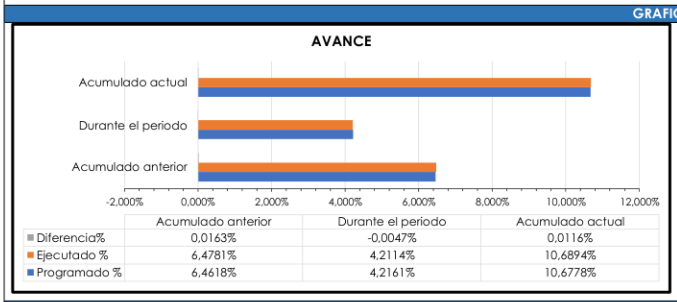

Programado %	Ejecutado %	Diferencia%		
6,4618%	6,4781%	0,0163%	Acumulado anterior	Ok,Adelantados
4,2161%	4,2114%	-0,0047%	Durante el periodo	Atrasados
10,6778%	10,6894%	0,0116%	Acumulado actual	Ok,Adelantados

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
Subtotal					**$ 39.221.436,09**		**2,12%**	**$ 39.221.436,09**
2,0	**CIMENTACIONES**							
2,1	**EDIFICIO DE SERVICIO**							
2,1,1	Excavacion general para cimentacion, incluye retiro de material sobrante	m3	52,89	$ 153.367,67	$ 8.111.922,93	52,89	0,4393%	$ 8.111.922,93
2,1,2	Solado en Concreto Pobre de f'c= 14 MPa (140 kg/cm2/) e =0,05 m	m3	1,44	$ 890.049,97	$ 1.285.232,15	1,44	0,0696%	$ 1.285.232,15
2,1,3	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para vigas de cimentacion.	kg	574,65	$ 13.791,77	$ 7.925.479,35	574,65	0,4292%	$ 7.925.479,35
2,1,4	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para zapatas.	Kg	431,32	$ 13.791,77	$ 5.948.617,77	431,32	0,3221%	$ 5.948.617,77
2,1,5	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para viga de cimentación.	m3	3,59	$ 1.464.861,16	$ 5.258.119,12	3,59	0,2847%	$ 5.258.119,12
2,1,6	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para zapata.	m3	10,68	$ 1.199.842,57	$ 12.817.918,17	10,68	0,6941%	$ 12.817.918,17
2,1,7	Suministro y colocacion de material seleccionado	m3	23,47	$ 254.992,89	$ 5.983.466,24	18,77	0,2592%	$ 4.786.772,99
2,1,8	Sumnistro y colocacion de piedra rajon envuelta en geotextil e=20cm	m3	5,78	$ 180.857,22	$ 1.044.631,31	5,78	0,0566%	$ 1.044.631,31
2,2	**AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO**							
2,2,1	Excavacion general para cimentacion, incluye retiro de material sobrante	m3	30,62	$ 153.367,67	$ 4.696.808,29	30,62	0,2543%	$ 4.696.808,29
2,2,2	Solado en Concreto Pobre de f'c= 14 MPa (140 kg/cm2/) e =0,05 m	m3	0,78	$ 890.049,97	$ 697.799,17	0,78	0,0378%	$ 697.799,17
2,2,3	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para vigas de cimentacion.	Kg	948,52	$ 13.791,77	$ 13.081.714,35	948,52	0,7084%	$ 13.081.714,35
2,2,4	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para zapatas.	Kg	335,89	$ 13.791,77	$ 4.632.551,89	335,89	0,2509%	$ 4.632.551,89
2,2,5	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para viga de cimentación.	m3	7,54	$ 1.464.861,16	$ 11.040.072,58	7,54	0,5979%	$ 11.040.072,58
2,2,6	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para zapata.	m3	5,49	$ 1.199.842,57	$ 6.584.736,02	5,49	0,3566%	$ 6.584.736,02
2,2,7	Suministro y colocacion de material seleccionado	m3	17,33	$ 254.992,89	$ 4.418.108,86	13,86	0,1914%	$ 3.534.487,08
2,2,8	Sumnistro y colocacion de piedra rajon envuelta en geotextil e=20cm	m3	3,14	$ 180.857,22	$ 567.168,25	3,14	0,0307%	$ 567.168,25
Subtotal					**$ 94.094.346,44**		**4,98%**	**$ 92.014.031,42**
3,0	**ESTRUCTURAS**							
3,1	**EDIFICIO DE SERVICIO**							
3,1,1	Suministro y colocacion de acero de refuerzo para columnas según despiece estructural, Fy=420 Mpa	Kg	713,00	$ 13.791,77	$ 9.833.559,72	713,00	0,5325%	$ 9.833.559,72
3,1,2	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para columnas.	m3	1,59	$ 1.888.182,17	$ 2.997.489,19	1,59	0,1623%	$ 2.997.489,19
3,1,3	Suministro y colocacion de acero de refuerzo para viga según despiece estructural, Fy=420 Mpa	Kg	585,62	$ 13.791,77	$ 8.076.697,83	585,62	0,4374%	$ 8.076.697,83
3,1,4	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para viga	m3	4,35	$ 1.878.808,07	$ 8.171.687,84	4,35	0,4425%	$ 8.171.687,84
3,1,5	Suministro y colocacion de acero de refuerzo para losa del tanque de almacenamiento según despiece estructural, Fy=420 Mpa	kg	69,88	$ 13.791,77	$ 963.835,10	29,95	0,0224%	$ 413.072,19
3,1,6	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para losa del tanque de almacenamiento.	m3	1,50	$ 1.306.138,90	$ 1.959.208,35		-	$ -
3,2	**AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO**							
3,2,1	Suministro y colocacion de acero de refuerzo para columnas según despiece estructural, Fy=420 Mpa	Kg	1208,84	$ 13.791,77	$ 16.672.083,18	1208,84	0,9028%	$ 16.672.083,18
3,2,2	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para columnas.	m3	4,54	$ 2.696.403,73	$ 12.244.833,60	4,54	0,6631%	$ 12.244.833,60
3,2,3	Suministro, figurado e intalación de acero de refuerzo para viga cinta según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289.	Kg	113,04	$ 13.791,77	$ 1.558.968,74	32,30	0,0241%	$ 445.419,64
3,2,4	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para viga cinta de 0,10x0,15m.	m3	4,64	$ 1.547.906,40	$ 7.182.285,68		-	$ -
3,2,5	Suministro y colocacion de acero de refuerzo para graderia según despiece estructural, Fy=420 Mpa	kg	363,06	$ 13.791,77	$ 5.007.303,19		-	$ -
3,2,6	Suministro y colocación de concreto de F'c= 21MPa para graderia.	m3	6,54	$ 1.263.888,90	$ 8.261.662,55		-	$ -
Subtotal					**$ 82.929.614,98**		**3,19%**	**$ 58.854.843,20**
4,0	**MAMPOSTERÍA**							
Subtotal					**$ 105.187.268,15**		**0,00%**	**$ -**
5,0	**PLACA "PAZ A LO BIEN"**							
Subtotal					**$ 7.771.829,37**		**0,00%**	**$ -**

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 5**

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00		
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**5**	**DEL**	10/08/2026	**AL**	15/08/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	32

6,0	**PINTURA Y ACABADOS**								
Subtotal					**$ 18.282.886,57**		**0,00%**	$	-
7,0	**CUBIERTA**								
Subtotal					**$ 268.229.847,05**		**0,00%**	$	-
8,0	**IMPERMEABILIZACIONES**								
Subtotal					**$ 4.879.736,45**		**0,00%**	$	-
9,0	**CARPINTERIA METALICA**								
Subtotal					**$ 39.260.462,35**		**0,00%**	$	-
10,0	**ESPACIO PUBLICO**								
Subtotal					**$ 89.073.503,90**		**0,00%**	$	-
11,0	**PLAZAS Y ANDENES**								
Subtotal					**$ 696.317.769,43**		**0,00%**	$	-
12,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**								
Subtotal					**$ 126.450.174,22**		**0,00%**	$	-
13,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
Subtotal					**$ 227.395.176,97**		**0,00%**	$	-
CERTIFICACIONES RETIE - RETILAP		1,00	$ 13.440.042,00		**$ 13.440.042,00**		-	$	-
IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO		1,00	$ 16.794.462,00		**$ 16.794.462,00**	0,21	**0,19%**	$	3.598.813,29
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)		1,00	$ 17.282.430,00		**$ 17.282.430,00**	0,21	**0,20%**	$	3.703.377,86
TOTAL ACUMULADO					**$ 1.846.610.986,00**		**10,6894%**	$	**197.392.501,85**

Realizó.	Revisó.	Supervisó.
ANDRES FERIA AGUIRRE	DAVID GONZALES PUENTE	DAVID GONZALES PUENTE
INTERVENTORIA	SECRETRARIO (E) DE OBRAS PUBLICAS - MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	SUPERVISOR DEL CONTRATO

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

En el transcurso de esta semana se realizaron las actividades conrrespondientes; Se culmina con el suministro y colocacion de los concretos para zapatas y vigas de cimentacion y se comienzan con las actividades de relleno con material seleccionado correspondientes al capitulo 2 - Cimentaciones; tanto del Edificio de servicio como el del Area polivalente multiproposito.

En el Capitulo 3 - Estructuras se realizaron las siguientes actividades; Se culmino con el vaceado del concreto de columnas, aceros de vigas y concreto de vigas y se inicio con la figuracion del acero de refuerzo de la losa del tanque y de las vigas cintas; tanto del Edificio de servicio como el del Area polivalente multiproposito.

Se continuan tambien con las actividades correspondientes a los Programas de impacto ambiental y el Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO).
