	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

INFORME MENSUAL No. DIECISÉIS (16) **MES O PERIODO:** NOVIEMBRE DEL 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	711
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	712
1	**INTRODUCCIÓN**		715
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		716
2.1	Localización		716
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		718
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		718
2.4	Características técnicas del proyecto		719
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		722
3.1	Información general del contrato		722
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		722
3.3	Seguimiento Items no previstos		724
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		725
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		726
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	727
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	737
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	739
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	759
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	762
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	768
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	771
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	779
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		786
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	787
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	790
	• Seguimiento Programa de Obra		792
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	803
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	805
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	807
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	811
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		1084
5.1	Información general del contrato		1084
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		1085
5.3	Informes especialistas y profesionales		1091
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		1117
5.5	Informe matriz de riesgos.		1118
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		1124
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		1125
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	1126
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	1128
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	1134
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	1136
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	1147
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		1179
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	1180
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	1182
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	1186
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	1193
7	**Conclusiones y recomendaciones**		819
8	**Anexos**		820
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		821
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		823
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		829
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		830

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 4/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
PERIODO MES: nov-23

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

PLAZO INICIAL: 8 MESES
PLAZO PRORROGA N°1: 4 MESES
PLAZO PRORROGA N°2: 4 MESES
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023
PLAZO ACUMULADO: 16 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.121.889.999,40
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.121.889.999,40
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	5000
	Mejoramiento	m	5000
	Subbase	m	5000
Explaneaciones	Excavación en material común de la explanación y canales	-	
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	10

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m	100	1270
	Mejoramiento	m	0	4065
	Subbase	m	0	3250
Explaneaciones	Excavación en material común de la explanación y canales	m	-	5015
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	0	4

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 8.016.404.815,00		$ 8.016.404.815,00
0,00	$ 41.265.012,10	$ 7.840.352,30	$ 49.105.364,40
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.105.047.827,10	$ 16.842.172,30	$ 8.121.889.999,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 24.505.305,90		$ 24.505.305,90	$ 3.114.400.290,21
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 24.505.305,90		$ 24.505.305,90	$ 3.170.780.110,21

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 4/12/2023 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 8.016.404.815,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.114.400.290,21
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	38,85%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	18
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**23**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











Fundida de losas Reforzadas y Ciclopeo de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI 17/08/2023

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Mediante comunicado CVRIMG-1791-2022 del 17 de noviembre de 2023, Esta Interventoría, en ejercicio de sus facultades contractuales y legales, presenta el informe de presunto incumplimiento al Contrato de Obra Pública No. LP-MSBV-006-2022. (en adelante el "Contrato de Obra") celebrado entre el Consorcio Vial San Bernardo (en adelante el "Contratista de Obra" o el "Contratista") y la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento. Así, y en virtud de lo anterior, se recomienda a la Entidad iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, tendiente a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria prevista en la Cláusula Décima Sexta. Lo anterior, como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de Obra respecto a lo establecido en la Cláusula Novena - Obligaciones generales del contratista, numerales 2, 3, y 4, respaldados en la Garantía Única de Cumplimiento No. NB-100217190 expedida por Mundial de Seguros S.A.

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto**CMA-DTE-SEP-196-2021**y número ID del SECOPCO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".**Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Bernardo del Viento, mediante el convenio interadministrativo No. 1876 de 2021. Es por ello por lo que mediante el proceso de licitación pública **LP-MSBV-006-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**, El cual fue adjudicado al **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO**, cuyo plazo inicial es de ocho (8) meses a partir del 24 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $8.121.889.999,00.

El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de Noviembre de 2023; e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Este proyecto se localiza en la vía que conduce desde la intersección que lleva San Bernardo del Viento - Moñitos hasta el Corregimiento del El Castillo.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Bernardo del Viento.

San Bernardo del Viento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Está situado sobre la costa norte de Colombia en la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe y dista 78 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento. El territorio corresponde a un bosque seco tropical, con predominio de relieve bajo, baja altitud y alta temperatura, con un promedio de 30 °C, una humedad relativa del 80%, dos épocas de lluvias durante el año, entre abril – mayo y octubre – noviembre, en donde se precipita el 76% de la lluvia anual que es de unos 1.300 mm y una época de verano, que corresponde al resto del año. La mayor parte del territorio, al norte, sur y este, es plano, el resto presenta alturas cercanas a los 100 msnm, posee 34,2 km de playas de los cuales algunos tramos presentan condiciones adecuadas para el turismo y ecoturismo.

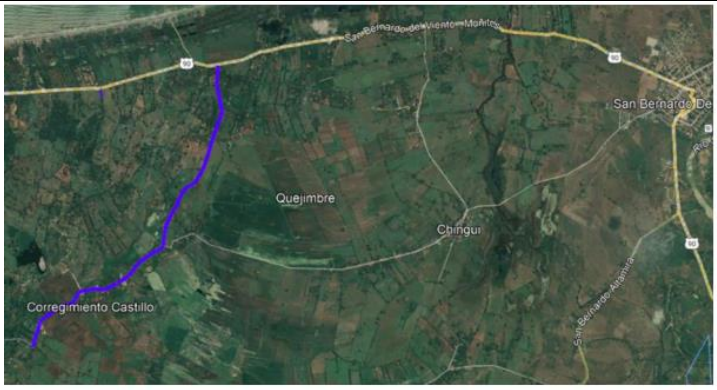


Ilustración 3. Vía al corregimiento el Castillo.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales para el material de AFIRMADO presentada por el contratista, se encuentra ubicada en la vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba. Esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.

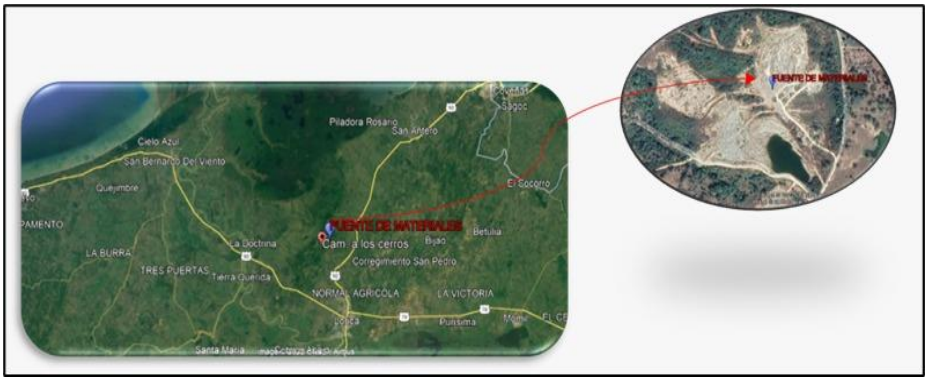


Ilustración 4. Ubicación de la fuente de materiales.

Para el material se SUBBASE GRANULAR, se encuentra ubicada en el corregimiento de san Sebastián, municipio de santa cruz de lorica, Cantera San José esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Se benefician principalmente la zona rural del municipio de San Bernardo del viendo, principalmente la población que habita en el corregimiento de El Castillo.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de la vía; es por ello que se realiza el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de placa huella.

	
Estado inicial de la Vía, 24/08/2022	Estado de la la via Actual 30/11/2023



Estado de la la via Actual 30/11/2023



Estado de la la via Actual 30/11/2023

Ilustración 5. Estado inicial de la Vía. Cto. LP-MSBV-006-2022


2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Inicialmente se tenía contemplada la construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5 con una longitud de 7 metros.

Luego de la actualización de los estudios y diseños, se define la metafísica a construir así: se realizará la construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Culvert de 1X1, un (1) Box Culvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

Contrato LP-MSBV-006-2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	5000 metros
Ancho Calzada	5,3 metros
Losa de concreto	0,15 metros
Subbase	0,15 metros
Afirmado (mejoramiento)	0,20 metros

i. . ESTRUCTURA DE LA PLACA HUELLA.

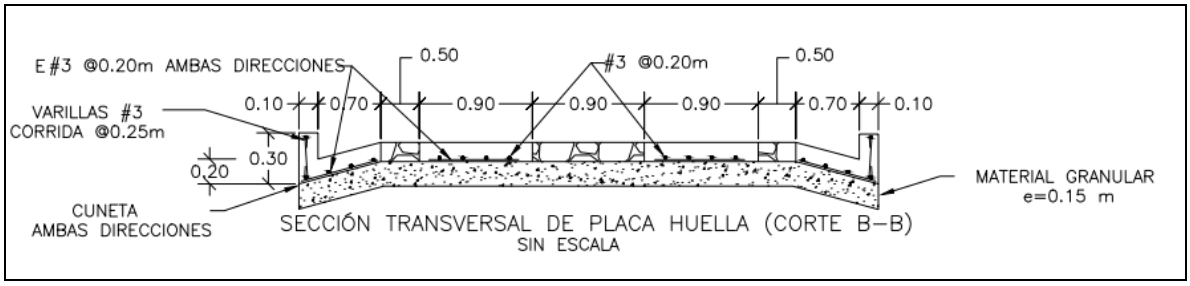



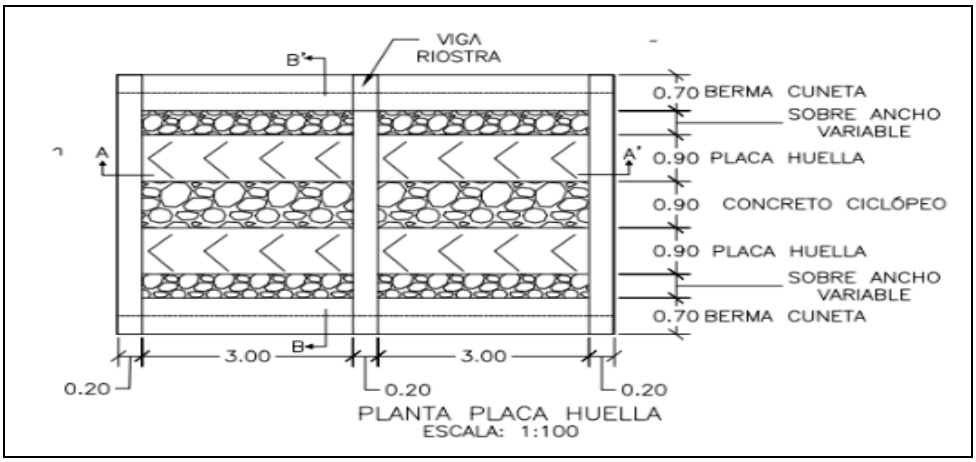


Ilustración 6. Sección típica en planta de la placa huella.


ii. OBRAS DE DRENAJES


✓ Boxculvert.

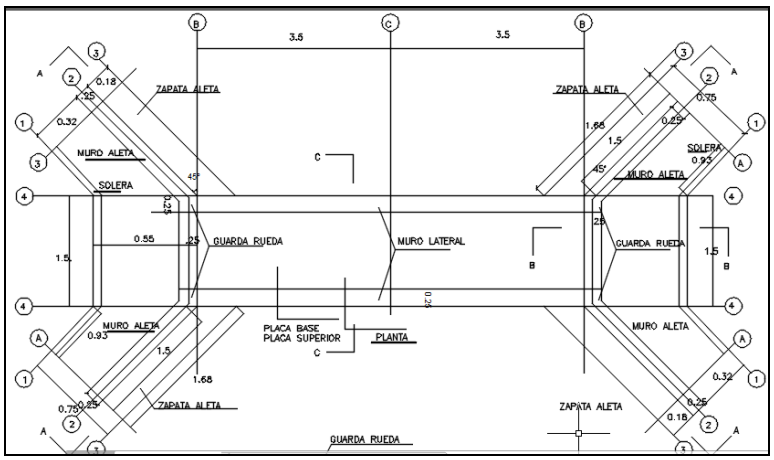

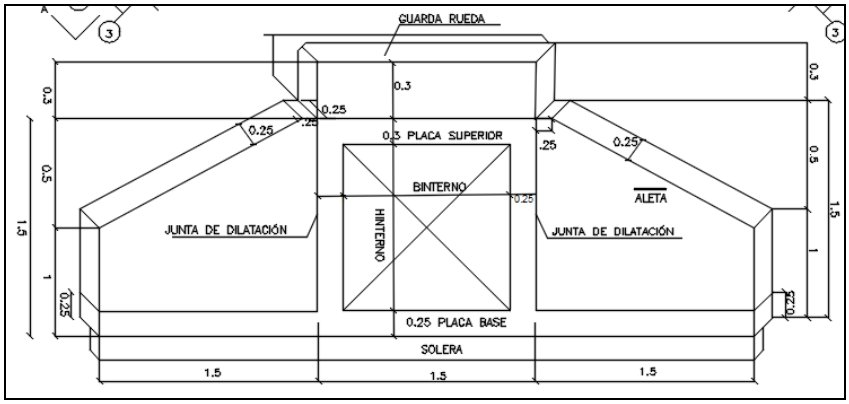

- ✓ **Alcantarillas de 36”**

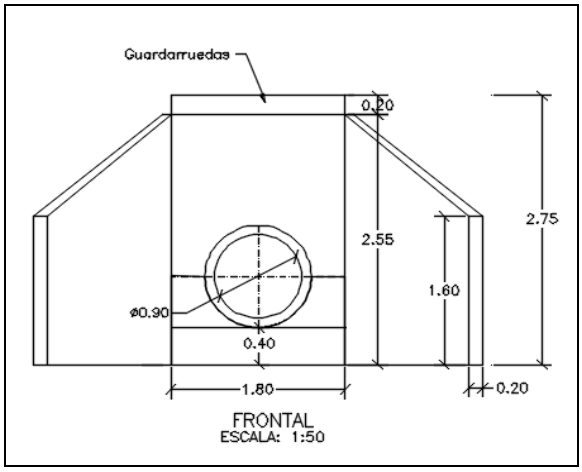

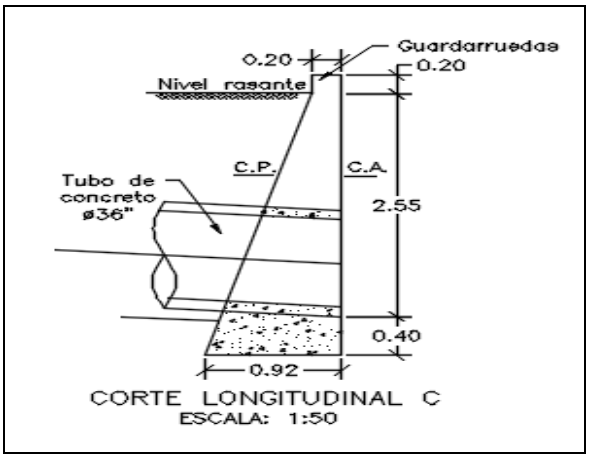

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-MSBV-006-2022
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022/07/13
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
NIT	901611859-1
INTEGRANTES	• ALEXANDER THEVENING GARCÉS • C.C. 721.485.658 • Participación: 90%
	• CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S. • NIT. 900.506.559-2 • Participación: 10%
DIRECCIÓN	Cra 11 N 10-31 Pueblo Nuevo – Córdoba
TELEFONO	3107193787
CORREO	consorciovial.sanbernardo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.121.889.999,00
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA INICIO	24/08/2022
PRORROGA N°1	4 MESES
PRORROGA N° 2	4 MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	23/12/2023

Tabla 1. Información Cto. LP-MSBV-006-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

Durante este periodo, el contratista de obra realizó actividades desde el día 01 de noviembre hasta el 10 de noviembre del 2023, esto debido a que, sin justa causa, el contratista no continuo con el suministro de materiales para la construcción de la placa huella, debido a esto la obra quedó inactiva. Esta interventoría, ante problemática presentada realizó varios requerimientos, de los cuales no se tuvo respuesta por parte del contratista.

debido al atraso significativo que presenta la obra, esta interventoría recomendó al municipio de san Bernardo del viento (ente contratante), iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, tendiente a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria prevista en la Cláusula Décima Sexta. Lo anterior, como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de Obra

respecto a lo establecido en la Cláusula Novena - Obligaciones generales del contratista, numerales 2, 3, y 4, respaldados en la Garantía Única de Cumplimiento No. NB-100217190 expedida por Mundial de Seguros S.A.

las actividades realizadas fueron:

i. Replanteo topográfico en conjunto entre la Interventoría y contratista

ii. Se continua con la fundición de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA.
iii. Se continua con la figuración de Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
iv. Se continua con las fundidas de Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
v. Se continua con la construcción de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
vi. Se Continua con la construcción de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
vii. Se Continua con las Excavaciones varias en materia común en seco a mano

.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental P.A.G. A V6, fue aprobado y enviado por la Interventoría Rad N°30779 de 29/03/2023 a INVIAS, se está a la espera para concepto de no objeción.
ii. Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio, el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023, por lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje.
iii. Permisos Ambientales: resolución No. 3-0619 del 29 de marzo de 2023, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – C.V.C. otorga el permiso de ocupación de cause a nombre del municipio de San Bernardo del Viento, de los siguientes puntos.
iv. Dentro de los requerimientos se solicita que, un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentar un informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.

v. Seguimiento a actividades PAGA: Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:

- ✓ permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
- ✓ certificaciones faltantes de los materiales utilizados en obra (arena).

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El contratista instalo el punto de atención al usuario ubicado en el Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar.
ii. El contratista realizo entrega de Informes sociales tercer trimestre, en revisión por Interventoría.
iii. Se realizó reunión mensual con la veeduría el 31 de octubre 2023 para informarle el estado del proyecto y atender inquietudes de la comunidad.
iv. El contratista presento las actas de vecindad ante la interventoría.

v. Seguimiento a actividades PAGA: Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:

- ✓ Gestiones ante ministerio del interior
- ✓ Gestión ante ICANH
- ✓ Cierre de 3 PQRS.
- ✓ Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

i. A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. A la fecha, se tiene una inversión de obra programada de $ 7.530.562.009,92 correspondiente al 93,94% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.114.400.290,21 correspondiente al 38,85%; lo que representa un atraso del 55,09%.
ii. para expedir acta definitiva de aprobación.
iii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iv. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
v. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
vi. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vii. Reuniones de seguimiento Mensual con la veeduría
viii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
ix. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
x. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
xi. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xii. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
xiii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xiv. Inspección de maquinaria y equipos en obra.
xv. Mediante comunicado CVRIMG-1341-2023 Mediante comunicado CVRIMG-1341-2023, está interventoría solicita al CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, realizar la toma de núcleos a los elementos donde se está reportando el no cumplimiento de la norma y así poder dirimir y liberar dichos elementos.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 63 (Numeración consecutiva) del 27/10/2023 al 2/11/2023 **mo Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%		INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	9/1 de 2022	VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/12/2023	VALOR ANTICIPO: $ 2.436.567.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO: $ 831.674.261,00			VALOR AMORTIZADO: $ 368.980.099,00
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.604.892.739,00			SALDO POR AMORTIZAR: $ 281.019.901,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 2.792.288.970,40	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.979.601.028,60	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.270.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.266.265.942,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.748.854,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	5.746.371.506,27	71,68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	3.102.122.109,51	38,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(2.644.249.396,76)	-32,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	5.746.371.506,27	71,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3.102.122.109,51	38,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(2.644.249.396,76)	-32,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	180.219.363,41	2,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	12.227.125,20	0,15%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	1.912.169.255,00	41,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 146.393.722,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 368.980.099,00
Saldo $	$ 281.019.901,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 71,68%
Meta Física Ejecutada %: 38,70%
Avance o Atraso Físico %: -32,99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1100			1100	22%
Box Coulvert	Und	10		10	Prog	10			10	100,0%
					Ejec	4			4	40,0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente al mes de septiembre , ESTA RECIBIDO

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	30	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	27	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 30

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social del mes de Septiembre esta recibido. Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior.
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se reactivaron las actividades en obra, ingreso material para construcción de placa huella. las actividades realizadas son :
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excavacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

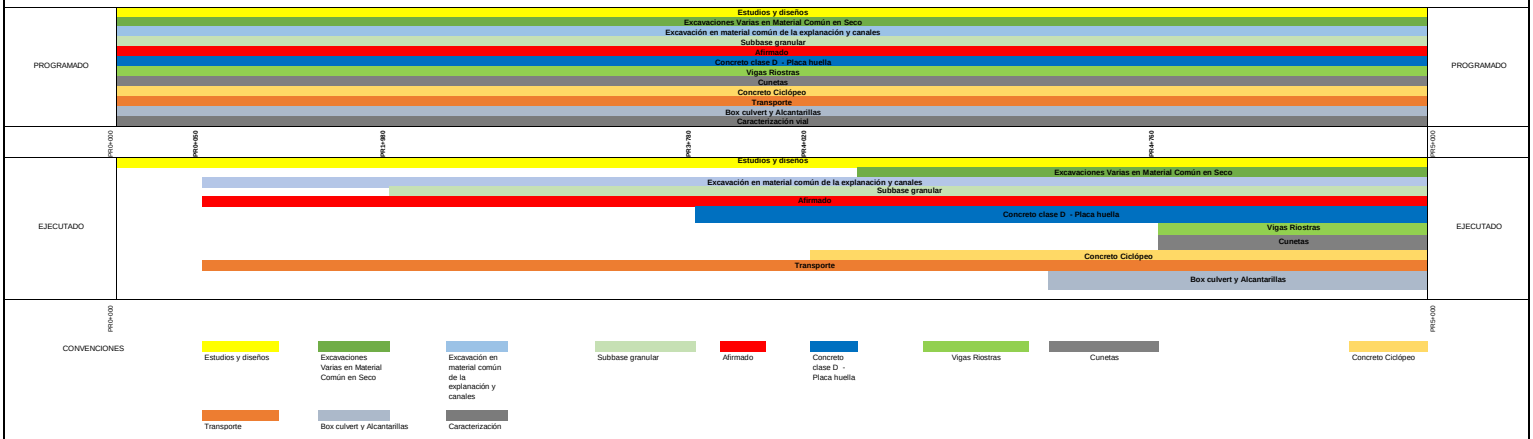

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y VIGAS RIOSTRA K 4+034. C. DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y VIGAS RIOSTRA K 4+034. C. DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y VIGAS RIOSTRA K 4+034. C. DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS reforzadas. K 3+800 . C-.DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS reforzadas. K 3+800 . C-.DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS reforzadas. K 3+800 . C-.DERECHO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ ORALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 64 del 3/11/2023 al 9/11/2023 **mo Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMIENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/12/2023

VALOR INICIAL:	$	8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$	2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$	831.674.261,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$	1.604.892.739,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL:	$	4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$	650.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$	368.980.099,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$	281.019.901,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 2.792.288.970,40	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.979.601.028,60	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.270.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.266.265.942,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.748.854,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	6.181.079.935,75	77,11%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(3.066.679.645,54)	-38,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	6.181.079.935,75	77,11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(3.066.679.645,54)	-38,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	434.708.429,48	5,42%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	12.278.180,70	0,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	1.912.169.265,00	41,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 146.393.712,00

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR IC

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 368.980.099,00
Saldo $	$ 281.019.901,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 77,11% Avance o Atraso Físico % -38,26%
Meta Física Ejecutada % 38,85%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1290			1290	26%
Box Coulvert	Und	10		10	Prog	10			10	100,0%
					Ejec	4			4	40,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje .
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes despuès de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución. **Seguimiento a actividades PAGA.**
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente al mes de octubre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	23	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	20	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030. Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social del mes de Octubre sin recibir Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se reactivaron las actividades en obra, ingreso material para construcción de placa huella. las actividades realizadas son :
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excvacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

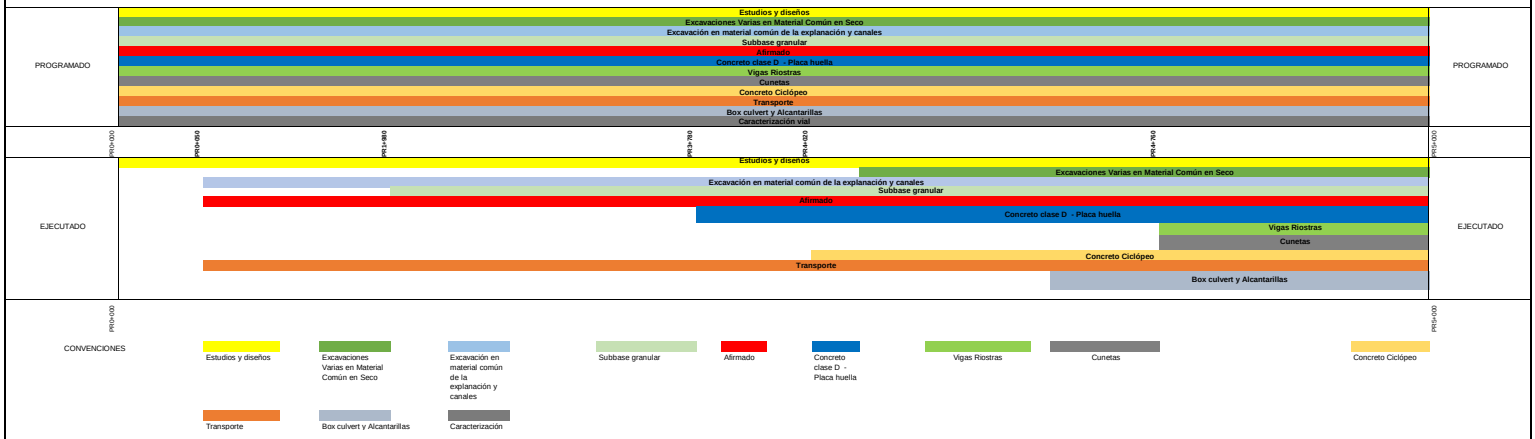

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y VIGAS RIOSTRA K 4+034. C. DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO CICLOPEO K 4+024. C. DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS REFORZADAS (HUELLA) K 4+006. C. DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS REFORZADAS. K 3+866 . C-.DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS REFORZADAS. K 3+866 . C-.DERECHO



CONFORMACIÓN DE CAPA UNICA DE SUB BASE GRANULAR. K 2+900 AL 1+800

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 16/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 65 (Numeración consecutiva) del 10/11/2023 al 16/11/2023 **mo Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 831.674.261,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.604.892.739,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 368.980.099,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 281.019.901,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 2.792.288.970,40	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.979.601.028,60	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.270.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.266.265.942,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.748.854,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 6.590.564.572,53	82,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.476.164.282,32)	-43,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.590.564.572,53	82,21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.476.164.282,32)	-43,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 409.484.636,78	5,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.912.169.255,00	41,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 146.393.712,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR IIC

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 368.980.099,00
Saldo $	$ 281.019.901,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 82,21% Avance o Atraso Físico %: -43,36%
Meta Física Ejecutada %: 38,85%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1290			1290	26%
Box Coulvert	Und	10		10	Prog	10			10	100,0%
					Ejec	4			4	40,0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Cordoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A
EMISIONES:	SI	NO X		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución. **Seguimiento a actividades PAGA.**
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción. Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente al mes de octubre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social del mes de Octubre sin recibir
- Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana no se realizaron actividades en obra,debido a la falta de material en para construcción de placa huella. el ingreso de material para el proyecto fue nulo. las actividades acumuladas son:
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excavacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

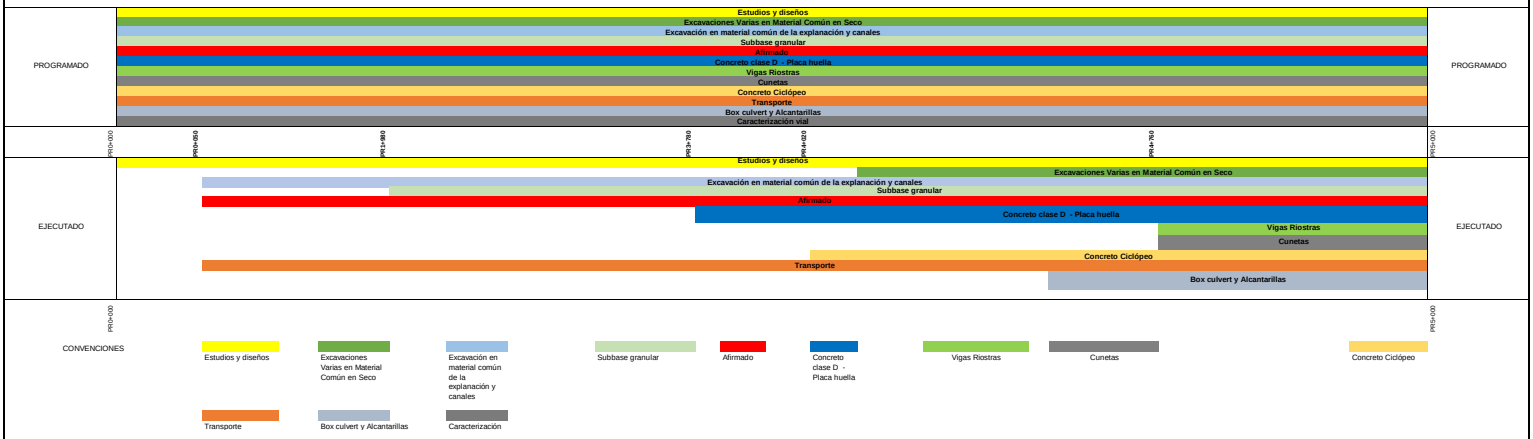

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



MAQUINARIA INACTIVA



MAQUINARIA INACTIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 23/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 66 (Numeración consecutiva) del 17/11/2023 al 23/11/2023 **mo Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%		INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/12/2023	VALOR ANTICIPO: $ 2.436.567.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO: $ 831.674.261,00			VALOR AMORTIZADO: $ 368.980.099,00
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.604.892.739,00			SALDO POR AMORTIZAR: $ 281.019.901,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 2.792.288.970,40	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.979.601.028,60	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.270.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.266.265.942,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.748.854,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.134.329.522,24	89,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.019.929.232,03)	-50,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.134.329.522,24	89,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.019.929.232,03)	-50,15%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 543.764.949,71	6,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.912.169.255,00	41,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 146.393.712,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 368.980.099,00
Saldo $	$ 281.019.901,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89,00% Avance o Atraso Físico %: -50,15%
Meta Física Ejecutada %: 38,85%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1290			1290	26%
Box Coulvert	Und	10		10	Prog	10			10	100,0%
					Ejec	4			4	40,0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Cordoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A
EMISIONES:	SI	NO X		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución. **Seguimiento a actividades PAGA.**
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción. Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente al mes de octubre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El dia 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social del mes de Octubre sin recibir
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana no se realizaron actividades, esta Interventoria pone en conocimiento la posible parálisis de la obra sin justa casusa desde el día 10 de noviembre de 2023, hechos que han quedado registrados en el libro de obra, dicha situación pone en riesgo latente la ejecución del contrato, ya que esto genera que de manera inmediata el Ente contratante, en este caso el Municipio de San Bernardo del Viento inicie las actuaciones jurídicas por el posible incumplimiento a las obligaciones contractuales y así poder salvaguardar los recursos del contrato.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excvacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

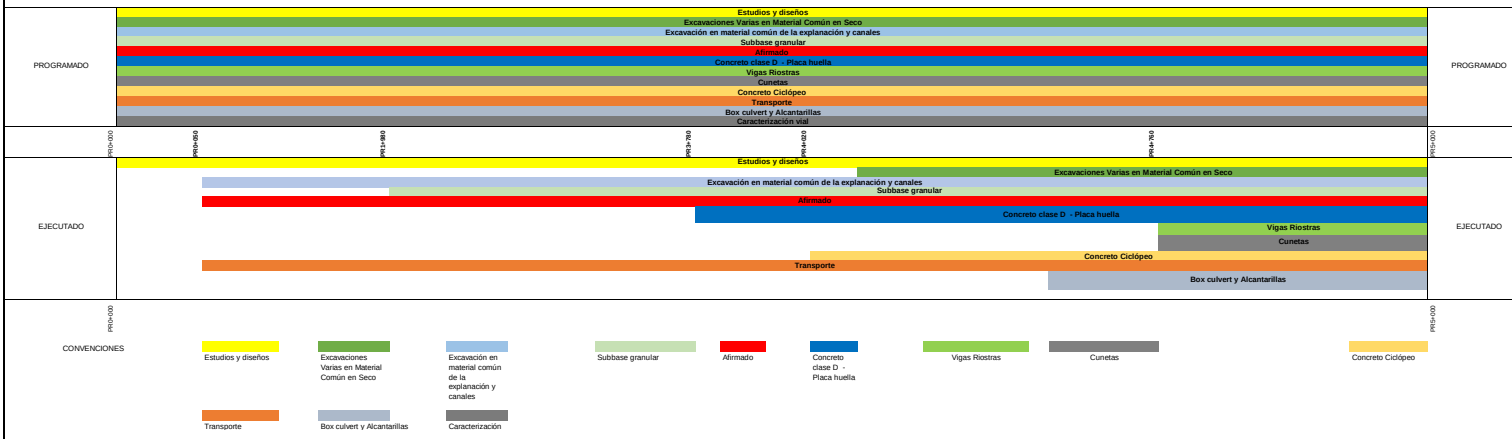

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



MAQUINARIA INACTIVA



MAQUINARIA INACTIVA

NOTA: Se le ha solicitado al contratista reactivar las actividades en obra de forma INMEDIATA, y esta interventoría reitero la recomendación al Municipio de San Bernardo del Viento, en el sentido de que apertura de manera INMEDIATA los procesos sancionatorios por los presuntos incumplimientos al Contrato de Obra Pública No. LP-MSBV-006-2022 por parte del CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO según lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Además de solicitar la caducidad del Contrato por hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 30/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 67 (Numeración consecutiva) del 24/11/2023 al 30/11/2023 **mo Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/12/2023

VALOR INICIAL:	$	8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$	2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$	886.239.634,80
SALDO POR AMORTIZAR:	$	1.550.327.365,20

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL:	$	4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	4.564.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$	650.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$	368.980.099,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$	281.019.901,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.154.459.481,20	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.617.430.517,80	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.270.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.266.265.942,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.748.854,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.530.562.009,92	93,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(4.416.161.719,71)	-55,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.530.562.009,92	93,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3.114.400.290,21	38,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(4.416.161.719,71)	-55,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	396.232.487,68	4,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	1.912.169.255,00	41,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$	54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 146.393.712,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	$	2.436.567.000,00
Amortizado $	$	886.239.634,80
Saldo $	$	1.550.327.365,20

INDICADOR IIC

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado $	$	650.000.000,00
Amortizado $	$	368.980.099,00
Saldo $	$	281.019.901,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 93,94%
Meta Física Ejecutada %: 38,85%
Avance o Atraso Físico %: -55,09%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1290			1290	26%
Box Coulvert	Und	10		10	Prog	10			10	100,0%
					Ejec	4			4	40,0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Cordoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO X	N/A
EMISIONES:	SI		NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución. **Seguimiento a actividades PAGA.**
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción. Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente al mes de octubre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El dia 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social del mes de Octubre sin recibir
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana no se realizaron actividades en obra,debido a la falta de materiales para construcción de placa huella. ;el suministro de material para la ejecución del proyecto fue nulo. las actividades acumuladas son:
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excavacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

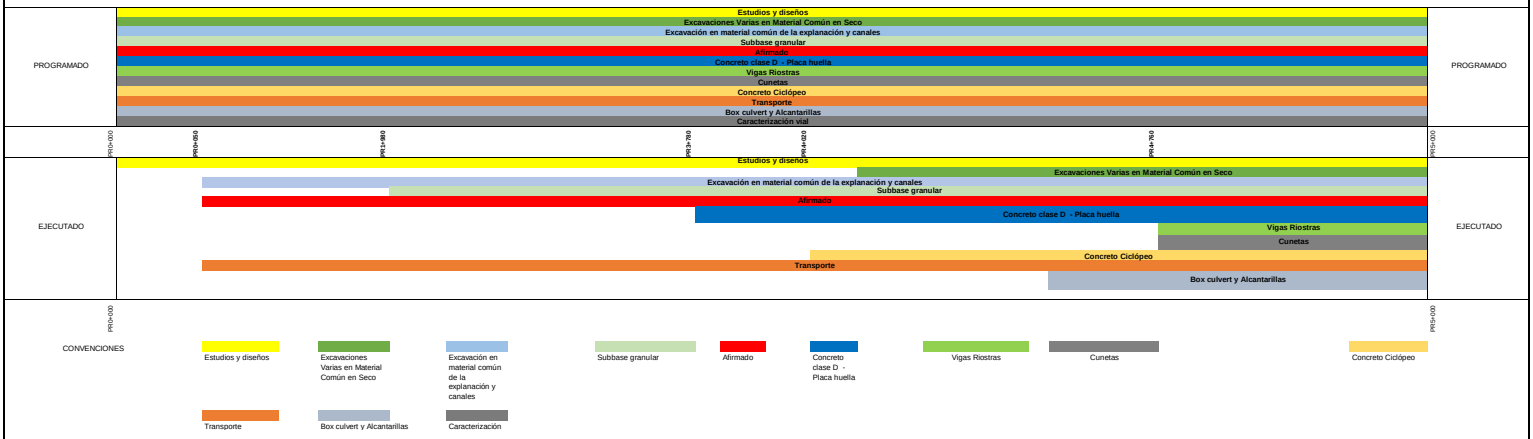

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS - CARRIL DERECHO. K 3+860 A 4+008



MAQUINARIA INACTIVA



MAQUINARIA INACTIVA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: noviembre-2023 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MINICARGADOR	Caterpila Cp-433C / 2022		San Bernardo del Viento	A	A	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MOTONIVELADORA			San Bernardo del Viento	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
RETROCARGADOR			San Bernardo del Viento	A	I	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR	Caterpillar-CS431B		San Bernardo del Viento	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
MEZCLADORA			San Bernardo del Viento	A	I	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VIBRADOR DE CONCRETO			San Bernardo del Viento	A	I	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
CARMIX			San Bernardo del Viento	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
CARRO HUMECTACIÓN			San Bernardo del Viento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA IMX-224			San Bernardo del Viento	A	I	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA SZA-124			San Bernardo del Viento	A	I	I	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			TOTAL ACTIVO	6	1	2	6	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL EN REPARACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			TOTAL INACTIVO	3	8	7	3	9	9	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	10%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	10%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	8	80%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): El formato no se encuentra diligenciado dado que el contrato se encontraba en revisión de los estudios y diseños del proyecto; por lo tanto, la maquinaria no fue trasladad a campo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se recomendó en obra realizar un mantenimiento total ala auto hormigonera Carmix 2.5 TT, puesto que a presentado fallas recurrentes durante este mes.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma
Nombre:ERIKC CAMARGO MORALES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSRV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2023 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VÍA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Porvenir, Protección, Colpensiones.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO	84.094.056	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9457800913	$ 80.000	COLPENSIONES	9457800913	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
2	ANDRÉS FABIÁN VILLALBA BARRIOS	10.772.157	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 2.400.000	$ 167.100	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 96.000	COLPENSIONES	9457800913	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
3	GONZALEZ FUENTES DAYANA MARCELA	1.003.459.220	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 46.400	COLPENSIONES	9457800913	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
4	CORONADO GONZALEZ JAVIER EDUARDO	10.820.409	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 24.300	V	NUEVA EPS	9457800913	$ 14.000	COLFONDOS	9457800913	$ 55.700	$ 14.000			
5	ALTAMIRANDA ALVAREZ JOSE CAMILO	1.067.842.072	TOPÓGRAFO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.800.000	$ 10.944.731	V	CAJACOPI	9457800913	$ 72.000	PORVENIR	9457800913	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
6	AVILA CORREA LUIS CARLOS	1.068.736.529	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 32.300	V	MUTUALSER	9457800913	$ 18.600	PORVENIR	9457800913	$ 74.300	$ 18.600			
7	AVILA QUERRA NEIVER ANTONIO	11.166.136	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 27.000	V	MUTUALSER	9457800913	$ 15.500	PORVENIR	9457800913	$ 61.900	$ 15.500			
8	AVILA RAMOS LUIS MANUEL	1.070.821.962	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400			
9	CASTRO AVILA OMAIRO	10.943.413	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 21.600	V	MUTUALSER	9457800913	$ 12.400	PORVENIR	9457800913	$ 49.500	$ 12.400			
10	DE LA HOZ BILLAR ALQUIDEZ RAFAEL	1.123.405.092	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	CAJACOPI	9457800913	$ 46.400	PROTECCIÓN	9457800913	$ 185.600	$ 46.400			
11	DURANGO OVIEDO JORGE ALEXANDER	1.067.971.701	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAS MAQUINAS DEL CARIBE SAS	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
12	FAJARDO MARTINEZ JULIO CESAR	10.944.731	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	$ 1.160.000	X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 10.800	V	MUTUALSER	9457800913	$ 6.200	PORVENIR	9457800913	$ 24.800	$ 6.200			
13	GERRERO FONSECA HELMER	9.273.669	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 53.900	V	NUEVA EPS	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 123.800	$ 46.400			
14	LEMUS ANGULO JESUS DAVID	1.043.635.137	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 37.700	V	NUEVA EPS	9457800913	$ 31.000	PORVENIR	9457800913	$ 86.700	$ 31.000			
15	MARTINEZ MARTINEZ AMAURY DE JESUS	73.091.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	CAJACOPI	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400			
16	MEDINA PERALTA JORGE ELIECER	17.953.908	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
17	MENDOZA BALLESTA PABLO	1.070.817.648	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 59.300	V	MUTUALSER	9457800913	$ 34.100	PROTECCIÓN	9457800913	$ 136.200	$ 34.100	$ -	$ -	
18	MORELO SUAREZ LEOBIGILDO ANTONIO	1.070.819.412	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 24.300	V	MUTUALSER	9457800913	$ 14.000	PORVENIR	9457800913	$ 55.700	$ 14.000	$ -	$ -	
19	NUÑEZ MARTINEZ JAIME ENRIQUE	10.943.765	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 53.900	V	MUTUALSER	9457800913	$ 31.000	PORVENIR	9457800913	$ 123.800	$ 31.000	$ -	$ -	
20	ORTIZ TABORDA JOSE ALFREDO	1.127.655.712	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 48.500	V	MUTUALSER	9457800913	$ 27.900	PORVENIR	9457800913	$ 111.400	$ 27.900			
21	PACHECO MORELO MANUEL VICENTE	1.070.812.240	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 27.000	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 9.300	PORVENIR	9457800913	$ 61.900	$ 15.500			
22	PADILLA QUINTANA EVER DE JESUS	1.070.823.163	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 43.100	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 24.800	PORVENIR	9457800913	$ 99.000	$ 24.800	$ -	$ -	
23	RIVAS GALEANO LUIS GERARDO	11.165.712	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 24.300	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 14.000	PORVENIR	9457800913	$ 55.700	$ 14.000	$ -	$ -	
24	PAULA ANDREA PARDO BONILLA	1.067.927.123	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAULA ANDREA PARDO BONILLA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9457784183	$ -	PORVENIR	9457784183		$ -	$ -	$ -	
25	TRICIA REGINA RUDA MOLINA	50.894.549	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRICIA REGINA RUDA MOLINA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457784183	$ -	PORVENIR	9457784183		$ -	$ -	$ -	
26	YURLEY PAJARO ORTIZ	1.070.816.923	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	YURLEY PAJARO ORTIZ	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457784183	$ -	PORVENIR	9457784183					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se relacionan los soportes de pago del mes de septiembre, cancelados en el mes de octubre del 2023, se le ha solicitado al contratista atravez de oficios la entrega de la planilla del mes de agosto..

El contratista adjunta la certificación de fecha ____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	215542913	9457576327	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$9,292,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1067842072	ALTAMIRANDA ALVAREZ JOSE CAMILO	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1068736529	AVILA CORREA LUIS CARLOS	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	11166136	AVILA GUERRA NEIVER ANTONIO	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	1070821962	AVILA RAMOS LUIS MANUEL	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1003562614	CASTILLO CONDE WILFRAN	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																							
6	CC	10943413	CASTRO AVILA OMAIRO	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/30																							
7	CC	10820409	CORONADO GONZALEZ JAVIER EDUARDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22																									
8	CC	85463491	DE LA HOZ PACHECO ERIS HURBANO	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/30																							
9	CC	1123405092	DE LA HOZ VILLAR ALCIDES RAFAEL	Dependiente	0	No	No																												
10	CC	1067971701	DURANGO OVIEDO JORGE ALEXANDER	Dependiente	0	No	No																												
11	CC	10944731	FAJARDO MARTINEZ JULIO CESAR	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/23	X	2023/08/30																							
12	CC	1003459220	GONZALEZ FUENTES DAYANA MARCELA	Dependiente	0	No	No																												
13	CC	1070811981	GONZALEZ MADERA EMERITA	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/19																							
14	CC	9273669	GUERRERO FONSECA HELMER	Dependiente	0	No	No																												
15	CC	10942362	HERNANDEZ PETRO SADIT MANUEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/01	X	2023/08/09																							
16	CC	1043635137	LEMUS ANGULO JESUS DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/26																							
17	CC	73091534	MARTINEZ MARTINEZ AMAURY DE JESUS	Dependiente	0	No	No																												
18	CC	17953908	MEDINA PERALTA JORGE ELIECER	Dependiente	0	No	No																												
19	CC	84094056	MEJIA TURIZO LUIS ANTONIO	Dependiente	0	No	No																												
20	CC	1070817648	MENDOZA BALLESTA PABLO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22																									
21	CC	1010103310	MORALES BELTRAN FELIPE	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/30																							
22	CC	1070819412	MORELO SUAREZ LEOBIGILDO ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/30																							
23	CC	10943765	NUÑEZ MARTINEZ JAIME ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																												
24	CC	1127655712	ORTIZ TABORDA JOSE ALFREDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/01	X	2023/08/12																							

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.800.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.800.000	16%	SIN RIESGO	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	4%	$ 72.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		NUEVA EPS MOVILIDAD	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		NUEVA E.P.S.	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		CAJACOPI	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		CAJACOPI	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	8	$ 309.334	16%	SIN RIESGO	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.500		MUTUAL SER	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		COOSALUD MOVILIDAD	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	19	$ 734.667	16%	SIN RIESGO	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.600		MUTUAL SER	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		MUTUAL SER	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	5	$ 193.334	16%	SIN RIESGO	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000		MUTUAL SER	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		SANITAS	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		MUTUAL SER	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		MUTUAL SER	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 72.000		COMFACOR	30	$ 1.800.000	4%	$ 72.000	ARL SURA	30	$ 1.800.000	6,96%	5	$ 125.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 12.400		COMFACOR	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	ARL SURA	8	$ 309.334	6,96%	5	$ 21.600	8	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 29.400		COMFACOR	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	ARL SURA	19	$ 734.667	6,96%	5	$ 51.200	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 7.800		COMFACOR	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	ARL SURA	5	$ 193.334	6,96%	5	$ 13.500	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 80.000		COMFACOR	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	ARL SURA	30	$ 2.000.000	6,96%	5	$ 139.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

Planilla Integrada

25	CC	10884388	OSORIO RODRIGUEZ [illegible]	Dependiente		0	No	No							X	2023/08/19																	
26	CC	1193235959	PALOMO MEJIA NEIDER LUIS	Dependiente		0	No	No							X	2023/08/30																	
27	CC	11165712	RIVAS GALEANO LUIS	Dependiente		0	No	No							X	2023/08/19																	
28	CC	1070808797	URANGO DIAZ ROBIN	Dependiente		0	No	No						X	2023/08/18	X	2023/08/30																	
29	CC	1003562697	USUGA PEREZ DERIS	Dependiente		0	No	No								X	2023/08/30																	
30	CC	70772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	Dependiente		0	No	No																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-08	2023-09	215342913	9457576327	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$9,292,200	

Total Afiliados(30)

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$4,661,200	$139,600	$0	$4,800,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$55,700	$1,700	$0	$57,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$889,600	$26,700	$0	$916,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,614,600	$78,200	$0	$2,692,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,101,300	$33,000	$0	$1,134,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,029,100	$60,700	$0	$2,089,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$2,029,100	$60,700	$0	$2,089,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,165,800	$34,900	$0	$1,200,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	30	$1,165,800	$34,900	$0	$1,200,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$1,165,800	$35,100	$0	$1,200,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$2,800	$0	$95,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$1,400	$0	$47,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$510,800	$15,300	$0	$526,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$34,200	$1,100	$0	$35,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$111,400	$3,400	$0	$114,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$290,200	$8,700	$0	$298,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$2,400	$0	$82,400
TOTAL				**30**	**$9,021,900**	**$270,300**	**$0**	**$9,292,200**

| | | |

$ 0	$ 29.400		COMFACOR	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	ARL SURA	19	$ 734.667	6,96%	5	$ 51.200	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 29.400		COMFACOR	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	ARL SURA	19	$ 734.667	6,96%	5	$ 51.200	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 20.200		COMFACOR	13	$ 502.667	4%	$ 20.200	ARL SURA	13	$ 502.667	6,96%	5	$ 35.000	13	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 96.000		COMFACOR	30	$ 2.400.000	4%	$ 96.000	ARL SURA	30	$ 2.400.000	6,96%	5	$ 167.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 1.165.800						$ 1.165.800						$ 2.029.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	215546201	9457576400	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$1,118,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	6890583	ALZAMORA MARTINEZ JOSE ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
2	CC	6617440	BELLO VERGARA JAVIER ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
3	CC	10941669	CARDENAS ALVAREZ ADALBERTO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
4	CC	1070819767	CARDENAS FAJARDO DAVID FELIPE	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/25	X	2023/08/25																						
5	CC	1070810879	CONDE BARRIOS LEINER ANDRES	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/18	X	2023/08/22																						
6	CC	1193569375	GARCIA PITALUA ALVARO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/23	X	2023/08/30																						
7	CC	1070816699	MADERA MUÑOZ ROGER LUIS	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/30																						
8	CC	1003562858	MERCADO TORRES PEDRO NEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
9	CC	1070820537	MONTES AVILA FRANCISCO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/18	X	2023/08/19																						
10	CC	1068736327	NUÑEZ REYES YOIDER ENRIQUE	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
11	CC	15022766	OROZCO SUAREZ JUAN BAUTISTA	Dependiente - Cotizante con indemnización sustitutiva o devolución de saldos	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
12	CC	1192736423	OSORIO PETRO LEINER	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
13	CC	1002508018	RIVERA CABEZA LUIS MIGUEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
14	CC	84093091	SALCEDO HERNANDEZ OSCAR ALFREDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
15	CC	1047486201	SUAREZ MARTINEZ HERNAN DARIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
16	CC	1070823927	VILLA ALTAMIRANDA CARLOS ALBERTO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
Total		**Afiliados(16)**																																				

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		NUEVA E.P.S.	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		NUEVA E.P.S.	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		MUTUAL SER	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	5	$ 193.334	16%	SIN RIESGO	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000		MUTUAL SER	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	8	$ 309.334	16%	SIN RIESGO	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.500		MUTUAL SER	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	2	$ 77.334	16%	SIN RIESGO	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400		NUEVA EPS MOVILIDAD	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo		0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		CAJACOPI	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		SALUD TOTAL	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		NUEVA EPS MOVILIDAD	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		MUTUAL SER	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
																					$ 557.300						$ 141.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 7.800		COMFACOR	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	ARL SURA	5	$ 193.334	6,96%	5	$ 13.500	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 12.400		COMFACOR	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	ARL SURA	8	$ 309.334	6,96%	5	$ 21.600	8	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 3.100		COMFACOR	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	ARL SURA	2	$ 77.334	6,96%	5	$ 5.400	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 141.500						$ 141.500						$ 245.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	215546201	9457576400	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$1,118,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$557,300	$16,800	$0	$574,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$6,200	$200	$0	$6,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$6,200	$200	$0	$6,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$396,300	$11,900	$0	$408,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$148,600	$4,500	$0	$153,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$245,200	$7,400	$0	$252,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$245,200	$7,400	$0	$252,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$141,500	$4,300	$0	$145,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	$141,500	$4,300	$0	$145,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$141,500	$4,700	$0	$146,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$14,000	$500	$0	$14,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,600	$100	$0	$1,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$1,600	$100	$0	$1,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$97,800	$3,000	$0	$100,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$20,200	$700	$0	$20,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$4,700	$200	$0	$4,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,600	$100	$0	$1,700
TOTAL				**16**	**$1,085,500**	**$33,200**	**$0**	**$1,118,700**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	215562663	9457529410	Y	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$590,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	12,5%	$ 145.000	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
																					$ 185.600						$ 145.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 145.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 145.000						$ 0						$ 242.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	215562663	9457529410	Y	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$590,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$5,600	$0	$191,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$5,600	$0	$191,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$242,400	$7,300	$0	$249,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$242,400	$7,300	$0	$249,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$4,400	$0	$149,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$4,400	$0	$149,400
TOTAL				3	$573,000	$17,300	$0	$590,300

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	229819155	9457784183	Y	2023/10/13	2023/10/20	BANCOLOMBIA	7	$577,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	12,5%	$ 145.000	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
																					$ 185.600						$ 145.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 145.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 145.000						$ 0						$ 242.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	229819155	9457784183	Y	2023/10/13	2023/10/20	BANCOLOMBIA	7	$577,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$242,400	$1,800	$0	$244,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$242,400	$1,800	$0	$244,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
TOTAL				3	$573,000	$4,300	$0	$577,300

4.8. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 3/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES INFORME MENSUAL: noviembre-2023

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 971de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	210343	Vias Terciarias Mejoradas	220117	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 1.350.000.000,00	$ -
2023	210344	Vias Terciarias Mejoradas	220119	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 6.771.889.999,00	$ 6.771.889.999
				TOTAL		$ 8.121.889.999,00	$ 6.771.889.999

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 8.121.889.999,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
0	ANTICIPO		$ 1.350.000.000,00	$ -	$ 1.350.000.000,00	$ -		$ 1.350.000.000	Registro No. 210343, 13/07/2022	$ -		NA			ANTICIPO
0	ANTICIPO		$ 1.086.567.000,00	$ -	$ 2.436.567.000,00	$ -		$ 2.436.567.000	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 5.685.322.999,00		NA			ANTICIPO
1	PARCIAL	may-23	$ 2.436.745.672,00	$ -	$ 2.436.745.672,00	$ 731.023.701,60	$ 1.705.721.970,40	$ 1.705.543.298	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.979.601.028,60	$ 5.685.144.327,00	NA			ACTA PARCIAL No.1
2	PARCIAL	ago-23	$ 335.501.868,00	$ -	$ 335.501.868,00	$ 100.650.560,40	$ 234.851.307,60	$ 1.604.892.738	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.744.749.721,00	$ 5.349.642.459,00	NA			ACTA PARCIAL No.2
3	PARCIAL	oct-23	$ 181.884.576,00		$ 181.884.576,00	$ 54.565.372,80	$ 127.319.203,20	$ 1.550.327.365	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.617.430.517,80	$ 5.167.757.883,00	NA			ACTA PARCIAL No.3
TOTALES			**$ 2.954.132.116**	**$ -**	**$ 2.954.132.116**	**$ 886.239.634,80**	**$ 2.067.892.481,20**	**$ 1.550.327.365,20**	**$ -**	**$ 3.617.430.517,80**	**$ 5.167.757.883,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 2.897.752.296,00	$ -	**$ 2.897.752.296,00**
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	**$ 56.379.820,00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 2.945.130.296,00	$ 9.001.820,00	**$ 2.954.132.116,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.9. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2023 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**Total**
Seco	18	24	22	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	22	24	24	22	24	18	22	24	24	20	24	24	24	24	24	685
Lluvias moderadas	4	0	2	2											4	2			2		6	2			4						28
Lluvias intensas	2	0		3											2																7
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Se anexa Registro pluviométrico del IDEAM-MAYO 2023-ESTACION SAN BERNARDO

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma
Nombre: ERICK AMID CAMARGO MORALES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202201974COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
1/11/2023 0:00	30.5	50		900
2/11/2023 0:00	0	50		900
3/11/2023 0:00	21	50		900
4/11/2023 0:00	0	50		900
5/11/2023 0:00	20.3	50		900
6/11/2023 0:00	0	50		900
7/11/2023 0:00	6.5	50		900
8/11/2023 0:00	0	50		900
9/11/2023 0:00	0	50		900
10/11/2023 0:00	0	50		900
11/11/2023 0:00	17.4	50		900
12/11/2023 0:00	0	50		900
13/11/2023 0:00	1.9	50		900
14/11/2023 0:00	11.8	50		900
15/11/2023 0:00	0	50		900
16/11/2023 0:00	0.5	50		900
17/11/2023 0:00	0.9	50		900
18/11/2023 0:00	19.5	50		900
19/11/2023 0:00	1.2	50		900
20/11/2023 0:00	1.9	50		900
21/11/2023 0:00	8.7	50		900
22/11/2023 0:00	0	50		900
23/11/2023 0:00	0	50		900
24/11/2023 0:00	1.7	50		900
25/11/2023 0:00	0	50		900
26/11/2023 0:00	0	50		900
27/11/2023 0:00	0	50		900
28/11/2023 0:00	0	50		900
29/11/2023 0:00	0	50		900
30/11/2023 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
			VERSIÓN	1
			PAGINA	

FECHA: 5/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2022 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG


RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha toma del Ensayo (Día/Mes/Año)	Fecha roturadel Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo(PSI)	porcentaje de aceptación	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA											
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
1	26/08/2023	1/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	K4+350 - KK4+260… VIGA RIOSTRA - DER	1	3000 PSI	3048 PSI	100%	SI	
2	26/08/2023	1/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	K4+456 - K4+400…CUNETA Y VIGA RIOSTRA - IZQ	1	3000 PSI	3608 psi	100%	SI	
3	7/09/2023	1/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	K4+610 - K4+584 - CUNETA DER	1	3000 PSI	4080 PSI	100%	SI	
4	14/09/2023	1/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	K4+350 - K4+267…CUNETA - DERECHO	1	3000 PSI	4627 PSI	100%	SI	
5	18/10/2023	16/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	K3+738 - K3+800 - HUELLA DER	1	3000 PSI	4000 PSI	100%	SI	
6	19/10/2023	17/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	K3+709 - K3+789 - CICLOPEO - DERECHO	1	3000 PSI	4137 PSI	100%	SI	

Se hace la observacion que desde el 10 de noviembre del presente año fueron suspendidas las actividades de ejecución del contrato de obra LP-MSBV-006-2022 sin justa causa, ademas se le realizo requerimiento al contratista para que hiciera la entrega de los resultado de los ensayos de las muestras de concretos tomadas en el mes de octubre que tienen pendientes por entregar y hasta la fecha no se ha recibido ninguna documentacion al respecto.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma
Nombre: ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR



Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NIT. 900.238.905-8
RÉGIMEN COMÚN

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO
NORMA INVIAS E-410-13

VERSION	1
FECHA	15/05/2021
ENSAYO No	90


CLIENTE: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

LOCALIZACION : CORREGIMIENTO EL CASTILLO PLACA - SAN BERNARDO DEL VIENTO **EQUIPO:** PC-42

OBRA: PLACA HUELLA EL CASTILLO SAN BERNARDO DEL VIENTO - CORDOBA

FECHA:NOVIEMBRE 19 DE 2023

ABSCISAS	UBICACIÓN CONCRETO	RESISTENCIA DISEÑO (PSI)	No CILINDRO	FECHA AAAA/MM/DD		EDAD (DIAS)	DIAMETRO CILINDRO (mm)	ALTURA CILINDRO (mm)	PESO DEL CILINDRO (KG)	DENSIDAD (TON/M3)	CARGA MAXIMA KN	RESISTENCIA (PSI)	TIPO DE FALLA
				TOMA	ROTURA								
K4+479-K4+546	CUNETA IZQ	3000	01	24/08/2023	01/11/2023	69	154,00	304	12,8	2,259	341,9	2.661	D
K4+350-K4+260	VIGA RIOISTRA DER	3000	02	26/08/2023	01/11/2023	67	153,00	304	12,9	2,302	386,5	3.048	E
K4+456-K4+400	VIGA RIOISTRA CUNETA DER	3000	03	26/08/2023	01/11/2023	67	153,00	304	12,8	2,293	457,5	3.608	C
K4+610 - K4+584	CUNETA DER	3000	04	07/09/2023	01/11/2023	55	153,00	304	13,2	2,362	517,4	4.080	D
K4+350 - K4+267	CUNETA DER	3000	05	14/09/2023	01/11/2023	48	153,00	304	12,8	2,292	586,7	4.627	D
K3+738 - K3+800	HUELLA IZQ	3000	05	18/10/2023	16/11/2023	29	154,00	304	12,8	2,262	513,9	4.000	E
K3+709-K3+784	CICLOPEO	3000	06	19/10/2023	17/11/2023	29	153,00	304	12,8	2,290	524,6	4.137	E

TIPO A  TIPO B  TIPO C  TIPO D  TIPO E 

CLIENTE: ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCION PARCIAL, TOTAL SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO INCICONSULTA LTDA

OBSERVACIONES: MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO



ING JUAN PABLO FLOREZ REVOLLO

ING GEOTECNISTA MAT # 1320254096 BLV

Powered by CamScanner

4.11. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES
PLAZO ADICIONAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	23	8	2022	23	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	23	8	2022	23	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	23	8	2022	23	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	4	2023	23	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	4	2023	23	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100217190

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 500.000.000,00	23	8	2022	23	4	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100049452 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	4	12	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	28	7	2023	28	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	28	7	2023	28	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	28	7	2023	29	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	11	2023	23	11	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	11	2023	23	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 6

Certificado de modificación o anexo No.: NB-100217190
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 580.000.000,00	23	8	2022	23	11	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 7 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. NB-100049452
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: eTNup4YySqjOnqd/Zql7zg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71707679	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114061089
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	TELÉFONO	7758011
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	TELÉFONO	7758011

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL N.02 DE FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023, SE AJUSTAN LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.. LP-MSBV-006-2022. , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/07/2023	24:00 Horas Del 28/03/2024	812.188.999,90	427.233,67
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 28/07/2023	24:00 Horas Del 28/03/2024	2.436.566.999,70	1.281.701,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/07/2023	24:00 Horas Del 29/11/2026	1.624.377.999,80	872.268,73
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 28/11/2028	16.913.946,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 28/11/2028	2.436.566.999,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.326.614.945,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2.581.203,40
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.581.203,40
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	490.428,65
TOTAL A PAGAR	$	3.071.632,05

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71707679	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACLARAMOS BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS 812004943 PARTICIPACION 90%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100217190** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2 / MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2** , expedida por la Compañía en **04/08/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **05** días del mes **AGOSTO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ObKVhd/5u0cJwkxO7PRUlA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71707680	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114061089
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114061089
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL N.02 DE FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023, SE AJUSTAN LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO. LP-MSBV-006- 2022. MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO.

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	308.273,97
PATRONAL	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	308.273,97
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	308.273,97
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	58.572,05
TOTAL A PAGAR	$	366.846,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71707680	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS 812004943 PARTICIPACION 90%

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.12. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 10/09/2022

OBSERVACIONES: No presenta información suficiente para la ejecución del proyecto, garantizando recursos y calidad. Este plan es en sí una intención de cumplir los requisitos de la ISO9001 e ISO10005 pero no establece como lo realizará. No presentan información básica a la que se debe hacer seguimiento como plan de inspeción y ensayo, planeación metrológica, plan ante productos no conformes, defectuosos o control de quejas entre otros.
Se solicita presentar un plan de calidad con mayor detalle de como el contratista cumplira los requisitos de la entidad controtante, normativas y sus necesidades internas de Sistema de Gestión de Calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:
No se presento programa de auditoria.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO **X** APROBADO: NO **X** FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 91 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO **X**

OBSERVACIONES:
No se presenta Plan de inspección y ensayo al cual se le hace seguimientos mensuales de acuerdo con los requisitos del INVIAS.
Presentan indicadores de gestión pero no tiene en cuenta los principales a controlar por el cliente que son los avances fisicos y facturación.
Se solicita que se complementen los planes de inspección y ensayo, sin embargo se hace seguminiento al cumplimiento de las especificaciones del INVIAS.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 21
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 20
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 1

OBSERVACIONES:
Ver anexo de No Conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 3
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2
No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 1

OBSERVACIONES:
Para el mes de julio no se recibieron PQR, que son basicamente situaciones con los propietarios y las comunidades que intervienen en la ejecucion de la obra.
Ver anexo de quejas

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**41%**	**Cumplimiento en ejecución de inversión:** $Ejecutado / $Programado * 100
IG2: Índice de gestión 2 =	**0%**	**Satisfacción del cliente:** No. De encuestas sobresalientes y adecuadas / No. Encuestas efectuadas *100
IG3: Índice de gestión 3 =	**41%**	**Cumplimiento en el avance de obra física:** Cantidad de obra ejecutada / Total de obra programada * 100
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

En el mes de julio se tuvo un aproximado una ejecución del 37,41% con un atraso considerable respecto a lo programado. Ver anexo de Indicadores.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	HORNO	PINZUAR	263	2/08/2021	T-23908-004 R0	2/08/2022	
2	NIVEL AUTOMATICO	LINERTEC	106865	29/04/2022	N-087-22	29/10/2022	
3	ESTACION TOTAL	TOPCON	CS5208	15/02/2022	OS102	15/08/2022	
4	ESTACION TOTAL	CYGNUS	HV5305	29/04/2022	E-090-22	29/10/2022	
5	ESTACION TOTAL	TOPCON	UL3181	15/05/2022	1250	15/11/2022	
6	ESTACION TOTAL	TOPCON	V10677	26/05/2022	1622	25/11/2022	
7	ESTACION TOTAL	TOPCON	3W0695	1/02/2022	2K1292	2/08/2022	
8	ESTACION TOTAL	TOPCON	284994	19/12/2022	3685	18/06/2023	
9	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS170461	30/09/2022	1901	30/09/2023	

OBSERVACIONES:

En el mes de julio no se presentaron los certificados de calibración de los equipos de topografía y laboratorio, dejando aclaracion de que estos ya estan vencidos como se habia notificado los meses pasados.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: DIANA MARIA MONTANO ORTIZ
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 7620282844VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ID	MES	Especificación	Descripción	unidad	Cantidad ejecutada	Material/ Insumo	Ensayos	Frecuencia	Cant. Esperada	Cant. Presentada	Observación
	Total Inicio								0	0	
	Total feb-23								67	1	
	Total mar-23								76	7	
	Total abr-23								67	14	
	Total may-23								74	3	
	Total jun-23								103	16	
424	jul-23	630	Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	6,09						
425	jul-23	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
426	jul-23	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
427	jul-23	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
428	jul-23	630	Concreto clase C (280 kg/cm2 o 4000 PSI)- TABLEROS, ESTRIBUS, BASE Y ALETAS	m3	79,64						
429	jul-23	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
430	jul-23	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	2	0	
431	jul-23	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	2	0	
432	jul-23	640	Acero de refuerzo de Fy=4.200 Kg/cm2 (60000 PSI)	kg	79794	Acero	Protocolo de calidad del proveedor	Por lote de producción	1	0	
433	jul-23	320	Subbase Granular Clase C	m3	2867,4						
434	jul-23	320				subbase granular tipo A	Granulometría	Una (1) vez por jornada	1	0	
435	jul-23	320				subbase granular tipo A	Desgaste en la máquina de los ángeles (en seco, 500 revoluciones)	Una (1) vez por mes	1	0	
436	jul-23	320				subbase granular tipo A	degradaciòn por abrasiòn en el equipo Micro-Deval	Una vez por semana	4	0	
437	jul-23	320				subbase granular tipo A	Solidez (por sodio y magnesion)	Una (1) vez por mes	1	0	
438	jul-23	320				subbase granular tipo A	Límite Líquido	Una vez por jornada	1	0	
439	jul-23	320				subbase granular tipo A	Índice de Plasticidad	Una vez por jornada	1	0	
440	jul-23	320				subbase granular tipo A	Equivalente de arena (agregado combinado)	Una vez por semana	4	0	
441	jul-23	320				subbase granular tipo A	Contenido de terrones de arcilla y particulas deleznables	Una (1) vez por mes	1	0	
442	jul-23	320				subbase granular tipo A	CBR	Una (1) vez cada 15 dìas	2	0	
443	jul-23	320				subbase granular tipo A	Proctor	Una (1) vez cada 15 dìas	2	0	
444	jul-23	320				subbase granular tipo A	Densidad	El menor volumen que resulte de 500 ml de capa compactada, en el ancho total; ó 3500 m2 ó volumen en una jornada de trabajo.	3	0	

445	jul-23	311	Afirmado 15cm (Material para Mejoramiento, utilizar CBR de acuerdo a la guía, CBR ≤3%)	m3	9300,25						
446	jul-23	311				Afirmado	Desgaste	Por fuente	1	0	
447	jul-23	311				Afirmado	Solidez	Por fuente	1	0	
448	jul-23	311				Afirmado	Límite líquido	Por fuente	1	0	
449	jul-23	311				Afirmado	Indice de plasticidad	Por fuente	1	0	
450	jul-23	311				Afirmado	contenido de terrones	Por fuente	1	0	
451	jul-23	311				Afirmado	contracción lineal	Por fuente	1	0	
452	jul-23	311				Afirmado	CBR	Por fuente	1	0	
453	jul-23	311				Afirmado	Granulometría	Por fuente	1	0	
454	jul-23	311				Afirmado	Granulometría	1 vez por jornada	1	0	
455	jul-23	311				Afirmado	Límite líquido	1 vez por jornada	1	0	
456	jul-23	311				Afirmado	Indice de plasticidad	1 vez por jornada	1	0	
457	jul-23	311				Afirmado	contracción lineal	1 vez por jornada	1	0	
458	jul-23	311				Afirmado	Proctor modificado	1 vez por jornada	1	0	
459	jul-23	311				Afirmado	Densidad	cada 500 ml, 3500 m2 o 1 vez por jornada	9	0	
460	jul-23	630	Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI)- PLACA HUELLA- VIGAS RIOSTRAS- CUNETAS	m3	564,5						PLACA HUELLA = 382.5 + VIGAS RIOSTRAS = 44.4 CUNETAS = 137.6 =TOTAL = 564.5
461	jul-23	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
462	jul-23	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	12	0	
463	jul-23	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	12	0	
464	jul-23	630	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c= 21 Mpa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	228,58						
465	jul-23	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
466	jul-23	630				Agregado ciclópeo	Tamaño Máx	Diseño de mezcla	1	0	
467	jul-23	630				Agregado ciclópeo	Rel L/A	Diseño de mezcla	1	0	
468	jul-23	630				Agregado ciclópeo	Desgaste	Diseño de mezcla	1	0	
469	jul-23	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	5	0	
470	jul-23	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	5	0	
	Total jul-23								91	0	
	Total general								478	41	

ANEXO DE NO CONFORMIDADES							
MES	**CONTRATISTA**	**OFICIO/ NOTA BITÁCORA**	**NO CONFORMIDAD**	**OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO**	**CERRADO EN EL MES?**	**CERRADO?**	**MES CIERRE**
nov-22	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-219-2023	Atraso del contrato de obra.	dio respuesta	SI		nov-22
nov-22	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-249-2023	Reiteración de solicitud de notificación de la dirección exacta de la sede de servicio de atención al usuario.	entregado	SI		nov-22
nov-22	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-262-2023	Reiteración de atraso del contrato de obra.	no respondio		SI	dic-22
dic-22	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-370-2022	Remision NO conformidad calidad de afirmado	dio respuesta	SI		dic-22
dic-22	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-385-2022	Reiteracion aprobacion PMT ante entidad correspondiente	no presento	SI		ene-23
ene-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-079-2023	Reiteracion solicitud respuesta revision y/o actualizacion estudios y diseños	no entrego		SI	mar-23
ene-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-085-2023	Solicitud implementacion plan de contingencia	no entrego		SI	feb-23
ene-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-133-2023	Requerimiento equipo de maquinaria minimo	no respondio		SI	feb-23
feb-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-183-2023	Requerimiento equipo de maquinaria minimo	si cumple	SI		feb-23
feb-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-184-2023	NO conformidad calidad de material de afirmado	subsanado	SI		feb-23
feb-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-193-2023	No conformidad con la calidad del material de subbase	no presento	SI		feb-23
feb-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-200-2023	Solicitud aumentar rendimientos de obra y presentar plan de trabajo diario. Atraso de obra	no presento	SI		feb-23
feb-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-215-2023	Reiteración legalizacion del anticipo	entregado		SI	mar-23
feb-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-243-2023	Atraso en la ejecución de actividades	no respondio	SI		feb-23

mar-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-333-2023	Observaciones al diseño geometrico		SI		mar-23
mar-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-378-2023	Seguimiento compromisos pactados comité de obra No 6 del 27/02/2023		SI		mar-23
mar-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-399-2023	Modificacion plan inversion del anticipo		SI		mar-23
may-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-674-2023	REITERACION OFICIO CVRIMG-634-2023				
may-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-698-2023	INCUMPLIMIENTO AMPLIACION DE GARANTIAS CONTRACTUALES		SI		may-23
may-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-754-2023	Incumplimiento en calidad en material de Subbase granular-12 de mayo- 2022.		SI		may-23
may-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-757-2023	Retiro de material de afirmado		SI		may-23
jul-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-1034-2023	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-1018-2023 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO				
jul-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-1035-2023	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-1019-2023 SOLICITUD INFORME MENSUAL MES DE JUNIO				
jul-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-1060-2023	Reiteración comunicado CVRIMG-955-2023 con asunto: Observaciones a informes de gestión ambiental (febrero, marzo y abril 2023)				
jul-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-1081-2023	REITERACIÓN OFICIO CVRIMG-1034-2023 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO.				
jul-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-1084-2023	Reiteración del comunicado CVRIMG-678-2023, cuyo asunto es solicitud de ensayos de extracción de núcleos.				
jul-23	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	CVRIMG-950-2023	Reiteración Recomendación de aplicación apremio de multa por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales				

4.13. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO
Vial San Bernardo

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

DPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento

PÁGINA	1

DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	7	9	2022

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LP-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL:X** **PLAN No.1** **MODIFICACIÓN:**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANBERNARDO

REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

REP.LEGAL FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO

VR. CONTRATO:	8.121.889.999		PORCENTAJE DE ANTICIPO :	30,0%
VR. ANTICIPO:	1.350.000.000	1.350.000.000	% IMP. MUNICIPALES	0,0%
VR. IMPUESTOS:	0			
VR. ANTICIPO RECIBIDO:	0			

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Mano de Obra	100.000.000,00	7,41%	150.000.000,00	11,11%	49.200.000,00	3,64%	299.200.000,00	22,16%
2	Transporte de Materiales	340.800.000,00	25,24%	100.000.000,00	7,41%		0,00%	440.800.000,00	32,65%
3	Suministro de Materiales	300.000.000,00	22,22%	150.000.000,00	11,11%		0,00%	450.000.000,00	33,33%
4	Alquiler de equipos y herramientas	100.000.000,00	7,41%	60.000.000,00	4,44%		0,00%	160.000.000,00	11,85%
TOTAL		840.800.000,00	62,28%	460.000.000,00	34,07%	49.200.000,00	3,64%	1.350.000.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO
Representante Legal
Consorcio Vial San Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Interventor

CONSORCIO
Vial San Bernardo
Nit: 901611859-1

MUNUICIPIO DE SAN BERNARDO
DPARTAMENTO DE CORDOBA
MODIFICACION 1 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

DE	1

DD	MM	AA
8	3	2023

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LF-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** **MODIFICACION** X **PLAN No.**
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- VIA CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG
REP. LEGAL FREDY RODRIGUEZ
VR. CONTRATO: 8.121.889.999
VR. ANTICIPO: 2.436.567.000
VR. ANTICIPO A RECIBIR 1.086.567.000
VR. ANTICIPO RECIBIDO: 1.350.000.000

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%
% IMP. MUNICIPALES: 0%

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta critica del programa de obra.

No.	DESCRIPCION	VR. MES 1	%	VR. MES 2	%	VR. MES 3	%	VR. MES 4	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Contratode Mano de Obra	$ 100.000.000	4,10%	150.000.000,00	6,16%	49.200.000,00	2,02%	98.797.000,00	4,05%	397.997.000,00	16,33%
2	Transporte de Materiales y equipos	$ 340.800.000	13,99%	100.000.000,00	4,10%			350.000.000,00	14,36%	790.800.000,00	32,46%
3	Suministro de Materiales	$ 300.000.000	12,31%	150.000.000,00	6,16%			400.000.000,00	16,42%	850.000.000,00	34,89%
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 100.000.000	4,10%	60.000.000,00	4,44%			237.770.000,00	9,76%	397.770.000,00	16,33%
TOTAL		840.800.000,00	34,51%	460.000.000,00	20,86%	49.200.000,00	2,02%	1.086.567.000,00	44,59%	2.436.567.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA
Representante Legal
Consorcio vial Sa Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOS
Secretario de Infraestructura Municipio de San Bernardo Del Viento
Supervisor De Obra

FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio vial IMG
Interventor

Powered by CamScanner

MEPI-MN1-IN-2-FR-2, INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	05/12/2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 13 **MES:** nov-2023 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | |

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15593 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 687-000021-91 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.350.000.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	AVANZAR CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	Mano de obra
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	INTEGRA2 SAS	$ 340.800.000,00	2	Transporte de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	356	6-oct-22	JANNE MIQUEL ROQUEME RAFAEL	$ 300.000.000,00	3	Suministro de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.	$ 100.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	TOPOGRAFIA TOTAL ALTAMIRANDA SAS	$ 199.200.000,00	1	Mano de obra
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	INTEGRA2 SAS	$ 100.000.000,00	2	Transporte de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS	$ 60.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	4	5-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 147.648.570,00	3	Suministro de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	5	19-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 2.351.000,00	3	Suministro de materiales

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Mano de Obra	$ 397.997.000,00	$ 299.200.000,00	$ -	$ 299.200.000,00	$ 98.797.000,00
2	Transporte de Materiales	$ 790.800.000,00	$ 440.800.000,00	$ -	$ 440.800.000,00	$ 350.000.000,00
3	Suministro de Materiales	$ 850.000.000,00	$ 449.999.570,00		$ 449.999.570,00	$ 400.000.430,00
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 397.770.000,00	$ 160.000.000,00	$ -	$ 160.000.000,00	$ 237.770.000,00
	TOTALES	$ 2.436.567.000,00	$ 1.349.999.570,00	$ -	$ 1.349.999.570,00	**$ 1.086.567.430,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (DIC) : 5 (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 434.243,91 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
15593 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 228.978,69	oct-22	10/11/2022	$ 228.978,69
15593 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 197.569,56	nov-22	12/12/2022	$ 426.548,25
15594 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 7.695,66	dic-22	28/12/2022	$ 434.243,91

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.


Firma:
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

• Seguimiento al programa de obra


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**	**274 días**	**mar 23/08/22**	**dom 23/04/23**		**$ 8.123.957.999,00**
2		INICIO	0 días	mar 23/08/22	mar 23/08/22		$ 0,00
3		**I. EXPLANACIONES**	**22 días**	**dom 18/09/22**	**sáb 8/10/22**		**$ 100.839.101,00**
4		Excavaciones varias en material común en seco.	1 día	vie 7/10/22	sáb 8/10/22	5	$ 9.864.101,00
5		Excavación en material común de la explanación y canales	21 días	dom 18/09/22	vie 7/10/22	27	$ 90.975.000,00
6		**II. ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER DE 2.5X2.5 L=7M (CANTIDAD 1UND)**	**86 días**	**sáb 28/01/23**	**vie 14/04/23**		**$ 106.553.207,00**
7		Excavaciones varias en materia común en seco a mano	6 días	lun 30/01/23	sáb 4/02/23	8	$ 4.689.216,00
8		Demolición de estructuras	2 días	sáb 28/01/23	lun 30/01/23	19	$ 895.114,00
9		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PS	4 días	sáb 4/02/23	mié 8/02/23	7	$ 2.877.815,00
10		Concreto clase C (280kg/cm2 ó 4000 PS	23 días	vie 3/03/23	jue 23/03/23	11FC-4 días	$ 48.537.494,00
11		Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	30 días	mié 8/02/23	lun 6/03/23	9	$ 47.730.842,00
12		Relleno para Estructuras con material excavacion	22 días	lun 20/03/23	sáb 8/04/23	10FC-4 días	$ 296.950,00
13		Relleno para Estructuras con recebo	29 días	lun 20/03/23	vie 14/04/23	12CC	$ 1.525.776,00
14		**III. PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5.3M Y LONGITUD DE 5300M**	**43 días**	**mié 21/12/22**	**sáb 28/01/23**		**$ 7.529.166.899,00**
15		Subbase Granular Clase C.	17 días	mié 28/12/22	jue 12/01/23	16FC-5 días	$ 1.207.775.000,00
16		Afirmado (Material para Mejoramiento)	12 días	jue 22/12/22	dom 1/01/23	23FC-10 días	$ 411.562.500,00
17		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	24 días	mar 27/12/22	mar 17/01/23	18FC-20 días	$ 2.370.659.200,00
18		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	25 días	vie 23/12/22	sáb 14/01/23	20FC-20 días	$ 373.378.824,00
19		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	24 días	sáb 7/01/23	sáb 28/01/23	21FC-3 días	$ 907.517.975,00

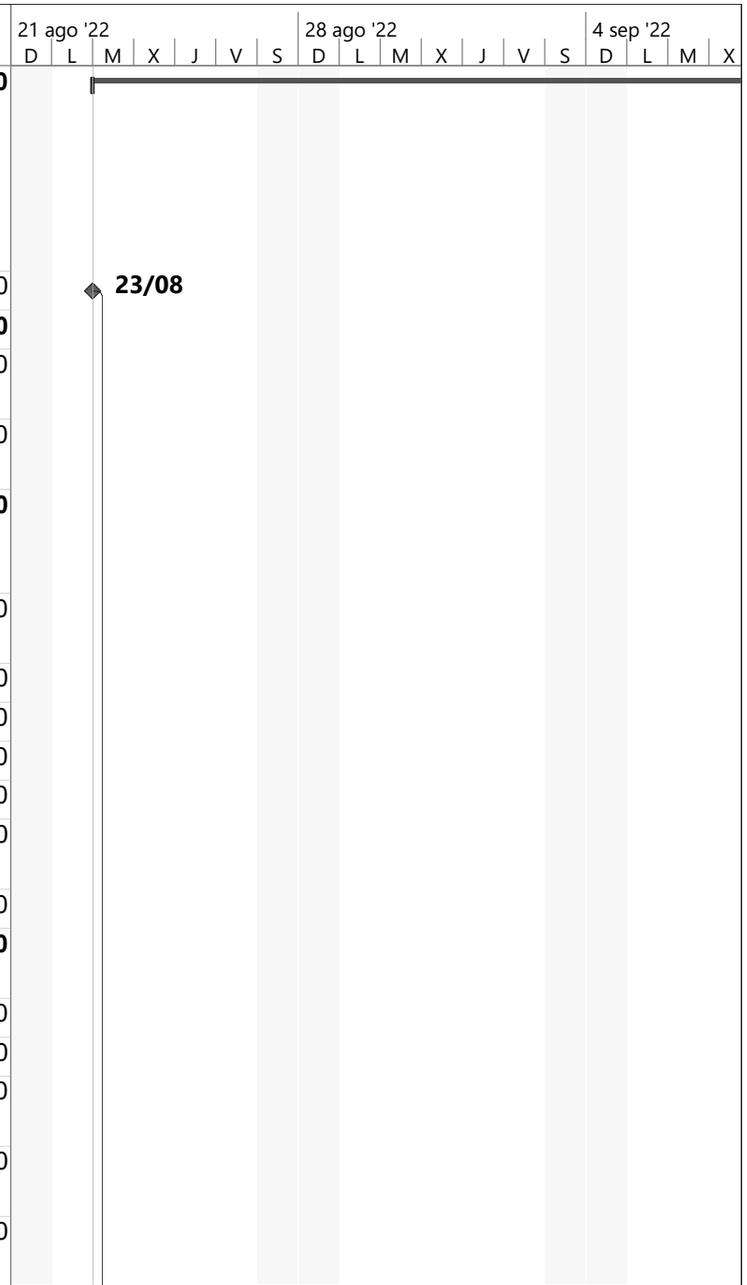

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23


Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
20		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	22 días	mié 21/12/22	lun 9/01/23	15FC-25 días	$ 1.225.089.600,00
21		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	21 días	jue 22/12/22	lun 9/01/23	17FC-30 días	$ 1.033.183.800,00
22		**IV. TRANSPORTE**	**95 días**	**vie 7/10/22**	**vie 30/12/22**		**$ 278.203.608,00**
23		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	95 días	vie 7/10/22	vie 30/12/22	5	$ 278.203.608,00
24		**V. CARACTERIZACIÓN VIAL**	**10 días**	**vie 14/04/23**	**dom 23/04/23**		**$ 3.710.000,00**
25		Caracaterización del corredor	10 días	vie 14/04/23	dom 23/04/23	13	$ 3.710.000,00
26		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	10 días	vie 14/04/23	dom 23/04/23	25CC	$ 49.105.364,00
27		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	mar 23/08/22	dom 18/09/22	2	$ 56.379.820,00
28		FIN DEL PROYECTO	0 días	dom 23/04/23	dom 23/04/23	26;25	$ 0,00

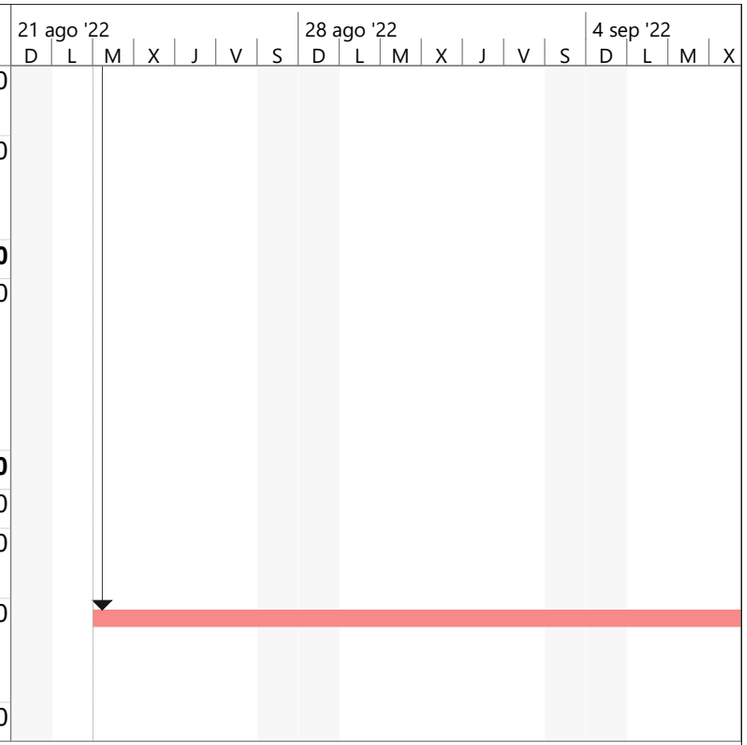


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

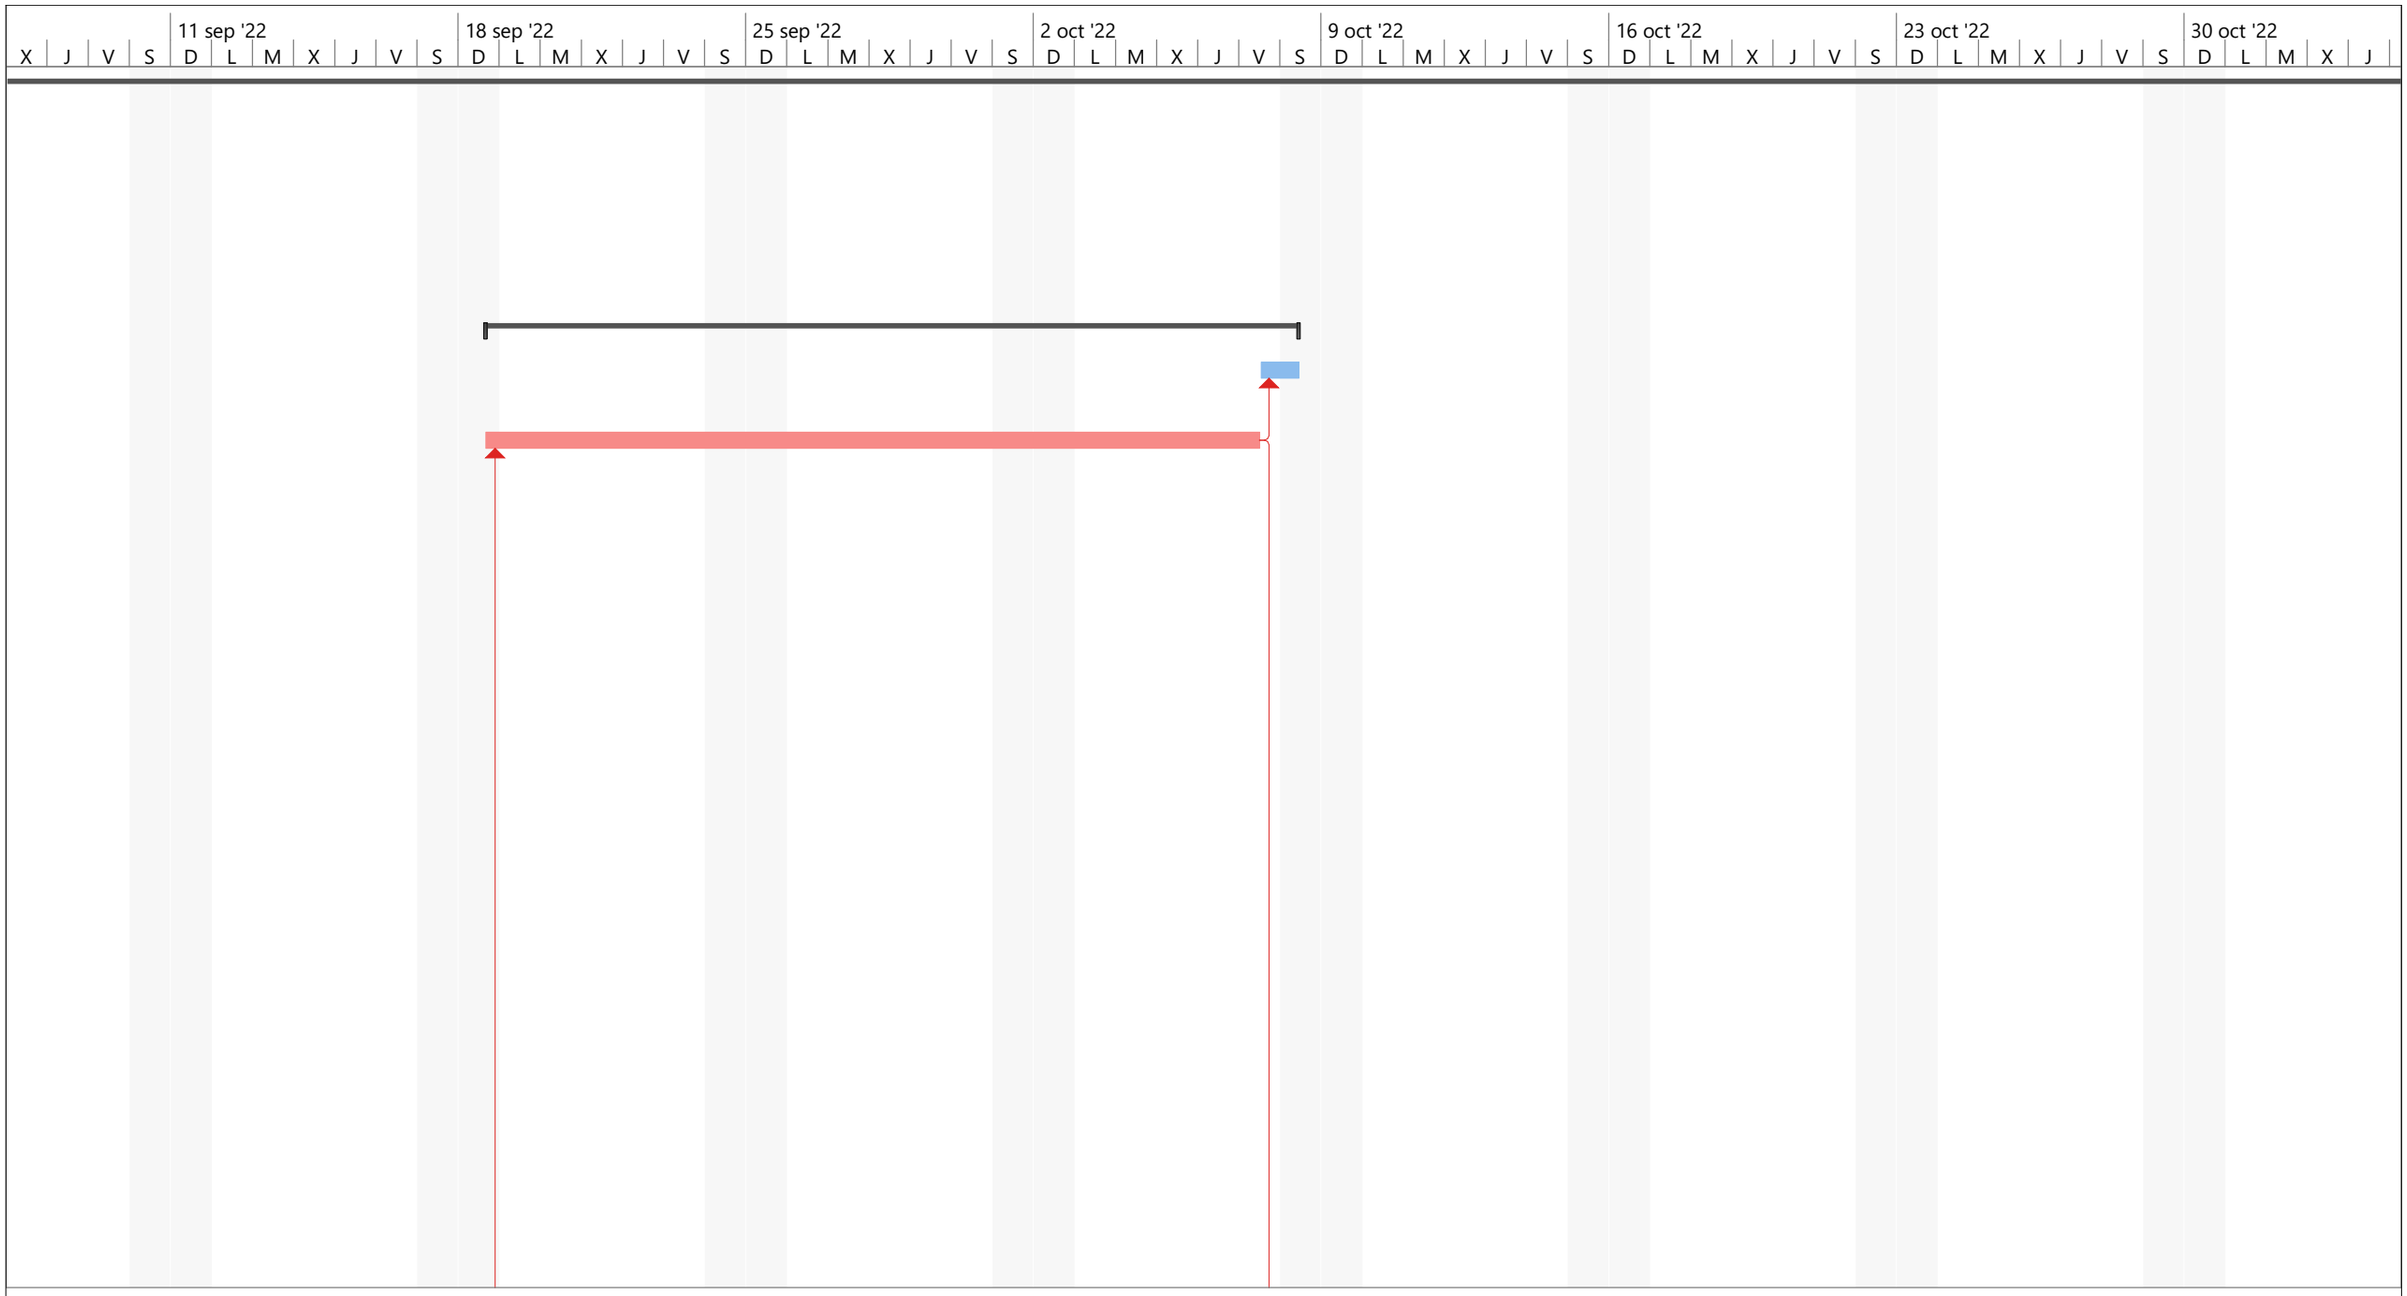

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

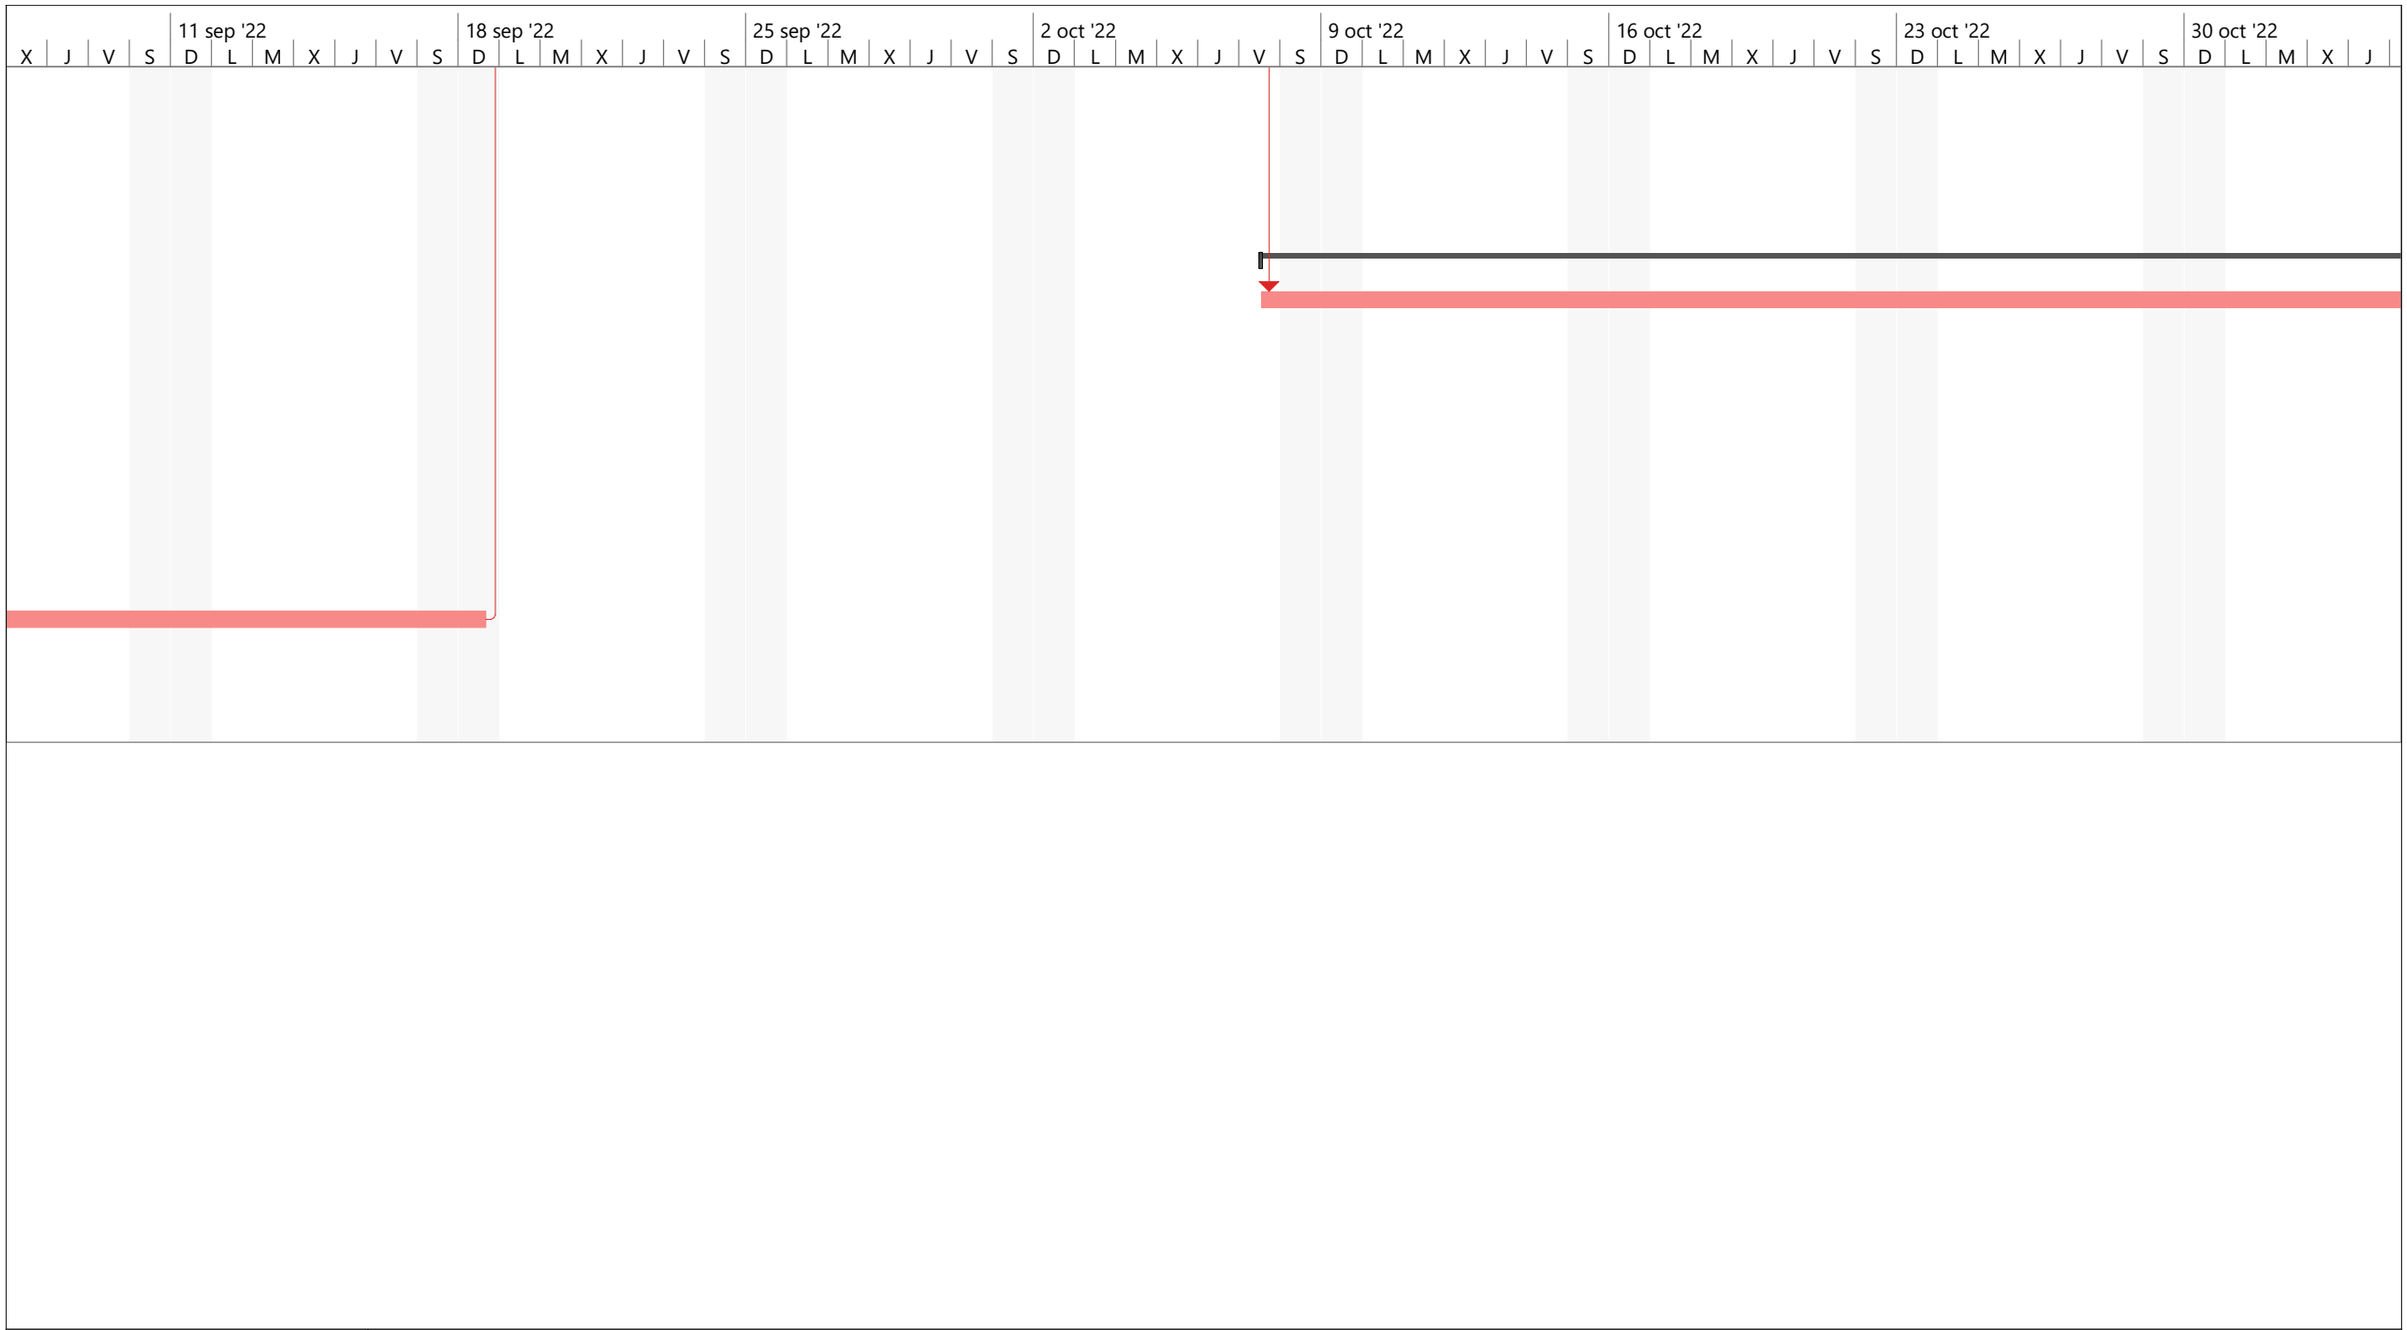


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			




Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

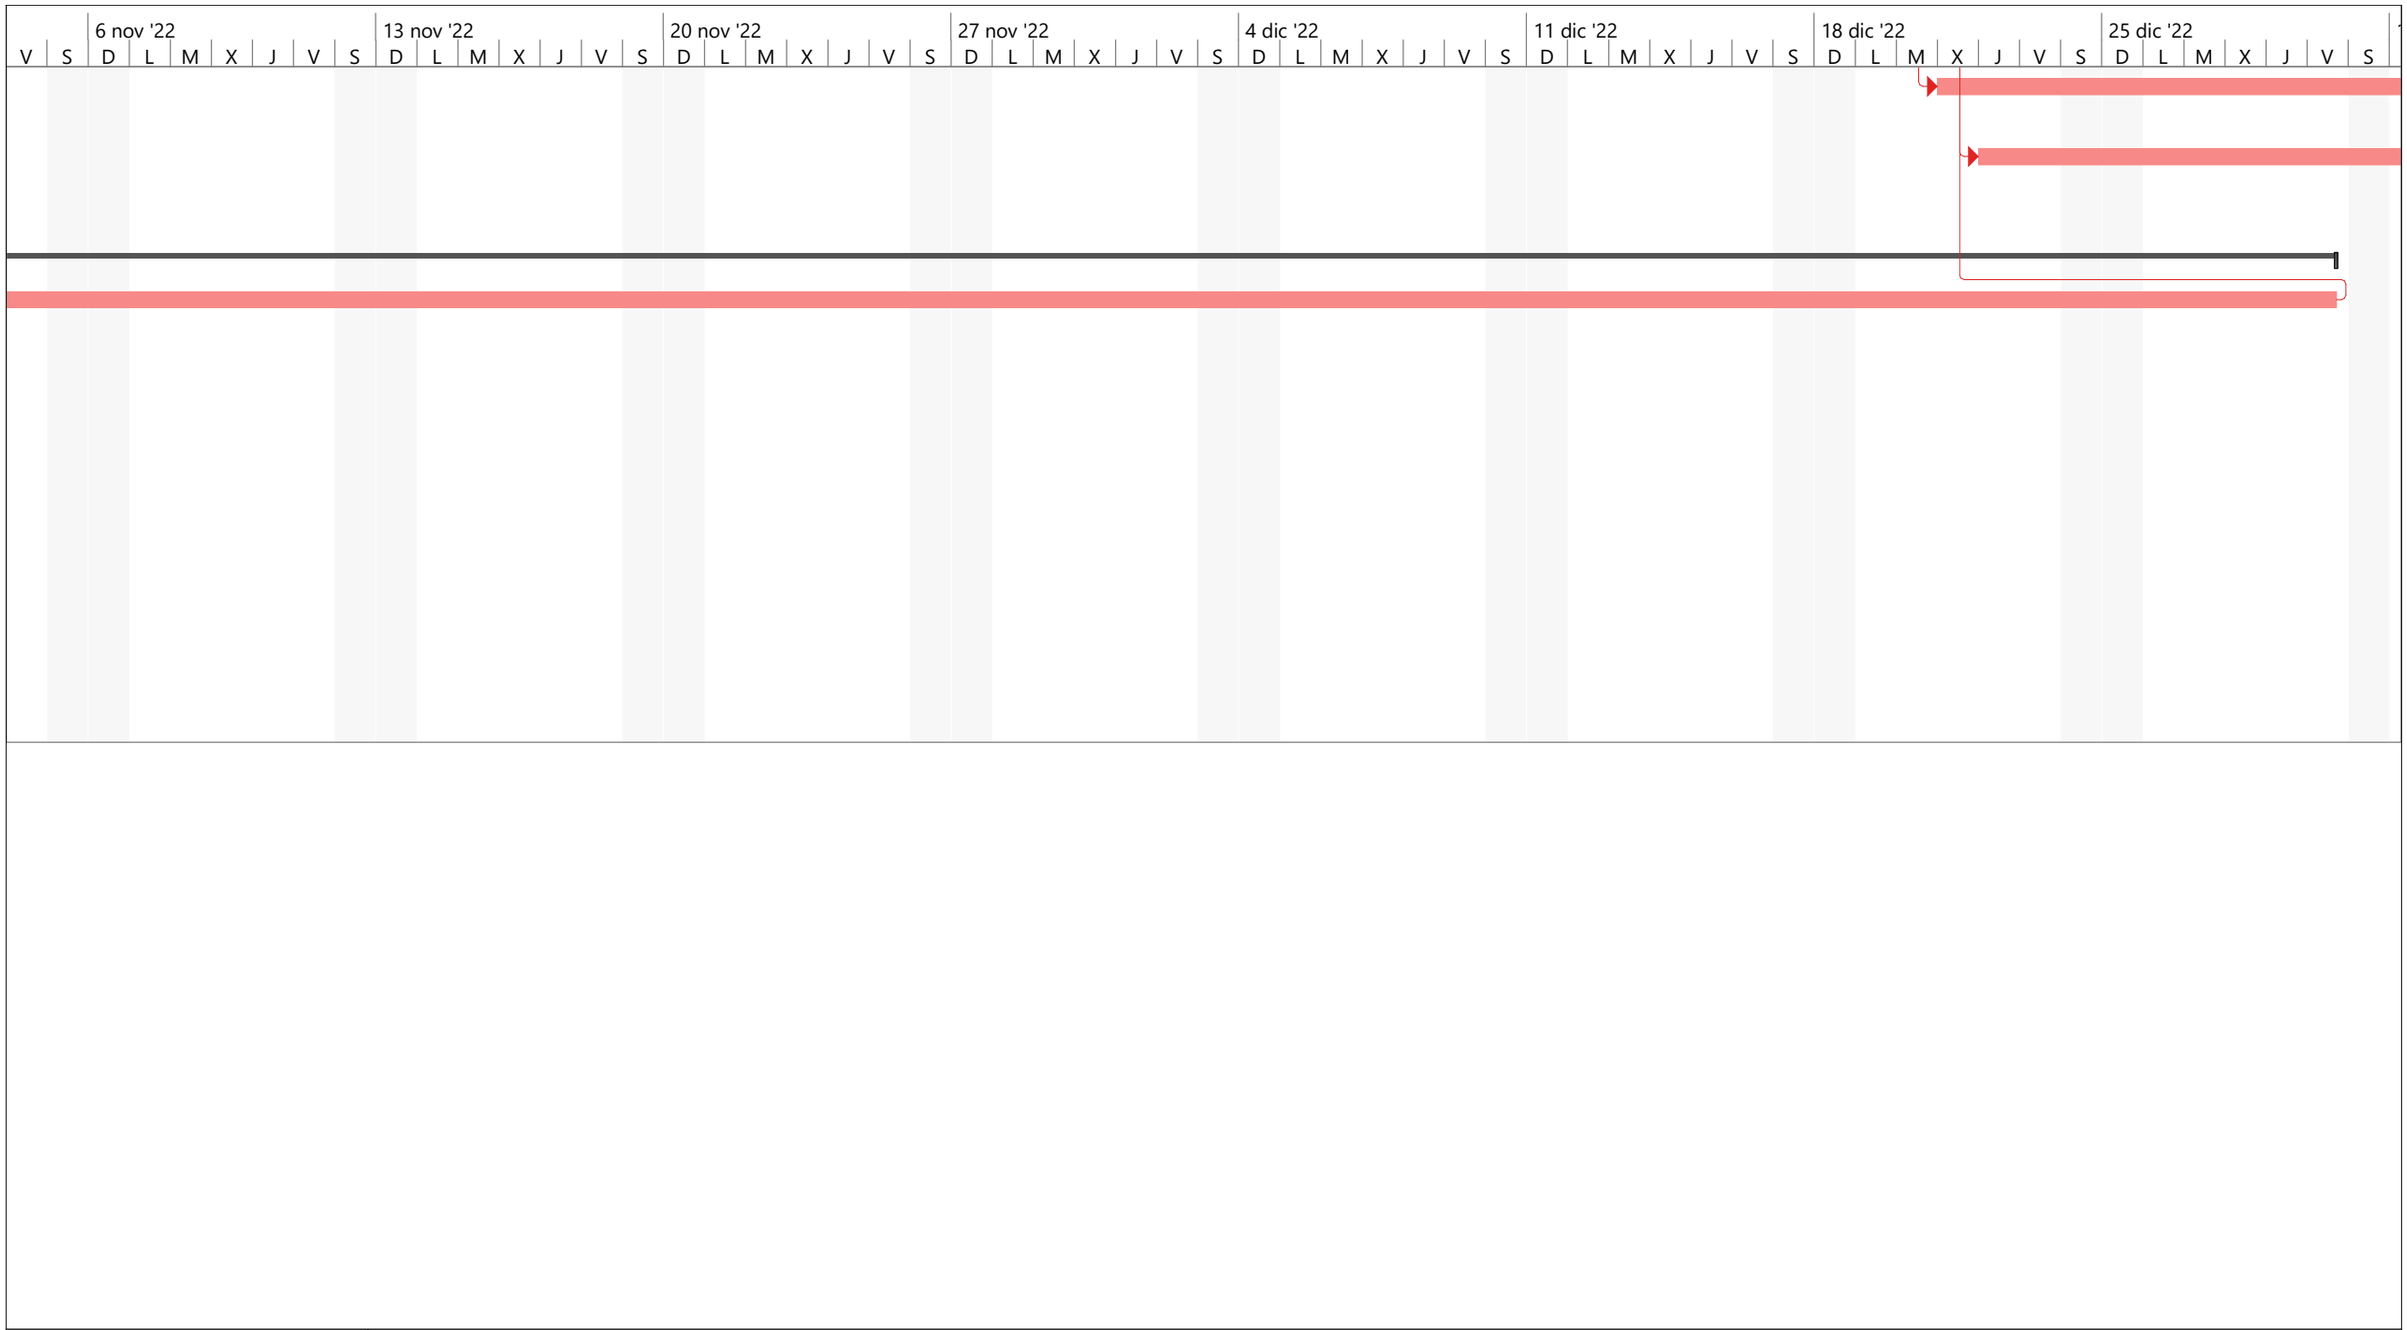


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

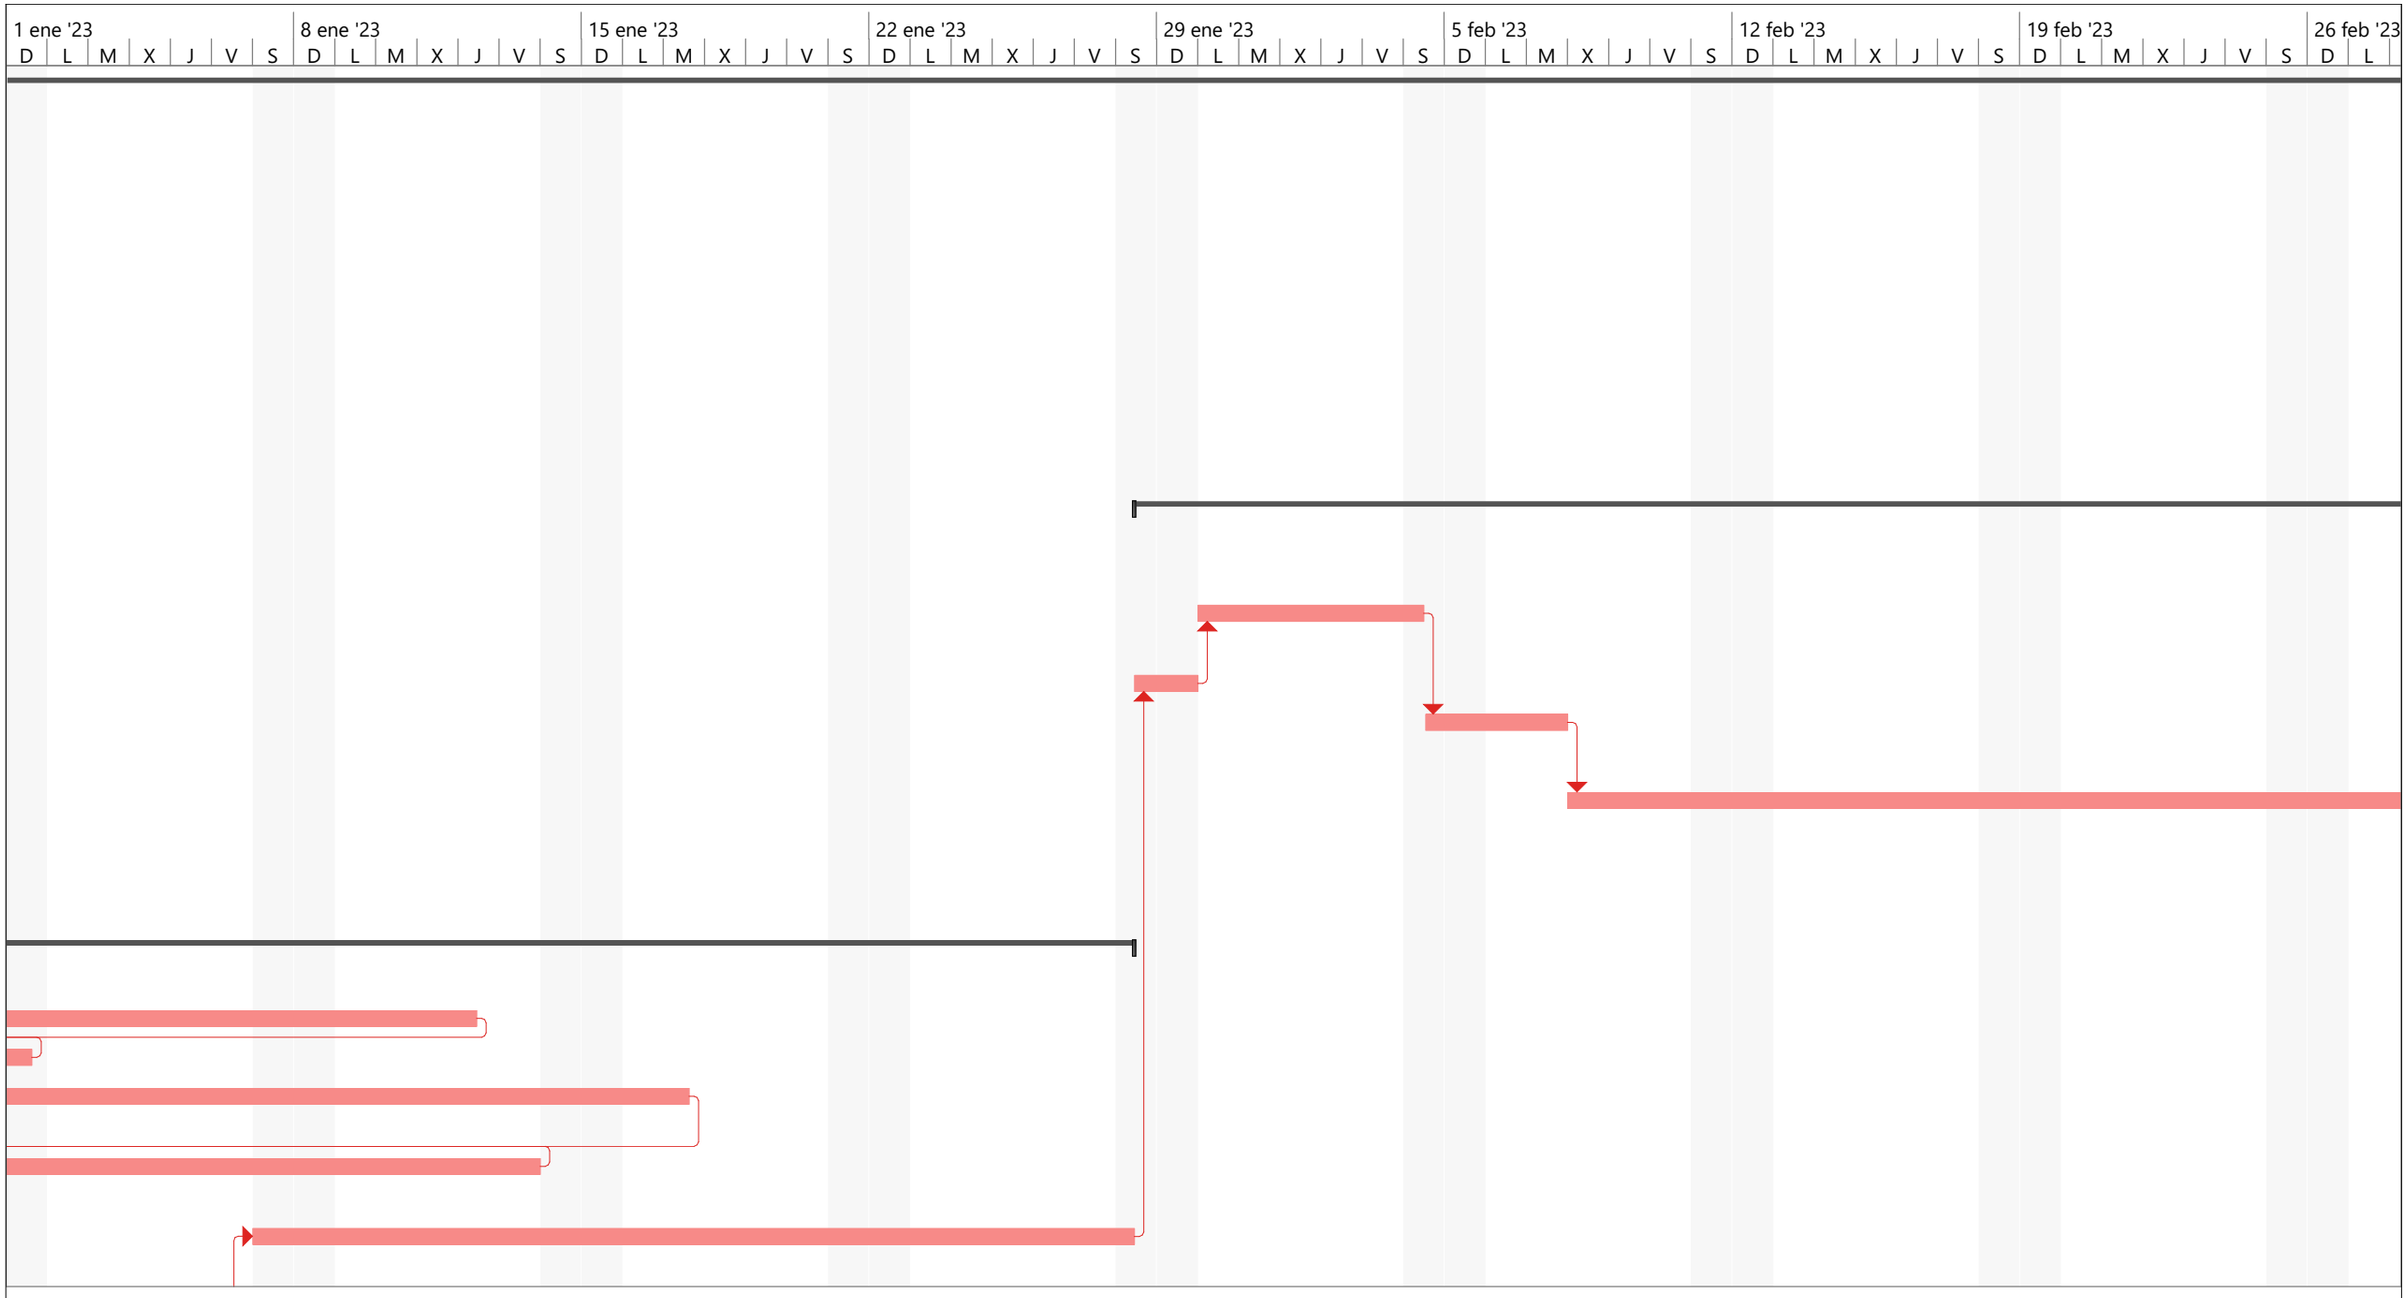


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

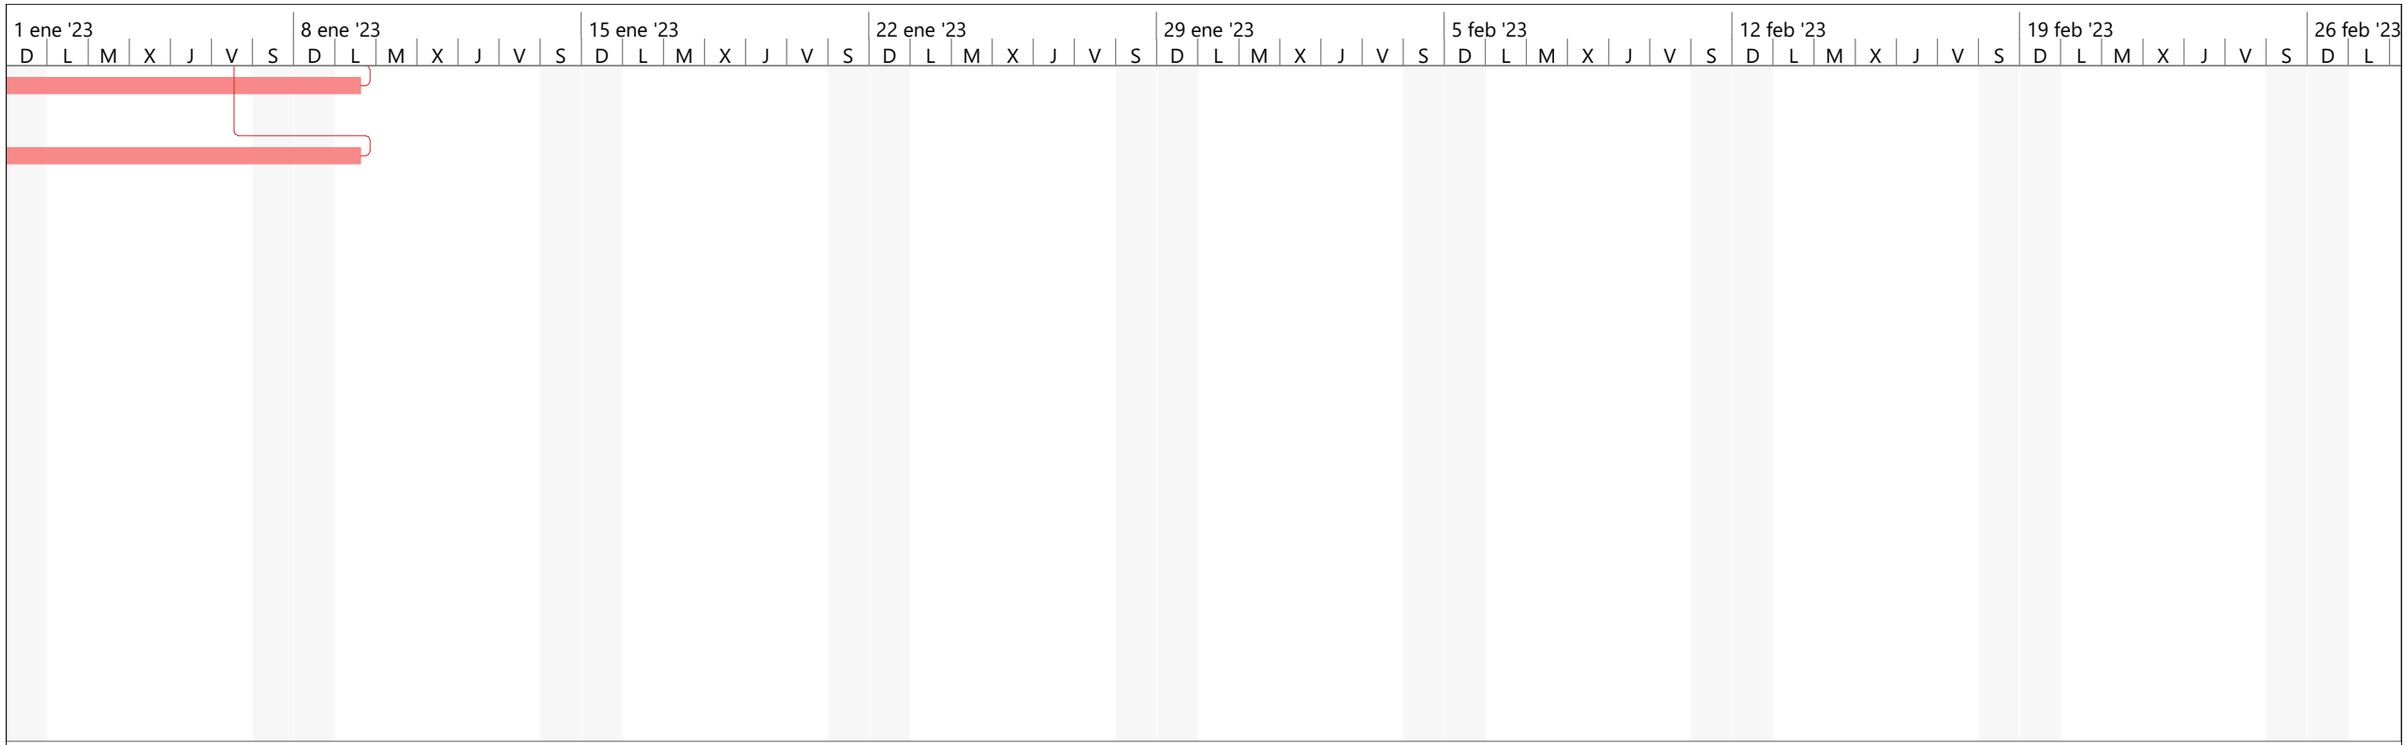


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

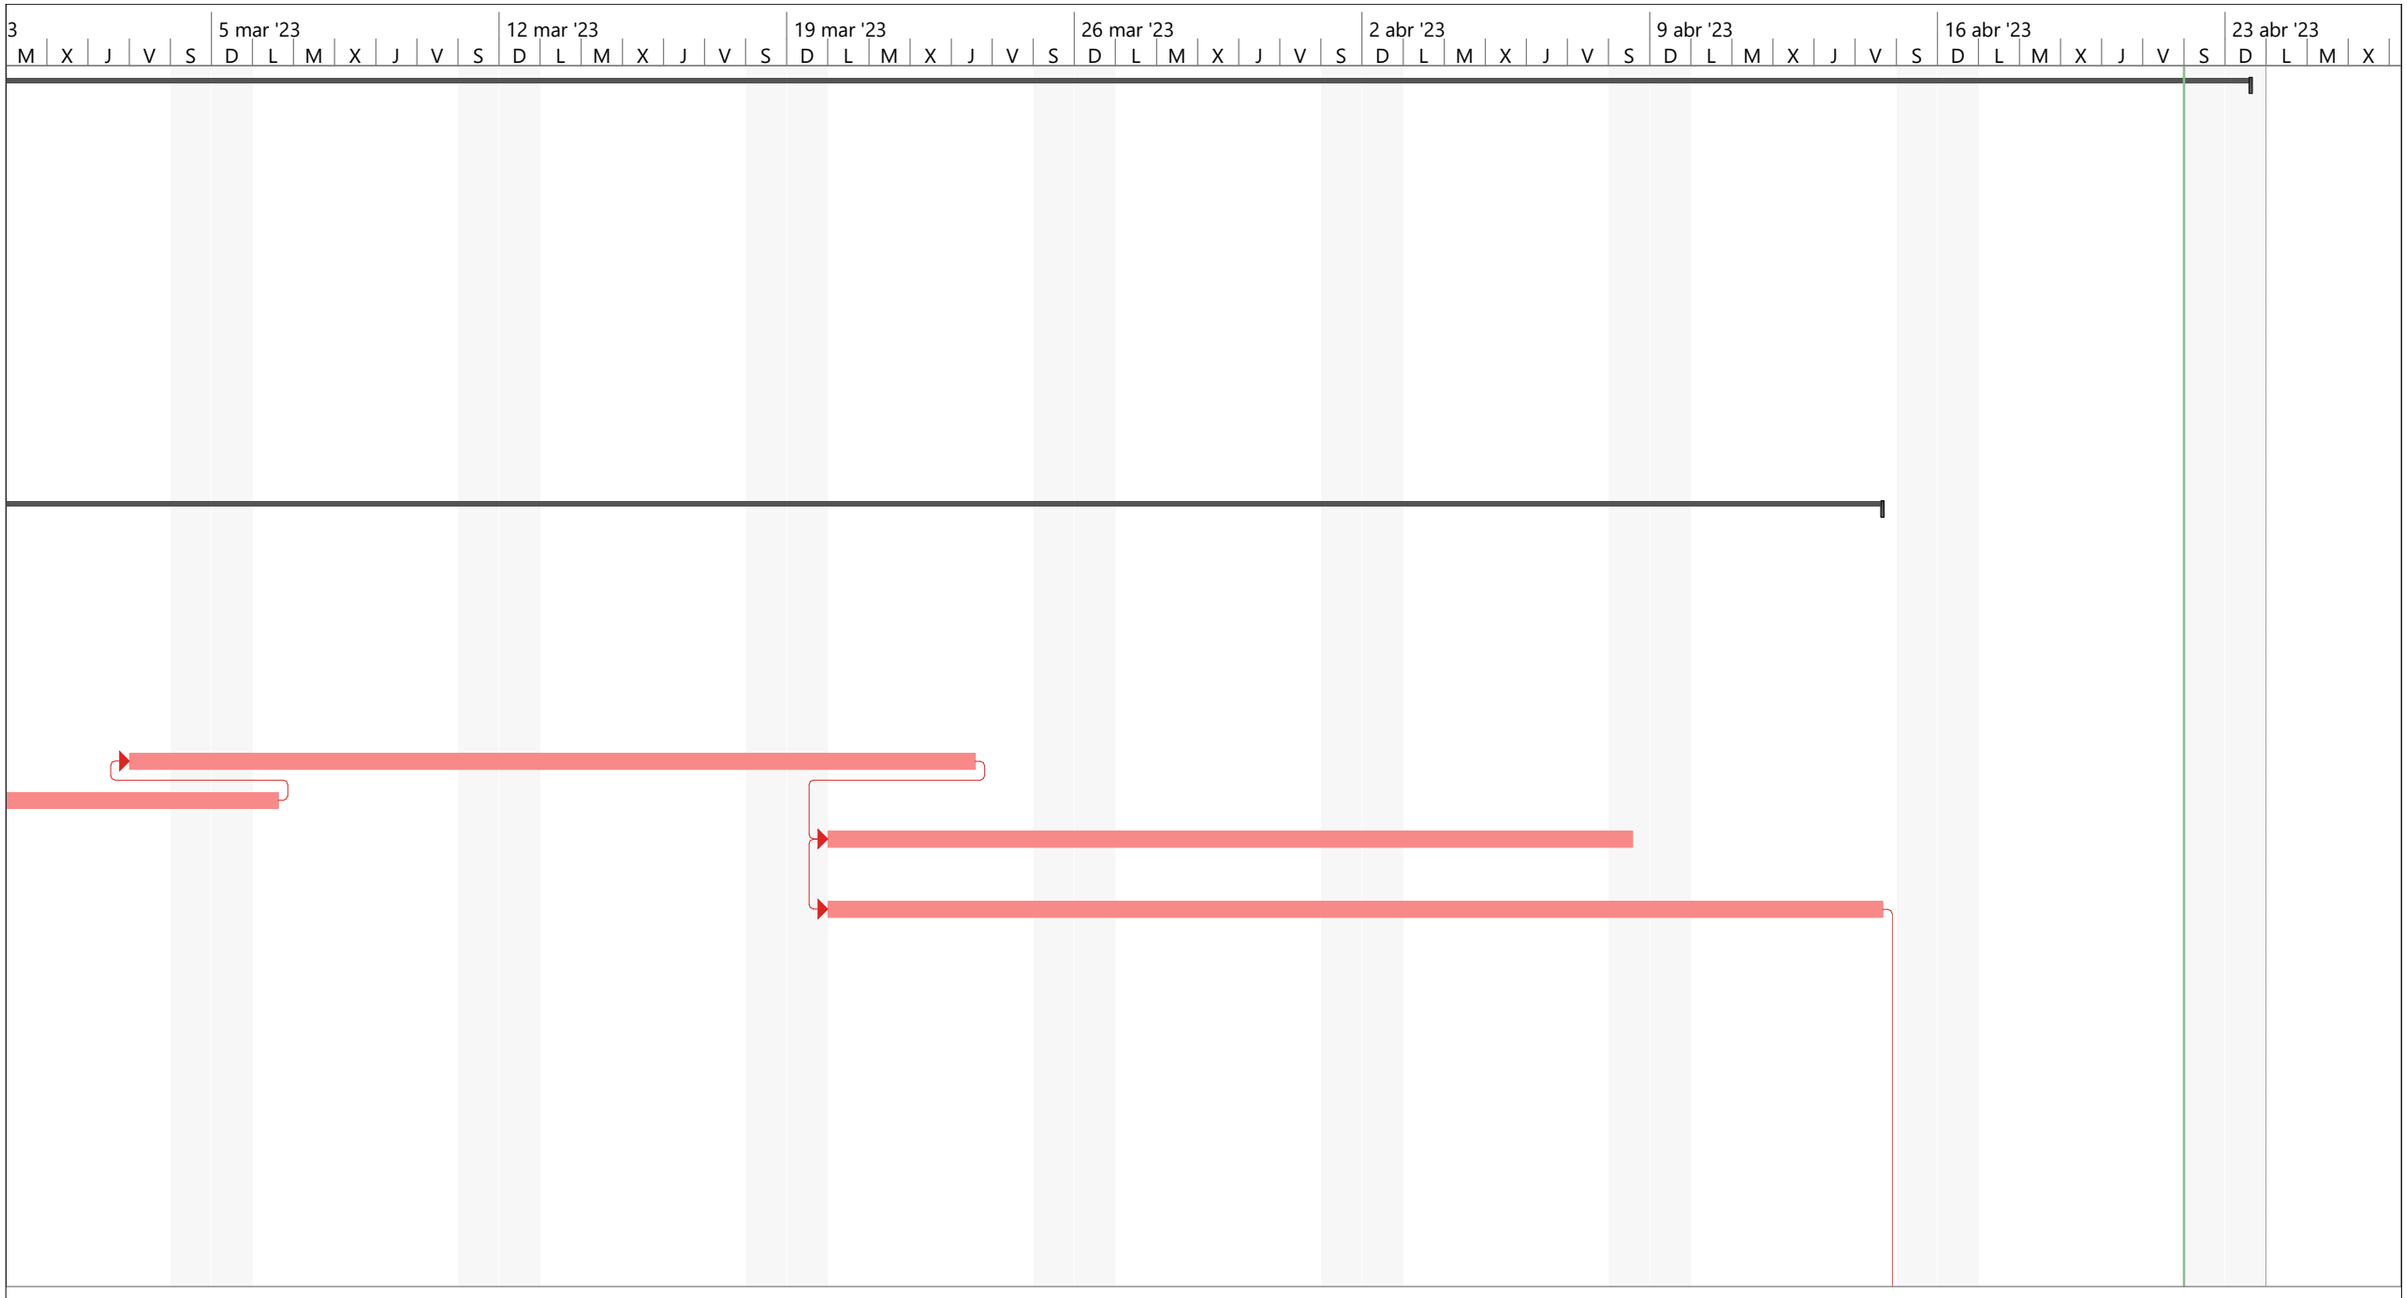

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

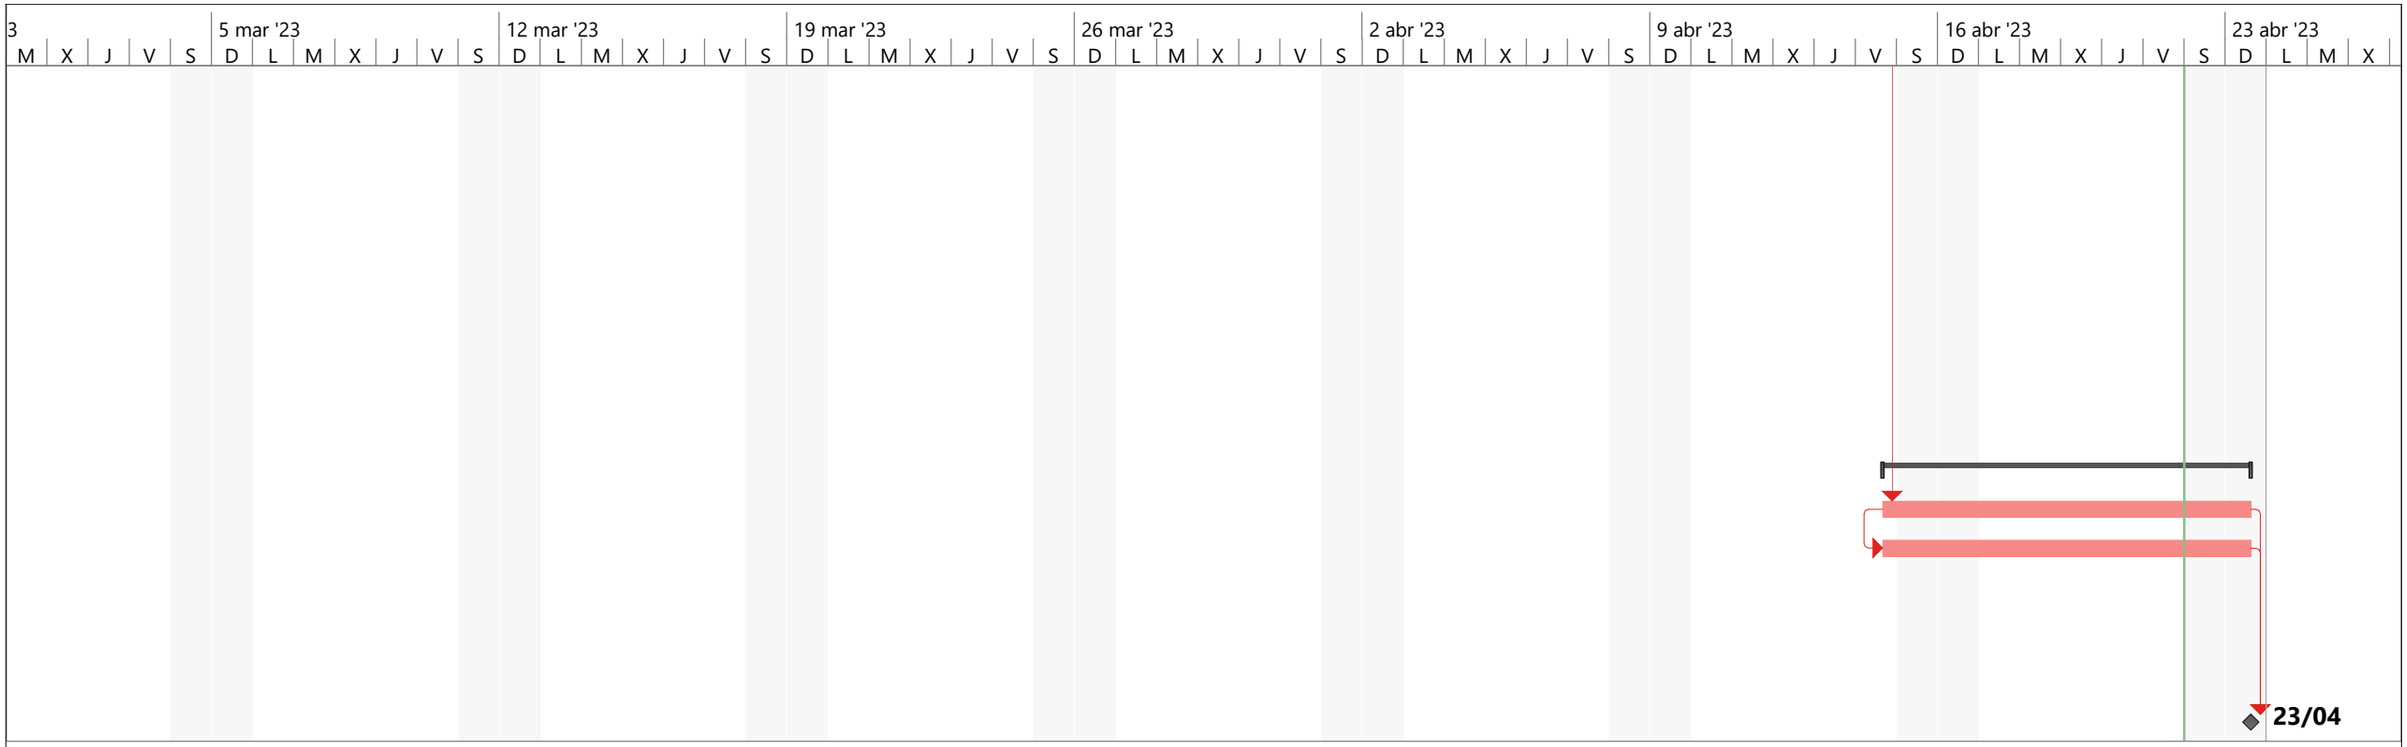

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES, MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ( )

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MSBV-006-2023

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 6 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión (no) correspondiente al periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.121.889.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 16 MESES (En meses según tal prórroga sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023	8 marzo/2023	9 abril/2023	10 mayo/2023	11 junio/2023	12 julio/2023	13 agosto/2023	14 septiembre/2023	15 octubre/2023	16 noviembre/2023	17 diciembre/2023
EXPLANACIONES	$ 100.839,10 / $ 144.692,69	1,26% / 1,80%	$39.205,94 / 0,49%	% P			0,13%	0,38%	0,38%	0,40%			0,38%	0,27%	0,99%	0,00%	0,31%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P			$ 10.804,19	$ 28.811,17	$ 28.811,17	$ 32.412,57			$ 30.307,07	$ 21.544,17	$ 79.600,61	$ 0,00	$ 25.024,54	$ 6.256,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
				$ E			37,34%	74,31%	74,31%												
				% E			0,05%	0,09%	0,09%												
BOX CULVERT 2,5X2,5 L =7M (CANTIDAD 1UND)	$ 106.553,21 / $ 649.612,58	1,33% / 8,10%	$65.854,18 / 0,82%	% P			0,05%	1,20%					0,40%	0,00%	2,08%	0,18%	0,00%	0,00%	2,98%	2,05%	0,80%
				$ P			$ 4.199,99	$ 102.354,21					$ 32.446,56	$ 0,00	$ 167.353,54	$ 413.366,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.446,30	$ 244.336,85	$ 48.466,59
				$ E									$ 9.812,91	$ 18.448,16	$ 47.562,09						
				% E									0,11%	0,20%	0,52%						
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,3 M Y LONGITUD DE 5300 M	$ 7.527.088,90 / $ 6.940.185,94	93,90% / 86,57%	$2.668.673,75 / 33,29%	% P			0,00%	13,08%	19,57%	21,91%	21,98%	15,95%	2,80%	0,09%	15,98%	14,01%	2,92%	0,19%	7,47%	21,46%	0,41%
				$ P			$ 0,00	$ 1.548.163,89	$ 1.568.882,18	$ 1.748.199,24	$ 1.737.908,16	$ 1.210.239,74	$ 224.488,33	$ 6.987.952,92	$ 1.281.098,22	$ 1.123.174,11	$ 231.271,20	$ 533.530,68	$ 599.095,07	$ 1.720.073,02	$ 433.666,22
				$ E				$194.940,26	$98.315,63	$ 440,28	$ 786.267,06	$ 543.161,81	$ 96.556,42	$ 555.579,28	$ 194.361,13						
				% E				2,73%	1,38%	0,01%	11,03%	7,62%	1,35%	7,79%	2,73%						
TRANSPORTE	$ 278.203,61 / $ 278.203,61	3,47% / 3,47%	$73.208,12 / 0,91%	% P			0,12%	0,09%	0,07%	1,26%	0,12%		2,08%	0,18%	2,98%	0,00%	0,00%	0,55%	1,30%	0,00%	0,00%
				$ P			$ 9.935,94	$ 79.486,75	$ 79.486,75	$ 99.358,43	$ 9.935,94		$ 164.555,13	$ 7.746,51	$ 167.555,55	$ 0,00	$ 47.740,32	$ 11.935,08	$ 155.076,65	$ 0,00	$ 0,00
				$ E				$79.486,75	$79.486,75	$99.358,43											
				% E				1,00%	0,56%	0,35%											
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3.710,00 / $ 3.710,00	0,05% / 0,05%	$0,00 / 0,00%	% P													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
				$ P										$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.710,00
				$ E																	
				% E																	
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$ 8.016.404,815**	**100%**	**$ 2.846.942,00**																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 8.016.404,815**	**100%**	**35,51%**																		

Reprogramación No.1 **Reprogramación No.2** **Reprogramación No.3**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	15,70%	20,92%	23,45%	21,80%	15,10%	5,64%	3,39%	22,15%	19,17%	3,53%	6,88%	11,07%	24,50%	6,06%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.258.814,02	$1.676.980,10	$1.879.940,26	$ 1.747.844,00	$ 1.210.239,74	$ 452.164,08	$ 272.143,59	$ 1.775.647,92	$ 1.536.541,05	$ 283.094,16	$ 551.130,90	$ 887.589,02	$ 1.964.409,87	$ 485.842,81
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	16,01%	36,93%	60,38%	82,19%	97,29%	43,05%	51,35%	73,50%	92,67%	51,48%	58,36%	69,43%	93,94%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.283.753,05	$2.960.735,15	$4.840.696,41	$ 6.588.539,41	$ 7.798.779,15	$ 3.451.300,21	$ 4.116.291,65	$ 5.891.939,58	$ 7.428.480,63	$ 4.127.232,219	$ 4.678.563,118	$ 5.566.152,143	$ 7.530.562,010	$ 8.016.404,815
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	1,75%	2,71%	9,81%	1,79%	3,82%	7,50%	5,30%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	$220.451,13	$140.110,12	$217.366,27	$786.267,06	$143.161,81	$306.414,35	$601.013,83	$431.957,42						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	4,50%	7,21%	17,02%	18,81%	22,63%	30,13%	35,51%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0,00	$220.451,13	$360.761,26	$578.127,53	$1.364.394,59	$1.507.556,40	$1.813.970,75	$2.414.984,58	$2.846.942,00						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 49.105.364,00 / $ 49.105.364,00	$ -	0,00%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00 / $ 47.378.000,00	$ 47.378.000,00	0,58%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00 / $ 9.001.820,00	$ 9.001.820,00	0,11%
-	$ - / $ -	$ -	0,00%
-	$ - / $ -	$ -	0,00%
-	$ - / $ -	$ -	0,00%
-	$ - / $ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 105.485.184,00	$ 56.379.820,00	0,69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 105.485.184,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.121.889.999,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 8.121.889.999,00**	**$ 2.903.321.815,46**	**35,75%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Reprogramación de acuerdo a la prórroga No. 2

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS [illegible]
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY [illegible] RAMIREZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN-IN-6-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	04/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA — **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 15 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-MSRV-006-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMC

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.121.889.999,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 16 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/12/2023 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADO	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES	$ 100.839,10 / $ 144.692,69	1,26% / 1,80%	$43.546,70 / 0,54%
BOX CULVERT 2,5X2,5 L =7M (CANTIDAD 1UND)	$ 106.553,21 / $ 649.612,58	1,33% / 8,10%	$151.053,23 / 1,88%
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,3 M Y LONGITUD DE 5300 M	$ 7.527.098,90 / $ 6.940.185,94	93,90% / 86,57%	$2.859.147,29 / 35,67%
TRANSPORTE	$ 278.203,61 / $ 278.203,61	3,47% / 3,47%	$60.653,08 / 0,76%
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3.710,00 / $ 3.710,00	0,05% / 0,05%	$0,00 / 0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 8.016.404,815**	**100%**	**$ 3.114.400,29**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 8.016.404,815**	**100%**	**38,85%**

% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 agosto/2022	2 septiembre/2022	3 octubre/2022	4 noviembre/2022	5 diciembre/2022	6 enero/2023	7 febrero/2023	8 marzo/2023	9 abril/2023	10 mayo/2023	11 junio/2023	12 julio/2023	13 agosto/2023	14 septiembre/2023	15 octubre/2023	16 noviembre/2023	17 diciembre/2023
% P			0,13%	0,36%	0,36%	0,40%			0,36%	0,27%	0,08%	0,00%	0,31%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P			$ 10.804,19	$ 28.811,17	$ 28.811,17	$ 32.412,57			$ 30.307,07	$ 21.544,17	$ 79.660,61	$ 0,00	$ 25.024,54	$ 6.456,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ E				0,23%	0,23%	0,23%											
% E				$ 18.006,98	$ 18.811,17	$ 32.412,57											
% P			0,05%	1,26%	0,08%	0,18%			0,40%	0,00%	2,59%	5,16%	0,00%	0,00%	1,66%	3,05%	0,60%
$ P			$ 4.198,99	$ 100.394,21					$ 32.446,96	$ 0,00	$ 207.953,54	$ 413.396,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.445,30	$ 244.336,65	$ 46.465,59
$ E									$9.817,91	$18.434,16	$24.552,23	$61.380,57	$36.828,34				
% E									0,12%	0,23%	0,31%	0,77%	0,46%				
% P			0,00%	13,08%	19,57%	21,81%	21,68%	15,10%	2,80%	3,03%	15,98%	14,01%	2,62%	6,52%	7,47%	21,46%	5,41%
$ P			$ 0,00	$ 1.048.163,89	$ 1.568.682,18	$ 1.746.169,26	$ 1.737.808,16	$ 1.210.239,74	$ 224.488,33	$ 242.852,92	$ 1.281.086,22	$ 1.123.174,11	$ 210.351,30	$ 533.139,66	$ 599.065,07	$ 1.720.973,02	$ 433.866,22
$ E				13%	20%	22%	22%	15%	3%	3%	16%	14%	3%	7%	7%	21%	5%
% E				7,83%	9,39%	2,28%	9,71%	6,79%	2,80%	6,17%	9,35%	7,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P			0,12%	0,00%	0,00%	2,45%	0,14%		2,80%	0,00%	2,59%	0,00%	0,00%	0,13%	2,73%	0,00%	0,00%
$ P			$ 9.935,84	$ 19.486,75	$ 19.486,75	$ 19.935,43	$ 9.935,84		$ 164.930,13	$ 0,00	$ 207.953,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.740,22	$ 11.935,68	$ 100.078,95	$ 0,00
$ E				51,25%	140.163,74	114.239,06											
% E				0,24%	0,24%	0,18%											
% P													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
$ P										$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.710,00
$ E																	
% E																	

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2 — Reprogramación No.3

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	15,70%	20,92%	23,45%	21,80%	15,10%	5,64%	3,39%	22,15%	19,17%	3,53%	6,88%	11,07%	24,50%	6,06%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.258.816,02	$1.676.980,10	$1.879.960,26	$ 1.747.844,00	$ 1.210.239,74	$ 452.164,08	$ 272.143,59	$ 1.775.647,92	$ 1.536.541,05	$ 283.084,16	$ 551.330,90	$ 887.589,02	$ 1.964.409,87	$ 485.842,81
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	16,01%	36,93%	60,38%	82,19%	97,29%	34,91%	50,07%	72,22%	91,39%	51,48%	58,36%	69,43%	93,94%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.283.755,05	$2.960.735,15	$4.840.695,41	$ 6.588.539,41	$ 7.798.779,15	$ 2.798.866,98	$ 4.013.994,32	$ 5.789.642,25	$ 7.326.183,30	$ 4.127.232,219	$ 4.678.563,118	$ 5.566.152,143	$ 7.530.562,010	$ 8.016.404,815
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	1,75%	2,61%	0,71%	1,79%	3,82%	7,10%	2,65%	3,64%	1,40%	1,31%	0,62%	0,31%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	$220.451,13	$140.310,12	$209.151,99	$778.052,78	$143.161,81	$306.414,35	$569.308,48	$164.512,84	$292.194,13	$111.915,41	$104.704,80	$49.717,15	$24.505,31	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	4,50%	7,11%	16,82%	18,60%	22,42%	29,53%	31,58%	35,22%	36,62%	37,92%	38,54%	38,85%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0,00	$220.451,13	$360.761,26	$569.913,24	$1.347.966,02	$1.491.127,83	$1.797.542,18	$2.366.850,66	$2.531.363,49	$2.823.557,63	$2.935.473,03	$3.040.177,84	$3.089.894,98	$3.114.400,29	

0,16

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluyo IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 49.105.364,00 / $ 49.105.364,00	$ -	0,00%
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00 / $ 47.378.000,00	$ 47.378.000,00	0,58%
* IVA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.820,00 / $ 9.001.820,00	$ 9.001.820,00	0,11%
*	$ - / $ -	$ -	0,00%
*	$ - / $ -	$ -	0,00%
*	$ - / $ -	$ -	0,00%
*	$ - / $ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 105.485.184,00	$ 56.379.820,00	0,69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 105.485.184,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.121.889.999,00**	**$ 3.170.780.110,21**	**39,54%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 8.121.889.999,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

• ACTAS DE COMITÉ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/12/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

• Entrega del informe técnico sobre el seguimiento del permiso de ocupación de cauce del Boxculvert de 2x3 ubicado en el k 4+370. (no cumplió)
Intervine el Director de Interventoría manifestando que esto consiste en entregar un informe técnico donde se incluyan todas las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualice las condiciones en que se encontraban la ribera del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
El contratista se compromete que para el martes 07 de diciembre del 2023 entrega esta documentación.
• Realizar el Lleno en la excavación de tubería que se hizo de 2". no se ha dado cumplimiento.
El contratista de obra en representación del Ing. Luis Antonio Mejía manifiesta que no se pudo realizar el lleno porque el material estaba saturado que para el día jueves 07 de diciembre del 2023 se programaría el inicio del tape de esta excavación.
• Entrega de elementos de protección personal EPP al personal de obra (no cumplió).
El contratista de obra en representación del Ing. Luis Antonio Mejía dice que esto se hará el día que se reactive la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Componente tecnico.
2. Seguimiento al componente ambiental
3. Seguimiento al componente social
4. Seguimiento al componente de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estudios Y Diseños: todos los temas de este componente están aprobados
Por la Interventoría
• GEOMÉTRICO: Aprobado
• HIDRÁULICO: Aprobado.
• ESTRUCTURAL: Aprobado.
• GEOTÉCNICO: Aprobado
• PLACA HUELLA: Aprobado

2. Seguimiento Al Componente Ambiental

• P.A.G.A: PAGA V6, se tiene concepto de no objeción emitido por el INVIAS
• Informes Ambientales: El contratista no ha entregado el informe mensual del seguimiento PAGA del mes de octubre.
• PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE: está pendiente la entrega del informe técnico de seguimiento de las actividades de este.

3. Seguimiento Al Componente Social:

• Informes Sociales: El contratista no ha entregado el informe mensual del seguimiento PAGA del mes de octubre. el contratista se compromete a entregar los informes el día 7 de diciembre del presente año.

• Punto De Atención Al Usuario: Se cuenta con punto de servicio de atención al usuario, con su respectivo pendón informativo.

• Reunión Mensual Veedurías: Se viene realizando las reuniones mensuales con la veeduría como lo estipula el manual de Interventoría.

• Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
o Gestiones ante ministerio del interior
o Gestión ante ICANH
o Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

La interventoría mediante un comunicado le hará un breve resumen de los requerimientos que tiene pendiente en la parte social y ambiental para que lo tengan presente y den respuesta lo más pronto.

4. Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo: Se viene realizaron las observaciones por parte de la interventoría las cuales el contratista acatado a estas, se viene realizando las capacitaciones al personal de obra.
En cuanto a este componente este contrato se viene desempeñando de manera adecuada. se tiene pendiente el pago de la seguridad del mes de octubre
el contratista

5. Reporte Avance Del Proyecto

• AVANCE EN PORCENTAJE.
- Meta Física Programada: 89%
- Meta Física Ejecutada: 38.85%
- Atraso Físico: -50.15%

interviene el ingeniero Fredy Rodríguez Director de la interventoria manifestando que la obra presenta una inactividad sin justa causa dese el día de 10 de noviembre del presente año hasta la fecha, esta interventoria de acuerdo a las obligaciones contractuales, radicó ante el municipio recomendaciones del inicio de dos apremios de multas y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria; hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte del municipio de San Bernanrdo del Viento. El contratista de obra en representación del Ing. Luis Antonio Mejía dice que para los presentes no es ajena la situación del proyecto que radica en el flujo de caja y en la inversión de recursos al proyecto; se han buscado alternativas entre las cuales está la de ceder los derechos económicos a un inversionista que me acaba de confirmar que si va a invertir en el proyecto, esto se haría ya con el aval del municipio y de la interventoria; si todo se materializa estaría presentando a la secretaria de obra la cesión para que revisen y aprueben y comenzar a trabajar desde mañana.
El arquitecto David en representación del municipio, manifiesta que él ha sido insistente con el ingeniero Luis para que reactive la obra, ya que al municipio le interesa es que el proyecto se termine, por lo que aun no se le a hecho efectiva la sanción de multa, tratando de que pueda dar una solución a esta problemática y se pueda terminar el proyecto.

El contratista agradece la voluntad que ha tenido el municipio en este proceso, manifiesta que se está haciendo lo posible para sacar el proyecto adelante y tener feliz término, que a hablado con la comunidad explicándoles la situación y que la idea es comenzar a trabajar mañana.

el ingeniero Fredy manifiesta que no entiende que paso con la parte económica si se ha dado el 30% del anticipo y se han pagado las actas parciales según el avance de la obra. manifiesta su preocupación referente que el contrato vence el 23 de diciembre de 2023; no se ven argumentos juridicos de como prorrogar el contrato ; sabemos que el Invias solicito documentación al municipio para prorrogar el convenio, pero preocupa es como se va a argumentar el aval para dar una prorroga a un contrato que está suspendido hace un mes sin justa causa, solicita que intervenga el municipio, para ver qué alternativa plantean ellos para continuar con el desarrollo del contrato; Por parte interventora en el área jurídica del consorcio, comenta que solo se puede analizar una prorroga siempre y cuando el municipio abra los procesos de incumplimiento en la que se defina si es acreedor a una multa por parte del contratista; se recalca que esta interventoria está en la posición de que el municipio debe actuar jurídicamente y debe abrir los procesos de incumplimiento para que quede la trazabilidad de esto.

La ingeniera Laura peña en representación del instituto nacional de vías INVIAS, interviene manifestando que es bastante preocupante el desarrollo de este contrato, porque no es la primera vez que se escucha el tema de la cesión economica del contrato y más preocupante porque hoy 4 de diciembre de 2023 y se tiene la intención prorrogar el convenio con el fin de que puedan continuar con la ejecución del contrato; y preocupa también el tema de que tienen casi un mes sin actividades y que se pudo haber avanzado; manifiesta que los incumplimientos de las obras no son solo físicas sino también administrativas y más preocupante que el municipio no haya querido actuar jurídicamente; este contrato a perdido meses sin ejecución, entonces insto al arquitecto David Rojas (supervisor del contrato) a que no se quede solo con la buena intención de querer ayudar sino también mirar que tienen responsabilidades contractuales que son las que dan origen al contrato de obra que es el convenio.

El arquitecto David Rojas (supervisor del contrato) manifiesta que una vez se termine el presente comité, hablara con el grupo jurídico del municipio, para interponer las sanciones pertinentes y que del ingeniero Luis dependerá si eso avanza o se queda ahí.

Ing. Luis Antonio Mejía dice que él está gestionando para poder reactivar la obra mañana.

el ingeniero Fredy Rodríguez interviene diciendo que para concluir hay tres temas importantes; primero el tema de la documentación para la prorrogar el convenio, numero dos argumentación que paso el contratista para prorroga con unos argumentos que no son valederos; primero el municipio debe abrir los procesos sancionatorios y después se ve lo del tema de la prorroga con argumentos juridicos que haya lugar.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Instlación del relleno de la excavación realizada para la verificación de la tuberia.	07/12/2023	Contratista
Entrega de informa técnico de la ocupación de cauce del boxculvert de 2x3 ubicado en el K4+370.	07/12/2023	Contratista
Entrega de informes social y ambiental del mes de octubre	07/12/2023	Contratista
Entrega de EPP	05/12/2023	Contratista
Documentacio para ampliacion de convenio	04/12/2023	Municipio
Iniciar los procesos de apremio de multa y ahcer efectiva la clausula penal pecuniaria	07/12/2023	Municipio
reactivar las obras de manera inmediata	05/12/2023	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA por definir (Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	Representante Legal	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	Director de Obra	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	Residente de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ	Secretario de Infraestructura - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisora contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

• ACTAS DE REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/11/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 24
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1.Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. verificación cumplimiento de compromisos
2. parte técnica
3.. Seguridad y salud en el trabajo.
4. componenete ambiental y social.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 3: 00 pm en el corregimiento del castillo, contando con la participación del contratista, interventoría.

1. verificación de compromisos:
- Incrementar cuadrillas. (no cumplio)
- cerrar PQR (no cumplio)
- Garantizar suministro de materials para construcción de placa huella.(cumplio).cabe decir de que aunque si ingreso material para construcción de placa huella, este es muy poco , por lo que no garantiza un avance significativo en la obra.

Parte Técnica : se continua trabajando con dos frntes de trabajo,en esta semana se evidenció el ingreso de materiales para construcción de placa huela; . se concentran en cerrar los tramos del 3+700 al 4+100, realizando actividades de figuración de acero de refuerzo, vaciado de cunetas , vigas riostra, losas reforzadas y losas en concreto ciclópeo . muy a pesar que de que se esta trabajando el avance de la obra es minimo, esto debido aque se requiere que abran nuevos frentes de trabajo donde se genere un buen avance; en la obra se cuenta para la logistica de instalación de materiales para construcción de placa huella,con un minicargador y un l retrocargador . se evidenció utilización de maquinaria de forma minima ,(motoniveladora y vibro compactado)r debido a que no se contó con suministro de material de sub base granular ni de afirmado.

3**.. Seguridad y salud en el trabaj**o:
se evidencia que persisite parte del personal que no cuenta con los elementos minimos de protección personal EPP , ni con la dotación minima para trabajar,se hace la recomendación de mejora este aspecto. En cuanto a señalización se evidencia mejoras en . los tramos que se estan interviniendo,. El sst viene realizando charlas y pausas activas con el personal en obra.

4. componente ambiental y social :se hace la observación al contratista de retirar de los bordes de la via los escombros producidos en las demoliciones y llevar a la disposición final las bolsas de cemento utilizadas, aún persiste en esta problematica. de la parte social se reitera que hay varis PQRS por cerrar.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
INCREMENTAR CUADRILLAS	martes, 7 de noviembre de 2023	CONTRATISTA
CERRAR PQR	martes, 7 de noviembre de 2023	CONTRATISTA
SUMINISTRAR EEP Y DOTACIÓN AL PERSONAL FALTANTE	martes, 7 de noviembre de 2023	CONTRATISTA
GARANTIZAR SUMISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA.	martes, 7 de noviembre de 2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/11/2023
(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


FECHA: 4/11/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/11/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1.Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. verificación cumplimiento de compromisos
2. parte técnica
3.. Seguridad y salud en el trabajo.
4. componenete ambiental y social.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 3: 00 pm en el corregimiento del castillo, contando con la participación del contratista, interventoría.

1. verificación de compromisos:
- Incrementar cuadrillas. (no cumplio)
- cerrar PQR (no cumplio)
- Garantizar suministro de materials para construcción de placa huella.(No cumplio).

Parte Técnica : se continua trabajando con dos frentes de trabajo,en esta semana se evidenció la falta de material tipo cemento , lo cual repercutio directamente en el rendimiento de la obra, por lo que se erequiere que el ingreso de materiales para construcción de placa huella lo antes posible; .aún se concentran en cerrar los tramos del 3+850 al 4+030, realizando actividades de figuración de acero de refuerzo, vaciado de cunetas , vigas riostra, losas reforzadas y losas en concreto ciclópeo . muy a pesar que de que se esta trabajando el avance de la obra es minimo, esto debido aque se requiere que abran nuevos frentes de trabajo donde se genere un buen avance; en la obra se cuenta para la logistica de instalación de materiales para construcción de placa huella,con un minicargador y un l retrocargador . se evidenció maquinaria inactiva ,(motoniveladora y vibro compactador) debido a que no se contó con suministro de material de sub base granular ni de afirmado.

3**.. Seguridad y salud en el trabaj**o:
se evidencia que persisite parte del personal que no cuenta con los elementos minimos de protección personal EPP , ni con la dotación minima para trabajar,se hace la recomendación de mejora este aspecto. En cuanto a señalización se evidencia mejoras en . los tramos que se estan interviniendo,. El sst viene realizando charlas y pausas activas con el personal en obra.

4. componente ambiental y social :se hace la observación al contratista de retirar de los bordes de la via los escombros producidos en las demoliciones y llevar a la disposición final las bolsas de cemento utilizadas, aún persiste en esta problematica. de la parte social se reitera que hay varis PQRS por cerrar.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
INCREMENTAR CUADRILLAS	lunes, 13 de noviembre de 2023	CONTRATISTA
CERRAR PQR	lunes, 13 de noviembre de 2023	CONTRATISTA
GARANTIZAR SUMISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA.	lunes, 13 de noviembre de 2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 18/11/2023
(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


FECHA: 11/11/2023
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 31-10-2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento mensual a las actividades de obra, con el comité de Veeduria ciudadana.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Bienvenida y presentación.- 2. Descripción avances de la obra por parte de la interventoria.- 3. Descripción de actividades desarrolladas por parte del contratista.- 4. Inquietudes por parte de la Veeduria. - 5. Conclusiones y despedida.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Interventoria: Informa el avance de la obra y el estado de los compromisos pactados en el comite anterior.

La obra va en un 69,43% programado.
Ejecutado en un 38,54% y con un atraso del 30,89%.

De los compromisos pactados aún no se fija la fecha para programación de la reunión con presencia del alcalde del municipio de San Bernardo del viento, representante legal del

Contratista y la interventoria y Veeduría.
El contratista cumplio con el informe del consolidado de los personal pendientes por pagos.; pero cabe decir que a la fecha no se les han cancelado.
Veedores: Manifiestan preocupación por el lento rendimiento en la construcción de la placa huella, preguntan que esta pasando.
Contratista: responde que ha tenido inconvenientes con el suministro de los materiales, pero que ya esta en la solución para esta semana.
Interventoría: Solicita que este suministro se haga lo más pronto posible, ya que el atraso de la obra va creciendo.

- Veedores: Preguntan que cuando le resuelven el tema del pago el personal.
- Contratista: Dice que ya esta en proceso y que ha llegado a acuerdos con algunos

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPMMI-06-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31-10-2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reunión con Presencia del Municipio, Contratista, Interventoria Y Veeduria.	24 NOV-23.	Interventoria
Pago a personal del consolidado pendiente.	24 Nov-23	Contratista.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Erick Camargo Mendez	Ing Residente Interventoria	CIMG	
Isidoro J Avila M		Veeduria	
Federico Jimenez		Veeder	
Dayana Gonzalez	Aux Residente	Contratista	
Gustavo Díaz	Ing. Auxiliar	CVIMG.	Gustavo Díaz A.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

i. A la fecha, semana N° 67 se tiene una inversión de obra programada de $ 7.530.562.009,92 correspondiente al 93,94% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.114.400.290,21 correspondiente al 38,85%; lo que representa un atraso del 55,09%.

i. se recomienda al contratista reactivar la obra en la mayor brevedad posible y subsanar todas las no conformidades presentes en la obra.

ii. Se recomienda al contratista, atender oportunamente en las fechas establecidas, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.

.

iii. Se recomienda al contratista mantener auxiliares de tráfico en los frentes simultáneos de trabajo; para evitar accidentes y/o incidentes.

iv. Mediante comunicado CVRIMG-1791-2022 del 17 de noviembre de 2023, Esta Interventoría, en ejercicio de sus facultades contractuales y legales, presenta el informe de presunto incumplimiento al Contrato de Obra Pública No. LP-MSBV-006-2022. (en adelante el "Contrato de Obra") celebrado entre el Consorcio Vial San Bernardo (en adelante el "Contratista de Obra" o el "Contratista") y la alcaldía municipal de San Bernardo del Viento. Así, y en virtud de lo anterior, se recomienda a la Entidad iniciar el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, tendiente a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria prevista en la Cláusula Décima Sexta. Lo anterior, como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista de Obra respecto a lo establecido en la Cláusula Novena - Obligaciones generales del contratista, numerales 2, 3, y 4, respaldados en la Garantía Única de Cumplimiento No. NB-100217190 expedida por Mundial de Seguros S.A.

Adicionalmente a lo anterior dejamos constancia que nos encontramos ante una falta GRAVISIMA por parte del CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, ya que desde el 10 de noviembre del presente año fueron suspendidas las actividades de ejecución del contrato de obra LP-MSBV-006-2022 sin justa causa, lo que conlleva a que la interventoría solicite la caducidad del contrato, esto agotando el último recurso jurídico que se tiene para salvaguardar los recursos públicos destinados a la ejecución de dicho contrato

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1687-2023	3/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Seguimiento de gestión social atención a las PQR.
CVRIMG-1694-2023	4/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1713-2023	7/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – octubre de 2023.
CVRIMG-1729-2023	9/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de seguimiento social mes de octubre 2023.
CVRIMG-1751-2023	14/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Inactividad de labores en obra.
CVRIMG-1752-2023	14/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Seguimiento a compromisos pactados en el comité de obra No. 14 de fecha 31 de octubre 2023
CVRIMG-1788-2023	17/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1801-2023	18/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1823-2023	22/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de la placa huella, que hayan cumplido los 7 y 28 días
CVRIMG-1824-2023	22/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de toma de acciones correctivas instalación de acero placa huella.
CVRIMG-1841-2023	25/1172023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1892-2023	30/11/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1729-2023 Solicitud informe de seguimiento social mes de octubre 2023.

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 190-21-11-2023	2023-11-21	ENVÍO DE INFORME SST DE OCTUBRE 2023
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 191-29-11-2023	2023-11-29	SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-006-2022

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	4 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



CONSTRUCCION PLACA HUELLA K 4+030- CARRIL DERECHO



CONSTRUCCION PLACA HUELLA K 4+030- CARRIL DERECHO



CONSTRUCCION PLACA EN CICLOPEO K 4+030- CARRIL DERECHO



CONSTRUCCION CUNETAS.. K 4+030- CARRIL DERECHO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	4 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



CONSTRUCCION CUNETAS- CARRIL DERECHO



CONSTRUCCION PLACA HUELLA



CONSTRUCCION PLACA HUELLA K 3+800- CARRIL DERECHO



CONSTRUCCION PLACA HUELLA K 3+800- CARRIL DERECHO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	4 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



CONFORMACION CAPA DE AFIRMADO ... K 1+500



CONFORMACION CAPA DE AFIRMADO ... K 1+500



MAQUINARIA INACTIVA



MAQUINARIA INACTIVA

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	4 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO Nº**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO Nº**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



ACERO DE REFUERZO CARRIL DERECHO K 3+950



ACERO DE REFUERZO CARRIL DERECHO K 3+860



ACERO DE REFUERZO CARRIL DERECHO K 3+860



ACERO DE REFUERZO CARRIL DERECHO K 3+950

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	4 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



INACTIVIDAD EN OBRA



INACTIVIDAD EN OBRA



INACTIVIDAD EN OBRA



INACTIVIDAD EN OBRA

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

⇒ Miercoles, 01 de Noviembre 2023.

- Estado del clima: Se presento lluvia intensa desde las 5:00 am - 7:00 am y moderada desde las 7:00 am - 11:00 am, resto del dia soleado.
- Personal en obra
  - Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 1 conductor de volqueta, 2 operadores, 18 ayudantes.
  - Interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar.
- Maquinaria en obra.
  1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 retrocargador (A), 1 Minicargador (A), 1 camion (I-Avend)
- Actividades Ejecutadas
  - Se realizó vaciado de cunetas por el carril derecho y viga riostra desde el K 4+080 al K 4+044.
  - Se realizó Vaciado de losas reforzadas por el carril derecho desde el K 3+836 al K 3+848.

⇒ Jueves, 02 de Noviembre 2023.

- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 2 maestros, 7 ayudantes, 1 conductor de volqueta.
  - Interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar.
- Maquinaria en obra.
  1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 Minicargador (A), 1 retrocargador (I), 1 Camion (I-Alq)
- Actividades Ejecutadas.
  - Se realizó adecuación de terreno e instalación de acero de refuerzo para cunetas por el carril derecho desde el K 3+814 al K 3+834.

⇒ Viernes, 03 de Noviembre 2023.

— Estado del clima: Se presento lluvia moderada desde las 4:00pm - 6:00pm; resto del dia Soleado

— Personal en obra.

- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 2 ayudantes, 2 operadores., 6 ayudantes.
- Interventoria: 1 ingeniero auxilias, 1 ingeniero residente.

— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (A), 1 Vibro compactador (A), 1 retro cargador (I), 1 Mini cargador (I), 1 Camion (I-A)

— Actividades Ejecutadas.

- Se realizó conformación y compactación de capa de S.b.g. desde el K 2+900 al K 1+300.
- Las actividades de construcción de placa huella estuvo paralizada a la espera de material tipo cemento.
- se realizó figuracion de acero de refuerzo para Cunetas.

⇒ Sábado, 04 de Noviembre. 2023.

— Estado del clima: Se presento lluvia intensa desde la 1:00 am hasta las 4:00 am., lluvia moderada desde las 4:00 am hasta las 6:00 am. resto del dia soleado.

— Personal en obra.

- Contratistas: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 7 ayudantes, 2 maestros, 1 operador.
- Interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar.

— Maquinaria en obra
1 motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (A), 1 Mini cargador (A), 1 camion (I, alquilado).

— Actividades Ejecutadas.

- Se realizó vaciado de cunetas desde el K3+814

al K 3+834 carril derecho.

⇒ Domingo, 05 de Noviembre 2023.
- Estado del clima: Dia soleado.
No se realizaron actividades ~~extra~~ contractuales.

⇒ Lunes, 06 de Noviembre 2023. (Festivo).
- Estado del clima: Dia soleado.
- No se realizaron actividades en obra.

⇒ Martes, 07 de Noviembre. 2023.
- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra.
  - contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 2 operadores, 2 maestros de obra, 10 ayudantes.
  - Interventoria: 1 ingeniero auxiliar, 1 ingeniero residente.
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (A), 1 Mini cargador (A), 1 Camion (I) Amarillo).
- Actividades Ejecutadas.
  - Se realizó vaciado de cunetas desde el K 4+044. al K 4+034 carril derecho.
  - Se realizó vaciado de losas en concreto ciclopeo (de 3x0,5) desde el K 4+034 al K 4+024 carril derecho.
  - Se realizó vaciado de losas reforzadas desde el K 4+024 al K 4+008 carril derecho.
  - Se realizó vaciado de losas reforzadas desde el K 3+898 al K 3+866 carril derecho.
  - Se realizó instalacion de acero de refuerzo

para losa desde el K 3+884 el K 3+900 carril derecho.

⇒ Miercoles, 08 de Noviembre. 2023.
-- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra.
• Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 2 operadores, 19 ayudantes.
• Interventoria: Ingeniero Auxiliar, Ingeniero residente.
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I), 1 Mini cargador (A), 1 retro cargador (A), 1 carmix 6m3 1 volqueta doble troque (I), 1 Volqueta sencilla (I).
- Actividades Ejecutadas.
• Figuración de Acero de refuerzo para cunetas, losas y viga riostra.
• Adecuación de terreno para losas (Huella y Descanso), cunetas y viga riostra desde el K 3+910 al 3+930 y 4+000 al 3+970. carril derecho.
• Se instaló acero de refuerzo para losas (huella) por el carril derecho desde el K 3+910 al K 3+919.

⇒ Jueves, 09 de Noviembre 2023.
- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra.
• Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 2 maestros de obra, 2 operadores, 19 ayudantes.
• Interventoria: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero Residente.
- Maquinaria en obra
1 Motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I), 1 Mini cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 carmix (I-alquilado).

— Actividades Ejecutadas.
- Se realizó adecuación de terreno para losas reforzadas (huella) por el carril derecho desde el K 3+920 al K 3+970.
- Se realizó figuración de acero de refuerzo para losas (huella), y cunetas y viga riostra.
- Se realizó instalación de acero de refuerzo para cunetas y huella por el carril derecho desde el K 3+920 al K 3+970.

— Nota: En este día no se realizaron actividades de vaciado en concreto, debido a la falta de material Tipo cemento. Esta interventoría ha reiterado al contratista el tema de la falta de suministro de materiales y que este ha incumplido reiteradamente; se le solicita y exige subsanar esta inconformidad de manera inmediata.

Viernes, 10 de Noviembre 2023.

— Estado del clima: Día soleado.

— Personal en obra
- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST.
- Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar.

— Maquinaria en obra
1 Motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I)
1 Mini cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 Camión (I-Alq)

— Actividades Ejecutadas.
En este día no se realizaron actividades en obra debido a la falta de material para la construcción de placa huella (Material Tipo Cemento). Tampoco llego material de S.b.g y Afirmado; esta interventoría hace llamado de atención al Contratista debido a la nula ejecución presentada, lo cual implica un aumento en el retraso de la obra y se le requiere disponer

O agilizar el suministro de materiales para emplear a subsanar esta no conformidad.

⇒ Sábado, 11 de Noviembre 2023.

— Estado del clima: Día soleado.

— personal en obra.

• contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST.

• Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar

— Maquinaria en obra:

• 1 Motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I), 1 Mini cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 carmix (I-Averiado).

— Actividades ejecutadas.

No se realizaron actividades contractuales por falta de materiales en obra. esta interventoría recalca y reitera al contratista el llamado de atención, ya que se ve con preocupación la inactividad que se ha venido presentado en obra, ya que esto genera de manera inmediata que el ente contratante pueda iniciar un proceso sancionatorio por posible incumplimiento a las obligaciones contractuales, por lo que se le recomienda al contratista (consorcio vial san bernardo) a subsanar de manera inmediata esta no conformidad presente y así poder ejecutar el contrato.

⇒ Domingo, 12 de Noviembre 2023.

— Estado del clima: Día soleado.

NO se realizaron actividades contractuales.

⇒ Lunes, 13 de Noviembre 2023 (festivo).

— Estado del clima: Día soleado.

No se realizaron actividades contractuales.
Nota: Esta interventoría recomienda al contratista a reclamar las actividades en obra, ya que cada día que se deja de trabajar incrementa el atraso en la obra y se ve con preocupación esta situación que se está presentando.

⇒ Martes, 14 de Noviembre. 2023.
- Estado del clima: Día soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: 1 ingeniero residente
  - Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero Auxiliar.
- Maquinaria en obra
1 Motoniveladora (C), 1 Vibro compactador (C), 1 Minicargador (C), 1 retro cargador (C), 1 carmix (C-Arboral).
- Actividades ejecutadas
En este día se continua sin el ingreso de material para construcción de placa huella, por lo que las actividades fueron nulas.
Esta interventoría reitera al contratista su preocupación por la inactividad que presenta la obra en todos estos días, incrementando aún más el atraso del proyecto; se le hace la recomendación de dar solución inmediatamente a esta situación.

⇒ Miércoles, 15 de Noviembre. 2023.
- Estado del clima: Se presentó lluvia intensa desde las 1:00 am – 3:00 am y moderada desde las 3:00 am – hasta las 7:00 am, resto del día Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratistas: No hizo presencia personal.

1 Ingeniero Residente, 1 ing. auxiliar.
(1), 1 Vibro compactador (1),
(1), 1 Mini cargador (1), 1 Cammix (1-
Ejecutadas
Se realizaron actividades
esto debido a la falta de ma-
(cemento) para la construcción de placa
huella.
Esta Interventoría Nuevamente le recitera al con-
tratista que el contrato tiene un atraso significa-
tivo y de continuar así, se estara exponiendo
a que el ente contratante Municipio de San
Bernardo de (viento) proceda a dar inicio a un
proceso sancionatorio por posible incumplimiento
del contrato; por lo que se le recomienda
subsanar esta inconformidad en la mayor
brevedad posible, para así dar cumplimiento
a la ejecución del proyecto en un buen termino.

Jueves, 16 de Noviembre 2023.

- Estado del clima: Se presento lluvia moderada desde las 2:00 am - hasta las 4:00 am, resto del dia Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: No se presento personal.
  - Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria en obra.

1 Mobnivelodora (1), 1 Vibro compactador (1), 1 Mini cargador (1), 1 retro cargador (1), 1 Cammix (1-Alquil

- Actividades Ejecutadas

No se realizaron actividades constructivas en obra, esto debido a la falta de ma-

teriales para la construcción de placa huellas. Esta interventoría nuevamente le exige al contratista la preocupación que se tiene por la inactividad que se ha tenido en obra en estos días, y se le hace un llamado de atención pidiendo que subsane en la mayor brevedad posible esta no conformidad con el suministro de materiales

Fabián Muñoz

⇒ Viernes, 17 de Noviembre 2023.
- Estado del clima: Día soleado.
- Personal en obra
  - Contratista: No se presenta personal.
  - Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 Minicargador (I), 1 retro cargador (I), 1 carmix (I-Alq).
- Actividades Ejecutadas
No se realizaron actividades contractuales en obra, esto debido a la falta de materiales para la construcción de placa huellas.
Esta interventoría hace llamado de atención al contratista por la inactividad presente en la obra y se exige de manera inmediata subsanar la no conformidad presente en la mayor brevedad posible, se le recuerda que el atraso que presenta el proyecto es alto y con esta falta de suministro de materiales se incrementara aún más.

Fabián Muñoz

⇒ Sábado, 18 de Noviembre 2023.
- Estado del Clima: Día Soleado.

- Estado del clima: Día soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: No se presento personal.
  - Interventoria: 1 Ingeniero residente, 1 ingeniero Auxil...
- Maquinaria en obra.
  1 Motoniveladora (1), 1 Vibro compactador (1), 1 Mini cargador (1), 1 retro cargador (1), 1 carmix (1-A...
- Actividades Ejecutadas.
  No se realizaron actividades contractuales en obra, debido a la falta de materiales para construcción de placa huella.
  Nota: Esta interventoria le resta al contratista su preocupación por la inactividad presentada en la obra desde el dia 10 de Noviembre hasta la fecha y que aún no se ve el ingreso de materiales para subsanar esta no conformidad, se le hace llamado de atención y se le exige reactivar las actividades de placa huella en la mayor brevedad posible y así evitar que se incremente aún mas el atraso de la obra.

⇒ Domingo, 19 de Noviembre 2023.

- Estado del clima: Se presento lluvia moderada desde las 2:00 am - 4:00 am, resto del dia Soleado.
- Actividades Ejecutadas.
  No se realizaron actividades contractuales

⇒ Lunes, 20 de Noviembre 2023.

- Estado del clima: Día soleado.
- Personal en obra.

- Contratista: No se presento personal.
- Interventoria: 1 ingeniero Residente, 1 ingeniero auxiliar.

— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 Mini cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 Camix (I-Alq).

— Actividades Ejecutadas.
No se realizaron actividades contractuales en obra, esto debido a la falta de materiales para la construcción de placa huella.

- Nota: Esta interventoria refiere al contratista su preocupación por la inactividad presentada en la obra desde el dia 10 de Noviembre del 2023 hasta fecha. Y que aún no se ve ingreso de materiales para reactivar la obra. Se le hace llamado de atención al contratista y se le exige reactivar la obra en la mayor brevedad posible, para de esta forma evitar que se incremente aún más el atraso de la obra.

⇒ Martes, 21 de Noviembre 2023.

— Estado del clima: Se presento lluvia moderada desde las 2:00 am - 5:00 am y 10:00 am - 12:30 y resto del dia soleado.

— personal en obra
- contratista: No se presento personal en obra
- Interventoria: 1 Ingeniero residente, 1 ingeniero Auxiliar.

— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 Mini cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 camix (I-Alq).

— Actividades Ejecutadas.
No se realizaron actividades contractuales en obra, esto debido a la falta de materiales para la construcción de placa huella

Nota: Esta interventoría retira al contratista su preocupación por la inactividad presentada en la obra desde el día 10 de Noviembre del 20... hasta la fecha y que aún no se ve ... so de materiales para reactivar la obra. ... le hace llamado de atención al contratista y se le exige reactivar la obra en la ... brevedad posible y así evitar que siga incrementándose el atraso de la obra.

⇒ Miércoles, 22 de Noviembre 2023.

- Estado del clima: Se presentó lluvias moderadas desde las 9:30 am hasta 11:30 am, resto del día nublado.
- Personal en obra.
- Contratista: No se presento Personal.
- Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 ing. auxiliar
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador, 1 retro cargador (I), 1 Minicargador (I), 1 camioneta (I alquilado).
- Actividades Ejecutadas.
No se realizaron actividades contractuales en obra, debido a la falta de materiales para construcción de placa huella.

Nota: Esta interventoría retira al contratista su preocupación por la inactividad presentada en la obra desde el día ... Noviembre del presente año hasta la fecha y que aún no se ve el ingreso de ... faltantes para reactivar la obra, se hace llamado de atención al contratista se le exige reactivar la obra en la ... brevedad posible y así evitar que siga incrementándose el atraso de la ...

obra

⇒ Jueves, 23 de Noviembre 2023.
- Estado del clima: Dia soleado.
- personal en obra
  - Contratista: No se presentó personal.
  - Interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar.
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I), 1 retrocargador (I), 1 Minicargador (I), 1 Carro (I-mal)
- Actividades Ejecutadas.
No se realizaron actividades contractuales en obra, esto debido a la falta de materiales para construcción de placa huella.
  - Nota: Esta interventoria reitera al contratista su preocupación por la inactividad presentada en la obra desde el dia 10 de noviembre del 2023 hasta la fecha y que aun no se ve el ingreso de materiales para reactivar la obra, se le hace llamado de atención al contratista y se le exige reactivar la obra en la mayor brevedad posible y asi evitar que siga incrementandose el atraso de la obra.

⇒ Viernes, 24 de Noviembre 2023
- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra
  - Contratista: No se presento personal.
  - Interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero Auxiliar.
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I),

1 Mini cargador (I), 1 Retroexcavador (I), 1 carmix (I
Averiado).

Actividades Ejecutadas.

No se realizaron actividades contractuales en obra
debido a la falta de materiales para construcción
de placa huella.

Nota: Esta interventoría reitera al contratista su preo
cupación por la inactividad presentada en la obra des
de el día 10 de Noviembre del presente año hasta
la fecha, y que aún se vé la falta de Sumi
nistro para reactivar la obra, Se le hace llama
do de atención al contratista y se le exige reac
tivar la obra en la mayor brevedad posible y
así evitar que siga incrementandose el atraso
de la obra.

Sábado, 25 de Noviembre de 2023.

Estado del clima: Dia soleado, Se presento llovizna mode
rada desde las 5:00 am - 8:30 am.

Personal en obra.

Contratista: No se presento personal.

Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero Auxiliar.

Maquinaria en Obra

1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 Mini
cargador (I), 1 retroexcavador (I), 1 carmix (I-averiado).

Actividades Ejecutadas

No se realizaron actividades contractuales en obra
debido a la falta de materiales para construcción
de placa huella.

Nota: Esta interventoria reitera al contratista su
preocupación por la inactividad presentada en la obra
desde el día 10 de Noviembre del presente año hasta
la fecha y que aún se ve la falta de
Sumistro para reactivar la obra, se le

hace llamado de atención al contratista y se le exige reactivar la obra en la mayor brevedad posible y así evitar que siga incrementandose el atraso de la obra.

⇒ Domingo, 26 de Noviembre de 2023
No se presentaron actividades en obra.

⇒ Lunes, 27 de Noviembre de 2023.
— Estado del clima: Día soleado.
— Personal en obra.
• Contratista: No se presentaron personal en obra.
• Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar.
— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 Mini-cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 camión (I-Aut)
— Actividades Ejecutadas
No se realizaron actividades contractuales en obra, debido a la falta de materiales para construcción de placa huella.
• Nota: Esta interventoría refiere al contratista su preocupación por la inactividad presentada en obra desde el día 10 de Noviembre del presente año hasta la fecha y que pues aún no se vé el suministro de materiales para reactivar la obra, se le hace llamado de atención al contratista y se le exige reactivar la obra en la mayor brevedad posible y así evitar que siga incrementandose el atraso en la obra.
• Se le recuerda al contratista que el contrato presenta un atraso significativo y de continuar así, se estaría exponiendo a que el ente contratante

(municipio de San Bernardo del viento) proceda a dar inicio a un proceso sancionatorio por posible incumplimiento del contrato, por lo que le recomienda subsanar esta no conformidad en la mayor brevedad posible y así poder dar cumplimiento del proyecto en un buen termino.

Jubis Villalba

⇒ Martes, 28 de Noviembre 2023.

— Estado del clima: Día soleado.

— Personal en obra.

- Contratista: No se presentó personal.
- Interventoria: 1 ingeniero Residente, 1 ingeniero Auxiliar.

— Maquinaria en obra.

1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 Minicargador (I), 1 retrocargador (I), 1 carmix (I-averiado).

— Actividades Ejecutadas.

No se realizaron actividades contractuales en obra, esto debido a la falta de materiales para construcción de placa huella.

- Nota: Esta interventoria manifiesta el contratista su preocupación por la inactividad presentada en la obra desde el dia 10 de Noviembre del presente año. Hasta la fecha y que aún persista la falta de suministro de materiales para reactivar la obra. Se le hace llamado de atención al contratista y se le pide reactivar la obra en la mayor brevedad posible y así evitar que sigas incrementandose el atraso de la obra.

Se le recuerda al Contratista que el contrato presenta un atraso significativo y que de continuar así se estara exponiendo a que el ente contratante (municipio de San Bernardo del viento, proceda a dar

Inicio dun proceso sancionatorio por posible incumplimiento del contrato, por lo que se le recomienda subsanar esta no conformidad en la mayor brevedad posible y así poder dar cumplimiento del proyecto en un buen termino.

⇒ Miércoles, 29 de Noviembre 2023.

- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra
  - Contratista: No se presento personal.
  - Interventoria: 1 ingeniero Residente, 1 ingeniero Auxiliar.
- Maquinaria en obra

1 Motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I), 1 mini cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 carro x (I-Arrend).

- Actividades Ejecutadas

No se realizaron actividades contractuales en obra, esto debido a la falta de materiales para construcción de placa huella.

- Nota: Esta interventoria manifesta su inconformidad al contratista por la inactividad presentada en obra desde el dia 10 de Noviembre del 2023 hasta la fecha y que aún persiste la falta de suministro de materiales para reactivar la obra; se le hace llamado de atención al contratista y se le exige reactivar la obra en la mayor brevedad posible y así evitar que siga incrementandose el atraso de la obra.

Se le reitera al contratista que el contrato presenta un atraso significativo y que por ende esta interventoria recomendo (al municipio de San Bernardo del viento Como contratante) que se adelante de manera inmediata el debido proceso sancionatorio de la clausula penal

Pecuniaria prevista en la cláusula Decima Sexta del contrato de la referencia; esto por los presuntos incumplimientos del contrat. de obra pública No. LP-MSBV-006-2022, por parte del CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO según lo establecido en el Articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

⇒ Jueves, 30 de Noviembre 2023.
- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: No se presento personal.
  - Interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero Auxiliar
- Maquinaria en obra.
  1 Motoniveladora (G), 1 Vibro compactador (G)
  1 Mini cargador (G), 1 retro cargador (G), 1 Camx (G).
- Actividades Ejecutadas.
  No se realizaron actividades contractuales en obra, esto a la falta de materiales para construcción de placa huella.

Nota: Esta interventoria manifiesta su inconformidad al contratista por la inactividad presentada en obra desde el dia 10 de Noviembre del presente año hasta la fecha y que aún persiste la falta de materiales para reactivar la obra. Se le hace llamado de atención al contratista y se le pide reactivar la obra en la mayor brevedad posible. Y así evitar que siga incrementandose el atraso de la obra. Se le reitera al contratista que el contrato presenta un atraso significativo y que por ende esta interventoria recomendo al ente contratante (municipio de San Bernardo del Viento) que se adelante de manera inmediata el debido proceso sancionatorio de la clau

la penal pecuniaria prevista en la clausula Décima Sexta del Contrato de referencia, esto por los presentes incumplimientos del Contrato de obra publica N° LP-MSBV-006-2022, por parte del CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, según lo establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.
