	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

INFORME MENSUAL No. DIECIOCHO (18) **MES O PERIODO:** 45292

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	247
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	275
1	**INTRODUCCIÓN**		278
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		279
2.1	Localización		279
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		281
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		281
2.4	Características técnicas del proyecto		282
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		285
3.1	Información general del contrato		285
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		286
3.3	Seguimiento Items no previstos		287
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		288
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		289
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	290
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	298
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	300
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	320
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	323
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	330
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	333
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	341
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		347
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	348
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	351
	• Seguimiento Programa de Obra		353
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	364
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	366
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	368
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	372
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		701
5.1	Información general del contrato		701
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		702
5.3	Informes especialistas y profesionales		708
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		744
5.5	Informe matriz de riesgos.		745
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		751
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		752
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	753
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	755
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	761
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	763
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	774
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		802
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	803
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	805
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	809
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	813
7	**Conclusiones y recomendaciones**		379
8	**Anexos**		380
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		381
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		383
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		388
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		389

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** ene-24

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

PLAZO INICIAL: 8 MESES
PLAZO PRORROGA N°1: 4 MESES
PLAZO PRORROGA N°2: 4 MESES
PLAZO PRORROGA N° 3 : 5 MESES
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 9/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 21 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.121.889.999,40
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.121.889.999,40
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 2.436.567.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 932.324.822,40

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	5000
	Mejoramiento	m	5000
	Subbase	m	5000
Explaneaciones	Excavación en material común de la explanación y canales	-	
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	10

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m	200	1500
	Mejoramiento	m	400	4465
	Subbase	m	0	3250
Explaneaciones	Excavación en material común de la explanación y canales	m	-	5015
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	0	4

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 8.016.404.815,00		$ 8.016.404.815,00
#¡VALOR!	$ 41.265.012,10	$ 7.840.352,30	$ 49.105.364,40
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.105.047.827,10	$ 16.842.172,30	$ 8.121.889.999,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 190.672.212,40		$ 190.672.212,40	$ 190.672.212,40
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 190.672.212,40		$ 190.672.212,40	$ 247.052.032,40

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 8.015.662.815,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.374.862.765,83
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	42,10%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16

REGISTRO FOTOGRÁFICO











Fundida de losas Reforzadas y Ciclopeo de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI 17/08/2023. e instalaci+on de afirmado.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto**CMA-DTE-SEP-196-2021**y número ID del SECOPCO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".**Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Bernardo del Viento, mediante el convenio interadministrativo No. 1876 de 2021. Es por ello por lo que mediante el proceso de licitación pública **LP-MSBV-006-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**, El cual fue adjudicado al **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO**, cuyo plazo inicial es de ocho (8) meses a partir del 24 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $8.121.889.999,00.

El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambienta desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 09 al 31 de Enero de 2024 e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Este proyecto se localiza en la vía que conduce desde la intersección que lleva San Bernardo del Viento - Moñitos hasta el Corregimiento del El Castillo.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Bernardo del Viento.

San Bernardo del Viento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Está situado sobre la costa norte de Colombia en la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe y dista 78 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento. El territorio corresponde a un bosque seco tropical, con predominio de relieve bajo, baja altitud y alta temperatura, con un promedio de 30 °C, una humedad relativa del 80%, dos épocas de lluvias durante el año, entre abril – mayo y octubre – noviembre, en donde se precipita el 76% de la lluvia anual que es de unos 1.300 mm y una época de verano, que corresponde al resto del año. La mayor parte del territorio, al norte, sur y este, es plano, el resto presenta alturas cercanas a los 100 msnm, posee 34,2 km de playas de los cuales algunos tramos presentan condiciones adecuadas para el turismo y ecoturismo.

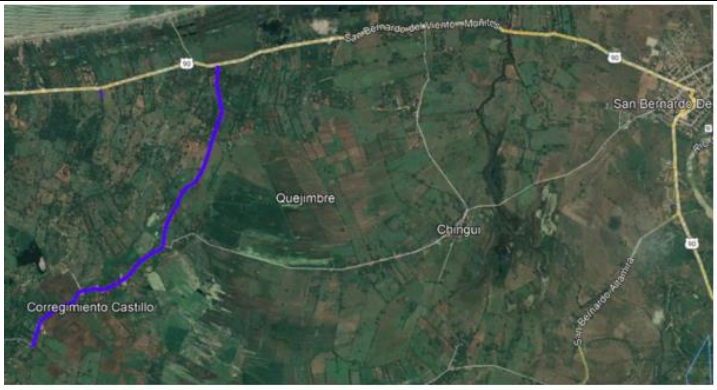


Ilustración 3. Vía al corregimiento el Castillo.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales para el material de AFIRMADO presentada por el contratista, se encuentra ubicada en la vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba. Esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.

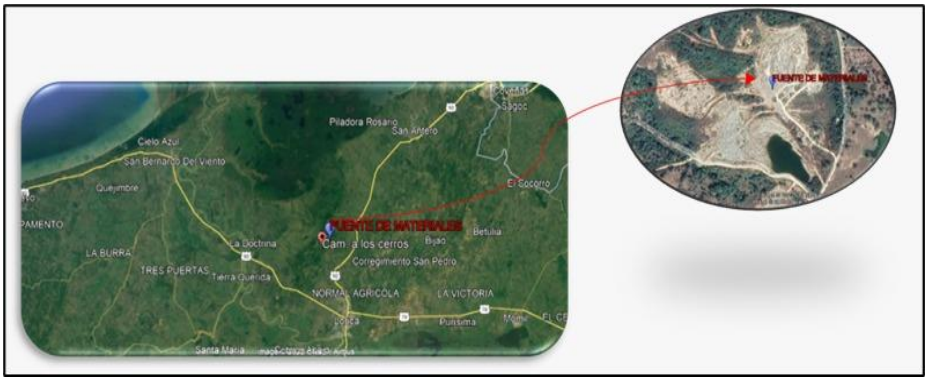


Ilustración 4. Ubicación de la fuente de materiales.

Para el material se SUBBASE GRANULAR, se encuentra ubicada en el corregimiento de san Sebastián, municipio de santa cruz de lorica, Cantera San José esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Se benefician principalmente la zona rural del municipio de San Bernardo del viendo, principalmente la población que habita en el corregimiento de El Castillo.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de la vía; es por ello que se realiza el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de placa huella.

	
Estado inicial de la Vía, 24/08/2022	Estado de la la via Actual 30/11/2023

	
Estado de la la via Actual 31/01/2024	Estado de la la via Actual 31/01/2024

Ilustración 5. Estado inicial de la Vía. Cto. LP-MSBV-006-2022


2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Inicialmente se tenía contemplada la construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5 con una longitud de 7 metros.

Luego de la actualización de los estudios y diseños, se define la metafísica a construir así: se realizará la construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Culvert de 1X1, un (1) Box Culvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y seis (6) alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

Contrato LP-MSBV-006-2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	5000 metros
Ancho Calzada	5,3 metros
Losa de concreto	0,15 metros
Subbase	0,15 metros
Afirmado (mejoramiento)	0,20 metros

i. . ESTRUCTURA DE LA PLACA HUELLA.





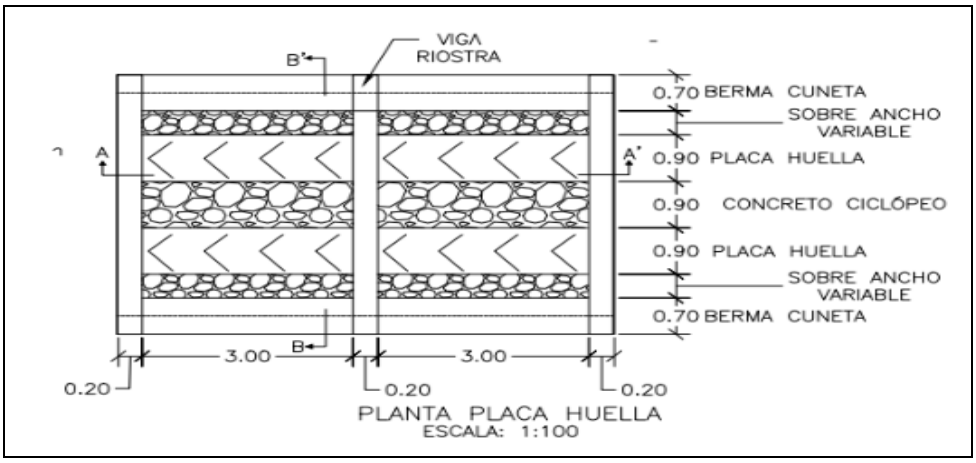


Ilustración 6. Sección típica en planta de la placa huella.


ii. OBRAS DE DRENAJES


✓ Boxculvert.

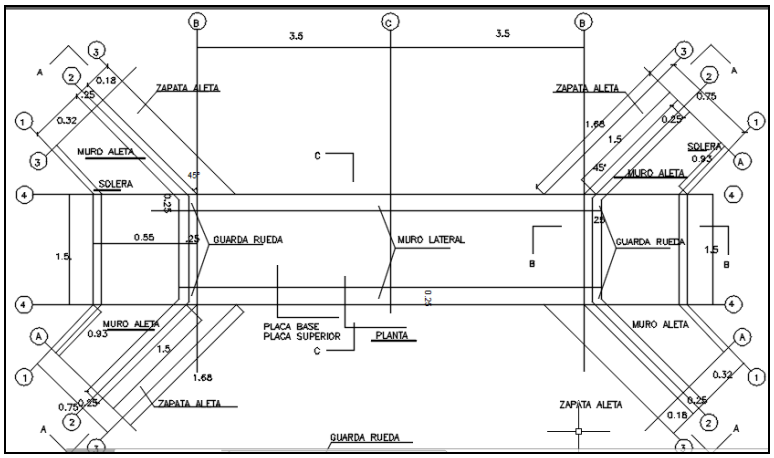

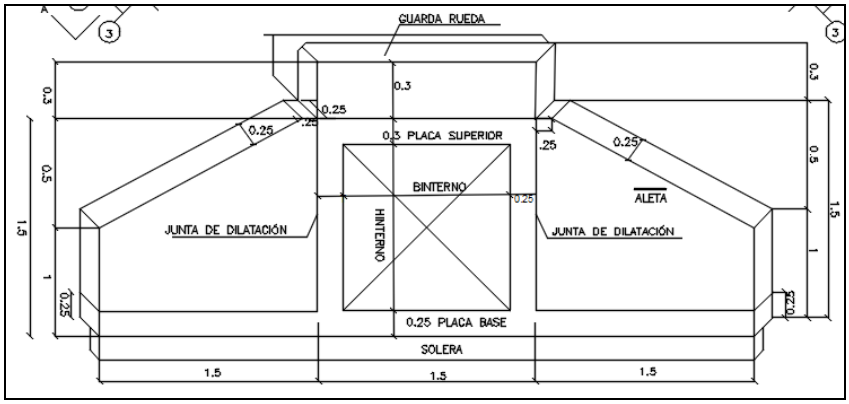

- ✓ **Alcantarillas de 36”**

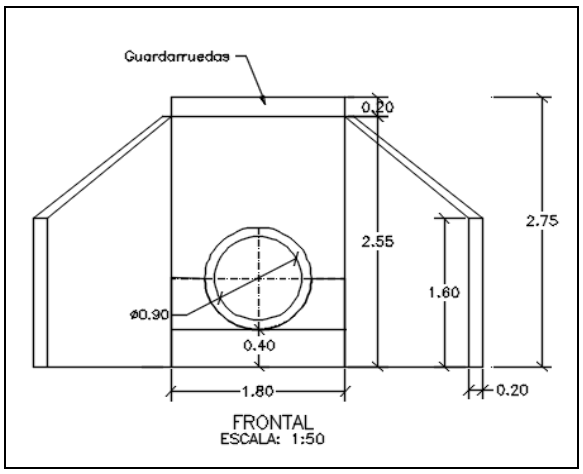

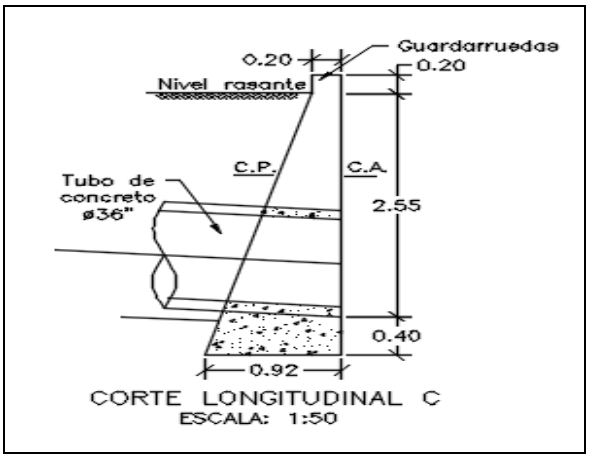

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-MSBV-006-2022
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022/07/13
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
NIT	901611859-1
INTEGRANTES	• ALEXANDER THEVENING GARCÉS • C.C. 721.485.658 • Participación: 90%
	• CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S. • NIT. 900.506.559-2 • Participación: 10%
DIRECCIÓN	Cra 11 N 10-31 Pueblo Nuevo – Córdoba
TELEFONO	3107193787
CORREO	consorciovial.sanbernardo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.121.889.999,00
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA INICIO	24/08/2022
PRORROGA N°1	4 MESES
PRORROGA N° 2	4 MESES
PRORROGA N° 3	5 MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	11/06/2024

Tabla 1. Información Cto. LP-MSBV-006-2022

El contrato de obra estuvo suspendido desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 08 de enero de 2024. El cual es reiniciado mediante acta de reinicio No.1 suscrita el 9 de enero de 2023. Teniendo en cuenta que los motivos que llevaron a la suspensión del contrato de obra fueron superados; por lo que acuerdan:

1. El contratista se compromete a actualizar las pólizas de acuerdo con la presente acta de reinicio N°.1

2. El contratista se compromete a entregar a la Interventoría la reprogramación de las obras, y plan de contingencia para que el desarrollo de la obra no se afecte en el tiempo de suspensión de las actividades.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Replanteo topográfico en conjunto entre la Interventoría y contratista

ii. Se continua con la fundición de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA.

iii. Se continua con la figuración de Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

iv. Se continua con las fundidas de Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).

v. Se continua con la construcción de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS

vi. Se Continua con la construcción de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS

vii. Se Continua con las Excavaciones varias en materia común en seco a mano

viii. Instalación de afirmado.

ix. El contratista presenta la propuesta para el cambio de Placa Huella a Pavimento rígido. La interventoría, mediante su especialista de pavimentos, realiza la revisión del diseño de pavimento rígido entregado por el contratista, el cual es devuelto con observaciones (comunicado CVRIMG-158-2024, de 25 de enero de 2024).

.

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental P.A.G. A V6, fue aprobado y enviado por la Interventoría Rad N°30779 de 29/03/2023 a INVIAS, se está a la espera para concepto de no objeción.

ii. Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio, el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023, por lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje.

iii. Permisos Ambientales: resolución No. 3-0619 del 29 de marzo de 2023, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – C.V.C. otorga el permiso de ocupación de cause a nombre del municipio de San Bernardo del Viento, de los siguientes puntos.

iv. Dentro de los requerimientos se solicita que, un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentar un informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.

Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.

v. Seguimiento a actividades PAGA: Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:

- ✓ permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
- ✓ certificaciones faltantes de los materiales utilizados en obra (arena).

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El contratista instalo el punto de atención al usuario ubicado en el Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar.
ii. El contratista realizo entrega de Informes sociales tercer trimestre, en revisión por Interventoría.
iii. Se realizó reunión mensual con la veeduría el 31 de octubre 2023 para informarle el estado del proyecto y atender inquietudes de la comunidad.
iv. El contratista presento las actas de vecindad ante la interventoría.

v. Seguimiento a actividades PAGA: Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:

- ✓ Gestiones ante ministerio del interior
- ✓ Gestión ante ICANH
- ✓ Cierre de 3 PQRS.
- ✓ Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

i. A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

i. A la fecha, se tiene una inversión de obra programada según reprogramación ajustada a prórroga N°3 es de $ 4.629.746.159,76 correspondiente al 57,75% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.374.862.765,83 correspondiente al 42,1%; lo que representa un atraso del -15,65%.
ii. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
iii. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
iv. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
v. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
vi. Reuniones de seguimiento Mensual con la veeduría
vii. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
viii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
ix. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
x. Diligenciamiento de la bitácora de obra
xi. Inspección de EPP: por medio de esta se verificó la utilización de es estos y se garantizó la calidad, el estado y buen funcionamiento de estos equipos.
xii. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xiii. Inspección de maquinaria y equipos en obra.
xiv. Mediante comunicado CVRIMG-1341-2023 Mediante comunicado CVRIMG-1341-2023, está interventoría solicita al CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, realizar la toma de núcleos a los elementos donde se está reportando el no cumplimiento de la norma y así poder dirimir y liberar dichos elementos.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 11/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 71 del 9/01/2024 al 11/01/2024 (Numeración consecutiva) **mo Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/05/2023	VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 831.674.261,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.604.892.739,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	97-1 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.154.459.481,20	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.617.430.517,80	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 315.435.811,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.474.876.034,93	55,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.232.687.639,93	40,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.242.188.394,99)	-15,50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 56.379.820,00	0,70%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.474.876.034,93	55,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.232.687.639,93	40,33%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.242.188.394,99)	-15,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.037.435,31	0,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 48.497.086,50	0,60%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.154.564.189,00	69,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89214 del 13/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 196.704.889,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR IIC

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 55,82% Avance o Atraso Físico %: -15,50%
Meta Física Ejecutada %: 40,33%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1340			1340	27%
Box Coulvert	Und	10		10	Prog	10			10	100,0%
					Ejec	4			4	40,0%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A
EMISIONES:	SI	NO X		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoria da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes despues de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.
Seguimiento a actividades PAGA.
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	23	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 2
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El dia 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoria y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre sin recibir
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana el dia 09/01/2024, se reactivo el contrato; se continuo con las actividades en obra. para construcción de palca huella. . las actividades acumuladas son:
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D fc = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excavacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

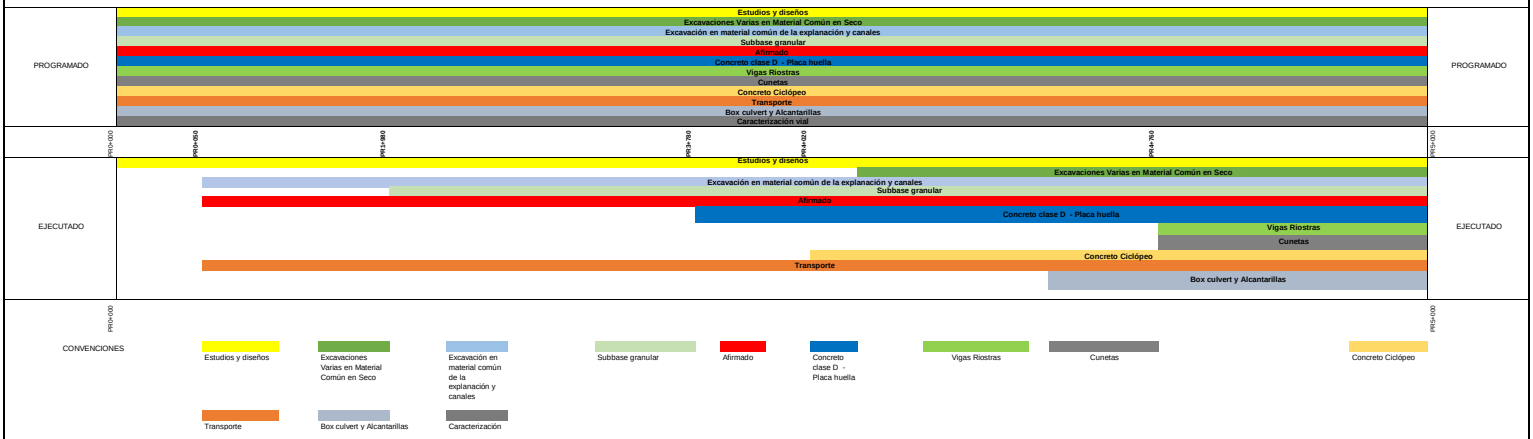

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS (HUELLA)- CARRIL IZQUIERDO. 3+706



ACERO DE REFUERZO PARA LOSAS (HUELLA)- CARRIL IZQUIERDO. 3+706



VACIADO DE LOSAS REFORZADAS (HUELLA). CARRIL IZQUIERDO. K 3+706



VACIADO DE LOSAS REFORZADAS (HUELLA). CARRIL IZQUIERDO. K 3+706



VACIADO DE LOSAS EN CONCRETO CICLOPEO. CARRIL IZQUIERDO. K3+706



ACIADO DE CUNETAS . CARRIL IZAQUIERDO. K 3+706

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista.
3. Gestionar la bitácora de obra.
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción.
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 18/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 72 del 12/01/2024 al 18/01/2024 (Numeración consecutiva) **mo Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y sieis (6) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1		INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7	
INTEGRANTES:	1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%		INTEGRANTES:	1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)	
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00	CONTRATO No.	971 de 2022	VALOR INICIAL: $ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	22/08/2022	VALOR ADICIONES: $ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/05/2024	VALOR ANTICIPO: $ 2.436.567.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO: $ 831.674.261,00			VALOR AMORTIZADO: $ 650.000.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.604.892.739,00			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.154.459.481,20	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.617.430.517,80	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 315.435.811,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.499.287.971,78	56,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.260.227.396,63	40,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.239.060.575,15)	-15,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.499.287.971,78	56,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.260.227.396,63	40,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.239.060.575,15)	-15,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	24411936,47	0,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	175.597.567,7	0,34%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.154.564.189,00	69,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 89214 del 13/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 196.704.889,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR IIC

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 56,13% Avance o Atraso Físico %: -15,46%
Meta Física Ejecutada %: 40,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1400			1400	28%
Box Coulvert	Und	12		12	Prog	12			12	100,0%
					Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Comprensor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Cordoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes despuès de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.
Seguimiento a actividades PAGA.
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción. Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre sin recibir

Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se continuó con las actividades en obra. para construcción de palca huella. . las actividades acumuladas son:
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excavacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

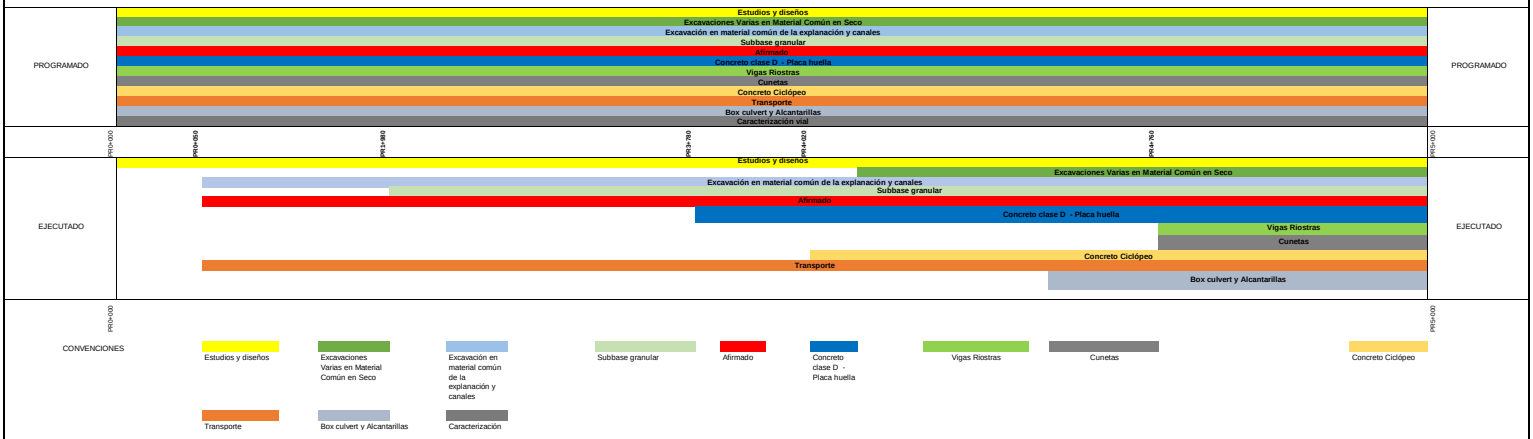

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCIO´N DE MODULOS EN CONCRETO CICLOPEO- CARRIL IZQUIERDO. 3+570



CONSTRUCIO´N DE MODULOS EN CONCRETO CICLOPEO- CARRIL IZQUIERDO. 3+570



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS. CARRIL IZQUIERDO.. K 3+620



ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS.. CARRIL IZQUIERDO. K 3+570



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y VIGAS RIOSTRA .. CARRIL IZQUIERDO. K 3+570 / 537



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y VIGAS RIOSTRA .. CARRIL IZQUIERDO. K 3+570/537

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 74 del 26/01/2024 al 1/02/2024 **mo Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (6) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/05/2024

VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 831.674.261,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.604.892.739,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 9/1 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 5.364.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$ 650.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.154.459.481,20	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.617.430.517,80	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.557.874.096,00	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 315.435.811,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.629.746.159,76	57,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.374.862.765,83	42,10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.254.883.393,93)	-15,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.629.746.159,76	57,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.374.862.765,83	42,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.254.883.393,93)	-15,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 82.245.816,28	1,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.288.662,70	0,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.154.564.189,00	69,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 88214 del 12/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 196.704.889,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 57,75%
Meta Física Ejecutada %: 42,10%
Avance o Atraso Físico %: -15,65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4466			4466	89,3%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1530			1500	30%
Box Coulvert	Und	12		12	Prog	12			12	100,0%
					Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Comprensor	1	
Equipo de oeicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Cordoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN: Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes despues de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución. **Seguimiento a actividades PAGA.**
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente al mesde de Noviembre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	15	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	15	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El dia 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldia municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social de l mes de Diciembre sin recibir Al realizar
revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se continuó con las actividades en obra. para construcción de palca huella y se realizó instalación de capa de afirmado. las actividades acumuladas son:
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA.
6. Instalació de matreial de afirmado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excvacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

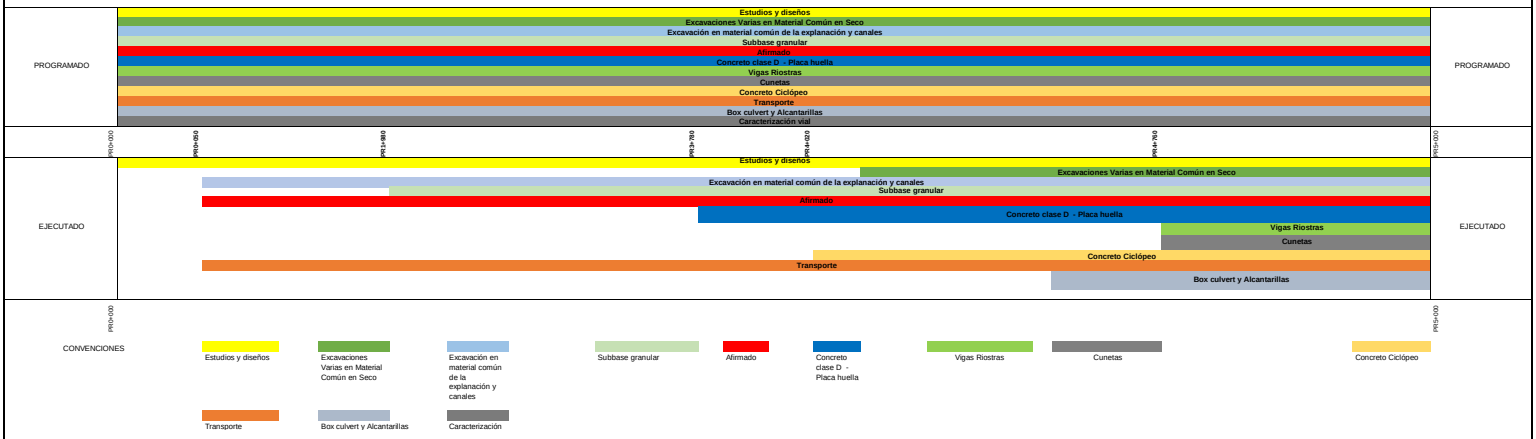

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCIÓN DE MODULOS EN CONCRETO REFORZADO (HUELLA)- CARRIL IZQUIERDO. 3+360



CONSTRUCIÓN DE MODULOS EN CONCRETO CICLOPEO Y VIGAS RIOSTRA- CARRIL IZQUIERDO. 3+460



CONSTRUCIÓN DE MODULOS PARA CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO - CARRIL IZQUIERDO. 3+424/323,1



CONSTRUCIÓN DE MODULOS EN CONCRETO CICLOPEO- CARRIL DERECHO. 3+436



ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCIÓN DE MODULOS DE CUNETAS - CARRIL DERECHO. 3+436.



CONSTRUCIÓN DE MODULOS DE CUNETAS REFORZADAS - CARRIL DERECHO. 3+436.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matricula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 73 del 19/01/2024 al 25/01/2024 **mo Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT(** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y sieis (6) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÈS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022	VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	24/04/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/05/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 831.674.261,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.604.892.739,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.154.459.481,20	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.617.430.517,80	
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**		$ 399.985.204,00	$ 3.070.014.796,00	$ 1.894.284.660,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.557.874.096,00	$ -
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 315.435.811,00	$ 1.894.284.660,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.547.500.343,48	56,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.334.574.103,13	41,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.212.926.240,35)	-15,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 56.379.620,00	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.547.500.343,48	56,73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.334.574.103,13	41,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.212.926.240,35)	-15,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 48.212.371,70	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 74.346.706,50	0,93%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.154.564.189,00	69,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 88214 del 13/12/2023
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ 196.704.889,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 831.674.261,00
Saldo $	$ 1.604.892.739,00

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 56,73% Avance o Atraso Físico % -15,13%
Meta Física Ejecutada % 41,60%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	100		Prog	100			100	100,0%
					Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	5000		Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	4950			4950	99,0%
Subbase Granular	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000	3000	2000	Prog	5000			5000	100,0%
					Ejec	1500			1500	30%
Box Coulvert	Und	12		12	Prog	12			12	100,0%
					Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	3
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica ,Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual c umple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoria da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentar un informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución. **Seguimiento a actividades PAGA.**
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES: Informe ambiental correspondiente al mesde diciembre sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Ahrecia K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal , para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social de l mes de Diciembre sin recibir Al realizar
revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En esta semana se continuó con las actividades en obra. para construcción de palca huella y se realizó instalación de capa de afirmado. las actividades acumuladas son:
1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D fc = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA.
6. Instalació de matreial de afirmado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D fc = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excvacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

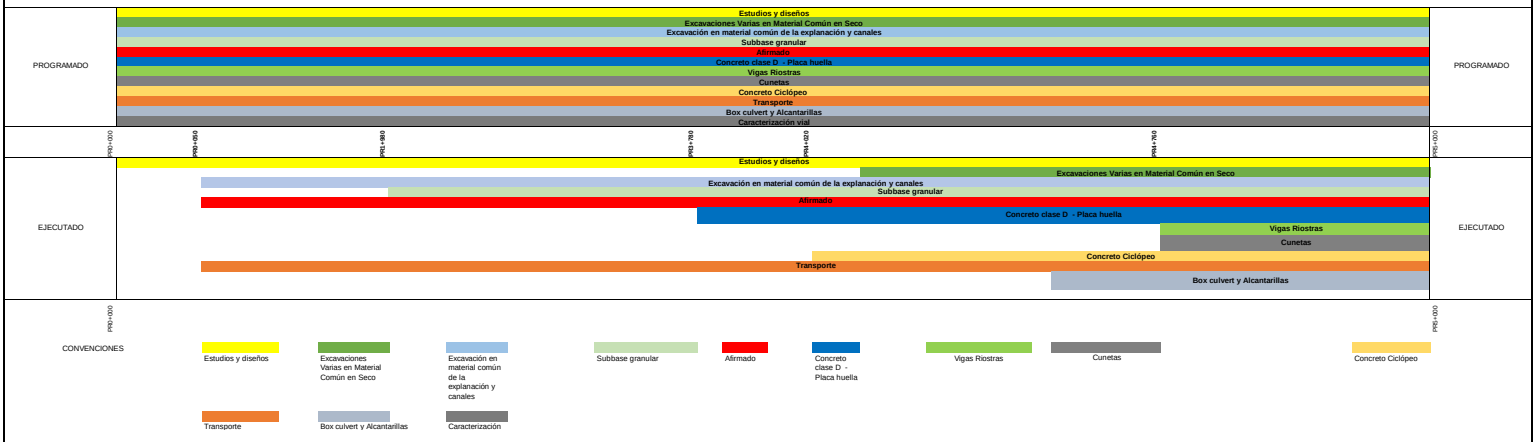

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCIÓN DE MODULOS EN CONCRETO REFORZADO (HUELLA)- CARRIL IZQUIERDO. 3+424



CONSTRUCIÓN DE MODULOS EN CONCRETO REFORZADO (HUELLA)- CARRIL IZQUIERDO. 3+424



CONSTRUCIÓN DE MODULOS EN CONCRETO CICLOPEO- CARRIL IZQUIERDO. 3+424



CONSTRUCIÓN DE MODULOS EN CONCRETO CICLOPEO- CARRIL IZQUIERDO. 3+424



INSTALACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO.K0+000 -0+300



INSTALACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO.K0+000 -0+300

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: enero-2024 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MINICARGADOR	Caterpila Cp-433C / 2022		San Bernardo del Viento									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
MOTONIVELADORA			San Bernardo del Viento									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
RETROCARGADOR			San Bernardo del Viento									R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VIBROCOMPACTADOR	Caterpillar-CS431B		San Bernardo del Viento									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
MEZCLADORA			San Bernardo del Viento									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO			San Bernardo del Viento									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A
CARMIX			San Bernardo del Viento									R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
CARRO HUMECTACIÓN			San Bernardo del Viento									I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I
VOLQUETA IMX-224			San Bernardo del Viento									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A
VOLQUETA SZA-124			San Bernardo del Viento									A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO												10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL ACTIVO												5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	8	8	8	8	8	8	0	5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL INACTIVO												3	3	3	3	3	8	3	3	3	3	3	3	8	0	0	0	0	0	0	8	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,419355	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	54%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	13%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	2	27%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): El formato no se encuentra diligenciado dado que el contrato se encontraba en revisión de los estudios y diseños del proyecto; por lo tanto, la maquinaria no fue trasladad a campo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se recomendó en obra realizar un mantenimiento total ala auto hormigonera Carmix 2.5 TT, puesto que a presentado fallas recurrentes durante este mes.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma
Nombre:ERIKC CAMARGO MORALES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202181579COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: enero-2024 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VÍA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 671 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Porvenir, Protección, Colpensiones.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO	84.094.056	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9457800913	$ 80.000	COLPENSIONES	9457800913	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
2	ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS	10.772.157	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 2.400.000	$ 167.100	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 96.000	COLPENSIONES	9457800913	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
3	GONZALEZ FUENTES DAYANA MARCELA	1.003.459.220	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 46.400	COLPENSIONES	9457800913	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
4	CORONADO GONZALEZ JAVIER EDUARDO	10.820.409	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 24.300	V	NUEVA EPS	9457800913	$ 14.000	COLFONDOS	9457800913	$ 55.700	$ 14.000			
5	ALTAMIRANDA ALVAREZ JOSE CAMILO	1.067.842.072	TOPÓGRAFO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.800.000	$ 10.944.731	V	CAJACOPI	9457800913	$ 72.000	PORVENIR	9457800913	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
6	AVILA CORREA LUIS CARLOS	1.068.736.529	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 32.300	V	MUTUALSER	9457800913	$ 18.600	PORVENIR	9457800913	$ 74.300	$ 18.600			
7	AVILA GUERRA NEIVER ANTONIO	11.166.136	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 27.000	V	MUTUALSER	9457800913	$ 15.500	PORVENIR	9457800913	$ 61.900	$ 15.500			
8	AVILA RAMOS LUIS MANUEL	1.070.821.962	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400			
9	CASTRO AVILA OMAIRO	10.943.413	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 21.600	V	MUTUALSER	9457800913	$ 12.400	PORVENIR	9457800913	$ 49.500	$ 12.400			
10	DE LA HOZ BILLAR ALQUIDEZ RAFAEL	1.123.405.092	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	CAJACOPI	9457800913	$ 46.400	PROTECCIÓN	9457800913	$ 185.600	$ 46.400			
11	DURANGO OVIEDO JORGE ALEXANDER	1.067.971.701	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MAS MAQUINAS DEL CARIBE SAS	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
12	FAJARDO MARTINEZ JULIO CESAR	10.944.731	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	$ 1.160.000	X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 10.800	V	MUTUALSER	9457800913	$ 6.200	PORVENIR	9457800913	$ 24.800	$ 6.200			
13	GERRERO FONSECA HELMER	9.273.669	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 53.900	V	NUEVA EPS	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 123.800	$ 46.400			
14	LEMUS ANGULO JESUS DAVID	1.043.635.137	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 37.700	V	NUEVA EPS	9457800913	$ 31.000	PORVENIR	9457800913	$ 86.700	$ 31.000			
15	MARTINEZ MARTINEZ AMAURY DE JESUS	73.091.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	CAJACOPI	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400			
16	MEDINA PERALTA JORGE ELIECER	17.953.908	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457800913	$ 46.400	PORVENIR	9457800913	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
17	MENDOZA BALLESTA PABLO	1.070.817.648	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 59.300	V	MUTUALSER	9457800913	$ 34.100	PROTECCIÓN	9457800913	$ 136.200	$ 34.100	$ -	$ -	
18	MORELO SUAREZ LEOBIGILDO ANTONIO	1.070.819.412	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 24.300	V	MUTUALSER	9457800913	$ 14.000	PORVENIR	9457800913	$ 55.700	$ 14.000	$ -	$ -	
19	NUÑEZ MARTINEZ JAIME ENRIQUE	10.943.765	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 53.900	V	MUTUALSER	9457800913	$ 31.000	PORVENIR	9457800913	$ 123.800	$ 31.000	$ -	$ -	
20	ORTIZ TABORDA JOSE ALFREDO	1.127.655.712	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 48.500	V	MUTUALSER	9457800913	$ 27.900	PORVENIR	9457800913	$ 111.400	$ 27.900			
21	PACHECO MORELO MANUEL VICENTE	1.070.812.240	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 27.000	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 9.300	PORVENIR	9457800913	$ 61.900	$ 15.500			
22	PADILLA QUINTANA EVER DE JESUS	1.070.823.163	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 43.100	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 24.800	PORVENIR	9457800913	$ 99.000	$ 24.800	$ -	$ -	
23	RIVAS GALEANO LUIS GERARDO	11.165.712	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 24.300	V	SALUD TOTAL	9457800913	$ 14.000	PORVENIR	9457800913	$ 55.700	$ 14.000	$ -	$ -	
24	PAULA ANDREA PARDO BONILLA	1.067.927.123	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAULA ANDREA PARDO BONILLA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9457784183	$ -	PORVENIR	9457784183		$ -	$ -	$ -	
25	TRICIA REGINA RUDA MOLINA	50.894.549	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TRICIA REGINA RUDA MOLINA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457784183	$ -	PORVENIR	9457784183		$ -	$ -	$ -	
26	YURLEY PAJARO ORTIZ	1.070.816.923	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	YURLEY PAJARO ORTIZ	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUALSER	9457784183	$ -	PORVENIR	9457784183					

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se relacionan los soportes de pago del mes de septiembre, cancelados en el mes de octubre del 2023, se le ha solicitado al contratista atravez de oficios la entrega de la planilla del mes de OCTUBRE

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	215542913	9457576327	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$9,292,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1067842072	ALTAMIRANDA ALVAREZ JOSE CAMILO	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1068736529	AVILA CORREA LUIS CARLOS	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	11166136	AVILA GUERRA NEIVER ANTONIO	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	1070821962	AVILA RAMOS LUIS MANUEL	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1003562614	CASTILLO CONDE WILFRAN	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																							
6	CC	10943413	CASTRO AVILA OMAIRO	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/30																							
7	CC	10820409	CORONADO GONZALEZ JAVIER EDUARDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22																									
8	CC	85463491	DE LA HOZ PACHECO ERIS HURBANO	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/30																							
9	CC	1123405092	DE LA HOZ VILLAR ALCIDES RAFAEL	Dependiente	0	No	No																												
10	CC	1067971701	DURANGO OVIEDO JORGE ALEXANDER	Dependiente	0	No	No																												
11	CC	10944731	FAJARDO MARTINEZ JULIO CESAR	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/23	X	2023/08/30																							
12	CC	1003459220	GONZALEZ FUENTES DAYANA MARCELA	Dependiente	0	No	No																												
13	CC	1070811981	GONZALEZ MADERA EMERITA	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/19																							
14	CC	9273669	GUERRERO FONSECA HELMER	Dependiente	0	No	No																												
15	CC	10942362	HERNANDEZ PETRO SADIT MANUEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/01	X	2023/08/09																							
16	CC	1043635137	LEMUS ANGULO JESUS DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/26																							
17	CC	73091534	MARTINEZ MARTINEZ AMAURY DE JESUS	Dependiente	0	No	No																												
18	CC	17953908	MEDINA PERALTA JORGE ELIECER	Dependiente	0	No	No																												
19	CC	84094056	MEJIA TURIZO LUIS ANTONIO	Dependiente	0	No	No																												
20	CC	1070817648	MENDOZA BALLESTA PABLO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22																									
21	CC	1010103310	MORALES BELTRAN FELIPE	Dependiente	0	No	No				X	2023/08/30																							
22	CC	1070819412	MORELO SUAREZ LEOBIGILDO ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/30																							
23	CC	10943765	NUÑEZ MARTINEZ JAIME ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																												
24	CC	1127655712	ORTIZ TABORDA JOSE ALFREDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/01	X	2023/08/12																							

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.800.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.800.000	16%	SIN RIESGO	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	4%	$ 72.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		NUEVA EPS MOVILIDAD	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		NUEVA E.P.S.	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		CAJACOPI	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		CAJACOPI	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	8	$ 309.334	16%	SIN RIESGO	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.500		MUTUAL SER	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		COOSALUD MOVILIDAD	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	19	$ 734.667	16%	SIN RIESGO	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.600		MUTUAL SER	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		MUTUAL SER	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	5	$ 193.334	16%	SIN RIESGO	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000		MUTUAL SER	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		SANITAS	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		MUTUAL SER	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		MUTUAL SER	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 72.000		COMFACOR	30	$ 1.800.000	4%	$ 72.000	ARL SURA	30	$ 1.800.000	6,96%	5	$ 125.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 12.400		COMFACOR	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	ARL SURA	8	$ 309.334	6,96%	5	$ 21.600	8	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 29.400		COMFACOR	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	ARL SURA	19	$ 734.667	6,96%	5	$ 51.200	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 7.800		COMFACOR	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	ARL SURA	5	$ 193.334	6,96%	5	$ 13.500	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 80.000		COMFACOR	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	ARL SURA	30	$ 2.000.000	6,96%	5	$ 139.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

Planilla Integrada

25	CC	10884388	OSORIO RODRIGUEZ [illegible]	Dependiente		0	No	No							X	2023/08/19																	
26	CC	1193235959	PALOMO MEJIA NEIDER LUIS	Dependiente		0	No	No							X	2023/08/30																	
27	CC	11165712	RIVAS GALEANO LUIS	Dependiente		0	No	No							X	2023/08/19																	
28	CC	1070808797	URANGO DIAZ ROBIN	Dependiente		0	No	No						X	2023/08/18	X	2023/08/30																	
29	CC	1003562697	USUGA PEREZ DERIS	Dependiente		0	No	No								X	2023/08/30																	
30	CC	70772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	Dependiente		0	No	No																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-08	2023-09	215342913	9457576327	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$9,292,200	

Total Afiliados(30)

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$4,661,200	$139,600	$0	$4,800,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$55,700	$1,700	$0	$57,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$889,600	$26,700	$0	$916,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,614,600	$78,200	$0	$2,692,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,101,300	$33,000	$0	$1,134,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,029,100	$60,700	$0	$2,089,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$2,029,100	$60,700	$0	$2,089,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,165,800	$34,900	$0	$1,200,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	30	$1,165,800	$34,900	$0	$1,200,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				30	$1,165,800	$35,100	$0	$1,200,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$92,800	$2,800	$0	$95,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$1,400	$0	$47,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$510,800	$15,300	$0	$526,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$34,200	$1,100	$0	$35,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$111,400	$3,400	$0	$114,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$290,200	$8,700	$0	$298,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$2,400	$0	$82,400
TOTAL				**30**	**$9,021,900**	**$270,300**	**$0**	**$9,292,200**

| | | |

$ 0	$ 29.400		COMFACOR	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	ARL SURA	19	$ 734.667	6,96%	5	$ 51.200	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 29.400		COMFACOR	19	$ 734.667	4%	$ 29.400	ARL SURA	19	$ 734.667	6,96%	5	$ 51.200	19	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 20.200		COMFACOR	13	$ 502.667	4%	$ 20.200	ARL SURA	13	$ 502.667	6,96%	5	$ 35.000	13	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 46.400		COMFACOR	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$ 0	$ 96.000		COMFACOR	30	$ 2.400.000	4%	$ 96.000	ARL SURA	30	$ 2.400.000	6,96%	5	$ 167.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 1.165.800						$ 1.165.800						$ 2.029.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	215546201	9457576400	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$1,118,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	6890583	ALZAMORA MARTINEZ JOSE ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
2	CC	6617440	BELLO VERGARA JAVIER ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
3	CC	10941669	CARDENAS ALVAREZ ADALBERTO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
4	CC	1070819767	CARDENAS FAJARDO DAVID FELIPE	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/25	X	2023/08/25																						
5	CC	1070810879	CONDE BARRIOS LEINER ANDRES	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/18	X	2023/08/22																						
6	CC	1193569375	GARCIA PITALUA ALVARO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/23	X	2023/08/30																						
7	CC	1070816699	MADERA MUÑOZ ROGER LUIS	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/30																						
8	CC	1003562858	MERCADO TORRES PEDRO NEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
9	CC	1070820537	MONTES AVILA FRANCISCO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/18	X	2023/08/19																						
10	CC	1068736327	NUÑEZ REYES YOIDER ENRIQUE	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
11	CC	15022766	OROZCO SUAREZ JUAN BAUTISTA	Dependiente - Cotizante con indemnización sustitutiva o devolución de saldos	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
12	CC	1192736423	OSORIO PETRO LEINER	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
13	CC	1002508018	RIVERA CABEZA LUIS MIGUEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/08	X	2023/08/19																						
14	CC	84093091	SALCEDO HERNANDEZ OSCAR ALFREDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
15	CC	1047486201	SUAREZ MARTINEZ HERNAN DARIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
16	CC	1070823927	VILLA ALTAMIRANDA CARLOS ALBERTO	Dependiente	0	No	No		X	2023/08/22	X	2023/08/22																						
Total		**Afiliados(16)**																																				

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		NUEVA E.P.S.	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		NUEVA E.P.S.	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		MUTUAL SER	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	5	$ 193.334	16%	SIN RIESGO	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000		MUTUAL SER	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	8	$ 309.334	16%	SIN RIESGO	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.500		MUTUAL SER	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	9	$ 348.000	16%	SIN RIESGO	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	2	$ 77.334	16%	SIN RIESGO	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400		NUEVA EPS MOVILIDAD	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo		0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		CAJACOPI	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		SALUD TOTAL	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		MUTUAL SER	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		NUEVA EPS MOVILIDAD	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		COOSALUD MOVILIDAD	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		MUTUAL SER	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
																					$ 557.300						$ 141.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 7.800		COMFACOR	5	$ 193.334	4%	$ 7.800	ARL SURA	5	$ 193.334	6,96%	5	$ 13.500	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 12.400		COMFACOR	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	ARL SURA	8	$ 309.334	6,96%	5	$ 21.600	8	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 14.000		COMFACOR	9	$ 348.000	4%	$ 14.000	ARL SURA	9	$ 348.000	6,96%	5	$ 24.300	9	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 3.100		COMFACOR	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	ARL SURA	2	$ 77.334	6,96%	5	$ 5.400	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 18.600		COMFACOR	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	ARL SURA	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 1.600		COMFACOR	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	ARL SURA	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 141.500						$ 141.500						$ 245.200				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	215546201	9457576400	E	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$1,118,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$557,300	$16,800	$0	$574,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$6,200	$200	$0	$6,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$6,200	$200	$0	$6,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$396,300	$11,900	$0	$408,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$148,600	$4,500	$0	$153,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$245,200	$7,400	$0	$252,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$245,200	$7,400	$0	$252,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$141,500	$4,300	$0	$145,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	16	$141,500	$4,300	$0	$145,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$141,500	$4,700	$0	$146,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$14,000	$500	$0	$14,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,600	$100	$0	$1,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$1,600	$100	$0	$1,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$97,800	$3,000	$0	$100,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$20,200	$700	$0	$20,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$4,700	$200	$0	$4,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,600	$100	$0	$1,700
TOTAL				**16**	**$1,085,500**	**$33,200**	**$0**	**$1,118,700**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	215562663	9457529410	Y	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$590,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	12,5%	$ 145.000	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
																					$ 185.600						$ 145.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 145.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 145.000						$ 0						$ 242.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	215562663	9457529410	Y	2023/09/14	2023/10/12	BANCOLOMBIA	28	$590,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$5,600	$0	$191,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$5,600	$0	$191,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$242,400	$7,300	$0	$249,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$242,400	$7,300	$0	$249,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$4,400	$0	$149,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$4,400	$0	$149,400
TOTAL				3	$573,000	$17,300	$0	$590,300

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	229819155	9457784183	Y	2023/10/13	2023/10/20	BANCOLOMBIA	7	$577,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		MUTUAL SER	30	$ 1.160.000	12,5%	$ 145.000	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
																					$ 185.600						$ 145.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 145.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 145.000						$ 0						$ 242.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	229819155	9457784183	Y	2023/10/13	2023/10/20	BANCOLOMBIA	7	$577,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$242,400	$1,800	$0	$244,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$242,400	$1,800	$0	$244,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
TOTAL				3	$573,000	$4,300	$0	$577,300

4.8. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES INFORME MENSUAL: diciembre-2023

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	210343	Vias Terciarias Mejoradas	220117	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 1.350.000.000,00	$ -
2023	210344	Vias Terciarias Mejoradas	220119	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 6.771.889.999,00	$ 6.771.889.999
			TOTAL			$ 8.121.889.999,00	$ 6.771.889.999

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 8.121.889.999,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
0	ANTICIPO		$ 1.350.000.000,00	$ -	$ 1.350.000.000,00	$ -		$ 1.350.000.000	Registro No. 210343, 13/07/2022	$ 1.350.000.000,00		NA			ANTICIPO
0	ANTICIPO		$ 1.086.567.000,00	$ -	$ 2.436.567.000,00	$ -		$ 2.436.567.000	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 5.685.322.999,00		NA			ANTICIPO
1	PARCIAL	may-23	$ 2.436.745.672,00	$ -	$ 2.436.745.672,00	$ 731.023.701,60	$ 1.705.721.970	$ 1.705.543.298	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.979.601.028,60	$ 5.685.144.327,00	NA			ACTA PARCIAL No.1
2	PARCIAL	ago-23	$ 335.501.868,00	$ -	$ 335.501.868,00	$ 100.650.560,40	$ 234.851.308	$ 1.604.892.738	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.744.749.721,00	$ 5.349.642.459,00	NA			ACTA PARCIAL No.2
3	PARCIAL	oct-23	$ 181.884.576,00		$ 181.884.576,00	$ 54.565.372,80	$ 127.319.203	$ 1.550.327.365	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.617.430.517,80	$ 5.167.757.883,00	NA			ACTA PARCIAL No.3
TOTALES			**$ 2.954.132.116**	**$ -**	**$ 2.954.132.116**	**$ 886.239.634,80**	**$ 2.067.892.481,20**	**$ 1.550.327.365**	**$ -**	**$ 11.341.781.267,40**	**$ 5.167.757.883,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 2.897.752.296,00	$ -	**$ 2.897.752.296,00**
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	**$ 56.379.820,00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 2.945.130.296,00	$ 9.001.820,00	**$ 2.954.132.116,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.9. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES INFORME MENSUAL: enero-2024 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	210343	Vias Terciarias Mejoradas	220117	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 1.350.000.000,00	$ -
2023	210344	Vias Terciarias Mejoradas	220119	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 6.771.889.999,00	$ 6.771.889.999
				TOTAL		$ 8.121.889.999,00	$ 6.771.889.999

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 8.121.889.999,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
0	ANTICIPO		$ 1.350.000.000,00	$ -	$ 1.350.000.000,00	$ -		$ 1.350.000.000	Registro No. 210343, 13/07/2022	$ 1.350.000.000,00		NA			ANTICIPO
0	ANTICIPO		$ 1.086.567.000,00	$ -	$ 2.436.567.000,00	$ -		$ 2.436.567.000	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 5.685.322.999,00		NA			ANTICIPO
1	PARCIAL	may-23	$ 2.436.745.672,00	$ -	$ 2.436.745.672,00	$ 731.023.701,60	$ 1.705.721.970	$ 1.705.543.298	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.979.601.028,60	$ 5.685.144.327,00	NA			ACTA PARCIAL No.1
2	PARCIAL	ago-23	$ 335.501.868,00	$ -	$ 335.501.868,00	$ 100.650.560,40	$ 234.851.308	$ 1.604.892.738	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.744.749.721,00	$ 5.349.642.459,00	NA			ACTA PARCIAL No.2
3	PARCIAL	oct-23	$ 181.884.576,00		$ 181.884.576,00	$ 100.650.560,40	$ 81.234.016	$ 1.504.242.178	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.663.515.705,40	$ 5.167.757.883,00	NA			ACTA PARCIAL No.3
TOTALES			**$ 2.954.132.116**	**$ -**	**$ 2.954.132.116**	**$ 932.324.822,40**	**$ 2.021.807.293,60**	**$ 1.504.242.178**	**$ -**	**$ 11.387.866.455,00**	**$ 5.167.757.883,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES	$ 2.897.752.296,00	$ -	**$ 2.897.752.296,00**
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	**$ 56.379.820,00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 2.945.130.296,00	$ 9.001.820,00	**$ 2.954.132.116,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Categoria
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal
13/08/5010	DOCTRINA LA [13085010]	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	ClimÃ¡tica Principal

Entidad	AreaOperativa	Departamento
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba
INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa 02 - AtlÃ¡ntico-Bolivar-Sucre	Cordoba

Municipio	FechaInstalacion	FechaSuspension	IdParametro	Etiqueta	DescripcionSerie	Frecuencia
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria
Lorica	15/01/1968 0:00		PRECIPITACION	PTPM_CON	DÃ-a pluviomÃ©trico (convencional)	Diaria

Fecha	Valor	Grado	Calificador	NivelAprobacion
1/11/2023 0:00	30.5	50		900
2/11/2023 0:00	0	50		900
3/11/2023 0:00	21	50		900
4/11/2023 0:00	0	50		900
5/11/2023 0:00	20.3	50		900
6/11/2023 0:00	0	50		900
7/11/2023 0:00	6.5	50		900
8/11/2023 0:00	0	50		900
9/11/2023 0:00	0	50		900
10/11/2023 0:00	0	50		900
11/11/2023 0:00	17.4	50		900
12/11/2023 0:00	0	50		900
13/11/2023 0:00	1.9	50		900
14/11/2023 0:00	11.8	50		900
15/11/2023 0:00	0	50		900
16/11/2023 0:00	0.5	50		900
17/11/2023 0:00	0.9	50		900
18/11/2023 0:00	19.5	50		900
19/11/2023 0:00	1.2	50		900
20/11/2023 0:00	1.9	50		900
21/11/2023 0:00	8.7	50		900
22/11/2023 0:00	0	50		900
23/11/2023 0:00	0	50		900
24/11/2023 0:00	1.7	50		900
25/11/2023 0:00	0	50		900
26/11/2023 0:00	0	50		900
27/11/2023 0:00	0	50		900
28/11/2023 0:00	0	50		900
29/11/2023 0:00	0	50		900
30/11/2023 0:00	0	50		900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
				VERSIÓN	1
				PAGINA	

FECHA 5/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSRV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: enero-2024 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha toma del Ensayo (Día/Mes/Año)	Fecha roturadel Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo(PSI)	porcentaje de aceptación	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA											
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
1	23/10/2023	23/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CICLOPEO DER	1	3000 PSI	3451 PSI	115%	SI	
2	25/10/2023	23/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	HUELLA DER	1	3000 PSI	4436 PSI	148%	SI	
3	26/10/2023	23/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	HUELLA DER	1	3000 PSI	3995 PSI	133%	SI	
4	27/10/2023	24/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CUNETA Y VIGA RIOSTRA DER	1	3000 PSI	3364 PSI	112%	SI	
5	1/11/2023	29/11/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CUNETA Y VIGA RIOSTRA DER	1	3000 PSI	3451 PSI	115%	SI	
6	4/11/2023	2/12/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CUNETA DER	1	3000 PSI	3996 PSI	133%	SI	
6	7/11/2023	5/12/2023	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CICLOPEO DER	1	3000 PSI	4436 PSI	148%	SI	

NOTAS: el contratista aun no presenta los resultados de los ensayos mes de diciembre

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGO [illegible]
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NIT. 900.238.905-8
RÉGIMEN COMÚN

INFORME DE ENSAYO

RESISTENCIA A LA COMPRESION CILINDROS DE CONCRETO
NORMA INVIAS E-410-13

VERSION	1
FECHA	15/05/202
ENSAYO No	91

CLIENTE: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

LOCALIZACION : CORREGIMIENTO EL CASTILLO PLACA - SAN BERNARDO DEL VIENTO

EQUIPO: PC-42

OBRA: PLACA HUELLA EL CASTILLO SAN BERNARDO DEL VIENTO - CORDOBA

FECHA: DICIEMBRE 06 DE 2023

ABSCISAS	UBICACIÓN CONCRETO	RESISTENCIA DISEÑO (PSI)	No CILINDRO	FECHA AAAA/MM/DD		EDAD (DIAS)	DIAMETRO CILINDRO (mm)	ALTURA CILINDRO (mm)	PESO DEL CILINDRO (KG)	DENSIDAD (TON/M3)	CARGA MAXIMA KN	RESISTENCIA (PSI)	TIPO DE FALLA
				TOMA	ROTURA								
K4+105-K4+080	CICLOPEO DER	3000	01	23/10/2023	23/11/2023	30	153,00	304	12,9	2,319	437,6	3.451	D
K4+080-K4+064	HUELLA DER	3000	02	25/10/2023	23/11/2023	29	153,00	304	12,9	2,319	555,2	4.436	D
K4+064-K4+030	HUELLA DER	3000	03	26/10/2023	23/11/2023	28	152,00	304	12,7	2,278	506,5	3.995	E
K3+770-k3+798	CUNETA Y VIGA RIOSTRA DER	3000	04	27/10/2023	24/11/2023	37	153,00	304	12,8	2,309	426,6	3.364	D
K4+080 - K4+044	CUNETA Y VIGA RIOSTRA DER	3000	05	1/11/2023	29/11/2023	33	153,00	304	12,8	2,292	437,6	3.451	D
K3+814 - K3+836	CUNETA DER	3000	05	04/11/2023	02/12/2023	31	153,00	304	12,7	2,278	506,7	3.996	E
K3+817 - K3+385	CICLOPEO DER	3000	05	07/11/2023	05/12/2023	28	152,00	304	12,9	2,319	555,2	4.436	D

TIPO A 

TIPO B 

TIPO C 

TIPO D 

TIPO E 

CLIENTE: ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCION PARCIAL, TOTAL SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO INCICONSULTA LTDA

OBSERVACIONES: MUESTRAS LLEVADAS AL LABORATORIO

ING JUAN PABLO FLOREZ REVOLLO

ING GEOTECNISTA MAT # 1320254096 BLV

4.11. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05 (Día) 02 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES
PLAZO ADICIONAL: 8 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	23	8	2022	23	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	23	8	2022	23	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	23	8	2022	23	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	4	2023	23	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	4	2023	23	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100217190

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 500.000.000,00	23	8	2022	23	4	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100049452 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05 (Día) 02 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	28	7	2023	28	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	28	7	2023	28	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	28	7	2023	29	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	11	2023	23	11	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	11	2023	23	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 6

Certificado de modificación o anexo No.: NB-100217190
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 580.000.000,00	23	8	2022	23	11	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 7 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. NB-100049452
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: eTNup4YySqjOnqd/Zql7zg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71707679	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114061089
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	TELÉFONO	7758011
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	TELÉFONO	7758011

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL N.02 DE FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023, SE AJUSTAN LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.. LP-MSBV-006-2022. , CUYO OBJETO ES

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/07/2023	24:00 Horas Del 28/03/2024	812.188.999,90	427.233,67
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 28/07/2023	24:00 Horas Del 28/03/2024	2.436.566.999,70	1.281.701,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/07/2023	24:00 Horas Del 29/11/2026	1.624.377.999,80	872.268,73
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 28/11/2028	16.913.946,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/11/2023	24:00 Horas Del 28/11/2028	2.436.566.999,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.326.614.945,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	2.581.203,40
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	2.581.203,40
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	490.428,65
TOTAL A PAGAR	$	3.071.632,05

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71707679	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACLARAMOS BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS 812004943 PARTICIPACION 90%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PACA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100217190** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2 / MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2** , expedida por la Compañía en **04/08/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **05** días del mes **AGOSTO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ObKVhd/5u0cJwkxO7PRUlA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71707680	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114061089
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	No. DOC. IDENTIDAD	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	TELÉFONO	3114061089
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL N.02 DE FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2023, SE AJUSTAN LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTINÚAN VIGENTES

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO. LP-MSBV-006- 2022. MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO.

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	308.273,97
PATRONAL	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	290000000.00	580000000.00	580.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 580.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	308.273,97
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	308.273,97
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	58.572,05
TOTAL A PAGAR	$	366.846,02

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	71707680	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	04/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	28/11/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS 812004943 PARTICIPACION 90%

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.12. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 23/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 10/09/2022

OBSERVACIONES: No presenta información suficiente para la ejecución del proyecto, garantizando recursos y calidad. Este plan es en sí una intención de cumplir los requisitos de la ISO9001 e ISO10005 pero no establece como lo realizará. No presentan información básica a la que se debe hacer seguimiento como plan de inspeción y ensayo, planeación metrológica, plan ante productos no conformes, defectuosos o control de quejas entre otros.
Se solicita presentar un plan de calidad con mayor detalle de como el contratista cumplira los requisitos de la entidad controtante, normativas y sus necesidades internas de Sistema de Gestión de Calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:
No se presento programa de auditoria.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO **X** APROBADO: NO **X** FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 10 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO **X**

OBSERVACIONES:
No se presenta Plan de inspección y ensayo al cual se le hace seguimientos mensuales de acuerdo con los requisitos del INVIAS.
Presentan indicadores de gestión pero no tiene en cuenta los principales a controlar por el cliente que son los avances fisicos y facturación.
Se solicita que se complementen los planes de inspección y ensayo, sin embargo se hace seguminiento al cumplimiento de las especificaciones del INVIAS.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 2 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 1

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 33 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 30

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 3

OBSERVACIONES:
Ver anexo de No Conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 1

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 3

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2 **No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 1

OBSERVACIONES:
Para el mes de octubre no se recibieron PQR, que son basicamente situaciones con los propietarios y las comunidades que intervienen en la ejecucion de la obra.
Ver anexo de quejas

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**56%**	**Cumplimiento en ejecución de inversión:** $Ejecutado / $Programado * 100
IG2: Índice de gestión 2 =	**NA**	**Satisfacción del cliente:** No. De encuestas sobresalientes y adecuadas / No. Encuestas efectuadas *100
IG3: Índice de gestión 3 =	**56%**	**Cumplimiento en el avance de obra física:** Cantidad de obra ejecutada / Total de obra programada * 100
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

En el mes de octubre se tuvo un aproximado una ejecución del 38.54% con un atraso considerable respecto a lo programado. Ver anexo de Indicadores.
El contratista no ha aplicado encuestas de satisfacción durante el desarrollo del contrato.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	HORNO	PINZUAR	263	2/08/2021	T-23908-004 R0	2/08/2022	
2	NIVEL AUTOMATICO	LINERTEC	106865	29/04/2022	N-087-22	29/10/2022	
3	ESTACION TOTAL	TOPCON	CS5208	15/02/2022	OS102	15/08/2022	
4	ESTACION TOTAL	CYGNUS	HV5305	29/04/2022	E-090-22	29/10/2022	
5	ESTACION TOTAL	TOPCON	UL3181	15/05/2022	1250	15/11/2022	
6	ESTACION TOTAL	TOPCON	V10677	26/05/2022	1622	25/11/2022	
7	ESTACION TOTAL	TOPCON	3W0695	1/02/2022	2K1292	2/08/2022	
8	ESTACION TOTAL	TOPCON	284994	19/12/2022	3685	18/06/2023	
9	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS170461	30/09/2022	1901	30/09/2023	

OBSERVACIONES:

En el mes de octubre no se presentaron los certificados de calibración de los equipos de topografía y laboratorio, dejando aclaracion de que estos ya estan vencidos como se habia notificado los meses pasados.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: DIANA MARIA MONTANO ORTIZ
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 7620282844VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ID	MES	Especificación	Descripción	unidad	Cantidad ejecutada	Material/ Insumo	Ensayos	Frecuencia	Cant. Esperada	Cant. Presentada	Observación
	Total Inicio								0	0	
	Total feb-23								67	1	
	Total mar-23								76	7	
	Total abr-23								67	14	
	Total may-23								74	3	
	Total jun-23								103	16	
	Total jul-23								106	27	
	Total ago-23								67	8	
	Total sep-23								16	5	
519	oct-23	630	Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI)- PLACA HUELLA- VIGAS RIOSTRAS- CUNETAS	m3	37,72						
520	oct-23	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
521	oct-23	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
522	oct-23	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
523	oct-23	630	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c= 21 Mpa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	12,13						
524	oct-23	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
525	oct-23	630				Agregado ciclópeo	Tamaño Máx	Diseño de mezcla	1	0	
526	oct-23	630				Agregado ciclópeo	Rel L/A	Diseño de mezcla	1	0	
527	oct-23	630				Agregado ciclópeo	Desgaste	Diseño de mezcla	1	0	
528	oct-23	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
529	oct-23	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
530	oct-23	640	Acero de refuerzo de Fy=4.200 Kg/cm2 (60000 PSI)	kg	1708,39	Acero	Protocolo de calidad del proveedor	Por lote de producción	1	0	
	Total oct-23								10	0	
	Total general								586	81	

ANEXO DE NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDADES

MES	CONTRATISTA	OFICIO/ NOTA BITÁCORA	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO	CERRADO EN EL MES?	CERRADO?	MES CIERRE
jul-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-1060-2023	Reiteración comunicado cvrimg-955-2023 con asunto: observaciones a informes de gestión ambiental (febrero, marzo y abril 2023)				
jul-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-1084-2023	Reiteración del comunicado cvrimg-678-2023, cuyo asunto es solicitud de ensayos de extracción de núcleos.	No ha presentado			
sep-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-1457-2023	Reiteracion soclicitud legalizacion anticipo	Entregado		SI	oct-23
oct-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-1587-2023	Segunda reiteración comunicado CVRIMG-1374-2023 Solicitud informes de seguimiento social mes de agosto 2023.	entregado	SI		oct-23
oct-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-1678-2023	Reiteración solicitud plan de contingencia.	no ha presentado			

QUEJAS Y RECLAMOS					
MES	**CONTRATISTA**	**QUEJA/ RECLAMO**	**OBSERVACIÓN**	**CERRADA EN EL MES?**	**MES CIERRE**
feb-23	Consorcio Vial San Bernardo	Se recepciona petición del rector de la institución educativa de El Castillo, sobre la instalación de reductores de velocidad a la entrada de la institución; con el fin de disminuir riesgo por accidentes de tránsito.	Se responde mediante oficio 01-03-2023. que toca esperar que el proyecto avance para determinar la señalización-	NO	
may-23	Consorcio Vial San Bernardo	Dos familias manifiestan de manera verbal que sus viviendas presentan fisuras Manuel Perez Lopez y Maria Julio Bolaños	Pendiente - el dia 11-07-2023 se hace visita domiciliaria a la vivienda del señor manuel perez lopez y la señora Maria Julio Bolaños , con el fin de verificar el estado de los predios. PENDIENTE por dar dar respuesta y cerrar la solicitud. Interventoría emite oficio CVRIMG-1375-2023 del 05-09-2023. Oficio CVRIMG-1687-2023 día 03-11-2023	NO	
oct-23	Consorcio Vial San Bernardo	No se presentaron.			

4.13. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

• Seguimiento a la inversión del Anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO
Vial San Bernardo

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

DPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento

PÁGINA	1

DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	7	9	2022

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LP-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL:X** **PLAN No.1** **MODIFICACIÓN:**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANBERNARDO

REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

REP.LEGAL FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO

VR. CONTRATO:	8.121.889.999		PORCENTAJE DE ANTICIPO :	30,0%
VR. ANTICIPO:	1.350.000.000	1.350.000.000	% IMP. MUNICIPALES	0,0%
VR. IMPUESTOS:	0			
VR. ANTICIPO RECIBIDO:	0			

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Mano de Obra	100.000.000,00	7,41%	150.000.000,00	11,11%	49.200.000,00	3,64%	299.200.000,00	22,16%
2	Transporte de Materiales	340.800.000,00	25,24%	100.000.000,00	7,41%		0,00%	440.800.000,00	32,65%
3	Suministro de Materiales	300.000.000,00	22,22%	150.000.000,00	11,11%		0,00%	450.000.000,00	33,33%
4	Alquiler de equipos y herramientas	100.000.000,00	7,41%	60.000.000,00	4,44%		0,00%	160.000.000,00	11,85%
TOTAL		840.800.000,00	62,28%	460.000.000,00	34,07%	49.200.000,00	3,64%	1.350.000.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO
Representante Legal
Consorcio Vial San Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Interventor

CONSORCIO
Vial San Bernardo
Nit: 901611859-1

MUNUICIPIO DE SAN BERNARDO
DPARTAMENTO DE CORDOBA
MODIFICACION 1 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

DE	1

DD	MM	AA
8	3	2023

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LF-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** **MODIFICACION** X **PLAN No.**
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- VIA CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG
REP. LEGAL FREDY RODRIGUEZ
VR. CONTRATO: 8.121.889.999
VR. ANTICIPO: 2.436.567.000
VR. ANTICIPO A RECIBIR 1.086.567.000
VR. ANTICIPO RECIBIDO: 1.350.000.000

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%
% IMP. MUNICIPALES: 0%

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta critica del programa de obra.

No.	DESCRIPCION	VR. MES 1	%	VR. MES 2	%	VR. MES 3	%	VR. MES 4	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Contratode Mano de Obra	$ 100.000.000	4,10%	150.000.000,00	6,16%	49.200.000,00	2,02%	98.797.000,00	4,05%	397.997.000,00	16,33%
2	Transporte de Materiales y equipos	$ 340.800.000	13,99%	100.000.000,00	4,10%			350.000.000,00	14,36%	790.800.000,00	32,46%
3	Suministro de Materiales	$ 300.000.000	12,31%	150.000.000,00	6,16%			400.000.000,00	16,42%	850.000.000,00	34,89%
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 100.000.000	4,10%	60.000.000,00	4,44%			237.770.000,00	9,76%	397.770.000,00	16,33%
TOTAL		840.800.000,00	34,51%	460.000.000,00	20,86%	49.200.000,00	2,02%	1.086.567.000,00	44,59%	2.436.567.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA
Representante Legal
Consorcio vial Sa Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOS
Secretario de Infraestructura Municipio de San Bernardo Del Viento
Supervisor De Obra

FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio vial IMG
Interventor

Powered by CamScanner

MEPI-MN1-IN-2-FR-2, INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	05/02/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 15 **MES:** ene-2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | |

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15593 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 687-000021-91 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.350.000.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	AVANZAR CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	Mano de obra
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	INTEGRA2 SAS	$ 340.800.000,00	2	Transporte de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	356	6-oct-22	JANNE MIQUEL ROQUEME RAFAEL	$ 300.000.000,00	3	Suministro de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.	$ 100.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	TOPOGRAFIA TOTAL ALTAMIRANDA SAS	$ 199.200.000,00	1	Mano de obra
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	NTEGRA2 SAS	$ 100.000.000,00	2	Transporte de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS	$ 60.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	4	5-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 147.648.570,00	3	Suministro de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	5	19-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 2.351.000,00	3	Suministro de materiales

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Mano de Obra	$ 397.997.000,00	$ 299.200.000,00	$ -	$ 299.200.000,00	$ 98.797.000,00
2	Transporte de Materiales	$ 790.800.000,00	$ 440.800.000,00	$ -	$ 440.800.000,00	$ 350.000.000,00
3	Suministro de Materiales	$ 850.000.000,00	$ 449.999.570,00		$ 449.999.570,00	$ 400.000.430,00
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 397.770.000,00	$ 160.000.000,00	$ -	$ 160.000.000,00	$ 237.770.000,00
	TOTALES	$ 2.436.567.000,00	$ 1.349.999.570,00	$ -	$ 1.349.999.570,00	**$ 1.086.567.430,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (DIC) : 5 (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 434.243,91 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
15593 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 228.978,69	oct-22	10/11/2022	$ 228.978,69
15593 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 197.569,56	nov-22	12/12/2022	$ 426.548,25
15594 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 7.695,66	dic-22	28/12/2022	$ 434.243,91

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.


Firma:
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

• Seguimiento al programa de obra


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**	**274 días**	**mar 23/08/22**	**dom 23/04/23**		**$ 8.123.957.999,00**
2		INICIO	0 días	mar 23/08/22	mar 23/08/22		$ 0,00
3		**I. EXPLANACIONES**	**22 días**	**dom 18/09/22**	**sáb 8/10/22**		**$ 100.839.101,00**
4		Excavaciones varias en material común en seco.	1 día	vie 7/10/22	sáb 8/10/22	5	$ 9.864.101,00
5		Excavación en material común de la explanación y canales	21 días	dom 18/09/22	vie 7/10/22	27	$ 90.975.000,00
6		**II. ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER DE 2.5X2.5 L=7M (CANTIDAD 1UND)**	**86 días**	**sáb 28/01/23**	**vie 14/04/23**		**$ 106.553.207,00**
7		Excavaciones varias en materia común en seco a mano	6 días	lun 30/01/23	sáb 4/02/23	8	$ 4.689.216,00
8		Demolición de estructuras	2 días	sáb 28/01/23	lun 30/01/23	19	$ 895.114,00
9		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PS	4 días	sáb 4/02/23	mié 8/02/23	7	$ 2.877.815,00
10		Concreto clase C (280kg/cm2 ó 4000 PS	23 días	vie 3/03/23	jue 23/03/23	11FC-4 días	$ 48.537.494,00
11		Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	30 días	mié 8/02/23	lun 6/03/23	9	$ 47.730.842,00
12		Relleno para Estructuras con material excavacion	22 días	lun 20/03/23	sáb 8/04/23	10FC-4 días	$ 296.950,00
13		Relleno para Estructuras con recebo	29 días	lun 20/03/23	vie 14/04/23	12CC	$ 1.525.776,00
14		**III. PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5.3M Y LONGITUD DE 5300M**	**43 días**	**mié 21/12/22**	**sáb 28/01/23**		**$ 7.529.166.899,00**
15		Subbase Granular Clase C.	17 días	mié 28/12/22	jue 12/01/23	16FC-5 días	$ 1.207.775.000,00
16		Afirmado (Material para Mejoramiento)	12 días	jue 22/12/22	dom 1/01/23	23FC-10 días	$ 411.562.500,00
17		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	24 días	mar 27/12/22	mar 17/01/23	18FC-20 días	$ 2.370.659.200,00
18		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	25 días	vie 23/12/22	sáb 14/01/23	20FC-20 días	$ 373.378.824,00
19		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	24 días	sáb 7/01/23	sáb 28/01/23	21FC-3 días	$ 907.517.975,00

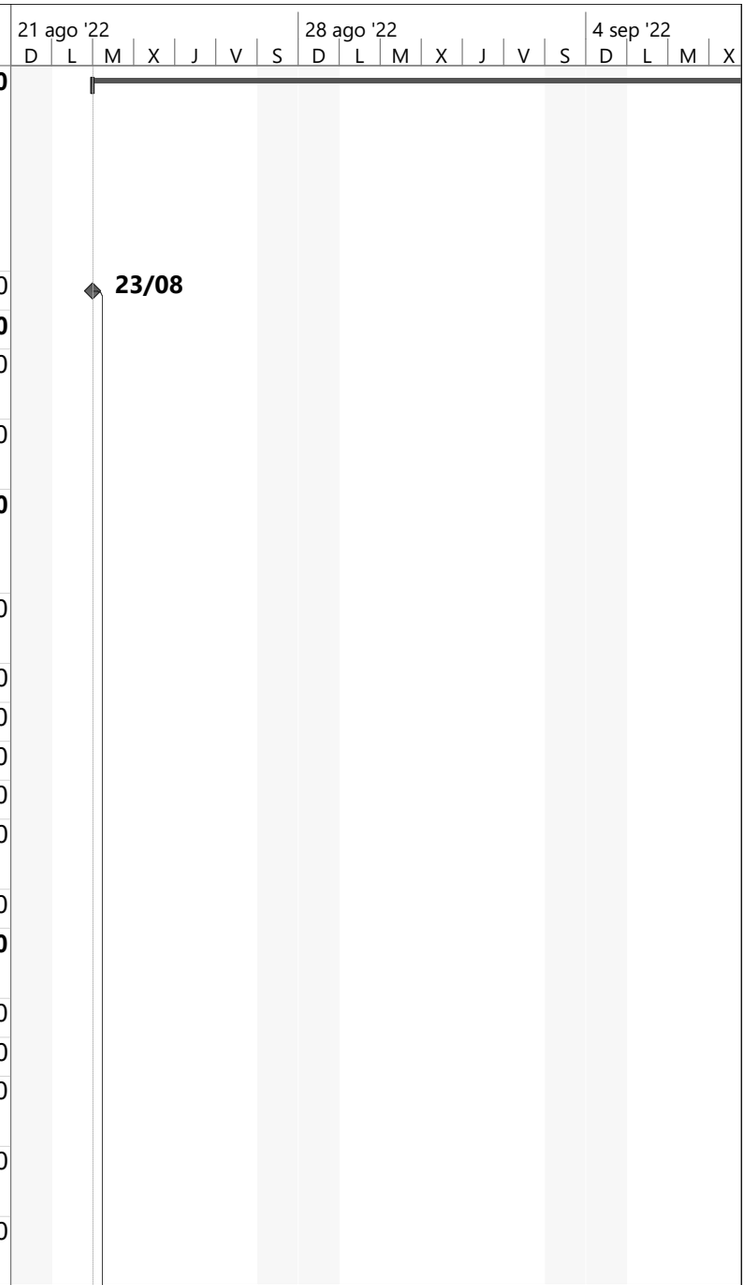

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23


Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
20		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	22 días	mié 21/12/22	lun 9/01/23	15FC-25 días	$ 1.225.089.600,00
21		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	21 días	jue 22/12/22	lun 9/01/23	17FC-30 días	$ 1.033.183.800,00
22		**IV. TRANSPORTE**	**95 días**	**vie 7/10/22**	**vie 30/12/22**		**$ 278.203.608,00**
23		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	95 días	vie 7/10/22	vie 30/12/22	5	$ 278.203.608,00
24		**V. CARACTERIZACIÓN VIAL**	**10 días**	**vie 14/04/23**	**dom 23/04/23**		**$ 3.710.000,00**
25		Caracaterización del corredor	10 días	vie 14/04/23	dom 23/04/23	13	$ 3.710.000,00
26		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	10 días	vie 14/04/23	dom 23/04/23	25CC	$ 49.105.364,00
27		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	mar 23/08/22	dom 18/09/22	2	$ 56.379.820,00
28		FIN DEL PROYECTO	0 días	dom 23/04/23	dom 23/04/23	26;25	$ 0,00

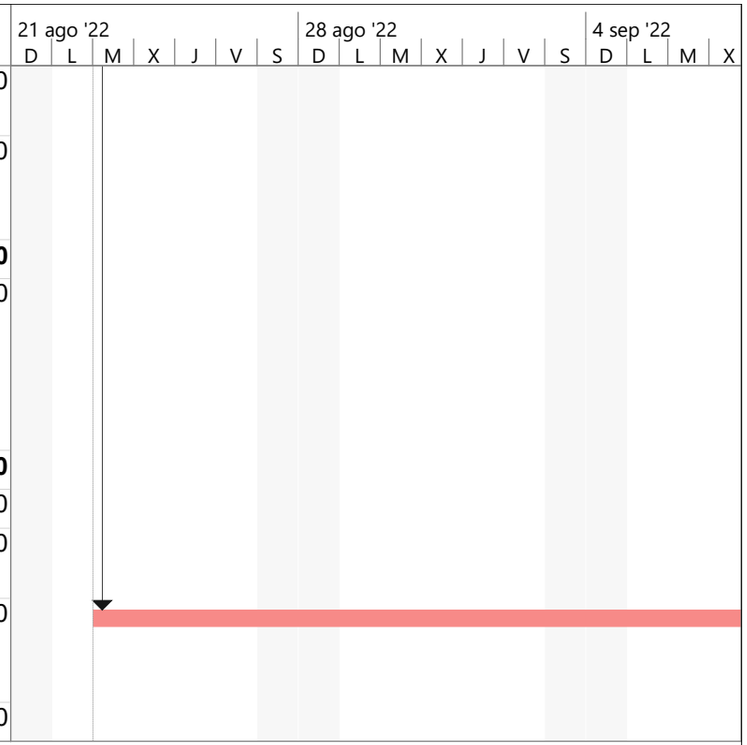


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

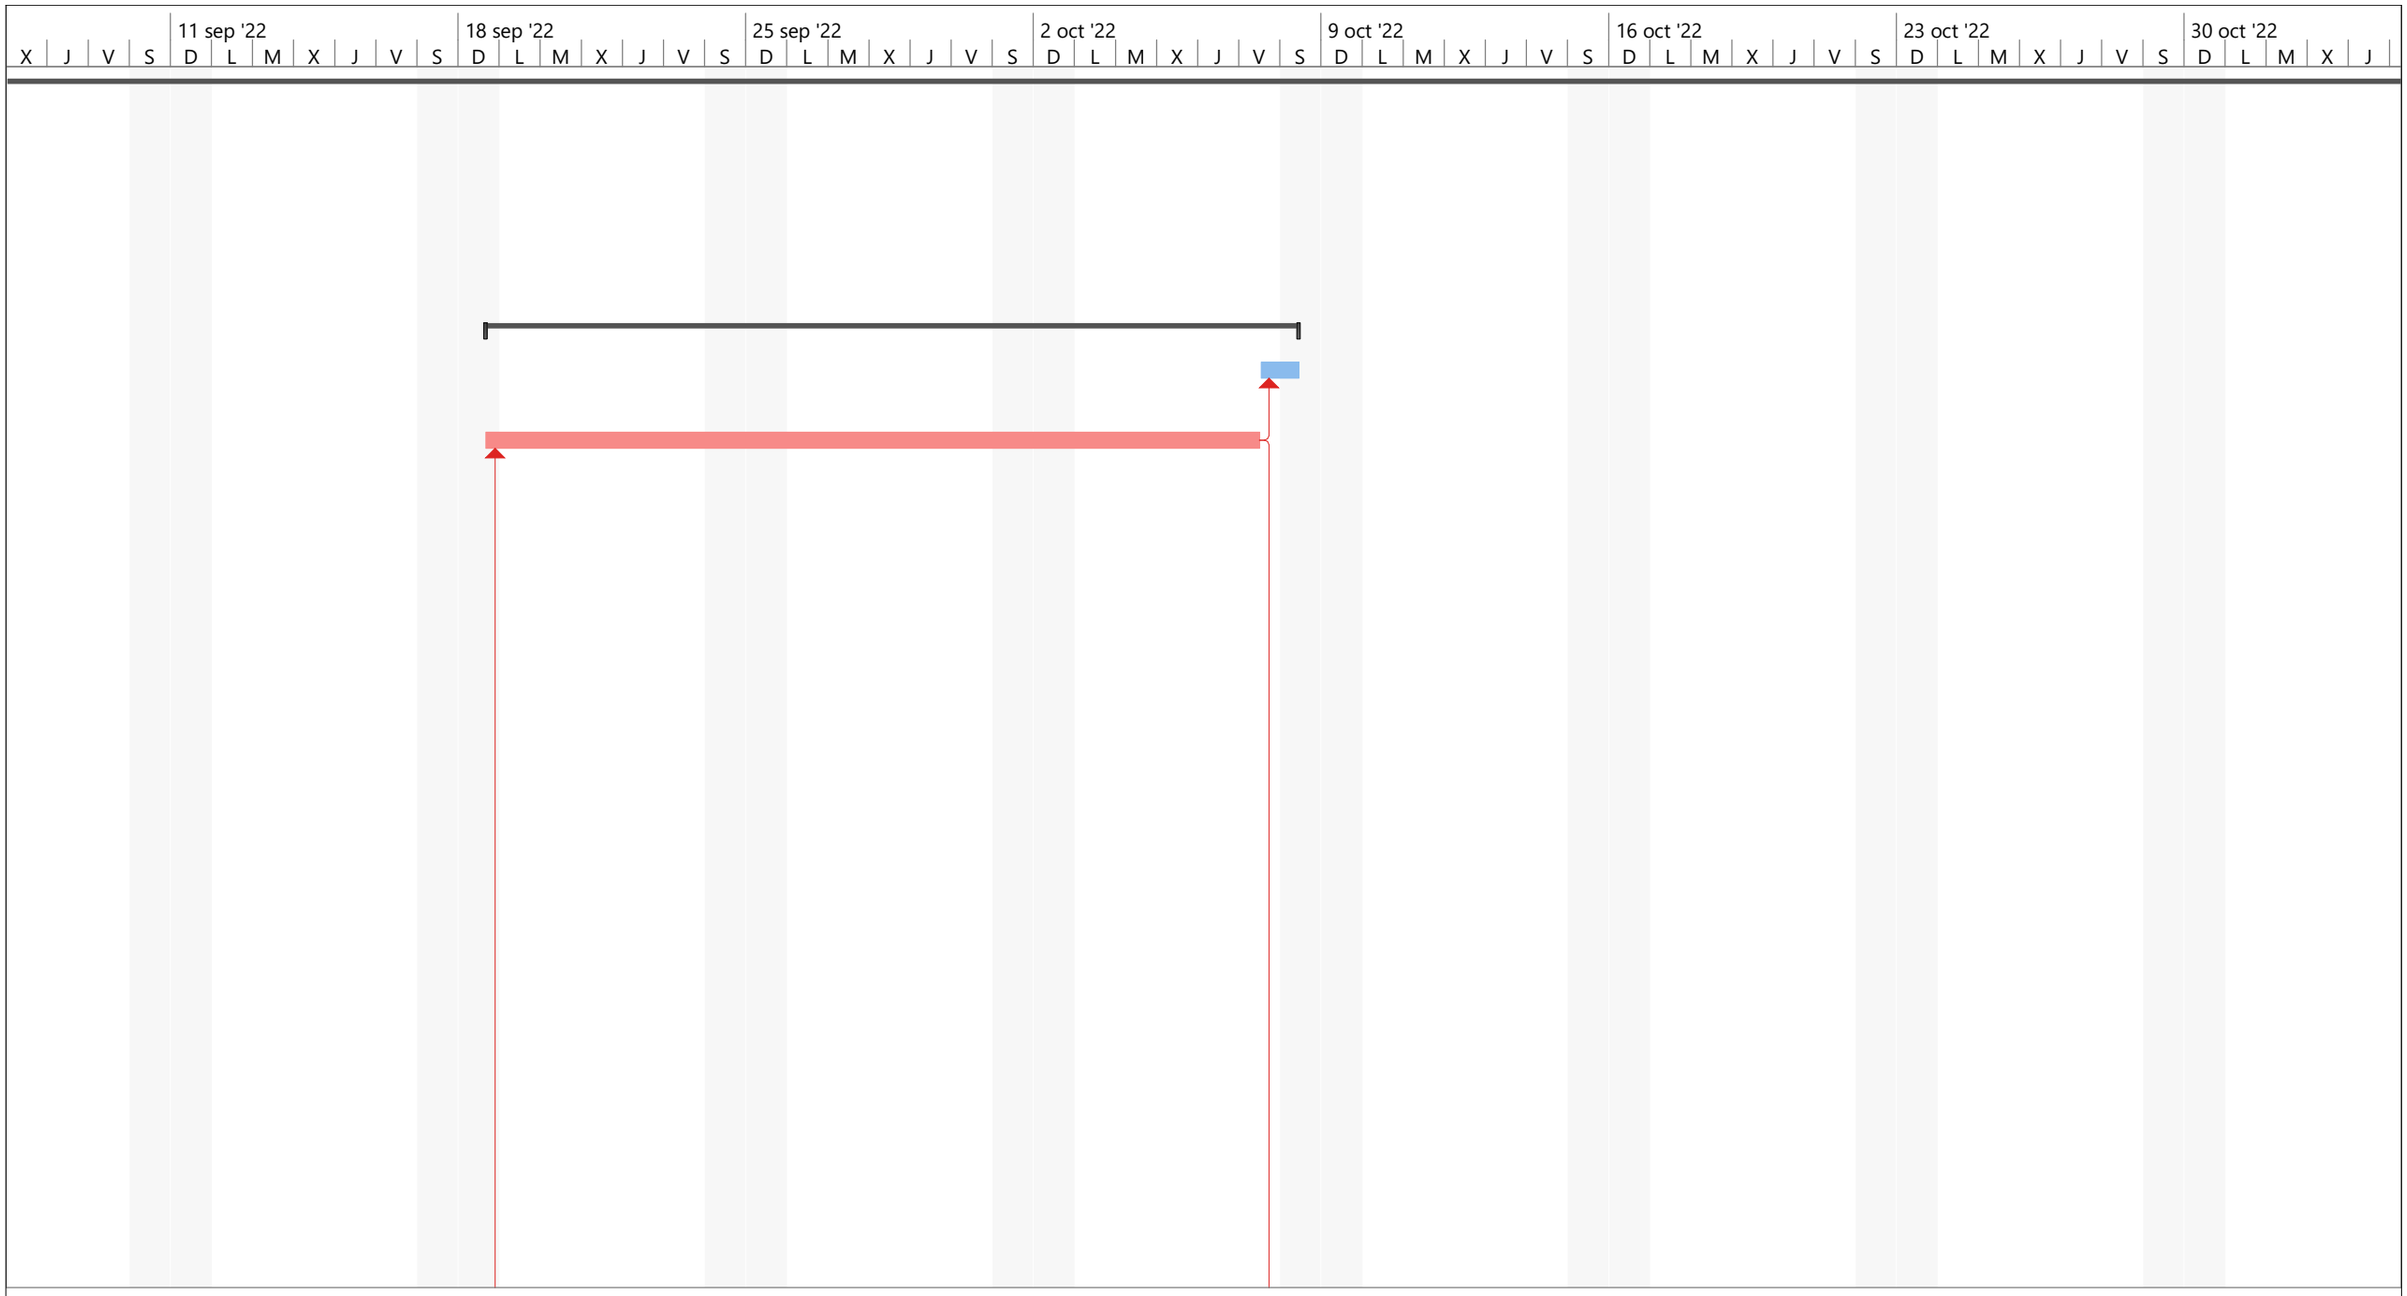

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

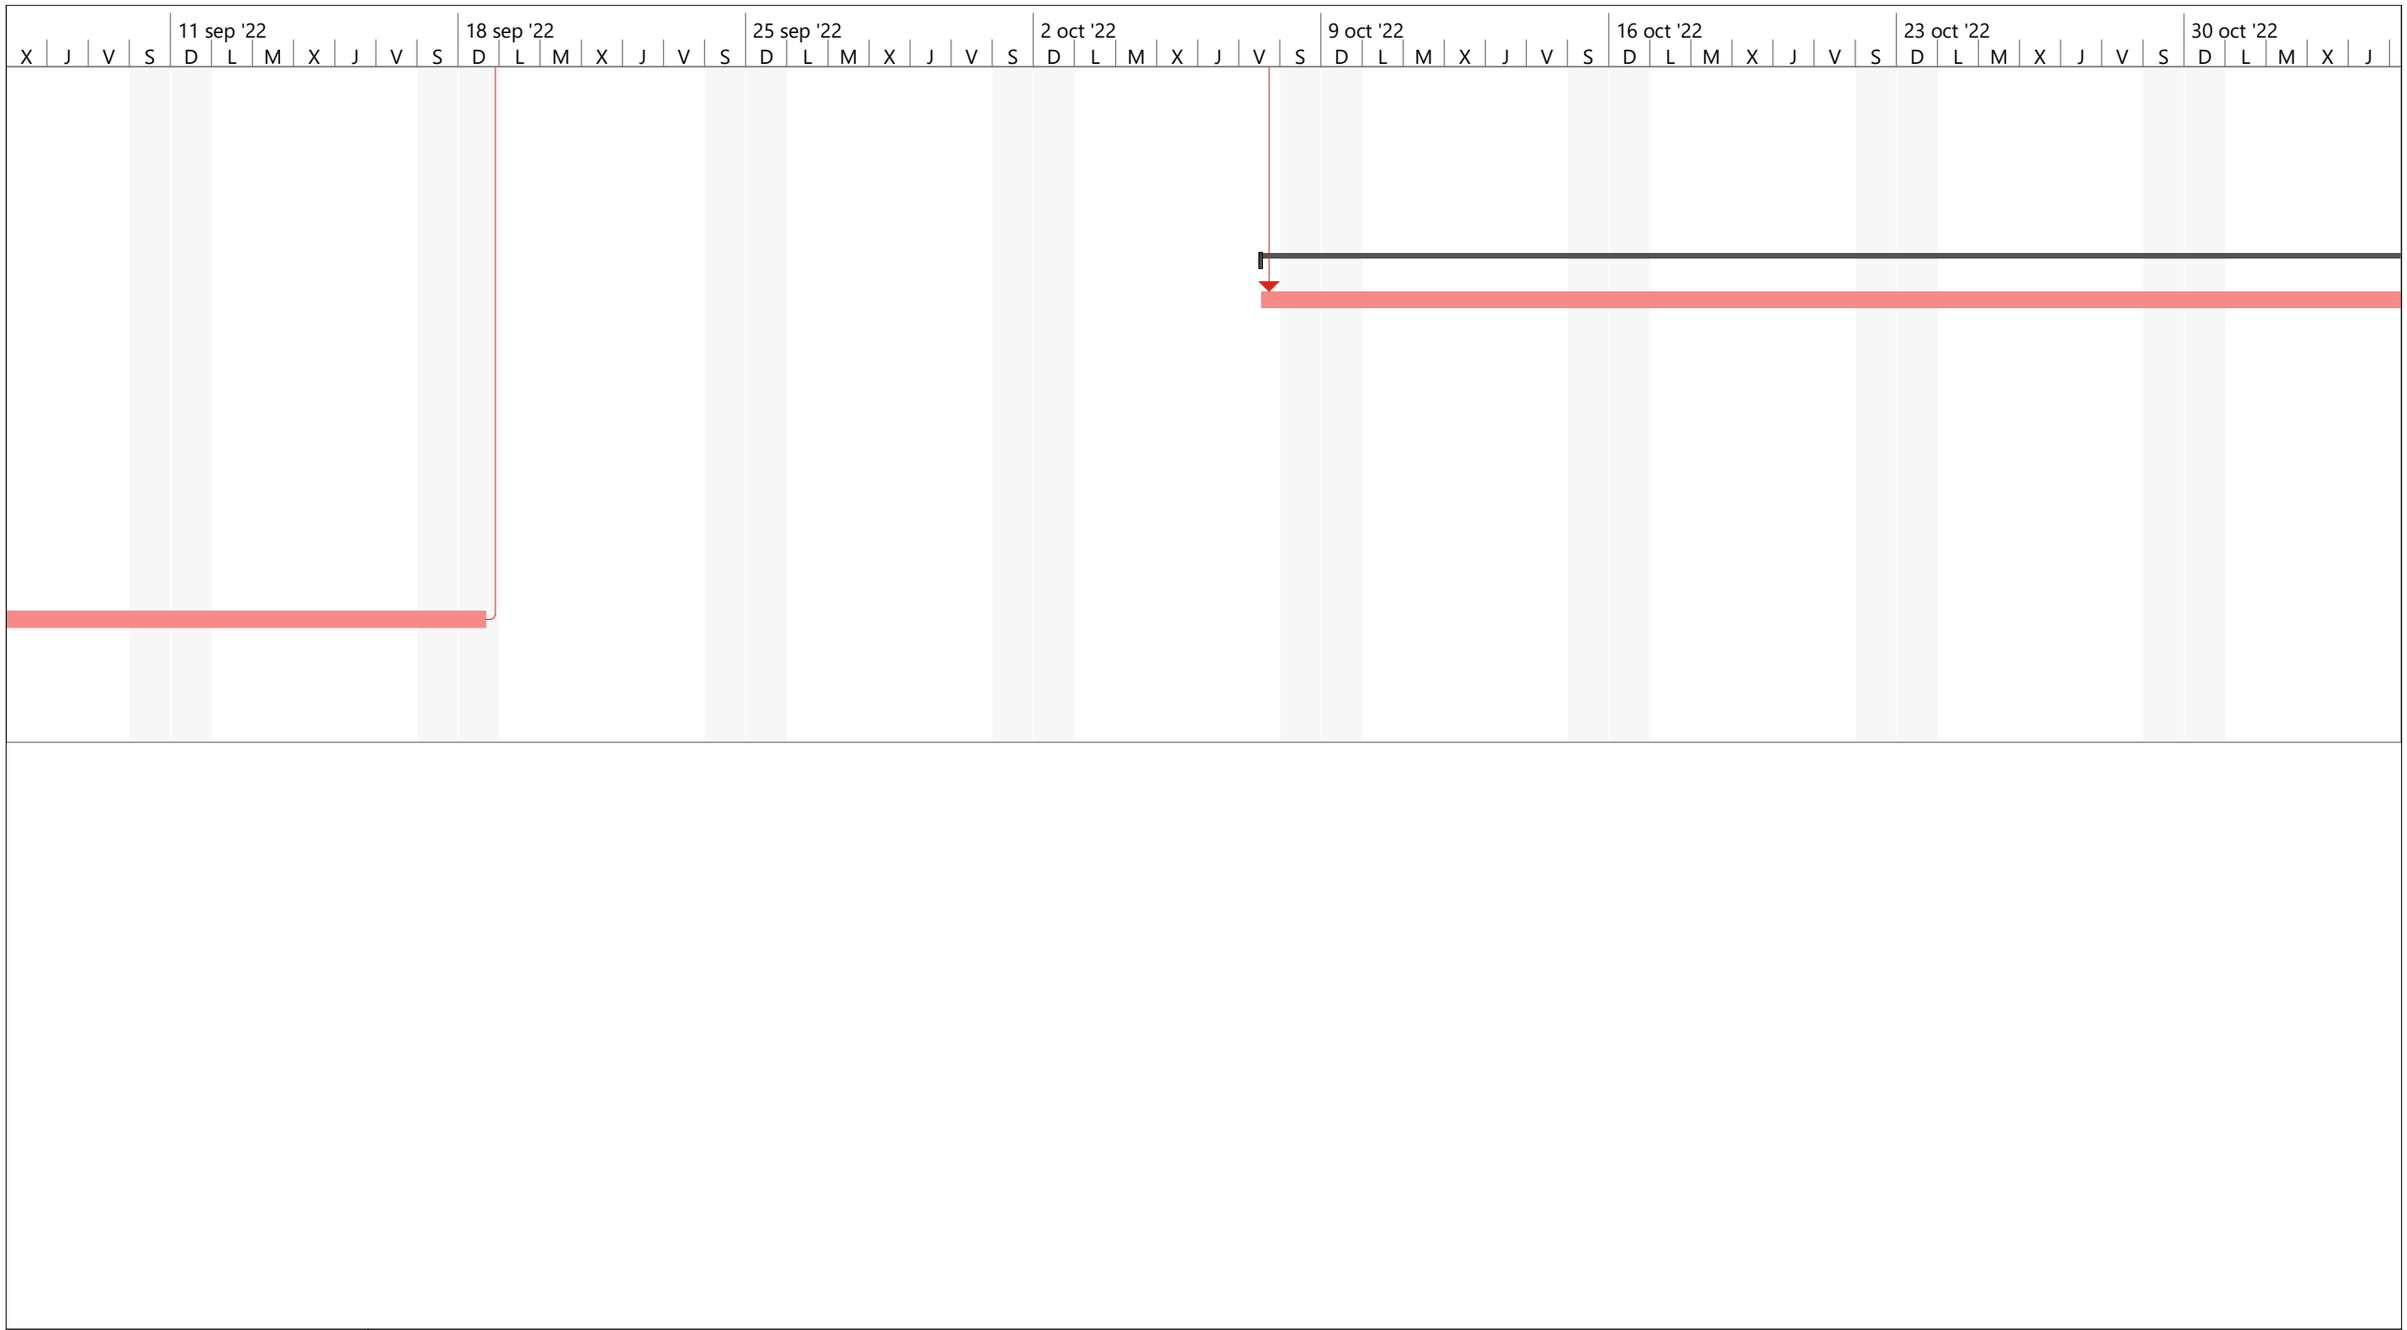


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			




Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

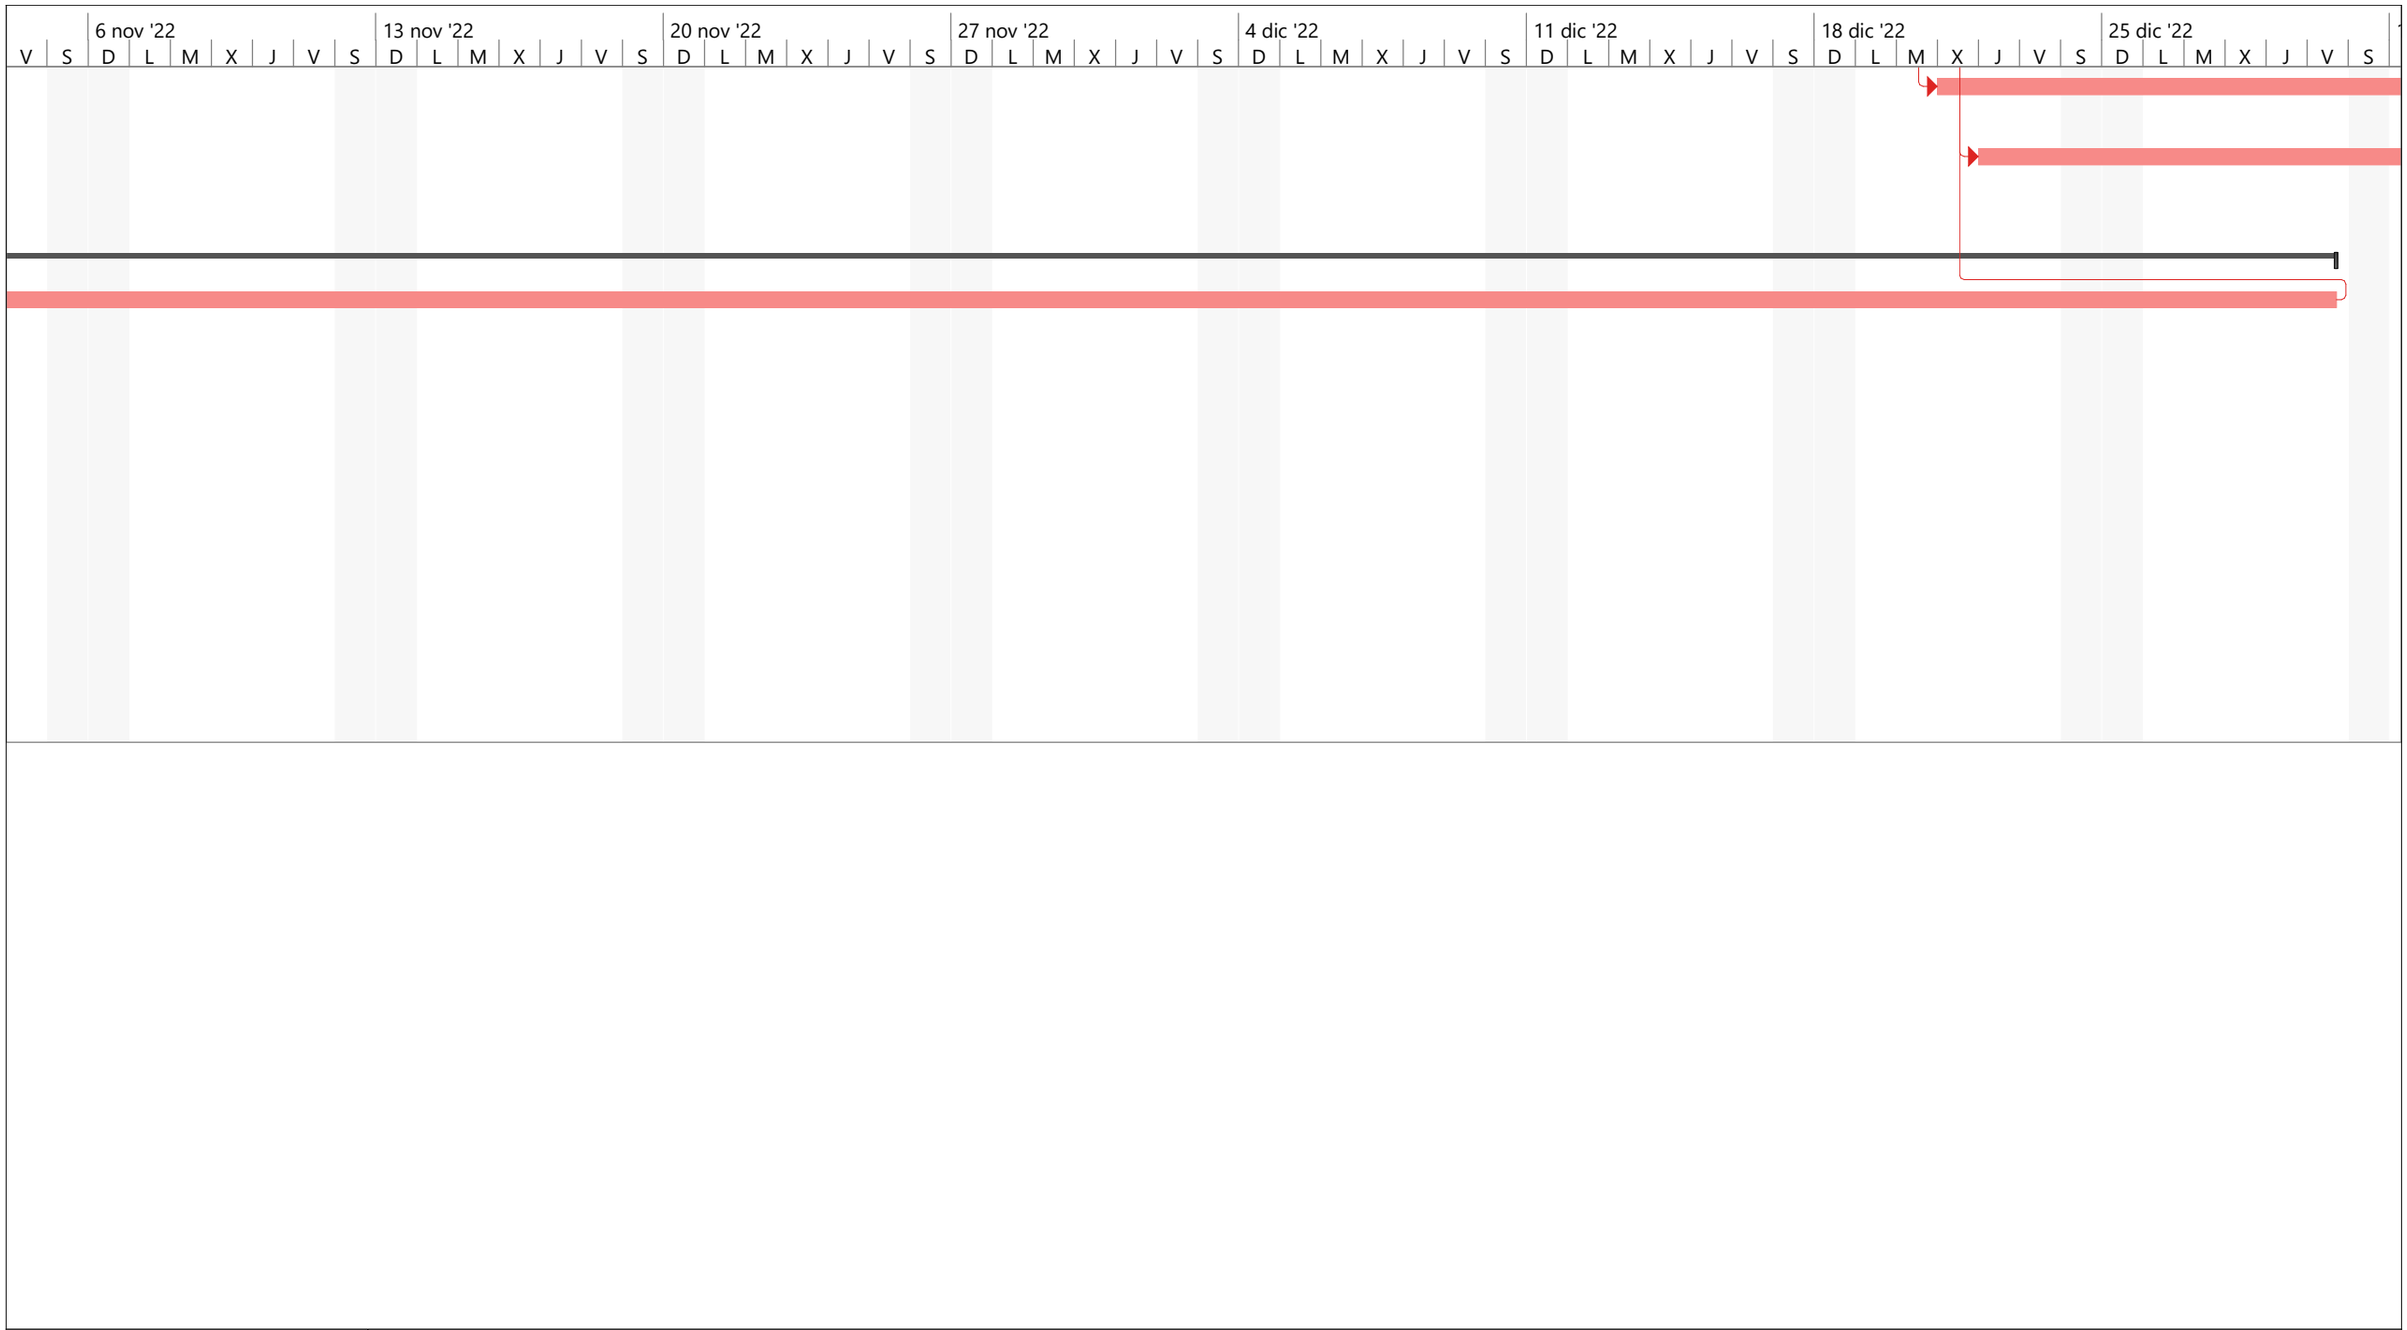


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

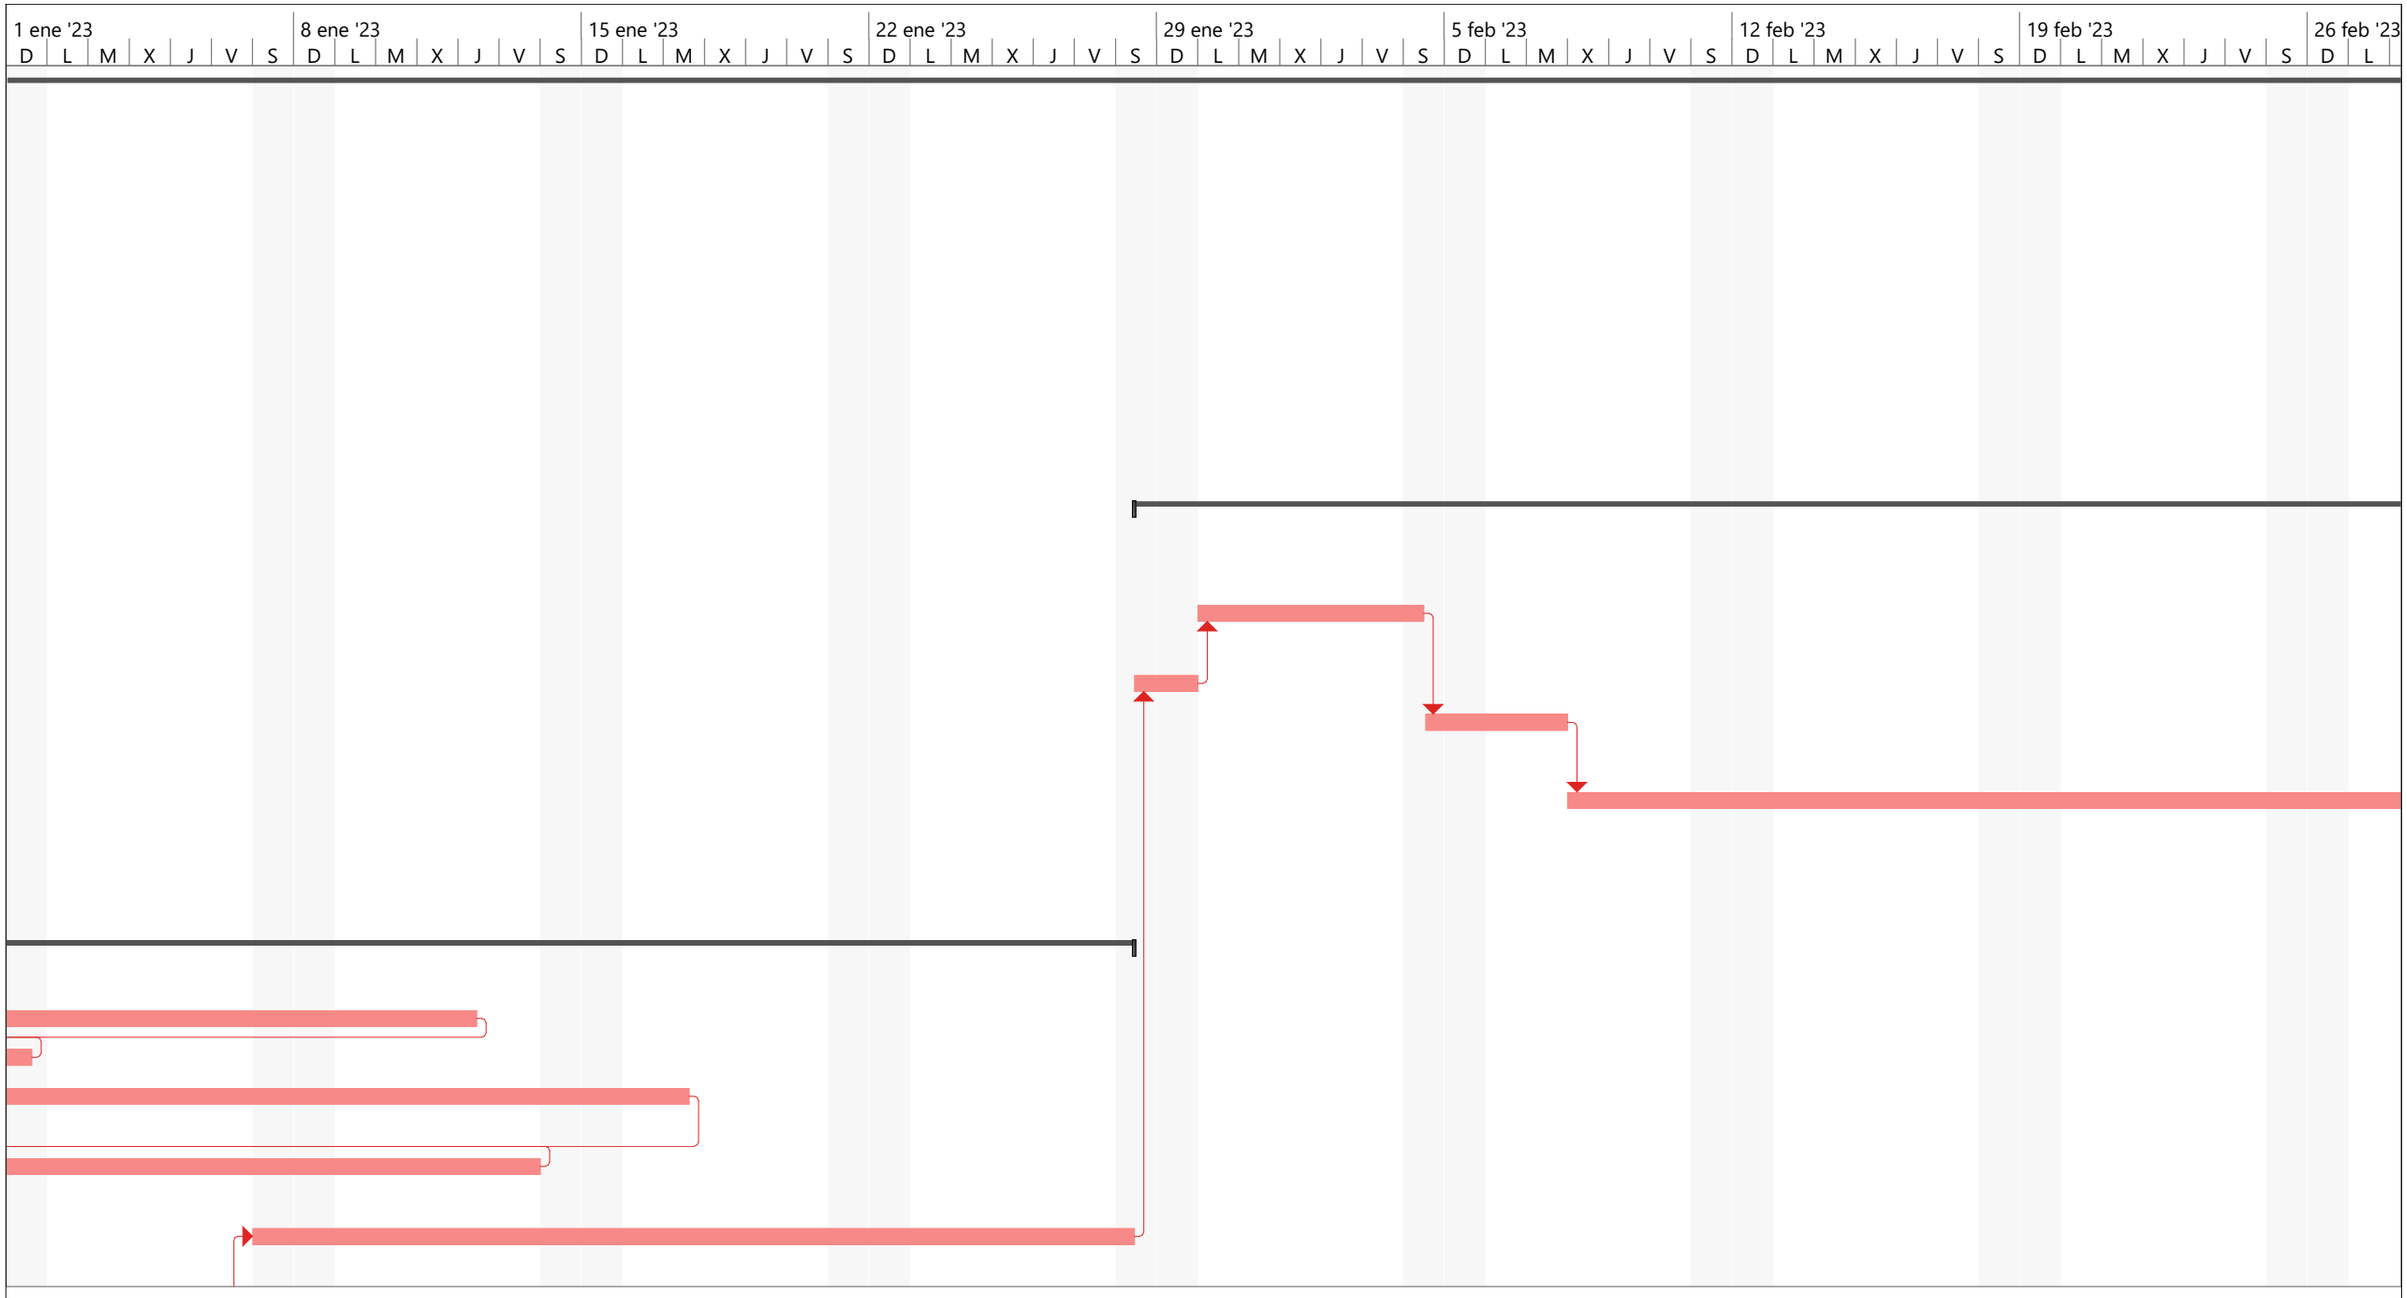


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

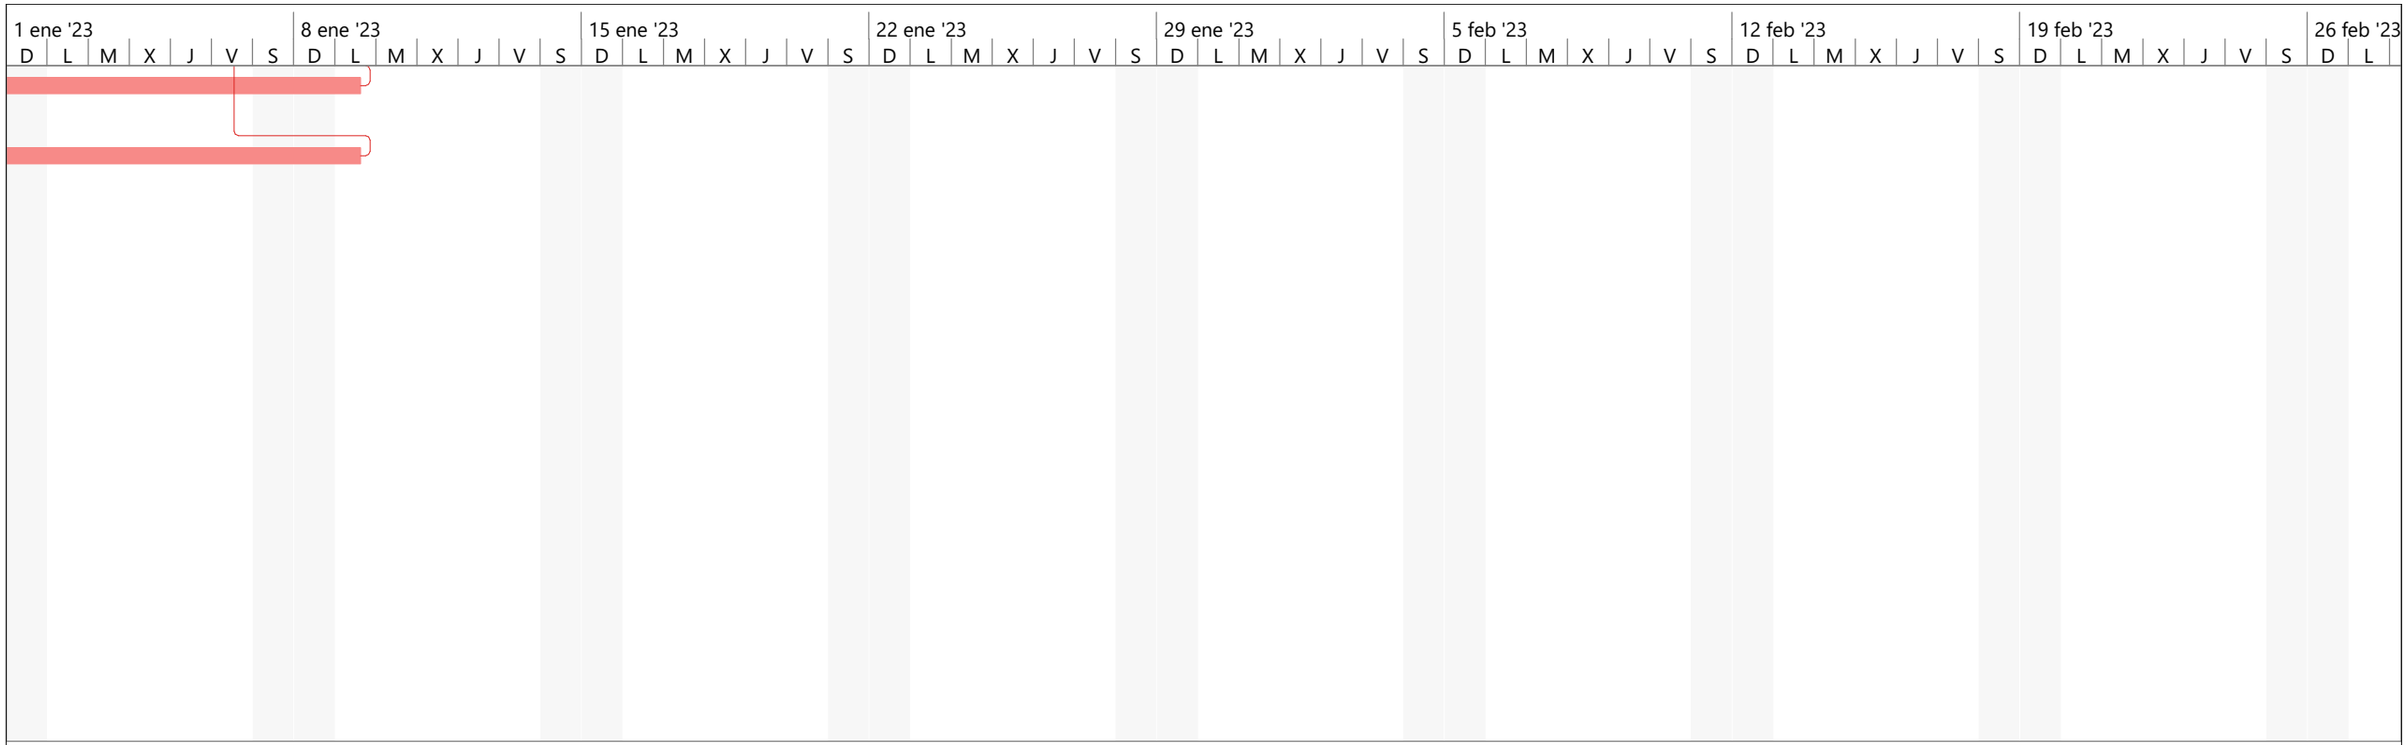


Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

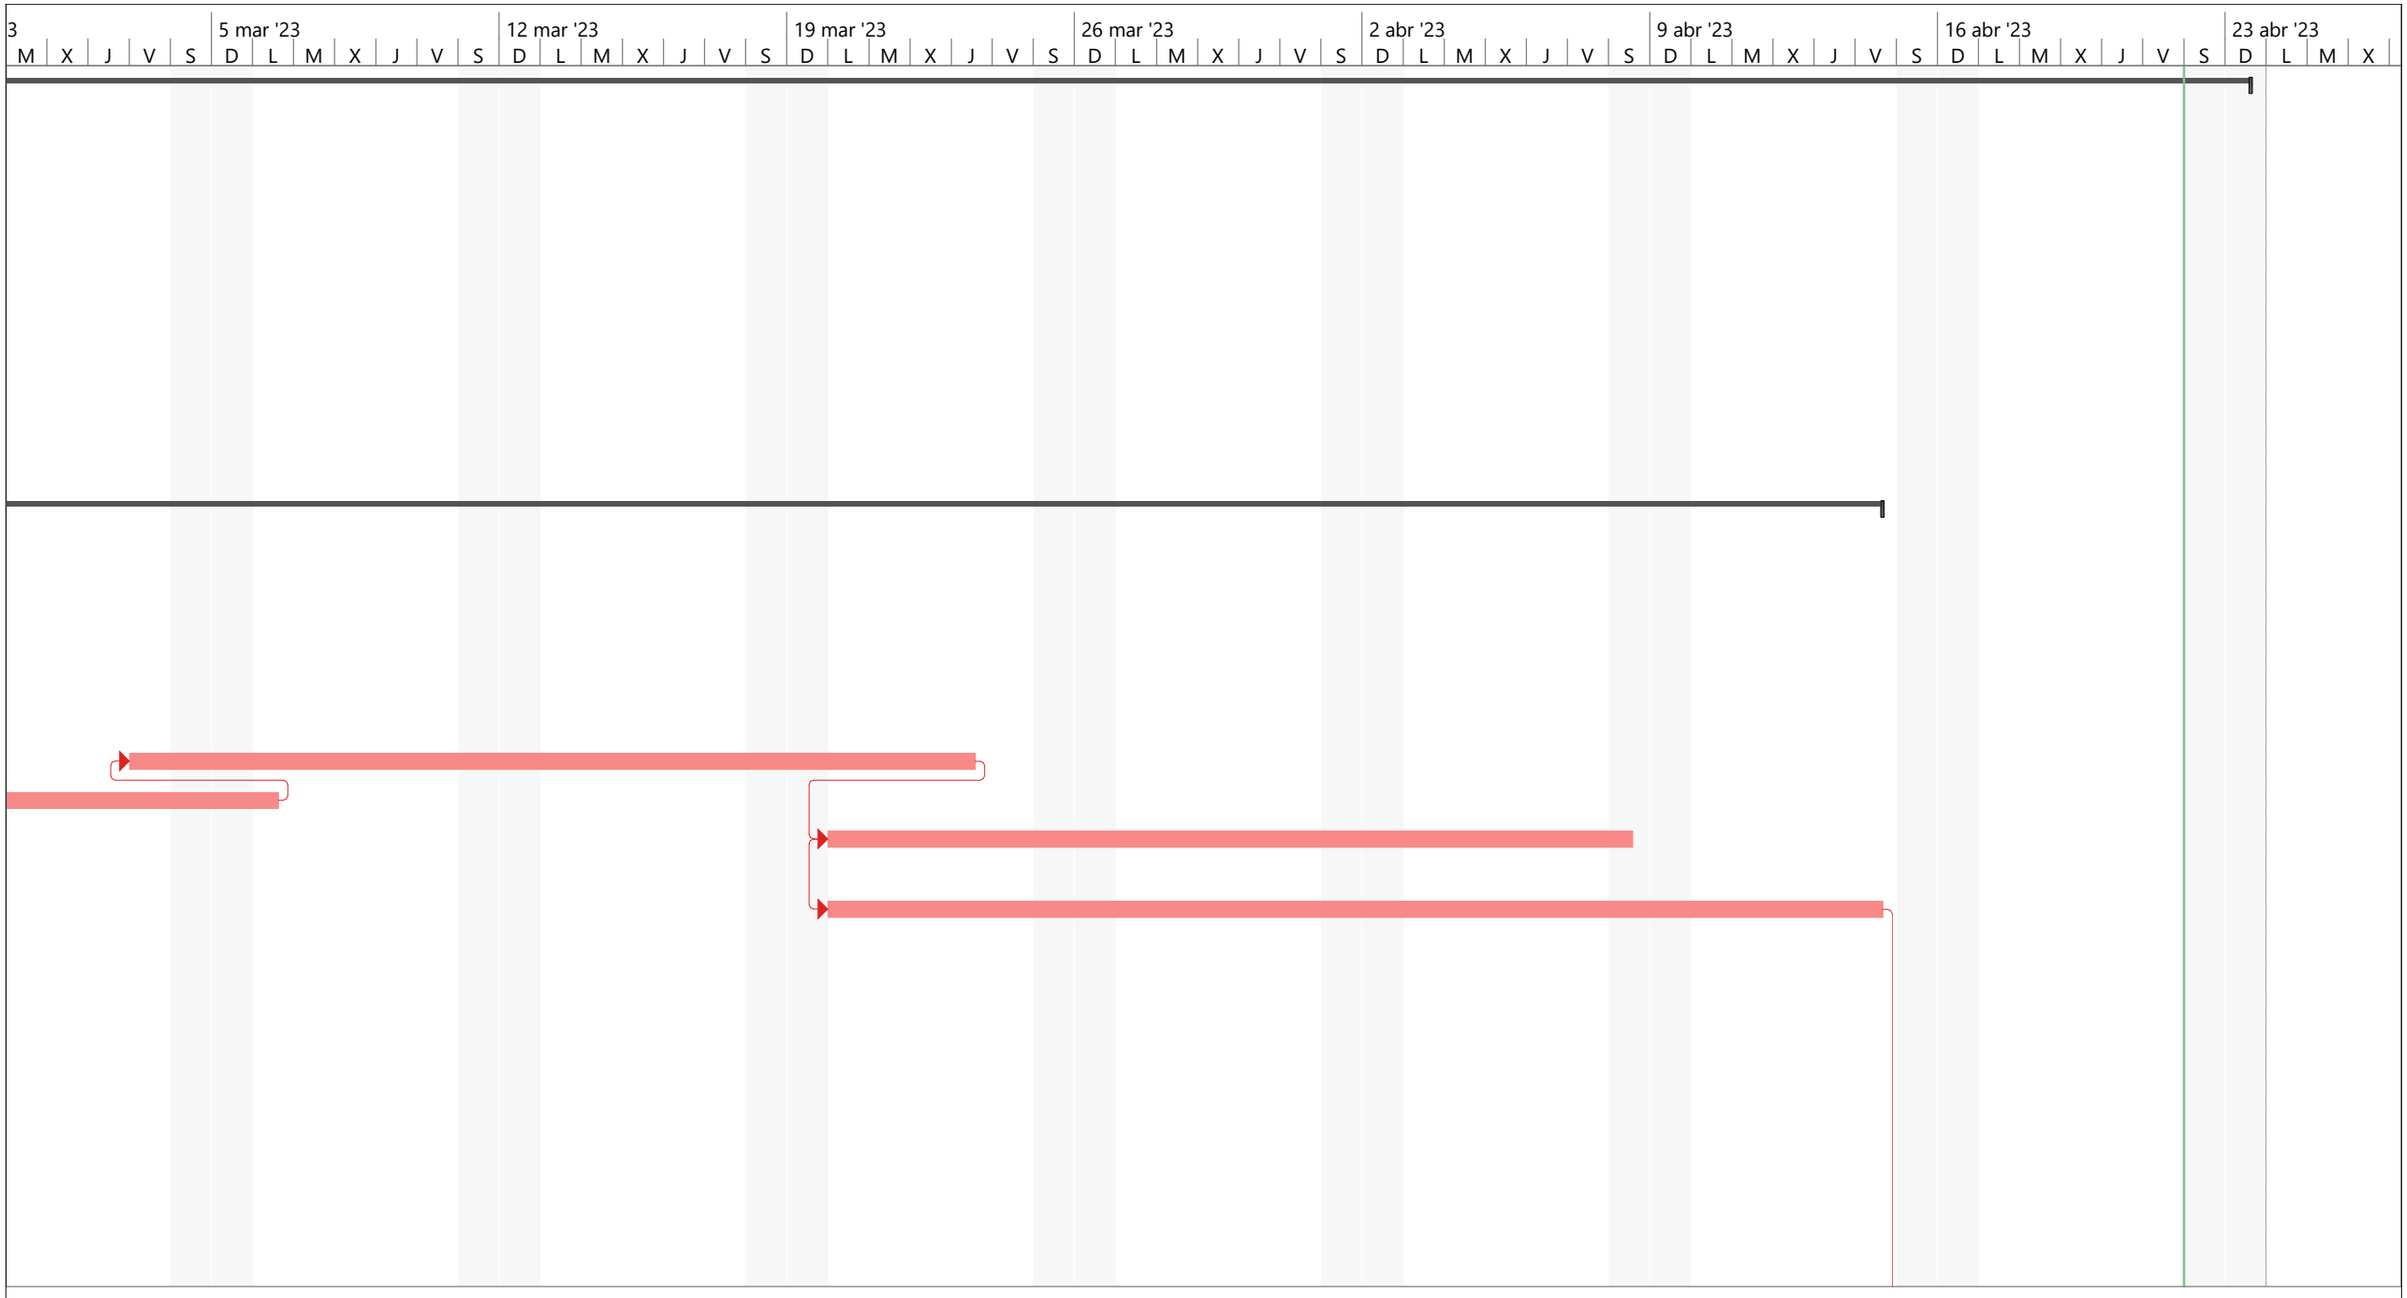

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo			
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

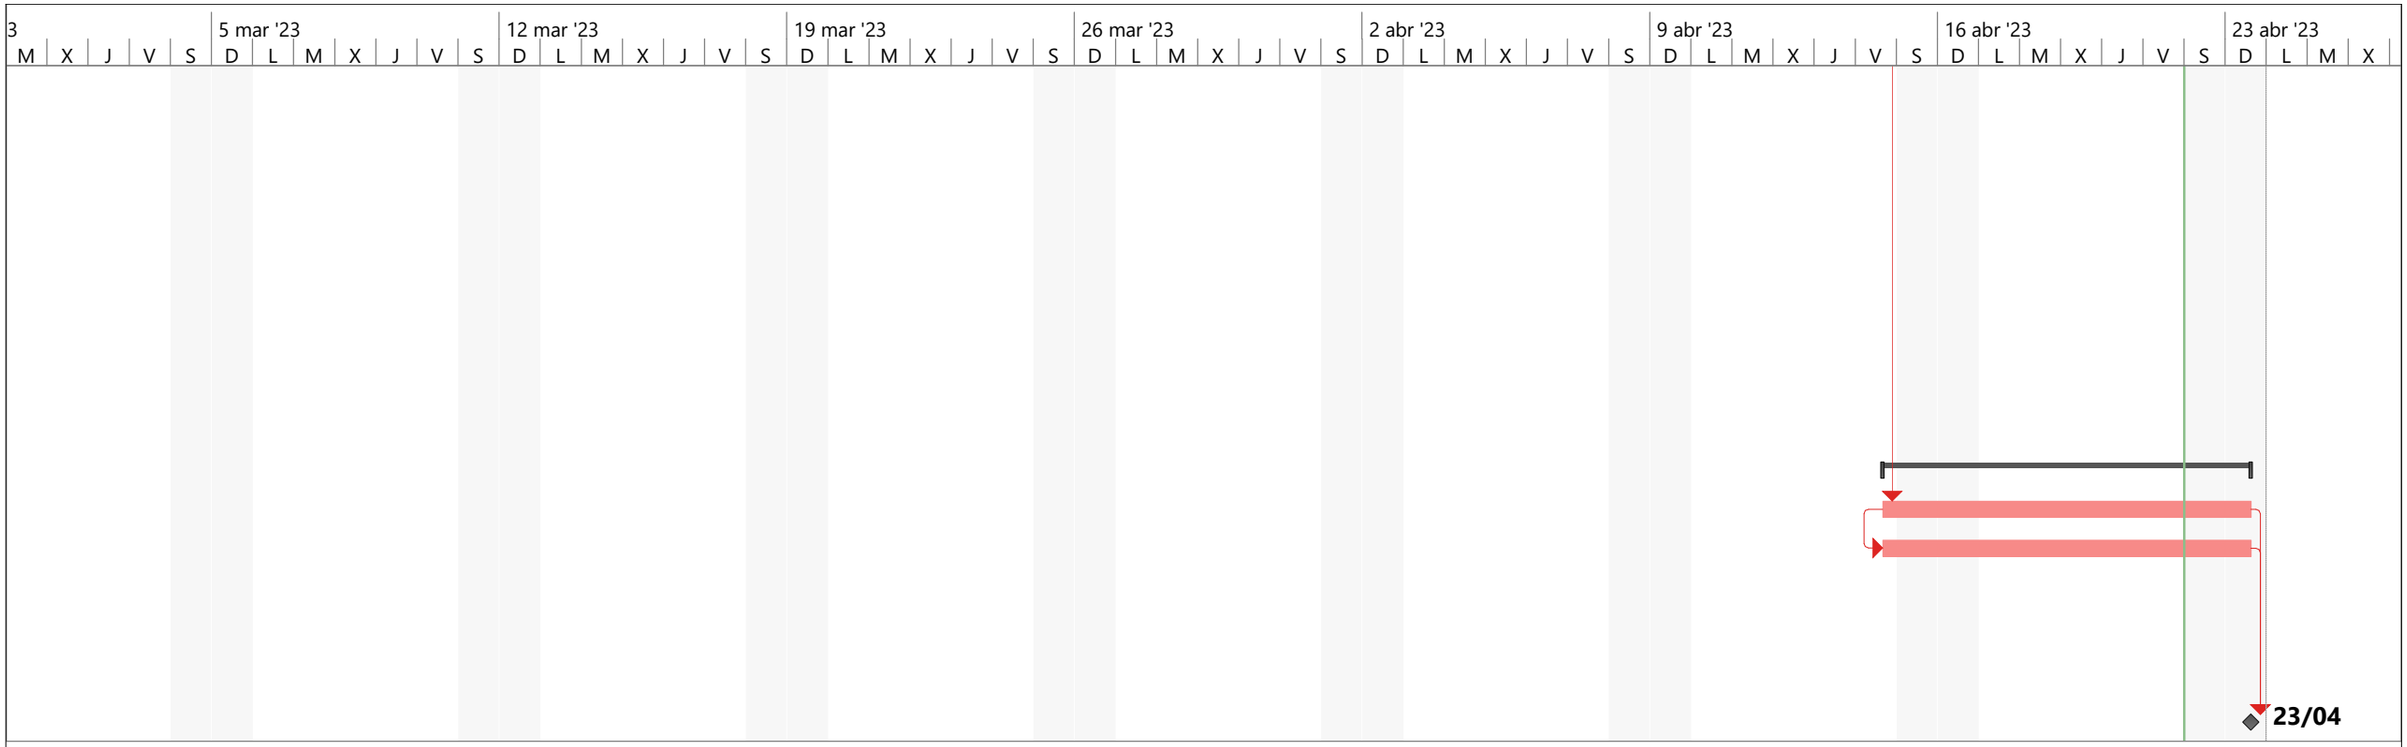

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: sáb 22/04/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES, MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPHWG-INV-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** I

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MSBV-08-2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 976 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL MC

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/08/2022 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 121.889.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) ACTA #8: $ 121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas Un suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR APROPIADO (Incluido IVA) #8: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado: $ Valor acumulado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Suspensión No. 1	18	19	20	21	22	22
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos		(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado: $ Valor Ejecutado	agosto/2022	septiembre/2022	octubre/2022	noviembre/2022	diciembre/2022	enero/2023	febrero/2023	marzo/2023	abril/2023	mayo/2023	junio/2023	julio/2023	agosto/2023	septiembre/2023	octubre/2023	noviembre/2023	diciembre/2023	Del 22/12/2023 al 08/01/2024	enero/2024	febrero/2024	marzo/2024	abril/2024	mayo/2024	junio/2024
EXPLANACIONES	$	160.699,10	1,26%	$43.549,70	%P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00	$ 40.500,00
					$ E				$ 43.549,70																				
					%E				0,34%																				
BDV CULVERT 2 EXCLS. L = 7M (CANTIDAD ELIND.)	$	169.492,68	1,33%	$151.053,23	%P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59
					$ E	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59	$ 21.186,59
					%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,5 M Y LONGITUD DE 5000 M	$	7.527.090,60	62,90%	$2.929.937,53	%P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00
					$ E	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00	$ 1.046.250,00
					%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTE	$	276.353,61	3,47%	$0,00	%P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47	$ 23.029,47
					$ E																								
					%E																								
CARACTERIZACIÓN VIAL	$	276.353,61	0,76%		%P																								
					$ P	$ 69.088,40	$ 69.088,40	$ 69.088,40	$ 69.088,40																				
					$ E																								
	$	3.703,00	0,05%	$0,00	%E																								
					%P													0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P													#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
					$ E																								
					%E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$**	**$152.402.921**	**100%**	**$ 3.194.190,56**																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$**	**$152.402.921**	**100%**	**2,10%**																									

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	15,70%	20,53%	22,45%	21,88%	15,19%	5,44%	3,89%	22,16%	19,17%	3,92%	4,58%	11,67%	24,59%	6,05%	0,00%	2,25%	7,56%	9,54%	9,74%	13,98%	3,99%				
	VALOR Miles de Pesos	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.930,53	$ 11.258.514,02	$ 31.476.385,15	$ 31.979.982,36	$ 1.747.854,00	$ 1.214.239,74	$ 8.812.164,08	$ 2.272.142,58	$ 1.773.447,92	$ 1.124.541,95	$ 393.089,51	$ 934.139,80	$ 1.597.539,00	$ 3.961.459,07	$ 483.193,81	$ 0,00	$ 178.469,95	$ 599.374,36	$ 769.399,98	$ 786.199,07	$ 891.364,42	$ 319.679,84				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		$ 0,00	$ 0,00	$ 514.930,53	$ 11.773.444,55	$ 43.249.829,70	$ 75.229.812,06	$ 76.977.666,06	$ 78.192.305,80	$ 87.004.469,88	$ 89.276.612,46	$ 91.050.060,38	$ 92.174.602,33	$ 92.567.691,84	$ 93.501.831,64	$ 95.099.370,64	$ 99.060.829,71	$ 99.544.023,52	$ 99.722.493,47	$ 100.321.867,83	$ 101.091.267,81	$ 101.877.466,88	$ 102.768.831,30	$ 103.088.511,14				
	VALOR Miles de Pesos	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.930,53	$ 11.258.514,02	$ 31.960.720,15	$ 32.465.885,41	$ 1.748.329,41	$ 1.766.779,19	$ 2.411.299,21	$ 2.128.291,65	$ 1.581.978,59	$ 1.437.385,43	$ 1.127.212,23	$ 1.178.361,59	$ 1.597.539,00	$ 3.961.459,07	$ 1.511.553,93	$ 1.511.553,93	$ 1.690.023,88	$ 2.289.398,24	$ 3.058.798,22	$ 3.845.065,29	$ 4.736.429,71	$ 5.056.109,55				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	7,39%	20,98%	21,31%	1,15%	1,16%	1,58%	1,40%	1,04%	0,94%	0,74%	0,77%	1,05%	2,60%	0,99%	0,99%	1,11%	1,50%	2,01%	2,52%	3,11%	3,32%				
	VALOR Miles de Pesos	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.859.264,00	$ 13.791.335,00	$ 14.012.103,00	$ 755.000,00	$ 762.539,00	$ 1.040.520,00	$ 918.992,00	$ 682.866,00	$ 620.507,00	$ 486.527,00	$ 508.648,00	$ 689.600,00	$ 1.709.920,00	$ 652.660,00	$ 652.660,00	$ 729.554,00	$ 988.024,00	$ 1.320.400,00	$ 1.659.667,00	$ 2.044.364,00	$ 2.182.680,00				
	%	0,00%	0,00%	0,00%	3,19%	9,05%	9,20%	0,50%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,41%	0,32%	0,33%	0,45%	1,12%	0,43%	0,43%	0,48%	0,65%	0,87%	1,09%	1,34%	1,43%				
	VALOR Miles de Pesos	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.859.264,00	$ 18.650.599,00	$ 32.662.702,00	$ 33.417.702,00	$ 34.180.241,00	$ 35.220.761,00	$ 36.139.753,00	$ 36.822.619,00	$ 37.443.126,00	$ 37.929.653,00	$ 38.438.301,00	$ 39.127.901,00	$ 40.837.821,00	$ 41.490.481,00	$ 42.143.141,00	$ 42.872.695,00	$ 43.860.719,00	$ 45.181.119,00	$ 46.840.786,00	$ 48.885.150,00	$ 51.067.830,00				
	%	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	4,55%	7,11%	19,63%	19,68%	20,43%	20,53%	21,18%	21,53%	21,81%	22,10%	22,50%	23,48%	23,85%	24,23%	24,65%	25,22%	25,98%	26,94%	28,10%	29,37%				
	VALOR Miles de Pesos	$0	$0	$0,00	$335.451,13	$565.761,16	$569.912,16	$1.547.966,00	$1.491.127,00	$1.797.140,19	$2.366.363,64	$2.531.363,00	$2.615.473,03	$2.535.473,03	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88	$2.595.864,88				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluir N/A, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$	49.405.364,00	$ -	0,00%
	$	49.101.364,00		
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	47.378.000,00	$ 47.378.000,00	0,58%
	$	47.378.000,00		
* SIN REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	9.001.820,00	$ 9.001.820,00	0,11%
	$	9.001.820,00		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$	105.485.184,00	$ 56.379.820,00	0,69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$	105.485.184,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$**	**8.121.889.999,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$**	**8.121.889.999,00**	**$ 3.340.570.373,43**	**39,96%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez sucrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% programado	% ejecutado
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Reprogramación de acuerdo al inciso No.1 y la prórroga No. 3

Aprueba Firma:
Nombre: [illegible]
Representante legal o Apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. : 25202216872 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o Apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No. 25202216872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
MEPI-MN-IN-6-FR-2

• ACTAS DE COMITÉ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/01/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

ACTA DE INICIO: 24 DE AGOSTO 2024 - PLAZO INICIAL: 8 MESES - PRORROGA 1: 4 MESES - PRORROGA 2: 4 MESES.
SUSPENSION 1: 21 DICIEMBRE 2023 - REINICIO 1: 9 DE ENERO 2024 - PRORROGA 3: 5 MESES - FECHA FINALIZACION: 11 DE JUNIO 2024

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

• Lleno de la excavación de tubería de 2" de presión. (CUMPLIÓ)

Esta fue una excavación que se hizo para mirar la posibilidad del traslado de tubería por parte del municipio pero se confirmó que no era necesario trasladarla de donde estaba ubicada, pero esta excavación había quedado abierta, ya el contratista realizo las actividades de lleno en este sector cumpliendo con el compromiso pactado en el comité anterior.

• entrega de informe técnico de la ocupación de cauce del Boxculvert de 2x3 ubicado en el k4+370. (NO CUMPLIO)

Hasta la fecha el contratista no ha dado cumplimiento a la entrega de este informe, el Ing Luis Mejía representante legal de la parte contratista se compromete que para el viernes 02 de febrero 2024 hace la entrega de este informe técnico.

• Entrega de EPP (CUMPLIÓ).

• Entrega de informe social y ambiental del mes de Octubre y Noviembre (CUMPLIÓ)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Componente tecnico.
2. Seguimiento al componente ambiental
3. Seguimiento al componente social
4. Seguimiento al componente de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS: todos los temas de este componente están aprobados
Por la Interventoría
• GEOMÉTRICO: Aprobado
• HIDRÁULICO: Aprobado.
• ESTRUCTURAL: Aprobado.
• GEOTÉCNICO: Aprobado
• PLACA HUELLA: Aprobado
El Ingeniero Fredy Alexander Rodríguez Director de Interventoría Interviene manifestando que el contratista hace aproximadamente dos semanas presento a la Interventoría posibilidad de un cambio del diseño de la estructura de pavimento, el cual hoy en día se tiene un diseño aprobado de placa huella de sección típica de 5.3m de 15cm de espesor y el contratista presento una alternativa de un pavimento rígido de espesor también de 15cm ancho libre de 5m, la interventoría ya respondió la solicitud del contratista y se está a la espera de que el contratista de respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría, se tiene conocimiento que el Ingeniero Luis Mejía va a convocar una mesa técnica para ver si podemos ir dirimiendo las observaciones para ver qué solución se le da solicitud del contratista.

Interviene el Ingeniero Luis Mejía de la parte Contratista manifiesta que se encuentran respondiendo las observaciones realizadas por la Interventoría ya que posiblemente para el día de hoy estarían enviando la respuesta y después que la analicen estaremos convocando una mesa técnica para darle viabilidad a esta opción que es la más viable para el proyecto y poder aumentar los rendimientos que es lo que me esta afectando en el atraso que se lleva.

2. SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO PAGA DE LA PARTE AMBIENTAL Y SOCIAL

• ENTREGA DE INFORMES: Está pendiente la entrega de los informes del mes de diciembre tanto de la parte social como ambiental.
La parte contratista manifiesta haber enviado al correo de la interventoría el día 19 de enero del 2024 el informe de la parte ambiental del mes de diciembre.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

• Mejorar señalización de la obra: Esta interventoría solicita mejorar la señalización en la zona donde esté trabajando la maquinaria.
Interviene el Ingeniero Erick Camargo Residente de Interventoría manifestando que la señalización es deficiente en el sector donde viene trabajando la maquinaria amarilla, debido a que no cuenta con las señales necesarias para cumplir con el plan de manejo de tráfico presentado por el contratista ya que solo cuenta con un par de señales al principio y final del tramo que se está interviniendo.

• Entrega de soporte de pago de aportes de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023.
Interviene el Ingeniero Luis Mejía de la parte Contratista informa que como estuvo suspendida la obra ha tenido problemas porque se está depurando y organizando al personal vinculado en esos meses a la obra, ya se tiene la del mes de octubre depurada y cargada en el sistema y esta la espera que se carguen las otras para proceder al pago nosotros pensamos que para el día viernes ya se tenga solucionado el tema de las planillas y poderles entregar estos soportes de pagos a seguridad social.

4. REPORTE AVANCE DEL PROYECTO

• AVANCE EN PORCENTAJE.
- Meta Física Programada: 56,73%
- Meta Física Ejecutada: 41.60%
- Atraso Físico: -15.13%

El Director de Interventoría informa que se le ha manifestado por escrito al contratista que requiere implementar un plan de contingencia en cual requiere que abran más cuadrillas de las que se tienen, si es cierto que abrieron un frente con maquinaria amarilla para instalación de afirmado, y uno en placa huella, la recomendación de la interventoría es que abran dos frentes más, uno en placa huella y otro en construcción de obras de artes y aprovechar el tiempo seco que se tiene aproximadamente hasta el mes de abril, la idea es salir de todas las obras de arte para cuando llegue el invierno no tener el inconveniente y no se enrede el contrato ya que este tiene fecha límite de entrega hasta junio y se le requiere abra los nuevos frentes.

El Ingeniero Luis Mejía manifiesta que el presento un plan de contingencia donde contempla cuatro cuadrillas. Durante esta semana se ha estado realizando el análisis en campo para el inicio de la construcción del boxcoulvert ubicado en el K0+350 y en compañía del residente de interventoría y el ingeniero auxiliar de interventoría ir analizando y valorando el tema de los desvíos una vez se inicien las actividades en este punto. Además tenemos contemplado que para el día de mañana iniciar con otra cuadrilla de placa huella para así poder ir aumentando los rendimientos, para esta semana se arranquen con las dos cuadrillas más solicitadas contempladas en el plan de contingencia.

El Director de obra le solicita al contratista entregar los resultados de los ensayos de los laboratorio de la resistencia de los concretos realizados en los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre, además de los ensayos de caracterización del material de afirmado que se viene instalando durante este mes, esto para dar cumplimiento a los parámetros de ensayos de calidad de la obra.
El contratista se compromete a entregar estos resultados el 02 de febrero del 2024.

Se le Informa al contratista que si tiene contemplado radicar acta parcial debe estar al día con todos los informes, ambientales, sociales, pago de aportes, entregas de laboratorios y de más documentos que certifiquen la calidad de la obra, para que nosotros como interventoría poder tramite a cualquier acta parcial. La idea es que siempre estén al día en la documentación para que cuando presenten un acta de pago salga lo más pronto posible de parte de la interventoría.

Interviene el Ingeniero Luis Mejía comunicando que se vienen alistando unos tramos en afirmado, la interventoría la parte topográfica nos realizó unas observaciones y se están corrigiendo para proceder hacer las densidades y pueda ser recibida por la interventoría, como también los concretos, por lo que de parte del contratista la idea es entregar los documentos que acrediten la calidad de cada proceso constructivos, resultados de ensayos a la resistencias de concretos, así como densidades de materiales instalados en obra y demás documentos que se requieren para la aprobación del acta de pago.

El Ingeniero director de interventoría manifiesta que después del reinicio la obra ha tenido otra dinámica, el Ing. Luis se le ha visto más al frente del proyecto puedo dar fe de eso y que el como representante legal y residente del contrato toma las decisiones rápidamente y eso le da dinamismo al proyecto, pero si se necesita que se implemente más el plan de contingencia para que haya un mejor rendimiento.

Interviene el Secretario de Infraestructura David Rojas pregunta que de acuerdo al plan de contingencia va acorde a lo que contemplo en este plan?

Interviene el Ingeniero Fredy Rodríguez informándole que el contratista pasó un plan de contingencia contemplando cuatro cuadrillas pero hasta la fecha no se han abierto las cuatro cuadrillas por lo que viene incumpliendo en el cumplimiento de la implementación del plan de contingencia, pero el contratista manifiesta que abrirá las otras dos cuadrillas faltantes una en la construcción de obras de arte y otra en placa huella, ya en el caso que abra estas dos cuadrillas adicionales si le da cumplimiento al plan de contingencia, porque ahora mismo está por debajo.

Interviene el Secretario de Infraestructura David Rojas pregunta cuánto es el porcentaje de ejecución con respecto a lo programado?.
Se le repite los porcentajes para darle claridad a Arquitecto David Rojas, se lleva una obra programada de 56.73% y un ejecutado de 41.6% para un atraso del 15.13%
Interviene el Arquitecto David Rojas solicitándole que agilice con el tema con las cuadrillas para verle más rendimiento a la obra y ya salga del sector del pueblo, además de terminar con las actividades de placa huella en el sector del boxculvert del K4+370 y no tengas que devolverte

El Director de interventoría manifiesta que el secretario de infraestructuras le solicito realizar un comité esta semana para mirar el avance físico de la obra como tal, interviene el Ingeniero Luis Mejía representante legal de la parte contrista sugiere realizarlo para la próxima semana. El Secretario de Obras David le aclara al Ingeniero Luis que según última reunión de comité realizada en el municipio se quedó en hacerle seguimiento quincenal, por lo que sugiere hacerlo esta semana para que no se dilate tanto y se tenga un seguimiento al avance físico. La idea es ponernos de acuerdo, municipio,

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de informa técnico de la ocupación de cauce del boxculvert de 2x3 ubicado en el K4+370.	02/02/2024	Contratista
Respuesta a observaciones realizada por la interventoria a cambio del diseño de la estructura de pavimento	31/01/2024	Contratista
Soporte de pagos de aportes a seguridad social	02/02/2024	Contratista
Apertura de dos nuevas cuadrillas una en obras de arte y otra en placa huella	02/02/2024	Contratista
Entrega de resultado de ensayo de resitencia de los concretos de septiembre, octubre, noniembre, diciembre y enero	02/02/2024	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA por definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	Representante Legal	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
MARIA RANGEL	Coordinadora de Proyectos	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	Residente de interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ	Secretario de Infraestructura - Supervisor del contrato de obra	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	Supervisora contrato de Interventoría	INVIAS - TERRITORIAL CÓRDOBA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

• ACTAS DE REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 27
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1.Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. verificación cumplimiento de compromisos
2. parte técnica
3.. Seguridad y salud en el trabajo.
4. componenete ambiental y social.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 3: 00 pm en el corregimiento del castillo, contando con la participación del contratista, interventoría.

1. verificación de compromisos: -
Incrementar cuadrillas. (no cumplio)
- cerrar PQR (no cumplio)
- Entrega de EPP (Parcialmente). falta personal por entregar EPPS,

Parte Técnica : se reiniciaron actividades el dia 09 de Enero, trabajando con dos cuadrillas ,en esta semana se evidenció el ingreso de materiales para construcción de placa huela; . se concentran en cerrar los tramos del 3+700 al 3+400, realizando actividades de figuración de acero de refuerzo, vaciado de cunetas , vigas riostra, losas reforzadas y losas en concreto ciclópeo . muy a pesar que de que se esta trabajando el avance de la obra es minimo, esto debido aque se requiere que abran nuevos frentes de trabajo donde se genere un buen avance; en la obra se cuenta para la logistica de instalación de materiales para construcción de placa huella,con un minicargador y un retrocargador . se evidenció utilización de maquinaria de forma minima ,(motoniveladora y vibro compactado)r debido a que no se contó con suministro de material de sub base granular ni de afirmado.

3**.. Seguridad y salud en el trabaj**o:
se evidencia que se suministro al personal parte de los elementos minimos de protección personal EPP ,se hace la recomendación de terminar de subsanar este aspecto. En cuanto a señalización se evidencia mejoras en . los tramos que se estan interviniendo,. El sst viene realizando charlas y pausas activas con el personal en obra. **4. componente ambiental y social** :se hace la observación al contratista de retirar de los bordes de la via los escombros producidos de las demoliciones y de la parte social se reitera que hay varis PQRS por cerrar.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
INCREMENTAR CUADRILLAS	lunes, 15 de enero de 2024	CONTRATISTA
CERRAR PQR	lunes, 15 de enero de 2024	CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2023
(Día / Mes / Año)


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 28
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1.Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. verificación cumplimiento de compromisos
2. parte técnica
3.. Seguridad y salud en el trabajo.
4. componenete ambiental y social.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 3: 00 pm en el corregimiento del castillo, contando con la participación del contratista, interventoría.

1. verificación de compromisos: -

Incrementar cuadrillas. (entro otra cuadrilla de trabajo, pero hace falta otra para aumentar los rendimientos y por ende el avance)

- cerrar PQR (no cumplio)

Parte Técnica : se avanza trabajando con dos cuadrillas , se evidenció ingreso de materiales para construcción de placa huela; . se inició trabajos en un tramo nuevo del k3+400 al k3+300 por el carril izquierdo , tambien se avanzó en el tramo del 3+700 al 3+400, realizando actividades de figuración de acero de refuerzo, vaciado de cunetas , vigas riostra, losas reforzadas y losas en concreto ciclópeo . muy a pesar que de que se esta trabajando y que el avance de la obra aumento , aún no es el esperado, esto debido aque se requiere que abran nuevos frentes de trabajo donde se genere un buen avance para acortar el atraso que se tiene; en la obra se cuenta para la logistica de instalación de materiales para construcción de placa huella,con un minicargador y un retrocargador(el retrocargador esta en reparación) . se evidenció maquinaria inactiva ,(motoniveladora y vibro compactado)r debido a que no se contó con suministro de material de sub base granular ni de afirmado.

3**.. Seguridad y salud en el trabaj**o:

se evidencia que se suministro al personal parte de los elementos minimos de protección personal EPP ,se hace la recomendación de terminar de subsanar este aspecto. En cuanto a señalización se evidencia mejoras en . los tramos que se estan interviniendo,. El sst viene realizando charlas y pausas activas con el personal en obra. **4.**

componente ambiental y social :se hace la observación al contratista de retirar de los bordes de la via los escombros producidos de las demoliciones y de la parte social se reitera que hay varias PQRS por cerrar. se tiene pendiente la entrega de informes del mes de noviembre y diciembre.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
ABRIR FRENTE CON MAQUINARIA	lunes, 22 de enero de 2024	CONTRATISTA
REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT	lunes, 22 de enero de 2024	CONTRATISTA
CERRAR PQR	lunes, 22 de enero de 2024	CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 15/12/2023
(Día / Mes / Año)


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 29
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1.Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. verificación cumplimiento de compromisos
2. parte técnica
3.. Seguridad y salud en el trabajo.
4. componenete ambiental y social.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 3: 00 pm en el corregimiento del castillo, contando con la participación del contratista, interventoría.

1. verificación de compromisos: -

Abrir frente con maquinaria : (Cumplió) -

Reactivar la construcción de boxculvert (No cumplio)

- cerrar PQR (no cumplio)

Parte Técnica : se avanza trabajando con dos cuadrillas en la construcción de placa huella , se abrio otro frenre de trabajo con la maquinaria en la instalación de afirmado en tramo del k0+000 a mayores; se evidencia ingreso de materiales para construcción de placa huela; . se esta trabajando en dos tramos,del k3+400 al k3+300 por el carril izquierdo y del 3+700 al 3+400, realizando actividades de figuración de acero de refuerzo, vaciado de cunetas , vigas riostra, losas reforzadas y losas en concreto ciclópeo . muy a pesar que de que se esta trabajando y que el avance de la obra aumento , aún no es el esperado, esto debido aque se requiere que abran nuevos frentes de trabajo donde se genere un buen avance para acortar el atraso que se tiene; en la obra se cuenta para la logistica de instalación de materiales para construcción de placa huella,con un minicargador y un retrocargador(el retrocargador esta en reparación) .

3**.. Seguridad y salud en el trabaj**o:

se evidencia que se suministro al personal parte de los elementos minimos de protección personal EPP ,se hace la recomendación de terminar de subsanar este aspecto. En cuanto a señalización se evidencia mejoras en . los tramos que se estan interviniendo,. El sst viene realizando charlas y pausas activas con el personal en obra. **4. componente ambiental y social** :se hace la observación al contratista de retirar de los bordes de la via los escombros producidos de las demoliciones y de la parte social se reitera que hay varias PQRS por cerrar. se tiene pendiente la entrega de informes del mes de noviembre y diciembre.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN DE BOXCULVERT	lunes, 29 de enero de 2024	CONTRATISTA
CERRAR PQR	lunes, 29 de enero de 2024	CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/2023
(Día / Mes / Año)


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
ERICK CAMARGO MORALES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

i. A la fecha, se tiene una inversión de obra programada según reprogramación ajustada a prórroga N°3 es de $ 4.629.746.159,76 correspondiente al 57,75% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.374.862.765,83 correspondiente al 42,1%; lo que representa un atraso del -15,65%.
ii. Se recomienda al contratista, atender oportunamente en las fechas establecidas, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.
iii. Se recomienda al contratista mantener auxiliares de tráfico en los frentes simultáneos de trabajo; para evitar accidentes.
iv. se recomienda al contratista mantener el suministro de materiales para construcción de placa huella, de tal manera que se garantice un rendimiento constante para así generar un mayor avance.
v. Se da acta de reinicio N°1 al contrato de LICITACION PUBLICA No. LP-MSBV-006-2022, ya que los motivos por los cuales se dio la suspensión fueron superadas.

vi. El contratista presenta la propuesta para el cambio de Placa Huella a Pavimento rígido. La interventoría, mediante su especialista de pavimentos, realiza la revisión del diseño de pavimento rígido entregado por el contratista, el cual es devuelto con observaciones (comunicado CVRIMG-158-2024, de 25 de enero de 2024).

.

.

.

.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-1923-2023	1/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1925-2023	1/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	PRIMERA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-1801-2023 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1938-2023	6/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1957-2023	12/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Reiteración comunicado CVRIMG-1713-2023 Solicitud de informe de gestión ambiental – octubre de 2023.
CVRIMG-1958-2023	12/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud de informe de gestión ambiental – noviembre de 2023.
CVRIMG-1968-2023	15/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-1989-2023	21/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEGUNDA REITERACION COMUNICADO CVRIMG-1925-2023 SOLICITUD PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE.
CVRIMG-1990-2023	21/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	Solicitud informe de seguimiento social mes de noviembre 2023.
CVRIMG-1994-2023	21/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD INFORME MENSUAL SST MES DE NOVIEMBRE.

CVRIMG-2018-2023	21/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-2052-2023	29/12/2023	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.

8.1.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REMITENTE	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO / REFERENCIA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 192-07-12-2023	2023-12-07	SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-006-2022
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 193-16-12-2023	2023-12-16	ENVÍO DE DISEÑOS DE MEZCLA
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	OF 194-16-12-2023	2023-12-16	INFORMACIÓN DE FESTIVIDADES EN EL CORREGIMIENTO DEL CASTILLO
CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	N/A	2023-12-19	Solicitud de Suspensión Temporal de Actividades en Obra

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



CONSTRUCCIÓN CUNETAS K 3+706. CARRIL IZQUIERDO



CONSTRUCCIÓN CUNETAS Y VIGAS RIOSTRA K 3+537. CARRIL IZQUIERDO



~~ADECUACIÓN DE TERRENO E INSTALACIÓN DE RIELES PARA CICLOPEO Y CUNETA K 3+424- CARRIL IZQUIERDO~~



CONSTRUCCION CUNETAS.. K 3+424- CARRIL IZQUIERDO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



CONSTRUCCION DE CUNETAS REFORZADAS - K3+436- CARRIL DERECHO



CONSTRUCCION DE CUNETAS REFORZADAS - K3+436- CARRIL DERECHO



CONSTRUCCION DE LOSAS EN CONCRETO CICLOPEO Y VIGAS RIOSTRA K 3+424- CARRIL IZQUIERDO



CONSTRUCCION DE LOSAS REFORZADAS K 3+424- CARRIL IZQUIERDO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

			FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS- K 3+568.. CARRIL IZQUIERDO



CONSTRUCCIÓN DE MODULOS EN CICLOPEO- K 3+537.. CARRIL IZQUIERDO



CONSTRUCCIÓN DE MODULOS EN CICLOPEO. K 3+436 - CARRIL DERECHO



CONSTRUCCIÓN DE LOSAS REFORZADAS (HUELLA). K 3+424 - CARRIL IZQUIERDO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	2 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA HUELLA. CARRIL IZQUIERDO- K 3+706



LOSAS REFORZADAS (HUELLA)- CARRIL IZQUIERDO. K 3+706



INSTALACIÓN DE AFIRMADO K0+000- 0+400



INSTALACIÓN DE AFIRMADO K0+000- 0+400

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

- ACUERDAN

- Suspender el contrato de Licitación publica N. LP-MSBV-006-2022, desde el 21 de Diciembre del 2023 hasta que se de solución a las causales que dieron Origen a la presente suspensión.
- El contratista se compromete a actualizar las garantías de cumplimiento del contrato, de acuerdo con el termino pactado en el inciso anterior, y con base en los riesgos amparados inicialmente.
- Todas las Clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no son modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.
- El contratista se compromete a entregar a la interventoria la reprogramación de las obras y plan de contingencia para que el desarrollo de la obra no se afecte en el tiempo de suspensión de las actividades

⇒ Martes, 09 de Enero del 2024.

- En la oficina de Secretaria de infraestructura del municipio de san Bernardo del viento se suscribe el acta de Reinicio N°1 del contrato de obra publica N° LP-MSBV-006-2022 ya que los motivos por los cuales se dio la suspensión fueron superados.

1. El contratista se compromete a actualizar las polizas de acuerdo con la presente acta de Reinicio No1.
2. El contratista se compromete a entregar a la interventoria la reprogramación de las Obras, y plan de contingencia para que el desarrollo de la obra no se afecte en el Tiempo de Suspensión de las actividades.

CamScanner Powered by CamScanner

· Se reinician las actividades.
- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra.
• Contratista: 1 ingeniero residente, 1 ~~SST~~ auxiliar, 1 maestro de obra, 1 operador maquinaria; 1 Topografo, 1 ayudantes.
• Interventoria: 1 ing. Auxiliar, 1 ing. residente.
- Maquinaria en obra.
1 motoniveladora CJ), 1 vibro compactador CJ), 1 retro cargador (R), 1 minicargador (A), 1 Canmix CJ-Aux)
- Actividades realizadas.
• Se realizó adecuación de terreno e instalación de niveles para construcción de modulos en concreto ciclopeo. desde el K 3+706 al K 3+638 carril Izquierdo.
• Se realizó adecuación de terreno e instalación de niveles para construcción de modulos de huella desde el K 3+568 al K 3+537. carril Izquierdo.

⇒ ~~Miércoles~~, 10 de Enero del 2024
- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra
• Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
• Interventoria: 1 ingeniero Residente, 1 ingeniero Auxiliar
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora CJ), 1 Vibro compactador CJ), 1 retro cargador CR), 1 Mini cargador (A), 1 Canmix (J
- Actividades realizadas.
• Se realizó vaciado de modulos en concreto ciclopeo. desde el K 3+706 al K 3+638 carril Izquierdo.

CamScanner Powered by CamScanner

⇒ Jueves, 11 de Enero del 2024.
- Estado del clima: Soleado.
- Personal en obra:
  - Contratista: 1 ing residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador maquinaria, 1 ayudantes.
  - Interventoria:
    1 ingeniero Residente, 1 ing Auxiliar.
- Maquinaria en obra.
  1 motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I)
  1 retro cargador (R), 1 minicargador (A), 1 carmix (I-A)
- Actividades realizadas.
  - Se realizó instalación acero de refuerzo para huella y seguidamente se procedio a vaciar los modulos desde el K 3+568 al K 3+537 C. Izquierdo y K 3+706 al K 3+620. C. Izquierdo
    Se tomaron muestras del concreto utilizado.
  - Se adecuo Terreno y se instalo rieles para construcción de modulos de huella desde el K 3+620 al K 3+591 C. Izquierdo..
  - Se adecuo Terreno y se instalo rieles para Construcción de modulos en concreto ciclopeo desde el K 3+591 al K 3+537. carril Izquierdo.

⇒ ~~Miercoles~~ Viernes 12 de Enero del 2024.
- Estado del clima: Dia soleado.
- personal en obra.
  - Contratista: 1 ingeniero Residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
  - Interventoria
    1 ingeniero residente, 1 ingeniero Auxiliar
- Maquinaria en obra.
  1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I),
  1 retro cargador (R), 1 Minicargador (A), 1 carmix (I-A)

CamScanner Powered by CamScanner

— Actividades Ejecutadas.
• Se realizó vaciado de modulos de huella desde el K 3+620 al K 3+540 carril izquierdo.
• Se realizó vaciado de modulos en concreto ciclopeo desde el K 3+591 al K 3+537 c. izq
• Se tomaron muestras del concreto estabilizado para realizar ensayos en laboratorio.
• Se realizó adecuación de terreno e instalación de rieles para construcción de cunetas desde el K 3+706 al K 3+620 c. Izquierdo.

⇒ Sábado, 13 de Enero del 2024.
— Estado del clima: Día Soleado.
— personal en obra.
• Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 [illegible] dantes.
• Interventoría: 1 ingeniero Residente, 1 ingeniero A
— Maquinaria en obra.
1 motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (R), 1 Minicargador (A), 1 Camión (I)
— Actividades Ejecutadas.
• Se realizó instalación de acero de refuerzo y seguidamente se procedio a vaciar los modulos de cunetas desde el K 3+706 al K 3+620 por el carril izquierdo.
• Se realizó adecuación de terreno e instalación de rieles para Construcción de modulos de cuneta desde el K 3+620 al K 3+540 c. Izq

⇒ Lunes, 15 de Enero del 2024
— Estado del clima: Día Soleado.

CamScanner Powered by CamScanner

- Personal en obra
  - Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
  - Interventoría: 1 ingeniero Residente, 1 ing. Auxiliar
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (R), 1 Mini cargador (A), 1 camión (I-A)
- Actividades Ejecutadas.
  - Se realizó instalación de acero de refuerzo y seguidamente se procedio a vaciar los modulos de cuneta desde el K 3+620 al K 3+570. Coml Izquierdo.

=) Martes, 16 de Enero del 2024.
- Estado del clima: Dia soleado.
- Personal en obra
  - Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 Operador maquinaria, 1 ayudantes.
  - Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero Auxiliar.
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (I), 1 Vibro compactador (I), 1 retro cargado (R), 1 Mini cargador (A), 1 camión (I-Auxiliar).
- Actividades Ejecutadas.
  - Se realizó adecuación de terreno e instalación de rieles para construcción de modulos de cuneta K 3+568 al K 3+537.
  - Se realizó adecuación e instalación de rieles para Construcción de modulos en concreto reforzado desde el K 3+570 al K 3+537 franja central.

=) Miércoles 17 de Enero del 2024.
- Estado del clima: Dia soleado.

— Personal en obra.
- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
— Actividades Ejecutadas.
- Se realizó vaciado de modulos en concreto ciclopeo desde el k 3+570 al 3+537 franja central.
- Se instalo acero de refuerzo para cunetas desde el K 3+570 al 3+537 carril izquierdo.

→ 18/01/2024 — Jueves del 2024.
— Estado del clima: Soleado.
— No se realizaron actividades con maquinaria.
— Se realizó vaciado de modulos de cuneta del K 3+537 al K 3+570 carril izquierdo.

→ 19/01/2024 — Viernes.
— Estado del clima: Dia soleado.
— Personal en obra.
- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
- Interventoria: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero auxil
— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (C), 1 rodillo compactador (C), 1 retro cargador (R), 1 mini cargador (A), 1 camión (C
— Actividades Ejecutadas.
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de rieles para construcción de modulos en concreto ciclopeo, desde el k 3+424 al k 3+323 carril izq. (franja central).
- Se realizó figuración de acero de refuerzo

CamScanner Powered by CamScanner

⇒ 20 / 01 / 2024 — Sábado.
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: 1 ingeniero residente, 1 SSTT, 1 Auxiliar, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
  - Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria en obra
1 motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I), 1 retro cargador (R), 1 mini cargador (A), 1 Camión (I-alquilado).
- Actividades Ejecutadas.
  - Se realizó vaciado de modulos de concreto ciclopeo desde el K 3+424 al K 3+323 franja Central.

⇒ 21 / 01 / 2024 — Domingo
- Estado del clima: Día soleado.
- No se realizaron actividades.

⇒ 22 / 01 / 2024 — Lunes.
- Estado del clima: Día Soleado
- Personal en obra:
  - Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes,
  - Interventoría: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ing. residente.
- Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (A), 1 vibro compactador (A), 1 retro cargador (R), 1 minicargador (A), 1 Camión (I-A)
- Actividades Ejecutadas.

CamScanner Powered by CamScanner

- K 3+424 al K 3+370. Carril Izquierdo: Se realizó adecuación de terreno, instalación de rieles e instalación de acero de refuerzo para construcción de modulos de huella.
- Se realizó instalación, extendido, humectación y compactación de capa de afirmado a cota de corona, desde el K 0+000 al K 0+060. calzada.
- Se tomo muestra del material, para realizar ensayos en laboratorio.

⇒ 23 / 01 / 2024 — Martes.

— Estado del clima: Dia soleado.

— Personal en obra:

- Contratista: 1 ingeniero Residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 4 operadores de maquinaria, 1 ayudante
- Interventoria: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero Residente

— Maquinaria en obra.

1 Motoniveladora (A), 1 Vibro compactador (A), 1 retro cargador (A), 1 minicargador (A), 1 carmix (1-Averiado), 2 volquetas

— Actividades Ejecutadas.

- Se realizó moviado de modulos de huella desde el K 3+424 al K 3+392 carril Izquierdo.
- Se realizó adecuación de terreno e instalación de riele para construcción de modulos de huella desde el K 3+3 al K 3+323 carril Izquierdo.
- Se realizó instalación, extendida, humectación y compact eión de capa de afirmado a cota de corona, desde K 0+060 al K 0+140. calzada.

⇒ 24 / 01 / 2024 — Miércoles.

— Estado del clima: Dia soleado.

— Personal en obra

- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 4 operadores de maquinaria, 1 ayudantes.
- Interventoría: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero Residente.

— Maquinaria en obra.
1 motoniveladora (A), 1 Vibro compactador (A), 1 retro-cargador (E), 1 minicargador (A), 1 camión (A-AU), 2 volquetas.

— Actividades ejecutadas.
- Se realizó instalación de acero de refuerzo para construcción de modulos de huella desde el K 3+390 el K 3+323. carril izquierdo.
- Se realizó instalación, extendida, humectación y compactación de material de afirmado a cota de corona desde el K 0+140 el K 0+220 calzada.

⇒ 25 / 01 / 2024 — Jueves.

— Estado del clima: Día soleado

— Personal en obra.
- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 4 operadores de maquinaria, 1 ayudante.
- Interventoría: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero Residente

— Maquinaria en obra.
1 motoniveladora (A), 1 Vibro compactador (A), 1 retro-cargador (E), 1 minicargador (A), 1 carm. x (I-Averiado), 2 volquetes.

— Actividades Ejecutadas.
- Se realizó vaciado de modulos de huella desde el K 3+392 el K 3+357 carril I-Izquierdo.
- Se realizó adecuación de terreno e instalación de rieles para construcción de modulos en concreto ciclopeo. desde el K 3+436 al K 3+470 Carril derecho.
- Se realizó instalación, extendida, humectación y compactación de material de afirmado a cota de corona desde el K 0+220 al K 0+320 calzada.

CamScanner Powered by CamScanner

⇒ 26/01/2024 — Viernes.
— Estado del clima: Día soleado.
— Personal en obra
• Contratista: 1 ingeniero Residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 4 operadores de maquinaria, 1 ayudantes.
• Interventoría: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero Residente
— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora (A), 1 Vibro compactador (A), 1 retro-cargador (A), 1 mini cargador (A), 1 carmix (C-1r), 2 volquet
— Actividades Ejecutadas.
• Se realizó vaciado de modulos de huella por el carril izquierdo desde el K 3+357 al K 3+323.
• Se realizó vaciado de modulos en concreto ciclopeo por el carril derecho desde el K 3+436 al K 3+470.
• Se realizó adecuación de terreno e instalación de niveles para construcción de modulos de huella de el K 3+470 al K 3+533 carril derecho.
• Se realizó instalación, extendida, humectación y compactación de material de afirmado a cotas de corona, desde el K 0+320 al K 0+360 calzada.

⇒ 27/01/2024 — Sábado.
— Estado del clima: Día soleado.
— personal en obra
• contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 4 operadores de maquinaria, 1 ayudantes.
• Interventoría: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero Residente
— Maquinaria en obra
1 motoniveladora (A), 1 Vibro compactador (A), 1 retro cargador (A), 1 mini cargador (A), 1 Carmix (C1-Axeo) 2 volquetas.
— Actividades Ejecutadas.
• Se realizó vaciado de modulos de huella por

CamScanner Powered by CamScanner

el carril izquierdo desde el K 3+470 al K 3+535.
- Se realizó instalación, extendida, humectación y compactación de material de afirmado a cota de corona desde el K 0+360 al K 0+400. calzada.
- Se realizó adecuación de terreno e instalación de niveles para construcción de modulos en concreto ciclopeo desde el K 3+424 al K 3+323 carril izquierdo.

⇒ 28 / 01 / 2024 — Domingo
— Estado del clima: Dia soleado.
No se realizaron actividades

⇒ 29 / 01 / 2024 — Lunes.
— Estado del clima: Dia Soleado.
— Personal en obra
- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 Auxiliar sst, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
- Interventoria: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero residente
— Maquinaria en obra
1 motoniveladora (I), 1 vibro compactador (I), 1 retro cargador (R), 1 mini cargador (A), 1 camión (I-AV)
— Actividades ejecutadas.
- Se realizó vaciado de modulos en concreto ciclopeo por el carril izquierdo desde el K 3+424 al K 3+323.

CamScanner Powered by CamScanner

⇒ 30 / 01 / 2024 — Martes.
— Estado del clima: Día Soleado.
— Personal en obra:
• Contratista: 1 Ingeniero Residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
• Interventoría: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero residente.
— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora CJ), 1 vibro compactador CJ), 1 retro-cargador (R), 1 minicargador (A), 1 carnix (J - auxiliar).
— Actividades Ejecutadas.
• Se realizó adecuación de terreno e instalación de rieles para construcción de modulos de cuneta K3+424/
• Se realizo figurado de acero de refuerzo para modulos de cunetas.

⇒ 31 / 01 / 2024 — Miercoles.
— Estado del clima: Día soleado.
— Personal en obra
• Contratista: 1 ingeniero residente, 1 auxiliar SST, 1 maestro de obra, 1 operador de maquinaria, 1 ayudantes.
• Interventoría: 1 ingeniero Auxiliar, 1 ingeniero residente.
— Maquinaria en obra.
1 Motoniveladora CJ), 1 vibro compactador CJ), 1 retro-cargador (R), 1 minicargador (A), 1 carnix (J - Auxiliar)
— Actividades Ejecutadas.
• Se realizó moviado de modulos de cuneta por el carril izquierdo desde el K3+424 al K3+323.

⇒ 01 / 02 / 2024 — Jueves.
— Estado del clima: Día Soleado.
— Personal en obra:
• Contratista: 1 ingeniero residente [illegible]

CamScanner Powered by CamScanner
