	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022 **Contratista:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

Contrato de Interventoría No. 971 de 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

Objeto Contrato de Obra:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

INFORME MENSUAL No. VEINTIDÓS (22) **MES O PERIODO:** may-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	454
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	458
1	**INTRODUCCION**		459
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		459
2.1	Localización		461
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		461
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		462
2.4	Características técnicas del proyecto		463
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		465
3.1	Información general del contrato		465
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		466
3.3	Seguimiento Items no previstos		468
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		468
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		470
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	471
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	481
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	483
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	493
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	496
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	499
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	501
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	510
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		520
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	522
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	524
	• Seguimiento Programa de Obra		526
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	531
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	533
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	535
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	538
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		881
5.1	Información general del contrato		881
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		882
5.3	Informes especialistas y profesionales		888
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		913
5.5	Informe matriz de riesgos.		914
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		920
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		921
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	922
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	924
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	930
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	932
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	939
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		962
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	NA
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	963
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	967
7	**Conclusiones y recomendaciones**		541
8	**Anexos**		542
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		543
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		544
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		546
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		548

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2723 de fecha 26/07/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MEPI-MN1-IN-15-FR-2, RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** may-24

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

PLAZO INICIAL: 8 MESES
PLAZO PRORROGA N°1: 4 MESES
PLAZO PRORROGA N°2: 4 MESES
PLAZO PRORROGA N° 3 : 5 MESES
FECHA DE INICIO: 24/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 9/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 21 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 8.121.889.999,40
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 8.121.889.999,40
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 2.436.567.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ 1.008.695.358,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 971 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	m	5000
	Mejoramiento	m	5000
	Subbase	m	5000
Explaneaciones	Excavación en material común de la explanación y canales	-	
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	10

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m	100	1600
	Mejoramiento	m	400	4465
	Subbase	m	0	3250
Explaneaciones	Excavación en material común de la explanación y canales	m	-	5015
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	Box Coulvert	Und	0	4

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 8.016.404.815,00		$ 8.016.404.815,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 41.265.012,10	$ 7.840.352,30	$ 49.105.364,40
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.105.047.827,10	$ 16.842.172,30	$ 8.121.889.999,40

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 72.887.182,99		$ 72.887.182,99	$ 3.521.922.277,64
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 56.379.820,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	$ 72.887.182,99		$ 72.887.182,99	$ 3.578.302.097,64

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 7.848.175.450,09
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.521.922.277,64
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	44,88%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	20
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**26**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1







Fundida de losas Reforzadas y bordillos

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Mediante comunicado CVRIMG-753-2024 del 26 de abril de 2024, la interventoría recomenda al municipio de San Bernardo del Viento la aplicación de procedimiento sancionatorio que podría resultar en declaratoria de caducidad por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de Obra del contrato de la referencia, específicamente por el atraso en la ejecución de la obra contratada y la no legalización y amortización de los recursos girados del anticipo y demás obligaciones contractuales

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Como resultado del concurso de méritos abierto**CMA-DTE-SEP-196-2021**y número ID del SECOPCO1.PCCNTR.3626320, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, celebró el contrato de interventoría No. 971 del 2022, con el **CONSORCIO VIAL RURAL IMG**, el cual tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 2".**Mediante comunicado SVR 49265, por la subdirectora de vías regionales de INVIAS, se impartió orden iniciación al contrato a partir del 22 de agosto de 2022. La Supervisión del Contrato es ejercida por la Ingeniera LAURA ISABELA PEÑA GARCIA, la cual fue nombrada mediante resolución No. 2723 de fecha 26 de julio de 2022. La gestión técnica del Proyecto es ejercida por el ingeniero ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON, el cual fue nombrado mediante resolución 3343 del 2 de noviembre de 2021.

Por otra parte, El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, establece lazos de cooperación con el municipio de San Bernardo del Viento, mediante el convenio interadministrativo No. 1876 de 2021. Es por ello por lo que mediante el proceso de licitación pública **LP-MSBV-006-2022,** se celebra el Contrato de Obra No. LP-MSBV-006-2022, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"**, El cual fue adjudicado al **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO**, cuyo plazo inicial es de ocho (8) meses a partir del 24 de agosto de 2022 según acta de inicio, y tiene un valor inicial de $8.121.889.999,00. Actualmente la fecha de terminación es el 11 de junio de 2024 de acuerdo con la ultima prorroga otorgada.

El presente informe mensual de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativa, financiera y ambiental desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido desde el 01 al 31 de Mayo de 2024 e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo periodo, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión No.1 del 2022, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y estado del contrato y de los diferentes proyectos que nos ocupan.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Este proyecto se localiza en la vía que conduce desde la intersección que lleva San Bernardo del Viento - Moñitos hasta el Corregimiento del El Castillo.



Ilustración 1. Mapa de Colombia, Ubicación del departamento de Córdoba.



Ilustración 2. Mapa de Córdoba, ubicación del municipio de San Bernardo del Viento.

San Bernardo del Viento es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Está situado sobre la costa norte de Colombia en la desembocadura del río Sinú en el mar Caribe y dista 78 km de la ciudad de Montería, la capital del departamento. El territorio corresponde a un bosque seco tropical, con predominio de relieve bajo, baja altitud y alta temperatura, con un promedio de 30 °C, una humedad relativa del 80%, dos épocas de lluvias durante el año, entre abril – mayo y octubre – noviembre, en donde se precipita el 76% de la lluvia anual que es de unos 1.300 mm y una época de verano, que corresponde al resto del año. La mayor parte del territorio, al norte, sur y este, es plano, el resto presenta alturas cercanas a los 100 msnm, posee 34,2 km de playas de los cuales algunos tramos presentan condiciones adecuadas para el turismo y ecoturismo.

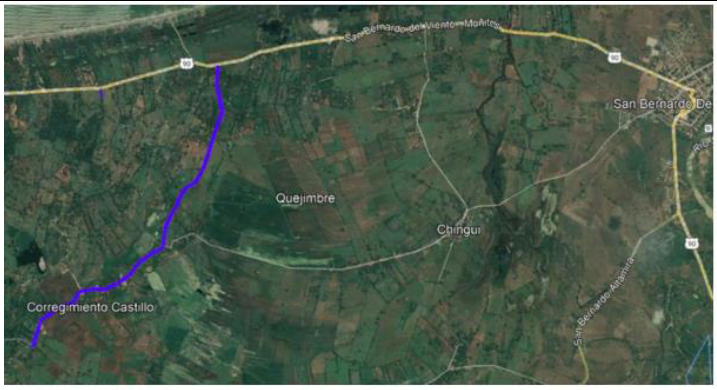


Ilustración 3. Vía al corregimiento el Castillo.

2.1.1. FUENTE DE MATERIALES

La fuente de materiales para el material de AFIRMADO presentada por el contratista, se encuentra ubicada en la vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica Córdoba. Esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.

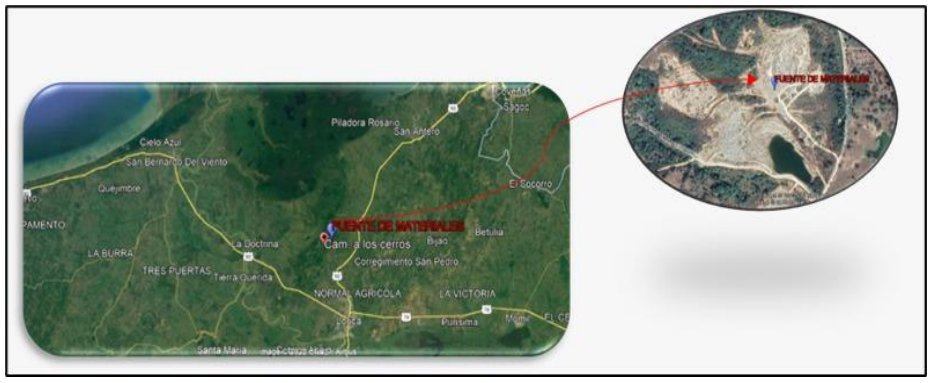


Ilustración 4. Ubicación de la fuente de materiales.

Para el material se SUBBASE GRANULAR, se encuentra ubicada en el corregimiento de san Sebastián, municipio de santa cruz de lorica, Cantera San José esta cuenta con permiso minero y licencia ambiental.



2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

.

2.2.1. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Se benefician principalmente la zona rural del municipio de San Bernardo del viendo, principalmente la población que habita en el corregimiento de El Castillo.

2.2.2. BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gracias a la ejecución del presente proyecto, los niveles de servicio de la vía serán óptimos ya que no existirá flujo interrumpido bajo ningún aspecto técnico en lo que respecta a capacidad, distribución vehicular, entre otros. Esto traerá como beneficio la calidad del servicio de los usuarios, ya que con ello se logra una disminución en los tiempos de viaje, un oportuno acceso a los servicios de salud y una mayor facilidad en la comercialización de los productos agropecuarios, entre otros aspectos.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Inicialmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de la vía; es por ello que se realiza el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de placa huella.



Estado inicial de la Vía, 24/08/2022



Estado de la la via Actual 30/04/2024



Estado de la la via Actual 30/04/2024



Estado de la la via Actual 30/04/2024

Ilustración 5. Estado inicial de la Vía. Cto. LP-MSBV-006-2022


2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Inicialmente se tenía contemplada la construcción de 5300 metros de Placa Huella y un Box Coulvert de 2,5X2,5 con una longitud de 7 metros.

Luego de la actualización de los estudios y diseños, se define la metafísica a construir así: se realizará la construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Culvert de 1X1, un (1) Box Culvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (7) alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

Contrato LP-MSBV-006-2022	
Sistema	Placa Huella
Longitud	5000 metros
Ancho Calzada	5,3 metros
Losa de concreto	0,15 metros
Subbase	0,15 metros
Afirmado (mejoramiento)	0,20 metros

i. . ESTRUCTURA DE LA PLACA HUELLA.





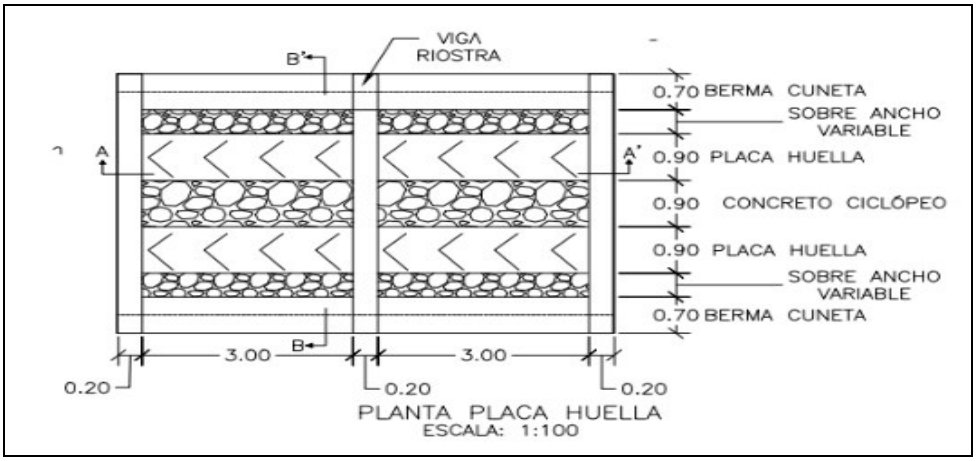


Ilustración 6. Sección típica en planta de la placa huella.


ii. OBRAS DE DRENAJES


✓ Boxculvert.

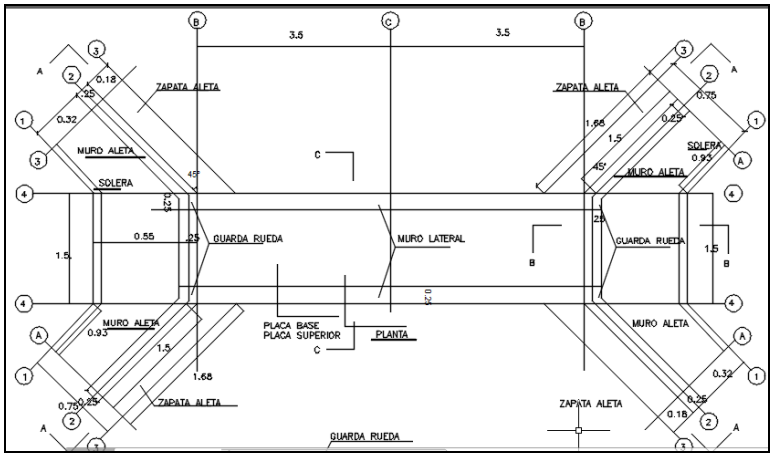

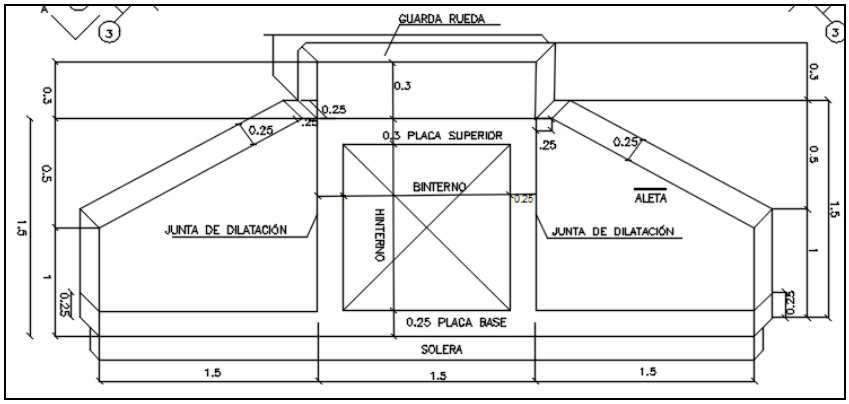

✓ Alcantarillas de 36”

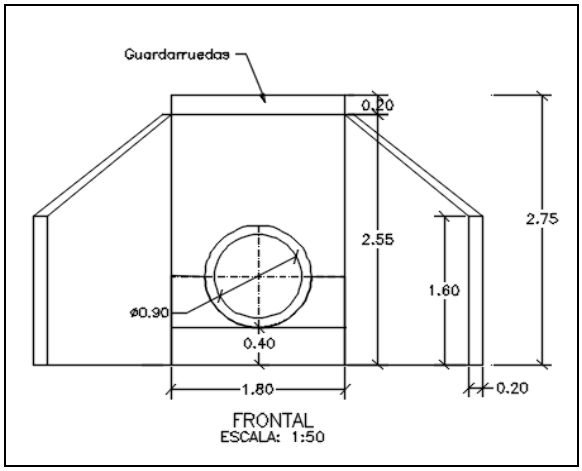

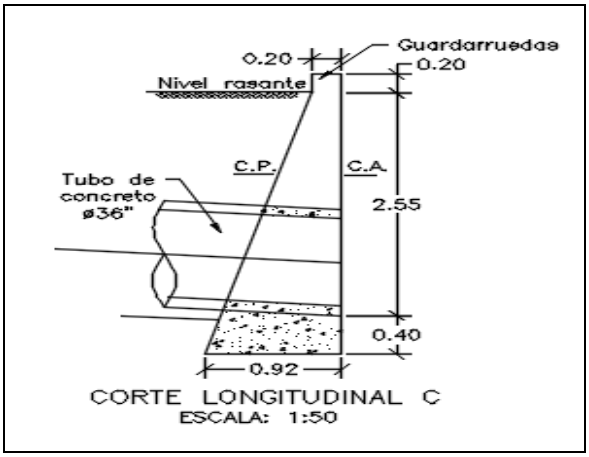

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

PROCESO No.	LP-MSBV-006-2022
CONTRATO No.	LP-MSBV-006-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022/07/13
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
NIT	901611859-1
INTEGRANTES	• ALEXANDER THEVENING GARCÉS • C.C. 721.485.658 • Participación: 90%
	• CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S. • NIT. 900.506.559-2 • Participación: 10%
DIRECCIÓN	Cra 11 N 10-31 Pueblo Nuevo – Córdoba
TELEFONO	3107193787
CORREO	consorciovial.sanbernardo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.121.889.999,00
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA INICIO	24/08/2022
PRORROGA N°1	4 MESES
PRORROGA N° 2	4 MESES
PRORROGA N° 3	5 MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	11/06/2024

Tabla 1. Información Cto. LP-MSBV-006-2022

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

3.2.1. GESTIÓN TÉCNICA

i. Replanteo topográfico en conjunto entre la Interventoría y contratista

ii. Se continua con la fundición de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA.
iii. Se continua con la figuración de Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
iv. Se continua con las fundidas de Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
v. Se continua con la construcción de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
vi. Se Continua con la construcción de Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS

3.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y/O DE SOSTENIBILIDAD

i. El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental P.A.G. A V6, fue aprobado y enviado por la Interventoría Rad N°30779 de 29/03/2023 a INVIAS, se está a la espera para concepto de no objeción.

ii. Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio, el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023, por lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje.

iii. **Permisos Ambientales:** RESOLUCIÓN No. 3-0619 del 29 de marzo de 2023.Se encuentra a nombre del municipio de San Bernardo del Viento. Ocupación de Cauce permanente en los siguientes puntos:

Punto	Coordenadas	
	Norte	Oeste
Box Coulvert 1	9°19'28,344" N	76°1'1,704" W
Box Coulvert 2	9°19'16,056" N	76°1'13,086" W
Box Coulvert 3	9°18'57,21" N	76°1'38,61" W

Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentar un informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.

Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.

iv. **Estado actual de los informes de gestión ambiental**: el contratista presenta atraso en la entrega del informe correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2024.

v. **Seguimiento a actividades PAGA.**

Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:

- ✓ permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
- ✓ certificaciones faltantes de los materiales utilizados en obra (arena).

3.2.3. GESTIÓN SOCIAL

i. El contratista instalo el punto de atención al usuario ubicado en el Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar.
ii. El contratista realizo entrega de Informes sociales tercer trimestre, en revisión por Interventoría.
iii. se realizó la reunión mensual con la veeduría del mes de Enero para informarle el estado del proyecto y atender inquietudes de la comunidad.
iv. El contratista presento las actas de vecindad ante la interventoría.
v. **Estado actual de los informes de gestión Social**: el contratista presenta atraso en la entrega del informe correspondiente al mes de Diciembre del 2023, Enero, Febrero y Marzo del 2024.
vi. **Seguimiento a actividades PAGA:** Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
   - ✓ Gestiones ante ministerio del interior
   - ✓ Gestión ante ICANH
   - ✓ Cierre de 3 PQRS.
   - ✓ Actas de compromiso del sitio de acopio temporal.

3.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Se realizaron visitas por parte de la SISO de Interventoría y se realizaron observaciones al contratista:

- ✓ **Mejorar señalización de la obra:** solicita mejorar la señalización en las zonas donde se tiene material acordonado en la vía.
- ✓ Se tiene pendiente entrega de las planillas de seguridad del mes de enero, febrero, marzo y abril.
- ✓ Se solicitó la entrega de EPP a los trabajadores que se encuentran en obra.

3.2.4. GESTIÓN PREDIAL

i. A la fecha, el proyecto no requiere de adquisición de predios

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

i. A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha se tiene una inversión de obra programada según reprogramación ajustada a prórroga N°3 es de $ 7.848.175.450,09 correspondiente al 97,90% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.521.922.277,64 correspondiente al 43,93%; lo que representa un atraso del -53,97%.

i. Hacer seguimiento a los compromisos pactados.
ii. Realizar la revisión de la información entregada por el contratista.
iii. Envío de oficios correspondientes a contratista y municipio.
iv. Reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra.
v. Reuniones de seguimiento Mensual con la veeduría
vi. Elaboración de informes semanales de avances del contrato de obra.
vii. Revisión de las afiliaciones del personal en obra a la seguridad social.
viii. Acompañamiento para supervisión y control de las actividades en obra.
ix. Diligenciamiento de la bitácora de obra
x. Inspección de EPP y afiliaciones a seguridad social.
xi. Inspección de señalización vial: se realizó inspección, especificando observaciones en diferentes puntos.
xii. Inspección de maquinaria y equipos en obra.

xiii. Mediante comunicado CVRIMG-1341-2023 Mediante comunicado CVRIMG-1341-2023, está interventoría solicita al CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, realizar la toma de núcleos a los elementos donde se está reportando el no cumplimiento de la norma y así poder dirimir y liberar dichos elementos.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **SEMANA No.:** 97 del 26/04/2024 al 2/05/2024 **mo Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (6) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1
INTEGRANTES: 1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90% 2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%
CONTRATO No. LP-MSBV-008-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/06/2024

VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 932.324.822,40
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.504.242.177,60

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7
INTEGRANTES: 1. GRUPO POSSO S.A.S. NIT. 800.007.208-9 (30%) 2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A. NIT. 830.103.289-5 (55%) 3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)
CONTRATO No. 971.96.2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 5.364.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$ 650.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	$ 3.663.515.705,40
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.108.374.293,60	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.663.515.705,40	$ 3.663.515.705,40
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 400.000.000,00	$ 3.070.014.796,00	$ 2.209.720.471,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.754.578.985,00	$ 708.153.853
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796,00	$ 315.435.811,00	$ 1.501.566.618,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.198.608.822,29	89,80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.449.035.094,65	43,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.749.573.727,64)	-46,77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 66.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.198.608.822,29	89,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.449.035.094,65	43,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.749.573.727,64)	-46,77%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 124.647.638,39	1,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.245.981.548,00	71,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-24
VALOR FACTURA: $ 243.840.853,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 932.324.822,40
Saldo $	$ 1.504.242.177,60

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 89,80% Avance o Atraso Físico %: -46,77%
Meta Física Ejecutada %: 43,02%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (2022)	Vigencia (2023)	Vigencia (2024)
Estudios y diseños	%	100	50	50	
Explanación	m	5000	1730	3220	50
Afirmado	m	5000	1730	3220	50
Subbase Granular	m	5000	90	3110	1800
Placa Huella	m	5000		1340	3660
Box Coulvert	Und	12		4	8

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Prog	100			100	100,0%
	Ejec	100			100	100,0%
Explanación	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	4466			4466	89,3%
Subbase Granular	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	1650			1650	33%
Box Coulvert	Prog	12			12	100,0%
	Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	2
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual cumple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A
EMISIONES:	SI	NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expidió resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentaen informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES:
Seguimiento a actividades PAGA.
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena). - Informe

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES :
El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social del mes de Diciembre , Enero , Febreo y marzo sin recibir
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se deja constancia que desde el dia 05 de abril del 2024 se presenta de forma injustificada una nueva inactividad en la obra ; se le ha hecho las debidas recomendaciones al contratista pero hasta la fecha no se a sub sanado esta problematica. el dia lune 29 de abril del 2024. se realizó audiencia de apremio de multas en las instalaciones de la alcaldia municipal del municipio de san bernardo del viento, a la cual no asistió el contratista de obra , por lo que se realizara otra audiencia el dia martes 14 de mayo del 2024. las actividades acumuladas son:

1.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
2.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
3.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - HUELLA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidraulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excvacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

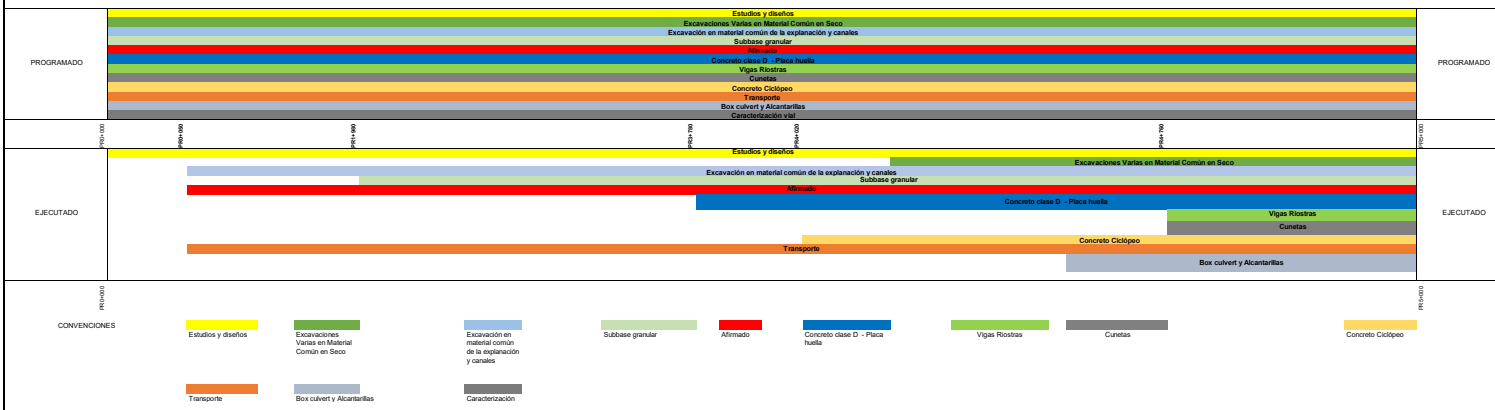

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBRA INACTIVA



OBRA INACTIVA



OBRA INACTIVA



AUDIENCIA #2, PARA APREMIO DE MULTA, NO ASISITIO EL CONTRATISTA



REUNION CON PERSONAL DEL CORREGIMEIENTO EL CATILLO, PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL E INTERVENTORIA



PROTESTA DE LA COMUNIDAD DEL CASTILLO , CIERRE DE LA VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO - MOÑITOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 9582-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 90 del 17/05/2024 al 23/05/2024 **no Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella y seis(6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, tres (3) Box Coulvert dobles de 1,5X1,5 , un Box Coulvert doble de 1X1 y séis alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/06/2024

VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 932.324.822,40
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.504.242.177,60

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/09/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 5.364.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$ 650.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	$ 3.663.515.705,40
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.108.374.293,60	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.663.515.705,40	$ 3.663.515.705,40
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 400.000.000,00	$ 3.070.014.796,00	$ 2.209.720.471,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.754.578.985,00	$ 708.153.853
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796	$ 315.435.811,00	$ 1.501.566.618,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.689.355.407,35	95,92%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.491.640.713,58	43,56%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.197.714.693,77)	-52,36%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 56.379.820,00		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.689.355.407,35	95,92%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.491.640.713,58	43,56%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.197.714.693,77)	-52,36%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.820.042,74	1,98%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.750.948,31	0,43%	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.245.981.548,00	71,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: mar-24
VALOR FACTURA: $ 243.840.853,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 932.324.822,40
Saldo $	$ 1.504.242.177,60

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 95,92%
Meta Física Ejecutada % 43,56%
Avance o Atraso Físico % -52,36%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Vigencia (2024)
Estudios y diseños	%	100	50	50	
Explanación	m	5000	1730	3220	50
Afirmado	m	5000	1730	3220	50
Subbase Granular	m	5000	90	3110	1800
Placa Huella	m	5000		1340	3660
Box Coulvert	Und	12		4	8

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	100			100	100,0%
Ejec	100			100	100,0%
Prog	5000			5000	100,0%
Ejec	4950			4950	99,0%
Prog	5000			5000	100,0%
Ejec	4466			4466	89,3%
Prog	5000			5000	100,0%
Ejec	3200			3200	64,0%
Prog	5000			5000	100,0%
Ejec	1650			1650	33%
Prog	12			12	100,0%
Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	1
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	2
Motoniveladora	1	
Regla vibratoria	1	1
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 8 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Cordoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica, Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san jose de lorica, el cual cumple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje. Dentro de los requerimientos, se solicita que un mes despues de terminada la actividadconstructiva(puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de aguay los puntos de objeto de ocupación.
NOTA : Si bien el permiso de ocupación de cauce esta a nombredel municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico, ya que es el ncargado de realizar la actividad constructivay puede dar un mrjor alcance a lo solicitado en la resolución.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

OBSERVACIONES:
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PAGA
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividadesdescritasen el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atra so :ambientales
permisos y/o autorizacionesambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena
certificaciones faltantes de los materiales de los materiales utilizados en obra (arena).
- informe ambiental del mes de diciembre,eneero, febrero , marzo, y abril sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	20	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.

Informes Sociales jmes diciembre, del 2023, enero, febrero, marzo y abril , Pendiente por Entregar
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividadesdescritasen el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atra so
- gestiones ante el ministerio del interior
- gestión ante ICANH
- CIERRE DE 3 pqrs; actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a inviás para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


el contratita inicia suministro de materiales el dia 8 de mayo e inicia actividades el dia 14 de mayo cel 2024. las actividades arealizadas y acumuladas son:

1. concreto clase D para huella.
2.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
3.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. concreto clase D para huella.
2. abrir frentes para la construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
3. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
4. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
5.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
6. Continuar con la Excavacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

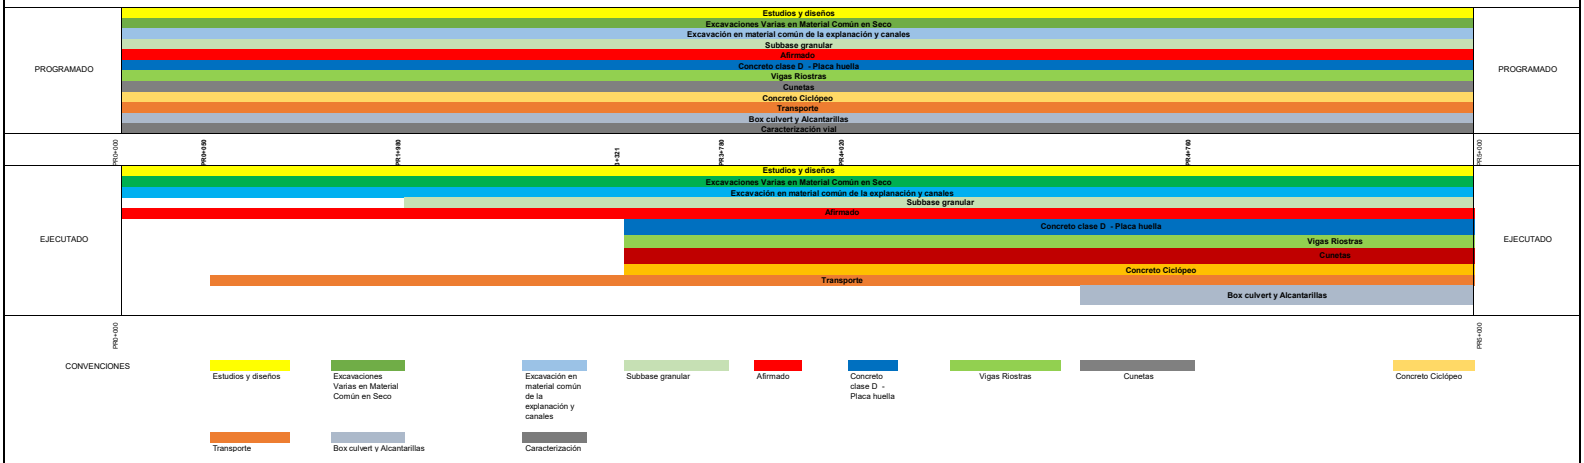

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



acero de refuerzo para módulos d cuneta y huella .. K 4+345 al k 4+370 carril izquierdo



construcción de módulos de cuneta y huella .. K 4+345 al k 4+370 carril izquierdo



construcción de módulos de cuneta y huella .. K 4+345 al k 4+370 carril izquierdo



construcción de bordillos . K 4+800 a k4+600



construcción de bordillos . K 4+800 a k4+600



construcción de bordillos . K 3+323 a k3+600

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	9/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **SEMANA No.:** 97 del 3/05/2024 al 9/05/2024 **mo Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella, seis (6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, cinco (5) Box Coulvert de 1,5X1,5 y siete (6) alcantarillas de 36 pulgadas de diametro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-008-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/06/2024

VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 932.324.822,40
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.504.242.177,60

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S. NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A. NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971.06.2022
FECHA DE INICIO: 22/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 5.364.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$ 650.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	$ 3.663.515.705,40
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.108.374.293,60	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.663.515.705,40	$ 3.663.515.705,40
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 400.000.000,00	$ 3.070.014.796,00	$ 2.209.720.471,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204,00	$ 2.754.578.985,00	$ 708.153.853
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796,00	$ 315.435.811,00	$ 1.501.566.618,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.371.715.321,87	91,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.449.035.094,65	43,02%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 3.922.680.227,22	48,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 66.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.371.715.321,87	91,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.449.035.094,65	43,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.922.680.227,22	48,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 173.106.499,58	2,16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.245.981.548,00	71,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: mar-24
VALOR FACTURA: $ 243.840.853,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 932.324.822,40
Saldo $	$ 1.504.242.177,60

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 91,96% Avance o Atraso Físico % 48,93%
Meta Física Ejecutada % 43,02%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (2022)	Vigencia (2023)	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	50	50		Prog	100			100	100,0%
						Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	1730	3220	50	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	1730	3220	50	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	4466			4466	89,3%
Subbase Granular	m	5000	90	3110	1800	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000		1340	3660	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	1650			1650	33%
Box Coulvert	Und	12		4	8	Prog	12			12	100,0%
						Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	3
Motoniveladora	1	1
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retrocargador	1	1
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	2
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN: Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san José de lorica, el cual cumple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:
Se expidió resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje
Dentro de los requerimientos se solicita que un mes después de terminada la actividad constructiva (puente) se debe presentaen informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de agua y los puntos de objeto de ocupación.
Nota: si bien el permiso de ocupación de cauce está a nombre del municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico ya que es el encargado de realizar la actividad constructiva y puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023

OBSERVACIONES:
Seguimiento a actividades PAGA.
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
Ambientales:
Permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena.
Certificaciones faltantes de los materiales utilizado en obra (arena). - Informe

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES :
El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.
- Informe Social del mes de Diciembre , Enero , Febreo y marzo sin recibir
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividades descritas en el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atraso:
- Gestiones ante ministerio del interior
- Gestión ante ICANH ; Cierre de 3 PQRS ; Actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALUOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se deja constancia que desde el dia 05 de abril del 2024 se presenta de forma injustificada una nueva inactividad en la obra ; se le ha hecho las debidas recomendaciones al contratista pero hasta la fecha no se a sub sanado esta problematica. el dia lune 29 de abril del 2024. se realizó audiencia de apremio de multas en las instalaciones de la alcaldia municipal del municipio de san bernardo del viento, a la cual no asistió el contratista de obra , por lo que se realizara otra audiencia el dia martes 14 de mayo del 2024. Para esta semana Se realizo reunion en el municipio del Castillo con la participacion del Alcalde, Secretario de Infraestructuras, contratista, socio Inversionista, Director de Interventoria, Residente de interventoria y comunidad. con el objeto de informales que se retomarian las actividades en obra y que para esta semana ingresarian materiales agregados, cemento y arena, ademas de organizar las deudas pendientes que tiene el contratista, verificar el estado de equipos, formaleteria y retomar actividades el lunes 13 de mayo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Abrir nueva obra de arte
2. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C y Afirmado
3. Continuar construcción de obras Hidraulicas box culvert y Alcantarillas
4. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
5. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
7. Continuar con la Excvacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

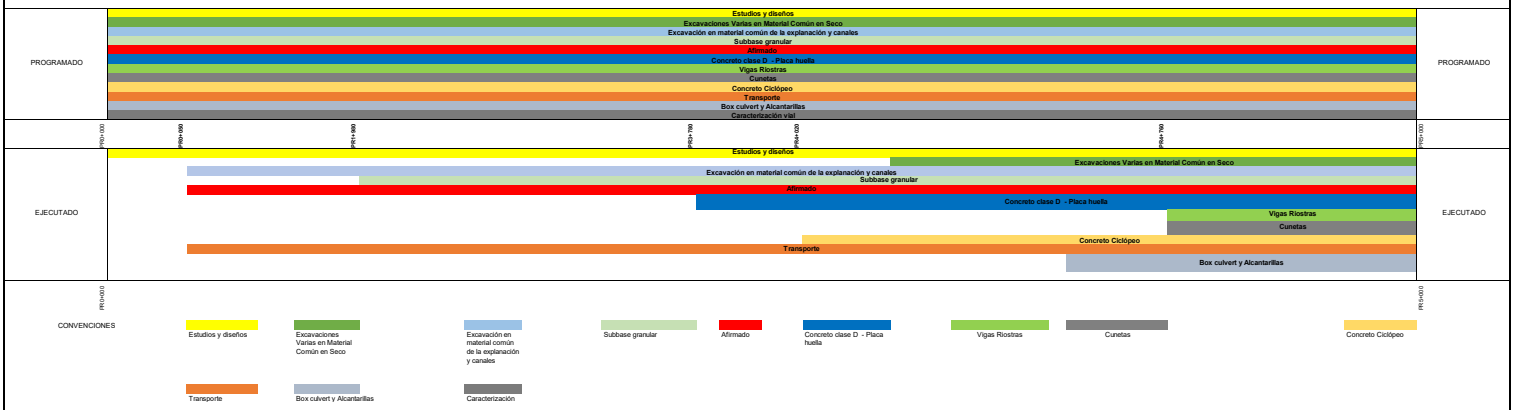

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INGRESO DE MATERIALES



INGRESO DE MATERIALES



INGRESO DE MATERIALES



INGRESO DE MATERIALES



REUNION CON PERSONAL DEL CORREGIMEIENTO EL CATILLO, PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA



REUNION CON PERSONAL DEL CORREGIMEIENTO EL CATILLO, PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, CONTRATISTA E INTERVENTORIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 89 del 10/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) **no Informe Semanal SI** ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella y seis(6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, tres (5) Box Coulvert dobles de 1,5X1,5 , un Box Coulvert doble de 1X1 y séis alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/06/2024

VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 932.324.822,40
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.504.242.177,60

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No. 971 de 2022
FECHA DE INICIO: 22/09/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024

VALOR INICIAL:	$ 4.564.284.660,00
VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	$ 5.364.284.660,00
VALOR ANTICIPO:	$ 650.000.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	$ 3.663.515.705,40
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.108.374.293,60	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.663.515.705,40	$ 3.663.515.705,40
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 400.000.000,00	$ 3.070.014.796,00	$ 2.209.720.471,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.754.578.985,00	$ 708.153.853
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796	$ 315.435.811,00	$ 1.501.566.618,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.530.535.364,61	93,94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.456.889.765,27	43,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.073.645.599,34)	-50,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.530.535.364,61	93,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.456.889.765,27	43,12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.073.645.599,34)	-50,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 158.820.042,74	1,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.854.670,62	0,10%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.245.981.548,00	71,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: mar-24
VALOR FACTURA: $ 283.840.853,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 932.324.822,40
Saldo $	$ 1.504.242.177,60

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 93,94%
Meta Física Ejecutada % 43,12%
Avance o Atraso Físico % -50,82%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base						Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (2023)	Vigencia (2024)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100	50	50		Prog	100			100	100,0%
						Ejec	100			100	100,0%
Explanación	m	5000	1730	3220	50	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	m	5000	1730	3220	50	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	4466			4466	89,3%
Subbase Granular	m	5000	90	3110	1800	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	m	5000		1340	3660	Prog	5000			5000	100,0%
						Ejec	1650			1650	33%
Box Coulvert	Und	12		4	8	Prog	12			12	100,0%
						Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	1
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	2
Motoniveladora	1	
Regla vibratoria	1	1
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	
Vibrocompactador	1	1
Volqueta 6 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica ,Cordoba	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san jose de lorica, el cual cumple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje. Dentro de los requerimientos, se solicita que un mes despues de terminada la actividadconstructiva(puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de aguay los puntos de objeto de ocupación.
NOTA : Si bien el permiso de ocupación de cauce esta a nombredel municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico, ya que es el ncargado de realizar la actividad constructivay puede dar un mejor alcance a lo solicitado en la resolución.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

OBSERVACIONES:
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PAGA
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividadesdescritasen el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atra so :ambientales
permisos y/o autorizacionesambientales vigentes, de conformidad con la normatividad de los proveedores de arena
certificaciones faltantes de los materiales de los materiales utilizados en obra (arena).
- informe ambiental del mes de diciembre,eneero, febrero , marzo, y abril sin recibir

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.

Informes Sociales jmes diciembre, del 2023, enero, febrero, marzo y abril , Pendiente por Entregar
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividadesdescritasen el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atra so
- gestiones ante el ministerio del interior
- gestión ante ICANH
- CIERRE DE 3 pqrs; actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ----------
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ----------
AVALÚOS APROBADOS: ----------
PREDIOS ADQUIRIDOS: ----------

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a inviás para concepto de no objeción, Rad N°30779 del 29/03/2023.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


se deja constancia que desde el dia 05 de abril del 2024 al 13 de mayo del 2024, se presentó en obra una inactividad de forma injustificada; el contratita inicia suministro de materiales el dia 8 de mayo e inicia actividades el dia 14 de mayo cel 2024

1. concreto losa de fondo, figuracion y encofrado de muros de Boxculvert K2+620
2. Concreto de moros y losa superior de Boxculvert K3+250
3.Fundida de losa de muros, Armado y encofrado de losa superior de Boxculvert K4+370
3 Relleno, extension y compactacion con material de Subbase
4.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
5.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
6.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
7.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

3. Continuar con la ejecución de relleno Subbase Granular Clase C.
4. abrir frentes para la construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
5. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
6. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
7.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
8. Continuar con la Excvacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

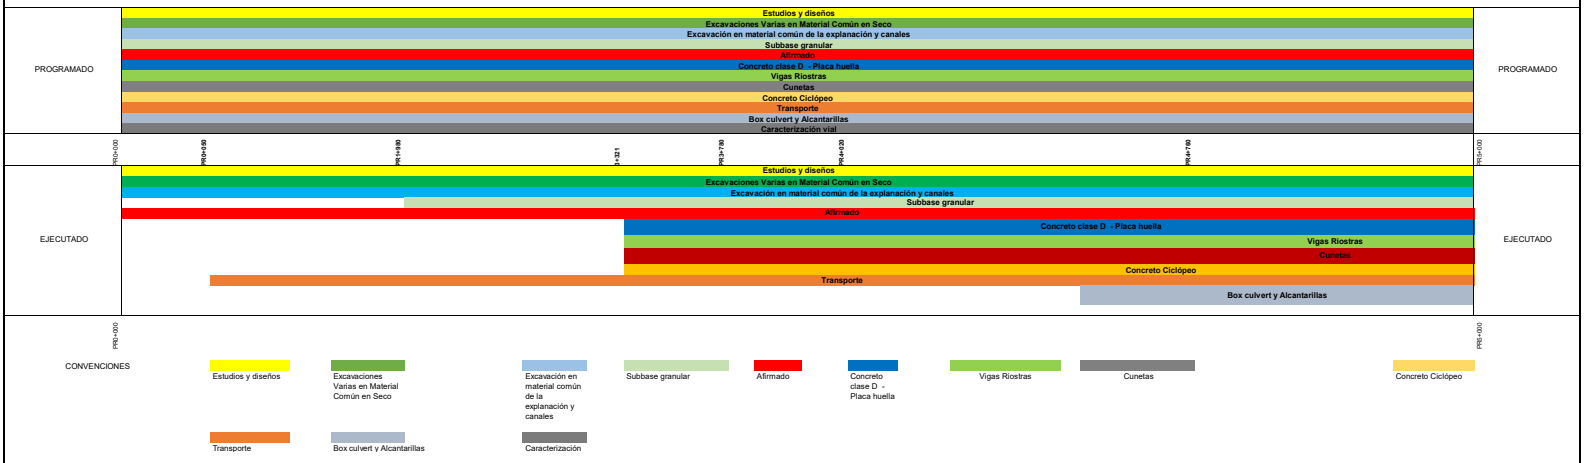

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



instalación de acero para módulos de cuneta . K 3+280 carril derecho



construcción de módulos de cuneta. Carril derecho. K 3+280



construcción de módulos de cuneta. Carril derecho. K 3+280



construcción de brdillos . Ambos margenes, k 5+014 a menores



construcción de brdillos . Ambos margenes, k 5+014 a menores



adecuación de terreno para construcción de módulos de cuneta . Carril izquierdo. K 4+345 a mayores

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO
Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **SEMANA No.:** 91 del 24/05/2024 al 30/05/2024 **no Informe Semanal SI** ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECT** ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La construcción de 5000 metros de Placa Huella y seis(6) Box Coulvert de 1X1, un (1) Box Coulvert de 2X3, tres (3) Box Coulvert dobles de 1,5X1,5 , un Box Coulvert doble de 1X1 y séis alcantarillas de 36 pulgadas de diámetro.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objeto del contrato tiene como alcance, el mejoramiento de la vía que comunica al casco urbano del municipio con el corregimiento El Castillo, ubicado en la zona rural del municipio, con la construcción de 5000 metros de Placa Huella

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

INTEGRANTES:
1. ALEXANDER THEVENING GARCÉS, Participación: 90%
2. CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERÍAS S.A.S., Participación: 10%

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022
FECHA DE INICIO: 23/08/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 24/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 11/06/2024

VALOR INICIAL:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.121.889.999,00
VALOR ANTICIPO:	$ 2.436.567.000,00
VALOR AMORTIZADO:	$ 932.324.822,40
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.504.242.177,60

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

INTEGRANTES:
1. GRUPO POSSO S.A.S, NIT. 800.007.208-9 (30%)
2. INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A, NIT. 830.103.289-5 (55%)
3. HUGO ALFREDO POSSO PRADO, C.C. 4.610.382 (15%)

CONTRATO No.	971 de 2022	**VALOR INICIAL:**	$ 4.564.284.660,00
FECHA DE INICIO:	22/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	**VALOR ACUMULADO:**	$ 5.364.284.660,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ 650.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 650.000.000,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 6.771.889.999,00	$ 3.663.515.705,40
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 1.350.000.000,00	$ 3.108.374.293,60	
	SALDO DE VIGENCIA		$ -	$ 3.663.515.705,40	$ 3.663.515.705,40
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 400.000.000,00	$ 3.070.014.796,00	$ 2.209.720.471,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 399.985.204	$ 2.754.578.985,00	$ 708.153.853
	SALDO DE VIGENCIA		$ 14.796	$ 315.435.811,00	$ 1.501.566.618,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	8.016.404.815,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.848.175.450,09	97,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	3.521.922.277,64	43,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(4.326.253.172,45)	-53,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	56.379.820,00	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.848.175.450,09	97,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3.521.922.277,64	43,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(4.326.253.172,45)	-53,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	158.820.042,74	1,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	30.281.564,06	0,38%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4.564.284.660,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	3.245.981.548,00	71,12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	54.373.219,80	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	54.373.219,80	1,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: mar-24
VALOR FACTURA: $ 243.840.853,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 2.436.567.000,00
Amortizado $	$ 932.324.822,40
Saldo $	$ 1.504.242.177,60

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 650.000.000,00
Amortizado $	$ 650.000.000,00
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 97,90%
Meta Física Ejecutada % 43,93%
Avance o Atraso Físico % -53,97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____2022____	Vigencia (2023)	Vigencia (2024)
Estudios y diseños	%	100	50	50	
Explanación	m	5000	1730	3220	50
Afirmado	m	5000	1730	3220	50
Subbase Granular	m	5000	90	3110	1800
Placa Huella	m	5000		1340	3660
Box Coulvert	Und	12		4	8

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Prog	100			100	100,0%
	Ejec	100			100	100,0%
Explanación	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	4950			4950	99,0%
Afirmado	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	4466			4466	89,3%
Subbase Granular	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	3200			3200	64,0%
Placa Huella	Prog	5000			5000	100,0%
	Ejec	1700			1700	34%
Box Coulvert	Prog	12			12	100,0%
	Ejec	4			4	33,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Buldozer	1	
Carrotanque de agua	1	
Compactador manual	1	1
Compresor	1	
Equipo de oxicorte	1	
Mezcladora de concreto	1	2
Motoniveladora	1	
Regla vibratoria	1	
Retroexcavadora	1	
Retroexcavadora sobre orugas	1	
Vibrocompactador	1	
Volqueta 8 m3	1	1
Cortadora de Pavimento	1	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Vereda El Esfuerzo, Municipio de Santa Cruz de Lorica -Cordoba	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	Cantera san jose , Corregimiento de san Sebastian, Municipio de santa cruz de lorica, Vereda Arroyo Seco,Municipio de Tolu Viejo-Sucre	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

OBSERVACIONES: El contratista solicito cambio de cantera para el material se subbase Granular hacia la cantera san jose de lorica, el cual cumple con los permisos y licencias ambientales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI X	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES:
Se expide resolución de aprobación por parte de la CVS al consorcio , el cual autoriza y concede el permiso de ocupación de cause mediante RESOLUCIÓN No. 3-0619 de fecha 29 DE MARZO DE 2023 , po lo que la interventoría da viabilidad en la intervención de las obras de drenaje. Dentro de los requerimientos, se solicita que un mes despues de terminada la actividadconstructiva(puente) se debe presentarun informe técnico en el que se incluyan las medidas ambientales ejecutadas, observaciones y registro fotográfico donde se visualicen las condiciones en que se encontraban las riberas del cuerpo de aguay los puntos de objeto de ocupación.
NOTA : Si bien el permiso de ocupación de cauce esta a nombredel municipio, se recomienda al contratista realizar el informe técnico, ya que es el ncargado de realizar la actividad constructivay puede dar un mrjor alcance a lo solicitado en la resolución.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

OBSERVACIONES:
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PAGA
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividadesdescritasen el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atra so ambientales
).
- informe ambiental : ok

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	20	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corredor Vial Abscisa K1+030, Corregimiento el Palmar

OBSERVACIONES : El día 25 de mayo se realizo reunión con la comunidad en acompañamiento de contratista e interventoría y alcaldía municipal ,para tratar temas de avance e inquietudes del proyecto.

Informes Sociales jmes diciembre, del 2023, enero, febrero, marzo y abril , Pendiente por Entregar
Al realizar revisión al cumplimiento de las actividadesdescritasen el PAGA, se evidencian las siguientes actividades con atra so
- gestiones ante el ministerio del interior
- gestión ante ICANH
- CIERRE DE 3 pqrs; actas de compromiso del sitio de acopio temporal

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES: Hasta la fecha, el proyecto no requiere adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. PAGA V6, enviado a invias para concepto de no objeción, Rad N°30779 de 29/03/2023.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


El contratista reinicia actividades el dia 14 de mayo cel 2024. Las actividades realizadas y acumuladas son:

1. concreto clase D para huella. k4+345,6 al k 4+370,43 carril izquierdo
2.Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).
3.Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
4.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS - k4+345,6 al k 4+370,43 carril izquierdo
5.Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS- k4+345,6 al k 4+370,43 carril izquierdo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. concreto clase D para huella.
2. Abrir frentes para la construcción de obras Hidráulicas box culvert y Alcantarillas
3. Continuar Con fundicion de losas para placa Huella.
4. Continuar con la fundicion del Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
5.Continuar con la fundicion de Vigas Riostras
6. Continuar con la Excavacion,Colocacion de acero y Fundida de las cunetas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

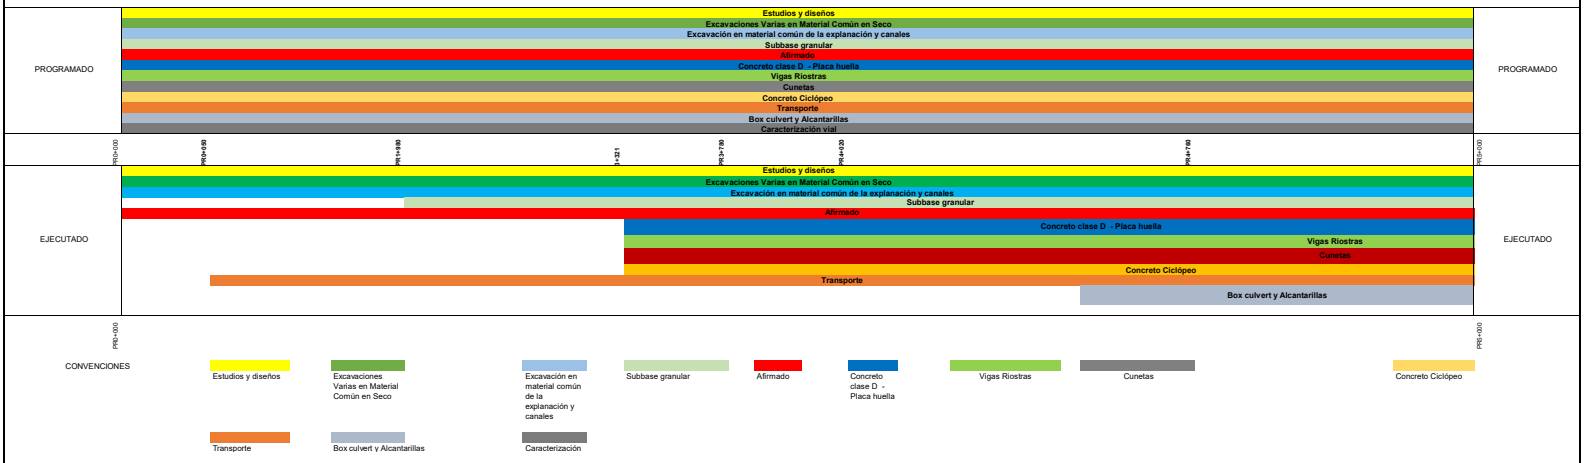

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



adecuación de terreno e instalación de rieles para modulos de cuneta y huella. K 4+345,6 a k 4+370,43.. Carril derecho



construcción de modulos de cuneta. K 4+345,6 a k 4+370,43.. Carril derecho



construcción de modulos de huella. K 4+345,6 a k 4+370,43.. Carril derecho



construcción de bordillos



construcción de bordillos



construcción de bordillos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

1. Hacer seguimiento a los compromisos.
2. Revisar información entregada por el contratista
3. Gestionar la bitácora de obra
4. Realizar seguimiento y control a las actividades de construcción
5. Realizar reunión con el comité de Veedurías

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: FREDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO

Matrícula Profesional No.: 25202-154872 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: mayo-2024 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MINICARGADOR	Caterpila Cp-433C / 2022		San Bernardo del Viento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	R	R	A	A	A
MOTONIVELADORA			San Bernardo del Viento																															
RETROCARGADOR			San Bernardo del Viento	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
VIBROCOMPACTADOR	Caterpillar-CS431B		San Bernardo del Viento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA			San Bernardo del Viento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
MEZCLADORA			San Bernardo del Viento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO			San Bernardo del Viento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A
CARMIX			San Bernardo del Viento																															
CARRO HUMECTACIÓN			San Bernardo del Viento																															
VOLQUETA IMX-224			San Bernardo del Viento																															
VOLQUETA SZA-124			San Bernardo del Viento																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	3	3	4	4	4
			TOTAL EN REPARACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
			TOTAL INACTIVO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5	1	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	34%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	18%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	3	48%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Hasta el día 13 de mayo, se presentó inactividad en obra.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se soicita al contrartista disponer en obra el equipo ofrecido para el contrato.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACION= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma
Nombre: KAREN BOBADILLA PINTO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202145689COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo-2024

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VÍA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Porvenir, Protección, Colpensiones

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS ANTONIO MEJA TURIZO	84.094.056	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9463040451	$ 80.000	COLPENSIONES	9463040451	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
2	ANDRÉS FABIÁN VILLALBA BARRIOS	10.772.157	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 2.400.000	$ 167.100	V	SALUD TOTAL	9463040451	$ 96.000	COLPENSIONES	9463040451	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
3	GONZALEZ FUENTES DAYANA MARCELA	1.003.459.220	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	SALUD TOTAL	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200	$ -	$ -	
4	CONDE LICONA MANUEL FRANCISCO	10.941.929	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	SANITAS	9463040451	$ 23.200	PROTECCIÓN	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
5	JIMENEZ VELASQUEZ NEIDER EMIGDIO	1.070.815.492	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PROTECCIÓN	9463040451	$ 92.800	$ 23.200	$ -	$ -	
6	AVILA CORREA LUIS CARLOS	1.068.736.529	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
7	AVILA GUERRA NEIVER ANTONIO	11.166.136	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
8	MADERA MUÑOZ ROGER LUIS	1.070.816.699	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	ALIANSALUD(ANTES COLMEDICA)	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
9	MONTES AVILA FRANCISCO	1.070.820.537	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
10	DE LA HOZ BILLAR ALCIDEZ RAFAEL	1.123.405.092	OPERADOR DE MAQUINARIA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	CAJACOPI	9463040451	$ 23.200	PROTECCIÓN	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
11	MUÑOZ SUAREZ ERNESTO JOSE	1.070.809.450	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200	$ -	$ -	
12	FAJARDO MARTINEZ JULIO CESAR	10.944.731	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
13	MUÑOZ TORRES JOSE DANIEL	1.070.822.893	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
14	LEMUS ANGULO JESUS DAVID	1.043.635.137	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	NUEVA EPS	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
15	MARTINEZ MARTINEZ AMAURY DE JESUS	73.091.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	CAJACOPI	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
16	MEDINA PERALTA JORGE ELIECER	17.953.908	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200	$ -	$ -	
17	MENDOZA BALLESTA PABLO	1.070.817.648	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9463040451	$ 23.200	PROTECCIÓN	9463040451	$ 92.800	$ 23.200	$ -	$ -	
18	OSORIO PETRO LENER	1.192.736.423	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	SALUD TOTAL	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200	$ -	$ -	
19	PACHECO MORELO MANUEL VICENTE	1.070.812.240	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	$ 1.160.000	$ 40.400	V	SALUD TOTAL	9463040451	$ 23.200	PORVENIR	9463040451	$ 92.800	$ 23.200			
20	TRICIA REGINA RUDA MOLINA	50.894.549	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	TRICIA REGINA RUDA MOLINA	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9462760801	$ -	PORVENIR	9457784183		$ -	$ -	$ -	
21	YURLEY PAJARO ORTIZ	1.070.816.923	INDEPENDIENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X	YURLEY PAJARO ORTIZ	$ 1.160.000	$ 40.400	V	MUTUALSER	9462760801	$ 72.500	PROTECCION	9457784183	$ 92.800				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Se relacionan los soportes de pago del mes de Diciembre, cancelados en el mes de febrero del 2024. El contratista no ha entregado la seguridad social de los meses de enero, febrero, marzo y abril.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	462226456	9462760801	Y	2024/01/16	2024/02/19	BANCOLOMBIA	34	$253,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1070816923	PAJARO ORTIZ YURLEY	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
2	CC	50894549	RUEDA MOLINA TRICIA REGINA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
Total		**Afiliados(2)**																																				

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PROTECCION	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	12,5%	$ 72.500	$
							$ 1.160.000	No			0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	$
																					$ 92.800						$ 72.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 72.500			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 0			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 72.500						$ 0						$ 80.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	462226456	9462760801	Y	2024/01/16	2024/02/19	BANCOLOMBIA	34	$253,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,800	$2,900	$0	$95,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$92,800	$2,900	$0	$95,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,800	$2,500	$0	$83,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$80,800	$2,500	$0	$83,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$72,500	$2,300	$0	$74,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,500	$2,300	$0	$74,800
TOTAL				2	$246,100	$7,700	$0	$253,800

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	462202676	9463040451	E	2024/01/16	2024/02/19	BANCOLOMBIA	34	$4,551,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1068736529	AVILA CORREA LUIS CARLOS	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
2	CC	11166136	AVILA GUERRA NEIVER ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
3	CC	10941929	CONDE LICONA MANUEL FRANCISCO	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
4	CC	1123405092	DE LA HOZ VILLAR ALCIDES RAFAEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
5	CC	10944731	FAJARDO MARTINEZ JULIO CESAR	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
6	CC	1003459220	GONZALEZ FUENTES DAYANA MARCELA	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
7	CC	1070815492	JIMENEZ VELASQUEZ NEIDER EMIGDIO	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
8	CC	1043635137	LEMUS ANGULO JESUS DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
9	CC	1070816699	MADERA MUÑOZ ROGER LUIS	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
10	CC	73091534	MARTINEZ MARTINEZ AMAURY DE JESUS	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
11	CC	17953908	MEDINA PERALTA JORGE ELIECER	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
12	CC	84094056	MEJIA TURIZO LUIS ANTONIO	Dependiente	0	No	No																											
13	CC	1070817648	MENDOZA BALLESTA PABLO	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
14	CC	1070820537	MONTES AVILA FRANCISCO	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
15	CC	1070809450	MUÑOZ SUAREZ ERNESTO JOSE	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
16	CC	1070822893	MUÑOZ TORRES JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
17	CC	1192736423	OSORIO PETRO LEINER	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
18	CC	1070812240	PACHECO MORELO MANUEL VICENTE	Dependiente	0	No	No		X	2023/12/01	X	2023/12/15																						
19	CC	10772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	Dependiente	0	No	No																											

Total **Afiliados(19)**

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		NUEVA EPS MOVILIDAD	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		SANITAS	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		CAJACOPI	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		COOSALUD MOVILIDAD	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		SANITAS	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		NUEVA EPS MOVILIDAD	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		MUTUAL SER	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		SALUD TOTAL	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	15	$ 580.000	16%	SIN RIESGO	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800		SALUD TOTAL	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	$
							$ 2.400.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	16%	SIN RIESGO	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000		SALUD TOTAL	30	$ 2.400.000	4%	$ 96.000	$
																					$ 2.281.600						$ 570.400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 80.000		COMFACOR	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	ARL SURA	30	$ 2.000.000	6,96%	5	$ 139.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 23.200		COMFACOR	15	$ 580.000	4%	$ 23.200	ARL SURA	15	$ 580.000	6,96%	5	$ 40.400	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 96.000		COMFACOR	30	$ 2.400.000	4%	$ 96.000	ARL SURA	30	$ 2.400.000	6,96%	5	$ 167.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 570.400						$ 570.400						$ 993.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901611859	1	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 11 # 10 - 31	PUEBLO NUEVO-CORDOBA	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	462202676	9463040451	E	2024/01/16	2024/02/19	BANCOLOMBIA	34	$4,551,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$2,281,600	$70,100	$0	$2,351,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$796,800	$24,500	$0	$821,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,020,800	$31,300	$0	$1,052,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$464,000	$14,300	$0	$478,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$993,100	$30,500	$0	$1,023,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$993,100	$30,500	$0	$1,023,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$570,400	$17,500	$0	$587,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	19	$570,400	$17,500	$0	$587,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$570,400	$17,900	$0	$588,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$23,200	$800	$0	$24,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$23,200	$800	$0	$24,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$23,200	$800	$0	$24,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	$208,800	$6,400	$0	$215,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$46,400	$1,500	$0	$47,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$142,400	$4,400	$0	$146,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$103,200	$3,200	$0	$106,400
TOTAL				19	$4,415,500	$136,000	$0	$4,551,500

4.4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES INFORME MENSUAL: mayo-2024

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	210343	Vias Terciarias Mejoradas	220117	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 1.350.000.000,00	$ -
2023	210344	Vias Terciarias Mejoradas	220119	1.3.1.1.07 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-MSBV-006-2022	$ 6.771.889.999,00	$ 6.771.889.999
				TOTAL		$ 8.121.889.999,00	$ 6.771.889.999

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 8.121.889.999,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
0	ANTICIPO		$ 1.350.000.000,00	$ -	$ 1.350.000.000,00	$ -		$ 1.350.000.000	Registro No. 210343, 13/07/2022	$ 1.350.000.000,00		NA			ANTICIPO
0	ANTICIPO		$ 1.086.567.000,00	$ -	$ 2.436.567.000,00	$ -		$ 2.436.567.000	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 5.685.322.999,00		NA			ANTICIPO
1	PARCIAL	may-23	$ 2.436.745.672,00	$ -	$ 2.436.745.672,00	$ 731.023.701,60	$ 1.705.721.970	$ 1.705.543.298	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.979.601.028,60	$ 5.685.144.327,00	NA			ACTA PARCIAL No.1
2	PARCIAL	ago-23	$ 335.501.868,00	$ -	$ 335.501.868,00	$ 100.650.560,40	$ 234.851.308	$ 1.604.892.738	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.744.749.721,00	$ 5.349.642.459,00	NA			ACTA PARCIAL No.2
3	PARCIAL	oct-23	$ 181.884.576,00		$ 181.884.576,00	$ 54.565.372,80	$ 127.319.203	$ 1.550.327.365	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.617.430.517,80	$ 5.167.757.883,00	NA			ACTA PARCIAL No.3
4	PARCIAL	feb-24	$ 408.185.744,00		$ 408.185.744,00	$ 122.455.723,20	$ 285.730.021	$ 1.427.871.642	Registro No. 210344, 13/07/2022	$ 3.331.700.497,00	$ 4.759.572.139,00	NA			ACTA PARCIAL No.4
TOTALES			**$ 3.362.317.860**	**$ -**	**$ 3.362.317.860**	**$ 1.008.695.358,00**	**$ 2.353.622.502,00**	**$ 1.427.871.642**	**$ -**	**$ 3.331.700.497,00**	**$ 4.759.572.139,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 3.305.938.039,99		**$ 3.305.938.039,99**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (PAGA) Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O AJUSTES		$ -	**$ -**
REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 9.001.820,00	**$ 56.379.820,00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 3.353.316.039,99	$ 9.001.820,00	**$ 3.362.317.860,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: **ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo-2024 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	19	24	24	24	24	20	24	24	24	24	729
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.
Se anexa Registro pluviométrico del IDEAM-MAYO 2023-ESTACION SAN BERNARDO

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma Karen Bobadilla P.
Nombre: KAREN BOBADILLA PINTO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202145689COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CodigoEstacion	NombreEstacion	Latitud	Longitud	Altitud	Entidad	Departamento	Municipio	FechaInstalacion	IdParametro	Etiqueta	Frecuencia	Fecha	Valor	Grado	NivelAprobacion
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	1/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	2/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	3/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	4/05/2024 0:00	17.4	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	5/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	6/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	7/05/2024 0:00	1.7	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	8/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	9/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	10/05/2024 0:00	26	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	11/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	12/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	13/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	14/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	15/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	16/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	17/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	18/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	19/05/2024 0:00	5.5	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	20/05/2024 0:00	35.5	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	21/05/2024 0:00	1.6	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	22/05/2024 0:00	48	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	23/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	24/05/2024 0:00	1.7	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	25/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	26/05/2024 0:00	49.5	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	27/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	28/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	29/05/2024 0:00	0	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	30/05/2024 0:00	4.4	50	900
13/08/5010	CTRINA LA [13085(	92.972.222.220	-7.589.277.778	20	IA METEOROLOGIA Y	Cordoba	Lorica	15/01/1968 0:00	PRECIPITACION	PTPM_CON	Diaria	31/05/2024 0:00	0	50	900

4.6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
			VERSIÓN	1
			PAGINA	

FECHA 5/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo-2024 **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha toma del Ensayo (Día/Mes/Año)	Fecha roturadel Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo(PSI)	porcentaje de aceptación	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA											
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
1	20/03/2024	17/04/2024	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CUNETA - CARRIL DERECHA.- K3+430- 3+390	1	>=3100 PSI	5521	100%	SI	
2	21/03/2024	18/04/2024	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CUNETA - CARRIL DERECHA.- K3+490- 3+321	1	>=3100 PSI	3858	100%	SI	
3	21/03/2024	18/04/2024	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	CUNETA - CARRIL DERECHA.- K3+490- 3+321	1	>=3100 PSI	3193	100%	SI	
4	22/03/2024	19/04/2024	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	HUELLA - CARRIL DERECHA.- K3+308 - 3+256	1	>=3100 PSI	3398	100%	SI	
5	23/03/2024	20/04/2024	RESISTENCIA A LA COMRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV-E- 410 - 13	HUELLA - CARRIL DERECHA.- K3+286 - 3+247	1	>=3100 PSI	3498	100%	SI	

NOTAS: Se esta a la espera de que el contratista presente los resultados de los ensayos

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organización for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: ANDRÉS FABIAN VILLALBA BARRIOS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-109996COR

Firma
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

FECHA DE INICIO: 23/08/2022

PLAZO INICIAL: 8 MESES
PLAZO ADICIONAL: 13 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 8.121.889.999,00

VALOR ACUMULADO: $ 8.121.889.999,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 56.379.820,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	23	8	2022	23	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	23	8	2022	23	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	23	8	2022	23	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	4	2023	23	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	4	2023	23	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100217190

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 500.000.000,00	23	8	2022	23	4	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100049452 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	28	7	2023	28	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	28	7	2023	28	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 1.624.377.999,80	28	7	2023	29	11	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	23	11	2023	23	11	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	23	11	2023	23	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 6

Certificado de modificación o anexo No.: NB-100217190
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 580.000.000,00	23	8	2022	23	11	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 7 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. NB-100049452
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

SUSPENSIÓN No 1.: 21/12/2023
ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **REINICIO No 1.:** 09/01/2024

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 812.188.999,90	9	1	2024	26	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.436.566.999,70	9	1	2024	26	5	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.624.377.999,80	9	1	2024	26	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 16.913.946,00	26	1	2024	26	1	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 2.436.566.999,70	26	1	2024	26	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 6

Certificado de modificación o anexo No.: NB-100217190
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** .....

SUSPENSIÓN No 1.: 21/12/2023
REINICIO No 1.: 09/01/2024

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	500 SMMLV	$ 580.000.000,00	23	8	2022	26	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 7 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. NB-100049452
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.21 10:08:27 -05:00

Código de Seguridad: XpSKF12H6lKizqAoVleVvw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	71853588	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	26/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	**TELÉFONO**	3114061089
ASEGURADO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	**TELÉFONO**	7758011
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.804-9
DIRECCIÓN	CALLE 8 NO. 8-02	**TELÉFONO**	7758011

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LA VIGENCIAS SEGUN CONTRATO ADICIONAL N°2 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE ENERO DE 2024.3

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.. LP-MSBV-006-2022. , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

ACLARAMOS BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/01/2024	24:00 Horas Del 26/10/2024	812.188.999,90	680.903,65
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/01/2024	24:00 Horas Del 26/10/2024	2.436.566.999,70	2.042.710,96
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/01/2024	24:00 Horas Del 26/06/2027	1.624.377.999,80	1.344.005,91
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 26/06/2024	24:00 Horas Del 26/06/2029	16.913.946,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 26/06/2024	24:00 Horas Del 26/06/2029	2.436.566.999,70	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 7.326.614.945,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	4.067.620,52
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.067.620,52
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	772.847,90
TOTAL A PAGAR	$	4.840.468,42

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100217190	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	71853588	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	26/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE COMPLIMIENTO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ES POR CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ACLARAMOS QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS 812004943 PARTICIPACION 90%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100217190** y endoso, **10** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2 / MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO E INVIAS 800215807-2** , expedida por la Compañía en **21/01/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **21** días del mes **ENERO** del año **2024.**



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.21 10:12:05 -05:00

Código de Seguridad: YxCMS69iLVeLsDn7RFlxAQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	12	No. CERTIFICADO	71853589	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	26/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	**TELÉFONO**	3114061089
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.611.859-1
DIRECCIÓN	CR 11 10 31	**TELÉFONO**	3114061089
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y ACTA DE REINICIO DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO NO. LP-MSBV-006- 2022. MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO.

VIGENCIA DEL CONTRATO:
DESDE 09\01\2024 HASTA 26\06\2024

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	541.369,86
PATRONAL	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	325.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 650.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	541.369,86
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	541.369,86
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	102.860,27
TOTAL A PAGAR	$	644.230,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/01/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100049452	No. ANEXO	12	No. CERTIFICADO	71853589	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/01/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	23/08/2022	24:00 Horas Del	26/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ACLARAMOS TOMADOR CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO NIT 901611859-1
- CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIA SAS 900506559 PARTICIPACION 10%
- CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA SAS 812004943 PARTICIPACION 90%

ACLARAMOS BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS Y BENEFICIARIO/ASEGURADO A MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT 800096804-9 Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CON NIT. NO. 800.215.807-2

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

4.8. MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: Consorcio Vial San Bernardo

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 10/09/2022

OBSERVACIONES: No presenta información suficiente para la ejecución del proyecto, garantizando recursos y calidad. Este plan es en sí una intención de cumplir los requisitos de la ISO9001 e ISO10005 pero no establece como lo realizará. No presentan información básica a la que se debe hacer seguimiento como plan de inspeción y ensayo, planeación metrológica, plan ante productos no conformes, defectuosos o control de quejas entre otros.
Se solicita presentar un plan de calidad con mayor detalle de como el contratista cumplira los requisitos de la entidad controtante, normativas y sus necesidades internas de Sistema de Gestión de Calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:
No se presento programa de auditoria.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO **X** APROBADO: NO **X** FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 12 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 3

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO **X**

OBSERVACIONES:
No se presenta Plan de inspección y ensayo al cual se le hace seguimientos mensuales de acuerdo con los requisitos del INVIAS.
Presentan indicadores de gestión pero no tiene en cuenta los principales a controlar por el cliente que son los avances fisicos y facturación.
Se solicita que se complementen los planes de inspección y ensayo, sin embargo se hace seguminiento al cumplimiento de las especificaciones del INVIAS.
Se envio el oficio CVRIMG-1823-2023 con una solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de la placa huella, que hayan cumplido los 7 y 28 días.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 8 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 8

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 54 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 41

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 13

OBSERVACIONES:
Ver anexo de No Conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 3

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 1 **No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 2

OBSERVACIONES:
Para el mes de febrero no se recibieron PQR, que son basicamente situaciones con los propietarios y las comunidades que intervienen en la ejecucion de la obra.
Ver anexo de quejas

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**62%**	**Cumplimiento en ejecución de inversión:** $Ejecutado / $Programado * 100
IG2: Índice de gestión 2 =	**NA**	**Satisfacción del cliente:** No. De encuestas sobresalientes y adecuadas / No. Encuestas efectuadas *100
IG3: Índice de gestión 3 =	**62%**	**Cumplimiento en el avance de obra física:** Cantidad de obra ejecutada / Total de obra programada * 100
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

En el mes de febrero se tuvo un aproximado una ejecución del 42.76% con un atraso considerable respecto a lo programado. Ver anexo de Indicadores.
El contratista no ha aplicado encuestas de satisfacción durante el desarrollo del contrato.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCON	284994	19/12/2022	3685	18/06/2023	
2	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS170461	30/09/2022	1901	30/09/2023	

OBSERVACIONES:

En el mes de febrero no se presentaron los certificados de calibración de los equipos de topografía y laboratorio, dejando aclaracion de que estos ya estan vencidos como se habia notificado los meses pasados.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: DIANA MARIA MONTANO ORTIZ
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 7620282844VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: Consorcio Vial San Bernardo

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 10/09/2022

OBSERVACIONES: No presenta información suficiente para la ejecución del proyecto, garantizando recursos y calidad. Este plan es en sí una intención de cumplir los requisitos de la ISO9001 e ISO10005 pero no establece como lo realizará. No presentan información básica a la que se debe hacer seguimiento como plan de inspeción y ensayo, planeación metrológica, plan ante productos no conformes, defectuosos o control de quejas entre otros.
Se solicita presentar un plan de calidad con mayor detalle de como el contratista cumplira los requisitos de la entidad controtante, normativas y sus necesidades internas de Sistema de Gestión de Calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:
No se presento programa de auditoria.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO **X** APROBADO: NO **X** FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 10 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO **X**

OBSERVACIONES:
No se presenta Plan de inspección y ensayo al cual se le hace seguimientos mensuales de acuerdo con los requisitos del INVIAS.
Presentan indicadores de gestión pero no tiene en cuenta los principales a controlar por el cliente que son los avances fisicos y facturación.
Se solicita que se complementen los planes de inspección y ensayo, sin embargo se hace seguminiento al cumplimiento de las especificaciones del INVIAS.
Se envio el oficio CVRIMG-1823-2023 con una solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de la placa huella, que hayan cumplido los 7 y 28 días.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 54 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 41

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 13

OBSERVACIONES:
Ver anexo de No Conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 3

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 1 **No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 2

OBSERVACIONES:
Para el mes de marzo no se recibieron PQR, que son basicamente situaciones con los propietarios y las comunidades que intervienen en la ejecucion de la obra.
Ver anexo de quejas

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**54%**	**Cumplimiento en ejecución de inversión:** $Ejecutado / $Programado * 100
IG2: Índice de gestión 2 =	**NA**	**Satisfacción del cliente:** No. De encuestas sobresalientes y adecuadas / No. Encuestas efectuadas *100
IG3: Índice de gestión 3 =	**54%**	**Cumplimiento en el avance de obra física:** Cantidad de obra ejecutada / Total de obra programada * 100

IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

En el mes de marzo se tuvo un aproximado una ejecución del 42.92% con un atraso considerable respecto a lo programado. Ver anexo de Indicadores.
El contratista no ha aplicado encuestas de satisfacción durante el desarrollo del contrato.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCON	284994	19/12/2022	3685	18/06/2023	
2	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS170461	30/09/2022	1901	30/09/2023	

OBSERVACIONES:

En el mes de marzo no se presentaron los certificados de calibración de los equipos de topografía y laboratorio, dejando aclaracion de que estos ya estan vencidos como se habia notificado los meses pasados.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: DIANA MARIA MONTANO ORTIZ
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 7620282844VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: Consorcio Vial San Bernardo

FECHA DE INICIO: 23/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 8 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 10/09/2022

OBSERVACIONES: No presenta información suficiente para la ejecución del proyecto, garantizando recursos y calidad. Este plan es en sí una intención de cumplir los requisitos de la ISO9001 e ISO10005 pero no establece como lo realizará. No presentan información básica a la que se debe hacer seguimiento como plan de inspeción y ensayo, planeación metrológica, plan ante productos no conformes, defectuosos o control de quejas entre otros.
Se solicita presentar un plan de calidad con mayor detalle de como el contratista cumplira los requisitos de la entidad controtante, normativas y sus necesidades internas de Sistema de Gestión de Calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:
No se presento programa de auditoria.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO **X** APROBADO: NO **X** FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 10 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO **X**

OBSERVACIONES:
No se presenta Plan de inspección y ensayo al cual se le hace seguimientos mensuales de acuerdo con los requisitos del INVIAS.
Presentan indicadores de gestión pero no tiene en cuenta los principales a controlar por el cliente que son los avances fisicos y facturación.
Se solicita que se complementen los planes de inspección y ensayo, sin embargo se hace seguminiento al cumplimiento de las especificaciones del INVIAS.
Se envio el oficio CVRIMG-1823-2023 con una solicitud de presentar los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto instalado en la construcción de la placa huella, que hayan cumplido los 7 y 28 días.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 3 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 57 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 44

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 13

OBSERVACIONES:
Ver anexo de No Conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 3

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 1 **No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 2

OBSERVACIONES:
Para el mes de abril no se recibieron PQR, que son basicamente situaciones con los propietarios y las comunidades que intervienen en la ejecucion de la obra.
Ver anexo de quejas

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	**48%**	**Cumplimiento en ejecución de inversión:** $Ejecutado / $Programado * 100
IG2: Índice de gestión 2 =	**NA**	**Satisfacción del cliente:** No. De encuestas sobresalientes y adecuadas / No. Encuestas efectuadas *100
IG3: Índice de gestión 3 =	**48%**	**Cumplimiento en el avance de obra física:** Cantidad de obra ejecutada / Total de obra programada * 100

IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

En el mes de abril se tuvo un aproximado una ejecución del 43.02% con un atraso considerable respecto a lo programado. Ver anexo de Indicadores.
El contratista no ha aplicado encuestas de satisfacción durante el desarrollo del contrato.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	ESTACION TOTAL	TOPCON	284994	19/12/2022	3685	18/06/2023	
2	BALANZA DIGITAL	TRUMAX	YS170461	30/09/2022	1901	30/09/2023	

OBSERVACIONES:

En el mes de abril no se presentaron los certificados de calibración de los equipos de topografía y laboratorio, dejando aclaracion de que estos ya estan vencidos como se habia notificado los meses pasados.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: : 25202154872 CND

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Firma
Nombre: DIANA MARIA MONTANO ORTIZ
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 7620282844VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ID	MES	Especificación	Descripción	unidad	Cantidad ejecutada	Material/ Insumo	Ensayos	Frecuencia	Cant. Esperada	Cant. Presentada	Observación
	Total Inicio								0	0	
	Total feb-23								67	1	
	Total mar-23								76	7	
	Total abr-23								67	14	
	Total may-23								74	3	
	Total jun-23								103	16	
	Total jul-23								106	27	
	Total ago-23								67	8	
	Total sep-23								16	5	
	Total oct-23								10	2	
	Total nov-23								10	2	
	Total dic-23								24	2	
	Total ene-24								28	4	
	Total feb-24								12	3	
	Total mar-24								10	0	
621	abr-24	630	Concreto clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI)- PLACA HUELLA- VIGAS RIOSTRAS- CUNETAS	m3	6,57						
622	abr-24	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
623	abr-24	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
624	abr-24	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
625	abr-24	630	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c= 21 Mpa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	1,70						
626	abr-24	630				Concreto	Dosificación y caracterización de materiales	Diseño de mezcla	1	0	
627	abr-24	630				Agregado ciclópeo	Tamaño Máx	Diseño de mezcla	1	0	
628	abr-24	630				Agregado ciclópeo	Rel L/A	Diseño de mezcla	1	0	
629	abr-24	630				Agregado ciclópeo	Desgaste	Diseño de mezcla	1	0	
630	abr-24	630				Concreto	Resistencia a la compresión	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
631	abr-24	630				Concreto	Asentamiento (slump)	Cada 50 m3 o fracción	1	0	
632	abr-24	640	Acero de refuerzo de Fy=4.200 Kg/cm2 (60000 PSI)	kg	320,33	Acero	Protocolo de calidad del proveedor	Por lote de producción	1	0	
	Total abr-24								10	0	
	Total general								680	94	

QUEJAS Y RECLAMOS

MES	CONTRATISTA	QUEJA/ RECLAMO	OBSERVACIÓN	CERRADA EN EL MES?	MES CIERRE
may-23	Consorcio Vial San Bernardo	Manifiestan de manera verbal que sus viviendas presentan fisuras por causas de la intervención de la obra.	Pendiente - el dia 11-07-2023 se hace visita domiciliaria a la vivienda del señor manuel perez lopez y la señora Maria Julio Bolaños , con el fin de verificar el estado de los predios. PENDIENTE por dar dar respuesta y cerrar la solicitud. Interventoría emite oficio CVRIMG-1375-2023 del 05-09-2023. Oficio CVRIMG-1687-2023 día 03-11-2023. Se reitera comunidado CVRIMG-1687-2023 mediante el cual se solicita atender la PQR oficio CVRIMG-102-2024	NO	
abr-24	Consorcio Vial San Bernardo	No se presentaron.			

ANEXO DE NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDADES

MES	CONTRATISTA	OFICIO/ NOTA BITÁCORA	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO	CERRADO EN EL MES?	CERRADO?	MES CIERRE
mar-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-485-2024	Reiteración solicitud de informes de seguimiento social.				
jul-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-1084-2023	Reiteración del comunicado CVRIMG-678-2023, cuyo asunto es solicitud de ensayos de extracción de núcleos.	No ha presentado			
oct-23	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-1678-2023	Reiteración solicitud plan de contingencia.	no ha presentado			
ene-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-006-2024	Reiteración comunicado CVRIMG-1957-2023 solicitud de informe de gestión ambiental – octubre 2023	Informe recibido			
ene-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-102-2024	Reiteración comunicado CVRIMG-1687-2023- seguimiento de gestión social atención a las pqr.				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-196-2024	Reiteracion a solicitud plan de contingencia por bajo rendimiento en la ejecución de la obra.				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-258-2024	Cuarta reiteracion del comunicado CVRIMG-071-2024 solicitud planilla pago de seguridad social del mes de octubre				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-259-2024	Segunda reiteracion del comunicado CVRIMG-073-2024 solicitud pago de seguridad social personal operativo y administrativo mes de noviembre				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-261-2024	Primera reiteracion del comunicado CVRIMG-116-2024 solicitud pago de seguridad social personal operativo y administrativo mes de diciembre.				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-306-2024	Reiteración oficio CVRIMG-108-2014 del 19 de enero de 2024 (solicitud modificación de pólizas.)				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-349-2024	Reiteración CVRIMG-147-2024 - solicitud de adecuado manejo y disposición final de residuos.				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-440-2024	Reiteración comunicado CVRIMG-043-2024 solicitud informe social mes de diciembre 2023.				
feb-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-441-2024	Reiteración comunicado CVRIMG-245-2024 solicitud informe social mes de enero 2024.				
abr-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-605-2024	Primera reiteracion comunicado CVRIMG-338-2024 solicitud planilla pago de seguridad social del mes enero.		SI		abr-24
abr-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-606-2024	Primera reiteracion comunicado CVRIMG-512-2024 solicitud planilla pago de seguridad social del mes febrero.		SI		abr-24
abr-24	Consorcio Vial San Bernardo	CVRIMG-725-2024	Primera reiteracion del comunicado CVRIMG-707-2024 señalizacion en obra fin de semana k3+230.		SI		abr-24

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

CONSORCIO

Vial San Bernardo

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

DPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento

PÁGINA	1

DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	7	9	2022

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LP-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL:X** **PLAN No.1** **MODIFICACIÓN:**

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANBERNARDO

REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

REP.LEGAL FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO

VR. CONTRATO:	8.121.889.999		PORCENTAJE DE ANTICIPO :	30,0%
VR. ANTICIPO:	1.350.000.000	1.350.000.000	% IMP. MUNICIPALES	0,0%
VR. IMPUESTOS:	0			
VR. ANTICIPO RECIBIDO:	0			

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Mano de Obra	100.000.000,00	7,41%	150.000.000,00	11,11%	49.200.000,00	3,64%	299.200.000,00	22,16%
2	Transporte de Materiales	340.800.000,00	25,24%	100.000.000,00	7,41%		0,00%	440.800.000,00	32,65%
3	Suministro de Materiales	300.000.000,00	22,22%	150.000.000,00	11,11%		0,00%	450.000.000,00	33,33%
4	Alquiler de equipos y herramientas	100.000.000,00	7,41%	60.000.000,00	4,44%		0,00%	160.000.000,00	11,85%
TOTAL		840.800.000,00	62,28%	460.000.000,00	34,07%	49.200.000,00	3,64%	1.350.000.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA TURIZO
Representante Legal
Consorcio Vial San Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor

FREDRY ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL RURAL IMG
Interventor

CONSORCIO
Vial San Bernardo
Nit: 901611859-1

MUNUICIPIO DE SAN BERNARDO
DPARTAMENTO DE CORDOBA
MODIFICACION 1 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

DE	1

DD	MM	AA
8	3	2023

DATOS GENERALES

CONTRATO No. LF-MSBV-006 **DE** 2022 **PLAN INICIAL** **MODIFICACION** X **PLAN No.**
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL- VIA CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
REP. LEGAL LUIS ANTONIO MEJIA
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG
REP. LEGAL FREDY RODRIGUEZ
VR. CONTRATO: 8.121.889.999
VR. ANTICIPO: 2.436.567.000
VR. ANTICIPO A RECIBIR 1.086.567.000
VR. ANTICIPO RECIBIDO: 1.350.000.000

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%
% IMP. MUNICIPALES: 0%

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta critica del programa de obra.

No.	DESCRIPCION	VR. MES 1	%	VR. MES 2	%	VR. MES 3	%	VR. MES 4	%	VALOR TOTAL	% TOTAL
1	Contratode Mano de Obra	$ 100.000.000	4,10%	150.000.000,00	6,16%	49.200.000,00	2,02%	98.797.000,00	4,05%	397.997.000,00	16,33%
2	Transporte de Materiales y equipos	$ 340.800.000	13,99%	100.000.000,00	4,10%			350.000.000,00	14,36%	790.800.000,00	32,46%
3	Suministro de Materiales	$ 300.000.000	12,31%	150.000.000,00	6,16%			400.000.000,00	16,42%	850.000.000,00	34,89%
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 100.000.000	4,10%	60.000.000,00	4,44%			237.770.000,00	9,76%	397.770.000,00	16,33%
TOTAL		840.800.000,00	34,51%	460.000.000,00	20,86%	49.200.000,00	2,02%	1.086.567.000,00	44,59%	2.436.567.000,00	100,00%

LUIS ANTONIO MEJIA
Representante Legal
Consorcio vial Sa Bernardo
Contratista

DAVID JOSE ROJAS MUÑOS
Secretario de Infraestructura Municipio de San Bernardo Del Viento
Supervisor De Obra

FREDY ALEXANDER RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio vial IMG
Interventor

Powered by CamScanner

MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	05/06/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 19 **MES:** may-2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | |

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 15593 **DE** 2022 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 687-000021-91 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30%

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 1.350.000.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	AVANZAR CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	Mano de obra
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	INTEGRA2 SAS	$ 340.800.000,00	2	Transporte de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	356	6-oct-22	JANINE MIQUEL ROQUEME RAFAEL	$ 300.000.000,00	3	Suministro de materiales
DOCUMENTO DE EGRESO	670	6-oct-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.	$ 100.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	TOPOGRAFIA TOTAL ALTAMIRANDA SAS	$ 199.200.000,00	1	Mano de obra
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	INTEGRA2 SAS	$ 100.000.000,00	2	Transporte de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	3	29-nov-22	JJ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS	$ 60.000.000,00	4	Alquiler de equipos y herramientas
NOTIFICACION DE PAGOS	4	5-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 147.648.570,00	3	Suministro de materiales
NOTIFICACION DE PAGOS	5	19-dic-22	INTEGRA2 SAS	$ 2.351.000,00	3	Suministro de materiales

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Mano de Obra	$ 397.997.000,00	$ 299.200.000,00	$ -	$ 299.200.000,00	$ 98.797.000,00
2	Transporte de Materiales	$ 790.800.000,00	$ 440.800.000,00	$ -	$ 440.800.000,00	$ 350.000.000,00
3	Suministro de Materiales	$ 850.000.000,00	$ 449.999.570,00		$ 449.999.570,00	$ 400.000.430,00
4	Alquiler de equipos y herramientas	$ 397.770.000,00	$ 160.000.000,00	$ -	$ 160.000.000,00	$ 237.770.000,00
	TOTALES	$ 2.436.567.000,00	$ 1.349.999.570,00	$ -	$ 1.349.999.570,00	**$ 1.086.567.430,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (DIC) : 5 (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 434.243,91 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
15593 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 228.978,69	oct-22	10/11/2022	$ 228.978,69
15593 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 197.569,56	nov-22	12/12/2022	$ 426.548,25
15594 - P.A. ANT CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO		$ 7.695,66	dic-22	28/12/2022	$ 434.243,91

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.


Firma:
Nombre: **LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO**
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matricula Profesional No.: 08202-264027ATL

Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA**


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Reinicio No.1	Fin	Predecesoras
1		**MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**	**174,13 días**	**mar 9/01/24**	**mar 11/06/24**	
2		INICIO	0 días	mar 9/01/24	mar 9/01/24	
3		**I. EXPLANACIONES**	**51,38 días**	**mar 9/01/24**	**vie 23/02/24**	
4		Excavaciones varias en material común en seco.	1 día	vie 23/02/24	vie 23/02/24	5
5		Excavación en material común de la explanación y canales	50,38 días	mar 9/01/24	jue 22/02/24	
6		**II. ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER DE 2.5X2.5 L=7M (CANTIDAD 1UND)**	**86 días**	**vie 9/02/24**	**jue 25/04/24**	
7		Excavaciones varias en materia común en seco a mano	6 días	dom 11/02/24	vie 16/02/24	8
8		Demolición de estructuras	2 días	vie 9/02/24	sáb 10/02/24	5FC-60%
9		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	4 días	vie 16/02/24	lun 19/02/24	7
10		Concreto clase C (280kg/cm2 ó 4000 PSI)	23 días	jue 14/03/24	mié 3/04/24	11FC-4 días
11		Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	30 días	lun 19/02/24	dom 17/03/24	9
12		Relleno para Estructuras con material excavacion	22 días	sáb 30/03/24	vie 19/04/24	10FC-4 días
13		Relleno para Estructuras con recebo	29 días	sáb 30/03/24	jue 25/04/24	12CC
14		**III. PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5.3M Y LONGITUD DE 5300M**	**174,13 días**	**mar 9/01/24**	**mar 11/06/24**	
15		Subbase Granular Clase C.	151 días	mar 9/01/24	mié 22/05/24	16FC-100%
16		Afirmado (Material para Mejoramiento)	97 días	mar 9/01/24	jue 4/04/24	5FC-100%

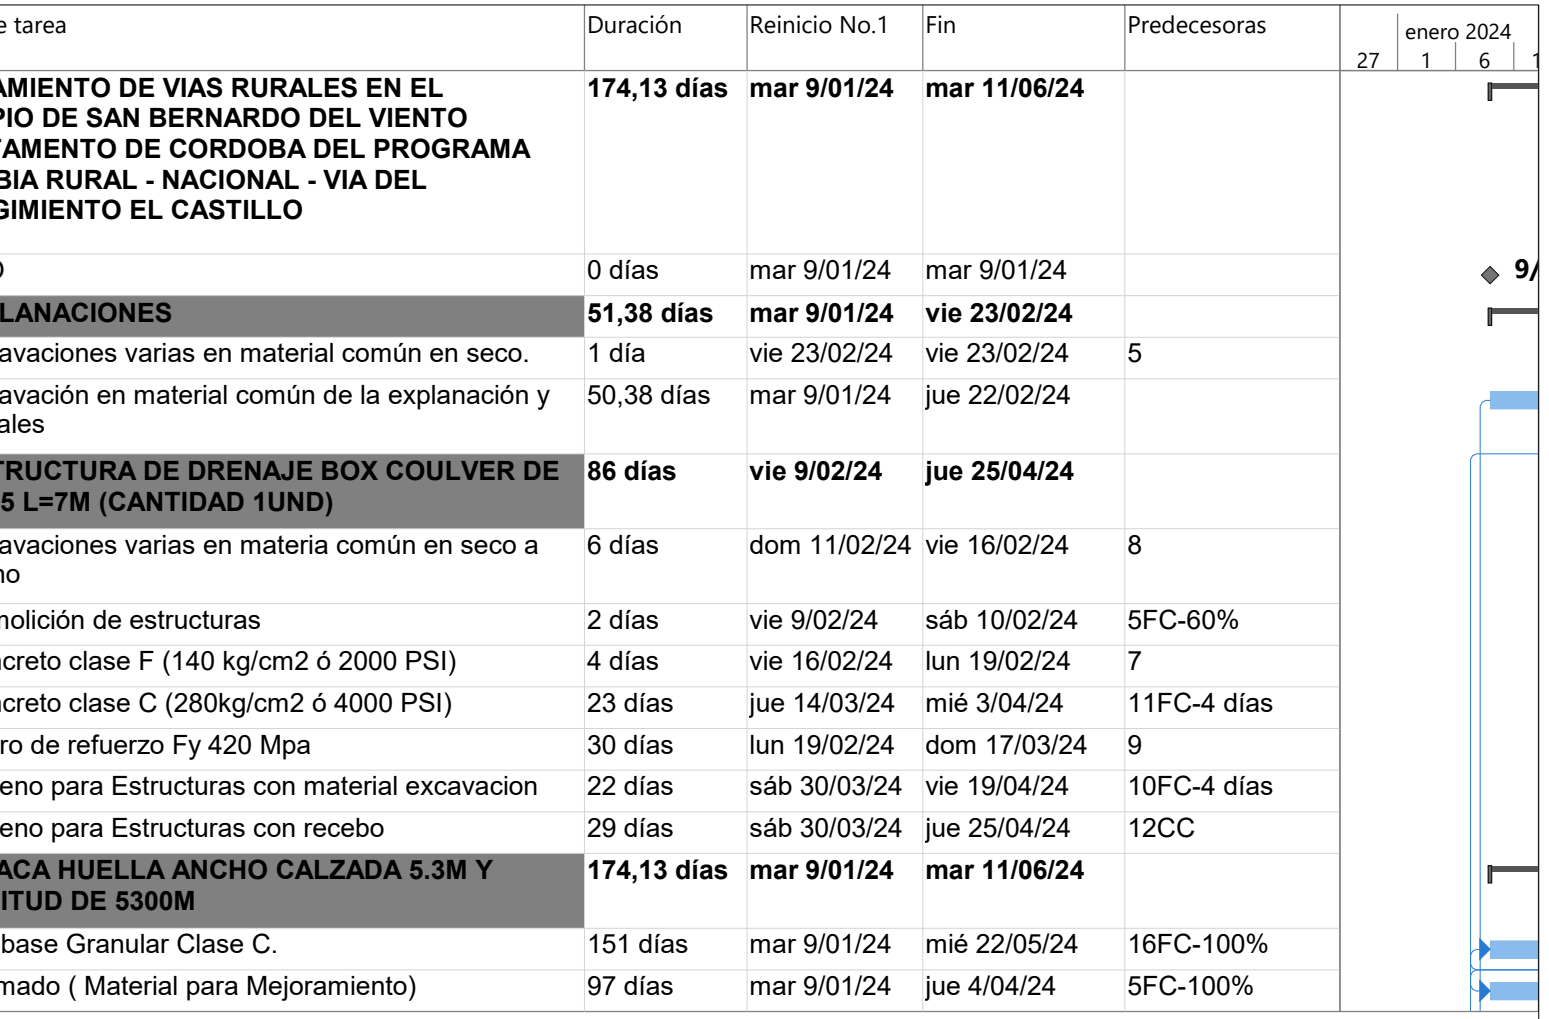

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: vie 19/01/24


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Reinicio No.1	Fin	Predecesoras
17		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	160 días	mar 9/01/24	jue 30/05/24	20CC-100%
18		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	103 días	mar 12/03/24	mar 11/06/24	20CC;19FC-80%
19		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	125 días	lun 19/02/24	dom 9/06/24	20CC;21FC-90%
20		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	116 días	mar 9/01/24	dom 21/04/24	15FC-100%
21		Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	160 días	mar 9/01/24	jue 30/05/24	17FC-100%
22		**IV. TRANSPORTE**	**41 días**	**vie 19/01/24**	**sáb 24/02/24**	
23		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	41 días	vie 19/01/24	sáb 24/02/24	5CC-100%
24		**V. CARACTERIZACIÓN VIAL**	**0,38 días**	**mar 11/06/24**	**mar 11/06/24**	
25		Caracaterización del corredor	1 día	mar 11/06/24	mar 11/06/24	18FF
26		FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 11/06/24	mar 11/06/24	25;13




Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: vie 19/01/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

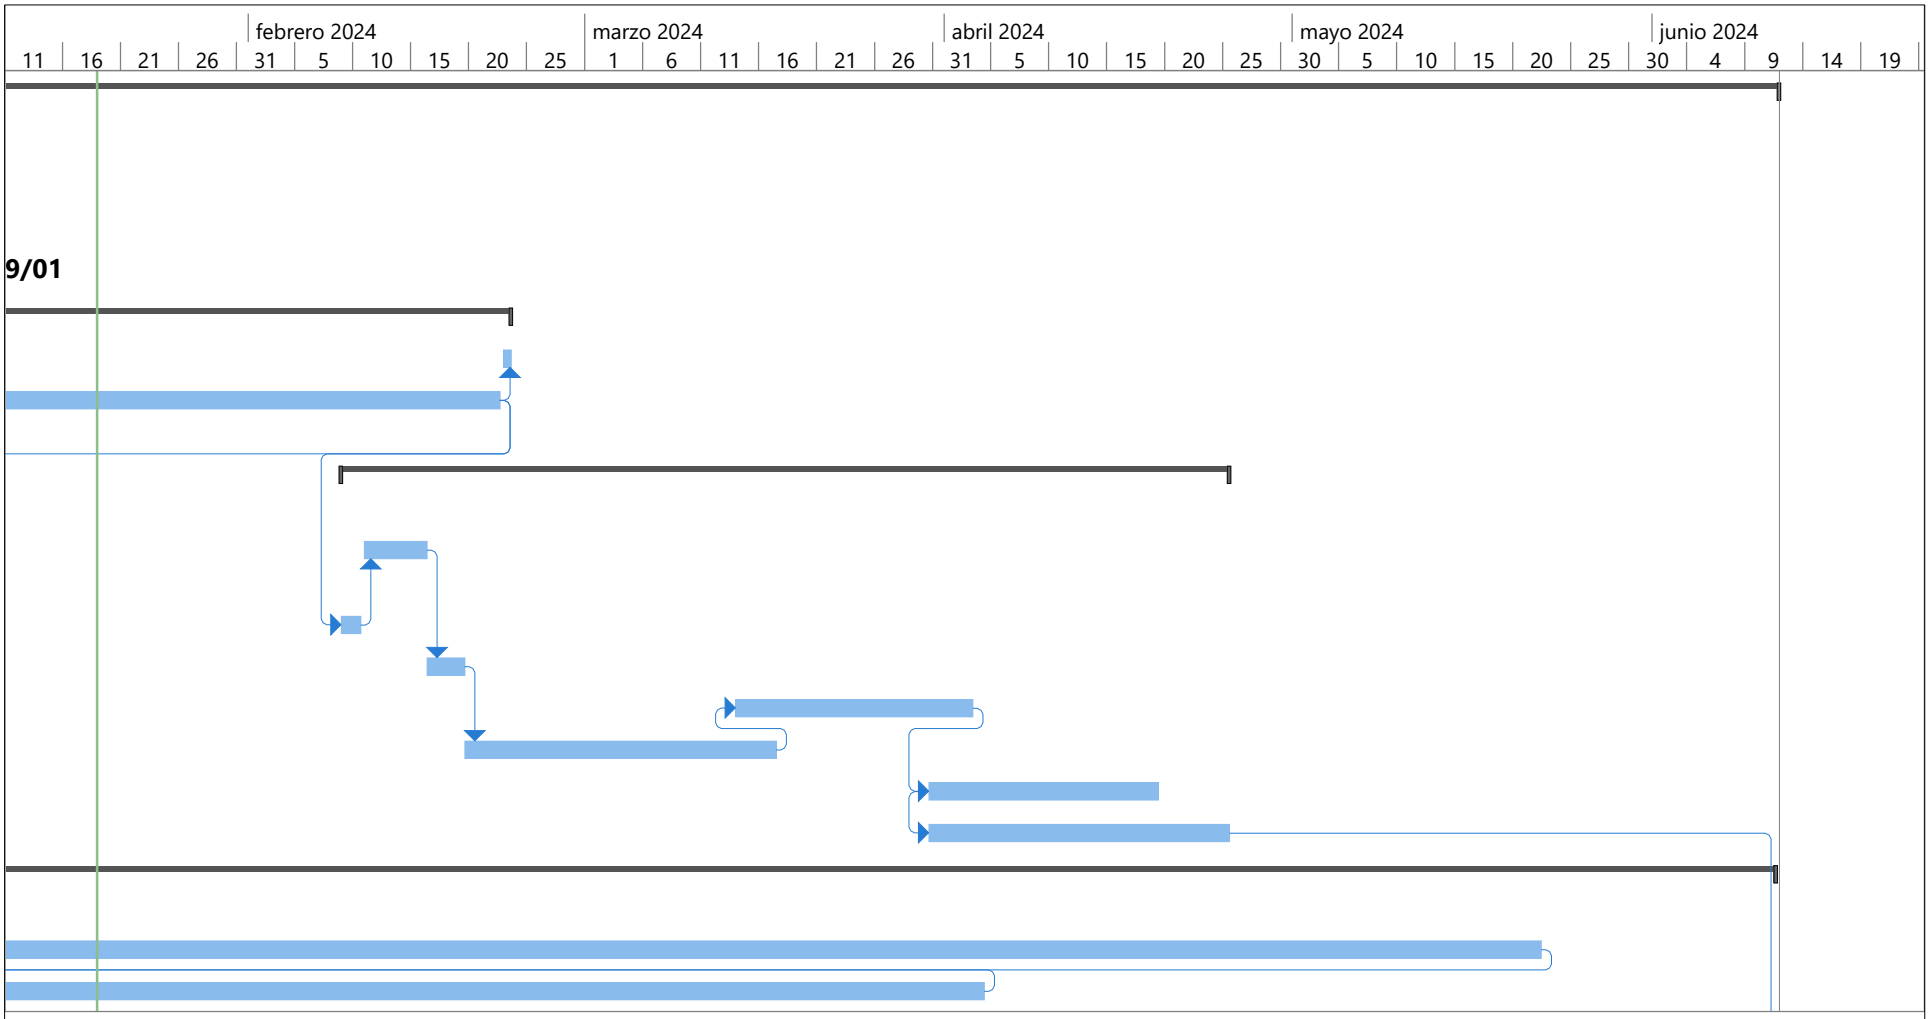

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: vie 19/01/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

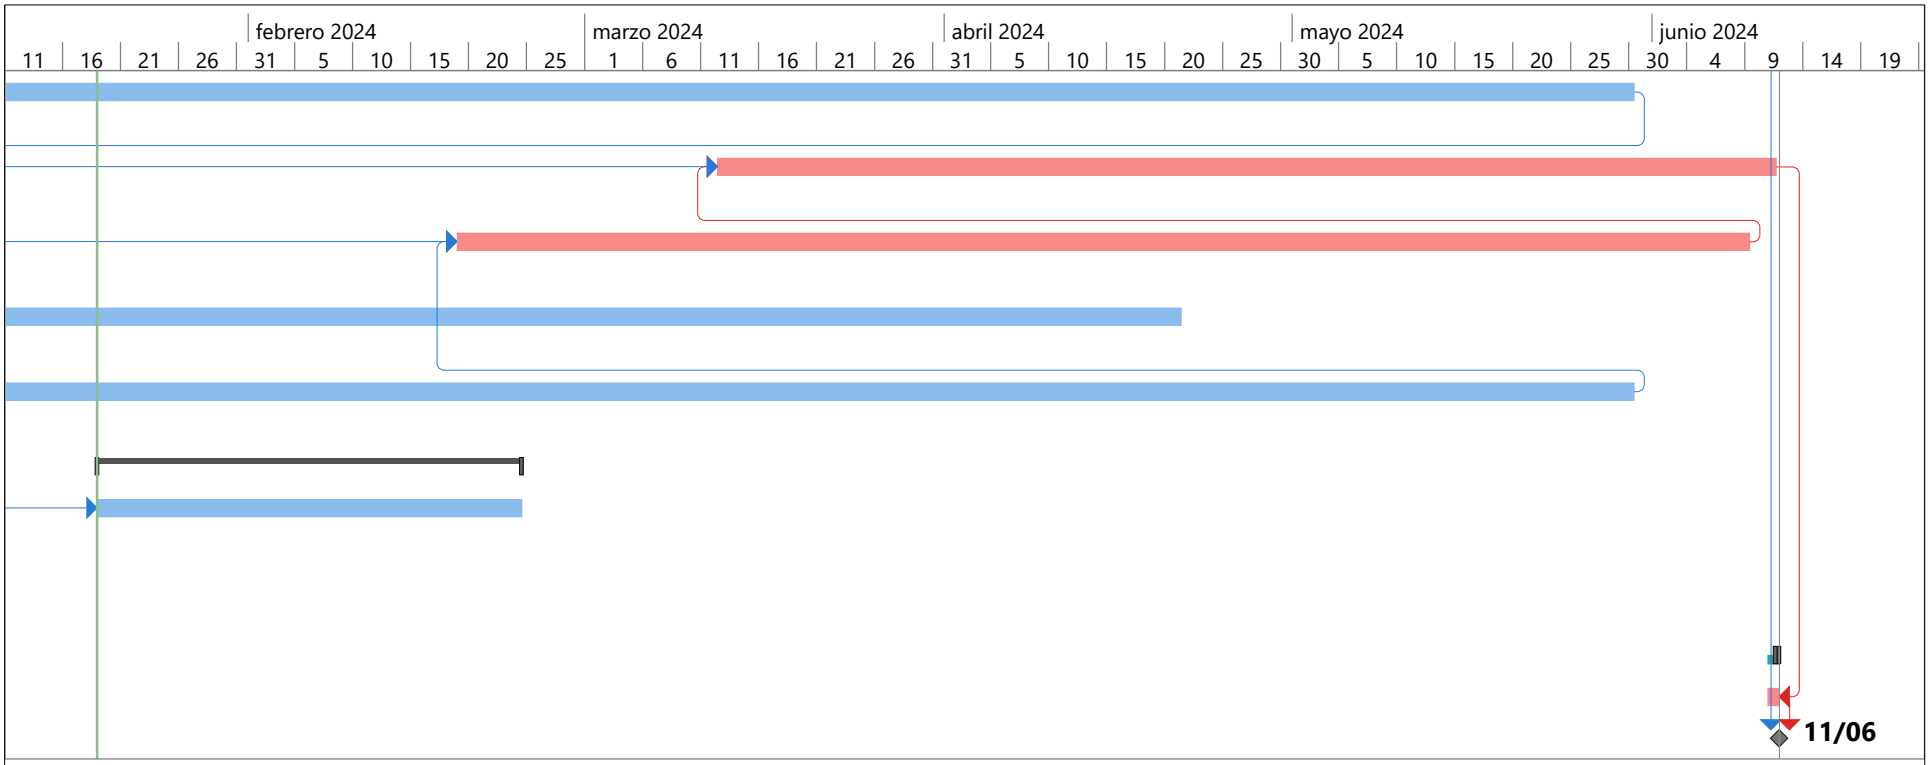

Proyecto: CRONOGRAMA BALA
Fecha: vie 19/01/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES, MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPIANVI-INVI-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	10/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PROGRAMA DE INVERSIONES** I

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MSBV-008-2022

OBJETO:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 970 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMC

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03/08/2022 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) $: $ 121.889.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) $: $ 121.889.999,00

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/01/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR APORTES (Incluido IVA) $: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA pesos	Mides de	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Procesado: $ Valor ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Suspensión No. 1	18	19	20	21	22	23
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA pesos	Mides de	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA pesos	Mes	agosto/2022	septiembre/2022	octubre/2022	noviembre/2022	diciembre/2022	enero/2023	febrero/2023	marzo/2023	abril/2023	mayo/2023	junio/2023	julio/2023	agosto/2023	septiembre/2023	octubre/2023	noviembre/2023	diciembre/2023	Del 23/12/2023 Al 08/01/2024	enero/2024	febrero/2024	marzo/2024	abril/2024	mayo/2024	junio/2024
EXPLANACIONES	$ 160.659,10	1,26%	$43.349,70	$ -	$			0,32%	0,36%	0,00%	0,00%			0,36%	0,27%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 144.660,69	1,60%	0,54%		$			0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BOX CULVERT 2 EXG 2,1 ~ 7M (CANTIDAD 1UND)	$ 166.553,21	1,33%	$151.053,23	$ -	$			0,00%	1,26%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 149.012,58	0,10%	1,68%		$			0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,5 M Y LONGITUD DE 5000 M	$ 7.527.066,60	63,96%	$3.939.937,53		$	0,00%	0,00%	12,08%	76,07%	21,97%	0,00%	0,00%	76,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,95%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 6.940.160,94	66,07%	36,04%		$																								
TRANSPORTE	$ 279.203,61	3,47%	$60.453,09		$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 279.203,61	3,47%	0,76%		$																								
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 3.710,00	0,05%	$0,00		$			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 3.710,00	0,05%	0,00%		$																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 8.016.406.373**	**100%**	**$ 3.784.190,55**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 8.016.406.373**	**100%**	**39,72%**																										

Reprogramación No.1 **Reprogramación No.2** **Reprogramación No.3** Reprogramación N.4 Según artículo No.7 y Prórroga No.4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	19,78%	26,92%	22,48%	21,68%	10,19%	0,44%	3,29%	22,16%	19,17%	3,93%	6,68%	11,67%	34,69%	6,00%	0,00%	2,26%	16,98%	11,24%	9,90%	6,10%	2,16%
	VALOR Millon de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.258.513,02	$1.679.989,18	$1.679.989,26	$ 1.747.864,09	$ 1.291.239,74	$ 452.164,09	$ 272.141,59	$ 1.773.647,92	$ 1.326.041,06	$ 283.884,16	$ 501.339,36	$ 937.559,09	$ 1.984.459,07	$ 483.193,01	$ 0,00	$ 177.967,56	$ 969.963,16	$ 900.307,31	$ 793.697,36	$ 649.598,63	$ 168.339,36
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR Millon de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.283.452,05	$2.963.441,23	$4.643.430,49	$ 6.391.294,58	$ 7.682.534,32	$ 8.134.698,41	$ 8.406.840,00	$ 10.180.487,92	$ 11.506.528,98	$ 11.790.413,14	$ 12.291.752,50	$ 13.229.311,59	$ 15.213.770,66	$ 15.696.963,67	$ 15.696.963,67	$ 15.874.931,23	$ 16.844.894,39	$ 17.745.201,70	$ 18.538.899,06	$ 19.188.497,69	$ 19.356.837,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,97%	0,97%	0,75%	1,79%	0,87%	0,47%	2,68%	1,91%	1,91%	0,52%	1,91%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR Millon de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	$225.441,13	$160.170,12	$280.191,89	$178.592,79	$143.181,80	$69.474,00	$80.976,00	$511.810,41	$156.736,89	$69.717,13	$64.080,31	$69.793,09	$ 0,00								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	1,73%	2,70%	3,45%	5,24%	6,11%	6,58%	9,26%	11,17%	13,08%	13,60%	15,51%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%	18,67%
	VALOR Millon de Pesos)	$0	$0	$0,00	$225.441,13	$385.611,25	$665.803,14	$844.395,93	$987.577,73	$1.057.051,73	$1.138.027,73	$1.649.838,14	$1.806.574,03	$1.876.291,16	$1.940.371,47	$2.010.164,56	$2.010.164,56								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluir IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 49.105.364,00	$ -	0,00%
	$ 49.105.364,00		
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 47.378.000,00	$ 47.378.000,00	0,58%
	$ 47.378.000,00		
* SIN REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 9.001.609,00	$ 9.001.609,00	0,11%
	$ 9.001.609,00		
-	$ -	$ -	0,00%
	$ -		
-	$ -	$ -	0,00%
	$ -		
-	$ -	$ -	0,00%
	$ -		
-	$ -	$ -	0,00%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 105.485.164,00	$ 56.379.609,00	0,69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 105.485.164,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 8.121.889.999,00**	**$ 3.340.570.373,43**	**39,96%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 8.121.889.999,00**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se consideró aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Mes	% Mes
CURVAS		

OBSERVACIONES:
Reprogramación de acuerdo al inserción No.1 y la prórroga No. 3

Aprueba Firma:
Nombre: " LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. : 25202154872 CND

Aprueba Firma:
Nombre: FREDY RODRIGUEZ GIRALDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202154872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPHAN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 DE (Utilizar mes y año) VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -
SEGUIMIENTO No. 22
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: LP-MSBV-08-2022
OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL IMG

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA FIJADA PARA INICIO DE OBRA: 24/10/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) de: $ 121.599.999,00 (Según contrato principal)
VALOR ACTUALIZADO (Incluido IVA) de: $ 121.599.999,00

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/06/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) de: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA pesos	Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES	$	160.899,16	1,26%	$43.395,79
	$	144.660,68	1,85%	0,54%
BOX CULVERT 2.5X2.5 L =7M (CANTIDAD 1UND)	$	166.553,21	1,33%	$151.053,23
	$	649.912,58	8,19%	1,88%
PLACA HUELLA ANCHO CALZADA 5,5 M Y LONGITUD DE 5000 M	$	7.527.099,90	93,90%	$3.266.699,27
	$	6.940.165,64	86,57%	40,70%
TRANSPORTE	$	278.353,61	3,47%	$60.453,09
	$	278.353,61	3,47%	0,76%
CARACTERIZACIÓN VIAL	$	3.710,00	0,05%	$0,00
	$	3.710,00	0,05%	0,05%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$**	**8.016.430,01**	**100%**	**$ 3.521.622,28**
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$**	**8.016.430,01**	**100%**	**43,92%**

% Programado $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Suspensión No. 1	18	19	20	21	22	23
$ Valor Ejecutado	agosto/2022	septiembre/2022	octubre/2022	noviembre/2022	diciembre/2022	enero/2023	febrero/2023	marzo/2023	abril/2023	mayo/2023	junio/2023	julio/2023	agosto/2023	septiembre/2023	octubre/2023	noviembre/2023	diciembre/2023	Del 23/12/2023	enero/2024	febrero/2024	marzo/2024	abril/2024	mayo/2024	junio/2024
% Ejecutado																		Al 06/01/2024						
% P			0,19%	0,36%	0,00%	0,00%			0,36%	0,27%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P			$ 15.505,79	$ 29.011,77	$ 00.470,72	$ 00.470,72			$ 29.011,77	$ 21.286,72	$ 7.725,05	$ 0,00	$ 00.470,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ E				144.660	00.470	00.470																		
% E				1,85%	0,00%	0,00%																		
% P			0,00%	1,85%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P			$ 0,00	$ 150.000,01					$ 00.000,00	$ 0,00	$ 00.000,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ E									00.000,00	00.000,00	00.000,01	00.000,00	00.000,00											
% E									0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ E																								
% E																								
% P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
$ E																								
% E																								

Reprogramación No.1 **Reprogramación No.2** **Reprogramación No.3** Reprogramación No.4 Según reinicio No.1 y Prórroga No.4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,31%	10,70%	20,93%	33,45%	21,68%	10,19%	8,44%	3,39%	23,16%	19,17%	3,93%	6,68%	11,67%	34,69%	6,85%	3,86%	2,32%	19,98%	11,29%	9,89%	8,10%	3,19%
	VALOR Miles de Pesos	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.258.619,02	$1.678.989,16	$1.679.960,26	$ 1.747.864,09	$ 1.231.259,74	$ 652.164,09	$ 272.143,39	$ 1.775.647,92	$ 1.534.341,06	$ 303.084,16	$ 501.336,86	$ 937.558,20	$ 1.864.459,87	$ 493.193,01	$ 0,00	$ 177.967,26	$ 869.983,16	$ 992.307,31	$ 792.691,96	$ 649.598,63	$ 168.229,36
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,31%	11,01%	31,94%	65,39%	87,07%	97,26%	105,70%	109,09%	132,25%	151,42%	155,35%	162,03%	173,70%	208,39%	215,24%	219,10%	221,42%	241,40%	252,69%	262,58%	270,68%	273,87%
	VALOR Miles de Pesos	$ 0,00	$ 0,00	$24.939,03	$1.283.558,05	$2.962.547,21	$4.642.507,47	$ 6.390.371,56	$ 7.621.631,30	$ 8.273.795,39	$ 8.545.938,78	$ 10.321.586,70	$ 11.855.927,76	$ 12.159.011,92	$ 12.660.348,78	$ 13.597.906,98	$ 15.462.366,85	$ 15.955.559,86	$ 15.955.559,86	$ 16.133.527,12	$ 17.003.510,28	$ 17.995.817,59	$ 18.788.509,55	$ 19.438.108,18	$ 19.606.337,54
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR Miles de Pesos	$ 0,00	$ 0,00	$0,00	$253.417,13	$196.170,12	$289.131,99	$778.058,79	$145.181,90	$264.414,04	$588.395,49	$764.613,64	$282.158,10	$111.215,41	$194.758,95	$43.717,19	$24.585,31	$64.793,05	$0,00	$190.872,01	$83.166,28	$13.382,91	$8.644,74	$71.897,19	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	3,16%	4,59%	7,11%	16,82%	18,60%	22,42%	29,93%	31,98%	33,82%	34,62%	37,49%	38,04%	38,19%	38,45%	38,45%	38,53%	38,92%	39,04%	39,08%	39,11%	
	VALOR Miles de Pesos	$0	$0	$0,00	$253.417,13	$449.587,25	$738.719,24	$1.516.778,03	$1.661.959,93	$1.787.540,19	$2.376.333,68	$3.140.947,32	$3.423.105,42	$3.534.320,83	$3.729.079,78	$3.772.796,97	$3.797.382,28	$3.862.175,33	$3.862.175,33	$4.053.047,34	$4.136.213,62	$4.149.596,53	$4.158.241,27	$4.230.138,46	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL ACTUALIZADO		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$	49.165.364,00	$ -	0,00%
	$	49.165.364,00		
* REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	47.378.000,00	$ -	0,00%
	$	47.378.000,00		
* S/A REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	9.001.820,00	$	0,11%
	$	9.001.820,00		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
-	$	-	$ -	0,00%
	$	-		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$	105.465.184,00	$ 59.379.820,00	0,69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$	105.465.184,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$**	**8.121.899.999,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$**	**8.121.899.999,00**	**$ 3.579.302.099,60**	**44,06%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Programado	% Valor Ejecutado
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: LUIS ANTONIO MEJIA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. : 2520215487 2 CND

Aprueba Firma
Nombre: FREDY ROLANDO PEÑARANDO
Representante legal o Apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No: 2520215487 2 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- **ACTAS DE COMITÉ**

FECHA: 30/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Radicar en la alcaldía del municipio de san Bernardo del viento, los soportes para el proceso de solicitud de apremio. (INTERVENTORIA). CUMPLIÓ
2. Entrega de informe ambiental. Cumplió
3. Entrega de informes social del mes de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. No cumplió
4. Entrega de Informe SST del mes de enero, febrero, marzo Y Abril. Cumplió
5. Entrega de Seguridad social de los meses de enero,febrero,marzo y abril. No cumplió

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Revisión de compromisos adquiridos
2. Estudios y diseños
3.Seguimiento al componente ambiental
4. Componente Social
5.SST
6.Rendimiento de Obra.
7. Recibo de obra

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se da inicio al comité con una breve introducción de los datos generales del contrato de obra, se procede con la presentación de los participantes y luego se continua con los puntos a tratar:

1. Revisión de compromisos:

1.1. Radicar en la alcaldía del municipio de san Bernardo del viento, los soportes para el proceso de solicitud de apremio. (INTERVENTORIA). CUMPLIÓ 1.2. Entrega de informe ambiental. Cumplió

1.3. Entrega de informes social del mes de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. No cumplió

1.4. Entrega de Informe SST del mes de enero, febrero, marzo Y Abril. Cumplió

1.5 Entrega de Seguridad social de los meses de enero,febrero,marzo y abril. No cumplió

2.Estudios y diseños: Los estudios y diseños se encuentran avalados por la Interventoría.

3.Componente Ambiental: La Interventoría informa que el contratista se encuenta al día con la entrega de los informes mensuales.

PAGA: Estado APROBADO por interventoría, en respuesta emitida por el INVIAS se informa que el PAGA queda a la entera responsabilidad del contratista de obra y la interventoría, cualquier incumplimiento de la legislación ambiental y social o la afectación de recursos naturales, así como reclamaciones de terceros o contra terceros que se deriven de la ejecución del contrato de obra.

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

4.Social: Mensualmente, se están realizando reuniones de seguimiento con la veeduría y Junta de Acción comunal.
El contratista no ha realizado la entrega de los informes mensuales correspondiente a enero, febrero, marzo y abril.
Por otra parte,se informa que hay tres PQR abiertas 5. SST: La profesional SST ha realizado visitas a la obra, con la finalidad de realizar seguimiento al personal que se encuentra laborando para el proyecto, el uso de epp y señalización, al respecto se han realizado las siguientes observaciones: Mejorar señalización, hacer entrega de EPP a los trabajadores y hacer entrega de la seguridad social de los meses enero, febrero, marzo y abril.
6. El proyecto presenta un avance de obra ejecutado de 43,68% , contra un programado de 95,92% , para un atraso del 52,24%.
La Interventoría informa que por parte del contratista se realizó solicitud de prórroga por seis (6) meses, sin embargo el Director de Interventoría y la Ingeniera Laura Peña de INVIAS, ratifican al contratista y a la entidad contratante, que el proyecto no cuenta con recursos para continuar realizando la supervisión de las obras y se recuerda que el proyecto vence el día 11 de junio de 2024. Por lo anteriror, el secretario de planeación David Rojas, manifiesta que están revisando el presupuesto presentado por la Interventoría y que en el día de mañana la alcaldía tendrá una respuesta, para ver si el proyecto continúa o no y en caso positivo, iniciar con el trámite de la prórroga del convenio.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ingreso de 20 viajes de arena y 20 viajes de triturado	31/05/2024	Contratista
Ingreso de acero a la obra	31/05/2024-03/06/24	Contratista
Ingreso de Motoniveladora	04/06/24	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 11/06/2024 (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS MEJÍA TURIZO	Contratista	Contratista	
FREDDY ALEXANDER RODRÍGUEZ GIRALDO	Director de Interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
DAVID ROJAS	Secretario de Planeación	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	
LAURA PEÑA	Supervisora de INVIAS	INVIAS	
KAREN BOBADILLA PINTO	Ing. Residente de Interventoría	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- **ACTAS DE REUNIÓN**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 28/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 34
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-006-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO, NIT. 901611859-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 971 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL IMG, NIT. 901.579.942-7

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1.Seguimiento y control ala ejecucion de las actividades del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. verificación cumplimiento de compromisos
2. parte técnica
3.. Seguridad y salud en el trabajo.
4. componenete ambiental y social.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 9: 00 am en el corregimiento del castillo, contando con la participación del contratista, interventoría.

1. verificación de compromisos:
- Reactivar la construcción de los boxculvert (No cumplio)
- Incrementar suministro de materiales para construcción de placa huella (no cumplio)
- Incrementar cuadrillas en la construcción de placa huella (No cumplio)
- Cerrar las tres PQR abiertas (No cumplio)

Parte Técnica : Teniendo en cuenta que las actividades se retomaron el día 14 de mayo de 2024, la Interventoría solicita incrementar los rendimientos de la obra de manera representativa, sin embargo le recuerda al contratista que el contrato de obra vence el día 11 de junio de 2024 y que el CONSORCIO VIAL RURAL IMG, no cuenta con recursos para continuar ejerciendo la supervisión de las obras. El contratista informa que solicitará una prórroga por 6 meses e incrementará las cuadrillas para mejorar los rendimientos.

3. Seguridad y salud en el trabajo:
El personal actualmente no cuenta con los EPP, por lo que se solicita la entrega de los mismos. se compromete a entregar los cascos para el día de mañana.

4. componente ambiental :En cuanto al área ambiental, se solicita realizar aseo de los frentes de obras en los que se están realizando actividades, se recomienda que día a día se realice aseo al finalizar la jornada. 5. Social:El
contratista tiene pendiente la entrega de los informes sociales desde el mes de diciembre de 2023 y cerrar 3 PQR. El contratits, revisará con la profesional social e informará a la Interventoría para la entrega de los informes y así mismo revisará las PQR impuestas, para subsanar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de Cascos	29 de mayo de 2024	CONTRATISTA
Aseo en los frentes de trabajo	Diarios al finalizar la jornada	CONTRATISTA
Informes sociales	11 de junio de 2024	CONTRATISTA


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
LUIS ANTONIO MEJÍA TURIZO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	
ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	
KAREN BOBADILLA PINTO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

i. A la fecha, semana N° 91, se tiene una inversión de obra programada según reprogramación ajustada a prórroga N°3 es de $ 7.848.175.450,09 correspondiente al 97,90% y una inversión de obra ejecutada acumulada de $ 3.521.922.277,64 correspondiente al 43,93%; lo que representa un atraso del -53,97%.
ii. Se recomienda al contratista, atender oportunamente en las fechas establecidas, cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones y comités técnicos realizados.
iii. Se recomienda al contratista mantener auxiliares de tráfico en los frentes simultáneos de trabajo; para evitar accidentes.
iv. Se recomienda al contratista garantizar el suministro de materiales para construcción de placa huella, de tal manera que se garantice un rendimiento constante y así generar un mayor avance.
v. Desde nel 14 de mayo se retomaron las actividades en obra, sin embargo, se ha evidenciado un muy bajo rendimiento en el avance de esta, por lo que se le recomienda al contratista implementar un plan de contingencia eficaz que permita solucionar esta situación.
vi. El municipio de San Bernardo del Viento, acogiendo la solicitud de la interventoria de iniciar el proceso de apremio por incumplimiento al contrato de obra N° LP - MSBV - 006 - 2022, inicia el proceso citando al contratista de obra, y auguradora que respalda las pólizas de incumplimiento, el día 23 de abril del 2024.
vii. El contratista presentó solicitud de prórroga del contrato de obra por seis meses, ya que el contrato vence el día 11 de junio de 2024.
viii. En comité mensual del día 30 de mayo de 2024, la Interventoría e INVIAS, reiteraron a la alcaldía y contratista que no se cuenta con recursos para continuar realizando la supervisión al contrato de obra.

.

.

.

.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

NÚMERO CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A/EMPRESA	ASUNTO
CVRIMG-777-2024	3/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE REACTIVAR LAS LABORES EN OBRA.
CVRIMG-778-2024	3/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-787-2024	6/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD INFORME MENSUAL INFORMES SST FEBRERO, MARZO Y ABRIL.
CVRIMG-791-2024	6/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN – PROGRAMA COLOMBIA RURAL (CÓRDOBA)
CVRIMG-809-2024	8/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL – ABRIL DE 2024.
CVRIMG-823-2024	9/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL – ABRIL DE 2024.
CVRIMG-828-2024	11/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.
CVRIMG-849-2024	18/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD SEÑALIZACION EN OBRA FIN DE SEMANA.
CVRIMG-862-2024	23/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD CERTIFICADOS DE AFILIACION PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-863-2024	23/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD ENTREGA Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.
CVRIMG-865-2024	23/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACION EN OBRA.
CVRIMG-938-2024	31/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SOLICITUD DE SEÑALIZACION DE ACOPIOS DE MATERIALES PETREOS EN LA VIA.
CVRIMG-949-2024	31/05/2024	CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO	SEÑALIZACIÓN EN OBRA FIN DE SEMANA PUENTE FESTIVO.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



Cinstrucción de bordillos



Construcción de bordillos



Construcción de bordillos



Construcción de Placas, para empalme del Box k4+370

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO ACTIVIDADES SOCIALES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

				FECHA ELABORACIÓN	5 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN BERNARDO	**CONTRATO N°**	LP-MSBV-002	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL RURAL IMG	**CONTRATO N°**	971 de 2022		
NOMBRE DEL PROYECTO	**:"MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO**				



PROTESTA COMUNIDAD POR EEL ESTADO DEL PROYECTO



PROTESTA COMUNIDAD POR EEL ESTADO DEL PROYECTO



AUDIENCIA DE DESCARGOS



REUNION CON LA COMUNIDAD

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

8.4. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

- Se realizó socialización del estado del proyecto en la comunidad del castillo.

⇒ Mayo 01 del 2024 (Miercoles - Festivo).
- Estado del clima: Dia Soleado.
- Personal en obra.: No personal.
- Actividades realizadas.
No se realizaron actividades en obra, continua la inactividad por falta de materiales para la construcción de la placa huella.

⇒ Mayo 02 del 2024. (Jueves)
- Estado del clima: Dia Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: No personal.
  - Interventoria: 1 ingeniero Residente, 1 ing. auxiliar.
- Maquinaria en obra.
1 retro cargador (J-auxiliar), 1 Vibro compactador (I).
- Actividades Realizadas.
No se realizaron actividades en obra, esto debido a que aún persiste la falta de materiales en obra para la construcción de la placa huella, como lo es: arena, triturado, Cemento y acero.
- Esta interventoria continua haciendo llamados de atención al Contratista, debido a la inactividad que presenta la obra desde el dia 05 de abril hasta la fecha, la cual la realiza manera injustificada y por lo que se ha solicitado dar solución a esta problematica en la mayor brevedad posible.
- En el dia de hoy la comunidad del castillo se tomo la Via que comunica el municipio de San Bernardo del Viento con el municipio

de Montes, esto a raíz de la inconformidad que tienen por la problemática de la construcción de la placa huella.

⇒ Mayo 03 del 2024 (Viernes)
— Estado del clima: Día soleado.
— Personal en obra:
• contratista: No se presentó personal.
• Interventoría: 1 ing. residente, 1 ing auxiliar.
— Maquinaria en obra.
1 Vibro compactador (G), 1 retro cargador (J-americano).
— Actividades realizadas.
. No se realizaron actividades en obra, debido a que aún persiste la problemática de la falta de suministro de materiales para la construcción de placa huella..
- Esta interventoría muestra su preocupación por la inactividad presentada en obra de manera injustificada, desde el día 25 de abril del 2024 y que a la fecha aún persiste, se le hace llamado de atención al contratista para que realice actividades en la mayor brevedad posible.
- Esta alerta el proceso a este contratista para apertura de multas, se han realizado dos audiencias, a las cuales no ha asistido personal del consorcio sin brindar que es el contratista.

⇒ Mayo 04 del 2024 (Sábado)
— Estado del clima: Día soleado.
— Personal en obra.
- contratista: No se presento personal

- Interventoría Ing. residente. 1 ing auxiliar.
— Maquinaria en obra.
1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (I-avanzado)
— Actividades realizadas.
No se realizaron actividades en obra, esta aquí aún continua la problemática de la falta del Suministro de materiales para la Construcción de la placa huella.
- En este día se realizó una reunión con personal de la Comunidad del castillo, personal de la alcaldía (alcalde, secretario, etc), interventoría y contratista, en donde se le informa a la comunidad que el contratista iba a continuar con la ejecución de la obra.
- Dán continua abierto el proceso para apremio de multa, se continuara con la segunda audiencia el día 14 de mayo del 2024.

⇒ Mayo 05 del 2024 (Domingo).
— Estado del clima: Día Soleado.
— Personal en obra
- No existe personal.
— Actividades realizadas.
No se realizaron actividades.

⇒ Mayo 06 del 2024 (Lunes)
— Estado del clima: Día Soleado
— Personal en obra.
- Contratista: No personal.
- Interventoría: 1 Ingeniero Residente, 1 ing auxiliar.
— Maquinaria y Equipos en obra.
1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (I-avanzado)

2 mezcladoras (G), 1 vibrador de concreto (G).
— Actividades realizadas
• No se realizaron actividades en obra, esto aquí continua la problemática con el suministro de materiales para la construcción de placa huella (Cemento, Cemento, acero, Entorno)
— Esta interventoría manifiesta al contratista su preocupación por la inactividad que se presenta en obra de manera injustificada desde el día 05 de abril del 2024. y que a la fecha se mantiene, por lo que se le recomienda reactivar la obra en la mayor brevedad posible.
• En este día se realizó reunión en la comunidad del castillo con personal de la Zona, alcaldía (alcalde, secretario de infraestructura), interventoría y contratista, con la finalidad de darle solución a la problemática presentada en obra.
• Hay una audiencia abierta para aperno de multas, para el día 14 de mayo.

⇒ Mayo 07 del 2024 (Martes)
— Estado del clima: Día soleado
— Personal en obra.
• Contratista: No se presentó personal.
• Interventoría: 1 ing. residente, 1 ing. auxiliar.
— Maquinaria y Equipos en obra.
1 Vibro compactador (G) 1 retro cargador (G) alquilado.
2 mezcladoras (G), 1 vibrador de concreto (G).
— Actividades realizadas
• No se realizaron actividades en obra, esto debido a que aún persiste la problemática en la falta de suministro de materiales para

la construcción de placa huella.
- Esta interventoría reitera su preocupación al contratista para problemática que se presenta en obra desde el día 05 de abril del 2024, hasta la fecha, como lo es la inactividad que se presenta de forma injustificada; por lo que se le hace la recomendación al contratista de reactivar la obra, en la mayor brevedad posible.
- Hay una audiencia abierta para apremio de multa para el día 14 de mayo.

⇒ Mayo 08 del 2024. (Miercoles)
- Estado del clima: se presentó lluvia intensa desde las 2:00 am hasta las 5:00 am., resto del día Soleado.
- Personal en obra.
- Contratista: No se presentó personal.
- Interventoría 1 ing. residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria en obra.
1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (I. ausente) 2 mezcladoras (I), 1 Vibrador de concreto (I).
- Actividades Realizadas.
- No se realizaron actividades en obra.
- Se Vio el ingreso a obra de material tipo piedra roja y arena, para la construcción de la placa huella; pero ahí se mantiene la inactividad en obra.

Nota: Se encuentra abierta audiencia para apremio de multas, para el día 14 de mayo.

⇒ Mayo 09 del 2024 (Jueves)
- Estado del clima. Día Soleado.

— Personal en obra.
• Contratista: No presentó personal
• Interventoría: 1 ing residente, 1 ing auxiliar.
— Maquinaria y Equipos en obra.
1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (I - alquilado)
2 mezcladoras (I), 1 Vibrador de concreto (I)
— Actividades Realizadas.
• Se autorizó ingreso de materiales para la construcción de placa huellas. como lo son: triturado y arena.
• Aún se mantiene la inactividad en obra.

⇒ Mayo 10 del 2024 (Viernes).
— Estado del clima: Día Soleado.
— Personal en obra.
• Contratista: No se presentó personal.
• Interventoría: 1 ing residente, 1 ing. auxiliar.
— Maquinaria en obra y equipos
1 vibro compactador (I), 1 retro cargador (I - alquilado).
2 mezcladoras (I), 1 Vibrador de concreto (I).
— Actividades realizadas.
• En el día de hoy continuo la entrada de materiales para la construcción de placa huellas (arena y Triturado), se está a la espera de que entre el resto de materiales para retomar la obra.
• Aún persiste la inactividad en obra, se le solicita al contratista reactivar la obra en la mayor brevedad posible.
Nota: antes estas abscisas abscisas la audiencia para apoyo de multas al contratista, esta para el 14 de mayo.

⇒ Mayo 11 del 2024 (Sábado).
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: No se presento personal.
  - Interventoría: 1 ing. residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria en obra. y Equipos.
  1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (I-averiado)
  2 mezcladoras (I), 1 Vibrador de concreto (I).
- Actividades Realizadas.
  Se evidencio ingreso de materiales para la construcción de placa huellas (Cemento y Acero).
  No se reportan actividades en este día por lo que la inactividad continua.
  Se le recomienda al contratista reactivar la obra en la mayor brevedad posible.
- Nota: Se encuentra abierta la continuación de la audiencia para aprenio de multas al contratista, para el día 14 de mayo del 2024.

⇒ Mayo 12 del 2024 (Domingo).
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: No se presento.
  - Interventoría: No se presento. día de descanso.
- Actividades realizadas.
  No se realizaron actividades en obra.

⇒ Mayo 13 del 2024 (Lunes - Festivo)
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: No se presento personal.

- Intervention: N/A Día N. laboral
- Actividades realizadas
No se realizaron actividades en obra.

⇒ Mayo 14 del 2024 (Martes).
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
  - Contratista: 1 ing residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 10 ayudantes
  - Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ing Auxiliar
- Maquinaria y Equipos en obra.
1 Vibro compactador (I), 1 retro cargador (I) 2 mezcladoras (A) 1 Vibrador de concreto (A).
- Actividades realizadas.
  - Se realizó fogueado de acceso de refuerzo para construcción de modulos de cuneta y huella.
  - Se realizó instalación de niveles y seguidamente se realizo el vaciado en concreto para bordillos, por el carril derecho desde el K 5+011 al 4+900
  - Se colocaron niveles para construcción de modulos de cuneta y huella, por el carril izquierdo desde el K 4+345,6 al K 4+370,4.

Nota: La audiencia que estaba pactada para continuar el día de hoy se aplazo, pero no han definido la fecha en la que se hara esta audiencia es para aprobar las multas al contratista, por incumplimientos en la ejecución del contrato

⇒ Mayo 15 del 2024 (Miércoles).
- Estado del clima: Día Soleado
- Personal en obra.
  - Contratista: 1 ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales 10 ayudantes; 1 Operador de maquinaria
  - Interventoría: 1 ing. Residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria en obra. y Equipo:
  1 Mini cargador (A), 1 retrocargador (C), 1 Vibro compactador (C), 2 mezcladoras (A), 1 Vibrador de concreto (A).
- Actividades realizadas.
  - Se realizó figuración de acero de refuerzo para construcción de modulos de cuneta y huella.
  - Se realizó adecuación de terreno, seguidamente instalación de acero de refuerzo construcción de modulos de cuneta, desde el 3+285 al 3+245,4 cam! derecho.
  - Se realizo instalación de reglas y adecuación de terreno para construcción de modulos de cuneta, desde el K 4+345,6 al K 3+420,4 por el cam! izquierdo.
  - Se realizo desencofrado de bordillos, desde el K 5+011 al K 4+900 cam! derecho.
  - Se realizó instalación de reglas y seguidamente construcción de bordillos, utilizando concreto hecho en obra. desde el K 5+011 al K 4+900 cam. izq.

Nota: Aun esta abierta la audiencia para aprobación de multas el contratista de obra, la fecha no se ha definido.

⇒ Mayo 16 del 2024 (Jueves).
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
- Contratista: 1 ing residente, 1 maestro de obra

2 oficiales, 12 ayudantes, 1 operador de Maquinaria
- Interventoría: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero
— Maquinaria en obra
1 Mini cargador (A), 1 Retro cargador (I), 1 Vibro-compactador (I), 2 mezcladoras (A), 1 Vibrador de Concreto (A).
— Actividades Realizadas
- Se realizó construcción de modulos de cuneta (Vaciado con concreto hecho en obra), desde el K 3+283 al K 3+245,4 carril derecho: Se tomaron muestras del concreto.
- Se realizó figuración de acero para construcción de módulos de cuneta y huella.
- Se realizó desencofrado de bordillos, desde el K 4+100 al K 4+900 carril izquierdo.
- Se realizó instalación de rieles y seguidamente construcción de bordillos, desde el K 4+900 al K 4+900 carril derecho.

Nota: Se encuentra Pendiente la nueva fecha para Continuar con la audiencia de apremio de multas al contratista de obra.

Mayo 17 del 2024 (Viernes)
— Estado del Clima: Día Soleado
— Personal en obra:
- Contratista: 1 ing residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 12 ayudantes, 1 operador de maquinaria
- Interventoría: 1 ing residente, 1 ing auxiliar
— Maquinaria y Equipo en obra.
— 1 Mini cargador (A), 1 Retro cargador (I), 1 vibro-compactador (I), 2 Mezcladoras (A), 1 Vibrador de Concreto (A).
— Actividades Realizadas.

- Se realizó figuración de acero para construcción de modulos de cuneta y huella
- Se realizo adecuación de terreno e instalación de acero de refuerzo para construcción de módulos de cuneta y huella, desde el k 4+345, al k 4+370.4 carril izquierdo.
- Se realizó desencofrado de bordillos desde el k 4+900 al k 4+800 carril derecho.
- Se realizó instalación de riebal y seguidamente Construcción de bordillos desde el k 4+800 al k 4+860. carril izquierdo.

— Nota: Se encuentra pendiente por fijar la nueva fecha para continuar con la audiencia de apremio de multas que se aplazo desde el dia 14 de mayo., para el contratista de obra.

⇒ Mayo 18 del 2024 (Sábado).

— Estado del clima: Dia Soleado

— Personal en obra.

- Contratista: 1 ing. residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 12 ayudantes, 1 operador de maquinaria
- Interventoría: 1 ing residente, 1 ing. auxiliar

— Maquinaria y Equipo en obra.
1 mini cargador (A), 1 retrocargador (I), 1 Vibrador de concreto (A), 1 Vibro compactador (I), 2 mezcladoras (A)

— Actividades realizadas.

- Se realizó figuración de acero de refuerzo para construcción de modulos de cuneta y huella. y viga riostra.
- Se realizo construcción de módulos de cuneta y huella, desde el K 4+345 al k 4+37 carril izquierdo; se tomarón muestras

del concreto utilizado, para ensayos en laboratorio.
- Se realizó desencofrado de bordillos desde el K 4+900 al K 4+800 carril izquierdo.
- Se realizó instalación de mallas y seguidamente construcción de bordillos desde el K4+800 al K 4+750 carril izquierdo y K 4+800 al K4+730, carril derecho.

- Nota: Se encuentra pendiente por fijar la nueva fecha, para continuar con la audiencia de aprobación de multas al contratista de obra, que se tenía para el 14 de mayo del 2024.

⇒ Mayo 19 del 2024. (Domingo).
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
No se presentó personal por ser día dominical.
- Actividades realizadas.
No se realizaron actividades en obra.

⇒ Mayo 20 del 2024 (Lunes).
- Estado del clima: Día Soleado.
- Personal en obra.
- Contratista: 1 ing residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudantes, 1 operador de maquinaria
- Interventoría: 1 ing residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria y Equipo en obra.
1 Mini cargador (A), 1 Vibro compactador (A) 1 retro cargador (A), 2 mezcladoras (A), 1 Vibrador de concreto (A).
- Actividades Realizadas.
- Se realizó Instalación de mallas y seguridad

mente construcción de bordillos, desde el K 3+323,6 al k 3+436,8 carril derecho.

- Se realizó desencofrado de bordillos, desde el k 4+800 al k 4+750 carril izquierdo. y 4+800 al k 4+730 carril derecho.
- Se realizo instalación de rieles y seguidamente construcción de bordillos, desde el k 4+750 al k 4+690 carril izquierdo y k 4+730 al k 4+705 carril derecho.

Nota - Se encuentra pendiente por fijar la nueva fecha, para continuar con la audiencia de aprobación de multas al contratista de obra, la cual estaba, para el 14 de mayo del 2024 y se aplazó.

Luz

⇒ Mayo 21 del 2024. (Martes)

— Estado del clima: Se presentó lluvia intensa desde las 7:00 am hasta las 5:am y moderada desde las 5:00 am - 7:00 am., rest. del día soleado.

— Personal en obra.

- contratista: 1 ing residente, 1 maestros de obra 2 oficiales, 16 ayudantes, 1 operador de maquinaria 1 Topografía, 1 cadenero 1 peón.
- Interventoría: 1 ing. residente, 1 ing auxiliar

— Maquinaria y equipos en obra.
1 mini cargador (A), 1 retro cargador (A), 1 vibro-compactador (I), 2 mezcladoras (A), 1 vibrador de concreto (A).

— Actividades Realizadas.

+ Se realizó desencofrado de bordillos desde el k 3+323,6 al k 3+436,8 carril derecho;

- K 4+750 al k 4+690 carril Izquierdo, k 4+730 al k 4+705 carril derecho

- Se realizó instalación de mallas y seguidamente construcción de bordillos, desde el K 3+323,6 al K 3+436,8 carril izquierdo; K 4+690 al K 4+593,04 carril izquierdo y K 4+705 al K 4+684,9 carril derecho.

Nota: Se está a la espera de la fijación de la nueva fecha para continuar con la audiencia de apremio de multas al contratista, la cual estaba prevista para el día 14 de mayo del 2024 y se aplazó.

⇒ Mayo 22 del 2024. (Miércoles).

— Estado del clima: Se presentó lluvia intensa desde la 1:00 am hasta 5:00 am y lluvia moderada desde las 5:00 am a 7:00 am, 8:00 am a 12:00 m.

— Personal en obra.

- Contratista: 1 ing residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 topografo, 1 cadenero.
- Interventoría: 1 ing residente, 1 ing-auxiliar

— Maquinaria y equipos en obra.
1 minicargador (A), 1 retrocargador (I), 1 vibro-compactador (I), 2 mezcladoras ( ), 1 vibrador de concreto ( )

— Actividades realizadas.

- Se realizó desencofrado de bordillos, desde el K 3+323,6 al K 3+436,8 carril izquierdo, K 4+690 al K 4+593,04 carril izquierdo y K 4+705 al K 4+684,9 carril derecho.
- Se realizó instalación de mallas y seguidamente construcción de bordillos, desde K 3+436,8 al K 3+536,1 carril izquierdo

y K 4+684,9 al K 4+563 carril derecho.

⇒ Mayo 23 del 2024 (Jueves)
- Estado del clima: Día soleado
- Personal en obra:
  - Contratista: 1 ing residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 Topografo, 1 cadenero
  - Interventoría: 1 ing. residente, 1 ing. auxiliar
- Maquinaria en obra y equipos.
  1 Minicargador (A), 1 retro cargador (I), 1 Vibro compactador (I), 2 mezcladoras (A), 1 Vibrador de concreto (A).
- Actividades realizadas.
  - Se realizó desencofrado de bordillos, desde el K 3+436,8 al K 3+536,1 carril izquierdo y K 4+684,9 al K 4+563 carril derecho.
  - Se realizó instalación de niche y seguidamente construcción de bordillos desde el K 4+593,04 al K 4+471,69 carril izquierdo, K 3+536,1 al K 3+553,07 carril izquierdo y K 3+436,8 al K 3+565,87 C. Derecho.

Nota: Se encuentra pendiente por fijar la nueva fecha para continuar con la audiencia de apremio de multas al contratista de obra, la cual estaba prevista para el 14 de mayo y se aplazó.

⇒ Mayo 24 del 2024 (Viernes)
- Estado del clima: Día soleado
- Personal en obra.
  - contratista. 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes, 1 Topografo, 1 cadenero, 1 operador maquinaria.

- Interventoría: 1 ing residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria en obra.
1 Mini cargador (A), 1 retro cargador (A), 1 Vibro compactador (I), 2 mezcladoras (A), 1 Vibrador de concret. (A).

⇒ Actividades Realizadas.
- Se realizó descapote de bordillos, desde el K 4+593 al K 4+471,64 cam. izquierdo, K 3+536,1 al K 3+553,07 cam. izquierdo y K 3+436,8 al K 3+565,87 cam. derecho
- Se realizó instalación de moldes y seguidamente Construcción de bordillos desde el K 3+553,07 al K 3+~~565,87~~ cam. izquierdo y K 4+563 al K 4+417,73. cam. derecho.

- Nota: Se encuentra pendiente por fijar la nueva fecha para dar continuación a la audiencia de aprobación de multas al Contratista de obra, la cual estaba prevista para el 14 de mayo y se aplazó.

⇒ Mayo 25 del 2024. (Sábado).
- Estado del clima: día soleado.
- Personal en obra: 1 ing residente.
- Interventoría: Ing residente, 1 ing auxiliar.
- Maquinaria en obra.
1 mini cargador (I), 1 retro cargador (I), 1 Vibro compactador (I), 2 mezcladoras (A), 1 Vibrador de concreto (A)
- Actividades Realizadas.
No se realizaron actividades en este día, debido a que, el mini cargador se averió y no se pudo transportar los moldes hacia el punto donde se iba trabajar, por lo que el contratista opto por suspender actividades por este día.

⇒ Mayo 26 del 2024 (Domingo)
- Estado del clima: Día Soleado
- Actividades realizadas.
No se realizaron actividades en obra, día dominical.

⇒ Mayo 27 del 2024. (Lunes).
- Estado del clima: Se presentó lluvia intensa desde la 1:00 am hasta las 5:00 am y lluvia moderada desde las 5:00 am hasta las 7:00 am resto del día soleado.
- personal en obra
  - contratista: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 2 operadores de maquinaria 1 Topografo, 1 cadenero, 16 ayudantes.
  - Interventoría: 1 Ingeniero residente, 1 ing. auxiliar.
- Maquinaria en obra. y Equipo.
1 Retrocargador (R), 1 retrocargador (R), 1 Vibro compactador (C), 2 mezcladoras (A), 1 vibrador de concreto (A)
- Actividades realizadas.
  - Se realizó desencofrado de bordillos, desde el K 4+563 al K 4+417,73 carril derecho, K 3+553 al K 3+684,27 carril izquierdo.
  - Se realizó instalación de mallas para construcción de bordillos desde el K 3+690,69 hasta el K 3+820,64. carril derecho.

⇒ Mayo 28 del 2024 (Martes).
- Estado del clima: Día Soleado
- Personal en obra
  - Contratista: 1 ing. residente, 1 maestro de obra,

2 oficiales, 1 topógrafo, 1 cadenero, 2 operadores de maquinaria, 16 ayudantes.
- Interventoría: 1 ing. residente, 1 ing auxiliar.
— Maquinaria y Equipos en obra.
1 Mini cargador (CE), 1 retro cargador (CE), 1 vibro compactador (CI), 2 mezcladoras (CA), 1 vibrador concreto (CA)
— Actividades Realizadas.
- Se realizó demarcado de bordillos desde el K 3+693,69 hasta el K 3+820,64. carril derecho.
- Se realizó instalación de rieles y seguidamente Construcción de bordillos desde el K 3+820,64 al K 3+905,42. carril derecho, K 4+209,47. al K 4+080,72 carril izquierdo
- Se realizó adecuación de terreno, instalación de rieles y seguidamente instalación ~~de cerco de~~ enfus para construcción de modulos de cuneta, desde el K 4345,61 al K 4+370,43 carril derecho.

Nota Se encuentra pendiente por fijar la nueva fecha para dicha contratación y la anulación de aprobación de mallas al contratista de obra, la cual estaba prevista para el 14 de mayo y se aplazó.

Mayo 29 del 2024 (miércoles)
- Estado del clima: Día soleado
— Personal en obra.
- Contratista: 1 ingeniero residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 16 ayudantes, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de maquinaria.
- Interventoría: 1 ing. residente, 1 ing auxiliar
— Maquinaria en obra.
1 minicargador (CE), 1 retro cargador (CE), 1 vibro compactador (CI), 2 mezcladoras (CA), 1 vibrador de concreto (CA).

— Actividades en obra

- Se realizó desconsolado de bordillos desde el K 3+820,64 al K 3+965,42 carril derecho, K 4+109,4 4+080,72 carril izquierdo.
- Se realizó instalación de niche y seguidamente construcción de bordillos desde el K 4+178,82 al K 4+067,92 carril derecho, 4+080,72 al K 4+050,52 carril izquierdo y K 3+833,04 al K 3+780,39 carril izquierdo.
- Se realizó construcción de modulos de cuneta, desde el K 4+345,61 al K 4+370,43 carril derecho.
- Nok Se encuentran pendiente por fijar la nueva fecha para dicha continuidad y la audiencia de apremio de multas al contratista de obra, la cual estaba prevista para el día 14 de enero del 2024 y se aplazó sin saber los motivos.

⇒ Mayo 30 del 2024 (Jueves)

— Estado del clima: Día soleado

— personal en obra

- contratos: 1 ing. residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de maquinaria.
- Interventoras: 1 ing residente, 1 ing auxiliar

— Maquinaria en obra.

1 Mini cargador (A), 1 retrocargador (A), 1 Vibro compactador (I), 1 mezcladora (A), 1 vibrador de concreto (A)

— Actividades realizadas.

- Se realizó instalación de acero de refuerzo y seguidamente vaciado en concreto, para construcción de modulos de cuneta desde el K 4+345,61 al K 4+370,43 carril derecho.
- Se realizó adecuación de terreno para construcción

de modelos de placa huella, por el carril izquierdo del K 3+321,07 al K 3+445,47

- Nota: Se encuentra pendiente por fijar la nueva fecha para dar la continuación a la audiencia de apremio de multas al contratista de obra, la cual estaba prevista para el día 14 de mayo del 2024 y se aplazó sin saber los motivos.

Se realizó comité mensual con INDAS, Alcaldía, Contratista e Interventoría, en el comité la Interventoría e INDAS ratificaron a la alcaldía que los recursos para interventoría estarían hasta el 11 de Junio de 2024, y se solicitó a la alcaldía definir si van a cubrir los gastos de interventoría o si se liquida el contrato.

Mayo 31 de 2024 (Viernes).
Estado del clima: soleado.
Personal en Obra.
Contratista: 2ng. Residente, 1 maestro, 2 oficiales, 1 Topógrafo, 1 cadenero, 1 operador, 20 ayudantes.
Interventoría: 2ng. Residente, 2ng Auxiliar, Topógrafo, cadenero
Maquinaria: 1 Mini cargador (A)
Equipos: 2 Mezcladoras, 1 vibrador de concreto, 1 Compactador (Rana).
Actividades: En K31320 a K3+444 se alista pista, se enmicla placa de 0.9m, se instala acero y se funden 15 placas.
En K+ a K+ se funden aproximadamente 73ml de bordillos por lado izquierdo y de K+ a K+ se funden aproximadamente 64 ml. de bordillos por lado derecho.
