	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	223

INFORME MENSUAL NO. 1 **MES O PERIODO:** AGOSTO DE 2020

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO SAN JOSÉ DE URÉ**		X		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		8
2.1	Localización		X		8
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		10
2.3	Características técnicas del proyecto		X		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		13
3.1	Información general del contrato		X		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		19
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		20
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		22
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		24
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		26
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		28
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	30
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		31
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		33
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		36
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		39
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		42
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	43
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	43
	• Seguimiento Programa de Obra		X		44
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		45
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	45
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	47
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		48
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		65
5	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR**		X		73
6	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		75
6.1	Localización		X		75
6.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		76
6.3	Características técnicas del proyecto		X		76
7	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		77
7.1	Información general del contrato		X		77
7.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		79
7.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		81
7.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		81
8	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		84
8.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		85
8.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		87
8.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		89
8.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		91
8.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		93
8.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	95
8.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		96
8.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		98
8.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		101
8.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		104
8.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		107
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	108
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	108
	• Seguimiento Programa de Obra		X		109
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		110
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	110
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	112
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		113
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		119
9	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO VALENCIA**		X		127
10	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		129
10.1	Localización		X		129
10.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		130
10.3	Características técnicas del proyecto		X		130
11	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		132
11.1	Información general del contrato		X		132
11.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		133
11.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		135
11.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		135
12	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		138
12.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		139
12.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		141

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	223

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
12.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		143
12.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		145
12.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		147
12.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	149
12.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		150
12.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		152
12.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		155
12.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		158
12.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		161
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	162
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	162
	• Seguimiento Programa de Obra		X		163
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		164
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	164
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		X	166
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		167
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		173
13	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		180
13.1	Información general del contrato		X		180
13.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		181
13.3	Informes especialistas		X		181
13.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		188
13.5	Información otros programas y aplicativos		X		189
14	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		190
14.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		191
14.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		193
14.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		195
14.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		197
14.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		199
14.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		202
14.7	Otros documentos seguimiento mensual			X	205
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		X	206
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	206
15	**Conclusiones y recomendaciones**		X		207
16	**Anexos**		X		208
16.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		209
16.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		213
16.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			X	213

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INVIAS N° 779 - 2020

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1



Versión 2
Tomo 1

PERIODO: DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN N°	FECHA	PÁGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO
0	31 de Agosto de 2020	323	Versión inicial	x	
1	14 de Septiembre de 2020	309	Valores y firmas	x	
2	18 de Septiembre de 2020	223	Incluir todos los formatos y modificar organización del informe	x	

Elaborado por: **Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**	Elaborado por:	Revisado por: **Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**
Aprobado por: **Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**		

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA N°	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	INVIAS	
2	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ	
3	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR	
4	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALENCIA	

CONTRATO DE OBRA No. 056 de 2020

SAN JOSÉ DE URÉ

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

1. INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°1** correspondiente al periodo del 04 al 31 de agosto de 2020 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabela Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

El Acta de iniciación al contrato No. 056 de 2020, correspondiente al municipio de San José de URÉ, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista 4L INGENIERÍA S.A.S. la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ representado por el Secretario de Planeación Municipal.

El Acta de iniciación al contrato No. LP-MPL-002-2020, correspondiente al municipio de Puerto Libertador, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista CONSORCIO

MEJORAMIENTO VIALES, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR representado por el Secretario de Infraestructura.

El Acta de iniciación al contrato No. MV-LP-002-2020, correspondiente al municipio de Valencia, fue inscrita el día 13 de agosto de 2020 entre el contratista TVP MUNICIPIOS, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE VALENCIA representado por el Supervisor.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SAN JOSÉ DE URÉ

De acuerdo con el Convenio Interadministrativo Numero 000551, suscrito entre el Municipio de San José de URÉ Córdoba y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural, se tiene que de los 10.000 metros de vías que tiene el tramo VERSALLES- BRAZO IZQUIERDO – ALTO DEL CRISTAL; la entidad entrara a construir 500 metros de placa huella, y del tramo VERSALLES – SAN PEDRITO que tiene una longitud de 8000 metros, se construirá 560 metros de Placa Huella. Para un total de 1060 metros de obra efectivamente construida (Placa huella).

Las vías objeto del alcance del contrato se encuentran catalogadas como vías rurales, y se encuentran en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad a los sitios descritos a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ	
San José de Uré:	• Tramo N° 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal • Tramo N° 2 – Versalles – San Pedrito

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SAN JOSÉ DE URÉ

El mejoramiento de vías en el Municipio de San José de URÉ contempla dos tramos: el tramo Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal que se localiza en la parte sur del municipio y el tramo Versalles – San Pedrito que se localiza en el costado sur del municipio.

El tramo N° 1 a mejorar se localiza desde el K0+000 (inicio de placa huella vereda Versalles) al K10+000 (Vereda Alto del Cristal).

El tramo N° 2 a mejorar se localiza en el K0+000 (Puente vehicular) en las coordenadas 829556.004 N y 1345283.72 E al K9+700 (Escuela San Pedrito), a la cual en la visita de reconocimiento no se tuvo acceso por las difíciles condiciones de transitabilidad.

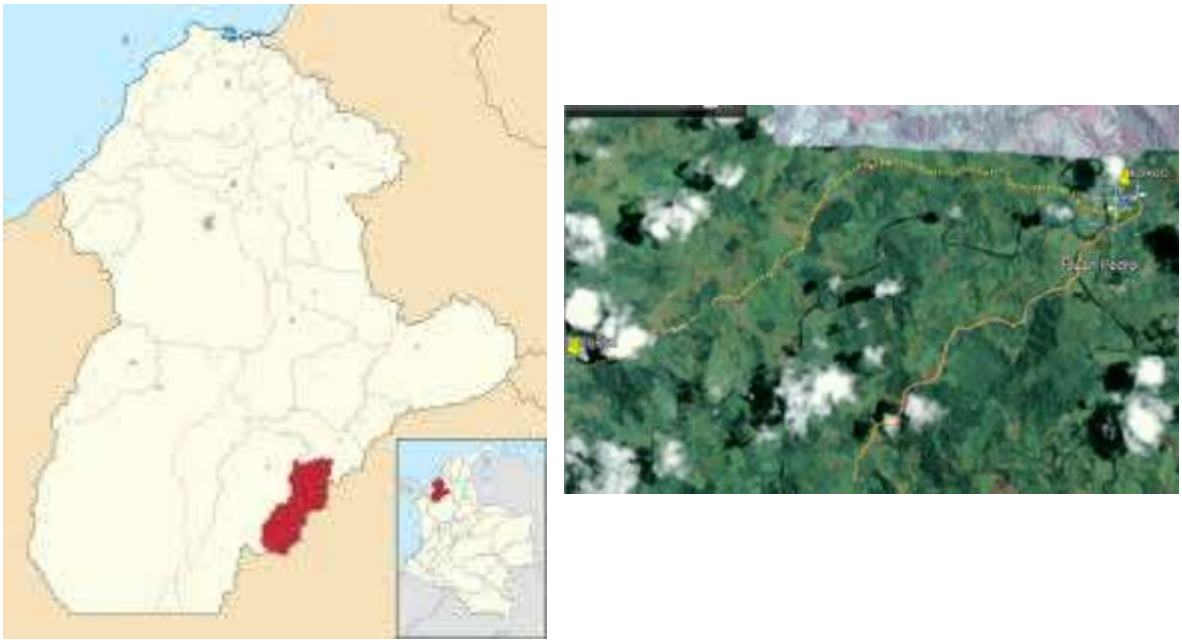


Figura 1. Zona de localización de los tramos a intervenir
Fuente: Informe de Topografía URÉ



Figura 2. Trazado Versalles – Brazo – Izquierdo – Alto de Cristal
Fuente: Anexo Técnico San José de URÉ



Figura 3. Trazado Versalles - San Pedrito
Fuerte: Anexo Técnico San José de URÉ

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
San José de Uré	Tramo N° 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal	500,00	7,00
	Tramo N° 2 – Versalles – San Pedrito	560,00	7,00

La visita de reconocimiento a los tramos viales se realizó el 18 de agosto de 2020, en compañía de Contratista, Alcaldía, INVIAS e Interventoría, encontrando inconvenientes para el acceso al

Tramo N° 2 Versalles – San Pedrito para el cual hay que atravesar la quebrada San Antonio, y el día de la visita no fue posible realizar este cruce, ya que no existe puente alguno, por lo tanto, se reprogramo la visita para el día 25 de Agosto con la coordinación de la comunidad y de vehículos de tracción animal.

En el recorrido no se detectaron las obras a realizar por el deterioro del tramo vial, la rasante de la vía no se encontró definida en todo el recorrido realizado, en el registro fotográfico se evidencia esta situación.

Al respecto de lo encontrado en este tramo se realizó comité virtual el día 31 de agosto, con el INVIAS, alcaldía, contratista e interventoría para revisar la posibilidad de trasladar los recursos de inversión al tramo N° 1.

En cuanto al sector Versalles – Brazo Izquierdo se realizó visita de reconocimiento el 18 de agosto detectando las obras a ejecutar y los sectores de placa huella a construir.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, limpieza de alcantarillas y cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que se revisaran por parte del contratista en el primer mes de ejecución del contrato, el cual es de revisión y ajustes a los diseños recibidos.

Tramo 1. Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K2+980	7	1	1	BOX COULVERT
K4+200 – K4+400	200	5	0.15	PLACA HUELLA
K5+600 – K5+750	150	5	0.15	PLACA HUELLA
K6+900 – K7+050	150	5	0.15	PLACA HUELLA
K2+700	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
SERÁN PRIORIZADAS	4000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	3.1 Ha			Rocería a cada lado de la vía

Tramo 2. Versalles – San Pedrito

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K1+700 – K1+910	210	5	0.15	PLACA HUELLA
K3+400 – K3+550	150	5	0.15	PLACA HUELLA
K4+000 – K4+200	200	5	0.15	PLACA HUELLA
K5+680	6	0.9	0.9	Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K5+700	7	1	1	BOX COULVERT
SERÁN PRIORIZADAS	4000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	4 Ha			Rocería a cada lado de la vía

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SAN JOSÉ DE URÉ

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN JOSÉ DE URÉ

CONTRATO DE OBRA N° 056 DE 2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.096.689.836,00 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE URÉ
CONTRATISTA	**4L INGENIERÍA S.A.S.**, NIT. 901.144.628-1 R.L. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ PADILLA
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CALLE 35 # 8 A 4
PBX	3232862
CORREO ELECTRÓNICO	Jose.mor2012@hotmail.com
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 DE MARZO DE 2020
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° 056 de 2020, por la aseguradora suramericana, hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
2648705-3	Cumplimiento	14/08/2020	13/09/2021	$109.668.984,00	CONTRATO DE OBRA	24/07/2020
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/08/2020	14/08/2023	$219.337.967,00		
	Estabilidad de Obra.	14/08/2020	14/08/2025	$329.006.951,00		
	Calidad de los bienes y equipos suministrados	14/08/2020	14/08/2025	$5.754.104,00		
0703665-5	Responsabilidad civil	24/07/2020	23/01/2021	$175.560.600,00		

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 04 al 31 de agosto de 2020:

El día 4 de agosto de 2020, se dio orden de inicio al contrato de Interventoría por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se procedió a notificar al Municipio de San José de URÉ, con el fin de proceder con la suscripción de la orden de inicio del contrato de obra, la cual se suscribió el día 14 de agosto de 2020.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido al COVID – 19, se elaboró por parte del contratista, la elaboración de los protocolos de bioseguridad para el COVID-19, los cuales a la fecha del presente informe no cuentan con el aval correspondiente de la ARL.

De la misma forma se emiten las pólizas del contrato de obra, las cuales hubo que ajustar acorde al convenio 551 de 2020 suscrito entre el Municipio de San José de URÉ y el INVIAS, en cuanto a los amparos y porcentajes de los mismos, se realizan los ajustes correspondientes y se actualizan acorde al acta de inicio.

Se entrega la programación del proyecto por parte del contratista, la cual se solicitó ajustar incluyendo el mes de estudios y diseños.

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

AVANCE FÍSICO			AVANCE EN TIEMPO			AVANCE FINANCIERO		
CORTE A:			lun. 31 ago. 20			CORTE A:		lun. 31 ago. 20
	%	INVERSIÓN		%	Días		%	VALOR
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	0,00%	$ -	TIEMPO CONTRATADO:	100%	210	PRESUPUESTO CONTRATO	100%	$ 1.096.689.836,00
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	0,00%	$ -	TIEMPO EJECUTADO:	8,57%	18	ACUMULADO ACTAS	0,00%	$ -
POR EJECUTAR	100,00%	$ 1.096.689.836,00	TIEMPO POR EJECUTAR:	91,43%	192	POR PAGAR EN ACTAS	100,00%	$ 1.096.689.836,00
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	$ -	ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	-			



El avance de obra se encuentra en ceros debido a que el contrato de obra se encuentra en etapa de Estudios y Diseños, el cual finaliza en el primer mes de ejecución el cual se vence el 14 de septiembre.

Otras actividades realizadas

Se realizó revisión a las hojas de vida del personal postulado para el contrato de obra, los cuales una vez verificado cada uno de los perfiles la interventoría hizo llegar el siguiente resumen al contratista mediante el oficio C. Int – 027 – 2020 de fecha 25 de agosto de 2020:

SITUACIÓN A VERIFICAR	ACCIÓN VERIFICABLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1.	Presentación de plan de calidad	X			
2.	Plan de manejo de Transito	X			
3. Información sobre el personal profesional	Ingeniero Civil con Estudios de especialización en gerencia		X		Aporta Hoja de vida y documentos del señor RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, ingeniero civil, con especialización en gerencia de proyectos, SOLAMENTE APORTA UNA CERTIFICACIÓN LABORAL Y SON MINIMO DOS, por lo cual NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA
	Ingeniero Civil con estudios de especialización en vias y transporte		X		Aporta Hoja de vida y documentos de la señora ANA MARIA LAKAH NOVA, ingeniera civil, con especialización en Vias y Transporte. SOLAMENTE APORTA UNA CERTIFICACIÓN LABORAL Y SON MINIMO TRES, por lo cual NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA
	Tecnico SGSST	X			Aporta Hoja de vida y documentos de la señora JOHANIS VASQUEZ PADILLA, Ingeniera Industrial con Tecnico en higiene y seguridad industrial, CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA.
	Profesional en trabajo social o sociólogia		X		NO APORTA - NO CUMPLE
	Ingeniero Civil con Especialización en Gerencia de Proyectos o con certificado PMP, profesional 100% para cumplimiento de puntos en licitación.		X		NO APORTA - NO CUMPLE
4. Posibles Fuentes de materiales para el proyecto	Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoria, previo inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones tecnicas establecidas para evitar impactos ambientales, iguamnete se obliga a cumplir las normativa ambiental y minera aplicable a la		X		NO APORTA - NO CUMPLE
5.	Programación de Obra	X			Se Aporta, se debe corregir incluyendo el mes de estudios y diseños.
6.	Programa de Inversiones Semanal		X		No aporta
7.	Flujo de Caja		X		No aporta
8.	Equipo Minimo Requerido		X		Se debe incluir
9.	Apus	X			

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 4 al 31 de agosto de 2020, se han llevado a cabo las siguientes actividades, las cuales están sujetas a la supervisión y control por parte de esta interventoría:

- Se realizaron reuniones virtuales previas al inicio del contrato con la finalidad de establecer los lineamientos de inicio del mismo, se realizaron reuniones los días 15 de Julio de 2020 y el 22 de Julio de 2020, en las cuales se tocaron varios temas en cuanto al cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre Alcaldía e INVIAS.
- Se radicó ante el INVIAS mediante documento C Int-007-2020 el protocolo de bioseguridad de interventoría aprobado por la ARL.
- Se realizó visita inicial de reconocimiento al proyecto el día 18 de agosto de 2020, en la cual se realizaron los recorridos de los dos tramos del proyecto, Versalles – Brazo Izquierdo y Versalles – San Pedrito.
- En la vereda Versalles no hay acceso vehicular, únicamente acceso peatonal y de motocicletas en razón a que el puente de ingreso a la Vereda sufrió un desplome por creciente del río.

  De esta manera el día de la visita inicial no fue posible tener acceso al tramo Versalles – San Pedrito, ya que este sector no tiene ningún tipo de acceso diferente al de tracción animal, hubo que reprogramar la terminación de esta visita para el día 25 de agosto de 2020.
- En el tramo Versalles – Brazo Izquierdo se realizó el recorrido detectando las obras a realizar y los tramos de placa huella a construir.
- Se solicitará por parte de la Alcaldía Municipal el traslado de los recursos estimados en el tramo Versalles – San Pedrito para el otro sector, ya que en este tramo actualmente no hay acceso para vehículos ni motocicletas, en la visita realizada no fue posible detectar una rasante de la vía ni las obras existentes indicadas en la ficha del proyecto.
- Se realiza toda la verificación documental de las pólizas del contrato, solicitando las correcciones pertinentes al contratista de obra y Alcaldía Municipal, donde se garantizan que las mismas estén acorde con lo estipulado en el convenio Alcaldía – Municipio y posteriormente actualizadas según acta de inicio del contrato.
- Mediante oficio No C Int-022-2020 se comparten los links de la página de Invias a cada contratista para la descarga de toda la documentación técnica del proyecto para la etapa de estudios y diseños.

- Mediante documento C Int-024-2020 se dan los lineamientos generales para la etapa de estudios y diseños y los entregables de cada capítulo, con la finalidad informativa para el contratista de obra y su implementación en esta etapa.
- Se radican los informes semanales 1, 2 y 3 correspondientes al período del presente informe mediante comunicados C. Int-030; C. Int-031 y C. Int-032, posteriormente se procede a realizar el cargue en la plataforma CIFRA del Instituto.
- En cuanto al cumplimiento del componente ambiental se emite comunicado No C. Int-036 en el cual se le reitera al contratista de la elaboración e implementación del PAGA acorde con los lineamientos del INVIAS y se detallan los formatos a diligenciar previos al inicio de la fase de implementación en obra.
- Se realizó la revisión a las hojas de vida entregadas por el contratista de obra, hubo que realizar varios ajustes a las mismas ya que presentaban algunas inconsistencias, el contratista está realizando los ajustes correspondientes.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE AGOSTO DE 2020:

VALOR PROGRAMADO (BÁSICO DE OBRA)	$0,00	0%
VALOR EJECUTADO	$0,00	0%

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños.

AVANCE FÍSICO DEL MES DE AGOSTO DE 2020:

PROGRAMADO	0.87%
EJECUTADO	0.00%

La programación corresponde a la entrega de estudios y diseños, la cual hasta la fecha el contratista se encuentra adelantando.

AVANCE PREDIAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Mediante comunicado SRT 26281de fecha 22 de julio de 2020, se dio aprobación a hojas de vida de Especialistas y director de interventoría del Consorcio Interventorías 2020.
- Mediante comunicado SRT 28422 de fecha 04 de Agosto de 2020, se da el acta de inicio al Consorcio Interventorías 2020.
- Mediante comunicado DT-COR 29506 de fecha 12 de agosto de 2020, se solicita diligenciar formatos para permisos de transitabilidad.
- Mediante comunicado DT-COR 30097 de fecha 16 de agosto de 2020, se emite el certificado de transitabilidad.
- Mediante comunicado DT-COR 32012 de fecha 27 de agosto de 2020, se devuelve plan de cargas y la proyección de actas de visita técnica inicial a interventoría para realizar los ajustes necesarios.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** 8

CONTRATO DE OBRA No.: 056 DE 2020
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: SIETE (7) NESES
FECHA DE INICIACION: 14 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.096.689.836,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.096.689.836,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 0,5
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:		$ 1.096.689.836,00		$ 1.096.689.836,00	0,00		1	0,000
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.096.689.836,00
Total	$ 1.096.689.836,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,50	0,07	6,5	$ 1.096.689.836,00	0	$ 1.096.689.836,00	$ 1.096.689.836,00
Interventor:	$ 24.231.664,17	1,00	0,14	6	$ 401.844.860,83	0	$ 401.844.860,83	$ 401.844.860,83

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14/08/2020	13/09/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14/08/2020	14/08/2023
Calidad de Estudios y Diseños	14/08/2020	14/08/2025
Estabilidad y Calidad de Obra	14/08/2020	14/08/2025

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	24/07/2020	23/01/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 24/07/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **CONTRATO No.** 056 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS **SECTOR:** SAN JOSE DE URÉ
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría Matrícula
Matrícula No. : 25202-097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: AGOSTO **CONTRATO DE OBRA No.** 056 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS **SECTOR:** SAN JOSE DE URÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **779 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	23			24	25	26	27	28	29			30	31	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 8 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRAMO VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTO DEL CRISTAL

SECTOR: SAN JOSÉ DE URÉ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	155		155	SRG	056 DE 2020	1.096.689.836,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.096.689.836,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JESÚS MARTINEZ PADILLA
Representante Legal
Matrícula No.: 22202311394 COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA		DE

FECHA	31	8	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: **056 DE 2020** **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 08 DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

SECTOR: SAN JOSÉ DE URÉ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco														24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	432
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11
(NO APLICA EN ESTE INFORME)

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 08 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTOS DEL CRISTAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

SECTOR: SAN JOSE DE URÉ

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre :
Director de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre : JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No. 25202-097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.8 INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No:** **PERIODO MES:** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	056 DE 2020	PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	PLAZO ACUMULADO:	0,5 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	13 DE MARZO DE 2021
SECTOR:	SAN JOSE DE URÉ	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.096.689.836,00	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTOS DEL CRISTAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
				-

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre
Director de Obra
Matrícula No.

Firma
Nombre JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.9 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.096.689.836,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.096.689.836,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.180.346,82

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.180.346,82

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 109.668.984,00	14	8	2020	13/09/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 219.337.967,00	14	8	2020	14	8	2023
Calidad de Estudios y Diseños	0,52%	$ 5.754.104,00	14	8	2020	14	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 329.006.951,00	14	8	2020	14	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2648705-3

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16%	$ 175.560.600,00	24	7	2020	23	1	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIA EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIO: 14/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** SIETE (7) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI____ X NO____ APROBADO: SI____ NO____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI____ NO____ APROBADO: SI____ NO____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

(NO APLICA)

- ✓ **Seguimiento Programa de Obra**

✓ **Seguimiento Programa de Inversiones.**
MINFRA-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-M-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31	AGOSTO	2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 056 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA S.A.S.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal (Indique la sub y fuente del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/08/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.096.689.836,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.096.689.836,00

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021				
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.665.280,00	0,152%	0,00%	% P	0,00%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100%
	$1.665.280,00	0,152%	$0	$ P		$832.640	$832.640								
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				96,00%
Relleno para estructuras con recebo	$2.308.350,00	0,210%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%				
				$ P				$1.154.175	$1.154.175						
	$2.308.350,00	0,210%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				90,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$19.633.878,60	1,790%	0,00%	% P	0,00%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P		$19.633.879									
	$19.633.878,60	1,790%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				84,00%
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	$2.039.509,50	0,186%	0,00%	% P	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P		$1.019.755	$1.019.755								
	$2.039.509,50	0,186%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				78,00%
Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$24.523.125,00	2,236%	0,00%	% P	0,00%	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P		$24.523.125									
	$24.523.125,00	2,236%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				72,00%
Subbase Granular Clase C	$164.557.749,60	15,005%	0,00%	% P	0,00%	3,22%	4,29%	0,00%	3,22%	4,29%	0,00%				
				$ P		$35.262.375	$47.016.500		$35.262.375	$47.016.500					
	$164.557.749,60	15,005%	$0	$ E											
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				66,00%
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.565.776,00	0,416%	0,00%	% P	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%				
				$ P		$1.141.444	$1.141.444		$1.141.444	$1.141.444					
	$4.565.776,00	0,416%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				60,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$266.311.405,50	24,283%	0,00%	% P	0,00%	2,70%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00%				
				$ P		$29.590.156	$59.180.312	$59.180.312	$59.180.312	$59.180.312					
	$266.311.405,50	24,283%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				54,00%
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.025.073,10	8,574%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	1,43%	1,91%	1,91%	1,91%	1,43%				
				$ P			$15.670.846	$20.894.461	$20.894.461	$20.894.461	$15.670.846				
	$94.025.073,10	8,574%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				48,00%
Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$248.219.961,00	22,634%	0,00%	% P	0,00%	1,04%	2,08%	5,37%	5,37%	5,37%	2,79%				
				$ P		$11.411.268	$22.822.536	$61.138.902	$61.138.902	$61.138.902	$30.569.451				
	$248.219.961,00	22,634%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				42,00%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$187.667.421,30	17,112%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%				
				$ P				$46.916.855	$46.916.855	$46.916.855	$46.916.855				
	$187.667.421,30	17,112%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				36,00%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$378.986,00	0,035%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,02%	0,00%	0,00%				
				$ P				$189.493	$189.493						
	$378.986,00	0,035%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				30,00%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$45.600.000,00	4,158%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00%				
				$ P				$15.200.000	$15.200.000	$15.200.000					
	$45.600.000,00	4,158%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				24,00%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.228.653,00	0,477%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,36%				
				$ P						$1.307.163	$3.921.490				
	$5.228.653,00	0,477%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				18,00%
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$19.180.346,82	1,749%	0,00%	% P	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P	$19.180.347										
	$19.180.346,82	1,749%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				12,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.784.321,00	0,983%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,00%				
				$ P						$10.784.321					
	$10.784.321,00	0,983%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				6,00%
Etapa de cierre financiero				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P											
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.096.689.836,42														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.096.689.836,42														

		1	2	3	4	5	6	7			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,75%	11,25%	13,47%	18,66%	21,98%	24,03%	8,83%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.180.346,82	$ 123.414.641,43	$ 147.684.032,49	$ 204.674.198,35	$ 241.078.017,26	$ 263.379.958,48	$ 97.078.641,59			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,75%	13,00%	26,47%	45,13%	67,11%	91,15%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.180.346,82	$ 142.594.988,25	$ 290.279.020,74	$ 494.953.219,08	$ 736.031.236,35	$ 999.611.194,83	$ 1.096.689.836,42			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)					$ -	$ -	$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
MA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PACA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.096.689.836,42
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ 1.096.689.836,42

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada CPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada CPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el 'Valor básico de obra programada'.
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por CPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma:
Nombre: JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Aprueba Firma
Nombre :
Jefe unidad ejecutora
Matrícula:

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.:

✓ ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MINFRA-MN-IN-14-FR-1

No se generaron actas de comité durante el presente mes.

✓ **Acta de Reunión**

MINFRA-MN-IN-1-FR-4

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	15	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓNTERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 **DE** 2020 MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

CONTRATO DE OBRA No. 56 **DE** 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002 **DE** 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE (SAN JOSE DE URE, VALENCIA Y PUERTO LIBERTADOR) EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
INVIAS		
DIEGO JOSE ABAD	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA	INVIAS
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	INVIAS
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	SUPERVISORA PROYECTO	INVIAS-TERRITORIAL CORDOBA
INTERVENTORIA		
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESPECIALISTA HIDRAULICO Y AMBIENTAL	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
MUNICIPIO DE VALENCIA		
MAURICIO PINEDA OTERO	ASESOR DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALENCIA
MARIA LUISA ARDANA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALENCIA
JHON CARLOS VIDAL	CONTRATISTA VALENCIA	TVP MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR		
YINA RAMOS MONTIEL	APOYO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO LIBERTADOR
PEDRO OCHOA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	PUERTO LIBERTADOR
JOSE DANIEL COGOLLO	CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE		
JUAN CARLOS CERPA ARAMENDIS	ASESOR OFICINA PLANEACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE URE
JOSE FERNANDO MORALES HERNANDEZ	CONTRATISTA	4L INGENIERIA SAS
LUIS CARLOS RUIZ MEDRANO	RESIDENTE	4L INGENIERIA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Organizar cronograma de actividades para dar orden de inicio conjunta de los tres proyectos y programar temas preliminares (socializacion de proyectos, diseñar y socializar protocolos de bioseguridad tanto interventoria como contratista, revisar manejo de trafico, etc)

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Recursos para los protocolos de bioseguridad
Radicacion de Protocolos de bioseguridad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	15	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

Inicia la reunión el ingeniero Arturo Espitia por parte del INVIAS y da los lineamientos del día, se exponen las características de los proyectos y se manifiesta la ruta a seguir para el inicio de los mismos, se consulta por parte del Ing Mauricio Pineda de la Alcaldía de Valencia sobre presupuesto para implementación de protocolos de bioseguridad, a lo cual el Ing Diego Abad Director Territorial Cordoba manifiesta que inicialmente no se pueden destinar recursos del proyecto para tal fin y se debe hacer la consulta al DNP y ellos deben dar su aprobación para dicha destinación, que cada contratista debió estimar dentro de la elaboración de su oferta dichos costos, de la misma forma el Ingeniero Arturo Espitia manifiesta que se debe generar la solicitud al OCAD para tales recursos. Se manifiesta por parte del Ing Mauricio Pineda que se realizó un requerimiento al Invias en tal sentido, se le solicita el radicado de dicha comunicación por parte del Invias y se manifiesta por parte del Instituto que el correo atencionciudadano@invias.gov.co es el correo oficial para cualquier tipo de requerimiento o comunicación con la entidad.

Manifiesta el Arq Juan Carlos Cerpa por parte de la Alcaldía de San José de Ure que dicho proceso de modificación en el presupuesto para la inclusión de estos recursos no es tan fácil y que requiere de un cambio en los convenios de cada municipio con el INVIAS, por lo tanto sugiere que cada Alcaldía lo maneje internamente con cada contratista o cargarlo a una parte de los imprevistos del contrato.

Continua el Ing Arturo Espitia manifestando el cronograma que debemos tener para dar inicio lo antes posible, hay que realizar urgente la radicación de protocolos ante las ARL respectivas ya que el trámite de aprobación por parte de éstas puede tardar, se debe ir coordinando la socialización de los proyectos con Alcaldías y revisión de documentos previos a inicio por parte de Interventoria.

Por parte de Interventoria manifiesta el Ing Juan Diego Jiménez que los plazos de ejecución de los contratos son de 7 meses dentro de los cuales hay un mes de revisión de estudios y diseños.

Se manifiesta por parte del Ingeniero Jhon Vidal contratista de Valencia que requiere un recorrido por el proyecto para aclarar el alcance de las intervenciones ya que lo estipulado en los anexos técnicos no concuerda con las necesidades del corredor a intervenir a lo que el Ing Diego Abad de INVIAS manifiesta que sin acta de inicio no se puede realizar recorridos con interventoria ni con INVIAS.

Se sugiere entonces por parte de la Alcaldía de Valencia si se puede realizar un protocolo para estudios y diseños y otro para el inicio de las obras a lo que se responde por parte del Ing Diego Abad que es buena idea y que se podría realizar de esta manera, con la finalidad de dar inicio lo antes posible.

Se pregunta por parte del Ing Diego Abad de INVIAS por el estado actual de los contratos de obra: por parte de la Alcaldía de Puerto Libertador manifiestan que están en el trámite de firma de contrato, por parte de las Alcaldias de San José de Ure y Valencia que los contratos ya están legalizados.

Se debe programar reunión de seguimiento en 8 días en horas de la tarde para revisar radicación de protocolos ante ARLs y fijar actas de inicio de los contratos.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLES**
Generar nueva reunion en la tarde (2pm)	**22 de Julio de 2020**	**INTERVENTORIA**
Allegar radicaciones de protocolo de seguridad a alcaldia e interventoria	**22 de Julio de 2020**	**CONTRATISTAS**

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22 (Día) 7 (Mes) 2020 (Año) 2:00 p. m.

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CORREO ELECTRONICO- TELEFONO	FIRMA
JUAN DIEGOJIMENEZ SERNA	**ryingenieria@gmail.com y proyectos@ryjingenieria.com Cel. 3212400302**	
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	jorge.ibarra@gmail.com	
ROLANDO ARTUROESPITIA BUITRAGO	**respitia@invias.gov.co Cel. 3105587521**	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	lipena@invias.gov.co	
MAURICIO PINEDA OTERO	**obraspublicas@valencia.com Cel. 3108200305**	
JHON CARLOS VIDAL	jhonkrlos1979@hotmail.com	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

		FECHA	15 (Día)	7 (Mes)	2020 (Año)

JUAN CARLOS CERPA ARAMENDIS	Cel. 3004579776	
JOSE FERNANDO MORALES HERNANDEZ	jose_mor2012@hotmail.com Cel. 3013711680	
JOSE DANIEL COGOLLO	camaveba@hotmail.com Cel.3187948418	
LUIS CARLOS RUIZ MEDRANO	lucato-6@hotmail.com Cel. 3004579776	
YINA RAMOS MONTIEL	ramosmontiel.yinasofia@gmail.com Cel. 3147744097	
MARIA LUISA ARDANA	obraspublicas@valencia-cordoba.gov.co	
DIEGO JOSE ABAD	dabad@invias.gov.co Cel. 3103656416	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
PEDRO OCHOA	secretariadeinfraestructura@puertolibertador-cordoba.gov.co	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	22	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓNTERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 **DE** 2020 MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

CONTRATO DE OBRA No. 56 **DE** 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002 **DE** 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE (SAN JOSE DE URE, VALENCIA Y PUERTO LIBERTADOR) EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
INVIAS		
DIEGO JOSE ABAD	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA	INVIAS
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	INVIAS
LAURA ISABEL APEÑA GARCIA	SUPERVISORA PROYECTO	INVIAS-TERRITORIAL CORDOBA
INTERVENTORIA		
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESPECIALISTA HIDRAULICO Y AMBIENTAL	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
MUNICIPIO DE VALENCIA		
MAURICIO PINEDA OTERO	ASESOR DE OBRAS	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALENCIA
JHON CARLOS VIDAL	CONTRATISTA VALENCIA	TVP MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR		
YINA RAMOS MONTIEL	APOYO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUERTO LIBERTADOR
PEDRO OCHOA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	PUERTO LIBERTADOR
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE		
JUAN CARLOS CERPA ARAMENDIS	ASESOR OFICINA PLANEACION	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE URE
LUIS CARLOS RUIZ	CONTRATISTA SAN JOSE DE URE	4L INGENIERIA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializacion de radicación ante ARL`s de protocolos de Bioseguridad y PAPSO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Avance en radicacion de protocolos de Bioseguridad
Radicación de documentos previos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	22	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

Inicia la reunión el ingeniero Arturo Espitia por parte del INVIAS solicitando información de protocolos radicados ante la interventoria.

Responde interventoria que de Valencia y Puerto Libertador ya se radicaron protocolos, ante las ARL`s respectivas, falta San José de Ure por radicar.

Se realiza observación por parte de la Interventoria respecto de la documentación enviada del protocolo de Valencia, en el cual hace falta por radicar el PAPSO, el contratista se compromete a remitirlo el día de hoy mismo.

El ingeniero Arturo Espitia menciona el mantener un seguimiento constante ante los recibidos de cada ARL y subsanar lo antes posible cualquier observación para dar inicio a los contratos.

Se sugiere por parte de la interventoria que mediante AVAL o recibido de ARL se de inicio a los contratos, debido a que no se tiene presente que emitan un documento especifico aprobando los protocolos.

Lo cual es aceptado por el Ingeniero Arturo Espitia, para dar continuidad, adicionalmente solicita información del estado de contratistas para dar inicio a los contratos.

Interventoria responde que ya solicito los requisitos previos a los contratistas por medio de correo electronico los cuales se encuentran especificados en los anexos tecnicos de cada proceso de contratación (hojas de vida, equipo minimo, puntos en pliegos, etc).

El ingeniero Jhon carlos Vidal solicita reuniones aparte por contratos y solicita aclaracion del alcalce del proyecto.

A lo cual responde el ingeniero Diego Jose Abad y el ingeniero Arturo Espitia que el alcance esta claro en los estudios previos y en el anexo tecnico.

Interventoria solicita la firma del acta de inicio para realizar un recorrido lo mas pronto posible para verificacion de cantidades de obra, debido a que se tienen dudas por parte de contratistas de las verdaderas cantidades y los diseños de vias.

La poliza del municipio de San Jose de Ure contiene observaciones por parte juridica.

Se solicita radicar el protocolo de Interventoria ante las alcaldías respectivas, ya que son autoridad en el desarrollo de los proyectos.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLES**
Entrega de documentos previos	24 DE JULIO DE 2020	CONTRATISTAS
Radicación de protocolo de bioseguridad a Alcaldia	24 DE JULIO DE 2020	CONTRATISTA SAN JOSE DE URE
Allegar a interventoria contratos, registros presupuestales y polizas	24 DE JULIO DE 2020	CONTRATISTAS
Solucionar observaciones de Poliza	24 DE JULIO DE 2020	CONTRATISTA SAN JOSE DE URE
Informe de avances	28 DE JULIO DE 2020	INTERVENTORIA
Revision y aprobación de hojas de vida de interventoria	24 DE JULIO DE 2020	INVIAS
Radicar protocolo de bioseguridad ante Alcaldias	23 DE JULIO DE 2020	INTERVENTORIA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 29 (Día) 7 (Mes) 2020 (Año) 2:00 p. m.

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CORREO ELECTRONICO- TELEFONO**	**FIRMA**
JUAN DIEGOJIMENEZ SERNA	**ryingenieria@gmail.com y proyectos@ryjingenieria.com Cel. 3212400302**	
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	jorge.ibarra@gmail.com	
ROLANDO ARTUROESPITIA BUITRAGO	**respitia@invias.gov.co Cel. 3105587521**	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	lipena@invias.gov.co	
MAURICIO PINEDA OTERO	**obraspublicas@valencia.com Cel. 3108200305**	
JHON CARLOS VIDAL	jhonkrlos1979@hotmail.com	
LUIS CARLOS RUIZ		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

			FECHA	22 (Dia)	7 (Mes)	2020 (Año)

JUAN CARLOS CERPA ARAMENDIS	Cel. 3004579776	
YINA RAMOS MONTIEL	ramosmontiel.yinasofia@gmail.com Cel. 3147744097	
DIEGO JOSE ABAD	dabad@invias.gov.co Cel. 3103656416	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
PEDRO OCHOA	secretariadeinfraestructura@puertolibertador-cordoba.gov.co	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	24	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 **DE** 2020 MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

CONTRATO DE OBRA No. 56 **DE** 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. PENDIENTE **DE** 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE (SAN JOSE DE URE, VALENCIA Y PUERTO LIBERTADOR) EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
INVIAS		
DIEGO JOSE ABAD	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA	INVIAS
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	INVIAS
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	SUPERVISORA PROYECTO	INVIAS-TERRITORIAL CORDOBA
JOSE GUILLERMO VILLATE CAMARGO	LIDER OCAD	OCAD PAZ
INTERVENTORIA		
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Documentacion preliminar y definir orden de inicio de los contratos

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Documentación previa, y revision de diseños
Anticipos a Municipios
Radicación y revision de permisos ambientales
Acta de inicio
Socializacion de contratos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	24	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

Habla el ingeniero Juan Diego Jimenez de Interventoria sobre falta de informacion de polizas, ya se recibieron estudios previos los cuales se iniciaran a revisar.

Poliza de Valencia en revision, la poliza de San Jose de Ure la va solicitar el ingeniero Arturo Espitia entre el lunes y el presente dia y por ultimo Puerto Libertador tambien quedo de entregarla esta semana, por lo cual hay que realizar seguimiento a la entrega de estas polizas.

Ya aprobaron las hojas de vida de interventoria por parte del Invias.

Manifiesta Jose Guillermo Villate que se debe revisar si los municipios tienen anticipo, ya que se debe realizar el desembolso a una cuenta que manejará firmas conjuntas con Interventoria, por lo tanto se deben remitir los documentos de la persona que firmará por parte de la Interventoria que será el Rep Legal, Juan Diego Jiménez Serna

Jose Guillermo Villate habla de tres desembolsos que se realizan a los municipios, un 30%, un 50% restante Vs avance de 50% y un 20% contra entrega.

San jose de ure y valencia no definieron Anticipo comenta el ingeniero Arturo Espitia.

En puerto Libertador se manejará un anticipo según el Ing Arturo.

Dentro del convenio, queda claro que los permisos ambientales son por cuenta del municipio, entonces es necesario ir hablando con los municipios para realizar visita de obra y verificar los lugares donde se realizaran los BOX COULVERT, con el fin de establecer que documentos se necesita para los permisos ambientales, la revision de estudios y diseños y establecer un acta de mayores y menores el cual debe entrar a revisar la interventoria.

En caso de que las cantidades sean mayores menciona el ingeniero Jose Guillermo, que el municipio debe responder por todo ya que eso quedo estipulado en el convenio. Ademas en casos de que ya se encuentre construido el tramo o la ubicación futura de los Box Coulver sea diferente debe ser actualizado en los estudios y diseños.

En caso de que el municipio quiera ubicar en una abscisa diferente el Box Coulver o mover la placa huella algunos kilometros, se debe soportar técnicamente dicha desición con el aval de Interventoria.

Para el mantenimiento de vias estara un personal con los emprendedores de las juntas de accion comunales de acuerdo a la cartilla de COLOMBIA RURAL que se compartiran. Pero en el caso de estos contratos esto ya esta incluido en los presupuestos, por lo cual el contratista debe contratar este personal para roceria, limpieza y demas con su dotación respectiva.

Se debe estipular muy claro el rubro de obras de compensación ambiental cómo se manejará, se debe definir con municipios y contratista.

Inquietud del especialista ambiental de interventoria: en caso de que los estudios que existen no sean los requeridos para los permisos ambientales que se debe hacer

Responde el ingeniero Jose Guillermo: que sebe empezar tramite con la documentacion que existe y cuando el ente ambiental solicita los estudios definitivos se le hacen llegar los diseños aprobados ya por la interventoria y contratista de obra. Lo cual ya esta establecido por el convenio, donde el municipio se hara cargo de dichos costos.

Existe un formato de inversiones ambientales que debe llenar el contratista que se debe hacer en este caso pregunta el ingeniero ambiental, a lo cual responde el ingeniero jose que eso hara parte del municipio, pero adicionalmente el contratista tambien debe implementar el paga y tener su profesional ambiental. Pero de acuerdo al convenio la responsabilidad de estos permisos es de la Alcaldía, como dice en el PARAGRAFO 3 del convenio.

Ya se solicito acompañamiento de gestor social y ambiental por parte de INVIAS.

Revisar si es necesario entre interventoria y contratista el solicitar permisos ambientales y cuales son necesarios ante la entidad pertinente.

Lo ideal para dar inicio a la obra es tener por lo menos un contrato firmado y legalizado, sin embargo con Valencia y Puerto Libertador es posible que la siguiente semana ya esten listos y con esto se pueda dar inicio a la interventoria tambien.

La proxima semana se debe ratificar a los contratistas la entrega de la documentación previa solicitada en el comité del pasado miércoles 22 de Julio, protocolos, hojas de vida, etc.

Para la socializacion de los proyectos es necesario realizar varias reuniones para mantener distanciamientos y lo reglamentario por la Pandemia las cuales deben realizarse por la interventoria y los contratistas.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLES**
Entregar documentación de Interventoria para firma de cuentas conjuntas	**27 de Julio de 2020**	**Interventoria**
Reiterar a los contratistas entrega de documentación faltante	**24 de Julio de 2020**	**Interventoria**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	24	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CORREO ELECTRONICO - TELEFONO	FIRMA
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	ryingenieria@gmail.com y proyectos@ryjingenieria.com Cel. 3212400302	
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	jorge.ibarra@gmail.com	
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO	respitia@invias.gov.co Cel. 3105587521	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	lpena@invias.gov.co	
DIEGO JOSE ABAD	dabad@invias.gov.co Cel. 3103656416	
JOSE GUILLERMO VILLATE CAMARGO	jvillate@invias.gov.co	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 18 (Día) Ago (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA.** **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA**

En San Jose de Uré. (Indique en este espacio el lugar de reunión) se reunieron José Fernando Morales (Autorizado Contratista de Obra), (Residente de Obra), Juan Diego Jimenez Serna (Director de Interventoría)

Diego José Abad Durango (Director Territorial - INVÍAS) Laura Isabela Peña García (Supervisor Contrato de Interventoria - INVÍAS) Juan Carlos Cerpa (Asesor Externo oficina de Planeación Municipal),

Jorge Eliecer Ibarra (Esp Hidraúlico y Ambiental) y Franklin Leandro Osorio Cano (Esp Estructuras)
(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de obra No. 56 de 2020

y de Interventoría No. 779 de 2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO, IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: TRAMO 1: Versalles - Brazo izquierdo - Alto del cristal y TRAMO 2: Versalles - San Pedrito
(Sectores de la ejecución de la obra según alcance del contrato)

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA: **SIETE (7) MESES**
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: **14** (Día) **DE** **AGOSTO** (Mes) **DE** **2020** (Año) (Oficio No. C Int 018 2020)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: **13** (Día) **DE** **MARZO** (Mes) **DE** **2021** (Año)

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO): $ 1.096.689.836,00
(Valor Total del contrato de obra en números)

CONTRATISTA DE OBRA: 4L INGENIERIA SAS
(Nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020.
(Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen totalmente la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:

1. Estudios y Diseños:

1.1 El Contratista manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.

1.2. El Contratista desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste.

Se manifiesta por parte del contratista que posee la información de estudios y diseños, dispondrá esta semana de comisión
Se deberá consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema SIG de la entidad para implementar su compatibilidad con el proyecto.

2. Programa de Obra.

Se recibió por parte de Interventoria, se debe incluir el mes de estudios y diseños.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	18	Ago	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

3. Programa de Inversiones.

Se entregará el Viernes 21 de Agosto de 2020.

4. Anticipo.

No Aplica

5. Flujo de Caja.

Se entregará el Viernes 21 de Agosto de 2020.

6. Requisitos Sociales.

Se contactó con el Presidente de la Junta de Acción Comunal el día de hoy, Sr José Londoño Arroyave.
Se manifiesta por parte del Arq Cerpa de la Alcaldía que se debe coordinar la reunión en Versalles preferiblemente, el Ing Diego Abad manifiesta que debe ser mejor en cada vereda, por motivos de evitar aglomeraciones.
Se concluye que previo a la reunión de socialización se establecerá la mejor forma de hacerlo y se acordará entre las partes para su mejor desarrollo.

7. Requisitos Ambientales.

Se manifiesta por parte del Ing Jorge Ibarra Esp Ambiental de Interventoria que se envió comunicado días atrás respecto del cumplimiento de la elaboración del PAGA por parte del contratista.
El costo de la implementación del PAGA está incluido dentro de la Administración del proyecto y costos unitarios del proyecto.
Se sugiere buscar una persona que tenga ya experiencia con el manejo de contratos INVIAS para su implementación.

8. Equipos, plantas, etc.

Las fuentes de material deben estar licenciadas, se deberá emitir un comunicado por parte del contratista de qué fuentes de material utilizará para el proyecto.
Se deberá verificar y aprobar por parte de la Interventoria

9. Personal, Campamento, logística, señalización temporal, vallas, etc.:

Se remitió a Interventoría documentos con hojas de vida del proyecto, está en revisión.
El personal, campamento, logística y señalización temporal se evaluará una vez se vayan a iniciar las actividades físicas de la obra.
Para el tema de la valla se deberá consultar el diseño y cumplimiento de esta de acuerdo a los requerimientos del convenio, se consultará a través del Gestor del proyecto y se entregará al contratista la especificación.

10. Otros.

El Arq Cerpa manifiesta que el manejo de la información se maneje a través de un grupo de Whatsapp, se le manifiesta que ya se creó el día de hoy 18 de Agosto de 2020.
El Ing Luis Felipe Gonzalez Secretario de Planeación de San José de Uré manifiesta que el Arq Cerpa participará dentro del contrato en la toma de decisiones.
Revisar el tema de la información geográfica encontrada el día de hoy, ya que debe ajustarse a lo establecido inicialmente proyectado.
El recorrido al Tramo Versalles - San Pedrito no se pudo realizar por dificultades de ingreso, ya que era necesario trasnportarse en caballo, por lo cual se reprograma la visita.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

	FECHA	18 (Día)	Ago (Mes)	2020 (Año)

COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTERVENTORÍA:

1. Estudios y/o Diseños.

1.1. El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste.

Se establecerá contacto por parte de la Interventoria con la Subdirección de Estudios e Innovación.

2. Programa de distribución del personal.

Se entregará esta semana

3. Anticipo.

No aplica

4. Campamento, laboratorio, logistica, etc.

Se entregará una vez inicien las intervenciones físicas en el proyecto.

5. Otros.

La Seguridad Social se deberá pagar por el Consorcio o alguna empresa integrante del Consorcio, no es válido contratos de prestación de servicios

El correo electrónico para enviar cualquier notificación o solicitud es atencionciudadano@invias.gov.co

Se deberá enviar copia a la Territorial de todos los documentos que se emitan tanto a Invias Bogotá como a Alcaldías y Contratistas.

Gestionar pronto la apertura

5. DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha _____ el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

Se coordinará entre contratista e Interventoria la apertura de la bitácora ya que en la visita no asistió ni Director ni Residente de Obra.

OBSERVACIONES

1. Durante la visita de obra inicial no estuvo presente por parte del contratista de Obra, el Representante Legal, Director ni el Residente, se presentó el Sr. José Fernando Morales en su representación. A la reunion técnica inicial virtual no asistió el Director de Obra.
2. Por motivos de Salud, el supervisor de obra no puso asistir a la visita.
3. La reunion tecnica inicial se realizo de forma virtual a traves de la plataforma Teams, debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que atraviesa el pais.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:
Anexos (fotografias, video, etc.):

Firma

Nombre: José Fernando Morales
Autorizado firma Contratista
Matricula No.: 22202-143008 COR

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097497 CND.

Firma

Nombre: Felipe Gonzalez
Secretario de Planeación
Matricula No.:

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Firma

Nombre: Laura Isabela Peña García
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 22202 - 328524 COR

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Firma

Nombre: Diego José Abad Durango
Director Territorial
Matricula No. : 08202 - 093534 ATL.

Firma

Nombre: FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO.
Cargo ESPECIALISTA ESTRUCTURAS INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202 - 108791 ANT

Firma

Nombre: JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ
Cargo ESPECIALISTA HIDRAÚLICO Y AMBIENTAL INTERVENTORIA
Matricula No. : 22202 - 099845 COR


Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa)
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO
INTERVENTORIAS 2020.
NIT: 901.381.064-3

R&J Ingeniería Sas. MIGUEL ROBLES SAS


REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 18 de Agosto de 2020.
Visita: Inicial
Municipio: San Jose de Uré.

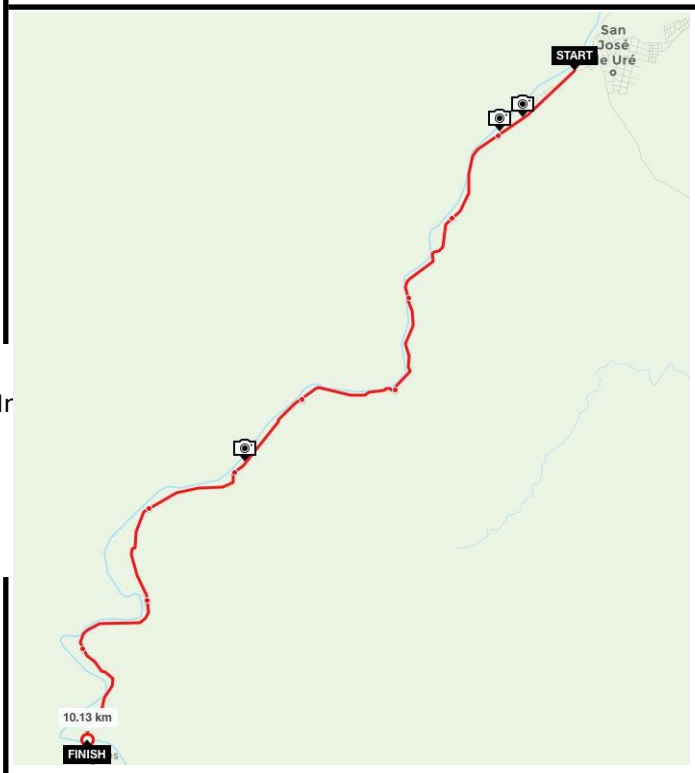

(Ir

(Supervis

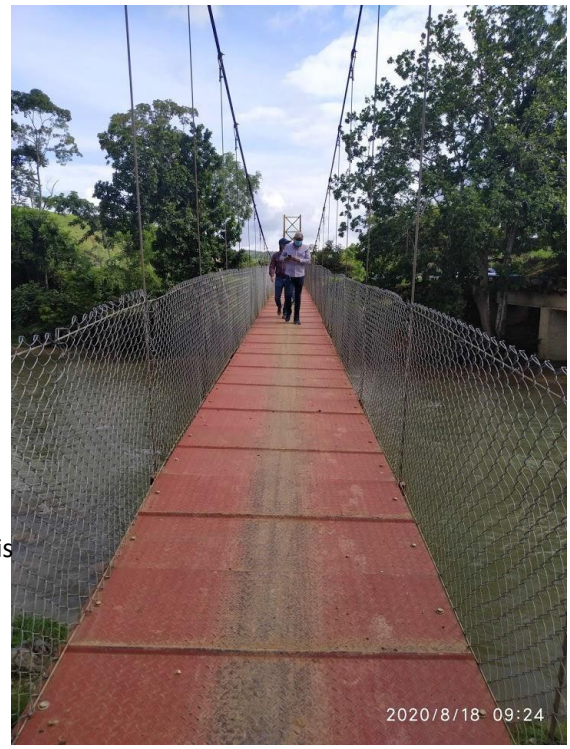

Recorrido de la cabecera Municipal de San José de Uré hasta la Vereda Versalles (10.13 Km), no hay acceso vehícular a la vereda, el ingreso de la comunidad es por el puente peatonal únicamente.



TRAMO 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal.

CONSORCIO
INTERVENTORIAS 2020.
NIT: 901.381.064-3

R&J Ingeniería Sas. MIGUEL ROBLES SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 18 de Agosto de 2020.
Visita: Inicial
Municipio: San Jose de Uré.



K2+980: Proyección de Box Coulvert.



Sitios críticos de la vía, se planea placa huella



Descripción: K 6 + 300



Descripción: Fin de la Via. K 10 + 000

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNION	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	8	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓNTERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 **DE** 2020 MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

CONTRATO DE OBRA No. 56 **DE** 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No. LP-MVP-002-2020 **DE** 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE (SAN JOSE DE URE, VALENCIA Y PUERTO LIBERTADOR) EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
INVIAS		
DIEGO JOSE ABAD	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA	INVIAS
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	INVIAS
LAURA ISABEL APEÑA GARCIA	SUPERVISORA PROYECTO	INVIAS-TERRITORIAL CORDOBA
JOSE GUILLERMO VILLATE CAMARGO	LIDER	OCAD PAZ
INTERVENTORIA		
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESPECIALISTA HIDRAULICO Y AMBIENTAL	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE		
JUAN CARLOS CERPA		ALCALDIA SAN JOSE DE URE
JOSE MORALES	AUTORIZADO POR CONTRATISTA	4L INGENIERIA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Translado de recursos al tramo VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO del tramo VERSALLES - SAN PEDRITO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Translado de recursos al tramo VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO del tramo VERSALLES - SAN PEDRITO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reitera la participación del director y/o residentes por parte del contratista de San Jose de Ure

Se habla de la visita a los dos tramos del contrato 056 de 2020 de San Jose de Uré, donde se cuenta que se pudo recorrer bien el tramo VERSALLES - ALTO DEL CRISTAL, pero en el tramo de VERSALLES - SAN PEDRITO, se tuvo inconveniente por que solo se podia recorrer a caballo, toco reprogramar visita y se logro recorrer el tramo teniendo inconvenientes, ya que la via se encuentra deteriorada completamente y no se logro evidenciar las obras a ejecutar. (Interventoria)

Habla Jose Morales de la dificultad de transporte en el tramo VERSALLES - SAN PEDRITO, ademas se cuenta con problemas de orden publico, por lo cual se solicita el translado de los recursos al otro TRAMO.

El ingeniero Jose Guillermo habla de consulta al ART donde solicitan por parte del municipio, contratista e interventoria, un informe completo para realizar el translado de los recursos al tramo VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTO DEL CRISTAL.

La justificación podria ser es que tiene poca población este tramo, ya que decir que son sobre costos no es valido, comenta el ingeniero Diego Abad, por lo cual solicita que se analice bien una justificación para el translado de recursos.

Queda el ingeniero Jose Guillermo Villate de hablar con los encargados sobre el porque de la priorización del tramo VERSALLES - SAN PEDRITO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

El tramite ante Ocad Paz, se necesita sustento tecnico, juridico y cuando ya se encuentre se debe allegar al ingeniero Jose Guillermo Villate, y mientras se realiza el ajuste informativo, se puede ir trabajando el otro tramo.

No se tiene abscisa de Gabion, si se tienen los metros claros, pero al no encontrarse tampoco en visita, se tiene que expresar en los estudios y diseños si se necesita o no y su respectiva ubicación.

Se necesita optimización de los estudios y diseños, realizando aprobaciones parciales.

Adelantar diseños en las zonas que se creen que se deberian intervenir

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
INFORME ESTADO DE VÍA	7 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ALCALDIA SAN JOSÉ DE URÉ - CONTRATISTA
REVISIÓN DE INFORME	8 DE SEPTIEMBRE DE 2020	INTERVENTORIA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 4 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año) 4:00 p. m.

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CORREO ELECTRONICO - TELEFONO	FIRMA
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	ryingenieria@gmail.com y proyectos@ryjingenieria.com Cel. 3212400302	
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	jorge.ibarra@gmail.com	
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO	respitia@invias.gov.co Cel. 3106587621	
LAURA ISABELA PEÑA GARCIA	lipena@invias.gov.co	
DIEGO JOSE ABAD	dabad@invias.gov.co Cel. 3103656416	Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
JOSE GUILLERMO VILLATE CAMARGO		
JUAN CARLOS CERPA ARAMENDIS	Cel. 3004579776	
JOSE MORALES		

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

✓ **INFORME SEMANAL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 14 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 1 del 04/08/2020 al 13/08/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: SIN INICIO

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 19.180.347,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X


MES FACTURADO: 1
VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ___ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO X	N/A	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 21 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **2** del 14/08/2020 al 20/08/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 8
VALOR FACTURA: $ 19.180.347,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X


MES FACTURADO: 1
VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

OBSERVACIONES: No se ha entregado por parte del contratista los datos de la fuente de materiales a utilizar para realizar la respectiva verificación por parte de la interventoria.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO X	N/A
EMISIONES:	SI ___	NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO X	N/A

OBSERVACIONES: No se ha entregado por parte del contratista información de permisos y/o licenciamiento ambiental para realiza r la respectiva verificación por parte de la interventora.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 28 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **3** del 21/08/2020 al 27/08/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.096.689.836,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 8

VALOR FACTURA: $ 19.180.347,00

FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 1

VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00


FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

OBSERVACIONES: No se ha entregado por parte del contratista los datos de la fuente de materiales a utilizar para realizar la respectiva verificación por parte de la interventoria.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO X	N/A
EMISIONES:	SI ___	NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO X	N/A

OBSERVACIONES: No se ha entregado por parte del contratista información de permisos y/o licenciamiento ambiental para realiza r la respectiva verificación por parte de la interventora.

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020

PUERTO LIBERTADOR

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

5. INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°1** correspondiente al periodo del 04 al 31 de agosto de 2020 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabel Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

El Acta de iniciación al contrato No. 056 de 2020, correspondiente al municipio de San José de URÉ, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista 4L INGENIERÍA S.A.S. la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ representado por el Secretario de Planeación Municipal.

El Acta de iniciación al contrato No. LP-MPL-002-2020, correspondiente al municipio de Puerto Libertador, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista CONSORCIO

MEJORAMIENTO VIALES, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR representado por el Secretario de Infraestructura.

El Acta de iniciación al contrato No. MV-LP-002-2020, correspondiente al municipio de Valencia, fue inscrita el día 13 de agosto de 2020 entre el contratista TVP MUNICIPIOS, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE VALENCIA representado por el Supervisor.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PUERTO LIBERTADOR

De acuerdo con el Convenio Interadministrativo N° 532 , suscrito entre el Municipio de Puerto Libertador y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural, el tramo PUERTO LIBERTADOR – PUERTO CAREPA – GILGAR donde la entidad entrara a construir 1000 metro de placa huella, dos Box Coulvert de 7 metros de longitud cada uno y construcción de alcantarillas. Con la cual esta importante zona rural del Municipio de Puerto Libertador, inicia de manera definitiva la solución a la grave problemática de movilidad existente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	
Puerto Libertador:	• Tramo N° 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgar

6.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PUERTO LIBERTADOR

El mejoramiento de vías en el Municipio de Puerto Libertador contempla el tramo Puerto Libertador – Puerto Carepa – Gilgar que se localiza en el costado oriental del municipio. El tramo N° 1 a mejorar se localiza en el K0+000 al K20+000, P.I. 7°53'05'' Latitud Norte y 75°42'38'' Latitud Oeste, P.F. 7°54'11'' Latitud Norte y 75°48'44'' Latitud Oeste.



Figura 4. Trazado Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgar
Fuente: Anexo Técnico Puerto Libertador

6.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario que realizo la el Instituto Nacional de Vías - INVIAS para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
Puerto Libertador	Tramo N° 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgar	1000,00	14,00

6.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que cumplirán con las características de diseño de construcción entregados por el municipio de Puerto Libertador, basados en las cartillas de construcción de INVIAS.

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K8+200	1	1	7	BOX COULVERT
K10+500	1	1	7	BOX COULVERT
K10+900 – K11+200	300	5	0.15	PLACA HUELLA
K17+400 – K17+700	300	5	0.15	PLACA HUELLA
K19+600 – K20+000	400	5	0.15	PLACA HUELLA
K7+900	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K10+300	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K11+200	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
SERÁN PRIORIZADAS	6000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	7.9 Ha			Rocería a cada lado de la vía

7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO LIBERTADOR

7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO LIBERTADOR

CONTRATO DE OBRA N° LP-MPL-002-2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.094.587.428,61 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE PUERTO LIBERTADOR
CONTRATISTA	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.,** NIT. 901.394.612-6 R.L. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ INTEGRANTES: • CASS INGENIERÍA S.A.S. (85% PARTICIPACIÓN) NIT. 900.111.0629-2 R.L. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ • CARLOS MANUEL VERGARA (15% PARTICIPACIÓN) C.C. 92.509.184
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CARRERA 17 # 15 – 54
CORREO ELECTRÓNICO	camaveva@hotmail.com
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 DE MARZO DE 2020
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° LP-MPL-002-2020, por la aseguradora Seguros del Estado S.A., hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
11-11-101154523	Cumplimiento del contrato	15/07/2020	15/08/2021	$109.523.185,90		
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	15/07/2020	15/02/2024	$328.569.557,70		

	indemnizaciones laborales				CONTRATO DE OBRA	13/08/2020
	Estabilidad y calidad de Obra.	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$328.569.557.70		
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15/07/2020	15/08/2021	$328.569.557.70		
11-40-101037181	Predios Labores y Operaciones	15/07/2020	15/02/2021	$328.569.557.70		

7.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 4 al 31 de agosto de 2020:
El día 4 de agosto de 2020, se dio orden de inicio al contrato de Interventoría por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se procedió a notificar al Municipio de Puerto Libertador, con el fin de proceder con la suscripción de la orden de inicio del contrato de obra, la cual se suscribió el día 14 de agosto de 2020.


Adicionalmente, y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido al COVID – 19, se elaboró por parte del contratista, la elaboración de los protocolos de bioseguridad para el COVID-19, los cuales a la fecha del presente informe no cuentan con el aval correspondiente de la ARL.

De la misma forma se emiten las pólizas del contrato de obra, las cuales hubo que ajustar acorde al convenio 532 de 2020 suscrito entre el Municipio de Puerto Libertador y el INVIAS, en cuanto a los amparos y porcentajes de los mismos, se realizan los ajustes correspondientes y se actualizan acorde al acta de inicio.

Se encuentra un error en el valor del contrato No LP – MPL – 002 – 2020, ya que la propuesta económica del contratista fue por otro valor, se manifiesta el inconveniente a la Alcaldía Municipal y procederán a realizar el Otrosí respectivo.

Se entrega la programación del proyecto por parte del contratista, la cual se solicitó ajustar incluyendo el mes de estudios y diseños.

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

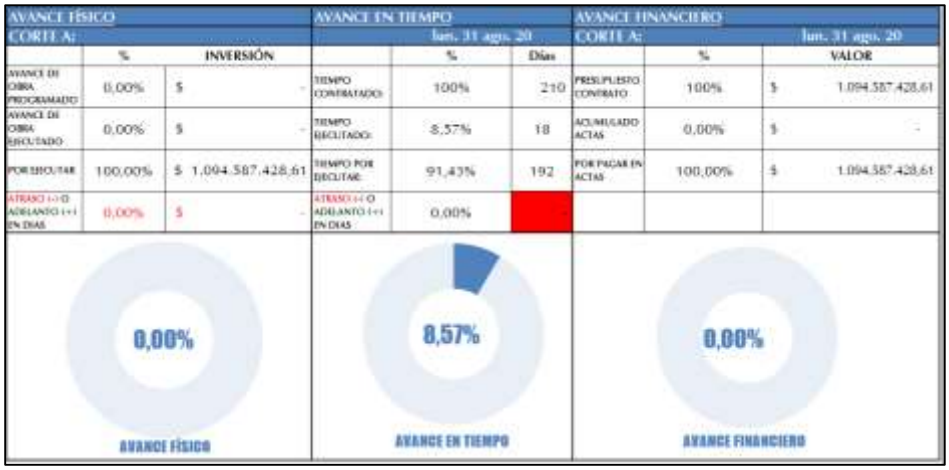

El avance de obra se encuentra en ceros debido a que el contrato de obra se encuentra en etapa de Estudios y Diseños, el cual finaliza en el primer mes de ejecución el cual se vence el 14 de septiembre.

Otras actividades realizadas

Se realizó revisión a las hojas de vida del personal postulado para el contrato de obra, los cuales una vez verificado cada uno de los perfiles la interventoría procedió a dar la aprobación al siguiente personal mediante el comunicado C. Int – 037 del 31 de agosto de 2020:

SITUACIÓN A VERIFICAR	ACCIÓN VERIFICABLE	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1.	Presentación de plan de calidad	X			
2.	Plan de manejo de Transito	X			
3. Información sobre el personal profesional	Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias - Especialista en Dirección de obras o Gerencia de Proyectos - Director de Obra.	X			Aporta Hoja de vida y documentos del señor CARLOS MANUEL VERGARA BARVO, ingeniero civil, con especialización en Gerencia y Dirección de obras.
	Ingeniero Civil o ingeniero de Transporte y Vias - Residente de obra.	X			Aporta Hoja de vida y documentos del señor JESUS DAVID QUINTERO DIAZ, ingeniero civil, con especialización en Gerencia y Dirección de obras.
	Profesional residente ambiental y social. 5 años de experiencia general contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional Acreditar experiencia especifica certificada en cargo similar con mínimo 12 meses.	X			Aporta Hoja de vida y documentos del Ing DAVID MANUEL SAEZ DIAS. Ingeniero Ambiental del 2009, y Esp en Gerencia del 2018. Cumple con 12 meses de Experiencia
	Profesional o tecnólogo para Seguridad y Salud en el Trabajo SST (SISO) con su respectiva licencia, quien coordinará junto con la ARL el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad; la verificación y el registro del Estado de Salud del personal operativo y administrativo dispuesto a la ejecución del contrato, asi como Exigir y verificar el cumplimiento del suministro de las Dotaciónes de Ley y de los elementos de Protección Personal y de los demás asociados al Riesgo Biológico (Tapabocas, guantes, antibacteriales, caretas,etc)	X			Aporta Hoja de vida y documentos de la señora KARINA ANDREA CORONADO ROJAS, Sociologa, Especialista en Salud Ocupacional.

De igual forma se recibieron por parte del contratista el plan de calidad, plan de manejo de tránsito, relación de maquinaria mínima del proyecto y análisis de precios unitarios, aprobando la documentación presentada como se evidencia en el cuadro anterior.

7.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

7.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

Para el período de ejecución del 4 al 31 de agosto de 2020, se han llevado a cabo las siguientes actividades, las cuales están sujetas a la supervisión y control por parte de esta interventoría:

- Se realizaron reuniones virtuales previas al inicio del contrato con la finalidad de establecer los lineamientos de inicio del mismo, se realizaron reuniones los días 15 de Julio de 2020 y el 22 de Julio de 2020, en las cuales se tocaron varios temas en cuanto al cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre Alcaldía e INVIAS.
- Se radicó ante el INVIAS mediante documento C Int-007-2020 el protocolo de bioseguridad de interventoría aprobado por la ARL.
- Se realizó visita inicial de reconocimiento al proyecto el día 19 de agosto de 2020, en la cual se detectaron las obras a realizar y los tramos a intervenir, en conjunto con funcionarios de la Alcaldía Municipal, INVIAS, contratista e Interventoría. Se verifica el tramo a ejecutar y los sectores de placa huella a realizar, un box coulvert para construir y las alcantarillas para realizar mantenimiento, queda pendiente por parte de la Alcaldía dar la ubicación de los sectores para realizar los muros en Gavión ya que dentro de la ficha técnica de la visita no se indican abscisas, de la misma forma la ubicación de 1 box Coulvert ya que de los estimados inicialmente uno se estima como no necesario.
- Se solicitará por parte de la Alcaldía Municipal el traslado de unos metros lineales de placa huella a otro sector, se legalizará mediante un comunicado para solicitar el aval y autorización al Instituto.
- Se realiza toda la verificación documental de las pólizas del contrato, solicitando las correcciones pertinentes al contratista de obra y Alcaldía Municipal, donde se garantizan que las mismas estén acorde con lo estipulado en el convenio Alcaldía – Municipio y

posteriormente actualizadas según acta de inicio del contrato., a la fecha del presente informe el contratista se encuentra a la espera del otro si con el cambio del valor del contrato de acuerdo a lo nombrado anteriormente.

- Mediante oficio No C Int-022-2020 se comparten los links de la página de Invias a cada contratista para la descarga de toda la documentación técnica del proyecto para la etapa de estudios y diseños.
- Mediante documento C Int-024-2020 se dan los lineamientos generales para la etapa de estudios y diseños y los entregables de cada capítulo, con la finalidad informativa para el contratista de obra y su implementación en esta etapa.
- Se radican los informes semanales 1, 2 y 3 correspondientes al período del presente informe mediante comunicados C. Int-030; C. Int-031 y C. Int-032, posteriormente se procede a realizar el cargue en la plataforma CIFRA del Instituto.
- En cuanto al cumplimiento del componente ambiental se emite comunicado No C. Int-036 en el cual se le reitera al contratista de la elaboración e implementación del PAGA acorde con los lineamientos del INVIAS y se detallan los formatos a diligenciar previos al inicio de la fase de implementación en obra.
- Se realizó la revisión a las hojas de vida entregadas por el contratista de obra, hubo que realizar varios ajustes a las mismas ya que presentaban algunas inconsistencias, el contratista corrigió y se aprobaron mediante documento C Inti – 037 – 2020.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE AGOSTO DE 2020:

VALOR PROGRAMADO (BÁSICO DE OBRA)	$0,00	0%
VALOR EJECUTADO	$0,00	0%

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños.

AVANCE FÍSICO DEL MES DE AGOSTO DE 2020:

PROGRAMADO	0.56%
EJECUTADO	0.00%

La programación corresponde a la entrega de estudios y diseños, la cual hasta la fecha el contratista se encuentra adelantando.

AVANCE PREDIAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Se encuentran descritas en la descripción del Municipio de San Jose de Uré

8. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

8.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** 8

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MPL-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

PLAZO INICIAL: SIETE (7) NESES
FECHA DE INICIACION: 14 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.094.587.428,61
VALOR ACUMULADO: $ 1.094.587.428,61
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 0,5
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:		$ 1.094.587.428,61		$ 1.094.587.428,61	0,00		1	0,000
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.094.587.428,61
Total	$ 1.094.587.428,61

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,50	0,07	6,5	$ 1.094.587.428,61	0	$ 1.094.587.428,61	$ 1.094.587.428,61
Interventor:	$ 24.231.664,17	1,00	0,14	6	$ 401.844.860,83	0	$ 401.844.860,83	$ 401.844.860,83

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	15/07/2020	15/08/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15/07/2020	15/08/2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15/07/2020	15/02/2024
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y Calidad de Obra	AMPARA 5 AÑOS	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	15/07/2020	15/02/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 13/08/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CORDOBA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: **AGOSTO** **CONTRATO No.** **LP-MPL-002-2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR

CONTRATISTA: **CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES** **SECTOR:** PUERTO LIBERTADOR
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																												
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora														I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Retroexcavadora sobre llantas														I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Vibro compactador														I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Volqueta de 6m3														I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202 - 097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: AGOSTO **CONTRATO DE OBRA No.** LP-MPL-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES **SECTOR:** PUERTO LIBERTADOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **779 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 -097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

MES INFORME MENSUAL: 8 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	265		265	SRG	LP-MPL-002-2020	1.099.979.936,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.094.587.428,61

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Director de Obra
Matrícula No.: 0820254648ATL



Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA		DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No **LP-MPL-002-2020** **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 08 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco														24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	432
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11 (NO APLICA EN ESTE INFORME)

8.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 08 DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. dias cotizados		Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados		

8.8. INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Dia) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No:** _____ **PERIODO MES:** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	LP-MPL-002-2020	PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	PLAZO ACUMULADO:	0,5 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	13 DE MARZO DE 2021
SECTOR:	PUERTO LIBERTADOR	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.094.587.430,00	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
				-

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Director de Obra
Matrícula No.: 0820254648ATL

Firma

Nombre JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

8.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.094.587.428,61

VALOR ACUMULADO: $ 1.094.587.428,61 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.520.193,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 109.523.185,90	15	7	2020	15/08/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 328.569.557,70	15	7	2020	15/08/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 328.569.557,70	15	7	2020	15	2	2024
Calidad de Estudios y Diseños			14	8	2020	14	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 328.569.557,70	AMPARA 5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **11-11-101154523**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 328.569.557,70	15	7	2020	15	2	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **11-40-101037181** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



Firma _____
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIA EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

FECHA DE INICIO: 14/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** SIETE (7) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ X NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: _____

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES: _____

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Director de Obra
Matrícula No.: 0820254648ATL

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

(NO APLICA)

- ✓ **Seguimiento Programa de Obra**

- ✓ **Seguimiento Programa de Inversiones.**

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MINTRA-MAN-IN-6-FR-1		
VERSION:	1		
FECHA	1	DE	1
FECHA	31	ACOSTO	2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MPL-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar (Indique (rutas) y tramo del (o)once del contrato según código ruta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/08/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.094.587.428,61 (según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.094.587.428,61

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las prórrogas con suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	$ Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7			
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		AGOSTO DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2020	OCTUBRE DE 2020	NOVIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2020	ENERO DE 2021	FEBRERO DE 2021			
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.873.421,52	0,171%	0,00%	% P	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P		$1.873.422								
	$1.873.421,52	0,171%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Relleno para estructuras con recebo	$2.407.949,77	0,220%	0,00%	% P	0,00%	0,13%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P		$1.605.300	$802.650							
	$2.407.949,77	0,220%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$20.245.804,19	1,850%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	1,48%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P			$16.196,643	$4.049,161						
	$20.245.804,19	1,850%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Concreto Clase F 14	$2.126.509,26	0,194%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P			$2.126.509							
	$2.126.509,26	0,194%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Acero de refuerzo de fy = 4,200 kg / cm2 (60.000 PSI)	$23.917.933,79	2,185%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	1,25%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P			$19.134.347	$4.783,587						
	$23.917.933,79	2,185%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Subbase Granular Clase C	$166.102.903,91	15,175%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,79%	7,59%	3,79%	0,00%			
				$ P				$41.525.726	$83.051.452	$41.525.726				
	$166.102.903,91	15,175%	$0	$ E										
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.736.243,77	0,433%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P				$4.736.244						
	$4.736.243,77	0,433%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$258.306.161,59	23,598%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,93%	15,73%	3,93%			
				$ P					$43.051.027	$172.204.108	$43.051.027			
	$258.306.161,59	23,598%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.618.577,96	8,644%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,76%	2,88%			
				$ P						$63.079.052	$31.539.526			
	$94.618.577,96	8,644%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Acero de refuerzo de fy = 4,200 kg / cm2 (60.000 PSI)	$224.126.984,93	20,476%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	15,36%	0,00%			
				$ P					$56.031.746	$168.095.239				
	$224.126.984,93	20,476%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$181.702.893,83	16,600%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,07%	5,53%			
				$ P						$121.135.263	$60.567.631			
	$181.702.893,83	16,600%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Gavion de malla en alambre de acero entrelazado clase 1	$42.303.071,81	3,865%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	2,58%			
				$ P						$14.101.024	$28.202.048			
	$42.303.071,81	3,865%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$580.433,22	0,053%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%			
				$ P							$580.433			
	$580.433,22	0,053%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$36.479.919,30	3,333%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%			
				$ P							$36.479.919			
	$36.479.919,30	3,333%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.866.851,76	0,536%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%			
				$ P							$5.866.852			
	$5.866.851,76	0,536%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$18.520.193,00	1,692%	0,00%	% P	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P	$18.520.193									
	$18.520.193,00	1,692%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.671.575,00	0,975%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	0,00%			
				$ P						$10.671.575				
	$10.671.575,00	0,975%	$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Etapa de cierre financiero				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
				$ P										
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.094.587.428,61													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.094.587.428,61													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,69%	0,32%	3,50%	5,03%	16,64%	53,98%	18,85%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 18.520.193,00	$ 3.478.721,37	$ 38.260.149,57	$ 55.094.717,34	$ 182.134.225,12	$ 590.811.985,87	$ 206.287.436,35						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,69%	2,01%	5,51%	10,54%	27,18%	81,15%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 18.520.193,00	$ 21.998.914,37	$ 60.259.063,93	$ 115.353.781,28	$ 297.488.006,40	$ 888.299.992,26	$ 1.094.587.428,61						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)				$ -	$ -	$ -	$ -						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.094.587.428,61
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.094.587.428,61

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada CPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada CPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por CPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma: Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 080254648ATL

Aprueba Firma: Nombre: LUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Aprueba Firma: Nombre:
Jefe unidad ejecutora
Matrícula:

Revisó Firma: Nombre: Matrícula No.

Revisó Firma: Nombre: Matrícula No.

Revisó Firma: Nombre:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

✓ ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MINFRA-MN-IN-14-FR-1

No se generaron actas de comité durante el presente mes.

✓ **Acta de Reunión**

MINFRA-MN-IN-1-FR-4

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	20	Ago	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

En Puerto Libertador (Indique en este espacio el lugar de reunión) se reunieron Carlos Vergara (Director de Obra), (Residente de Obra) Juan Diego Jimenez Serna (Director de Interventoría)

Diego José Abad Durango (Director Territorial - INVÍAS), Laura Isabela Peña García (Supervisor del Contrato de Interventoría - INVÍAS), Pedro Antonio Ochoa de la Ossa (Secretario de Obras públicas municipal)

Jorge Eliecer Ibarra Hernández (Esp Hidraúlico y Ambiental) y Franklin Leandro Osorio Cano (Esp Estructuras)

(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)

Con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de obra No. LP - MPL - 002 de 2020

y de Interventoría No. 779 de 2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO, IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: TRAMO: Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar.
(Sectores de la ejecución de la obra según alcance del contrato)

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA: **SIETE (7) MESES**
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: **14** (Día) **DE** **AGOSTO** (Mes) **DE** **2020** (Año) (Oficio No. C Int 020 - 2020)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: **13** (Día) **DE** **MARZO** (Mes) **DE** **2021** (Año)

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO): $ 1.094.587.428,61
(Valor Total del contrato de obra en números)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES
(Nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020.
(Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen totalmente la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:

1. Estudios y Diseños:

1.1 El Contratista manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.

1.2. El Contratista desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste.

Se manifiesta por parte del contratista que posee la información de estudios y diseños, dispondrá esta semana de comisión
Se deberá consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema SIG de la entidad para implementar su compatibilidad con el proyecto.

2. Programa de Obra.

Se recibió por parte de Interventoría, se debe incluir el mes de estudios y diseños.

3. Programa de Inversiones.

Se debe ajustar con el mes de estudios y diseños.

4. Anticipo.

Se deberá esperar el día de mañana Viernes 21 de Agosto de 2020 del avance del trámite del cambio de la tarjeta de firmas por parte de la Alcaldía para tramitar la solicitud por parte del contratista.

5. Flujo de Caja.

Se debe ajustar con el mes de estudios y diseños.

6. Requisitos Sociales.

Se contactó en la visita al Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Gilgar, se deberá coordinar en el mes de estudios y diseños la reunión de socialización

7. Requisitos Ambientales.

Se manifiesta por parte de Interventoría del cumplimiento del componente ambiental del proyecto con toda la normatividad que exige el INVIAS en cuanto a formatos y demás.
Se deberá elaborar el PAGA para revisión de la Interventoría lo antes posible.
Se sugiere buscar una persona que tenga ya experiencia con el manejo de contratos INVIAS para su implementación.

8. Equipos, plantas, etc.

Las fuentes de material deben estar licenciadas, se deberá emitir un comunicado por parte del contratista de qué fuentes de material utilizará para el proyecto.

9. Personal, Campamento, logística, señalización temporal, vallas, etc.:

Se remitió a Interventoría documentos con hojas de vida del proyecto, está en revisión.
El personal, campamento, logística y señalización temporal se evaluará una vez se vayan a iniciar las actividades físicas de la obra.
Para el tema de la valla se consultará la especificación con los requerimientos del convenio y se socializará con el contratista para su instalación.
y se entregará al contratista la especificación.

10. Otros.

Cantidades de gavión no están priorizadas, se deberá establecer la necesidad y su prioridad en el proyecto ya que no están ubicadas con abscisado.
La cantera autorizada es Caucasia, el contratista manifiesta que los Kms de transporte no concuerdan con lo establecido en el proyecto, se manifiesta por parte de la Interventoría que se deberá realizar un comunicado al respecto.
Las obras se pueden cambiar de Abscisados, realizando la consulta previa a Subdireccion Terciaria.
Por parte del Ingeniero Mario García, secretario de infraestructura del Municipio, manifiesta que la priorización de las obras a hoy es otra y solicita replantear la ubicación de algunas intervenciones en puntos críticos de la vía, se acuerda emitir un comunicado por parte del Municipio en este sentido para elevar la consulta a la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNION TECNICA INICIAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4		
		VERSION	1		
		PAGINA		DE	

	FECHA	20 (Día)	Ago (Mes)	2020 (Año)

COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTERVENTORÍA:

1. Estudios y/o Diseños.

1.1. El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste.
Se establecerá contacto por parte de la Interventoría con la Subdirección de Estudios e Innovación.

2. Programa de distribución del personal.
Se entregará esta semana

3. Anticipo.
No aplica

4. Campamento, laboratorio, logística, etc.
Se entregará una vez inicien las intervenciones físicas en el proyecto.

5. Otros.
La Seguridad Social se deberá pagar por el Consorcio o alguna empresa integrante del Consorcio, no es válido contratos de prestación de servicios
El correo institucional es atencionciudadano@invias.gov.co
Se deberá enviar copia a la Dirección Territorial Córdoba de todos los comunicados que se emitan tanto a Invias Bogotá como a Alcaldías y Contratistas.
Gestionar pronto la apertura

5. DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha _____el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora. Se coordinará entre contratista e Interventoría la apertura de la bitácora ya que en la visita no asistió ni Director ni Residente de Obra.

OBSERVACIONES

1. Durante la visita de obra inicial no estuvo presente por parte del contratista de Obra, el Representante Legal, Director ni el Residente, se presentó el Sr. José Cogollo en su representación. A la reunión técnica inicial virtual, asistió el Director de Obra.
2. Por motivos de Salud, el supervisor de obra no pudo asistir a la visita.
3. La reunión técnica inicial se realizó de forma virtual a través de la plataforma Teams, debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que atraviesa el pais.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:
Anexos (fotografías, video, etc.):

Firma
Nombre: Carlos Manuel Vergara Barvo.
Director de Obra
Matricula No.: 08202 - 54648 ATL

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097497 CND.

Firma
Nombre: Pedro Antonio Ochoa de la Ossa
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Matricula No.: 22228-433014 COR

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Firma
Nombre: Laura Isabela Peña García
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 22202 - 328524 COR

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO


Firma
Nombre: Diego José Abad Durango
Director Territorial INVIAS
Matricula No. : 08202 - 096534 ATL

Firma
Nombre: FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO.
Cargo ESPECIALISTA ESTRUCTURAS INTERVENTORIA.
Matricula No. : 05202 - 108791 ANT

Firma
Nombre: JORGE ELIECER IBARRA HERNÁNDEZ
Cargo ESPECIALISTA HIDRAÚLICO Y AMBIENTAL INTERVENTORIA
Matricula No. : 22202 - 099845 COR

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa)
Copias: Contratista , Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020. NIT: 901.381.064-3	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Fecha: 19 de Agosto de 2020 Visita: Inicial Municipio: Puerto Libertador.

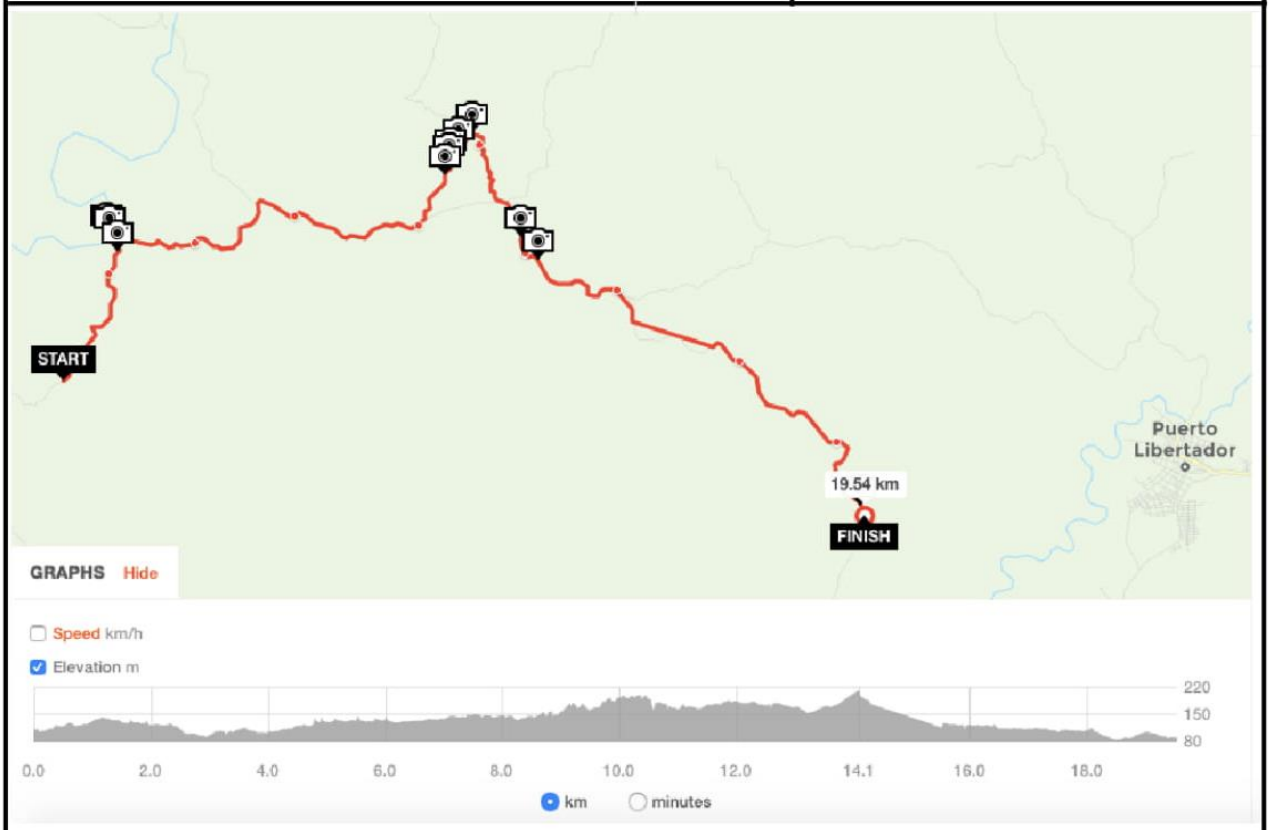

Descripción: Recorrido en Planta desde el K20 + 000 hasta el K0 +000, se realizó de esta manera ya que el K0 del proyecto no fue posible ubicarlo en el primer recorrido, se deberá ajustar Abscisado con la topografía realizada.



Descripción: K 0 + 000



Descripción: K 20 + 000

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020. NIT: 901.381.064-3	REGISTRO FOTOGRAFICO
R&J Ingeniería Sas. MIGUEL ROBLES SAS	Fecha: 19 de Agosto de 2020 Visita: Inicial Municipio: Puerto Libertador.



Descripción: K 10 + 300



Descripción: Sitios Críticos de la Vía

✓ **INFORME SEMANAL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 14 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 1 (Numeración consecutiva) del 04/08/2020 al 13/08/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: SIN INICIO

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.428,61	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.587.429	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.094.587.428,61

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 8

VALOR FACTURA: $ 18.520.193,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 1


VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO X	N/A	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 21 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **2** (Numeración consecutiva) del 14/08/2020 al 20/08/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.428,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.587.429	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 8

VALOR FACTURA: $ 18.520.193,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 1


VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO X	N/A	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 28 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) del 21/08/2020 al 27/08/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.428,61	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.587.429	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 8
VALOR FACTURA: $ 18.520.193,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X


MES FACTURADO: 1
VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO X	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO X	N/A
EMISIONES:	SI ___	NO X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO X	N/A

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020

VALENCIA

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

9. INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°1** correspondiente al periodo del 04 al 31 de agosto de 2020 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabel Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

El Acta de iniciación al contrato No. 056 de 2020, correspondiente al municipio de San José de URÉ, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista 4L INGENIERÍA S.A.S. la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ representado por el Secretario de Planeación Municipal.

El Acta de iniciación al contrato No. LP-MPL-002-2020, correspondiente al municipio de Puerto Libertador, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista CONSORCIO

MEJORAMIENTO VIALES, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR representado por el Secretario de Infraestructura.

El Acta de iniciación al contrato No. MV-LP-002-2020, correspondiente al municipio de Valencia, fue inscrita el día 13 de agosto de 2020 entre el contratista TVP MUNICIPIOS, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE VALENCIA representado por el Supervisor.

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VALENCIA

El proyecto consiste en el mejoramiento de vía rural con la construcción de plaza huella, box coulvert y obras complementarias desde el CRUCE DE VÍA (CALLEJAS – VALENCIA) – SANTA MARÍA – SAN RAFAEL – LA BANCA hasta GUADUAL CENTRAL, se pretenden realizar 845 ML de placa huella, construcción de 2 box coulvert de 1.5 x 1.5 de 6 mts y obras complementarias de limpieza de 16 alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería aumentando así la vida útil del tramo vial, con lo que se espera disminuir los tiempos de recorrido del personal, aumentar la comercialización de los productos del campo que son cultivados en esta zona al igual que garantizar la salida de al personal del sector a centros de salud y en especial a los estudiantes a centros de enseñanza, aun en tiempos de lluvias.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA	
Valencia:	• Tramo N° 1 – Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca

10.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VALENCIA

El mejoramiento de vías en el Municipio de Valencia contempla el tramo Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca que se localiza en la parte sur del municipio. El tramo N° 1 a mejorar se localiza en el K0+000 al K25+830, P.I. 8°15'30'' Latitud Norte y 79°08'55'' Latitud Oeste, P.F. 8°27'40'' Latitud Norte y 79°88'25'' Latitud Oeste.



Figura 5. Trazado Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca
Fuente: Anexo Técnico Valencia

10.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario que realizo el Instituto Nacional de Vías - INVIAS para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
Valencia	Tramo N° 1 – Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca	1050,00	27,00

10.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que cumplirán con las características de diseño de construcción entregados por el municipio de Valencia, basados en las cartillas de construcción de INVIAS.

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K2+480	350	5		PLACA HUELLA SECTOR BARBA DEL SOL
K7+980	6	1.5	1.5	BOX COULVERT DE 1.5X1.5
K9+110	100	5		PLACA HUELLA LOMA PACHO MARTÍNEZ
K9+600	100	5		PLACA HUELLA APARTADA EL COCUELO
K10+080	6	1.5	1.5	BOX COULVERT DE 1.5X1.5
K3+000	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K3+900	7	3	3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K4+810	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K4+900	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+130	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+370	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+375	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+940	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+050	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+320	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

K6+640	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+980	7	2.5	2.5	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K7+400	7	5	3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K8+700	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K0+000 – K25+830				Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles (mantenimiento concertado contratista e interventoría)
K0+000 – K25+830				Rocería ambos lados de la vía (mantenimiento concertado contratista e interventoría)

11. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA VALENCIA

11.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VALENCIA

CONTRATO DE OBRA N° MV-LP-002-2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.043.889.132,00 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE VALENCIA
CONTRATISTA	**TVP MUNICIPIOS,** NIT. 900.210.090-0 R.L. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CALLE 33 # 12 – 63
PBX	7897130
CORREO ELECTRÓNICO	Tvpmunicipios2016@gmail.com
FECHA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12 DE MARZO DE 2020

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° MV-LP-002-2020, por la aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia, hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
540-47-994000011835	Cumplimiento	19/06/2020	19/05/2021	$313.166.739,60	CONTRATO DE OBRA	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	19/06/2020	19/01/2024	$208.777.826,40		
	Estabilidad y calidad de Obra.	Vigencia de cinco (5) años.		$313.166.739,60		
	Calidad del servicio	30/07/2020	19/01/2026	$5.827.378,00		
540-74-994000002717	Predios, labores y operaciones	19/06/2020	19/01/2021	$175.560.600,00		

11.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES


Durante el periodo comprendido entre el 4 al 31 de agosto de 2020:
El día 4 de agosto de 2020, se dio orden de inicio al contrato de Interventoría por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se procedió a notificar al Municipio de Valencia, con el fin de proceder con la suscripción de la orden de inicio del contrato de obra, la cual se suscribió el día 13 de agosto de 2020.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país debido al COVID – 19, se elaboró por parte del contratista, la elaboración de los protocolos de bioseguridad para el COVID-19, los cuales a la fecha del presente informe cuenta con el aval correspondiente de la ARL y de la Alcaldía Municipal.

De la misma forma se emiten las pólizas del contrato de obra, las cuales hubo que ajustar acorde al convenio 563 de 2020 suscrito entre el Municipio de Valencia y el INVIAS, en cuanto a los amparos y porcentajes de los mismos, se realizan los ajustes correspondientes y se actualizan acorde al acta de inicio.

Se entrega la programación del proyecto por parte del contratista, la cual se solicitó ajustar incluyendo el mes de estudios y diseños.

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

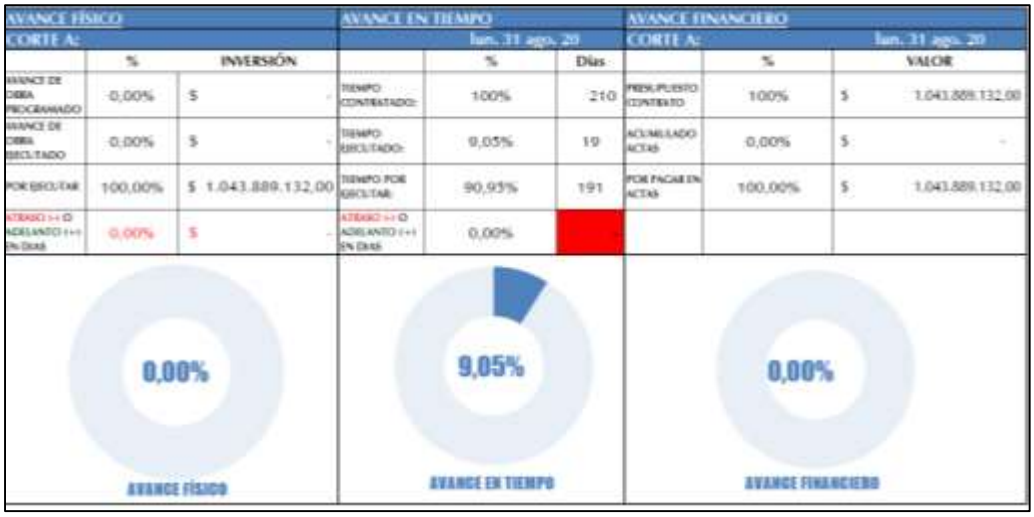

El avance de obra se encuentra en ceros debido a que el contrato de obra se encuentra en etapa de Estudios y Diseños, el cual finaliza en el primer mes de ejecución el cual se vence el 14 de septiembre.

Otras actividades realizadas

Se realizó revisión a las hojas de vida del personal postulado para el contrato de obra, los cuales una vez verificado cada uno de los perfiles la interventoría procedió a dar la aprobación al siguiente personal mediante el comunicado C. Int – 038 del 31 de agosto de 2020:

SITUACIÓN A VERIFICAR	ACCIÓN VERIFICABLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.	Presentación de plan de calidad	X		
2.	Plan de manejo de Transito	X		
3. Información sobre el personal profesional	Director de Obra / Ingeniero Civil	X		Aporta Hoja de vida y documentos del señor MANUEL ARTURO PETRO PETRO, ingeniero civil, el cual CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
	Residente de Obra / Ingeniero Civil	X		Aporta Hoja de vida y documentos del señor JHON CARLOS VIDAL ESTRADA, ingeniero civil, el cual CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
	Topografo / Ingeniero Topografico Topografo o Tecnico Topografico	X		Aporta Hoja de vida y documentos del señor LUIS ALBERTO SALAS MARQUEZ, topogrago, el cual CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
	Profesional o especialista en Salud Ocupacional. Cinco (5) años, contada entre la fecha de confirmación de la matricula profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso. Deberá haber ocupado el cargo de residente, asesor o profesional SISO o similares, en la ejecución de por lo menos DOS (2) contrato de obra pública, para lo cual deberá aportar copia de la certificación en tal sentido emitida por su empleador.	X		Aporta Hoja de vida y documentos de la señora YOCASTA LUCIA DE LA BARRERA CRUZ, Profesional o especialista de seguridad Ocupacional, el cual CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA
4. Posibles Fuentes de materiales para el proyecto	Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoria, previo inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones tecnicas establecidas para evitar impactos ambientales, igualmente se obliga a cumplir las normativa ambiental y minera aplicable a la obra.		X	
5. Maquinaria minima del Proyecto	Vibro compactador de rodillo (1)	X		
	Volteos minimo 7 m3 (1)			
	Retroexcavadora de llanta o de oruga (1)			
	Motoniveladora (1)			
6.	Programación de Obra con Inversión Semanal	X		
7.	Apus	X		

De igual forma se recibieron por parte del contratista el plan de calidad, plan de manejo de tránsito, relación de maquinaria mínima del proyecto y análisis de precios unitarios, aprobando la documentación presentada como se evidencia en el cuadro anterior.

11.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

11.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

Para el período de ejecución del 23 al 30 de junio de 2020, se han llevado a cabo las siguientes actividades, las cuales están sujetas a la supervisión y control por parte de esta interventoría:

- Se realizaron reuniones virtuales previas al inicio del contrato con la finalidad de establecer los lineamientos de inicio del mismo, se realizaron reuniones los días 15 de Julio de 2020 y el 22 de Julio de 2020, en las cuales se tocaron varios temas en cuanto al cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre Alcaldía e INVIAS.
- Se radicó ante el INVIAS mediante documento C Int-007-2020 el protocolo de bioseguridad de interventoría aprobado por la ARL.
- Se realizó visita inicial de reconocimiento al proyecto el día 20 de agosto de 2020, en la cual se detectaron las obras a realizar y los tramos a intervenir, en conjunto con funcionarios de la Alcaldía Municipal, INVIAS, contratista e Interventoría. Se verifican tramos a realizar de placa huella estimados en los anexos técnicos del proyecto pero que a la fecha la necesidad del tramo está en otros sectores, por lo que la Alcaldía Municipal emitirá un documento en el cual se solicitará el cambio de las ubicaciones de las placas huellas necesarias a la fecha.
- Se realiza toda la verificación documental de las pólizas del contrato, solicitando las correcciones pertinentes al contratista de obra y Alcaldía Municipal, donde se garantizan que las mismas estén acorde con lo estipulado en el convenio Alcaldía – Municipio y posteriormente actualizadas según acta de inicio del contrato.
- Mediante oficio No C Int-022-2020 se comparten los links de la página de Invias a cada contratista para la descarga de toda la documentación técnica del proyecto para la etapa de estudios y diseños.
- Mediante documento C Int-024-2020 se dan los lineamientos generales para la etapa de estudios y diseños y los entregables de cada capítulo, con la finalidad informativa para el contratista de obra y su implementación en esta etapa.

- Se radican los informes semanales 1, 2 y 3 correspondientes al período del presente informe mediante comunicados C. Int-030; C. Int-031 y C. Int-032, posteriormente se procede a realizar el cargue en la plataforma CIFRA del Instituto.
- En cuanto al cumplimiento del componente ambiental se emite comunicado No C. Int-036 en el cual se le reitera al contratista de la elaboración e implementación del PAGA acorde con los lineamientos del INVIAS y se detallan los formatos a diligenciar previos al inicio de la fase de implementación en obra.
- El día 29 de agosto se recibe mediante correo electrónico el documento PAGA por parte del contratista de obra, el cual entra a revisión por el Especialista de Interventoría para emitir informe de revisión No 1.
- Se realizó la revisión a las hojas de vida entregadas por el contratista de obra, hubo que realizar varios ajustes a las mismas ya que presentaban algunas inconsistencias, el contratista corrigió y se aprobaron mediante documento C Int – 038 – 2020.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE AGOSTO DE 2020:

VALOR PROGRAMADO (BÁSICO DE OBRA)	$0,00	0%
VALOR EJECUTADO	$0,00	0%

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños.

AVANCE FÍSICO DEL MES DE AGOSTO DE 2020:

PROGRAMADO	0.62%
EJECUTADO	0.00%

La programación corresponde a la entrega de estudios y diseños, la cual hasta la fecha el contratista se encuentra adelantando.

AVANCE PREDIAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0

- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE AGOSTO DE 2020:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Se encuentran descritas en la descripción del Municipio de San Jose de Uré

12. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

12.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** 8

CONTRATO DE OBRA No.: MV-LP-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

PLAZO INICIAL: SIETE (7) NESES
FECHA DE INICIACION: 13 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.043.889.132,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.043.889.132,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 0,5
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:		$ 1.043.889.132,00		$ 1.043.889.132,00	0,00		1	0,000
Acumulado:								

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.043.889.132,00
Total	$ 1.043.889.132,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,50	0,07	6,5	$ 1.043.889.132,00	0	$ 1.043.889.132,00	$ 1.043.889.132,00
Interventor:	$ 24.231.664,17	1,00	0,14	6	$ 401.844.860,83	0	$ 401.844.860,83	$ 401.844.860,83

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	19/06/2020	19/05/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19/06/2020	19/01/2024
Calidad de Estudios y Diseños	30/07/2020	19/01/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	AMPARA 5 AÑOS	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/06/2020	19/01/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

12.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CORDOBA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: **AGOSTO** **CONTRATO No.** **MV-LP-002-2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS - VALENCIA)- SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

CONTRATISTA: **TVP MUNICIPIOS** **SECTOR:** VALENCIA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																												
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora													I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Excavadora													I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Vibro compactador													I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
Volqueta 6X4 14 M3													I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JHON CARLOS VIDAL E
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202148611COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202 - 097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

12.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: AGOSTO **CONTRATO DE OBRA No.** MV-LP-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS - VALENCIA)- SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS **SECTOR:** VALENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **779 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JHON CARLOS VIDAL E
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202148611COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202 - 097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

12.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: MV-LP-002-2020 **CONTRATISTA:** TVP MUNICIPIOS

MES INFORME MENSUAL: 8 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

SECTOR: VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	20200345		20200345	SRG	MV-LP-002-2020	1.999.963.880,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.043.889.132,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
Director ejecutivo

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

12.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA		DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No **MV-LP-002-2020** **CONTRATISTA:** TVP MUNICIPIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 08 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS- VALENCIA)- SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

SECTOR: VALENCIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco													24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	456
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JHON CARLOS VIDAL E
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202148611COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202 - 097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

12.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11
(NO APLICA EN ESTE INFORME)

12.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: MV-LP-002-2020

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 08 DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CRUCE DE VIA (CALLEJAS-VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

SECTOR: VALENCIA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		

12.8. INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 8 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No:** _____ **PERIODO MES:** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	MV-LP-002-2020	PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES	PLAZO ACUMULADO:	0,5 MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	12 DE MARZO DE 2021
SECTOR:	VALENCIA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.043.889.132,00	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	CRUCE DE VIA (CALLEJAS-VALENCIA)- SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
				-

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre MANUEL ARTURO PETRO P
Director de Obra
Matrícula No. 2220209780 6COR

Firma
Nombre JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

12.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 **CONTRATISTA:** TVP MUNICIPIOS

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13/08/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.043.889.132,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.043.889.132,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.424.593,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30%	$ 313.166.739,60	19	6	2020	19/05/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 208.777.826,40	19	6	2020	19	1	2024
Calidad de Estudios y Diseños	0,56%	$ 5.827.378,00	30	7	2020	19	1	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 313.166.739,60	Ampara 5 años			14	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **540-47-994000011835**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	17%	$ 175.560.600,00	19	6	2020	19	1	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **540-74-994000002717** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	8	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____



Firma _____
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

12.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-17
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIA EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

FECHA DE INICIO: 13/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** SIETE (7) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 12/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACION: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-17
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

6. INDICES DE GESTION IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MARCELO ARTURO PETRO P
Director de Interventoría
Matrícula No.: 2220209 306COR

Firma
Nombre: YOCASTA LUCIA DE LA BARRERA C
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.: 22202085563COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

12.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

(NO APLICA)

- ✓ **Seguimiento Programa de Obra**

- ✓ **Seguimiento Programa de Inversiones.**

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MN-FRA-MN-N-6-FR-1		
VERSIÓN:	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31	AGOSTO	2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: MV-LP-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Cruce de Via (Calleja - Valencia) - San Rafael - La Blanca - Guadual Central (Indique la ruta y tramo del puente de acuerdo según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13 DE AGOSTO DE 2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.043.889.132,00 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.043.889.132,00

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12 DE MARZO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	S. Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado / S. Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021				
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.371.300,00	0,131%	0,00%	% P	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				100%
	$1.371.300,00	0,131%	$0	$ P		$685.650	$685.650								
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				96,00%
Relleno para estructuras con recebo	$1.451.790,00	0,139%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%				
	$1.451.790,00	0,139%	$0	$ P				$725.895	$725.895						
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				90,00%
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	$31.552.122,00	3,023%	0,00%	% P	0,00%	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$31.552.122,00	3,023%	$0	$ P		$31.552.122									
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				84,00%
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$2.375.182,00	0,228%	0,00%	% P	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$2.375.182,00	0,228%	$0	$ P		$1.187.591	$1.187.591								
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				78,00%
Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	$29.858.400,00	2,860%	0,00%	% P	0,00%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$29.858.400,00	2,860%	$0	$ P		$29.858.400									
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				72,00%
Subbase Granular Clase C	$145.137.902,00	13,904%	0,00%	% P	0,00%	2,98%	3,97%	0,00%	2,98%	3,97%	0,00%				
	$145.137.902,00	13,904%	$0	$ P		$31.100.979	$41.467.972		$31.100.979	$41.467.972					
				$ E											
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				66,00%
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.179.278,00	0,400%	0,00%	% P	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%				
	$4.179.278,00	0,400%	$0	$ P		$1.044.820	$1.044.820		$1.044.820	$1.044.820					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				60,00%
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	$279.461.652,00	26,771%	0,00%	% P	0,00%	2,97%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00%				
	$279.461.652,00	26,771%	$0	$ P		$31.051.295	$62.102.589	$62.102.589	$62.102.589	$62.102.589					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				54,00%
Concreto piedra pegada - Resitencia 21 Mpa	$86.956.562,00	8,330%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	1,39%	1,85%	1,85%	1,85%	1,39%				
	$86.956.562,00	8,330%	$0	$ P			$14.492.760	$19.323.680	$19.323.680	$19.323.680	$14.492.760				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				48,00%
Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	$221.743.280,00	21,242%	0,00%	% P	0,00%	2,12%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	2,12%				
	$221.743.280,00	21,242%	$0	$ P		$22.174.328	$44.348.656	$44.348.656	$44.348.656	$44.348.656	$22.174.328				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				42,00%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$183.934.778,00	17,620%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%				
	$183.934.778,00	17,620%	$0	$ P				$45.983.695	$45.983.695	$45.983.695	$45.983.695				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				36,00%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36". Incluye rectificación de descoles	$3.031.888,00	0,290%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%				
	$3.031.888,00	0,290%	$0	$ P				$1.515.944	$1.515.944						
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				30,00%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$18.264.320,00	1,750%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00%				
	$18.264.320,00	1,750%	$0	$ P				$6.088.107	$6.088.107	$6.088.107					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				24,00%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$4.424.634,00	0,424%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,32%				
	$4.424.634,00	0,424%	$0	$ P						$1.106.159	$3.318.476				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				18,00%
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños	$19.424.593,00	1,861%	0,00%	% P	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$19.424.593,00	1,861%	$0	$ P	$19.424.593										
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				12,00%
Obras de compensación ambiental	$10.721.451,00	1,027%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	0,00%				
	$10.721.451,00	1,027%	$0	$ P						$10.721.451					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				6,00%
Etapa de cierre financiero				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P											
				$ E											
				% F	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.043.889.132,00														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.043.889.132,00														

		1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,86%	14,24%	15,84%	17,25%	20,33%	22,24%	8,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.424.593,00	$ 148.635.184,17	$ 163.330.038,17	$ 180.088.565,94	$ 212.234.364,44	$ 232.187.127,94	$ 85.969.258,33
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,86%	16,10%	31,94%	49,19%	69,52%	91,76%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 19.424.593,00	$ 168.079.777,17	$ 333.409.815,33	$ 513.498.381,28	$ 725.732.745,72	$ 957.919.873,67	$ 1.043.889.132,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)					$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.043.889.132,00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.043.889.132,00

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada CPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada CPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por CPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

Firma: Nombre: GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma: Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe unidad ejecutora
Matrícula:

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor o Dirección Territorial

✓ ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MINFRA-MN-IN-14-FR-1

No se generaron actas de comité durante el presente mes.

✓ **Acta de Reunión**

MINFRA-MN-IN-1-FR-4

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 20 (Día) Ago (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA.** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CÓRDOBA**

En Valencia (Indique en este espacio el lugar de reunión) se reunieron Jhon Carlos Vidal (Residente de Obra), Juan Diego Jimenez Serna (Director de Interventoría), Diego José Abad Durango (Residente de Interventoría) (Director Territorial - INVÍAS), Laura Isabela Peña García (Supervisor Contrato Interventoria - INVÍAS),

Jorge Eliecer Ibarra (Esp Hidraúlico y Ambiental Interventoria) y Franklin Leandro Osorio Cano (Esp Estructuras Interventoria)
(Relacione aquí los nombres y cargos de los profesionales adicionales que se considere pertinente convocar a la reunión técnica inicial)

con el fin de realizar el recorrido al sitio de las obras y precisar actividades relacionadas con el inicio de la ejecución de los Contratos de obra No. MV-PL-002 de 2020

y de Interventoría No. 779 de 2020

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO, IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: TRAMO: Cruce de via (calleja - Valencia)- San Rafael - La Blanca - Guadual Central
(Sectores de la ejecución de la obra según alcance del contrato)

PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA: **SIETE (7) MESES**
(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA: **13** (Día) **DE** **AGOSTO** (Mes) **DE** **2020** (Año) (Oficio No. C Int 018 2020)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: **12** (Día) **DE** **MARZO** (Mes) **DE** **2021** (Año)

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA (IVA INCLUIDO): $ 1.043.889.132,00
(Valor Total del contrato de obra en números)

CONTRATISTA DE OBRA: TVP MUNICIPIOS.
(Nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020.
(Nombre o razón social del Interventor)

Los asistentes manifiestan que han revisado y conocen totalmente la documentación e información correspondiente al proyecto (Documentación Técnica, Legal, Financiera, etc.) objeto del contrato de obra y del contrato de interventoría.

COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL CONTRATISTA:

1. Estudios y Diseños:

1.1 El Contratista manifiesta expresamente que el Instituto puso a su disposición los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto.

1.2. El Contratista desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste.

Se deberá consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema SIG de la entidad para implementar su compatibilidad con el proyecto.

2. Programa de Obra.

Se recibió por parte de Interventoria, se debe incluir el mes de estudios y diseños.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	20 (Día)	Ago (Mes)	2020 (Año)

3. Programa de Inversiones.

El programa de Inversiones se debe ajustar con el mes de estudios y diseños de 1 mes.

4. Anticipo.

No Aplica

5. Flujo de Caja.

El flujo de caja se debe ajustar con el mes de estudios y diseños a incluir en la programación.

6. Requisitos Sociales.

Para la socialización del proyecto, se deberá contactar a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y líderes sociales de la zona de influencia del proyecto para coordinar lo pertinente en este mes inicial de estudios y diseños y programar las reuniones con comunidad.

7. Requisitos Ambientales.

Se manifiesta por parte del Director de Interventoria del cumplimiento del componente ambiental del INIVAS en todos sus aspectos, el Ing Jorge Ibarra Especialista de Interventoria manifiesta que el contratista se debe ceñir a los lineamientos del Instituto en este componente en cuanto a formatos y la Guia de

Se sugiere buscar una persona que tenga ya experiencia con el manejo de contratos INVIAS para su implementación.

8. Equipos, plantas, etc.

Las fuentes de material deben estar licenciadas, se deberá emitir un comunicado por parte del contratista de qué fuentes de material utilizará para el proyecto.
Se deberá verificar y aprobar por parte de la Interventoria

9. Personal, Campamento, logística, señalización temporal, vallas, etc.:

Se remitió a Interventoría documentos con hojas de vida del proyecto, está en revisión.
El personal, campamento, logística y señalización temporal se evaluará una vez se vayan a iniciar las actividades físicas de la obra.
Para el tema de la valla se deberá consultar el diseño y cumplimiento de esta de acuerdo a los requerimientos del convenio, se consultará a través del Gestor del proyecto y se entregará al contratista la especificación.

10. Otros.

Se solicita por parte de la Alcaldia Ing Alejandro Morales, pregunta si los tramos a realizar de placa huella se pueden variar, el Ing Diego manifiesta que consultó con el Ing Villate, y manifestó que se debe respetar el alcance de metros lineales y las abscisas de acuerdo a la priorización a la fecha.
Sin embargo se debe solicitar por parte de la Alcaldía los cambios a realizar y justificarlos técnicamente para solicitar la autorización de cambio al INVIAS a través de la Interventoria.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA INICIAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-1-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

	FECHA	20 (Día)	Ago (Mes)	2020 (Año)

COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA INTERVENTORÍA:

1. Estudios y/o Diseños.

1.1. El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste.

Se establecerá contacto por parte de la Interventoria con la Subdirección de Estudios e Innovación.

2. Programa de distribución del personal.

Se entregará esta semana

3. Anticipo.

No aplica

4. Campamento, laboratorio, logística, etc.

Se entregará una vez inicien las intervenciones físicas en el proyecto.

5. Otros.

La Seguridad Social se deberá pagar por el Consorcio o alguna empresa integrante del Consorcio, no es válido contratos de prestación de servicios

El correo electrónico para enviar cualquier notificación o solicitud es atencionciudadano@invias.gov.co

Se deberá enviar copia a la Territorial de todos los documentos que se emitan tanto a Invias Bogotá como a Alcaldías y Contratistas.

Gestionar pronto la apertura.

5. DIARIO DE OBRA (BITÁCORA)

Con fecha **21 de Agosto de 2020.** el Contratista de Obra e Interventoría procedieron a la apertura y firma de la Bitácora.

OBSERVACIONES

1. Durante la visita de obra inicial no estuvo presente por parte del contratista de Obra, el Representante Legal ni Director de Obra, estuvo presente el Residente de Obra con autorización pra la toma de desiciones por parte del representante legal de la empresa. A l reunión técnica inicial virtual asistió igualmente el Residente de obra.
2. Por motivos de Salud, el supervisor de obra no pudo asistir a la visita.
3. La reunion tecnica inicial se realizo de forma virtual a traves de la plataforma Teams, debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que atraviesa el pais.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:
Anexos (fotografías, video, etc.):

Firma

Nombre:
Director de Obra
Matricula No.:

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097497 CND.

Firma

Nombre: JHON CARLOS VIDAL ESTRADA
Residente de Obra
Matricula No.: 22202 - 148611 COR

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No

Firma

Nombre: Laura Isabela Peña García
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No. : 22202 - 328524 COR

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Firma

Nombre: Diego José Abad Durango
Director Territorial
Matricula No. : 08202 - 093534 ATL.

Firma

Nombre: FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO.
Cargo ESPECIALISTA ESTRUCTURAS INTERVENTORIA.
Matricula No. : 05202 - 108791 ANT

Firma

Nombre: JORGE ELIECER IBARRA HERNÁNDEZ
Cargo ESP. HIDRAÚLICO Y AMBIENTAL INTERVENTORIA
Matricula No.: 22202 - 099845 COR

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa)
Copias: Contratista , Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020.
NIT: 901.381.064-3

R&J Ingeniería Sas. MIGUEL ROBLES SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 20 de Agosto de 2020
Visita: Inicial
Municipio: Valencia.



Descripción: Desde la cabecera urbana del Municipio de Valencia hasta el inicio del tramo de vía hay 7,34 Km. Sector cruce de vía Calleja - Valencia. El tramo inicia en este sector en un recorrido de 24,45 Km hasta la vereda Guadual Central. Las coordenadas del documento técnico no concuerdan con lo verificado en sitio. Se tomaron coordenadas con GPS de Contratista e Interventoria y los datos concordaban entre sí, pero no con el documento de la ficha técnica del levantamiento.





Descripción: Tramos críticos de la vía, para construir placa huella

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020. NIT: 901.381.064-3	R&J Ingeniería Sas. MIGUEL ROBLES SAS	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
		Fecha: 20 de Agosto de 2020 Visita: Inicial Municipio: Valencia.

	
Descripción: Box a Construir K 10 + 080	Descripción: Sector final Vereda Guadual Central K 23 + 800

✓ **INFORME SEMANAL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	14	8	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **1** del 04/08/2020 al 13/08/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13 de Agosto 2020.

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	MV-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.043.889.132,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.043.889.132,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.043.889.132	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.043.889.132,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 8

VALOR FACTURA: $ 19.424.593,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 1


VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO	X	N/A	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	21	8	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **2** del 14/08/2020 al 20/08/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13 de Agosto 2020.

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	MV-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.043.889.132,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.043.889.132,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.043.889.132	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.043.889.132,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 8

VALOR FACTURA: $ 19.424.593,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 1


VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO X	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO X	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO X	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO X	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO X	N/A		
EMISIONES:	SI ___	NO X	N/A		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	28	8	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **3** del 21/08/2020 al 27/08/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13 de Agosto 2020.

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	MV-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.043.889.132,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.043.889.132,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.043.889.132	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.043.889.132,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 8

VALOR FACTURA: $ 19.424.593,00 FECHA FACTURA: 14/09/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 1


VALOR FACTURA: $ 29.319.985,00 FECHA FACTURA: 31/08/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ___ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	___	NO	X	N/A	

13. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

13.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 779 DE 2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 426.076.525,00 INCLUIDO IVA
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020** **NIT. 901.381.064-3** **Integrado por:** MIGUEL ROBLES S.A.S., con Nit: 901.252.893-1, con un porcentaje de participación del 60% y R&J INGENIERIA S.A.S., con Nit: 900.171.717-1, con un porcentaje de participación del 40%
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Carrera 58 # 90 – 53, Bogotá Colombia
PBX	3225888
CORREO ELECTRÓNICO	Proyectos@ryjingenieria.com
FECHA DE INICIO	AGOSTO 04 DE 2020
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
SISTEMA	ACTAS DE COSTOS
PÓLIZAS	Seguros del Estado- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal N° 41-44-101230573, anexo de modificación N° 4 ajuste de vigencias.

13.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

a) Revisión de avance de inversión semanal programado y ejecutado, de acuerdo a los programas de inversión solicitados a los contratistas.
b) Diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en cuando a la gestión de reportes de avance semanal.
c) Atención y respuesta de comunicados a los proyectos, de conformidad con la correspondencia recibida y enviada, los cuales se anexan al presente informe.

13.3. INFORMES ESPECIALISTAS

En el periodo 04 al 31 de agosto de 2020, se contó con apoyo de los profesionales mencionados a continuación, en revisión de temas pertinentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING. JORGE ELIECER IBARRA HERNÁNDEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ING. FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	ING. JORGE ELIECER IBARRA HERNÁNDEZ

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.



JORGE ELIÉCER IBARRA HERNÁNDEZ
Especialista Hidráulico y Ambiental

INFORME N°:	FECHA DE PRESENTACIÓN	PRESENTADO POR:	PRESENTADO A:
1	04 AL 31 DE AGOSTO DE 2020	CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 NIT. 901.381.064-3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

CONTENIDO

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 3

1.1. ESPECIALISTA HIDRÁULICO 3

1.2. ESPECIALISTA AMBIENTAL 3

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1. ESPECIALISTA HIDRÁULICO

- Revisión de la documentación existente suministrada por el Instituto Nacional de Vías. De la revisión a la documentación remitida por el Instituto no se encontró ningún documento referente a estudios y diseños hidráulicos e hidrológicos de los diferentes corredores viales. Por lo anterior se manifestó a cada Municipio y Contratista, la necesidad de hacer los respectivos estudios atendiendo los lineamientos del Invias.
- Se realizó visita a cada corredor vial con el propósito de conocer de primera mano la condición actual y el entorno físico del mismo; para así tener un mejor criterio al momento de la revisión y aprobación de los estudios y diseños.

1.2. ESPECIALISTA AMBIENTAL

- Revisión de la documentación existente suministrada por el Instituto Nacional de Vías. de la revisión se observó que no existen documentos técnicos que sirvan como línea base para la correcto control y seguimiento Ambiental de cada proyecto; así como para la elaboración del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental.

  Por otro lado, de las reuniones sostenidas con personal del Instituto, quedó claro que está en manos de cada Alcaldía, el control y seguimiento ambiental de los Proyectos; toda vez que así está establecido en cada uno de los convenios suscritos entre en Instituto y cada Municipio.
- Se realizó visita a cada corredor vial con el fin de conocer la condición actual y el entorno ambiental del mismo.
- A través de reuniones y de comunicados (correos electrónicos y oficios) se informó oportunamente a las Alcaldías y Contratistas; de la importancia del diligenciamiento oportuno de los formatos establecidos por el Invias para el control y seguimiento Ambiental de los Proyectos, así como la elaboración del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.



FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO
Especialista en Estructuras

INFORME N°:	FECHA DE PRESENTACIÓN	PRESENTADO POR:	PRESENTADO A:
1	04 AL 31 DE AGOSTO DE 2020	CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 NIT. 901.381.064-3	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

CONTENIDO

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 3

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Acompañamiento a visita inicial de reconocimiento al Municipio de San José de Uré.
- Acompañamiento a visita inicial de reconocimiento al Municipio de Puerto Libertador.
- Acompañamiento a visita inicial de reconocimiento al Municipio de Valencia.

13.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Acta de costos de Agosto	31-Ago-20	$29.319.985,00	$24.231.664,17
2	Acta de costos de Septiembre	30-Sep-20	$74.121.105,00	
3	Acta de costos de Octubre	31-Oct-20	$70.106.045,00	
4	Acta de costos de Noviembre	30-Nov-20	$66.602.685,00	
5	Acta de costos Diciembre	31-Dic-20	$65.093.765,00	
6	Acta de costos Enero	31-Ene-21	$65.346.045,00	
7	Acta de costos Febrero	28-Feb-21	$55.486.895,00	
VALOR TOTAL				**$24.231.664,17**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE SAN JOSÉ DE URÉ

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1		$329.006.950,80	
2	Cuenta No. 2		$548.344.918,00	
3	Cuenta No. 3		$219.337.967,20	
VALOR TOTAL				**$0,00**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE PUERTO LIBERTADOR

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1		$328.376.229,00	
2	Cuenta No. 2		$547.293.715,00	
3	Cuenta No. 3		$218.917.486,00	
VALOR TOTAL				**$0,00**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE VALENCIA

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1		$313.166.739,60	
2	Cuenta No. 2		$521.944.566,00	
3	Cuenta No. 3		$208.777.826,40	
VALOR TOTAL				**$0,00**

13.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

La interventoría teniendo en cuenta el proceso de gestión de calidad que adelanta el INVIAS, elaboró y presentó los reportes de avance mensual de interventoría para los contratos de obra, mediante el uso y aplicación del Manual y Formatos de Interventoría del 2016, formatos los cuales hacen parte del presente **informe mensual de interventoría No. 1.**

Adicionalmente la interventoría presento reportes de avance semanal de Interventoría para los contratos de obra, en el Sistema de Información Gerencial (CIFRA), a partir del 7 de agosto del 2020.

14. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: AGOSTO **CONTRATO No.** 779 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 **SECTOR:** SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estación Topografica	Marca TOPCON, Ref GTS 235w Serial 272650																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

14.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

MES DEL INFORME: AGOSTO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 779 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 **SECTOR:** SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR DE OBRA																															
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESP. AMBIENTAL																															
FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO	ESP. ESTRUCTURAL																															
ENRIQUE MARIN PEÑA	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS																															
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESP. HIDRAULICO																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

14.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) AGOSTO (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 - 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

SECTOR: SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0478	P 23580	Nación	Contrato Principal	$ 142.025.508,00
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0479	P 23682	Nación	Contrato Principal	$ 142.025.508,00
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0480	P 23855	Nación	Contrato Principal	$ 142.025.509,00
				TOTAL		**$ 426.076.525,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
		REGISTRO PRESUPUESTAL 9220 DEL 21 DE MAYO DE 2020					**$ 142.025.508,00**	**$ 142.025.508,00**	**$ 142.025.509,00**		**$ 426.076.525,00**		
		VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2020 (N/A)											
1	**Agosto / 2020.**	$ 20.401.782,00	$ 3.876.338,58	$ 24.278.120,58			$ 8.092.706,86	$ 8.092.706,86	$ 8.092.706,86	$ 24.278.120,58	$ 401.798.404,42		
TOTALES							**$ 133.932.801,14**	**$ 133.932.801,14**	**$ 133.932.802,14**	**$ 24.278.120,58**	**$ 401.798.404,42**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula No.: 22202 - 328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

14.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MINFRA-MN-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) AGOSTO (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 - 2020. **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2020. **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

SECTOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	79.912.944	INGENIERO DIRECTOR	$ 5.350.000,00	$ 2.675.000,00	$ 186.180,00	$ 107.000,00	$ 428.000,00	$ 107.000,00		
2	FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO	15.459.141	ESPECIALISTA ESTRUCTURA	$ 4.500.000,00	$ 900.000,00	$ 62.640,00	$ 36.000,00	$ 144.000,00	$ 36.000,00		
3	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10.766.686	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 4.500.000,00	$ 2.565.000,00	$ 178.524,00	$ 102.600,00	$ 410.400,00	$ 102.600,00		
4	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10.766.686	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 4.500.000,00	$ 900.000,00	$ 62.640,00	$ 36.000,00	$ 144.000,00	$ 36.000,00		
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 18.850.000,00**	**$ 7.040.000,00**	**$ 489.984,00**	**$ 281.600,00**	**$ 1.126.400,00**	**$ 281.600,00**		
						$			**2.179.584,00**		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND.

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 328524 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

14.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORSIO INTERVENTORIAS 2020

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 04/08/2020

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 426.076.525,00

VALOR ACUMULADO: $ 426.076.525,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 42.607.652,50	12	5	2020	30/06/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 85.215.305,00	12	5	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	$ 127.822.957,50	12	5	2020	12	5	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **41-44-101230573**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	8	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

14.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

FECHA DE INICIO: 04/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2020 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2020 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: (Indicar número y año)

CONTRATISTA:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. N/A FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO **X** APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: **N/**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

14.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

(NO APLICA)

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SAN JOSÉ DE URÉ

- De acuerdo a lo encontrado en las visitas de reconocimiento en los tramos viales a intervenir, se debe agilizar la aprobación del traslado de los recursos del sector Versalles – San Pedrito al sector Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal. Se sugiere remitir comunicado por parte de la Alcaldía lo antes posible para aterrizar el proyecto completamente en alcance y cantidades de obra a ejecutar, por lo tanto como función de esta interventoría se realizará esta labor.
- Una vez se inicien las obras, se exigirá un seguimiento completo al protocolo de bioseguridad del contratista y cumplimiento del PAPSO.
- El periodo de estudios y diseños está en curso sin que a la fecha se haya entregado información para revisión de esta Interventoría.

PUERTO LIBERTADOR

- De acuerdo a lo encontrado en la visita de reconocimiento se solicitará por parte de la Alcaldía Municipal el traslado del abscisado en algunas obras proyectadas inicialmente en el levantamiento con el que se estructuro el proyecto, por parte de esta Interventoría se revisará una vez se reciba la información y se avalará ante el Instituto para su cambio definitivo.
- Una vez se inicien las obras, se exigirá un seguimiento completo al protocolo de bioseguridad del contratista y cumplimiento del PAPSO.
- El periodo de estudios y diseños está en curso sin que a la fecha se haya entregado información para revisión de esta Interventoría.

VALENCIA

- De acuerdo a lo encontrado en la visita de reconocimiento se solicitará por parte de la Alcaldía Municipal el traslado del abscisado en algunas obras proyectadas inicialmente en el levantamiento con el que se estructuro el proyecto, por parte de esta Interventoría se revisará una vez se reciba la información y se avalará ante el Instituto para su cambio definitivo.
- Una vez se inicien las obras, se exigirá un seguimiento completo al protocolo de bioseguridad del contratista y cumplimiento del PAPSO.
- El periodo de estudios y diseños está en curso sin que a la fecha se haya entregado información para revisión de esta Interventoría.

16. ANEXOS

16.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA, ALCALDÍA E INTERVENTOR

SAN JOSÉ DE URÉ

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**	**RESPUESTA**
13/07/2020	Citación a Reunión inicio 15 Julio 11 AM	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ Y 4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	
20/07/2020	Citación a Reunión de seguimiento 21 Julio 4PM	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ Y 4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	
29/07/2020	Aprobación ARL (Se adjunta Papso y Protocolo)	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ Arq. Juan Carlos Cerpa Asesor Oficina Planeación Municipal	
05/08/2020	Estado actual contrato San José de Ure	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ Arq. Juan Carlos Cerpa Asesor Oficina Planeación Municipal	
07/08/2020	Solicitud corrección pólizas contratista	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ Arq. Juan Carlos Cerpa Asesor Oficina Planeación Municipal	
21/08/2020	Links página INVIAS, para consulta de cartillas, especificaciones y normatividad.	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. JOSÉ FERNANDO MORALES HERNÁNDEZ 4L INGENIERÍA S.A.S. CONTRATISTA	
24/08/2020	Fase de estudios y diseños, detalles de entregables por parte del Contratista	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. JOSÉ FERNANDO MORALES HERNÁNDEZ 4L INGENIERÍA S.A.S. CONTRATISTA	
25/08/2020	Revisión Documentos de inicio Contrato 056-2020	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ PADILLA 4L INGENIERÍA S.A.S. CONTRATISTA	

28/08/2020	Reunión de Seguimiento Proyecto PDET	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ Arq. Juan Carlos Cerpa Asesor Oficina Planeación Municipal ING. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ PADILLA 4L INGENIERÍA S.A.S. CONTRATISTA	
29/08/2020	Reiteración al seguimiento del componente ambiental.	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ PADILLA 4L INGENIERÍA S.A.S. CONTRATISTA	

PUERTO LIBERTADOR

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**	**RESPUESTA**
13/07/2020	Citación a Reunión inicio 15 Julio 11 AM	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR Y CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
20/07/2020	Citación a Reunión de seguimiento 21 Julio 4PM	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR Y CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
29/07/2020	Aprobación ARL (Se adjunta Papso y Protocolo)	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ Y CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
05/08/2020	Estado actual contrato de obra.	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR ING. Pedro Ochoa de la Ossa Secretario de Infraestructura	
06/08/2020	Revisión amparos pólizas Otro si No 1	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR ING. Pedro Ochoa de la Ossa Secretario de Infraestructura	
11/08/2020	Revisión documentos	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. CARLOS MANUEL VERGARA CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES CONTRATISTA	

21/08/2020	Links página INVIAS, para consulta de cartillas, especificaciones y normatividad.	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. CARLOS MANUEL VERGARA CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES CONTRATISTA	
24/08/2020	Fase de estudios y diseños, detalles de entregables por parte del Contratista	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. CARLOS MANUEL VERGARA CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES CONTRATISTA	
27/08/2020	Acta de visita técnica inicial	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. CARLOS MANUEL VERGARA CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES CONTRATISTA	
29/08/2020	Reiteración al seguimiento del componente ambiental.	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES CONTRATISTA	
31/08/2020	Aprobación hojas de vida	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES CONTRATISTA	

VALENCIA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**	**RESPUESTA**
13/07/2020	Citación a Reunión inicio 15 Julio 11 AM	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALENCIA Y TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	
20/07/2020	Citación a Reunión de seguimiento 21 Julio 4PM	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALENCIA Y TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	
29/07/2020	Aprobación ARL (Se adjunta Papso y Protocolo)	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALENCIA Y TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	
05/08/2020	Estado actual contrato de obra valencia.	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. MAURICIO PINEDA ALCALDÍA MUNICIPAL VALENCIA	

07/08/2020	Revisión amparos y pólizas contrato MV-LP-002-2020	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. MAURICIO PINEDA ALCALDÍA MUNICIPAL VALENCIA	
12/08/2020	Revisión pólizas Anexo No. 3 contrato MV-LP-002-2020	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL TVP MUNICIPIOS	
21/08/2020	Links página INVIAS, para consulta de cartillas, especificaciones y normatividad.	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. JHON CARLOS VIDAL TVP MUNICIPIOS	
24/08/2020	Fase de estudios y diseños, detalles de entregables por parte del Contratista	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ING. JHON CARLOS VIDAL TVP MUNICIPIOS	
25/08/2020	Revisión documentos de inicio contrato MV-LP-002-2020	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL TVP MUNICIPIOS	
31/08/2020	Aprobación hojas de vida	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS OBRAS

SAN JOSÉ DE URÉ

Tramo 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal

Visita de reconocimiento de obra.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>









Tramo 2 – Versalles – San Pedrito

Visita de reconocimiento de obra.

















PUERTO LIBERTADOR

Tramo 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa – Gilgar

Visita de reconocimiento de obra.










Remark: Visita Inicial Puerto Libertador


Remark: Visita Inicial Puerto Libertador






Network time is not synchronized
Remark: Visita Inicial Puerto Libertador


Network time is not synchronized
Remark: Visita Inicial Puerto Libertador


Network time is not synchronized
Remark: Visita Inicial Puerto Libertador


Remark: Visita Inicial Puerto Libertador


VALENCIA

Tramo 1 – Cruce de la vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Blanca – Guadual Central

Visita de reconocimiento de obra.





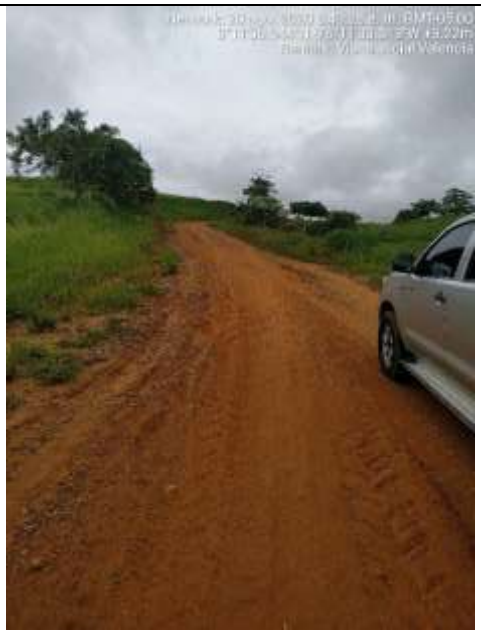






Remark: Visita Inicial Valencia






Network: 20 ago. 2020 9:25:41 a. m. GMT-05:00
8°10'54.799"N -76°12'37.889"W ±3.22m
Remark: Visita Inicial Valencia


Network: 20 ago. 2020 9:34:24 a. m. GMT-05:00
8°10'54.799"N -76°12'45.558"W ±3.22m
Remark: Visita Inicial Valencia


Remark: Visita Inicial Valencia


Remark: Visita Inicial Valencia







