MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.

INFORME FINAL

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.

CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.

CONTRATISTA

CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS

NIT: 902050995-9

SAMC-001-2026

CONTRATANTE

ALCALDIA DE AGUACHICA

PERIODO

21 DE MAYO DE 2026 AL 20 DE JUNIO DE 2026

CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto dar un informe del MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR. entregados por parte de CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS quien actúa en función de contratista de la selección de SAMC-001-2026 cuyo contrato 110-2026 para el informe mensual 1 correspondiente del 21 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026.

Para el presente informe se describirán las actividades ejecutadas durante el periodo del 21 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026, con un porcentaje de ejecución del 44% que equivale a un valor de $ 71.048.383., para un acumulado ejecutado de 159.923.322 para el 100% que fueron acordados mediante contrato 110-2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
TABLA DE CONTENIDO 4
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 7
1.1. Localización general 8
1.2. Localización especifica 8
1.3. Características técnicas del contrato de obra 9
1.4. Presupuesto general 9
2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 11
2.1. Información general del contrato 11
2.2. Pólizas 12
2.3. Datos financieros 13
3. AVANCE DE LA OBRA 13
4. SEGURIDAD SOCIAL 16
4.1. PLANILLA ABRIL 6021408115 16
4.2. PLANILLA MAYO 6021486906 16
4.3. 4.3 PLANILLA JUNIO 17
5. PERSONAL UTILIZADO 17
6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 18
REGISTRO FOTOGRAFICO 19

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Localización general 8
Ilustración 2: localización especifica 8
Ilustración 3: presupuesto 9

TABLAS

Tabla 1: informacion del contrato....11
Tabla 2: póliza de cumplimiento anexo 0....12
Tabla 3: poliza RCE anexo 0....12
Tabla 4: poliza de cumplimiento anexo 1....13
Tabla 5 : cdp y rp....13
Tabla 6: avance de obra....13
Tabla 7: Valores del contrato....14
Tabla 8: Personal utilizado....17
Tabla 9: Relación de maquinaria....17

GRAFICAS

Grafica 1: Diagrama de barras en valores por ítems con IVA incluido 10
Grafica 2: Diagrama de barras en % por ítems con IVA incluido 10
Grafica 3: Ejecutado vs pendiente por ejecutar en valores 15
Grafica 4: Ejecutado vs pendiente por ejecutar en porcentaje 15

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

1.1. Localización general



Ilustración 1: Localización general

1.2. Localización especifica

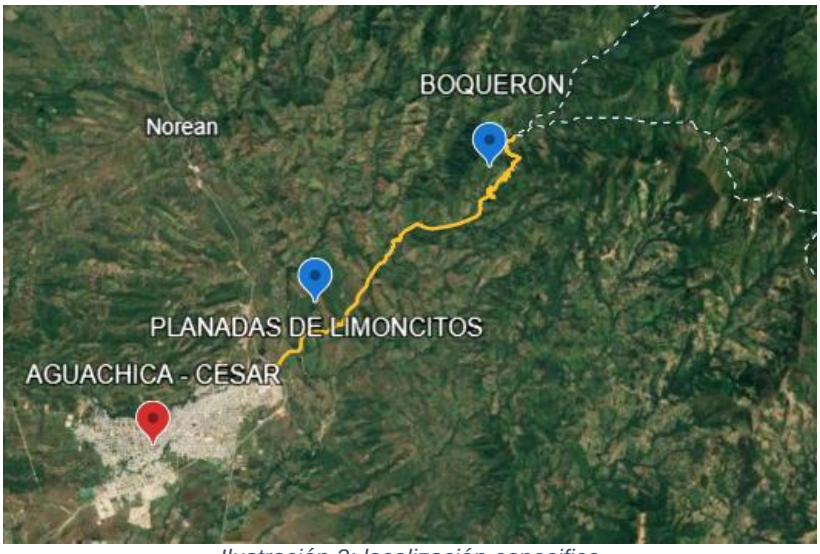


Ilustración 2: localización especifica

Aguachica está ubicada al sur del departamento del Cesar, a los 8° 18′ 45″ de latitud norte y 73° 37′ 37″ de longitud oeste del meridiano de Greenwich, entre la Serranía de los Motilones y el valle del río Magdalena, a una distancia de 280 kilómetros de Valledupar, la capital del departamento. Su extensión territorial es de 976 kilómetros cuadrados [2] que

ocupa el 3,8% de la superficie del departamento. Limita por el norte con el municipio de La Gloria (Cesar), El Carmen (Norte de Santander), por el este con Río de Oro (Cesar), por el sur con Río de Oro y San Martín (Cesar) y Puerto Wilches (Santander), por el oeste con Gamarra (Cesar) y Morales (Bolívar).

1.3. Características técnicas del contrato de obra

El contrato **110-2026 CUYO OBJETO ES:** MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR, comprende en forma general las siguientes actividades.

- Conformación de la Calzada Existente
- Transporte de material granular

1.4. Presupuesto general

En el acta realizada se ejecutaron los 2 capitulos con sus item desglosado de la siguiente manera.


PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1,1	Conformación de la Calzada Existente	m2	42.000	$ 2.024,84	$ 85.043.322,00
1,2	Transporte de material granular	m3-km	36.000	$ 2.080,00	$ 74.880.000,00
TOTAL COSTOS OBRA					**$ 159.923.322,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

Ilustración 3: presupuesto

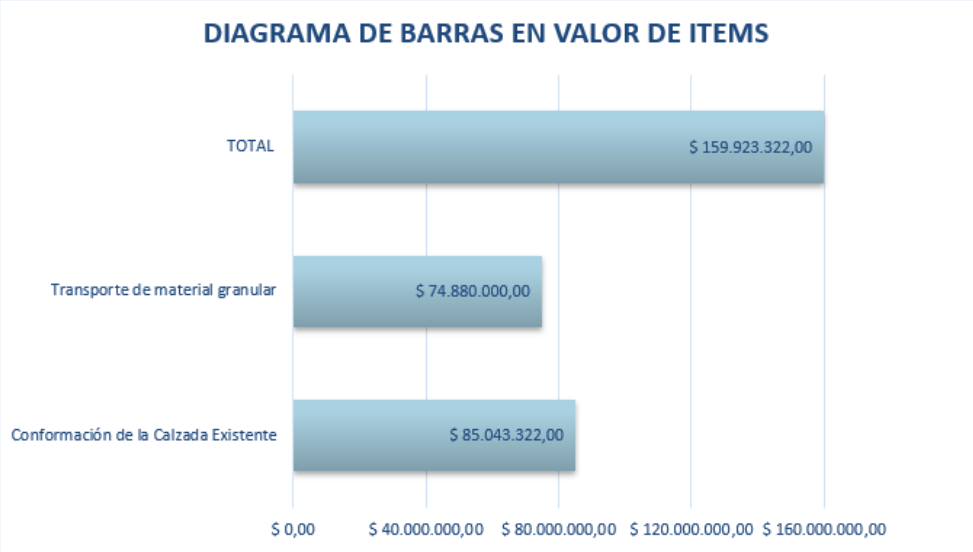

Grafica 1: Diagrama de barras en valores por ítems con IVA incluido

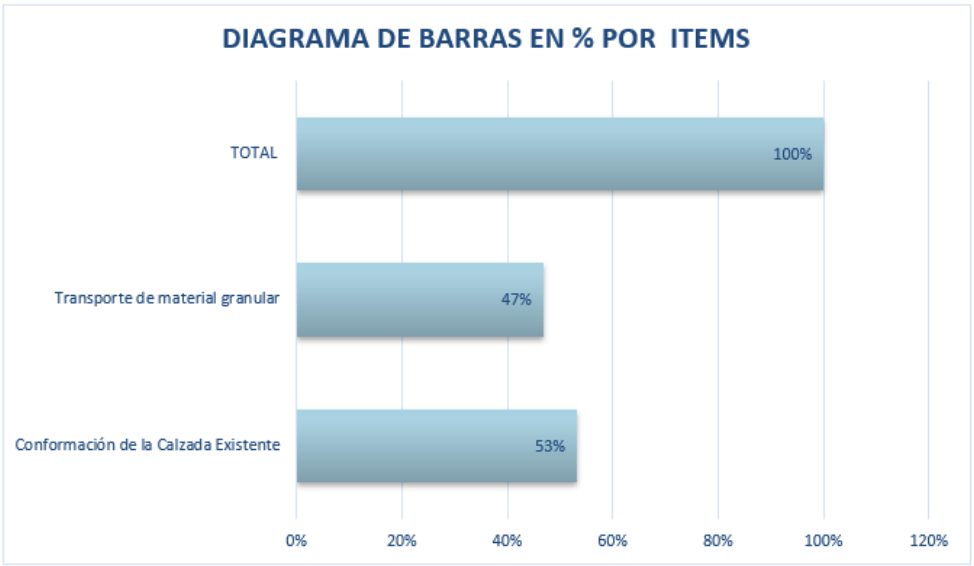

Grafica 2: Diagrama de barras en % por ítems con IVA incluido

CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

2.1. Información general del contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
Modalidad de seleccion	SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA		
Contrato nº	110-2026		
Objeto	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS PLANADAS DE LIMONCITO Y BOQUERON DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.		
Contratista	CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA		
Nit.	902050995-9		
Representante legal	LUIS FERNANDO AMAYA FRIAS		
Dirección de la Obra	Municipio de Aguachica vereda planada de limoncitos y boqueron en el departamento de Cesar		
Estado actual contrato	100%		
Fecha inicio	21 de abril de 2026		
Fecha final	20 de junio de 2026		
Valor inicial	$ **159.923.322**	Valor adicional	$ 0
Valor total de la Obra	$ **159.923.322**	Anticipo	$ 0
Valor de la Obra	Valor costo de la obra		$**159.923.322**
	Valor Adición No.		$ 0
	Valor Total del contrato		$**159.923.322**

Tabla 1: informacion del contrato

2.2. Pólizas

• Garantía de cumplimiento anexo 0

ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL
N° PÓLIZA		B - 100077445
CERTIFICADO		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN		30/03/2026

Nº POLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
B - 100077445	CUMPLIMIENTO	27/03/2026	27/11/2026	$ 31.984.664,40
B - 100077445	PRESTACIONES SOCIALES	27/03/2026	27/05/2029	$ 7.996.166,10
B - 100077445	ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/03/2026	27/05/2028	$ 47.976.996,60

Tabla 2: póliza de cumplimiento anexo 0

• Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual anexo 0

ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL
N° PÓLIZA		B – 100021785
CERTIFICADO		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN		30/03/2026

Nº POLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
B - 100021785	AMPAROS BASICOS - PREDIOS, LABORES Y OBLIGACIONES	27/03/2026	27/05/2026	$ 350,181,000
B - 100021785	PATRONAL	27/03/2026	27/05/2026	$ 350,181,000
B - 100021785	CONTRATISTA Y SUBCONTRASTISTA	27/03/2026	27/05/2026	$ 350,181,000
B - 100021785	PROPIOS Y NO PROPIOS	28/03/2026	27/05/2026	$ 350,181,000

Tabla 3: poliza RCE anexo 0

• Garantía de cumplimiento anexo 1

ASEGURADORA		SEGUROS MUNDIAL
N° PÓLIZA		B - 100077445
CERTIFICADO		ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN		22/04/2026

Nº POLIZA	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
B - 100077445	CUMPLIMIENTO	21/04/2026	22/12/2026	$ 31.984.664,40
B - 100077445	PRESTACIONES SOCIALES	21/04/2026	21/06/2029	$ 7.996.166,10
B - 100077445	ESTABILIDAD DE LA OBRA	21/04/2026	21/06/2029	$ 47.976.996,60

Tabla 4: poliza de cumplimiento anexo 1

2.3. Datos financieros

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP			
N°	CDP0120	Fecha	21/02/2026
Registro(s) Presupuestal(es) – RP			
N°	REG0170	Fecha	08/04/2026

Tabla 5 : CDP Y RP

3. AVANCE DE LA OBRA


En el periodo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades: de la semana 5 ala 8

ACTIVIDAD	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Conformación de la Calzada Existente	5.062.103,00	15.186.308,00	15.186.308,00	15.186.308,00	13.161.467,00	11.136.626,00	10.124.205,00	
Transporte de material granular	$ 8.139.131,00	$ 9.766.956,00	$ 9.766.956,00	$ 10.580.869,00	$ 12.208.695,00	$ 12.208.695,00	$ 8.139.130,00	$ 4.069.565,00
EJECUTADO	13.201.234,00	24.953.264,00	24.953.264,00	25.767.177,00	25.370.162,00	23.345.321,00	18.263.335,00	4.069.565,00
EJECUTADO ACUM	13.201.234,00	38.154.498,00	49.906.528,00	50.720.441,00	51.137.339,00	48.715.483,00	41.608.656,00	22.332.900,00
% EJECUTADO	8%	16%	16%	16%	16%	15%	11%	3%
% EJECUTADO ACUM	8%	24%	39%	56%	71%	86%	97%	100%


Tabla 6: avance de obra

DETALLE	VALORES
Valor inicial del contrato	$ 159.923.322
Valor adicional al contrato	0
Valor ejecutado del 21 de abril al 20 de mayo de 2026	$ 88.874.939
Valor ejecutado presente informe	$71.048.383
Valor ejecutado total	$159.923.322
% ejecutado del 21 de abril al 20 de mayo de 2026	56%
% ejecutado presente informe	44%
% ejecutado acumulado	100%
Valor por ejecutar	0
Valor por ejecutar en %	0%

Tabla 7: Valores del contrato

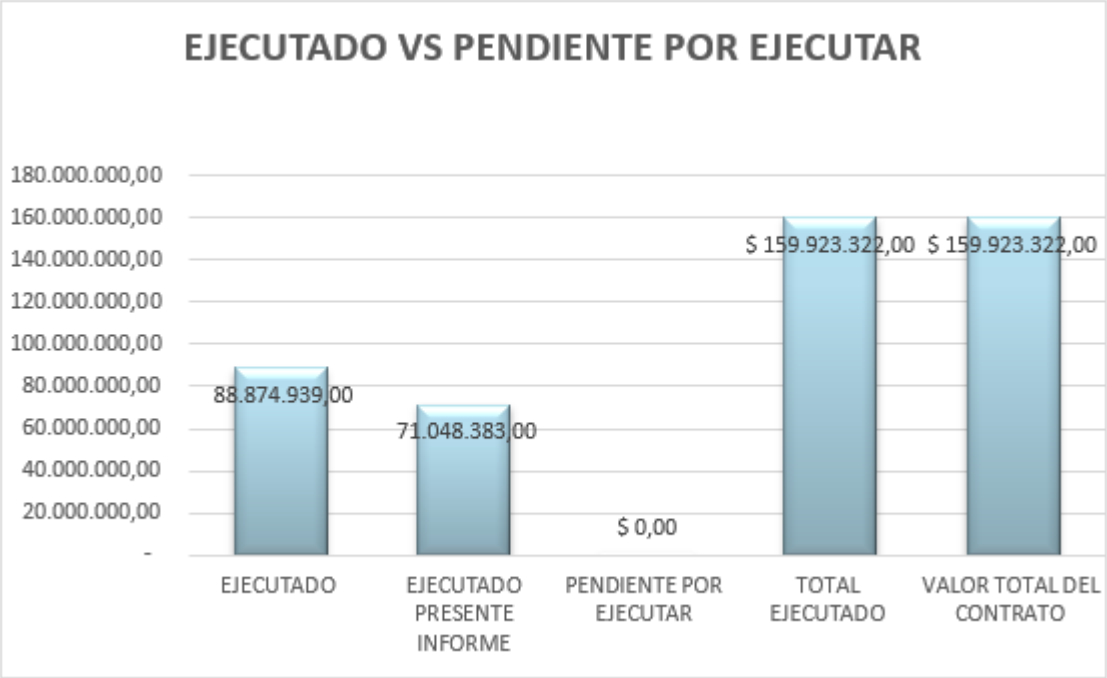


Grafica 3: Ejecutado vs pendiente por ejecutar en valores

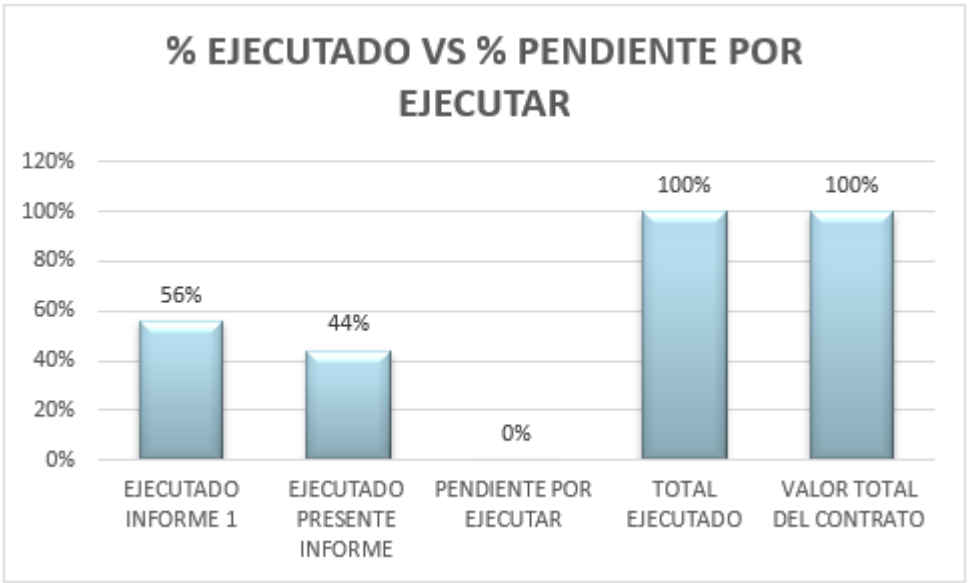

Grafica 4: Ejecutado vs pendiente por ejecutar en porcentaje

4. SEGURIDAD SOCIAL

4.1. PLANILLA ABRIL 6021408115

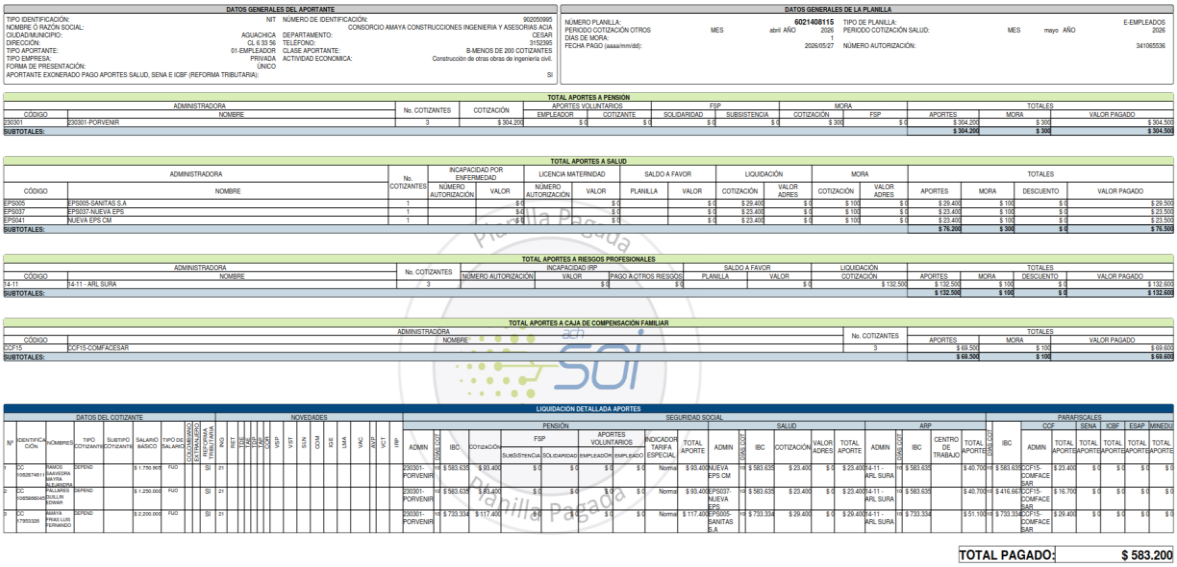

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902550995
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 33 56	TELEFONO:	3152395
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021408115	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES mayo AÑO			2026
DIAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					341065536

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 304.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 304.200	$ 300	$ 304.500
SUBTOTALES:										$ 304.200	$ 300	$ 304.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 29.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 29.400	$ 100	$ 0	$ 29.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 23.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 23.400	$ 100	$ 0	$ 23.500
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 23.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 23.400	$ 100	$ 0	$ 23.500
SUBTOTALES:													$ 76.200	$ 300	$ 0	$ 76.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 132.500	$ 132.500	$ 100	$ 0	$ 132.600
SUBTOTALES:									$ 132.500	$ 100	$ 0	$ 132.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR


ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	3	$ 69.500	$ 100	$ 69.600
SUBTOTALES:			$ 69.500	$ 100	$ 69.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO TRABAJA	IRA	SLN	INC	LMA	VAC	VCT	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	VCT	VSP	COM	EDE	EDU	PNS	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																			
																											ADMIN	AJUSTE	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	AJUSTE	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	AJUSTE	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	AJUSTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1082674614	RAMOS MANJARRA MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	21																	230301-PORVENIR	$	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	$	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	$	$ 1.750.905	$ 121.900	$	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065866536	PALLARES DUELLIN EDWAR	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI	21																	230301-PORVENIR	$	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS037-NUEVA EPS	$	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	$	$ 1.250.000	$ 87.000	$	$ 1.250.000	CCF15-COMFACESAR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 17953326	AMAYA TRIANA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	$	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	$	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	$	$ 2.200.000	$ 153.200	$	$ 2.200.000	CCF15-COMFACESAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 583.200

4.2. PLANILLA MAYO 6021486906

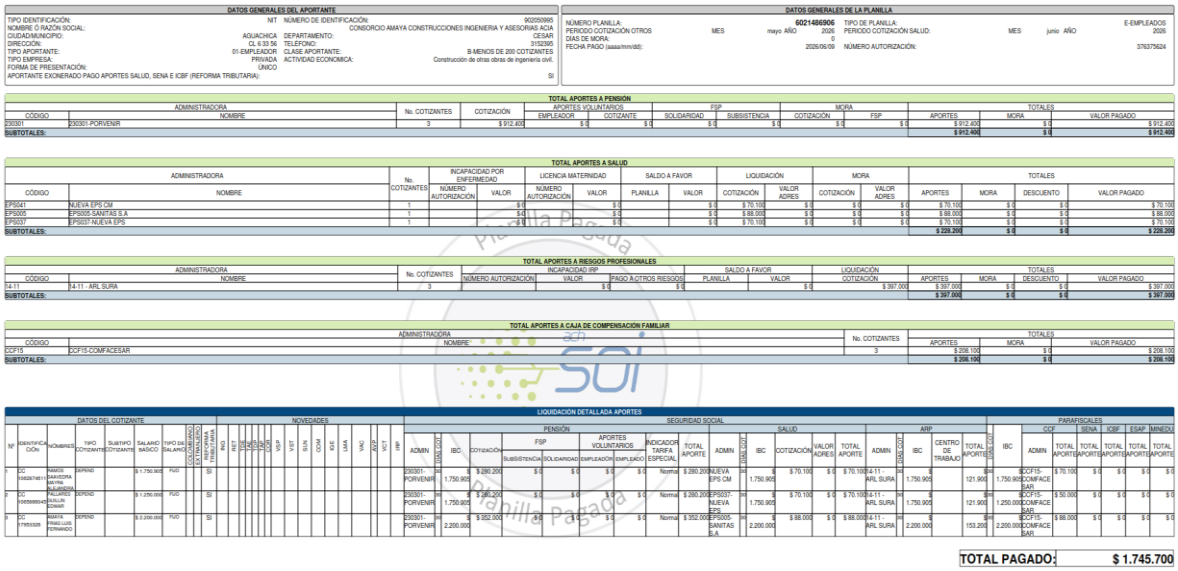

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902550995
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 33 56	TELEFONO:	3152395
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021486906	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES junio AÑO			2026
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					376375624

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 912.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.400	$ 0	$ 912.400
SUBTOTALES:										$ 912.400	$ 0	$ 912.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 88.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 228.200	$ 0	$ 0	$ 228.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 397.000	$ 397.000	$ 0	$ 0	$ 397.000
SUBTOTALES:									$ 397.000	$ 0	$ 0	$ 397.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	3	$ 208.100	$ 0	$ 208.100
SUBTOTALES:			$ 208.100	$ 0	$ 208.100


LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO TRABAJA	IRA	SLN	INC	LMA	VAC	VCT	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	VCT	VSP	COM	EDE	EDU	PNS	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																			
																											ADMIN	AJUSTE	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	AJUSTE	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	AJUSTE	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	AJUSTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1082674614	RAMOS MANJARRA MAYRA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	$	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	$	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	$	$ 1.750.905	$ 121.900	$	$ 1.750.905	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065866536	PALLARES DUELLIN EDWAR	DEPEND		$ 1.250.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	$	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	$	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	$	$ 1.750.905	$ 121.900	$	$ 1.250.000	CCF15-COMFACESAR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 17953326	AMAYA TRIANA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	$	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	$	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	$	$ 2.200.000	$ 153.200	$	$ 2.200.000	CCF15-COMFACESAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.745.700

CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com

4.3. PLANILLA JUNIO

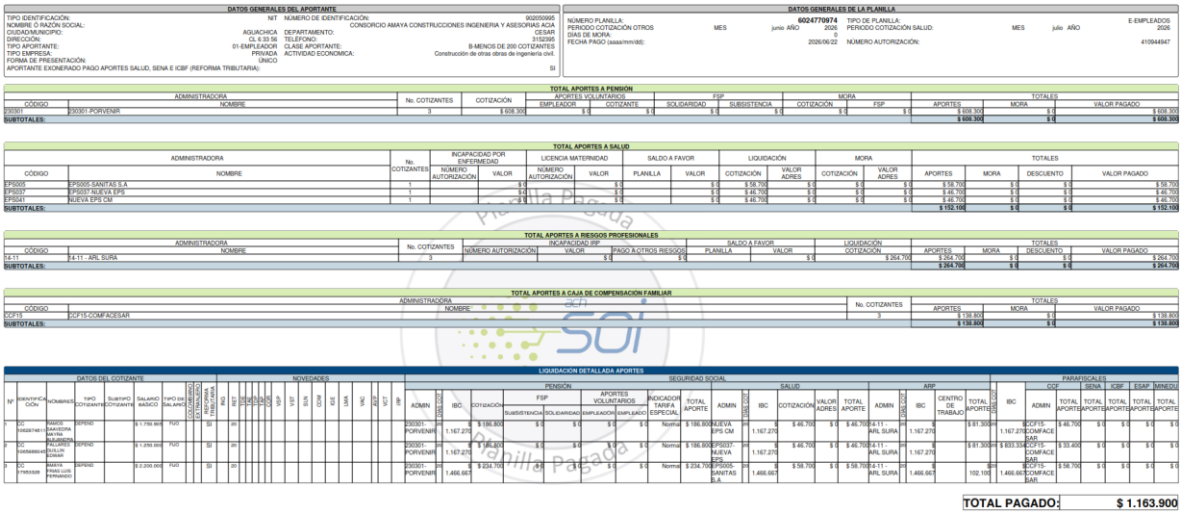

5. PERSONAL UTILIZADO

El personal utilizado será relacionado a continuación con corte del 9 de mayo de 2025.

	NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	FECHA DE EXPEDICIÓN	CARGO
1	Edwar	Pallares Guillin	1.065.866.045	4/11/2004	Director de obra
2	Luis Fernando	Amaya frías	17.953.26	14/08/1986	Ingeniero residente

Tabla 8: Personal utilizado

Relación de equipos y herramientas

Equipos	Cantidad
Motoniveladora 140G	1
Vibro compactadora 8.6 Ton	1

Tabla 9: Relación de maquinaria

CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- La Obra se encuentra al 100% correspondiente a $ 159.923.322
- Se realiza informe final de Obra y correspondiente al periodo del 21/05/2026 al 20 de junio del 2026

Cordialmente,



CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES
INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
NIT: 902050995-9
R/LEGAL LUIS FERNANDO AMAYA FRIAS
C.C. 17.953.326 de Fonseca
amayaconstrucciones.sas1@gmail.com
Ciudad Aguachica

REGISTRO FOTOGRAFICO








CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com













CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com









CONSORCIO AMAYA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y ASESORIAS ACIA SAS
Calle 6 33 56, Aguachica, Cesar, Colombia
Tel. 3185852324
Correo: amayaconstrucciones.sas1@gmail.com
