	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	240

INFORME MENSUAL NO. 5 **MES O PERIODO:** DICIEMBRE DE 2020

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO SAN JOSÉ DE URÉ**		X		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		8
2.1	Localización		X		8
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		10
2.3	Características técnicas del proyecto		X		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		13
3.1	Información general del contrato		X		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		18
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		19
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		21
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		23
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		25
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		27
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	31
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		32
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		34
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		37
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		40
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		43
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	44
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	44
	• Seguimiento Programa de Obra		X		45
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		47
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		48
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		49
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	56
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		57
5	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR**		X		67
6	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		69
6.1	Localización		X		69
6.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		70
6.3	Características técnicas del proyecto		X		70
7	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		71
7.1	Información general del contrato		X		71
7.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		72
7.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		73
7.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		74
8	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		77
8.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		78
8.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		80
8.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		82
8.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		84
8.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		86
8.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	90
8.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		91
8.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		93
8.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		96
8.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		99
8.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		102
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		104
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		105
	• Seguimiento Programa de Obra		X		106
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		108
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		109
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		110
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		125
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		129
9	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO VALENCIA**		X		139
10	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		141
10.1	Localización		X		141
10.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		142
10.3	Características técnicas del proyecto		X		142
11	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		144
11.1	Información general del contrato		X		144

11.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		145
11.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		146
11.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		146
12	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		149
12.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		150
12.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		152
No.	**CONTENIDO**	**FORMATO**	**ADJUNTO**		
			SI	**NO**	**FOLIO**
12.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		154
12.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		157
12.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		159
12.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	161
12.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		162
12.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		164
12.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		167
12.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		170
12.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		173
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	174
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	174
	• Seguimiento Programa de Obra		X		175
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		177
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		178
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		179
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	189
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		190
13	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		199
13.1	Información general del contrato		X		199
13.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		200
13.3	Informes especialistas		X		200
13.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		206
13.5	Información otros programas y aplicativos		X		207
14	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		208
14.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		209
14.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		211
14.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		213
14.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		215
14.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		217
14.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		220
14.7	Otros documentos seguimiento mensual			X	223
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		X	224
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	224
15	**Conclusiones y recomendaciones**		X		225
16	**Anexos**		X		227
16.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		228
16.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		231
16.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			X	231

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INVIAS N° 779 - 2020

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 5



Versión 0
Tomo 1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN N°	FECHA	PÁGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA	
				SI	NO

Elaborado por: **Residente de Obra 1** **Carlos Alberto Cortes Valero**	Elaborado por: **Residente de Obra 2** **Elkin Enrique Estrada Coronado**	Revisado por: **Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**
Aprobado por: **Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**		

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA N°	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	INVIAS	
2	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE URÉ	
3	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LIBERTADOR	
4	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALENCIA	

CONTRATO DE OBRA No. 056 de 2020

SAN JOSÉ DE URÉ

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

1. INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5** correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabela Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

El Acta de iniciación al contrato No. 056 de 2020, correspondiente al municipio de San José de URÉ, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista 4L INGENIERÍA S.A.S. la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ representado por el Secretario de Planeación Municipal.

El Acta de iniciación al contrato No. LP-MPL-002-2020, correspondiente al municipio de Puerto Libertador, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista CONSORCIO

MEJORAMIENTO VIALES, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR representado por el Secretario de Infraestructura.

El Acta de iniciación al contrato No. MV-LP-002-2020, correspondiente al municipio de Valencia, fue inscrita el día 13 de agosto de 2020 entre el contratista TVP MUNICIPIOS, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE VALENCIA representado por el Supervisor.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SAN JOSÉ DE URÉ

De acuerdo con el Convenio Interadministrativo Numero 000551, suscrito entre el Municipio de San José de URÉ Córdoba y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural, se tiene que de los 10.000 metros de vías que tiene el tramo VERSALLES- BRAZO IZQUIERDO – ALTO DEL CRISTAL; la entidad entrara a construir 500 metros de placa huella, y del tramo VERSALLES – SAN PEDRITO que tiene una longitud de 8000 metros, se construirá 560 metros de Placa Huella. Para un total de 1060 metros de obra efectivamente construida (Placa huella).

Las vías objeto del alcance del contrato se encuentran catalogadas como vías rurales, y se encuentran en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad a los sitios descritos a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ	
San José de Uré:	• Tramo N° 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal • Tramo N° 2 – Versalles – San Pedrito

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SAN JOSÉ DE URÉ

El mejoramiento de vías en el Municipio de San José de URÉ contempla dos tramos: el tramo Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal que se localiza en la parte sur del municipio y el tramo Versalles – San Pedrito que se localiza en el costado sur del municipio.

El tramo N° 1 a mejorar se localiza desde el K0+000 (inicio de placa huella vereda Versalles) al K10+000 (Vereda Alto del Cristal).

El tramo N° 2 a mejorar se localiza en el K0+000 (Puente vehicular) en las coordenadas 829556.004 N y 1345283.72 E al K9+700 (Escuela San Pedrito), a la cual en la visita de reconocimiento no se tuvo acceso por las difíciles condiciones de transitabilidad.



Figura 1. Zona de localización de los tramos a intervenir
Fuente: Informe de Topografía URÉ



Figura 2. Trazado Versalles – Brazo – Izquierdo – Alto de Cristal
Fuente: Anexo Técnico San José de URÉ



Figura 3. Trazado Versalles - San Pedrito
Fuerte: Anexo Técnico San José de URÉ

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
San José de Uré	Tramo N° 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal	500,00	7,00
	Tramo N° 2 – Versalles – San Pedrito	560,00	7,00

La visita de reconocimiento a los tramos viales se realizó el 18 de agosto de 2020, en compañía de Contratista, Alcaldía, INVIAS e Interventoría, encontrando inconvenientes para el acceso al Tramo N° 2 Versalles – San Pedrito para el cual hay que atravesar la quebrada San Antonio, y el

día de la visita no fue posible realizar este cruce, ya que no existe puente alguno, por lo tanto, se reprogramo la visita para el día 25 de Agosto con la coordinación de la comunidad y de vehículos de tracción animal.

En el recorrido no se detectaron las obras a realizar por el deterioro del tramo vial, la rasante de la vía no se encontró definida en todo el recorrido realizado, en el registro fotográfico se evidencia esta situación.

Al respecto de lo encontrado en este tramo se realizó comité virtual el día 31 de agosto, con el INVIAS, alcaldía, contratista e interventoría para revisar la posibilidad de trasladar los recursos de inversión al tramo N° 1.

En cuanto al sector Versalles – Brazo Izquierdo se realizó visita de reconocimiento el 18 de agosto detectando las obras a ejecutar y los sectores de placa huella a construir.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, limpieza de alcantarillas y cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que se revisaran por parte del contratista en el primer mes de ejecución del contrato, el cual es de revisión y ajustes a los diseños recibidos.

Tramo 1. Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	H	
K2+650	7	1	1	BOX COULVERT
K4+200 – K4+400	200	5	0.15	PLACA HUELLA
K4+880 – K5+030	150	5	0.15	PLACA HUELLA
K7+000 – K7+150	150	5	0.15	PLACA HUELLA
SERÁN PRIORIZADAS	4000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	3.1 Ha			Rocería a cada lado de la vía

Tramo 2. Versalles – San Pedrito

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	H	
K1+700 – K1+910	210	5	0.15	PLACA HUELLA
K3+400 – K3+550	150	5	0.15	PLACA HUELLA
K4+000 – K4+200	200	5	0.15	PLACA HUELLA
K5+680	6	0.9	0.9	Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K5+700	7	1	1	BOX COULVERT
SERÁN PRIORIZADAS	4000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	4 Ha			Rocería a cada lado de la vía

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SAN JOSÉ DE URÉ

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN JOSÉ DE URÉ

CONTRATO DE OBRA N° 056 DE 2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.096.689.836,00 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE URÉ
CONTRATISTA	**4L INGENIERÍA S.A.S.**, NIT. 901.144.628-1 R.L. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ PADILLA
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CALLE 35 # 8 A 4
PBX	3 23 28 62
CORREO ELECTRÓNICO	Jose.mor2012@hotmail.com
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 DE MARZO DE 2021
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° 056 de 2020, por la aseguradora suramericana, hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
2648705-3	Cumplimiento	14/08/2020	13/09/2021	$109.668.984,00	CONTRATO DE OBRA	24/07/2020
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/08/2020	14/08/2023	$219.337.967,00		
	Estabilidad de Obra.	14/08/2020	14/08/2025	$329.006.951,00		
	Calidad de los bienes y equipos suministrados	14/08/2020	14/08/2025	$5.754.104,00		
0703665-5	Responsabilidad civil	24/07/2020	23/01/2021	$175.560.600,00		


3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES


Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020:


- El día 01 de diciembre se inician actividades en el tramo Versalles – Brazo izquierdo, en el campamento de Versalles se realiza figuración de acero para las placas de concreto clase D, vigas riostras, cunetas y bordillos del proyecto.
- De igual forma se inician las actividades en el tramo Versalles – Brazo izquierdo, en las Abs 7 +000 a la Abs 7 +150 con las actividades de Excavación en la calzada de la vía.
- El día 03 de diciembre en el tramo Versalles – Brazo izquierdo, en la Abs 4+880 hasta Abs 5+030 se realiza la excavación de la subrasante.
- En la semana 18 del proyecto que inicia el 4 de diciembre de 2020, se inicia los trabajos de suministro y compactación del material de subbase y el proceso de fundida de concreto clase D y cuneta; en el tramo Versalles – Brazo izquierdo, en las Abs 7 +000 a la Abs 7 +150. Estas actividades se vienen realizando en el sentido de la Abs 7 + 150 hacia Versalles.
- En la semana 19 del proyecto que inicia el 11 de diciembre, en el tramo Versalles – Brazo izquierdo, en las Abs 7 +000 a la Abs 7 +150, continúan las actividades de fundida de Concreto clase D y cunetas con la instalación de sus respectivos refuerzos en acero y se inicia la actividad de suministro de concreto con piedra pegada. En la Abs 4+880 hasta Abs 5+030 se realiza el suministro y compactación de material de subbase.
- El día 15 de diciembre se realiza el acta de comité de obra en el municipio de Montelibano en instalaciones provisionales de la alcaldía de San Jose de Ure. En este comité se solicita la entrega a la corrección del PAGA al contratista y se compromete a entregarlos el día 18 de diciembre de 2020; también se informa la necesidad de realizar los ensayos de laboratorios pertinentes en donde se evidencie la compactación de la subbase y la resistencia de concretos; el Arq. Juan Serpa, funcionario de la Alcaldía de San Jose de Ure, informa que los recursos del tramo San Pedrito no se van a trasladar al tramo de Brazo Izquierdo y que la Alcaldía se compromete a realizar el mejoramiento de la vía Versalles – San Pedrito ya que la vía se perdió con capa vegetal por el NO USO de esta.
- El 22 de diciembre no se pudo realizar el comité semanal de obra ya que el contratista estaba resolviendo el pago de la mano de obra para las navidades y la Alcaldía en cierre de fin de año. El siguiente comité de obra se realizará el martes 05 de enero de 2021.

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

AVANCE FÍSICO			AVANCE EN TIEMPO			AVANCE FINANCIERO		
CORTE A:			jue. 31 dic. 20			CORTE A:		jue. 31 dic. 20
	%	INVERSIÓN		%	Días		%	VALOR
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	28,38%	$ 311.211.596,05	TIEMPO CONTRATADO:	100%	210	PRESUPUESTO CONTRATO	100%	$ 1.096.689.836,00
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	15,20%	$ 166.705.688,71	TIEMPO EJECUTADO:	66,19%	139	ACUMULADO ACTAS	0,00%	$ -
POR EJECUTAR	84,80%	$ 929.984.147,29	TIEMPO POR EJECUTAR:	33,81%	71	POR PAGAR EN ACTAS	100,00%	$ 1.096.689.836,00
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	-13,18%	-$ 144.505.907,34	ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	-13,18%	- 27,67			

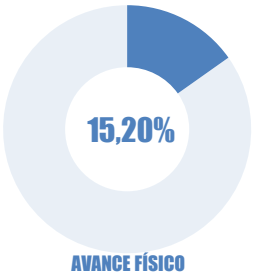





El contrato actualmente se encuentra con un retraso del 13.18%, ya que se presentaron inconvenientes por las lluvias que se presentaron este mes en conjunto al mal estado de la vía de acceso para llegar hasta Brazo Izquierdo, esto presento retraso en cuanto a la realización de actividades en obra.

Otras actividades realizadas

Se culmina con la revisión de estudios y diseños allegados por el contratista el día 26 de DICIEMBRE de 2020, donde el contratista subsano las observaciones al estudio hidráulico.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2020, se han llevado a cabo las siguientes actividades, las cuales están sujetas a la supervisión y control por parte de esta interventoría:

- Mediante comunicado C. Int - 144 del 10 de diciembre de 2020, se solicita documentación como la afiliación para nuevo personal y certificados de calidad y calibración.
- Mediante comunicado C. Int - 148 del 11 de diciembre de 2020, se solicita tomar medidas inmediatas a la Alcaldía de San Jose de Ure y al Contratista por un atraso del 18,59%.
- Mediante comunicado C. Int - 149 del 14 de diciembre de 2020, se solicita al contratista entregar las observaciones al documento PAGA.
- Mediante comunicado C. Int - 151 del 14 de diciembre de 2020, se cita a comité semanal de obra a la Alcaldía de San Jose de Ure y al Contratista.
- Mediante comunicado C. Int - 154 del 17 de diciembre de 2020, se da aprobación de reprogramación 3 de Obras.
- Mediante comunicado C. Int - 159 del 28 de diciembre de 2020, se da aprobación del PAGA, pero se solicitan documentos ambientales para complementarlo.
- Se entrega a la Secretaria de Hacienda, a la Tesorera y al Arq Serpa el oficio DT-COR 53426 con la circular externa 23 para el Reintegro de los rendimientos financieros del trimestre vía Whatsapp

AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

VALOR PROGRAMADO (BÁSICO DE OBRA)	$311.211.596,05	28,38%
VALOR EJECUTADO	$ 166.705.688,71	15,20%

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra retrasado con las actividades de obra, debido a las lluvias presentadas y el mal estado de acceso del proyecto.

AVANCE FÍSICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

PROGRAMADO	25,76 %
EJECUTADO	14,38%

La programación corresponde a inicio de actividades en obra tales como:

- Excavaciones varias en material común en seco.
- Subbase
- Concreto de Resistencia 21Mpa (D)
- Acero de refuerzo de fy = 4200 Kg/cm2 (60.000 PSI)

AVANCE PREDIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Mediante comunicado SRT 46428 de fecha 19 de DICIEMBRE de 2020, el instituto nacional de vías – INVIAS, aprueba las hojas de vida de los residentes de interventoría.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: DICIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 056 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA MARCO IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA

PLAZO INICIAL: SIETE MESES (7)
FECHA DE INICIACION: 14 DE AGOSTO 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.096.689.836,00
VALOR ACUMULADO: $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 4,5
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	1060
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	ML	72
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 302.061.838,82	$ 157.115.516		$ 157.115.516	52%	$ 19.779.704,00	100%	13%
Acumulado:	$ 516.034.892,13	$ 166.705.689		$ 166.705.689	32%	$ 61.073.224,43	100%	37%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.096.689.836
Total	

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	7,00	6,00	1,00	1	1	0	$ 1.096.689.836	$ 939.574.320
Interventor:	0,43	5,00	1,00	0,00	$ 242.856.851,72	2,5	$ 242.856.851,72	$ 242.856.851,72

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.559.725,71
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	7.559.725,71

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14-ago-20	13/9/2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14/8/2020	14/8/2023
Calidad de Estudios y Diseños	14/8/2020	14/8/2025
Estabilidad y Calidad de Obra	14/8/2020	14/8/2025

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	24/7/2020	23/1/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 24-jul-20

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

C. Int - 148 (Solicitud Medidas por atraso), C. Int - 149 (Seguimiento al documento PAGA), C. Int - 151 (Comité de obra), C. Int - 154 (Aprobación reprogramación No. 3), C. Int - 155 (Acta de aprobación parcial de estudios y diseños), C. Int - 159 (Solicitud formatos ambientales).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Es necesario cumplir con la programación estipulada para dar cumplimiento al tiempo de ejecución de la obra en el plazo inicialmente contratado. Es necesario abrir más frentes de obra para poder cumplir con la programación, ya que se están presentando un incremento en el atraso del proyecto. Hacer un seguimiento completo al protocolo de bioseguridad del contratista y cumplimiento del PAPSO. Velar por el cumplimiento de todos los programas que contiene el PAGA, ya que este se encuentra aprobado por la interventoría. Ejercer control a las actividades físicas de obra, realizando ensayos de laboratorio para verificar densidades del terreno y la capacidad de resistencia del concreto.
Así mismo, verificar la cuantía del acero suministrado en la fundida del hormigón. VALOR PROGRAMADO $311.211.596.05 (28,38%), VALOR EJECUTADO $166.705.689 (15,20%)

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.25202-097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **CONTRATO No.** 056 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DELCRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS **SECTOR:** SAN JOSE DE URÉ (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
MINI CARGADOR DE PALA Y RODILLO	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
COMPRESOR 125 PIES 3 CON MARTILLO	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA)	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
FORMALETA METALICA CONCRETO HIDRAULICO	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
CIZALLA	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
VOLQUETA	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
TRACTOR	A	A	A	A	R		A	A	A	A	R	R		R	R	R	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS	A	A	A				A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		A		A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Nombre: ANA MARIA LAKAH
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: CARLOS CORTES
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 0820275862ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: DICIEBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 056 DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DELCRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

SECTOR: SAN JOSE DE URÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 770 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	20	21	22	23			24	25	26		27	28	29		30	31
Rafael Eduardo Montes Navas	Director de obra	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X		X	X	X	X	X
Ana Maria Lakah Nova	Residente de obra	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X		X	X	X	X	X
Johanis Vasquez Padilla	Tecnico SGSST	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X		X	X	X	X	X
Angelica Guillenis Durango	Profesional de trabajo social	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X		X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma: Ana María Lakah N.
Nombre: ANA MARIA LAKAH
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma:
Residente de Interventoría
Matricula No.:
Nombre: CARLOS CORTES
0820275862ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 12 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRAMO VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTO DEL CRISTAL

SECTOR: SAN JOSÉ DE URÉ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	155		155	SRG	056 DE 2020	1.096.689.836,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.096.689.836,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.066.725.168		1.066.725.168,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.784.321		10.784.321,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			0,00
AJUSTES			0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 16.117.939	$ 3.062.408	19.180.347,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			0,00
VALOR TOTAL			1.096.689.836,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JESÚS MARTINEZ PADILLA
Representante Legal
Matrícula No.: 22202311394 COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MIN FRA-MN-IN-1 5-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA		DE	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CC RDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 12 de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALL ES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOSDEL CRISAL Y VERSALL ES - SAN PED RITO

SECTOR: SAN JOSÉ DEURÉ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	X		X	X					X			X		X	X	X	X		X		X	X	X	X				X	X	X	X	432
Lluvias moderadas		X					X	X										X								X					144
Lluvias intensas					X					X	X																					72
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Ana María Lakah N.
Nombre: ANA MARIA LAKAH
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202-221903COR

Firma
Nombre: CARLOS CORTEZ VALERO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 0820275862ATL

Original: Informe mensual / rchivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial


Tiempo mensual para San José de Uré, Córdoba, Colombia
08:20 CDT
Dic. 2020
DOM. LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.
29 32° 23°
30 31° 24°
1 31° 23°
2 31° 23°
3 31° 23°
4 31° 23°
5 32° 23°
6 32° 23°
7 32° 24°
8 32° 24°
9 31° 24°
10 32° 24°
11 32° 23°
12 33° 23°
13 33° 23°
14 33° 23°
15 33° 23°
16 32° 24°
17 32° 24°
18 33° 24°
19 33° 24°
20 33° 23°
21 33° 23°
22 33° 23°
23 33° 23°
24 32° 23°
25 32° 22°
26 32° 21°
MARTES, 22. DIC.
33° / 23°
Parcialmente Nublado
21%
Cuarto creciente
Alta Récord
Baja Récord
Amanecer 06:10
Atardecer 17:51
Salida De Luna 12:39
Puesta De Luna 00:15
27 31° 21°
28 31° 22°
29 31° 22°
30 31° 22°
31 31° 22°
1 31° 22°
2 31° 22°

Tiempo mensual para San José de Uré, Córdoba, Colombia

08:20 COT

Ene. 2021

DOM.	LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.
27	28	29	30	31	1	2
31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°
21°	22°	22°	22°	22°	22°	22°
3	4	5	6	7	8	9
31°	31°	31°	Avg	Avg	Avg	Avg
22°	22°	22°	--	--	--	--
10	11	12	13	14	15	16
Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg
--	--	--	--	--	--	--

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11
(NO APLICA PARA ESTE INFORME)

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA.

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERÍA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES-BRAZO IZQUIERDO-ALTOS DEL CRISTAL

SECTOR: SAN JOSE DE URÉ

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
ELIECER MANUEL PERTUZ POLO		dic-20	30	1.007.794.975	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
CIPRIAM RIQUEME JOSÉ EDWIN.		dic-20	30	1.045.425.935	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
ORTIZ MARTINEZ IVAN ANDRES		dic-20	30	1.063.297.018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
DE HOYOS VEGA AMAURY ANTONIO		dic-20	30	1.066.570.957	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
CIPRIAN MENDEZ MANUEL SABINO		dic-20	30	1.193.150.863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
LONDOÑO CORREA YAIR		dic-20	30	1.193.150.881	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
RUDA PEREZ LEIDER JESUS		dic-20	30	1.197.215.399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
CIPRIAM ROQUEME ARGELIO JOSE		dic-20	30	78.298.659	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
ORTIZ PADILLA JADER MANUEL		dic-20	30	78.301.766	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	
SOTELO DIEGO DAVID		dic-20	30	78.302.962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4368429153	30		4368429153	30	4368429153	30	4L INGENIERIA SAS	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Director de Obra
Matricula No.: 22202-139976COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.8 INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No:** 5,00 **PERIODO MES:** DICIEMBRE **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	056 DE 2020	PLAZO INICIAL:	SIETE MESES (7)	PLAZO ACUMULADO:	4,5
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA MARCO IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	12/03/2021
SECTOR:	SAN JOSE DE URE	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.096.689.836	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	VERSALLES-BRAZO IZQUIERDO-ALTOS DEL CRISTAL	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
056-2020	4,5	12/03/2020	1.096.689.836,00	###############

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	1.096.689.836,00
Total	1.096.689.836,00

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
779-2020	5	13/03/2021	$ 426.276.525,00	426.276.525,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 169.868.875,08	$ 1.065.574,82		$ 1.065.574,82	0,01	$ 9.665.073,00	1,00	9,07
Acumulado:	$ 187.542.828,18	$ 9.590.173,41		$ 9.590.173,41	0,05	$ 41.293.520,43	1,00	4,31

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,01	3,50	0,50	3,50	$ 1.087.099.662,59	0	$ 1.096.689.836,00	$ 909.147.007,82
Interventor:	0,10	4,00	0,80	1,00	$ 302.395.963,72	0	$ 302.395.963,72	$ 302.395.963,72

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.559.725,71
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	7.559.725,71

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 832.640	$ -	$ 1.248.960	$ -
Relleno para estructuras con recebo														$ 577.088	$ -	$ 1.154.176	$ -
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 7.362.704	$ -	$ 14.725.408	$ -
Concreto resistencia 14 Mpa (F)														$ 1.019.755	$ -	$ 1.528.408	$ -
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 6.280.313	$ -	$ 18.242.813	$ -
Subbase Granular Clase C														$ 36.812.920	$ 78.195.468	$ 56.304.762	$ 78.789.568
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 1.019.115	$ 1.162.806	$ 1.557.187	$ 1.162.806
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 53.688.248	$ 38.732.066	$ 80.887.345	$ 38.732.066
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa														$ 13.109.312	$ 4.880.775	$ 13.109.312	$ 4.880.775
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 49.367.033	$ 21.340.975	$ 73.819.750	$ 21.340.975
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.														$ 29.453.130	$ 12.803.426	$ 29.453.130	$ 12.803.426
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles														$ -		$ -	
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles														$ -		$ -	
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad														$ -		$ -	
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS														$ 10.184.273		$ 19.180.346	$ 8.996.073
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL														$ -		$ -	
Etapa de cierre financiero														$ -		$ -	
														$ 209.706.531,0	$ 157.115.516	$ 311.211.597	$ 166.705.689

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre : RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Director de Obra
Matricula No.: 22202-139976COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.9 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.096.689.836,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.096.689.836,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.180.346,82

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.180.346,82

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 109.668.984,00	14	8	2020	13/09/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 219.337.967,00	14	8	2020	14	8	2023
Calidad de Estudios y Diseños	0,52%	$ 5.754.104,00	14	8	2020	14	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 329.006.951,00	14	8	2020	14	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2648705-3

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16%	$ 175.560.600,00	24	7	2020	23	1	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIO: (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** **FECHA DE VENCIMIENTO:** (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 de 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:**

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:**

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:**

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:**

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:**

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RAFAEL EDUARDO MONTES
Director de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: RAFAEL EDUARDO MONTES
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.25202097497CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

(NO APLICA)

- ✓ **Seguimiento Programa de Obra**

- ✓ **Seguimiento Programa de Inversiones.**

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

MINGRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	DICIEMBRE (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Indicar consecutivo)

CONTRATO No: 056 DE 2020
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA: 4L INGENIERIA S.A.S.
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal Y Versalles - San Pedrito (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/08/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.096.689.836,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.096.689.836,00

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las prorrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.665.280,00	0,152%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,08%	0,04%	0,00%				100%
	$1.665.280,00	0,152%	$0	$ P				$416.320	$832.640	$416.320					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				96,00%
Relleno para estructuras con recebo	$2.308.350,00	0,210%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%				
	$2.308.350,00	0,210%	$0	$ P				$577.088	$577.088	$577.088	$577.088				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				90,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$19.633.878,60	1,790%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	0,45%	0,00%				
	$19.633.878,60	1,790%	$0	$ P				$7.362.704	$7.362.704	$4.908.470					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				84,00%
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	$2.039.509,50	0,186%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	0,05%	0,00%				
	$2.039.509,50	0,186%	$0	$ P				$508.653	$1.019.755	$511.102					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				78,00%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$24.523.125,00	2,236%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,09%	0,57%	0,57%	0,00%				
	$24.523.125,00	2,236%	$0	$ P				$11.962.500	$6.280.313	$6.280.313					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				72,00%
Subbase Granular Clase C	$164.557.749,60	15,005%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	3,36%	6,32%	3,55%				
				$ P				$19.491.842	$36.812.920	$69.284.314	$38.968.674				
	$164.557.749,60	15,005%	$0	$ E											
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				66,00%
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.565.776,00	0,416%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	0,18%	0,10%				
				$ P				$538.072	$1.019.115	$1.924.173	$1.084.415				
	$4.565.776,00	0,416%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				60,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$266.311.405,50	24,283%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,48%	4,90%	9,66%	7,25%				
				$ P				$27.199.097	$54.688.248	$105.958.606	$79.467.455				
	$266.311.405,50	24,283%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				54,00%
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.025.073,10	8,574%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	4,22%	3,16%				
				$ P					$18.109.312	$46.237.578	$34.678.184				
	$94.025.073,10	8,574%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				48,00%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$248.219.961,00	22,634%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	4,50%	9,09%	6,82%				
				$ P				$24.452.717	$49.367.033	$99.657.263	$74.742.948				
	$248.219.961,00	22,634%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				42,00%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$187.667.421,30	17,112%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,69%	5,70%	8,72%				
				$ P					$29.453.130	$62.555.807	$95.658.484				
	$187.667.421,30	17,112%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				36,00%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$378.986,00	0,035%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%				
				$ P						$94.747	$284.240				
	$378.986,00	0,035%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				30,00%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$45.600.000,00	4,158%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	3,05%				
				$ P						$12.160.000	$33.440.000				
	$45.600.000,00	4,158%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				24,00%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.228.653,00	0,477%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%				
				$ P							$5.228.653				
	$5.228.653,00	0,477%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				18,00%
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$19.180.346,82	1,749%	0,00%	% P	0,27%	0,27%	0,27%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%				
				$ P	$2.998.691	$2.998.691	$2.998.691		$10.184.273						
	$19.180.346,82	1,749%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				12,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.784.321,00	0,983%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%				
				$ P							$10.784.321				
	$10.784.321,00	0,983%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				6,00%
Etapa de cierre financiero				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P											
				$ E											
				% F	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.096.689.836**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.096.689.836**														

		1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,27%	0,27%	0,27%	8,44%	19,12%	37,44%	34,19%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.998.691,20	$ 2.998.691,20	$ 2.998.691,20	$ 92.508.991,97	$ 209.706.330,50	$ 410.363.780,05	$ 374.914.460,34
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,27%	0,55%	0,82%	9,26%	28,38%	65,81%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.998.691,20	$ 5.997.382,39	$ 8.996.073,59	$ 101.505.065,56	$ 311.211.396,05	$ 721.775.376,08	$ 1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)					$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.096.689.836,42**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.096.689.836,42**

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor programado	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **IESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 2220231139 4COR

Aprueba Firma:
Nombre: **IUAN DIEGO IIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Aprueba Firma
Nombre :
Jefe unidad ejecutora
Matrícula:

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MIN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN:	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA:	31 (Día)	DIC (Mes)	2020 (Año)


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No: DE 1 a 31 de Diciembre 2020 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
SEGUIMIENTO No: 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al numero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 056 DE 2020
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA: 4L INGENIERIA S.A.S.
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal Y Versalles - San Pedrito (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/08/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.096.689.836,00 (según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.096.689.836,00

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las paborgas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 18/08/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.665.280,00	0,152%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,00%	0,00%
	$1.665.280,00	0,152%	$0	$ P				$832.640	$832.640		
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relleno para estructuras con recebo	$2.308.350,00	0,210%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%
	$2.308.350,00	0,210%	$0	$ P				$1.154.175	$1.154.175		
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$19.633.878,60	1,790%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	0,45%	0,00%	0,00%
	$19.633.878,60	1,790%	$0	$ P				$14.725.409	$4.908.470		
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	$2.039.509,50	0,186%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%
	$2.039.509,50	0,186%	$0	$ P				$1.019.755	$1.019.755		
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$24.523.125,00	2,236%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%
	$24.523.125,00	2,236%	$0	$ P				$24.523.125			
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subbase Granular Clase C	$164.557.749,60	15,005%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	1,25%
	$164.557.749,60	15,005%	$0	$ P				$41.139.437	$54.852.583	$54.852.583	$13.713.146
				$ E					$78.195.468		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,13%	0,00%	0,00%
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.565.776,00	0,416%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,14%	0,14%	0,03%
	$4.565.776,00	0,416%	$0	$ P				$1.141.444	$1.521.925	$1.521.925	$380.481
				$ E					$1.162.806		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$266.311.405,50	24,283%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	5,20%	6,94%	5,20%	
	$266.311.405,50	24,283%	$0	$ P				$57.066.730	$76.088.973	$76.088.973	$57.066.730
				$ E					$38.732.066		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,53%	0,00%	0,00%
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.025.073,10	8,574%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,57%	3,43%	2,57%
	$94.025.073,10	8,574%	$0	$ P					$28.207.522	$37.610.029	$28.207.522
				$ E					$4.880.775		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$248.219.961,00	22,634%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	4,85%	6,47%	6,47%	4,85%
	$248.219.961,00	22,634%	$0	$ P				$53.189.992	$70.919.989	$70.919.989	$53.189.992
				$ E					$21.340.975		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,95%	0,00%	0,00%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$187.667.421,30	17,112%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,70%	5,70%	5,70%
	$187.667.421,30	17,112%	$0	$ P					$62.555.807	$62.555.807	$62.555.807
				$ E					$12.803.326		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	0,00%	0,00%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$378.986,00	0,035%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
	$378.986,00	0,035%	$0	$ P						$189.493	$189.493
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$45.600.000,00	4,158%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%	2,08%
	$45.600.000,00	4,158%	$0	$ P						$22.800.000	$22.800.000
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.228.653,00	0,477%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	
	$5.228.653,00	0,477%	$0	$ P						$5.228.653	
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$19.180.346,82	1,749%	94,44%	% P	0,58%	0,58%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$19.180.346,82	1,749%	$18.114.772	$ P	$6.393.449	$6.393.449	$6.393.449				
				$ E		$7.459.024	$1.065.575	$9.590.173			
				% E	0,00%	0,68%	0,10%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.784.321,00	0,983%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%
	$10.784.321,00	0,983%	$0	$ P							$10.784.321
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Etapa de cierre financiero		0,000%	#¡DIV/0!	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,000%	$0	$ P							
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.096.689.836,42**										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.096.689.836,42**										

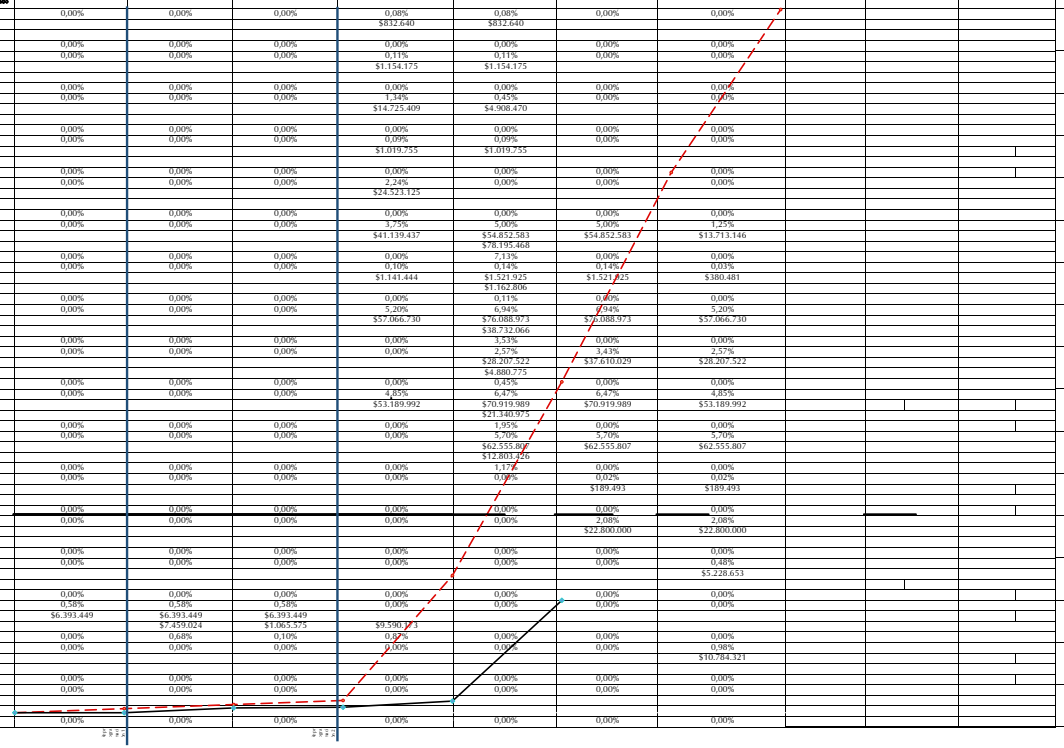

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,58%	0,58%	17,76%	27,54%	29,77%	23,17%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 6.393.448,94	$ 6.393.448,94	$ 6.393.448,94	$ 194.792.706,49	$ 302.061.838,82	$ 326.538.799,73	$ 254.116.144,56		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,58%	1,17%	1,75%	19,51%	47,05%	76,83%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 6.393.448,94	$ 12.786.897,88	$ 19.180.346,82	$ 213.973.053,31	$ 516.034.892,13	$ 842.573.691,86	$ 1.096.689.836,42		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,68%	0,10%	0,87%	14,53%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 7.459.023,76	$ 1.065.574,82	$ 9.590.173,41	$ 157.115.816,00	$ -	$ -		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,68%	0,78%	1,65%	15,98%	15,98%	15,98%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 7.459.023,76	$ 8.524.598,58	$ 18.114.771,99	$ 175.230.587,99	$ 175.230.587,99	$ 175.230.587,99		

* Datos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
IVA = REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C= (A+B)	$ 1.096.689.836,42	$ 1.096.689.836,42
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C'=(A'+B')	$ 1.096.689.836,42	$ 1.096.689.836,42

CONVENCIONES		
TIPO DE DATO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: Jesús Alberto Martínez Padilla.
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 22202311394COR

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202- 097497CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- ✓ **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**
  MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 56 **DE** 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 779 **DE** 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS CORTES VALERO	Ing. Res. Interventoría	Consorcio Interventorías 2020
JOSE MORALES HERRERA	Ing. Contratista	4L Ingeniería S.A.S.
LUIS FELIPE GONZALEZ	Apoyo Soc. Ambiental	Alcaldía San José de Ure

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. ENTREGA PACA.
2. PRESENTACION SOCIAL - AMBIENTAL EN OBRA.
3. ENTREGA ENSAMOS ANTES DE INICIO DE OBRAS EN SECTORES A INTERVENIR.
4. RECURSOS SECTOR VERSALLES - SAN PEDRITO.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PAGINA		DE	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

1. SE DIO A CONOCER LA IMPORTANCIA DE ENTREGA PARA
2. DICHO PERSONAL SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO Y PERSONAL TECNICO EN LAS REUNIONES
3. SE ESTAN REALIZANDO LOS ENSAYOS DE CONO Y ARENA ANTES DE FUNDIR Y TOMA DE CILINDROS EN LA FUNDIDA DE CONCRETO
4. NO SE VAN A PASAR LOS RECIBOS A PAGO HASTA QUE LA ALCALDIA SE COMPROMETE A HACER MEJORAMIENTO DE LA VIA VENGUER - SAN PERMITO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL MANTO DICHO.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
ENTREGA PARA	VIERNES 18 DIC - 2020	CONTRATISTA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITE DE OBRA 22 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican ni en sus alcances el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA			
			(Día)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Carlos Cortes Valencia	
Jorge Carlos Cerpa Arauejo	
Jose Morales Hernandez	
Luis Felipe Gonzalez Juntos	

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINUTA-GIN-INT-FT-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 22 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ De OBRA No. 4
(La numeración es consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 56 DE 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4G INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ N V- NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 773 DE 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS CORTES VALERIO	RESIDENTE INTERV.	CONSORCIO INTERVENTORIA 2020

OBJETIVOS DE LA REUNION

REALIZAR COMITE SEMANAL DE OBRA PARA DAR SEGUIMIENTO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

NO SE PUDO REALIZAR LA REUNION PORQUE FUNCIONARIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE URE ATENDIA TEMAS DEL FIN DE AÑO FISCAL Y EL CONTRATISTA RESOLVIA EL PAGO DE TRABAJADORES PARA NAVIDAD.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROGRAMA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITE DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-M-N-14-FR-[illegible]	
	VERSION	1	
	PAGINA	2	[illegible]
	FECHA	22 (Día)	2 (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En caso necesario anexar hoja de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por ningún concepto el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra sin perjuicio de las responsabilidades propias de quienes en el ejercicio de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MIN-IVA-MN-IN-F-41-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	22 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
CARLOS CORTES VALESTO	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Coordinador, Ejecutor y Documentación Contractual.

✓ **Acta de Reunión**
MINFRA-MN-IN-1-FR-4
MINFRA-MN-IN-14-FR-2
(NO APLICA PARA ESTE INFORME)

- ✓ **INFORME SEMANAL**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	11 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **18** del 04/12/2020 al 10/12/2020
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 11
VALOR FACTURA: $ 329.006.950,80 FECHA FACTURA: 24/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 123.880.561,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	


MES FACTURADO: 4
VALOR FACTURA: $ 28.995.218,70 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	35		35
ACERO (%)	5,4		5,4
SUBBASE (Km)	65		65
CONCRETO CLASE D	4,68		4,68
CONCRETO PIEDRA PEGADA			
CUNETA	3,27		3,27
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:			
Otros: Tractor con zorra	1		

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El pasado viernes 30 de octubre fue remitido a Interventoría el documento PAGA para ser revisado; el 10 de noviembre de 2020 fue remitido al Contratista el oficio C. Int - 111 - 2020, presentando las observaciones encontradas.

El 24 de noviembre pasado fue enviado al Contratista el oficio C. Int - 127 - 2020, recordando la atención a las observaciones realizadas al documento PAGA mediante el oficio C. Int - 111 - 2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
El 24 de noviembre pasado fue enviado al Contratista el oficio C. Int - 127 - 2020, recordando la atención a las observaciones realizadas al documento PAGA mediante el oficio C. Int - 111 - 2020.

ESTADO: El pasado viernes 30 de octubre fue remitido a Interventoría el documento PAGA para ser revisado; el 10 de noviembre de 2020 fue remitido al Contratista el oficio C. Int - 111 - 2020, presentando las observaciones encontradas.

documento PAGA mediante el oficio C. Int - 111 - 2020.
A la fecha el Contratista no ha presentado la nueva versión del documento PAGA; es decir que se encuentra pendiente para aproba ción

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista continua con la actividad de figurado de acero para la placa huella en el sector de Versalles - Brazo Izquierdo en la Abs 7 + 000 hasta 7+150. Tambien da inicio a la construcción de concreto reforzado de la abs 7+135 hasta la abs 7+150
En la Abs 4+880 hasta Abs 5+030 se realiza el suministro de la subbase compactada
Mediante comunicado C. Int - 144 del 10 de diciembre de 2020, se solicita documentación como la afiliación para nuevo personal y certificados de calidad y calibración


% programado acumulado: 26,19%, % ejecutado acumulado: 7,60%, % de atraso 18,59% , Valor ejecutado: $83,352,654,58.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Revisión de documentos solicitados en el comunicado C Int-144
Ejercer control a las actividades de campo para bgarantizar la calidad de la obra

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento a las comunicaciones al respecto del Traslado de Recursos del Tramo Versalles - San Pedrito.
Revisar documentación de personal de obra, plan de contingencia y la fuente de materiales que propone el contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **19** del 11/12/2020 al 17/12/2020
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 12
VALOR FACTURA: $ 329.006.950,80 FECHA FACTURA: 7/01/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	


MES FACTURADO: 5
VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	35		35
ACERO (%)	17,5		17,5
SUBBASE (Km)	88,4		88,4
CONCRETO CLASE D	17,9		17,9
CONCRETO PIEDRA PEGADA	1,7		1,7
CUNETA	9,8		9,8
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:			
Otros: Tractor con zorra	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El pasado viernes 30 de octubre fue remitido a Interventoría el documento PAGA para ser revisado; el 10 de noviembre de 2020 fue remitido al Contratista el oficio C. Int - 111 - 2020, presentando las observaciones encontradas.
El 24 de noviembre pasado fue enviado al Contratista el oficio C. Int - 127 - 2020, recordando la atención a las observaciones realizadas al documento PAGA mediante el oficio C. Int - 111 - 2020.
Al no recibir respuesta al oficio anterior, el 14 de diciembre pasado fue enviado al Contratista otro oficio (C. Int - 149 - 2020), recordando la atención a las observaciones realizadas al documento PAGA mediante el oficio C. Int - 111 - 2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
El 24 de noviembre pasado fue enviado al Contratista el oficio C. Int - 127 - 2020, recordando la atención a las observaciones realizadas al

ESTADO: El pasado viernes 30 de octubre fue remitido a Interventoría el documento PAGA para ser revisado; el 10 de noviembre de 2020 fue remitido al Contratista el oficio C. Int - 111 - 2020, presentando las observaciones encontradas.

El 24 de noviembre pasado fue enviado al Contratista el oficio C. Int - 127 - 2020, recordando la atención a las observaciones realizadas al documento PAGA mediante el oficio C. Int - 111 - 2020.
Al no recibir respuesta al oficio anterior, el 14 de diciembre pasado fue enviado al Contratista otro oficio (C. Int - 149 - 2020), recordando la atención a las observaciones realizadas al documento PAGA mediante el oficio C. Int - 111 - 2020.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


En la semana de este informe, el contratista continua con la actividad de figurado de acero para la placa huella en el sector de Versalles - Brazo izquierdo en la Abs 7 + 000 hasta 7+150. Se construye concreto reforzado de la abs 7+093 hasta la abs 7+135 en un volumen de 35 M3 y se funden 1,5 M3 de Concreto ciclopeo en ese tramo.
En la Abs 4+300 hasta Abs 4+400 se realiza el suministro de la subbase compactada 81 M3
El dia 11 de diciembre el contratista remite reprogramación de actividades en obra para la respectiva revisión y aprobación
Mediante comunicado C. Int - 148 del 11 de diciembre de 2020, se solicita tomar medidas inmediatas a la Alcaldía de San Jose de Ure y al Contratista por un atraso del 18,59%
Mediante comunicado C. Int - 149 del 14 de diciembre de 2020, se solicita al contratista entregar las observaciones al documento PAGA
Mediante comunicado C. Int - 151 del 14 de diciembre de 2020, se cita a comité semanal de obra a la Alcaldía de San Jose de Ure y al Contratista
Mediante comunicado C. Int - 154 del 17 de diciembre de 2020, se aprueba reprogramación de fecha 11 de diciembre de 2020.
% programado acumulado: 16,59%, % ejecutado acumulado: 11,98%, % de atraso 4,62% , Valor ejecutado: $131.330.576,41.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar comité de obra el día martes 22 de diciembre
Ejercer control a las actividades de campo para garantizar la calidad de la obra

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento, control y verificación a las actividades del contrato en referencia en el Tramo Versalles - Brazo Izquierdo en los tramos a intervenir.
Revisar documentación de personal de obra, plan de contingencia y la fuente de materiales que propone el contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 20 del 18/12/2020 al 24/12/2020
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 12
VALOR FACTURA: $ 329.006.950,80 FECHA FACTURA: 7/01/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	


MES FACTURADO: 5
VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	35		35
ACERO (%)	24,2		24,2
SUBBASE (Km)	88,4		88,4
CONCRETO CLASE D	33		33
CONCRETO PIEDRA PEGADA	8,9		8,9
CUNETA	15,9		15,9
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:			
Otros: Tractor con zorra	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El 21 de diciembre fue remitido a Interventoría la versión 02 del documento PAGA; este fue revisado y aprobado, sin embargo el Contratista debe complemetar la documentación referente a la legalidad de la cantra a utilizar en el proceso de construcción.

.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A		
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A		

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
Está pendiente por entregar diligenciados los formatos anexos al documento PAGA (Plan de inversión ambiental y social, acta de radicación ambiental y las actas de vecindad). Además el Contratista debe complemetar la documentación referente a la legalidad de la cantra a utilizar

ESTADO: El 21 de diciembre fue remitido a Interventoría la versión 02 del documento PAGA; este fue revisado y aprobado, sin embargo está pendiente por entregar diligenciados los formatos anexos (Plan de inversión ambiental y social, acta de radicación ambiental y las actas de vecindad)

ambiental y las actas de vecindad). Además el Contratista debe complemetar la documentación referente a la legalidad de la cantra a utilizar en el proceso de construcción.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista continua con la actividad de figurado de acero para la placa huella en el sector de Versalles - Brazo izquierdo en la Abs 7 + 000 hasta 7+150. Se construye concreto reforzado de la abs 7+040 hasta la abs 7+093 en un volumen de 29 M3 y se funden 7 M3 de Concreto ciclopeo en ese tramo.

Mediante comunicado C. Int - 154 del 17 de diciembre de 2020, se da aprobación de reprogramación 3 de Obras
Mediante comunicado C.Int - 155 del 23 de Diciembre de 2020 se emite acta de aprobación parcial de los estudios y diseños.


% programado acumulado: 20,49%, % ejecutado acumulado: 15,20%, % de atraso 5,29% , Valor ejecutado: $166,705,688,71.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar comité de obra
Ejercer control a las actividades de campo para garantizar la calidad de la obra

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento, control y verificación a las actividades del contrato en referencia en el Tramo Versalles - Brazo Izquierdo en los tramos a intervenir.
Revisar documentación de personal de obra, plan de contingencia y la fuente de materiales que propone el contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

Invías - Gestión Pública con Calidad

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **21** del 25/12/2020 al 31/12/2020

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 13/03/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 12
VALOR FACTURA: $ 329.006.950,80 FECHA FACTURA: 7/01/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	


MES FACTURADO: 5
VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	35		35
ACERO (%)	24,2		24,2
SUBBASE (Km)	88,4		88,4
CONCRETO CLASE D	33		33
CONCRETO PIEDRA PEGADA	8,9		8,9
CUNETA	15,9		15,9
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:			
Otros: Tractor con zorra	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El 21 de diciembre fue remitido a Interventoría la versión 02 del documento PAGA; este fue revisado y aprobado, sin embargo el Contratista debe complemetar la documentación referente a la legalidad de la cantra a utilizar en el proceso de construcción.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
El 28 de diciembre fue enviado al contratista el ofcicio C. Int – 159 – 2020 informando que está pendiente por entregar diligenciados los formatos

ESTADO: El 21 de diciembre fue remitido a Interventoría la versión 02 del documento PAGA; este fue revisado y aprobado, sin embargo está pendiente por entregar diligenciados los formatos anexos (Plan de inversión ambiental y social, acta de radicación ambiental y las actas de vecindad)

anexos al documento PAGA (Plan de inversión ambiental y social, acta de radicación ambiental y las actas de vecindad). Además de complemetar la docuemntación referente a la legalidad de la cantra a utilizar en el proceso de construcción.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista realiza acopio de materiales granulares para la placa huella en el sector de Versalles - Brazo izquierdo en la Abs 7 + 000 hasta 7+150.
Mediante comunicado C. Int - 159 del 28 de diciembre de 2020, se da aprobación del PAGA, pero se solictan documentos ambientales para complementarlo.
Se entrega a la Secretaria de Hacienda, a la Tesorera y al Arq Serpa el oficio DT-COR 53426 con la circular externa 23 para el Reintegro de los rendimientos financieros del trimestre vía Whatsapp


% programado acumulado: 28,38%, % ejecutado acumulado: 15,20%, % de atraso 13,18% , Valor ejecutado: $166,705,688,71.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar comité de obra
Ejercer control a las actividades de campo para garantizar la calidad de la obra
Solicitar más frentes de obras para disminuir el atraso que se está presentando

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento, control y verificación a las actividades del contrato en referencia en el Tramo Versalles - Brazo Izquierdo en los tramos a intervenir.
Revisar documentación de personal de obra, plan de contingencia

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

Invías - Gestión Pública con Calidad

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020

PUERTO LIBERTADOR

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

5. INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5** correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabel Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

El Acta de iniciación al contrato No. 056 de 2020, correspondiente al municipio de San José de URÉ, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista 4L INGENIERÍA S.A.S. la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ representado por el Secretario de Planeación Municipal.

El Acta de iniciación al contrato No. LP-MPL-002-2020, correspondiente al municipio de Puerto Libertador, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista CONSORCIO

MEJORAMIENTO VIALES, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR representado por el Secretario de Infraestructura.

El Acta de iniciación al contrato No. MV-LP-002-2020, correspondiente al municipio de Valencia, fue inscrita el día 13 de agosto de 2020 entre el contratista TVP MUNICIPIOS, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE VALENCIA representado por el Supervisor.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PUERTO LIBERTADOR

De acuerdo con el Convenio Interadministrativo N° 532 , suscrito entre el Municipio de Puerto Libertador y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural, el tramo PUERTO LIBERTADOR – PUERTO CAREPA – GILGAL donde la entidad entrara a construir 1000 metro de placa huella, dos Box Coulvert de 7 metros de longitud cada uno y construcción de alcantarillas. Con la cual esta importante zona rural del Municipio de Puerto Libertador, inicia de manera definitiva la solución a la grave problemática de movilidad existente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	
Puerto Libertador:	• Tramo N° 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgal

6.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PUERTO LIBERTADOR

El mejoramiento de vías en el Municipio de Puerto Libertador contempla el tramo Puerto Libertador – Puerto Carepa – Gilgal que se localiza en el costado oriental del municipio. El tramo N° 1 a mejorar se localiza en el K0+000 al K20+000, P.I. 7°53'05'' Latitud Norte y 75°42'38'' Latitud Oeste, P.F. 7°54'11'' Latitud Norte y 75°48'44'' Latitud Oeste.



Figura 4. Trazado Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgal
Fuente: Anexo Técnico Puerto Libertador

6.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario que realizo la el Instituto Nacional de Vías - INVIAS para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
Puerto Libertador	Tramo N° 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa – Gilgal	1000,00	14,00

6.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que cumplirán con las características de diseño de construcción entregados por el municipio de Puerto Libertador, basados en las cartillas de construcción de INVIAS.

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K11+200	1	1	7	BOX COULVERT
K10+500	1	1	7	BOX COULVERT
K10+900 – K11+200	300	5	0.15	PLACA HUELLA
K11+400 – K11+700	300	5	0.15	PLACA HUELLA
K19+600 – K20+000	400	5	0.15	PLACA HUELLA
K7+900	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K10+300	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K11+200	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
SERÁN PRIORIZADAS	6000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	7.9 Ha			Rocería a cada lado de la vía

7. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO LIBERTADOR

7.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO LIBERTADOR

CONTRATO DE OBRA N° LP-MPL-002-2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.094.587.428,61 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE PUERTO LIBERTADOR
CONTRATISTA	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.,** NIT. 901.394.612-6 R.L. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ INTEGRANTES: • CASS INGENIERÍA S.A.S. (85% PARTICIPACIÓN) NIT. 900.111.0629-2 R.L. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ • CARLOS MANUEL VERGARA (15% PARTICIPACIÓN) C.C. 92.509.184
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CARRERA 17 # 15 – 54
CORREO ELECTRÓNICO	camaveba@hotmail.com
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 DE MARZO DE 2021
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° LP-MPL-002-2020, por la aseguradora Seguros del Estado S.A., hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
11-11-101154523	Cumplimiento del contrato	14/08/2020	14/09/2021	$109.458.743,00		
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	14/08/2020	16/03/2024	$328.569.557,70		

	indemnizaciones laborales				CONTRATO DE OBRA	13/08/2020
	Estabilidad y calidad de Obra.	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$328.376.229,00		
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/08/2020	14/09/2021	$328.569.557.70		
11-40-101037181	Predios Labores y Operaciones	15/07/2020	15/02/2021	$328.569.557.70		

7.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES


Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2020:

- En la semana 18 del proyecto que inicia el 4 de diciembre de 2020, se realiza visita al campamento del contratista y se evidencia el acopio y figuración de acero del proyecto, se le solicita el traslado del campamento al sitio de la obra para poder verificar esta actividad in situ.
- En la semana 19 del proyecto que inicia el 11 de diciembre, se inicia el acopio de material de Subbase, se continua con el acopio de material granular para la elaboración de concreto, se trasladó el campamento al corregimiento de Gilgal que se encuentra en el tramo 19 + 600 hasta 20 + 000; se continua la figuración de acero para las placas de concreto de 21 MPa clase D, vigas riostras, cunetas.
- Se realiza el comité semanal de obra el día 16 de diciembre de 2020, donde se avisa nuevamente del atraso en obra, se solicita la presencia del personal técnico, social y ambiental del contratista en la obra y la realización de los ensayos de laboratorio para verificar la compactación de la subbase y resistencia del concreto.
- En la semana 20 del proyecto que inicia el 18 de diciembre, el contratista instala acero y formaletas para fundir concreto clase D pero no pudo fundir por daño de mezcladora de concreto.
- Se realiza el comité semanal de obra el día 23 de diciembre de 2020, donde se avisa nuevamente del atraso en obra, se solicita la presencia del personal técnico, social y ambiental del contratista en la obra y la realización de los ensayos de laboratorio para verificar la compactación de la subbase y resistencia del concreto.
- En la semana 21 del proyecto que inicia el 25 de diciembre, el contratista funde concreto clase D en el tramo 19 + 600 a 20+000. Se fundieron 90 ml de placa de concreto clase D en el eje derecho de la vía, la zona de la fundida va de atrás hacia adelante, es decir, de la Abs 20+000 hacia Abs 19+600

- Se realiza el comité semanal de obra el día 30 de diciembre de 2020, donde se entrega al Secretario de Hacienda Municipal el oficio DT-COR- 53426 para el reintegro de los rendimientos financieros del trimestre anterior. Se socializa el tema de los emprendedores rurales, donde el proyecto cuenta con la dotación del personal y realizará las actividades de rocería y limpieza de cunetas y alcantarillas a final del proyecto. Se avisa nuevamente del atraso en obra, el contratista se compromete con la entrega de plan de contingencia para el martes 5 de enero de 2021.

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

AVANCE FÍSICO			AVANCE EN TIEMPO			AVANCE FINANCIERO		
CORTE A:			jue. 31 dic. 20			CORTE A:		jue. 31 dic. 20
	%	INVERSIÓN		%	Días		%	VALOR
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	44,82%	$ 490.558.448,47	TIEMPO CONTRATADO:	100%	210	PRESUPUESTO CONTRATO	100%	$ 1.094.587.428,61
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	12,01%	$ 131.497.862,00	TIEMPO EJECUTADO:	66,19%	139,00	ACUMULADO ACTAS	0,00%	$ -
POR EJECUTAR	87,99%	$ 963.089.566,61	TIEMPO POR EJECUTAR:	33,81%	71,00	POR PAGAR EN ACTAS	100,00%	$ 1.094.587.428,61
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	-32,80%	-$ 359.060.586,47	ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	-32,80%	- 68,89			

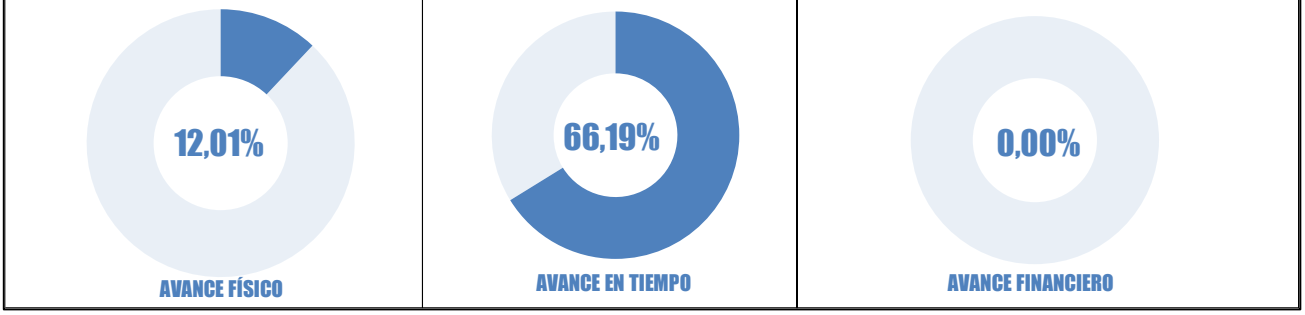

El contrato actualmente se encuentra con un retraso del 32,80%, este atraso corresponde a actividades en obra que aún no se han iniciado a la fecha del presente informe.

7.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

7.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

Para el período de ejecución del 01 al 31 de diciembre de 2020, se han llevado a cabo las siguientes actividades, las cuales están sujetas a la supervisión y control por parte de esta interventoría:

- Mediante comunicado C. Int - 140 del 04 de diciembre se da respuesta al oficio enviado por el contratista el 03 de diciembre para el cambio de ing residente, pero el señor Jose Cogollo no cumple con el perfil del cargo.
- Mediante comunicado C. Int - 142 del 07 de diciembre de 2020, se da orden de operación de anticipo.
- Mediante comunicado C. Int - 144 del 10 de diciembre de 2020, se solicita documentación como la afiliación para nuevo personal y certificados de calidad y calibración.
- Mediante comunicado C. Int - 147 del 11 de diciembre de 2020, se solicita tomar medidas inmediatas a la Alcaldía de Puerto Libertador y al Contratista por un atraso del 14,69%
- Mediante comunicado C. Int - 151 del 14 de diciembre de 2020, se cita a comité semanal de obra a la Alcaldía de Puerto Libertador y al Contratista.
- Se realizó el comité de obra No 8, en donde se entrega al Secretario de Hacienda el oficio DT-COR 53426 con la circular externa 23 para el Reintegro de los rendimientos financieros del trimestre, también se trató en el comité el atraso en obra y la solicitud del plan de contingencia.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

VALOR PROGRAMADO (BÁSICO DE OBRA)	$490.558.448,47	44,82%
VALOR EJECUTADO	$131.497.862,00	12,01%

A la fecha de presentación del informe, el contratista entrego la documentación correspondiente a estudios y diseños y esta pronto a dar inicio a las actividades de obra.

AVANCE FÍSICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

PROGRAMADO 43,12%
EJECUTADO 10,32%

La programación corresponde a actividades de obra tales como:

- Excavaciones varias en material común en seco
- Subbase Granular Clase C
- Concreto 21 MPa – Clase D
- Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg/cm2 (60.000 PS)

AVANCE PREDIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Se encuentran descritas en la parte de arriba de San José de Uré

8. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

8.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** DICIEMBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP - MPL - 002 - 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACION:	14 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:			
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.094.587.430,00	VALOR ADICIÓNALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.430,00	AMORTIZACION ANTICIPO:	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 328.376.229,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 - 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	1000
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	ML	16
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 383.231.787,98	$ 112.977.668,00		$ 112.977.668,00	29,48%	$ 19.779.704,00	100%	17,508%
Acumulado:	$ 490.558.448,65	$ 131.497.862,00		$ 131.497.862,00	26,81%	$ 61.073.224,43	100%	46,444%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.099.979.936,0
Total	$ 1.099.979.936,0

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	7,00	5,00	71,43%	2,00	$ 963.089.568,00	0	1.094.587.430	$ 963.089.568
Interventor:	0,43	5,00	1,00	0,00	$ 242.856.851,72	2,5	$ 242.856.851,72	$ 242.856.851,72

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.563.187,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	$ 15.563.187,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14-ago-20	14-sep-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14-ago-20	14-sep-21
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14-ago-20	16-mar-24
Calidad de Estudios y Diseños	14-sep-20	14-sep-25
Estabilidad y Calidad de Obra	AMPARA 5 AÑOS	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	15-jul-20	15-feb-21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 14/08/2020

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N / A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

C. Int - 137 (Reunion tecnica para el 3 de Diciembre), C. Int - 138 (Aclaraciones ordenes de operación), C. Int - 140 (Revisión hoja de vida residente), C. Int - 142 (Ordenes de operación), C. Int - 144 (Solicitud de documentación), C. Int - 147 (Solicitud medidas inmediatas por atraso), C. Int - 152 (Comite de obra), C.Int - 156 (Acta de aprobación parcial de estudios y diseños).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Es necesario cumplir con la programación estipulada para dar cumplimiento al tiempo de ejecución de la obra en el plazo inicialmente contratado. Es necesario abrir más frentes de obra para poder cumplir con la programación, ya que se están presentando un incremento en el atraso del proyecto. Hacer un seguimiento completo al protocolo de bioseguridad del contratista y cumplimiento del PAPSO. Velar por el cumplimiento de todos los programas que contiene el PAGA, ya que este se encuentra aprobado por la interventoría. Ejercer control a las actividades físicas de obra, realizando ensayos de laboratorio para verificar densidades del terreno y la capacidad de resistencia del concreto. Así mismo, verificar la cuantía del acero suministrado en la fundida del hormigón. VALOR PROGRAMADO $490.558.448.47 (44,82%), VALOR EJECUTADO $131.497.862 (12,01%).

Firma
Nombre JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **CONTRATO No.** LP-MPL-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR, PUERTO CAREPA, GILGAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES **SECTOR:** PUERTO LIBERTADOR
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	I	I		A	A	I	I	I	I		A	A	A	I
VIBROCOMPACTADOR	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	I	I		A	A	A	I	I	I		A	A	A	I
VOLQUETA 1	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	I	I		A	A	A	I	I	I		A	A	A	I
VOLQUETA 2	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	I	I		A	A	A	I	I	I		A	A	A	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JESUS DAVID QUINTERO DIAZ
Residente de Obra
Matrícula No.: 05202-176924ANT

Firma
Nombre: CARLOS CORTES VALERO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 0820275862ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: DICIEMBRE. **CONTRATO DE OBRA No.** LP-MPL-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR- PUERTO CAREPA- GILGAL

CONTRATISTA: CONSAORCIO MEJORAMIENTOS V **SECTOR:** GILGAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **779 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIAZ BALTAZAR JAIDER MANUEL	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CIPRIAM RIQUEME JOSÉ EDWIN.	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ORTIZ MARTINEZ IVAN ANDRES	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DE HOYOS VEGA AMAURY ANTONIO	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CIPRIAN MENDEZ MANUEL SABINO	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LONDOÑO CORREA YAIR	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUDA PEREZ LEIDER JESUS	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CIPRIAM ROQUEME ARGELIO JOSE	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ORTIZ PADILLA JADER MANUEL	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SOTELO DIEGO DAVID	AUXILIAR																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: JESÚS DAVID QUINTERO DIAZ
Residente de Obra
Matricula No.: 05202-176924ANT

Firma
Nombre: CARLOS CORTES VALERO.
Residente de Interventoría
Matricula No.: 0820275862ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

MES INFORME MENSUAL: 12 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	265		265	SRG	LP-MPL-002-2020	1.099.979.936,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.094.587.428,61

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.065.395.661	$ -	$ 1.065.395.660,6
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.671.575	$ -	$ 10.671.575,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.563.187	2.957.005,53	$ 18.520.193
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			1.094.587.428,14

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Director de Obra
Matrícula No.: 0820254648ATL

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA.** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: **LP-MPL-002-2020** **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE del 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR- PUERTO CAREPA- GILGAR.

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	696
Lluvias moderadas																		X														24
Lluvias intensas																			X													24
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**744**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:


Firma
Nombre: JESUS DAVID QUINTERO DIAZ
Residente de Obra
Matrícula No.: 05202-176924ANT

Firma
Nombre: CARLOS CORTES VALERO
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 0820275862ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial



The weather channel

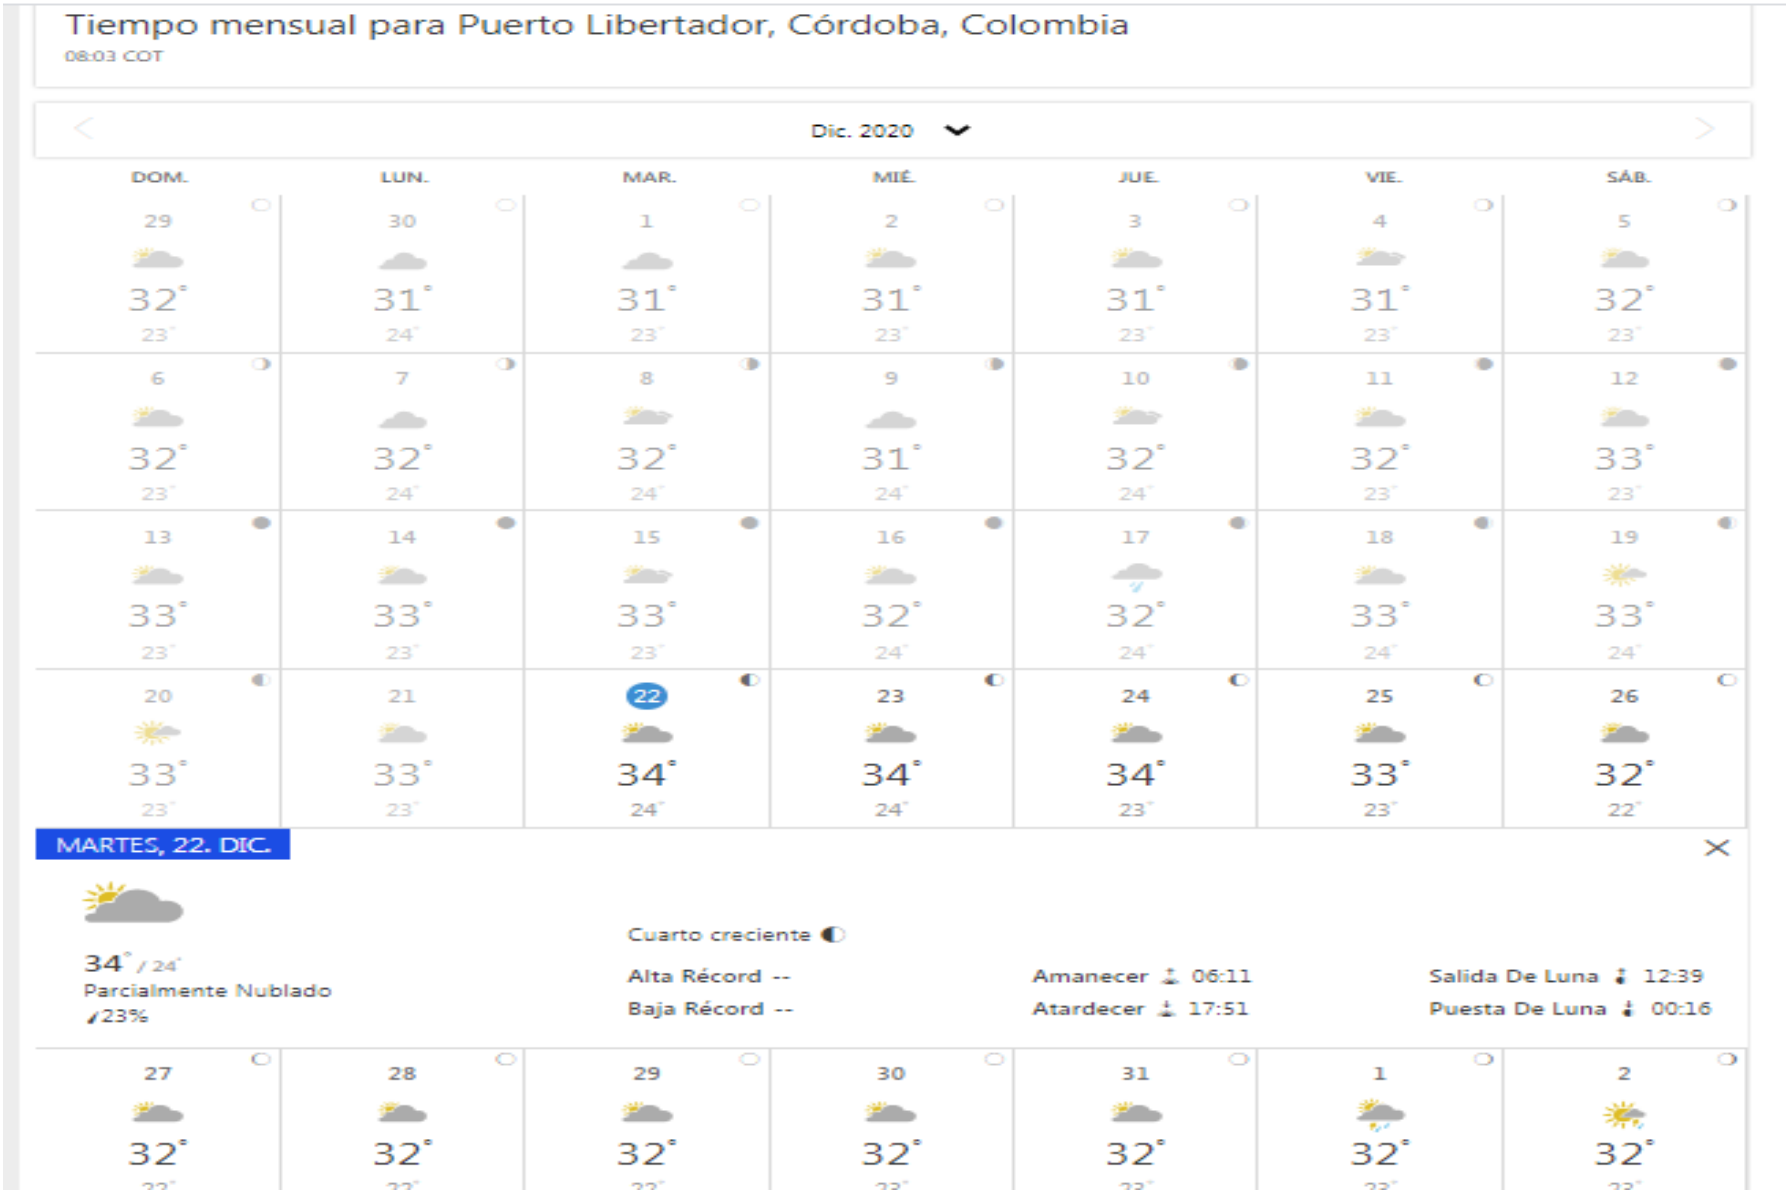
Tiempo mensual para Puerto Libertador, Córdoba, Colombia
08:03 COT
Dic. 2020
DOM. LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.
29 30 1 2 3 4 5
32° 23° 31° 24° 31° 23° 31° 23° 31° 23° 31° 23° 32° 23°
6 7 8 9 10 11 12
32° 23° 32° 24° 32° 24° 31° 24° 32° 24° 32° 23° 33° 23°
13 14 15 16 17 18 19
33° 23° 33° 23° 33° 23° 32° 24° 32° 24° 33° 24° 33° 24°
20 21 22 23 24 25 26
33° 23° 33° 23° 34° 24° 34° 24° 34° 23° 33° 23° 32° 22°
MARTES, 22. DIC.
34° / 24°
Parcialmente Nublado
23%
Cuarto creciente
Alta Récord --
Baja Récord --
Amanecer 06:11
Atardecer 17:51
Salida De Luna 12:39
Puesta De Luna 00:16
27 28 29 30 31 1 2
32° 32° 32° 32° 32° 32° 32°

8.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11
(NO APLICA EN ESTE INFORME)

8.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR- PUERTO CAREPA- GILGAL

SECTOR: GILGAL.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
DIAZ BALTAZAR JAIDER MANUEL		dic-20	13	1.003.080.808																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
CIPRIAM RIQUEME JOSÉ EDWIN.		dic-20	13	1.045.425.935																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
ORTIZ MARTINEZ IVAN ANDRES		dic-20	13	1.063.297.018																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
DE HOYOS VEGA AMAURY ANTONIO		dic-20	13	1.066.570.957																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
CIPRIAN MENDEZ MANUEL SABINO		dic-20	13	1.193.150.863																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
LONDOÑO CORREA YAIR		dic-20	13	1.193.150.881																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
RUDA PEREZ LEIDER JESUS		dic-20	13	1.197.215.399																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
CIPRIAM ROQUEME ARGELIO JOSE		dic-20	13	78.298.659																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
ORTIZ PADILLA JADER MANUEL		dic-20	13	78.301.766																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
SOTELO DIEGO DAVID		dic-20	13	78.302.962																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48072088	13	SURA	48072088	13	48072088	13	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BRAVO
Director de Obra
Matrícula No. 0820254648ATL

Firma
Nombre : Juan Diego Jimenez Serna.
Director de Interventoría
Matricula No. 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.8. INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No:** **PERIODO MES:** DICIEMBRE **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	LP-MPL-002-2020	PLAZO INICIAL:	SIETE MESES (7)	PLAZO ACUMULADO:	4,5
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA MARCO IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	
SECTOR:	PUERTO LIBERTADOR	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.094.587.430	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	PUERTO LBERTADOR PUERTO CAREPA-GILGAR	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP-MPL-002-2020	4,5	12/03/2021	1.094.587.430,00	###############

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.094.587.430
Total	$ 1.094.587.430

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
779-2020	5	13/03/2020	$ 426.076.525,00	426.076.525,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 383.231.787,98	$ 112.977.668,00		###############	0,29	$ 19.779.704,00	1,00	0,18
Acumulado:	$ 490.558.448,65	$ 131.497.862,00		###############	0,26	$ 61.073.224,43	1,00	0,46

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	7,00	5,00	71,43%	2,00	$ 963.089.568,00	0	$ 1.094.587.430,00	$ 963.089.568,00
Interventor:	0,43	5,00	100,00%	0,00	$ 242.856.851,72	2,5	$ 242.856.851,72	$ 242.856.851,72

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.563.187,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	15.563.187,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	P R	P R	P R	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 1.248.948	$ -	$ 1.873.422	$ -
Relleno para estructuras con recebo														$ 1.605.300	$ -	$ 2.407.950	$ -
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 13.497.203	$ -	$ 13.497.203	$ -
Concreto Clase F 14														$ 1.417.673	$ -	$ 1.417.673	$ -
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 15.945.289	$ -	$ 15.945.289	$ -
Subbase Granular Clase C														$ 60.401.056	$ 59.479.637	$ 75.501.320	$ 59.479.637
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 3.157.496	$ 3.571.238	$ 3.946.870	$ 3.571.238
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 93.929.513	$ 12.702.895	$ 117.411.892	$ 12.702.895
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa														$ 37.847.431		$ 47.309.289	
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 81.500.722	$ 37.223.898	$ 101.875.902	$ 37.223.898
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.														$ 72.681.158		$ 90.851.447	
Gavion de malla en alambre de acero entrelazado clase 1														$ -			
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles														$ -			
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles														$ -			
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad														$ -			
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS														$ -	$ -	$ 18.520.193	$ 18.520.194
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL														$ -			
Etapa de cierre financiero														$ -			
														$ 383.231.788,3	$ 112.977.668	$ 490.558.450	$ 131.497.862

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BRAVO
Director de Obra
Matrícula No. 0820254648ATL

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

8.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.094.587.428,61

VALOR ACUMULADO: $ 1.094.587.428,61 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.520.193,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.520.193,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 109.458.743,00	14	8	2020	14/09/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 328.569.557,70	14	8	2020	14/09/2021		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 218.917.486,00	14	8	2020	16	3	2024
Calidad de Servicio	0,43%	$ 4.668.956,10	14	9	2020	14	9	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 328.569.557,70	AMPARA 5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-11-101154523

Certificado de modificación o anexo No.: 4

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 328.569.557,70	15	7	2020	15	2	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101037181 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIA EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

FECHA DE INICIO: 14/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** SIETE (7) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ X NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Director de la Obra
Matrícula No.: 0820254648ATL

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	5	10	20
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA _____ **DIRECCIÓN TERRITORIAL** _____

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 002 **DE** 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMEINTOS VIALES

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO, IMPLEMENTACION ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 4	VR. MES 5		TOTAL	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 202.642.231,96			$ 202.642.231,96	61,71	%
2	MANO DE OBRA		$ 39.867.590,49		$ 39.867.590,49	12,14	%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		$ 85.866.406,56		$ 85.866.406,56	26,15	%
TOTAL		$ 202.642.231,96	$ 125.733.997,04		**$ 328.376.229,00**	100,00	%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma) Sebastian Vergara B.
SEBASTIAN VERGARA BENITEZ
Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES
Contratista

(Firma)
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Interventor
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 4 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** 1 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. LP - MPL - 002 **DE**

CONTRATO DE FIDUCIA No. 000219337 **DE** BCO DE BOGOTA ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTÁ
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** SUCURSAL
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO: **$ 328.376.229,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
Proforma	315	19-nov	Ferreteria La Troncal	$ 108.991.492,29	1	MATERIALES
Factura	29172	24-nov	Distrias SAS	$ 93.650.739,67	1	MATERIALES

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 202.642.231,96	$ -	$ 202.642.231,96	$ 202.642.231,96	$ -
	TOTALES	$ 202.642.231,96	$ -	$ 202.642.231,96	$ 202.642.231,96	$ -

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. **FECHA** **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES:

Firma Sebastian Vergara B.
Nombre : SEBASTIAN VERGARA BENITEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES
Matricula No. :

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Representante Legal o Delegado
Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Matricula No.: 25202 - 097497 CND.

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- ✓ **Seguimiento Programa de Obra**

- ✓ **Seguimiento Programa de Inversiones.**

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

MINFRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: LP-MPL-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar (Indique la ruta y tramo del acuerdo del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/08/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.094.587.428,61 (Iniciar contrato en pesos $)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.094.587.428,61

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado / $ Ejecutado	1 ACOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021				
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.873.421,52	0,171%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,11%	0,00%	0,00%				100%
	$1.873.421,52	0,171%	$0	$ P				$624.474	$1.248.948						
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				96,00%
Relleno para estructuras con recebo	$2.407.949,77	0,220%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,15%	0,00%	0,00%				
	$2.407.949,77	0,220%	$0	$ P				$802.650	$1.605.300						
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				90,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$20.245.804,19	1,850%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,23%	0,62%	0,00%				
	$20.245.804,19	1,850%	$0	$ P					$13.497.203	$6.748.601					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				84,00%
Concreto Clase F 14	$2.126.509,26	0,194%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,06%	0,00%				
	$2.126.509,26	0,194%	$0	$ P					$1.417.673	$708.836					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				78,00%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$23.917.933,79	2,185%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%	0,73%	0,00%				
	$23.917.933,79	2,185%	$0	$ P					$15.945.289	$7.972.645					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				72,00%
Subbase Granular Clase C	$166.102.903,91	15,175%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	5,52%	5,52%	2,76%				
	$166.102.903,91	15,175%	$0	$ P				$15.100.264	$60.401.056	$60.401.056	$30.200.528				
				$ E											
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				66,00%
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.736.243,77	0,433%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,29%	0,07%	0,00%				
	$4.736.243,77	0,433%	$0	$ P				$789.374	$3.157.496	$789.374					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				60,00%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$258.306.161,59	23,598%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	8,58%	8,58%	4,29%				
	$258.306.161,59	23,598%	$0	$ P				$23.482.378	$93.929.513	$93.929.513	$46.964.757				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				54,00%
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.618.577,96	8,644%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	3,46%	3,46%	0,86%				
	$94.618.577,96	8,644%	$0	$ P				$9.461.858	$37.847.431	$37.847.431	$9.461.858				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				48,00%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$224.126.984,93	20,476%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	7,45%	7,45%	3,72%				
	$224.126.984,93	20,476%	$0	$ P				$20.175.180	$81.500.722	$81.500.722	$40.750.361				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				42,00%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$181.702.893,83	16,600%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%	6,64%	6,64%	1,66%				
	$181.702.893,83	16,600%	$0	$ P				$18.170.289	$72.681.158	$72.681.158	$18.170.289				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				36,00%
Gavion de malla en alambre de acero entrelazado clase 1	$42.303.071,81	3,865%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	1,29%				
	$42.303.071,81	3,865%	$0	$ P						$28.202.048	$14.101.024				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				30,00%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$580.433,22	0,053%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%				
	$580.433,22	0,053%	$0	$ P							$580.433				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				24,00%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$36.479.919,30	3,333%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%				
	$36.479.919,30	3,333%	$0	$ P							$36.479.919				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				18,00%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.866.851,76	0,536%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%				
	$5.866.851,76	0,536%	$0	$ P							$5.866.852				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				12,00%
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$18.520.193,00	1,692%	0,00%	% P	0,45%	0,45%	0,45%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$18.520.193,00	1,692%	$0	$ P	$4.938.718	$4.938.718	$4.938.718	$3.704.039							
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				6,00%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.671.575,00	0,975%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%				
	$10.671.575,00	0,975%	$0	$ P						$10.671.575					
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0%
Etapa de cierre financiero				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
				$ P											
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.094.587.428,61**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.094.587.428,61**

		1	2	3	4	5	6	7			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,45%	0,45%	0,45%	8,45%	35,01%	36,68%	18,51%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4.938.718,13	$ 4.938.718,13	$ 4.938.718,13	$ 92.510.506,27	$ 383.231.787,98	$ 401.402.959,03	$ 202.576.030,93			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,45%	0,90%	1,35%	9,81%	44,82%	81,49%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4.938.718,13	$ 9.877.436,27	$ 14.816.154,40	$ 107.326.660,67	$ 490.558.448,65	$ 892.011.407,68	$ 1.094.587.428,61			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)					$ -	$ -	$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.094.587.428,61**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 1.094.587.428,61**

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma: Sebastian Vergara B.
Nombre: **SEBASTIAN VERGARA BENITEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Aprueba Firma
Nombre :
Jefe unidad ejecutora
Matrícula:

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.
Supervisor del contrato de Interventoría

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No: DE 1 a 31 de Diciembre 2020 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No: 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al numero del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

CONTRATO No: LP-MPL-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

LOCALIZACIÓN (EJE/TA Y TRAMO): Puerto Libertador - Puerto Carepa - Cligar (Indicar la vía y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/08/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.094.587.428,61 (según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.094.587.428,61


PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/08/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(5) OBRA PROGRAMADA (5) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(6) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021				
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.873.421,52 $1.873.421,52	0,171% 0,171%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,06% $624.474 0,00%	0,11% $1.248.948 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%				100%
Relleno para estructuras con recebo	$2.407.949,77 $2.407.949,77	0,220% 0,220%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,07% $802.650 0,00%	0,15% $1.605.300 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%				90%
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$20.245.804,19 $20.245.804,19	1,850% 1,850%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1,23% $13.497.203 0,00%	0,62% $6.748.601 0,00%	0,00% 0,00%				
Concreto Clase F 14	$2.126.509,26 $2.126.509,26	0,194% 0,194%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,13% $1.417.673 0,00%	0,06% $708.836 0,00%	0,00% 0,00%				80%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$23.917.933,79 $23.917.933,79	2,185% 2,185%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1,46% $15.945.289 0,00%	0,73% $7.972.645 0,00%	0,00% 0,00%				
Subbase Granular Clase C	$166.102.903,91 $166.102.903,91	15,175% 15,175%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 1,38% $15.100.264 0,00%	0,00% 5,52% $60.401.056 $87.222.465 0,00%	0,00% 5,52% $60.401.056 0,00%	0,00% 2,76% $30.200.528 0,00%				70%
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.736.243,77 $4.736.243,77	0,433% 0,433%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,07% $789.374 0,00%	0,29% $3.157.496 $2.948.717 0,27%	0,07% $789.374 0,00%	0,00% 0,00%				
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$258.306.161,59 $258.306.161,59	23,598% 23,598%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	2,15% $23.482.378 0,00%	8,58% $93.929.513 $13.750.990 1,26%	8,58% $93.929.513 0,00%	4,29% $46.964.757 0,00%				60%
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.618.577,96 $94.618.577,96	8,644% 8,644%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,86% $9.461.858 0,00%	0,00% 3,46% $37.847.431 0,00%	0,00% 3,46% $37.847.431 0,00%	0,00% 0,86% $9.461.858 0,00%				
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$224.126.984,93 $224.126.984,93	20,476% 20,476%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1,86% $20.375.180 0,00%	7,45% $81.500.722 $24.537.117 2,24%	7,45% $81.500.722 0,00%	3,72% $40.750.361 0,00%				50%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$181.702.893,83 $181.702.893,83	16,600% 16,600%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1,66% $18.170.289 0,00%	6,64% $72.681.158 $2.893.412 0,26%	6,64% $72.681.158 0,00%	1,66% $18.170.289 0,00%				40%
Gavion de malla en alambre de acero entrelazado clase 1	$42.303.071,81 $42.303.071,81	3,865% 3,865%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	2,58% $28.202.048 0,00%	1,29% $14.101.024 0,00%				
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$580.433,22 $580.433,22	0,053% 0,053%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,05% $580.433 0,00%				30%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$36.479.919,30 $36.479.919,30	3,333% 3,333%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	3,33% $36.479.919 0,00%				20%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.866.851,76 $5.866.851,76	0,536% 0,536%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,54% 0,00%	0,00% 0,54% $5.866.852 0,00%				10%
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$18.520.193,00 $18.520.193,00	1,692% 1,692%	84,03% $15.563.187	% P $ P % E $ E	0,45% $4.938.718 0,00%	0,45% $4.938.718 $10.288.996 0,94%	0,45% $4.938.718 $3.216.392 0,29%	0,34% $3.704.039 $2.057.799 0,19%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%				0%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.671.575,00 $10.671.575,00	0,975% 0,975%	0,00% $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,97% $10.671.575 0,00%	0,00% 0,00%				
Etapa de cierre financiero		0,000% 0,000%	#¡DIV/0! $0	% P $ P % E $ E	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.094.587.428,61**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.094.587.428,61**														

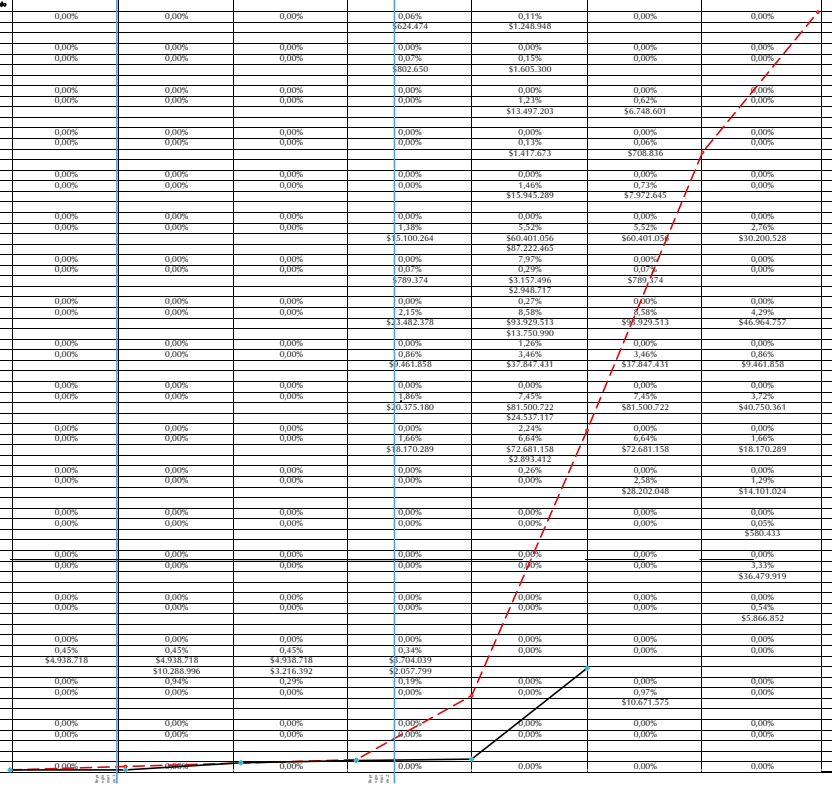

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	5,00%	0,45%	0,45%	6,45%	35,01%	36,68%	18,51%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4.938.718,13	$ 4.938.718,13	$ 4.938.718,13	$ 92.510.506,27	$ 383.231.787,98	$ 401.452.959,03	$ 202.576.020,93	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,45%	0,90%	1,35%	9,81%	44,82%	81,49%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4.938.718,13	$ 9.877.436,27	$ 14.816.154,40	$ 107.326.660,67	$ 490.558.448,65	$ 892.011.407,68	$ 1.094.587.428,61	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,94%	0,29%	0,19%	12,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 10.288.996,11	$ 3.216.391,67	$ 2.057.799,22	$ 131.352.701,81	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADO	%	0,00%	0,94%	1,23%	1,42%	13,42%	13,42%	13,42%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 10.288.996,11	$ 13.505.387,78	$ 15.563.187,00	$ 146.915.888,81	$ 146.915.888,81	$ 146.915.888,81	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C= (A+B)	**$ 1.094.587.428,61**	**$ 1.094.587.428,61**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 1.094.587.428,61**	**$ 1.094.587.428,61**

CONVENCIONES		
TIPO DE DATO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma: Sebastian Vergara B.
Nombre: **SEBASTIAN VERGARA BENITEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202- 097497CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- ✓ **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**
  MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MNIN-04-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración debe ser consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1-MN-0002 DE 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 5

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DEPUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 178 DE 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS CORTES VALERO	Ing RESIDENTE INTERV	CONSORCIO INTERVENTORIA 2020
Wilth Moncada Acosta	Prof Univ SOC. Hf.	ALCALDIA MPAL
Jose Daniel Cogollo Galindo	Ref Contratista	Contratista

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REALIZAR COMITE TECNICO SEMANAL DE OBRA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. INFORMAR NUEVAMENTE EL ATRASO EN OBRA YA QUE EL CONTRATISTA NO HA DADO INICIO A LA OBRA FISICA.
2. PRESENCIA DEL PERSONAL TECNICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PRESENTADO EN EL PROYECTO
3. REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO ANTES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA MN IN 14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 16 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

DE INICIO DE OBRA REQUERIDO EN SECTORES A INTERVENIR

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1- A CORTE DE LA SEMANA PASADA EL ATRASO EN OBRA ERA DE 14% Y ESTA SEMANA NO SE HA INICIADO LA OBRA FISICAMENTE YA QUE AUNQUE SI EL DIA JUEVES NO SE INICIA OFICIALMENTE MEDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA INFORMA QUE INICIARA OBRA MAÑANA JUEVES 17 DIC.

2. SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DEL PERSONAL REQUERIDO OBRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

3. ANTES DE FUNDIR LOSAS DE CONTRAPISO HAY QUE HACER LA DENSIDAD A LA SUB-BASE Y TOMA DE CILINDROS DE CONCRETO A LA FUNDIDA DE ESTE.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
INICIAR OBRAS FALTAS	JUEVES 16 DIC 2020	CONTRATISTA.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de las partes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 23 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año) 8:00 AM.

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra se entienden por si solas el Contrato de Obra y de interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA MN IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Carlos Cortes Varela	
Lileth Zorante Acosta – Pier Univ. - Ayuda mutual	
Jose D. Cogollos – Contratista	

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Unidades funcionales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MI-FRA-VIA-3-14-FR-1		
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	22 (DÍA)	12 (MES)	2020 (AÑO)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5

UNIDAD EJECUTORA: SUSCRIPCIÓN DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP MPL 002 DE 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2021

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Carlos Casseres Negrete	Dir. Interventor	Consorcio Interventorias 2020
Lizeth Caicedo Acosta	Prof. Universitario	Secretaria de Infra.
Pedro Ochoa de los Ríos	Sec. Infraestructura	Alcaldía
Jose Cogollo Galindo	Pte Comunidad	Comunidad

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. TOMAR MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA DISMINUIR ATRASO
2. REALIZAR EL COMITE DE OBRA SEMANAL.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

DEL COMITE ANTERIOR FECHADO EL 16 DIC-2020, EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL COMPROMISO PACTADO Y ES EL DAR INICIO A LA OBRA FISICA, SE HAN SUMINISTRADO MATERIAL DE SUBBASE A 120 ml Y DE ENTRADA RIELO Y ACERO PARA ALCANTARILLA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. TOMAR MEDIDAS CONTINGENCIA PARA DISMINUIR ATRASO EN OBRA

2 SOLICITAR NUEVAMENTE EL PERSONAL TECNICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO EN OBRA.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL de INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MI-FR-XX-IN-141-5.1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 23 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

3. RECORDAR LA TOMA DE DENSIDADES ANTES DE FUNDIR CONCRETO Y TOMA DE CILINDROS DURANTE LA FUNDIDA.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

1. EL CONTRATISTA VA A DISMINUIR EL ATRASO EN OBRA CON OTRO FRENTE DE OBRA EN EL MISMO SECTOR DE GILGAL. POR ESO REALIZO DESVIO A LA VIA PARA PODER TRABAJAR LOS DOS FRENTES.
2. EN LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO INGRESAN A OBRA LOS RECURSOS HUMANOS SOCIAL Y AMBIENTAL. ESTO DEMORA PARA UN INCREMENTO ADICIONAL
3. SE DEJA CLARO LA IMPORTANCIA DE LOS ENSAYOS YA QUE SI NO CUMPLEN EL CONTRATISTA ASUME EL COSTO DE LA DEMOLICION QUE REQUIERA.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(Si no hay espacio en esta casilla, diligenciar en el siguiente cuadro y adjuntar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: ____ (Día) ____ (Mes) ____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en el intervinieron, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MNIN-01.03.1		
		VERSION	1		
		PAGINA	3	DE	3
		FECHA	22 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Carlos Cortes Valero	
Lineth Tarante Acosta	
Pedro Ochoa de la Ossa	
Jose D. Cogollo Galindo	

Organismo Externo o Interno de Intervención
Objeto: Contratista, Interventoría o Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-N-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE
		FECHA	30 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 8
(Si iniciaron en año consecutivo)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. IT-MPI-002 DE 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 778 DE 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jair Enrique Cortes	Secretario Hacienda	Alcaldia puerto Libertador.
Carlos Cortes Valero	Residente Interventoria	Consorcio Interventoria 2020
Ana Ramos Martinez	Apoyo Profesional	Alcaldia de Puerto Libertador
Juan Cogollo	Ante Contratista	CONTRATISTA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. ENTREGA RECIBO DT-COR 53426
2. MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR EL ATRASO EN OBRA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE HACE LECTURA DEL ACTA 5 DE FECHA 23-12-2020

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. EL SECRETARIO DE HACIENDA PARTICIPA EN LA REUNION SOLO PARA RECIBIR EL RECIBO DT-COR 53426 CUYO ASUNTO ES EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y LA CIRCULAR EXTERNA N° 23
2. ATRASO EN OBRA.
3. EMPRENDEDORES RURALES.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MNFRA-MS-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

A. PARTICIPACION PERSONAL AMBIENTAL DEL PROYECTO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. EL SECRETARIO DE HACIENDA RADICO LOS PECIOS MODIFICADOS
2. EL CONTRATISTA PRESENTA ATRASO DE OBRA PARA DISMINUIR ESTE SE LE SOLICITA LA ENTREGA DEL PLAN DE CONTINGENCIA YA QUE ES EL UNICO CONTRATO CON ANTICIPO Y EL MES AVANZA
3. SE SOCIALIZA EL TEMA DE LOS EMPRENDEDORES RURALES EL PROYECTO CUENTA CON LA DOTACION DE LOS UNIFORMES EL CONTRATISTA REALIZARA LA INDUCCION Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EL ULTIMO MES DEL PROYECTO PARA LA ENTREGA FORMAL
4. PARA EL PROXIMO COMITE SE COORDINARA LA PRESENCIA DEL PERSONAL AMBIENTAL DE TODOS LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO (CONTRATISTA, INTERVENTORIA, ALCALDIA) PARA REALIZAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE ENERO 2021
5. SE INICIO LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR GILGAL CON 60ML CONCRETO CLASE D.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
ENTREGA PLAN CONTINGENCIA	05-ENERO-2020	CONTRATISTA
ENTREGA INFORME AMBIENTAL	11-01-2020	INTERVENTORIA
COORDINAR PERSONAL AMBIENTAL PARA COMITE	06-01-2020	TODOS

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere convenientes)

SE RADICA AL CORREO ELECTRONICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA@PUERTOLIBERTADOR-CORDOBA.GOV.CO EL OFICIO DT-CONT-0342

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: 06 (Día) 01 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los asistentes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN IN 14 FR 1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Juan Enrique Cortes	
CARLOS CORTES VARELO	
Yina Ramos Montiel	
Jose Cogollo	

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventoría y Dirección Territorial

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-COR 53426

Monteria, 24 de diciembre de 2020

Sr.
EDER JHON SOTO CUADRADO
ALCALDE
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
Calle 3#9-33 Barrio Aguas Vivas
3134688575
contactenos@puertolibertador-cordoba.gov.co
Puerto Libertador - Córdoba

Pdo Jhon Cortes 30-12-2020 9:28 a.m. sec. Hacienda.

Asunto: Reintegro rendimientos financieros

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el convenio interadministrativo No. 000532 de 2020 suscrito entre el Instituto Nacional de Vias y el municipio de Puerto Libertador el 18 de febrero 2020, cuyo objeto es " AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ", la Dirección Territorial Córdoba del INVIAS en cumplimiento de las cláusulas del convenio, **SEPTIMA: MANEJO DE LOS RECURSOS inciso 5) "los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Instituto deben ser consignados, según instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Circular Externa 023 del 18 de octubre de 2019"**, solicita los comprobantes de egreso de las consignaciones/transferencias al Tesoro Nacional de los rendimientos financieros correspondientes al primer trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) de 2020.

Le recordamos también que dichos recursos deben ser consignados los primeros cinco (5) dias del trimestre vencido, para el caso del próximo trimestre (octubre, noviembre y diciembre) deben realizarse antes del 05 de enero de 2021.

REINTEGRO SALDOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DE MANEJO DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

El Instructivo para manejo de anticipo del manual de Interventoria MINFRA-MN-IN-2, establece: " Los **rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al Contratista, serán reintegrados por el Contratista mensualmente a la Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma provista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la**

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-COR 53426

consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora Indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación."

Por lo anterior se solicita a la firma interventora CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020, que ante esta situación ordene a quien corresponda tome medidas correctivas que permitan el estricto cumplimiento de la misma.

Le informamos que, de persistir el incumplimiento, esta Dirección Territorial, solicitará a la Subdirección de Red Terciaria y férrea del Instituto, estudiar la posibilidad de iniciar proceso para aplicar las sanciones de conformidad a la resolución 3662 del 2007.

Se anexa Circular 023 del 18 de octubre de 2019.

Atentamente,

Firmado digitalmente por
DIEGO JOSE ABAD
DURANGO

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Director Territorial Córdoba

ANEXO 2 Folios

C.C. CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 - Juan Diego Jimenez - Director de Obra - rjdingenieria@gmail.com
INVIAS - SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

Proyectó: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

CIRCULAR EXTERNA No. 023

6.8 Subdirección de Operaciones

Bogotá D. C., 18 de octubre de 2019

PARA: **Entidades receptoras de recursos del Sistema General de Regalías**

ASUNTO: Reintegro de los Rendimientos Financieros Sistema General de Regalías

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21, de la Ley 1942 de 2018:

"***Artículo 19. Del giro y la ordenación del gasto.*** *Los órganos y demás entidades designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías deberán hacer uso del sistema de presupuesto y giro de regalías -SPGR- para realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.*"
(...)

"***ARTÍCULO 20. Rendimientos financieros de las regalías directas y compensaciones.*** *Los rendimientos financieros que generen los recursos de Asignaciones Directas en la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, serán incorporados en el Presupuesto del SGR del siguiente bienio para cada una de las entidades beneficiarias de que trata el inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Política y deberán destinarse a las mismas finalidades definidas por la Constitución Política y la ley. Estos recursos no harán parte de los rendimientos financieros del Sistema General de Regalías.*"

"***ARTÍCULO 21. Rendimientos financieros de los recursos diferentes a regalías directas y compensaciones.*** *Los rendimientos financieros de los recursos diferentes a regalías directas y compensaciones que se generen en las cuentas maestras de las entidades públicas ejecutoras a la entrada en vigencia de esta Ley, serán de propiedad del Sistema.*

Dichos rendimientos deben ser reintegrados por el ejecutor a la Cuenta Única del Sistema en las condiciones y plazos que fije la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ser presupuestados en la bienalidad siguiente a aquella en la que se generaron."

Por otra parte, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, que dispone:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal 111711
PBX (571) 381 1700
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional 01 8000 910071
atencionciudadano@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
www.minhacienda.gov.co

*"**Artículo 91. Anticipos.** En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.*

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista."

En ningún caso los recursos entregados a título de anticipo, se podrán girar a Fondos de inversión Colectiva.

En virtud de lo anterior, y con ocasión del pago a destinatario final, **los rendimientos que generen los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)**, diferentes a los generados por Asignaciones Directas, se deben reintegrar **trimestralmente**, sin importar el tipo de entidad que los reciba y la fuente de los mismos, a la cuenta Única del Sistema General de Regalías, así

Entidad Financiera:	**BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**
Número de Cuenta:	**3-0070-0-00683-0**
Tipo de Cuenta:	**CORRIENTE**
Nombre Cuenta:	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
NIT Cuenta SGR:	**900517804-1**

Esta disposición también aplica a los rendimientos financieros generados por las fuentes del SGR, diferentes a las asignaciones directas, que actualmente se encuentren en las cuentas maestras de las entidades territoriales, que no hayan sido incorporados al presupuesto del bienio 2019-2020.

Los rendimientos financieros deben ser reintegrados a más tardar, el quinto (5°) día hábil del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron.

INFORMACIÓN A REPORTAR:

Para todos los casos, junto con cada transferencia de rendimientos, se deberá remitir la siguiente información, a los correos electrónicos willmora@minhacienda.gov.co y hbaron@minhacienda.gov.co

i) La fecha de consignación.
ii) El trimestre al que corresponden los rendimientos financieros.
iii) El valor de los rendimientos trasladados
iv) Fuente que les dio origen (Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Asignación para la Paz o Municipios Río Magdalena y Canal del Dique).
v) NIT y nombre de la entidad territorial beneficiaria de los recursos del Sistema General de Regalías que financia el proyecto de inversión.

La información debe ser remitida, a más tardar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, al reintegro de los rendimientos a la Cuenta Única del SGR.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

Elaboró: Hernando Darío G
Revisó: Julio E. Ochoa H

- ✓ **Acta de Reunión**

MINFRA-MN-IN-1-FR-4

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	3	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020 **DE** 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS CORTES V.	RESIDENTE INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria 2020
JOSE COGOLLO GALINDO	RTE CONTRATISTA	Consorcio mejoramientos viales
Maria José Gonzalez M.	Secretaria.	Consorcio interventorias 2020.
Jina Inés Hoops	Asesor SGR	Alcaldia Pto. Libertador
Pedro Ochoa	Sec. Infraestructura	Alcaldía de Puerto libertador
Yinu Ramos	Apoyo Profesional Infra	Alcaldía de Pto Libertador

OBJETIVOS DE LA REUNION

Socialización proyecto placa huella.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

TRAMO 1: K 10+900 – K 11+200 L=300
BOX 1 K 10 + 500
BOX 2 K 11 + 200

DESARROLLO DE LA REUNION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	3 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

en la abs 11+020 descoles.
Tramo 2: K 11+400 - K 11+700.
En la abs 11+480 y 11+520.
Hacer descoles en alcantarillas existentes.

El dia de hoy 03/12/2020 en contratista, comenzó a transportar materiales y equipos a obras (sitios) ha tenido inconvenientes con la lluvia
la Construcción de los gaviones, se suspende hasta nueva orden, para verificar el cumplimiento en la construcción de la placa huella.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Inicio de Obra Física	09/12/2020	Contratista.
Entrega de acta de aprobación de estudios y diseños.	09/12/2020	Interventoria.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA		DE	

	(Día)	(Mes)	(Año)
FECHA	3	12	2020

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CORREO ELECTRONICO - TELEFONO	FIRMA
Carlos Cortes Vargas	ing.carlos.cortes75@gmail.com	
José Cazalla Cabrera	descazalla6526@gmail.com	
María José González	maria.gomu@outlook.com	María J González O.
Lina Hoyos Olivero	linalucia@gmail.com	Lina Hoyos.
Pedro Ochoa	Secretariadeinfraestructura@puertolibertador-cordoba.gov.co	
Yina Ramos	RAMOSmontiel.yinasofia@gmail.com	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- ✓ **INFORME SEMANAL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 11 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 18 del 04/12/2020 al 10/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.428,61

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.587.429	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 11

VALOR FACTURA: $ 328.376.228,58 FECHA FACTURA: 31/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 123.880.561,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: 4


VALOR FACTURA: $ 28.995.218,70 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)			
ACERO (%)	10,21		10,21
SUBBASE (Km)			
CONCRETO CLASE D			
CONCRETO PIEDRA PEGADA			
CUNETA			
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Caucasia, Antioquia	PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El día 27 de octubre de 2020 enviaron para revisión unos documentos de la Corporación CVS y de

INGEOMINAS que hacen referencia a una cantera diferente a la señala en el Acta de radicación ambiental y social del proyecto.

El contratista a través de correo electrónico enviado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.

OBSERVACIONES: El contratista a través de correo electrónico enviado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.
Como se había mencionado en los informes anteriores, el Contratista manifiesta que no requiere de licencia y/o permisos ambientales para la ejecución de las obras.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 27 de octubre fue remito por correo electrónico a Interventoría, la cuarta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resultas las recomendaciones y/o observaciones; es decir que se considera aprobado el documento.

OBSERVACIONES:
El contratista a través de correo electrónico enviado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requer ida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se han realizado mas gestiones sociales

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Mediante comunicado C. Int - 140 del 04 de diciembre se da respuesta al oficio enviado por el contratista el 03 de diciembre para el cambio de ing residente, pero el señor Jose Cogollo no cumple con el perfil del cargo
Mediante comunicado C. Int - 142 del 07 de diciembre de 2020, se da orden de operación de anticipo
Mediante comunicado C. Int - 144 del 10 de diciembre de 2020, se solicita documentación como la afiliación para nuevo personal y certificados de calidad y calibración
En la semana de este informe, el contratista realiza figuración de acero en el campamento, transporto maquinaria a la obra (retroexcavadora, mini cargador y vibrocompactador), continua el acopio de material granular para la fundida de los concretos y realización de desvio para la intervención del tramo Abs 19+600 hasta 20+000
Porcentaje programado acumulado: 18,62%, Porcentaje ejecutado acumulado: 3,93%, Porcentaje de atraso 14,69% , Valor ejecutado: $43,061,366,30.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dar seguimiento al inicio de actividades físicas del proyecto el el sector Abs 19+600 a Abs 20+000

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
Revisar documentación de personal de obra
Actualmente se está transportando materiales, herramientas y equipo a la zona

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 18 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 11/12/2020 al 17/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.428,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.587.429	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 11

VALOR FACTURA: $ 328.376.228,58 FECHA FACTURA: 31/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: 5


VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)			
ACERO (%)	10,21		10,21
SUBBASE (Km)			
CONCRETO CLASE D			
CONCRETO PIEDRA PEGADA			
CUNETA			
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Caucasia, Antioquia	PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El contratista a través de correo electrónico envíado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.

OBSERVACIONES: Como se había mencionado en los informes anteriores, el Contratista manifiesta que no requiere de licencia y/o permisos ambientales para la

OBSERVACIONES: Como se había mencionado en los informes anteriores, el Contratista manifiesta que no requiere de licencia y/o permisos ambientales para la ejecución de las obras.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 27 de octubre fue remito por correo electrónico a Interventoría, la cuarta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resultas las recomendaciones y/o observaciones; es decir que se considera aprobado el documento.

OBSERVACIONES:
El contratista a través de correo electrónico envíado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se han realizado mas gestiones sociales

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante comunicado C. Int - 147 del 11 de diciembre de 2020, se solicita tomar medidas inmediatas a la Alcaldía de Puerto Libertador y al Contratista por un atraso del 14,69%
Mediante comunicado C. Int - 151 del 14 de diciembre de 2020, se cita a comité semanal de obra a la Alcaldía de Puerto Libertador y al Contratista


En la semana de este informe, el contratista realiza figuración de acero en el campamento, transporto maquinaria a la obra (retroexcavadora, mini cargador y vibrocompactador), continua el acopio de material granular para la fundida de los concretos y realización de desvio para la intervención del tramo Abs 19+600 hasta 20+000
Porcentaje programado acumulado: 27,44%, Porcentaje ejecutado acumulado: 3,93%, Porcentaje de atraso 23,51% , Valor ejecutado: $43,061,366,30.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dar seguimiento al inicio de actividades físicas del proyecto el el sector Abs 19+600 a Abs 20+000

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisar documentación de personal de obra
Actualmente se está transportando materiales, herramientas y equipo a la zona

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

FECHA: 25 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 20 del 18/12/2020 al 24/12/2020
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.428,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.587.429	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 12

VALOR FACTURA: $ 328.376.228,58 FECHA FACTURA: 31/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: 5

VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	37,1		37,08
ACERO (%)	10,21		10,21
SUBBASE (Km)	17,6		17,6
CONCRETO CLASE D			
CONCRETO PIEDRA PEGADA			
CUNETA			
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Caucasia, Antioquia	PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X

OBSERVACIONES: El contratista a través de correo electrónico envíado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Como se había mencionado en los informes anteriores, el Contratista manifiesta que no requiere de licencia y/o permisos ambientales para la ejecución de las obras.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 27 de octubre fue remito por correo electrónico a Interventoría, la cuarta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resultas las recomendaciones y/o observaciones; es decir que se considera aprobado el documento.

OBSERVACIONES:
El contratista a través de correo electrónico envíado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: **No se ha realizado ninguna gestión predial**

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: No se han realizado mas gestiones sociales

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista realiza figuración de acero en el campamento, transporto maquinaria a la obra (retroexcavadora, mini cargador y vibrocompactador), continua el acopio de material granular para la fundida de los concretos y realización de desvio para la intervención del tramo Abs 19+600 hasta 20+000
Se realiza excavación de 60 M3 y suministro de Subbase con 120 M3 en el tramo Abs 19+880 hasta 20+000
Mediante comunicado C. Int - 156 del 23 de Diciembre se emite acta de aprobación parcial de los estudios y diseños.


Porcentaje programado acumulado: 36,13%, Porcentaje ejecutado acumulado: 10,59%, Porcentaje de atraso 25,54% , Valor ejecutado: $115,936,670,00.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dar seguimiento al inicio de actividades físicas del proyecto el el sector Abs 19+600 a Abs 20+000

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisar documentación de personal de obra
Actualmente se está transportando materiales, herramientas y equipo a la zona

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 21 del 25/12/2020 al 31/12/2020
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.428,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 13/03/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.094.587.429	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 12
VALOR FACTURA: $ 328.376.228,58 FECHA FACTURA: 31/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	


MES FACTURADO: 5
VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	46,4		46,4
ACERO (%)	10,21		10,21
SUBBASE (Km)	22		22
CONCRETO CLASE D	3		3
CONCRETO PIEDRA PEGADA			
CUNETA			
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Caucasia, Antioquia	PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X

OBSERVACIONES: El contratista a través de correo electrónico envíado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Como se había mencionado en los informes anteriores, el Contratista manifiesta que no requiere de licencia y/o permisos ambientales para la ejecución de las obras.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 27 de octubre fue remito por correo electrónico a Interventoría, la cuarta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resultas las recomendaciones y/o observaciones; es decir que se considera aprobado el documento.

OBSERVACIONES:
El contratista a través de correo electrónico envíado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: **No se ha realizado ninguna gestión predial**

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se han realizado mas gestiones sociales

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista realiza figuración de acero en el campamento, continua el acopio de material granular para la fundida de los concretos y realización de desvio para la intervención del tramo Abs 19+600 hasta 20+000
Se realiza excavación de 15 M3 y suministro de Subbase con 30 M3 en el tramo Abs 19+850 hasta 19+880. De igual forma, funden 30 placas para un volumen de 11,3 M3 de Concreto clase D en el eje derecho
Se realizó el comité de obra No 8, en donde se entrega al Secretario de Hacienda el oficio DT-COR 53426 con la circular externa 23 para el Reintegro de los rendimientos financieros del trimestre, tambien se trató en el comité el atraso en obra y la solicitud del plan de contigencia


Porcentaje programado acumulado: 44,82%, Porcentaje ejecutado acumulado: 12,01%, Porcentaje de atraso 32,80% , Valor ejecutado: $131,497,862,00.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dar seguimiento a las actividades físicas del proyecto el el sector Abs 19+600 a Abs 20+000, y el cumplimiento al plan de contingencia que debe entregar el contratista el 5 de enero de 2021 en donde de manera verbal informó en el comité que abrira mas frentes de obras para la fundida de concretos

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisar documentación de personal de obra
Dar seguimiento a los procesos técnicos como son la compactación de Subbase, fundida de los diferentes tipos de concretos, la cuantía de
Acero suministrado en sus items correspondientes (Viga Riostra, Cunetas, Bordillos y Placa)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020

VALENCIA

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

9. INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°5** correspondiente al periodo del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2020 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabel Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

El Acta de iniciación al contrato No. 056 de 2020, correspondiente al municipio de San José de URÉ, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista 4L INGENIERÍA S.A.S. la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ representado por el Secretario de Planeación Municipal.

El Acta de iniciación al contrato No. LP-MPL-002-2020, correspondiente al municipio de Puerto Libertador, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista CONSORCIO

MEJORAMIENTO VIALES, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR representado por el Secretario de Infraestructura.

El Acta de iniciación al contrato No. MV-LP-002-2020, correspondiente al municipio de Valencia, fue inscrita el día 13 de agosto de 2020 entre el contratista TVP MUNICIPIOS, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA 2020 y el MUNICIPIO DE VALENCIA representado por el Supervisor.

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VALENCIA

El proyecto consiste en el mejoramiento de vía rural con la construcción de plaza huella, box coulvert y obras complementarias desde el CRUCE DE VÍA (CALLEJAS – VALENCIA) – SANTA MARÍA – SAN RAFAEL – LA BANCA hasta GUADUAL CENTRAL, se pretenden realizar 845 ML de placa huella, construcción de 2 box coulvert de 1.5 x 1.5 de 6 mts y obras complementarias de limpieza de 16 alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería aumentando así la vida útil del tramo vial, con lo que se espera disminuir los tiempos de recorrido del personal, aumentar la comercialización de los productos del campo que son cultivados en esta zona al igual que garantizar la salida de al personal del sector a centros de salud y en especial a los estudiantes a centros de enseñanza, aun en tiempos de lluvias.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA	
Valencia:	• Tramo N° 1 – Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca

10.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VALENCIA

El mejoramiento de vías en el Municipio de Valencia contempla el tramo Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca que se localiza en la parte sur del municipio. El tramo N° 1 a mejorar se localiza en el K0+000 al K25+830, P.I. 8°15'30'' Latitud Norte y 79°08'55'' Latitud Oeste, P.F. 8°27'40'' Latitud Norte y 79°88'25'' Latitud Oeste.



Figura 5. Trazado Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca
Fuente: Anexo Técnico Valencia

10.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario que realizo el Instituto Nacional de Vías - INVIAS para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
Valencia	Tramo N° 1 – Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca	1050,00	27,00

10.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que cumplirán con las características de diseño de construcción entregados por el municipio de Valencia, basados en las cartillas de construcción de INVIAS.

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K2+480	300	5		PLACA HUELLA SECTOR BARBA DEL SOL
K7+980	6	1.5	1.5	BOX COULVERT DE 1.5X1.5
K9+110	400	5		PLACA HUELLA LOMA PACHO MARTÍNEZ
K9+600	305	5		PLACA HUELLA APARTADA EL COCUELO
K10+080	6	1.5	1.0	BOX COULVERT DE 1.5X1.0
K3+000	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K3+900	7	3	3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K4+810	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K4+900	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+130	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+370	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+375	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+940	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+050	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+320	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

K6+640	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+980	7	2.5	2.5	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K7+400	7	5	3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K8+700	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K0+000 – K25+830				Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles (mantenimiento concertado contratista e interventoría)
K0+000 – K25+830				Rocería ambos lados de la vía (mantenimiento concertado contratista e interventoría)

11. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA VALENCIA

11.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VALENCIA

CONTRATO DE OBRA N° MV-LP-002-2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.043.889.132,00 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE VALENCIA
CONTRATISTA	**TVP MUNICIPIOS,** NIT. 900.210.090-0 R.L. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CALLE 33 # 12 – 63
PBX	7897130
CORREO ELECTRÓNICO	Tvpmunicipios2016@gmail.com
FECHA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12 DE MARZO DE 2021

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° MV-LP-002-2020, por la Aseguradora Solidaria de Colombia, hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
540-47-994000011835	Cumplimiento	19/06/2020	19/05/2021	$313.166.739,60	CONTRATO DE OBRA	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	19/06/2020	19/01/2024	$208.777.826,40		
	Estabilidad y calidad de Obra.	Vigencia de cinco (5) años.		$313.166.739,60		
	Calidad del servicio	30/07/2020	19/01/2026	$5.827.378,00		
540-74-994000002717	Predios, labores y operaciones	19/06/2020	19/01/2021	$175.560.600,00		


11.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES


Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de DICIEMBRE de 2020:


- El día 4 de diciembre en las instalaciones del colegio Catalino Gulfo del casco urbano de Valencia se reunió el contratista, la interventoría, la supervisora, la Alcaldía y las Juntas de Acciones Comunales de las poblaciones ubicados en la zona de influencia de la obra para socializarles y el proyecto explicándoles el alcance y atender cualquier inquietud de la comunidad. .
- El día 7 de Diciembre hace presencia en obra el laboratorios de suelos de la Interventoría tomando las densidades de los tramos intervenidos hasta el momento Barbas del Sol y Apartada El Cocuelo que cuentan con la excavación y Subbase para poder verificar que estas densidades cumplan con las especificaciones u poder autorizar al contratista fundir concreto placa reforzada y cuneta reforzada en estos sectores.
- El 9 de Diciembre después de tener los resultados de las Densidades y cumpliendo el contratista con las especificaciones se autoriza para empezar con la fundida de placas y cunetas en los sectores de Barbas del sol y apartada el Cocuelo.
- El día 16 de Diciembre se realiza comité de obra semanal en las instalaciones de la Alcaldía se tratas temas de avance de obras, seguimiento al PAGA y la toma de ensayos de suelos en los tramos a fundir próximamente.
- El día 18 de Diciembre se realizan en horas de la mañana en los sectores Barbas del sol y Aparatada EL Cocuelo capacitaciones por parte del contratista a sus obreros en cabeza de la Ingeniera Yocasta de la Barrera profesional Siso del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El día 23 de Diciembre se realiza comité de obra semanal en las instalaciones de la Alcaldía se tratas temas de avance y cantidades de obra, seguimiento y revisión de planillas de afiliaciones de los trabajadores por parte del contratista.
- El día 29 de Diciembre se realiza comité de obra semanal en las instalaciones de la Alcaldía se tratas temas de avance y cantidades de obra donde se alcanza una avance del 24,46% en ejecución de obra y el contratista manifiesta que en próximas días enviara el acta parcial No 1 para socialización y revisión por parte la Interventoría

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

AVANCE FÍSICO			AVANCE EN TIEMPO			AVANCE FINANCIERO		
CORTE A:			jue. 31 dic. 20			CORTE A:		jue. 31 dic. 20
	%	INVERSIÓN		%	Días		%	VALOR
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	49,63%	$ 518.075.343,17	TIEMPO CONTRATADO:	100%	210	PRESUPUESTO CONTRATO	100%	$ 1.043.889.132,00
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	24,46%	$ 255.365.339,36	TIEMPO EJECUTADO:	66,67%	140,00	ACUMULADO ACTAS	0,00%	$ -
POR EJECUTAR	75,54%	$ 788.523.792,64	TIEMPO POR EJECUTAR:	33,33%	70,00	POR PAGAR EN ACTAS	100,00%	$ 1.043.889.132,00
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	-25,17%	-$ 262.710.003,81	ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	-25,17%	- 52,85			

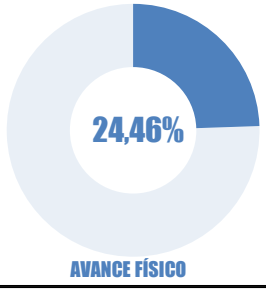





El contrato actualmente se encuentra con un retraso del 25,17%, ya que al inicio de obras con algunas actividades adelantadas presentaron inconvenientes el contratista con la maquinaria utilizada, por lo cual no se logró adelantar más trabajos los días 28 y 30 de DICIEMBRE.

11.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

11.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

Para el período de ejecución del 01 al 31 de DICIEMBRE de 2020, se han llevado a cabo las siguientes actividades, las cuales están sujetas a la supervisión y control por parte de esta interventoría:

- Excavación , Subsase , figuración de acero, fundida de placa reforzada, cuneta reforzada, y concreto ciclópeo en los sectores Barbas del sol en una longitud de 165 mts y Apartada el cocuelo en una longitud de 150 mts, en ambos sectores en un ancho de 2,85 mts,

debido al tráfico de vehículos y motos en el sector solo se ejecutaron las actividades en solo la mitad de la via para permitir el tránsito de las comunidades.

- En el sector Pacho Martínez en una longitud de 400 mts se realizó la excavación y y subbase y se le realizo un mejoramiento en aproximadamente una longitud de 300 metros con un ancho de 2 mts y un espeso de 0.15 mts
- Mediante comunicado C. Int – 132 del 1 de DICIEMBRE de 2020 se solicita listado de personal que ingresara a realizar las actividades de obra.
- Mediante comunicado MV-LP-002-2020-019 el contratista allega a la interventoría la caracterización del material de subbase.
- Mediante comunicado MV-LP-002-2020-020 el contratista allega a la interventoría la relación de personal y maquinaria requerida en obra.
- Mediante comunicado MV-LP-002-2020-021 el contratista solicita el balance de obra.
- Mediante comunicado C. Int – 153 del 14 de DICIEMBRE de 2020 se cita al contratista y la alcaldía a comité de obra, los cuales se realizaran cada 8 dias.
- Mediante comunicado C. Int – 157 del 24 de DICIEMBRE de 2020 se emite aprobación parcial de estudios y diseños.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

VALOR PROGRAMADO (BÁSICO DE OBRA)	$582.559.819,97	55,81%
VALOR EJECUTADO	$255.365.339,36	24,46%

A la fecha de presentación del informe, el contratista ya entrego la documentación correspondiente a los estudios y diseños y ya inicio actividades de obra.

AVANCE FÍSICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

PROGRAMADO	53,95%
EJECUTADO	41,63%

La programación corresponde a inicio de actividades en obra tales como:

- Excavaciones varias en material común en seco.
- Relleno para estructuras con recebo
- Concreto Resistencia 21 MPa (D)
- Concreto Resistencia 14MPa (F)

- Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)
- Subbase Granular Clase C

AVANCE PREDIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Fuentes de material: 1
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2020:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Se encuentran descritas en la parte de arriba de San José de Uré

12. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

12.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** 12

CONTRATO DE OBRA No.: MV-LP-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

PLAZO INICIAL: SIETE (7) NESES
FECHA DE INICIACION: 13 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.043.889.132,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.043.889.132,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 4,5
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	metros	1000
Construcción	unidad	2
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	metros	300
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 260.537.043,20	$ 361.504.375,80		$ 361.504.375,80	1,39	$ 19.779.704,00	1,00	0,05
Acumulado:	$ 582.559.819,97	$ 454.011.668,80		$ 454.011.668,80	0,78	$ 61.073.224,43	1,00	0,13

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 1.043.889.132,00
Total	$ 1.043.889.132,00

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,43	4,50	0,64	2,50	$ 589.877.463,20	0	$ 1.043.889.132,00	$ 461.329.312,03
Interventor:	0,43	5,00	1,00	0,00	$ 242.856.851,72	2,5	$ 242.856.851,72	$ 242.856.851,72

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 19.424.593,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 19.424.593,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	19/06/2020	19/05/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19/06/2020	19/01/2024
Calidad de Estudios y Diseños	30/07/2020	19/01/2026
Estabilidad y Calidad de Obra	AMPARA 5 AÑOS	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/06/2020	19/01/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

12.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CORDOBA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: **DICIEMBRE** **CONTRATO No.** **MV-LP-002-2020** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS - VALENCIA)- SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

CONTRATISTA: **TVP MUNICIPIOS** **SECTOR:** VALENCIA
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**
Excavadora	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**
Vibro compactador	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**
Volqueta 6X4 14 M3	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**I**	**A**	**A**	**A**	**I**	**I**	**I**	**I**	**A**	**I**	**I**	**I**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JHON CARLOS VIDAL E
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202148611COR

Firma
Nombre: ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 22202097163COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

12.3. PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: DICIEMBRE **CONTRATO DE OBRA No.** MV-LP-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS - VALENCIA)- SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS **SECTOR:** VALENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **779 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020


NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MANUEL ARTURO PETRO PETRO	DIRECTOR DE OBRA																															
JHON CARLOS VIDAL ESTRADA	RESIDENTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
YOCASTA LUCIA DE LA BARRERA CRUZ	PROFESIONAL SISO																		X													
LUIS ALBERTO SALAS MARQUEZ	TOPOGRAFO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
OLGA PATRICIA TAMARA VIDAL	INSPECTOR DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
CARLOS ANDRES GOMEZ TORREGLOSA	OPERADOR VIBRO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
PEDRO CASTELLANO GARCIA	OPERADOR MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
ROO MARIO ARROYO RIVEROS	OPERADOR RETROCARGADOR	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
OSCAR JAVIER ORTEGA ORTIZ	CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
IVAN SUAREZ	MAESTRO DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
ELIGIO MEJIA RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
DANIEL PAYARES SOTO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
OMAR HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
ENOC ARRIETA MORALES	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
ALDAIR ANGULO ANGULO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
DANIEL ALVAREZ VIDAL	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
OBIER REYES VERGARA	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
HUMBERTO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
ELVER ACOSTA FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
FRANCISCO OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
JAIRO HERNANDEZ MERCADO	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
CARLOS REYES MENDOZA	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
ALEX LORA MARQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
ORFIDIO MORALES LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
JULIO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
NORELIZ AVILA DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			
RAFAEL NARVAEZ	AYUDANTE DE OBRA	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X				X	X	X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.



Firma
Nombre: JHON CARLOS VIDAL E
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202148611COR



Firma
Nombre: ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 22202097163COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

12.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: MV-LP-002-2020 **CONTRATISTA:** TVP MUNICIPIOS

MES INFORME MENSUAL: 12 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

SECTOR: VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	20200345		20200345	SRG	MV-LP-002-2020	1.999.963.880,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.043.889.132,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MANUEL ARTURO PETRO PETRO
Director de Obra
Matrícula No.: 22202-097806COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

12.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA		DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No **MV-LP-002-2020** **CONTRATISTA:** TVP MUNICIPIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE DE VIA (CALLEJAS- VALENCIA)- SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

SECTOR: VALENCIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	22	24	24	21	24	24	24	24	21	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	20	24	20	20	24				644
Lluvias moderadas		2			3					3								4						4			4					20
Lluvias intensas	4																									4						8
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JHON CARLOS VIDAL E
Residente de Obra
Matrícula No.: 22202148611COR

Firma
Nombre: ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 22202097163COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

12.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11
(NO APLICA PARA ESTE INFORME)

12.7. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) | 12 (Mes) | 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: MV-LP-002-2020

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 12 DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CRUCE DE VIA (CALLEJAS-VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA

SECTOR: VALENCIA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
MANUEL ARTURO PETRO PETRO	DIRECTOR DE OBRA	DICIEMBRE	30	78.714.017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
JHON CARLOS VIDAL ESTRADA	RESIDENTE DE OBRA	DICIEMBRE	30	78.767.715	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
YOCASTA LUCIA DE LA BARRERA CRUZ	PROFESIONAL SISO	DICIEMBRE	30	50.915.880	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
LUIS ALBERTO SALAS MARQUEZ	TOPOGRAFO	DICIEMBRE	30	6.956.640	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
OLGA PATRICIA TAMARA VIDAL	INSPECTOR DE OBRA	DICIEMBRE	30	1.068.807.718	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
ELVER ACOSTA	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	4	1.068.815.393																											x	x	x	9415194571	4		9415194571	4	9415194571	4	TVP MUNICIPIOS	
DANIEL ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	13	10.902.699																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9415194571	13		9415194571	13	9415194571	13	TVP MUNICIPIOS	
ALDAIR ANGULO	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	6	1.010.154.978	x	x	x	x	x	x																								9415194571	6		9415194571	6	9415194571	6	TVP MUNICIPIOS	
ALFREDO CUADRADO	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	13	7.383.910	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	9415194571	13		9415194571	13	9415194571	13	TVP MUNICIPIOS	
REMBERTO DE HOYOS	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	13	1.068.814.963	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	9415194571	13		9415194571	13	9415194571	13	TVP MUNICIPIOS	
MELISSA FERNANDEZ	PALETERA	DICIEMBRE	4	1.068.823.502	x	x	x	x																										9415194571	4		9415194571	4	9415194571	4	TVP MUNICIPIOS	
PEDRO GARCEZ	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	5	1.068.818.894	x	x	x	x	x																									9415194571	5		9415194571	5	9415194571	5	TVP MUNICIPIOS	
OMAR HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	27	10.904.835	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					9415194571	27		9415194571	27	9415194571	27	TVP MUNICIPIOS	
HUMBERTO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	14	10.902.556	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																9415194571	14		9415194571	14	9415194571	14	TVP MUNICIPIOS	
ELIGIO MEJIA	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	3	1.068.813.530	x	x	x																											9415194571	3		9415194571	3	9415194571	3	TVP MUNICIPIOS	
ENOC MORALES	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	28	1.003.466.079	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				9415194571	28		9415194571	28	9415194571	28	TVP MUNICIPIOS	
YONOVER PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	27	1.068.815.227	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					9415194571	27		9415194571	27	9415194571	27	TVP MUNICIPIOS	
OBIER REYES	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	14	1.193.114.317	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																9415194571	14		9415194571	14	9415194571	14	TVP MUNICIPIOS	
GUSTAVO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	5	1.003.464.229	x	x	x	x	x																									9415194571	5		9415194571	5	9415194571	5	TVP MUNICIPIOS	
LUIS TAPIA	AYUDANTE DE OBRA	DICIEMBRE	28	1.068.815.432	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					9415194571	28		9415194571	28	9415194571	28	TVP MUNICIPIOS	
CARLOS ANDRES GOMEZ TORRESGLOSA	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	DICIEMBRE	30	1.073.994.356	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
PEDRO CASTELLANO GARCIA	OPERADOR MOTONIVELADORA	DICIEMBRE	30	10.901.671	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
ROO MARIO ARROYO RIVEROS	OPERADOR RETROCARGADOR	DICIEMBRE	30	1.108.762.490	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	
OSCAR JAVIER ORTEGA ORTIZ	CONDUCTOR VOLQUETA	DICIEMBRE	30	8.903.271	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	9415194571	30		9415194571	30	9415194571	30	TVP MUNICIPIOS	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: MANUEL ARTURO PETRO PETRO
Director de Obra
Matrícula No.: 22202-097806COR

Firma
Nombre : JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

12.8. INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: ____ **SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No:** 5,00 **PERIODO MES:** DICIEMBRE **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	LP-MPL-002-2020	PLAZO INICIAL:	SIETE MESES (7)	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	FECHA DE INICIACIÓN:	14 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	
SECTOR:	VALENCIA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.043.889.032	VALOR ADICIONALES:	
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	779 DE 2020	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
MV-LP-002-2020			$ 1.043.889.132	################

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
Total	

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
779			$ 426.076.525	

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:								
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:								
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 19.424.593,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 685.650	$ -	$ 1.371.300	$ -
Relleno para estructuras con recebo														$ 725.895	$ -	$ 1.451.790	$ -
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ -	$ -	$ 31.552.122	$ -
Concreto Clase F 14														$ 1.187.591	$ -	$ 2.375.182	$ -
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ -	$ -	$ 29.858.400	$ -
Subbase Granular Clase C														$ 41.467.972	$ 158.315.845	$ 82.935.944	$ 158.315.845
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 1.194.079	$ 19.186.237	$ 2.388.158	$ 19.186.237
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 74.523.107	$ 41.874.173	$ 149.046.214	$ 41.874.173
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa														$ 24.844.732	$ 27.454.069	$ 43.478.281	$ 27.454.069
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 63.355.223	$ 28.747.821	$ 126.710.446	$ 28.747.821
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.														$ 52.552.794	$ 18.164.001	$ 91.967.389	$ 18.164.001
Gavion de malla en alambre de acero entrelazado clase 1														$ -			
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles														$ -			
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles														$ -			
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad														$ -			
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS														$ -	$ -	$ 19.424.593	$ 18.520.194
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL														$ -			
Etapa de cierre financiero														$ -			
														$ 260.537.043,0	$ 293.742.146	$ 582.559.819	$ 312.262.340

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: MANUEL ARTURO PETRO PETRO
Director de Obra
Matrícula No.: 22202-097806COR

Firma
Nombre : JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No. 25202-097497 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

12.9. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 **CONTRATISTA:** TVP MUNICIPIOS

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13/08/2020

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/03/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.043.889.132,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.043.889.132,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.424.593,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.424.593,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	30%	$ 313.166.739,60	19 / 6 / 2020	19/05/2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 208.777.826,40	19 / 6 / 2020	19 / 1 / 2024
Calidad de Estudios y Diseños	0,56%	$ 5.827.378,00	30 / 7 / 2020	19 / 1 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 313.166.739,60	Ampara 5 años	14 / 8 / 2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **540-47-994000011835**

Certificado de modificación o anexo No.: **4**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	17%	$ 175.560.600,00	19 / 6 / 2020	19 / 1 / 2021
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **540-74-994000002717** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

12.10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIA EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

FECHA DE INICIO: 13/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** SIETE (7) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 12/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ X NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MANUEL ARTURO PETRO PETRO
Director de Obra
Matrícula No.: 22202-097806COR

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

12.11. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

(NO APLICA)

- ✓ **Seguimiento Programa de Obra**

- ✓ **Seguimiento Programa de Inversiones.**

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

MINFRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MIN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (día)	DICIEMBRE (mes)	2020 (año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: MV-LP-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** Cruce de Vía (Calleja - Valencia) - San Rafael - La Blanca - Caudal Central (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses según las prórrogas de suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13 DE AGOSTO DE 2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12 DE MARZO DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.043.889.132,00 (Sumira contratos principal y adiciones) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A)** $ 1.043.889.132,00

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(A) OBRA PROGRAMADA / (B) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(B) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021				
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.371.300,00	0,131%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,07%	0,07%	0,000%	0,000%				100%
	$1.371.300,00	0,131%	$0	$ P				$685.650	$685.650						
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				96,00%
Relleno para estructuras con recebo	$1.451.790,00	0,139%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,07%	0,07%	0,000%	0,000%				
				$ P				$725.895	$725.895						
	$1.451.790,00	0,139%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				90,00%
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	$31.552.122,00	3,023%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	3,02%	0,000%	0,000%	0,000%				
				$ P				$31.552.122							
	$31.552.122,00	3,023%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				84,00%
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$2.375.182,00	0,228%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,11%	0,11%	0,000%	0,000%				
				$ P				$1.187.591	$1.187.591						
	$2.375.182,00	0,228%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				78,00%
Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	$29.858.400,00	2,860%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	2,86%	0,000%	0,000%	0,000%				
				$ P				$29.858.400							
	$29.858.400,00	2,860%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				72,00%
Subbase Granular Clase C	$145.137.902,00	13,904%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	3,97%	3,97%	3,97%	1,99%				
				$ P				$41.467.972	$41.467.972	$41.467.972	$20.733.986				
	$145.137.902,00	13,904%	$0	$ E											
				% E		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				66,00%
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.179.278,00	0,400%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,11%	0,11%	0,11%	0,06%				
				$ P				$1.194.079	$1.194.079	$1.194.079	$597.040				
	$4.179.278,00	0,400%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				60,00%
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	$279.461.652,00	26,771%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	7,14%	7,14%	7,14%	5,35%				
				$ P				$74.523.107	$74.523.107	$74.523.107	$55.892.330				
	$279.461.652,00	26,771%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				54,00%
Concreto piedra pegada - Resistencia 21 Mpa	$86.956.562,00	8,330%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	1,79%	2,38%	2,38%	1,79%				
				$ P				$18.633.549	$24.844.732	$24.844.732	$18.633.549				
	$86.956.562,00	8,330%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				48,00%
Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	$221.743.280,00	21,242%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	6,07%	6,07%	6,07%	3,03%				
				$ P				$63.355.223	$63.355.223	$63.355.223	$31.677.611				
	$221.743.280,00	21,242%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				42,00%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$183.934.778,00	17,620%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	3,78%	5,03%	5,03%	3,78%				
				$ P				$39.414.595	$52.552.794	$52.552.794	$39.414.595				
	$183.934.778,00	17,620%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				36,00%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36". Incluye rectificación de descoles	$3.031.888,00	0,290%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,29%				
				$ P							$3.031.888				
	$3.031.888,00	0,290%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				30,00%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$18.264.320,00	1,750%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,75%				
				$ P							$18.264.320				
	$18.264.320,00	1,750%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				24,00%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$4.424.634,00	0,424%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,42%				
				$ P							$4.424.634				
	$4.424.634,00	0,424%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				18,00%
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños	$19.424.593,00	1,861%	0,000%	% P	0,62%	0,62%	0,62%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
				$ P	$6.474.864	$6.474.864	$6.474.864								
	$19.424.593,00	1,861%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				12,00%
Obras de compensación ambiental	$10.721.451,00	1,027%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,03%				
				$ P							$10.721.451				
	$10.721.451,00	1,027%	$0	$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				6,00%
Etapa de cierre financiero				% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				
				$ P											
				$ E											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%				0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.043.889.132,00														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.043.889.132,00														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,62%		0,62%		0,62%		28,99%		24,06%		24,71%		19,48%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 6.474.864,33		$ 6.474.864,33		$ 6.474.864,33		$ 302.598.183,77		$ 260.337.043,20		$ 257.397.507,20		$ 203.391.404,83	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,62%		1,24%		1,86%		30,85%		55,81%		80,52%		100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 6.474.864,33		$ 12.949.728,67		$ 19.424.593,00		$ 322.022.776,77		$ 582.559.819,97		$ 840.497.727,17		$ 1.043.889.132,00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)									$ -		$ -		$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ - / $ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.043.889.132,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 1.043.889.132,00**

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Aprueba Firma
Nombre :
Jefe unidad ejecutora
Matrícula:

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.
Supervisor del contrato de Interventoría

Revisó Firma:
Nombre:
Matrícula No.
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

(Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	DICIEM (Mes)	2020 (Año)


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No: DE 1 a 31 de Diciembre 2020 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No: 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al numero del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

CONTRATO No: MV-LP-002-2020
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Cruce de Via (Calleja - Valencia) - San Rafael - La Bonca - Cuadual Central (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según catalogo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020
INTERVINTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13/08/2020 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.043.889.132,00 (segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.043.889.132,00

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/08/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(G) OBRA PROGRAMADA	(G) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(G) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.371.300,00	0,131%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%				100%
	$1.371.300,00	0,131%	$0	$ P				$685.650	$685.650						
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				90%
Relleno para estructuras con recebo	$1.451.790,00	0,139%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%				
	$1.451.790,00	0,139%	$0	$ P				$725.895	$725.895						
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	$31.552.122,00	3,023%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$31.552.122,00	3,023%	$0	$ P				$31.552.122							
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Concreto Resistencia 14MPa (F)	$2.375.182,00	0,228%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%				
	$2.375.182,00	0,228%	$0	$ P				$1.187.591	$1.187.591						80%
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	$29.858.400,00	2,860%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$29.858.400,00	2,860%	$0	$ P				$29.858.400							
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Subbase Granular Clase C	$145.137.902,00	13,904%	44,55%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,97%	3,97%	3,97%	1,99%				
	$145.137.902,00	13,904%	$64.659.000	$ P				$41.467.972	$41.467.972	$41.467.972	$20.733.986				
				$ E				$64.659.000	$51.511.670						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	4,93%	0,00%	0,00%				
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.179.278,00	0,400%	201,56%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,11%	0,06%				
	$4.179.278,00	0,400%	$8.423.700	$ P				$1.194.079	$1.194.079	$1.194.079	$597.040				
				$ E				$8.423.700	$131.906						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,01%	0,00%	0,00%				
Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	$279.461.652,00	26,771%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	7,14%	7,14%	5,35%				
	$279.461.652,00	26,771%	$0	$ P				$74.523.107	$74.523.107	$74.523.107	$55.892.330				
				$ E					$55.826.799						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,35%	0,00%	0,00%				
Concreto piedra pegada - Resistencia 21 Mpa	$86.956.562,00	8,330%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	2,38%	2,38%	1,79%				
	$86.956.562,00	8,330%	$0	$ P				$18.633.549	$24.844.732	$24.844.732	$18.633.549				
				$ E					$11.031.431						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,06%	0,00%	0,00%				
Acero de refuerzo de fy= 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	$221.743.280,00	21,242%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	6,07%	6,07%	6,07%	3,03%				
	$221.743.280,00	21,242%	$0	$ P				$63.355.223	$63.355.223	$63.355.223	$31.677.611				
				$ E					$31.690.091						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,05%	0,00%	0,00%				70%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$183.934.778,00	17,620%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,78%	5,03%	5,03%	3,78%				
	$183.934.778,00	17,620%	$0	$ P				$39.414.595	$52.552.794	$52.552.794	$39.414.595				
				$ E					$15.567.555						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,49%	0,00%	0,00%				60%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36". Incluye rectificación de descoles	$3.031.888,00	0,290%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%				
	$3.031.888,00	0,290%	$0	$ P							$3.031.888				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$18.264.320,00	1,750%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%				
	$18.264.320,00	1,750%	$0	$ P							$18.264.320				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				50%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$4.424.634,00	0,424%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%				
	$4.424.634,00	0,424%	$0	$ P							$4.424.634				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				40%
Revisión y/o ajustes a estudios y diseños	$19.424.593,00	1,861%	100,00%	% P	0,62%	0,62%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$19.424.593,00	1,861%	$19.424.593	$ P	$6.474.864	$6.474.864	$6.474.864								
				$ E	$5.500.000	$4.440.000	$5.168.017	$4.316.576							
				% E	0,53%	0,43%	0,50%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%				30%
Obras de compensación ambiental	$10.721.451,00	1,027%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%				
	$10.721.451,00	1,027%	$0	$ P							$10.721.451				
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				20%
Etapa de cierre financiero		0,000%	#¡DIV/0!	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		0,000%	$0	$ P											
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				10%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1.043.889.132,00**														0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.043.889.132,00**														

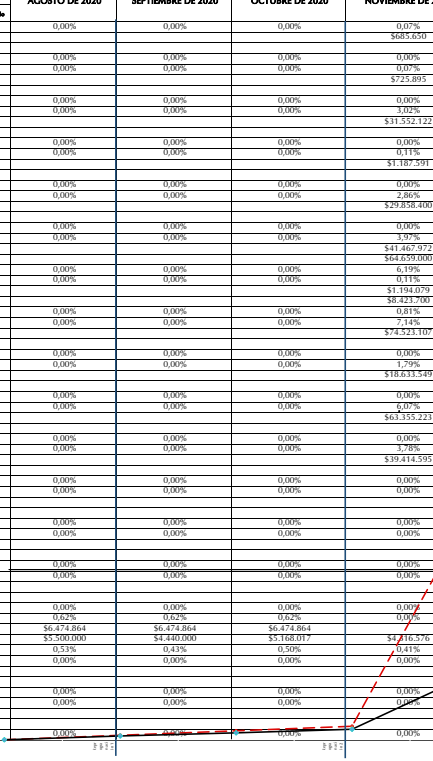

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el 'Valor básico de obra programada'.
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA.
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		3,00%		0,62%		0,62%		28,59%		24,86%		24,71%		19,48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$	6.474.864,33	$	6.474.864,33	$	6.474.864,33	$	302.598.183,77	$	260.537.043,20	$	257.937.907,20	$	203.391.404,83
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,62%		1,24%		1,86%		30,45%		55,31%		80,02%		100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$	6.474.864,33	$	12.949.728,67	$	19.424.593,00	$	322.022.776,77	$	582.559.819,97	$	840.497.727,17	$	1.043.889.132,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,53%		0,43%		0,50%		7,41%		15,00%		0,00%		0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$	5.500.000,00	$	4.440.000,00	$	5.168.016,78	$	77.399.276,22	$	162.559.432,36	$	-	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,53%		0,95%		1,45%		8,86%		24,76%		24,76%		24,76%
	VALOR (Miles de Pesos)	$	5.500.000,00	$	9.940.000,00	$	15.108.016,78	$	92.507.293,00	$	258.466.748,36	$	258.466.748,36	$	258.466.748,36

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C= (A+B)	**$ 1.043.889.132,00**	**$ 1.043.889.132,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 1.043.889.132,00**	**$ 1.043.889.132,00**

CONVENCIONES		
TIPO DE DATO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202- 097497CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

- ✓ **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**
  MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	16 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 DE 2020 MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Elkin Estrada Coronado	Ing. Residente Interv.	Consorcio Interventoria 2020
Jhon Carlos Vidal.	Ing. Residente de obra.	TVP Municipios.
Maria Luisa Aldana.	Secretaria de obras Publicas	Alcaldia Municipal de Valencia.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Revisar los porcentajes de avance de obra.
- Realizar Seguimiento a las actividades propuestas en el PAGA.
- Revisar Compromisos pactados.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Avance de obra.
- Seguimiento al PAGA.
- Toma de ensayos antes de fundir tramos nuevos.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA MNUR 14 FR 1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- La interventoría manifiesta retraso en obra por lo que pueden continuar los retrasos en la programación de obra. El contratista manifiesta tener en obra el personal idoneo, contando con un total de 29 obreros. sabiendo que las obras en fisico inician desde el 23 de Noviembre, teniendo hasta el momento 164 de avance fisico en obra con las siguientes cantidades: 315m de placa reforzada y 260m de cunetas.
- El contratista adelanta actividades de cumplimiento del Paga con evidencias de cuenta con capacitación de Residuos Implementa de Bioseguridad. Como muestra de cumplimiento de las fichas dispuestas en el PAGA.
- El Contratista realiza el muestreo antes de fundir llevando así su control de calidad que es verificado por los ensayos de interventoria.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
• Adecuación de 400m en el sector Pacho Martinez con subbase.	17 - Diciembre.	Jhon Carlos Vidal
• Visita del personal SISO para Capacitaciones	18 - Diciembre	Jhon C. Vidal
• Capacitación con personal social.	21 - Diciembre.	Jhon C. Vidal.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: 23 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

NOTAS
1 Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos

2 Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 16 (Día) 12 (Mes) 200 (Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Elkin Estrada Coronado	
JHON CARLOS UBAL E	
María Luisa Aldana Villalba	María Luisa Aldana V.

Original Informe mensual de Interventoría
Copias Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14 FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 23 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 DE 2020 MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Elkin Estrada Coronado	Ing. Residente de Interventoria	Consorcio Interventorias 2020
Jhon Carlos Vidal	Ing Residente de obra	TVP Municipios
Alejandro Morales Garcia	Ing obras publicas	Alcaldia
Maria Luisa Aldana Villalba	Ing. obras publicas	Alcaldia

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Verificar cantidades y avance de obra.
- Revision de planillas de Pago.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Avance de obra
- Planillas de Pago.
- Firma de acta pendiente.
- Revisión de actividades de mejoramiento.
- Balance de Obra.

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 23 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

- Se inicia con la verificación de cantidades y avance de obra. que se tienen a la fecha. Al 23 de Diembre del año en curso se cuenta con un 26% de avance del proyecto.
- El contratista manifiesta que para el acta parcial se le incluya el mejoramiento en el sector Abantado El Cocuelo que ya cuenta con densidades. De igual forma, el contratista Constobla se debe incluir el mejoramiento del sector Pacho Martinez, el cual tiene un alcance de 400m.
- Se le manifiesta al contratista que suministre las planillas de pago para tramitar el acta. Tambien se le recuerda firmar el acta de Ajustes y diseño.
- El Contratista solicita el Buntace de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Acta firmada de Ajustes y Diseños.	23-12-2020	Contratista
Planillas de pago	24-12-2020	Contratista
Balance de Obra	24-12-2020	Interventoria.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA: 30 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Elkin Estrada Coronado	
María Luisa Aldana V.	María Luisa Aldana V.
Alejandro Morales García	Alejandro M
JHON CARLOS VIDAL E.	
Fabiana Montiel Arroyo.	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	29 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020 **DE** 2020 MUNICIPIO DE VALENCIA

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 770 **DE** 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Maria Luisa Aldana	Arq. Obras Publicas	Alcaldia
Alejandro Morales	Ing. obras Publicas	Alcaldia
Ihan Nidal E.	Ing Residente obra	Contratista
Elkin Estrada	Ing Residente Inte	Interventoria

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Verificar Cantidades y Avance de Obra
- Socializar Acta Parcial N-1

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Avance de Obra
- Balance de Obra
- Acta Parcial de Obra N. 1

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 29 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se inicia con la verificación de las cantidades y avance de obra q' se tiene a la fecha 29/12/2020. Cuenta con un avance del 30%.
- El contratista indica q' anexo a nuestro correo un balance de obra ajustado para indicar q' su porcentaje de ejecución es mayor al 30%.
- El contratista se le recuerda q' el porcentaje mínimo de avance para cobro es del 30% y manifiesta q' en la primera semana laboral de enero/2021, enviara el Acta con novedad para revisión por parte de la interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
- Balance de Obra	04/01/2021	Contratista
- Acta Parcial No 1	04/01/2021	Contratista
- Revisión de Balance y Acta	05/01/2021	Interventoría

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 6 (Día) / 01 (Mes) / 2021. (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	29	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
JHON CARLOS CADAVID	
María Luisa Aldana V.	
Alejandro Morales	
Elkin Eduardo Coronado	

Original: Informe mensual de interventoría
Copias: Contratista, interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

✓ **Acta de Reunión**

MINFRA-MN-IN-1-FR-4

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

(NO APLICA PARA ESTE INFORME)

- ✓ **INFORME SEMANAL**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 11 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 04/12/2020 al 10/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13 de Agosto 2020.

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	MV-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.043.889.132,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.043.889.132,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.043.889.132	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.043.889.132,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 12
VALOR FACTURA: $ 310.184.739,60 FECHA FACTURA: 15/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 123.880.561,28

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	


MES FACTURADO: 4
VALOR FACTURA: $ 28.995.218,70 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	43,89		43,89
ACERO (%)			
SUBBASE (Km)	43,89		43,89
CONCRETO CLASE D			
CONCRETO PIEDRA PEGADA			
CUNETA			
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:	1		1
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Corregimiento Loma Grande en el municipio de Montería	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	Corregimiento de Rio Nuevo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista el pasado 23 de octubre, informan cual va a ser la fuente de materiales.

El 24 de noviembre pasado fue enviado al Contratista el oficio C. Int - 126 - 2020, , recordando la entrega de la información pendiente de la cantera Loma Grande (documentación ambiental)

OTROS (Especificar cual) SI ____ NO X N/A ____

OBSERVACIONES: En el acta de radicación ambiental entregada el pasado 23 de octubre, el Contratista manifiesta que no requiere de permisos ambientales para la ejecución de la obra.

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 23 de octubre fue remitido por correo electrónico a Interventoría, la quinta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resueltas las recomendaciones y/o observaciones; por tanto se considera aprobado esta versión del documento.

OBSERVACIONES:
El Contratista en atención al oficio C. Int - 126 - 2020, envía el oficio COM. MV-LP-002- 2020-017 el mismo 24 de noviembre, anexando la información requerida (documentación ambiental de la cantera Loma Grande); es decir que a la fecha el Contratista se encuentra al día con la documentación del PAGA.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: ____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____
AVALÚOS APROBADOS: ____
PREDIOS ADQUIRIDOS: ____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: ____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: ____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: ____
OTROS: ____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A la fecha se tiene la totalidad del acero figurado para todos los tramos
Por parte del laboratorio, se realizaron las pruebas de densidades en el sector Barbas del Sol y Apartada El Cocuelo
En el sector Apartada el Cocuelo esta programado para el día 12/12/2020 el fundido de los primeros metros de concreto
Dentro de los 150 m comprendidios entre el PR2+480 y el PR2+630 en el sector Barbas del Sol, se fundieron 75m de concreto con un ancho de 0.90m
En el sector Barbas del Sol, se inció el fundido del concreto para cunetas


Porcentaje programado acumulado: 37,21%, Porcentaje ejecutado acumulado: 11,44%, Porcentaje de atraso 25,77% , Valor ejecutado: $119,421,013,19.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de obra de subbase y fundir concretos para los sectores de placa huella y cunetas

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. ____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar acompañamiento en las actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202 - 097497 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 18 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **19** (Numeración consecutiva) del 10/12/2020 al 17/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13 de Agosto 2020.

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	MV-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.043.889.132,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.043.889.132,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.043.889.132	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.043.889.132,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 12

VALOR FACTURA: $ 310.184.739,60

FECHA FACTURA: 15/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: 5

VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00


FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACION (%)	44,65		44,65
ACERO (%)	11,27		11,27
SUBBASE (Km)	41,54		41,54
CONCRETO CLASE D	11,72		11,72
CONCRETO PIEDRA PEGADA			
CUNETA	11,95		11,95
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:	1		1
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Corregimiento Loma Grande en el municipio de Montería	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	Corregimiento de Rio Nuevo	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista el pasado 23 de octubre, informan cual va a ser la fuente de materiales.

El 24 de noviembre pasado fue enviado al Contratista el oficio C. Int - 126 - 2020, , recordando la entrega de la información

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el acta de radicación ambiental entregada el pasado 23 de octubre, el Contratista manifiesta que no requiere de permisos ambient ales para la ejecución de la obra.

pendiente de la cantera Loma Grande (documentación ambiental)

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 23 de octubre fue remitido por correo electrónico a Interventoría, la quinta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resueltas las recomendaciones y/o observaciones; por tanto se considera aprobado esta versión del documento.

OBSERVACIONES:
El Contratista en atención al oficio C. Int - 126 - 2020, envía el oficio COM. MV-LP-002- 2020-017 el mismo 24 de noviembre, anexando la información requerida (documentación ambiental de la cantera Loma Grande); es decir que a la fecha el Contratista se encuentra al día con la documentación del PAGA.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A la fecha se tiene la totalidad del acero figurado para todos los tramos
En el sector Loma Pacho Martinez la topografia esta seriendo para ara empezar la excavacion en el dia de hoy en los PR9+110 y el PR9+510
En el sector Apartada el Cocuelo se ejecuo a la fecha 150 mts se fundio 150 mts de placa reforzada con ancho de 0,9 mts y 150 mts de cuneta con un ancho de 0,7 mts por 2,5 metros que contiene la mitad de la placa
En el Sector Barbas del Sol se ejecutaron hasta la fecha 165 mts comprendidios entre el PR2+480 y el PR2+630 en el sector Barbas del Sol, se fundieron 165m de concreto de placa con un ancho de 0.90m y 165 mts de cuneta con ancho de 0,7 mts


Porcentaje programado acumulado: 43,38%, Porcentaje ejecutado acumulado: 15,52%, Porcentaje de atraso 27,86% , Valor ejecutado: $162,048,057,04

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de obra de subbase y fundir concretos para los sectores de placa huella y cunetas

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar acompañamiento en las actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202 - 097497 CND

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **20** (Numeración consecutiva) del 17/12/2020 al 24/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13 de Agosto 2020.

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	MV-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.043.889.132,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.043.889.132,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31/12/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.043.889.132	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.043.889.132,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 12

VALOR FACTURA: $ 310.184.739,60 FECHA FACTURA: 15/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: 5

VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	45,35		45,35
ACERO (%)	11,46		11,46
SUBBASE (Km)	74,63		74,63
CONCRETO CLASE D	11,72		11,72
CONCRETO PIEDRA PEGADA	9,13		9,13
CUNETA	11,95		11,95
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:	1		1
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Corregimiento Loma Grande en el municipio de Montería	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	Corregimiento de Rio Nuevo	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el acta de radicación ambiental entregada el pasado 23 de octubre, el Contratista manifiesta que no requiere de permisos ambientales para la ejecución de la obra.

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 23 de octubre fue remitido por correo electrónico a Interventoría, la quinta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resueltas las recomendaciones y/o observaciones; por tanto se considera aprobado esta versión del documento.

OBSERVACIONES:
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A la fecha se tiene la totalidad del acero figurado para todos los tramos

En el sector Loma Pacho Martinez se determino un mejoramiento de la subbase en 300 metros de largo y dos metros de ancho con un espesor de 0,3 mts en los PR9+210 y el PR9+510

En el sector Apartada el Cocuelo se fundio una longitud de 150 mts de placa reforzada con ancho de 0,9 mts y 150 mts de cuneta con un ancho de 0,7 mts, y se esta fundiendo concreto ciclopeo o piedra pegada hasta la fecha en aprox 70 mts lineales (ciclopeo central: 0,9 mts y sobreanchos : 0,35mts)

En el Sector Barbas del Sol se ejecutaron hasta la fecha 165 mts comprendidios entre el PR2+480 y el PR2+630 en el sector Barbas del Sol, se fundieron 165m de concreto de placa con un ancho de 0.90m y 165 mts de cuneta con ancho de 0,7 mts y se esta fundiendo piedra pegada o concreto ciclopeo con una longitud aproximada a la fecha de 80 metros lineales (ciclopeo central: 0,9 mts y sobreanchos : 0,35mts)

Hasta la fecha de hoy el contratista tiene un avamnce aproximado del 28% y con la intencion de la proxima semana superar el 30% de avance y poder tramitar un acta parcial del 30% como se lo permite el contrato de obra en sus clausulas.

Mediante comunicado C.Int - 157 del 24 de diciembre se emite acta de aprobación parcial de estudios y diseños


Porcentaje programado acumulado: 49,63%, Porcentaje ejecutado acumulado: 24,46%, Porcentaje de atraso 25,17% , Valor ejecutado: $255,365,339,36.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de obra de subbase y fundir concretos para los sectores de placa huella y cunetas

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar acompañamiento en las actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202 - 097497 CND

FECHA: 1 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **21** (Numeración consecutiva) del 25/12/2020 al 31/12/2020

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ROLANDO ARTURO ESPITIA CAMARGO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 13 de Agosto 2020.

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	TVP MUNICIPIOS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	MV-LP-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.043.889.132,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.043.889.132,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 13/03/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 426.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.043.889.132	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.043.889.132,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 12
VALOR FACTURA: $ 310.184.739,60 FECHA FACTURA: 8/01/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 183.219.673,28

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	


MES FACTURADO: 5
VALOR FACTURA: $ 59.339.112,00 FECHA FACTURA: 11/12/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 94.885.342,58

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100
EXCAVACIÓN (%)	96,88		96,88
ACERO (%)	11,46		11,46
SUBBASE (Km)	96,88		96,88
CONCRETO CLASE D	58,16		58,16
CONCRETO PIEDRA PEGADA	22,5		22,5
CUNETA	33,08		33,08
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:	1		1
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento Loma Grande en el municipio de Montería — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: Corregimiento de Rio Nuevo — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

OBSERVACIONES: Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el acta de radicación ambiental entregada el pasado 23 de octubre, el Contratista manifiesta que no requiere de permisos ambientales para la ejecución de la obra.

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 23 de octubre fue remitido por correo electrónico a Interventoría, la quinta versión del documento PAGA; la Interventoría realizó la revisión y se evidenció que fueron resueltas las recomendaciones y/o observaciones; por tanto se considera aprobado esta versión del documento.

OBSERVACIONES:
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A la fecha se tiene la totalidad del acero figurado para todos los tramos

En el sector Loma Pacho Martinez se termino la excavacion , subbase y mejoramiento de la subbase en 300 metros de largo y dos metros de ancho con un espesor de 0,3 mts en los PR9+210 y el PR9+610

En el sector Apartada el Cocuelo se fundio una longitud de 150 mts de placa reforzada con ancho de 0,9 mts y 150 mts de cuneta con un ancho de 0,7 mts, y se fundio concreto ciclopeo o piedra pegada hasta la fecha en todos los 150 mts lineales (ciclopeo central: 0,9 mts y sobreanchos : 0,35mts)

En el Sector Barbas del Sol se ejecutaron hasta la fecha 165 mts comprendidios entre el PR2+480 y el PR2+630 en el sector Barbas del Sol, se fundieron 165m de concreto de placa con un ancho de 0.90m y 165 mts de cuneta con ancho de 0,7 mts y se fundio piedra pegada o concreto ciclopeo en una longitud de 150 mts lineales (ciclopeo central: 0,9 mts y sobreanchos : 0,35mts)


Porcentaje programado acumulado: 55,81%, Porcentaje ejecutado acumulado: 43,49%, Porcentaje de atraso 12,32% , Valor ejecutado: $454,001,668,80.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con las actividades de obra de subbase y fundir concretos para los sectores de placa huella y cunetas

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar acompañamiento en las actividades de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202 - 097497 CND

13. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

13.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 779 DE 2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 426.076.525,00 INCLUIDO IVA
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020** **NIT. 901.381.064-3** **Integrado por:** MIGUEL ROBLES S.A.S., con Nit: 901.252.893-1, con un porcentaje de participación del 60% y R&J INGENIERÍA S.A.S., con Nit: 900.171.717-1, con un porcentaje de participación del 40%
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Carrera 58 # 90 – 53, Bogotá Colombia
PBX	3225888
CORREO ELECTRÓNICO	Proyectos@ryjingenieria.com
FECHA DE INICIO	AGOSTO 04 DE 2020
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA 1	HASTA EL 13 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	HASTA EL 13 DE MARZO DE 2021
SISTEMA	ACTAS DE COSTOS
PÓLIZAS	Seguros del Estado- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal N° 41-44-101230573, anexo de modificación N° 5 ajuste de vigencias.

13.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

a) Revisión de avance de inversión semanal programado y ejecutado, de acuerdo a los programas de inversión solicitados a los contratistas.
b) Diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en cuando a la gestión de reportes de avance semanal.
c) Atención y respuesta de comunicados a los proyectos, de conformidad con la correspondencia recibida y enviada, los cuales se anexan al presente informe.
d) Revisión de estudios y diseños de cada uno de los contratos de obra, emitiendo los conceptos y observaciones necesarias para correcciones.
e) Revisión de Valla informativa para instalación en cada Proyecto.
f) Revisión de documento PAGA y entrega de observaciones a contratistas para correcciones.
g) Solicitud de reprogramación de obra y plan de contingencia por retrasos en entregas de documentación correspondiente a la etapa de estudios y diseños.
h) Acompañamiento a Contratista y Entidad en cambio de abscisas y ubicación de obras iniciales de acuerdo a solicitudes de Alcaldías.

13.3. INFORMES ESPECIALISTAS

En el periodo 01 al 31 de DICIEMBRE de 2020, se contó con apoyo de los profesionales mencionados a continuación, en revisión de temas pertinentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING. JORGE ELIECER IBARRA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	ING. CARLOS ALBERTO CORTES VALERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2	ING. ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO
AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	ING. JESÚS DAVID PÁEZ BUELVAS
SECRETARIA 1	María José González Muñoz
SECRETARIA 2	Fabiana Montiel Aroca

INFORME GESTION AMBIENTAL No. 5

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

ASUNTO: Actividades desarrolladas en la Interventoría Ambiental

ELABORADO POR: Jorge Eliecer Ibarra Hernández

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de diciembre de 2020

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- Dentro de las actividades de seguimiento se envió el oficio C. Int - 149 – 2020 a 4L Ingeniería SAS, contratista del municipio de Uré, solicitando una vez más los ajustes al documento PAGA, realizados a través del oficio C. Int - 111 – 2020.

- Revisión No. 02 del documento PAGA correspondiente al proyecto del municipio de San José de Uré; de la revisión se originó el oficio C. Int - 159 – 2020, por medio del cual se da por aprobada la versión del documento presentado, sin embargo, queda pendiente complementar la documentación que acredite la legalidad Ambiental y Minera de la cantera a utilizar, así como entregar diligenciados los siguientes
  Formatos:

    - MSOAMB-MN-IN-1-FR-1: Acta de radicación ambiental y social de proyectos.
    - MSOAMB-MN-IN-1-FR-2: Plan de inversión ambiental.
    - MSOAMB-MN-IN-1-FR-6: Plan de inversión social.
    - MSOAMB-MN-IN-1-FR-12: Acta de vecindad.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A CORTE DEL PRESENTE INFORME

Fecha	Tipo de Correspondencia	Destinatario	Asunto de la correspondencia
14/12/2020	Oficio C. Int - 149 - 2020	4L INGENIERIA SAS - Contratista de San José de Uré	Solicitud de ajuste al documento PAGA presentado
28/12/2020	Oficio C. Int - 159 - 2020	4L INGENIERIA SAS - Contratista de San José de Uré	Aprobación del PAGA

Atentamente,

JORGE IBARRA HERNÁNDEZ
Especialista Ambiental

Bogotá D.C., 14 de Diciembre de 2020. C. Int – **149** – 2020.
Responder con este código.

Señores:
4L INGENIERIA SAS
Atn: Jesús Alberto Martínez Padilla
Representante Legal.
Calle 35 8 A – 04.
Montería – Córdoba.
Jose.mor2012@hotmail.com

REFERENCIA: CONTRATO 779 – 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO PAGA – OFICIO C. INT – 111 - 2020.

Respetados Señores:

Una vez más nos permitimos pedir la nueva versión del documento PAGA, atendiendo las observaciones realizadas a través del oficio C. Int – 111 – 2020 del pasado 10 de noviembre, y requerido también por medio del oficio C. Int – 127 – 2020 del 24 de noviembre pasado. Toda vez que ya fueron iniciadas las actividades en obras y este documento es indispensable para la implementación, control y seguimiento de los programas y proyectos necesarios para la mitigación de posibles impactos ambientales.

Así mismo debe ser entregado a esta Interventoría los documentos correspondientes a C. Int – 130 – 2020 del 25 de Noviembre, C. Int – 144 – 2020 del 10 de Diciembre de 2020, los cuales también son necesarios para el control administrativo y técnico de las obras en ejecución.

De igual manera, para llevar un control administrativo, técnico y ambiental de la ejecución de las obras, se programa un comité técnico semanal a realizar todos los martes en las instalaciones de la Alcaldía de San José de Uré, contando con la participación del Director y/o Residente de obra.

Por último, recordamos la necesidad de contar en obra de un profesional y/o inspector ambiental que esté al frente por parte del Contratista de la implementación, control y seguimiento de lo plasmado en el documento PAGA, antes mencionado, dicho personal se había autorizado por parte de esta Interventoría mediante comunicado C. Int – 067 – 2020 del 30 de septiembre de 2020.

Cordialmente,

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020.

JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA.
Rep Legal.

JORGE IBARRA HERNANDEZ.
Especialista Ambiental.

Copia: Archivo.
Copia: Ing Arturo Espitia Buitrago – Gestor Proyecto INVIAS. Ing Diego José Abad Durango – Director Territorial Córdoba. Alcaldía Municipal de San José de Uré.
Elaboró: JIH 14.12.2020.

Bogotá D.C., 28 de Diciembre de 2020. C. Int – **159** – 2020.
Responder con este código.

Señores:
4L INGENIERIA SAS.
Atn: Jesús Alberto Martínez Padilla.
Representante Legal.
Calle 35 8 A – 04.
Montería – Córdoba.
jose.mor2012@hotmail.com.

REFERENCIA: CONTRATO 779 – 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

ASUNTO: SOLICITUD DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL CTO URÉ.

Respetados Señores:

Después de recibir el documento PAGA el 21 de diciembre de 2020 vía correo electrónico y realizada la revisión del mismo; este documento fue aprobado por esta Interventoría, sin embargo, está pendiente por complementar la documentación que acredite la legalidad Ambiental y Minera de la cantera a utilizar, así como entregar diligenciados los siguientes formatos:

- MSOAMB-MN-IN-1-FR-1: Acta de radicación ambiental y social de proyectos.
- MSOAMB-MN-IN-1-FR-2: Plan de inversión ambiental.
- MSOAMB-MN-IN-1-FR-6: Plan de inversión social.
- MSOAMB-MN-IN-1-FR-12: Acta de vecindad.

Quedamos atentos a cualquier aclaración.

Cordialmente,

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020.

JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA.
Rep Legal.

JORGE IBARRA HERNANDEZ
Especialista Ambiental.

Copia: Archivo.
Copia: Ing Diego José Abad Durango – Director Territorial Córdoba INVIAS.
Copia: Ing Rolando Arturo Espitia – Gestor Técnico proyecto.
Copia: Alcaldía Municipal de San José de Uré. – Oficina Planeación Municipal.
Elaboró: JIH 28.12.2020.

13.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Acta de costos de Agosto	31-Ago-20	$24.231.664,17	$24.231.664,17
2	Acta de costos de Septiembre	30-Sep-20	$35.182.158,41	$35.182.158,41
3	Acta de costos de Octubre	31-Oct-20	$35.471.520,00	$35.471.520,00
4	Acta de costos de DICIEMBRE	30-Nov-20	$28.995.219,00	$28.995.219,00
5	Acta de costos Diciembre	31-Dic-20	$59.339.112,00	$59.339.112,00
6	Acta de costos Enero	31-Ene-21	$65.346.045,00	
7	Acta de costos Febrero	28-Feb-21	$55.486.895,00	
8	Acta de costos Marzo	13-Mar-21	$122.023.911,42	
VALOR TOTAL				**$183.219.773,28**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE SAN JOSÉ DE URÉ

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1		$329.006.950,80	
2	Cuenta No. 2		$548.344.918,00	
3	Cuenta No. 3		$219.337.967,20	
VALOR TOTAL				**$0,00**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE PUERTO LIBERTADOR

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1		$328.376.229,00	
2	Cuenta No. 2		$547.293.715,00	
3	Cuenta No. 3		$218.917.486,00	
VALOR TOTAL				**$0,00**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE VALENCIA

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1		$313.166.739,60	
2	Cuenta No. 2		$521.944.566,00	
3	Cuenta No. 3		$208.777.826,40	
VALOR TOTAL				**$0,00**

13.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

La interventoría teniendo en cuenta el proceso de gestión de calidad que adelanta el INVIAS, elaboró y presentó los reportes de avance mensual de interventoría para los contratos de obra, mediante el uso y aplicación del Manual y Formatos de Interventoría del 2016, formatos los cuales hacen parte del presente **informe mensual de interventoría No. 5.**

Adicionalmente la interventoría presento reportes de avance semanal de Interventoría para los contratos de obra, en el Sistema de Información Gerencial (CIFRA).

14. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

14.1. EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: DICIEMBRE **CONTRATO No.** 779 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 **SECTOR:** SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c. modelo 2012 a 2017																															
Moto	Motocicleta 150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante																															
Topografia	Trabajo de topografia																															
Ensayos de laboratorio	Ensayos de laboratorio																															
Oficina	Oficina en puerto libertador																															
Oficina	Oficina en Valencia																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

14.2. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

MES DEL INFORME: DICIEMBRE **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 779 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 **SECTOR:** SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR DE OBRA																															
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE 1																															
ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO	RESIDENTE 2																															
JESUS DAVID PAEZ BUELVAS	AUXILIAR DE INTERVENTORIA																															
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESP. AMBIENTAL																															
FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO	ESP. ESTRUCTURAL																															
ENRIQUE MARIN PEÑA	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS																															
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESP. HIDRAULICO																															
FABIANA MONTIEL AROCA	SECRETARIA 1																															
MARIA JOSÉ GONZALEZ MUÑOZ	SECRETARIA 2																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

14.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31	DICIEMBRE	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 - 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020

SECTOR: SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0478	P 23580	Nación	Contrato Principal	$ 142.025.508,00
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0478	P 23682	Nación	Contrato Principal	$ 142.025.508,00
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0478	P 23855	Nación	Contrato Principal	$ 142.025.509,00
				TOTAL		**$ 426.076.525,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 183.219.673,28**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
		REGISTRO PRESUPUESTAL 9220 DEL 21 DE MAYO DE 2020					**$ 142.025.508,00**	**$ 142.025.508,00**	**$ 142.025.509,00**		**$ 426.076.525,00**		
		VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2020 (N/A)											
1	**Agosto / 2020.**	$ 20.362.743,00	$ 3.868.921,17	$ 24.231.664,17			$ 8.077.221,39	$ 8.077.221,39	$ 8.077.221,39	$ 24.231.664,17	$ 401.844.860,83		
2	**Septiembre / 2020.**	$ 29.564.839,00	$ 5.617.319,41	$ 35.182.158,41			$ 11.727.386,14	$ 11.727.386,14	$ 11.727.386,14	$ 35.182.158,41	$ 366.662.702,42		
3	**Octubre / 2020.**	$ 29.808.000,00	$ 5.663.520,00	$ 35.471.520,00			$ 11.823.840,00	$ 11.823.840,00	$ 11.823.840,00	$ 35.471.520,00	$ 331.191.182,42		
4	**Noviembre / 2020.**	$ 24.365.730,00	$ 4.629.488,70	$ 28.995.218,70			$ 9.665.072,90	$ 9.665.072,90	$ 9.665.072,90	$ 28.995.218,70	$ 302.195.963,72		
5	**Diciembre / 2020.**	$ 49.864.800,00	$ 9.474.312,00	$ 59.339.112,00			$ 19.779.704,00	$ 19.779.704,00	$ 19.779.704,00	$ 59.339.112,00	$ 242.856.851,72		
TOTALES		**$ 153.966.112,00**	**$ 29.253.561,28**	**$ 183.219.673,28**			**$ 80.952.283,57**	**$ 80.952.283,57**	**$ 80.952.284,57**	**$ 183.219.673,28**	**$ 242.856.851,72**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula No.: 22202 - 328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

14.4. CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MINFRA-MN-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	DICIEMBRE	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 - 2020. **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2020.

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

SECTOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	79.912.944	INGENIERO DIRECTOR	$ 5.350.000,00	$ 2.675.000,00	$ 186.180,00	$ 107.000,00	$ 428.000,00	$ 107.000,00		
2	CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	79.688.911	RESIDENTE 1	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.120,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00		
3	ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO	10.766.037	RESIDENTE 2	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.120,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00		
4	JESUS DAVID PAEZ BUELVAS	1.233.339.099	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 163.560,00	$ 94.000,00	$ 376.000,00	$ 94.000,00		
5	FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO	15.459.141	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	$ 4.500.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
6	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10.766.686	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 4.500.000,00	$ 2.565.000,00	$ 178.524,00	$ 102.600,00	$ 410.400,00	$ 102.600,00		
7	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10.766.686	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 4.500.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
8	ENRIQUE MARIN PEÑA	79.370.211	ESPECIALISTA GEOTECNIA Y PAVIME	$ 4.500.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
9	FABIANA MONTIEL AROCA	1.067.958.262	SECRETARIA 1	$ 950.000,00	$ 950.000,00	$ 66.120,00	$ 38.000,00	$ 152.000,00	$ 38.000,00		
10	MARIA JOSE GONZALEZ MUÑOZ	1.017.258.513	SECRETARIA 2	$ 950.000,00	$ 950.000,00	$ 66.120,00	$ 38.000,00	$ 152.000,00	$ 38.000,00		
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 34.500.000,00**	**$ 16.390.000,00**	**$ 1.140.744,00**	**$ 655.600,00**	**$2.622.400,00**	**$ 655.600,00**		
						$			**5.074.344,00**		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND.

Firma

Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 22202 - 328524 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

14.5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	12	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORSIO INTERVENTORIAS 2020

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 4/08/2020

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/03/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 426.076.525,00

VALOR ACUMULADO: $ 426.076.525,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 42.607.652,50	4	8	2020	7/12/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 85.215.305,00	4	8	2020	7	6	2024
Calidad del servicio	30%	$ 127.822.957,50	4	8	2020	4	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **41-44-101230573**

Certificado de modificación o anexo No.: **5**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	12	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

14.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

FECHA DE INICIO: 4/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2020 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/03/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: (Indicar número y año)

CONTRATISTA:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. N/A FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO **X** APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: **N/**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LAURA ISABELLA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

14.7. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- ✓ **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

(NO APLICA)

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SAN JOSÉ DE URÉ

- Es necesario cumplir con la programación estipulada para dar cumplimiento al tiempo de ejecución de la obra en el plazo inicialmente contratado.
- Es necesario abrir más frentes de obra para poder cumplir con la programación, ya que se están presentando un incremento en el atraso del proyecto.
- Hacer un seguimiento completo al protocolo de bioseguridad del contratista y cumplimiento del PAPSO.
- Velar por el cumplimiento de todos los programas que contiene el PAGA, ya que este se encuentra aprobado por la interventoría.
- Ejercer control a las actividades físicas de obra, realizando ensayos de laboratorio para verificar densidades del terreno y la capacidad de resistencia del concreto. Así mismo, verificar la cuantía del acero suministrado en la fundida del hormigón.
- VALOR PROGRAMADO $311.211.596.05 (28,38%), VALOR EJECUTADO $166.705.689 (15,20%)

PUERTO LIBERTADOR

- Es necesario cumplir con la programación estipulada para dar cumplimiento al tiempo de ejecución de la obra en el plazo inicialmente contratado.
- Es necesario abrir más frentes de obra para poder cumplir con la programación, ya que se están presentando un incremento en el atraso del proyecto.
- Hacer un seguimiento completo al protocolo de bioseguridad del contratista y cumplimiento del PAPSO
- Velar por el cumplimiento de todos los programas que contiene el PAGA, ya que este se encuentra aprobado por la interventoría.
- Ejercer control a las actividades físicas de obra, realizando ensayos de laboratorio para verificar densidades del terreno y la capacidad de resistencia del concreto. Así mismo, verificar la cuantía del acero suministrado en la fundida del hormigón.
- VALOR PROGRAMADO $490.558.448.47 (44,82%), VALOR EJECUTADO $131.497.862 (12,01%)

VALENCIA

- Se están adelantando actividades de excavación , Subbase , fundida de concreto placa reforzada, cunetas, concreto ciclópeo y figuración de acero

- Es necesario cumplir con la programación estipulada para dar cumplimiento al tiempo de ejecución de la obra en el plazo inicialmente contratado aumentando los frentes de trabajo.
- En la ejecución de las obras el contratista esta realizado cumplimiento del protocolo de bioseguridad y del PAPSO.
- VALOR PROGRAMADO $582.559.819,97 (55,81%), VALOR EJECUTADO $454.011.668,80 (43,49%)

16. ANEXOS

16.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA, ALCALDÍA E INTERVENTOR

SAN JOSÉ DE URÉ

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**	**RESPUESTA**
11/12/2020	Solicitud medidas inmediatas por atraso	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDIA DE SAN JOSÉ DE URÉ 4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	
11/12/2020	Reprogramación de obra	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
14/12/2020	Seguimiento al documento PAGA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	
14/12/2020	Comité de obra	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	
17/12/2020	Aprobación reprogramación de obra No. 3	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	
21/12/2020	Respuesta oficio C. Int 111 - 2020	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
21/12/2020	Respuesta oficio C. Int 113 - 2020	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
23/12/2020	Acta de aprobación parcial de estudios y diseños	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	
28/12/2020	Solicitud formatos ambientales	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	4L INGENIERÍA SAS CONTRATISTA	

PUERTO LIBERTADOR

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**	**RESPUESTA**
02/12/2020	Reunión técnica para el 3 de diciembre	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
02/12/2020	Aclaraciones a las órdenes de operación	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
03/12/2020	Respuesta oficio revisión de documentos de anticipo	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
03/12/2020	Hoja de vida cambio de residente	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
04/12/2020	Revisión hoja de vida residente	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
07/12/2020	Ordenes de operación	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
10/12/2020	Solicitud de documentación	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
11/12/2020	Solicitud medidas inmediatas por atraso	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDIA DE PUERTO LIBERTADOR CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
14/12/2020	Comité de obra	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	
23/12/2020	Acta de aprobación parcial de estudios y diseños	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES CONTRATISTA	

VALENCIA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA				
FECHA	**ASUNTO**	**REMITE**	**DESTINO**	**RESPUESTA**
01/12/2020	Solicitud No. 2 de listado de personal	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	
01/12/2020	Caracterización de material de subbase	TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
01/12/2020	Relación de personal y maquinaria para ingreso a obra	TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
02/12/2020	Solicitud de balance de obra	TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
02/12/2020	Invitación a socialización del contrato	ALCALDIA DE VALENCIA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	
11/12/2020	Solicitud medidas inmediatas por atraso	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	ALCALDIA DE VALENCIA TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	
14/12/2020	Comité de obra	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	
24/12/2020	Acta de aprobación parcial a los estudios y diseños	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020	TVP MUNICIPIOS CONTRATISTA	

16.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS OBRAS


SAN JOSÉ DE URÉ

Tramo 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal







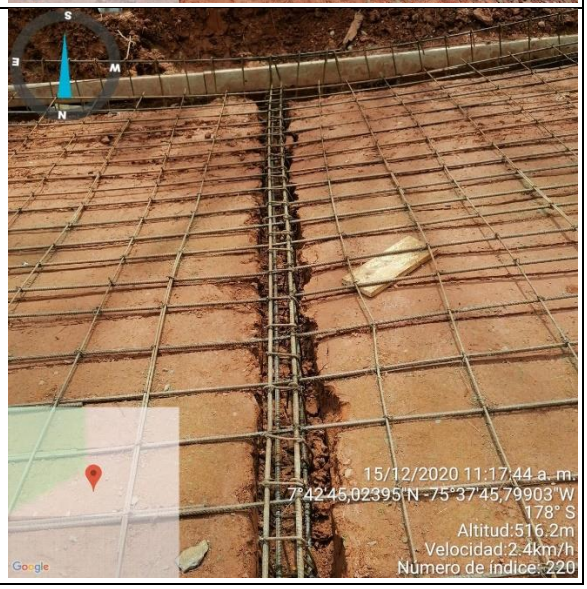


15/12/2020 11:20:16 a. m.
7°42'43,92377"N -75°37'46,8855"W
56° NE
Altitud:520.7m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 222


15/12/2020 11:17:30 a. m.
254° W
Altitud:448.7m
Velocidad:2.3km/h
Número de índice: 219


15/12/2020 11:18:17 a. m.
7°42'44,95979"N -75°37'45,9991"W
261° W
Altitud:516.6m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 221


19 dic. 2020 11:58:51 a. m.
7°42'45.258"N -75°37'46.212"W
74° E
Altitud:510.3m
Velocidad:0.1km/h
Número de índice: 24


23/12/2020 8:31:35 a. m.
7°42'44,91929"N -75°37'44,735"W
100° E
Altitud:506.0m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 268


23/12/2020 7:10:37 a. m.
7°42'45,43642"N -75°37'43,87148"W
271° W
Altitud:509.8m
Velocidad:1.6km/h
Número de índice: 265

PUERTO LIBERTADOR

Tramo 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa – Gilgar















4/12/2020 10:36:23 a. m.
7°55'23,10915"N -75°45'57,0023"W
254° W
Altitud:125.7m
Velocidad:1.7km/h
Número de índice: 159


4/12/2020 10:36:09 a. m.
7°55'23,19814"N -75°45'57,05116"W
200° S
Altitud:124.9m
Velocidad:1.6km/h
Número de índice: 157


4/12/2020 11:16:26 a. m.
7°54'10,7259"N -75°48'40,81566"W
27° NE
Altitud:116.5m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 169


4/12/2020 11:12:42 a. m.
7°54'13,16186"N -75°48'38,41333"W
314° NW
Altitud:123.6m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 163


SGR
pdet
INVIAS
4/12/2020 10:38:04 a. m.
7°55'21,36082"N -75°45'56,70448"W
89° E
Altitud:133.7m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 162

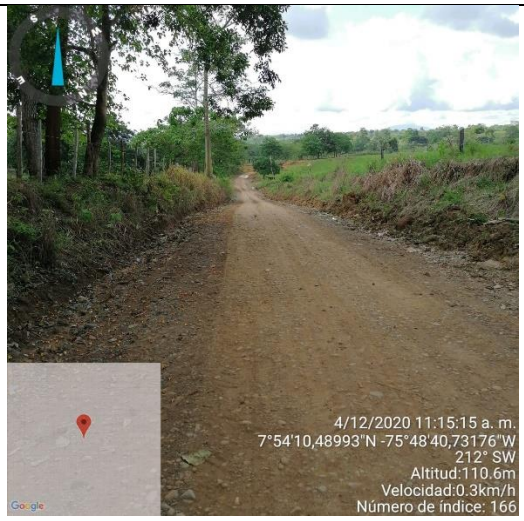
4/12/2020 11:15:15 a. m.
7°54'10,48993"N -75°48'40,73176"W
212° SW
Altitud:110.6m
Velocidad:0.3km/h
Número de índice: 166


4/12/2020 12:01:37 p. m.
7°55'48,31585"N -75°45'42,55881"W
144° SE
Altitud:190.1m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 182


4/12/2020 11:44:33 a. m.
7°55'8,63468"N -75°48'23,33178"W
72° E
Altitud:89.6m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 180


22/12/2020 9:04:45 a. m.
7°54'13,13041"N -75°48'38,51359"W
272° W
Altitud:121.8m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 262


22/12/2020 8:32:18 a. m.
7°54'9,9612"N -75°48'40,61445"W
212° SW
Altitud:129.5m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 257


22/12/2020 8:42:29 a. m.
7°54'9,23509"N -75°48'41,02044"W
233° SW
Altitud:122.8m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 260


22/12/2020 11:04:57 a. m.
7°54'6,90028"N -75°48'41,65778"W
28° NE
Altitud:120.4m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 263


La hora de la red no está sincronizada
Local: 29/12/2020, 11:38:13 a. m. COT
N 7° 54' 6.952", W 75° 48' 41.675"


La hora de la red no está sincronizada
Local: 29/12/2020, 11:38:04 a. m. COT
N 7° 54' 6.952", W 75° 48' 41.675"


SGR
VIAS

VALENCIA

Tramo 1 – Cruce de la vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Blanca – Guadual Central






















14 dic. 2020 7:56:00 a. m.


14 dic. 2020 7:56:19 a. m.


15 dic. 2020 8:59:04 a. m.


15 dic. 2020 10:05:51 a. m.


17 dic. 2020 9:48:08 a. m.


17 dic. 2020 9:51:44 a. m.


18/12/2020, 7:53:02 a. m.
206° SE
Altitud:83.9meter
Velocidad:1.6km/h


18/12/2020, 8:15:01 a.
45° NE
Altitud:91.0meter








23/12/2020, 7:38:43 a. m.
52° NE
Altitud:115.8meter
Velocidad:1.8km/h




29/12/2020, 6:55:01 a.
217° S
Altitud:98.5me
Velocidad:2.8km
