KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

340

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				35	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-11	Y	23/12/2019	39543667	$3.133.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	892115006-5	103.600	0		0		0	12	900	0	104.500	1
EPS002	Salud Total EPS	900130907-4	17.500	0		0		0	12	200	0	17.700	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	103.600	0		0		0	12	900	0	104.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	300.600	0		0		0	12	2.600	0	303.200	5
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	129.800	0		0		0	12	1.200	0	131.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	10.500	0		0		0	12	100	0	10.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	239.000	0		0		0	12	2.100	0	241.100	9
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	3.500	0		0		0	12	100	0	3.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	103.600	0		0		0	12	900	0	104.500	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	10.500	0		0		0	12	100	0	10.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	309.800	0	0	0	0	12	2.700	0	312.500	10
230301	Porvenir	800224808-8	723.500	0	0	0	0	12	6.300	0	729.800	13
231001	Colfondos	800227940-6	26.600	0	0	0	0	12	300	0	26.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	247.400	0	0	0	0	12	2.200	0	249.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	776.100				776.100	12	6.800	782.900			7.761	782.900	35

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

PAGADA
39543667

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				35	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-11	Y	23/12/2019	39543667	$3.133.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.022.200	1.031.300
Pensión	4	1.307.300	1.318.800
Riesgos Laborales	1	776.100	782.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	3.105.600	3.133.000

PAGADA

27 3

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				36	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-11	Y	23/12/2019	39543667	$3.133.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dependiente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006502390	OLAYA CAICEDO HAROL ANDRES	59	0			N	X	X															230301	27,604	4,500	0	0	0	0	ESSC62	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1006502433	RONDON TAPIERO JEFFERSON	59	0			N	X	X															230301	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS037	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1007238427	OSORIO ARCILA VATEO	59	0			N	X	X															230301	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS002	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1014270390	MEDINA BAUTISTA JORGE ESTEBAN	59	0			N	X	X															230201	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS017	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1019060429	VIVAS LEON ELIZABETH	59	0			N																	230301	828,116	132,500	0	0	0	0	EPSC34	828,116	103,600	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1020415312	RUDA HENAO JHONATHAN ALEXIS	59	0			N		X															230301	55,208	8,900	0	0	0	0	EPS037	55,208	7,000	14-11	55,208	5	3,900		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1020488189	PINEDA CIRO DUVAN	59	0			N	X	X															230201	55,208	8,900	0	0	0	0	EPS002	55,208	7,000	14-11	55,208	5	3,900		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1022684713	PICO CABALLERO DENNIS ALEJANDRO	59	0			N		X															231001	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS037	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1024566559	GUTIERREZ HERNANDEZ JOHN JAIRO	59	0			N	X	X															230201	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS017	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1024607487	FLORIAN SENCIAL felix ALONSO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	414,058	5	28,900		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1063798159	CORTES PAEZ LUIS ALEJANDRO	59	0			N																	230301	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS008	828,116	103,600	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1067956753	CORTES MIRANDA JUAN STIVEN	59	0			N	X																230301	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS037	828,116	103,600	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1070007227	TUNJANO RODRIGUEZ EDWIN YESITH	59	0			N																	230201	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS037	828,116	103,600	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1070014180	SANCHEZ TAPIERO JONATHAN	59	0			N	X	X															230301	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS017	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1083061903	RIOS CALVETE KRISTOPHER RAINIERE	59	0			N	X	X															230201	55,208	8,900	0	0	0	0	EPS037	55,208	7,000	14-11	55,208	5	3,900		0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	1097332898	BARRERA BELLO MARGIE CLAUDETH	59	0			N	X																25-14	662,493	106,000	0	0	0	0	EPS010	662,493	82,900	14-11	662,493	5	46,200		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1117507921	ORDOÑEZ PIMENTEL JHON ANDERSON	59	0			N	X	X															25-14	55,208	8,900	0	0	0	0	ESSC62	55,208	7,000	14-11	55,208	5	3,900		0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	1124044505	SOLANO NESTOR LUIS	59	0			N																	230301	900,000	144,000	0	0	0	0	EPS016	900,000	112,500	14-11	900,000	5	62,700		0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	1124450926	EPIEYU IPUANA ATILCO SEGUNDO	59	0			N		X															230301	30,000	4,800	0	0	0	0	EPS037	30,000	3,800	14-11	30,000	5	2,100		0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	1124507125	GONZALEZ IGUARAN EDUAR	59	0			N		X															230201	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS037	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	1124513392	GONZALEZ SAPUANA LUIS	59	0			N																	230301	828,116	132,500	0	0	0	0	CCFC23	828,116	103,600	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	1152439341	OSORIO SANCHEZ EDWIN ALBERTO	59	0			N	X	X															230201	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS037	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC	1214731177	ARANGO ACOSTA Juan DAVID	59	0			N	X																230201	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS010	828,116	103,600	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	17668656	GARCIA RODRIGUEZ JOSE GILBERTO	59	0			N	X	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC	3218160	URREA RIVERA ANDRES MAURICIO	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC	3474221	HURTADO USUGA FABIO NELSON	59	0			N																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	63130745	SANTAMARIA CIFUENTES GINA PAOLA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	717,731	5	50,000		0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	71367525	BAENA CARDONA MAURICIO	59	0			N	X	X															230201	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS010	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC	71526052	SANCHEZ OCAMPO JHON JAIRO	59	0			N	X	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
30	CC	71680905	GOMEZ GIRALDO LUIS ALFONSO	59	0			N	X																25-14	828,116	132,500	0	0	0	0	EPS010	828,116	103,600	14-11	828,116	5	57,700		0	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	79728548	VELASQUEZ BALLEN OMAR ORLANDO	59	0			N	X	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	55,208	5	3,900		0	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	79739619	BARRIENTOS BETANCUR ROMAN ENRIQUE	59	0			N	X	X															230301	55,208	8,900	0	0	0	0	EPS002	55,208	7,000	14-11	55,208	5	3,900		0	0	0	0	0	0	0	0
33	CC	79803563	CABALLERO CORREDOR ADAN	59	0			N	X	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
34	CC	79920766	MESA CALCALI EUCUDES	59	0			N		X															230301	55,208	8,900	0	0	0	0	EPS010	55,208	7,000	14-11	55,208	5	3,900		0	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	79966558	VELASQUEZ BALLEN CESAR RODRIGO	59	0			N	X	X															230701	27,604	4,500	0	0	0	0	EPS044	27,604	3,500	14-11	27,604	5	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0
36	CC	88695695	HENAO HOYOS OMAR ARLEY	59	0			N		X															231001	138,020	22,100	0	0	0	0	EPS016	138,020	17,300	14-11	138,020	5	9,700		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CL 45A 67 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2020-01	2019-12	E	16/01/2020	39543805	TOTAL A PAGAR	
					$505.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.200	0		0		0	2	100	0	36.300	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	2	100	0	33.300	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	33.200	0		0		0	2	100	0	33.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	277.000	0	0	0	0	2	400	0	277.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.200				22.200	2	100	22.300			222	22.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	36.200	2	100	36.300	1
CCF21	Cafam	860013570-3	66.400	2	100	66.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	102.600	102.900
Pensión	1	277.000	277.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.300
CCF	2	102.600	102.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	504.400	505.400

PAGADA
39543805

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2020-01	2019-12	E	16/01/2020	39543805	TOTAL A PAGAR	
					$505.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1037638294	BELTRAN VALENCIA BRENDA	1	0			S																	230301	902.968	144.500	0	0	0	0	EPS002	902.968	36.200	14-11	902.968	1	4.600	CCF04	902.968	36.200	0	0	0	0	0
2	CC	79968191	HENAO BOTERO ADRIAN ALBERTO	1	1			S																			0	0	0	0	0	MIN002	828.116	33.200	14-11	828.116	2	8.700	CCF21	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	88274684	RODRIGUEZ BUENHAVER LEONARDO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-11	828.116	2	8.700	CCF21	828.116	33.200	0	0	0	0	0

PAGADA

345

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTROL DE INGRESOS A OBRA

FI - IN - F 21
VERSIÓN 02
17-Jul-12

CONTRATO No. / NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMOVILIDAD 2019
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	CONTRATISTA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	FECHA DE AFILIACIÓN Y ADMINISTRADORA			PERIODO COTIZADO	CLASE DE RIESGO	FECHA DE ENTREGA DE DOTACION	FECHA DE EXAMEN DE INGRESO	FECHA DE INDUCCION NOTIFICACION DE RIESGOS	OBSERVACIÓN
							SALUD	PENSIÓN	ARP						
1	Luis Alejandro Cortés Páez	1.053.798.159	DIRECTOR DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	23/10/2019		22 10 2019 Compensar	22 10 2019 Porvenir	22 10 2019 SURA	Diciembre	5	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	
2	Andrés Mauricio Urrea Rivera	3.215.160	RESIDENTE DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	28/09/2019		27 9 2019 Medimas	27 9 2019 colpensiones	27 9 2019	Diciembre	5	28/09/2019	28/09/2019	28/09/2019	
3	Margie Berrera Bello	1.097.332.698	ARQ.AUXILIAR DE DIRECCION	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	11/09/2019		8 11 2019 Sura	8 11 2019 colpensiones	8 11 2019 SURA	Diciembre	5	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	
4	Juan Alejandro Ruiz Rincón	1.052.383.653	SST - MA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	16/12/2019		15 12 2019 Compensar	15 12 2019 Porvenir	15 12 2019 SURA	Diciembre	5	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	
5	Edwin Yesith Turjano	1.070.007.227	ELECTRICO	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	8/03/2019		2 8 2019 NUEVA EPS	2 8 2019 Proteccion	2 8 2019 PORVENIR	Diciembre	5	8/03/2019	8/03/2019	8/03/2019	
6	Néstor Solano	1.121.044.805	OFICIAL DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	8/03/2019		2 8 2019 COOMEVA	2 8 2019 Porvenir	2 8 2019 SURA	Diciembre	5	8/03/2019	8/03/2019	8/03/2019	
7	Azico Epiayu	1.124.490.926	OFICIAL DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	8/10/2019		9 8 2019 NUEVA EPS	9 8 2019 Porvenir	9 8 2019 SURA	Diciembre	5	8/10/2019	8/10/2019	8/10/2019	
8	Jennifer Zoro	1.133.994.602	OFICIAL DE OBRA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	16/12/2019		17 12 2019 Sanitas	17 12 2019 Proteccion	17 12 2019 SURA	Diciembre	5	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	
9	Yoendris Arrieta Morales	1.015.473.871	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	12/06/2019		5 12 AÑO NUEVA EPS	5 12 AÑO Porvenir	5 12 AÑO ADMINISTRADORA	Diciembre	5	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	
10	Felix Alonso Florian Sencial	1.024.607.462	AYUDANTE	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	12/06/2019		5 12 2019 Sura	5 17 2019 Porvenir	5 12 2019 SURA	Diciembre	5	12/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	

NOTA 1	AL PRESENTE FORMATO SE ANEXA AFILIACIONES DE SALUD - PENSIÓN Y ARL EN EL ORDEN LA NUMERACIÓN COLUMNA B (MEDIO MAGNETICO) sin la información anexo no se permiten los ingresos.
NOTA 2	LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEBE REPOSAR EN UNA AZ EN LA OFICINA DE CALLE 13
NOTA 2	REMITIR 24 HORAS PREVIO AL INGRESO DEL PERSONAL

amablemente se le informa a la entidad que el tiempo de atencion de este requerimiento es el siguentre

RESPONSABLE		FECHA SOLICITUD
NOMBRE	Gina Santamaría	
CARGO	COORDINADOR SST - OBRA	
EL SST VERIFICO LA VERACIDAD LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION PARA SOLICITAR INGRESO A INTERVENTORIA		

NOTA: Solicitar el contrato de los subcontratistas

346

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

PERSONAL PROVENIENTE DE POBLACIÓN VULNERABLE

Bogotá, 28 de Julio de 2019

SDM-OF-019

KING CO

Señores: CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019

Atn: Señora
ANA MIREYA ARAGÓN
Interventoría
Ciudad

Referencia: Realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaria distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo - 1653 de 2019

Asunto: PERSONAL PROVENIENTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

Cordial saludo,

En atención a su oficio **RL -1653-2019 014** de fecha 19 de Julio "COMUNICADO CORRECTIVO - OBSERVACIONES FRENTE A LA EJECUCIÓN CONTRATO NO. 2019-1601." Damos respuesta de la siguiente manera:

A su solicitud **6. "PERSONAL PROVENIENTE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Para dar cumplimiento a la Directiva 001 de 2011, el contratista deberá vincular, como mínimo, una persona del Personal total requerido para el desarrollo del contrato, proveniente de la población vulnerable, y su selección e incorporación debe realizarse de acuerdo con los parámetros establecidos en dicha directiva"**

Informamos que el **Sr. ADRIÁN ALBERTO HENAO BOTERO**, identificado con **C.C 79.966.191**, está vinculado a nuestra empresa desde 11-05-2019, en calidad de mensajero. Estará vinculado a este contrato bajo el cargo de PERSONAL DE COMPRAS, anexamos a este oficio hoja de vida, y certificados de discapacidad, actualmente cuenta con afiliación a ARL por parte de la compañía, es pensionado de las FF.MM debido a que fue herido en combate y su servicio de salud esta cubierto por SANIDAD MILITAR de por vida debido a su condición.

Muchas gracias

ANDRÉS MAURICIO URREA
DIRECTOR DE OBRA

Scanned by CamScanner

130

ARL | sura

Medellín, 10 de Mayo de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de KINGCO SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000003 - ADMINISTRATIVOS, Clase de riesgo 2, Porcentaje de cotización 1.044%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C79966191	HENAO BOTERO ADRIAN ALBERTO	11/05/2019		25516517	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C8827468419130450 30

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/05/2019 12:30:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 201.233.204.28, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

349

Scanned by CamScanner

minerva
10-03

SIEMPRE AL DIA!

Hoja de vida LA ORIGINAL Calidad 100

www.formasminerva.com

HOJA DE VIDA
PARA SOLICITUD DE EMPLEO

Diligencie esta Hoja de Vida a máquina o con letra imprenta legible. Cualquier tachón o enmendadura invalida el formato.

Cargo al que aspira: Empleo o cargo al que aspira interesado

I. INFORMACION GENERAL

Apellidos completos: HENAO BOTERO
Nombres completos: ADRIAN ALBERTO
Lugar y fecha de nacimiento: ARANZAZU CALDAS 09-AGOS 1973
Dirección de residencia y Barrio: AICALA
Ciudad: BOGOTA
Teléfono: 3194486183
No Celular: 79966191 BTA
Correo electrónico:
Nacionalidad: COLOMBIANO
Profesión u oficio principal: COMERCIANTE
Estado civil: UNION LIBRE

FOTOGRAFIA RECIENTE Tamaño Documento

DOCUMENTACION

(*) Respuesta opcional Art. 111, decreto 2150 de 1995

Cédula de ciudadanía: ✓ No. 79966191
Expedida en: BOGOTA
Tarjeta profesional No:
¿Tiene vehículo? SI: No: ✓
Libreta militar No: Distrito No: Primera vez: ✓
Libreta de conductor No: Categoría: Segunda vez:

II. INFORMACION PERSONAL

¿Está laborando actualmente? SI: No: ✓ ¿En qué empresa? Empleador: Tiempo de contrato:
¿Desde cuándo labora en esta empresa? Sabe cuánto tiempo de cesantías tiene acumulado? Fecha: ¿Sabe cuánto debe pagarle la empresa por vacaciones? Nombre de esta empresa? Dependencia:
¿Tiene familiares trabajando en esta empresa? Nombre: Parentesco:
¿Cómo tuvo conocimiento de la vacante para la que se presenta? Anuncio: Amigo: ✓ Por medio de agencia: Otro ¿Cuál?
¿En qué ciudad desea trabajar? BOGOTA ¿En qué ciudades o regiones del país está dispuesto a trabajar? BOGOTA
¿Cómo se enteró de nuestra vacante? Nombre del entrevistador: ELENA Teléfono: 3133230816
¿Tiene usted hijos? Cuántos? Edades: ¿Trabaja actualmente? SI: ✓ No: Describa brevemente su labor actual: PENCION ¿Cuánto gana mensualmente? $ 1.000000
¿Tiene ingresos adicionales? SI: No: ✓ Describa brevemente su labor mensual: PENCION ¿Cuánto suman sus ingresos mensuales aproximados?
¿Por qué cree usted que debemos contratarlo? ¿Cuánto es su aspiración salarial?
¿Cuál es su pasatiempo favorito? DEPORTE ¿Practica algún deporte? SI: ✓ No: ¿Cuál(es)? CICLISMO
¿Alguna vez ha recibido distinciones o reconocimientos por su desempeño en actividades deportivas, culturales, sociales, etc.? SI: No: ✓ ¿Cuál(es)?
¿Pertenece a algún club de recreación, deportivo, cultural, etc.? SI: No: ✓ ¿Cuál(es)?

OBJETIVO Mencione brevemente que expectativas tiene a nivel laboral, educativo y personal e indique como planea hacerlas realidad.

HACER CRECER LA EMPRESA DONDE TRABAJE

minerva by Lexis. Prohibida su reproducción. Se denunciarán penalmente los infractores.

09973469

350

Scanned by CamScanner

III. INFORMACION FAMILIAR

Nombre esposa(o) o compañera(o): SORAYA MACIAS | Profesión, ocupación u oficio: COMERCIANTE | Empresa donde labora:

Cargo actual: | Dirección: | Teléfono: 3175923232 | Ciudad: BOG

N° de personas que dependen económicamente del solicitante: 2 | Parentesco: PADRES | Edades: 71 - 72

Nombre(s) padre(s): ARTURO HENAO | Profesión, ocupación u oficio: MUSICO | Teléfono: 3016053981

OBELIA BOTERO | AMA DE CASA | 3138301432

Nombre(s) hermano(s): | Profesión, ocupación u oficio: | Teléfono:

IV. EDUCACION Y APTITUDES

ESTUDIOS	AÑOS APROBADOS	AÑO GRADO	TITULO OBTENIDO	NOMBRE DE LA INSTITUCION	CIUDAD
Primaria	✓				
Bachillerato				INSTITUTO UNIVERSITARIO CAMPOS MARZALES	
Educación Superior					
Postgrados					

Otros cursos, diplomados seminarios: | Duración: | Fecha de ingreso: | Intensidad:

¿Curso actualmente estudiando? | ¿Qué título recibirá al final? | Fecha aproximada de grado: | Año aproximado que cursa:

Nombre de la universidad: | Horario: Diurno / Nocturno | Fines de semana / Ocasional

OTROS CONOCIMIENTOS: Indique el grado de dominio: R - Regular, B - Bien, MB - Muy Bien

Sistemas		R	B	MB					R	B	MB
¿Programas que maneja?		R	B	MB					R	B	MB
Idiomas		Lee			Habla			Escribe			
		R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB	
¿Otro idioma?		R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB	

Notas: en caso de ser contratado(a) favor presentar título universitario.

V. TRAYECTORIA POR EMPRESAS

MARQUE CON UNA EQUIS (X) EN QUE CLASE DE EMPRESA(S) HA TRABAJADO Y EN QUE AREA(S) DE ESTAS EMPRESA(S) HA DESEMPEÑADO

EMPRESAS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS (*)				AREA DE LA EMPRESA	
AGRICULTURA		FINANCIERO		Administrativa	Financiera
GANADERÍA / AVICULTURA		INMOBILIARIO		Ventas	Producción
MINERÍA		INFORMATICO		Servicios	Mercadeo
HIDROCARBUROS		SALUD		Gerencia	Otra:
INDUSTRIA		EDUCACION		Contabilidad	
Alimentos y Bebidas	OTROS:	SEGUROS		Compras	
Tabaco		TURISMO/RECREACION		Auditoría	
Textiles y Confecciones		OTROS SERVICIOS		Asesoría	
Cuero y Calzado	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA			Producción	
Papel y Cartón	CONSTRUCCION			Logística	
Editorial y Artes Gráficas	COMERCIO			Ventas	
Química y Farmacéutico	HOTELES Y RESTAURANTES	OTROS SECTORES		Recursos	
Caucho y Plástico	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			Mantenimiento	
Vidrio, Cerámica y Cemento	COMUNICACIONES			Publicidad	

(*) Referirse a la Clasificación Industrial Internacional Estandarizada para Colombia CIIU

minerva®

152

351

Scanned by CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

ACTA DE JUNTA MEDICA LABORAL
REGISTRADA EN LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

STAFE DE BOGOTA D.C.26-JUN-96 No. 2548
Lugar y fecha

INTERVIENEN: Doctor TE.MED.WILLIAM QUIROGA/MATAMOROS
Oficial Sanidad

Doctor TE.MED.ARMANDO PORTILLA CARRILLO
Oficial Sanidad

Doctor GUILLERMO ARIAS RESTREPO
Representante Juntas Médicas Sanidad

ASUNTO: Que trata del Acta de Junta Médica Laboral Militar o de Policía practicada en LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO, (lugar) SANTAFE DE BOGOTA D.C. al grado SL. apellidos y nombres completos HENAO BOTERO ADRIAN ALBERTO, código 2529620, cédula de ciudadanía No. 79.966.191 de ARANZAZU (CALD)., con el fin de clasificar su capacidad laboral de acuerdo con el concepto emitido por los especialistas de los siguientes servicios: PROCTOLOGIA

Clasificar las lesiones y secuelas, valorar la capacidad laboral y su imputabilidad al mismo y fijar los correspondientes índices para indemnizar si es del caso de conformidad con el artículo 21 del Decreto 94 de 11-ENE-89

En STAFE DE BOGOTA a los 26 días del mes de JUNIO de 1996 se reunieron
lugar

los oficiales de Sanidad anteriormente anotados, para efectuar la Junta Médica Laboral al (grado) SL. apellidos y nombres completos HENAO BOTERO ADRIAN ALBERTO

Después de estudiar en todas sus partes los documentos de Sanidad relacionados con el caso mencionado, acordaron el texto y conclusiones del Acta de Junta Medica que se transcribe a continuación:

I. IDENTIFICACION:

A. Paciente natural de ARANZAZU (CALDAS)., fecha de nacimiento 9-AGOS-73 (edad) 22 , cédula de ciudadanía No. 79.966.191 de ARANZAZU (C)., historia clínica No. SIN.

DIRECCION: CALLE 90 A BIS No 33-66 ESTE SANTAFE DE BOGOTA D.C.

II. ANTECEDENTES:

A. Datos del resumen de historia clínica:

Del estudio de la historia clínica se concluye que ha sido visto en el servicio de PROCTOLOGIA NO SE LE HA PRACTICADO JUNTA MEDICA NI TRIBUNAL MEDICO ANTERIOR.

Al paciente le fue efectuado examen sicofísico general para la presente diligencia, la cual se verifica de acuerdo con el concepto y la intervención personal del especialista.

352

Scanned by CamScanner

SL.HENAO BOTERO ADRIAN ALB TO JM NO 2548 BIRIC 26-JUN-96

I. CONCLUSIONES

A. Diagnostico Positivo de las lesiones o afecciones

1- HERIDA POR ARMA DE FUEGO CON FRACTURA DE ISQUION DERECHO, TRAUMA DE URETRA PROSTATICA Y ESFINTER ANAL MANEJADO QUIRURGICAMENTE QUE DEJA COMO SECUELA:a. COLOSTOMIA Y CISTOSTOMIA PERMANENTE. FISTULA URETRORECTAL. CICATRIZ QUELOIDE ABDOMINAL.

2- DISMINUCION DE LA AGUDEZA VISUAL OD 20/70 - 20/30

OI 20/80 - 20/50.

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad sicofisica para el servicio

LE DETERMINA INCAPACIDAD ABSOLUTA Y PERMANENTE.

NO APTO.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

LE PRODUCE UNA DISMINUCION DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL CIEN POR CIENTO (100%).

D. Imputabilidad del Servicio

LESION (1) OCURRIDA EN EL SERVICIO Y EN ACCION DIRECTA DEL ENEMIGO DE ACUERDO AL INFORME RELACIONADO ANTERIORMENTE.

LESION (2) DIAGNOSTICADA EN EL SERVICIO PERO NO POR CAUSA NI RAZON DEL MISMO.

E. Fijación de los correspondientes indices

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 21 DEL DECRETO 94 DEL 11-ENE-89 LE CORRESPONDE POR:

1-a. NUMERAL 6-074 LITERAL (c) INDICE VEITIUNO (21) (POR ASEMILACION).

2- NUMERAL 6-053 INDICE TRES (3).

II. DECISIONES

En presencia de los participantes, se establece que la decisión ha sido tomada por unanimidad y corresponde a la veracidad de los hechos.

III. RECURSOS

Contra la presente Acta de Junta Médica Laboral procede el recurso de solicitar convocatoria de Tribunal Médico Laboral de revisión y de Policía del cual podrá hacerse uso dentro de los (4) meses siguientes a la notificación según lo establecido en el Decreto 94 de Enero de 1.989.


TE.MED.WILLIAM QUIROGA MATAMOROS
Doctor
Oficial Sanidad

TE.MED.ARLANDO PORTELLA CARRILLO
Doctor
Oficial Sanidad

GUILLERMO ARIAS RESTREPO.
Doctor
Representante Juntas Médicas.

353

Scanned by CamScanner





Scanned by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CARNÉ DE SERVICIOS DE SALUD

A12671277

ESTE CARNÉ ES PERSONAL E INSTRANSFERIBLE

Documento válido para uso de Servicios de Salud F.F.M.M. Según lo establece la ley 352 de 1997, el decreto 1795 de 2000 y demás normas concordantes.
Debe presentar Documento Identidad y se debe verificar de que el afiliado este activo en el sistema.
En caso de pérdida por favor informar a la respectiva dirección de Sanidad Militar en término de 48 horas.
Si este carné es encontrado por favor informar al PBX: 3238555 ext: 1301, 1314, 1315 Bogotá.
Correo Electrónico afiliaciones@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Scanned by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2020-01	2019-12	E	16/01/2020	39543805	TOTAL A PAGAR	
					$505.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	36.200	0		0		0	2	100	0	36.300	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	33.200	0		0		0	2	100	0	33.300	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	33.200	0		0		0	2	100	0	33.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	277.000	0	0	0	0	2	400	0	277.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.200				22.200	2	100	22.300			222	22.300	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	36.200	2	100	36.300	1
CCF21	Cafam	860013570-3	66.400	2	100	66.500	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	102.600	102.900
Pensión	1	277.000	277.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.300
CCF	2	102.600	102.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	504.400	505.400

356

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901025544-1	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS		CL 45A 57 A 32	7520944	KINGCO@INBOX.RU	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2020-01	2019-12	E	16/01/2020	39543805	TOTAL A PAGAR	
					$505.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Soliciar	Extranjería	Cotiza en exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1037638284	BELTRAN VALENCIA BRENDA	1	0			0																	230301	902.968	144.500	0	0	0	0	EPS002	902.968	58.200	14-11	902.968	1	4.800	CCF04	902.968	58.200	0	0	0	0	0
2	CC	79985191	HENAO BOTERO ADRIAN ALBERTO	1	1			0																		0	0	0	0	0	0	MN002	828.116	53.200	14-11	828.116	2	8.700	CCF21	828.116	53.200	0	0	0	0	0
3	CC	88274084	RODRIGUEZ BUENHAVER LEONARDO	1	0			0																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	53.200	14-11	828.116	2	8.700	CCF21	828.116	53.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

CAPACITACIONES

358
~~345~~

KINO

KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

DIALOGOS DE SEGURIDAD PRE OPERACIONALES

Codigo: FR-SST-070

Version: 0

Vigencia:

FECHA: 19/12/19

DURACION DE LA CHARLA: 30 minutos

PROYECTO: Secretaria de Movilidad

CONTRATISTA: Khalifa Ingeniería y Cons

TEMA: Inducción SST

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
Alex Epiayu	1094490986	oficial	Alex Epiayu
Edwin Yesid Tapias	1000227	Ayu Electrico	Edwin Tapias E.
Luis Alejandro Cortés	1.053.798.154	Director de Obra	
Yoandris Acosta M	1065933811	Ayudante	Yoandris Acosta
Marvis Barrera Bello	1093332898	Ayudante	
Luis Florian	1.039.607.562	Ayudante	Luis Florian

NOMBRE RESPONSABLE: Juan Alejandro Ruiz Ramos

CARGO: Residente SST II

FIRMA:

359

INC

Juan Alejandro Ruiz Rincón

Presidente CSTM

360

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

INDUCCIONES Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

3.61

ING

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP'S

Nombre: Yoendris Arrieta | Cedula: 1015 473 841

Cargo: Ayudante de Obra. | Fecha de ingreso: 6/12/2019

Item	Fecha	Elementos	Cantidad	Firma	
				Entrega	Recibe
1	6/12/19	Guantes	1		Yoendris Arrieta
2	6/12/19	Gafas	1		Yoendris Arrieta
3	6/12/19	Protector Respiratorio	1		Yoendris Arrieta
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Recibe Información del Uso adecuado y oportuno de los EPP'S SI ☑ NO ☐

562

ING

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP'S

Nombre: Yenifer Paez	Cedula: 1.133.994.062
Cargo: Oficial de Obra	Fecha de ingreso: 18/12/2019

Item	Fecha	Elementos	Cantidad	Firma	
				Entrega	Recibe
1	18/12/19	Guantes	1		
2	18/12/19	Gafas	1		
3	18/12/19	Protector Respiratorio.	1		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Recibe información del Uso adecuado y apertura de los EPP´S SI ☑ NO ☐

363

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

INFORME
RCD

364

Diciembre 27 de 2019

SDM-OF-127

Señores: **CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019**

Atn: SEÑOR
RICARDO MORENO GARCÍA
CONSORCIO INTERMOVILIDAD 2019
Interventoría
Ciudad

Referencia: **Realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaria distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo.**

Asunto: Generación de RCD mes de Diciembre.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar que durante el mes de diciembre de 2019 no se generaron residuos de construcción y demolición para la generación de RCD en las diferentes sede de la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM).

Agradezco su atención.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO CORTES
DIRECTOR DE OBRA
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

365

UBICACIÓN Y FECHA DEL PERSONAL

UBICACIÓN Y FECHA DEL PERSONAL

Fecha ENERO 2020		NOMBRES									
		Luis Alejandro Cortés Páez	Angelica Munar	Margie Barrera Bello	Juan Alejandro Ruiz Rincón	Edwin Yesith Tunjano	Néstor Solano	Atilco Epiayu	Jennifer Zoro	Yoendris Arrieta Morales	Felix Alonso Florian Sencial
Miércoles	1										
Jueves	2	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Almacén	Almacén		Almacén
Viernes	3	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Almacén	Almacén		Almacén
Sábado	4	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Almacén		Calle 13	Almacén
Domingo	5	Admón.				Calle 13		Almacén			Almacén
Lunes	6										
Martes	7	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Almacén	Almacén		Almacén
Miércoles	8	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Almacén	Almacén		Almacén
Jueves	9	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Calle 13		Calle 13
Viernes	10	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Calle 13		Calle 13
Sábado	11	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Calle 13	Calle 13	Calle 13
Domingo	12	Admón.				Calle 13		Calle 13		Calle 13	Calle 13
Lunes	13	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Calle 13		Calle 13
Martes	14	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Calle 13		Calle 13
Miércoles	15	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Calle 13		Calle 13
Jueves	16	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Calle 13		Calle 13
Viernes	17	Admón.		Admón.	Admón.	Calle 13		Calle 13	Paloquemao		
Sábado	18	Admón.		Admón.	Admón.		Calle 13	Calle 13	Paloquemao	Calle 13	Calle 13
Domingo	19	Admón.					Calle 13	Calle 13	Calle 13	Calle 13	Calle 13
Lunes	20	Admón.		Admón.	Admón.		Calle 13	Almacén	Calle 13		Almacén
Martes	21	Admón.		Admón.	Admón.						
Miércoles	22	Admón.		Admón.	Admón.		Patio Sur	Patio Sur	Calle 13		Patio Sur
Jueves	23	Admón.	Admón.	Admón.	Admón.		Patio Sur		Patio Sur		Patio Sur
Viernes	24	Admón.	Admón.	Admón.	Admón.						
Sábado	25	Admón.		Admón.	Admón.	Patio 4	Calle 13	Chicó		Chicó	Calle 13
Domingo	26	Admón.								Chicó	
Lunes	27	Admón.	Admón.	Admón.	Admón.						
Martes	28	Admón.	Admón.	Admón.	Admón.			Calle 13			Patio Sur
Miércoles	29	Admón.	Admón.	Admón.	Admón.			Patio Sur			Patio Sur
Jueves	30	Admón.	Admón.	Admón.	Admón.			Patio Sur			Patio Sur
Viernes	31	Admón.	Admón.	Admón.	Admón.			Patio Sur			Patio Sur

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

BITACORA DE OBRA

368

LIBRO DE OBRA I

CL. 13.

S. D. M.

Contrato obra: 1601

Contrato Interventoria:
1653.

Contacto
314 414 9534
321 208 1041 83

...baño de discapacidad reducidad en el segundo piso. Por otra parte se realiza la instalación de un lfon en el baño del segundo piso. 2) materiales y recurso disponibles El contratista cuenta con los materiales para realizar las actividades 3) obdervaciones de la Interventoria: se Reitera al contratista sobre las goteras en el primer piso, se tiene un nuevo punto de goteo el contratista comenta q\ ya le dio solución a una de ellas en la noche. se le dice al contratista q\ le de solución a las nuevas goteras y Presentar recomendaciones del manejo de la poceta. 4) Requerimientos de la entidad: No predenta 5) Eventualidades: No predenta 6) obras no previstas: No predenta 7) Decisiones tomadas: No predenta 8) Firmas: Nombre Luisa Fernanda Guevara Cargo Residente Interventoria Firma Luisa Fernanda Guevara
Nombre: Lynda Paez C. Cargo: R. Interventoria 2
Firma: Nombre: Andrés M. Urrea R.
Cargo: Residente de Obra Firma:

01-12-2019 Hora inicio: 8:00Am - Hora terminación: 5:00 pm Estado del tiempo: Soleado 1) Descripcion de las actividades: (El contratista realiza instalación de piso en vinilo de 0,83m² para esta actividad se realizo la nivelación de area a intervenir con mastico y para la instalación se aplico adhesivo En la sede de Paloquemao.) Por otra parte en la sede calle 43 se aplica emulsión asfaltica en el segundo piso sede cafeteria para posteriormente realizar la instalación de manto asfaltico. 2) Materiales y recursos: dos oficiales, 01 auxiliar de residente, herramienta menor, manto asfaltico, emulsion asfaltica 3) observaciones de la interventoria: no tener

en cuenta el parrafo entre las lineas 21 hasta 34 por favor tener cuidado con las bitacoras cuando las llenan ello pertenece a palogremao no a las instalaciones de calle 13. Por otra parte se reitera la entrega de los informes semanales a interventoría. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: no presento 7) Decisiones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H. Cargo: Residente de Interventoria Firma: ——— Nombre: Lynda Paz ——— Cargo: R. interventoría 2 ——— Firma: Nombre: Andrés Mauricio Urrea Cargo: Residente de obra Firma:

02-12-2019 Hora de inicio: 7:00 Am – Hora terminacion: 4:30pm Estado del clima: Soleado 1) descripción de actividades: Se realiza la instalación de dos paradoles en la zona de la cafeteria. 2) materiales y recursos disponibles: dos oficiales, 1 director de obra, un ingeniero residente, un auxiliar de residente, herramientas menores, una Pulidora, EPOXICO (Sicadur 31) 3) Observaciones de la interventoria: se le reitera al contratista q' la bateria del baño de mujeres sige estrenando filtraciones y aun no esta resuelto el tema, q' por favor verifique cual es el daño y le de una solucion inmediata a los baños del segundo piso y revisar q' ningun otro baño este fallando. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No se presentan 6) obras no previstas: No presento 7) Decisiones tomadas no presento 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H. Cargo: Residente Interventoria ——— Firma: 85
Nombre: Lynda Paz Cargo: Residente Interventoria 2
Firma: Nombre: Andrés Mauricio Urrea R.
Cargo: Residente de obra. Firma:

374

03-12-2019 Hora de inicio: 7:00am - Hora terminación 5:00pm estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: Se atendio el requerimiento de retivar la puerta en los baños de mujeres en el segundo piso. Se llamo contratista de las puertas, para que venga a dar solución. ACTIVIDADES SST: Nuevamente se reitera haciendolo llamado de atención al Director de obra y al residente de obra para que se de estricto complimiento al anexo 1 Anexo Técnico. Numeral 2. Alcance del Contrato. Numeral 6.1 Procedimiento para ejecución de los trabajos; número 6.3 Personal Minimo exigido. ——— 2) materiales y recursos disponibles: un oficial, un auxiliar de residente, cinta pelibró, llaves para retiro de la puerta. 3) Observaciones de la interventoria: Se cae la puerta de una unidad de los sanitarios, Se le dice al contratista que le de solución de forma inmediata de reparación. En todo caso nos encontramos ante una cuestion recurrente de observaciones en los baños ejecutados por la firma del contratista. Requerimos se presente un informe indicando porque se genero la caida de la puerta de las divisiones de los baños adicionalmente se evalúen las demas puertas para evitar q se presente nuevamente este TIPO de problemas. ——— 4) Requerimientos de la entidad: 1) Solicitud de una respuesta pronta, ejecutando las actividades necesarias que responda lo presentado a la solución y respuesta inmediata de reparación de la caida de la puerta de las divisiones de los baños. 2) Solicitamos se translade la profesional Diso para realizar el acompañamiento al problema presentado. 5) Eventualidades: Se presento en el baño de las mujeres segundo piso la caida de una puerta 6) obras no previstas: No presenta. 7) acciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Lynda Paez Cagis

86

372

cargo: R Interventoria 2. Firma: Nombre: Luis Alejandro Cortes Cargo: Director de Obra Firma: Nombre Andrés Mauricio Urrea Cargo R. de Obra Firma:

04-12-2019 Hora inicio: 7:00 AM - Hora terminación: 5:00pm Estado del tiempo: soleado 1) descripción de las actividades: El personal se encuentra realizando actividades en Puente Aranda por lo que no se estan desarrollando actividades en la sede. 2) materiales y recursos disponibles: 1 director de obra, 1 ing. residente, 1 auxiliar de residente. 3) observaciones de la interventoria: se requiere acción inmediata reportan Fuga de un Tubo de agua en la terraza norte segundo piso Subsecretaria de servicio a la ciudadania, el cual está cayendo en el sistema de aire acondicionado electrico se requiere permiso de la Entidad para poder ingresar a esta zona y cerrar el registro 4) requerimientos de la entidad: No presento 5) Eventualidades: no presenta 6) obras no previstas: no presenta 7) decisiones tomadas: no presenta 8) Firmas: Nombre: Lynda Paz Cargo: R. Interventoria Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente de Interventoria. Firma: Nombre: Andres M. Urrea. cargo: Residente de obra Firma:

05-12-2019 Hora de inicio: 7:30 A m - Hora terminación: 5:00pm Estado del clima: soleado 4) descripción de las actividades: Se da una solución parcial al requerimiento de la fuga de agua en el terraza - por lo que no fue posible suspender el agua ya que esta alimenta los aires acondicionados y aun no hay respuesta del acompañamiento de las personas encargadas por parte de la

entidad, ya se solicito el acompañamiento. Por otra parte se atiende el requerimiento del push del baño de mujeres en el segundo piso. 2) materiales y recursos disponibles: un director de obra, un auxiliar de residente, Un oficial, un ayudante, herramientas menores, tubo y Pegante. 3) observaciones de la interventoria: Solicitamos colaboracion para tener acceso a la terraza, se ha acudido al personal de seguridad pero nos informan q' no tienen llaves esto es necesario ya q' el contratista solicita q' se encuentre la persona encargada de los chiller debido a q' tienen q' cerrar el paso del agua a estas maquinas 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta. 6) obras no previstas 7) Decisiones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Lynda Perez ——— cargo: Interventoria2 ——— Firma: ——— Nombre: Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente Interventoria Firma: ——— Nombre: Andres Mauricio Urrea R. Cargo: Residente de obra Firma:

06-12-2019 Hora de inicio: 7:00am — Hora terminacion: 5pm estado del clima: soleado 1) descripción de las actividades: El contratista aun no puede solucionar la fuga de agua en la terraza porque no ha habido respuesta por parte de la entidad para la suspención del agua mientras se arregla. 1) materiales y recursos disponibles: un director de obra, un ing residente, un auxiliar de residente, un oficial, un ayudante, herramienta menor. 3) observaciones de la Interventoria: todavia no se ha recibido respuesta de la entidad ya q' es necesario darle una solucion por el momento el contratista hace un arreglo parcial.

88

374

4) Requerimientos de la entidad: Actualzacion de Cronograma de trabajo, Acta de vecindad, INFORME SISO previo al ingreso:, lista personal, afiliaciones salud, pensión y ARL, Gestion solicitud del PIN para frente de trabajo para cobros que se generen en este periodo se deben entregar antes de 10 de diciembre de 2019. llamado de atención 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presentan. 7) Desiciones tomadas: no presento 8) firmas: Nombre: Lynda Paez C. _____ cargo: IC Interventoria _____ Firma: _____ Nombre: Luis Fernando Cargo: Residente Interventoria. Firma: _____ Nombre: Andrés Mauricio Urrea. Cargo: Residente de obra Firma: _____

07/12-2019 Hora de inicio: 7:00 AM - Hora terminación: 4:30 PM Estado del clima: Soleado 1) Descripcion de las actividades: El contratista se encuentra a la espera de que la entidad de respuesta para suspender el agua en la terraza y poder solucionar la fuga de agua. Por otra parte se encuentra el personal realizando ela instalación de la ventanilla No 1 de correspondencia. El resto del personal se encuentra atendiendo el requerimiento en la sede chico y puente Aranda. 2) Materiales y recursos disponibles: un ingeniero residente, un director de obra, un auxiliar de residente, un oficial, Un ayudante, herramientas menores. 3) observaciones de la interventoria: El contratista hizo un arreglo parcial ya q la entidad no ha dado respuesta para poder ingresar a la terraza y la persona encargada de los chillers se han mandado correos pero no han sido Respondidos. 89

375

4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Desiciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Lynda Paez C. Cargo: R. Interventoria 2 Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Andres Mauricio Urrea Cargo: Residente de obra Firma

09-12-2019 Hora de inicio: 7:00 AM - Hora terminación: 5pm Estado del clima: soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista realiza arreglo de Push en el baño de mujeres segundo piso. Se encuentra pendiente para arreglo de filtración en terraza porque no hay respuesta de la entidad para suspender el agua. 2) Materiales y recursos disponibles: un oficial, un ayudante, un ingeniero residente, Un auxiliar de residente, herramienta menor 3) Observaciones de la interventoria: Todavia no se ha recibido respuesta de la entidad, el contratista le da un arreglo paraal por el momento se reserta la persona encargada de los chillers para poder dar una buena solución 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas no presenta 7) Desiciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Lynda Paez C. Cargo: R. Interventoria 2 Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente de Interventoria Firma: Nombre: Luis Alejandro Cortes. Cargo: Director de Obra. Firma:

10-12-2019 Hora inicio: 7:00 AM - Hora Terminación: 5:00pm Estado del tiempo: Soleado 1) Descripción de las actividades: El personal se encuentra atendiendo los requerimientos en las sedes

~~94~~

de Almacen y fuente Aranda. Se encuentra realizando trabajos Joendris con don Gonzalo del área de mantenimiento. Pendiente arreglo Fuga de agua en la terraza aun no han dado respuesta la entidad para poder suspender el agua. 2) materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un ingeniero residente, un auxiliar de residente, un ayudante. 3) observaciones de la interventoria: Se debe cambiar de caracter inmediato las siguientes luminarias: Cuatro (4) luminarias LED de 60x60 de sobreponer (sin su carcasa) de 6000K (luz blanca) en pto 3 C113. Suministrar e instalar seis (6) drivers para reemplazo de los dañados. Revisar que en el area todas las luminarias esten funcionando. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presentas 7) decisiones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente de Interventoria Firma: ff.

Nombre: Lynda Paz Cargo: R. Interventoria 2

Firma: lp Nombre: Alejandro Cortés

Cargo: Director de Obra Firma:

11-12-2019 Hora de inicio: 7:00 AM - Hora de terminación: 5:30pm

Estado del clima: lluvias en horas de la tarde. 1) Descripción de las actividades: El Contratista se encuentra realizando actividades en las sedes de Puente Aranda y Almacen. Por otra parte esta trabajando Joendris con don Gonzalo en el area de mantenimiento Aun no hay respuesta de la entidad para la suspencion del agua para arreglo en filtración en la terraza. 2) materiales y recursos disponibles: Un director de obra, Un ingeniero residente, Un auxiliar de

91

377

residente, un ayudante. 3) obderuaciones de la interventoria: Se realiza llamado de atención por la entrega de los informes semanales a la interventorra, no se cumple estan pendiente No 26 y 27 semanas del 25 al 01 de diciembre del 2 al 8 de diciembre, se solicita ponerse al dia.
4) Requerimientos de la entidad: Suministro e instalacion de cuatro(4) drivers para reemplazo de los dañados. 5) eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta. 7) decisiones tomadas no presenta 8) Firmas: Nombre. Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente Interv. Firma: Nombre. Lynda Paez cargo: R interventoria2 Firma: Nombre Luis Alejandro Cortés cargo. Director de Obra Firma:

12-12-2019 Hora Inicio: 5:00 AM - Hora terminación: 5:00pm Estado del clima: Soleado 1) descripción de actividades: El contratista realiza el cambio de tres drivers en el tercer piso 2) Materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un tecnico electricista, un auxiliar de residente, herramienta menor, escalera. 3) observaciones de la interventoria: Realizar seguimiento a las luminarias del tercer piso y atender las luminarias que presenten fallas realizar un chequeo diario y reportarlo en la bitacora, este seguimiento se requiere en vista que se presentan afectación al personal por la iluminación. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Firmas Nombre: Lynda Paez Residente interventoria2 cargo: R Interventoria Firma: Nombre: Alejandro Cortes cargo: Director Firma: Nombre: cargo: Firma:

14-12-2019	Hora de inicio: 7:00 Am - Hora terminacion: 8:00 pm. Estado del clima: Soleado. 1) descripción de las actividades: El contratista realizo el mortero del cuarto de camaras. 2) materiales y recursos disponibles: un director de obra, un ingeniero residente un auxiliar de residente, un oficial, un ayudante, herramienta menor. 3) observaciones de la interventoria: Se otro reinicio de las actividades en el cuarto de cámaras de acuerdo con las instrucciones del correo electronico donde se informo que el área se podia intervenir se solicita actualice el cronograma de acuerdo con los tiempos programados inicialmente. 4) Requerimientos de la entidad: reiteramos sus obligaciones y solicitamos se genere el reporte y se entregue para el dia 14-12-2019 se solicita se realice la respectiva actualización. se les reitera q ve se realice la respectiva actualización) el control y reporte debe generarse de forma mensual dado que su incumplimiento puede acarrear inconvenientes a la entidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de cada mes. 5) Eventualidades: no se presentan 6) obras no previstas: no se predentan. 7) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Cargo: Residente Interventoria Firma: Luisa Fernanda Grevomff Nombre: Lynda Paez — Cargo: R interventoria 2 Firma: — Nombre: Luis Alejandro Cantes Cargo: Directa de Obra Firma:
16-12-2019	Hora de inicio: 7:00 AM — Hora de terminación: 10 pm Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: el contratista realizo la instalación de división en drywall en 93

370

el cuarto de camaras. Adicionalmente se encuentra yocndris realizando actividades con do gonzalo del area de mantenimiento 2) materiales y recursos disponibles: un director de obra, un ingeniero residente, un auxiliar de residente, un oficial, dos ayudantes, herramienta menor. 3) observaciones de la interventoria: Reiteramos nuevamente atender de caracter urgente las luminarias en el tercer (3) piso de Calle 13. En baño del tercer (3) Piso, segunda unidad sanitario wc mujeres se presentan problemas con el push (queda oprimido). Revisar y solucionar de forma URGENTE. Para dar cumplimiento al Anexo 1 Anexo Técnico. Personal minimo, se solicita el acompañamiento prof. SISO. 4) Requerimientos de la entidad: No se presenta 5) Eventualidades: no se presenta 6) obras no previstas: NO se presentan. 7) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Hernández Cargo: Residente de interventoria Firma: Nombre: Lynda Paez Cargo: R Interventoria 2 Firma: Nombre: Luis Alejandro Cortés Cargo: Director de Obra Firma:

21-12-2019 Hora inicio: 7:00am - Hora terminación: 5:00pm Estado del clima: Nublado 7) Descripción de las actividades: El contratista realiza arreglo del tableado en el area de comunicaciones enterrando la canaleta con su respectivo cableado. por otra parte se trabaja en la instalación del piso en el cuarto de camaras. Adicionalmente se realiza la instalación de cuatro (4) lamparas led en el tercer Piso. 2) materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un residente, un auxiliar de residente,

	un tecnico electrisista, dos oficiales, un ayudante. herramienta menor. 3) observaciones de la interventoria: la interventora se reserva el recibo de la actividad orreglo de cables canaleta, por la presentación, se le recuerda que un mantenimiento correctivo es una intervención tendiente a corregir fallas anomalias que afecten funcionamiento y ademas buena presentación 4) requerimientos de la entidad: No se presenta 5) Eventualidades: No se presenta 6) obras no previstas: No Se presentan 7) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente de Interventoria Firma: Nombre: Lynda Paez Cargo: P. interventoria Firma: Nombre: Luis Alejandro Cortes Cargo: Dirección Firma:
22-12-2019	Hora de inicio: 7:00 am - Hora terminación: 5:00pm Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: el contratista termina la instalación de la tableta en el cuarto de camaras. Por otra parte se hace el alistado de muro división en dry wall en el cuarto de camaras. 2) materiales y recurso disponibles: Un director de obra, un residente, un auxiliar de residente Un oficial, un ayudante, herramienta menor. 3) observaciones de la interventoria: Nuevamente se reitera la instalación de las luminarias LED en el tercer (3) piso el 13. Cumplir con su obligacion contractual CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: numeral 12. Dotar al personal con los elementos de seguridad industral y el numeral 13. Garantizar la disposición permanente en la SDH de un maestro de obra... numeral 20. Garantizar la adecuada disposición de RCD.

4) Requerimientos de la entidad: No se presentan 5) Eventualidades: No se presentan 6) obras no previstas: No se presentan 7) Firmas: Nombre: Alejandro Cortes Cargo: Director de Obra Firma: [signature]
Nombre: Lynda Paez Cargo: R. Interventoria 2
Firma: [signature] Nombre: _____
Cargo: _____ Firma _____

24-12-2019 Hora de inicio: 7:00 AM - Hora terminación: 5 PM
Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista continua trabajando en el cuarto de camaras realizando el estoco de los muros. Se realiza la instalación de las dos puertas en la zona de camaras. 2) materiales y recurso disponibles: Un director de obra, un ingeniero residente, un auxiliar de residente, dos oficiales, dos ayudantes, herramienta menor, 2 puertas 3) observaciones de la interventoria: Se evidencia que desde el dia 13 de diciembre no ha realizado acompañamiento en los frentes de trabajo el Ing Andres Vera con cargo Residente de obra; en calidad de interventoria se realiza llamado de atención y se cumple con lo establecido en el contrato Anexo 1 Anexo técnico numeral 6.2 Personal minimo requerido.
4) Requerimientos de la entidad: No se presenta 5) Eventualidades: No se presenta 6) obras no previstas: No se presentan 7) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Hernández
Cargo: Residente Interventoria Firma: [signature]
Nombre: Lynda Paez Cargo: R. Interventoria 2
Firma: [signature] Nombre: Luis Alejandro Cortés
Cargo: Director de Obra Firma: [signature]

~~100~~

26-12-2019 Hora inicio: 7:00 Am- Hora terminacion: 5:00 Pm Estado del clima soleado. 1) Descripción de las actividades: El contratista continua trabajando en el cuarto de camaras. Por otra parte se encuentra yoendris con don Gonzalo en el area de mantenimiento. 2) materiales y recursos disponibles: un director de obra, un residente, un auxiliar de residente, dos oficiales, un ayudante herramienta menor. 3) observaciones de la interventoria: Se observa q' el contratista no concluyo los trabajos y de acuerdo a la programacion era la fecha de entrega a la interventoria, no se ha realizado desmonte de cerramiento, continuan con escombro y herramienta no se instalo piso aprobado desde el 23 de diciembre, se ordena retiro inmediato de todos los elementos del area de camaras. 4) Requerimientos de la entidad: Se le recuerda que los 25 de cada mes deben ser entregado el reporte rep. a la fecha no se ha presentado el del mes de diciembre 5) Cuentoalidades: no se presentan 6) Firmas: Nombre:
Cargo: Firma:
Nombre: Lynda Paez Cargo: R. interventoria.
Firma:
Nombre: Alejandro Cortés
Cargo: Director de Obra Firma:

27-12-2019 Hora de inicio: 7:00am- Hora terminacion: 5:00pm
Estado de clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista continua realizando actividades en el cuarto de camaras. Por otra parte se hizo acompañamiento para verificar nuevo trabajo de los biometricos: de los cuales

LIBRO DE OBRA II

Calle 13

Contratobra 1601

Contratohierro 1653

384

Contacto
3144149534
3208041498

NOTA: Se continua con las anotaciones del dia 27 de diciembre, porque el libro de obra cierra en la pagina con número de folio 100. Para la Calle 13 de la SDH.

27-12-2019 Se requieren 15 puntos, verificar los lugares donde se van a instalar, se establecieron las condiciones y el acompañamiento para la certificación de las puertas automaticas con el acompañamiento del Ingeniero Javier Peñaranda. 2) MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES: Un director de obra, 01 aux residente de obra, 01 técnico electrisista, 02 oficiales, 02 ayudantes, herramienta menor, 3) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: Se reitera al contratista sus obligaciones frente al contrato 1601 de 2019. De acuerdo con el cronograma de cámaras la fecha de entrega estaba definida para el 24 de diciembre de 2019 de acuerdo con la directriz impartida por la interventoria una vez informado por la SDH que la suspención de actividades se podia ordenar el reinicio mediante correo electronico, teniendo en cuenta las obras a ejecutar y el tiempo requerido, se recuerda que es de estricto cumplimiento los cronogramas aprobados, por la interventoria Ademas tenga en cuenta en Anexo 1 Anexo Tecnico en el numeral 6.3 ... Descripcion de las actividades a cargo del Director de obra es el responsable de las actividades desde su requerimiento, evaluación, recomendación, propuesta economica y ejecución. y con relacion a las actividades a cargo del residente de obra Coordinar los trabajos y asumir la responsabilidad en la ejecución de las obras, dentro de los tiempos pactados con la entidad. Verificar y garantizar la correcta conclusion de las obras. Esta interventoria realiza llamado de atencion al director de obra en vista que no ha dado respuesta ha guardado silencio administrativo y no han atendido la totalidad de los requerimientos que ha realizado la Entidad e interventoria a traves de actas de comite de obra, correos electronicos, mesas de seguimiento, visitas técnicas anotaciones en bitacora y matriz de gestion de seguimiento, lo cual afecta el mantenimiento en la Sede Cl 13 y en las diferentes Sides de la SDH. Se insta y ordena con caracter inme-

385

diato, que se tomen las acciones bajo un plan de contingencia y se cumpla el contrato 1601. Adicionalmente se observa que el residente de obra desde el 23 de diciembre no realiza seguimiento, acompañamiento en las diferentes Sedes que se encuentran en ejecución y no se firman las bitacoras. 4) REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD: El ing Javier Peñaranda solicita trabajos a nivel de BIOMETRICOS, la interventoria solicita: la presentación del Plan de trabajo, Cronograma, presupuesto, justificación técnica de acuerdo con lo establecido en el contrato CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Numeral 5 Presentar el presupuesto discriminado de intervención y ajustado si a se requiere; previo al INICIO de las actividades requeridos por la ENTIDAD, el cual debe ser analizado y aprobado por el interventor del contrato. Numeral 6 Realizar los diagnósticos evaluaciones y valoraciones de cada uno de los requerimientos efectuados, en un plazo no mayor de tres (3) días habiles a la terminación del requerimiento solicitado, en compañia del interventor designado. Numeral 9. Entregar, previo al inicio de las actividades de obra, la ficha Tecnica de los materiales. 5) EVENTUALIDADES: Ninguna. 6) OBRAS NO PREVISTAS: El contratista no ha gestionado para este dia ONP ante interventoria. 7) FIRMAS: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H. Cargo: Residente de Interventoria. Firma: ff. Nombre: Luis Alejandro Cortes Cargo Director de Obra Firma: JAN Nombre: Andres Urrea Cargo: Residente de Obra Firma: _____

28-12-19 Hora de Inicio: 7:00 am HORA DE TERMINACION: 5:00 pm Estado del Clima: Soleado 1) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Continuan los trabajos en el área de camaras, se realizo el desmonte del cerramiento provisional, se realizo actividad de pintura muros. En el área de comunicaciones se realiza el cambio de drivers de tres (3) luminarias y se instalan dos (2) lámparas led, en el área tercer piso donde requirio la reposición por daño agua emergencia por filtración (Canales tapadas) el 19-10-2019. 2) MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES: 01 Director de obra, 01 aux de residencia de obra, 01 técnico electrisista, 02 oficiales, 02 ayudantes 386

herramienta menor, escalera, drivers, lamparas led. 3) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: Se reitera al contratista dar cumplimiento a los requerimiento de la entidad y la interventoria en los tiempos establecidos contractualmente y definidos por la entidad. Se solicita la entrega de los informes semanales y el informe mensual No 6 correspondiente al mes de diciembre de 2019 teniendo en cuenta los parametros establecidos por el contrato y reiterados por la interventoria mediante oficio RL 1693 2019 OSI. 4) REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD: Ninguna 5) EVENTUALIDADES: Ninguna. 6) OBRAS NO PREVISTAS: No se presento gestion por parte del contratista ante interventoria para este dia de ONP. 7) FIRMAS: Nombre Luisa Fernanda Guevara H. Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Luis Alejandro Cortes Cargo Director de Obra Firma: Nombre Andres Urrea Cargo Residente de Obra Firma:

30-12-19 HORA DE INICIO: 7:00 am HORA TERMINACION: 5:00 p.m. ESTADO DEL CLIMA: Nublado. 1) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Continuan trabajos a nivel de acabados cuarto de cámaras. 2) MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES: 01 Director de obra, 01 aux de residente de obra, 01 técnico electrisista, 02 oficiales, 02 ayudantes. herramienta menor. 3) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA. Se solicita un informe detallado de los mantenimientos realizados a las puestas en Cl 13. Se vuelve a presentar problemas de funcionamiento a las puertas de acceso área contravenarones, y a la plazdeta que conduce a cafeteria. Por otra parte se requiere el retiro de escombros en ninguno de las Sedes de la SDH se permite el almacenamiento de materiales o productos de demolición. Nuevamente se solicita el RETIRO INMEDIATO de materiales acopiados dentro de la SEDE' Cl 13. Por otra parte atender o realizar el cambio de ceramica fracturada en el Hall de ingreso Cl 13. 4) REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD: Verificar correo electronico 30-12-2019 5) EVENTUALIDADES: Ninguna. 6) OBRAS NO PREVISTAS: Ninguna gestion por parte del contratista para interventoria, este dia. 7) FIRMAS: Nombre Luisa Fernanda Guevara: Cargo: Residente Interventoria Firma:

Nombre: Luis Alejandro Cortes Cargo Director de Obra Firma:
Nombre: Andres Urrea Cargo: Residente de Obra Firma:

31-12-19 HORA DE INICIO: 7:30 am HORA DE TERMINACION: 3:00 pm. ESTADO DEL CLIMA: Nublado. 1) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Continuan los trabajos en cuarto de camaras, se realizo el cambio de un driver en luminaria tercer piso. 2) MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES: 01 Director de obra, 01 oficial, 01 ayudante, 01 tecnico electrisista. herramienta menor escalera, 01 driver. 3) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: El contratista comunica que ya se encuentra lista el área de cámaras para la entrega, se solicita que se realice la entrega de la documentación certificado de calidad memorias de cálculo, balance final de ejecución en la sede Cl 13 y el registro fotografico antes durante y finalizacción para realizar el acta de recibo a satisfacción. Inventario y llaves de puertas. 4) REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD Revisión pozo unidad sanitaria baños segundo piso, no esta funcionando se requiere atención de caracter urgente. De acuerdo con el correo electronico de fecha 31-12-2019 11:37 am. se evidencio que aun persisten luminarias que requieren atención en el tercer piso Cl 13. Por otra parte el correo adjunta registro fotografico donde evidencia acopio de materiales y escombros en la sede el cual debe ser retirado inmediatamente 5) EVENTUALIDADES: Ninguno 6) OBRAS NO PREVISTAS: El contratista para este dia no realizó gestion ante interventoria. 7) FIRMAS: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H. Cargo: Residente Interventoria Firma:
Nombre: Luis Alejandro Cortes Cargo: Director de Obra Firma:
Nombre: Andres Urrea Cargo Residente de obra Firma:

LIBRO DE OBRA.

POLICIA METROPOLITANA.

ENTREGADA AL CONTRATISTA.

01 - 08 - 2019.

POR PARTE DE LA ENTIDAD

Polvera

~~103~~

389

20-10-19 Se inicia actividad en la policia a las 8:00 am. se continuo con trabajos de construccion de las cubiertas de la policia. En horas de tarde se presentan lluvias por lo que es necesario la suspencion de las actividades.

Andres Urrea. Director de Obra.

21-10-19. Los señores que trabajan en la estructura de la cubierta inician labores a las 10 am. Se deja armado los marcos de la cubierta y a su vez realizan ajustes de puertas en la sede de la policia metropolitana.

Andrés Urrea. Director de Obra.

23-10-19 Se inicia actividades con el mantenimiento y instalación de puerta fabricadas. Estas puertas son en vidrio templado. No se hacen mas actividades en esta sede.

Andrés Mauricio Urrea. Director Obra.

25-10-19 Se inicia trabajos a las 8 am se instala el domo y la cubierta del iris. No se realizan mas actividades.

Director de Obra.

29-10-19 Se realiza visita a la sede de la policia con el encargado del mantenimiento. Se revisa parte y actividades pendientes y ejecutadas. el contratista se compromete a sacar todos los pendiente durante los siguientes dias.

Director Obra. Andres Mauricio Urrea

01-12-2019 Hora inicio: 8:00 am - Hora terminación: 12 pm Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista se encu- entra [illegible] la entrega de la

Puerta del Shut de basuras.
Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre:
Cargo: Firmas:
Nombre: Alejandro Cortes Cargo: Director de Obra
Firma:

12-12-19 OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA: De acuerdo con el comité de obra realizado en la SDH. el 13 se realizan observaciones a la cubierta del Iris y se solicita verificación in sito por lo cual se hace visita con la participación de la interventoria contratista y la SDH (Ing Oscar Saavedra) Se verifica que la estructura instalada requiere de actividades para inclinarla pero no se puede bajar porque la viga esta afectada solo se puede dar inclinación. El contratista se compromete a realizar actividades el fin de semana y entregar a la interventoria el día lunes. De igual manera presentará el esquema. a la interventoria para el aval y la interventoria lo remitira a la entidad teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas. El requerimiento de la entidad se reitera por parte de la interventoria que la cubierta cumpla la función de protección por sol y del agua, en el patio armerillo (Aparatos verificación Iris).
Observaciones del Contratista: Mediante visita técnica realizada en el sitio, se establece con el Ing Oscar Saavedra y la Interventoria, que se va a dejar la cubierta en el sitio donde se encuentra actualmente, y se le realiza una inclinación y el sellamiento para evita filtraciones de agua en la cubierta, adicionalmente, se le instalara un flanche contra la pared.
Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara. Cargo: Residente Interventori
Firma:
Hora de inicio: 10:00 Am - Hora terminación: 4:30 Pm
Estado del clima: Soleado Descripción de las actividades: Se realiza el arreglo y pintura del techo de la peluqueria. Adicionalmente se realiza la instalación de una canaleta para proteger el cableado, tambien se realiza el arreglo de la lamina ubicada en los

lavamanos de los baños. 1) materiales y recursos disponibles: Un tecnico electricista, un oficial, un auxiliar de residente, herramienta menor, canaleta, cable encauchetado, tornillos, brocha, espatula, rodillo, cinta malla. 3) observaciones de la interventoria: Se solicita que se instale la luminaria que se daño en Peluqueria por las demoras en atender la filtración de poceta segundo piso. Por otra parte no se acepta por calidad las reparaciones a la cubierta mis continua en observacion. Por calidad lampara lavamanos WC ocultar cable. 4) Requerimientos de la entidad: Entrega de esquema con la propuesta de la solucion la cubierta de Iris Policia para el aval de la interventoria 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Mediciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interv. Firma: ff.

Nombre: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Nombre: Alejandro Cortés Paéz

Cargo: Director de Obra Firma

7-12-19 OBSERVACIONES INTERVENTORIA: De acuerdo con el recorrido con el Ing Oscar Saavedra se reiteran las observaciones a la cubierta Domo Iris, no se recibe porque no se realizo o dio una solución Tecnica definitiva; nuevamente se reitera que hasta tanto no se realice las actividades para solucionar esta cubierta no se realiza el recibo de obras y se da hasta el dia 7 de enero para cumplir con cada observacion adicionalmente se reitera corrección del cable a nivel de cielorraso que se observa en WC (hombre y mujeres) Hall parqueaderos que se oculte el cable negro, por otra parte se instale la luminaria en Peluqueria y se repare las bisagras y chapa puerta área de archivo. Nombre: Luisa

Firma

LIBRO DE OBRA.

FRENTE DE TRABAJO

PATIO 4.

Contactos:
Cel 3144149534
Cel 3212081041

LIT PERLA IMPRESORES LTDA

Tricos; y por lo tanto, nos enviará por correo electrónico la ubicación de los puntos donde deben ser instalados. observaciones de la interventoria: De acuerdo con la instrucciones de la SDH solo se deben instalar dos puntos Nombre: Andres M Urrea. Firma: Residente. Obra.
Nombre: Alejandro Cantes. Firma: Cargo: Director

13/12/2019 Hora de inicio: 7:00 Am Hora de Terminación 6:00pm Estado del Tiempo: soleado 1) Descripción de actividades: instalación de punto electrico segun indicaciones se revisa en el plano y se verifica una distancia de 16m y se verifica los materiales necesarios para la instalación de un punto electrico 2) Materiales y recursos: se cuentan con los materiales para realizar la actividad 3) observaciones de la interventoría: se solicita q' se realice el listado de materiales con los cuales se va realizar la atención del requerimiento y se defina fecha de ejecución 4) Requerimientos por la entidad: Ninguno 5) obras previstas: Ninguna 6) Eventualidades: ninguna 7) Decisiones tomadas: Ninguna. 8) Firmas: Nombre Lyndy Por cargo: I. Interventoria Nombre: Luisa Fdo. Guevara cargo: Residente Interventoria Firma:
Nombre: Alejandro Cantes cargo: Directo. Firma:

14-12-2019 Hora de inicio: 8:00am Hora de Terminación: 6:00 pm Estado del Tiempo: soleado 1) Descripción de actividades: se trabaja en la instalación de Tubería y cajas 2) Materiales y Recursos: se cuentan con los materiales para realizar la actividad 3) Observaciones de la interventoria: Ninguna 4) Requerimientos por la entidad: ninguna 5) obras previstas: Ninguna 6) eventualidades: Ninguna 7) Decisiones tomadas: Ninguna 8) Firmas: Nombre: Lynda Port Cargo: I. Interventoria Nombre: Luisa Guevara Firma:
Cargo Residente Interv Nombre: Alejandro Cantes cargo: Directo Firma:

15-12-2019 Hora de inicio: 7:00am Hora de terminación: 5:00pm Estado del Tiempo: Soleado 1) Descripción de actividades: se continua Trabajando en la instalación de la Tubería 2) Materiales y Recursos: Se ~~encu~~ cuentan con los materiales para realizar las actividades 3) Observaciones de la Interventoria: Ninguna 4) Requerimientos por la entidad: Ninguna 5) obras previstas: Ninguna 6) eventualidades: ninguna 7) Decisiones

~~107~~ 395


Tomadas: Ninguna 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara
Cargo: Residente Interv Firma: Nombre: Lynda Paez
Cargo: R. Interventoria 2 Firma: Nombre: Alejandro Cortes
Cargo: Director Firma:

16-12-19 Hora de inicio: 8:00am Hora de terminación: 4:00pm
1) Estado del Tiempo: soleado 2) Descripción de actividades: se realiza el sondeo de la tubería y instalación de bajante MT 3) Observaciones de la interventoria: las instalaciones deben ser mantenidas en condiciones adecuadas tanto funcionales como Fisicas 4) Requerimientos de la entidad: Ninguno 5) obras previstas: Ninguna 6) eventualidades: Ninguna 7) Decisiones tomadas: Ninguna: 8) Firmas Nombre: Lynda Paez Cargo: R. Interventoria Firma: Nombre: Luisa Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Alejandro Cortes Cargo: Director Firma:

20-12-19 Hora de inicio: 8:00 am Hora de Terminación: 4:00pm
1) Estado del Tiempo: soleado 2) Descripción de actividades: se realiza la instalación de la canaleta 3) Observaciones de la interventoria: se le reitera al contratista instalar la canaleta y Ponchar el Jack. 4) Requerimientos de la entidad: Ninguno 5) obras previstas: Ninguna 6) Eventualidades: Ninguna 7) Decisiones Tomadas: Ninguna: 8) Materiales y Recursos disponibles: se cuentan con los materiales para realizar la actividad 9) Eventualidades: ninguna Firmas: Nombre: Lynda Paez Cargo: R. interventoria Firma: Nombre: Luisa Guevara Cargo: Residente Firma Nombre: Alejandro Cortes Cargo: Director Firma:

23-12-19



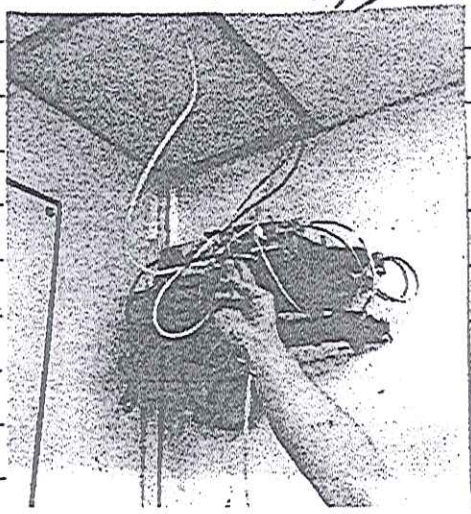

396

Observaciones de la interventoria: se verifica el punto instalado el funcionario sebastian palacios del grupo operativo de subdirección de gestión envia con CC. 1015929662 hace la prueba del punto instalado y confirma q todo esta en buen funcionamiento.
Nombre: Luisa Fernanda Guevara. Cargo Residente Interventoria. Firma

01-12-2019 Hora inicio: 7:30 AM - Hora terminación: 2:00 pm
Estado del tiempo: Soleado 4) descripción de las actividades: El contratista realiza instalación de piso en vinisol de 0,183m², para esta actividad se realizo la nivelación del área a intervenir con mastico y para la instalación se aplico adhesivo 2) materiales y recursos disponibles: dos oficiales, 01 Auxiliar de residente, 1 residente, herramienta menor, mastico y adhesivo para vinisol. 3) observaciones de la interventoria: Se reitera la observación realizada el 23-11-2019. Continua pendiente la instalación de piso vinisol en el segundo piso, adicionalmente el retiro de la canaleta. Para el recibo a satisfacción de la actividad se requieren los registros fotograficos del antes y despues y certificados de calidad 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Mediciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Luisa Fernanda Guevara
Nombre: Alejandra Cortés cargo: Director de Obra
Firma: Nombre: Andres H. Urrea cargo: Residente de Obra Firma: Nombre Lyndo Paez Cargo R. Inter.

08-12-2019 Hora inicio: 8:00 AM - Hora de terminación: 12:pm
Estado del clima: lluvias en horas de la tarde. 4) descripción de actividades: El contratista realiza la instalación de una llave en la poceta del quinto piso. Por otra parte con acompañamiento de la interventoria se realiza prueba a la impermeabilización realizada en el

BOSTON

la terrazo del quinto piso, donde se riega agua para verificar que el manto asfaltico no deje pasar el agua, dando como resultado que no se presenta Filtración.
2) materiales y recursos disponibles: un director de obra, Un Arquitecto residente de interventoria, un oficial de obra, un ayudante herramientas menores, llave. 3) Observaciones de la interventoria: Se realizo verificación de la impermeabilización por un periodo de dos horas iniciando a las 10:00 am, se verifica que no se presentan filtraciones de agua en el aleoraso del quinto piso oficina y hall de escaleras, se realizo registro fotografico y video, antes durante y al finalizar. Se observo agua aposada antes del inicio de la actividad el dia anterior se presentaron lluvias.
4) Requerimientos de la entidad: NO presenta
5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) desiciones tomadas No presenta. 8) firmas: Nombre: Julia Fernanda Guevara.
Cargo: Residente de Interventoria Firma: Julia Fernanda Guevara
Nombre: Luis Alejandro Cortes. Cargo: Director de obra.
Firma: Nombre.
Cargo. Firma;

H5

399

LIBRO DE OBRA.

Frente de trabajo:

PUENTE Aranda.

Carrera 59 No. 14-64.

POLICIA METROPOLITANA.

Contactos
Cel 314 4149534
Cel 321 2083041

02-12-2019 Hora de inicio: 7:00AM - Hora Fin: 4:30 pm
- Estado del clima: DIA SOLEADO 1) descripción de las actividades: El contratista continua trabajando en la instalación del tablero electrico Por otra parte se realiza la impermeabilización de la caja electrica por la fachada posterior. Se realiza la correccion de la caneleta, corte de canaleta. de realiza el pase entre canaleta y tablero de 1". 2) materiales y recursos disponibles: 01 tecnico electricista, 1 oficial, un director de obra, herramientas menores, circuitos, breaker de totalizador, canaleta 3) observaciones de la interventoria: El contratista reporta que por la situación que paso la ciudad con el PARO, se vio afectado y solicita se tenga en cuenta en la programación porque de acuerdo con lo que se comprometio en fecha de entrega no va a ser posible y pide se tenga en cuenta para el 7/12/19. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Desiciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Jorge Fernando Cuevas cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Lynda Poa Cogua cargo: Interventoria Firma: Nombre: Alejandro Cote cargo: Director Firma

03-12-2019 Hora de inicio: 7:00am - Hora terminacion: 4:30pm
Estado del clima: SOLEADO 1) descripción de las actividades: El contratista se encuentra realizando actividades de la instalación del tablero electrico, se tapa la canaleta, se conectan los distintos circuitos, se peino el tablero. 2) materiales y recursos disponibles: 1 tecnico electricista, 1 oficial, un director de obra, 01 auxiliar de residente, Breaker de totalizador, herramienta menor, circuitos,

canaleta 3) observaciones de la interventoria: Se solicita se realicen las contingencias para cumplir con la fecha de entrega pactada; de igual manera se solicita se indique como fue afectado por el paro. 4) Requerimientos de la entidad: NO PRESENTA 5) observaciones del contratista: Solicitamos a la interventoria un plazo para iniciar trabajos el dia 26 de Noviembre de 2019 y estos trabajos se entregarian en dos semanas ya que el proveedor nos quedo mal. 7) decisiones tomadas: no presenta 8) FIRMAS: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria. Firma: ____ Nombre: ____ Cargo: ____ Firma: ____ Nombre: Alejandro Cortés cargo: Director de Obra Cargo: ____

4-12-2019 Hora de inicio: 7:00Am - Hora termanacion: 5:00Pm Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista se encuentra realizando actividades en el tablero electrico: Se tapa la canaleta; se conectan los distintos circuitos, se peina el tablero, se retira la bandeja, se instala el bicicher de totalizador, se cableo 2) Materiales y recursos disponibles: 1 tecnico electricista, 1 oficial, un director de obra, un ingresidente, un auxiliar de residente, herramienta menor, circuitos 3) observaciones de la interventoria: la interventoria, nuevamente reitera al contratista cumplir con el cronograma de trabajo aprobado por la interventoria para realizar el recibo a satisfacción se solicito la entrega de planos firmados, memorias de calculo, el registro fotografico del antes y despues y los certificados de calidad de los materiales utilizados. 4) Requerimientos de la entidad: No presentaTTO 5) Eventualidades: No Presenta 6) obras

no previstas: No Prevenda 7) bedciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente de Interventoria Firma: Luisa Fernanda Guevara
Nombre: _____ Cargo: _____
Firma: _____ Nombre: Alejandro Cortés
cargo: Director de Obra Firma: _____
05-12-2019 Hora de inicio: 7:30AM - Hora terminación: 5P
Estado del clima: Soleado. 1) descripción de actividades: se continua trabajando en el tablero electrico: Se realizo la conexión de amarre y distribución, instalación de acometida, se hace desconexion (desistalación) de canaleta y se reconecto.
2) materiales y recursos disponibles: un tecnico electricista, un director de obra, un residente, un auxiliar de residente, un oficial, herramienta menor, taladro, canaleta, circuitos, breicher. 3) observaciones de la interventoria: Nuevamente se reitera su obligación contractual frente al Anexo 1 Anexo Tecnico y temas relacionado con el profesional SISO numeral 6.3. Se reitera dar cumplimiento y acompañamiento en los procesos. Es fundamental que el personal cuente con la dotacion de EPP. los servicios que se compran debe cumplir especificaciones Tecnicas
4) Requerimientos de la entidad: no presenta 5) Eventualidades: no prevenda 6) obras no previstas: No prevenda 7) bedciones tomadas: No prevenda 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara. cargo: Residente Interventoria Firma: _____
Nombre: _____ Cargo: _____
Firma: _____ Nombre: Alejandro Cortés
cargo: Director de Obr. Firma: _____
06-12-2019 Hora de inicio: 7:00AM - Hora terminación: 5:00PM
Estado del clima: Soleado 1) descripción de las actividades: Se realiza el desmonte del tablero electrico, se hace la construcción

del muro donde se retiro el tablero. y se continua trabajando en el cableado del tablero. 2) Materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un ingeniero residente, un tecnico electricista, un oficial, un ayudante, herramienta menor, taladro, canaleta, 3) observaciones de la interventoria: Se solicita la presentación del informe semanal y dar cumplimiento a la entrega de información a la interventoria sobre los avances de obra para que pueda facturar las actividades en el periodo del mes de diciembre. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Pedidiones tomadas: No presenta. 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Cargo: Firma: Nombre: Alejandro Cortés Cargo: Director de Obra Firma:

07-12-2019 Hora de inicio: 7:00AM Hora terminacion: 5 pm Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista continua trabajando en muro donde se encontraba el tablero que se retiro se hace el pañete y se realiza pintura del mismo. Tambien se continua en la instalación de las acometidas y conexion del tablero 2) Materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un residente, un auxiliar de residente, Un tecnico electrico, Un oficial, un ayudante, herramienta menor. 3) observaciones de la interventoria: Se solicita cumplir con el cronograma aprobado por la interventoria, fecha de entrega 9-12-2019. De no terminar en la fecha indicada se solicita presentar plan de contingencia y la justificacion para determinar el tiempo otorgado para el cumplimiento de actividad. 4) Requerimientos de la entidad: No #8

presenta 5) eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) desiciones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente Interventoria Firma: ——— Nombre: ———
Cargo: ——— Firma: ———
Nombre: Alejandro Cortés cargo: Director de Obra
Firma
8-12-2019 Hora de inicio: 7:00Am - Hora terminación: 3:00pm Estado del clima: lluvias en horas de la tarde. 1) descripción de las actividades: El contratista continua trabajando en el tablero electrico y su cableado a las tomacorrientes. 2) materiales y recursos disponibles: Un tecnico electrico, un oficial y un ayudante, herramientas menores taladro, Pulidora. 3) observaciones de la interventoria: el tablero ya se encuentra montado y las cajas de las tomas para maquina carta Papel ubicadas de acuerdo a la instrucción del personal de la SDM se encuentran instaladas/esta pendiente cableado 4) Requerimientos de la entidad: No presento 5) Eventualidades: no presenta 6) obras no previstas: No presento 7) desiciones tomadas no presenta. 8) Firmas: Nombre: Lynda Paez Cargo: R. interventoria Firma:
Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria
Firma: ——— Nombre: Alejandro Cortes Paez
cargo: Director de Obra Firma:
10-12-2019 Hora de inicio: 7:00 am - Hora terminacion: 5:00pm Estado del clima: soleado 1) descripción de las actividades: Se realiza la instalación de dos toma corrientes trifasicas para esto se utiliza un andamio, con sus respectivas recomendaciones de area SST. Actividades SST: Se observa que no hay acompañamiento SISO. La interventoria realiza acta de observaciones de acuerdo con las obras ejecutadas en

vista que de acuerdo con el cronograma las actividades se terminaban y entregaban el 9-12-2019. Cumplir con las observaciones. 2) Materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un residente de obra, una profesional siso, un tecnico electrico, un oficial, un ayudante, herramienta menor, Andamio. 3) observaciones de la interventoria: Para la interventoria la entrega esta programada para el dia 10-12-19 ya q' el contratista inicio trabajo el dia 28-11-19 ya q' hubieron problemas con los paros estas actividades se retrasaron. Se pidio solicitud el 22-11-19 para q' se movieran las cajas ya q' impedian inicia trabajo. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: no presenta 6) obras no previstas: no presenta 7) decisiones tomadas: No presenta .8) Firmas: Nombre: Lynda Paez Cargo: Residente interventoria 2 Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Luis Alejandro Cetó Cargo: Director de Obra Firma:

11-12-2019 Hora de inicio: 7:00 AM - Hora terminacion: 5pm estado del clima: Lluvias desde las 2:00 pm 1) Descripción de las actividades: se realiza la identificacion y rotulacion de circuitos del tablero electrico. Por otra parte se realiza la pintura de la pared donde se encontraba el otro tablero que de retiro. Adicionalmente se coloca el Plano de unifilar al tablero para la identificación de circuitos. 2) Materiales y recursos disponibles: Un director de obra, Un residente de obra, un tecnico electricista, Un oficial, un ayudante, herramienta menor. 3) Observaciones de la interventoria: Se le reitera al contratista q' debe sacar los escombros el dia de hoy. el contratista realizo la pintura de todo el muro para verificar la presentación por la afectación

de las demoliciones y regatas y asi entregar trabajos de calidad a nivel de acabados, se entrega plano con las capacidades de las proteccion
4) Requerimientos de la entidad: No presenta
5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Desiciones tomadas no predenta 8) Firmas: Nombre: Lynda Forero
Cargo: R. Interventoria 2 Firma:
Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria
Firma: Nombre: Juan Alejandro Cortes
cargo: Directa de Obra Firma:
12-12-2019 Hora de inicio: 7:00am - Hora terminación: 5:00pm
Estado del clima: Soleado 1) descripción de las actividades: Se continua trabajando en la pintura de la bodega 2) materiales y recursos disponibles: Un director de obra, Un ingeniero residente, Un oficial, un ayudante, Un auxiliar de residente herramiento menor, radillo, brocha, Andamio
3) observaciones de la interventoria: Se solicita el retiro de escombros producto de los trabajos realizados y presentar el informe respectivo, dando cumplimiento al numeral 20 de la Clausula Quinta: Obligaciones Especificas del contratista con la disposicion adecuada de RCD.
4) Requerimientos de la entidad: No presenta
5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas 7) Desiciones no tomadas: no presento
8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria
Firma: Nombre: Cargo:
Firma: Nombre Alejandro Cortés Cargo: Directa de Obra Firma:
13-12-2019 Hora de inicio: 7:00 AM - Hora Fin
Estado del clima: Soleado. 1) descripción de las actividades: El contratista en horas de la tarde del dia de ayer 12 - diciembre realizo el retiro de escombros de la sede. 2) materiales y recursos disponibles: Un auxiliar de residente un oficial, un ayudante, Una volqueta

3) observaciones de la interventoria: Remitir a la interventoria los documentos, certificados de calidad y documentación para realizar el acta de recibo a satisfación y los planos (diagrama unifilar) electricos debidamente firmados.
4) requerimientos de la calidad: No presenta
5) Firmas: Nombre: Juan Fernando Gaviria cargo: Residente Interventoria Firma: [signature] Nombre: _____
cargo: _____ Firma: _____
Nombre: Alejandro Cortés cargo: Director de Obra
Firma: [signature]

LIBRO DE OBRA

SIN ALMACEN

17

Observaciones actividades SST: Se solicita el acompañamiento del profesional SISOMA en los frentes de trabajo y se dejen plasmadas las instrucciones y recomendaciones en Bitacora. Se recuerda que se deben adoptar medidas necesarias para que el personal cumpla con todas los elementos de Seguridad.
Firmas: Nombre Luis Fernando Guevara Cargo: Residente Interventoria
Firma: Luis Fernando Guevara Nombre: Lynda Paez
Cargo: Residente interventoria Firma

29-11-2019 Hora inicio: 7:00Am - Hora terminación: 2:00pm
Estado del clima: parcialmente nubiado
1) Descripción de las actividades: El contratista realiza la limpieza del cartucho, realizando el desmonte del orinal, se saca el cartucho se limpio se desinfecto y se volvio a instalar. 2) Materiales y recursos disponibles: Un ingeniero residente, un oficial de obra, herramientas menores, desinfectante.
3) observaciones de la interventoria: Se solicita se remita los documentos del frente Fontes y cronograma de andajes C 113 y almacén, en medio fisico y debidamente firmados para el aval de la interventoria.
4) Requerimientos de la entidad: No presenta
5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas no presenta 7) Decisiones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Luis Fernando Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Luis Fernando Guevara
Nombre: Lynda Paez Cargo: Residente Interventoria
Firma: Nombre: Alejandra Cortes Cargo: Director de Obra Firma: Nombre: Andres Orrego Rivera. Cargo Obra Firma:

9-12-2019 Hora inicio: 7:00am - Hora de terminación: 5 Pm
Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista realiza la intervención en la bodega, en el baño ya que se hace retiro de pintura por humedad, se realiza limpieza de las paredes retirando

4) Requerimientos de la entidad: NO presenta 5) Eventualidades: NO presenta 6) obras no previstas: NO presenta 7) decisiones tomadas: NO presenta 8) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma: Luisa Fernanda Guevara Nombre: Lynda Paez C. Cargo: Residente interventoria 2 Firma: Nombre: Alejandro Cortés cargo: Director de Obra Firma:

11-12-2019 Hora de inicio: 7:00AM - Hora terminación: 5:00Pm Estado del clima: Lluvias desde las 2:00pm 1) descripción de las actividades: Se continua realizando la pintura de la bodega (4) pero por requerimiento de los Funcionarios de la Sede requieren que se aplique pintura de esmalte en las bodegas 4, 2, 1 por lo que de le aplica a la bodega 4 pintura de aceite. 2) materiales y recursos disponibles: un oficial, un residente, un ayudante, herramienta menor, Pintura, brocha, rodillo, Andamio. 3) observaciones de la interventoria: Se le reitera al contratista q' en la aplicación de la pintura para las bodegas q tiene q pintar utilize koraza. 4) Requerimientos de la entidad: NO presenta 5) Eventualidades no presenta 6) obras no prevista: No presento 7) decisiones tomadas: No presenta 8) Firmas: Nombre: Lynda Paez C. cargo: Interventoria 2 Firma: Nombre: Alejandro Cortés cargo: Directo Firma: Nombre Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente Interventoria Firma: Luisa Fernanda Guevara

12-12-2019 Hora de inicio: 7:00AM - Hora de terminación: 5Pm Estado del clima: Soleado 1) descripción de las actividades: El contratista continua realizando la pintura de la bodega numero cuatro (4). 2) MATERIALES y recursos: un director de obra, un ingeniero residente un auxiliar de residente, un oficial un ayudante herramienta menor, pintura, brocha, rodillo Andamio, espatula, escobo:

de los Trabajos) Especialmente se recomienda tener herramientas para trabajos industriales. 4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Firmas: Nombre: Lynda Perez Cargo: R Interventoria2 Firma: Nombre: Alejandro Cortés Cargo: Directa Obra Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente Interventoria Firma:

16-12-2019 Hora de inicio: 7:00am - Hora terminacion: 5:00 pm. Estado del clima: Soleado 1) descripcion de las actividades: Se realiza el retiro de los tablas que se encuentran sobre el andamio (instanteria metalica) Se realiza la pintura de una parte de la bodega numero dos (2) 2) materiales y recursos disponibles: un auxiliar de residente, un oficial de obra, un ayudante, herramienta menor, pintura, brocha, rodillo, espatula 3) observaciones de la interventoria: se confirma q' el personal no estuvo trabajando el dia de ayer 15-12-19 por estar trabajando en otra sede 4) Requerimiento de la entidad: no presento 5) Firmas: Nombre Luisa Fernanda Guevara H Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Lynda Perez Cargo: R Interventoria2 Firma: Nombre: Alejandro Cortés Cargo: Directa de Obra Firma:

17-12-2019 Hora de inicio: 7:00 a m - Hora terminación: Estado del clima: soleado 1) descripción de las actividades: El contratista continua realizando el corte de la instanteria metalica en la bodega numero dos (2). Se realiza acta de vecindad en las bodegas 1 y 2: Bodega 1: - Pisos: se encuentran con escombros, fisuras y disnivel - Paredes: Se observan con humedad, pintura deteriorada, soplada y con grietas - Tejas: Se encuentra teja transparente con Fisura y otra pandeada se evidencia Filtracion de agua - Lamparas 12 - 4 de ellas prenden Bodega 2: - Pisos: Fisurados y con desnivel - paredes agrietadas en el muro de mamposteria izquierdo se encuentra con dos fisuras y el que divide la bodega 1 y 2 se encuentra dilatado

Firma

madera de la instanteria para poder realizar los cortes. Se realiza pintura bodega dos (2). El Ing Javier peñaranda hace el recorrido en almacen y das las indicaciones para el trabajo de tablero electrico y salidas de iluminacion, se va instalar acometida nueva para iluminacion, instalacion de Tablero para los circuitos con espacio Totalizador, proximamente por area y cantidad segun requisitos y reflectores. 7) bodega) todo) con luz; cada bodega con su Breaker de proteccion.

2) materiales y recurso disponibles: Un director de obra, un ingeniero residente, un auxiliar de residente, un ayudante, dos oficiales herramienta menor, brocha, rodillo, pintura.

3) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Andres Urrea cargo: Residente Obra Firma: Nombre: Alejandro Cortes cargo: Directo de Obra Firma Nombre: Andres

19-12-2019 Hora de inicio: 7:00 AM - Hora terminación: 5:00 pm Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista termina la pintura en la bodega Número dos. Por otra parte realiza el resane de la bodega numero uno y la pintura en la bodega numero tres. Se verifican las medidas de la zonas afectadas a las cuales se les realizo resane en la bodega uno: de 4,395 m^2 y estuco 3,192 m^2. De la bodega 3: 5,7 m^2 de resane. 2) materiales y recurso disponibles: Un auxiliar de residente, un ayudante, dos oficiales. 3) observaciones de la interventoria: la interventora verifico las medidas de los resanes de Bodega 1 y 3 y se le reitera al contratista q' cambie la teja en mal Estado y la teja de bodega (5) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H. Cargo: Residente Interventoria Firma: Nombre: Lynda Paz Cargo: Interventora Firma: Nombre: Luis Alejandro Cortés Páez cargo: Directo de Obra. Nombre:

y con lluvias en las horas de la tarde
7) Descripción de las actividades: El contratista continua realizando los cortes de la instanteria metalica. Por otra parte se continua la pintura de la bodega numero (1) uno. 2) Materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un residente, un auxiliar de residente, dos oficiales, un ayudante
3) observaciones de la interventoria: Se le reitera al contratista el cambio de tejas en bodega 5 y bodega 2. y tambien del cartucho larga vida para la sede de almacen de forma urgente y inmediata, se le recomienda q' utilice correctamente la dotacion y el acompañamiento del personal siso, se le reitera el arreglo de las canales en las bodegas indicadas.
4) Requerimientos de la entidad: No presenta
5) Eventualidades: No presenta 6) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Covevana Hernández Cargo: Residente Interventoría Firma
Nombre: Linda Paez Cargo: Interventora Firma
Nombre: Alejandro Cortés Cargo: Director de Obra Firma:
2-12-2019 Hora inicial: 7:00 a.m Hora terminación: 7:00 p.m
Estado del clima: Soleado 7) Descripción de las actividades: El contratista continua realizando el corte de la instanteria metalica 2) materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un residente, un auxiliar de residente dos oficiales, un ayudante, herramienta menor, Pulidora 3) observaciones de la interventoria: se le recomienda al contratista q' mitigue la afectación de los trabajos en el área q' el personal utilice correctamente la dotación q' el acompañamiento del personal siso se le reitera el cambio de cartucho larga vida para la sede almacen de forma urgente y inmediata y q' el personal utilice todos la dotaciones de forma adecuada. Cumplir con las fechas solicitadas por la entidad.
4) Requerimientos de la entidad: No presenta 5) Eventualidades: no presenta 6) Obras no previstas: no presentan

7) Firmas: Nombre: Lynda Paez cargo: R interventoria
Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H.
Cargo: Residente de Interventoria Firma Luisa fernanda Guevara H.
Nombre: Alejandro Cortes cargo: Director de Obra
Firma:

23-12-2019 Hora de inicio: 7:00Am- Hora terminacion: 5Pm
Estado del clima: Soleado 1) Descripción de las actividades: El contratista continua realizando el corte de la instalación metalica. Adicionalmente se realiza la pintura de la bodega numero Uno (1). Por otra parte se hace el cambio de dos tejas plasticas blancas en la bodega 2 y 5. 2) materiales y recursos disponibles: un director de obra, un ingeniero residente, un auxiliar de residente, dos oficiales, un ayudante, taladro (pulidora), herramienta menor. 3) observaciones de la interventoria: Se le reitera al contratista el cambio de cartucho larga vida para la sede almacen de forma urgente y inmediata se le recomienda q utilice correctamente la dotación y el acompañamiento del personal sisa, se le reitera el arreglo de las canales en las bodegas indicadas. Tener en cuenta las fechas de entrega
4) Requerimientos de la entidad: NO presenta 5) Eventualidades: NG Presenta
6) obras no previstas: no presente
7) Firmas: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H Cargo: Residente Interv.
Firma: Luisa fernanda Guevara H Nombre: Lynda Paez C.
cargo: R Interventoria Firma:
Nombre: Alejandro Cortés cargo: Directo de Obra
Firma:

24-12-2019 Hora inicio: 7:00Am - Hora terminación: 5:00Pm
Estado del clima: soleado 1) descripción de las actividades: El contratista continua realizando la pintura de la

bodega numero uno (1). Por otra parte se termina de pintar la bodega numero 3 tres. Esta pendiente por entregar. 2) materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un residente, un auxiliar de residente, dos oficiales, un ayudante herramienta menor, pintura 3) observaciones de la interventoria: Se le reitera al contratista el cambio de cartucho larga vida para esta sede de forma urgente y inmediata se le recomienda q utilice correctamente la dotacion y el acompañamiento del personal: solo, se le reitera el arreglo de canale) en la) bodega) indicada)
4) Requerimientos de le entidad: No presenta 5) Eventualidades: No presenta 6) obras no previstas: No presenta 7) Firmas: Nombre: Firma: Cargo: Interventora
Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara Cargo: Residente de Interventoria Firma: Nombre: Luis Alejandro Cortés Cargo: Director de Obra Firma:
6-12-2019 Hora de inicio: 7:00am Hora terminacion: 5pm Estado del clima: soleado 1) descripción de las actividades: El contratista continua realizando la pintura de la bodega número uno (1). Por otra parte esta en espera de la aprobacion del APU de corte de instantaneria metalica que de tramito con el oficio 5om-OF-125 el 23 de diciembre de 2019. Espera de respuesta para continuar con la actividad. 2) materiales y recursos disponibles: Un director de obra, un ingeniero residente, un auxiliar de residente, dos oficiales, un ayudante, herramienta menor, pintura 3) Observaciones de la interventoria: Se le reitera al contratista el cambio de cartucho larga vida para esta sede de forma urgente y inmediata y utilice todos la) dotacione)

Firma

encuentra el encargado miguel y no se pueden abrir las bodegas porque no estan las llaves. 2) materiales y recursos disponibles: Un oficial, un ayudante 3) observaciones de la interventoria: el resto estuvo hasta la 10:00 am el contratista llego a trabajar al frente de Trabajo a las 10:30 am. se le reitera al contratista el cambio de cartucho larga vida para la sede Almacen de forma urgente y inmediata y se le recomienda utilice correctamente la dotación y el acompañamiento SISO, se le reitera el arreglo de cerca 4) Requerimientos de la entidad: no se presentan 5) Eventualidades: No se presentan 6) obras no previstas: No se presentan 7) Firmas: Nombre: Lynda Paez cargo: R. interventoria 2 Firma: Nombre: Luis Fernando Guevara cargo: Residente Interv. Firma: Nombre: Alejandro Cortes Cargo: Director de Obra Firma:

29-12-2019 Hora inicio: _____ Hora terminacion: _____

1) Descripción de las actividades: El dia anterior en horas de la noche Sonia Mireya alfonzo nos informo que las llaves no se encontraban en el sitio por lo cual solicitaron programar realizar las actividades hasta el dia lunes. 3) Observaciones de la interventoria: Se le Reitera al contratista el cambio de cartucho larga vida para la sede Almacen de forma urgente y inmediata, Se le pide al contratista una nueva Reprogramacion para el dia lunes. 4) Requerimientos de la entidad: Se autorizo el ingreso pero informan que no se tienen las llaves por lo cual solicitan que programen la actividad para el dia lunes 5) Eventualidades: No se presentan 6) Firmas: Nombre: Luis Alejandro Cortés Paez Cargo: Director de Obra Firma: Nombre: Lynda Paez Cargo: R. Interventoria 2 Firma: Nombre: Luis Fernando Guevara Hernandez Cargo: Residente Interventoria F. rma:

_____ , _____ , _____

mejora el acabado; en cuanto al corte de las estanterías, por ser una actividad que requirio mayores recursos para su ejecución, se paso el ADV el 23 de Diciembre de 2019 y esta a la espera de su aprobación. 5) Firmas: Nombre: Luis Alejandro Cortés Paez. Cargo: Director de Obra. Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H. Cargo Residente Interventoria Firma: H.

1-01-2020 Dia Festivo y no se ejecután actividades en la sede

2-01-2020 Hora de inicio: 7:00 a.m Hora terminación: 4:00 p.m Estado del Clima: Soleado. 1) Descripción de actividades: Se realiza orden y aseo de las bodegas No 1 y No 2 por las actividades de pintura y corte de estantería. Luego se realiza 3er mano de pintura en los baños del segundo piso de las oficinas. 2) Materiales y Recursos: Director de Obra, 1 oficial y 1 ayudante, pintura blanca y herramienta menor. 3) Observaciones de la interventoria: Con relación a la propuesta a nivel de sistema para extracción de olores, la propuesta no se acepta porque la esta planteando como servidumbre sobre vecinos y no se puede realizar por lo que se solicita se realice otra propuesta con el sistema mecanico de extracción pero utilizar la cubierta con el cambio de teja por una que tenga buitron o ducto que se pase por el cielo raso para desembocar ventanas we hombres. Se solicita que se presente a la interventoria la solución de caracter urgente y remitir a la entidad la propuesta con valor economico. Se le recuerda que las propuestas llevan un analisis, una programación, presupuesto y cronograma de ejecución, con ventajas y desventajas. 4) Observaciones del contratista: se revalua la propuesta presentada y se plantea no realizar esta ventilación en la servidumbre, sino que se propone realizar en la fachada. 5) Firmas: Nombre: Luis Alejandro Cortés Paez. Cargo: Director de Obra. Firma: Nombre: Luisa Fernanda Guevara H. Cargo: Residente de Interventoria Firma: H.

KING CO
KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

ACTAS DE COMITÉ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG	
	GESTION ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PRO-F02	Version 1.0

TEMA:

Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA 3-12-19 HORA 8:30 LUGAR Calle 13

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Arq. Lynda Paez	Interventoria
Aux. Margid Barrera	Contratista
Heidy Posada	Jefe de Aseo SDM

2. ORDEN DEL DIA

1) Entrega de elementos faltantes de aseo empleados por el personal del contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNION

La interventoria revisa el acompañamiento con la entidad para hacer entrega de los elementos faltantes de aseo del Item reposición de elementos de aseo empleados por el personal del contratista sin autorización del personal del contrato de aseo. El contratista realizo la atención con la entrega del acta de reposición de elementos de aseo. Se entrego los elementos de aseo a la señora Heidy Posada un trapero, 1 escoba, 1 recogedor, 1 balde de 12 litros, 3 balletillas rojas, 1 canera ecologica y un termo de 9 litros, la jefe de aseo Heidy habia confirmado esta entrega pero por correo electronico se hizo una verificación de la información diciendo que estaba pendiente una canera de 10 litros y un balde de 5 litros la señora explica que son 3 baldes de 5 litros se hace entrega de los 3 baldes de 5 litros y queda a paz y salvo.

420

1/3

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Quedan a paz y salvo		

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-PR01-F01	Versión 1.0

TEMA: _____ **LUGAR:** _____

RESPONSABLE: _____ **FECHA/HORA:** _____

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
17	Lynda Paez	Interventoría	Residente 2	3108744111	lynda@sehorma	
18	HEIDY POSADA.	ERINSER SAS.	SUPERVISORA	3232833049	HEIDYPE@gmail.com	
19	MARGIE BARRERA BELLO	CONTRATISTA	AUX Residente	3765208844	margiebarrera@elbog	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

GESTION ADMINISTRATIVA

Formato acta de reunión

CÓDIGO: PA01-PRO-F02 | Versión 1.0

TEMA: RECIBO CON OBSERVACIONES TABLERO ELECTRICO - TOMAS INDUSTRIALES.

FECHA: 09-12-2019 | HORA: 2:37 P.M. | LUGAR: SEDE FALOMIRAO.

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
ING. ADRES VARELA	C. / Residente Obra Khalifa Construcciones
TECNICO ELECTRICISTA YESITH TUNJANO.	
ARQ. LUISA FERNANDA GUEVARA.	Residente Interventoria Consorcio Intermovilidad

2. ORDEN DEL DIA

REQUERIMIENTOS: - TABLERO ELECTRICO, TOMA INDUSTRIALES PARA
- MAQUINA CORTA PAPEL

3. DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Se atiende el requerimiento de la entidad de realizar el recibo de los trabajos en la Sede Puente Aranda.
2. La interventoría levanta acta de recibo con observaciones teniendo en cuenta que el contratista continuan ejecutando actividades.
3. El contratista informa a la interventoría que no se pudo cumplir con la fecha de entrega inicialmente pactada 7/12/19 y solicita se dejen en el acta los motivos y tenerlos en cuenta:
   A. Para el 22 de noviembre se solicita a la entidad el retiro de las cajas que encontraban ubicadas en el área de trabajo; solo hasta el dia 25/11/2019 los funcionarios de la Sede Puente Aranda realizaron el retiro de las cajas.
   B- Tener en cuenta que por motivos del "Paro" no se trabajo por un periodo de tres (3) días. El personal por motivos de seguridad fue retirado de las instalaciones.
   C- Los proveedores de insumos se localizan en el centro igualmente se dificulto entregas y/o el suministro porque se presento el cierre de los establecimiento por el PARO.
3. El contratista solicita se realice el recibo de los trabajos para el dia 10/12/2019.
4. La interventoría realizo acompañamiento y verifico que esto

la entidad; por lo mismo la interventoria presentara el informe correspondiente para dejar la evidencia.

4. Se solicita por parte de la interventoria al Técnico electrisista presente una descripción de las actividades y como esta garantizando la ejecución de los trabajos.
   A- Demolición muro
   B- Regatas en muro.
   C- Instalación caja eléctrica.
   D- Montaje de tablero
   E- Conexiones cableado.
   E- Resanes muro exterior pañete impermeabilizado.
   F- Tendido por muro de ductos EHT.
   G- Instalación de cajas en los puntos indicados por personal de la SDM.
   H- Interno en el tablero se ejecuto: peinado de cableado se instalo caja de paso en la parte lateral exterior para circuitos del área recepción.
   I- Desmonte de tablero, y bandeja del tablero
   J- Desistalación de canaleta metalica de 10x4 sobrante.

5. Actividades pendientes por ejecutar: Conexión de los puntos de las tomas trifasicas al breaker en el tablero. y el retiro de escombros.

El técnico electrisista indica que no hay necesidad de pruebas a los trabajos realizados, el tablero lleva en funcionamiento desde el 2 de diciembre de 2019 sin que el las áreas se presentara alteraciones de energía. A las tomas solos se les realizaría una medición de tensión y seguimiento una vez entre en funcionamiento.
El técnico electrisista reporta que para realizar los trabajos desenergizo solo por 2 horas la sede. Sin que esto perjudicara el trabajo de los funcionarios pues así se había programado.

1 Pendiente de entrega: Cuadro de cargas, diagrama unifilar e identificación y marquillado de tablero. Se entregaria para el jueves 12-12-2019.

3 La interventoria realiza un apagado y encendido de los breakers

~~101~~ 403

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA	Seguimiento Contrato de mantenimiento - Sede policia Metropolit.		
FECHA	12 diciembre de 2019	HORA 7:00 AM.	LUGAR Direc. Administrativa.

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se Anexa listado	

2. ORDEN DEL DÍA
Revisión de temas pendientes en la sede de Policia Metropolitana y compromisos al respaldo.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Al respaldo se establecen cada uno con las respectivas fechas.		

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Luisa Fernanda Guevara

415

1/3

343-476

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Listado de asistencia a reuniones y eventos

Código: PA01-PR01-F01 | Versión 1.0

TEMA: Seguimiento Contrato Mantenimiento Policia LUGAR: Sede Calle 13 - Administrativa.

RESPONSABLE: _____ FECHA/HORA: 12 diciembre de 2019.

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Oscar Fdo Saavedra C.	SDM-SCTT	Contratista	7105	Osaavedra@movilidad..	
2	Claudia M Amaya P	SDM-SA	Contratista	6405	camaya@movilidadbogota.gov	
3	Laura Fernanda Bueyana	Interventoria	Residente	3212081041	lauraf.g.b@gmail.co	
4	Luis Alejandro Cortés	Contratista	Director	3143199909	alejandrocortesingenieria	
5	Jaime Ernesto Guerrero.	SDM-SA	Prof. Esp.	6405.	jguerrero@movilidad	
6	Hernan Cortes	Sub contra	Ehalifa		hcctotal@gmail.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

GESTION ADMINISTRATIVA

Formato acta de reunión

CÓDIGO: PA01-PRO-F02 | Version 1.0

TEMA: Entrega de Cerradura y Drivers.

FECHA: 16 enero 2020 | HORA: | LUGAR: Calle 13.

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Gonzalo Torres.	SDM.
Dayana Bahamon.	Interventoria
Jorge Bustos.	Aux Residente Obra

2. ORDEN DEL DIA

Entrega de la cerradura para Super Code. Requerimiento de 3 fecha

Entrega de veinte (20) drivers Requerimiento del 16/10/2019

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Se realizo la entrega de una chapa y 20 driver al Señor Gonzalo Torres Jefe de mantenimiento en la oficina Piso Zona parqueadero Calle 13

427

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

GESTION ADMINISTRATIVA

Formato nota de reunión

CÓDIGO: PA01-PRO-F02 | Version 1.0

TEMA: VISITA TECNICA

FECHA 19-12-19 | HORA 10.15am | LUGAR policía metropolitana

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Ing. Luis Alejandro Cote	Contratista
Arq. Lynda Paez	Interventoría
Yesith Tangarife	Tecnico contratista
Ing. Ernesto Camacho	SDM - SM

2. ORDEN DEL DÍA

a.) Revisión del sistema electrico

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De acuerdo a la revisión realizada en el area de Sanidad de la sede Metropolitana se revisó el compresor y se verificó q' no estaba en funcionamiento, las posibles causas son el daño de condensador, falla mecánica del equipo, las posibles soluciones, hacer un mantenimiento correctivo cambiar condensador o desarme de equipo y verificar q' las piezas mecanicas esten en buen estado, después se revisó tableros de distribución tanto regulado como tablero normal y se verifico q' estan en buen funcionamiento. Se revisó con multimetro la tensión de la toma para el equipo y se observó una de 104 voltios de tensión. La tensión se encuentra abajo de lo normal el estandar esta entre 105 y 115 voltios, esto se debe a posibles causas como una fuga de tensión, corriente parasitas, retorno de corrientes, caidas de tensión.

428

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL SALVO EL SISTEMA MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formato acta de reunión

CÓDIGO: PA01-PRO-F02 | Versión 1.0

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS

Luis Alejandro Castro
Contratista - Director

Tec Electrónica

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

429 2h

INTER MOVILIDAD 2019
CONSOCIO

Bogotá, 05 de enero de 2020.

Recibí: Se Tapia aceptado
No. 07-01-2020
3:58 p.m.

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Attn, **Sonia Mireya Alfonso Muñoz**
Subdirectora Administrativa
Supervisora Contrato 2019-1653
Bogotá D.C

RI -1653-2019 052

REFERENCIA: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO - 1601 DE 2019

ASUNTO: ENTREGA ACTA DE RECIBO SEDE POLICIA METROPOLITANA, BALANCE, "CUBIERTA DEL ARMERILLO (FILTRACIONES, ALTURA, LAS JUNTAS CORREGIRSE, SELLADAS E INCLINACION QUE DRENE AL LADO CONTRARIO DE LA PARED, COLOCARSE DEBAJO DE LA VIGA), RETIRAR LAMPARA DE BAÑO CONTIGUA AL SHUT, PINTURA DEL CIELORASO DE LA PELUQUERÍA Y CORRECCIÓN PUERTA INTERNA DEL ARCHIVO".

Cordial saludo

Por medio de la presente, esta interventoría hace entrega de la trazabilidad de los documentos que soportan las actividades referentes al asunto de la referencia, para revisión y verificación por parte de la Entidad, de acuerdo a las condiciones contractuales.

1) **CORREO ELECTRONICO** LLAMADO DE ATENCIÓN REQUERIMIENTOS NO CUMPLIDOS SEDE POLICIA METROPOLITANA- CONTRATO DE OBRA 1601 DE 2019 3 DE ENERO DE 2020 A LAS 13:46
2) **ACTA DE REUNIÓN** de fecha 27 de Diciembre de 2019 Tema: Inspección de obras Seccional Transito.
    i) CORREO ELECTRONICO **INVITACION: SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SEDE DE LA POLICIA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019 3:30 PM**
    ii) CORREO ELECTRONICO **INASISTENCIA CONTRATISTA DE OBRA 27 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 13:26**
3) **ACTA DE RECIBO PARCIAL CON OBSERVACION SEDE POLICIA METROPOLITANA** de fecha 27 de diciembre de 2019.
4) **ACTA DE COMITÉ:**
    a) **ACTA DE REUNIÓN** de fecha 29 de octubre de 2019 Tema: Recorrido Frente de Trabajo Policía Metropolitana,
    b) **ACTA DE REUNIÓN** de fecha 12 de diciembre de 2019 Tema: Seguimiento Contrato de Mantenimiento – Sede Policía Metropolitana,
    c) **ACTA DE REUNIÓN** de fecha 24 de diciembre de 2019 Tema: Seguimiento obras Policía Metropolitana.

Gmail

CONSORCIO MOVILIDAD <cintermovilidad2019@gmail.com>

LLAMADO DE ATENCIÓN REQUERIMIENTOS NO CUMPLIDOS SEDE POLICIA METROPOLITANA- CONTRATO DE OBRA 1601 DE 2019

1 mensaje

CONSORCIO MOVILIDAD <cintermovilidad2019@gmail.com> 3 de enero de 2020, 13:46
Para: KHALIFA SDM MOVILIDAD <Khalifa.sdmovilidad@gmail.com>
Cc: Sonia Mireya Alfonso Muñoz <salfonso@movilidadbogota.gov.co>, Jahir Ernesto Guerrero Rozo <jguerrero@movilidadbogota.gov.co>, Mantenimiento SDM <mantenimientosdm@movilidadbogota.gov.co>, CONSORCIO MOVILIDAD <cintermovilidad2019@gmail.com>, Claudia Marcela Amaya Pedraza <camaya@movilidadbogota.gov.co>

ACTA DE RECIBO CON OBSERVACIONES POLICIA M...

Ingenieros

KHALIFA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Ing. Luis Alejandro Cortes Paéz
Director de Obra
Ing. Leonardo Rodriguez Buenhaver
Representante Legal

Un cordial Saludo

ASUNTO: **LLAMADO DE ATENCIÓN REQUERIMIENTOS NO CUMPLIDOS SEDE POLICIA METROPOLITANA- CONTRATO DE OBRA 1601 DE 2019**

A) ANTECEDENTES

La Secretaria Distrital de Movilidad firma contrato de obra No. 1601, cuyo objeto corresponde a REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS DIFICACIONES A SU CARGO , con la firma KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, el cual se firma el día 12 de junio de 2019.

Se establece la póliza de cumplimiento No. 320207 con la empresa LIBERTY Y SEGUROS S.A; SEGURADO y como beneficiario SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDADAD

Se firma acta de inicio el día 5 de julio de 2019 entre el contratista de obra KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S y la firma interventoría Consorcio Inter Movilidad 2019 B

A la fecha se cuenta a con 182 días trascurridos desde la firma del acta de inicio de obra.

B) REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA 1601 DE 2019.

Haciendo referencia puntualmente a las obligaciones que le asisten al contratista, se requiere un cumplimiento estricto y detallado de las siguientes obligaciones para la atención de los requerimientos:

• Desarrollar el objeto contractual en condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente contrato incluyendo su anexo técnico y el pliego de condiciones.
• Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor del contrato.
• Cumplir con los tiempos mínimos de respuesta detallados en el Anexo 1 -Anexo Técnico, a los requerimientos radicados por el interventor del contrato, durante los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24) horas del día, en los términos establecidos en el Numeral6.2. del Anexo 1 - Anexo Técnico del Anexo Complementario.

• Garantizar la disponibilidad permanente del personal especializado para realizar el mantenimiento que permita cubrir las necesidades simultáneamente de por lo menos tres (3) de las diferentes sedes.
• Garantizar la disposición permanente en la Secretaría de un Maestro de Obra y ayudante autorizados y facultados por el Representante Legal, para resolver los asuntos que sean requeridos por la entidad. En caso de presentarse actividades simultáneas, la disponibilidad de este personal no podrá afectar la ejecución de las otras actividades
• Garantizar la disponibilidad de personal (mano de obra), maquinaria y elementos solicitados dentro del presente contrato, asumiendo la totalidad de costos derivados de los mismos.
• Disponer y garantizar, en todo momento, de todas y cada una de las herramientas comunes y especializadas, insumes y materiales requeridos para la ejecución de la obra y actividades a realizar.

C) REQUERIMIENTOS DE SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 1601 DE 2019.

El parado **21 de diciembre de 2019**, se realizó talle, para revisión de los requerimientos realizados por la entidad relacionada con la Sede Policía Metropolitana, con la participación del **Ing Andrés Urrea**; de acuerdo a lo pactado se comprometió a subsanar lo siguiente:

1. Generar las memorias de cálculo de las actividades ejecutadas y no cobradas a la fecha para que se incluyan en el balance dichas actividades que están pendientes por generar cobro.
2. Realizar la actividad de corrección a nivel del cable expuesto (En la presentación del acabado), para la luminaria instalada en el hall de baños de la zona de parqueadero.
3. Realizar la actividades reposición de luminaria en la peluquería por daño debido a la atención tardía a la actividad filtración de la poceta de aseo segundo piso.
4. Propuesta técnica, para la solución al domo cubierta de iris, de acuerdo con el comité de fecha 16/12/2019. Nos permitimos recordar que la ejecución de la actividad para dar solución el tema de la cubierta protección iris y protección agua no se logró dar una solución técnica.

Adicionalmente el pasado **26 de diciembre de 2019** se remitió correo electrónico, sin que a la fecha se tenga una respuesta por parte de usted, y con la siguiente observación que reiteramos:

En calidad de interventoría y de conformidad con lo establecido en el Contrato de obra 2019-1601 y demás anexos que lo conforman, y habida cuenta de que se han evidenciado que desde el día lunes el **Ing Andrés Urrea** con el cargo **Residente de obra**, no ha asistido a los frentes de trabajo en intervención, no se ha realizado reporte de actividades en la bitácora de obra, de otra parte, no ha sido entregada la información relacionada con **Policía Metropolitana** a la que se comprometió de acuerdo con la reunión realizada el día sábado 21 de diciembre de 2019.

reiteramos su obligación contractual relacionada con las CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA NUMERAL 17 y CLAUSULA QUINTA:OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA NUMERAL 15 y de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo técnico No. 6.3 Personal mínimo exigido rol Profesional Residente de obra.

De acuerdo a lo anterior, se insta al contratista nuevamente a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con la responsabilidad y oportunidad requerida, para atender el 100% de las solicitudes realizadas a la fecha en los tiempos de respuesta contratados y emitir reportes del cierre de los pendientes.

Nota 1. Nos permite adjuntar el documento generado por la interventoria, relacionada con la observaciones realizadas en el frente de trabajo Policía Metropolitana para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

Luisa Fernanda Guevara H.

432

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA	Seguimiento obras Policía Metropolitana		
FECHA	24/12/19	HORA 7:30 am	LUGAR Calle 13

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Se anexa listado	

2. ORDEN DEL DÍA

Cumplimiento compromiso del acta de 13-12-19 acta de recibo parcial de policía Metropolitana.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Recorrido con Ing. Saavedra. - Revisión para observaciones de la proyección del acta	- Interventoría - Entidad - Policía	9:30am


APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

433

→ El Ing Oscar Saavedra informa que la cubierta del Armerillo no esta en las condiciones que se requiere, presenta filtraciones en este momento, la altura no es la adecuada, por las juntas es donde se presenta la filtración esto debe ser corregido.

Se requiere que la cobierta se ubique justo debajo de la viga, que todas las juntas esten selladas Se requiere que se genere la inclinación de tal forma que drene hacia el lado contrario de la pared.

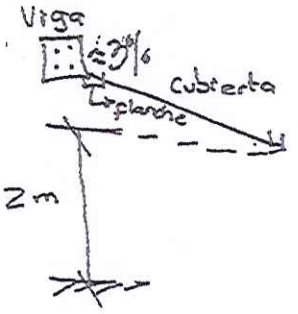

El Director de obra informa que el dia 13 de diciembre a las 2:00pm se entregara a interventoria el detalle con todas las dimensiones para ser avalado y la interventoria con su aval lo remitira a la Entidad por correo electronico mismo y se remitira a Oscar Saavedra.

Con respecto a la lampara del baño contigua al shoot, el Ing Oscar Saavedra solicita que sea retirada, el Director de Obra informa que hoy 12/12/19 queda arreglado este tema, bajo ese compromiso el Ing. Oscar Saavedra acepta para con complimiento hoy de este tema.

A la fecha se tiene pendiente la pintura del cielorraso de la peluqueria el Director de Obra se compromete a realizar esta labor hoy en horas de la tarde, esto no se cobrará toda vez que hace parte de la garantia.

En el area de archivo se debe corregir la puerta interna del archivo sea corregido el dia de mañana 13/12/19.

Se requiere envio del correo electronico con la relación del personal que ingrese de parte del contratista de obra, envio hoy a la Entidad, nombre y cedula, según esto el 17/12/19 la interventoria revizara y se programa proxima reunion el 18/12/19 la Entidad citara, a las 2pm. Para esa dia se requiere acta de recibo de esta sede y Balance, con informe de novedades.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Listado de asistencia a reuniones y eventos	
	Código: PA01-PR01-F01	Versión 1.0

TEMA: Seguimiento Obras Policía Metropolitana LUGAR: Cll 13

RESPONSABLE: _____ FECHA/HORA: 7:30 24/12/19

No.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Claudia Amaya	SDM	Contratista	6405	camaya@movilidad	
2	Luisa Fernanda Guevara H	Interventoria	Residente	3212081041	luisafgh@gmail.com	
3	Lynda Paez	Interventoria	Residente 2	3108744111	lynda915@hotmail.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaria Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formato acta de reunión

CÓDIGO: PA01-PR01-F02 | Versión 1.0

TEMA Inspeccion Obras Seccional Transito

FECHA 27-12-2019. | HORA 3:30 p.m. | LUGAR Seccional Transito

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Luisa Fernanda Guevara	Residente Interventoria
Otoniel Fernando Saavedra Corredor	SDM-SETT - Contratista.

2. ORDEN DEL DÍA

- Revisión obras Ejecutados y correccion observaciones
- Se presenta el documento el ing Saavedra indica que se rodigue para las observaciones de la SDM.
- No se han corregido las observaciones lampara fotovoltaica, cobreta tris

Continua respaldo →

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realiza la prueba de agua a la cobreta tris y presenta filtraciones
- La proteccion de luminosidad, inclinacion no permite la proteccion a los equipos.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
- Entregar el acta a la entidad - Revisión del acta SDM. - Solicitar nuevamente al contratista las correcciones.	- Interventoria - SDM. - Interventor.	27-12-19 7-01-2020 7-01-2020

APROBADO

Claudia Lucia C.
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Luisa Fernanda Guevara

436

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	Listado de asistencia a reuniones y eventos
	Código: PA01-PR01-F01 Versión 1.0

TEMA: Inspección Obras Concesión Tramo 2 LUGAR: Sede Secretaría

RESPONSABLE: Oscar Eduardo Sanabria Caicedo FECHA/HORA: 27-12-2019 - 3:30 p.m.

	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel-Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Carlos Andrés Ortiz	Secretaría	Gestor	4491300 Ext.	carlos.ortiz@movilidadbogota.gov.co	
2	Oscar Eduardo Caicedo	Secretaría	Contratista	3649200 Ext.	oscar.caicedo@movilidadbogota.gov.co	
3	Jorge Fernando Guevara	Interventoría	Residente	3012086852	jorge.guevara@ingeniarcon.com	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad el almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD:

Nº	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	OBSERVACIONES
108	Reposición de dos luminarias (baño de mujeres)	Se realiza la actividad, mediante el ítem contractual 230, 231 ver memoria de cálculo
109	Ajuste toma de luz	Se realiza la actividad, mediante el ítem contractual 231 ver memoria de cálculo.
110	Ajuste divisiones metálicas (baños hombres y mujeres)	Se realiza la actividad, mediante el ítem contractual 231 ver memoria de cálculo.
111	Manija de la unidad sanitaria	N/A
112	Revisión de los aparatos sanitarios (fugas, escapes)	Se realiza la actividad, mediante el ítem contractual 155, 219, 231 ver memoria de cálculo
113	Desmonte de puertas de entrada a los baños de hombres y mujeres las externas	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual** 18 ver memoria de cálculo
114	Reposición señalización baños hombres y mujeres	EL CONTRATISTA REALIZO LA ACTIVIDAD PERO NO HA REALIZADO EL COBRO.
115	Revisión griferia, cambio de push	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual** 155 ver memoria de cálculo
116	Colocación de una parte de la división faltante que está en la parte externa en el baño de los hombres	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual** 258 ver memoria de cálculo
117	Ajuste lámpara baño hombres sobre el sanitario	En el momento de la revisión se encontró que elemento presentaba fallas y se realizó la reposición de la lámpara. Se realiza la actividad, mediante el ítem contractual 230, 231 ver memoria de cálculo
118	Reposición lámparas sobre lavamanos	Se realiza la actividad, mediante el ítem contractual 231 ver memoria de cálculo
119	Revisión y realización de la soldadura de las puertas donde se requiera	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual** 119 ver memoria de cálculo folio 48. Se realizó el ajuste, reparación y mantenimiento del portón metálico se realizó pintura a las puerta y lograr un buen acabado y presentación.
120	Reposición e instalación de roseta sencilla y bombillo ahorrador	Se realiza la actividad, mediante el ítem contractual 236 ver memoria de cálculo.
121	Pintura techo incluye resane	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual** 89 ver memoria de cálculo folio 79, actividad realizada en shut de basura y sanidad.
122	Instalación de cuatro lámparas en la zona de lockers con la conexión eléctrica respectiva	Para la instalación de las lámparas requirió realizar la actividad, mediante los ítems contractuales 231, 235, 242, 243, 247, 253, ver memoria de cálculo.

139	Refuerzo del dry Wall para fijación de la baranda en madera en la llegada al segundo piso	EL CONTRATISTA REALIZO LA ACTIVIDAD PERO NO HA REALIZADO EL COBRO.
140	Reposición de todos los esquineros faltantes en este bloque, metálicos color blanco	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 121.** Ver memoria de cálculo.
141	Reparación del tubo de la poceta de traperos segundo piso que está causando goteo en el primer piso (zona de peluquería)	Se realiza la actividad, mediante los **ítems contractuales 15, 61,167.** Ver memorias de cálculo.
142	Tercer piso, en sala de computo, reposición de estructura de cubierta tipo domo	Se realiza la actividad, mediante la aprobación del ítem de **OBRA NO PREVISTA** gestión y aprobación realizada ante la interventoría **ONP 109** ver memoria de cálculo folio 56 y el anexo aprobación APU.
143	Reposición de puerta de vidrio tercer piso, costado occidental frente a la sala de computo.	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 58** ver memoria de cálculo.
144	Reposición de puerta de vidrio en la oficina jurídica	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 58** ver memoria de cálculo.
145	Reposición de puerta de vidrio subcomando segundo piso con chapa que concuerde con la que está instalada	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 58** ver memoria de cálculo.
146	Revisión y mantenimiento bujes puertas de cafetería primer piso	EL CONTRATISTA REALIZO LA ACTIVIDAD, PERO NO HA REALIZADO EL COBRO.
147	Reposición de push del baño del tercer piso mujeres tercer piso	Se realiza la actividad, mediante el **ítem OBRA NO PREVISTA** NP-70 ver memoria de cálculo.
148	Revisión y arreglo de filtraciones en los baños tercer piso hombres y mujeres	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 58** ver memoria de cálculo. no se ha cobrado Lavamanos suelto y se ajustó el sifón pega de lavamanos al mesón con silicona
149	Reposición e instalación del bombillo	N/A POR TEMA GARANTIA ELECTRICA POR OTRO CONTRATO
150	Revisión y mantenimiento de bujes de ambas puertas y revisión de los anclajes y puntos de fijación de las puertas	EL CONTRATISTA REALIZO LA ACTIVIDAD PERO NO HA REALIZADO EL COBRO.
176	Fijación de teja en el tercer piso del edificio Bloque A	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 99** ver memoria de cálculo. La cubierta inicialmente se fijó pero la fuerza del viento termino desajustándola totalmente y requirió del desmonte.
205	Reposición de división en baño zona orinal, en el área contigua al shut en acero inoxidable	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 74** ver memoria de cálculo.
206	Pintura marcos ventanas en área archivo y caja	Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 47** ver memoria de cálculo.
207	Reposición de chapa baño mujeres en el área contigua al shut	N/A. Se realizó el desmonte de las puertas

7. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:


- Una vez realizada la verificación de las filtraciones presentadas en área de Sanidad y para garantizar los trabajos la interventoría realizo el aval de la pintura de las fachadas cumpliendo las especificaciones de la pintura. Actividades avaladas por interventoría y el Ing Saavedra en el recorrido de inspección acta de fecha 29 de octubre de 2019 y se incluyó en el informe No. 4 del mes de octubre de 2019
- Se realizó instalación de faldón el 7 de noviembre de 2019 para mesón hall de baños zona de Parqueadero. Se realiza la actividad, mediante el **ítem contractual 70** ver memoria de cálculo.
- Se realizó la pintura de las puertas del Shut de basura, en vista que el aspecto y calidad del acabado de la soldadura no permitía una óptima presentación de acabado y se cuantifico por el **ítem contractual 119**, Se ejecutó en un área de 13,28 m2. se realiza la anotación en vista que el requerimiento inicial no indicaba la pintura del elemento.

8. ASPECTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO

Se realizó la instalación de la cubierta de iris en área armerillo. Las indicaciones iniciales no cumplen con lo requerido por la Policía Metropolitana, el elemento instalado, aunque armoniza arquitectónicamente con los elementos que se encuentran en el área (Domos), no permiten la protección de los equipos. Es de anotar que la cubierta de la planta física de la zona de armerillo a nivel de cuarto piso presenta una situación de evidente deterioro; debido a las restricciones del presupuesto asignado en el que no se apropian recursos para gastos de este tipo y adicionalmente la situación actual del requerimiento de protección a los equipos instalados para la lectura de iris presenta alto riesgo de daño en cuanto a posibles lluvias fuertes o granizadas y /o desprendimiento de tejas, así como la excesiva luminosidad, son los aspectos que no permiten aceptar el producto instalado, por parte de la Policía Metropolitana.

9. OBSERVACIONES FINALES

- Se requirió al contratista realizara la corrección a la cubierta del iris en zona armerillo, el elemento queda en observación para que cumpla las especificaciones requeridas. La interventoría realiza mediante la presente acta el recibo de las obras con observación.
- Para la cubierta del iris el contratista reporta un valor para el suministro e instalación de $5.121.856,08 y para el arreglo proyecta un valor de $4.700.000, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
- La interventoría ha realizado la aprobación de siete (7) APU de obras no previstas para el frente de trabajo Policía Metropolitana así:
    - **NP-43** DESARME, CORTE Y REINSTALACION DE MUEBLES DE ARCHIVO (ALTURA 2.05 X ANCHO 1.33* X LARGO 2.12) incluye remaches, tornillos y todos los elementos de sujeción si se requieren. (filos y dilataciones) y color indicado por la Interventoría.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**ACTA DE RECIBO PARCIAL CON OBSERVACION SEDE POLICIA METROPOLITANA**	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	

- El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: **SI** ____ **NO** ____ **PARCIALMENTE** __X__

POLICÍA METROPOLITANA

Coronel RODOLFO OSWALDO CARRERO VILLAMIL
Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de MEBOG

IT. CARLOS ANDRÉS PÓRTELA ESPITIA
Responsable Logístico

CONTRATISTA

Ing. LUIS ALEJANDRO CORTES PÁEZ
Director de obra

INTERVENTORÍA

Arq. LUISA FERNANDA GUEVARA HERNÁNDEZ
Residente de interventoría


	Baños parqueadero
108	Reposición de dos luminarias (baño de mujeres)
109	Ajuste toma de luz
110	Ajuste divisiones metálicas (baños hombres y mujeres)
111	Manija de la unidad sanitaria
112	Revisión de los aparatos sanitarios (fugas, escapes)
113	Desmonte de puertas de entrada a los baños de hombres y mujeres las externas
114	Reposición señalización baños hombres y mujeres
115	Revisión grifería, cambio de push
116	Colocación de una parte de la división faltante que está en la parte externa en el baño de los hombres
117	Ajuste lámpara baño hombres sobre el sanitario
118	Reposición lámparas sobre lavamanos
	Shut de basura
119	Revisión y realización de la soldadura de las puertas donde se requiera
120	Reposición e instalación de roseta sencilla y bombillo ahorrador
121	Pintura techo incluye resane
122	Instalación de cuatro lámparas en la zona de lockers con la conexión eléctrica respectiva
	SANIDAD
123	Revisión y reparación de todas las ventanas por filtraciones
124	Mantenimiento bajante y revisión de la salida de la viga canal
125	Cambio de vidrio roto en consultorio 102
126	Revisión, nivelación y ajuste de puertas (dos)
	ARCHIVO LADO SANIDAD
127	Desmonte y reubicación de archivadores (dos fijos y siete rodantes) al área del nuevo archivo
	ARMERILLO
128	Reposición de cubierta en zona de lectura de iris
	ARCHIVO
129	Revisión escape de baño en unidad sanitaria
130	Reposición del bizcocho de esa unidad sanitaria
131	Sondeo Sifón área de lavado de traperos
132	Pintura área de acuerdo con especificaciones remitidas, paredes y techo
133	Realizar cobertura de ventanas, con superboard

208	Revisión y reparación llave del lavamanos mujeres, bloque A, segundo piso
209	Revisión escape unidad sanitaria baño mujeres segundo piso bloque A
210	Revisión y reposición de push unidad sanitaria baño mujeres segundo piso bloque A
211	Revisión y reposición de domo tercer piso, bloque B, de este ya se había generado solicitud y no ha sido atendida a la fecha y hay ingreso de agua a la zona que está generando afectación a los trabajadores de esta área
212	Revisión fijación de divisiones baño hombres área contigua al shut
213	Revisión y mantenimiento puerta de vidrio tercer (3) piso oficina Contratación Torre A, que presenta problemas de cierre, golpea contra la pared, no cierra bien. Revisión y mantenimiento de bujes y revisión de los anclajes y puntos de fijación.

COPIA CONTROLADA
INNOVAMOS
SOLUCIONAMOS


Baños zona parqueaderos




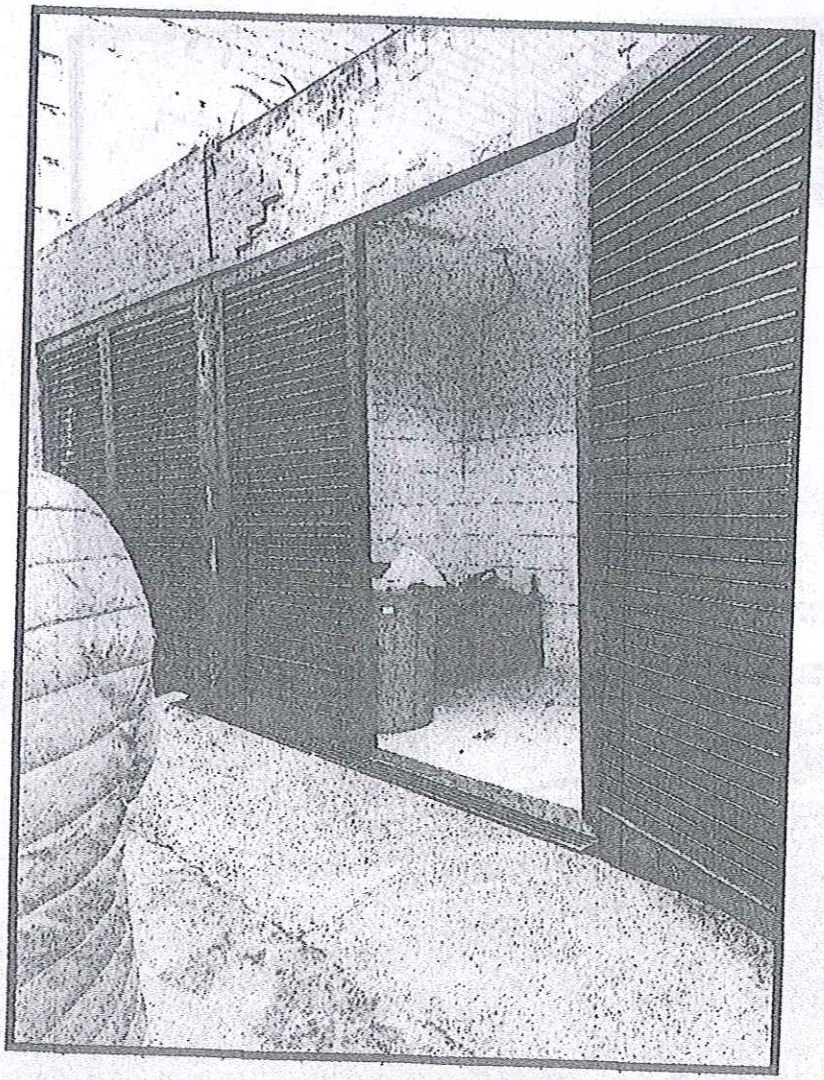


Zona Shut de basuras

SANIDAD

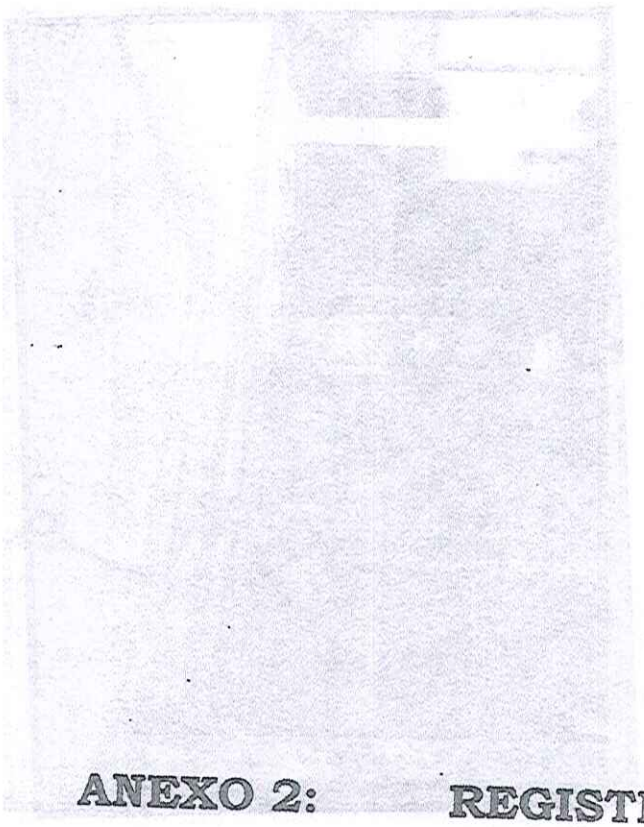

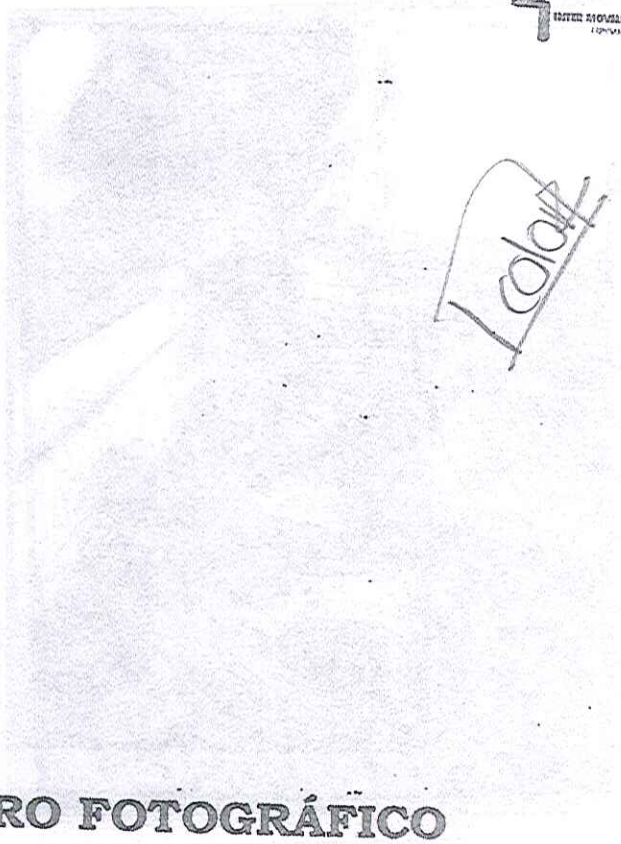


ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

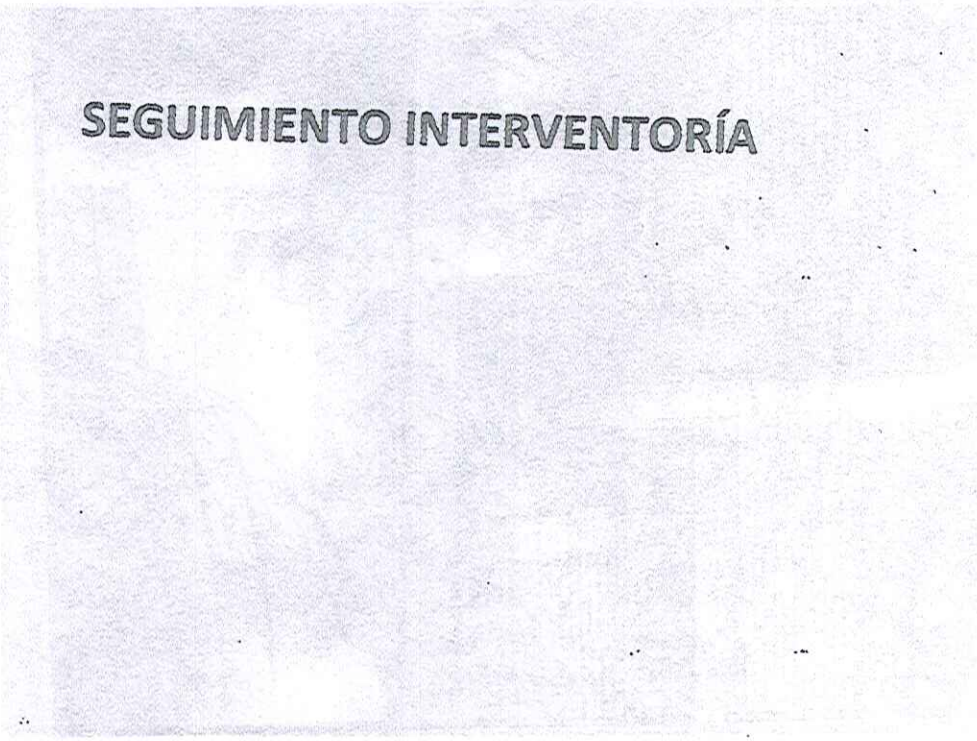


	CONSORCIO MOVILIDAD 2023	INFORME AGOSTO
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA METROPOLITANA

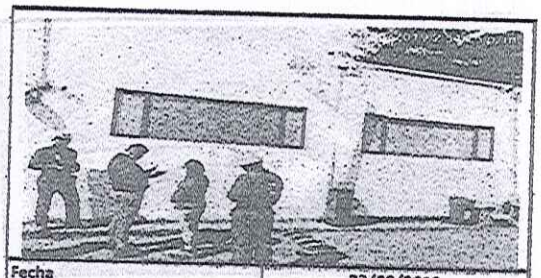

Fecha	23/08/2019
ubicación:	SANIDAD
Descripción:	inspeccion frente de trabajo, con acompañamiento de la interventoria

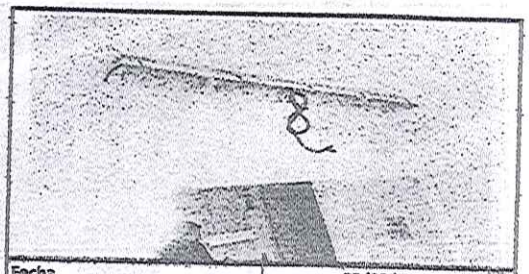


Fecha	23/08/2019
ubicación:	BAÑOS PARQUEADERO
Descripción:	inspeccion de faltante de luminaria

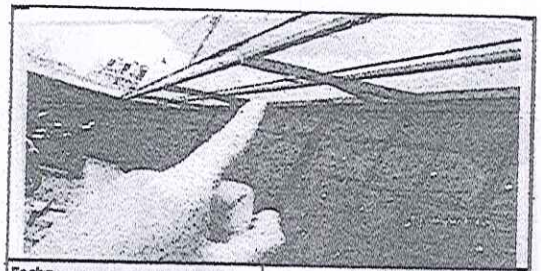


Fecha	23/08/2019
ubicación:	PASILLO ZONA PARQUEADERO
Descripción:	Inspeccion faltantes de luminarias, con acompañamiento de la interventoria



Fecha	23/08/2019
ubicación:	BAÑOS PARQUEADERO
Descripción:	Inspeccion de puertas a desmontar

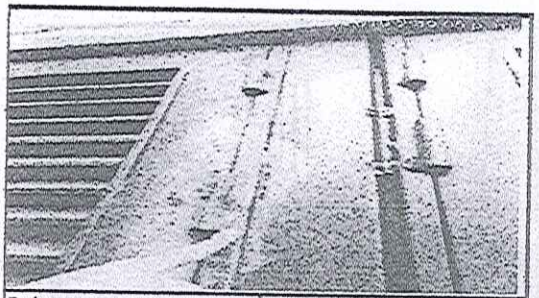


Fecha	23/08/2019
ubicación:	shut parqueadero
Descripción:	Inspeccion de arreglo ornamentacion metalica puerta, con acompañamiento de la interventoria




Fecha	23/08/2019
ubicación:	BAÑOS PARQUEADERO
Descripción:	inspeccion de toma electrica a intervenir, con acompañamiento de la interventoria

	CONSORCIO MOVILIDAD 2021	INFORME AGOSTO
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA METROPOLITANA

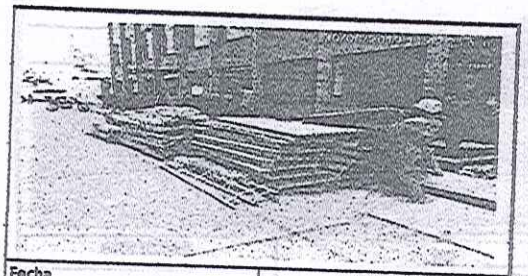


Fecha	30/08/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	acopio de ornamentacion para armado de archivo




Fecha	27/08/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	inspeccion de intervencion locativa de pañete y pintura en muros y cubierta

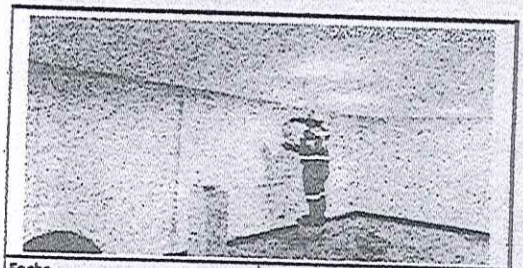


Fecha	29/08/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	inspeccion por parte de interentoria de laminas en ventanaspara disminucion de luminosidad en area de trabajo

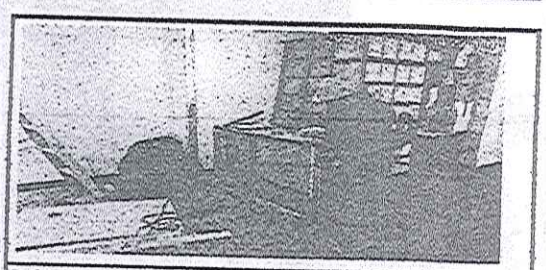

Fecha	29/08/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	inspeccion por parte de interventoria de instalacion de muro divisorio




Fecha	29/08/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Inspeccion de intervencion locativa de pañete y pintura en muros y cubierta

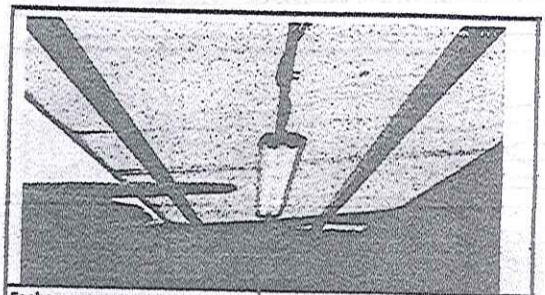


Fecha	25/08/2019
ubicación:	PASILLO ZONA PARQUEADERO
Descripción:	inspeccion de interventoria de instalación de cuatro lamparas en la zona de lockers con la conexión electrica respectiva

	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	INFORME SEPTIEMBRE
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICÍA

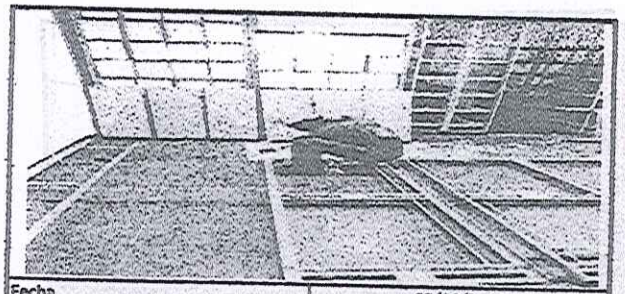


Fecha	03/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Revisión por parte de interventoría de armado de mobiliario metálico en archivo

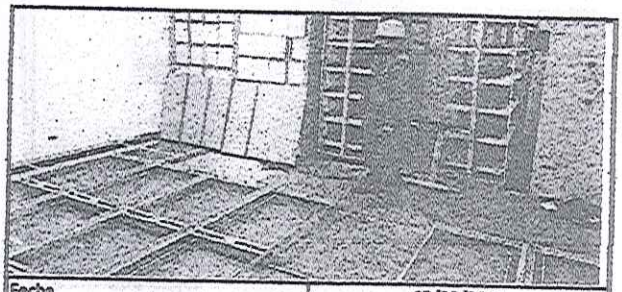


Fecha	03/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Revisión por parte de interventoría de armado de estantería en archivo

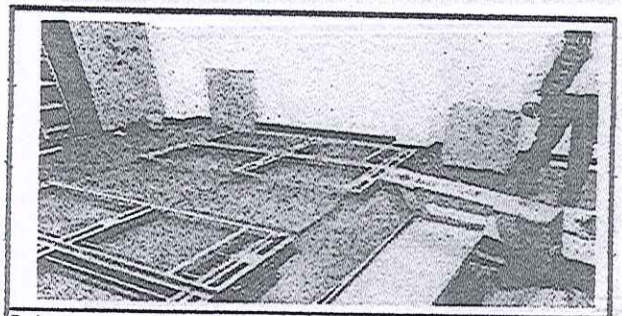


Fecha	03/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Revisión por parte de interventoría de armado de archivadores metálicos

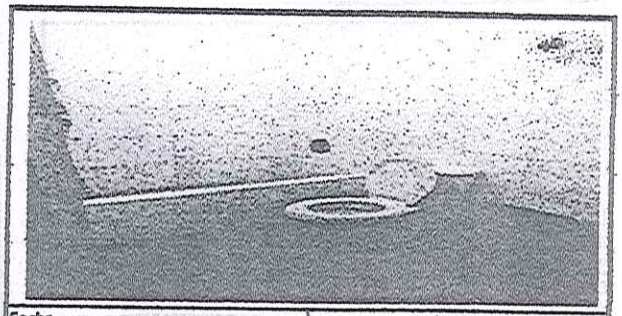

Fecha	03/09/2019
ubicación:	BAÑOS 2 PISO BLOQUE B
Descripción:	Revisión por parte de la interventoría de arreglo en la gotera en la poceta del baño

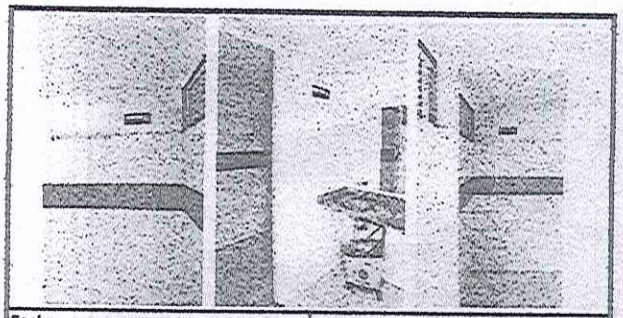


Fecha	06/09/2019
ubicación:	BAÑOS PARQUEADERO
Descripción:	Revisión por parte de interventoría dela instalación de señalización

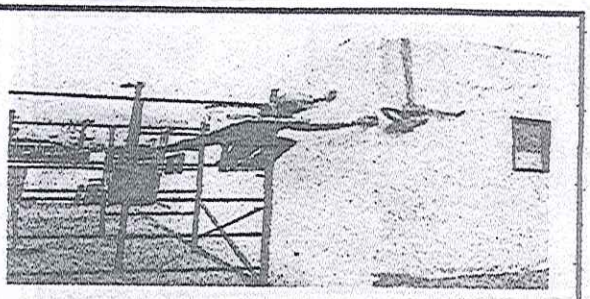


Fecha	06/09/2019
ubicación:	SANIDAD
Descripción:	Inspección por parte de la interventoría para resane en muros costado occidental

	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	INFORME SEPTIEMBRE
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA

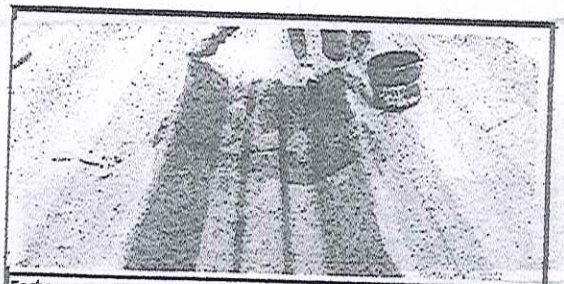


Fecha	16/09/2019
ubicación:	SANIDAD
Descripción:	Revisión de la interventoría de impermeabilización en cubierta con manto asfaltico




Fecha	14/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Inspección de la interventoría de adecuación de espacio de archivo

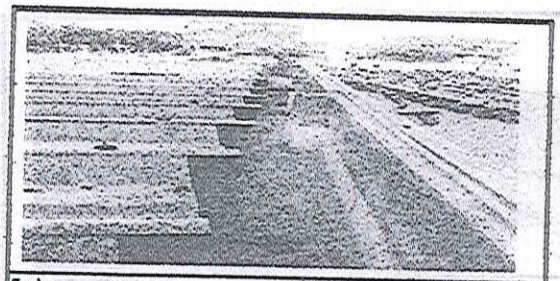


Fecha	16/09/2019
ubicación:	SANIDAD
Descripción:	Revisión de interventoría sobre el mantenimiento de la viga canal



Fecha	14/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Inspección de interventoría de entrega de acabados en cielorraso.

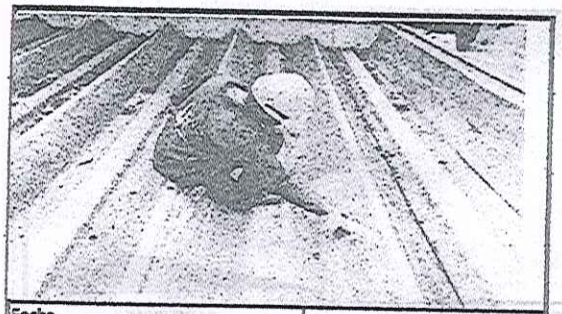


Fecha	16/09/2019
ubicación:	SANIDAD
Descripción:	Revisión de la interventoría de impermeabilización en cubierta con manto asfaltico

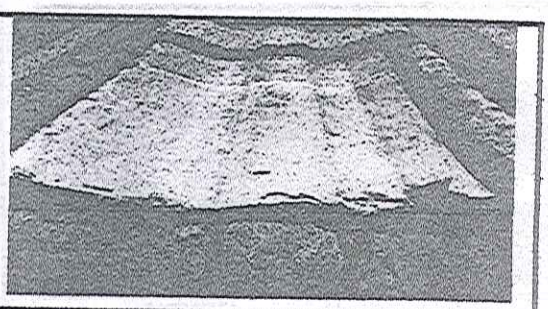


Fecha	16/09/2019
ubicación:	SANIDAD
Descripción:	Revisión de la interventoría de impermeabilización en cubierta con manto asfaltico

	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	INFORME SEPTIEMBRE
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA

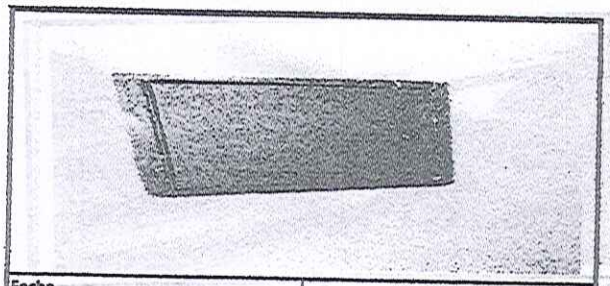


Fecha	206/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Inspección de interventoría de entrega de acabados en espacio intervenidos (marcos metálicos)

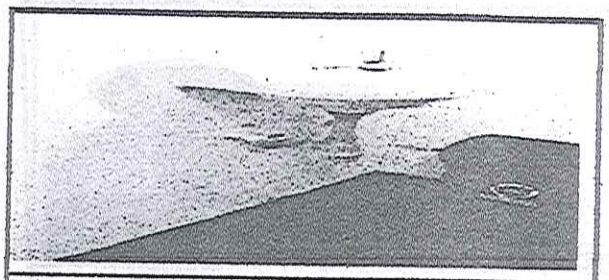


Fecha	20/09/2019
ubicación:	BAÑO BLOQUE B SEGUNDO PISO
Descripción:	Revisión de interventoría de intervención en lavamanos de filtración de agua.

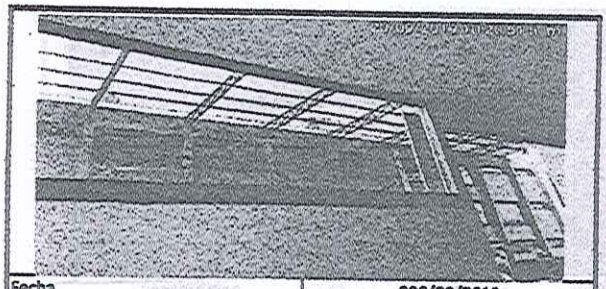


Fecha	206/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Inspección de interventoría de entrega de acabados en espacio intervenidos (marcos metálicos)

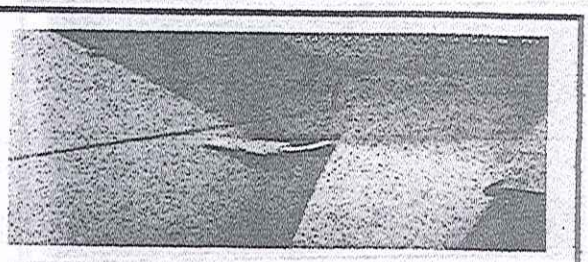

Fecha	20/09/2019
ubicación:	BAÑO BLOQUE B SEGUNDO PISO
Descripción:	Revisión de interventoría de intervención en lavamanos por filtración de agua.

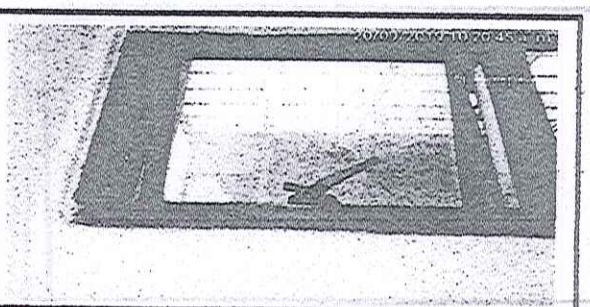


Fecha	206/09/2019
ubicación:	ARCHIVO
Descripción:	Inspección de interventoría de entrega de acabados en espacio intervenidos (marcos metálicos)

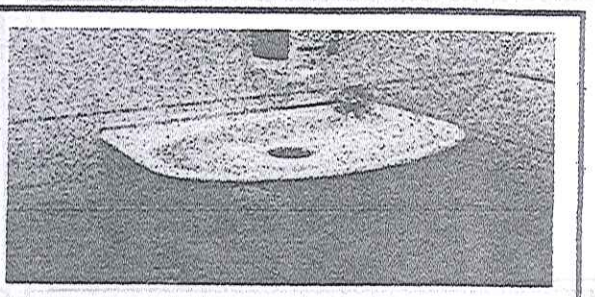


Fecha	20/09/2019
ubicación:	BAÑO BLOQUE B SEGUNDO PISO
Descripción:	Revisión de interventoría de intervención en lavamanos por filtración de agua.

	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	MES OCTUBRE
INTER MOVILIDAD 2019 CONSORCIO intermovilidad2019@gmail.com	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA METROPOLITANA

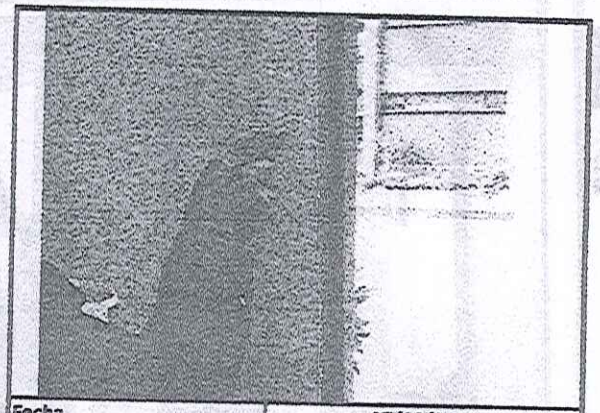


Fecha	07/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	El contratista realizo correcciones para lograr u optimo acabado a nivel de pintura de muros, en el área de archivo de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría

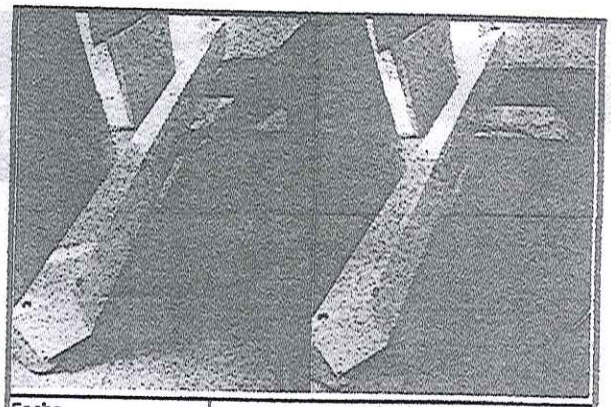

Fecha	07/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Se verifico el funcionamiento de los puntos reubicados en canaleta cumpliendo con los requerimiento.

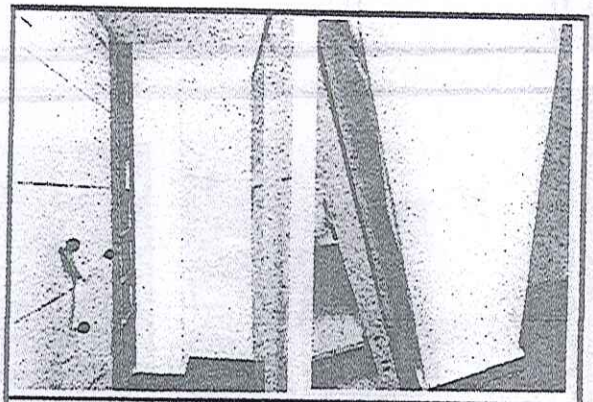


Fecha	07/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Se solicita la contratista realiza la instalación de esquineros para concluir con el requerimiento.

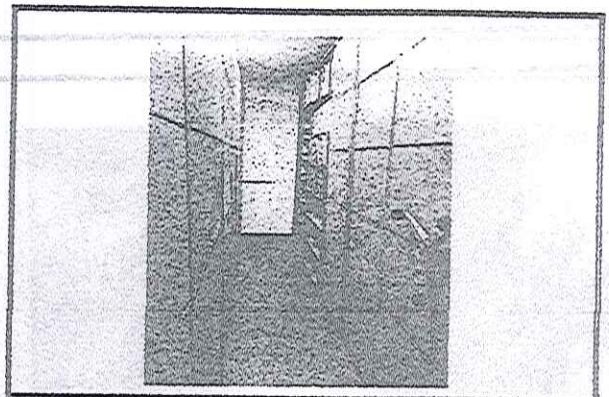


Fecha	07/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Hall de área de archivo la interventoría verifica los acabados a nivel de pintura muros y cielorraso. En el muro se observa la cobertura de ventanas con superboard.

	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	INFORME OCTUBRE
KING CO	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA METROPOLITANA

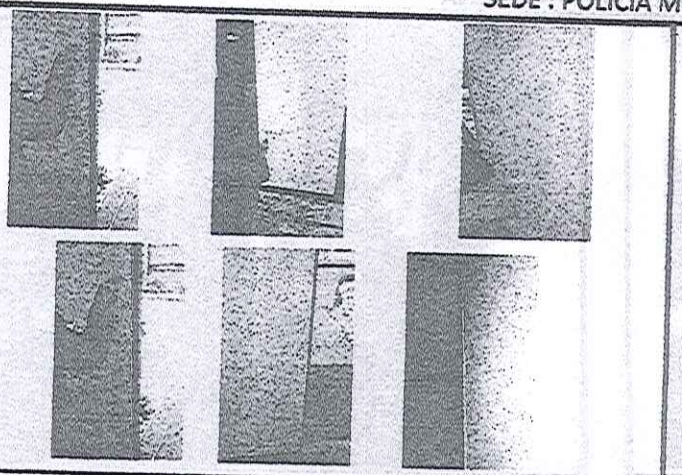


Fecha	07/10/2019
ubicación:	Archivo
Descripción:	Solución de pendientes en el área de archivo.

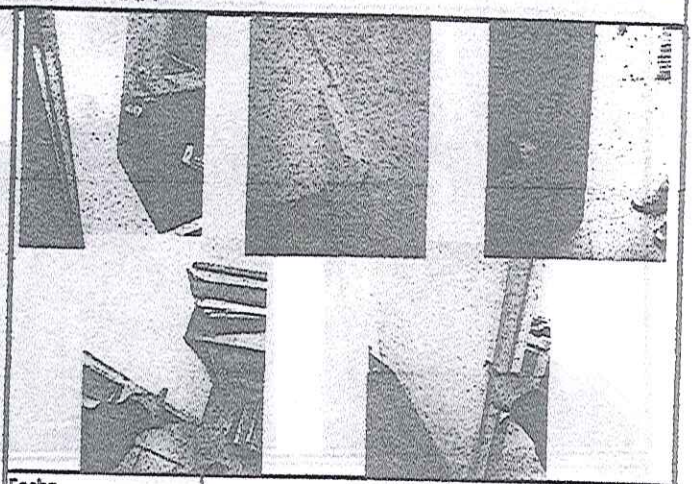

Fecha	08/10/2019
ubicación:	Archivo
Descripción:	Se realizó la entrega del área de archivo a la interventoría

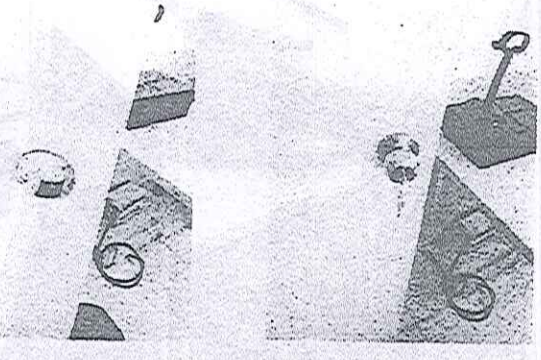


Fecha	08/10/2019
ubicación:	SANIDAD
Descripción:	Se realizo la instalación de chapa en consultorio.

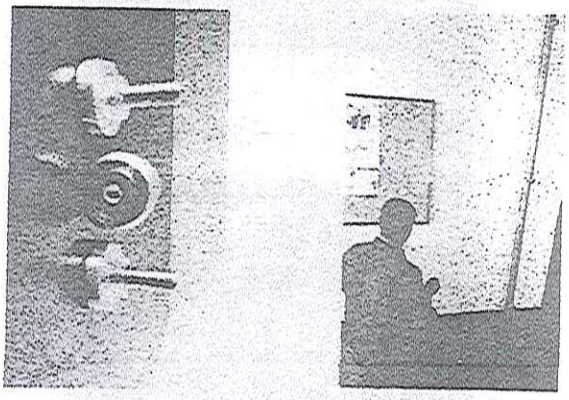


Fecha	09/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Revisión y mantenimiento puerta en vidrio, se requirio de elementos

INTER MOVILIDAD 2019 CONSORCIO cintermovilidad2019@gmail.com	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	INFORME OCTUBRE
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA METROPOLITANA

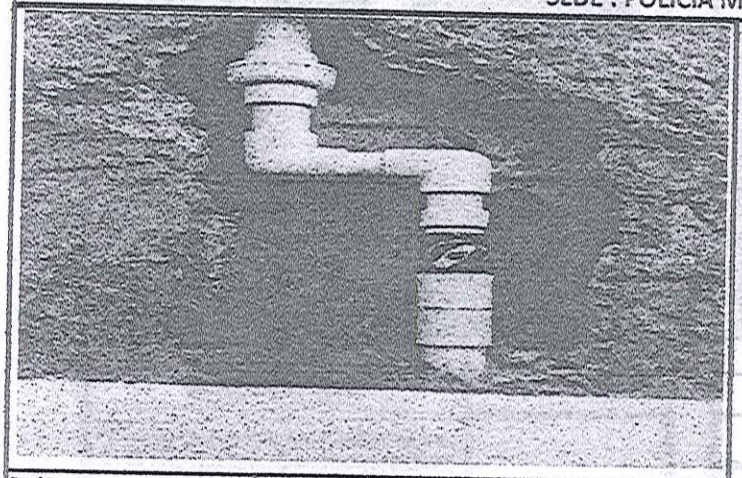


Fecha	17/10/2019
ubicación:	Bloque A
Descripción:	Se observan las obras que se requirieron para reparar la filtración del aparato sanitario baño mujeres segundo piso.

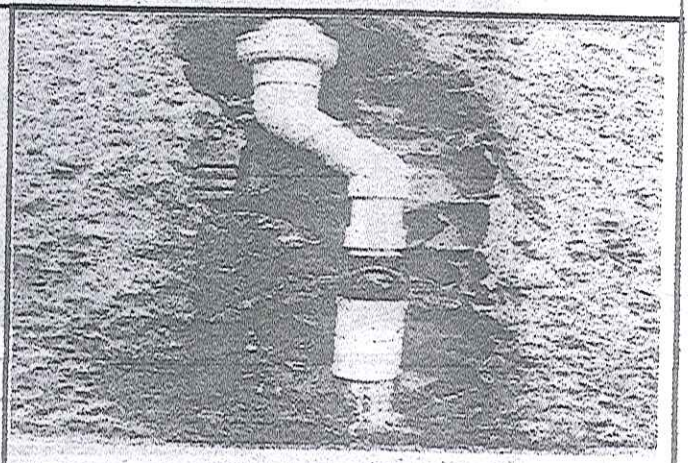

Fecha	17/10/2019
ubicación:	Bloque A
Descripción:	Se observan las obras que se requirieron para reparar la filtración del aparato sanitario baño mujeres tercer piso.

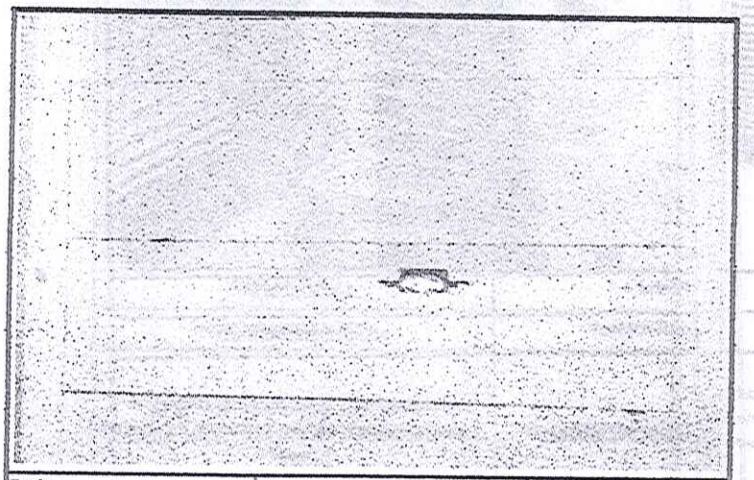


Fecha	19/10/2019
ubicación:	Bloque A
Descripción:	Se realizo la reposición de enchape y la grifería tipo push, en el baño mujeres segundo piso.

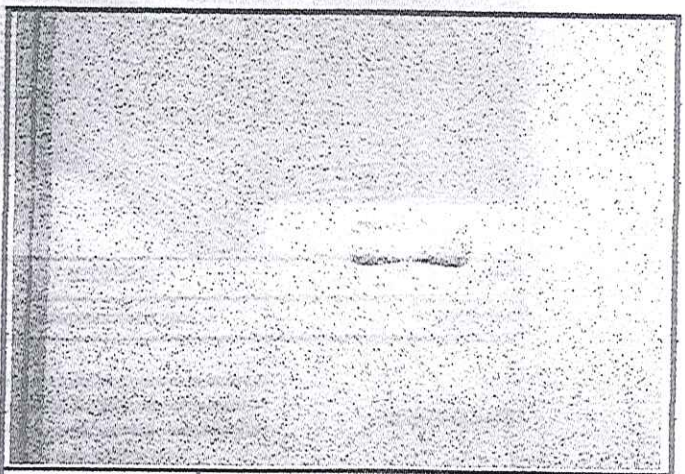


Fecha	18/10/2019
ubicación:	Bloque A
Descripción:	Se realizo la reposición de enchape y la grifería tipo push, en el baño mujeres tercer piso.

INTER MOVILIDAD 2019 CONSORCIO cintermovilidad2019@gmail.com	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	MES OCTUBRE
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión: 01


SEDE : POLICIA METROPOLITANA

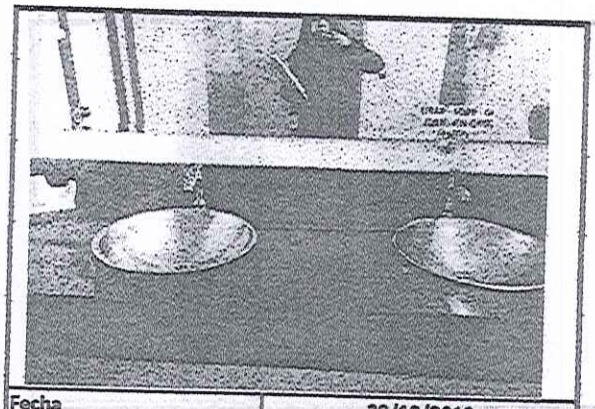


Fecha	29/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Recorrido con el Ing. Saavedra, se verifican las actividades están pendientes cambio de las griferías baño mujeres

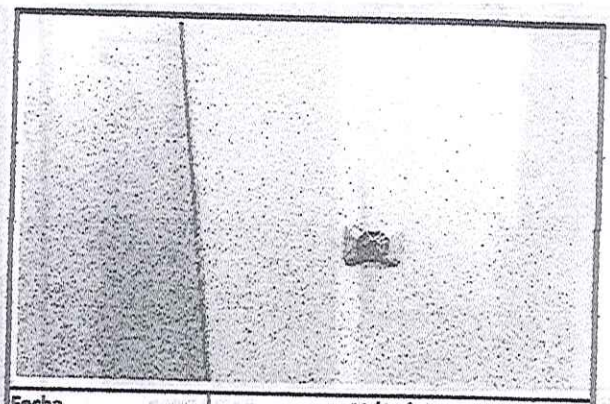

Fecha	29/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Se verificó que el contratista atendió el arreglo a nivel de la red del push sanitario del baño mujeres en segundo piso.

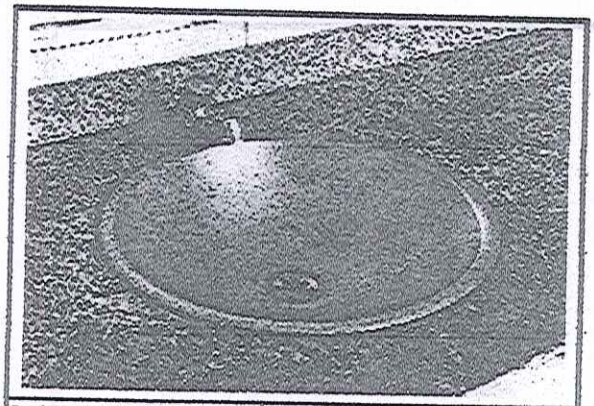


Fecha	29/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Se verifica en el momento de la inspección que los grifería para lavamanos tipo push, estuviera funcionando en optimas condiciones y no presentara fugas o goteras.

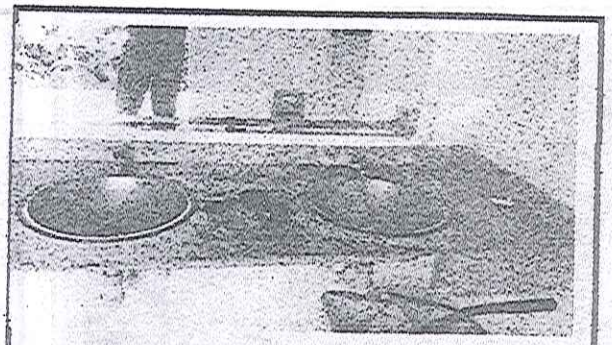


Fecha	29/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Se requeire la instalación de faldón para el mesón de lavamanos en hall de baños.


SEDE : POLICIA METROPOLITANA

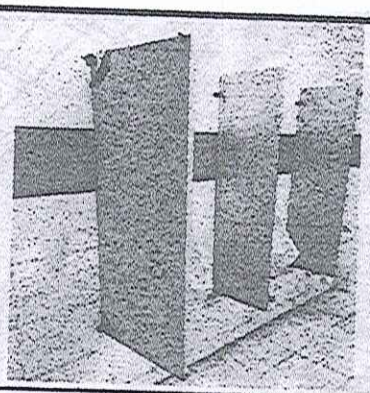


Fecha	18/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	La interventoría verifico que el contratista realizó la instalación de la división en baño zona orinal, en el área contigua al chut en acero inoxidable.

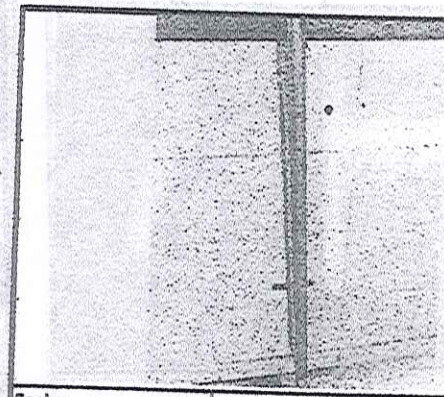

Fecha	18/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Platinas instaladas arriba y abajo para garantizar la estabilidad de los elementos.

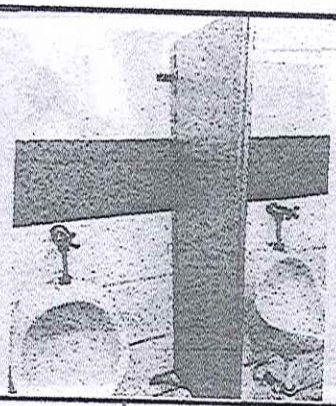

Fecha	18/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Se verifico que el contratista realizo el ajuste de las divisiones de los orinales en W.C. hombres

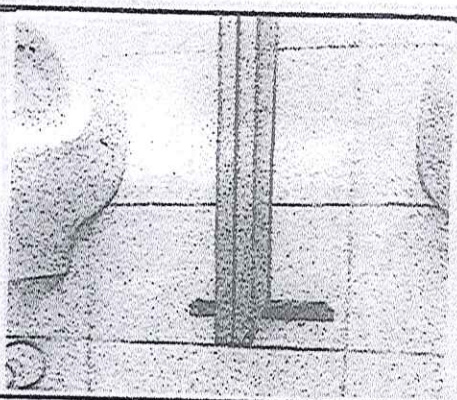

Fecha	18/10/2019
ubicación:	POLICIA METROPOLITANA
Descripción:	Se observa el elemento que permitió el ajuste de los divisiones a los muros

ANEXO 3: MEMORIAS DE CÁLCULO

OBRAS EJECUTADAS

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD				
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	OBRAS EJECUTADAS			KING CO KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
	FECHA:		43.818,00	
CONTRATO NUMERO	20191601	CONTRATO INTERVENTORIA	20191653	

OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO

CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES		SUPERVISOR	SONIA MIREYA ALFONSO MUÑOZ	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERMOVILIDAD 2019				
167	Reposición de accesorios Galvanizado 1/2" (Codos, Tee, Uniones, tapones, Bujes, Adaptadores, Universales), Incluye retiro del existente, soldadura y todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	2,00	$ 19.748,00	$ 39.496,00
212	Reinstalación aparatos sanitarios. Incluye cemento blanco y accesorios de montaje que se requieran.	UN	1,00	$ 232.595,00	$ 232.595,00
219	Suministro e instalación de válvula de push anti vandálica para lavamanos, incluye retiro de los existentes y accesorios para el buen funcionamiento.	UN	4,00	$ 255.842,00	$ 1.023.368,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y OTRAS				
229	Desmonte de canaleta metálica.	M	4,00	$ 10.260,00	$ 41.040,00
230	Desmonte de lámpara LED o fluorescente.	UN	5,00	$ 16.155,00	$ 80.775,00
231	Instalación de lámpara LED o fluorescente.	UN	5,00	$ 29.198,00	$ 145.990,00
235	Instalación de lámpara hermética LED, incluye guaya, herrajes y demás elementos de soporte para descolgarla 1.oo m y también limpieza.	UN	4,00	$ 71.402,00	$ 285.608,00
236	Suministro e instalación de bombillo LED para instalar en roseta tradicional.	UN	1,00	$ 29.027,00	$ 29.027,00
243	Suministro e instalación cable No 12.	M	102,00	$ 6.271,00	$ 639.642,00
244	Suministro e instalación de cable trenzado 3x12 color azul, blanco y verde.	M	3,00	$ 12.737,00	$ 38.211,00
245	Suministro e instalación de cable trenzado 3x12 color rojo, blanco y verde.	M	3,00	$ 12.737,00	$ 38.211,00
247	Suministro e instalación de tomacorriente eléctrica normal de 20 AMP con polo aislado.	UN	6,00	$ 29.288,00	$ 175.728,00
248	Suministro e instalación de tomacorriente eléctrica regulada de 20 AMP con polo aislado grado comercial.	UN	2,00	$ 31.031,00	$ 62.062,00
250	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2" incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	M	34,00	$ 26.034,00	$ 885.156,00
259	Suministro e instalación de canaleta metálica con división si se requiere de 12 cmx 5cm calibre 22.	M	4,00	$ 50.087,00	$ 200.348,00
273	Suministro e instalación de jack Cat. 6A marca homologada.	UN	2,00	$ 24.893,00	$ 49.786,00
276	Suministro e instalación de Patch Panel de 24P Cat. 6A marca homologada.	UN	2,00	$ 419.165,00	$ 838.330,00
277	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUELES.	UN	6,00	$ 27.459,00	$ 164.754,00
290	Suministro e instalacion de pelicula antisol color gris. Todos los porcentajes incluyen desmontes que se requieren	M2	1,83	$ 58.744,00	$ 107.501,52
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-43	DESARME,CORTE Y REINSTALACION DE MUEBLES DE ARCHIVO (ALTURA 2.05 X ANCHO 1.33* X LARGO 2.12) incluye remaches, tornillos y todos los elementos de sujeccion si se requieren.(filos y dilataciones) y color indicado por la Interventoría.	UN	7,00	$ 1.551.407,00	$ 10.859.849,00
NP-44	DESARME,CORTE Y REINSTALACION DE MUEBLES DE ARCHIVO (ALTURA 2.05 X ANCHO 0.65 * X LARGO 2.12) incluye remaches, tornillos y todos los elementos de sujeccion si se requieren.	UN	5,00	$ 1.163.067,00	$ 5.815.335,00
	TOTAL OBRAS				$ 32.017.170,10

RESUMEN SEDE POLICIA METROPOLITANA CORTE 3			
	COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA A EJECUTARSE	SEDE POLICIA	$ 32.017.170,10
	ADMINISTRACION 20 %		$ 6.403.434,00
	IMPREVISTOS 2,20%		$ 704.377,70
	UTILIDAD 5,4%		$ 1.728.927,20
	IVA SOBRE U 19%		$ 328.496,20
	VALOR TOTAL DE OBRA A EJECUTARSE		$ 41.182.405,20

NOTA: Actividades avaladas por interventoría y el Ing Oscar Saavedra en el recorrido de inspección, acta de fecha 29 de octubre de 2019 y se incluyó en el informe No. 4 del mes de octubre de 2019

ING

MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POLI-01 | Versión: 0 | Fecha de Emisión: 2014-03-21 | Página: 1 de 1

FECHA: DD 30 MM 9 AA 2019 | DIA | MES | AÑO 2019 | CORTE N° 3


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294146-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601

ELABORO: CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	18	DESCRIPCIÓN	Desmonte puertas metálicas y/o de madera. Incluye desmonte marcos si se requiere y retiro a sitio indicado.	UNID.	M2	UBICACIÓN: POLICIA METROPOLITANA

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
BAÑO PATIO	1.100	2.30		2	5.06
Subtotal					5.06
% Desperdicio					0.00
TOTAL					5.06

FOTOS ANTES

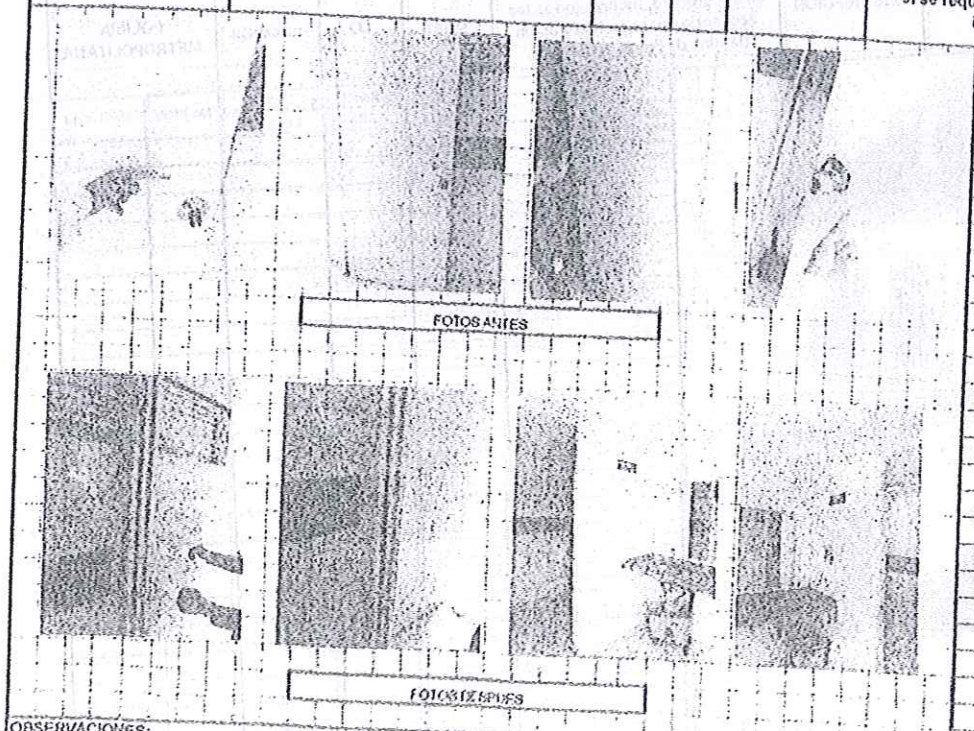

FOTOS DESPUES

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional


Director de obra: Mat. Profesional

Interventoria: Mat. Profesional

459

ING									MEMORIA DE CÁLCULO								
Código: SDM-KING-POLI-01							Versión: 0		Fecha de Emisión: 2014 08-21						Página: 1 de 1		
FECHA							DIA				MES				AÑO		
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	CORTE N°	3			ELABORO		CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS				
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO																
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019						NIT O C.C.	901294146-6	CONTRATO N°				20191653				
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S						NIT O C.C.	901025544-1	CONTRATO N°				20191601				

CAPÍTULO	PINTURAS	ITEM	45	DESCRIPCIÓN	Reposición estuco y pintura en vinilo tipo I, (3 manos). Incluye remates lineales (filos y dilataciones) y color indicado por la Interventoría.	UNID.	M2	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

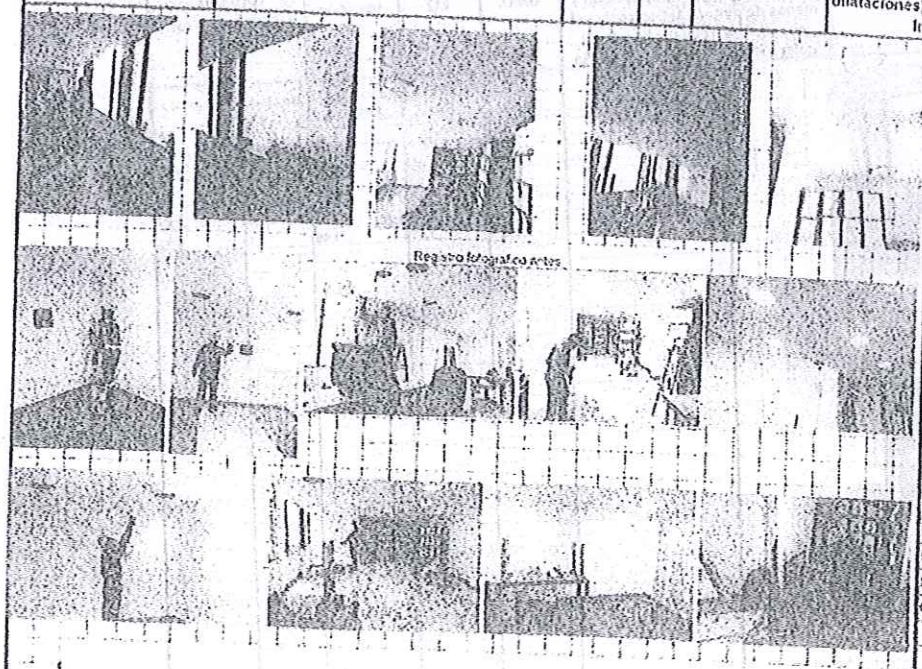

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
INGRESO ARCHIVO TECHO	1,650	2.79			
MUO 1	1.650	2.23		1	5.16
MUO 2	1,650	1.80		2	8.25
MURO 3	1,800	0.90		1	3.36
MURO 4	0.110	1.33		1	1.62
ENTRADA PASILLO BAÑOS	3.060	1.72		1	0.15
MURO 1	2.210	2.23		1.000	5.26
MURO 2	1.710	2.23		1.000	4.93
MURO3	1.800	0.90		1	3.81
MURO 4	1.800	2.23		1	1.62
OFICINA ARCHIVO	2.700	5.20		1	3.57
MURO 1	3.600	2.23		1	14.04
MURO 2	3.790	2.23		1	8.03
MURO3	2.650	1.45		1	8.45
MURO 4	4.34	2.23		1	4.16
ARCHIVO	8.09	5.20		1	9.63
MURO 1	4.31	2.23		1	42.07
MURO 2	8.09	2.23		1	9.65
MURO 3	5.20	2.23		1	18.04
MURO 4	8.09	2.23		1	11.60
COLUMNAS	0.45	2.23		1	18.04
				2	2.01
Subtotal					183,55
% Desperdicio					0,00
TOTAL					183,55

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional

Director de obra: Mat. Profesional

Interventoría: Mat. Profesional

460


MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POLI-01							Versión: 0		Fecha de Emisión: 2014-08-21			Página: 1 de 1	
FECHA							DIA		MES			AÑO	2019
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	CORTE N°	3	ELABORO	CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS			


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294146-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601

CAPÍTULO	PINTURAS	ITEM	49	DESCRIPCIÓN	Reposición pintura en Koraza acrilica para exteriores, (2 manos). Incluye andamios, eliminación de capas de pintura existentes, lavado con agua, cepillado, corrección fisuras y grietas con pañete impermeabilizado, remates lineales.	UNID.	M2	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA


FOTO ANTES

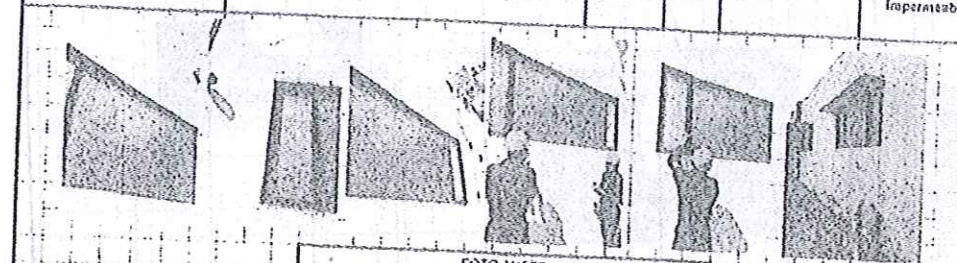

FOTOS DURANTE



FOTOS DESPUES



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
SANIDAD:					
MURO 1	9,000	4,00		1	36,00
VENTANA	1,400	0,80		1	1,12
	0,970	1,93		-2	-3,74
MURO 2	8,400	4,00		1	33,60
VENTANA	0,970	2,770		-2	-4
MURO 3	11,000	4,00		1	44,00
VENTANA	0,870	1,97		-2	-3,43
PUERTA	1,400	2,60		-1	-3,64
MURO4	8,650	3,90		1	33,74
VENTANAS	0,61	0,61		-4	-1,49
Subtotal					132,41
% Desperdicio					0,00
TOTAL					132,41


OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoría: Mat. Profesional

KING CO																			
Código: SDM-KING-POLI-01																			

ING CO											MEMORIA DE CÁLCULO							
Código: SDM-KING-POLI-01								Versión: 0			Fecha de Emisión: 2014-08-21					Página: 1 de 1		
FECHA								DIA					MES			AÑO		
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019		CORTE Nº	3				ELABORO			CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO																	
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019							NIT O C.C.	901294146-6		CONTRATO Nº					20191653		
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S							NIT O C.C.	901025544-1		CONTRATO Nº					20191601		

CAPÍTULO	CUBIERTAS CIELOS RASOS, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	ITEM	106	DESCRIPCIÓN	Impermeabilización con manto asfáltico con foild de aluminio, incluye imprimación con emulsión asfáltica.	UNID.	M2	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

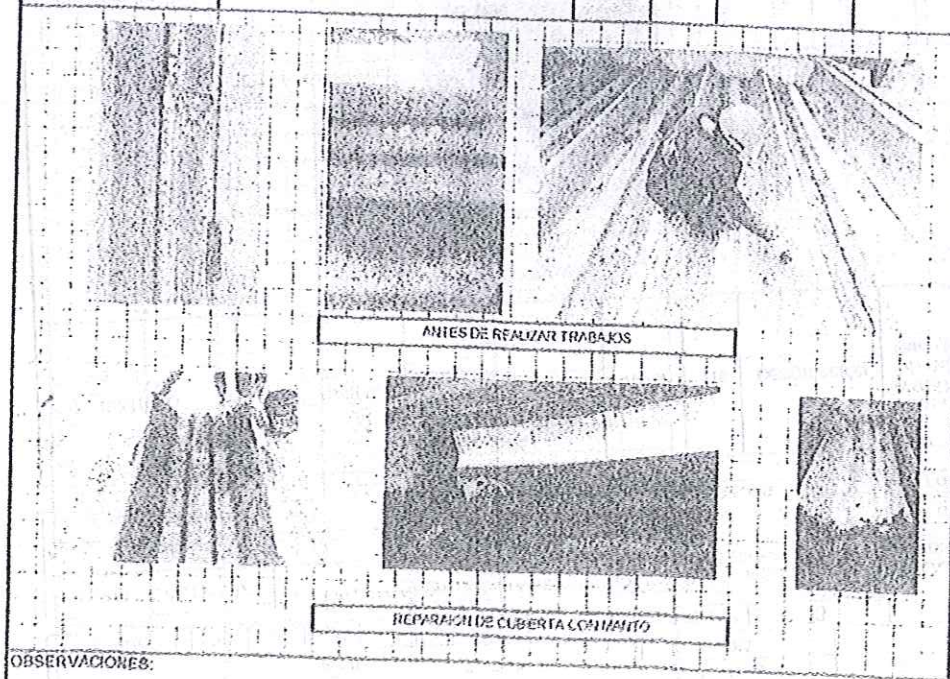

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
CUBIERTA SANIDAD	1,200		2,00	1	2,40

KING CO

MEMORIA DE CÁLCULO


Código: SDM-KING-POLI-01 | Versión: 0 | Fecha de Emisión: 2014-08-21 | Página: 1 de 1

FECHA: DD 30 | MM 9 | AA 2019 | DIA | MES | AÑO 2019

CORTE N° 3 | ELABORO: CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294146-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601

CAPÍTULO	CARPINTERIA METALICA	ITEM	117	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de vidrio templado e=6mm a 8mm, incluye todos los elementos, herrajes y accesorios para su correcta instalación.	UNID.	M2	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

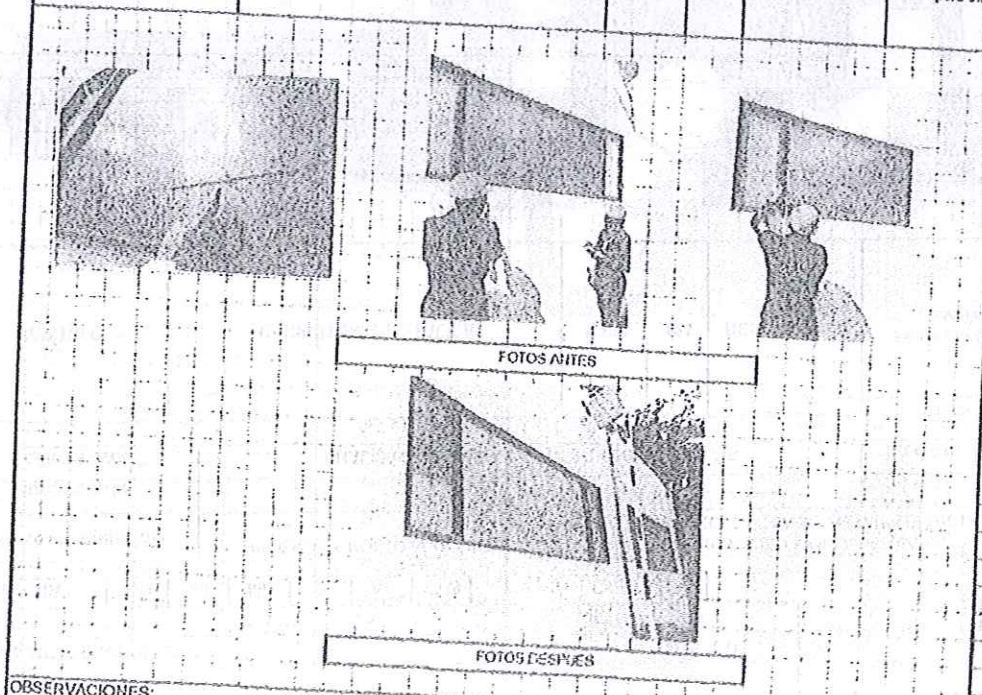


Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
SANIDAD	1,910	0,91		1	1,74

KING CO								MEMORIA DE CÁLCULO							
Código: SDM-KING-POLI-01							Versión: 0	Fecha de Emisión: 2014-08-21						Página: 1 de 1	
FECHA							DIA				MES			AÑO	2019
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	CORTE N°	3			ELABORO		CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS		

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO		
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	NIT O C.C.	901294146-6
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A.S	NIT O C.C.	901025544-1

CONTRATO N°	20191653	CAPÍTULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS	ITEM	155	DESCRIPCIÓN	Reposición griferías lavamanos, duchas, sanitarios, orinales, lavaplatos, manguera. Incluye reposición accesorios y/o empaqueteduras que se requieran.	UNID.	UN	UBICACIÓN	baños parqueadero
CONTRATO N°	20191601										

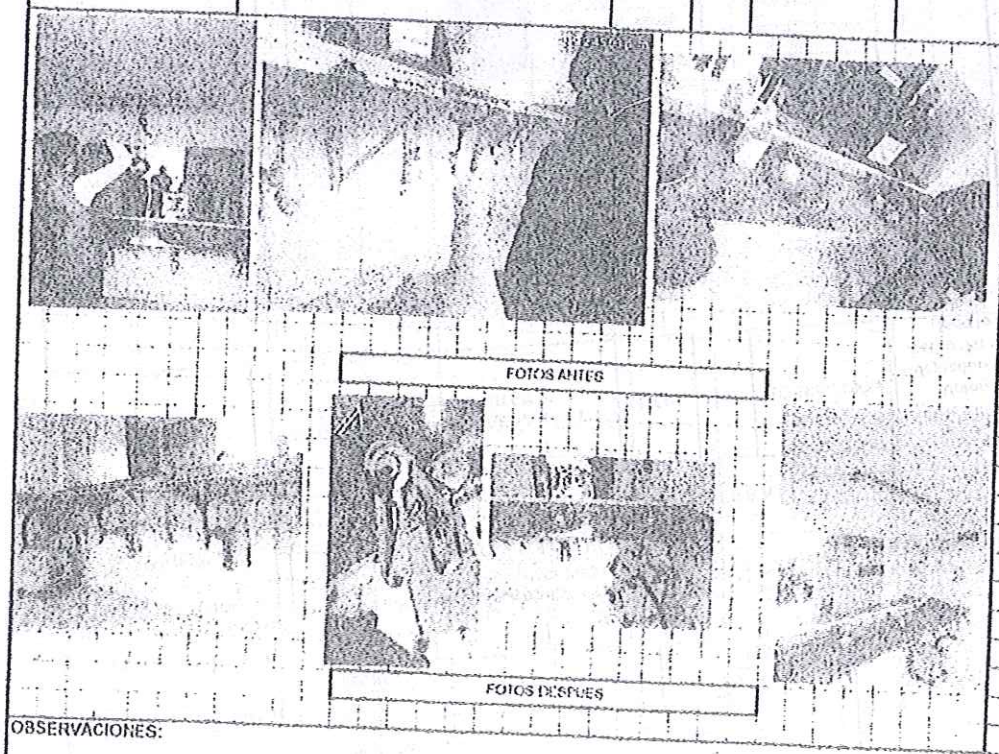

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
BAÑOS PATIOS				4	4,00
Subtotal					4,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					4,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional

| | | |

ING


MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POLI-01 | Versión: 0 | Fecha de Emisión: 2014-08-21 | Página: 1 de 1


FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	DIA		MES		AÑO	2019
							CORTE N°	3	ELABORO	CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS		

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294148-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601


CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS	ITEM	229	DESCRIPCIÓN	Desmonte de canaleta metálica.	UNID.	M	UBICACIÓN	archivo



fotos antes

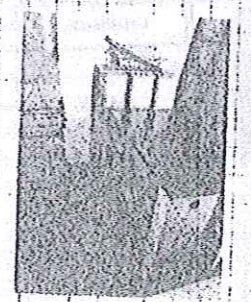

fotos antes



Fotos despues

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
				4	4,00
Subtotal					4,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					4,00

OBSERVACIONES

Residente de obra: Mat. Profesional

Director de obra: Mat. Profesional

Interventoria: Mat. Profesional

4 de 62


MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POLI-01	Versión: 0	Fecha de Emisión: 2014-08-21	Página: 1 de 1

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	CORTE N°	3	MES		AÑO	2019
									ELABORO	CAMILO ROJAS		

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO				
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	NIT O C.C.	901294145-6	CONTRATO N°	20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	901025544-1	CONTRATO N°	20191601

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS	ITEM	231	DESCRIPCIÓN	Instalación de lámpara LED o fluorescente.	UNID.	UN	UBICACIÓN	baños

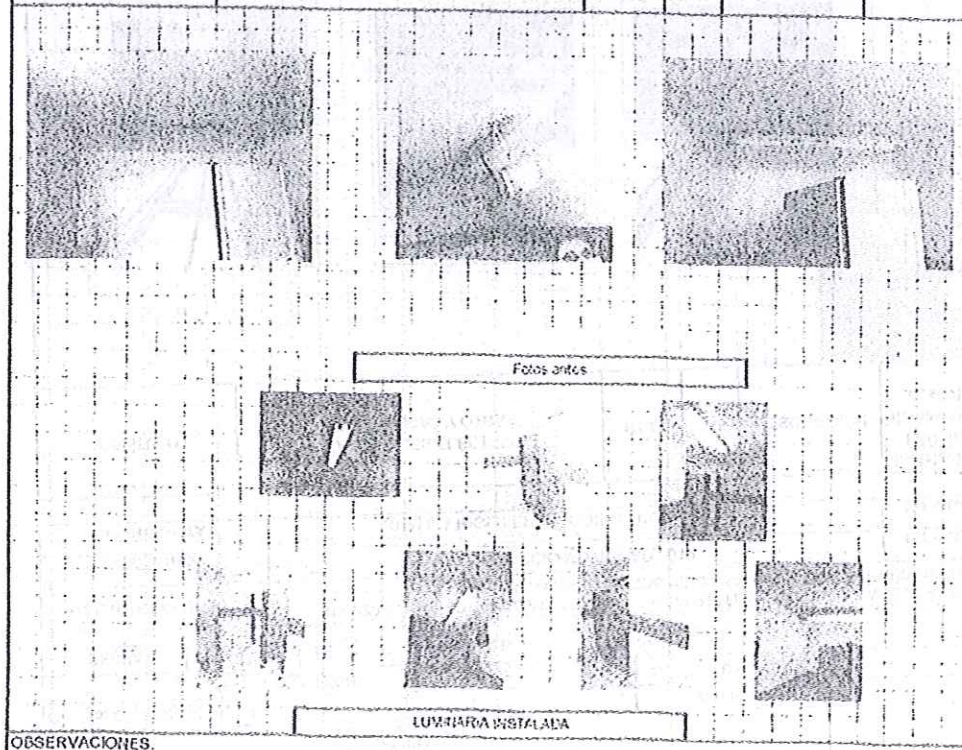

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
				5	5,00

ING C.O									MEMORIA DE CÁLCULO								
Código: SDM-KING-POLI-01								Versión: 0	Fecha de Emisión: 2014-08-21						Página: 1 de 1		
FECHA								DIA			MES			AÑO			
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	CORTE N°	3	ELABORO		CAMILO ROJAS				2019		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO																
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019							NIT O C.C.	901294146-6		CONTRATO N°				20191653		
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S							NIT O C.C.	901025544-1		CONTRATO N°				20191601		
CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS			ITEM	236	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de bombillo LED para instalar en roseta tradicional.		UNID.	UN	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA					
									Localización			Dimensiones			No Elem.	Resta Total	
												Ancho	Alto	Longitud			
									SHUT						1	1,00	


ING CO

MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POLI-01							Versión: 0	Fecha de Emisión: 2014-08-21				Página: 1 de 1	
FECHA							DIA		MES			AÑO	
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	CORTE N°	3	ELABORO		CAMILO ROJAS		2019

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO				
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	NIT O C.C.	901294146-6	CONTRATO N°	20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	901025544-1	CONTRATO N°	20191601

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS	ITEM	244	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cable trenzado 3x12 color azul, blanco y verde.	UNID.	M	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
AREA DE ARCHIVO					
INSTALADO PARA TOMA NORMAL			3,00	1	3,00
Subtotal					3,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					3,00

OBSERVACIONES

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional

ING CO																			
Código: SDM-KING-POLI-01																			

ING CO																			
Código: SDM-KING-POLI-01																			


KING CO

MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POLI-01							Versión: 0		Fecha de Emisión: 2014-08-21			Página: 1 de 1	
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	DIA		MES			AÑO	2019
							CORTE N°	3	ELABORÓ		CAMILO ROJAS		

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO				
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019	NIT O C.C.	901294148-6	CONTRATO N°	20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	901025544-1	CONTRATO N°	20191601

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS	ITEM	273	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de jack Cat. 6A marca homologada.	UNID.	UN	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

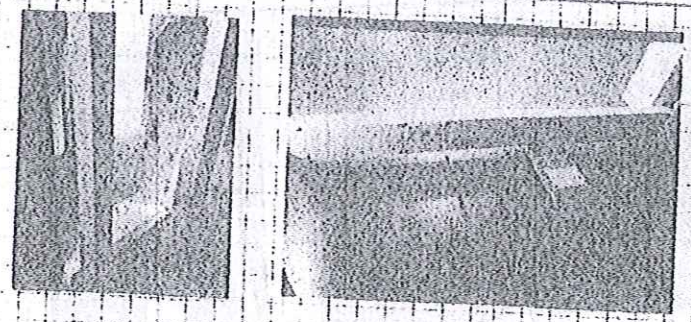

PARA PUNTO DE VOZ Y DATOS

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
ARCHIVO			2,00	1,000	2,00
Subtotal					2,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoría: Mat. Profesional

ING CO

MEMORIA DE CÁLCULO


Código: SOM-KING-POLI-01 | Versión: 0 | Fecha de Emisión: 2014-08-21 | Página: 1 de 1

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	CORTE N°	3	MES		AÑO	2019

ELABORO: CAMILO ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294146-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS	ITEM	277	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUELES.	UNID.	UN	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

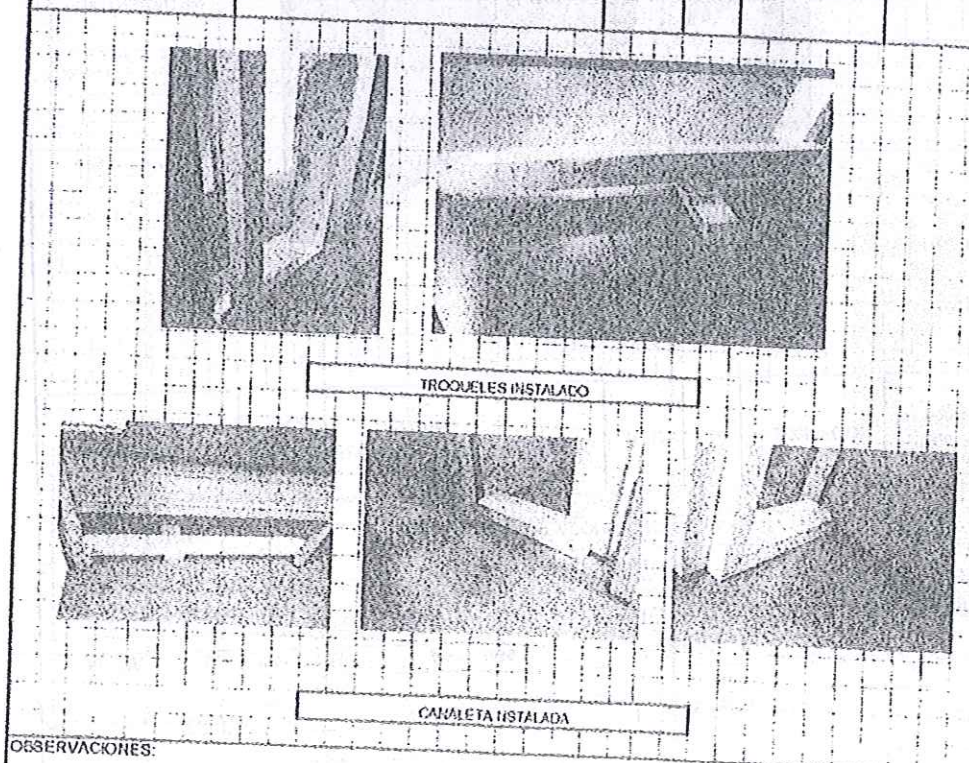

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA DE ARCHIVO					
INSTALADO PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS			6,00	1,000	6,00
Subtotal					6,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					6,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional

Director de obra Mat. Profesional

Interventoría: Mat. Profesional

474

ING

MEMORIA DE CÁLCULO


Código: SDM-KING-POLI-01							Versión: 0		Fecha de Emisión: 2014-06-21			Página: 1 de 1	
FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019	DIA		MES			AÑO	2019
							CORTE N°	3	ELABORO	CAMILO ROJAS			

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294146-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601

CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP-43	DESCRIPCIÓN	UNID.	UN	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

DESARME,CORTE Y REINSTALACION DE MUEBLES DE ARCHIVO (ALTURA 2.05 X ANCHO 1.33* X LARGO 2.12) Incluye remaches, tornillos y todos los elementos de sujeccion si se requieren.(fijos y dilataciones) y color indicado por la Interventoria.

Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA DE ARCHIVO					
				7	7,00
					0

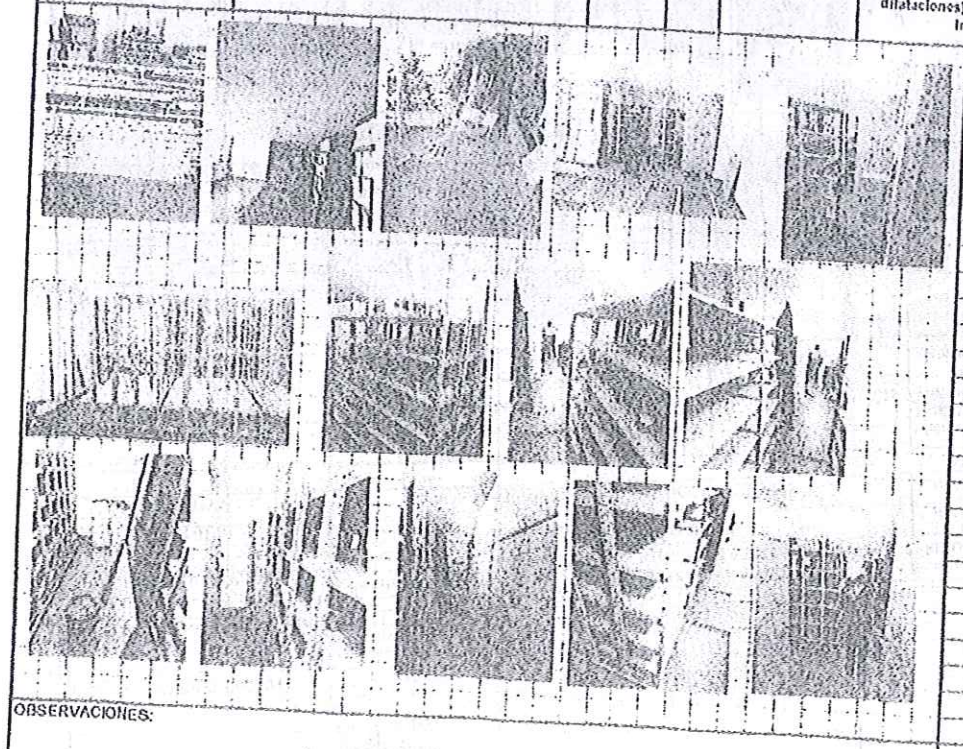

OBSERVACIONES:

		Subtotal	7,00
		% Desperdicio	0,00
		TOTAL	7,00

Residente de obra: Mat. Profesional

Director de obra: Mat. Profesional

Interventoria: Mat. Profesional

475

Código: SDM-KING-POLI-01

MEMORIA DE CÁLCULO

Versión: 0

Fecha de Emisión: 2014-03-21

Página: 1 de 1

FECHA	DD	30	MM	9	AA	2019


CORTE N° 3

	DIA	MES	AÑO
ELABORO			2019

CAMILO ALFONSO ROJAS CELIS

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294146-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	15	DESCRIPCIÓN	Demolición de enchapes. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	UNID.	M2	UBICACIÓN	BAÑO PISO 2 BLOQUE B

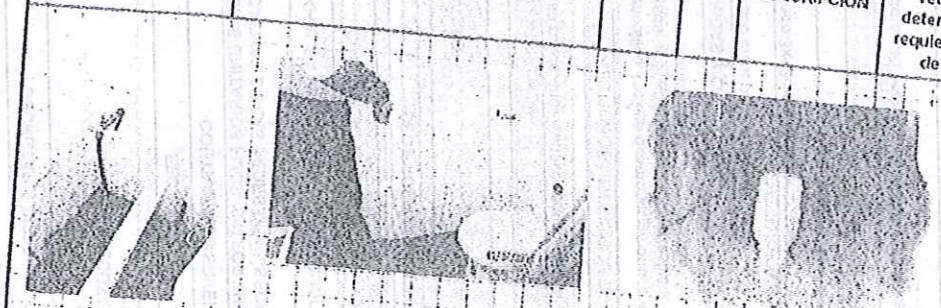

FOTOS ANTES



FOTOS DURANTE Y DESPUES

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
BAÑO	1.00	1.00	1.00	1	1.00
Subtotal					1,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra
Mat. Profesional

Director de obra:
Mat. Profesional

Interventoría:
Mat. Profesional


4716

ING

MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POL-05							Versión: 0		Fecha de Emisión: 2014-08-21				Página: 1 de 1		
FECHA							DIA		30	MES		11	AÑO		2019
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2019	CORTE N°	5	ELABORÓ			ING. ANDRES MAURICIO URREA RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO														
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019						NIT O C.C.	901294146-6	CONTRATO N°			20191653			
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S						NIT O C.C.	901025544-1	CONTRATO N°			20191601			

CAPÍTULO	PISOS Y ENCHAPES	ITEM	70	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de mesón en granito pulido. Inc. Transporte y acarreo al lugar de las obras.	UNID.	M	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

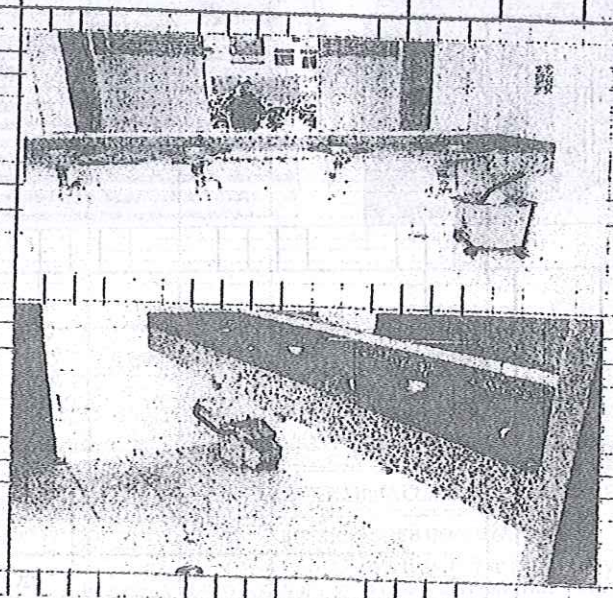

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
FALDON MESON BAÑOS POLICIA ZONA DE PARQUEADEROS			2,63		2,63
Subtotal					2,63
% Desperdicio					0,00
TOTAL					2,63

OBSERVACIONES:

Residente de obra:
Mat. Profesional

Director de obra:
Mat. Profesional

Interventoría:
Mat. Profesional


ING

MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KNG-POL-05							Versión: 0	Fecha de Emisión: 2014-08-21						Página: 1 de 1	
FECHA							DIA	30	MES	11	AÑO	2019			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2019	CORTE N°	5	ELABORÓ	ING. ANDRES MAURICIO URREA RIVERA					

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019	NIT O C.C.	901294146-6	CONTRATO N°	20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	901026544-1	CONTRATO N°	20191601

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS	ITEM	242	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12 para prolongación de conexiones.	UNID.	M	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

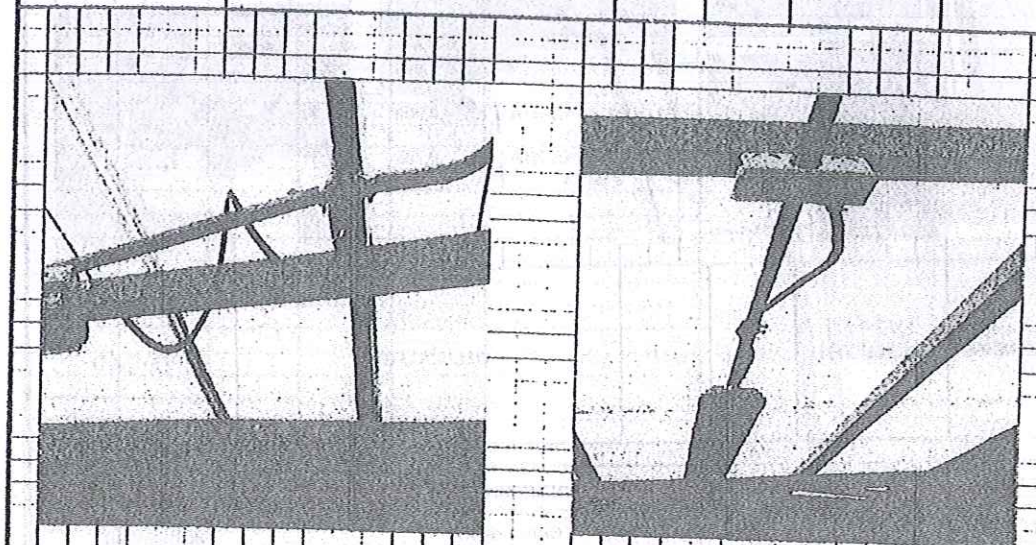

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
CASILLEROS PARQUEADEROS			0,90	4	3,60
Subtotal					3,60
% Desperdicio					0,00
TOTAL					3,60

OBSERVACIONES: SE COLOCA CABLE ENCAUCHETADO PARA CONEXIÓN DE LUMINARIAS HERMETICAS.

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional

ING																			
Código: SDM-KING-POL-05																			
FECHA																			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2019													

MEMORIA DE CÁLCULO


Versión: 0																			
DIA																			
Fecha de Emisión: 2014-08-21																			
30																			
MES																			
11																			
Página: 1 de 1																			
AÑO																			
2019																			

CORTE N°	5																		
ELABORÓ	ING. ANDRES MAURICIO URREA RIVERA																		

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO																		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019																		
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S																		

NIT O C.C.	901294146-6																		
CONTRATO N°	20191653																		
NIT O C.C.	901025544-1																		
CONTRATO N°	20191601																		

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS																		
ITEM	253																		
DESCRIPCIÓN	Reposición clavijas. Incluye revisión y desmonte existentes.																		
UNID.	UND																		
UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA																		

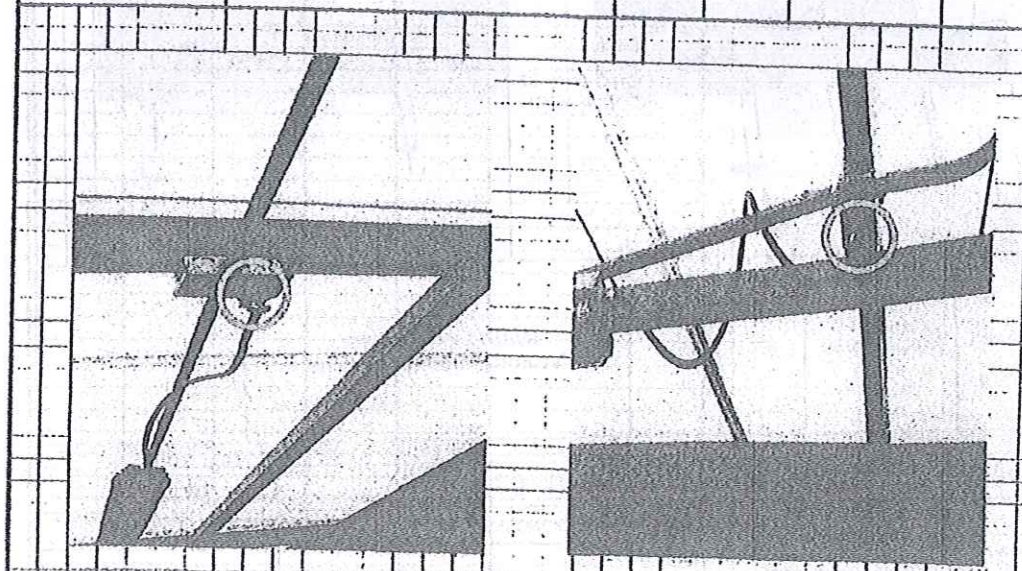

OBSERVACIONES: SE COLOCA CABLE ENCAUCHETADO PARA CONEXIÓN DE LUMINARIAS HERMETICAS.

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
CASILLEROS PARQUEADEROS				4	4,00
Subtotal					4,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					4,00

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoría: Mat. Profesional

ING

MEMORIA DE CÁLCULO


Código: SDM-KING-POL-05 | Versión: 0 | Fecha de Emisión: 2014-08-21 | Página: 1 de 1

FECHA	DD	30	MM	11	AA	2019	DIA	30	MES	11	AÑO	2019

CORTE N° 5 | ELABORÓ: ING. ANDRES MAURICIO URREA RIVERA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019 — NIT O C.C. 901294146-6 — CONTRATO N° 20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT O C.C. 901025544-1 — CONTRATO N° 20191601

CAPÍTULO	NO PREVISTO	ITEM	NP-70	DESCRIPCIÓN	Suministro e instlación de válvula Institucional Sanitaria Antivandalica 6 litros para taza trevi (C81). Ref.751270001 corona o equivalente . Cromo	UNID.	UND	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

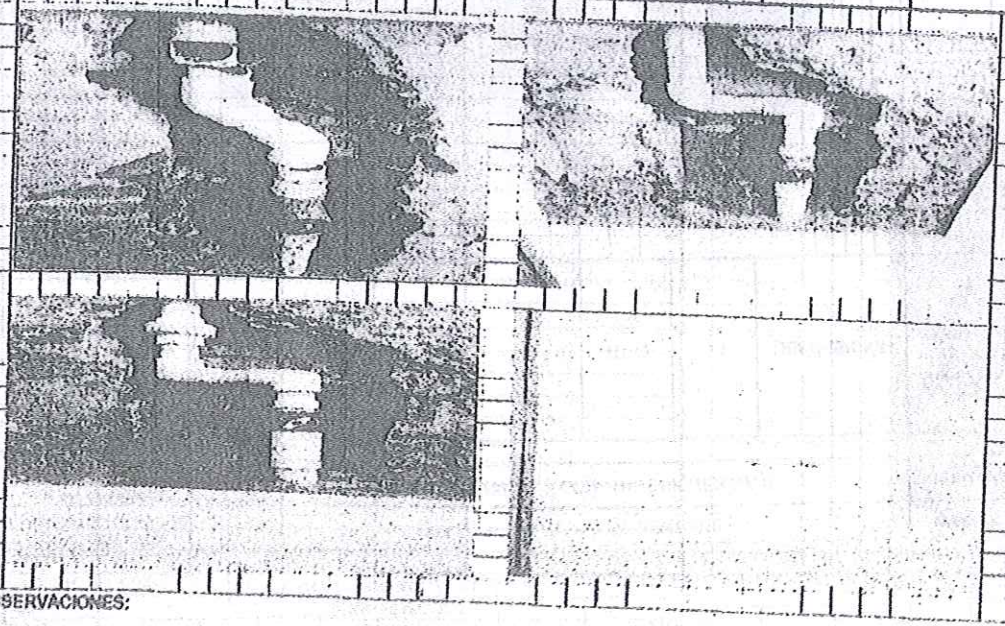

Localización	Dimensiones: Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
BAÑO MUJERES PISO 2 BLOQUE A				1	1,00
BAÑO MUJERES PISO 3 BLOQUE A				1	1,00
Subtotal					2,00
% Desperdicio					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional

Director de obra: Mat. Profesional

Interventoría: Mat. Profesional


ING

MEMORIA DE CÁLCULO

Código: SDM-KING-POL-03							Versión: 0	Fecha de Emisión: 2014-08-21				Página: 1 de 1			
FECHA							DIA	30	MES	11	AÑO	2019			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2019	CORTE N°	5	ELABORÓ	ING. ANDRES MAURICIO URREA RIVERA					

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019	NIT O C.C.	901284146-6	CONTRATO N°	20191653
CONTRATISTA	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	901025544-1	CONTRATO N°	20191601

CAPÍTULO	NO PREVISTO	ITEM	109	DESCRIPCIÓN	LUCERNARIO EN POLICARBONATO MACIZO DE 3MM DE ESPESOR COLOR CRISTAL CON SOPORTES EN PERFIL TUBULAR DE 0,25 M X 0,25 M CADA 1,20 M. POR ENCIMA Y POR DEBAJO Y CON CONECTORES TIPO OMEGA O EQUIVALENTE CADA 2,05 M INCLUYE FLANCHES LATERALES INTERNOS DE POLICARBONATO. SUMINISTRO E ISNTALACION.	UNID.	M2	UBICACIÓN	POLICIA METROPOLITANA

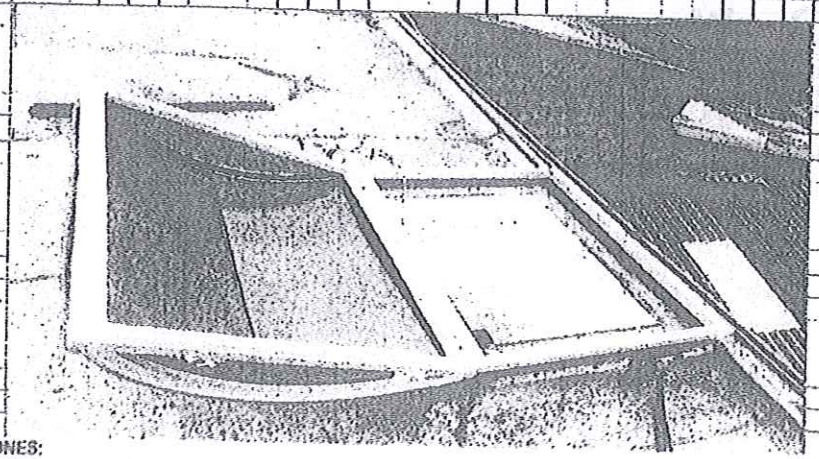

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
CUBIERTA BLOQUE B	1,000		1,08		1,08
Subtotal					1,08
% Desperdicio					0,00
TOTAL					1,08

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional

Director de obra: Mat. Profesional

Interventoria: Mat. Profesional

~~103~~

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

GESTION ADMINISTRATIVA

Formato acta de reunión

CÓDIGO: PA01-PRO-F02 | Version 1.0

TEMA:

Recorrido Frente de Trabajo Policia Metropolitana

FECHA 29/10/19 | HORA 10:30 am | LUGAR Policia Metropolitana

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Ing. Andres Urrea	Contratista
Arq. Lynda Paez	Interventoria
Arq. Luisa Guevara	Interventoria
Intendente Carlos portela	Intendente policia metropolitana
Ing. Oscar Saavedra	contratista SDM

2. ORDEN DEL DIA

Recorrido por la sede

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hace el recorrido con el Ing Oscar Saavedra y el intendente Carlos portela. Se dejaran las respectivas observaciones en el recorrido.
Se subsana temas pendientes de la cubierta de q cuando llueve todo el agua se pasa, el agua baja directamente en los radares
Se pide al contratista q la cubierta funcione para el agua como para el sol, ponerlo mas bajo y mover la camara, contratista dice q no se expreso q la cubierta era para proteccion de agua, por estetica del lugar quieren quitar las tejas q protegen los radares
La arquitecta luisa Guevara empieza a verificar los 53 requerimientes entregados a Policia Metropolitana, Se verifica reposicion de 2 luminarias del baño de mujeres
- Se verifica entrega de baños policia Metropolitana
- cambio de push fueron cambiados
- Se verifico entrega de division faltante de baños
- Se instalo una lampara de mujeres.
- Se encuentra nuevos requerimientos q volveran hacer sobre los baños
- Reposicion de chapas de baño mujeres y hombres
- Reposicion de lampara (sobre) en baño de mujeres queda pendiente
- Verificacion de puesta shut
- Verificación de soldadura de puertas queda completa
- Lamparas, pintura y resane verificado
- Lamparas donde estan los lockers

482

~~A/3~~

75

Sanidad
- Cambio de vidrio
- Ajuste de puerta de vidrio
- poner un tope para la puerta de vidrio
- Se encuentra un problema con la llave de la cocina en Sanidad
- Se arreglo el sol del baño de sanidad

En la parte de archivo solicitan anclar con un chazo en unos Estantes una platina en L para q' se ancle

En la zona de peluquería se solicita arreglar el cielo raso el señor contratista viene despues y sibrara el techo y la lampara, el cielo raso ya Estaba manchado, la afectacion ya estaba desde antes dicen q' no fue atendido el problema a tiempo y se inundo, al contratista se le hara el requerimiento
- Se verifica reposicion de esquineros
- Se encuentra un esquinero doñado y levantado se tienen fotos de q' eso ya había sido arreglado
- puerta segundo piso, instalar toda nuevamente no cambiar la paratela, se genera ruido se verifico y no es problema de la visagra, falta tope para la puerta

En la sala de computo
- Se verifica problema de domo quedo con Tapa esta solucionado tiene garantia.

Torre A
- Se verifico esquineros
- Reposicion de puerta de vidrio oficina
- El contratista se compromete de entregar llaves al intendente portela de la oficina juridica.
- verifica push Baño 4 pisos mujeres (2 piso)

Se encuentra una solicitud de Revision de escape pero no se encuentra se pide anular.
- Pendiente dejar llaves para lavamanos de mujeres
- 3 piso reposicion push Baño de mujeres
- En el baño de hombres se encuentra una fuga, pegar con silicona y ajustar Sifon de lavamanos pendiente q' fijen y ajustar.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Listado de asistencia a reuniones y eventos

Código: PA01-PR01-F01 | Versión 1.0

TEMA: Recorrido Frente de Trabajo Policía Metropo LUGAR: Policía Metropolitana

RESPONSABLE: Luisa Fernanda Guevara FECHA/HORA: 29 oct / 2019

NO.	Nombre	Entidad/ Dependencia	Cargo	Tel/Ext.	Correo Electrónico	Firma
17	Lynda Pozo	Interventoría	Residente 2 Interventoría	3108744111	lynda91s@hotm	
18	Carlos Portela Espitia	Setra	Logística	3209838499	Carlos.portela@correo.policia	
19	Andrés Mauricio Orrego R.	Contratista	Ing Residente	3114820757	andres_ing550@hotmail	
20	Luisa Fernanda Guevara	Interventoría	Residente Intv.	3212081041	luisafgh@hotmail.com	
21	Oscar Fernando Saavedra C	Contratista	SDM-SCTT	3115903202	osaavedra@movilidad	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

* La información institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad registrada en este formato es de carácter público.
* Mediante el registro de sus datos personales y la firma en el presente listado de asistencia a reuniones y eventos, usted autoriza a la Secretaría Distrital de Movilidad al almacenamiento y uso de los mismos únicamente con fines estadísticos en concordancia con la Ley 1581 de 2012.

KING CO
KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

CD-MEDIO MAGNETICO

485
