
INFORME MENSUAL NO. 11 **MES O PERIODO:** JUNIO DE 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO SAN JOSÉ DE URÉ**		X		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		8
2.1	Localización		X		8
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		10
2.3	Características técnicas del proyecto		X		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		13
3.1	Información general del contrato		X		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		17
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		20
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		21
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		23
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		25
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		27
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		29
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		31
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		33
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		35
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		38
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		41
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		44
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	45
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	45
	• Seguimiento Programa de Obra		X		46
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		47
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		47
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		50
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	58
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		59
5	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO PUERTO LIBERTADOR**		X		69
6	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		71
6.1	Localización		X		71
6.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		72
6.3	Características técnicas del proyecto		X		72
7	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		73
7.1	Información general del contrato		X		73
7.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		74
7.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		75
7.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		75
8	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		78
8.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		79
8.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		81
8.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		83
8.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		86
8.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		88
8.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		80
8.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		92
8.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		94
8.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		97
8.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		100
8.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		102
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	104
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	104
	• Seguimiento Programa de Obra		X		105
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		106
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		106
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		109
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		X	119
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		120
9	**INTRODUCCIÓN MUNICIPIO VALENCIA**		X		128
10	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		130
10.1	Localización		X		130
10.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		131
10.3	Características técnicas del proyecto		X		131
11	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		133
11.1	Información general del contrato		X		133

11.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		134
11.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		134
11.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		134
12	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		136
12.1	Información general del contrato		X		136
12.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		137
12.3	Informes especialistas		X		137
12.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		138
12.5	Información otros programas y aplicativos		X		139
13	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		X		140
13.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		141
13.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		143
13.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		145
13.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		147
13.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		149
13.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		151
No.	**CONTENIDO**	**FORMATO**	**ADJUNTO**		
			SI	**NO**	**FOLIO**
13.7	Otros documentos seguimiento mensual			X	154
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	155
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	155
14	**Conclusiones y recomendaciones**		X		156
15	**Anexos**		X		157
15.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		158
15.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		159
15.3	Actas de entrega y recibo definitivo de obra		X		172

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

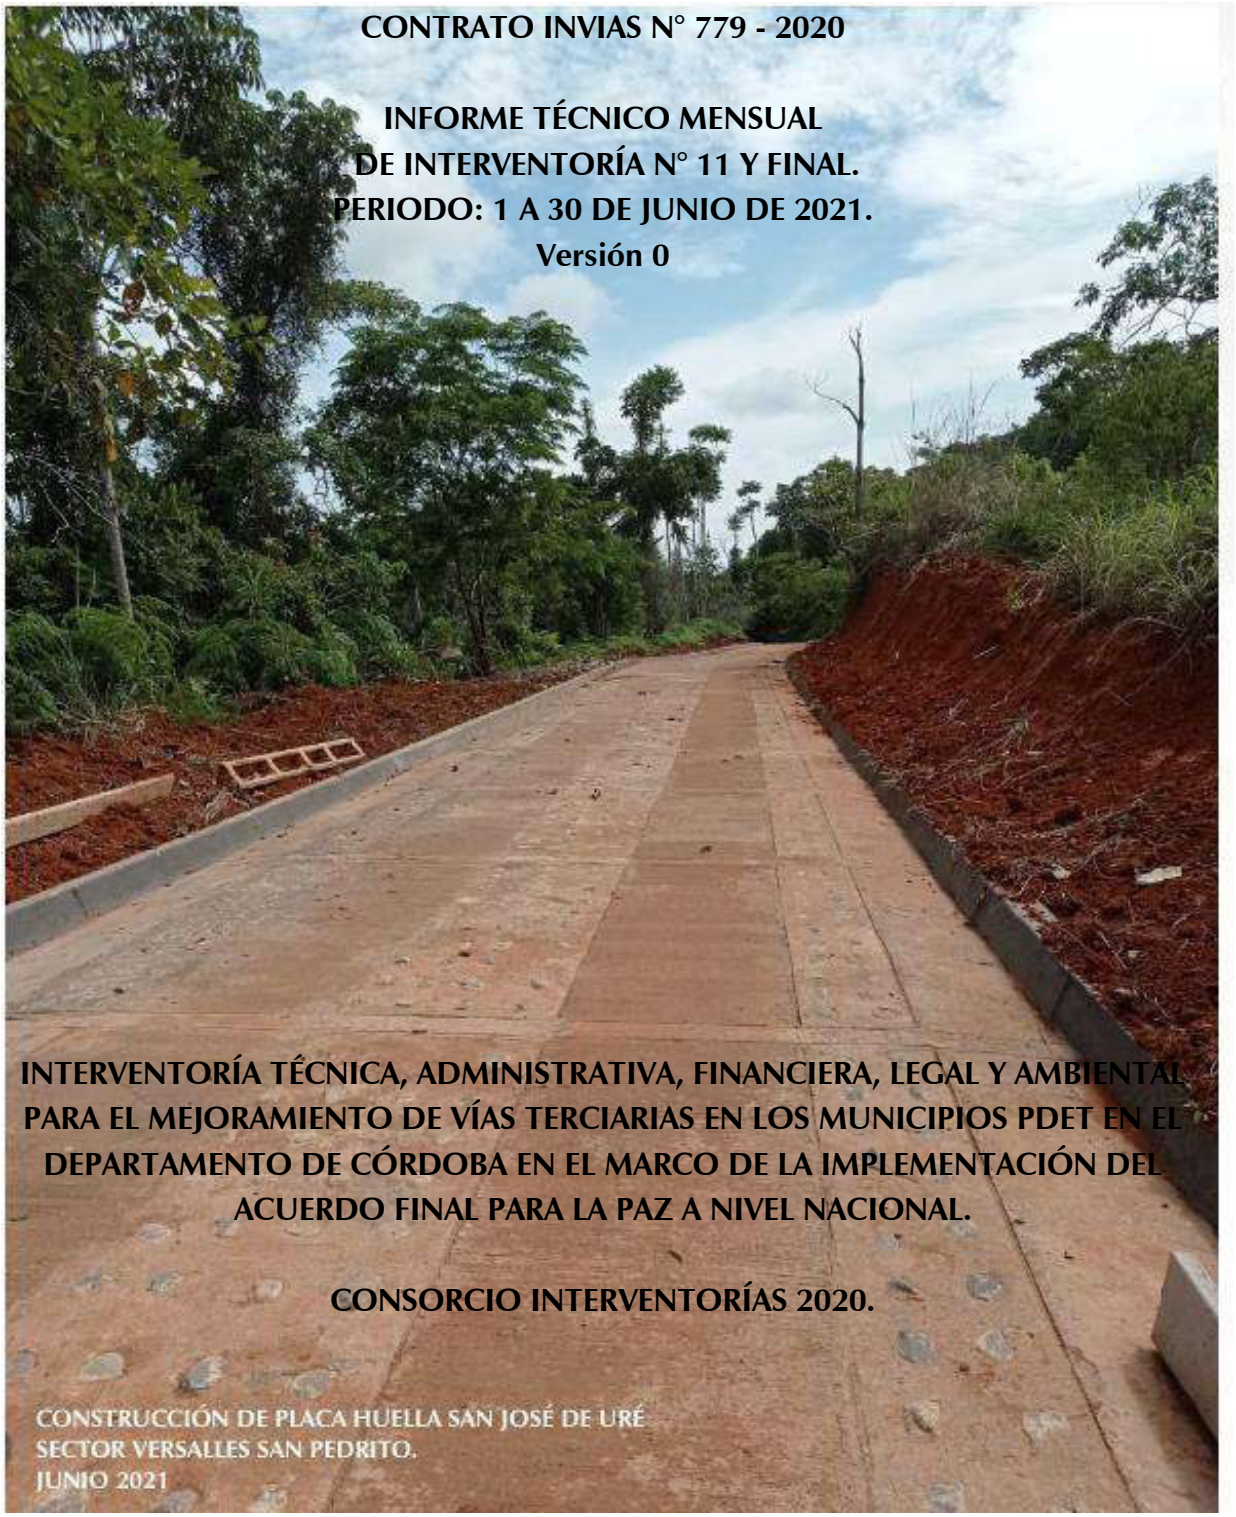

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 321 2400 302
Email: proyectos@ryjingenieria.com
www.ryjingenieria.com

VERSIÓN N°	FECHA	PÁGINAS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	COPIA CONTROLADA SI	COPIA CONTROLADA NO
0	6 / Dic / 2021			X	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Director de Interventoría **Juan Diego Jiménez Serna**	**Director de Interventoría.** **Juan Diego Jiménez Serna.**	**Supervisor contrato interventoría.** **Laura Isabela Peña Garcia.**

Revisó: Sair Saul Silgado Lopez
Abogado apoyo Territorial Córdoba

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

COPIA N°	EMITIDA A	FECHA DE DISTRIBUCIÓN
1	INVIAS	

CONTRATO DE OBRA No. 056 de 2020

SAN JOSÉ DE URÉ

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 321 2400 302
Email: proyectos@ryjingenieria.com
www.ryjingenieria.com

1 INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 11 y FINAL** correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2021 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabela Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

Mediante Prorroga Número uno (01) de 2020 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 13 de Marzo de 2021.

Mediante Prorroga Número dos (02) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 30 de Abril de 2021.

Mediante Prorroga Número tres (03) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 30 de Junio de 2021.

Mediante Adición Número uno (01) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la adición por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($50.000.000,00).

El Acta de iniciación al contrato No. 056 de 2020, correspondiente al municipio de San José de URÉ, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista 4L INGENIERÍA S.A.S. la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ representado por el secretario de Planeación Municipal.

Mediante Prorroga Número uno (01) de 2021 del contrato 056 de 2020 se concede por solicitud del CONTRASTISTA 4L INGENIERIA S.A.S. la ampliación del plazo del contrato de obra hasta el 30 de Abril de 2021.

Mediante Prorroga Número dos (02) de 2021 del contrato 056 de 2020 se concede por solicitud del CONTRASTISTA 4L INGENIERIA S.A.S. la ampliación del plazo del contrato de obra hasta el 30 de Junio de 2021.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SAN JOSÉ DE URÉ

De acuerdo con el Convenio Interadministrativo Numero 000551, suscrito entre el Municipio de San José de URÉ Córdoba y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural, se tiene que de los 10.000 metros de vías que tiene el tramo VERSALLES- BRAZO IZQUIERDO – ALTO DEL CRISTAL; la entidad entrara a construir 500 metros de placa huella, y del tramo VERSALLES – SAN PEDRITO que tiene una longitud de 8000 metros, se construirá 560 metros de Placa Huella. Para un total de 1060 metros de obra efectivamente construida (Placa huella).

Las vías objeto del alcance del contrato se encuentran catalogadas como vías rurales, y se encuentran en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad a los sitios descritos a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ	
San José de Uré:	• Tramo N° 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal • Tramo N° 2 – Versalles – San Pedrito

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SAN JOSÉ DE URÉ

El mejoramiento de vías en el Municipio de San José de URÉ contempla dos tramos: el tramo Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal que se localiza en la parte sur del municipio y el tramo Versalles – San Pedrito que se localiza en el costado sur del municipio.

El tramo N° 1 a mejorar se localiza desde el K0+000 (inicio de placa huella vereda Versalles) al K10+000 (Vereda Alto del Cristal).

El tramo N° 2 a mejorar se localiza en el K0+000 (Puente vehicular) en las coordenadas 829556.004 N y 1345283.72 E al K9+700 (Escuela San Pedrito), a la cual en la visita de reconocimiento no se tuvo acceso por las difíciles condiciones de transitabilidad y acceso, ya que es necesario pasar la quebrada Uré.

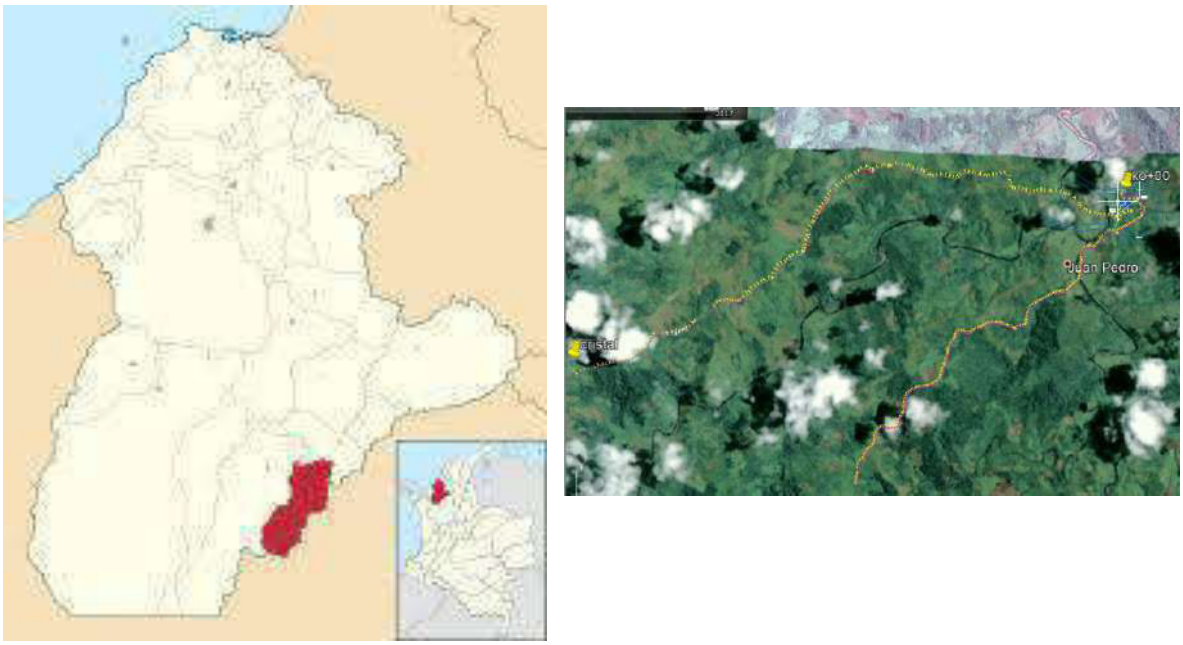


Figura 1. Zona de localización de los tramos a intervenir
Fuente: Informe de Topografía URÉ



Figura 2. Trazado Versalles – Brazo – Izquierdo – Alto de Cristal
Fuente: Anexo Técnico San José de URÉ



Figura 3. Trazado Versalles - San Pedrito
Fuerte: Anexo Técnico San José de URÉ

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
San José de Uré	Tramo N° 1 – Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal.	500,00	7,00
	Tramo N° 2 – Versalles – San Pedrito.	560,00	7,00

La visita de reconocimiento a los tramos viales se realizó el 18 de agosto de 2020, en compañía de Contratista, Alcaldía, INVIAS e Interventoría, encontrando inconvenientes para el acceso al Tramo N° 2 Versalles – San Pedrito para el cual hay que atravesar la quebrada San Antonio, y el día de la visita no fue posible realizar este cruce, ya que no existe puente alguno, por lo tanto,

se reprogramo la visita para el día 25 de Agosto de 2020 con la coordinación de la comunidad y de vehículos de tracción animal.

En el recorrido NO se detectaron las obras a realizar por el deterioro del tramo vial, la rasante de la vía no se encontró definida en todo el recorrido realizado, en el registro fotográfico se evidencia esta situación.

Al respecto de lo encontrado en este tramo se realizó comité virtual el día 31 de agosto de 2020, con el INVIAS, alcaldía, contratista e interventoría para revisar la posibilidad de trasladar los recursos de inversión al tramo N° 1.

En cuanto al sector Versalles – Brazo Izquierdo se realizó visita de reconocimiento el 18 de agosto de 2020 detectando las obras a ejecutar y los sectores de placa huella a construir.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, limpieza de alcantarillas, cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que se revisaran por parte del contratista en el primer mes de ejecución del contrato, el cual es de revisión y ajustes a los diseños recibidos.

Tramo 1. Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K2+650	7	1	1	BOX COULVERT
K4+200 – K4+400	200	5	0.15	PLACA HUELLA
K4+880 – K5+030	150	5	0.15	PLACA HUELLA
K7+000 – K7+150	150	5	0.15	PLACA HUELLA
SERÁN PRIORIZADAS	4000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	3.1 Ha			Rocería a cada lado de la vía

Tramo 2. Versalles – San Pedrito

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K1+700 – K1+910	210	5	0.15	PLACA HUELLA
K3+400 – K3+550	150	5	0.15	PLACA HUELLA
K4+000 – K4+200	200	5	0.15	PLACA HUELLA
K5+680	6	0.9	0.9	Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K5+700	7	1	1	BOX COULVERT
SERÁN PRIORIZADAS	4000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	4 Ha			Rocería a cada lado de la vía

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SAN JOSÉ DE URÉ

3.1 NFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SAN JOSÉ DE URÉ

CONTRATO DE OBRA N° 056 DE 2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.096.689.836,00 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE URÉ
CONTRATISTA	**4L INGENIERÍA S.A.S.**, NIT. 901.144.628-1 R.L. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ PADILLA
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CALLE 35 # 8 A 4
PBX	3 23 28 62
CORREO ELECTRÓNICO	Jose.mor2012@hotmail.com
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PRORROGA NO. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
PRORROGA NO. 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2021
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° 056 de 2020, por la aseguradora suramericana, hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
2648705-3	Cumplimiento	14/08/2020	29/12/2021	$109.668.984,00	CONTRATO DE OBRA	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/08/2020	29/12/2024	$219.337.967,00		
	Estabilidad de Obra.	14/08/2020	14/10/2025	$329.006.951,00		
	Calidad de los bienes y equipos suministrados	14/08/2020	14/10/2025	$5.754.104,00		
0703665-5	Responsabilidad civil	14/08/2020	29/06/2021	$175.560.600,00		

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2021:

- En la semana 43 del proyecto, el contratista realiza traslado de equipos y materiales del otro lado de la quebrada, se realizó comité semanal de obra No 64 y se informó que la obra no presenta atraso en el corte semanal, se solicita mejorar rendimiento abriendo nuevos frentes de obra y el inicio de labores de los emprendedores rurales. Se funden placas para un volumen de 23,7 M3 de Concreto clase D, se funde 21 M3 de cunetas, 10,1 M3 de concreto ciclópeo y se instalan 2708 Kg de acero entre las abs 1+ 700 hasta la 2+260 del sector San Pedrito. De acuerdo al balance presupuestal del contrato se hace necesario un valor adicional para cumplir con la meta física del proyecto por parte del contratista se radica dicha solicitud y por parte de la Interventoría se avala mediante comunicado C.Int-315-2020 radicado ante la Alcaldía Municipal.
- En la semana 44 del proyecto, el contratista continua con el avance de la construcción de placa huella en el Sector Versalles – San Pedrito. Se realizó comité semanal de obra No 65 y se informó que la obra no presenta atraso en el corte de la semana, se reitera a la entidad contratante el concepto dado por la interventoría frente al recurso adicional necesario para terminar la meta física del proyecto.
  Se emitieron los siguientes comunicados:
  C.Int-320-2020 se solicita al contratista documentación pendiente como la planilla de aportes y la reiteración del inicio de actividades como emprendedores rurales.
  C.Int-321-2020 se solicita a la Alcaldía los informes bimensuales de Abril y Mayo.
  C.Int-322-2020 se realizan observaciones al contratista frente al informe mensual PAGA del mes de Mayo de 2020.
  C.Int-323-2020 se informa al contratista de la documentación para la liquidación del contrato de obra con la finalidad que se prepare lo pertinente con tiempo en todas las áreas.
  C.Int-327-2020 se reitera a la Alcaldía Municipal sobre la necesidad del cumplimiento de la meta física del convenio suscrito con INVIAS.
  C.Int-330-2020 se solicita al contratista atender las observaciones recibidas por parte del INVIAS de acuerdo a oficio SMA 26603.
- En la semana 45 del proyecto, el contratista continua con las actividades programadas fundiendo 7,8 m3 de concreto, instala 150 m3 de sub-base granular en el sector San Pedrito.

Se emite el comunicado C. Int-336-2021 solicitando al contratista el inicio inmediato de las actividades de emprendedores rurales.

Se presenta un leve atraso de 1,79% por lo tanto se reitera la toma de acciones ya que el contrato está próximo a terminar.

Se realiza comité semanal de obra No 67 reiterando a la entidad contratante la necesidad de conseguir los recursos adicionales para terminar la meta física del contrato.

- En la semana 46 del proyecto se continua con las actividades programadas y se funde concreto y ciclópeo, se presenta un atraso mayor al de la semana anterior llegando a un 4,29% de retraso, por lo que se reitera por parte de interventoría el plazo faltante y la necesidad de un plan de contingencia para la última semana del contrato y poder cumplir con lo establecido en la programación.

  Se realiza el comité semanal de obra No 69, como compromiso de la Alcaldía queda estipulado la entrega de la respuesta al oficio C.Int-315-2021 de interventoría en el cual se da el aval a la solicitud de adición emitida por el contratista, dicha respuesta se entregará el 23 de Junio de 2021, de la misma manera el contratista entregará el plan de contingencia para la terminación del contrato en los tiempos del proyecto.

  Se emiten los siguientes comunicados:

  C. Int – 339 – 2021 se realizan observaciones para el cierre ambiental y social del contrato.

  C. Int – 341 – 2021 se realiza la implementación de la cartilla de emprendedores rurales de inmediato.

  C. Int – 344 – 2021 se da respuesta a INVIAS al comunicado SMA 26603.

  C. Int – 345 – 2021 se manifiesta a la entidad contratante el alcance del contrato de obra y su cumplimiento en meta física.

- En la semana 47 y final del proyecto, el contratista finaliza con la inversión hasta el presupuesto oficial del contrato, no hubo adición de recursos por parte de la Alcaldía Municipal por lo que la meta física no se pudo culminar.

  Se funden placas en el tramo K1+700 a K2+260.

  Se emiten los siguientes comunicados:

  C. Int – 346 – 2021 reiterando a la Alcaldía Municipal el alcance físico del contrato de obra.

  C. Int – 347 – 2021 dirigido a la Alcaldía Municipal en respuesta a la NO inversión de más recursos y alcanzar la meta física del proyecto.

  C. Int – 350 – 2021 dirigido a la empresa contratista dando respuesta al comunicado No 4L-025-2021, dando la NO viabilidad para el alcance de 923 ml de placa huella.

C. Int – 352 – 2021 comunicado al INVIAS reiterando el estado actual del cierre ambiental y social del proyecto.
C. Int – 355 – 2021 realizando citación de comité de obra a contratista y alcaldía.

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No	056 - 2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	779 DE 2020
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA	4L INGENIERIA SAS	CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.096.689.836,00	VALOR DEL CONTRATO	$ 426.076.525,00
VALOR ADICIONAL		VALOR ADICIONAL	$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 1.096.689.836,00	VALOR TOTAL	$ 476.076.525,00
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL	HASTA 31/12/2020
PRORROGA 1	UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DIAS	PRORROGA 1	HASTA 13/03/2021
PRORROGA 2	DOS (02) MESES	PRORROGA 2	HASTA 30/04/2021
		PRORROGA 3	HASTA 30/06/2021
FECHA DE INICIACIÓN	vie. 14 ago. 20	FECHA DE INICIACIÓN	mar. 4 ago. 20
TERMINACIÓN ACTUAL:	mié. 30 jun. 21	TERMINACIÓN ACTUAL:	mié. 30 jun. 21
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS	PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 877.351.868,00	VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 444.827.000,00
VALOR POR PAGAR A LA FECHA:	$ 1.096.689.836,00	VALOR POR PAGAR A LA FECHA:	$ 31.249.525,00
ANTICIPO:	$ -	PAGO ANTICIPADO:	

AVANCE FÍSICO

CORTE A: mié. 30 jun. 21

	%	INVERSIÓN
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	100,00%	$ 1.096.689.836,00
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100,00%	$ 1.096.689.836,00
POR EJECUTAR	0,00%	$ -
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	$ -



AVANCE EN TIEMPO

mié. 30 jun. 21

	%	Días
TIEMPO CONTRATADO:	100%	320
TIEMPO EJECUTADO:	100,00%	320
TIEMPO POR EJECUTAR:	0,00%	-
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	-



AVANCE FINANCIERO

CORTE A: mié. 30 jun. 21

	%	VALOR
PRESUPUESTO CONTRATO	100%	$ 1.096.689.836,00
ACUMULADO ACTAS	80,00%	$ 877.351.868,00
POR PAGAR EN ACTAS	20,00%	$ 219.337.968,00



El contrato actualmente se encuentra con un porcentaje programado acumulado: 100,00%, porcentaje ejecutado acumulado: 100,00%, porcentaje de atraso 0.00%, Valor ejecutado: $ 1.096.689.836,00.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se realizó ninguna adición de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 01 al 30 de Junio de 2021, se generaron los siguientes comunicados:

C.Int-320-2020 se solicita al contratista documentación pendiente como la planilla de aportes y la reiteración del inicio de actividades como emprendedores rurales.
C.Int-321-2020 se solicita a la Alcaldía los informes bimensuales de Abril y Mayo.
C.Int-322-2020 se realizan observaciones al contratista frente al informe mensual PAGA del mes de Mayo de 2020.
C.Int-323-2020 se informa al contratista de la documentación para la liquidación del contrato de obra con la finalidad que se prepare lo pertinente con tiempo en todas las áreas.
C.Int-327-2020 se reitera a la Alcaldía Municipal sobre la necesidad del cumplimiento de la meta física del convenio suscrito con INVIAS.
C.Int-330-2020 se solicita al contratista atender las observaciones recibidas por parte del INVIAS de acuerdo a oficio SMA 26603.
Se emite el comunicado C. Int-336-2021 solicitando al contratista el inicio inmediato de las actividades de emprendedores rurales.
C. Int – 339 – 2021 se realizan observaciones para el cierre ambiental y social del contrato.
C. Int – 341 – 2021 se realiza la implementación de la cartilla de emprendedores rurales de inmediato.
C. Int – 344 – 2021 se da respuesta a INVIAS al comunicado SMA 26603.
C. Int – 345 – 2021 se manifiesta a la entidad contratante el alcance del contrato de obra y su cumplimiento en meta física.
C. Int – 346 – 2021 reiterando a la Alcaldía Municipal el alcance físico del contrato de obra.
C. Int – 347 – 2021 dirigido a la Alcaldía Municipal en respuesta a la NO inversión de más recursos y alcanzar la meta física del proyecto.

C. Int – 350 – 2021 dirigido a la empresa contratista dando respuesta al comunicado No 4L-025-2021, dando la NO viabilidad para el alcance de 923 ml de placa huella.
C. Int – 352 – 2021 comunicado al INVIAS reiterando el estado actual del cierre ambiental y social del proyecto.
C. Int – 355 – 2021 realizando citación de comité de obra a contratista y alcaldía.
El proyecto se culmina con la faltante de la meta física a cumplir, tal y como se puede evidenciar en los comunicados del período, la posición de la Interventoría y el Instituto fue recalcar el cumplimiento de la meta física del proyecto el cual se priorizó en 1000 ml y no 923 ml como lo manifestó el Municipio en su comunicado de respuesta a nuestros oficios.
Se deja la salvedad en el acta de recibo definitivo de la situación y se deja constancia por escrito del no cumplimiento.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE JUNIO DE 2021:

VALOR FACTURADO	$ 877.351.868,00	80,00%

A la fecha de presentación del informe, el contratista ha facturado el 80% del contrato, de acuerdo a la forma de pago del mismo, una vez se obtenga el acta de recibo definitivo de las obras y la documentación de liquidación, se tramitará el último desembolso del convenio que corresponderá al 20% faltante por cobrar.

AVANCE FÍSICO AL MES DE JUNIO DE 2021:

PROGRAMADO	100,00%
EJECUTADO	100,00%

La meta física cumplida en la ejecución del proyecto fue la siguiente:

TRAMO 1.
Vereda Versalles – Brazo Izquierdo – Alto del Cristal: 500 ml

TRAMO 2.
Vereda Versalles – San Pedrito: 400 ml

Total ml intervenidos: 900 ml.

AVANCE PREDIAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Se debe dar inicio al recibo de las obras objeto de la Interventoría, de la misma forma solicitar toda la documentación pertinente para los trámites de liquidación del contrato de obra.

4 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 056 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA MARCO IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA

PLAZO INICIAL: SIETE MESES (7)
FECHA DE INICIACION: 14 DE AGOSTO 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.096.689.836,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.096.689.836,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 10,5 meses
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción	ML	1000
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción	ML	900
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 321.283.175,32	$ 315.181.290		$ 315.181.290	98%	$ 10.416.508,21	100,00%	3,30%
Acumulado:	$ 1.096.689.836,00	$ 1.096.689.836		$ 1.096.689.836	100%	$ 158.692.175,00	100,00%	14,47%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.096.689.836
Total	$ 1.096.689.836

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1,00	10,50	1,00	0,00	$ -	0	$ -	$ -
Interventor:	0,93	10,00	1,00	0,00	$ 31.570.824,62	0	$ 31.570.824,62	$ 31.570.824,62

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 16.117.939,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 16.117.939,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14-ago-20	29/12/21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14/08/20	29/12/21
Calidad de Estudios y Diseños	14/08/20	14/10/25
Estabilidad y Calidad de Obra	14/08/20	14/10/25

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	24/07/20	29/06/21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: Otro Si No 2 de 28 Abril de 2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se recalcó sobre el cumplimiento de la meta física del contrato y la necesidad de la adición de recursos para ello, la entidad contratante definió no adicionar recursos al contrato, por lo tanto la meta física no se alcanzó a cumplir.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Como mes final del contrato se realizó lo pertinente para cumplir con la ejecución del presupuesto oficial, posterior al recibo final de la obra se deberá agilizar la documentación de liquidación del contrato y convenio con INVIAS.

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** 056 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS **SECTOR:** SAN JOSE DE URÉ
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPRESOR 125 PIES 3 CON MARTILLO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FORMALETA METALICA CONCRETO HIDRAULICO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CIZALLA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MINICARADOR DE PALA Y RODILLO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: ANA MARÍA LAKAH NOVA
Residente de Obra
Matrícula No.: 2202221903 COR

Firma
Nombre: CARLOS CORTÉS VALERO
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 0820275862 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE OBRA No.** 056 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS **SECTOR:** SAN JOSE DE URÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rafael Eduardo Montes Navas	Director de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ana Maria Lakah Nova	Residente de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Johanis Vasquez Padilla	Tecnico SGSST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Angelica Guilianis Durango	Profesional de trabajo social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eliecer Manuel Pertuz Polo	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jose Edwin Roqueme Ciprian	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ivan Andres Ortiz Martinez	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amaury Antonio de Hoyos Vega	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Manuel Sabino Mendez Ciprian	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Yair Correa Londoño	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Leider Jesus Ruda Perez	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jose Argelio Roqueme Ciprian	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jader Manuel Ortiz Padilla	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Diego David Sotelo	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Argelio José Cipriam Roqueme	Ayudante de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: ANA MARÍA LAKAH NOVA
Residente de Obra
Matricula No.: 2202221903 COR

Firma
Nombre: CARLOS CORTÉS VALERO
Residente de Interventoría
Matricula No.: 0820275862 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA

MES INFORME MENSUAL: MAYO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

SECTOR: SAN JOSE DE URE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	155		155	SRG	056 DE 2020	$ 1.096.689.836,00
			TOTAL			1.096.689.836,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.096.689.836,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Parcial	2020	$ 327.570.603	$ 1.436.347,88	$ 329.006.950,80	$ -	$ -	$ 767.682.885	$ 329.006.951	$ 767.682.885	26/01/2021	X		
TOTALES			$ 327.570.603	$ 1.436.348	$ 329.006.951	$ -	$ -	$ 767.682.885	$ 329.006.951	$ 767.682.885				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.066.725.168		$ 1.066.725.168
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.784.321		$ 10.784.321
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 16.117.939	$ 3.062.408	$ 19.180.347
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL	$ 1.093.627.428	$ 3.062.408	$ 1.096.689.836

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RAFAEL MONTES NAVAS
Director de Obra
Matrícula No.: 2202139976 COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	DE	

FECHA **30** (Día) **6** (Mes) **2021** (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

SECTOR: SAN JOSÉ DE URÉ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	8	8	24	24	24	24	8	8	24	8	8	14	12	24	24	12	24	10	24	24	12	24	12	24	11	24	18	12	24	24		521
Lluvias moderadas	12	8					8	12		8	12	10	9			6		10			6		6		10		2	6				125
Lluvias intensas	4	8					8	4		8	4		3			6		4			6		6		3		4	6				74
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ANA MARÍA LAKAH NOVA
Residente de Obra
Matrícula No.: 2202221903 COR

Firma
Nombre: CARLOS CORTÉS VALERO.
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 0820275862ATL.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA **30** (Día) **6** (Mes) **2021** (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CORDOBA**

CONTRATO DE OBRA No: **056 DE 2020** **CONTRATISTA:** **4L INGENERIA**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **JUNIO** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** **VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO- ALTOS DEL CRISAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO**

SECTOR: **SAN JOSE DE URE**

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	25/06/21	DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E 161 2013	Pavimentación vía Versalles-San Pedrito San José de Uré		95%	103	SI	

OBSERVACIONES:

NOTA:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: RAFAEL MONTES NAVAS
Director de Obra
Matrícula No.: 2202139976 COR

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA.

CONTRATO DE OBRA No: 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERÍA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VERSALLES-BRAZO IZQUIERDO-ALTOS DEL CRISTAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO

SECTOR: SAN JOSE DE URÉ

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																												EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
JOSE ARMANDO NISPERUZA LAZO	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.003.262.435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
CARLOS ANDRES OVIEDO CELESTINO	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.003.290.392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
RIGO HUMBERTO GARCÍA VALDEZ	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.063.277.594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
CESAR ALFONSO CORDERO MENDOZA	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.063.288.640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
EBER LUIS CAMANO MACEA	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.064.188.112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
ANTONIO ENRIQUE MARTINEZ PATERNINA	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.066.602.596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
OVER GUTIERREZ SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.072.493.852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
MIGUEL RAMIRO GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	11.000.284	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
DONATO ANDRES OSORIO CAMARGO	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.197.213.775	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
ALBERTO DAIRO RIVERO	AYUDANTE DE OBRA	jun-21	30	1.197.214.184	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
ANA MARIA LAKAH NOVA	RESIDENTE DE OBRA	jun-21	30	1.067.845.766	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
ANGELICA GUILIANIS VIDAL DURANGO	TRABAJADORA SOCIAL	jun-21	30	50.966.556	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	
JOHANIS VASQUEZ PADILLA	TÉCNICO SG-SST	jun-21	30	30.666.343	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4407652488	30		4407652488	30	4407652488	30	4L INGENIERIA SAS	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : RAFAEL MONTES NAVAS
Director de Obra
Matricula No.: 2202139976 COR

Firma
Nombre : JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No. 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.8 INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA | **ACTA No:** 11 | **PERIODO MES:** JUNIO | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : 056 DE 2020
PLAZO INICIAL: SIETE MESES (7)
PLAZO ACUMULADO: 10,5 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA MARCO IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL
FECHA DE INICIACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-jun-21

SECTOR: SAN JOSE DE URE
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.096.689.836
VALOR ADICIONALES:

RUTA
VALOR ACUMULADO: $ 1.096.689.836,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

TRAMO: VERSALLES-BRAZO IZQUIERDO-ALTOS DEL CRISTAL Y VERSALLES - SAN PEDRITO
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
056 DE 2020	10,5	30/06/21	1.096.689.836,00	1.096.689.836,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.096.689.836
Total	$ 1.096.689.836

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
779 DE 2020	10	30/06/21	$ 476.076.525,00	476.076.525,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)	E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
En el mes:	$ 321.283.175,00	$ 315.181.290		$ 315.181.290	98%	$ 10.416.508,00	100%	3,30%
Acumulado:	$ 1.096.689.836,00	$ 1.096.689.836		$ 1.096.689.836	100%	$ 158.692.175,00	100%	14%
				-				

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1,00	10,50	1,00	0,00	-	0	$ -	$ -
Interventor:	0,33	10,50	1,00	0,00	31.570.825	6	$ 31.570.824,62	$ 31.570.824,62

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 16.117.939,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 16.117.939,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PRO	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PRN	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 832.640	$ 832.640	$ 1.665.280	$ 832.640
Relleno para estructuras con recebo														$ 2.308.350	$ 2.308.350	$ 2.308.350	$ 2.308.350
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 19.633.879	$ 19.633.879	$ 19.633.879	$ 19.653.879
Concreto resistencia 14 Mpa (F)														$ 1.019.755	$ 1.019.755	$ 2.039.510	$ 1.019.755
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 21.532.500	$ 21.532.500	$ 24.523.125	$ 21.532.500
Subbase Granular Clase C														$ 36.079.326	$ 36.079.326	$ 164.557.750	$ 178.212.733
Excavaciones varias en material comun en seco														$ 1.005.620	$ 1.005.620	$ 4.565.776	$ 5.116.908
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 58.075.954	$ 58.075.954	$ 266.311.406	$ 243.436.750
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa														$ 22.876.076	$ 22.876.076	$ 94.025.073	$ 113.470.782
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 55.878.034	$ 55.878.034	$ 248.219.961	$ 251.827.295
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.														$ 45.140.014	$ 45.140.014	$ 187.667.421	$ 189.318.754
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles														$ 378.986	$ 378.986	$ 378.986	$ 378.986
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles														$ 45.600.000	$ 45.600.000	$ 45.600.000	$ 45.600.000
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad														$ 5.228.653	$ 4.800.156	$ 5.228.653	$ 4.800.156
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS														$ -	$ -	$ 19.180.347	$ 19.180.347
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL														$ 5.693.389		$ 10.784.321	
Etapa de cierre financiero														$ -		$ -	
														$ 321.283.176,0	$ 315.161.290	$ 1.096.689.838	$ 1.096.689.835

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre RAFAEL MONTES NAVAS
Director de Obra
Matrícula No. 22021 - 39976 COR

Firma

Nombre JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.9 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 2020 **CONTRATISTA:** 4L INGENIERIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/20

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.096.689.836,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.096.689.836,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.180.346,82

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 19.180.346,82

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 109.668.984,00	14	8	2020	13/09/21		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 219.337.967,00	14	8	2020	14	8	2023
Calidad de Estudios y Diseños	0,52%	$ 5.754.104,00	14	8	2020	14	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 329.006.951,00	14	8	2020	14	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2648705-3

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16%	$ 175.560.600,00	24	7	2020	23	1	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0703665-5 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 109.668.984,00	14	8	2020	29	12	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 219.337.967,00	14	8	2020	29	12	2024
Calidad de Estudios y Diseños	0,52%	$ 5.754.104,00	14	8	2020	14	10	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 329.006.951,00	26	7	2021	26	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2648705–3

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	16%	$ 175.560.600,00	14	7	2020	29	6	2021
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 2648705–3 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: 13 de Septiembre de 2021.

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:



Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 056 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIA EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIO: 14/08/20 (Indicar dia, mes y año) **PLAZO INICIAL:** SIETE (7) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ X NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
PC1102	CONO DE ASENTAMENTO SLUMP PLASTICO	PINZUAR	185745052	16/09/20			
PC133	MOLDE PLASTICO CILINDRICO PARA CONCRETO 6" X 12"	PINZUAR	196026123	2/12/20			
PC165	MAQUINA ELECTRICA DIGITAL PARA ENSAYOS DE CONCRETO - 1000 kN	PINZUAR	190	4/07/20			

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Director de Obra
Matrícula No.: 22202-139976COR

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

✔ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

(NO APLICA)

✔ **Seguimiento Programa de Obra**

✔ **Seguimiento Programa de Inversiones.**

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

MINGRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-AIN-IN-6-FR-1		
EDICIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA — **PROGRAMA DE INVERSIONES** X

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 5

CONTRATO No: 056 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA S.A.S.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal Y Versalles - San Pedrito
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código del INV)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INCIACION DEL CONTRATO: 14/08/20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (*Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.096.689.836,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.096.689.836,00

PLAZO ACUMULADO: 10,5 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/21 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (*Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021	8 MARZO DE 2021	9 ABRIL DE 2021	10 MAYO DE 2021	11 JUNIO DE 2021		
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.665.280,00 / $1.665.280,00	0,152% / 0,152%	50,00% / $832.640	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%		100%
				$ P										$832.640	$832.640		
				$ E											$832.640		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%		
Relleno para estructuras con recebo	$2.308.350,00 / $2.308.350,00	0,210% / 0,210%	100,00% / $2.308.350	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%		90%
				$ P											$2.308.350		
				$ E											$2.308.350		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%		
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$19.633.878,60 / $19.633.878,60	1,790% / 1,790%	100,10% / $19.653.879	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%		80%
				$ P											$19.633.879		
				$ E											$19.653.879		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%		
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	$2.039.509,50 / $2.039.509,50	0,186% / 0,186%	50,00% / $1.019.755	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%		70%
				$ P										$1.019.755	$1.019.755		
				$ E											$1.019.755		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%		
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	$24.523.125,00 / $24.523.125,00	2,236% / 2,236%	87,80% / $21.532.500	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	1,96%		60%
				$ P										$2.990.625	$21.532.500		
				$ E											$21.532.500		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%		
Subbase Granular Clase C	$164.557.749,60 / $164.557.749,60	15,005% / 15,005%	108,30% / $178.212.733	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	1,55%	1,24%	1,24%	1,24%	2,90%	2,63%	3,29%		50%
				$ P				$6.779.771	$16.949.428	$13.559.542	$13.559.542	$16.949.428	$31.817.252	$28.863.461	$36.079.326		
				$ E					$68.894.064	$8.780.616	$292.687		$45.591.660	$18.574.380	$36.079.326		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,28%	0,80%	0,03%	0,00%	4,16%	1,69%	3,29%		
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.565.776,00 / $4.565.776,00	0,416% / 0,416%	112,07% / $5.116.908	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,03%	0,03%	0,00%	0,08%	0,07%	0,09%		40%
				$ P				$187.155	$467.889	$374.311	$374.311	$467.889	$884.105	$804.496	$1.005.620		
				$ E					$53.301	$1.390.890	$8.097			$1.259.000	$1.005.620		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,09%		
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$266.311.405,50 / $266.311.405,50	24,283% / 24,283%	91,41% / $243.436.750	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	2,52%	2,01%	2,01%	2,52%	4,69%	4,24%	5,30%		30%
				$ P				$11.037.315	$27.593.286	$22.074.629	$22.074.629	$27.593.286	$51.401.544	$46.460.763	$58.075.954		
				$ E					$43.910.583	$18.196.615	$20.064.922	$41.971.583	$31.965.360	$31.312.734	$58.075.954		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,02%	1,66%	1,83%	3,83%	2,91%	2,86%	5,30%		
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.025.073,10 / $94.025.073,10	8,574% / 8,574%	120,68% / $113.470.782	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,91%	0,72%	0,72%	0,91%	1,38%	1,67%	2,09%		20%
				$ P				$1.986.259	$9.931.297	$7.945.037	$7.945.037	$9.931.297	$15.109.209	$18.300.861	$22.876.076		
				$ E					$3.893.596	$22.081.496	$12.915.866	$16.420.200	$17.050.816	$18.226.734	$22.876.076		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	2,01%	1,18%	1,50%	1,55%	1,66%	2,09%		
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	$248.219.961,00 / $248.219.961,00	22,634% / 22,634%	101,45% / $251.827.295	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	2,26%	1,81%	1,81%	2,26%	4,14%	4,08%	5,10%		10%
				$ P				$9.922.842	$24.807.104	$19.845.683	$19.845.683	$24.807.104	$46.271.083	$44.702.427	$55.878.034		
				$ E					$23.583.698	$24.909.798	$61.606.845	$10.625.948	$25.404.985	$35.787.987	$55.878.034		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	2,27%	5,62%	0,97%	3,23%	3,26%	5,10%		
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$187.667.421,30 / $187.667.421,30	17,112% / 17,112%	100,38% / $189.318.754	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,83%	1,46%	1,46%	1,83%	2,75%	3,29%	4,12%		0%
				$ P				$4.016.336	$20.081.680	$16.065.344	$16.065.344	$20.081.680	$30.105.013	$36.112.011	$45.140.014		
				$ E					$16.081.274	$28.369.939	$19.400.361	$28.869.906	$28.934.124	$24.536.137	$45.140.014		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	2,59%	1,77%	2,63%	2,64%	2,24%	4,12%		
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$378.986,00 / $378.986,00	0,035% / 0,035%	100,00% / $378.986	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%		
				$ P											$378.986		
				$ E											$378.986		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%		
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$45.600.000,00 / $45.600.000,00	4,158% / 4,158%	100,00% / $45.600.000	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%		
				$ P											$45.600.000		
				$ E											$45.600.000		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%		
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.228.653,00 / $5.228.653,00	0,477% / 0,477%	91,80% / $4.800.156	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%		
				$ P											$5.228.653		
				$ E											$4.800.156		
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%		
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$19.180.346,82 / $19.180.346,82	1,749% / 1,749%	100,00% / $19.180.347	% P	0,19%	0,25%	0,25%	0,13%	0,00%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P	$2.076.017	$2.768.023	$2.768.023	$1.384.011		$7.789.515	$3.394.758						
				$ E	$1.889.932	$1.889.932	$1.889.932	$1.889.932					$5.092.137	$6.528.484			
				% E	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.784.321,00 / $10.784.321,00	0,983% / 0,983%	0,00% / $0	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%		
				$ P							$5.090.932				$5.693.389		
				$ E													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Etapa de cierre financiero	$0,00 / $0,00	0,000% / #¡DIV/0!	0,00% / $0	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				$ P													
				$ E													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0%
					Proyección Programado		Proyección Programado		Proyección Programado		Proyección Programado						

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.096.689.836,00
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ -

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada CPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada CPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el 'Valor básico de obra programada'.
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por CPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021	8 MARZO DE 2021	9 ABRIL DE 2021	10 MAYO DE 2021	11 JUNIO DE 2021	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,00%	0,25%	0,25%	3,22%	9,10%	7,90%	8,06%	9,10%	16,21%	16,42%	29,30%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.076.016,98	$ 2.768.022,64	$ 2.768.022,64	$ 35.313.689,34	$ 99.830.683,11	$ 86.654.061,98	$ 88.350.236,23	$ 99.830.683,11	$ 177.728.206,12	$ 180.087.038,93	$ 321.283.175,32	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,19%	0,44%	0,69%	3,91%	13,02%	20,92%	28,97%	38,08%	54,28%	70,70%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.076.016,98	$ 4.844.039,63	$ 7.612.062,27	$ 42.925.751,61	$ 142.756.434,73	$ 229.410.496,70	$ 317.760.733,00	$ 417.591.416,00	$ 595.319.622,00	$ 775.406.661,00	$ 1.096.689.836,00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	14,33%	9,46%	10,42%	8,92%	14,96%	12,49%	28,74%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.889.931,50	$ 1.889.931,50	$ 1.889.931,50	$ 1.889.931,50	$ 157.116.515,00	$ 103.729.353,35	$ 114.288.777,91	$ 97.849.636,12	$ 164.039.081,55	$ 136.925.456,22	$ 315.181.289,85	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,17%	0,34%	0,52%	0,69%	15,02%	24,47%	34,90%	43,82%	58,78%	71,26%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.889.931,50	$ 3.779.863,00	$ 5.669.794,50	$ 7.559.726,00	$ 164.676.241,00	$ 268.405.594,35	$ 382.694.372,26	$ 480.544.008,38	$ 644.583.089,93	$ 781.508.546,15	$ 1.096.689.836,00	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS, 7 DIAS DE LA SEMANA		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C= (A+B)	$ 1.096.689.836,00	$ 1.096.689.836,00
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -	$ -

CONVENCIONES				
TIPO DE $ DEL EJE	PROGRAMADO		PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS				

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombres: Jesús Alberto Martínez Padilla
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombres: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND

*Original: Archivo de Gestión Contractual
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventoría, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-AIN-IN-6-FR-2		
EDICIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA — **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No:** — **DE** 1 a 30 de Junio de 2021 (Indicar mes y año) — **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:**

SEGUIMIENTO No: 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al numero del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 056 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA S.A.S. — **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal Y Versalles - San Pedrito (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código del INVIAS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INCIACION DEL CONTRATO: 14/08/20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (*Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.096.689.836,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.096.689.836,00

PLAZO ACUMULADO: 10,5 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/21 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021	8 MARZO DE 2021	9 ABRIL DE 2021	10 MAYO DE 2021	11 JUNIO DE 2021	
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.665.280,00	0,152%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	100%
	$1.665.280,00	0,152%	$0	$ P										$832.640	$832.640	
				$ E											$832.640	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	
Relleno para estructuras con recebo	$2.308.350,00	0,210%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	90%
				$ P											$2.308.350	
	$2.308.350,00	0,210%	$0	$ E											$2.308.350	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$19.633.878,60	1,790%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	
				$ P											$19.633.879	
	$19.633.878,60	1,790%	$0	$ E											$19.633.879	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%	
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	$2.039.509,50	0,186%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	
				$ P										$1.019.755	$1.019.755	
	$2.039.509,50	0,186%	$0	$ E											$1.019.755	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	80%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$24.523.125,00	2,236%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	1,96%	
				$ P										$2.990.625	$21.532.500	
	$24.523.125,00	2,236%	$0	$ E											$21.532.500	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	
Subbase Granular Clase C	$164.557.749,60	15,005%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	1,55%	1,24%	1,24%	1,24%	2,90%	2,63%	3,29%	
				$ P				$6.779.771	$16.949.428	$13.559.542	$13.559.542	$16.949.428	$31.817.252	$28.863.461	$36.079.326	
	$164.557.749,60	15,005%	$0	$ E					$60.894.064	$8.780.616	$292.687		$45.591.660	$18.574.398	$36.079.326	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,28%	0,80%	0,03%	0,00%	4,16%	1,69%	3,29%	
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.565.776,00	0,416%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,04%	0,03%	0,03%	0,00%	0,08%	0,07%	0,09%	
				$ P				$187.155	$467.889	$374.311	$374.311	$467.889	$884.105	$804.496	$1.005.620	
	$4.565.776,00	0,416%	$0	$ E					$53.301	$1.390.890	$8.097			$1.259.000	$1.005.620	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,09%	
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$266.311.405,50	24,283%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,01%	2,52%	2,01%	2,01%	2,52%	4,69%	4,24%	5,30%	
				$ P				$11.037.315	$27.593.286	$22.074.629	$22.074.629	$27.593.286	$51.401.544	$46.460.763	$58.075.954	
	$266.311.405,50	24,283%	$0	$ E					$43.910.583	$18.196.615	$20.064.922	$43.910.583	$31.965.360	$31.312.734	$58.075.954	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	1,66%	1,83%	3,80%	2,91%	2,86%	5,30%	
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.025.073,10	8,574%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,91%	0,72%	0,72%	0,91%	1,38%	1,67%	2,09%	
				$ P				$1.986.259	$9.931.297	$7.945.037	$7.945.037	$9.931.297	$15.895.209	$18.300.861	$22.876.076	
	$94.025.073,10	8,574%	$0	$ E					$3.893.596	$22.081.496	$12.915.866	$16.426.200	$12.000.816	$18.226.734	$22.876.076	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,36%	2,01%	1,18%	1,50%	1,55%	1,66%	2,09%	
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$248.219.961,00	22,634%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	2,26%	1,81%	1,81%	2,26%	4,41%	4,08%	5,10%	
				$ P				$9.922.842	$24.807.104	$19.845.683	$19.845.683	$24.807.104	$48.471.083	$44.702.427	$55.878.034	
	$248.219.961,00	22,634%	$0	$ E					$23.583.698	$24.909.798	$61.606.845	$10.625.948	$35.404.985	$35.787.987	$55.878.034	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	2,27%	5,62%	0,97%	3,23%	3,26%	5,10%	70%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$187.667.421,30	17,112%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,83%	1,46%	1,46%	1,83%	2,75%	3,29%	4,12%	
				$ P				$4.016.336	$20.081.680	$16.065.344	$16.065.344	$20.081.680	$30.105.013	$36.112.011	$45.140.014	
	$187.667.421,30	17,112%	$0	$ E					$16.081.274	$28.369.939	$19.400.361	$28.869.906	$28.934.124	$24.536.137	$45.140.014	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	2,59%	1,77%	2,63%	2,64%	2,24%	4,12%	60%
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$378.986,00	0,035%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	
				$ P											$378.986	
	$378.986,00	0,035%	$0	$ E											$378.986	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	50%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$45.600.000,00	4,158%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%	
				$ P											$45.600.000	
	$45.600.000,00	4,158%	$0	$ E											$45.600.000	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%	40%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.228.653,00	0,477%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	
				$ P											$5.228.653	
	$5.228.653,00	0,477%	$0	$ E											$4.800.156	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	30%
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$19.180.346,82	1,749%	39,41%	% P	0,19%	0,25%	0,25%	0,13%	0,00%	0,63%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P	$2.076.017	$2.768.023	$2.768.023	$1.384.011		$6.789.515	$3.394.758					
	$19.180.346,82	1,749%	$7.559.726	$ E	$1.889.932	$1.889.932	$1.889.932	$1.889.932					$5.092.117	$6.528.484		
				% E	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.784.321,00	0,983%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	
				$ P							$5.090.932				$5.693.389	
	$10.784.321,00	0,983%	$0	$ E												
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Etapa de cierre financiero		0,000%	#¡DIV/0!	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$ P												
		#¡DIV/0!	$0	$ E												
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,00%	0,25%	0,25%	3,22%	9,10%	7,90%	8,06%	9,10%	16,21%	16,42%	29,30%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.076.016,98	$ 2.768.022,64	$ 2.768.022,64	$ 35.313.689,34	$ 99.830.683,11	$ 86.654.061,98	$ 88.350.236,23	$ 99.830.683,11	$ 177.728.206,12	$ 180.087.038,93	$ 321.283.175,32	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,19%	0,44%	0,69%	3,91%	13,02%	20,92%	28,97%	38,08%	54,28%	70,70%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.076.016,98	$ 4.844.039,63	$ 7.612.062,27	$ 42.925.751,61	$ 142.756.434,73	$ 229.410.496,70	$ 317.760.733,00	$ 417.591.416,00	$ 595.319.622,00	$ 775.406.661,00	$ 1.096.689.836,00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	14,33%	9,46%	10,42%	8,92%	14,96%	12,49%	28,74%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.889.931,50	$ 1.889.931,50	$ 1.889.931,50	$ 1.889.931,50	$ 157.116.515,00	$ 103.729.353,35	$ 114.288.777,91	$ 97.849.636,12	$ 164.039.081,55	$ 136.925.456,22	$ 315.181.289,85	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,17%	0,34%	0,52%	0,69%	15,02%	24,47%	34,90%	43,82%	58,78%	71,26%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.889.931,50	$ 3.779.863,00	$ 5.669.794,50	$ 7.559.726,00	$ 164.676.241,00	$ 268.405.594,35	$ 382.694.372,26	$ 480.544.008,38	$ 644.583.089,93	$ 781.508.546,15	$ 1.096.689.836,00	

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada CPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada CPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la CPP y el 'Valor básico de obra programada'.
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.)
5. Para los contratos en los cuales se hengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por CPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS (DARIAS) 7 DIAS DE LA SEMANA		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C= (A+B)	**$ 1.096.689.836,00**	**$ 1.096.689.836,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -	$ -

CONVENCIONES

TIPO DE DATO (S)	PROGRAMADO		PROGRAMADO		EJECUTADO
BARRAS	$ Valor		$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - - - - - -		- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	————

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombres: Jesús Alberto Martínez Padilla.
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombres: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND

*Original: Archivo de Gestión Contractual
Copia: Unidad Ejecutora Contratista, Interventoría Dirección Territorial

✔ ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	4 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 60
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 56 **DE** 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 *DE* 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Darwin Franco	Jefe B Proyecto	Alcaldia San Jose
Iván José Ricardo Díaz	Jefe de Infraestructura	Alcaldia San José de Ure
Jose Montes H	contratista	4L ingeniria SA-S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el acta de comité semanal de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Resumen informativo
2. Emprendedores Rurales
3. Entrega informe de seguimiento al PAGA mes de abril

Escaneado con CamScanner

FECHA	4 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Resumen informativo: El contrato tiene un porcentaje programado del 54,28% y un porcentaje ejecutado del 58,78%

2. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL PROXIMO LUNES 10 DE MAYO EMPEZARA EL TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO RUTA 4 Y DEJARA EVIDENCIA EN REGISTRO FOTOGRAFICO EN LA ZONA DE BRAZO IZQUIERDO

3. EL DIA LUNES 10 MAYO ENTREGARÁ EL INFORME DEL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA PAGA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega del informe seguimiento al PAGA mes de Abril	10-05-2021	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 11 (Día) 5 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 61
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 56 DE 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 *DE* 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Iván José Ricardo Díaz	Jefe de Infraestructura	Alcaldía San José de Uré
Juan Diego Jimenez	Director Interventoria	Consorcio Interventorias 2020
José Morales H.	Contratista	4L ingeniería S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el acta de comité semanal de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Resumen informativo
2. Emprendedores Rurales
3. Entrega informe de seguimiento al PAGA mes de abril

Escaneado con CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Resumen informativo: El contrato tiene un porcentaje programado del ~~51,20%~~ 37,28% y un porcentaje ejecutado del ~~58,78%~~ 62,63% A CORTE DE LA SEMANA 39 (JUEVES 06 MAYO) A LA ALCALDIA SE LE INFORMO EL PROCESO DE DESEMBOLSO DEL 50% POR PARTE DE INVIAS.

2. INICIAR ACTIVIDADES EL 18 MAYO ES IMPORTANTE EL INICIO DE ESTA ACTIVIDAD PARA NO GENERAR ATRASO.

3. HOY SE ENTREGA EL INFORME DEL MES DE ABRIL

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega del informe seguimiento al PAGA mes de Abril	11-05-2021	Contratista
EMPIEZO EMPRENDEDORES RURALES	18-05-2021	CONTRATISTA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 19 (Día) 5 (Mes) 20 (Aí)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 62
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 56 **DE** 2020 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE

CONTRATISTA: 4L INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 **DE** 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Luis Carlos Ruiz Medrano	Contratista	4L Ingeniería SAS
Jose Morales N.	Contratista	4L ingeniería S.A.S.
Ivan José Ricardo Diaz	Jefe de Infraestructura	Alcaldía San José de Uré
José Betín Figueroa.	Supervisor.	INVIAS.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el acta de comité semanal de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Resumen informativo
2. Emprendedores Rurales
3. Obra Pavimento Versalles

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	3

FECHA	19	5	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Resumen informativo: El contrato tiene un porcentaje programado del 62,27% y un porcentaje ejecutado del 65,04% . SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ABRIR MAS FRENTE DE OBRA YA QUE EL PLAZO FINAL ES EL 30 JUNIO

2- SE LE SOLICITA INICIAR EL TRABAJO DE EMPRENDEDORES PUNTALO COMO SE HABIA COMPROMETIDO EN ACTAS PASADAS

3. SE LE RECUERDA AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE UNE QUE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE VERSALLES NO VAYA A DEJAR EL ACCESO A SAN PEDRITO BLOQUEADO PARA LLEGAR A LA OBRA. SE LE SOLICITA QUE SOCIALICE CON EL OTRO CON MATISTA LA HOJA DE RUTA DE LA OBRA DEL PAVIMENTO. SE LE RECUERDA QUE NO HAY MAS PLAZO DESPUES DEL 30 JUNIO.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	3

FECHA	19	5	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	
Luis Carlos Ruiz Medrano	
Jose Morales H	
Iván José Ricardo Díaz	
JOSÉ BETIN FIGUEROA.	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

✔ Acta de Reunión

MINFRA-MN-IN-1-FR-4

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

(NO SE GENERARON ACTAS DE REUNION EN EL MES)

✔ **INFORME SEMANAL**

FECHA: 11 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **44** del 4/06/2021 al 10/06/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YORDI RODOLFO DIAZ SANCHES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 12/03/2021	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ 50.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 476.076.525,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 910.647.299	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	906.744.403,09
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	895.286.053,83
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	81,64%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	15.361.244,71
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	910.647.298,54

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 6
VALOR FACTURA: $ 548.344.918,00 FECHA FACTURA: 18/06/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 329.006.950,80

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 444.827.000,38

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	


MES FACTURADO: 10
VALOR FACTURA: $ 32.371.689,00 FECHA FACTURA: 10/06/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 412.455.311,38

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	100	200
EXCAVACION (%)	100,00	162,3	262,30
ACERO (%)	109,30	71,6	180,90
SUBBASE (Km)	100,00	93,6	193,60
CONCRETO CLASE D	87,50	60,3	147,80
CONCRETO PIEDRA PEGADA	96,50	79,8	176,30
CUNETA	98,70	65,5	164,20
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros: Tractor con zorra			
Mezcladora	2		2

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El Contratista en atención a los requerimientos realizados hizo entrega de la documentación faltante de la cantera

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
Para el periodo del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

ESTADO: La segunda versión del documento PAGA fue aprobada por Interventoría el 21 de diciembre de 2020

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista realiza acopio de materiales granulares para la placa huella en el sector de Versalles - San Pedrito, realiza figuración de acero para la placa huella y traslado de equipos y materiales del otro lado de la quebrada

Se realizó comité semanal de obra No 65 y se informó que la obra no presenta atraso en el corte de la semana 43. Se solicita mejorar rendimiento abriendo nuevos frentes de obra y el inicio de labores de los emprendedores rurales. Se le recuerda al asesor de la alcaldía las mayores cantidades de obra ya que la interventoría dio aval a estas. En esta semana se presentaron fuertes lluvias que atrasaron un poco el ritmo de trabajo

Se funden placas para un volumen de 7,5 M3 de Concreto clase D y se instalan990 Kg de acero entre las abs 1+ 700 hasta la 2+260 San Pedrito.

Mediante oficio C. Int – 320 – 2021, de fecha 08 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es la solicitud de documentos y actividades pendientes del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 321 – 2021, de fecha 08 de junio de 2021, dirigido a Alcaldía de San José de Uré, cuyo asunto es la solicitud de informes bimensuales del mes de abril - mayo del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 322 – 2021, de fecha 08 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es observaciones realizadas al informe mensual PAGA del mes de mayo del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 323 – 2021, de fecha 08 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es la documentación requerida para la liquidación del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 327 – 2021, de fecha 09 de junio de 2021, dirigido a Alcaldía de San José de Uré, cuyo asunto es el cumplimiento de la meta física del convenio Invías - Municipio No 551 de 2020

Mediante oficio C. Int - 330 - 2021, de fecha 10 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, se solicita revisar observaciones mediante oficio SMA 26603

% programado acumulado: 82,68%. % ejecutado acumulado: 83,04%, % de atraso 0,0% , Valor ejecutado: $910.647.298,54

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar comité de obra

Ejercer control a las actividades de campo para garantizar la calidad de la obra


Solicitar más frentes de obras para disminuir el atraso que se está presentando

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

Seguimiento, control y verificación a las actividades del contrato en referencia en el Tramo Versalles - Brazo Izquierdo y Versalles - San Pedrito

Revisar documentación de personal de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

FECHA: 18 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 45 (Numeración consecutiva) del 11/06/2021 al 17/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YORDI RODOLFO DIAZ SANCHES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 12/03/2021	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ 50.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 476.076.525,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 953.557.907	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	973.177.479,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	938.196.662,43
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	85,55%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	15.361.244,71
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	953.557.907,14

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 6
VALOR FACTURA: $ 548.344.918,00 FECHA FACTURA: 18/06/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 329.006.950,80

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 444.827.000,38

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	


MES FACTURADO: 11
VALOR FACTURA: $ 32.371.689,00 FECHA FACTURA: 9/07/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 412.455.311,38

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	100	200
EXCAVACION (%)	100,00	162,3	262,30
ACERO (%)	109,30	71,6	180,90
SUBBASE (Km)	100,00	132,6	232,60
CONCRETO CLASE D	87,50	64,1	151,60
CONCRETO PIEDRA PEGADA	96,50	79,8	176,30
CUNETA	98,70	65,5	164,20
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:		1	1
Vibrocompactadores:		1	1
Volquetas:		1	1
Otros: Tractor con zorra			
Mezcladora		2	2

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: El Contratista en atención a los requerimientos realizados hizo entrega de la documentación faltante de la cantera

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
Para el periodo del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

ESTADO: La segunda versión del documento PAGA fue aprobada por Interventoría el 21 de diciembre de 2020

V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista realiza acopio de materiales granulares para la placa huella en el sector de Versalles - San Pedrito, realiza figuración de acero para la placa huella y traslado de equipos y materiales del otro lado de la quebrada

Se realizó comité semanal de obra No 67 y se informó que la obra no presenta atraso en el corte de la semana 44. Se solicita mejorar rendimiento abriendo nuevos frentes de obra y el inicio de labores de los emprendedores rurales. Se le recuerda al asesor de la alcaldía las mayores cantidades de obra ya que la interventoría dio aval a estas. En esta semana se presentaron fuertes lluvias que atrasaron un poco el ritmo de trabajo

Se funden placas para un volumen de 7,8 M3 de Concreto clase D y se suministran 150 M3 de subbase entre las abs 1+ 700 hasta la 2+260 San Pedrito.

Mediante oficio C. Int – 336 – 2021, de fecha 17 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es inicio de labores de Emprendedores Rurales del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.


% programado acumulado: 88,74%. % ejecutado acumulado: 86,95%, % de atraso 1,79% , Valor ejecutado: $953.557.907,14

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar comité de obra
Ejercer control a las actividades de campo para garantizar la calidad de la obra
Solicitar más frentes de obras para disminuir el atraso que se está presentando

IX. ESQUEMA GRAFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

Seguimiento, control y verificación a las actividades del contrato en referencia en el Tramo Versalles - Brazo Izquierdo y Versalles - San Pedrito
Revisar documentación de personal de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

FECHA: 25 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **46** del 18/06/2021 al 24/06/2021

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YORDI RODOLFO DIAZ SANCHES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 12/03/2021	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ 50.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 476.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 992.709.970	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	973.177.479,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	977.348.725,56
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	89,12%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	15.361.244,71
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	992.709.970,27

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 6
VALOR FACTURA: $ 548.344.918,00 FECHA FACTURA: 18/06/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 329.006.950,80

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 444.827.000,38

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	


MES FACTURADO: 11
VALOR FACTURA: $ 32.371.689,00 FECHA FACTURA: 9/07/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 412.455.311,38

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	100	200
EXCAVACIÓN (%)	100,00	162,3	262,30
ACERO (%)	109,30	72,8	182,10
SUBBASE (Km)	100,00	163,8	263,80
CONCRETO CLASE D	87,50	65,2	152,70
CONCRETO PIEDRA PEGADA	96,50	87,6	184,10
CUNETA	98,70	67,2	165,90
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros: Tractor con zorra			
Mezcladora	2		2

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El Contratista en atención a los requerimientos realizados hizo entrega de la documentación faltante de la cantera

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

ESTADO: La segunda versión del documento PAGA fue aprobada por Interventoría el 21 de diciembre de 2020

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista realiza acopio de materiales granulares para la placa huella en el sector de Versalles - San Pedrito, realiza figuración de acero para la placa huella y traslado de equipos y materiales del otro lado de la quebrada

Se realizó comité semanal de obra No 69 y se informó que la obra presenta atraso del 1,79% en el corte de la semana 45. Se le recuerda al asesor de la alcaldía las mayores cantidades de obra ya que la interventoría dio aval a estas y responderá el oficio 315 el día 23 de junio, a la fecha de este corte en el informe, no se había enviado. El contratista entregará plan de contingencia para la terminación de labores del proyecto. En esta semana se presentaron fuertes lluvias que atrasaron un poco el ritmo de trabajo

Se funden placas para un volumen de 7,8 M3 de Concreto clase D y se suministran 150 M3 de subbase entre las abs 1+ 700 hasta la 2+260 San Pedrito.

Mediante oficio C. Int – 339 – 2021, de fecha 18 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS y Alcaldía de San José de Uré, cuyo asunto es Citación a comité de obra el 22 de junio, del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 339 – 2021, de fecha 21 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es Solicitudes y Observaciones para cierre ambiental y social del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 341 – 2021, de fecha 22 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es Solicitud implementación cartilla de Emprendedores rurales del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 344 – 2021, de fecha 22 de junio de 2021, dirigido al Instituto Nacional de Vías, cuyo asunto es Atención al oficio SMA 26603 con fecha 25 de mayo de 2021 del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

Mediante oficio C. Int – 345– 2021, de fecha 22 de junio de 2021, dirigido a la Alcaldía de San José de Uré, cuyo asunto es Alcance actual del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.


% programado acumulado: 94,81% % ejecutado acumulado: 90,52% % de atraso 4,29% , Valor ejecutado: $992.709.970,27

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Realizar comité de obra
Ejercer control a las actividades de campo para garantizar la calidad de la obra
Solicitar más frentes de obras para disminuir el atraso que se está presentando

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE

Seguimiento, control y verificación a las actividades del contrato en referencia en el Tramo Versalles - Brazo Izquierdo y Versalles - San Pedrito
Revisar documentación de personal de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

Invías - Gestión Pública con Calidad

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): Tramo 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal. Tramo 2: Versalles - San Pedrito

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: **47** del 25/06/21 al 30/06/21

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YORDI RODOLFO DIAZ SANCHES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 14/08/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	4L INGENIERIA SAS		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	056 DE 2020	VALOR INICIAL:	$ 1.096.689.836,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 12/03/2021	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 1.096.689.836,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 476.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.096.689.836	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 452.879.479	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.096.689.836,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	942.987.745,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	443.608.110,64
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	40,45%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	9.271.368,60
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	452.879.479,24

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 3
VALOR FACTURA: $ 548.344.918,00 FECHA FACTURA: 8/04/21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 329.006.950,80

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 359.434.278,28

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	


MES FACTURADO: 8
VALOR FACTURA: $ 58.640.225,00 FECHA FACTURA: 9/04/21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 242.153.828,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	100	200
EXCAVACIÓN (%)	100,00	162,3	262,30
ACERO (%)	110,20	75,3	185,50
SUBBASE (Km)	109,40	173,9	283,30
CONCRETO CLASE D	103,30	68,7	172,00
CONCRETO PIEDRA PEGADA	126,60	96,9	223,50
CUNETA	109,20	77,7	186,90
BOX			
MANTENIMIENTO RUTINARIO	100	100	
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros: Tractor con zorra			
Mezcladora	2		2

TRAMO Y/O SECTOR 1: Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal

TRAMO Y/O SECTOR 2: Versalles -San Pedrito

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES: El Contratista en atención a los requerimientos realizados hizo entrega de la documentación faltante de la cantera

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el documento PAGA entregado por el Contratista, este manifiesta que no requiere permisos ambientales.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: La segunda versión del documento PAGA fue aprobada por Interventoría el 21 de diciembre de 2020

OBSERVACIONES:
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: En la semana no se realizo ninguna gestión social

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


En la semana de este informe, el contratista realiza acopio de materiales granulares para la placa huella en el sector de Versalles - San Pedrito, realiza figuración de acero para la placa huella y traslado de equipos y materiales del otro lado de la quebrada
Se realizó comité semanal de obra No 71 y se informó que la obra presenta atraso del 4,29% en el corte de la semana 46. El contratista termina la ejecución de recursos económicos contratados (1,096 Millones) pero no alcanza a ejecutar la meta física del convenio ya que no se adicionaron los recursos solicitados a la alcaldía
Se funden placas para un volumen de 7,2 M3 de Concreto clase D 9,6 M3 de concreto ciclopeo, 481,8 Kg de acero, 18,9 M3 de cunetas y se suministran 38,9 M3 de subbase entre las abs 1+ 700 hasta la 2+260 San Pedrito.
Mediante oficio C. Int – 346 – 2021, de fecha 25 de junio de 2021, dirigido a la Alcaldía de San José de Uré, cuyo asunto es Alcance del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.
Mediante oficio C. Int – 347 – 2021, de fecha 28 de junio de 2021, dirigido a la Alcaldía de San José de Uré, cuyo asunto es Respuesta al comunicado recibido el 25 de junio del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.
Mediante oficio C. Int – 350 – 2021, de fecha 28 de junio de 2021, dirigido a 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es Respuesta al oficio 4L-025-2021 del 22 de junio del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.
Mediante oficio C. Int – 352 – 2021, de fecha 28 de junio de 2021, dirigido al INVIAS, cuyo asunto es componente ambiental y social al termino del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.
Mediante oficio C. Int – 355– 2021, de fecha 29 de junio de 2021, dirigido a la Alcaldía de San José de Uré y 4L INGENIERIA SAS, cuyo asunto es Citación a comité de obra del contrato 056 - 2020 de la Alcaldía de San José de Uré.

% programado acumulado: 100%. % ejecutado acumulado: 100%, % de atraso 0% , Valor ejecutado: $1.096.689.836


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. Versalles - Brazo Izquierdo



RUTA No. Versalles - San Pedrito



Limpieza de Alcantarillas
Box Coulvert
Placa Huella

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE

Seguimiento, control y verificación de los remates finales en el tramo Versalles - Brazo Izquierdo y Versalles - San Pedrito

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

CONTRATO DE OBRA No. LP – MPL – 002 – 2020.

PUERTO LIBERTADOR

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 321 2400 302
Email: proyectos@ryjingenieria.com
www.ryjingenieria.com

5 INTRODUCCIÓN

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°11** correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2021 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabela Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

Mediante Prorroga Número uno (01) de 2020 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 13 de Marzo de 2021.

Mediante Prorroga Número dos (02) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 30 de Abril de 2021.

Mediante Prorroga Número tres (03) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 30 de Junio de 2021.

Mediante Adición Número uno (01) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la adición por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($50.000.000,00).

El Acta de iniciación al contrato No. LP-MPL-002-2020, correspondiente al municipio de Puerto Libertador, fue inscrita el día 14 de agosto de 2020 entre el contratista CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR representado por el secretario de Infraestructura.

Mediante Prorroga Número uno (01) de 2021 del contrato LP-MPL-002-2020 se concede por solicitud del CONTRASTISTA CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 la ampliación del plazo del contrato de obra hasta el 30 de Abril de 2021.

Mediante Acta de suspensión número uno (01) de 2021 del contrato LP-MPL-002-2020 se concede por solicitud del CONTRASTISTA CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 la suspensión del contrato a partir del día 22 de abril de 2021.

Mediante Acta de reinicio número uno (01) de 2021 del contrato LP-MPL-002-2020 se reanudan las actividades del contrato a partir del día 4 de Junio de 2021.

Mediante prórroga No 2 del contrato LP-MPL-002-2020 se concede por solicitud del CONTRASTISTA CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 la ampliación del plazo del contrato de obra hasta el 30 de Junio de 2021.

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PUERTO LIBERTADOR

De acuerdo con el Convenio Interadministrativo N° 532 , suscrito entre el Municipio de Puerto Libertador y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural, el tramo PUERTO LIBERTADOR – PUERTO CAREPA – GILGAL donde la entidad entrara a construir 1000 metros de placa huella, dos Box Coulvert de 7 metros de longitud cada uno y limpieza de alcantarillas.

Con la cual esta importante zona rural del Municipio de Puerto Libertador, inicia de manera definitiva la solución a la grave problemática de movilidad existente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	
Puerto Libertador:	• Tramo N° 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgal

6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PUERTO LIBERTADOR

El mejoramiento de vías en el Municipio de Puerto Libertador contempla el tramo Puerto Libertador – Puerto Carepa – Gilgal que se localiza en el costado oriental del municipio. El tramo N° 1 a mejorar se localiza en el K0+000 al K20+000, P.I. 7°53'05'' Latitud Norte y 75°42'38'' Latitud Oeste, P.F. 7°54'11'' Latitud Norte y 75°48'44'' Latitud Oeste.



Figura 4. Trazado Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgal
Fuente: Anexo Técnico Puerto Libertador

6.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario que realizo la el Instituto Nacional de Vías - INVIAS para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
Puerto Libertador	Tramo N° 1 – Puerto Libertador – Puerto Carepa - Gilgal	1000,00	14,00

6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que cumplirán con las características de diseño de construcción entregados por el municipio de Puerto Libertador, basados en las cartillas de construcción de INVIAS.

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K11+200	1	1	7	BOX COULVERT
K10+500	1	1	7	BOX COULVERT
K10+900 – K11+200	300	5	0.15	PLACA HUELLA
K11+400 – K11+700	300	5	0.15	PLACA HUELLA
K19+600 – K20+000	400	5	0.15	PLACA HUELLA
K7+900	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K10+300	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
K11+200	6			Limpieza de Alcantarillas, D=0.9M
SERÁN PRIORIZADAS	6000			Limpieza de cunetas en tierra
SERÁN PRIORIZADAS	7.9 Ha			Rocería a cada lado de la vía

7 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO LIBERTADOR

7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PUERTO LIBERTADOR

CONTRATO DE OBRA N° LP – MPL – 002 - 2020.	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.094.587.428,61 Incluido IVA.
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE PUERTO LIBERTADOR.
CONTRATISTA	**CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.,** NIT. 901.394.612-6 R.L. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ INTEGRANTES: ● CASS INGENIERÍA S.A.S. (85% PARTICIPACIÓN) NIT. 900.111.0629-2 R.L. SEBASTIÁN VERGARA BENÍTEZ ● CARLOS MANUEL VERGARA (15% PARTICIPACIÓN) C.C. 92.509.184
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CARRERA 17 # 15 – 54.
CORREO ELECTRÓNICO	camaveba@hotmail.com
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2020.
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES.
PRORROGA NO. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021.
PRORROGA NO. 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2021.
SISTEMA	PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° LP-MPL-002-2020, por la aseguradora Seguros del Estado S.A., hasta la fecha del presente informe.

N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
11-11-101154523	Cumplimiento del contrato	14/08/2020	14/09/2021	$109.458.743,00		
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	14/08/2020	16/03/2024	$328.569.557,70		

	indemnizaciones laborales				CONTRATO DE OBRA	13/08/2020
	Estabilidad y calidad de Obra.	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$328.376.229,00		
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/08/2020	14/09/2021	$328.569.557.70		
11-40-101037181	Predios Labores y Operaciones	15/07/2020	15/02/2021	$328.569.557.70		

7.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES


El contrato se reinició el día 4 de Junio de 2021 y su fecha de terminación es el 30 del mes.
Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No	MV-LP-002-2020	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	779 DE 2020
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.094.587.428,61	VALOR DEL CONTRATO	$ 426.076.525,00
VALOR ADICIONAL		VALOR ADICIONAL	$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 1.094.587.428,61	VALOR TOTAL	$ 476.076.525,00
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL	HASTA 31/12/2020
PRORROGA 1	UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DIAS	PRORROGA 1	HASTA 13/03/2021
SUSPENSIÓN No 1	22 DE ABRIL DE 2021	PRORROGA 2	HASTA 30/04/2021
REINICIO No 1	4 DE JUNIO DE 2021	PRORROGA 3	HASTA 30/06/2021
PRORROGA 2	VEINTISEIS (26) DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN	vie. 14 ago. 20	FECHA DE INICIACIÓN	mar. 4 ago. 20
TERMINACIÓN ACTUAL:	mié. 30 jun. 21	TERMINACIÓN ACTUAL:	mié. 30 jun. 21
PLAZO TOTAL:	NUEVE (9) MESES Y TRECE (13) DIAS	PLAZO TOTAL:	DIEZ MESES (10) Y VEINTISEIS (26) DIAS
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 875.669.942,89	VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 444.827.000,00
VALOR POR PAGAR A LA FECHA:	$ 1.094.587.428,61	VALOR POR PAGAR A LA FECHA:	$ 31.249.525,00
ANTICIPO:	$ 328.376.228,58	PAGO ANTICIPADO:	

AVANCE FÍSICO — CORTE A:

	%	INVERSIÓN
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	100,00%	$ 1.094.587.428,61
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100,00%	$ 1.094.587.428,61
POR EJECUTAR	0,00%	$ -
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS		

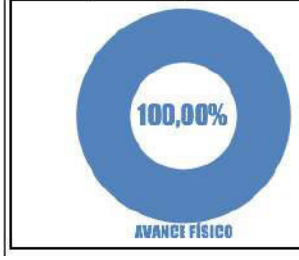

AVANCE EN TIEMPO — mié. 30 jun. 21

	%	Días
TIEMPO CONTRATADO:	100%	283
TIEMPO EJECUTADO:	100,00%	283,00
TIEMPO POR EJECUTAR:	0,00%	0,00
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS		



AVANCE FINANCIERO — CORTE A: mié. 30 jun. 21

	%	VALOR
PRESUPUESTO CONTRATO	100%	$ 1.094.587.428,61
ACUMULADO ACTAS	80,00%	$ 875.669.942,89
POR PAGAR EN ACTAS	20,00%	$ 218.917.485,72



El contrato actualmente cuenta con un Porcentaje programado acumulado de 100,00%, y un porcentaje ejecutado acumulado de 100,00%, Porcentaje de atraso 00,%, Valor ejecutado: $1094.587.428,61

7.3 SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

7.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO.

El contrato se reinició el día 4 de Junio de 2021 y se continuaron con las labores a ejecutar del proyecto, se terminaron los tramos de la siguiente manera:

TRAMO 1 K10+900 a K11+196,90 SECTOR CONDORITO.	296,90 ML
TRAMO 2 K11+400 a K11+554,42 SECTOR CARACOLÍ.	154,42 ML
TRAMO 3 K19+600 a K20+007,5 SECTOR GILGAL	407,50 ML
LONGITUD DE META FÍSICA EJECUTADA:	**858,82 ML.**

Con recursos del Municipio de Puerto Libertador se realiza la construcción de placa huella en el siguiente tramo con abscisas K11+595,82 a K11+750,38 para un total de 154,56 ml y se atienden sitios críticos en el corredor vial.

Es de anotar que en el acta de recibo final adjunto al presente informe se anexa cuadro resumen de cantidades de obra ejecutadas con recursos municipales y que son obras de recibo por parte de la entidad contratante, puesto que corresponden a recursos adicionales aportados por el municipio para garantizar el cumplimiento de la meta física, sin embargo, los mismos no se encuentran contenidos ni incluidos en el convenio principal suscrito entre el municipio y el INVIAS; no obstante, dichos recursos adicionales se ejecutaron en el marco del contrato de obra, es decir que si bien contaron con seguimiento y control por parte de la interventoría, la responsabilidad de recibo de su ejecución es exclusiva del municipio y del contratista.

Siendo así la meta física total ejecutada corresponde a 1013,38 ml, lo cual es mayor a la estimada en la meta inicial de 1000 ml.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE JUNIO DE 2021:

VALOR PROGRAMADO (BÁSICO DE OBRA)	$ 1094.587.428,61	100,00%
VALOR EJECUTADO	$ 1094.587.428,61	100,00%

AVANCE FÍSICO DEL MES DE JUNIO DE 2021:

PROGRAMADO	100%
EJECUTADO	100%

AVANCE PREDIAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0

- Actas de cierre: 0

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Se debe dar recibo a la totalidad de obras ejecutadas bajo el contrato y dar trámite a los documentos de liquidación del proyecto.

8 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

8.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO FORMATO MINFRA-M-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: LP - MPL - 002 - 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO ACUMULADO:	9,1 MESES
FECHA DE INICIACION:	14 DE AGOSTO DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	22/04/21
FECHA DE REANUDACIÓN:	22/04/21		
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.094.587.430,00	VALOR ADICIÓNALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1.094.587.430,00	AMORTIZACION ANTICIPO:	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 328.376.229,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 - 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	ML	1000
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	ML	858
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$123.050.940,00	$123.060.940		$123.060.940	100,00%	$ 16.437.664,37	0%	0,000%
Acumulado:	$1.094.587.430,00	$1.094.587.430,00		$1.094.587.430,00	100,00%	$ 137.485.103,79	100%	12,560%

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.099.979.936,0
Total	$ 1.099.979.936,0

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1,00	8,25	0,97	0,29	$ -	1,5	$ -	$ -
Interventor:	0,97	9,00	0,90	2,00	$ 13.621.213,62	6,0	$ 13.621.213,62	$ 13.621.213,62

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.563.187,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	$ 15.563.187,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	14-ago-20	14-sept-21
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14-ago-20	14-sept-21
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14-ago-20	16-mar-24
Calidad de Estudios y Diseños	14-sept-20	14-sept-25
Estabilidad y Calidad de Obra	AMPARA 5 AÑOS	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	15-jul-20	15-feb-21
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 14/08/20

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N / A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

La Interventoria manifiesta que no se alcanza a ejecutar la meta física del contrato, se alcanzan a ejecutar 858 ML de los 1000 ML priorizados, la Alcaldía Municipal mediante adición al contrato ejecuta actividades de construcción de placa huella y atención de puntos críticos al mismo, sin embargo éstos recursos no se adicionaron al convenio INVIAS - Municipio, la intervención del municipio fué de 154 ML para un total de meta física ejecutada de

Firma

Nombre JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA.

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAL.

MES DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **CONTRATO No.** LP-MPL-002-2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES. **SECTOR:** PUERTO LIBERTADOR.
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
RETROEXCAVADORA 1				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RETROEXCAVADORA 2				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA 1				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA 2				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA 3				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA 4				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre:
Residente de Obra **JESUS DAVID QUINTERO DIAZ**
Matrícula No.: **05202-176924ANT**

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría **CARLOS CORTES VALERO.**
Matrícula No. : **0820275862ATL.**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA.

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE OBRA No.** LP-MPL-002-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES. **SECTOR:** PUERTO LIBERTADOR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020. **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020.

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VERGARA BARVO CARLOS MANUEL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
QUINTERO DIAZ JESÚS DAVID		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OSORIO JOSE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BERRIO PRADO KEINER JOSE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VERGARA BENITEZ SEBASTIAN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PADILLA LUIS CARLOS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RAMOS ENSUNCHO JOEL DAVID		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CONDE SIERRA DAVID ANTONIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BUELVAS ESTRADA CARLOS MARIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MORALES HERRERA RAFAEL DAVID		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CARDOZO RIVERA WILINTON MANUEL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: **JESUS DAVID QUINTERO DIAZ**
Residente de Obra
Matricula No.: **05202-176924ANT**

Firma
Nombre: **CARLOS CORTES VALERO.**
Residente de Interventoría
Matricula No.: **0820275862412.**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-8

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERRÉA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAL.

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	265		265	SRG	LP-MPL-002-2020	1.099.979.936,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.094.587.428,61**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1		mar-21	$ 547.293.714,30		$ 547.293.714,30			552.686.221,70		$ 547.293.714,31	25/03/21		X	
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.065.395.661	$ -	$ 1.065.395.660,6
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.671.575	$ -	$ 10.671.575
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.563.187	$ 2.957.006	$ 18.520.193
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 1.091.630.423	$ 2.957.006	$ 1.094.587.428

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS MANUEL VERGARA BARVO
Matrícula No.: 0820254648ATL

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA		DE	

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR- PUERTO CAREPA-GILGAL.

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco				24	21	20	21	22	20	21	24	24	24	20	24	21	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	22	24			618
Lluvias moderadas					3	4	3	2	4	3				4		3				2								2				30
Lluvias intensas																																0
Total				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **JESÚS DAVID QUINTERO DÍAZ.**
Residente de Obra
Matrícula No.: **05202-176924ATL.**

Firma
Nombre: **CARLOS CORTÉS VALERO.**
Residente de Interventoría
Matrícula No.: **08202 - 75862412 ATL.**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO FORMATO MINFRA-MN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA.

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR- PUERTO CAREPA- GILGAR.

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	4/06/21	CILINDROS (ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO)	INV E-410-13	Pavimentación vía Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar	4	20,7 MPA	20,7	SI	
1	11/06/21	CILINDROS (ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO)	INV E-410-13	Pavimentación vía Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar	4	20,7 MPA	21,1	SI	
1	8/06/21	DENSIDAD EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA	INV E 161 2013	Pavimentación vía Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar	2	95%	98,66%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTA:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: **CARLOS MANUEL VERGARA BARVO**
Director de Obra
Matrícula No.: **0820254648 ATL**

Firma
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202 - 097 497 CND**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2021. (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA No: LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUERTO LIBERTADOR- PUERTO CAREPA- GILGAL

SECTOR: PUERTO LIBERTADOR.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
VERGARA BARVO CARLOS MANUEL		jun-21	30	92.509.184	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
QUINTERO DIAZ JESÚS DAVID		jun-21	30	1.066.722.952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
OSORIO JOSE		jun-21	30	1.003.337.051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
BERRIO PRADO KEINER JOSE		jun-21	30	1.003.338.513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
VERGARA BENITEZ SEBASTIAN		jun-21	30	1.066.750.903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
PADILLA LUIS CARLOS		jun-21	30	1.067.093.258	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
RAMOS ENSUNCHO JOEL DAVID		jun-21	30	1.067.094.178	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
CONDE SIERRA DAVID ANTONIO		jun-21	30	1.067.094.454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
BUELVAS ESTRADA CARLOS MARIO		jun-21	30	1.067.095.327	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
MORALES HERRERA RAFAEL DAVID		jun-21	30	1.067.097.611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	
CARDOZO RIVERA WILINTON MANUEL		jun-21	30	8.051.173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52736899	30	SURA	52736899	30	52736899	30	CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: **CARLOS MANUEL VERGARA BRAVO**
Director de Obra
Matrícula No. **0820254648 ATL**

Firma
Nombre : Juan Diego Jimenez Serna.
Director de Interventoría
Matricula No. 25202097497CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

8.8 INFORME AVANCE FÍSICO - FINANCIERO FORMATO MINFRA-IN-15-FR-14

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No:** 11,00 **PERIODO MES:** JUNIO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LP-MPL-002-2020
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES
SECTOR: PUERTO LIBERTADOR
RUTA:
TRAMO: PUERTO LBERTADOR PUERTO CAREPA-GILGAR

PLAZO INICIAL: SIETE MESES (7)
FECHA DE INICIACIÓN: 14 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN: 4 DE JUNIO DE 2021
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.094.587.430
VALOR ACUMULADO: $ 1.094.587.430,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 328.376.229,00

PLAZO ACUMULADO: 8,5 Meses
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/04/21
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/21
VALOR ADICIONALES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 779 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LAURA ISABEL PEÑA GARCIA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP-MPL-002-2020	8,5	30/04/21	$ 1.094.587.430	$ 1.094.587.430

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$1.094.587.430
Total	$1.094.587.430

ANTICIPOS

Otorgado $	$328.376.229
Amortizado $	$328.376.229
Saldo $	$0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
779 DE 2020	11	30/06/21	$476.076.525,00	$476.076.525,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$123.050.940,00	$123.050.940		$123.050.940	100,00%	$ 16.437.664,37	0%	0,000%
Acumulado:	$1.094.587.430,00	$1.094.587.430,00		$1.094.587.430,00	100,00%	$ 137.485.103,79	100%	12,560%

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	1,00	8,25	0,97	0,29	$ -	1,5	$ -	$ -
Interventor:	0,97	9,00	0,90	2,00	$ 13.621.213,62	6	$ 13.621.213,62	$ 13.621.213,62

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.563.187,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 15.563.187,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Excavaciones varias en material comun en seco														$ -	$ -	$ 1.873.422	$ 922.075
Relleno para estructuras con recebo														$ -	$ -	$ 2.407.950	$ 421.391
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 4.049.161	$ -	$ 20.245.804	$ 16.616.710
Concreto Clase F 14														$ 425.302	$ -	$ 2.126.509	$ 1.417.673
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 4.783.587	$ -	$ 23.917.934	$ 19.700.788
Subbase Granular Clase C														$ 15.100.264	$ -	$ 166.102.904	$ 187.005.428
Excavaciones varias en material comun en seco															$ -	$ 4.736.244	$ 4.390.832
CONCRETO 21 MPA - CLASE D														$ 23.482.379	$ -	$ 258.306.162	$ 232.133.909
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa														$ 8.601.689	$ -	$ 94.618.578	$ 126.544.272
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)														$ 20.375.181	$ -	$ 224.126.985	$ 255.595.326
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.														$ 16.518.445	$ -	$ 181.702.894	$ 188.371.628
Gavion de malla en alambre de acero entrelazado clase 1															$ -	$ 42.303.072	
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles														$ 193.478	$ -	$ 580.433	$ 580.433
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles														$ 10.422.834	$ -	$ 36.479.919	$ 36.479.919
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad														$ 1.676.244	$ -	$ 5.866.852	$ 5.886.852
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS														$ -	$ -	$ 18.520.193	$ 18.520.193
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL														$ 10.671.575	$ -	$ 10.671.575	
Etapa de cierre financiero														$ -	$ -	$ -	
														$ 116.300.139,0	$ -	$ 1.094.587.429	$ 1.094.587.428,86

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Nombre **CARLOS MANUEL VERGARA BRAVO**
Director de Obra
Matrícula No. **0820254648 ATL**

Firma

Nombre JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 097497 CND.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

8.9 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-15

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA.

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

FECHA DE INICIO: 14/08/20

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.094.587.428,61

VALOR ACUMULADO: $ 1.094.587.428,61 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.520.193,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.520.193,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779-2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 109.458.743,00	14	8	2020	14/09/21		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 328.569.557,70	14	8	2020	14/09/21		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 218.917.486,00	14	8	2020	16	3	2024
Calidad de Servicio	0,43%	$ 4.668.956,10	14	9	2020	14	9	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 328.569.557,70	AMPARA 5 AÑOS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-11-101154523

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 328.569.557,70	15	7	2020	15	2	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101037181 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 127.455.176,00	14	8	2020	31/12/21		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	$ 328.569.557,70	14	8	2020	31/12/21		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 254.910.352,00	14	8	2020	12	6	2024
Calidad de Servicio	0,43%	$ 4.668.956,10	14	9	2020	14	9	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 382.365.528,00	30	6	2021	30	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101154523

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	30%	$ 328.569.557,70	14	8	2020	30	4	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101037181 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: Se genero suspensión del contrato el dia 22 de abril de 2021

Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202097497CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA FORMATO MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002-2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.

FECHA DE INICIO: 14/08/20 (Indicar dia, mes y año) **PLAZO INICIAL:** SIETE (7) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/04/21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ X NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES: _____

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: _____

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
PC1102	CONO DE ASENTAMENTO SLUMP PLASTICO	PINZUAR	185745052	16/09/20			
PC133	MOLDE PLASTICO CILINDRICO PARA CONCRETO 6" X 12"	PINZUAR	196026123	2/12/20			
PC165	MAQUINA ELECTRICA DIGITAL PARA ENSAYOS DE CONCRETO - 1000 kN	PINZUAR	190	4/07/20			
NL 32	NIVEL TOPCON SOUTH		MNDD01	21/01/21			

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de Obra **CARLOS MANUEL VERGARA BRAVO**
Matrícula No.: **0820254648 ATL**

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-097497 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

8.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

✔ **Seguimiento a la inversión del anticipo**

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

MINFRA-MN-IN-2-FR-2

(NO APLICA)

✔ **Seguimiento Programa de Obra**

✔ **Seguimiento Programa de Inversiones.**

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

MINGRA-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
FECHA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA | **PROGRAMA DE INVERSIONES** X

CONTRATO No: LP-MPL-002-2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES | **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar (Indique en nota y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL:	7 Meses (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	9,1 MESES (En meses según las prórrogas más suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	14/08/20 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/21 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	22/04/21 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	4/06/21 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 1.094.587.428,61 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 1.094.587.428,61		

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021	8 MARZO DE 2021	9 ABRIL DE 2021	10 JUNIO DE 2021	
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.873.421,52	0,171%	49,22%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,13%	0,00%	0,00%	100%
	$1.873.421,52	0,171%	$922.075	$ P							$468.355	$1.405.066			
				$ E								$922.075			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	90%
Relleno para estructuras con recebo	$2.407.949,77	0,220%	17,50%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,16%	0,00%	0,00%	
	$2.407.949,77	0,220%	$421.391	$ P							$601.987	$1.805.962			
				$ E								$421.391			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$20.245.804,19	1,850%	42,07%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,92%	0,37%	0,37%	
	$20.245.804,19	1,850%	$8.518.388	$ P							$2.024.580	$10.122.902	$4.049.161	$4.049.161	
				$ E								$8.518.388			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	0,00%	0,00%	
Concreto Clase F 14	$2.126.509,26	0,194%	26,67%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,10%	0,04%	0,04%	
	$2.126.509,26	0,194%	$567.069	$ P							$212.651	$1.063.255	$425.302	$425.302	
				$ E								$567.069			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	80%
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$23.917.933,79	2,185%	42,37%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	1,09%	0,44%	0,44%	
	$23.917.933,79	2,185%	$10.133.614	$ P							$2.391.793	$11.958.967	$4.783.587	$4.783.587	
				$ E								$10.133.614			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	
Subbase Granular Clase C	$166.102.903,91	15,175%	94,18%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	2,76%	2,76%	3,45%	1,38%	1,38%	
	$166.102.903,91	15,175%	$156.437.538	$ P					$37.750.660	$30.200.528	$30.200.528	$37.750.660	$15.100.264	$15.100.264	
				$ E					$87.222.465	-$29.327.778	$98.542.851				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,97%	-2,68%	9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.736.243,77	0,433%	92,71%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,17%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$4.736.243,77	0,433%	$4.390.832	$ P					$2.368.122	$1.894.498	$473.624				
				$ E					$2.948.717	-$753.301		$2.195.416			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	-0,07%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$258.306.161,59	23,598%	76,95%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,36%	4,29%	4,29%	5,36%	2,15%	2,15%	
	$258.306.161,59	23,598%	$198.757.329	$ P					$58.705.946	$46.964.757	$46.964.757	$58.705.946	$23.482.379	$23.482.379	
				$ E					$13.750.990	$31.106.550	$62.479.654	$91.420.135			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,26%	2,84%	5,71%	8,35%	0,00%	0,00%	
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.618.577,96	8,644%	121,90%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	1,57%	1,57%	1,96%	0,79%	0,79%	
	$94.618.577,96	8,644%	$115.344.272	$ P					$21.504.222	$17.203.378	$17.203.378	$21.504.222	$8.601.689	$8.601.689	
				$ E						$25.676.990	$50.646.346	$39.020.937			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%	4,63%	3,56%	0,00%	0,00%	
Acero de refuerzo de fy = 4,200 Kg / cm2 (60.000 PSI)	$224.126.984,93	20,476%	94,28%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,65%	3,72%	3,72%	4,65%	1,86%	1,86%	
	$224.126.984,93	20,476%	$211.312.623	$ P					$50.937.951	$40.750.361	$40.750.361	$50.937.951	$20.375.181	$20.375.181	
				$ E					$24.537.117	-$1.653.752	$86.024.954	$101.604.304			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	-0,15%	7,93%	9,28%	0,00%	0,00%	70%
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$181.702.893,83	16,600%	86,87%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	3,02%	3,02%	3,77%	1,51%	1,51%	
	$181.702.893,83	16,600%	$157.853.183	$ P					$41.296.112	$33.036.890	$33.036.890	$41.296.112	$16.518.445	$16.518.445	
				$ E					$2.893.412	$16.274.474	$56.094.256	$82.591.040			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	1,49%	5,12%	7,55%	0,00%	0,00%	60%
Gavion de malla en alambre de acero entrelazado clase 1	$42.303.071,81	3,865%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	1,10%	1,10%	
	$42.303.071,81	3,865%	$0	$ P								$18.129.888	$12.086.592	$12.086.592	
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	$580.433,22	0,053%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	
	$580.433,22	0,053%	$0	$ P								$193.478	$193.478	$193.478	
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50%
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	$36.479.919,30	3,333%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%	0,95%	0,95%	
	$36.479.919,30	3,333%	$0	$ P								$15.634.251	$10.422.834	$10.422.834	
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40%
Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.866.851,76	0,536%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,15%	0,15%	
	$5.866.851,76	0,536%	$0	$ P								$2.514.365	$1.676.244	$1.676.244	
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30%
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$18.520.193,00	1,692%	100,00%	% P	0,23%	0,56%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$18.520.193,00	1,692%	$18.520.193	$ P	$2.469.359	$6.173.398	$4.938.718	$4.938.718							
				$ E		$10.288.996	$3.216.392	$5.014.805							
				% E	0,00%	0,94%	0,29%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.671.575,00	0,975%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	
	$10.671.575,00	0,975%	$0	$ P									$5.335.788	$5.335.786	
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Etapa de cierre financiero		0,000%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,000%	$0	$ P											
				$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.094.587.428,61														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.094.587.428,61														

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,00%	0,56%	0,45%	0,45%	19,42%	15,54%	15,93%	24,94%	11,24%	11,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.469.359,07	$ 6.173.397,67	$ 4.938.718,13	$ 4.938.718,13	$ 212.563.013,30	$ 170.050.410,64	$ 174.328.905,05	$ 273.023.025,33	$ 123.050.941,58	$ 123.050.939,79
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,23%	0,79%	1,24%	1,69%	21,11%	36,65%	52,57%	77,52%	88,76%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.469.359,07	$ 8.642.756,73	$ 13.581.474,87	$ 18.520.193,00	$ 231.083.206,30	$ 401.133.616,94	$ 575.462.521,99	$ 848.485.547,32	$ 971.536.488,82	$ 1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,94%	0,29%	0,46%	12,00%	3,78%	32,39%	30,82%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 10.288.996,11	$ 3.216.391,67	$ 5.014.805,22	$ 131.352.701,81	$ 41.323.182,50	$ 354.588.060,52	$ 337.394.368,70	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,94%	1,23%	1,69%	13,69%	17,47%	49,86%	80,69%	80,69%	80,69%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 10.288.996,11	$ 13.505.387,78	$ 18.520.193,00	$ 149.872.894,81	$ 191.196.077,31	$ 545.784.137,83	$ 883.178.506,53	$ 883.178.506,53	$ 883.178.506,53

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS FAMILIA 7 DIAS DE LA SEMANA		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
IVA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C= (A+B)	$ 1.094.587.428,61	$ 1.094.587.428,61
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B'	$ 1.094.587.428,61	$ 1.094.587.428,61

CONVENCIONES		
TIPO DE DATO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y refleja la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:

Firma: Sebastian Vergara B.
Nombre: **SEBASTIAN VERGARA BENITEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202- 097497CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copia: Supervisión Área Técnica Territorial Interventoría o Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES.

CÓDIGO	MINPRA-MN-IN-06-F-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA Y FÉRREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL :** CORDOBA — **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No** 11 — **SEGUIMIENTO No** 11

VALOR BÁSICO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO No: LP - MPL - 002 - 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL


CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES — **UBICACIÓN (RUTA Y TRAMO):** Puerto Libertador - Puerto Carepa - Cdigo (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según catálogo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 779-2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

PLAZO INICIAL: 7 Meses (En meses, según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/08/20 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/04/21 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (excluido IVA) (A): $ 1.094.587.428,61 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (excluido IVA) (C=A+B): $ 1.094.587.428,61

PLAZO ACUMULADO: 9,1 MESES (En meses, según las prórrogas del suscrito(aso))
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 30/04/21 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/21 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (excluido IVA) (B): $ -

ITEM DE PAGO	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA pesos	Miles de	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1 AGOSTO DE 2020	2 SEPTIEMBRE DE 2020	3 OCTUBRE DE 2020	4 NOVIEMBRE DE 2020	5 DICIEMBRE DE 2020	6 ENERO DE 2021	7 FEBRERO DE 2021	8 MARZO DE 2021	9 ABRIL DE 2021	10 JUNIO DE 2021
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA pesos	Miles de	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado										
Excavaciones varias en material comun en seco	$1.873.421,52		0,171%	49,22%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,13%	0,00%	0,00%
	$1.873.421,52		0,171%	$922.075	$ P							$468.335	$1.403.066		
					$ E								$922.075		
Relleno para estructuras con recebo	$2.407.949,77		0,220%	17,50%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%
	$2.407.949,77		0,220%	$421.391	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,16%	0,00%	0,00%
					$ P							$601.987	$1.805.962		
					$ E								$421.391		
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$20.245.804,19		1,850%	82,07%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
	$20.245.804,19		1,850%	$16.616.739	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,37%	0,37%	0,37%
					$ P							$2.024.580	$10.122.902	$4.049.161	$4.049.161
					$ E								$8.518.388	$12.445.681	$4.049.161
Concreto Clase F 14	$2.126.509,26		0,194%	66,67%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%
	$2.126.509,26		0,194%	$1.417.673	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,10%	0,04%	0,04%
					$ P							$212.651	$1.063.255	$425.302	$425.302
					$ E								$567.069	$425.302	$425.302
Acero de refuerzo de fy = 4,200 kg / cm2 (60.000 PSI	$21.917.931,79		2,185%	82,17%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
					% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	1,09%	0,44%	0,44%
					$ P							$2.391.793	$11.958.967	$4.783.587	$4.783.587
					$ E								$10.133.617	$4.783.587	$4.783.587
Subbase Granular Clase C	$166.102.901,91		15,175%	112,58%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,44%	0,44%
	$166.102.901,91		15,175%	$187.005.428	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%	2,76%	2,76%	3,45%	1,38%	1,38%
					$ P					$37.750.660	$30.200.528	$30.200.528	$37.750.660	$15.100.264	$15.100.264
					$ E					$87.222.463	-$29.127.778	$98.542.831	$0	$16.000.000	$14.567.890
Excavaciones varias en material comun en seco	$4.736.243,77		0,433%	92,75%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,97%	-2,68%	9,06%	0,00%	1,46%	1,33%
	$4.736.243,77		0,433%	$4.390.832	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,17%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P					$2.368.122	$1.894.498	$473.624	$0		
					$ E					$2.948.737	-$731.301		$2.195.416		
CONCRETO 21 MPA - CLASE D	$258.106.161,59		23,598%	89,67%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	-0,07%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%
	$258.106.161,59		23,598%	$232.133.909	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,36%	4,29%	4,29%	5,36%	2,15%	2,15%
					$ P					$38.705.946	$46.964.757	$46.964.757	$38.705.946	$23.482.379	$23.482.379
					$ E					$13.750.990	$31.106.550	$62.479.654	$91.420.135	$16.500.000	$16.876.580
Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	$94.618.577,96		8,649%	112,74%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,26%	2,84%	5,71%	8,35%	1,51%	1,54%
	$94.618.577,96		8,649%	$126.544.272	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	1,57%	1,57%	1,96%	0,79%	0,79%
					$ P					$21.504.222	$17.203.378	$17.203.378	$21.504.222	$8.601.689	$8.601.689
					$ E						$23.676.990	$30.646.346	$39.020.937	$5.600.000	$5.600.000
Acero de refuerzo de fy = 4,200 kg / cm2 (60.000 PSI	$224.126.984,93		20,476%	114,04%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%	4,63%	1,56%	0,51%	0,51%
	$224.126.984,93		20,476%	$255.595.326	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,65%	3,72%	3,72%	4,65%	1,86%	1,86%
					$ P					$10.937.951	$40.750.361	$40.750.361	$50.937.951	$20.373.181	$20.373.181
					$ E					$24.537.117	-$1.653.752	$66.294.954	$101.604.304	$20.373.181	$23.907.523
Cuneta de concreto sacada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	$181.702.893,83		16,600%	103,67%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,24%	-0,15%	-2,35%	9,28%	1,86%	2,18%
	$181.702.893,83		16,600%	$188.371.628	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	3,02%	3,02%	3,77%	1,51%	1,51%
					$ P					$41.296.112	$33.036.890	$33.036.890	$41.296.112	$16.518.445	$16.518.445
					$ E					$2.893.412	$16.274.474	$56.094.256	$82.591.040	$16.518.445	$14.000.000
Cascos de nulla en alambre de acero estrelvasado clase 1	$42.303.071,81		3,865%	0,00%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	1,49%	5,12%	7,55%	1,51%	1,38%
	$42.303.071,81		3,865%	$0	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	1,10%	1,10%
					$ P								$18.129.888	$12.086.592	$12.086.592
					$ E										
Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de desoles	$580.433,22		0,053%	100,00%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$580.433,22		0,053%	$580.433	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
					$ P								$193.478	$193.478	$193.478
Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de soldas y desoles	$36.479.919,30		3,333%	100,00%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$270.000	$310.433
	$36.479.919,30		3,333%	$36.479.919	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,03%
					$ P								1,43%	0,95%	0,95%
					$ E								$10.634.253	$10.422.834	$10.422.834
Ricoria a cada lado de la via y/o zonas necesarias para buena visibilidad	$5.866.851,76		0,536%	100,34%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%
	$5.866.851,76		0,536%	$5.886.852	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,15%	0,15%
					$ P								$2.214.165	$1.676.244	$1.676.244
					$ E										$5.886.852
REVISIÓN Y /O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$18.520.193,00		1,692%	100,00%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,54%
	$18.520.193,00		1,692%	$18.520.193	% P	0,23%	0,36%	0,45%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P	$2.469.359	$6.173.398	$4.938.718	$4.938.718						
					$ E		$10.288.996	$3.216.392	$5.014.805						
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$10.671.575,00		0,975%	0,00%	% E	0,00%	0,94%	0,29%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$10.671.575,00		0,975%	$0	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%
					$ P									$5.335.788	$5.335.788
					$ E										
Etapa de cierre financiero			0,000%	0,00%	% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,000%	$0	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					$ P										
					$ E										
					% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.094.587.428,61														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.094.587.428,61														

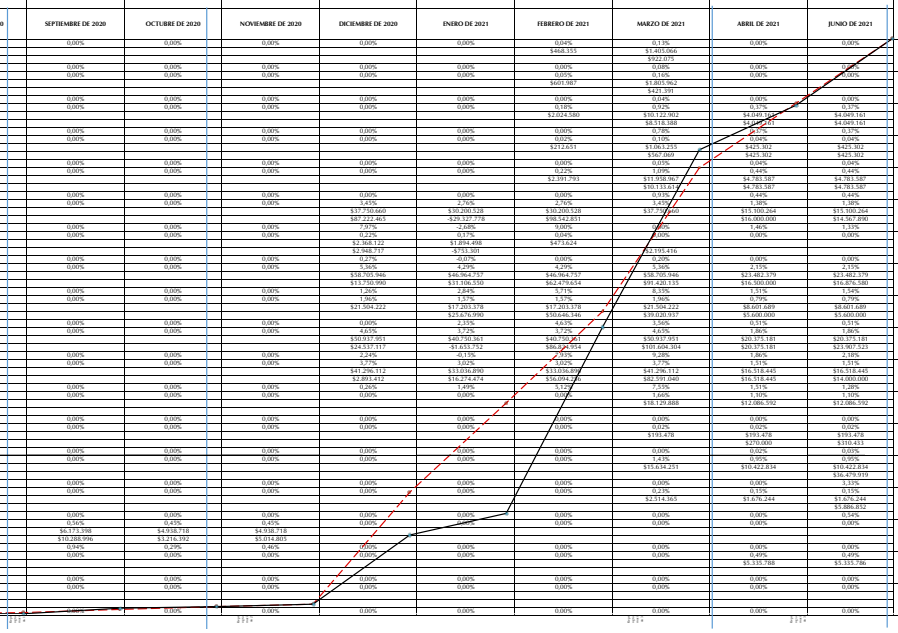

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser coincidente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. Para la columna de observaciones relacionar los comentarios más importantes del Taller de Seguimiento y Plan de Mejoramiento.
5. Para las unidades en los cuales se tengan consideradas ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,00%	0,56%	0,45%	0,45%	19,42%	15,54%	15,93%	24,94%	11,24%	11,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.469.359,07	$ 6.173.397,67	$ 4.938.718,13	$ 4.938.718,13	$ 212.563.013,30	$ 170.050.410,64	$ 176.328.905,05	$ 273.023.025,33	$ 123.050.941,50	$ 123.050.939,79
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,23%	0,79%	1,24%	1,69%	21,11%	36,65%	52,57%	77,52%	88,76%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.469.359,07	$ 8.642.756,73	$ 13.581.474,87	$ 18.520.193,00	$ 231.083.206,30	$ 401.133.616,94	$ 575.462.521,99	$ 848.485.547,32	$ 971.536.488,82	$ 1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,94%	0,29%	0,46%	12,68%	3,78%	32,39%	30,02%	7,72%	11,29%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 10.288.996,11	$ 3.216.391,67	$ 5.014.805,22	$ 131.352.701,81	$ 41.323.182,50	$ 354.588.060,52	$ 337.394.368,70	$ 84.521.675,50	$ 126.887.246,58
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,94%	1,23%	1,69%	13,69%	17,47%	49,86%	80,69%	88,41%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 10.288.996,11	$ 13.505.387,78	$ 18.520.193,00	$ 149.872.894,81	$ 191.196.077,31	$ 545.784.137,83	$ 883.178.506,53	$ 967.700.182,03	$ 1.094.587.428,61

* Solo conceptos deben corresponder a las relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR (Cifra) SIN IVA	VALOR (Cifra) SIN IVA ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 DIAS 24		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
NTA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
GASTOS SOCIALES Y PREDIAL (Incluye IVA)		
GESTION AGENCIA DE TIERRAS (Incluye IVA)		
GESTION SUBPREDIO (Incluye IVA)		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (= A+B)	$ 1.094.587.428,61	$ 1.094.587.428,61
VALOR ACTUALIZADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (= A'+B')	$ 1.094.587.428,61	$ 1.094.587.428,61

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copia: Subdirección de Contratos, Secretaría Ejecutiva y Dirección Territorial

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y refleja la realidad de la ejecución del contrato

CONVENCIONES		
DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	%	%

OBSERVACIONES:

Firma: Sebastian Vergara B.
Nombre: **SEBASTIAN VERGARA BENITEZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202- 097497CND

✔ ACTAS DE COMITÉ DE OBRA
MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	

FECHA: 9 (Dia) 6 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 66
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002 DE 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DEPUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Lizeth Zorrante Acosta	Prof. Universitario	Alcaldía m/pal

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el acta de comité semanal de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. INFORME DE AVANCE
2. ACTIVIDADES REALIZADAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 9 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1 EL PROYECTO PRESENTA UN ATRASO EN OBRA DE 13,59% A CORTE DE LA SEMANA 37

2. ESTA SEMANA SE TRABAJO EN LOS BOX CULVERT. HAY UNO TERMINADO Y EL OTRO EN UN 75%

EL CONTRATISTA HA TRASLADADO ACERO, RIELES, ETC AL SITIO DE LA OBRA.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA	9	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	
Lizeth Lorante Acosta	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	16	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 68
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002 DE 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET DEPUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Yoseth D. Cuadro Palmero	Apoyo Comunitario	Consorcio Int.
Lizeth Tovar Acosta.	Profesional Universitario	Alcaldía mpal

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el acta de comité semanal de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS DOS BOX COULVERT ESTAN PRACTICAMENTE TERMINADAS FALTAN DETALLES COMO LA CONSTRUCCION DE LOS BORDILLOS.

EL ING. COGOLLO SE PRESENTO SOLO A INICIAR LABORES DE PLACA HUELLA PERO LA LOGISTICA DE MAQUINARIA Y PERSONAL NO LLEGARON.

LE RECORDAMOS QUE EL PLAZO FINAL DEL CONTRATO ES EL 30 JUNIO DE 2021 (CONTRATISTA - INTERVENTORIA)

LA INTERVENTORIA Y LA ALCALDIA OFICIALIZARAN AL CONTRATISTA EL REINICIO VIGENTE DE ACTIVIDADES DE PLACA HUELLA.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
ACTUALIZAR POLIZAS DE ADICION Y PRORROGA	17 JUNIO 2021	CONTRATISTA.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA	16	6	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	
Jose Daniel Cogollo Carlino	
Lizeth Zarante Acosta	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 3	

FECHA: 22 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 70
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-MPL-002 DE 2020 MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICÍPIOS PDET DEPUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020

INTERVENTOR:

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020
Pedro Ochoa	Sec. Infraestructura	Alcaldía

OBJETIVOS DE LA REUNION

Realizar el acta de comité semanal de obra

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Informe de ejecución

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	3

FECHA: 22 (Dia) 6 (Mes) 2021 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Porcentaje programado 91,15%, Porcentaje ejecutado 70,91% Porcentaje de atraso 20,24%. Valor ejecutado: $903.741.043

SE REITERA NUEVAMENTE EL ATRASO DEL PROYECTO PARA ALCANZAR LA META FISICA FALTANDO 8 dias PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO.

REITERAMOS QUE NO HAY PERSONA DEL CONTRATISTA QUE RESPONDA A LAS INQUIETUDES DE REINICIO DE LABORES EN LA PLAZA HUELLA. TANTO LA INTERVENTORIA COMO LA ALCALDIA, MANIFIESTAN QUE LES HAN ESCRITO Y NO HAN RESPUESTA POR PARTE DEL CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Dia) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL *MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA* ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA	22	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	
Pedro Ochoa Del La Ossa	

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

✔ Acta de Reunión

MINFRA-MN-IN-1-FR-4

MINFRA-MN-IN-14-FR-2

(NO SE GENERARON ACTAS DE REUNION EN EL MES)

✔ **INFORME SEMANAL**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA		DE	

FECHA: 18 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 39 (Numeración consecutiva) del 11/06/2021 al 17/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YORDI RODOLFO DIAZ SANCHES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ 179.964.330,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 1.274.551.758,61

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ 50.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 476.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.274.551.759	$ 179.964.330	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 903.741.043	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.274.551.758,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.161.775.956,96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 885.220.850,19
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	69,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 18.520.193,00
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 903.741.043,19

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 6

VALOR FACTURA: $ 398.881.815,72 FECHA FACTURA: 30/06/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 875.669.942,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 444.827.000,38

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: 11


VALOR FACTURA: $ 32.371.689,00 FECHA FACTURA: 9/07/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 412.455.311,38

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100		100,00
EXCAVACIÓN (%)	92,7		92,70
ACERO (%)	94,3		94,30
SUBBASE (%)	94,2		94,20
CONCRETO CLASE D (%)	76,9		76,90
CONCRETO PIEDRA PEGADA (%)	121,90		121,90
CUNETA (%)	86,9		86,90
BOX (%)	100,00		100,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO (%)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: Carro - Tanque			
Mezcladora	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgal

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Caucasia, Antioquia	PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO X

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: El contratista a través de correo electrónico enviado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.

OBSERVACIONES: En el Acta de radicación ambiental y social del proyecto entregada el pasado 27 de octubre manifiestan que no requieren ningún tipo de permiso

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

OBSERVACIONES: En el Acta de radicación ambiental y social del proyecto entregada el pasado 27 de octubre manifiestan que no requieren ningún tipo de permiso.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 04 de febrero el Contratista presentó una nueva Versión del documento PAGA, obedeciendo a necesidades producto del desarrollo de la obra, como es el ajuste de indicadores y registros de cumplimiento en algunos proyectos

OBSERVACIONES:
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se han realizado mas gestiones sociales

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


En la semana de este informe, el contratista realiza acopio de acero y trabaja en las dos mitades faltantes de los Box Culvert quedando los dos completos
Se realizó el comité de obra No 68, en donde se trató el reinicio de actividades en la placa huella ya que esta semana no se han presentado a trabajar en ese frente de obra, se les recuerda el plazo final del proyecto que es el 30 junio de 2021. Esta solicitud se hará formalmente al contratista con oficio de la Interventoría y la Alcaldía.
Mediante oficio C.Int- 334 - 2021 de fecha 16 de junio de 2021, dirigido al Consorcio Mejoramiento Viales, cuyo asunto es Reinicio inmediato de obras del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.
Mediante oficio C.Int- 335 - 2021 de fecha 16 de junio de 2021, dirigido al Consorcio Mejoramiento Viales, cuyo asunto es la actualización de polizas del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.
Porcentaje programado acumulado: 91,15%, Porcentaje ejecutado acumulado: 70,91%, Porcentaje de atraso 20,25% , Valor ejecutado: $903.741.043,19

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dar seguimiento a las actividades físicas del proyecto el el sector Abs 19+600 a Abs 20+000 , del tramo 11+400 al 11+700 y del tramo 10+900 al 11+200 y Box Culvert

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisar documentación de personal de obra
Dar seguimiento a los procesos técnicos como son la compactación de Subbase, fundida de los diferentes tipos de concretos, la cuantía de
Acero suministrado en sus items correspondientes (Viga Riostra, Cunetas, Bordillos y Placa).

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 2520209749 7CND

FECHA: 25 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 40 (Numeración consecutiva) del 18/06/2021 al 24/06/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YORDI RODOLFO DIAZ SANCHES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/2020

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ 179.964.330,00	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ 50.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 1.274.551.758,61	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 476.076.525,00

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	20XX	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.274.551.759	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 903.741.043	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.274.551.758,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.161.775.956,96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 885.220.850,19
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	69,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.520.193,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 903.741.043,19

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: 6

VALOR FACTURA: $ 398.881.815,72 FECHA FACTURA: 30/06/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 875.669.942,89

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 444.827.000,38

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: 11


VALOR FACTURA: $ 32.371.689,00 FECHA FACTURA: 9/07/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 412.455.311,38

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISENOS (%):	100		100,00
EXCAVACION (%)	92,7		92,70
ACERO (%)	94,3		94,30
SUBBASE (%)	94,2		94,20
CONCRETO CLASE D (%)	76,9		76,90
CONCRETO PIEDRA PEGADA (%)	121,90		121,90
CUNETA (%)	86,9		86,90
BOX (%)	100,00		100,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO (%)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: Carro - Tanque			
Mezcladora	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgal

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Caucasia, Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: El contratista a través de correo electrónico enviado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el Acta de radicación ambiental y social del proyecto entregada el pasado 27 de octubre manifiestan que no requieren ningún tipo de permiso.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 04 de febrero el Contratista presentó una nueva Versión del documento PAGA, obedeciendo a necesidades producto del desarrollo de la obra, como es el ajuste de indicadores y registros de cumplimiento en algunos proyectos

OBSERVACIONES:
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se han realizado mas gestiones sociales

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la semana de este informe, el contratista no realiza actividades en obra
Se realizó el comité de obra No 70, en donde se trató el reinicio de actividades en la placa huella ya que esta semana no se han presentado a trabajar en ese frente de obra, se les recuerda el plazo final del proyecto que es el 30 junio de 2021. Esta solicitud se hará formalmente al contratista con oficio de la Interventoría y la Alcaldía.
Mediante oficio C.Int- 342 - 2021 de fecha 22 de junio de 2021, dirigido al Consorcio Mejoramiento Viales, cuyo asunto es solicitud en toma de acciones frente al atraso actual del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.


Porcentaje programado acumulado: 95,62% Porcentaje ejecutado acumulado: 70,91% Porcentaje de atraso 24,71%, Valor ejecutado: $903.741.043,19

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dar seguimiento a las actividades físicas del proyecto el el sector Abs 19+600 a Abs 20+000 , del tramo 11+400 al 11+700 y del tramo 10+900 al 11+200 y Box Culvert

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisar documentación de personal de obra
Dar seguimiento a los procesos técnicos como son la compactación de Subbase, fundida de los diferentes tipos de concretos, la cuantía de
Acero suministrado en sus items correspondientes (Viga Riostra, Cunetas, Bordillos y Placa).

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): PUERTO LIBERTADOR - PUERTO CAREPA - GILGAR.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

SEMANA No.: 41 del 25/06/21 al 30/06/21 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: YORDI RODOLFO DIAZ SANCHES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 14/08/20

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIALES			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020		
INTEGRANTES:	CASS INGENIERIA S.A.S. Y CARLOS MANUEL VERGARA BARVO			INTEGRANTES:	R&J INGENIERIA SAS, MIGUEL ROBLES SAS		
CONTRATO No.	LP-MPL-002-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.094.587.428,61	CONTRATO No.	779	VALOR INICIAL:	$ 426.076.525,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ 179.964.330,00	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2020	ADICIONES:	$ 50.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 1.274.551.758,61	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30/06/2021	VALOR ACUMULADO:	$ 476.076.525,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2020**	**20XX**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.274.551.759	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.094.587.428,61
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1.070.480.616,83
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 864.658.353,54
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	78,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 18.520.193,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 883.178.546,54

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: 3

VALOR FACTURA: $ 547.293.714,31 FECHA FACTURA: 8/04/20

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 359.434.278,28

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	X	

MES FACTURADO: 8


VALOR FACTURA: $ 58.640.225,00 FECHA FACTURA: 9/04/21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 242.153.828,28

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100,0		100,0
EXCAVACIÓN (%)	247,7		247,7
ACERO (%)	100,3		100,3
SUBBASE (%)	136,0		136,0
CONCRETO CLASE D (%)	84,4		84,4
CONCRETO PIEDRA PEGADA (%)	132,8		132,8
CUNETA (%)	102,3		102,3
BOX (%)	100,0		100,0
MANTENIMIENTO RUTINARIO (%)	100,0		100,0
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgal

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	3		3
Volquetas:	3		3
Otros: Carro - Tanque	1		1
Mezcladora	3		3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Caucasia, Antioquia	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: El contratista a través de correo electrónico enviado el pasado 03 de diciembre remitió a Interventoría la información requerida mediante el oficio el C. Int - 128 - 2020; por tanto se encuentra al día con la documentación del PAGA.

Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: En el Acta de radicación ambiental y social del proyecto entregada el pasado 27 de octubre manifiestan que no requieren ningún tipo de permiso.
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El día 04 de febrero el Contratista presentó una nueva Versión del documento PAGA, obedeciendo a necesidades producto del desarrollo de la obra, como es el ajuste de indicadores y registros de cumplimiento en algunos proyectos

OBSERVACIONES:
Para el período del presente informe no se presentó variación con relación al de la semana pasada

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES: No se ha realizado ninguna gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____
OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: No se han realizado mas gestiones sociales

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


En la semana de este informe, el contratista realiza actividades en obra para la culminación del proyecto
Se realizó el comité de obra No 72, en donde se trató el termino de actividades en la placa huella.
Mediante oficio C.Int- 348 - 2021 de fecha 28 de junio de 2021, dirigido a la Alcaldía de Puerto Libertador, cuyo asunto es entrega de Actas de Comité de Obras del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.
Mediante oficio C.Int- 349 - 2021 de fecha 28 de junio de 2021, dirigido al Consorcio Mejoramiento Viales, cuyo asunto es solicitud de reactivación inmediatas de obras del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.
Mediante oficio C.Int- 351 - 2021 de fecha 28 de junio de 2021, dirigido al INVIAS, cuyo asunto es componente ambiental y social al termino del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.
Mediante oficio C.Int- 353 - 2021 de fecha 29 de junio de 2021, dirigido al Consorcio Mejoramiento Viales, cuyo asunto es solicitud de reactivación inmediatas de obras del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.
Mediante oficio C.Int- 354 - 2021 de fecha 29 de junio de 2021, dirigido a la Alcaldía de Puerto Libertador y al Consorcio Mejoramiento Viales, cuyo asunto es citación a Comité de Obras del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.
Mediante oficio C.Int- 356 - 2021 de fecha 29 de junio de 2021, dirigido a la Alcaldía de Puerto Libertador, cuyo asunto es presunto incumplimiento del contrato LP-MPL-002-2020 del Municipio de Puerto Libertador.

Porcentaje programado acumulado: 100%. Porcentaje ejecutado acumulado: 100%. Porcentaje de atraso 0% . Valor ejecutado: $1.094.587.428,61

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

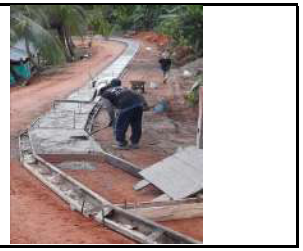


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisar documentación de personal de obra
Dar seguimiento a los procesos técnicos como son la compactación de Subbase, fundida de los diferentes tipos de concretos, la cuantía de
Acero suministrado en sus items correspondientes (Viga Riostra, Cunetas, Bordillos y Placa).

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
No. MAT: 25202097497CND

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020

VALENCIA

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 321 2400 302
Email: proyectos@ryjingenieria.com
www.ryjingenieria.com

9 INTRODUCCIÓN.

Proyecto 20181301010478 - "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL" de los contratos: CONTRATO No. 056 de 2020 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL, CONTRATO N° LP-MPL-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL y CONTRATO MV-LP-002-2020 - MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. Los recursos de las vías en el objeto de este contrato corresponden a los recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), del Sistema General de Participantes (SGP), del sistema General de Regalías (SGR) y las diferentes fuentes de financiación públicas o privadas de la vigencia 2020.

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°11** correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2021 en desarrollo del contrato de interventoría N° 779 de 2020 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL", el cual ha sido elaborado por el **CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020**, en cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías, del 2016.

La orden de iniciación del contrato de interventoría fue impartida mediante el oficio N° SRT 28422 del 04 de agosto de 2020, el plazo inicial de ejecución para el contrato de Interventoría es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, de igual manera se designó como supervisor del contrato de Interventoría por parte del INVIAS Territorial Córdoba a la Ingeniera Laura Isabela Peña García, Cel.: 304 367 6989 Email: lipena@invias.gov.co.

Mediante Prorroga Número uno (01) de 2020 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 13 de Marzo de 2021.

Mediante Prorroga Número dos (02) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 30 de Abril de 2021.

Mediante Prorroga Número tres (03) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la ampliación del plazo del contrato hasta el 30 de Junio de 2021.

Mediante Adición Número uno (01) de 2021 del contrato de interventoría se concede por solicitud del INTERVENTOR la adición por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($50.000.000,00).

El Acta de iniciación al contrato No. MV-LP-002-2020, correspondiente al municipio de Valencia, fue inscrita el día 13 de agosto de 2020 entre el contratista TVP MUNICIPIOS, la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020 y el MUNICIPIO DE VALENCIA representado por el Supervisor.

Mediante Prorroga Número uno (01) de 2021 del contrato MV-LP-002-2020 se concede por solicitud del CONTRASTISTA TVP MUNICIPIOS la ampliación del plazo del contrato de obra hasta el 30 de Abril de 2021.

10 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VALENCIA

El proyecto consiste en el mejoramiento de vía rural con la construcción de plaza huella, box coulvert y obras complementarias desde el CRUCE DE VÍA (CALLEJAS – VALENCIA) – SANTA MARÍA – SAN RAFAEL – LA BANCA hasta GUADUAL CENTRAL, se pretenden realizar 1003 ML de placa huella, construcción de 1 box coulvert de 1.5 x 1.5 de 6 mts, 1 box coulvert de 1.5 x 1.0 de 9 mts y obras complementarias de limpieza de 16 alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería aumentando así la vida útil del tramo vial, con lo que se espera disminuir los tiempos de recorrido del personal, aumentar la comercialización de los productos del campo que son cultivados en esta zona al igual que garantizar la salida de al personal del sector a centros de salud y en especial a los estudiantes a centros de enseñanza, aun en tiempos de lluvias.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA	
Valencia:	• Tramo N° 1 – Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca

10.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VALENCIA

El mejoramiento de vías en el Municipio de Valencia contempla el tramo Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca que se localiza en la parte sur del municipio. El tramo N° 1 a mejorar se localiza en el K0+000 al K25+830, P.I. 8°15'30'' Latitud Norte y 79°08'55'' Latitud Oeste, P.F. 8°27'40'' Latitud Norte y 79°88'25'' Latitud Oeste.



Figura 5. Trazado Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca
Fuente: Anexo Técnico Valencia

10.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario que realizo el Instituto Nacional de Vías - INVIAS para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte del Contratista para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

MUNICIPIO	TRAMO VIAL A INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	BOX COULVERT (M)
Valencia	Tramo N° 1 – Cruce de vía (Callejas – Valencia) – Santa María – San Rafael – La Banca	1003,00	15,00

10.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las vías a intervenir están catalogadas de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, box coulvert, alcantarillas, limpieza de cunetas y rocería a cada lado de la vía, actividades que cumplirán con las características de diseño de construcción entregados por el municipio de Valencia, basados en las cartillas de construcción de INVIAS.

Abscisa	Dimensiones (m)			Obra a ejecutar
	l	a	h	
K2+480	350	5		PLACA HUELLA SECTOR BARBA DEL SOL
K7+980	9	1.0	1.0	BOX COULVERT DE 1.0X1.0
K9+110	400	5		PLACA HUELLA LOMA PACHO MARTÍNEZ
K9+600	300	5		PLACA HUELLA APARTADA EL COCUELO
K10+080	6	1.5	1.5	BOX COULVERT DE 1.5X1.5
K3+000	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K3+900	7	3	3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K4+810	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K4+900	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+130	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+370	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+375	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K5+940	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+050	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

K6+320	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+640	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K6+980	7	2.5	2.5	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K7+400	7	5	3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K8+700	6			LIMPIEZA OBRAS DE ARTE
K0+000 – K25+830				Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles (mantenimiento concertado contratista e interventoría)
K0+000 – K25+830				Rocería ambos lados de la vía (mantenimiento concertado contratista e interventoría)

11 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA VALENCIA

11.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA VALENCIA

CONTRATO DE OBRA N° MV-LP-002-2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MARCO IMPLEMENTACIÓN PARA EL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL	$1.043.889.132,00 Incluido IVA
VALOR ADICIONAL	$ 56.074.748,00 Incluido IVA
VALOR TOTAL	$1.099.963.880,00 Incluido IVA
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE VALENCIA
CONTRATISTA	**TVP MUNICIPIOS,** NIT. 900.210.090-0 R.L. GUSTAVO ADOLFO MENDOZA VIDAL
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	CALLE 33 # 12 – 63
PBX	7897130
CORREO ELECTRÓNICO	Tvpmunicipios2016@gmail.com
FECHA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2020
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PRORROGA NO. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE ABRIL DE 2021

A continuación, se describe las pólizas adquiridas por el contrato de obra N° MV-LP-002-2020, por la Aseguradora Solidaria de Colombia, hasta la fecha del presente informe.


N° PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR	POR CONCEPTO DE:	FECHA DE APROBACIÓN POR LA ALCALDÍA
540-47-994000011835	Cumplimiento	13/08/2020	30/08/2021	$313.166.739,60	CONTRATO DE OBRA	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	13/08/2020	30/04/2024	$208.777.826,40		
	Estabilidad y calidad de Obra.	Vigencia de cinco (5) años.		$313.166.739,60		
	Calidad del servicio	13/08/2020	22/03/2026	$5.827.378,00		
540-74-994000002717	Predios, labores y operaciones	15/03/2021	02/05/2021	$175.560.600,00		


11.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES


El contrato se encuentra terminado y está en proceso de liquidación.

Para la fecha de corte del presente informe se evidencian los porcentajes programado y ejecutado así:

AVANCE FÍSICO			AVANCE EN TIEMPO			AVANCE FINANCIERO		
CORTE A:				vie. 30 abr. 21		CORTE A:		vie. 30 abr. 21
	%	INVERSIÓN		%	Días		%	VALOR
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	100,00%	$ 1.099.963.880,00	TIEMPO CONTRATADO:	100%	261	PRESUPUESTO CONTRATO	100%	$ 1.099.963.880,00
AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100,00%	$ 1.099.963.880,00	TIEMPO EJECUTADO:	100,00%	261,00	ACUMULADO ACTAS	80,00%	$ 879.971.104,00
POR EJECUTAR	0,00%	$ -	TIEMPO POR EJECUTAR:	0,00%	0,00	POR PAGAR EN ACTAS	20,00%	$ 219.992.776,00
ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	$ -	ATRASO (-) O ADELANTO (+) EN DIAS	0,00%	-			







El contrato actualmente se encuentra finalizado desde el 30 de abril de 2021 con todas las cantidades contratadas inicialmente más las adicionales ejecutadas en un 100%; por lo tanto, a la fecha el contrato se encuentra en proceso de liquidación.

11.3 SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

11.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO

Para el período de ejecución del 01 al 31 de Junio de 2021, el contrato se encuentra en proceso de liquidación y se emitieron varios comunicados respecto de los trámites correspondientes al

cierre de los capítulos ambiental, social, predial, de planos récord, de radicación ante el instituto del recibo del sistema de planos exigido por la Subdirección de Estudios e Innovación.

AVANCE FINANCIERO AL MES DE JUNIO DE 2021:

VALOR FACTURADO	$879.971.104,00	80%

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra en el proceso de liquidación del contrato.

AVANCE FÍSICO DEL MES DE JUNIO DE 2021:

PROGRAMADO	100%
EJECUTADO	100%

AVANCE PREDIAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Predios a intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Fuentes de material: 1
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE JUNIO DE 2021:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

12 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

12.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 779 DE 2020	
Concepto	**Fecha / Valor**
OBJETO	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 426.076.525,00 INCLUIDO IVA
ADICIÓN 1	$ 50.000.000,00 INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 476.076.525,00 INCUIDO IVA
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2020** **NIT. 901.381.064-3** **Integrado por:** MIGUEL ROBLES S.A.S., con Nit: 901.252.893-1, con un porcentaje de participación del 60% y R&J INGENIERÍA S.A.S., con Nit: 900.171.717-1, con un porcentaje de participación del 40%
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Carrera 58 # 90 – 53, Bogotá Colombia
PBX	3225888
CORREO ELECTRÓNICO	Proyectos@ryjingenieria.com
FECHA DE INICIO	AGOSTO 04 DE 2020
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA 1	HASTA EL 13 DE MARZO DE 2021
PRORROGA 2	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
PRORROGA 3	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021
SISTEMA	ACTAS DE COSTOS
PÓLIZAS	Seguros del Estado- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal N° 41-44-101230573, anexo de modificación N° 13 ajuste de valor.

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

a) Revisión de avance de inversión semanal programado y ejecutado, de acuerdo a los programas de inversión solicitados a los contratistas.
b) Diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en cuando a la gestión de reportes de avance semanal.
c) Atención y respuesta de comunicados a los proyectos, de conformidad con la correspondencia recibida y enviada, los cuales se anexan al presente informe.
d) Revisión de documento PAGA y entrega de observaciones a contratistas para correcciones.
e) Acompañamiento a Contratista y Entidad en cambio de abscisas y ubicación de obras iniciales de acuerdo a solicitudes de Alcaldías.
f) Realización de comités de obra y reuniones de obra para realizar el seguimiento a detalle de cada uno de los proyectos.
g) Con la terminación de los contratos de obra, se dio inicio a los trámites de consecución de documentación para la liquidación de mismos.

12.3 INFORMES ESPECIALISTAS

En el periodo 01 al 31 de Junio, se contó con apoyo de los profesionales mencionados a continuación, en revisión de temas pertinentes.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ING. JUAN DIEGO JIMÉNEZ SERNA
ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING. JORGE ELIECER IBARRA HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	ING. CARLOS ALBERTO CORTES VALERO
SECRETARIA 1	María José González Muñoz

12.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Acta de costos de Agosto	31-Ago-20	$24.231.664,17	$24.231.664,17
2	Acta de costos de Septiembre	30-Sep-20	$35.182.158,41	$35.182.158,41
3	Acta de costos de Octubre	31-Oct-20	$35.471.520,00	$35.471.520,00
4	Acta de costos de Noviembre	30-Nov-20	$28.995.218,70	$28.995.218,70
5	Acta de costos Diciembre	31-Dic-20	$59.339.112,00	$59.339.112,00
6	Acta de costos Enero	31-Ene-21	$58.934.155,00	$58.934.155,00
7	Acta de costos Febrero	28-Feb-21	$58.640.225,00	$58.640.225,00
8	Acta de costos Marzo	31-Mar-21	$62.348.265,00	$62.348.265,00
9	Acta de costos Abril	30-Abri-21	$50.188.243,72	$49.312.993.10
10	Acta de costos Mayo	31-May-21	$30.754.479,00	$32.153.919,00
11	Acta de costos Junio	30-Jun-21	$31.991.484,00	
VALOR TOTAL				**$444.609.230,38**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE SAN JOSÉ DE URÉ.

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1	26/01/2021	$329.006.950,80	$329.006.950,80
2	Cuenta No. 2		$548.344.918,00	$548.344.918,00
3	Cuenta No. 3		$219.337.967,20	
VALOR TOTAL				**$877.351.868,80**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE PUERTO LIBERTADOR.

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1	04/12/2021	$328.376.229,00	$328.376.229,00
2	Cuenta No. 2	25/03/2021	$547.293.715,00	$547.293.715,00
3	Cuenta No. 3		$218.917.486,00	
VALOR TOTAL				**$875.669.944,00**

PROGRAMA ANUAL DE CAJA CONTRATO DE OBRA DE VALENCIA.

No.	Descripción	Fecha	Programado	Ejecutado
1	Cuenta No. 1	14/01/2021	$313.166.739,60	$313.166.739,60
2	Cuenta No. 2	31/03/2021	$521.944.566,00	$521.944.566,00
3	Cuenta No. 3		$208.777.826,40	
VALOR TOTAL				**$835.111.305,60**

12.5 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

La interventoría teniendo en cuenta el proceso de gestión de calidad que adelanta el INVIAS, elaboró y presentó los reportes de avance mensual de interventoría para los contratos de obra, mediante el uso y aplicación del Manual y Formatos de Interventoría del 2016, formatos los cuales hacen parte del presente **informe mensual de interventoría No. 11.**

Adicionalmente la interventoría presentó reportes de avance semanal de Interventoría para los contratos de obra, en el Sistema de Información Gerencial (CIFRA).

13 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

13.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: **JUNIO** **CONTRATO No.** 779 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020** **SECTOR:** SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Camioneta	Camioneta o campero de mas de 2000 c.c. modelo 2012 a 2017	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Moto	Motocicleta 150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Topografia	Trabajo de topografia	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ensayos de laboratorio	Ensayos de laboratorio	I	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I
Oficina	Oficina en puerto libertador	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Oficina	Oficina en Valencia	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

13.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

MES DEL INFORME: JUNIO **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 779 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020 **SECTOR:** SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	DIRECTOR DE OBRA																															
CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	RESIDENTE 1																															
ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO	RESIDENTE 2																															
JESUS DAVID PAEZ BUELVAS	AUXILIAR DE INTERVENTORIA																															
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESP. AMBIENTAL																															
FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO	ESP. ESTRUCTURAL																															
ENRIQUE MARIN PEÑA	ESP. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS																															
JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	ESP. HIDRAULICO																															
FABIANA MONTIEL AROCA	SECRETARIA 1																															
MARIA JOSÉ GONZALEZ MUÑOZ	SECRETARIA 2																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

13.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 - 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

SECTOR: SAN JOSE DE URE - PUERTO LIBERTADOR - VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0478	P 23580	Nación	Contrato Principal y Adición No. 1	$ 159.041.983,00
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0478	P 23682	Nación	Contrato Principal y Adición No. 1	$ 159.041.983,00
2020	9220	005-2402-0603-2018-130101-0478	P 23855	Nación	Contrato Principal y Adición No. 1	$ 157.992.559,00
				TOTAL		**$ 476.076.525,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 476.076.525,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Saldo Registro Presupuestal No. 9220 De (21/05-2020) 005-2402-0603-2018-130101-0478	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
		REGISTRO PRESUPUESTAL 9220 DEL 21 DE MAYO DE 2020					**$ 159.041.983,00**	**$ 159.041.983,00**	**$ 157.992.559,00**		**$ 476.076.525,00**		
		VALOR ANTICIPO VIGENCIA 2020 (N/A)											
1	**Agosto / 2020.**	$ 20.362.743,00	$ 3.868.921,17	$ 24.231.664,17			$ 8.077.221,39	$ 8.077.221,39	$ 8.077.221,39	$ 24.231.664,17	$ 451.844.860,83		
2	**Septiembre / 2020.**	$ 29.564.839,00	$ 5.617.319,41	$ 35.182.158,41			$ 11.727.386,14	$ 11.727.386,14	$ 11.727.386,14	$ 35.182.158,41	$ 416.662.702,42		
3	**Octubre / 2020.**	$ 29.808.000,00	$ 5.663.520,00	$ 35.471.520,00			$ 11.823.840,00	$ 11.823.840,00	$ 11.823.840,00	$ 35.471.520,00	$ 381.191.182,42		
4	**Noviembre / 2020.**	$ 24.365.730,00	$ 4.629.488,70	$ 28.995.218,70			$ 9.665.072,90	$ 9.665.072,90	$ 9.665.072,90	$ 28.995.218,70	$ 352.195.963,72		
5	**Diciembre / 2020.**	$ 49.864.800,00	$ 9.474.312,00	$ 59.339.112,00			$ 19.779.704,00	$ 19.779.704,00	$ 19.779.704,00	$ 59.339.112,00	$ 292.856.851,72		
6	**Enero / 2021.**	$ 49.524.500,00	$ 9.409.655,00	$ 58.934.155,00			$ 19.644.718,33	$ 19.644.718,33	$ 19.644.718,33	$ 58.934.155,00	$ 233.922.696,72		
7	**Febrero / 2021.**	$ 49.277.500,00	$ 9.362.725,00	$ 58.640.225,00			$ 19.546.741,67	$ 19.546.741,67	$ 19.546.741,67	$ 58.640.225,00	$ 175.282.471,72		
8	**Marzo / 2021.**	$ 52.393.500,00	$ 9.954.765,00	$ 62.348.265,00			$ 20.782.755,00	$ 20.782.755,00	$ 20.782.755,00	$ 62.348.265,00	$ 112.934.206,72		
9	**Abril / 2021.**	$ 41.439.490,00	$ 7.873.503,10	$ 49.312.993,10			$ 16.437.664,37	$ 16.437.664,37	$ 16.437.664,37	$ 49.312.993,10	$ 63.621.213,62		
10	**Mayo / 2021.**	$ 27.203.100,00	$ 5.168.589,00	$ 32.371.689,00			$ 10.790.563,00	$ 10.790.563,00	$ 10.790.563,00	$ 32.371.689,00	$ 31.249.524,62		
11	**Junio / 2021.**	$ 26.260.104,72	$ 4.989.419,90	$ 31.249.524,62			$ 10.766.316,21	$ 10.766.316,21	$ 9.716.892,21	$ 31.249.524,62	$ 0,00		
	TOTALES	**$ 400.064.306,72**	**$ 76.012.218,28**	**$ 476.076.525,00**			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 476.076.525,00**	**$ 31.249.524,62**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matrícula No.: 22202 - 328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

13.4 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MINFRA-MN-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 779 - 2020.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

SECTOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA	79.912.944	INGENIERO DIRECTOR	$ 5.350.000,00	$ 2.675.000,00	$ 186.180,00	$ 107.000,00	$ 428.000,00	$ 107.000,00		
2	CARLOS ALBERTO CORTES VALERO	79.688.911	RESIDENTE 1	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 240.120,00	$ 138.000,00	$ 552.000,00	$ 138.000,00		
3	ELKIN ENRIQUE ESTRADA CORONADO	10.766.037	RESIDENTE 2	$ 3.450.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
4	JESUS DAVID PAEZ BUELVAS	1.233.339.099	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.350.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
5	FRANKLIN LEANDRO OSORIO CANO	15.459.141	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	$ 4.500.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
6	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10.766.686	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 4.500.000,00	$ 1.530.000,00	$ 106.488,00	$ 61.200,00	$ 244.800,00	$ 61.200,00		
7	JORGE ELIECER IBARRA HERNANDEZ	10.766.686	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 4.500.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
8	ENRIQUE MARIN PEÑA	79.370.211	ESPECIALISTA GEOTECNIA Y PAVIM	$ 4.500.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
9	FABIANA MONTIEL AROCA	1.067.958.262	SECRETARIA 1	$ 950.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -		
10	MARIA JOSE GONZALEZ MUÑOZ	1.017.258.513	SECRETARIA 2	$ 950.000,00	$ 950.000,00	$ 66.120,00	$ 38.000,00	$ 152.000,00	$ 38.000,00		
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 34.500.000,00**	**$ 8.605.000,00**	**$ 598.908,00**	**$ 344.200,00**	**$ 1.376.800,00**	**$ 344.200,00**		
						$			**2.664.108,00**		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.



Firma

Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202 - 097497 CND.

Firma

Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula No.: 22202 - 328524 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Dirección Territorial.

13.5 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORSIO INTERVENTORIAS 2020

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 4/08/2020

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 426.076.525,00

VALOR ACUMULADO: $ 476.076.525,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 42.607.652,50	4	8	2020	7/12/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 85.215.305,00	4	8	2020	7	6	2024
Calidad del servicio	30%	$ 127.822.957,50	4	8	2020	4	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101230573

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 47.607.652,50	4	8	2020	31/12/2021		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 95.215.305,00	4	8	2020	30	9	2024
Calidad del servicio	30%	$ 142.822.957,50	4	8	2020	4	8	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101230573

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Minuta de adición 1 - 22 de Mayo de 2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

13.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA MINFRA-MN-IN-15-FR-18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020

FECHA DE INICIO: 4/08/2020 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/12/2020 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: (Indicar número y año)

CONTRATISTA:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. N/A FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO **X** APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: **N/A**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 097 497 CND

Firma
Nombre:
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 22202-328524 COR

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

13.7 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

✔ **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

MINFRA-MN-IN-3-FR-2

(NO APLICA)

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

SAN JOSÉ DE URÉ

- Es necesario iniciar con la documentación de liquidación del contrato y los cierres correspondientes en todas las áreas del contrato.
- VALOR PROGRAMADO $1096.689.836,00 (100%), VALOR EJECUTADO $1096.689.836,00 (100%)

PUERTO LIBERTADOR

- Es necesario iniciar con la documentación de liquidación del contrato y los cierres correspondientes en todas las áreas del contrato.
- VALOR PROGRAMADO $1.094.587.430 (100,00%), VALOR EJECUTADO $1.094.587.430 (100,00%)

VALENCIA

- VALOR PROGRAMADO $1.099.963.880,00 (100%), VALOR EJECUTADO $1.099.963.880,00 (100%)

15 ANEXOS

15.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA, ALCALDÍA E INTERVENTOR

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

CONTRATO 779 – 2020 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020. NIT: 901.381.064-3

TIPO E: Enviada R: Recibida	No de OFICIO	REMITE	FECHA OFICIO	CORREO FECHA	CORREO HORA	FÍSICO FECHA	FÍSICO HORA	DIRIGIDO A:	ASUNTO	RECIBIDO	CORREO FECHA	CORREO HORA
2020												
			JUNIO									
E	C.Int - 316	C. Int 2021	mar 1 jun 2021	mar 1 jun 2021	11:54			INVIAS	Poliza actualizada adicion 1	46611	mar 1 jun 2021	13:48
E	C.Int - 317	C. Int 2021	jue 3 jun 2021	jue 3 jun 2021	11:26			INVIAS	Acta de costos No. 10			
E	C.Int - 318	C. Int 2021	jue 3 jun 2021	jue 3 jun 2021	17:24			Alcaldía Pto Lib	Acta de reinicio			
R	SMA 26675	INVIAS	mar 25 may 2021	vie 4 jun 2021	10:24			Interventoria	Respuesta entrada 37775 - Valencia	C.Int - 333		
R	SMA 26604	INVIAS	mar 25 may 2021	vie 4 jun 2021	10:45			Interventoria	Respuesta entrada 35073 - Puerto Libertador	C.Int - 329		
R	SMA 26603	INVIAS	mar 25 may 2021	vie 4 jun 2021	10:46			Interventoria	Respuesta entrada 29277 - Ure			
R	SMA 26601	INVIAS	mar 25 may 2021	vie 4 jun 2021	10:47			Interventoria	Respuesta entrada 29277 - Valencia	C.Int - 326		
E	C.Int - 319	C. Int 2021	vie 4 jun 2021	vie 4 jun 2021	17:28			Alcaldía Pto Lib	Acta de mayores y menores cantidades			
E	C.Int - 320	C. Int 2021	mar 8 jun 2021	mar 8 jun 2021	13:52			Contratista Urè	Solicitud documentación y actividades			
E	C.Int - 321	C. Int 2021	mar 8 jun 2021	mar 8 jun 2021	14:09			Alcaldía Uré	Informes bimensuales			
E	C.Int - 322	C. Int 2021	mar 8 jun 2021	mar 8 jun 2021	14:17			Contratista Urè	Observaciones informe mensual PAGA			
E	C.Int - 323	C. Int 2021	mar 8 jun 2021	mar 8 jun 2021	14:52			Contratista Urè	Documentos Liquidación			
E	C.Int - 324	C. Int 2021	mar 8 jun 2021	mar 8 jun 2021	15:00			Contratista Pto Libertador	Documentos Liquidación			
R	PTL-014-2021	Contr Pto Libert	mar 8 jun 2021	mar 8 jun 2021	16:04			Interventoria	Solicitud Adicion y prorroga			
E	C.Int - 325	C. Int 2021	mar 8 jun 2021	mar 8 jun 2021	16:48			INVIAS	Acta de costos No. 10			
E	C.Int - 326	C. Int 2021	mié 9 jun 2021	mié 9 jun 2021	11:38			INVIAS	Atención oficio SMA 26601			
E	C.Int - 327	C. Int 2021	mié 9 jun 2021	mié 9 jun 2021	15:05			Alcaldía Uré	Cumplimiento meta fisica convenio			
E	C.Int - 328	C. Int 2021	jue 10 jun 2021	jue 10 jun 2021	11:26			Alcaldía Pto Lib	Aval de adición y prorroga			
E	C.Int - 329	C. Int 2021	jue 10 jun 2021	jue 10 jun 2021	11:44			Contratista Pto Libertador	Observaciones SMA 26604			
E	C.Int - 330	C. Int 2021	jue 10 jun 2021	jue 10 jun 2021	11:55			Contratista Urè	Observaciones SMA 26603			
E	C.Int - 331	C. Int 2021	jue 10 jun 2021	vie 11 jun 2021	9:47			Internet	Solicitud internet			
E	C.Int - 332	C. Int 2021	jue 10 jun 2021	jue 10 jun 2021	16:28			INVIAS	Atención oficio SMA 26604	49681	jue 10 jun 2021	18:20
R	SIN	Min Interior	SIN	vie 11 jun 2021	9:36			Interventoria	Resolución procedencia de consulta previa ST - 0580 (San jose de Ure)			
E	C.Int - 333	C. Int 2021	mié 16 jun 2021	mié 16 jun 2021	10:31			INVIAS	Atención oficio SMA 26675	50939	mié 16 jun 2021	12.11
E	C.Int - 334	C. Int 2021	mié 16 jun 2021	mié 16 jun 2021	15:33			Contratista Pto Libertador	Rinicio inmediato			
E	C.Int - 335	C. Int 2021	mié 16 jun 2021	mié 16 jun 2021	15:37			Contratista Pto Libertador	Actualizacion de polizas			
R	SMA 27850	INVIAS	lun 31 may 2021	mié 16 jun 2021	14:48			Interventoria	Respuesta comunicado C. Int - 305 - 2021 (cierre ambiental y social)			
R	SIN	Contr Pto Libert		mié 16 jun 2021	16:01			Interventoria	Respuesta actualización de polizas			
R	20212105616	CVS	mié 16 jun 2021	mié 16 jun 2021	16:58			Interventoria	Certificación CVS Puerto Libertador			
R	SIN	Alcaldía Pto Libertador		mié 16 jun 2021	17:24			Interventoria	Acta de aprobación de polizas para proceso de reinicio			
E	C.Int - 336	C. Int 2021	jue 17 jun 2021	jue 17 jun 2021	9:20			Contratista Urè	Inicio emprendedores rurales			
R	SMA 29994	INVIAS	jue 10 jun 2021	jue 17 jun 2021	13:50			Interventoria	Respuesta a entrada No. 49116 - C.Int-326-2021			
R	SMA 29877	INVIAS	jue 10 jun 2021	jue 17 jun 2021	13:52			Interventoria	Respuesta a entrada No. 40395 - C.Int-305-2021			

15.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO SAN JOSE DE URE
PLACA HUELLA VERSALLES – BRAZO IZQUIERDO ALTOS DEL CRISTAL


ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 1 (K4+200 – K4+400)	

ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 1 (K4+200 – K4+400)	

ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 1 (K4+200 – K4+400)	

ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 1 (K4+200 – K4+400)	

ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 1 (K4+200 – K4+400)	

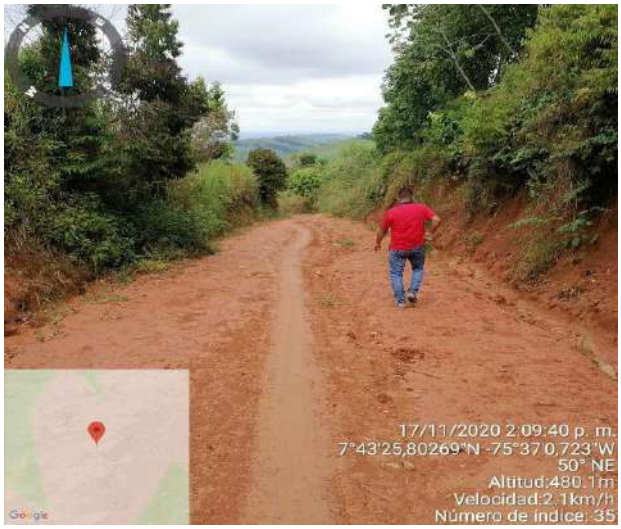ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 2 (K4+880 – K4+050)	

ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 2 (K4+880 – K4+050)	


ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 3 (K4+00 – K4+150)	

ANTES	DESPUES
	
TRAMO # 3 (K4+00 – K4+150)	

REGISTRO FOTOGRAFICO PUERTO LIBERTADOR
PUERTO LIBERTADOR – PUERTO CAREPA – GILGAL

ANTES	DESPUES
	
ABS 19+600	

ANTES	DESPUES
	
ABS 19+600	

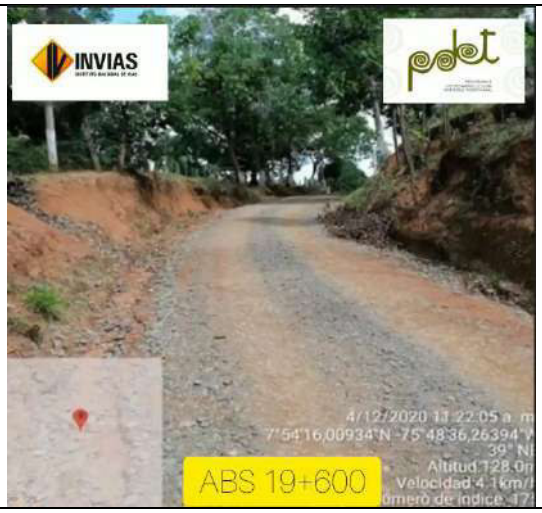ANTES	DESPUES
	
ABS 19+600	

ANTES	DESPUES
	
ABS 11+400	

ANTES	DESPUES
	
ABS 11+400	

ANTES	DESPUES
	
ABS 10+900	

ANTES	DESPUES
	
ABS 10+900	

REGISTRO FOTOGRAFICO VALENCIA
CALLEJAS VALENCIA – SANTA MARIA – SAN RAFAEL – LA BANCA

ANTES	DESPUES
	

ANTES	DESPUES
	

ANTES	DESPUES
	

ANTES	DESPUES
	

ANTES	DESPUES
	

ANTES	DESPUES
	

15.3 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA.** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CÓRDOBA.**

CONTRATO DE OBRA No. **056 DE 2020**
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: **4L INGENIERIA S.A.S.**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Versalles - Brazo Izquierdo - Alto del Cristal Y Versalles - San Pedrito**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: **14/08/20**
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: **7 Meses**

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **30/06/21**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: **$ 1.096.689.836,00**

VALOR ACUMULADO: **$ 1.096.689.836,00**
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **779 DE 2020** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020**
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
056 de 2020	23-jun-20	7 Meses.	$ 1.096.689.836,00	$ 1.096.689.836,00
Otro Si No 1	2-mar-21	1.5 Meses		$ 1.096.689.836,00
Otro Si No 2	28-abr-21	2 Meses		$ 1.096.689.836,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URE EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

TRAMO 1: VEREDA VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTO DEL CRISTAL. 500 MTS

TRAMO 2: VEREDA VERSALLES - SAN PEDRITO. 400 MTS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE VIA DE 5 MTS DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR DE PLACA, SECCIÓN DETALLADA ASÍ:

2 HUELLAS DE 0.90 mts, FRANJA CENTRAL DE CICLÓPEO DE 0.90 mts y DOS FRANJAS DE AJUSTE EN CICLÓPEO DE 0,45 mts y CUNETAS DE 0.70 Mts INCLUYENDO BORDILLO

TRAMO 1: VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTOS DEL CRISTAL: 500 MTS

Sector 1 de 150 ml.

Sector 2 de 150 ml.

Sector 3 de 200 ml.

TRAMO 2: VERSALLES - SAN PEDRITO: 400 MTS

Sector 1 de 400 ml.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	1.093.627.428,49
Valor IVA :	$	3.062.408,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	1.096.689.836,00

AIU: A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	VÍA: VERSALLES - BRAZO IZQUIERDO - ALTO DE CRISTAL. 500 ML				
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO.				
6	Subbase Granular Clase C	m3	378,75	$ 225.144,00	$ 85.272.445,71
7	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	1905,61	$ 26.120,00	$ 49.774.480,96
8	CONCRETO 21 MPA - CLASE D	m3	196,82	$ 665.945,00	$ 131.071.627,87
9	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	113,40	$ 483.917,00	$ 54.876.187,80
10	Acero de refuerzo fy = 4.200 kg / cm2 (60.000 PSI)	Kg	19705,98	$ 6.380,00	$ 125.724.132,55
11	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	175,30	$ 550.183,00	$ 96.447.079,90
	OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				
	Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	und	1	$ 189.493,00	$ 189.493,00
	Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	ml	4000	$ 6.080,00	$ 24.320.000,00
	Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	ha	3,1	$ 736.430,00	$ 2.282.933,00
	VÍA: VERSALLES -SAN PEDRITO				
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO: TOTAL 400 ML				
	Subbase Granular Clase C	m3	668,91	$ 225.144,00	$ 150.599.947,32
	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	382,34	$ 26.120,00	$ 9.986.677,27
	CONCRETO 21 MPA - CLASE D	m3	143,73	$ 665.945,00	$ 95.718.050,70
	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	100,75	$ 483.917,00	$ 48.752.702,08
	Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	kg	15065,06	$ 6.699,00	$ 100.920.854,41
	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	140,24	$ 550.183,00	$ 77.157.663,92
	OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				
	Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	und	1	$ 189.493,00	$ 189.493,00
	Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	ml	3500	$ 6.080,00	$ 21.280.000,00
	Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	ha	4	$ 736.430,00	$ 2.945.720,00
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.077.509.489,49**
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					**$ 1.077.509.489,49**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 16.117.939,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 3.062.408,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 19.180.347,00**
GESTION SOCIAL	
IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 1.096.689.836,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	20%	$ 329.006.950,80				$ 329.006.950,80
2	50%	$ 548.344.918,00				$ 548.344.918,00
3	20%	$ 219.337.967,20				$ 219.337.967,20
TOTALES						**$ 1.096.689.836,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Se deja constancia por parte de la Interventoria que la meta física del proyecto no fue cumplida en su totalidad, ya que lo ejecutado correspondió a 900 ML de placa Huella y lo contenido en el Anexo técnico del convenio correspondia a 1 KM de placa huella y dos box coulverts.

Se informó oportunamente al Municipio al respecto de la necesidad de realizar la adición presupuestal correspondiente pero no se tramitó para dar el cumplimiento respectivo.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre **JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA**
Representante legal o apoderado.
Contratista **4L INGENIERIA SAS.**
Matrícula No. **22202 - 311394 COR**

Firma
Nombre **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No. **25202 - 097 497 CND**

Firma
Nombre **ANA MARIA LAKAH NOVA**
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. **2202 221903 COR**

Firma
Nombre **CARLOS CORTES VALERO.**
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No. **0820275862ATL**

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. MV-LP-002-2020
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

CONTRATISTA: TVP MUNICIPIOS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 13/07/20
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.043.889.132,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.099.963.880,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 779
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA 2020

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
MV-LP-002-2020	19/06/20	7 MESES	$ 1.043.889.132	$ 1.043.889.132
MV-LP-002-2020 PRORROGA 1	11/03/21	1.5 MESES	$ 1.043.889.132	$ 1.043.889.132
MV-LP-002-2020 OTRO SI MODIFICATORIO No 2	20/04/21	0 MESES	$ 56.074.748	$ 1.099.963.880

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA , DEPARTAMENO DE CORDOBA ZONA RURAL UBICADA EN EL CRUCE DE VIA (CALLEJA - VALENCIA) - SANTA MARIA - SAN RAFAEL - LA BANCA - GUADUAL CENTRAL.

LA LONGITUD ALCANZADA 1050 MTS LINEALES, DISTRUBUIDOS ASI:

SECTOR BARBAS DEL SOL: 350 MTS

SECTOR PACHO MARTINEZ: 400 MTS

SECTOR APARATA EL COCUELO: 300 MTS

FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2021 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE ANCHO CINCO (5) METROS DE CALZADA EN LOS SECTORES:

SECTOR BARBAS DEL SOL: 350 MTS; PR - K2+480

SECTOR PACHO MARTINEZ; 400 MTS: PR - K9+110

SECTOR APARATA EL COCUELO: 300 MTS; PR - K9+600

OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

LIMPIEZA DE 16 ALCANTARILLAS

LIMPIEZA DE 3004 ML DE CUNETAS

ROCERIA EN 6 HA

CONSTRUCCIÓN DE DOS BOX COULVERT

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	1.099.963.880,00
Valor IVA :	$	-
Valor total ejecutado del contrato:	$	1.099.963.880,00

AIU: 30% % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	CONSTRUCCIÓN DE 2 BOX COULVER DE 1.5X1.5 y 1.0X1,0 (L =9m) y 1.0X1.0 (L=6M)				
	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	119,22	$ 26.120	$ 3.114.103
	Relleno para estructuras con recebo	m3	99,50	$ 80.655	$ 8.025.173
	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	34,91	$ 751.241	$ 26.225.823
	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	2,66	$ 609.021	$ 1.619.996
	Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	kg	2.268,22	$ 6.380	$ 14.471.244
	ONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO (BARBA DEL SOL) - (LOMA PACHO MARTINEZ) Y (APARTADA EL COCUELO)				
	Subbase Granular Clase C	m3	1.123,50	$ 215.530	$ 242.147.955
	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	1.123,50	$ 26.120	$ 29.345.820
	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	353,35	$ 751.241	$ 265.451.007
	Concreto piedra pegada - Resistencia 21MPa	m3	235,20	$ 498.033	$ 117.137.362
	Acero de refuerzo de fy = 4.200 Kg / cm 2 (60.000 PSI)	kg	29.642,20	$ 6.380	$ 189.117.236
	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	268,80	$ 588.403	$ 158.162.726
	OBRAS DE MANTENIMIENTO				
	Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	und	16,00	$ 189.493	$ 3.031.888
	Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	ml	3.004,00	$ 6.080	$ 18.264.320
	Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	ha	6,00	$ 737.439	$ 4.424.634
SUBTOTAL OBRAS					$ 1.080.539.287
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					$ 1.080.539.287
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 16.323.187
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 3.101.406
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 19.424.593
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 1.099.963.880**

FECHA	30	4	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1/12/20	$ 313.166.740,00				$ 313.166.740,00
2	1/03/21	$ 521.944.566,00				$ 521.944.566,00
3	25/05/21	$ 264.852.574,00				$ 264.852.574,00
N.. actas						
TOTALES						$ 1.099.963.880,00

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre GUSTAVO MENDOZA VIDAL
Representante legal o apoderado
Contratista: TVP MUNICIPIOS
Matrícula No.

Firma
Nombre I.C. JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No.25202-097497 CND

Firma
Nombre JHON CARLOS VIDAL ESTRADA
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 22202 - 148611 COR

Firma
Nombre I.C. ELKIN ESTRADA
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No. 22202093163COR

Firma
Nombre MARIA LUISA ALDANA VILLALBA
Supervisor
ALCALDIA MUNICIPAL DE VALENCIA
Matrícula No. 22202 - 418551 COR

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA.** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CÓRDOBA.**

CONTRATO DE OBRA No. **LP - MPL - 002 - 2020.**
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PUERTO LIBERTADOR EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

CONTRATISTA: **CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **Puerto Libertador - Puerto Carepa - Gilgar**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: **14/08/20**
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: **7 Meses**

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **13/03/21**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: **$ 1.094.587.430,00**

VALOR ACUMULADO: **$ 1.094.587.430,00**
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **779 DE 2020** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERVENTORIAS 2020**
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
Lp - Mpl - 002 - 2020	15-jul-20	7 Meses.	$ 1.095.231.859,00	$ 1.095.231.859,00
Otro Si No 1 Modifica Garantías	28-jul-20			
Otro Si No 2 - corrige valor	30-jul-20		$ 1.094.587.430,00	$ 1.094.587.430,00
Prórroga 001	11-feb-21	1.5 Meses	$ 1.094.587.430,00	$ 1.094.587.430,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		23-abr-21	23-abr-21	4-jun-21	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR EN LOS SIGUIENTES TRAMOS:

TRAMO 1 (K10 + 900 - K11+196,90) CONDORITO	296,90	ML
TRAMO 2 (K11 + 400 - K11+554,42) CARACOLÍ	154,42	ML
TRAMO 3 (K19 + 600 - K20+007,5) GILGAL	407,50	ML
LONGITUD DE META FÍSICA EJECUTADA:	**858,82**	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE VIA DE 5 MTS DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR DE PLACA, SECCIÓN DETALLADA ASÍ:

2 HUELLAS DE 0.90 mts, FRANJA CENTRAL DE CICLÓPEO DE 0.90 mts y DOS FRANJAS DE AJUSTE EN CICLÓPEO DE 0,45 mts y CUNETAS DE 0.70 Mts INCLUYENDO BORDILLO

TRAMO 1 (K10 + 900 - K11+196,90) CONDORITO
TRAMO 2 (K11 + 400 - K11+554,42) CARACOLÍ
TRAMO 3 (K19 + 600 - K20+007,5) GILGAL

BOX COULVERT
K10 + 500. 1m x 1m.
K11 + 200 1m x 1m.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

Con recursos del Municipio de Puerto Libertador se realiza la construcción de placa huella en el siguiente tramo con absisas K11+595,82 a K11+750,38 para un total de 154,56 ml y se atienden sitios críticos en el corredor vial. Es de anotar que adjunto a la presente acta se anexa cuadro resumen de cantidades de obra ejecutadas con recursos municipales y que son obras de recibo por parte de la entidad contratante, puesto que corresponden a recursos adicionales aportados por el municipio para garantizar el cumplimiento de la meta física, sin embargo, los mismos no se encuentran contenidos ni incluidos en el convenio principal suscrito entre el municipio y el INVIAS; no obstante, dichos recursos adicionales se ejecutaron en el marco del contrato de obra, es decir que si bien contaron con seguimiento y control por parte de la interventoría, la responsabilidad de recibo de su ejecución es exclusiva del municipio y de la entidad contratante.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	1.091.630.422,60
Valor IVA :	$	2.957.006,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	1.094.587.428,60

AIU: A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT DE 1.0X1.0				
1	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	63,00	$ 29.272,21	$ 1.844.149,31
2	Relleno para estructuras con recebo	m3	11,01	$ 80.264,99	$ 883.365,40
3	CONCRETO 21 MPA - CLASE D	m3	24,74	$ 688.632,80	$ 17.036.775,36
4	Concreto Clase F 14	m3	2,24	$ 506.311,73	$ 1.134.138,27
5	Acero de refuerzo fy = 4.200 kg / cm2 (60.000 PSI)	Kg	3177,62	$ 6.378,12	$ 20.267.227,94
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO.				
6	Subbase Granular Clase C	m3	695,64	$ 243.767,10	$ 169.575.171,28
7	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	695,64	$ 29.272,21	$ 20.363.043,95
8	CONCRETO 21 MPA - CLASE D	m3	414,56	$ 688.632,80	$ 285.479.721,88
9	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	216,26	$ 534.870,42	$ 115.671.249,00
10	Acero de refuerzo fy = 4.200 kg / cm2 (60.000 PSI)	Kg	35762,43	$ 6.378,12	$ 228.096.931,80
11	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	300,88	$ 574.282,22	$ 172.788.257,14
	OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				
	Limpieza de Alcantarillas con diametro menor o igual a 36", incluye rectificación de descoles	und	3	$ 193.477,74	$ 580.433,22
	Limpieza de cunetas en tierra con rectificación de salidas y descoles	ml	6000	$ 6.079,99	$ 36.479.919,30
	Rocería a cada lado de la vía y/o zonas necesarias para buena visibilidad	ha	7,9	$ 742.639,46	$ 5.866.851,76
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.076.067.235,60**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 15.563.187,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 2.957.006,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 18.520.193,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 1.094.587.428,60**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	328.376.229,00
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	328.376.229,00
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	50%	$ 547.293.714,30				$ 547.293.714,30
2	50%	$ 547.293.714,30				$ 547.293.714,30
						$ -
TOTALES						$ 1.094.587.428,60

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Se deja constancia por parte de la Interventoria que la meta física del proyecto no fue cumplida en su totalidad, ya que lo ejecutado correspondió a 858,82 ML de placa Huella y lo contenido en el Anexo técnico del convenio correspondia a 1 KM de placa huella y dos box coulverts.

Por parte del municipio de Puerto Libertador se adicionó dinero al contrato para terminar la meta fisica inicial, con dichos recursos se ejecutaron 154,56 ML con los cuales se alcanza la meta de 1013,38 ML, hace parte de la presente acta de recibo el anexo adjunto con las cantidades de obra ejecutadas con recursos municipales, actividades realizadas por el Municipio y el contratista que no son competencia ni responsabilidad de la Interventoria, ya que los recursos no fueron adicionados al convenio 532 de 2020.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre **EDER JHON SOTO CUADRADO.**
Alcalde
Municipio Puerto Libertador - Córdoba.

Firma
Nombre **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula No. **25202 - 097 497 CND**

Firma
Nombre **JESUS DAVID QUINTERO DIAZ**
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. **05202 - 176924 ATL**

Firma
Nombre **CARLOS CORTES VALERO.**
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula No. **08202 - 75862 ATL**

Firma Sebastian Vergara B.
Nombre **SEBASTIAN VERGARA BENITEZ**
Representante legal o apoderado.
Contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES**
Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO AL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA CON RECURSOS MUNICIPIO.

FECHA | 30 (Día) | 6 (Mes) | 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA.

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR EN EL SIGUIENTE TRAMO:

TRAMO 2 (K11+595,82 a K11+750,38) CARACOLÍ	154,56	ML
LONGITUD DE META FÍSICA EJECUTADA:	154,56	

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	179.964.330,00
Valor IVA :	$	-
Valor total ejecutado del contrato:	$	179.964.330,00

AIU: A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO.				
6	Subbase Granular Clase C	m3	242,51	$ 243.767,10	$ 59.116.997,04
7	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	242,51	$ 29.272,21	$ 7.098.928,46
8	CONCRETO 21 MPA - CLASE D	m3	72,37	$ 688.632,80	$ 49.836.355,41
9	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	39,31	$ 534.870,42	$ 21.026.826,10
10	Acero de refuerzo fy = 4.200 kg / cm2 (60.000 PSI)	Kg	4406,19	$ 6.378,12	$ 28.103.198,70
11	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	25,74	$ 574.282,22	$ 14.782.024,30
SUBTOTAL OBRAS					**$ 179.964.330,00**
VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO)	**AIU = 30% - (A = 20%, I = 5%, U = 5%)**				**$ 179.964.330,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1		$ 179.964.330,00				$ 179.964.330,00
2						$ -
TOTALES						$ 179.964.330,00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La Alcaldía Municipal deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: Se deja constancia por parte de la Interventoria en cuanto a la meta física del proyecto y lo descrito en éste anexo que la totalidad de metros lineales ejecutados de placa huella fueron 154,56 ML, se deja la claridad que el recurso del adicional fue aportado por el municipio de Puerto Libertador pero no adicionado al convenio 532 de 2020.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre **EDER JHON SOTO CUADRADO.**
Alcalde
Municipio Puerto Libertador - Córdoba.

Firma
Nombre **JESUS IVAN QUINTERO DIAZ**
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. **05202 - 176924 ATL**

Firma Sebastian Vergara B.
Nombre **SEBASTIAN VERGARA BENITEZ**
Representante legal o apoderado.
Contratista **CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES**
Matrícula No.

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
