SOLUCIONES ELECTRICAS V&G

CONFIABILIDAD EN CADA CONEXIÓN

INFORME FINAL


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ILUMINACIÓN LED 800 W

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES

COMPROMISO AMBIENTAL

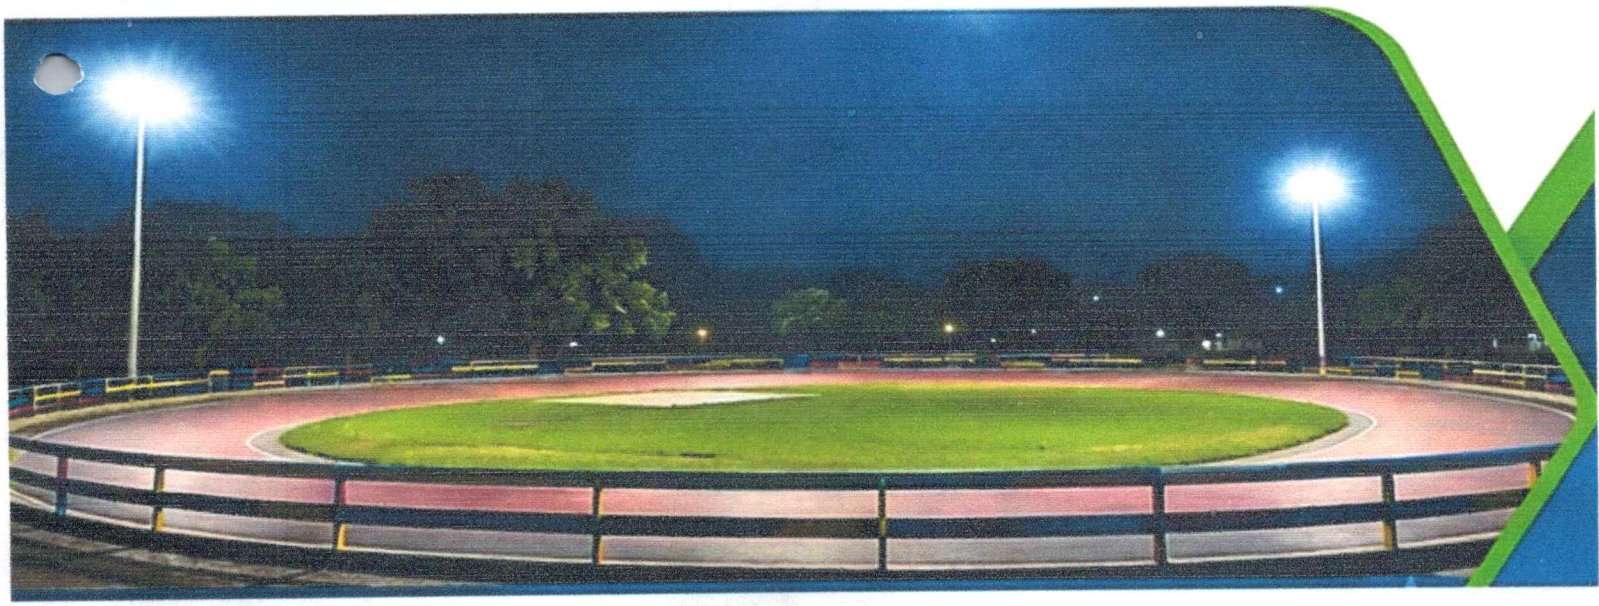

CONTRATO DE OBRA
SPOPM-CO-IMC-223-2026

PERIODO DE EJECUCIÓN
01 DE JULIO DE 2026
AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO
VALLE DEL GUAMUEZ
PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-223-2026

CONTRATANTE

MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ

CONTRATISTA DE OBRA

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. No. 1.121.507.367 expedida en Santiago, Putumayo.
Establecimiento de Comercio: SOLUCIONES ELÉCTRICAS V&G
Matrícula Mercantil No. 97899.

SUPERVISOR

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio del Valle del Guamuez

PERIODO DE EJECUCIÓN

Del **01 de julio de 2026** al **10 de julio de 2026**.

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME:
22 de julio de 2026.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio del Valle del Guamuez, en cumplimiento de sus funciones y competencias institucionales, adelanta la ejecución de proyectos de infraestructura orientados al fortalecimiento y mejoramiento de los espacios públicos, con el propósito de contribuir al desarrollo social, deportivo y comunitario del municipio. En este contexto, se formuló y ejecutó el proyecto denominado "Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del Patinódromo del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo", con el fin de optimizar las condiciones de iluminación del escenario deportivo, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria en condiciones de seguridad y eficiencia.

El proyecto responde a la necesidad de modernizar y fortalecer el sistema de alumbrado público existente mediante la instalación de infraestructura eléctrica que permita una iluminación eficiente del patinódromo municipal, mejorando la visibilidad, promoviendo el adecuado aprovechamiento del escenario en horario nocturno y contribuyendo al bienestar de la comunidad del Municipio del Valle del Guamuez. Para ello, se contempló la ejecución de actividades como localización y replanteo, excavaciones, instalación de tubería PVC e IMC, construcción de obras civiles para el gabinete de control, suministro e instalación de conductores eléctricos, reflectores LED de 500 W, tablero de protecciones y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación.

El presente informe tiene como finalidad presentar los resultados finales de la ejecución del Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026, evidenciando el desarrollo de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el avance físico y financiero del proyecto, así como las principales acciones realizadas durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2026 y el 10 de julio de 2026, de conformidad con el plazo contractual establecido.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como objeto presentar de manera detallada las actividades ejecutadas durante el desarrollo del Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026, cuyo objeto es el "Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del Patinódromo del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo", correspondiente al período de ejecución comprendido entre el 01 de julio de 2026 y el 10 de julio de 2026, de conformidad con el plazo contractual establecido.

De igual manera, el presente informe tiene como propósito:


- Describir de manera detallada las actividades desarrolladas durante la ejecución de cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto del contrato.
- Presentar el avance físico de las obras mediante un registro fotográfico que evidencie las diferentes etapas de ejecución del proyecto.
- Relacionar la documentación técnica y administrativa generada durante la ejecución contractual.
- Adjuntar las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución del contrato.
- Presentar el registro de bitácora correspondiente al período de ejecución de la obra.
- Evidenciar el cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas establecidas para el mejoramiento del sistema de alumbrado público del Patinódromo del Municipio del Valle del Guamuez.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio del Valle del Guamuez se encuentra ubicado en la zona suroccidental del departamento del Putumayo, cuya cabecera municipal es el centro poblado de La Hormiga. Su ubicación estratégica lo convierte en uno de los municipios con mayor dinámica comercial y de desarrollo de la región.

El proyecto objeto del Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026 se desarrolló en el Patinódromo del Municipio del Valle del Guamuez, ubicado en la cabecera municipal de La Hormiga, departamento del Putumayo. El proyecto consistió en el mejoramiento del sistema de alumbrado público de este escenario deportivo mediante la ejecución de obras civiles y eléctricas orientadas a optimizar las condiciones de iluminación, garantizando espacios adecuados para la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo de actividades comunitarias en horario nocturno.

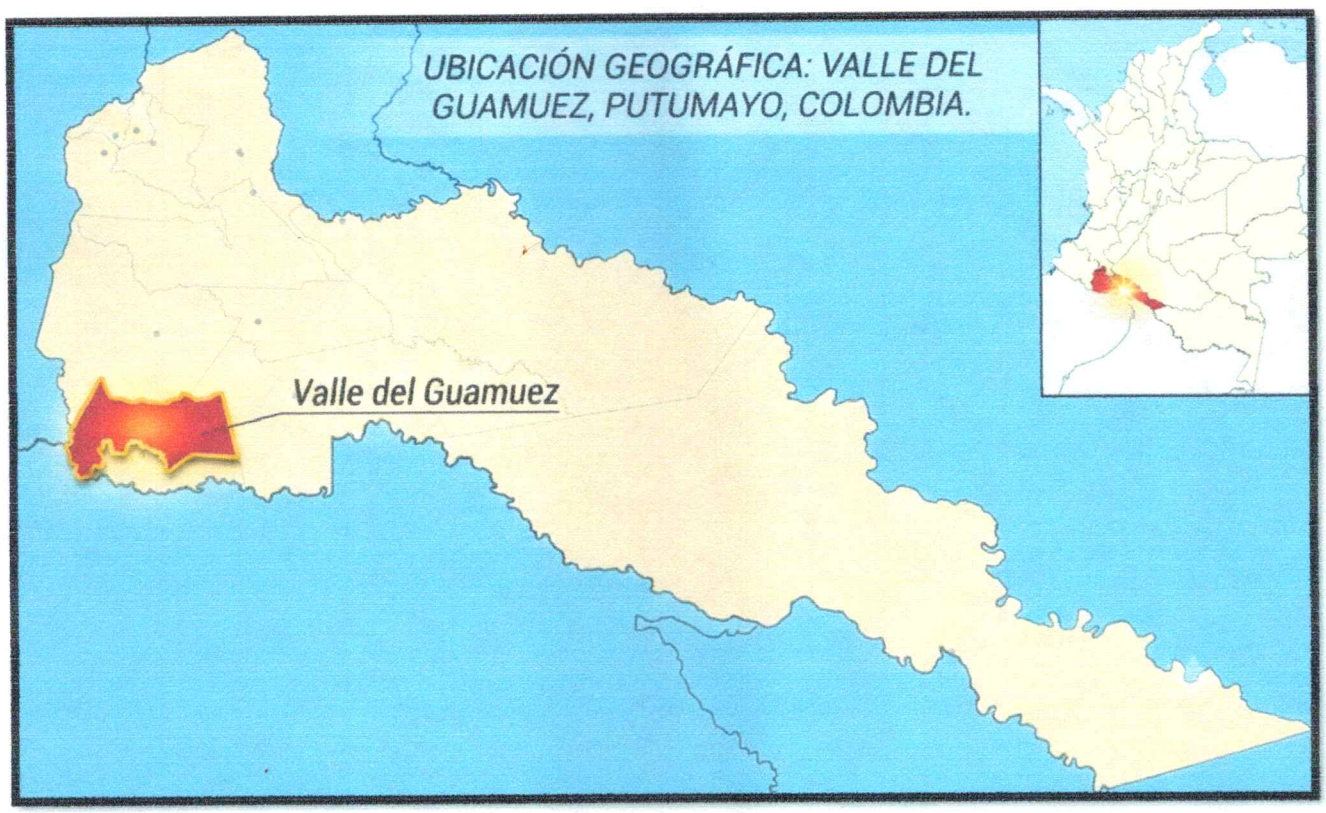

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	Obra
No. DE CONTRATO DE OBRA	SPOPM-CO-IMC-223-2026
CONTRATANTE	Municipio del Valle del Guamuez
NIT CONTRATANTE	800102912-2
CONTRATISTA DE OBRA	ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.121.507.367 expedida en Santiago, Putumayo
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	SOLUCIONES ELÉCTRICAS V&G
MATRÍCULA MERCANTIL	No. 97899
OBJETO	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($49.024.626,27) M/CTE.
CDP No.	2026000292 del 27 de mayo de 2026
RP No.	2026000459 del 22 de junio de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (01) mes
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
CARGO	Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipio del Valle del Guamuez
FECHA DEL ACTA DE INICIO	01 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 01	31 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	10 de julio de 2026

4.2 PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra presentado a continuación contemplo la ejecución de actividades relacionadas con el replanteo, excavaciones, instalación de tuberías y cajas de inspección, construcción de obras civiles, suministro e instalación de conductores eléctricos, montaje de reflectores LED, instalación del gabinete de control y protecciones eléctricas, así como los costos indirectos correspondientes a administración, imprevistos y utilidad (AIU). El valor total aprobado para la ejecución del contrato asciende a **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($49.024.626,27 M/CTE.)**, el cual constituyo la base para el seguimiento físico y financiero del proyecto durante su ejecución.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Localización y replanteo**				**$687.406,70**
1,1	Localización y replanteo	ML	190	$3.617,93	$687.406,70
2	**Excavaciones**				**$1.323.134,44**
2,1	Excavación manual de zanjas para instalación de tubería PVC	M3	34,2	$36.907,50	$1.262.236,50
2,2	Excavación manual para instalación de cajas de inspección eléctricas	M3	1,08	$46.134,90	$49.825,69
2,3	Excavación manual y nivelación de terreno para fundición placa de concreto (Gabinete) (1,50x1x0,10)	M3	0,15	$73.815,00	$11.072,25
3	**Instalación de tubería PVC y cajas de inspección eléctrica.**				**$5.717.180,05**
3,1	Suministro, transporte e instalación tubería PVC Conduit 1 1/2" (Acometida Mástil 1 y Mástil 3)	ML	90	$15.897,00	$1.430.730,00
3,2	Suministro, transporte e instalación tubería PVC Conduit 1" (Acometida Mástil 2 y Mástil 4)	ML	100	$14.147,00	$1.414.700,00
3,3	Suministro, transporte e instalación caja de inspección eléctrica	UND	5	$574.350,01	$2.871.750,05
4	**Concretos**				**$653.850,95**
4,1	Placa de concreto (1,50mx1mx0,10m) más pedestal para gabinete (0,80mx0,30mx0,50m)	UND	1	$653.850,95	$653.850,95
5	**Conductores (CU THNN/THWN-2)**				**$17.646.148,36**
5,1	Suministro, transporte e instalación de Cable Aislado No 4 AWG Cobre THHN Color Negro (Acometida principal)	ML	10	$85.722,00	$857.220,00
5,2	Suministro, transporte e instalación de Cable AWG # 12 color verde para puesta a tierra sistema de iluminación	ML	258	$13.455,00	$3.471.390,00
5,3	Suministro, transporte e instalación de Cable # 8 (3 x 8 AWG Cobre) (Mástil 2)	ML	109	$44.047,51	$4.801.178,59

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,4	Suministro, transporte e instalación de Cable # 10 (3 x 10 AWG Cobre) (Mástil 1 y Mástil 4)	ML	168	$38.972,51	$6.547.381,68
5,5	Suministro, transporte e instalación de Cable # 12 (3 x 12 AWG Cobre) (Mástil 3)	ML	59	$33.372,51	$1.968.978,09
6	**Tubería IMC + Capacete**				**$216.068,34**
6,1	Suministro, transporte e instalación de tubería IMC 1" (Acometida Principal)	UND	1	$216.068,34	$216.068,34
7	**Equipos de Iluminación**				**$5.701.563,28**
7,1	Suministro, transporte e instalación de reflector Tipo Led 500W (62,500Lm, IP66)	UN	4	$1.059.837,50	$4.239.350,00
7,2	Suministro, transporte e instalación de caja de conexión tipo intemperie para reflectores Led 500W (62,500Lm, IP66)	UN	4	$365.553,32	$1.462.213,28
8	**Tablero y protecciones**				**$4.640.189,87**
8,1	Suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo Intemperie, incluye protecciones y cableado interno	UN	1	$3.270.249,87	$3.270.249,87
8,2	Suministro, transporte e instalación de protecciones y sistema de control de reflectores y alimentación para servicios varios	UN	1	$1.369.940,00	$1.369.940,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$36.585.541,99**
				ADMINISTRACIÓN 29,0%	$10.609.807,18
				IMPREVISTOS 1,0%	$365.855,42
				UTILIDAD 4,0%	$1.463.421,68
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$12.439.084,28**
				VALOR TOTAL PROYECTO	**$49.024.626,27**

4.3 EQUIPO DE TRABAJO

Para la ejecución del **Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026**, cuyo objeto corresponde al **"Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del Patinódromo del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo"**, el contratista de obra ejecuto las actividades constructivas con un equipo de trabajo integrado por personal técnico y operativo con experiencia en la construcción e instalación de sistemas eléctricos de alumbrado público, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las normas de seguridad industrial y la reglamentación vigente aplicable.

El personal vinculado a la ejecución de las actividades contó con la idoneidad, experiencia y competencias requeridas para el desarrollo de labores relacionadas con obras civiles, canalizaciones, instalación de tuberías, tendido de conductores eléctricos, montaje de equipos de iluminación, instalación de tableros eléctricos y demás actividades contempladas en el alcance del contrato.

El equipo de trabajo desarrollo las actividades constructivas bajo la coordinación del contratista de obra y la supervisión ejercida por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio del Valle del Guamuez, garantizando la correcta ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4.4 SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la normatividad vigente, el contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI), garantizando la afiliación y el pago de los aportes correspondientes a Salud, Pensión, Riesgos Laborales (ARL) y demás contribuciones parafiscales que resultaron aplicables durante la ejecución del contrato.

Como soporte de esta obligación contractual, se anexan las planillas de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes al personal vinculado durante el período de ejecución del contrato, comprendido entre el **01 y el 10 de julio de 2026**.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. PLANILLA	PERIODO	AFP / PENSIÓN	EPS / SALUD	ARL / Riesgos	Total Aportes
Alan Achicanoy Juagibioy	Cotizante independiente	93331348	Julio 2026	Colpensiones $93.400	Mallamas EPS $73.000	Positiva Seguros $3.100	$169.500

4.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.5.1 Documentos técnicos de obra.

Acta de Inicio
Una vez surtido el proceso de contratación y cumplidos los requisitos administrativos, técnicos y legales exigidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026 el día 01 de julio de 2026, cuyo objeto corresponde al "Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del Patinódromo del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo".

De conformidad con lo establecido en el Acta de Inicio, el contrato contó con un plazo de ejecución de un (01) mes, fijándose como fecha de terminación el 31 de julio de 2026. Durante la ejecución del contrato las actividades se desarrollaron conforme a la programación establecida, cumpliendo las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas definidas para el proyecto, sin que se requirieran suspensiones o prórrogas.

4.5.2 Control presupuestal.

De acuerdo con el avance físico y financiero alcanzado durante la ejecución del contrato, al cierre del presente informe se evidencia un **avance financiero del 100 %**, correspondiente a la ejecución del valor total contratado, equivalente a **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($49.024.626,27 M/CTE.)**, cumpliéndose integralmente el objeto contractual.

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 49.024.626,27
Valor adicionado	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 49.024.626,27
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00
VALORES CANCELADOS	
Concepto	**Valor**
Pago de anticipo	$ 0,00
Valor pagos parciales anteriores (0,00 %)	$ 0,00
Valor ejecutado Informe final (100,00 %)	$ 49.024.626,27
Valor total ejecutado a la fecha	$ 49.024.626,27
VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR	
Concepto	**Valor**
Valor pendiente por ejecutar (0,00 %)	$ 0,00

4.5.3 Control de pólizas contrato de obra.

RELACION DE POLIZAS

Póliza No: 41-44-101306333 ANEXO 0
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Tomador: Achicanoy Juagibioy, Alan CC 1121.507.367
Fecha de expedición: 23-06-2026
Resolución No. OJMVG-169-2026, de fecha 25 de junio de 2026.
Estado: Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	22-06-2026	22-01-2027	$4.902.462,63
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22-06-2026	22-07-2029	$2.451.231,31
Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$4.902.462,63

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

Póliza No: 41-44-101306333 ANEXO 1
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Tomador: Achicanoy Juagibioy, Alan CC 1121.507.367
Fecha de expedición: 02-07-2026
Resolución No. OJMVG-176-2026, de fecha 06 de julio de 2026
Estado: No Aprobado

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA

Póliza No: 41-44-101306333 ANEXO 2
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Tomador: Achicanoy Juagibioy, Alan CC 1121.507.367
Fecha de expedición: 02-07-2026

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	01-07-2026	31-01-2027	$4.902.462,63
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01-07-2026	31-07-2029	$2.451.231,31
Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$4.902.462,63

Póliza No: 41-44-101306333 ANEXO 3
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Tomador: Achicanoy Juagibioy, Alan CC 1121.507.367
Fecha de expedición: 14-07-2026

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	01-07-2026	31-01-2027	$4.902.462,63
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01-07-2026	31-07-2029	$2.451.231,31
Estabilidad y calidad de la obra	10-07-2026	10-07-2031	$4.902.462,63

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual
Póliza No.: 41-40-101060645 ANEXO 0
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Tomador: Achicanoy Juagibioy, Alan CC 1121.507.367
Fecha de expedición: 23-06-2026
Resolución No. OJMVG-169-2026, de fecha 25 de junio de 2026.
Estado: Aprobado

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	22-06-2026	22-07-2026	$350.181.000,00
Daño emergente y lucro cesante	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	22-06-2026	22-07-2026	$350.181.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	22-06-2026	22-07-2026	$350.181.000,00
Contratistas y subcontratistas	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	22-06-2026	22-07-2026	$350.181.000,00
Responsabilidad civil patronal	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	22-06-2026	22-07-2026	$350.181.000,00
Vehículos propios y no propios	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	22-06-2026	22-07-2026	$350.181.000,00

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual
Póliza No.: 41-40-101060645 ANEXO 1
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Tomador: Achicanoy Juagibioy, Alan CC 1121.507.367
Fecha de expedición: 02-07-2026
Resolución No. OJMVG-176-2026, de fecha 06 de julio de 2026
Estado: No Aprobado

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual
Póliza No.: 41-40-101060645 ANEXO 2
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6
Tomador: Achicanoy Juagibioy, Alan CC 1121.507.367
Fecha de expedición: 02-07-2026

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	01-07-2026	31-07-2026	$350.181.000,00
Daño emergente y lucro cesante	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	01-07-2026	31-07-2026	$350.181.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	01-07-2026	31-07-2026	$350.181.000,00
Contratistas y subcontratistas	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	01-07-2026	31-07-2026	$350.181.000,00
Responsabilidad civil patronal	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	01-07-2026	31-07-2026	$350.181.000,00
Vehículos propios y no propios	10.00 % del valor de la pérdida mínimo: 1 SMMLV	01-07-2026	31-07-2026	$350.181.000,00

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

5. INFORME TÉCNICO

Durante el período de ejecución del Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026, cuyo objeto fue el "Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del Patinódromo del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo", se desarrollaron las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas, el presupuesto oficial y la programación establecida.

Dentro del período de ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades:

1. Se efectuó la localización y replanteo de las áreas de intervención para la ejecución de las obras eléctricas y civiles.
2. Se ejecutaron las excavaciones necesarias para la instalación de tuberías eléctricas, cajas de inspección y cimentación del gabinete de control.
3. Se realizó el suministro, transporte e instalación de tuberías PVC Conduit e IMC, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
4. Se ejecutó la instalación de cajas de inspección y la construcción de la placa de concreto con pedestal para el gabinete eléctrico.
5. Se realizó el tendido e instalación de los conductores eléctricos para alimentación principal, circuitos de iluminación y sistema de puesta a tierra.
6. Se efectuó el suministro, montaje y conexión de los reflectores LED de 500 W y de sus respectivos accesorios.
7. Se instaló el gabinete tipo intemperie, incluyendo el tablero de protecciones, sistema de control y cableado interno requerido para el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado.
8. Se realizó el seguimiento permanente a la calidad de los materiales, al cumplimiento de las especificaciones técnicas y a la correcta ejecución de cada una de las actividades contempladas en el contrato.
9. Se efectuó el control de cantidades de obra ejecutadas y el registro fotográfico correspondiente al desarrollo de las actividades.
10. Se mantuvo coordinación permanente con la supervisión del contrato para la verificación del avance físico, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la atención de los aspectos técnicos y administrativos que se presentaron durante la ejecución de la obra.
11. Una vez culminadas las actividades contractuales, se realizaron las pruebas de funcionamiento del sistema de alumbrado público, verificando su correcto desempeño y el cumplimiento del objeto contractual.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTIVIDADES CONTRATADAS			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Localización y replanteo**				**$ 687.406,70**			**$ 687.406,70**			**$ -**
1,1	Localización y replanteo	ML	190	$3.617,93	$ 687.406,70	190	$3.617,93	$ 687.406,70		$3.617,93	$ -
2	**Excavaciones**				**$1.323.134,44**			**$1.323.134,44**			**$ -**
2,1	Excavación manual de zanjas para instalación de Tuberia PVC	M3	34,2	$36.907,50	$1.262.236,50	34,2	$36.907,50	$1.262.236,50		$36.907,50	$ -
2,2	Excavación manual para instalación de cajas de inspección eléctricas	M3	1,08	$46.134,90	$49.825,69	1,08	$46.134,90	$49.825,69		$46.134,90	$ -
2,3	Excavación manual y nivelación de terreno para fundición placa de concreto (Gabinete) (1,50x1x0,10)	M3	0,15	$73.815,00	$11.072,25	0,15	$73.815,00	$11.072,25		$73.815,00	$ -
3	**Instalación de Tuberia PVC y cajas de inspección eléctrica.**				**$5.717.180,05**			**$5.717.180,05**			**$ -**
3,1	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC Conduit 1 1/2" (Acometida Mástil 1 y Mástil 3)	ML	90	$15.897,00	$1.430.730,00	90	$15.897,00	$1.430.730,00		$15.897,00	$ -
3,2	Suministro, transporte e instalación Tuberia PVC Conduit 1" (Acometida Mástil 2 y Mástil 4)	ML	100	$14.147,00	$1.414.700,00	100	$14.147,00	$1.414.700,00		$14.147,00	$ -
3,3	Suministro, transporte e instalación caja de inspección eléctrica	UND	5	$574.350,01	$2.871.750,05	5	$574.350,01	$2.871.750,05		$574.350,01	$ -
4	**Concretos**				**$ 653.850,95**			**$ 653.850,95**			**$ -**
4,1	Placa de concreto (1,50mx1mx0,10m) más pedestal para gabinete (0,80mx0,30mx0,50m)	UND	1	$653.850,95	$ 653.850,95	1	$653.850,95	$ 653.850,95		$653.850,95	$ -

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTIVIDADES CONTRATADAS			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	**Conductores (CU THNN/THWN-2)**				**$17.646.148,36**			**$17.646.148,36**			**$ -**
5,1	Suministro, transporte e instalación de Cable Aislado No 4 AWG Cobre THHN Color Negro (Acometida principal)	ML	10	$85.722,00	$ 857.220,00	10	$85.722,00	$ 857.220,00		$85.722,00	$ -
5,2	Suministro, transporte e instalación de Cable AWG # 12 color verde para puesta a tierra sistema de Iluminacion	ML	258	$13.455,00	$3.471.390,00	258	$13.455,00	$3.471.390,00		$13.455,00	$ -
5,3	Suministro, transporte e instalación de Cable # 8 (3 x 8 AWG Cobre) (Mástil 2)	ML	109	$44.047,51	$4.801.178,59	109	$44.047,51	$4.801.178,59		$44.047,51	$ -
5,4	Suministro, transporte e instalación de Cable # 10 (3 x 10 AWG Cobre) (Mástil 1 y Mástil 4)	ML	168	$38.972,51	$6.547.381,68	168	$38.972,51	$6.547.381,68		$38.972,51	$ -
5,5	Suministro, transporte e instalación de Cable # 12 (3 x 12 AWG Cobre) (Mástil 3)	ML	59	$33.372,51	$1.968.978,09	59	$33.372,51	$1.968.978,09		$33.372,51	$ -
6	**Tuberia IMC + Capacete**				**$ 216.068,34**			**$ 216.068,34**			**$ -**
6,1	Suministro, transporte e instalación de Tuberia IMC 1" (Acometida Principal)	UND	1	$216.068,34	$ 216.068,34	1	$216.068,34	$ 216.068,34		$216.068,34	$ -
7	**Equipos de Iluminacion**				**$5.701.563,28**			**$5.701.563,28**			**$ -**

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTIVIDADES CONTRATADAS			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,1	Suministro, transporte e instalación de reflector Tipo Led 500W (62,500Lm, IP66)	UN	4	$1.059.837,50	$4.239.350,00	4	$1.059.837,50	$4.239.350,00		$1.059.837,50	$ -
7,2	Suministro, transporte e instalación de caja de conexión tipo Interperie para reflectores Led 500W (62,500Lm, IP66)	UN	4	$365.553,32	$1.462.213,28	4	$365.553,32	$1.462.213,28		$365.553,32	$ -
8	**Tablero y protecciones**				**$4.640.189,87**			**$4.640.189,87**			**$ -**
8,1	Suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo Interperie, incluye protecciones y cableado interno	UN	1	$3.270.249,87	$3.270.249,87	1	$3.270.249,87	$3.270.249,87		$3.270.249,87	$ -
8,2	Suministro, transporte e instalación de protecciones y sistema de control de reflectores y alimentación para servicios varios.	UN	1	$1.369.940,00	$1.369.940,00	1	$1.369.940,00	$1.369.940,00		$1.369.940,00	$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$36.585.541,99**			**$36.585.541,99**			**$ -**
	ADMINISTRACIÓN		**29,0%**		$10.609.807,18		**29,0%**	$10.609.807,18		**29,0%**	$ -
	IMPREVISTOS		**1,0%**		$ 365.855,42		**1,0%**	$ 365.855,42		**1,0%**	$ -
	UTILIDAD		**4,0%**		$1.463.421,68		**4,0%**	$1.463.421,68		**4,0%**	$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$12.439.084,28**			**$12.439.084,28**			**$ -**
	VALOR TOTAL PROYECTO DE OBRA ELÉCTRICA				**$49.024.626,27**			**$49.024.626,27**			**$ -**

Municipio Valle del Guamuez
La Hormiga Putumayo
Email: selectricosvyg@gmail.com

5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026, cuyo objeto corresponde al "Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del Patinódromo del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo", se desarrollaron las actividades contempladas en el presupuesto oficial, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato. A continuación, se describen las principales actividades ejecutadas.

1.0 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y replanteo

Como actividad inicial del proyecto se realizó la localización y el replanteo del área de intervención en el Patinódromo Municipal del Valle del Guamuez. Durante esta labor se verificaron las dimensiones del escenario deportivo, los puntos de instalación de las canalizaciones eléctricas, cajas de inspección, gabinete de control y demás elementos proyectados. Asimismo, se efectuó la marcación de ejes, alineamientos, distancias y niveles, garantizando que la ejecución de las obras se desarrollara de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y condiciones establecidas para el proyecto.

2.0 EXCAVACIONES

2.1 Excavación manual de zanjas para instalación de tubería PVC

Se ejecutaron excavaciones manuales destinadas a la instalación de la tubería PVC Conduit que conforma las canalizaciones subterráneas del sistema de alumbrado público. Las zanjas fueron construidas respetando las dimensiones definidas en el diseño, permitiendo el adecuado alojamiento de la ductería y garantizando la protección mecánica de los conductores eléctricos.

2.2 Excavación manual para instalación de cajas de inspección eléctricas

Se realizaron las excavaciones correspondientes a la ubicación de las cajas de inspección eléctrica, verificando la profundidad, nivelación y dimensiones requeridas para facilitar posteriormente las labores de conexión, inspección y mantenimiento de la red eléctrica subterránea.

2.3 Excavación y nivelación para placa de concreto del gabinete

Se efectuó la excavación y adecuación del terreno destinada a la construcción de la placa de concreto y pedestal para el gabinete de control eléctrico. Esta actividad permitió disponer una base estable y con las condiciones estructurales necesarias para soportar el gabinete y sus equipos de protección.

3.0 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y CAJAS DE INSPECCIÓN

3.1 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Conduit de 1½"

Se realizó el suministro, transporte e instalación de tubería PVC Conduit de 1½", utilizada para la canalización principal del sistema eléctrico. La instalación se ejecutó garantizando continuidad, alineamiento y protección de los conductores, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto.

3.2 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Conduit de 1"
Se instaló tubería PVC Conduit de 1", destinada a las canalizaciones secundarias del sistema de alumbrado, asegurando un adecuado recorrido de los conductores eléctricos y facilitando futuras labores de mantenimiento.

3.3 Suministro, transporte e instalación de cajas de inspección eléctricas
Se suministraron e instalaron las cajas de inspección eléctrica contempladas en el proyecto, garantizando su correcta ubicación, nivelación y conexión con la red de ductería. Estas estructuras permiten el acceso para inspección, mantenimiento y futuras intervenciones sobre la infraestructura eléctrica.

4.0 OBRAS CIVILES

4.1 Construcción de placa de concreto para gabinete
Se ejecutó la construcción de la placa de concreto con pedestal destinada al soporte del gabinete eléctrico, realizando el proceso de formaleta, fundición, nivelación y acabado final. La estructura fue construida con las dimensiones establecidas en el presupuesto oficial, garantizando estabilidad y resistencia para el montaje del gabinete.

5.0 INSTALACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

5.1 Instalación de conductor THHN No. 4 AWG
Se realizó el suministro e instalación del conductor de cobre THHN No. 4 AWG destinado a la acometida principal del sistema de alumbrado, garantizando el cumplimiento de las condiciones de aislamiento, capacidad de conducción y seguridad eléctrica.

5.2 Instalación de conductor AWG No. 12 para puesta a tierra
Se efectuó la instalación del conductor de cobre AWG No. 12 color verde para conformar el sistema de puesta a tierra del sistema de iluminación, garantizando una adecuada disipación de corrientes de falla y protección de los equipos eléctricos.

5.3 Instalación de conductor No. 8 AWG
Se realizó el suministro e instalación del conductor de cobre No. 8 AWG correspondiente a los circuitos de alimentación proyectados, verificando continuidad, aislamiento y correcta conexión.

5.4 Instalación de conductor No. 10 AWG
Se ejecutó el tendido e instalación del conductor No. 10 AWG para los circuitos eléctricos contemplados en el proyecto, asegurando una distribución adecuada de la energía hacia los puntos de iluminación.

5.5 Instalación de conductor No. 12 AWG
Se instaló el conductor No. 12 AWG destinado a los circuitos finales del sistema de alumbrado, efectuando las conexiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y operación.

6.0 INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC

6.1 Instalación de tubería IMC de 1"

Se suministró e instaló tubería IMC de 1", utilizada para la protección mecánica de la acometida principal al gabinete eléctrico. La instalación se realizó cumpliendo las especificaciones técnicas y garantizando la seguridad de los conductores.

7.0 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

7.1 Suministro e instalación de reflectores LED de 500 W

Se realizó el suministro, montaje, fijación y conexión de los reflectores LED de 500 W, verificando su orientación y funcionamiento para proporcionar una iluminación uniforme y eficiente del Patinódromo Municipal, de acuerdo con los niveles de iluminación previstos en el proyecto.

7.2 Instalación de cajas de conexión para reflectores

Se instalaron las cajas de conexión tipo intemperie destinadas a proteger las uniones eléctricas de los reflectores LED, garantizando hermeticidad, seguridad y facilidad para futuras labores de mantenimiento.

8.0 TABLERO ELÉCTRICO Y PROTECCIONES

8.1 Instalación del gabinete eléctrico

Se suministró e instaló el gabinete metálico tipo intemperie, incluyendo su fijación sobre la placa de concreto, montaje del tablero, organización del cableado interno y verificación de todos los componentes eléctricos.

8.2 Instalación del sistema de protecciones y control

Como actividad final se instalaron las protecciones eléctricas, dispositivos de maniobra y sistema de control del alumbrado público, efectuando las conexiones correspondientes y las pruebas de funcionamiento necesarias para verificar el correcto desempeño del sistema.

9.0 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Una vez culminadas las actividades constructivas el día nueve (09) de julio de 2026, se realizaron las pruebas eléctricas y de funcionamiento del sistema de alumbrado público, verificando la continuidad de los conductores, el correcto funcionamiento de las protecciones, la operación del tablero eléctrico y el encendido de los reflectores LED. Los resultados obtenidos evidenciaron el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, permitiendo la puesta en servicio del sistema de iluminación del Patinódromo Municipal del Valle del Guamuez.

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO E INVERSIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

6.1 AVANCE FÍSICO

INFORME No.	PERÍODO DESDE	PERÍODO HASTA	AVANCE FÍSICO	AVANCE ACUMULADO
1 (Informe Final)	01/07/2026	09/07/2026	100,00 %	100,00 %

Al cierre del presente informe se evidencia el cumplimiento total de las actividades contempladas en el presupuesto oficial del proyecto, alcanzando una ejecución física del **100 %**, de conformidad con las cantidades de obra contratadas y recibidas a satisfacción por la supervisión del contrato.

6.2 BALANCE DE OBRA

Balance de Avance del Contrato

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE
Valor inicial del contrato	$49.024.626,27		
Valor adicionado	$0,00		
Valor ejecutado		**$49.024.626,27**	**100,00 %**
Saldo por ejecutar	$0,00	$0,00	0,00 %
TOTAL	**$49.024.626,27**	**$49.024.626,27**	**100,00 %**

El balance financiero refleja la ejecución total del valor contratado, sin presentarse adiciones presupuestales ni saldos pendientes por ejecutar, cumpliéndose integralmente el objeto contractual.

6.3 AVANCE EN TIEMPO

CONCEPTO	VALOR
Fecha Acta de Inicio	01 de julio de 2026
Plazo de ejecución	Un (01) mes
Fecha de finalización de las actividades	09 de julio de 2026
Fecha de terminación del plazo contractual	31 de julio de 2026
Fecha de terminación anticipada.	10 de julio de 2026
Suspensiones	No se presentaron
Prórrogas	No se presentaron
Reinicios	No se requirieron
Tiempo de ejecución contractual	Un (01) mes
Plazo pendiente	22 días calendario.
Porcentaje de ejecución	**100,00 %**

Las actividades constructivas fueron ejecutadas y culminadas el día nueve (09) de julio de 2026, alcanzando el cien por ciento (100 %) de ejecución física, dentro del plazo contractual establecido hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026, sin requerirse suspensiones, prórrogas ni modificaciones al contrato.

Indicador	Resultado
Avance físico	100,00 %
Avance financiero	100,00 %
Cumplimiento del plazo contractual	100,00 %
Cantidades ejecutadas	100,00 %
Cumplimiento del objeto contractual	100,00 %

7. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. SPOPM-CO-IMC-223-2026 se implementaron procedimientos de control de calidad orientados a garantizar que las actividades ejecutadas cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto, la reglamentación aplicable y las buenas prácticas de construcción para instalaciones eléctricas de alumbrado público.

Las labores de localización y replanteo, excavaciones, instalación de tuberías, construcción de obras civiles, tendido de conductores, montaje de reflectores LED, instalación del gabinete eléctrico y de los sistemas de protección fueron verificadas permanentemente durante su ejecución, comprobando el cumplimiento de las dimensiones, materiales, procedimientos constructivos y condiciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial y en los documentos contractuales.

De igual manera, durante el desarrollo de las actividades se realizaron verificaciones permanentes del correcto funcionamiento de los equipos instalados, la continuidad de los circuitos eléctricos, el adecuado conexionado de los conductores y la correcta operación de los dispositivos de protección y control, garantizando la confiabilidad y seguridad del sistema de alumbrado público.

Durante toda la ejecución del contrato se mantuvieron condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas intervenidas, efectuando la recolección permanente de residuos generados y la limpieza de las zonas de trabajo una vez finalizada cada actividad, contribuyendo a la seguridad del personal y de la comunidad.

Finalmente, se verificó que el personal, los equipos, las herramientas y los materiales empleados fueran adecuados para la ejecución de cada actividad, permitiendo culminar el proyecto con altos estándares de calidad y dando cumplimiento al objeto contractual.

8. INFORME AMBIENTAL

Durante la ejecución del proyecto **"Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del Patinódromo del Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo"**, las actividades constructivas se desarrollaron procurando minimizar los impactos ambientales derivados de la intervención, implementando medidas preventivas orientadas a la protección del entorno y al cumplimiento de las buenas prácticas ambientales aplicables a este tipo de obras.

Las excavaciones para canalizaciones eléctricas, la instalación de tuberías, cajas de inspección, gabinete de control y demás elementos del sistema de alumbrado se ejecutaron procurando afectar únicamente las áreas estrictamente necesarias para el desarrollo del proyecto. Los materiales producto de las excavaciones fueron manejados adecuadamente, reutilizando el material aprovechable y disponiendo los excedentes conforme a las condiciones del sitio de intervención.

De igual manera, se realizó la recolección permanente de residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra, manteniendo condiciones adecuadas de orden y limpieza en el área intervenida. Una vez concluidas las actividades constructivas, se efectuó la restitución y nivelación de las zonas intervenidas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, movilidad y presentación del escenario deportivo.

El personal vinculado al proyecto fue sensibilizado sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, promoviendo el uso responsable de los recursos, la adecuada disposición de residuos y el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección ambiental durante toda la ejecución del contrato.

En términos generales, la ejecución del proyecto no generó impactos ambientales significativos y las actividades desarrolladas se realizaron bajo criterios de prevención, control y mitigación, cumpliendo con la normatividad ambiental aplicable y con las recomendaciones impartidas por la supervisión del contrato.

9. RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante la ejecución del contrato existió una coordinación permanente entre el contratista y la supervisión designada por el Municipio del Valle del Guamuez, lo que permitió resolver oportunamente los aspectos técnicos y administrativos que se presentaron durante el desarrollo del proyecto, garantizando el normal avance de las actividades.
- Las actividades contempladas en el presupuesto oficial fueron ejecutadas en su totalidad, alcanzando un avance físico del 100 % y cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
- La ejecución financiera del contrato alcanzó el 100 % del valor contratado, sin requerirse adiciones presupuestales ni modificaciones al valor inicial del contrato.
- Las actividades constructivas finalizaron el día nueve (09) de julio de 2026, alcanzando una ejecución física y financiera del cien por ciento (100 %), dentro del plazo contractual establecido hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026, sin requerirse suspensiones, prórrogas o reinicios. Las pruebas realizadas al sistema de alumbrado público evidenciaron el correcto funcionamiento de los circuitos eléctricos, las protecciones, el

gabinete de control y los reflectores LED instalados, permitiendo la puesta en operación del sistema en condiciones seguras y eficientes.

- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la seguridad social del personal, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la utilización de los elementos de protección personal durante la ejecución de la obra.
- Como resultado de la ejecución del contrato, el Patinódromo del Municipio del Valle del Guamuez cuenta con un sistema de alumbrado público mejorado, que ofrece mejores condiciones de iluminación para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias en horario nocturno, beneficiando a la población usuaria del escenario deportivo.

10 ANEXOS.

- Registro Fotográfico
- Bitácora de obra
- Certificado de aportes a seguridad social
- Planilla de seguridad social
- Factura Electrónica.
- Certificado FIC SENA

ELABORO:

Alan Achicanoy.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. No. 1.121.507.367
SOLUCIONES ELÉCTRICAS V&G
Matrícula Mercantil No. 97899.
CONTRATO DE OBRA SPOPM-CO-IMC-223-2026

SOLUCIONES ELECTRICAS V&G
CONFIABILIDAD EN CADA CONEXIÓN


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ILUMINACIÓN LED 800 W

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES


COMPROMISO AMBIENTAL

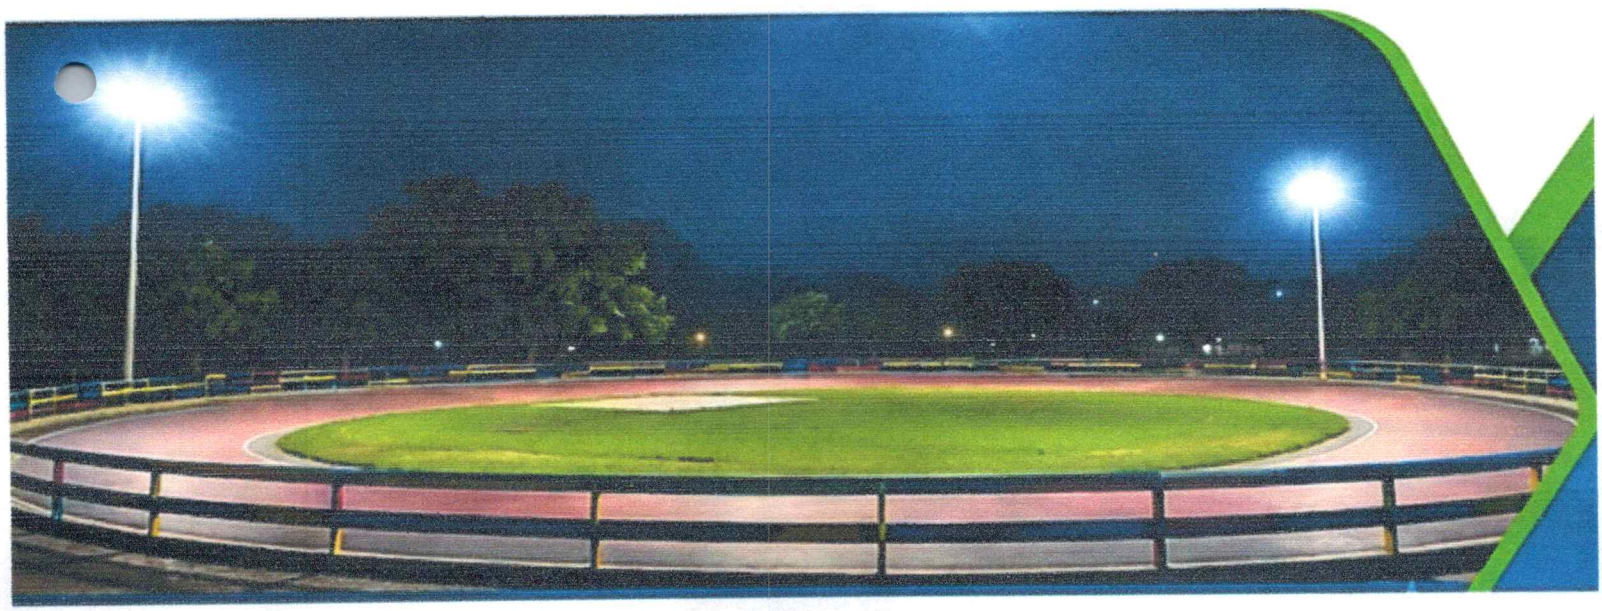

ANEXO 1

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

1,1	**Localización y replanteo**

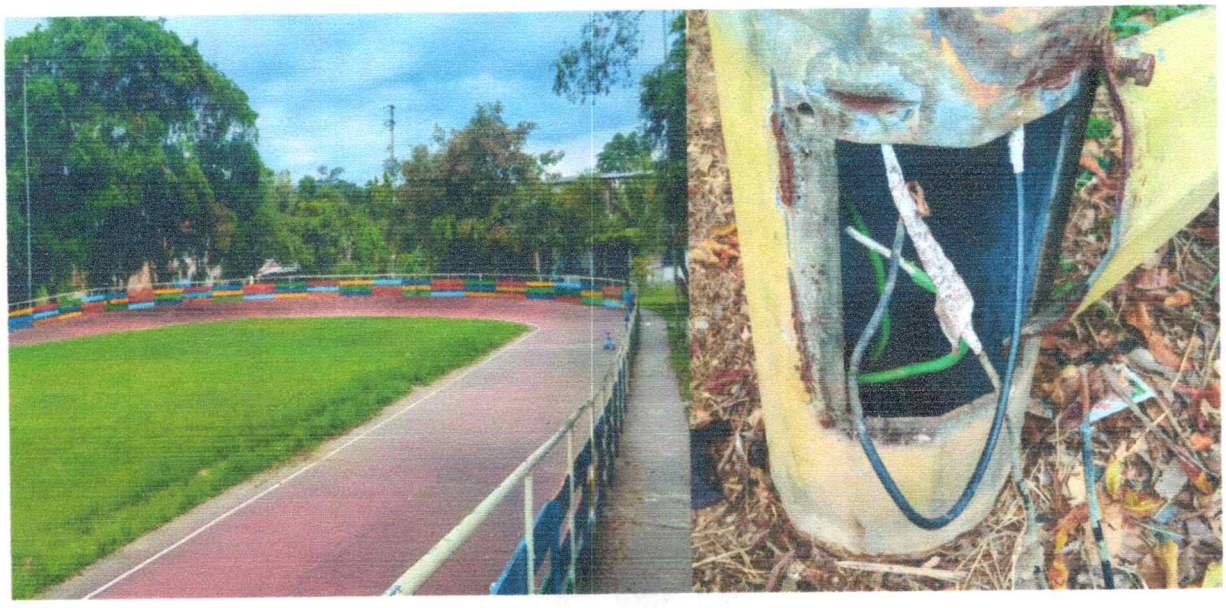

2,1	**Excavación manual de zanjas para instalación de tubería PVC**



2,2	**Excavación manual para instalación de cajas de inspección eléctricas**



2,3	**Excavación manual y nivelación de terreno para fundición placa de concreto (Gabinete) (1,50x1x0,10)**



3,1	**Suministro, transporte e instalación tubería PVC Conduit 1 1/2" (Acometida Mástil 1 y Mástil 3)**




3,2	**Suministro, transporte e instalación tubería PVC Conduit 1" (Acometida Mástil 2 y Mástil 4)**



3,3	**Suministro, transporte e instalación caja de inspección eléctrica**



4,1	**Placa de concreto (1,50mx1mx0,10m) más pedestal para gabinete (0,80mx0,30mx0,50m)**

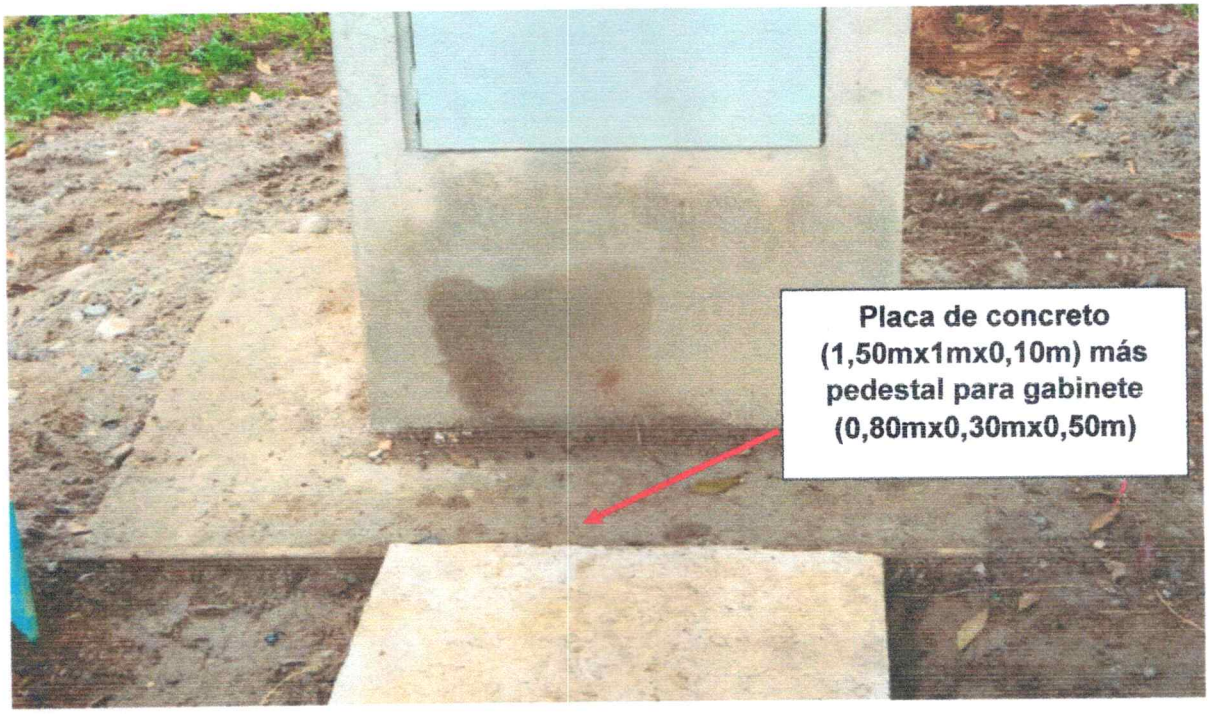


5,1	**Suministro, transporte e instalación de Cable Aislado No 4 AWG Cobre THHN Color Negro (Acometida principal)**




5,2	**Suministro, transporte e instalación de Cable AWG # 12 color verde para puesta a tierra sistema de iluminación**



5,3	**Suministro, transporte e instalación de Cable # 8 (3 x 8 AWG Cobre) (Mástil 2)**

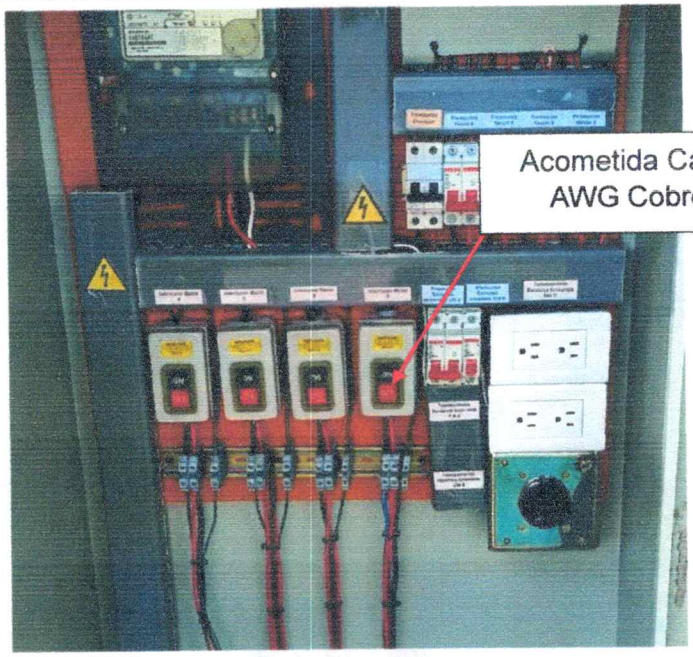

5,4	**Suministro, transporte e instalación de Cable # 10 (3 x 10 AWG Cobre) (Mástil 1 y Mástil 4)**

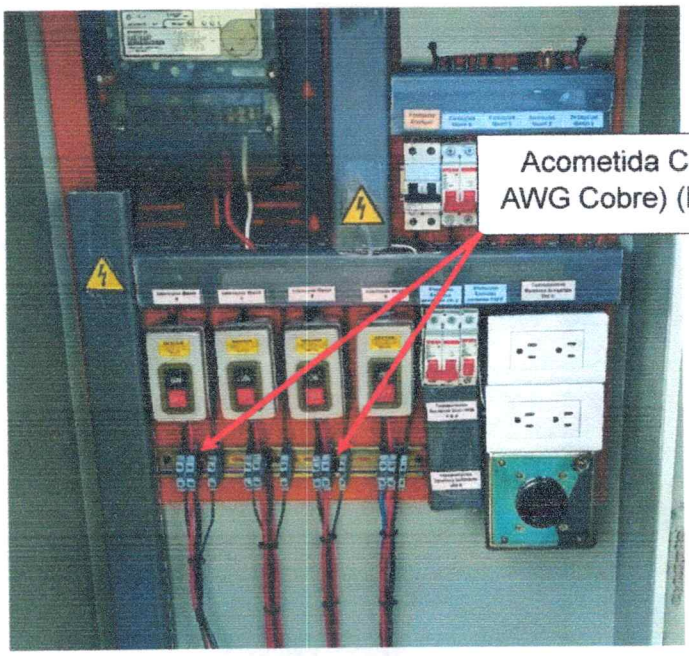

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

5,5	**Suministro, transporte e instalación de Cable # 12 (3 x 12 AWG Cobre) (Mástil 3)**



6,1	**Suministro, transporte e instalación de tubería IMC 1" (Acometida Principal)**




ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

7,1	**Suministro, transporte e instalación de reflector Tipo Led 500W (62,500Lm, IP66)**



7,2	**Suministro, transporte e instalación de caja de conexión tipo intemperie para reflectores Led 500W (62,500Lm, IP66)**

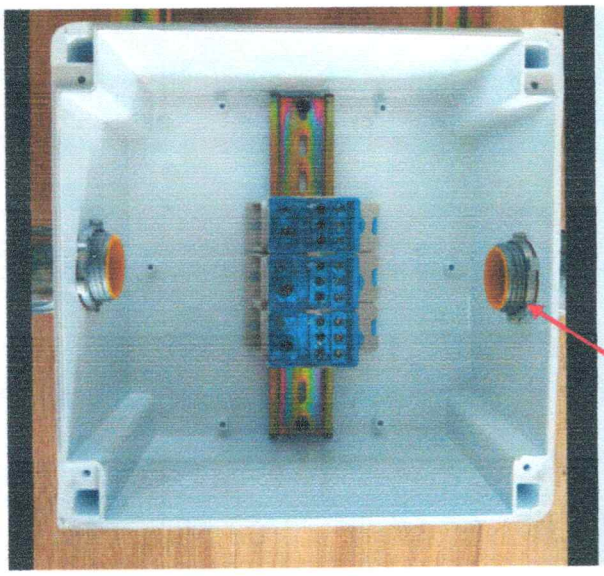




8,1	**Suministro, transporte e instalación de Gabinete tipo Intemperie, incluye protecciones y cableado interno**



8,2	**Suministro, transporte e instalación de protecciones y sistema de control de reflectores y alimentación para servicios varios**

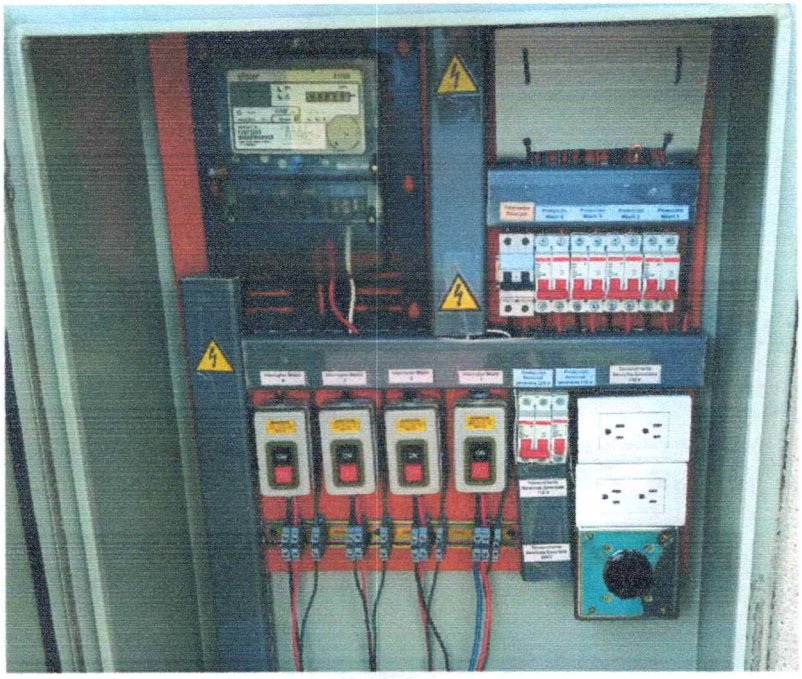

SOLUCIONES ELECTRICAS V&G

CONFIABILIDAD EN CADA CONEXIÓN


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ILUMINACIÓN LED 800 W

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES

COMPROMISO AMBIENTAL

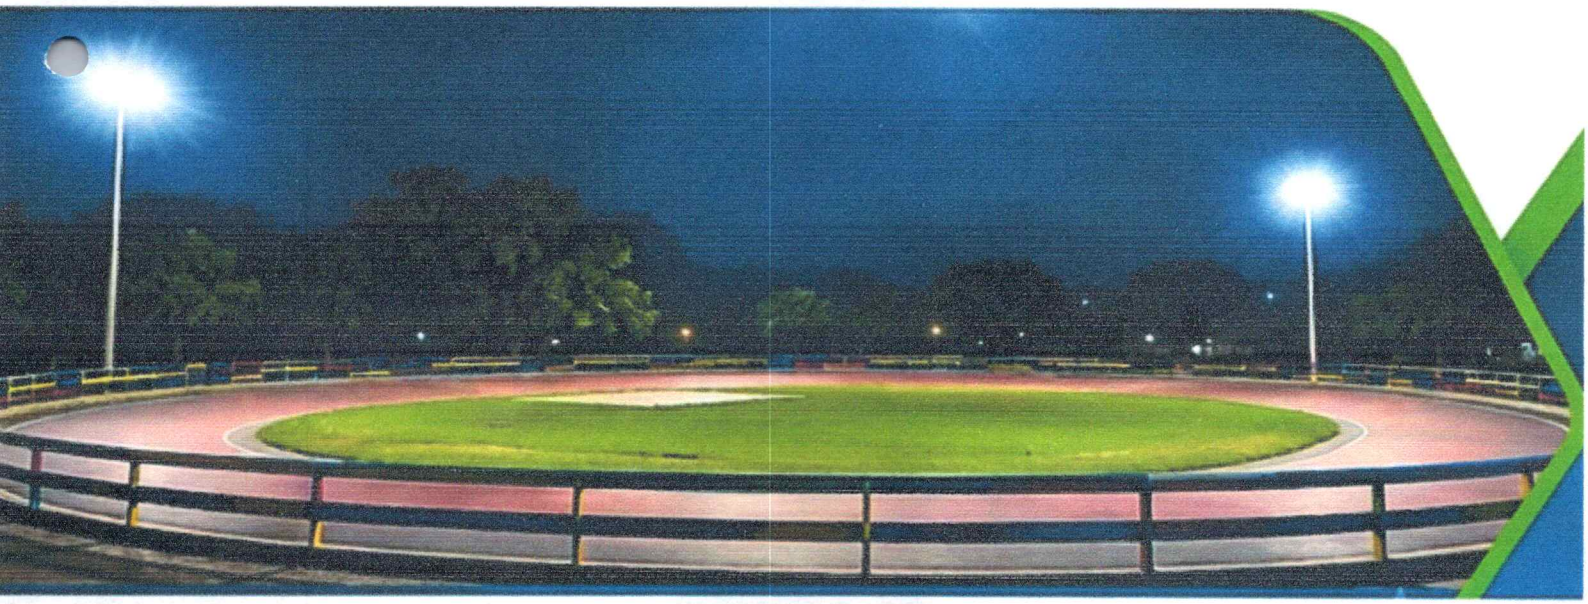

ANEXO 2

BITÁCORA DE OBRA

01 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Soleado.

Personal en obra: Contratista de obra, técnico electricista, oficiales electricistas y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Obra.
- Localización y replanteo del área de intervención del Patinódromo Municipal.
- Verificación de planos, especificaciones técnicas y puntos de instalación de canalizaciones, gabinete eléctrico y reflectores.
- Socialización de las actividades programadas y de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo con el personal de obra.

Observaciones:

Las actividades se desarrollaron normalmente, utilizando los elementos de protección personal y herramientas requeridas, sin presentarse novedades durante la jornada.

02 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Soleado.

Personal en obra: Técnico electricista, oficiales electricistas y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Inicio de excavaciones manuales para la instalación de tubería PVC Conduit.
- Excavación para la construcción de cajas de inspección eléctrica.
- Adecuación del terreno para la construcción de la placa de concreto del gabinete eléctrico.

Observaciones:

Las excavaciones se realizaron conforme a las dimensiones establecidas en las especificaciones técnicas del proyecto, sin novedades.

03 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Parcialmente nublado.

Personal en obra: Técnico electricista, oficiales electricistas y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Instalación de tubería PVC Conduit de 1½".
- Instalación de tubería PVC Conduit de 1".
- Construcción e instalación de cajas de inspección eléctrica.
- Inicio de la construcción de la placa de concreto para el gabinete.

Observaciones:

Se verificó el correcto alineamiento de las canalizaciones antes del relleno de las excavaciones.

04 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Soleado.

Personal en obra: Técnico electricista, oficiales electricistas y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Terminación de la placa de concreto para el gabinete eléctrico.
- Instalación de tubería IMC para protección de la acometida.
- Inicio del tendido de conductores eléctricos AWG No. 4, No. 8, No. 10 y No. 12.
- Instalación del conductor del sistema de puesta a tierra.

Observaciones:

Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas y manteniendo las condiciones de seguridad establecidas.

05 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Soleado.

Personal en obra: Técnico electricista, oficiales electricistas y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Culminación del tendido de conductores eléctricos.
- Instalación y fijación del gabinete metálico tipo intemperie.
- Montaje de los dispositivos de protección y control.
- Organización del cableado interno del tablero.

Observaciones:

Se verificó el correcto conexionado de los circuitos antes de continuar con el montaje de los equipos de iluminación.

06 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Soleado.

Personal en obra: Técnico electricista, oficiales electricistas y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Instalación de las cajas de conexión para reflectores.
- Montaje y orientación de los reflectores LED de 500 W.
- Conexionado de los circuitos de iluminación.
- Verificación del sistema de puesta a tierra.

Observaciones:

Los equipos quedaron instalados conforme a los planos del proyecto y a las recomendaciones del fabricante.

07 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Parcialmente nublado.

Personal en obra: Técnico electricista, oficiales electricistas y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Revisión general de conexiones eléctricas.
- Ajuste de terminales y dispositivos de protección.
- Identificación y rotulación de circuitos eléctricos.
- Organización del gabinete de control.

Observaciones:

Se realizaron inspecciones técnicas para garantizar la correcta operación del sistema antes de las pruebas de funcionamiento.

08 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Soleado.

Personal en obra: Técnico electricista, contratista y ayudantes.

Actividades realizadas:

- Ejecución de pruebas de continuidad y funcionamiento del sistema eléctrico.
- Verificación del encendido de los reflectores LED.
- Corrección de ajustes menores identificados durante las pruebas.
- Limpieza general del área intervenida.

Observaciones:

Las pruebas fueron satisfactorias y el sistema presentó un funcionamiento adecuado.

ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
C.C. N° 1.121.507.367
Tel. 3103257010

248

09 DE JULIO DE 2026

Condiciones climáticas: Soleado.

Personal en obra: Contratista, técnico electricista y supervisor.

Actividades realizadas:

- Inspección final de las obras ejecutadas.
- Verificación de las cantidades de obra ejecutadas.
- Registro fotográfico de la obra terminada.
- Organización de la documentación técnica y administrativa para la entrega del proyecto.
- Revisión conjunta con la supervisión del cumplimiento del objeto contractual.

Observaciones:

La obra fue culminada satisfactoriamente, ejecutándose la totalidad de las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas, alcanzando un avance físico del **100 %** y quedando el sistema de alumbrado público en condiciones de operación.

ELABORO:	APROBO:
Alan Achicanoy.	
ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY C.C. No. 1.121.507.367 Contrato de Obra N° SPOPM-CO-IMC-223-2026	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas Supervisor.

SOLUCIONES ELECTRICAS V&G
CONFIABILIDAD EN CADA CONEXIÓN


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ILUMINACIÓN LED 800 W

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES

COMPROMISO AMBIENTAL

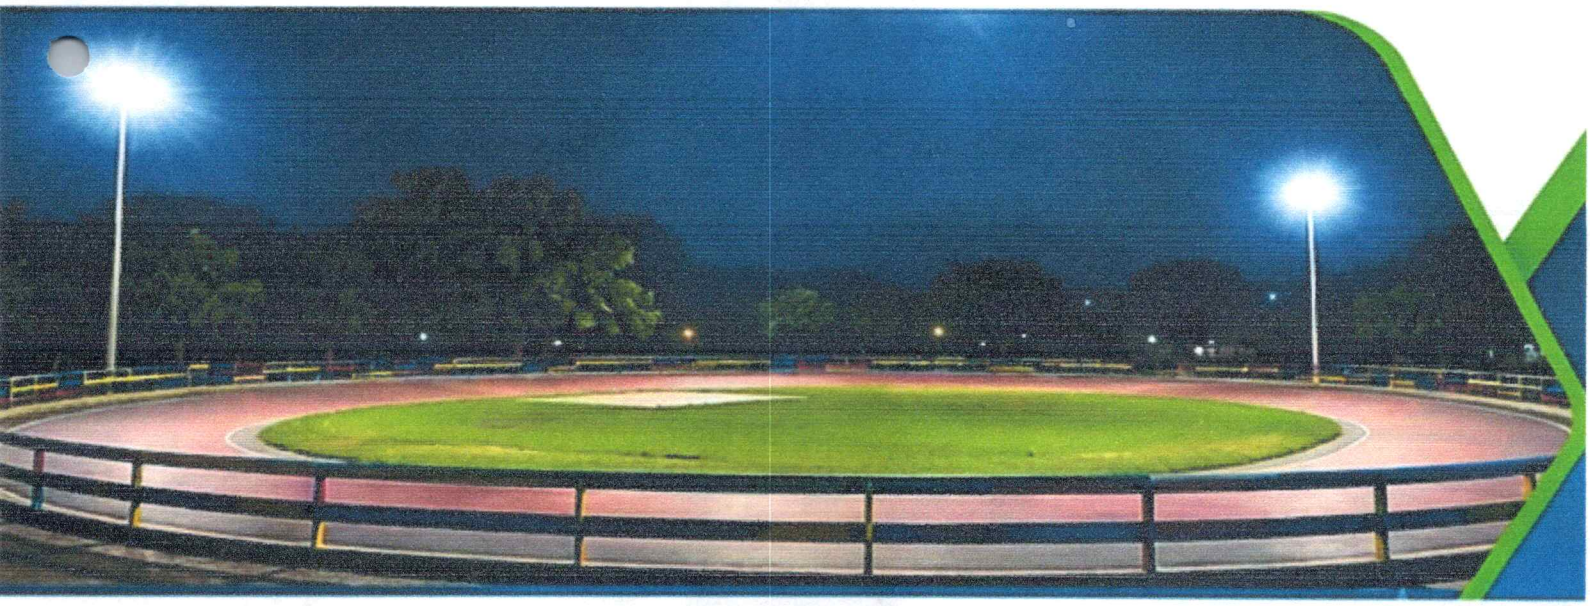

ANEXO 3

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Valle del Guamuez, 21 de julio de 2026

Señores:
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO.
Ciudad

Ref.: Contratación Mínima Cuantía N° SPOPM-CO-IMC-223-2026 DEL 22 DE JUNIO DE 2026.

Objeto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Yo, **ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.121.507.367 expedida en Santiago (Ptyo), en calidad de contratista, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con el Sistemas de Seguridad Social.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA, para el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2026 al día 10 de julio de 2026, tiempo en el cual finalizó la ejecución del contrato de obra en referencia.

Adicionalmente declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO, con las obligaciones a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

En constancia se firma en la ciudad de la Hormiga Putumayo, a los 21 días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

Alan Achicanoy.

Nombre del proponente **ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY**
C. C. No. 1.121.507.367 expedida en Santiago (Ptyo)
Teléfono : 3157354927

Certifica:

Nombre del Contador: **DEISY JOHANA CUARAN IMBACUAN**
C.C. 1126451100 expedida en el Valle Del Guamuez (Putumayo)
Tarjeta Profesional No 255823-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.507.367
ACHICANOY JUAGIBIOY

APELLIDOS
ALAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-1992
COLON
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-ABR-2010 SANTIAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-6401600-00947624-M-1121507367-20171019 0058173367G 2 9801773061

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.126.451.100**

CUARAN IMBACUAN

APELLIDOS

DEISY JOHANA

NOMBRES

Deisy Cuaran

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1990**

VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)
VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-JUL-2008 VALLE DEL GUAMUEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-6402800-00155273-F-1126451100-20090427 0011075584A 1 25673783

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

255823-T



DEISY JOHANA
CUARAN IMBACUAN
C.C. 1128461100
RES. INSCRIPCION 174 DEL 29/03/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266033 284188

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

Firma

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 5 5 3 1 9 3 2 E 0 A B 1 2 2 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISY JOHANA CUARAN IMBACUAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1126451100 de VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 255823-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SOLUCIONES ELECTRICAS V&G

CONFIABILIDAD EN CADA CONEXIÓN


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ILUMINACIÓN LED 800 W

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES

COMPROMISO AMBIENTAL

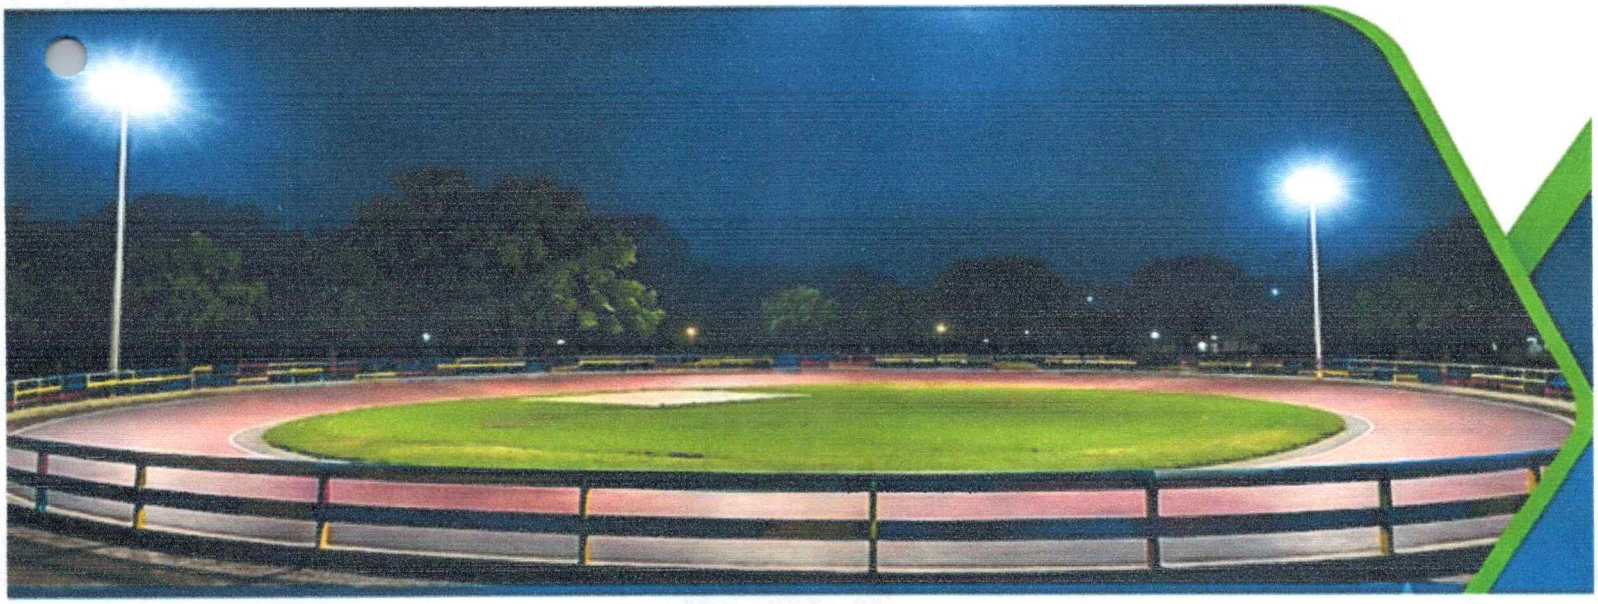

ANEXO 4

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121507367	ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY	BARRIO CENTRAL	3103598799	CENTRALDESERVI@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93331348	10/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$169.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	73.000	0		0		0	0	0	0	73.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	93.400	0	0	0	0	0	0		93.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.100				3.100	0	0	3.100			31	3.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	73.000	73.000
Pensión	1	93.400	93.400
Riesgos Laborales	1	3.100	3.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	169.500	169.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

252

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121507367	ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY	BARRIO CENTRAL	3103598799	CENTRALDESERVI@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93331348	10/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$169.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Apertante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1121507367	ACHICANOY JUAGIBIOY ALAN	59	0			N	X	X															26-14	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPSIC5	583.635	10	73.000	14-23	583.635	10	1	3.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOLUCIONES ELECTRICAS V&G
CONFIABILIDAD EN CADA CONEXIÓN


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ILUMINACIÓN LED 800 W

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES

COMPROMISO AMBIENTAL

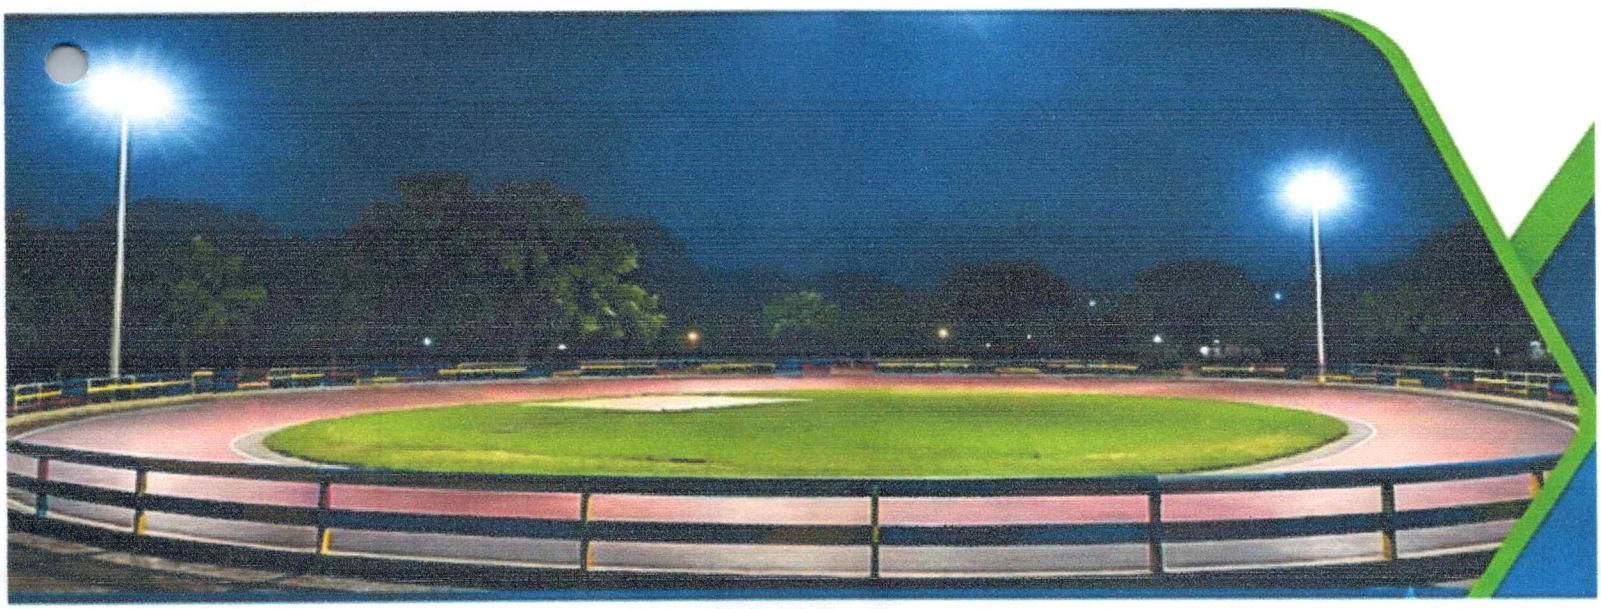

ANEXO 5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c342a2060977f9e406b72f6e0b9c7d856a7ac76e147f0f402e1cd36d53cb5a93ed43cac86c1ad8b2ce11ba33e73170ea

Número de Factura: FEV-4894
Fecha de Emisión: 10/07/2026
Fecha de Vencimiento: 10/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALAN ACHICANOY JUAGIBIOY
Nombre Comercial: SOLUCIONES ELECTRICAS V&G
Nit del Emisor: 1121507367
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Dirección: CL 7 5-14 BRR LA AMISTAD
Teléfono / Móvil: 3176190606
Correo: selectricosvyg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102912
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ
Dirección: CL 7 5 11 BRR CENTRAL
Teléfono / Móvil:
Correo: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	COSTO DIRECTOS	EA	1,00	$ 36.585.541,99	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.585.541,99
2	02	ADMINISTRACION 29%	EA	1,00	$ 10.609.807,18	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.609.807,18
3	04	IMPREVISTOS 1%	EA	1,00	$ 365.855,42	$ 0,00	$ 0,00					$ 365.855,42
4	03	UTILIDAD 4%	EA	1,00	$ 1.463.421,68	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.463.421,68

Notas Finales

COBRO DEL CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-223-2026
OBJETO:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL P UTUMAYO.

260

Datos Totales

Documento generado el:
10/07/2026 16:31:10
Documento validado por la DIAN:
10/07/2026 16:31:10
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	49.024.626,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49.024.626,27
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	49.024.626,27
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 49.024.626,27

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094268851 Rango desde: 1001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-06-11

SOLUCIONES ELECTRICAS V&G

CONFIABILIDAD EN CADA CONEXIÓN


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PATINÓDROMO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ILUMINACIÓN LED 800 W

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES

COMPROMISO AMBIENTAL

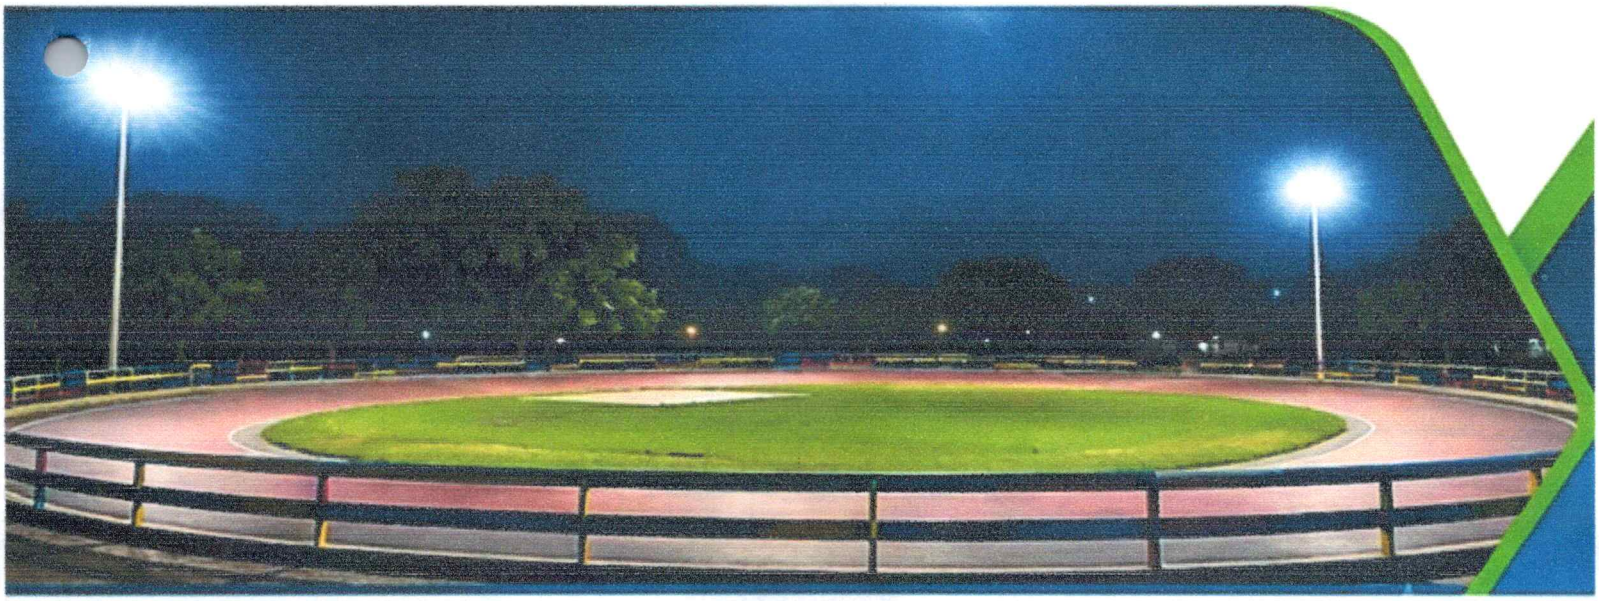

ANEXO 6

262

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social ACHICANOY JUAGIBIOY ALAN identificado con el NIT 1121507367, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
CTO No 223-2026	MSAP PAT VDG PUT	VALLE DEL GUAMUEZ	43,800	2026-07	15-JUL-2026	166192099
		Total	43,800			

Expedido por el SENA, a los veintiun (21) dias del mes de Julio de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-07-21

Generado por : Anyi Yuliana MartÃnez Pantoja

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 977796094 y el Número de Certificado: 540961
