

CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

INFORME ENTREGA DE ACTIVIDADES CORTE NUMERO 5

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

BOGOTA D.C, 14 JULIO DEL 2026

Carrera 25 No. 7-68 Sur, Barrio la Fraguita, Bogotá D.C. – Colombia
+57 (1) 391 1755 • Celulares: 313 208 1584 - 320 943 8792
edisondiaz@constructoraged.com - licitaciones@constructoraged.com
www.constructoraged.com

INTRODUCCION

La SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. contrato con **CONSTRUCTORA GED S.A.S** el suministro e instalación de carpintería metálica de las sedes de la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. El valor de cada bien o servicio ofertado es a todo costo, incluye: Suministro e Instalación, desmonte de lo existente y su correcto funcionamiento, mano de obra, transporte; cuyas actividades realizadas quedan evidenciadas como se muestra a continuación.

CONSTRUCTORA GED S.A.S
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

CAPÍTULO 1.

PERSONAL Y CERTIFICACIONES

Para el desarrollo de las actividades de suministro e instalación de carpintería metálica en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., CONSTRUCTORA GED S.A.S. dispuso del personal técnico y operativo idóneo, cumpliendo con los requisitos legales y de seguridad establecidos.

El personal asignado contó con afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL), cuyas planillas de pago se anexan al presente informe.

Durante la ejecución de las actividades, el personal utilizó de manera permanente los Elementos de Protección Personal (EPP) correspondientes, tales como casco, guantes, botas de seguridad, gafas de protección y demás elementos requeridos según la labor desempeñada.

Así mismo, se realizó la debida señalización de las áreas de trabajo con el fin de garantizar la seguridad del personal y de terceros dentro de las instalaciones intervenidas.

Se anexa registro fotográfico del personal en obra, formatos de entrega de EPP y evidencia del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Anexos de este capítulo:

- **Planillas de pago de seguridad social**
- **Certificación de cumplimiento de la política cero papel**
- **Certificación de generación de residuos peligrosos (RESPEL) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)**
- **Certificación de no aplicabilidad de entrega de certificaciones de disposición final de residuos peligrosos RESPEL y RAEE**
- **Certificación de cumplimiento en el suministro de elementos con minimización de empaques y embalajes**



CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900337315-7	CONSTRUCTORA G E D SAS	CR 25 7 68 SUR BRR LA FRAGUITA	3227696667	gestion@constructoraged.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 ccf			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89292380	04/06/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$21,754,001	$6.737.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	461.200	0		0		0	0	0	0	461.200	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	228.300	0		0		0	0	0	0	228.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	90.100	0		0		0	0	0	0	90.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	21.100	0		0		0	0	0	0	21.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	779.800	0	0	0	0	0	0		779.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.543.300	0	0	0	0	0	0		1.543.300	5
231001	Colfondos	800227940-6	588.300	0	0	0	0	0	0		588.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	569.800	0	0	0	0	0	0		569.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.514.600				1.514.600	0	0	1.514.600			15.146	1.514.600	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	870.800	0	0	870.800	12

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	870.800	870.800
Pensión	4	3.481.200	3.481.200
Riesgos Laborales	1	1.514.600	1.514.600
CCF	1	870.800	870.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.737.400	6.737.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900337315-7	CONSTRUCTORA G E D SAS	CR 25 7 68 SUR BRR LA FRAGUITA	3227696667	gestion@constructoraged.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		89292380	04/06/2026	12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$21.754.001	$6.737.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Clase	Tarifa	Es Pensionado	Es Extranjero no obligado a cotizar pensión	Es Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días Cot.	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días Cot.	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días Cot.	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000324400	GUARNIZO GOMEZ EDWIN ANDRES	1	0				X															230301	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS041	525.272	9	21.100	14-23	525.272	9	5	36.600	CCF24	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0
2	CC 1007338629	VARGAS CAMELO JEAN PIERRE FRANCOIS	1	0				X															230201	2.025.815	27	324.200	0	0	0	0	EPS005	2.025.815	27	81.100	14-23	2.025.815	27	5	141.000	CCF24	2.025.815	27	81.100	0	0	0	0	0
3	CC 1010005323	TRIANA ZAMBRANO DANIELA	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1013688524	DIAZ RIOS LADY VANESSA	1	0																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1023914625	COPETE CHIQUIZA LUIS DANIEL	1	0																	X		23100	2.250.905	30	360.200	0	0	0	0	EPS008	2.250.905	30	90.100	14-23	2.250.905	30	5	156.700	CCF24	2.250.905	30	90.100	0	0	0	0	0
6	CC 1043142232	AYALA LAZARO BRAYAN JAVIER	1	0																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	30	75.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1070598806	HURTADO HERNANDEZ ARNOLD	1	0				X															230201	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS002	1.517.451	26	65.700	14-23	1.517.451	26	5	105.700	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
8	CC 3081707	VANEGAS PARAMO LUIS CARLOS	1	0				X															23100	1.425.574	19	228.100	0	0	0	0	EPS005	1.425.574	19	57.100	14-23	1.425.574	19	5	99.300	CCF24	1.425.574	19	57.100	0	0	0	0	0
9	CC 57443447	VEGA PARRA CLAUDIA ELENA	1	0				X															230301	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS002	3.600.000	30	144.000	14-23	3.600.000	30	5	250.600	CCF24	3.600.000	30	144.000	0	0	0	0	0
10	CC 79518368	RUSSI CRUZ EDGAR JOAQUIN	1	0				X															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
11	CC 93391901	DIAZ PEDRAZA EDISON RICAURTE	1	0																			230301	2.847.000	30	455.600	0	0	0	0	EPS002	2.847.000	30	113.900	14-23	2.847.000	30	5	198.200	CCF24	2.847.000	30	113.900	0	0	0	0	0
12	PT 2875493	OCANDO OCANDO HUGO ENRIQUE	1	0																			230301	2.250.905	30	360.200	0	0	0	0	EPS005	2.250.905	30	90.100	14-23	2.250.905	30	5	156.700	CCF24	2.250.905	30	90.100	0	0	0	0	0

PROHIBIDA
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

- **Fotos del personal**

- **Formatos de entrega de EPP**

.

CONSTRUCTORA

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

| | | | ELEMENTO DE PROTECCION | | |

- **Fotos de inducción personal**

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: GSST-FO-01
CONSTRUCTORA	CONSTRUCCIONES GED S.A.S.	Versión: 1
	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Fecha: 21/01/2026
		pagina: 1 de 1

FECHA: 11/05/2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Carlos Vanegas Parrino C.C. 3081707

AREA/SECCIÓN: OBRA CARGO:

CELULAR: 3103350600 DIRECCIÓN: Cll. 65 Sur #90-48

RH: O+ LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA: Brigenia Parra CELULAR: 3053956819

OBJETIVO GENERAL

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud y el bienestar de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Política de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias Psicoactivas.
3. Política de Prevención de Acoso Laboral.
4. Objetivos y Metas en Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
6. Generalidades del SG-SST, Responsabilidades del SG, Enfermedades y accidentes laborales.
7. Funcionamiento de los Comités (COPASST y Comité de Convivencia Laboral).
8. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y Brigadas de Emergencias.
9. Derechos y Deberes del Sistema General de Riesgos Laborales.
10. Noificación de riesgos

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

Físicos	x	Psicosociales	x	Fenómenos Naturales	x
Químicos	x	Biomecánicos	x		
Biológicos	x	Condiciones de Seguridad	x		

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Declaro que conozco el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de SST de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Carlos Vanegas
FIRMA DEL TRABAJADOR
C.C. 3081707

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN
C.C. 5749347

CONSTRUCTORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: GSST-FO-03
		Versión: 1
	CONSTRUCCIONES GED S.A.S.	Fecha: 21/01/2026
	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	Pagina 1 de 1

FECHA: 11/05/2026

NOMBRE DEL TRABAJADOR: LUIS Carlos Vanegas Parame — C.C. 3081707

AREA/SECCIÓN: OBRA — CARGO: Maestro de Obra

CELULAR: 3[illegible] DIRECCIÓN: Calle 65 Sur # 94A-98

RH: O+ LLAMAR EN CASO DE EMERGENCIA: Eufemia Parra — CELULAR: 3053996819

FÍSICOS	X	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	QUÍMICOS	x	Polvos orgánicos e inorgánicos
	X	Iluminación (exceso o deficiencia)		x	Fibras
	X	Vibraciones			Líquidos
	X	Temperaturas extremas (frío o calor)		x	Gases y vapores
	X	Disconfort térmico		x	Humos metálicos y no metálicos
		Presión atmosférica		x	Material particulado
		Radiaciones Ionizantes	PSICOSOCIAL	x	Gestión organizacional
		Radiaciones No Ionizantes		x	Características de la organización de trabajo
SALUD PÚBLICA		Hepatitis A		x	Características del grupo social del trabajo
		Hepatitis B		x	Condiciones de la tarea
		Dengue		x	Interfase persona - tarea
	x	Toxo de tetánico		x	Jornada de trabajo
		Fiebre amarilla		x	Relaciones laborales
	x	Cefalea	BIOMECÁNCOS	x	Posturas
CONDICIONES DE SEGURIDAD	x	Mecánicos		x	Esfuerzo
	x	Eléctricos		x	Movimientos repetitivos
	x	Locativo		x	Manipulación de cargas
	x	Tecnológico	BIOLÓGICOS	x	Virus
	x	Accidentes de transito			Bacterias
	x	Públicos			Parásitos
	x	Trabajos en Alturas			Picaduras
		Espacios confinados			Mordeduras de animales
FENOMENOS NATURALES	x	Sismo		x	Fluidos o excrementos
	x	Terremoto		x	Contagio de infecciones
		Inundaciones	OTROS		
	x	Vendaval			
		Derrumbes			
	x	Precipitaciones			

CONTROL DEL RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS

COMUNES A TODO CARGO

Asistir a inducción antes del inicio de actividades
Asistir a la divulgación del plan de emergencias del proyecto
Respetar la señalización y demarcación de las áreas de trabajo
Reportar los incidentes y/o accidentes al Responsable SST
No manipular contactos eléctricos
Dar cumplimiento al programa de manejo de residuos solidos
Mantener hábitos de higiene y limpieza

Utilizar y cuidar los EPP'S necesarios para a protección de los riesgos referidos
Cumplir las normas establecidas en la obra en cuanto a los procedimientos seguros de trabajo

Reportar las condiciones inseguras evidenciadas en los frentes de trabajo

No fumar, ingerir licor, no consumir sustancias psicoactivas dentro de la obra
Identificar los sitios de ubicación de la camilla, botiquín, extintores, así como la ruta de evacuación y punto de encuentro

COMUNES A RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA

No permitir el incumplimiento delas normas de seguridad
No permitir el ingreso a la obra a personal no autorizado

COMUNES A OPERADORES Y AYUDANTES DE OBRA

Mantener orden y aseo en el área de trabajo
No operar herramientas ni equipos sin supervisión
Realizar los pre-operacionales junto con el inspector HSE
Seguir el procedimiento en caso de emergencias

COMUNES A PERSONAL DE SEGURIDAD

Solicitar y verificar los respectivos documentos para ingreso a obra

Mantener el uso de EPP'S necesarios para el desarrollo de sus labores en obra

OBSERVACIONES:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS EN OBRA

- [ ] CASCO CON BARBUQUEJO
- [ ] GAFAS DE SEGURIDAD
- [ ] PROTECTOR AUDITIVO
- [ ] PROTECTOR RESPIRATORIO
- [ ] BOTAS DE SEGURIDAD INDUTRIAL
- [ ] ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHALECO)
- [ ] GUANTES
- [ ] OTROS:

NOTA: **CON SU FIRMA SE COMPROMETE A CUMPLIR TODAS LAS NORMAS Y SUGERENCIAS DE SEGURIDAD REALIZADAS POR EL INSPECTOR HSE DE LA EMPRESA ARBO S.A.S. SU INCUMPLIMIENTO GENERARÁ LAS MULTAS ESTIPULADAS EN EL MANUAL DE CONTRATISTAS.**

Carlos Vanegas
FIRMA DEL COLABORADOR
3081707

FIRMA PERSONA RESPONSABLE SST

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: GSST-FO-02
C NSTRUCTORA	CONSTRUCCIONES GED S.A.S.	Versión: 1
	EVALUACION DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN	Fecha: 21/01/2026
		Pagina: 1 de 1

FECHA DE INGRESO: 12/05/2026
NOMBRE: Luis Carlos Vargas Tavera — C.C. 3081707
ÁREA/SECCIÓN: OBRA — CARGO: Maestro
SE SOCIALIZA CARTILLA DE INDUCCION — SI [X] NO [ ]
INDUCCION [X] — REINDUCCION [ ]

1. marque con una "X" según corresponda, son politicas y reglamentos de Construcciones GED SAS

	política de seguridad ysalud en el trabajo, política de prevencion consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, política de desconexion laboral, reglamento de higiene y seguridad industrial
	politica de est
	Politica ambiental y gestion humana
X	Todas las anteriores

2. coloque la letra según corresponde la definicion

a.	INCIDENTE DE TRABAJO	(B)	lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta
b.	ACCIDENTE DE TRABAJO	(O)	El Comité de Convivencia Laboral es el organismo encargado de promover la convivencia laboral y prevenir las conductas de acoso laboral entre trabajadores dentro de la institución.
c.	COPASST	(A)	Suceso en el trabajo que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones
d.	CCL	(C)	comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa

3. seleccione y marque con una "x" los epp que debe utilizar en obra



4. según la definicion seleccione si es verdadero "V" o falso "F"

(V)	acto inseguro acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador
(V)	condicion insegura Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas

5. En las siguientes imagenes encontrara actos y condiciones inseguras, determine con "A" los actos inseguros y con "C" las condiciones inseguras



6. coloque la letra según corresponda al rombo



7. con una flecha una según corresponda

que dede de hacer si sufre un accidenteo incidente	administradora de riesgos laborales Positiva
que hacer en caso de emergencia	mantener la calma, seguir rutas de avacuacion, llegar al punto de encuentro, seguir instrucciones de los brigadistas
a que ARL se encuentra afiliado	reportar al jefe inmediato y al inspector sst, apenas suceda el accidente o incidente

LA SEGURIDAD ES EL ARTE DE PRESERVAR VIDAS

Carlos Vargas.
FIRMA DEL TRABAJADOR

Calificación: 100%

CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

CAPÍTULO 2.

MATERIALES

Para la ejecución de las actividades contractuales, se utilizaron materiales que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato y las condiciones de calidad requeridas.

Los materiales empleados fueron recibidos, transportados y almacenados de manera adecuada, garantizando su integridad y correcto uso durante la instalación.

Se cuenta con fichas técnicas de los materiales utilizados, así como registro fotográfico de las zonas de acopio de material, zonas de acopio de residuos y zonas intervenidas.

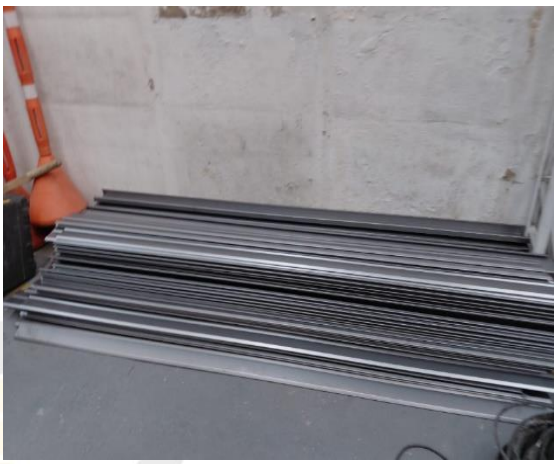
Adicionalmente, se anexa evidencia fotográfica del transporte, embalaje y llegada de los elementos a las diferentes sedes, asegurando el adecuado manejo de los mismos.

Anexos de este capítulo:

- **Manual de mantenimientos**

- **Fotos de acopio de materiales**





- **Fotos de transporte y embalaje**





CAPÍTULO 3.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE AMERICAS

NP 24. Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul océano con película Frost para ventanería de fachadas a instalar. (incluye transporte y material para el pegue).	7.06 M2

ANTES	DESPUES
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTRO DE ENCUENTRO BOSA

17. Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	0.35 M2

ANTES	DESPUES
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADE LA VICTORIA

17. Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	0.06 M2

ANTES

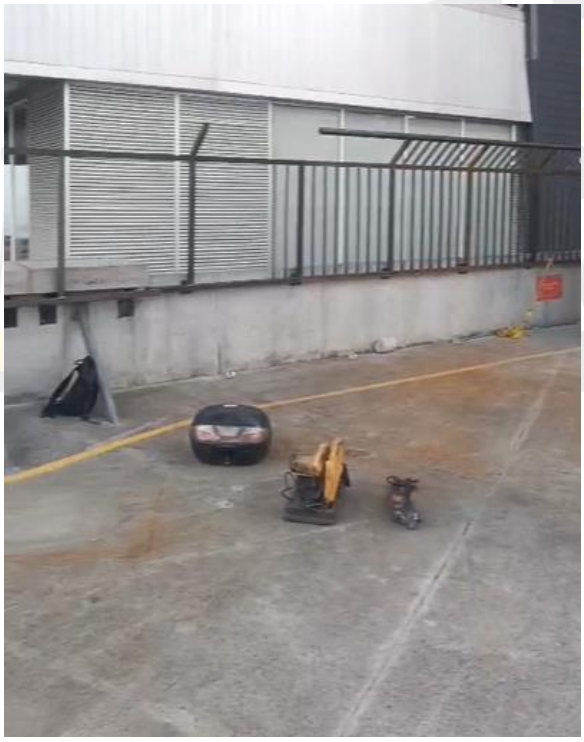
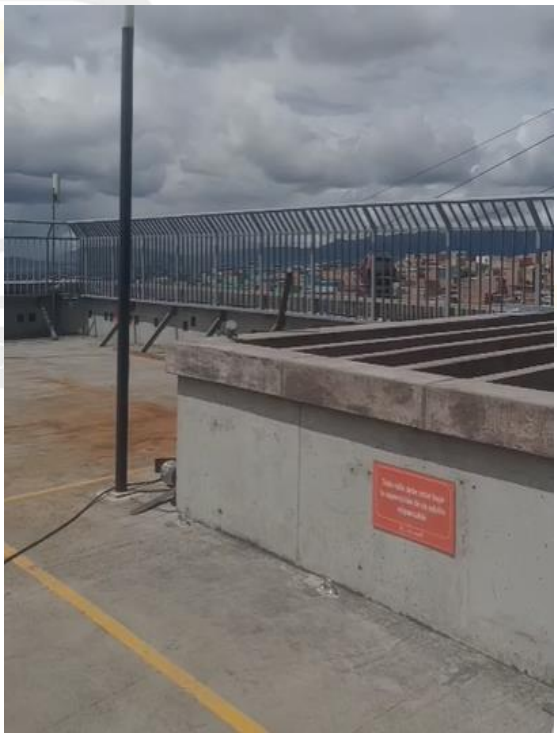


DESPUES



ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE MANITAS

NP 25. suministro e instalacion de baranda segun diseño enviado, parales en tuberia coldrolled 50 x 50 cal 18 distanciados a 1.20 m h= 1.20 cm, pasamanos superior e inferior en tuberia cr 50x50 cal 18 y travesaños verticales en platina de 2" x 4 mm distanciados cada 15 cm, acabado en anticorrosivo y esmalte, proyeccion tramo de baranda h= 0.40 m para anti escalada segun diseño, incluye platinas de fijacion, pernos y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	84.50 M2

ANTES	DESPUES
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADE LA GAITANA

1. Desmonte de ventanería (anclada a muro con tornillería y/o pata metálica) incluye desoldada de reja en acero galvanizado (soldada a la ventanería)	41.89 M2

ANTES	**DESPUES**
	

2. Suministro e instalación de ventanería nueva en acero galvanizado cold rolled calibre 18 con perciana fija en la parte superior, incluye alfagia según diseño existente, en pintura electrostática cofrada de color gris basalto (Incluye transporte, anclajes, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	1.26 M2

ANTES	**DESPUES**
	

3. Mantenimiento y reinstalación de rejas de ventanería, incluye lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte brillante de color gris basalto (la reinstalación inluye soldadura y/o fijación con tornillo; incluye transporte, anclajes, todos los accesorios, materiales y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	-8.07 M2

ANTES	**DESPUES**
	

NP 5. Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	1.28 M2

ANTES	**DESPUES**
	

6. Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue	-1.59 M2

ANTES	**DESPUES**
	

NP 17. Desmonte de puertaventanas y suministro e instalación de puertaventanas en peinazo batiente en acero cold rolled calibre 18, en pintura electrostática de color gris basalto, incluye chapa doble con llaves, manija, doble pasador interno, incluye marcos según diseño existente y (Incluye transporte, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR MEDIDAS EN SITIOS.	-0.36 M2

ANTES	**DESPUES**
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE SUBA

8. Desmonte de puerta existente y suministro e instalación de marco y puerta con perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática (Incluye transporte marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento) en color gris basalto. VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=,30cm	-3.12 M2

ANTES



DESPUES



8. Desmonte de puerta existente y suministro e instalación de marco y puerta con perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática (Incluye transporte marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento) en color gris basalto. VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=,30cm	-3.92 M2

ANTES



DESPUES



NP 24. Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul océano con película Frost para ventanería de fachadas a instalar. (incluye transporte y material para el pegue).	-2.95 M2

ANTES	**DESPUES**
	

CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE ENGATIVA

7. Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	-5.04 M2

ANTES

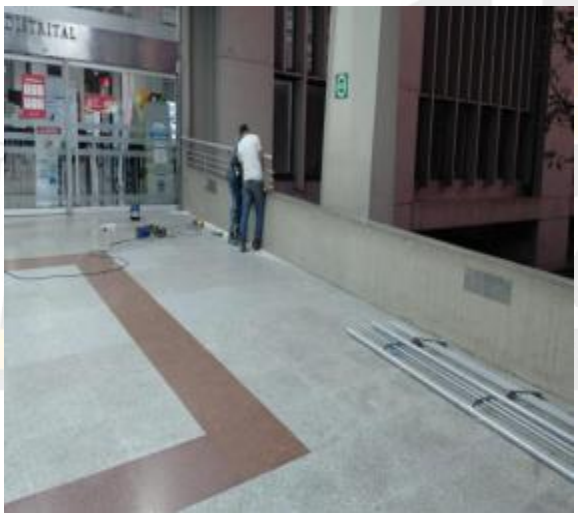


DESPUES



ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE CAD

NP 6. Suministro e instalación de barandilla metálica de tubo hueco cr de 90 cm de altura, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia	0.36 M2

ANTES	DESPUES
	

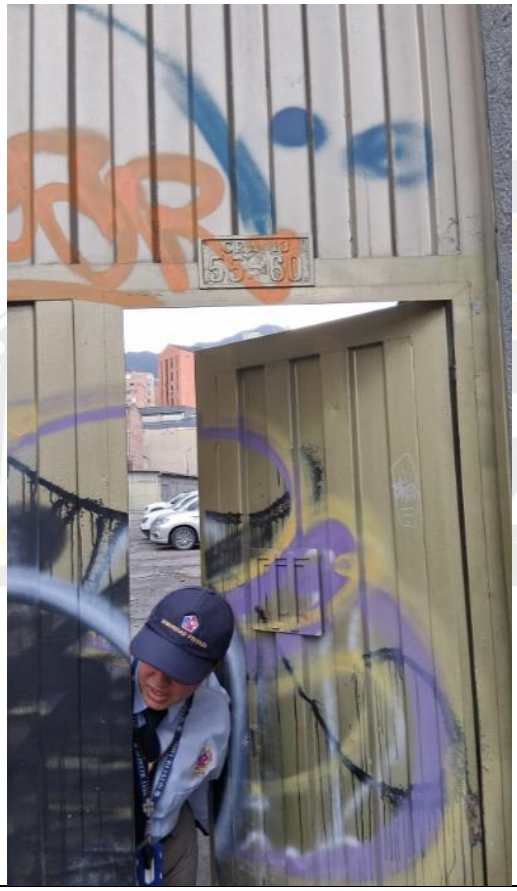
ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADE SERVITA

NP 8. Suministro e instalación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina 40 mm x 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil circular de 2" del mismo tipo de acero inoxidable, fijada mediante anclaje mecánico de expansión a las placas de piso. (incluye transporte al sitio, todos los accesorios, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación) VERIFICAR MEDIDA EN SITIO	-3.85 M2



ACTIVIDADES REALIZADAS EN BODEGA CALLE 55

NP 24. arreglo porton, incluye desmonte del mismo, corte y remplazo de peinazo inferior en perfil 7x7 cal. 14, remplazo de rodachin deñado e instalacion de 2 nuevos, remplazo guia inferior existente, reinstalacion del mismo acabado en anticorrosivo y esmalte similar al existente.	1 GL

ANTES	DESPUES
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANZANA LIEVANO

7. Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO	-2.33 M2

ANTES	**DESPUES**
	

7. Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO		-3.33 M2

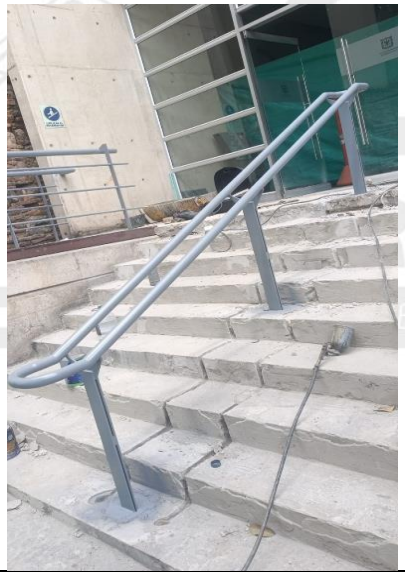
ANTES	**DESPUES**
	

NP 18. Desmonte de travesaños, suministro e instalacion de tuberia, de 3/4 cal. 16 para los nuevos travesaños, recorte retiro y reinstalacion de zona afectada en pasamanos, lijado y pintado en anticorrosivo y esmalte.	4.5 UNIDAD



NP 19. Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, remate en curva uniendo los dos sentidos de la baranda, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm la cual va doble para empotrar soporte de pasamanos construido en platina diseño igual a las barandas existentes con una separación de 120 cm entre sí;, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según plano entregado	3.3 M2

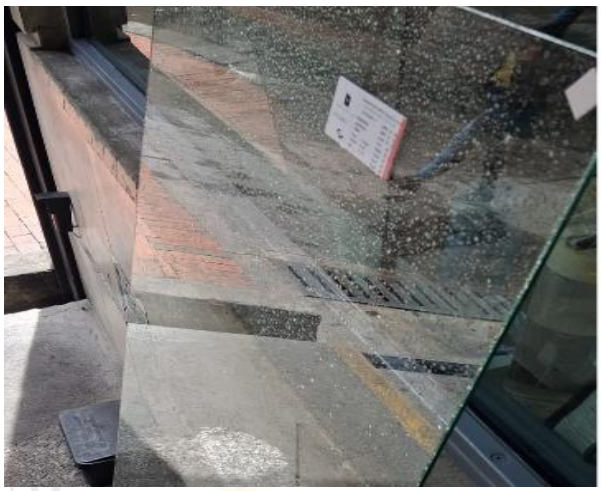
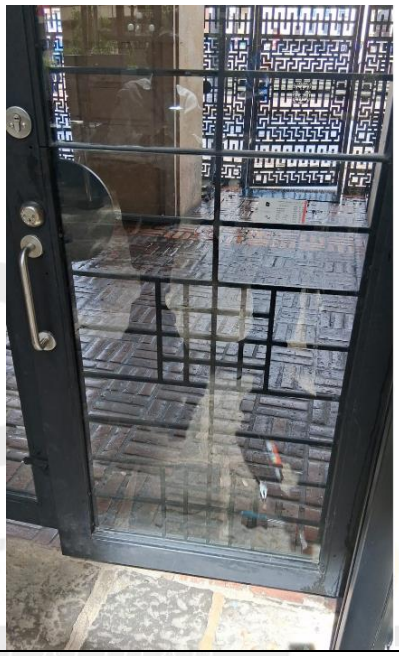
ANTES



DESPUES



NP 22. Suministro e instalación de vidrio incoloro templado en 6 mm para ventanería de fachadas .(incluye desmonte del vidrio existente, transporte del nuevo vidrio y material para el pegue.)	1 M2

ANTES	**DESPUES**
	

NP 25. suministro de puerta de seguridad tipo carcel enmarcada en perfil 4x8 cal 14, entamborada en 2 paneles lamina collroled cal 14 acabada en pintura al horno color a elegir, incluye marco puerta en lamina cal 14 y 12 pata gallinas para anclaje a muro, incluye chapa de seguridad, pasador, falleba superior e inferior, 4 bisagras de 3/4, refuerzos internos en lamina cal 14 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	3.8 M2
	

NP 26. suministro escotilla 80 x 80 en marco puerta cal 14, enmarcada en perfil 4x8 cal 14 y entamborada en lamina cr cal 14, incluye 8 pata gallinas para embeber en muro de concreto, 3 pasadores, bisagras 5/8 y cadenas para templete, incluye refuerzos en cal 14, acabado en pintura al horno color a elegir	1 UNIDAD
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN

NP 23. Adecuacion excotillas para auditorio, suministro de angulo 1" 1/2 para enmarcar encotilla y marco, bisagras fabricadas con aleta larga para distribucion de carga, acabado en esmalte anoloc champagne, incluye pasador instalado en la parte inferior	2 UNIDAD

ANTES	DESPUES
	

CAPÍTULO 4.

CORTE DE OBRA

En el presente capítulo se relaciona corte de obra, indicando el correspondiente al presente corte.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE CORTE No.5
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CODIGO No. 4233000-781-2025
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 411.448.500,00	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 274.299.000,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2025
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$ 137.149.500,00	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	30/04/2026
VALOR PAGADO DEL CONTRATO	$ 358.895.034,00		
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.553.466,00		

Surtida las revisión de los elemnetos suministrados a través del contrato 781-2025, la supervisión del contrato aprueba el siguiente corte a 30/04/2026 para el contrato:

CORTE TOTAL APROBADO AL 17/06/2026	**$**	**52.553.464,00**
I. ZONA SUR	**$**	**53.383.032,00**
1. SuperCADE Américas	$	1.428.238,00
2. Centro de Encuentro Bosa	$	144.242,00
3. SuperCADE Bosa	$	-
4. Centro de Encuentro Yomasa	$	-
5. CADE La Victoria	$	24.727,00
6. SuperCADE 20 de Julio	$	-
7. Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe	$	-
8. SuperCADE Manitas	$	51.785.825,00
II. ZONA NORTE	**-$**	**7.525.947,00**
9. CADE La Gaitana	$	932.216,00
10. SuperCADE Suba	-$	3.498.117,00
11. SuperCADE Engativá	-$	4.154.180,00
12. SuperCADE CAD	$	149.624,00
13. CADE Servita	-$	4.525.490,00
14. SUPERCADE Calle 13	$	-
15. Bodega Calle 55	$	3.570.000,00
III. ZONA CENTRO	**$**	**6.696.379,00**
16. Archivo de Bogotá	$	-
17. Manzana Lidvano	$	5.315.979,00
18. CMPR	$	1.380.400,00

SUPER CADE AMERICAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 24	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul oceano con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	7,06	M2	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300	$ 1.428.238
TOTAL						$	1.428.238,00

CENTRO DE ENCUENTRO BOSA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	0,35	M2	$ 346.320	$ 65.801	$ 412.121	$ 144.242
TOTAL						$	144.242,00

CADE LA VICTORIA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
17	Suministro e instalación de marco y puerta perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica (Incluye marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h=47cm	0,06	M2	$ 346.320	$ 65.801,00	$ 412.121,00	$ 24.727
TOTAL						$	24.727,00



CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

SUPER CADE MANITAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 25	suministro e instalacion de baranda segun diseño enviado, parales en tuberia coldrolled 50 x 50 cal 18 distanciados a 1.20 m h= 1.20 cm, pasamanos superior e inferior en tuberia cr 50x50 cal 18 y travesaños verticales en platina de 2" x 4 mm distanciados cada 15 cm, acabado en anticorrosivo y esmalte, proyeccion tramo de baranda h= 0.40 m para anti escalada segun diseño, incluye platinas de fijacion, pernos y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	84,50	M2	$ 515.000	$ 97.850,00	$ 612.850,00	$ 51.785.825
TOTAL						$	51.785.825,00

CADE LA GAITANA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
1	Desmonte de ventaneria (anclada a muro con tornilleria y/o pata metálica) incluye desoldada de reja en acero galvanizado (soldada a la ventaneria)	41,89	M2	$ 29.304	$ 5.568,00	$ 34.872,00	$ 1.460.788
2	Suministro e instalación de ventaneria nueva en acero galvanizado cold rolled calibre 18 con perciana fija en la parte superior, incluye alfagia según diseño existente, en pintura electrostática cofrada de color gris basalto (Incluye transporte, anclajes, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	1,26	M2	$ 97.680,00	$ 18.559,00	$ 116.239,00	$ 146.461
3	Mantenimiento y reinstalación de rejas de ventaneria, incluye lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte brillante de color gris basalto (la reinstalación inluye soldadura y/o fijación con tornillo; incluye transporte, anclajes, todos los accesorios, materiales y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS	-8,07	M2	$ 48.840,00	$ 9.280,00	$ 58.120,00	-$ 469.028
NP 5	Suministro e instalación de vidrio incoloro crudo en 6 mm para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue.)	1,28	M2	$ 100.418	$ 19.079,00	$ 119.497,00	$ 152.956
6	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	-1,59	M2	$ 137.640	$ 26.152,00	$ 163.792,00	-$ 260.429
NP 17	Desmonte de puertaventanas y suministro e instalación de puertasventanas en peinazo batiente en acero cold rolled calibre 18, en pintura electrostática de color gris basalto, incluye chapa doble con llaves, manija, doble pasador interno, incluye marcos según diseño existente y (Incluye transporte, todos los accesorios y equipos necesarios para su correcta instalación) VERIFICAR MEDIDAS EN SITIOS.	-0,36	M2	$ 230.000,00	$ 43.700,00	$ 273.700,00	-$ 98.532
TOTAL						$	932.216,00

SUPER CADE SUBA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
8	Desmonte de puerta existente y suministro e instalación de marco y puerta con perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática (Incluye transporte marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento) en color gris basalto. VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h= 30cm	-3,12	M2	$ 346.320	$ 65.801,00	$ 412.121,00	-$ 1.285.818
8	Desmonte de puerta existente y suministro e instalación de marco y puerta con perciana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática (Incluye transporte marco, angeo mosquitero metalico, chapa de seguridad porton, pasadores sup. e inf. 1/2", 4 bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento) en color gris basalto. VERIFICAR EN SITIO MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. Ancho marco 9cm, puerta en tubo rectangular 8x4cm, panel inferior h= 30cm	-3,92	M2	$ 346.320	$ 65.801,00	$ 412.121,00	-$ 1.615.514
NP 24	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul oceano con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar.(incluye transporte y material para el pegue).	-2,95	M2	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300	-$ 596.785
TOTAL						-$	3.498.117,00

Carrera 25 No. 7-68 Sur, Barrio la Fraguita, Bogotá D.C. – Colombia
+57 (1) 391 1755 • Celulares: 313 208 1584 - 320 943 8792
edisondiaz@constructoraged.com - licitaciones@constructoraged.com
www.constructoraged.com



CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

SUPER CADE ENGATIVA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 8	Suministro e instalación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina 40 mm x 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes	0,00	M2	$ 987.775	$ 187.677,00	$ 1.175.452,00	$ -
NP 9	Suministro e instalación de pasamanos tubular cilíndrico en tubo hueco, acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, de 2" de diámetro para rampa de discapacidad, con soportes del mismo material fijados al muro mediante anclaje mecánico por atornillado, inicio y terminación en curva. (Incluye	0,00	ML	$ 361.065,00	$ 68.602,00	$ 429.667,00	$ -
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	-5,04	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	-$ 4.154.180
	TOTAL					-$	4.154.180,00

SUPER CADE CAD							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 6	Suministro e instalación de baranda metálica de tubo hueco cr de 90 cm de altura, acabado en pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales 16 mm de diámetro, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según imagen de referencia	0,36	M2	$ 349.263	$ 66.360,00	$ 415.623,00	$ 149.624
	TOTAL					$	149.624,00

CADE SERVITA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 8	Suministro e instalación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, de acero inoxidable AISI 316 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina 40 mm x 8 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil circular de 2" del mismo tipo de acero inoxidable, fijada mediante anclaje mecánico de expansión a las placas de piso. (incluye transporte al sitio, todos los accesorios, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación) VERIFICAR MEDIDA EN SITIO	-3,85	M2	$ 987.775	$ 187.677,00	$ 1.175.452,00	-$ 4.525.490
	TOTAL					-$	4.525.490,00

BODEGA CALLE 55							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 24	Aarreglo porton, incluye desmonte del mismo, corte y remplazo de peinazo inferior en perfil 7x7 cal. 14, remplazo de rodachin dañado e instalacion de 2 nuevos, remplazo guia inferior existente, reinstalacion del mismo acabado en anticorrosivo y esmalte similar al existente.	1	GL	$ 3.000.000	$ 570.000,00	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000
	TOTAL					$	3.570.000,00

MANZANA LIEVANO							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	-2,33	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	-$ 1.920.484
7	Suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable AISI 304 satinado calibre 20, entamborado con poliestireno expandido, para baños y orinales institucionales y públicos de la sede. (Incluye todos los accesorios de anclaje, bisagras, seguros o pasador aptas para personas en condición de discapcidad, pines, ángulos y platinas según el caso y puertas para cada unidad sanitaria, transporte al sitio, equipos y mano de obra) - VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO.	-3,33	M2	$ 692.640,00	$ 131.602,00	$ 824.242,00	-$ 2.744.726
NP 18	Desmonte de travesaños, suministro e instalacion de tuberia, de 3/4 cal. 16 para los nuevos travesaños, recorte retiro y reinstalacion de zona afectada en pasamanos, lijado y pintado en anticorrosivo y esmalte.	4,5	UNIDAD	$ 180.000,00	$ 34.200,00	$ 214.200,00	$ 963.900

Carrera 25 No. 7-68 Sur, Barrio la Fraguita, Bogotá D.C. – Colombia
+57 (1) 391 1755 • Celulares: 313 208 1584 - 320 943 8792
edisondiaz@constructoraged.com - licitaciones@constructoraged.com
www.constructoraged.com



NP 19	Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, remate en curva uniendo los dos sentidos de la baranda, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm la cual va doble para empotrar soporte de pasamanos construido en platina diseño igual a las barandas existentes con una separación de 120 cm entre sí;, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según plano entregado	3,3	M2	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 2.591.820
NP 22	Suministro e instalación de vidrio incoloro templado en 6 mm para ventaneria de fachadas .(incluye desmonte del vidrio existente, transporte del nuevo vidrio y material para el pegue.)	1	M2	$ 150.000	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 178.500
NP 25	suministro de puerta de seguridad tipo carcel enmarcada en perfil 4x8 cal 14, entamborada en 2 paneles lamina collroled cal 14 acabada en pintura al horno color a elegir, incluye marco puerta en lamina cal 14 y 12 pata gallinas para anclaje a muro, incluye chapa de seguridad, pasador, falleba superior e inferior, 4 bisagras de 3/4, refuerzos internos en lamina cal 14 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3,8	M2	$ 1.118.000,00	$ 212.420,00	$ 1.330.420,00	$ 5.055.596
NP 26	suministro escotilla 80 x 80 en marco puerta cal 14, enmarcada en perfil 4x8 cal 14 y entamborada en lamina cr cal 14, incluye 8 pata gallinas para embeber en muro de concreto, 3 pasadores, bisagras 5/8 y cadenas para templete, incluye refuerzos en cal 14, acabado en pintura al horno color a elegir.	1	UNIDAD	$ 1.001.154	$ 190.219,00	$ 1.191.373,00	$ 1.191.373
			TOTAL			$	5.315.979,00

CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 23	Adecuacion excotillas para auditorio, suministro de angulo 1" 1/2 para enmarcar encotilla y marco, bisagras fabricadas con aleta larga para distribucion de carga, acabado en esmalte anoloc champagne, incluye pasador instalado en la parte inferior	2	UNIDAD	$ 580.000,00	$ 110.200,00	$ 690.200,00	$ 1.380.400
			TOTAL			$	1.380.400,00

El presente corte corresponde a las cantidades finales ejecutadas en el contrato.
Las diferencias en cantitades corresponde a ajustes realizados por los profesionales (ya sea por medidas o por calidad del elemento) de zona para el correspondiente recibo a satisfacción de cada actividad ejecutada.
El contratista atiende todas las observaciones por garantías de los elementos suministrados e instalados.

MAURO PALTA CERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISO DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS

ELABORÓ: JAHIR ERNESTO GUERRERO ROZO - APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 4233000-781-2025
REVISÓ:

Los valores aquí relacionados corresponden a las actividades efectivamente ejecutadas y debidamente soportadas en el presente informe.

Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS
