ANEXO V. SALVEDADES TRANSMILENIO S.A.

SALVEDADES - COMPONENTE ELECTROMECÁNICO

BOGOTÁ | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

ACTA DE REUNIÓN		
Asunto o tema: **FORMATOS RECECPION/ENTREGA COMPONENTE ELECTORMECANICO**		
Reunión: Interna [ ] Externa [X]	**Fecha:** *16 de julio de 2026*	**Hora inicio:** 17:00
Lugar: TransMiCable Ciudad Bolivar	**Lista de Asistencia (Formato R-OP-006)**	

1. Temas tratados

ANEXOS FORMATOS RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO
ESTACIONES (TUNAL, JUAN PABLO II, MANITAS, MIRADOR, PARKING, EQUIPOS DE RESPALDO)
PILONAS 1 A 24
CABINAS C001 A C164

Durante la Etapa Preoperativa se realizaron las actividades de inspección del componente electromecánico relacionadas en los anexos antes mencionados, sin embargo, quedó pendiente la inspección especializada solicitada por Cablemovil, dado que la operación del cable se encontraba a cargo de la Operadora Distrital de Transporte (ODT). Por lo anterior, si en los resultados de las inspecciones mencionadas que haga el operador entrante (Cablemovil) se identifican situaciones preexistentes al inicio de la Etapa de Operación, estas estarán a cargo del operador saliente (ODT)


O.D.T	CABLEMOVIL SAS	TRANSMILENIO SA
JOSE R. JACOME H. PPT 1235307	JOHAN J. PARADA C.C 1232404383	LEONARDO D. HENRIQUEZ C.E. 984372

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
ESTACIONES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MDD Ciudad Bolivar WAA90035BB

Fecha: 07/06/2016.
Estación: TUNAL

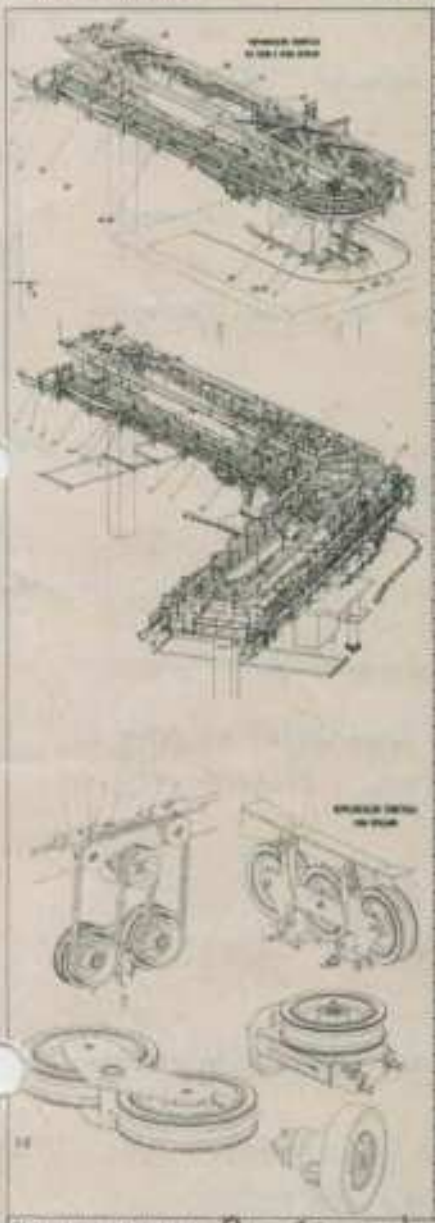

	Descripción	Operativo	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Armazon Portante (Viga de fuerte, fundamentos)	✓			
2	Plataformas	✓			
3	Senalettas	✓			
4	Escaleras	✓			
5	Tornilleria Armazon Portante	✓			
6	Rieleras/rieles Transportadores	✓			
7	Chumaceras/rodamientos	✓			
8	Correas Trapezoidales	✓			
9	Poleas de accionamiento de traccion ITO		X		
10	Polea de arrastre de estacion 400		X		
11	Poleas horizontales y verticales 900	✓			
12	Retenciones estacion lado ascendente	✓			
13	Retenciones estacion lado descendente	✓			
14	Guia Exterior (Triangulo)	✓			
15	Dispositivo de apertura y cierre de puertas	✓			
16	Riieles Guia		X		
17	Rieles de Acoplamiento		X		
18	Rieles de Aceleracion		X		
19	Puerto de acoplamiento		X		
20	Poleas Tensoras		X		
21	Dispositivos de seguridad	✓			
22	Sensores de control Desniveles		X		
23	Seguros de piso	✓			
24	Barreras de control de acceso	✓			
25	Cepos de alineamiento	✓			
26	Cilindros elevador de vagonetas	✓			
27	Motor Reductores Hmd		X		
28	Arbol de Tensor		X	X	No Aplica
29	Articles Articulados		X	X	No Aplica.
30	Frenos Hydrogluff	✓			
31	Sensores fuerza de agarre	✓			
32	Barras puerta a tierra	✓			
33	Armario de control	✓			
34	Armario de baterias	✓			
35	Armario Bloq magnet	✓			
36	Tableros de control Auxiliares	✓			
37	Volante Motriz o Reactor	✓			
38	Reductor/motor de Volante	✓			
39	Dispositivo de Friccion Volante	✓			
40	Dispositivo de torsion Volante	✓			
41	Corona Dentada	✓			
42	Reductor principal			X	
43	Reductor de respaldo			X	
44	Motor Principal			X	
45	Motor de Respaldo			X	
46	Bomba Kral			X	
47	Prensa de emergencia			X	
48	Prensa de apoyo			X	
49	Agujas de elevacion		X		
50	Armario de accionamiento de emergencia			X	
51	Unidad hidraulica para empalmes de tension de cable	✓			
52	Cerro tensor	✓			Falta Prueba Hora Seca.
53	Cilindro Hidraulico 1	✓			
54	Cilindro Hidraulico 2	✓			
55	Bateria hidraulica de emergencia	✓			
56	Motor de emergencia Cummins			X	
57	Transmision de engranaje	✓			
58	Generador Tacogenerico		X		
59	Unidades LC (poleas)		X		
60	Detectores Seguro de Trabajo		X		
61	Rieles Protectores			X	
62	Cuna Estacion, Ventilacion Sonda, Piscina Cuenca		X		
63	Tacheles Cuna		X		
64	Supervision estacion	✓			
65	Estado cepo de herramientas		X		

Observaciones Generales: 9. Se evidencia desgaste y Rozamiento horizontal inadecuado en la Polea 7 canales ubicada en las Poleas de deplieu (Vertical (lado entrada), a Si mismo se identifica que Polea 7 canales de salida ascendente Presenta desgaste.
10. Polea con guarnicion con desgaste y Rozamiento 2 salida ascendente.
16. Soldadura Escuela, entre neumaticos 14 y 15 salida ascendente.
17. Se evidencia Peladura en el riel acople salida ascendente.
18. soldadura interna Escuela entre neumaticos 14-15 salida ascendente.
19. Falta Punto de Refuerzo H25 Salida ascendente.
22. Sensor Proximidad 6. Sensor Proximidad salida 2. (Presentan Abolladuras y rayaduras).
27. Motoreductor Hmd (Entrada) Se evidencia tapa de la conexión electrica que no corresponde / Motoreductor Hmd (Salida) Se identifica que el instalado actualmente es un repuesto del sistema y se encuentra repicada.

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
Andres Hernandez	1023932903	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaya Ortiz	1025800648	CABLEMOVIL	
Fenis Florez	1143131919	ODT	

5 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO ID 11512750 (ILLIMANI, PORTAL DEL TUNAL)

Las piezas de recambio siguientes sirven para la conservación del paso por la estación:

Designación	Cantidad	Número de artículo
Apoyo por Accionamiento de fricción	2	10745749 ✓
Polea de fricción dia. 500 sin eje	1	10686616 ✓ 10686614
Unidad de rodillo tensor para correa trapezoidal en accionamiento por rueda de fricción	1	10681429 ✓
Correa trapezoidal CC/HCC LREF = 6150 mm	3	10275085 ✓
Polea 403 LW 93 dia. 435	1	10647598 ✓
Polea 500 dia. sin eje	1	10686697 ✓
Polea 403 LW 93 dia. 430	1	11304607 ✓
Cojinetes de neumáticos transportadores dia. 40	2	10680725 ✓
Cojinetes de neumáticos con embrague KI	1	11049893 ✓
Cojinetes de neumáticos con embrague KA	1	11050119 ✓
Rudea neumáticos completos "Doppelmayr-G"	5	10622234 ✓
Tensor de correas 14 grados	1	10861414 ✗ Faltante.
Tensor de correas largo 14 grados	1	11058370 ✗
Correa trapezoidal XPC LA = 1850 mm	1	10360353 ✓
Correa trapezoidal XPC LA = 1900 mm	5	10082482 ✓
Correa trapezoidal XPC LA = 1960 mm	2	10388513 ✓
Correa trapezoidal XPC LA = 2000 mm	1	10217238 ✓
Correa trapezoidal XPC LA = 2080 mm	1	10567647 ✓

- Tensor de correas con novedad en las poleas ya que no son las originales.

4 LISTA DE HERRAMIENTAS ID 11430975

Designación	Cantidad	Número de artículo	
Riel de grúa con carro grúa	1	10527785	✓
Aparejo de cadena, carga útil 1,0 t	1	10759701	✓
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	11517302	✗ Faltante 1.
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	11517308	✓
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	11517322	✓
Amoladora angular	1	11430980	✓
Discos lijadores	5	10017270	✗ Faltante 2.
Carril guía de recambio	1	10943404	✓
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	2	11434962	✗ Faltante 1.
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346	✓
Cable de poliamida, diámetro 12 mm, longitud 70 m	1	10529696	✓
Polea inv. SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909	✗ Faltante.

- Faltante eslinga circular longitud 2,0m (1).
- Faltante 2 discos lijadores (3(5)
- Faltante 1 Grillete 7,8"
- Faltante polea inv SRL-KG08 2T Hofer.

20. Se comprobo el uso de poleas no originales en las siguientes ubicaciones de Zona curva: (Requieren reemplazo en ambos niveles superior- inferior, posiciones 1C, 3C, 6C, 8C, 15C, 16C, 18C, 20C) (Requiere reemplazo nivel inferior, 2C, 4C, 5, 7C, 9C-13C (requiere reemplazo en nivel superior 19C).

43. AGuja WH1: Se identifica con Fisura, se evidencia desgaste en el eje rotula WH1 - Base de rotula Aguja W1 con desgaste.
AGuja WH2: Se identifico refuerzo con soldadura "se partio", Pasador de ajuste de riel guia wh2 no acopla correctamente.

58. Se evidencia generador tacometrico con desgaste.

59. se detecto que el sistema lubricacion Permanente, se encuentra Fuera de Servicio y tiene mangueras Cristalizadas.

60. se identifico Seguro de trabajo 1 Entrada incompleto, Falta Pin (pieza) plastica para seguridad y etiquetado.

62. Fisurado entre neumaticos 35-36 Entrada
Fisurado entre neumaticos 28-29 Salida
Fisurado entre neumaticos 25-26 Salida.
Fisurado entre neumaticos 1-2 salida.

65. Se identificaron tres cajas, cada una con dos chapas, de estas Cajas 1 y 3 presentan Chapa dañada.

63. se identifico desgaste en el domo, lado monte, salida cambiante parte superior.

* se detecto posible rayadura en riel de seguridad (entrada descendente estacion). la causa probable es el desgaste de los poleas 403 de la entrada, el cual obligo al cable a descender de su nivel y rozar contra el riel.
* se comprobo la ausencia de sensor SPM en el volante estacion.
* Durante la inspeccion a motoreductores de entrada y salida se confirmo que las poleas superior e inferior tienen desgaste.
* se evidencio partidura de Soldadura de la esquina superior derecha de la ventana, lado monte.
* se evidencia bisagra de la puerta de acceso al techo del domo dañada y dispositivo Mecanico elevador de la guillotina con desgaste en la pintura.
* se identifico la falta de tornillos en el soporte central del perfil de la ventana (lado monte)
* se identifico desgaste en poleas de las correas trapezoidales de las zonas rapidas especificamente en la entrada posiciones (1 a 30) y salida posiciones (30 a 1
* Durante la inspeccion se comprobo una falta de limpieza general en la plataforma electromecanica asi como en los componentes Mecanicos y electricos.

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA ESTACIONES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 19 MGO Ciudad Bolívar WAA0002668

Fecha: 03-06-16/04:06-16
Estacion: Juan Pablo II



	Descripción	Cantidad	No Existe	Mal estado	Observaciones
1	Armazon Portante (Viga de soporte, suspensiones)		X		Fisuras
2	Pasadores		X		Ausente - Faltante
3	Barandillas				
4	Escaleras		X		Ausente
5	Torniquete Armazon Portante	/			
6	Neumaticos Transportadores	/			
7	Chumaceras colgantes		X		Ausente
8	Cuerpos Transportadores	/			
9	Poleas de accionamiento de Motores PTO	/			
10	Poleas de entrada de estacion 400		X		Ausente
11	Poleas horizontales y verticales 500	/			
12	Balancines estacion lado ascendente	/			
13	Balancines estacion lado descendente	/			
14	Cuna Exterior (Triangular)	/	X		oxidación
15	Dispositivo de apertura y cierre de puertas	/			
16	Rieles Guia	/	X		oxidacion - Fisura
17	Rieles de Acoplamiento	/			
18	Rieles de Rodadura	/	X		Fisura.
19	Puesto de acoplamiento	/			
20	Poleas Tensoras			—	
21	Dispositivos de seguridad	/			
22	Sensores de control Geometrico	/			
23	Seguros de pino	/			
24	Barreras de control de acceso	/			
25	Capilla de mantenimiento	/			
26	Dispositivo elevador de neumaticos			—	
27	Mats Resistivos Nord			—	
28	Arbol de Tensión			—	
29	Arboles Articulados			—	
30	Frenos Morningroff			—	
31	Sensores fuerza de apriete	/			
32	Barras puesta a tierra	/			
33	Armario de puertas	/			
34	Armario de tuberias	/			
35	Armario Baja tensión	/			
36	Tableros de control Auxiliares	/			
37	Volante Motriz o Reenvio			—	
38	Revestimiento de Volante			—	
39	Dispositivo de Posicion Volante			—	
40	Dispositivo de tensión Volante			—	
41	Corona Dentada			—	
42	Reductor principal			—	
43	Reductor de velocidad			—	
44	Motor Principal			—	
45	Motor de Respaldo			—	
46	Bomba Eje			—	
47	Frenos de emergencia			—	
48	Frenos de servicio			—	
49	Agujas de emisión			—	
50	Armario de accionamiento de emergencia			—	
51	Unidad hidraulica para dispositivo de tensión de cable			—	
52	Cama tensor			—	
53	Cilindro Hidraulico 1			—	
54	Cilindro Hidraulico 2			—	
55	Sistema hidraulico de emergencia			—	
56	Motor de emergencia Cummins			—	
57	Transmision de Maniobra	/			
58	Generador Termomagnetico			—	
59	Unidades LED (perfil)				
60	Detectores Riesgo de Trabajo	/			
61	Rieles Protectores	/			
62	Puerta Emisión, Ventanas Domo, Pintura Domos		X		Ausente
63	Techado Domo		X		Ausente.
64	Humidificador estación	/			
65	Tablero caja de herramientas	/			

Observaciones Generales: 1 rollo tornillo de 12 tapa de acero al balanza vertical #7 salido desc 7. Pasante es el canal de las 4 polea 7 garganta; chumacera #96 salida ax. Presento exido alabe y pulido de lubricante pasante en el canal de las poleas sentido ascendente # 1, 16, 61, 68, 80, 90, 89, 95 y 96. Lado descendente # 10, 20, 01, 11, 83, 89 85, 86.
10 Pasante guarnicion Polea 400 sentido ascendente posicion #1. Ultima entrada descendente Presenta desgaste en las guardiciones de las 93 Poleas 400, se sugiere desmontarlas y en la Polea 1 en su Tipo Tolva presenta desgaste.
14-16. Cambiar de las uniones del rial guia y la trompeta, entrada ascendente y descendente 18 Fisura en el riel de rodadura Posicion # 68 lado ascendente, en el punto de medicion MP 1 se evidencia marca de desgaste en su cabeza de soldadura.
12. Fisuras en tornillos Tipo del domo lado ascendente Posiciones # 1, 11, 21, 18, 32, 47, 51, 54, 65, 68, 72, 76, 89, 93, 96. Lado descendente # 7, 18, 32, 39, 51, 61, 71, Fisura en la base union con el almacen lado ascendente armazon # 3 y 4 lado descendente Armazon # 7, 8 existe en bilz posiciones # 12, 58 y 91 lado descend falta tornillo cuarta manilla Individuales posicion #89 ascendente Fisuras de lado a lado
—Continua en el reverso—

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
Andres Alvarado	1.000.627.082	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jair Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL	
Bernardo Yamy	1090227655	ODT	

GS Falla escalera de acceso a claraboya lado valle; dispositivo de apertura de claraboyas lados valle y monte presentan perdida de pintura.
cabeza de guaya PARCIALMENTE con oxidación y mal enrollada; soporte de plasticos desprendidos de la cubierta (lineas peligrosas); Silicona de Juntas de domo en mal estado se evidencia filtraciones; Base de linea de vida fuera de su posición original.

4 Guardas de seguridad sentido descendente presentan rotura # 4 y 8 (Lateral) sentido ascendente # 1 y 16.
Falta señaletica baño EB Ascendente y Ext descendente

6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO ID 11510047 (JUAN PABLO II)

Las piezas de recambio siguientes sirven para la conservación del paso por la estación:

Designación	Cantidad	Número de artículo
Apoyo por Accionamiento de fricción	2	10745749
Polea de fricción dia. 500 sin eje	1	10686616 10686614
Unidad de rodillo tensor para correa trapezoidal en accionamiento por rueda de fricción	1	10681429
Correa trapezoidal CC/HCC LREF = 6150 mm	3	10275085
Polea 403 LW 93 dia. 435	1	10847598
Polea 500 dia. sin eje	1	10686697
Polea H 500 LW100 dia. 505	1	11200291
Polea V 500 LW100 dia. 505	1	11200310
Cojinetes de neumáticos transportadores dia. 40	2	10680725
Rudea neumáticos completos "Doppelmayr-G"	5	10622234
Correa trapezoidal XPC LA = 1870 mm	2	10067767
Correa trapezoidal XPC LA = 1900 mm	5	10082482


* Neumáticos completos Pero usados.

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA ESTACIONES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA55025SS

Fecha: 04-06-2026
Estación: Manitas

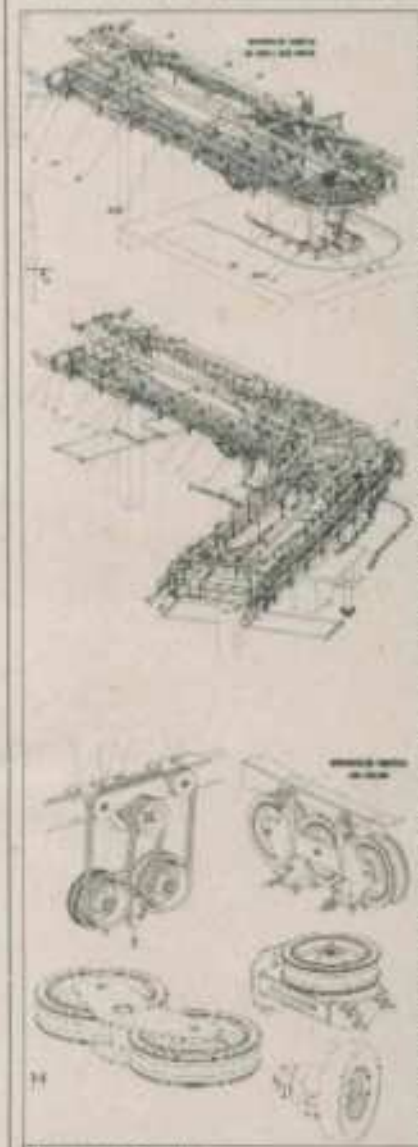

		Condiciones	No Aplica	Observaciones
1	Arranque Portante (Tomar de apoyo de suspensión)	✓		
2	Horquillas	✓		
3	Garganchos	✓		
4	Cuadrilla	✓		
5	Tensión a Arrastre Portante	✓		
6	Neumáticos Transportadores	✓		
7	Portagarras/rodillos	✓		
8	Correas Transportadoras	✓		
9	Poleas de accionamiento de tracción PTD		X	
10	Poleas de entrada de cabezas MCE		X	
11	Poleas horizontales y verticales DTD	✓		
12	Rodamientos estación sala accionamiento		X	
13	Rodamientos estación sala desviadora		X	
14	Vías Exterior (Trampolín)	✓		
15	Dispositivo de apertura y cierre de puertas	✓		
16	Rieles Guía	✓		
17	Rieles de Acoplamiento		X	
18	Rieles de Portadura	✓		
19	Puente de acoplamiento	✓		
20	Poleas Tensoras		X	
21	Dispositivo de seguridad	✓		
22	Sensores de control Geométrico		X	
23	Seguros de pasa	✓		
24	Barra de de control de botones	✓		
25	Cepillo de acoplamiento	✓		
26	Dispositivo elevador de horquillas		X	
27	Vías Retorno Interior Nivel	✓		
28	Arbol de Tracción	✓		
29	Ejes Articulados	✓		
30	Frenos Mecánicos	✓		
31	Sensores Fuerza de apriete	✓		
32	Barras anclaje a tierra	✓		
33	Armario de control	✓		
34	Armario de baterías	✓		
35	Armario Baja tensión	✓		
36	Tablero de control Auxiliares	✓		
37	Voltajes Motor y Reductor		X	
38	Amperímetro de Motores		X	
39	Dispositivo de Protección Térmica	✓		
40	Dispositivo de presión Hidráulica	✓		
41	Cámara Terminales	✓		
42	Botonera principal		X	
43	Radio con de repetidor	✓		
44	Motor Principal		X	
45	Motor de Respaldo		X	
46	Bomba Aux	✓		
47	Frenos de emergencia	✓		
48	Frenos de servicio	✓		
49	Agujas de extracción	✓		
50	Armario de accionamiento de emergencia	✓		
51	Unidad hidráulica para dispositivo de tensión de cable	✓		
52	Cuna tensor	✓		
53	Circuito Hidráulico 1	✓		
54	Circuito Hidráulico 2	✓		
55	Sistema hidráulico de emergencia	✓		
56	Motor de emergencia (Gasolina)	✓		
57	Transmisión de maniobra	✓		
58	Generador Termoplastico		X	
59	Inversores (2) (control)		X	
60	Selectores Sistema de Traslado		X	
61	Radios Portacintas	✓		
62	Rodillos Empuje, Semillero Guías, Pinzas Cierres	✓		
63	Cadenas Cierre	✓	X	
64	Iluminación cabinas	✓		
65	Estado cajas de herramientas		X	

Observaciones Generales:

9. Poleas con desgaste descendente.
- Poleas 1 cambiar con desgaste en forma de medialuna
Polea 15 externa con desgaste.
Polea 18 interna con desgaste.
Polea 19 interna con desgaste.
Polea 20 externa con desgaste.
Polea 21 externa con desgaste.
Polea 39 interna con desgaste.
Polea 40 interna con desgaste.
Polea 95 externa con desgaste.
Polea 96 externa con desgaste.
Polea 99 externa con desgaste.
Polea 100 externa con desgaste.
Polea 101 externa con desgaste.
Polea 102 interna con desgaste.

Información datos participantes

Nombre:	Número de identificación	Entidad	
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier Ortiz	1098806421	CABLEMOVIL	
Brayan Perez	1090227654	ODT	

Item 22 Daño en posición 9 descendente presenta tuerca floja.

Item 26 se evidencia protector de manómetro faltante.

Item 33 armario AI+058 conectada 50AI falta tornillo de ajuste de acometida
95AI falta tornillo de ajuste de acometida

Item 42. tomacable con fuga

Item 44. golpe en tapa de motor ventilador (manual).

Item 45 motor de repuesto aún se encuentra en repuestos.

Item 59 dispositivo de purga # 1 ascendente fuera de servicio.
dispositivo de purga # 1 descendente fuera de servicio

Item 60 se evidencia faltante de pines de bloqueo de seguridad entre ascendente y descendente.

Item 62. tornillo de hongo inferior (falta).

Item 63. -soportes plásticos de línea de purga-cuerpos sistema ascendente. en mal estado
-soportes plásticos de línea de purga-cuerpos lado valle en mal estado.
- Tornillería en estado de cuerpos línea purga-cuerpos sistema ascendente. con oxidación
- Faltante de 3 columna en junta de daño zona superior lado valle.
- columna cuerpos línea purga-cuerpos lado valle presenta oxidación en tornillería y acoplación en soldadura central. y pelusilla en la punta superior de la columna.

Item 65. objetos de cuyo dañados.

- Falta punto de medición MPV ascendente y descendente.

- Guardas de seguridad.
  posición # 2 ascendente con fisura.
  posición # 4 ascendente fisura inferior
  posición # 7 ascendente con fisura superior
  posición # 16 ascendente con fisura superior
  posición # 19 ascendente con fisura superior e inferior.

- Señaletica poclain.
  señalectica # 1 poclain se encuentra con arnese falta tornillo.
  señalectica # 2 poclain le falta un tornillo.

- 38 se identifica desgaste y ausencia de un trozo de revestimiento splomatico

- Seccionador.
  se identifico una alerta en la caida del interruptor SF6-CP, donde el visor frontal muestra el LED rojo iluminado (TRIPLO). Esto indicado refiere a una orden de apertura del interruptor provocada por corriente residual, lo que señala la existencia de una falla a tierra en los equipos ubicados aguas abajo.

4 LISTA DE HERRAMIENTAS ID 11430975

Designación	Cantidad	Número de artículo
Riel de grúa con carro grúa	1	10527785
Aparejo de cadena, carga útil 1,0 t	1	10759701
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	11517302
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	11517308
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	11517322
Amoladora angular	1	11430980
Discos lijadores	5	10017270
Carril guía de recambio	1	10943404
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	2	11434962
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
* Cable de poliamida, diámetro 12 mm, longitud 70 m	1	10529696
Polea inv. SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909

no no 1 en stock

* Cable poliamida incompleto.

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA ESTACIONES


Datos de la instalación

Nombre del sistema: III MSD Ciudad Bolivar WA40002668

Fecha: 07-06-16 / 08-06-16

Estación: MIRADOR

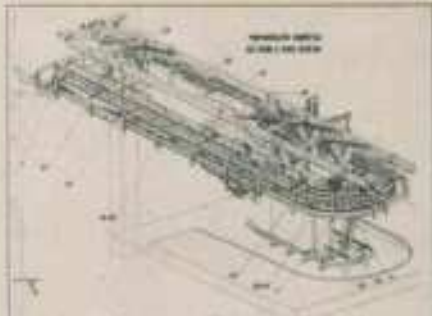

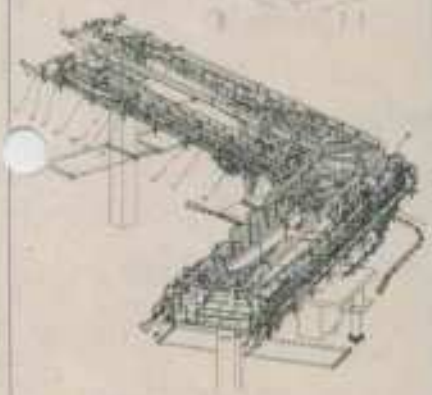



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO Aplica	Observaciones
1	Armazon Portante (Vigas de soporte, tubo estructural)	X			
2	Plataformas	X			
3	Barandillas	X			
4	Escaleras	X			
5	Torniteria Armazon Portante	X			
6	Neumaticos Transportadores	X			
7	Chumaceras Inferiores		X		
8	Correas Transportadoras	X			
9	Poleas de accionamiento de tension PTO		X		
10	Poleas de entrada de estacion 400		X		
11	Poleas horizontales y verticales 500	X			
12	Balancines estacion lado ascendente	X			
13	Balancines estacion lado descendente	X			
14	Guia Exterior (Trompeta)	X			
15	Dispositivo de apertura y cierre de puertas	X			
16	Riel/ Guia		X		
17	Rodas de Acoplamiento	X			
18	Rodas de Rodadura		X		
19	Pulsador de accionamiento	X			
20	Poleas Tensoras		X		
21	Dispositivos de seguridad	X			
22	Sensores de control Electronico	X			
23	Detector de paso	X			
24	Barreras de control de acceso	X			
25	Cuarto de amortiguacion	X			
26	Dispositivo elevador de neumaticos	X			
27	Motor Reductores Front		X		
28	Arbol de Torsion			—	
29	Arboles Articulados			—	
30	Frenos Monoghoff			—	
31	Sensores fuerza de apriete	X			
32	Barras puerta cabina	X			
33	Amarre de cuerpo	X			
34	Amarre de talonera	X			
35	Amarre Base talonera	X			
36	Tableros de control Auxiliares	X			
37	Volante Motriz o Reales		X		
38	Revestimiento de Volante	X			
39	Dispositivo de Posicion Volante	X			
40	Dispositivo de bloqueo Volante	X			
41	Corona Dentada	X			
42	Reductor principal			—	
43	Reductor de regulado			—	
44	Motor Principal			—	
45	Motor de Respaldo			—	
46	Bomba Eje	X		—	
47	Frenos de emergencia			—	
48	Frenos de servicio	X			
49	Aguas de talonera	X			
50	Amarre de accionamiento de emergencia	X			
51	Unidad hidraulica para dispositivo de tension de cable	X			
52	Dado tensor	X			
53	Cilindro Hidraulico 1	X			
54	Cilindro Hidraulico 2	X			
55	Sistema hidraulico de emergencia	X			
56	Motor de emergencia (Diesel)	X			
57	Transmision de impulsion	X			
58	Operador Tensometro	X			
59	Unidades UI puertas	X			
60	Sensores Seguro de Talleres	X			
61	Rodas Preparadas	X			
62	Cuarto Estacion, torniteria Diente, Primera Dentada		X		
63	Tacheado Diente	X			
64	Sumergidor estacion	X			
65	Equipo caja de herramientas	X			

Observaciones Generales: 7. Ambas poleas 7 presentan desgaste en su canal. Poleas de chumaceras presentan desgaste, todo entrada: Polea 1 canal interno, Polea 2 ambas, Polea 7 ambas, Polea 9 canal interno, Polea 10 canal externo, Polea 12 canal externo, Polea 13 ambas, Polea 14 ambas, Polea 15 ambas, Polea 16 canal externo, Polea 27 canal externo, Polea 28 canal externo, Polea 30 canal externo. Caso SOLIDO: Polea 5 canal externo, Polea 9 canal interno, Polea 11 canal externo, Polea 12 canal externo, Polea 19 canal externo. • continua siguiente pagina

9. Correa PTO todo alrededor presenta desgaste en forma externa con fisura.

10. Polea Apoyo Posicion #3 salida presenta desgaste en su numeracion

11. Riel guia Posicion # 15 descendente presenta fisura.

12. Riel de rodadura en Posicion # 2 entrada presenta fisura

20. Poleas de motor # 1 y 3 de regulacion Presentan desgaste y las de apoyo (chumaceras) Poleas Tensoras que presentan desgaste en su canal y no son del fabricante. #1-2 superior no corresponde inferior con desgaste, #2-3 ambos con desgaste, #4-5 superior no corresponde e inferior con desgaste, 5-6 superior no corresponde, 6-7 superior no corresponde e inferior con desgaste, 7-8 ambos no corresponden.

Continua en la siguiente Pagina

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Entidad	Firma
ANDRES ALBARRACIN	1030 627 092	TRANSMILENIO SA	
ELKIN JAMES O.	1095 806 481	CABLEMOVIL	
		ODT	

5 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO ID 11512750 (ILLIMANI, PORTAL DEL TUNAL)

Las piezas de recambio siguientes sirven para la conservación del paso por la estación:


Designación	Cantidad	Número de artículo	
Apoyo por Accionamiento de fricción	2	10745749	
Polea de fricción dia. 500 sin eje	1	10686616 10686614	
Unidad de rodillo tensor para correa trapezoidal en accionamiento por rueda de fricción	1	10681429	
Correa trapezoidal CC/HCC LREF = 6150 mm	3	10275085	
Polea 403 LW 93 dia. 435	1	10847598	
Polea 500 dia. sin eje	1	10686697	
Polea 403 LW 93 dia. 430	1	11304607	FALTA.
Cojinetes de neumáticos transportadores dia. 40	2	10680725	
Cojinetes de neumáticos con embrague KI	1	11049893	
Cojinetes de neumáticos con embrague KA	1	11050119	
Rudea neumáticos completos "Doppelmayr-G"	5	10622234	
Tensor de correas 14 grados	1	10861414	Poleas No Corresponden
Tensor de correas largo 14 grados	1	11058370	
Correa trapezoidal XPC LA = 1850 mm	1	10360353	
Correa trapezoidal XPC LA = 1900 mm	5	10082482	4 en stock
Correa trapezoidal XPC LA = 1960 mm	2	10388513	
Correa trapezoidal XPC LA = 2000 mm	1	10217238	
Correa trapezoidal XPC LA = 2080 mm	1	10567647	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
ESTACIONES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 14-06-2016
Estacion: Garaje/Parking

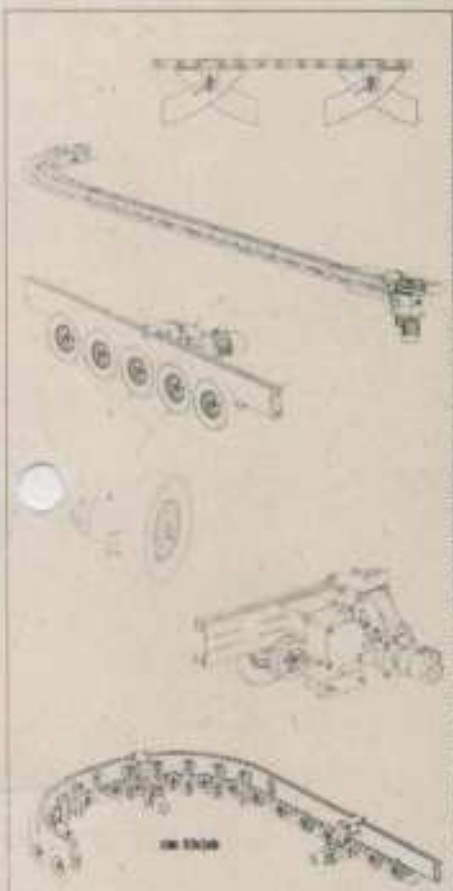

Descripción	Contrarios	No Contrarios	NO aplica	Observaciones
1 Rieles de Posicion	X			
2 Rieles Guia	X			
3 Armazon Portante / Vigas de soporte Parking	X			
4 Torniqueta armazon portante	X			
5 Transportador BF1_2 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
6 Transportador F01 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
7 Transportador BF1_1 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
8 Transportador BF1 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
9 Transportador F1 (Correas, neumaticos y motoreductor)		X		
10 Transportador BF2_2 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
11 Transportador F02 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
12 Transportador BF2_1 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
13 Transportador BF2 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
14 Transportador F2 (Correas, neumaticos y motoreductor)		X		
15 Transportador BF3_2 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
16 Transportador F03 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
17 Transportador BF3_1 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
18 Transportador BF3 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
19 Transportador F3 (Correas, neumaticos y motoreductor)		X		
20 Transportador BF4 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
21 Transportador BF4 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
22 Transportador F4 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
23 Transportador BF5_2 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
24 Transportador BF5_1 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
25 Transportador BF5 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
26 Transportador F01 (Correas, neumaticos y motoreductor)		X		
27 Transportador F02 (Transportador de cadena y motoreductor)	X			
28 Transportador F03 (Correas, neumaticos y motoreductor)		X		
29 Transportador F04 (Transportador de cadena y motoreductor)	X			
30 Transportador FA1 (Transportador de cadena y motoreductor)	X			
31 Transportador FA2 (Correas, neumaticos y motoreductor)	X			
32 Transportador FA3 (Transportador de cadena y motoreductor)	X			
33 Transportador FA4 (Correas, neumaticos y motoreductor)		X		
34 Agua M1	X			
35 Agua M2		X		
36 Agua M3	X			
37 Agua M4	X			
38 Agua M5	X			
39 Sensores	X			
40 Plataforma de mantenimiento Estado General	X			
41 Agua provisoria de la plataforma de mantenimiento	X			
42 Tablero de control Parking	X			
43 Tableros Auxiliares Parking	X			
44 Barandillas plataforma de mantenimiento	X			
45 Escalera Plataforma de mantenimiento	X			
46 Torniqueta Plataforma de mantenimiento	X			

Observaciones Generales: 9- Se evidencia la presencia de Fisuras y Microfisuras en las celdas trapezoidales ubicadas de la 1 a la 15.

14. Se identifica celdas en mal estado posiciones 10 11.

19. Se evidencia fisuras y microfisuras en varias posiciones 9 a la 15

20. Se evidencian fisuras y microfisuras en celdas posiciones 5 a la 9.

28. Se evidencian fisuras y microfisuras en varias posiciones 11 y 12. se observo desalineado la polea tensora

33. Se evidencia fisuras y microfisuras en varias posiciones 1 a la 6

35. Se evidencia cabina Fuera de Servicio.

Se identifica de fisuras bajo (grieta) tipo de rodadura, específicamente transportador F3.

Se identifican deformacion de la estructura riel guia, tensa, y solida a nivel F1 y F3 F2 en la solida F01 en la salida y entrada de las transportadoras FA3 y FA4.

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760231	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javier Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL	
Carlos E. Rojas J	1254646	ODT	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: C001

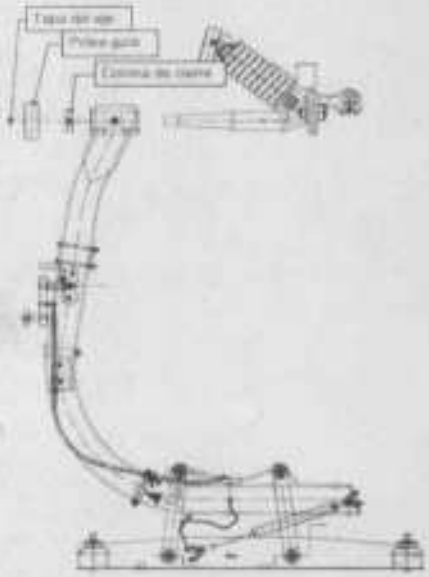

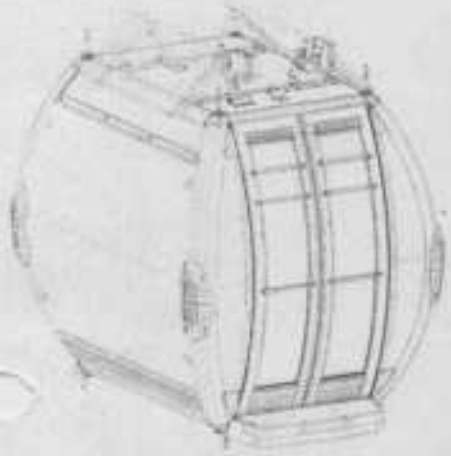

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Accionamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Nueva
6	Mordaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			Nuevo
10	Freno de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tejaños	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		Desgaste Rotula
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras, Abolladuras columnas
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladura Estribos Emergencia
42	Puerta derecha		X		Peladura Estribos Emergencia
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladura Perfil Delantero
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de Identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes Ortiz	1095906428	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 0002

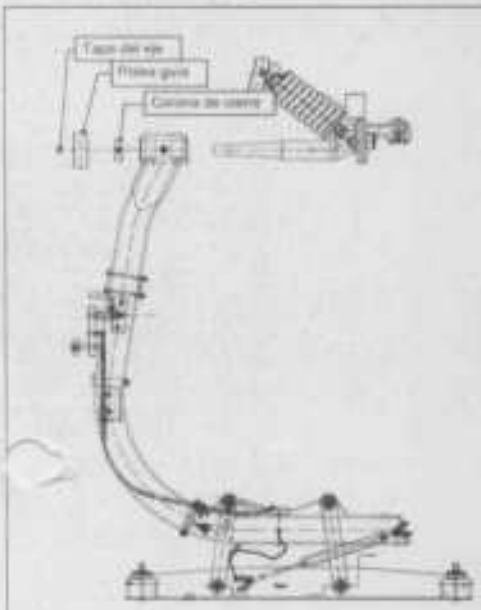



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Nueva
6	Mordaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			Nueva
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tenefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Ptladuras columnas Esquineras
27	Pintura interior Cabina		X		Ptladuras columnas Esquineras
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera		X		Seguro Arreglo.
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Ptladuras Estribos Esquineros
42	Puerta derecha		X		Ptladuras Estribos Esquineros
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Zocalo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			Ptladuras Panel Delantero
47	Armenas Wilan y soportes armenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053517774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaims Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	Elkin Jaims
Johan Dario Delgado	1095818209	O.D.T	Dario D

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 6003

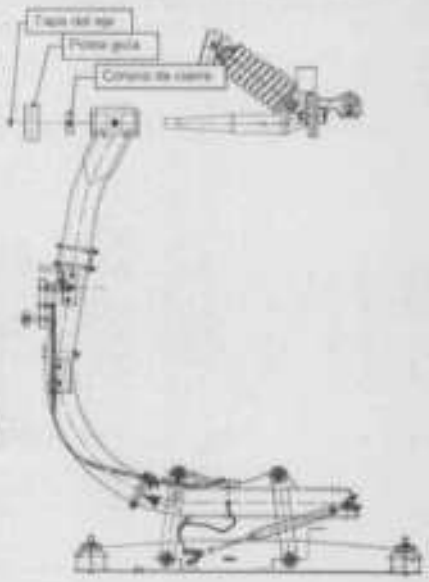



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Nueva
6	Mordaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			Nueva.
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension III	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Pedazos/Abolladuras Colmos Esq.
27	Pintura interior Cabina		X		Pinturas columnas Esquineros
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Ajustar Esquinero.
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintadura Estribos Entrada
42	Puerta derecha		X		Pintadura Estribos Entrada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Pintadura Techo Delantero
47	Amarres Wiski y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de Identificacion:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduza	1053517774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dairo Delgado	1095819209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 0004

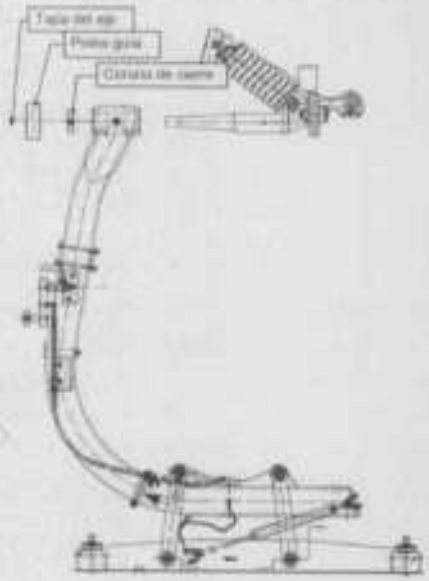



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil		X		Desgaste
6	Horquilla fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal horquillas		X		Desgaste
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladro	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Patines de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Pinturas Columnas Ejes
27	Pintura interior Cabina		X		Pinturas Columnas Ejes
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Acrilico Rayado
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guitarra derecha	X			
39	Ventana de guitarra trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pinturas Estados Ejes.
42	Puerta derecha		X		Pintura Estados Ejes.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina				Rodura Piso Pintura
47	Antenas Wan y soportes antenas	X			
48	Llanta de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tilado Z4	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Erik Javier Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095313709	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 0005

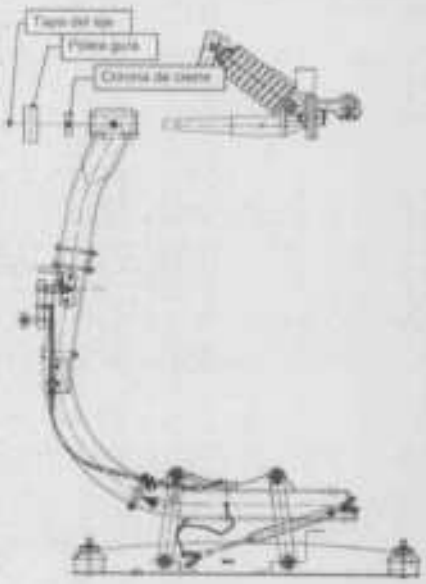

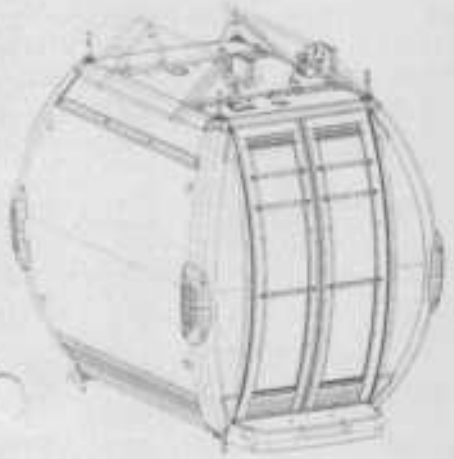

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleo de Acoplamiento	X			
2	Poleo de Rodadura delantera	X			
3	Poleo de Rodadura trasera	X			
4	Poleo Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Nueva
6	Mordaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			Nuevo
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Paladares/Abatibles/Columnas
27	Pintura interior Cabina		X		Abatibles Columnas Esquinas
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Gomas Rotas
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Acrilico Fisurado
32	Acrilico Lateral		X		Acrilico Fisurado
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta Izquierda		X		Taladros Estirados Enrej.
42	Puerta derecha		X		Taladros Estirados Enrej.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Taladros Techo Delante
47	Antenas Wan y soportes antenas	X			
48	Listón de rozamiento	X			
49	Pinza de transporte	X			
50	Grilla delantera	X			
51	Grilla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza M	1053512744	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jair Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2016

Numero Cabina: C 006

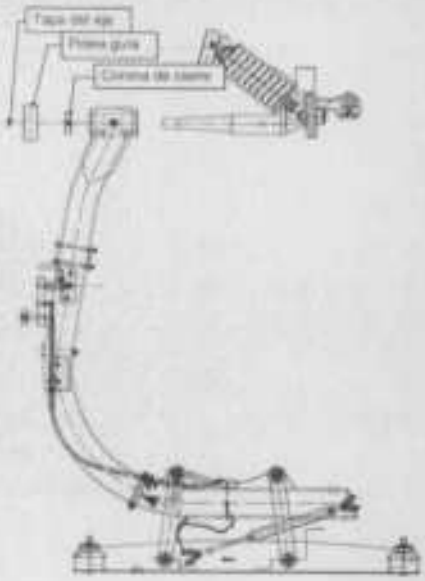



	Descripción	Cantidad	No Contiene	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Nuevo
6	Mordaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			Nuevo
10	Perno de Fricción	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taloñas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Estructura Columnas Esquinero
27	Pintura Interior Cabina		X		Estructura Columnas Esquinero
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Fuertes	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		?		Acrilico Trasero
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Estructura Estribo Ensa.
42	Puerta derecha		X		Estructura Estribo Ensa.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Estructura Perfil Principal
47	Antenas Wian y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512744	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jair Ortiz	1095800648	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 2007

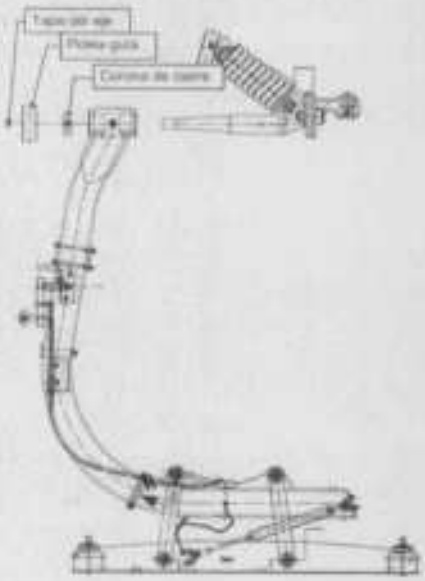



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Perno de Fricción	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telaña+	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Pintura Columnas Fuera
27	Pintura interior Cabina		X		Pintura Columna Dentro
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Cambio Puertas
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintura Fondo Fuera
42	Puerta derecha		X		Pintura Fondo Fuera
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Pintura Perf Pintura
47	Antenas Wlan y soportes antenas		X		Conexion con remenda
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jave Ortiz	1045806148	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daza Delgado	1095813209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002686

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 008.

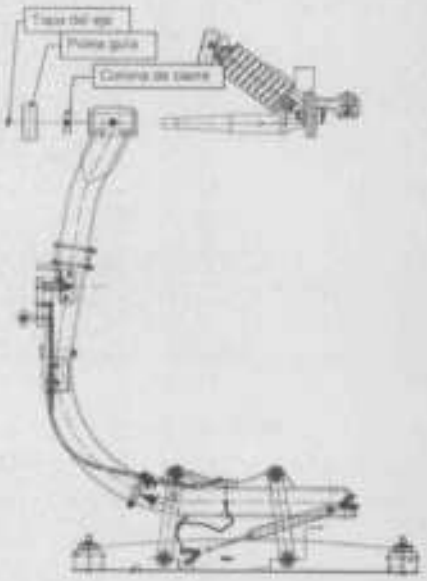



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas				Desgaste
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2		X		Pintura Exterior Fisura
26	Pintura exterior Cabina		X		Pintura Exterior Fisura
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Señaletica Faltante
32	Acrilico Laterales	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintura Estribos Fisura
42	Puerta derecha		X		Pintura Estribos Fisura
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Color Distinto Perfil
47	Anteojos Wian y soportes anteojos	X			
48	Ustion de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Señaleticas internas cabina dicen Rolita

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053574744	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose ortiz	1043806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan David Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 0009

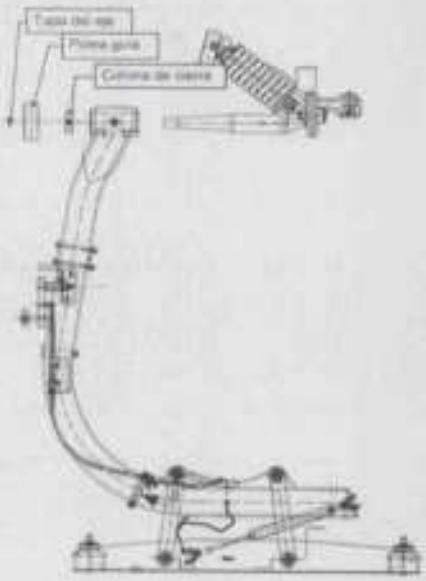



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil		X		Pinguete Desgaste
6	Montaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste
10	Toro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tesfias	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Platinas Columnas Esquinas
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Arrollo Fisurado.
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintura Estribos Emergencia
42	Puerta derecha		X		Pintura Estribos Emergencia.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wifi y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1043512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jays Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	Elkin
Johan Dario Delgado	1095819209	O.D.T	Dario D.

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: 2016

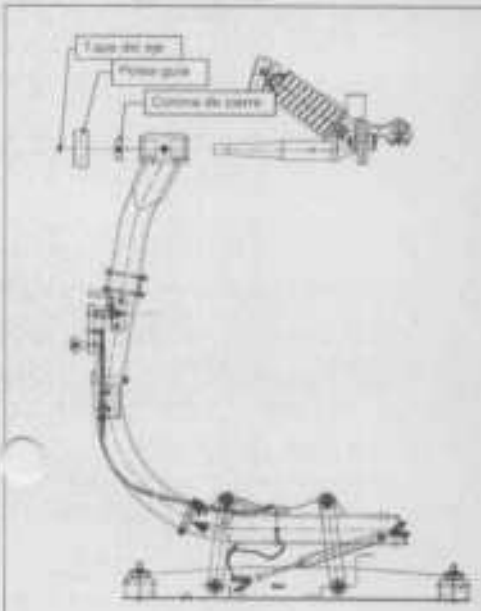



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste.
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (1)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Riela derecha 1	X			
23	Riela derecha 2	X			
24	Riela izquierda 1	X			
25	Riela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Externas Esquinas
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Externas Esquinas
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Acrilico Rayado
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribo Enrig
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribo Enrig
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladuras Area Delant
47	Antenas Wifari y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo Ortiz	1095808481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dairo Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: C011

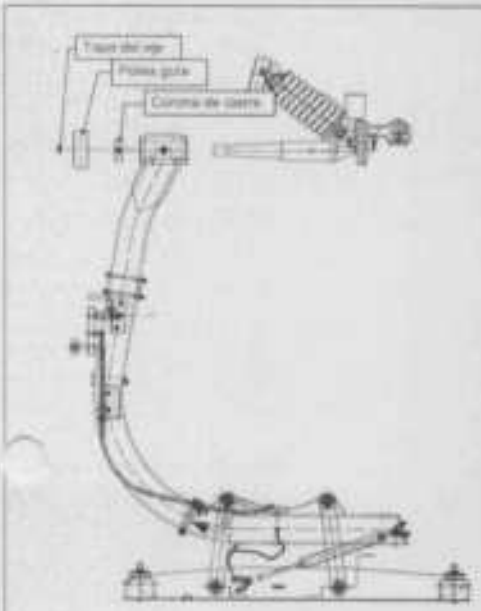

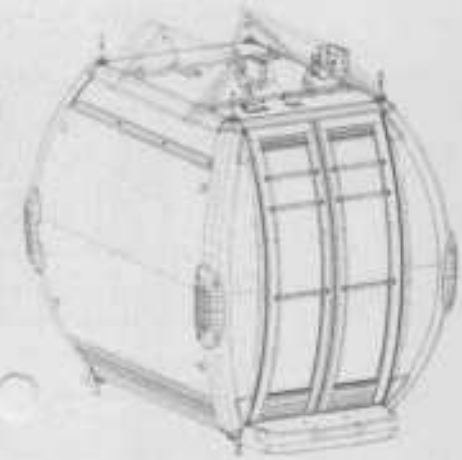

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste
10	Perno de Pinzajon	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Columna Esquina
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladura Estribo Esquina
42	Puerta derecha		X		Peladura Estribo Esquina
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladura Piso delantero
47	Antenas Wifi y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel lateral delantero	X			
53	Panel lateral trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jair Ortiz	1049580648	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095918209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 19-05-2024

Numero Cabina: C013

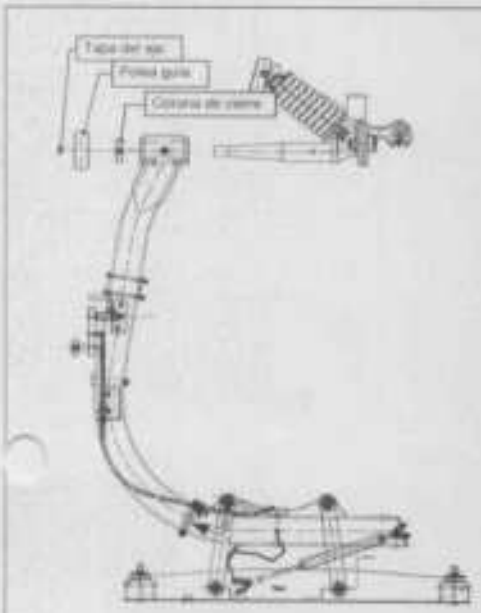



	Descripción	Cantidad	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaua Movil		X		Desgaste
6	Montaua fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Carro montaua		X		Desgaste
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Laterales Izquierda
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Acrilico Fisurado
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladura Estribo Entrada
42	Puerta derecha		X		Peladura Estribo Entrada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladura Parcial delantera
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jars Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095813709	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002686

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: C013

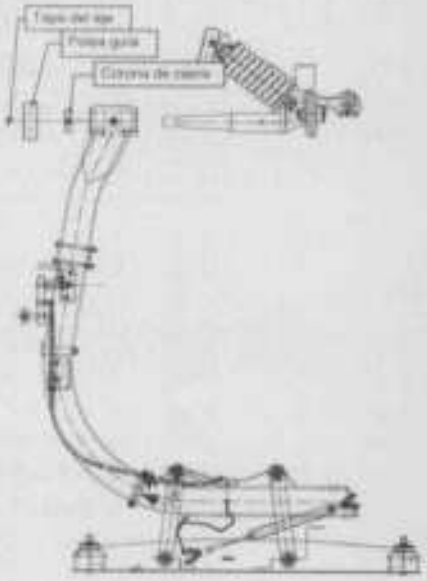



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleas de Acoplamiento	X			
2	Poleas de Rodadura delantera	X			
3	Poleas de Rodadura trasera	X			
4	Poleo Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste Desgaste
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste.
10	Foro de Fricción	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspensión (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tacaños	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Piladuras Colmenas Esqu.
27	Pintura Interior Cabina		X		Piladuras Colmenas Esqu.
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Laterai	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Piladuras Estriba Energ
42	Puerta derecha		X		Piladuras Estriba Energ
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Ambiente Grafy Adhido
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero				

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512724	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose Ortiz	1095866481	CABLEMOVIL SAS	
Johan David Delgado	1035813299	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 19-05-2026

Numero Cabina: C014

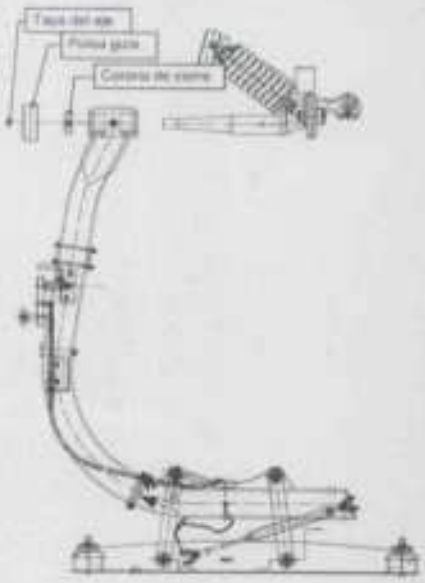



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleа de Acoplamiento	X			
2	Poleа de Rodadura delantera	X			
3	Poleа de Rodadura trasera	X			
4	Poleа Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste.
7	Rasorte principal izquierdo	X			
8	Rasorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste
10	Foro de friccion		X		Fisurado
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tenaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquinas
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Vidrio Trasero Rayado-Sucio
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribos Esquinas
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribos Esquinas.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Esmbo	X			
45	Esmbo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Bloadura Piso Techo
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Informacion de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jair ortiz		CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095818207	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 20-05-2026

Numero Cabina: C015

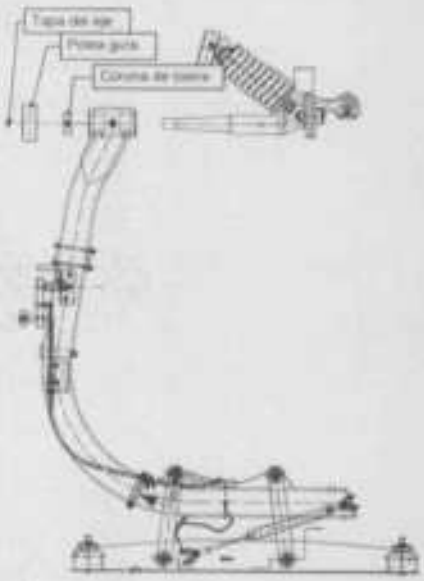



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordaza		X		Desgaste
10	Perno de Friccion		X		Fisurado
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (1)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tenefles	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquin
27	Pintura Interior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquin
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		V		Retoc para Impermeab Piso/Tapa
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribos Esquineros
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribos Esquineros
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladura Techo Delantero
47	Antenas Wlan y soportes anteras	X			
48	Lazon de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053517774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jair ortiz		CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095813203	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 20-05-2026

Numero Cabina: C016

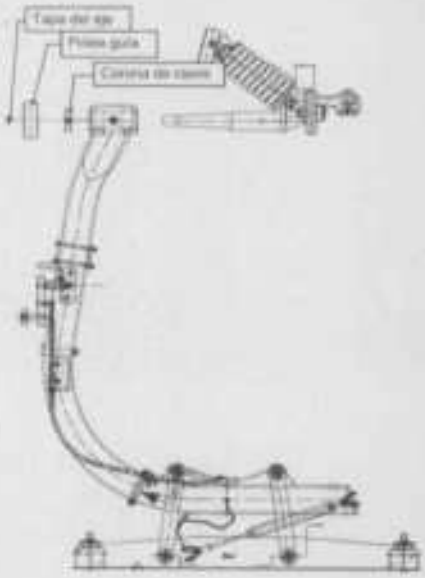



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Cana mordaza		X		Desgaste.
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Clavo	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taleflas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peloduras Columnas Inferior
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquineras
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Vidrio Frontal Rayado Este
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Vidrio Trasero Rayado Este
32	Acrilico Lateral				
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera		X		Rayado.
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribos Entrada
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribos Entrada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Escobillas. limite desgaste

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elver Josh ortiz	1049806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dairo Delgado	1095819209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 20-05-2026

Numero Cabina: 5017.

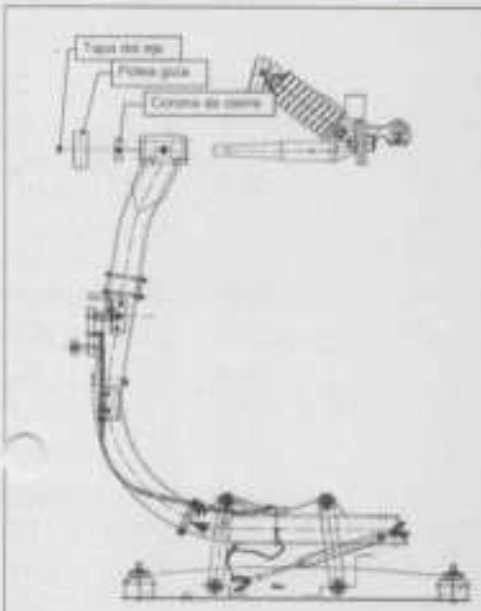

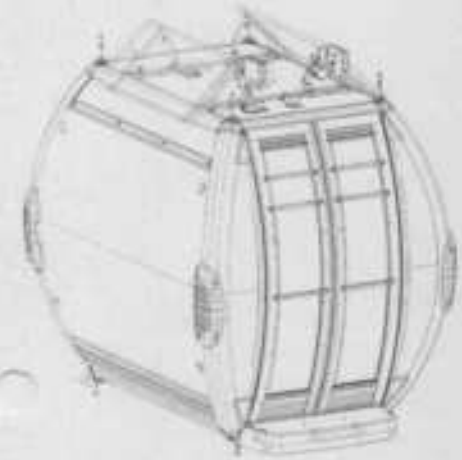

	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil		X		Desgaste
6	Montaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montazas		X		Desgaste
10	Perno de Friccion		X		Fisurado.
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Podillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tenallas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquinas
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquinas
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Vidrio frente rayado Gotas
31	Acrilico o vidrio trasero		X		
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribos Soldg.
42	Puerta derecha		X		Peladuras estribos Soldg
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wifi y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Escobillar limite Desgaste

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elver Jose ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095819209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 20-05-2016

Numero Cabina: 2018

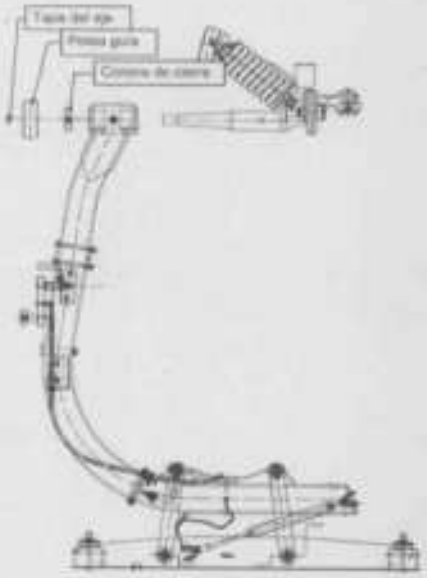



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tenaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladura Columnas Esquineros
27	Pintura interior Cabina		X		Peladura Columnas Esquineros
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Rota Izquierda Puerta Izquierda
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilicos Laterales	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribos Guias
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribos Guias
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladura Perfil Delantero
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Escobillas limite de Desgaste

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095913209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 20-05-2026

Numero Cabina: 2019

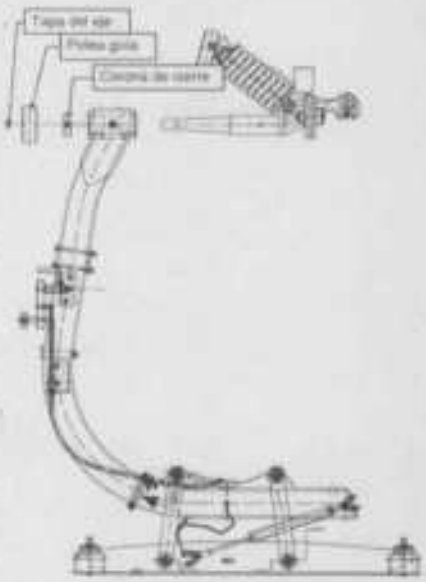



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil	X			
6	Montaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montazas	X			
10	Piano de Proceso	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension)))	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tetaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras / Abolladuras Cabina Sucia
27	Pintura Interior Cabina		X		Peladuras - Columnas Izquierda
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Ruta Ingreso - Derecha
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Rayadas Ruta Ingreso
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Abolladuras Estribo Sucio
42	Puerta derecha		X		Abolladuras Estribo Sucio
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Rayadas Pisos Pelados
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observacinnes Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin James Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	Elkin
Johan Dario Delgado	1075312202	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 2005-2026

Numero Cabina: 2070

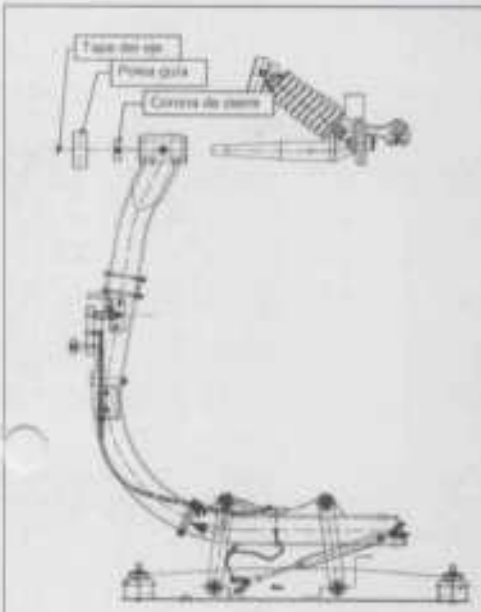



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Nueva
6	Mordaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montaza	X			Nueva
10	Forro de Frenten	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Colores Figuras
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Colores Figuras
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estado Fatig.
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estado Fatig.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Llavin de cojinamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin James Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daza Delgado	1095813207	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 2005-2026

Numero Cabina: C021

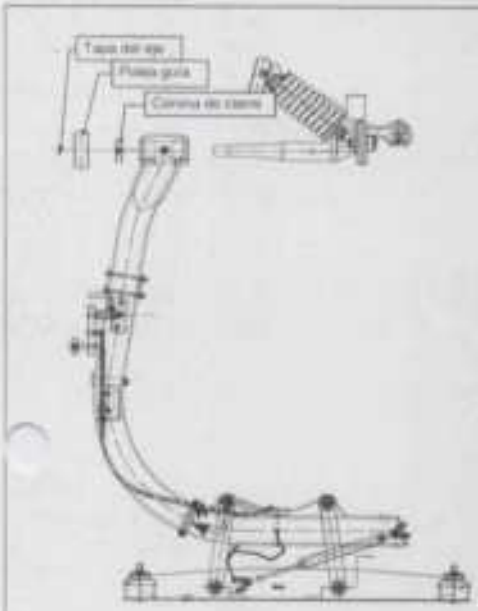



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Ajustar
6	Mordaza fija	X			Ajustar
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			Ajustar
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Columnas Izquierda
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Columnas Izquierda
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Falta Para Instalar Puerta
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Fisurado.
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribo Emergen
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribo Emergen.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Dombo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladuras Parte Delantera
47	Antenas Wan y soportes anteras	X			
48	Juego de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1055512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaime ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daza Delgado	1095818202	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 20-05-2026

Numero Cabina: C022

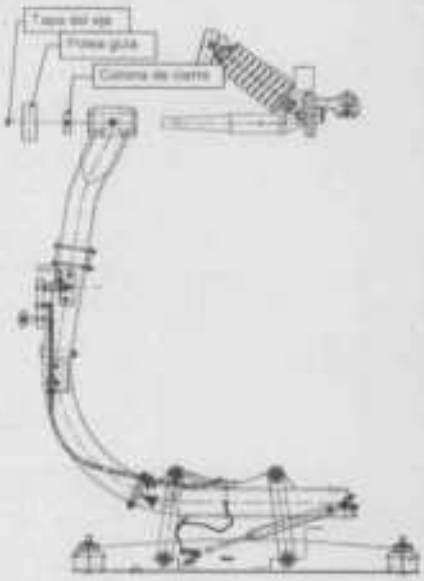



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquineros
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas				
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Rota parte inferior
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera		X		Rayado
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladura Estribo Cierre
42	Puerta derecha		X		Peladura Estribo Cierre
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladuras Perfil Divisorio
47	Antenas Wifi y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1055512774	TRANSMILENIO SA	
Elver Javier Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 20-05-2026

Numero Cabina: 2023

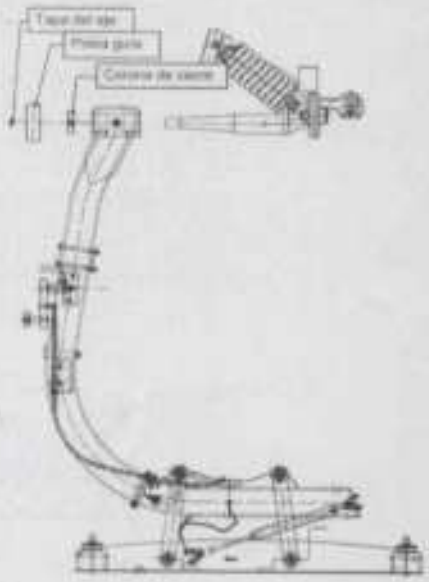



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil	X			Nueva
6	Montaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montaza	X			Nueva
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquinas
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquinas
28	Amortadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Goma Inferior Derecha/Izqu
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladura Estribo Entra
42	Puerta derecha		X		Peladura Estribo Entra
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladura Perfil Delantero
47	Antenas Wifen y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jara ortiz	1099806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daza Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 2025-7076

Numero Cabina: 6024

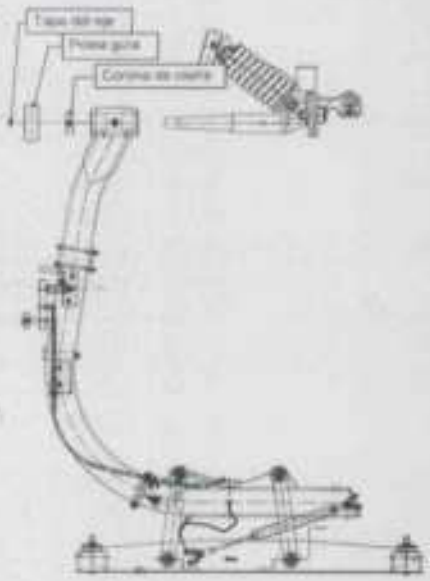



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste.
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladro	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Columnas Laguna
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribo Enganche
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribo Enganche
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Abolladuras / Peladuras Pisa / Diagonal
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elver Jaime Ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	Elver JO
Johan David Delgado	1093218709	O.D.T	David D

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002668

Fecha: 20-05-2026

Numero Cabina: C025

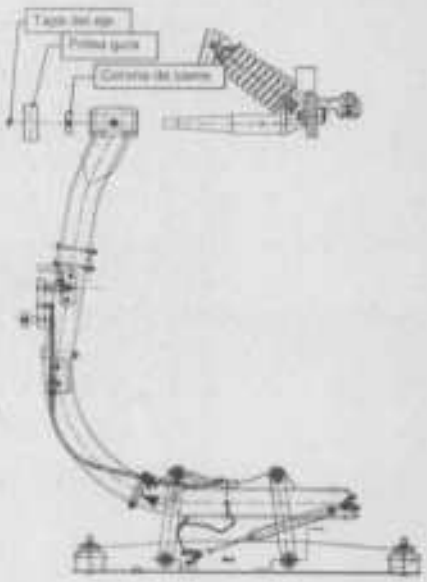



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montaase		X		Desgaste
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accioneamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura Interior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquineros
28	Aluminadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Rota Inferior Derecha
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Acrilico Rota Inferior Izq.
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y siguientes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes Ortiz	1075806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daza Delgado	1053183209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 21-05-2026

Numero Cabina: 2026

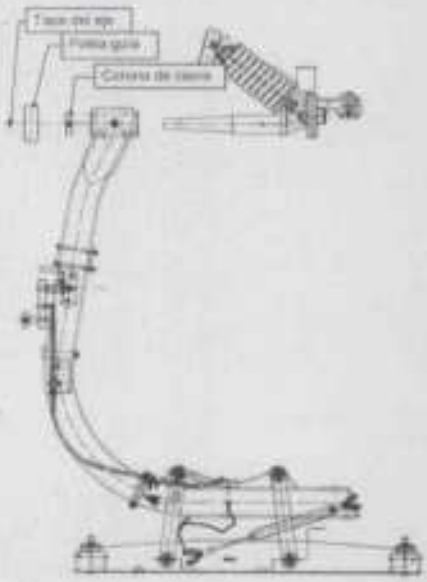



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			Nueva
6	Mordaza fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			Nueva
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taliafas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Rodadura Columnas Esquineras
27	Pintura interior Cabina		X		Rodadura Columnas Esquineras
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Laterial		X		Rodadura Soporte Vidrio principal Posterior
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Rodadura Estribo Empotrado
42	Puerta derecha		X		Rodadura Estribo Empotrado
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Pinas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javis Ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 21-05-2026

Numero Cabina: 2077.

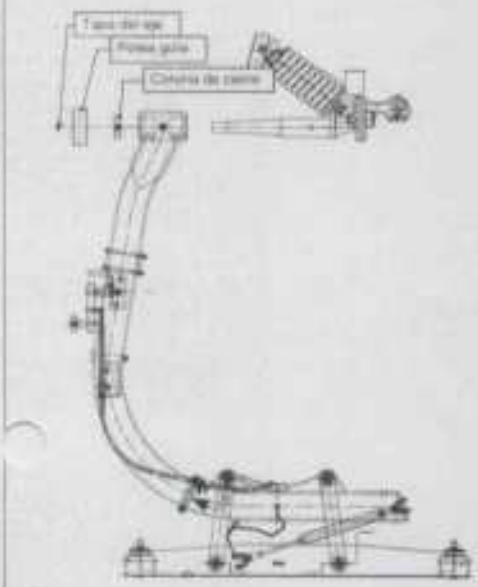



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil	X			Nueva
6	Horquilla fija	X			Nueva
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montajes	X			Nueva.
10	Forro de Friccion		X		Fisurada.
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspensión (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X	X		Pelodura Columna Esquinera
27	Pintura interior Cabina		X		Pelodura Columnas Esquineras
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Bota Inferior Puerta Derecha.
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Sin pelicula proteccion
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pelodura Estribo Emergencia
42	Puerta derecha		X		Pelodura Estribo Emergencia
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jona ortiz	1049806748	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1033818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 21-05-2026

Numero Cabina: 2026

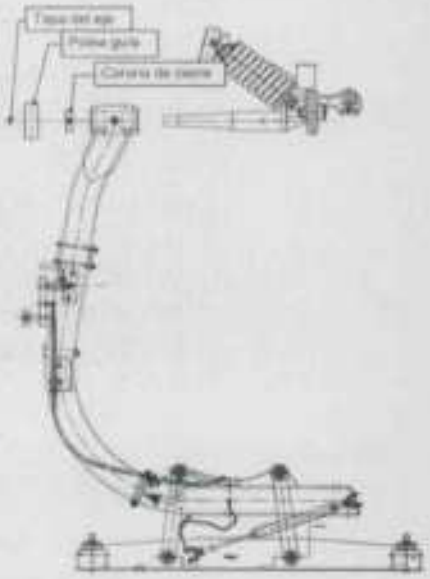



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste.
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladura Columnas Esquineras
27	Pintura Interior Cabina		X		Peladura Columnas Esquineras
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Sin pelicula Proteccion
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribo Emergen
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribo Emergen
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladuras Parte Delantera
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Palpa de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Escobillas limite desgaste.

Información de los participantes


Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tiboduiza	1053417774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose Ortiz	1049806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1093818709	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 21-05-2026
Numero Cabina: CC29.

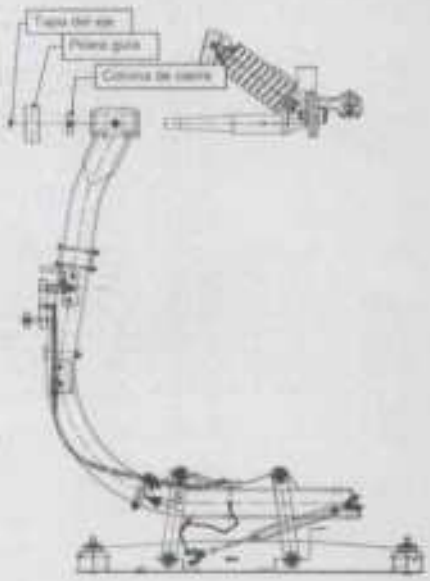



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleа de Acoplamiento	X			
2	Poleа de Rodadura delantera	X			
3	Poleа de Rodadura trasera	X			
4	Poleа Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste Rueda
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taleñas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras Columnas Esquinas
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
XX	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Peladuras Estribo Entrada
42	Puerta derecha		X		Peladuras Estribo Entrada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladura Perfil Delantero
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Señaletica transmicable. letra "A" dañada

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Ellen Johs ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1093818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002686

Fecha: 21-05-2026

Numero Cabina: C030

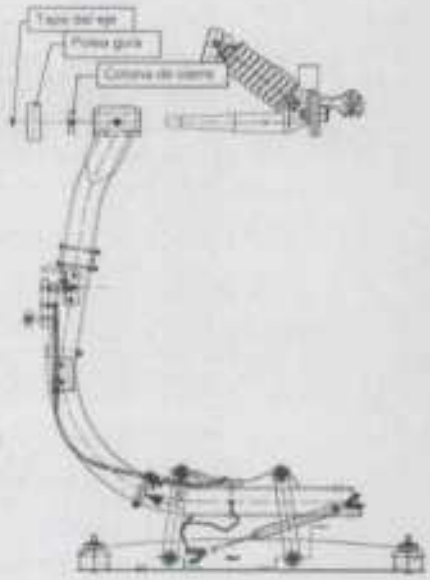



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgastada
6	Mordaza fija		X		Desgastada
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgastado.
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Pestillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura Interior Cabina		X		Pisaderas Columnas Izquierdas
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Rota Inferior Izquierda
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Sin pelicula de seguridad
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Pisadera Perfil Delantero
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Union de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes


Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaime Ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095818202	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 21-05-2026
Número Cabina: CD31

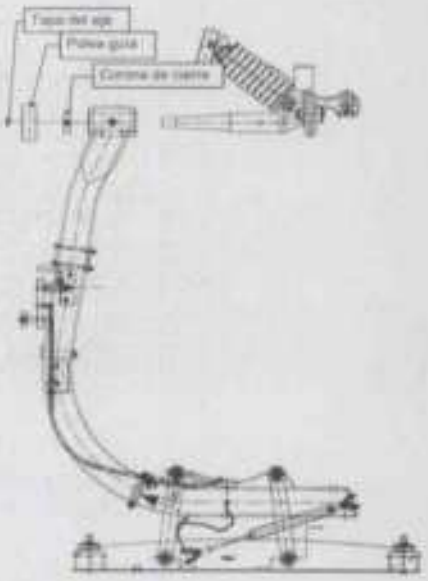



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil		X		Desgaste
6	Montaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montazas		X		Desgaste
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (J)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura Interior Cabina		X		Pelodura Columnas Esquinas
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Rota. Inferior Derecha
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Sin pelicula.
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 21-05-2026

Numero Cabina: 0032

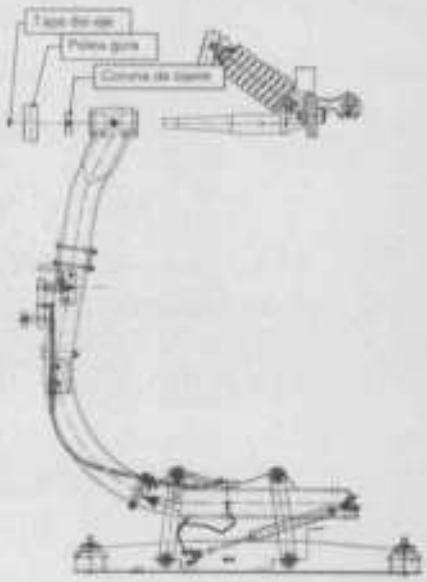



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Arrastramiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil	X			
6	Horquilla fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montaje	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (J)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefijo	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Pelodura Columnas Esquineras
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Falta Inferior Derecha
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos inserto	X			
34	Ventana Abatible inferior delantera	X			
35	Ventana Abatible inferior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pelodura Estribo Entrada
42	Puerta derecha		X		Pelodura Estribo Entrada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Pelodura Perfil Ribatura.
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose Ortiz	1093806482	CABLEMOVIL SAS	
Johan David Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 21-05-2026

Numero Cabina: C033

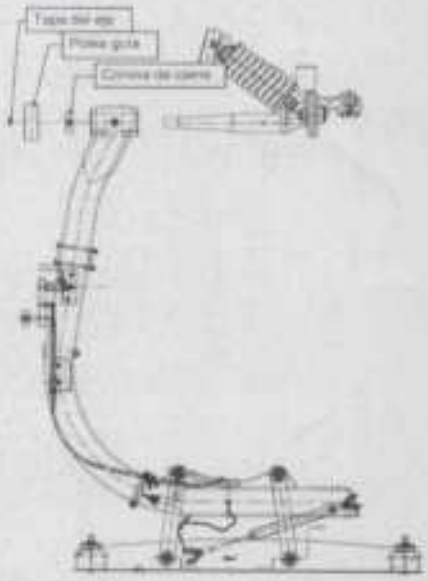



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Cartel mordazas		X		Desgaste
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rueda de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Piladura Columnas Esquinas
27	Pintura interior Cabina		X		Piladura Columnas Esquinas
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Rota Inferior Derecha
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Tope Inferior No Conforme
42	Puerta derecha		X		Maduras Estado Conf.
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina				
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javier Ortiz	1045804481	CABLEMOVIL SAS	
Johan David Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 22-09-2026

Numero Cabina: 6034

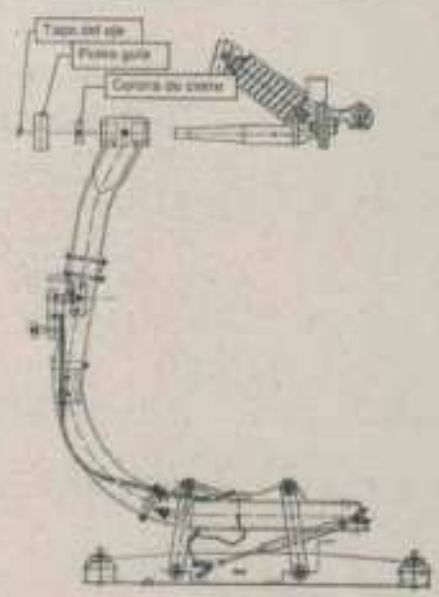



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil		X		DC19914E
6	Horquilla fija		X		DC19854E
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montajes		X		DC19914E
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Nodillo de acoplamiento a distancia	X			
17	Palanca de acoplamiento a distancia	X			
18	Telaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perfiles de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura interior Cabina		X		Retiadura en columnas exteriores
28	Antichastillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Retiadura pintura deficiente
47	Antenna Wifen y soportes antenas	X			
48	Lateral de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
ALEX TORRES	1007371850	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
ELKIN JAIMES ORTIZ	1095806481	CABLEMOVIL SAS	ELKIN JAIMES
Johan Daza Delgado	1095812209	O.D.T	Daza D

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 22-05-2026

Numero Cabina: 6035

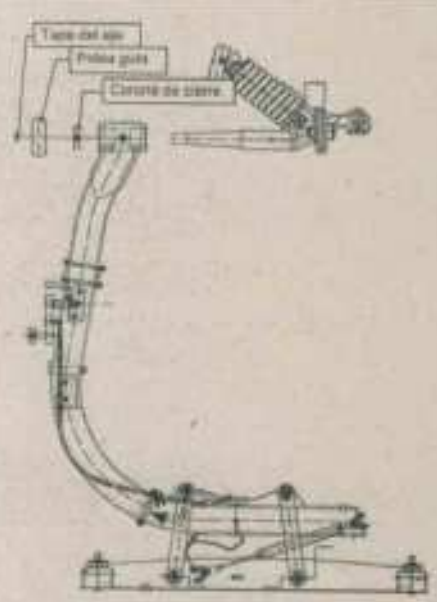



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tolvas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal		X		
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio estructura delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio estructura trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta Izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rosamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5 Desgaste
6 Desgaste
9 Desgaste
26 Pelladura en columna esquinera
27 Pelladura en columna esquinera
29 Rota parte inferior Puerta derecha
38 Acrilico Fisurado
32 Sin pelicula de proteccion Exterior
41 Pelladura en estribos de emergencia
42 Pelladura en estribos de emergencia

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
ALEX TORRES	1007371850	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
Elkin Jaime Ortiz	1045806481	CABLEMOVIL SAS	Elkin Jaime Ortiz
Johan Daño Delgado	1095813203	O.D.T	Daño D

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 12-05-2026

Numero Cabina: Ca36

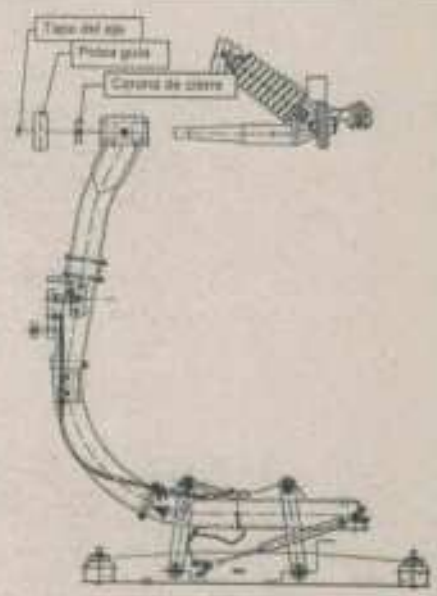



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Amarre de 4 puntos	X			
16	Rodillo de acolonamiento a distancia	X			
17	Palanca de acolonamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes anteras	X			
48	Cojinn de rozamiento	X			
49	Fotos de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5 Desgaste
6 Desgaste
9 Desgaste
26 Peladura en columnas esquineras
27 Peladura en columnas esquineras
32 Sin pelicula de Proteccion inferior
41 Peladura en estribos de emergencia
42 Peladura en estribos de emergencia

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
AIEX TORRES	1007371650	TRANSMILENIO SA	AIEX TORRES
ELKIN JULIO ORTIZ	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Juan Daño Delgado	1095813709	O.D.T	Daño D

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 22-05-2026

Numero Cabina: C037

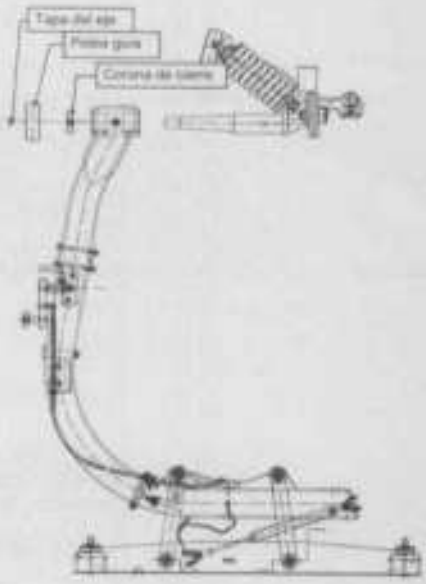



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Laterial		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible inferior delantera	X			
35	Ventana Abatible inferior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Palaa de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 6 Desgaste

6 Desgaste
9 Desgaste
27 Peladura en columna esquinera
32 Sin Pelicula de proteccion inferior
41 peladura en estribo de emergencia
42 peladura en estribo de emergencia
46 Peladura en perfil delantero

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
ALEX TOVAR	1007371850	TRANSMILENIO SA	ALEX TOVAR
[illegible]	[illegible]	CABLEMOVIL SAS	[illegible]
[illegible]	[illegible]	O.D.T	[illegible]

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 22-05-2026

Numero Cabina: C028

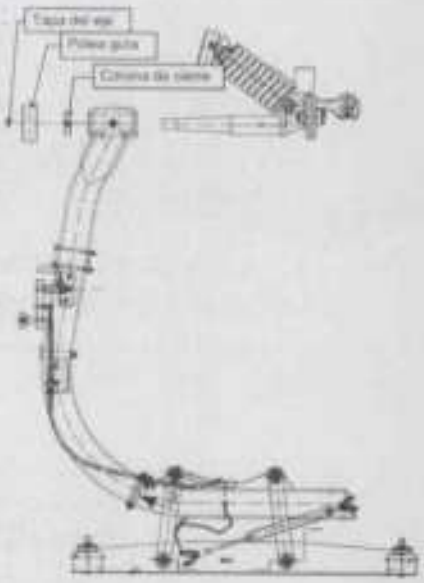



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleo de Acoplamiento	X			
2	Poleo de Rodadura delantera	X			
3	Poleo de Rodadura trasera	X			
4	Poleo Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Perno de Fricción	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspensión (3)	X			
15	Armazón de 4 puntos	P			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	A			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	A			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera		X		
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 27 Pelladura en columnas esquineras
19 Rota parte inferior puerta derecha
41 Pelladura en estribos de emergencia
42 Pelladura en estribos de emergencia
81 Base de espaldar caido

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
ALEX TORRES	1004371850	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
Elkin José Ortiz	1045806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daza Delgado	1095813209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 22-05-2026

Numero Cabina: C039

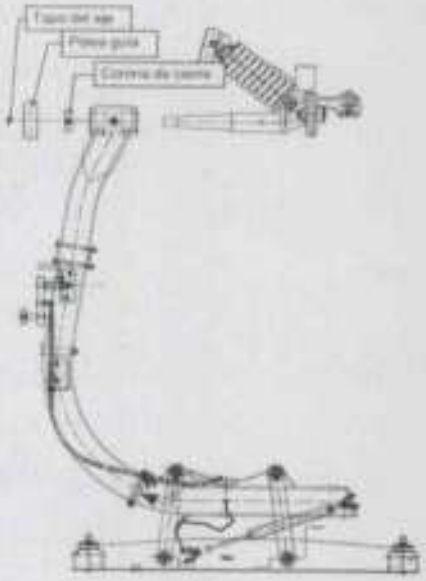



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NC aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefono	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible Interior delantera	X			
35	Ventana Abatible Interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wifi y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 26 Pelladura en columna estructura
27 Pelladura en columnas estructura
29 Para parte inferior puerta derecha
H1 Pelladura en estribo de emergencia
H2 Pelladura en estribo de emergencia

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
ALEX TORRES	1007371850	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
Ellen Jaramillo	1095804648	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 22-05-2026

Numero Cabina: C040

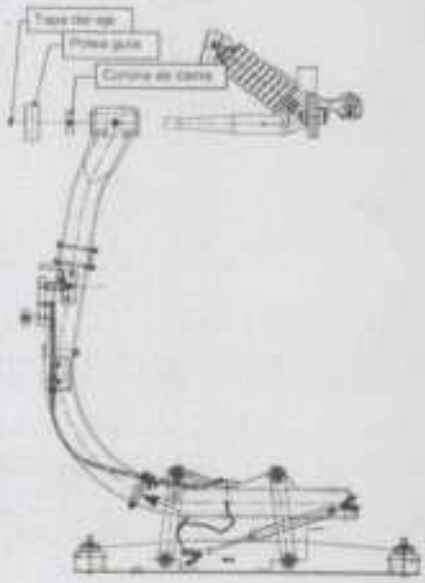



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil	X			
6	Horquilla fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefias	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wari y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 26 perdidas en columnas esquineras
27 perdidas en columnas esquineras
29 Rota pare C inferior puerta derecha
M1 perdida en estribo de emergencia. Falta tapon
M2 perdida en estribo de emergencia
M6 perdida pare'l delantero

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
ALEX TORRES	1007171850	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
Edwin Suarez Ortiz	1015900481	CABLEMOVIL SAS	Edwin Suarez
Johan Danilo Delgado	1095813200	O.D.T	Danilo D

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 22-05-2026

Numero Cabina: C041

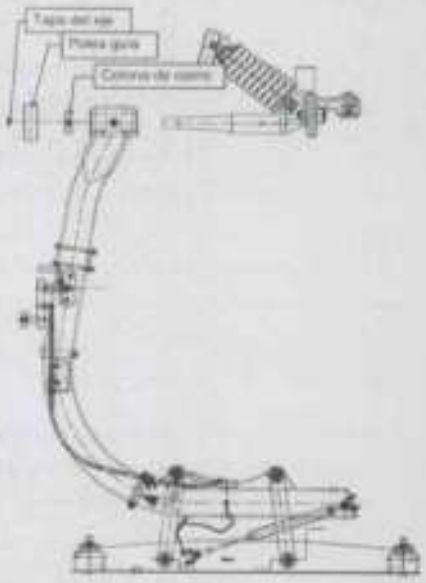



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil		X		
6	Montaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Biela de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 9 DESGASTE

6 DESGASTE
9 DESGASTE
27 PELADURA EN COLUMNA ESQUINERA
29 FALTA PARTE INFERIOR PUERTA IZQUIERDA
41 PELADURA EN ESTRIBO DE EMERGENCIA. FALTA TAPON
42 PELADURA EN ESTRIBO DE EMERGENCIA
46 PELADURA PERFIL DELANTERO

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
ALEX TORRES	1007371850	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
EDWIN SOLIS ORTIZ	1049620481	CABLEMOVIL SAS	EDWIN SOLIS
Jhon Dario Delgado	1075218209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/26

Numero Cabina: CO42

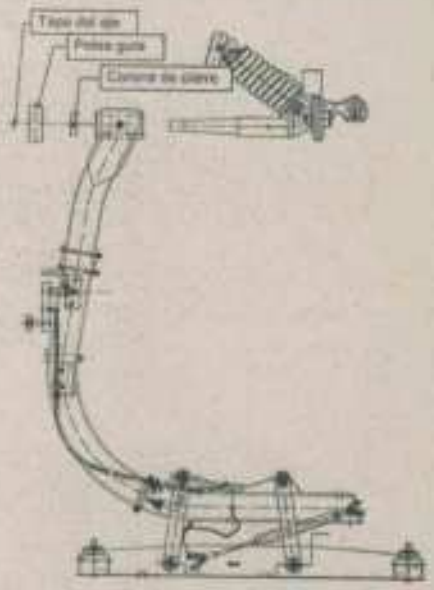



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO APLICA	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil	X			
6	Montaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montasas	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon pa 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tuercas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Amortiguadores de goma (4)				
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera		X		
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Cambio	X			
45	Cambio de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas WAN y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte				
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 26. acladura en columnas esquineras abolladuras.
27. acladuras en columnas esquineras
30 acrilico rayado
34. marco con abolladura exterior
41-42 paladuras en estribo de emergencia
46. acladuras perfil delantero.

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma:
Eduardo Gomez	80720231	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javier Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095813209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/26

Numero Cabina: CO-13

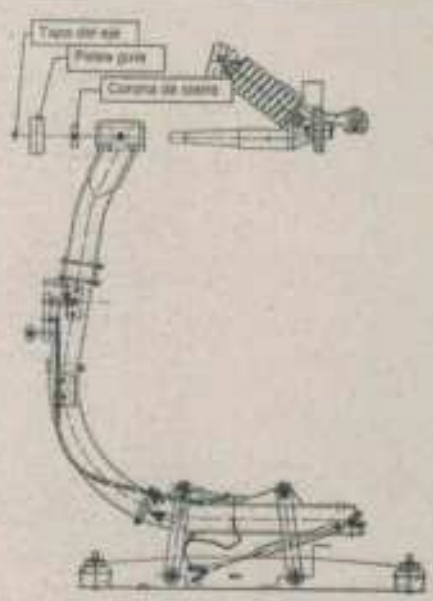



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		desgaste
10	Forro de Fricción		X		Fisura
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tewflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Laterai		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-C desgaste a. desgaste
10. Fisura.
26-27 peladuras en cabinas esquineras.
32. Fisurado
41-42 Peladura estribo

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	807623	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaus Ortz	1095846481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daño Delgado	1095988207	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/03/26

Numero Cabina: CC-14

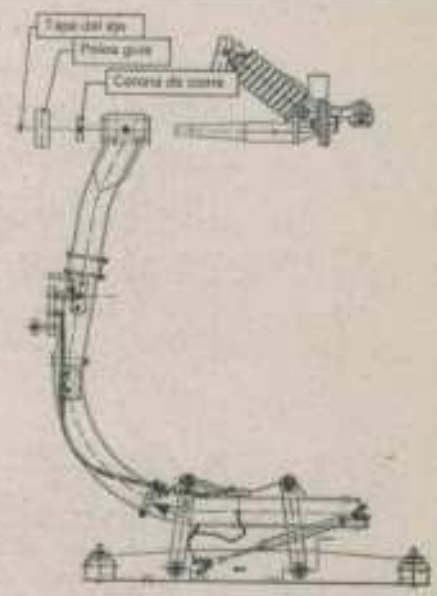



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		desgaste
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tacaños	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal		X		
31	Acrilico o vidrio trasero		X		
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abertura interior delantera	X			
35	Ventana Abertura interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta Izquierda	X	X		
42	Puerta derecha	X	X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste

9: desgaste

26-27 pelusas en columna esquineras y decubrimiento

29 rota

30. Figura: Lado izquierdo inferior

31 Vidrio rayado

46 pelusa perfil delantero.

41-42 pelusa en estribo de emergencia

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760131	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jael ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095812209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/26

Numero Cabina: C045

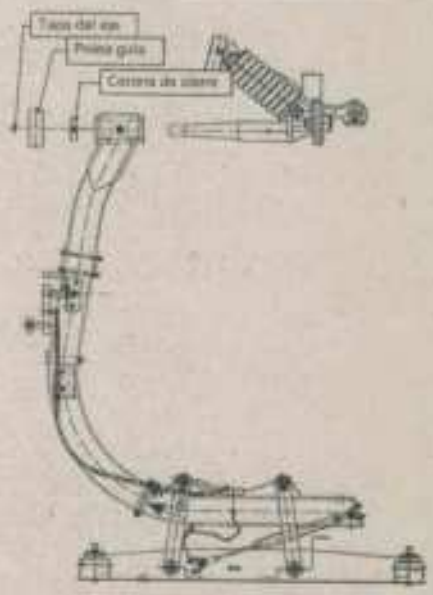



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horqueta Movil	X			
6	Horqueta fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		desgaste
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taleñas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9. desgaste
26-27 peladuras en cabinas
28 pintura pelada y rayada
41-42 peladuras alrededor de emergencia

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760171	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jara Ortiz	1045824481	CABLEMOVIL SAS	
Jaba-David Delgado	1095819209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/26

Numero Cabina: C046

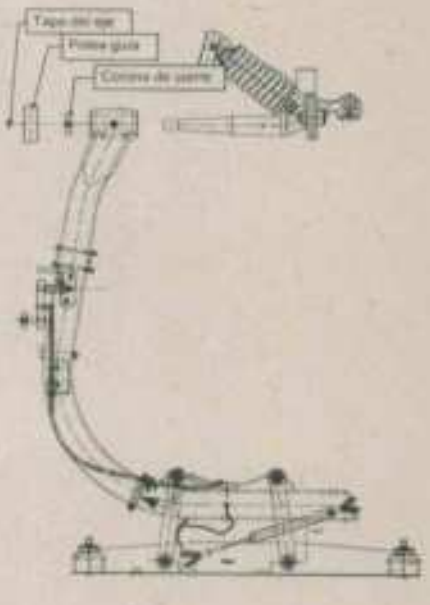



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleas de Acoplamiento	X			
2	Poleas de Rodadura delantera	X			
3	Poleas de Rodadura trasera	X			
4	Poleas Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Forro de Friccion				
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (J)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefono	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wan y soportes antenas	X			
48	Union de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 27. retadeo en columnas
29. rota
32. no tiene calcula
41-42 retadeo en estribos de emergencia
46 techo Pisoteado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760271	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaya OYH	1049380548	CABLEMOVIL SAS	
Johan David Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/24

Numero Cabina: C077

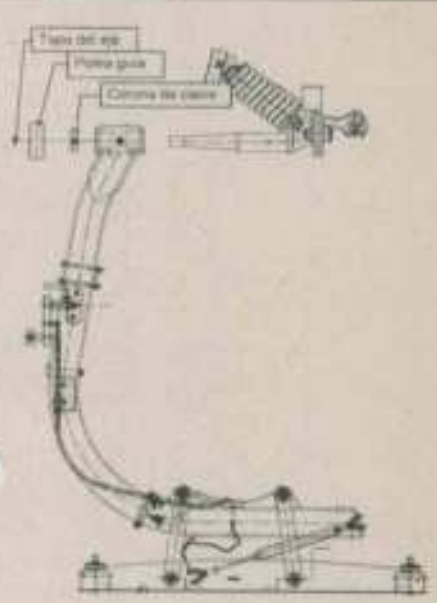

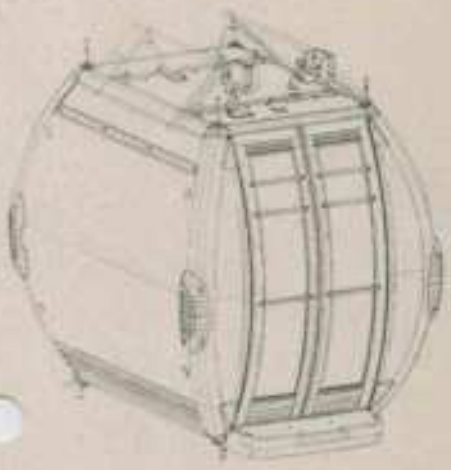

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		desgaste
10	Forro de Friccion				
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wari y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9. desgaste
32. retiro pelicula interior
46 techo Fisurado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760231	TRANSMILENIO SA	Edu
Edwin Jair ortiz	1049800498	CABLEMOVIL SAS	Edwin JH
Johan Dario Delgado	1033818209	O.D.T	Dario D

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/26

Numero Cabina: C049

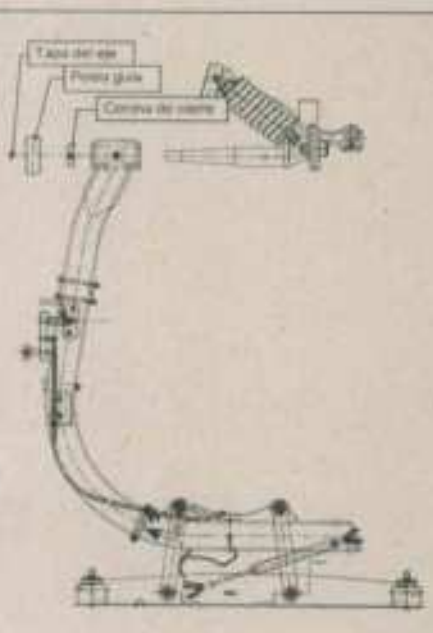



	Descripción	Contiene	No Contiene	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Armellas Wien y aspiritas anteriores	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Panas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9 desgaste
26-27. abollon duro rozal izquierdo trasero, retocado en cubon

Información de los participantes

Nombre:	Numero de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80706231	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/24

Numero Cabina: C019

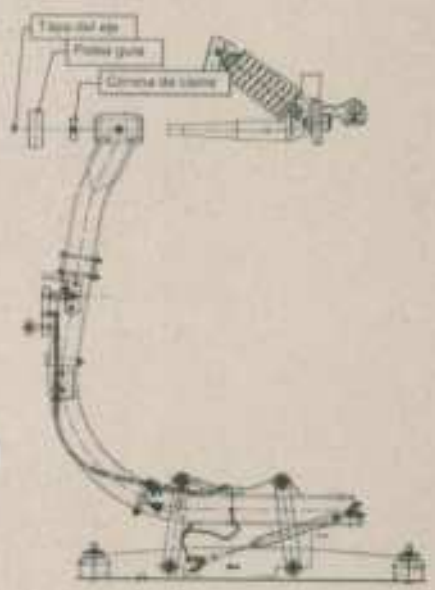



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO Aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil	X			
6	Montaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montacar		X		
10	Foro de Friccion				
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tesaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio izquierdo delantero	X			
37	Acrilico o vidrio izquierdo trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para extintor Internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Extintor	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9. desgaste
22 ejeduro en colocar
32 Fisuredo señaletica mal ajustu

Información de los participantes


Nombre:	Numero de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760271	TRANSMILENIO SA	
Elvin José Ortiz	1073806431	CABLEMOVIL SAS	
Johan Daza Delgado	1095318209	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 25/05/26
Numero Cabina: 2050

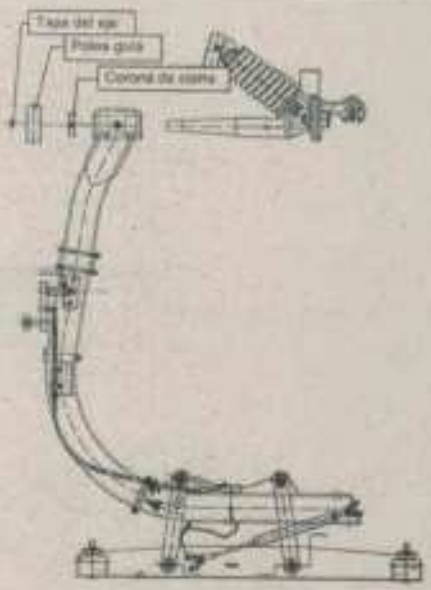



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Accionamiento	✓			
2	Polea de Retadura delantera	✓			
3	Polea de Retadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas		✓		
10	Foro de Friccion		✓		
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (I)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Tesafias	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perno de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina	✓			
27	Pintura interior Cabina	✓			
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral		✓		
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio seguimo delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio seguimo trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda	✓			
42	Puerta derecha	✓			
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Espejo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		✓		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9. desgaste
10. Fisurado
32. Fisurado
46 techo rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad:	Firma
Eduardo Gomez	80726271	TRANSMILENIO SA	
Edwin Sua ovilla	1049806428	CABLEMOVIL SAS	
Johan Dario Delgado	1095818209	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 26-05-26

Numero Cabina: 0051

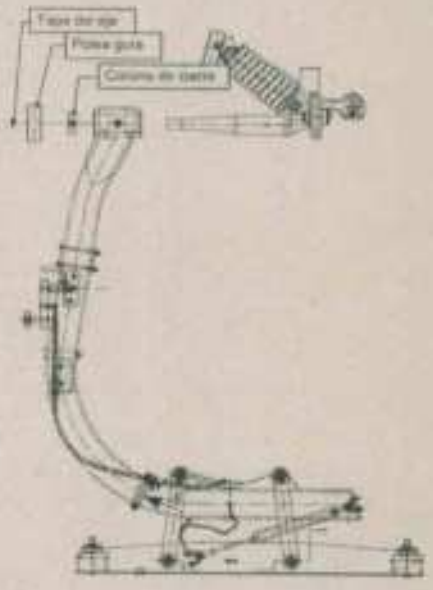



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Pisos de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (II)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de acoplamiento a distancia	X			
17	Palanca de acoplamiento a tolerancia	X			
18	Tasillas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Antihastillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos interiores	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Eantro	X			
45	Eantro de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas		X		
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9 desgaste
10: Fisurada
26-27 peladura en columna esquineres
29 Junta rota
32: no tiene pelicula
41-42 peladura estribos de Emergencia
47 antena izquierda conexion averiada

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760131	TRANSMILENIO SA	
Elkin James Ortiz	1075806491	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Arzate G.	79.091.312	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 26-05-26

Numero Cabina: 6052

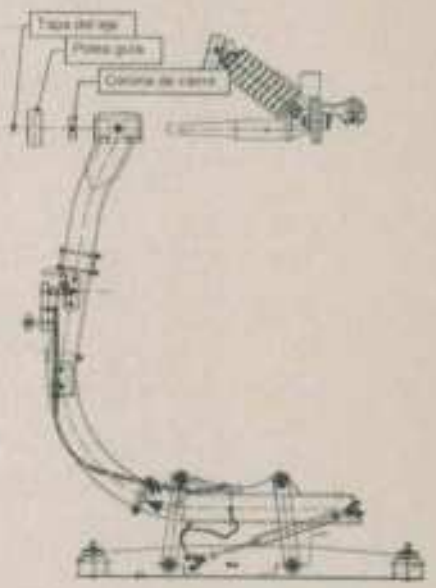



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil		X		
6	Montaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Radillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tiraflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos (marcos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste

9. desgaste
26-27 peladura en columnas esquineras
32 no tiene pelicula
41-42 peladura restos de emulsion
46. rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760231	TRANSMILENIO SA	
Erik Jaws Ortiz	1095806488	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.952	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 26-05-26

Numero Cabina: C053

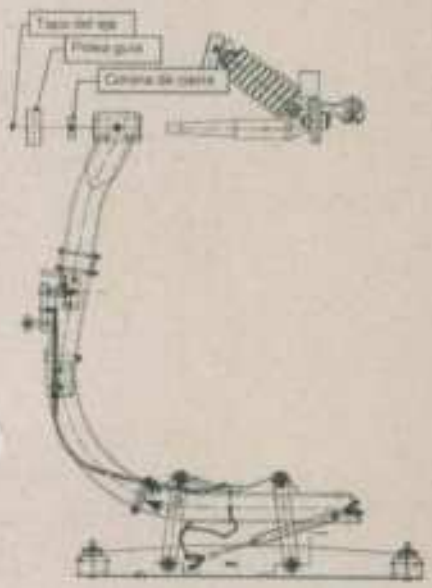

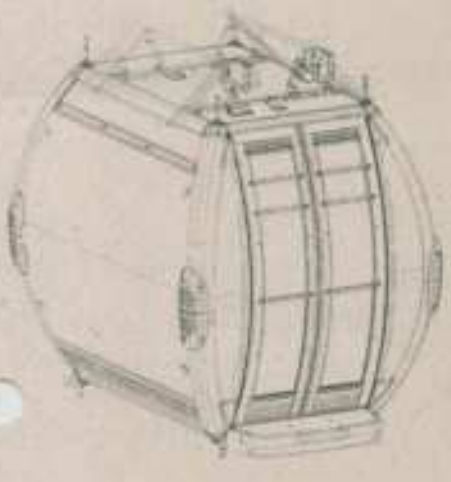

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil		X		
6	Horquilla fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal horquillas		X		
10	Forro de Fricción	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Pedilio de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio izquierdo delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio izquierdo trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Anclajes Wien y soportes anclajes	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6- desgaste
9- desgaste
26-27 corrosion en soportes columna
41-42 golpeados en estribos de amortiguación

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Garcia	80700231	TRANSMILENIO SA	
Edwin Sanz Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	75.091.777	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 26-05-26

Numero Cabina: 0054

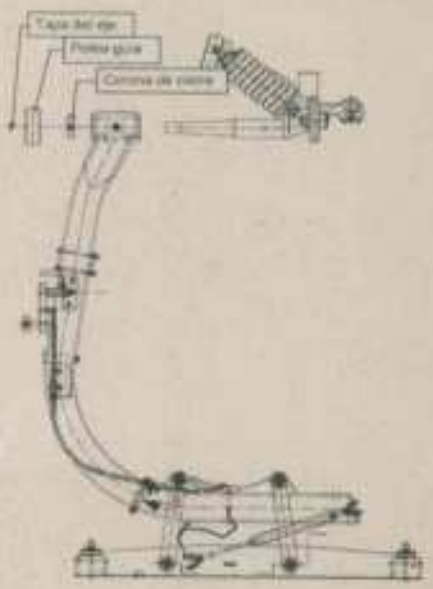



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal monteuse	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taliñas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Laterial	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 26-27 oxidadas en columnas izquierdas
41-42 oxidadas en estribos de anclajes
46. rayada

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760231	TRANSMILENIO SA	
Elver James Ortiz	1095806468	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	75.091.737	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 26-05-16

Numero Cabina: C053

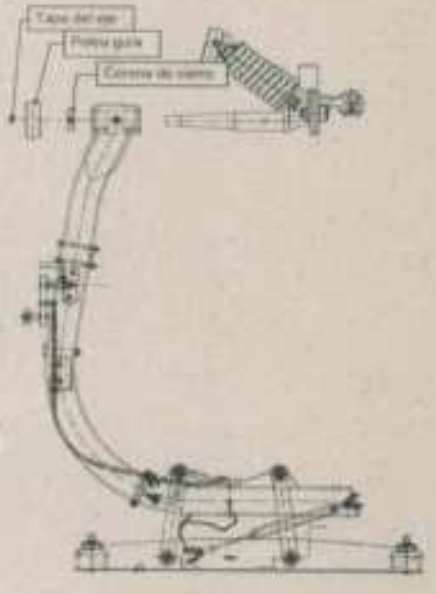



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Cierre montaje		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos Internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Escribo	X			
45	Escribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Anteojo Wipin y soportes anteojo	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Palpa de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera				
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9 desgaste
20 desgu axial en rotula
26-27 perdida en columnas esquineras
41-42 perdida en ostiros de emergencia
46 rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760231	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo Ortiz	1095826481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Albarez G.	72.091.717	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 26-05-26

Numero Cabina: C056

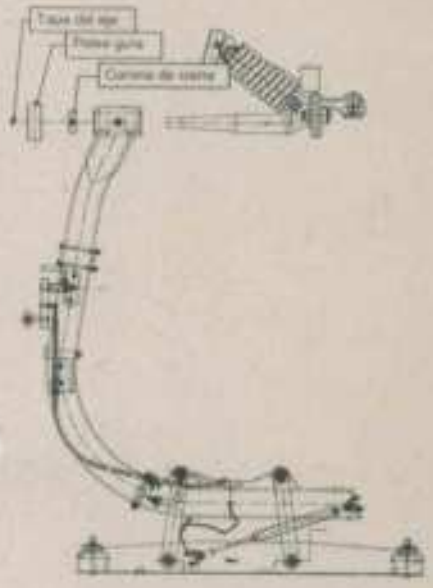



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rotadura delantera	X			
3	Polea de Rotadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Pulldo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquieda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Anclajes Wijan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 20. Juego axial en rotul.
26-27 pelados en columnas esquineras
29. rota
31. no tiene película
41-42 pelados en estribos de sincronismo
46 rayado

Información de los participantes


Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Edwin Gomez	80720171	TRANSMILENIO SA	
Edwin Soto Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Arrate C.	75 091757	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 26-05-26
Numero Cabina: 5057

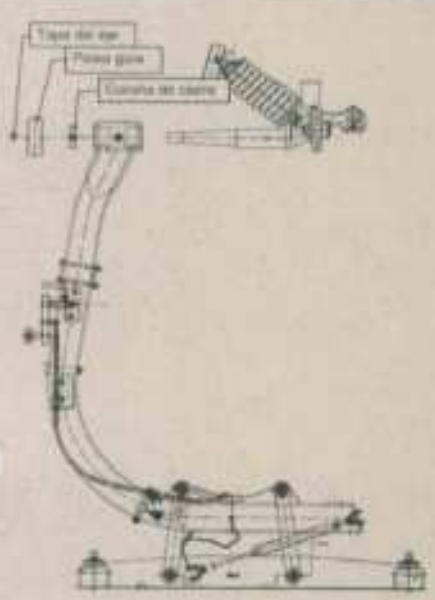



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO Aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil		X		
6	Montaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montazas		X		
10	Form de Friccion		X		
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos marmol	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Perno de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			

poleas 103 externa con desgaste en canal
104 externa con desgaste en canal
105 externa con desgaste en canal
106 interna con desgaste en canal
107 interna con desgaste en canal
108 interna con desgaste en canal.

poleas 7 canales guardacabo descendente con desgaste en forma de mariposa
115 interna con desgaste en canal.

poleas con desgaste ascendente.

polea 1 interna con desgaste en canal
2 interna
4 externa
5 interna.

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 26-05-26

Numero Cabina: 5058

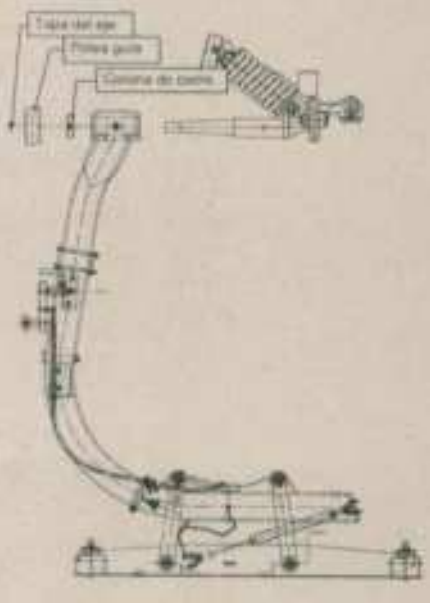

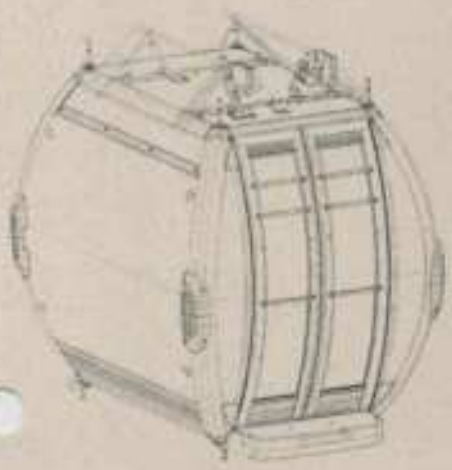

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Form de Friccion		X		
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corbata de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefilex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		
21	Perros de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquieda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Amortiguadoras de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantero	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos interiores	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Escribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transguria	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste

4. desgaste
10. Fisurado
20. Juego axial en rotula
26-27 Golpeado en columnas izquierda
41-42 Golpeado en estribos de emergencia
46 rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80700231	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jans Ortz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alvarez G.	T.S. 091.752	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 27-05-2022

Numero Cabina: C059

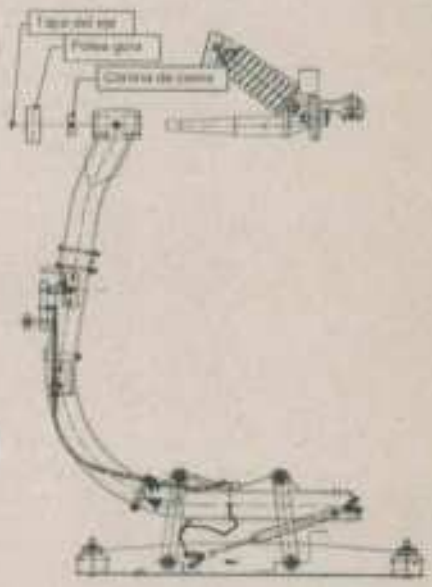

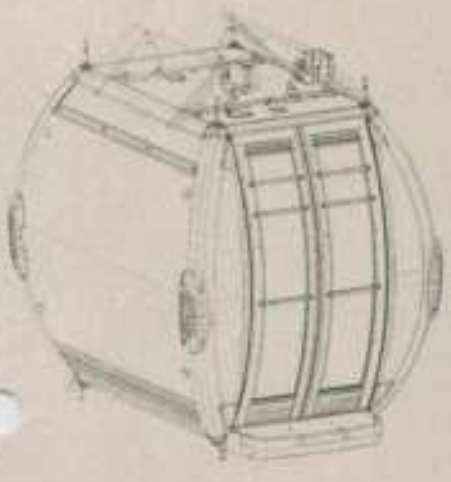

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil		X		
6	Montaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montacoa		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefax	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal		X		
31	Acrilico o vidrio trasero		X		
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y adyontas antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6 desgaste
9. desgaste
26-27 Caladura en Colmos esquineros
34. rota
70-71-72. Vidrio rayado
91-92 Caladura en ostilos de emergencia
96. rayada

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760231	TRANSMILENIO SA	
Elkin James Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO MIZATE G.	75.091.752	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WA40002686

Fecha: 27-05-2016

Numero Cabina: 0080

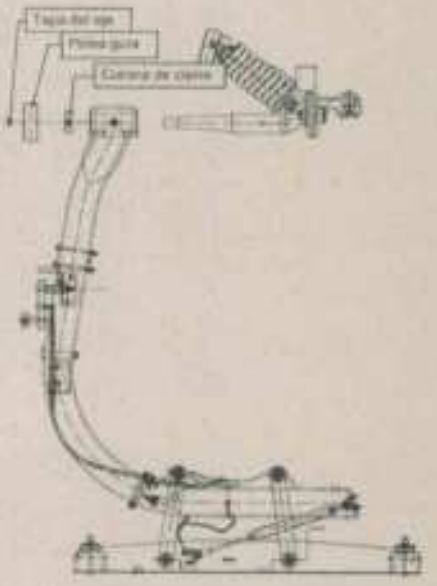



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordaza	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Pedilio de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taleñas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal		X		
31	Acrilico o vidrio trasero		X		
32	Acrilico Lateral		X		
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 26-27 golpeados en columna.
29 roto
30-31-32. Vidrio rayado
46 rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Cama	80760171	TRANSMILENIO SA	
Elkin Sotelo	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO PUENTE G.	75.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolívar WAA0002668

Fecha: 27-05-2016

Numero Cabina: C061

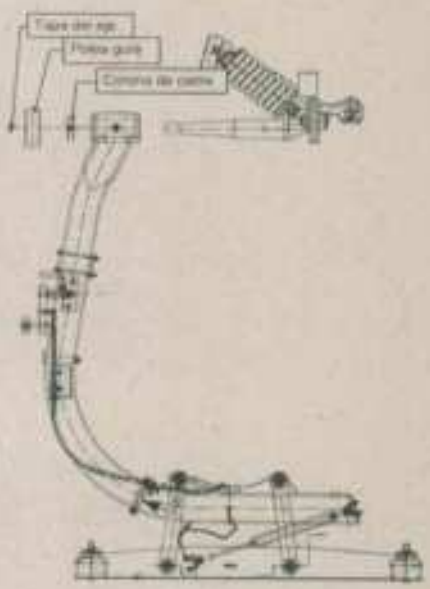

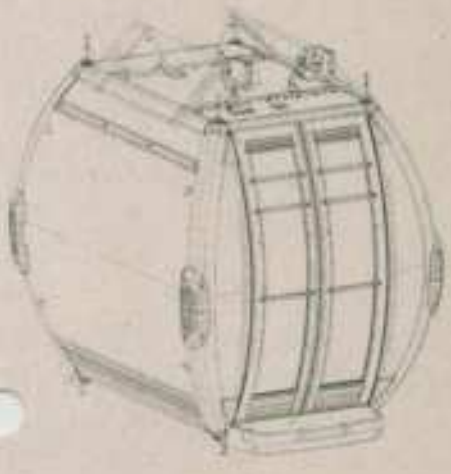

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil	X			
6	Horquilla fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefono	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)		X		
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		
31	Acrilico o vidrio trasero		X		
32	Acrilico Laterial	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible inferior delantera	X			
35	Ventana Abatible inferior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina izquierda	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos inferiores	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 26-27 soldadura en columnas
28. sobra izquierda delantera retirar
29-31 vidrio rayado
41-42 soldadura en estribos de emergencia

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80720271	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaime Ortiz	1095806480	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	75.091.257	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002588

Fecha: 27-05-2016

Numero Cabina: 6062

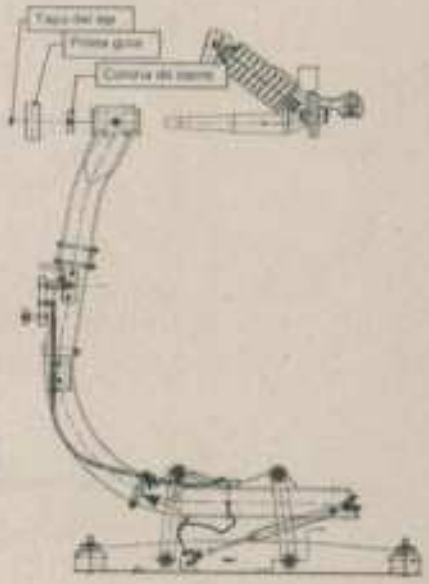



	Descripcion	Cantidad	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	2			
2	Polea de Rodadura delantera	2			
3	Polea de Rodadura trasera	2			
4	Polea Guia	2			
5	Mordaza Movil		2		
6	Mordaza fija		2		
7	Resorte principal izquierdo	2			
8	Resorte principal derecho	2			
9	Canal mordazas		2		
10	Perno de Friccion		2		
11	Lengueta delantera	2			
12	Lengueta trasera	2			
13	Corona de Cierre	2			
14	Barra de suspension (2)	2			
15	Armazon de 4 puntos	2			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	2			
17	Palanca de accionamiento a distancia	2			
18	Tapafaldon	2			
19	Brazo apertura puerta	2			
20	Cilindro de Freno	2			
21	Perros de Suspensión	2			
22	Biela derecha 1	2			
23	Biela derecha 2	2			
24	Biela izquierda 1	2			
25	Biela izquierda 2	2			
26	Pintura exterior Cabina		2		
27	Pintura Interior Cabina		2		
28	Almohadillas de goma (4)	2			
29	Juntas Puertas	2			
30	Acrilico o vidrio frontal		2		
31	Acrilico o vidrio trasero		2		
32	Acrilico Lateral	2			
33	Pasamanos interno	2			
34	Ventana Abatible Interior delantera	2			
35	Ventana Abatible Interior trasera	2			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	2			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	2			
38	Ventana de guillotina delantera	2			
39	Ventana de guillotina trasera	2			
40	Soportes para acrilicos internos	2			
41	Puerta izquierda		2		
42	Puerta derecha		2		
43	Mecanismo de apertura de puerta	2			
44	Estribo	2			
45	Estribo de guia	2			
46	Techo de la Cabina	2			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	2			
48	Liston de rozamiento	2			
49	Patas de transporte	2			
50	Silla delantera	2			
51	Silla trasera	2			
52	Panel Solar delantero	2			
53	Panel solar trasero	2			

Observaciones Generales: 5-6-9 desgaste
10 Fisurada
26-27 peladura en columnas
30-31 Vidrio rayado
41-42 peladura en cilindro de entrega

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760191	TRANSMILENIO SA	
Elkin Sanchez Ortiz	1095806451	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.252	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 27-05-2016

Numero Cabina: C063

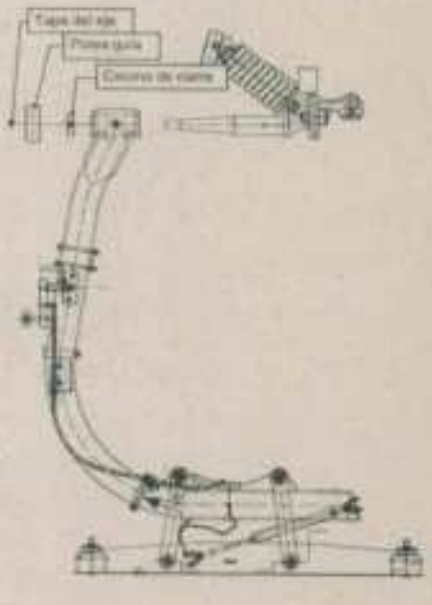



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Clamp	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefono	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal		X		
31	Acrilico o vidrio trasero		X		
32	Acrilico Laterales	X			
33	Pasamanos inferior	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos interiores	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Union de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6-9. de Seguridad fuera de operacion por limite de cupos Ajuste
26-27 golpeada en columnas
29. rota
30-31. vidrio rayado
46. rayada

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80756271	TRANSMILENIO SA	
Edwin Sanchez	1045800488	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	79.091.751	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 27-05-2024

Numero Cabina: C064

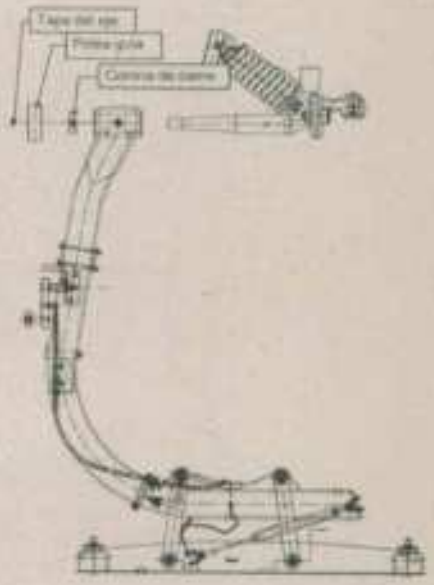



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Berro de suspension (U)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tatafles	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero		X		
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6-9 desgaste
26-27 celadura en columnas
36 vidrio rayado
41-42 celadura en estribos de entrega

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80700171	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jose Ortiz	1093806484	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	75.091.757.	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 27-05-2026

Numero Cabina: 0065

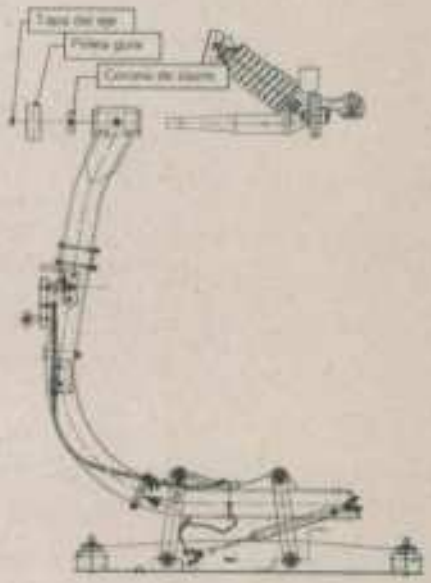



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		
10	Piloto de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tetellas	X			
19	Blaco apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Jumas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio equinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio equinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wian y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera		X		
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 5-6-9 desgaste
26-27 peludun en columnas
41-42 peludun en estribos de emergencia
46. rayado
50. Falta tornillo de Espaldar
Cabina Fuera de operación por limite de desgaste superado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gama	80760[illegible]	TRANSMILENIO SA	
[illegible]	1019[illegible]	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0003688

Fecha: 27-05-2026

Numero Cabina: C066

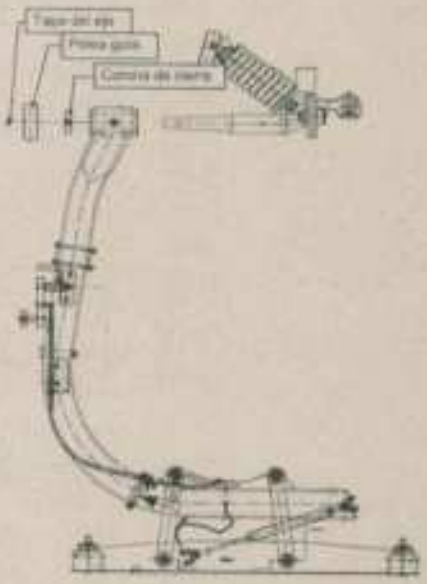

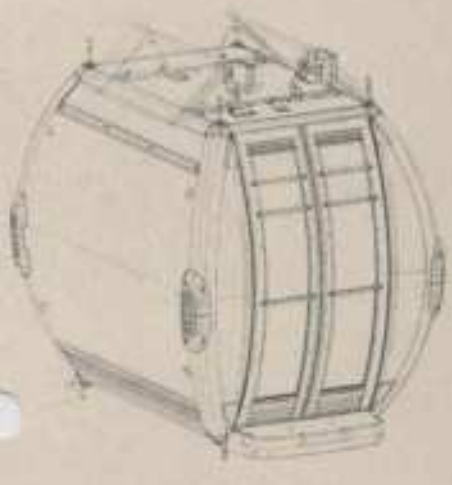

	Descripcion	Cantidad	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	4			
2	Polea de Rodadura delantera	4			
3	Polea de Rodadura trasera	4			
4	Polea Guia	2			
5	Mordaza Movil		X		
6	Mordaza fija		X		
7	Resorte principal izquierdo	2			
8	Resorte principal derecho	2			
9	Canal mordazas		X		
10	Forro de Friccion	4			
11	Lengueta delantera	1			
12	Lengueta trasera	1			
13	Correa de Clama	1			
14	Barra de suspension (J)	1			
15	Armazon de 4 puntos	1			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	1			
17	Palanca de accionamiento a distancia	1			
18	Telaflex	1			
19	Brazo apertura puerta	2			
20	Cilindro de Freno	1			
21	Perros de Suspensión	4			
22	Biela derecha 1	1			
23	Biela derecha 2	1			
24	Biela izquierda 1	1			
25	Biela izquierda 2	1			
26	Pintura exterior Cabina	1			
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	1			
29	Juntas Puertas		X		
30	Acrilico o vidrio frontal	1			
31	Acrilico o vidrio trasero	1			
32	Acrilico Lateral	2			
33	Pasamanos Interno	2			
34	Ventana Abatible interior delantera	1			
35	Ventana Abatible interior trasera	1			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	1			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	1			
38	Ventana de guillotina delantera	1			
39	Ventana de guillotina trasera	1			
40	Soportes para acrilicos /marcos	2			
41	Puerta izquierda		X		
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	1			
44	Estribo	1			
45	Estribo de guia	1			
46	Techo de la Cabina		X		
47	Antenas Wlan y soportes antenas	2			
48	Liston de rozamiento	2			
49	Patas de transporte	2			
50	Silla delantera	1			
51	Silla trasera	1			
52	Panel Solar delantero	1			
53	Panel solar trasero	1			

Observaciones Generales: 5-6-9 desgaste
27. oxidum en columnas
29. rota.
41-42 oxidum en estribos de emergencia.
46 rayado
6 cabina fuera de operacion por limite de desgaste superado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	80760271	TRANSMILENIO SA	
Elver Jairo ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Rolando Alzate G.	75.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 28/05/2026

Numero Cabina: CC17

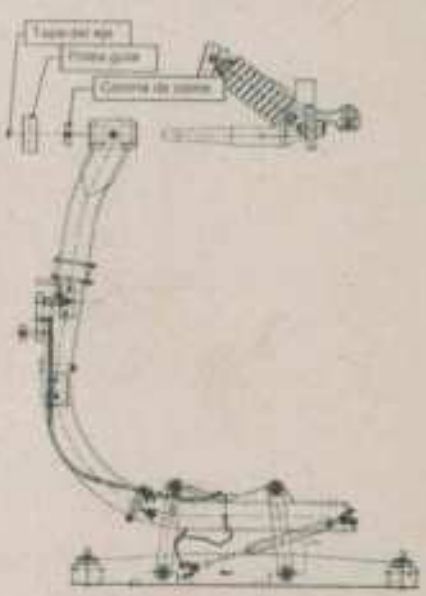



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rotadura delantera	X			
3	Polea de Rotadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			NUEVA
6	Mordaza fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			NUEVA
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (4)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tetaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES EN COLUMNA ESQ
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES EN COLUMNA ESQ
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilicos Laterales	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero		X		VIDRIO RAYADO
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES EN ESTRIBOS
42	Puerta derecha		X		RETOQUES EN ESTRIBOS
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		RAYADO
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Llanta de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Dayuth Castellanos	1026619938	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.217.	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 29-05-2026

Numero Cabina: C078

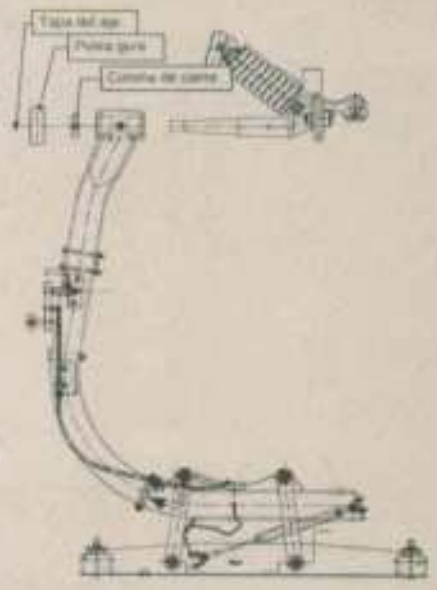



Descripción	Conforme	No Conforme	NO Aplica	Observaciones
1 Polea de Acoplamiento	X			
2 Polea de Rodadura delantera	X			
3 Polea de Rodadura trasera	X			
4 Polea Guia	X			
5 Horquilla Movil	X			NUEVO
6 Horquilla fija	X			NUEVO
7 Resorte principal izquierdo	X			
8 Resorte principal derecho	X			
9 Canal mordazas	X			NUEVO
10 Forro de Friccion	X			
11 Lengüeta delantera	X			
12 Lengüeta trasera	X			
13 Corona de Cierre	X			
14 Barra de suspension (2)	X			
15 Armazon de 4 puntos	X			
16 Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17 Palanca de accionamiento a distancia	X			
18 Telefleo	X			
19 Brazo apertura puerta	X			
20 Cilindro de Freno	X			
21 Pernos de Suspension	X			
22 Biela derecha 1	X			
23 Biela derecha 2	X			
24 Biela izquierda 1	X			
25 Biela izquierda 2	X			
26 Pintura exterior Cabina		X		RELACION COLUMNA DERECHA
27 Pintura interior Cabina		X		RELACION COLUMNA DERECHA
28 Amortiguadores de goma (4)	X			
29 Juntas Puertas	X			
30 Acrilico o vidrio frontal	X			
31 Acrilico o vidrio trasero	X			
32 Acrilico Laterales		X		FISURA PARTE SUPERIOR
33 Pasamanos interno	X			
34 Ventana Abatible interior delantera	X			
35 Ventana Abatible interior trasera	X			
36 Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37 Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38 Ventana de guillotina delantera	X			
39 Ventana de guillotina trasera	X			
40 Soportes para acrilicos internos	X			
41 Puerta izquierda		X		RELACION DETALLE CHAPETA
42 Puerta derecha		X		RELACION DETALLE CHAPETA
43 Mecanismo de apertura de puerta	X			
44 Estribo	X			
45 Estribo de guia	X			
46 Techo de la Cabina	X			
47 Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48 Limitn de rozamiento	X			
49 Patas de transporte	X			
50 Silla delantera		X		TORNILLO ESTATOR
51 Silla trasera	X			
52 Panel Solar delantero	X			
53 Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Deyvith Castellanos	1095 819 930	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	73.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 29-02-2026

Numero Cabina: C079

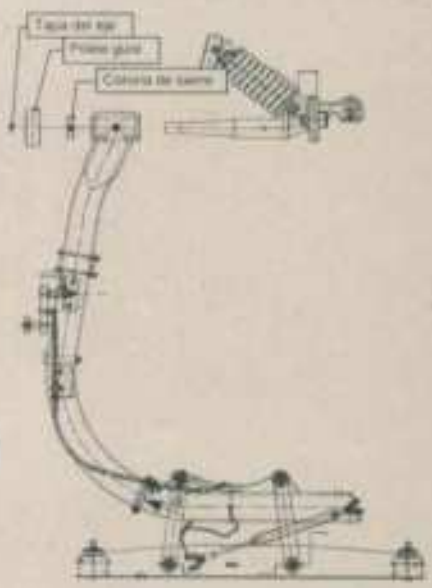

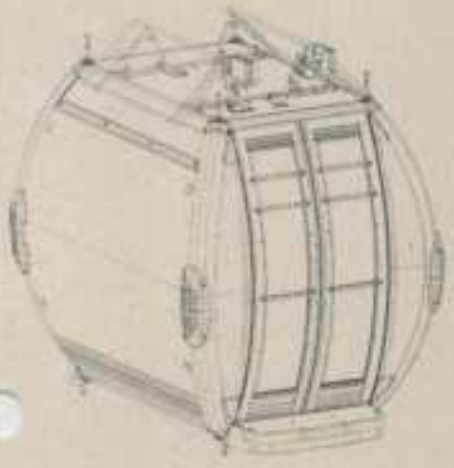

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		PRESENTA OXIDACION
21	Pernos de Suspension	X			
22	Bieta derecha 1	X			
23	Bieta derecha 2	X			
24	Bieta izquierda 1	X			
25	Bieta izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES ACTUALES ESTAN
27	Pintura Interior Cabina		X		RETOQUES ACTUALES ESTAN
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES EXTERIOR EMPEZAN
42	Puerta derecha		X		RETOQUES EXTERIOR EMPEZAN
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Escrito	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		PINTADO
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
JEFFERSON CARDENAS	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Deyuth Castellanos	1065 619 935	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	75. 091. 757.	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 29-03-2026

Numero Cabina: 5080

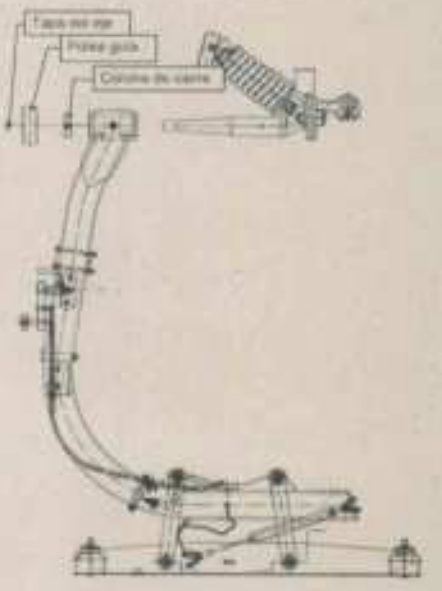

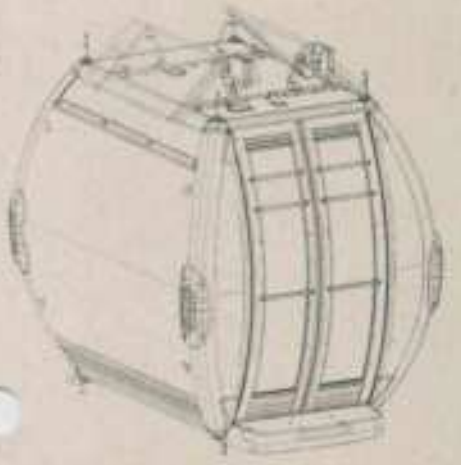

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Poleа Guia	X			
5	Montaza Movil	X			NUEVA
6	Montaza fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montazas	X			NUEVO
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Topeñas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES COLUMNAS ESTRUCTURA
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES COLUMNAS ESTRUCTURA
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		ROTA
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		FALTA PARTE SUPERIOR
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES PISTERO ENTRADA
42	Puerta derecha		X		RETOQUES ESTADO PINTURA
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Larguero de rozamiento	X			
49	Puntas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Deyuth Castellanos	1093 969 988	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate C.	75.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA8002688

Fecha: 29-05-2026

Numero Cabina: CAB1

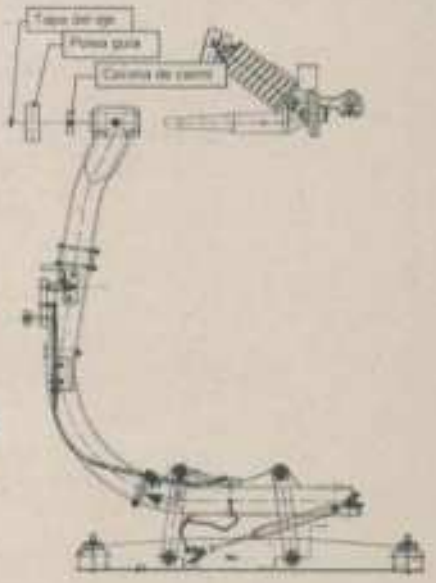



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Forro de Friccion	X			
11	Langüeta delantera	X			
12	Langüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tesafles	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		DEFECTOS COLUMNA ESQUINA
27	Pintura interior Cabina		X		DEFECTOS COLUMNA ESQUINA
28	Amohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
34	Pasamanos interior		X		TODALLO MAL ESTADO
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		PARCHE
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: PINZA FUERA DE OPERACION POR LIMITE DE DESGASTE EN EL CUERPO DE LA PINZA

6 CABINA FUERA de operacion POR LIMITE de DESGASTE SUPERADO

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
JEFFERSON CARDENAS	1073684726	TRANSMILENIO SA	
Jayuth Quintero	1015 99 938	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	75.091.754	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 29-09-2026

Numero Cabina: C082

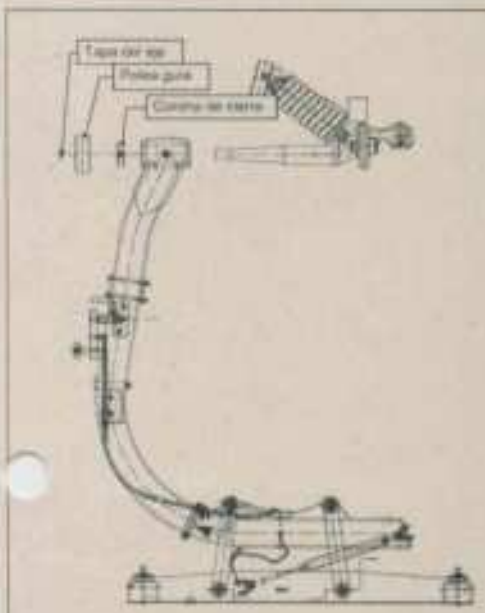



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Perno de Presion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tenefijo	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RELAVER COLUMNA ESQUINA
27	Pintura Interior Cabina		X		RELAVER COLUMNA ESQUINA
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		ROTON PARTE SUPERIOR
33	Pasamanos interno		X		TORNILLO MAL ESTADO
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos interiores	X			
41	Puerta izquierda		X		RELAVER ESTADO CHEVE
42	Puerta derecha		X		RELAVER ESTADO CHEVE
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Faldon	X			
45	Escribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar izquierdo	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687725	TRANSMILENIO SA	
Dayuth Castellano	1095 619936	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Arrieta G.	75.091.737	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 01/06/2026

Numero Cabina: 0083





	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil				NUEVA
6	Horquilla fija				NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Cartel horquillas				NUEVA
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taquillas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUI
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUI
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		ROTA
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno		X		RETOQUES PINTURA PASAMA
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio escurreno delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio escurreno trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES ESTRIBO PUER
42	Puerta derecha		X		RETOQUES ESTRIBO PUERTA
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Parlay de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 32 PELICULA INTERIOR NO TIENE

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687725	TRANSMILENIO SA	
Elkin James Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.737	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 M3D Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 01-06-2026

Numero Cabina: CO8H

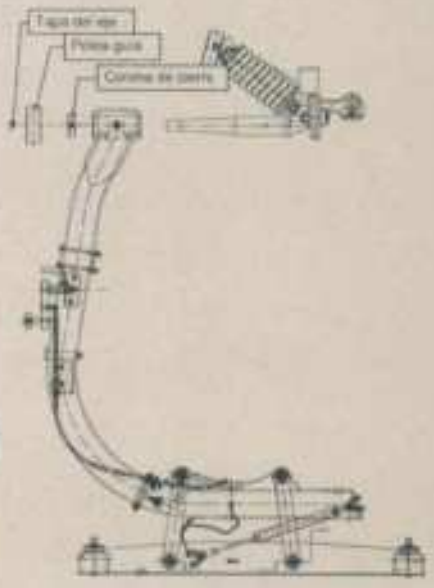

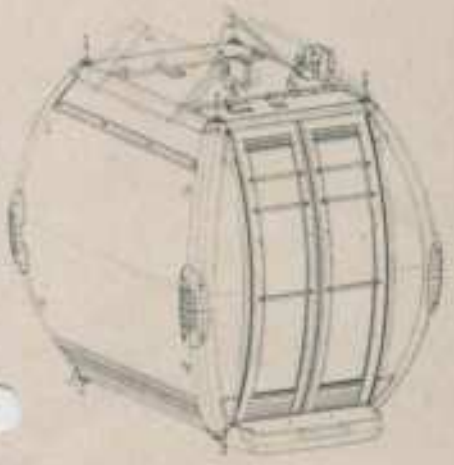

	Descripción	Cantidad	No Cantidad	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acostamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil	X			NUEVA
6	Montaza fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Cano montazas	X			NUEVA
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RELADRA COLUMNA ESQUI
27	Pintura interior Cabina		X		RETAQUEADA COLUMNA ESQUI
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		ROTA
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		ACRILICO PARTIDO SIERRO
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		REPARADA ESTRIBO CHEE
42	Puerto derecha		X		REPARADA ESTRIBO CHEE
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Panas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	Elkin Jaimes
Ricardo Arzate G.	75.091.737	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MSD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 01-06-2026

Numero Cabina: 0085

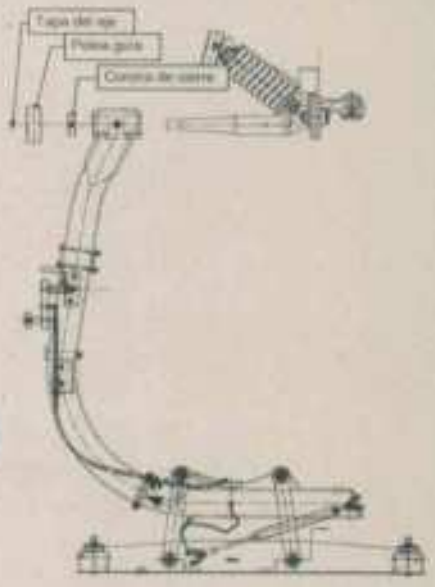



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleas de Acostamiento	X			
2	Poleas de Rodadura delantera	X			
3	Poleas de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Punto de Fricción	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUINE
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUIN
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		ROTA
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Laterales		X		ACRILICO SUPERIOR PARTIDO
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos		X		SOPORTE ACRILICO PARTIDO
41	Puerta izquierda		X		SOLDADURA ESTRIBO CHOF
42	Puerta derecha		X		SOLDADURA ESTRIBO CHOF
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: RUEDAS DE CARGA CON DESGASTE
32 ACRILICO NO TIENE PELICULA

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Elkin Julmes Ortiz	1049806481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.757.	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 01-06-2026

Numero Cabina: C086

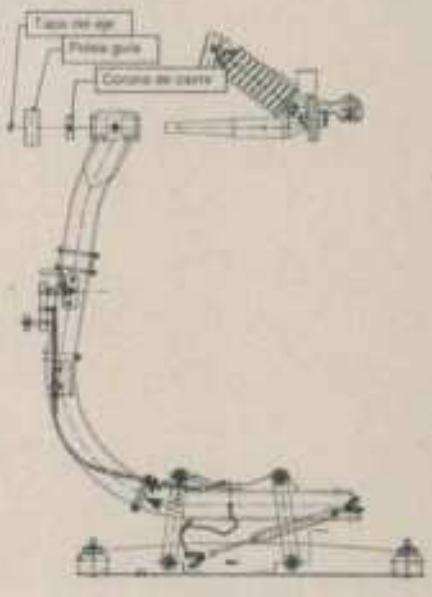



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Móvil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento o distancia	X			
18	Tolofles	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		OXIDACION BOTOLA
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		PELADURA COLUMNA ESQUI
27	Pintura interior Cabina		X		PELADURA COLUMNA ESQUI
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		ROTA
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Laterai		X		ACRILICO ANTICO-SOLDA
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero		X		ACRILICO RAYADO
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		PELADURA ESTRIBO EMER
42	Puerta derecha		X		PELADURA ESTRIBO EMER
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		PELADURA EN TECHO
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaramillo	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate C.	75.091.754	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 01-06-2026

Numero Cabina: CABI1

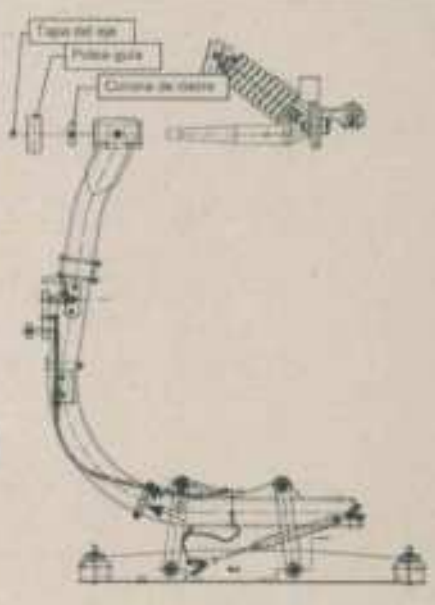

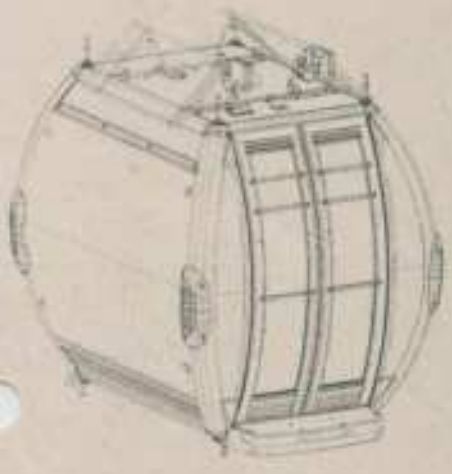

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladtas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		EXPLORACION EN BOTOLA
21	Perrnos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina	X			
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUI
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		ACRILICO FRENTE INTERI
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Sogortas para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES EN ESTRIBO AFEC
42	Puerta derecha		X		RETOQUES ESTRIBO AFEC
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Centro de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaws Ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	Ellen Jaws
Ricardo A	75.091.752	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 04-06-2026

Numero Cabina: C088

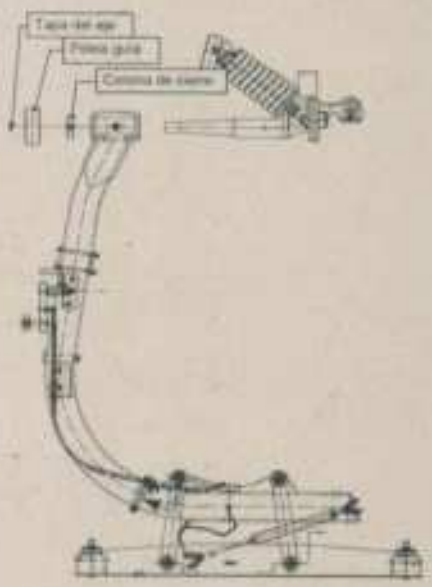



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleo de Acoplamiento	X			
2	Poleo de Rodadura delantera	X			
3	Poleo de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			NUEVA
6	Mordaza fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			NUEVO
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		OXIDACION PINTURA
21	Palmas de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUI
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUI
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		VIDRIO RAYADO
31	Acrilico o vidrio trasero		X		VIDRIO RAYADO
32	Acrilico Lateral		X		RAYADO SIN PELICULA VER
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES ESTRIBO ENERGY
42	Puerta derecha		X		RETOQUES ESTRIBO ENERGY
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		RETOQUES TECHO
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jane Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.737.	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 04-06-2026

Numero Cabina: CAB9

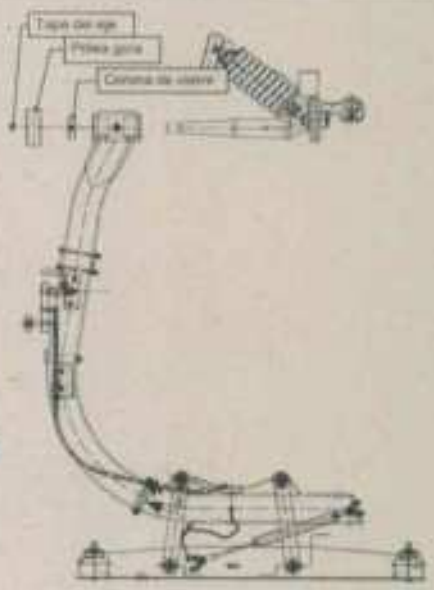



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acostamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Poleo Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES COLOR INCORRECTO
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES COLOR INCORRECTO
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Roto
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		ACRILICO RAYADO - SUCIO
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		PEQUEÑA ESTRIBO CHEQUEADO
42	Puerta derecha		X		PEQUEÑA ESTRIBO CHEQUEADO
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Cielos de rozamiento	X			
49	Pertas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
JEFFERSON CARDENAS	1073687726	TRANSMILENIO SA	
ELKIN SOLIS ORTIZ	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ACEVEDO C.	75.091.737	O.D.T	

TransMiCable
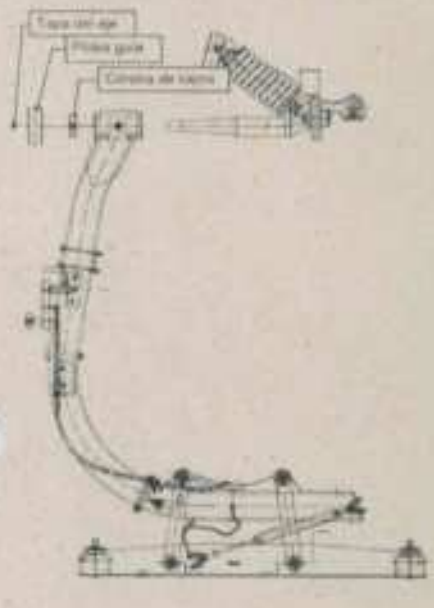
FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 02-06-2026

Numero Cabina: C092





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		DESGASTE
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tuercas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		REPARCHA COLUMNA ESCALA
27	Pintura interior Cabina		X		REPARCHA COLUMNA ESCALA
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		ACRILICO RAYADO
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		ACRILICO SIN PELICULA
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos		X		SOPORTE ACRILICO ROTO
41	Puerta izquierda		X		PINTURA ESTADO EMERGE
42	Puerta derecha		X		PINTURA ESTADO EMERGE
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Cuerpo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: 6 cabina fuera de operacion por limite de desgaste superado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Elkin James Ortz	1096806481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091757	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 02-06-2026

Numero Cabina: 0093



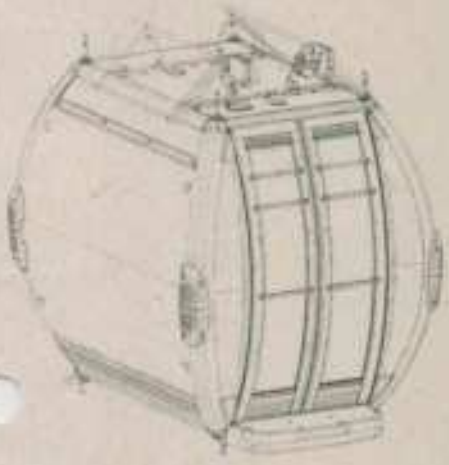

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acostamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			NIVELAR
6	Mordaza fija	X			NIVELAR
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montaje	X			NIVELAR
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tetafos	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUINA
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES COLUMNA ESQUINA
28	Antimpactos de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		ACRILICO RAYADO
31	Acrilico o vidrio trasero		X		ACRILICO RAYADO
32	Acrilico Lateral		X		ACRILICO LATERAL SIN RETIRO
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES EXTERIOR EMERGENCIA
42	Puerta derecha		X		RETOQUES EXTERIOR EMERGENCIA
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		RETOQUES EN PINTURA
47	Amarres Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Edwar Jonny ortiz	1095906481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 02-06-2025

Numero Cabina: 0094

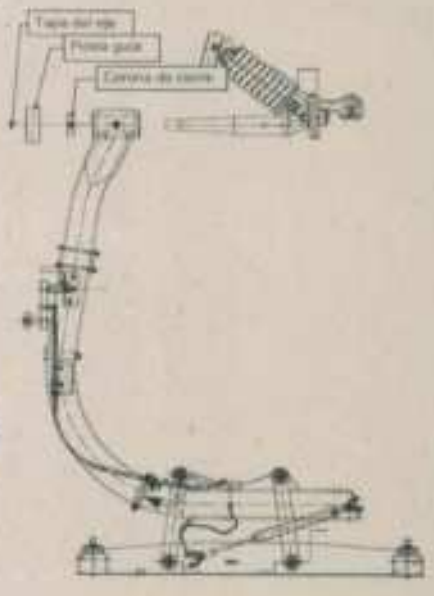



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			NUEVA
6	Mordaza fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Cartel montajes	X			NUEVA
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RELACIÓN TECHANA ESCAMA
27	Pintura interior Cabina		X		RELACIÓN COLUMNA SOCIAL
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		BETA ARANDELA TOPE PUERTA
30	Acrilico o vidrio frontal		X		ACRILICO RAYADO
31	Acrilico o vidrio trasero		X		ACRILICO PARTIDO Y RAYADO
32	Acrilico Lateral		X		ACRILICO SIN PELICULA Y RAYA
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RELACIÓN ESTRIBO CHAPETA
42	Puerta derecha		X		RELACIÓN ESTRIBO CHAPETA
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wan y soportes antenas		X		ANTENA TRASERA ROTA
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel lateral delantero	X			
53	Panel lateral trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073687776	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaimes Ortiz	1093800481	CABLEMOVIL SAS	Ellen Jaimes
Ricardo Alexis G.	75.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 12-06-2026

Numero Cabina: 0045

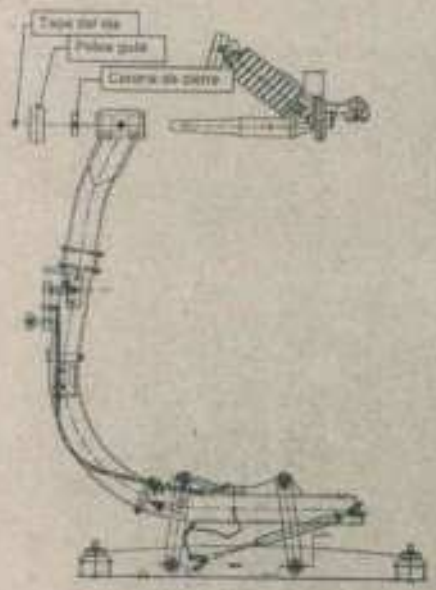



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Poleas de Acoplamiento	X			
2	Poleas de Rodadura delantera	X			
3	Poleas de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		DESGASTE
6	Mordaza fija		X		DESGASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Cansi mordazas		X		DESGASTE
10	Forro de Fricción	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspensión (3)	X			
15	Armazón de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tirafrex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES GUAYA ESQUI
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES GUAYA ESQUI
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		JUNTA PUERTA ACER
30	Acrílico o vidrio frontal		X		ACRILICO RAYADO
31	Acrílico o vidrio trasero		X		VIDRIO RAYADO
32	Acrílico Lateral		X		VIDRIO RAYADO
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrílico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrílico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrílicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES ESTRIBO DE ENTRA
42	Puerta derecha		X		RETOQUES ESTRIBO ENTRADA
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Arandelas Wilan y soportes anteriores	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
JEFFERSON CARDENAS	1073687776	TRANSMILENIO SA	
EDWIN SANTA CRUZ	1095906481	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G	75 091757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 07-5-6-2026

Numero Cabina: CAB6

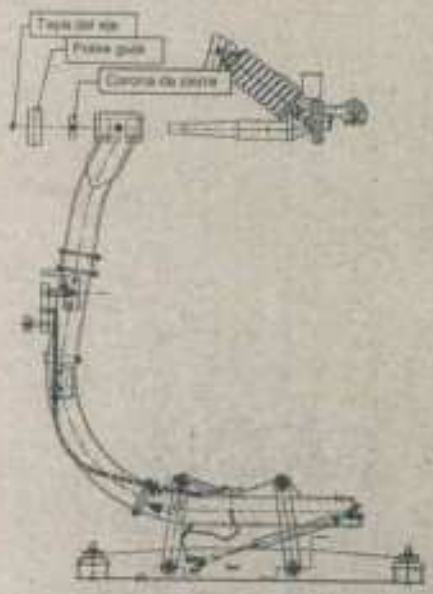



	Descripción	Cabina	No Cabina	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaza Movil	X			NUEVA
6	Montaza fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montajas	X			NUEVA
10	Perno de Pivotaje	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Almazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento e distancia	X			
17	Palanca de accionamiento e distancia	X			
18	Tensfau	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		PINTADA COLUMNA EXTERIOR
27	Pintura interior Cabina		X		PINTADA COLUMNA EXTERIOR
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Luces Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		VIDRIO ROTADO ACRILICO FRENTE
32	Acrilico Lateral		X		ACRILICO ROTADO SIN ARTICULA
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta Izquierda		X		PUERTA ESTRIBO ENFRENTE
42	Puerta derecha		X		PUERTA ESTRIBO ENFRENTE
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Carrito	X			
45	Carrito de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			PANEL TECHO CABINA
47	Antenas Wlan y soportes antenas		X		
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073683776	TRANSMILENIO SA	
Edwar Sport ortiz	1095808481	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G	79.091.757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 02-06-2026

Numero Cabina: 6081

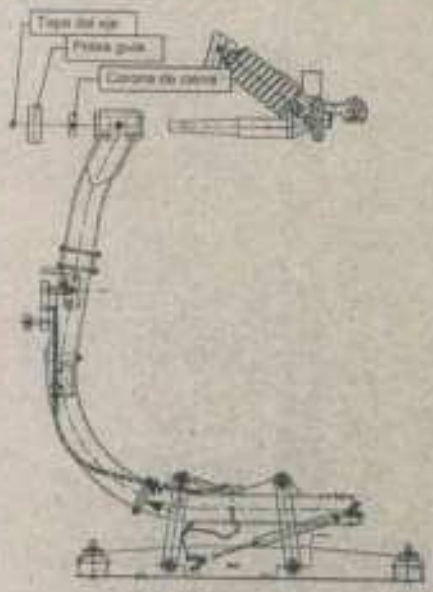



	Descripción	Cantidad	No. Cantidad	NO aplica	Observaciones
1	Poleas de Acoplamiento	X			
2	Poleas de Rodadura delantera	X			
3	Poleas de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Montaje Movil		X		DESCASTE
6	Montaje fija		X		DESCASTE
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montajes		X		DESCASTE
10	Pomo de Empuje	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspensión (1)	X			
15	Amazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tolahier	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUES OSCUROS ESCASOS
27	Pintura interior Cabina		X		RETOQUES OSCUROS ESCASOS
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		VIDRIO RAYADO Y GRAFITEADO
32	Acrilicos Laterales		X		VIDRIO RAYADO
33	Pasamanos interno		X		PINTURA RETOCADA
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera		X		RAYADA
39	Ventana de guillotina trasera		X		RAYADA
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		RETOQUES OSCUROS EMERG
42	Puerta derecha		X		RETOQUES OSCUROS EMERG
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	1073 687 726	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose del R	1045806418	CABLEMOVIL SAS	
Ricardo Alzate G.	75 091 754	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 16 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 27-06-2025

Numero Cabina: 1068

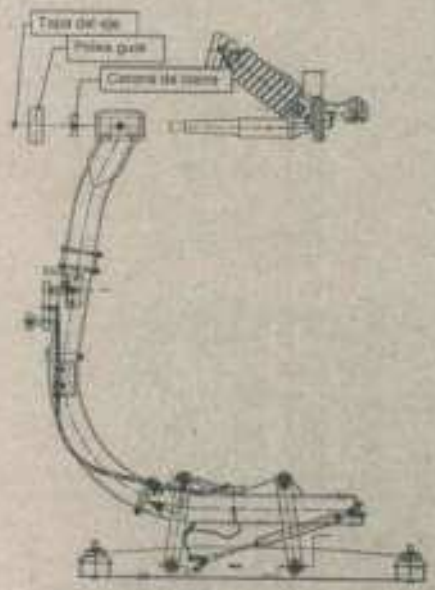



	Descripción	Conforme	No Conforme	No Aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil	X			NUEVA
6	Horquilla fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			NUEVA
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taleñas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		RETOQUE PINTURA EXTERIOR
27	Pintura interior Cabina	X			
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		NOTIFICAR TODAS LAS PUERTAS
30	Acrilico o vidrio frontal		X		ACRILICO RAYADO
31	Acrilico o vidrio trasero		X		ACRILICO RAYADO
32	Acrilico Lateral		X		VIDRIO ROJIZO, SIN FALTA
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		REPARACION ESTRIBO IZQUIERDO
42	Puerta derecha		X		REPARACION ESTRIBO DERECHO
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Listón de nuzamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad:	Firma
JEFFERSON CARDENAS	1073 687 726	TRANSMILENIO SA	
EDWIN SAENZ CAL 12	1045800611 BH	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G	75 CAL 757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002988

Fecha: 02-06-2026

Numero Cabina: 00999

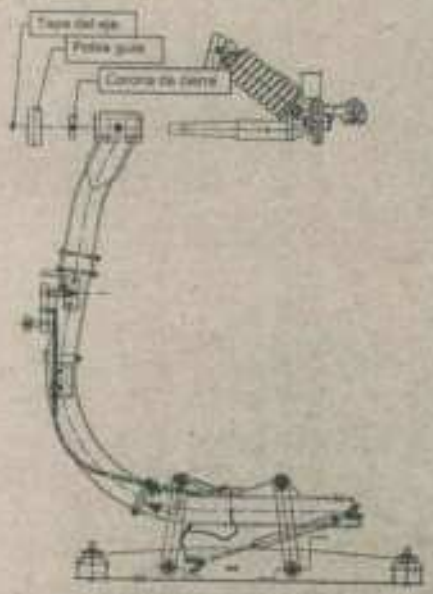



	Descripción	Cantidad	Estado	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			NUEVA
6	Mordaza fija	X			NUEVA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			NUEVA
10	Perno de Pinzaje	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tirafias	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de freno	X			
21	Perno de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		PINTADA AMARILLA ESQUINE
27	Pintura interior Cabina		X		REMODELACION LA ESQUINE
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		TOPE DE PUERTA EN MAL ESTADO
30	Acrilico o vidrio frontal		X		LIJADO PULIDO
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		LIJADO PULIDO APRETADO ROTO
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos		X		SOPORTE ACRILICO TRASERO
41	Puerta izquierda		X		IZQUIERDA ESTABA DOBLADA
42	Puerta derecha		X		DERECHA ESTABA DOBLADA CAMBIADA
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Satélite	X			
45	Carrito de guia	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	Antenas Wifi y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de las participantes

Nombre	Numero de Identificación	Entidad	Firma
JEFFERSON CARDENAS	1073687726	TRANSMILENIO SA	
Erik [illegible]	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
RICARDO ALZATE G.	75091757	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGO Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 03-06-26

Numero Cabina: 2108

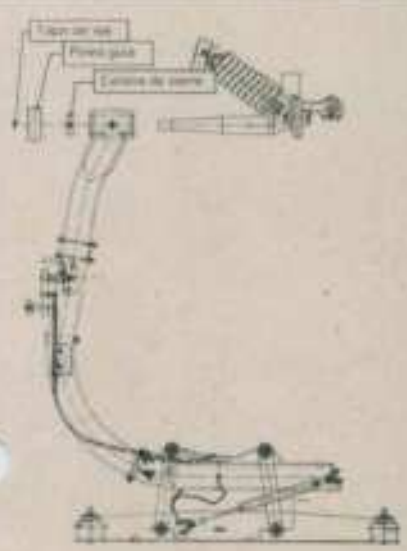



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	/			
2	Polea de Rotadura delantera	/			
3	Polea de Rotadura trasera	/			
4	Polea Guia	/			
5	Mordaza Movil		/		Desgaste
6	Mordaza fija		/		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	/			
8	Resorte principal derecho	/			
9	Canal mordazas		/		Desgaste
10	Forro de Friccion	/			
11	Lengüeta delantera	/			
12	Lengüeta trasera	/			
13	Corona de Cierre	/			
14	Barra de suspension (2)	/			
15	Armazon de 4 puntos	/			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	/			
17	Palanca de accionamiento a distancia	/			
18	Tijeritas	/			
19	Brazo apertura puerta	/			
20	Cilindro de Freno	/			
21	Perros de Suspension	/			
22	Biela derecha 1	/			
23	Biela derecha 2	/			
24	Biela izquierda 1	/			
25	Biela izquierda 2	/			
26	Pintura exterior Cabina		X		pintura en colores opacos
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	/			
29	Juntas Puertas	/			
30	Acrilico o vidrio frontal		/		vidrio rayado
31	Acrilico o vidrio trasero		/		vidrio rayado
32	Acrilico Lateral		/		vidrio rayado y con pelicula
33	Pasamanos interno	/			
34	Ventana Abatible inferior delantera	/			
35	Ventana Abatible inferior trasera	/			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	/			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	/			
38	Ventana de guillotina delantera	/			
39	Ventana de guillotina trasera	/			
40	Soportes para acrilicos internos	/			
41	Puerta izquierda		X		Pelicula en adhesivo exterior
42	Puerta derecha		X		pelicula en adhesivo exterior
43	Mecanismo de apertura de puerta	/			
44	Carrito	/			
45	Carrito de guia	/			
46	Techo de la Cabina		X		techo Cabina pelicula
47	Antenas Wifi y soportes antenas	/			
48	Liston de rozamiento	/			
49	Patas de transporte	/			
50	Silla delantera	/			
51	Silla trasera	/			
52	Panel Solar delantero	/			
53	Panel solar trasero	/			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes Ortiz	1095800481	CABLEMOVIL SAS	Elkin Jaimes
Brandon Ebang	1090227659	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 03-06-26

Numero Cabina: C101





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleo de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓	✓		Rayada
5	Mordaza Movil		✓		Desgastada
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho		✓		Roto
9	Canal mordazas	✓			
10	Patin de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Correa de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Pedal de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Tijeritas	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perfiles de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		✓		Pintura en colores equivocados pintada en colores diferentes
27	Pintura interior Cabina		✓		
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero		✓		Vidrio Rayado Vidrio roto y la pelicula Estirada
32	Acrilico Lateral		✓		
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda	✓			
42	Puerta derecha	✓			
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓	X		pintado en toda
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Arrecon Viajero y soportes anteriores	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	7964825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaime Ortiz	1095804948	CABLEMOVIL SAS	
Brayan Diaz	1090227655	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 03-06-24

Numero Cabina: 102

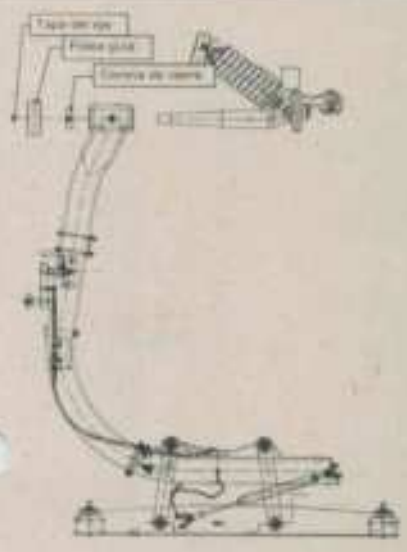



Descripción	Cumple	No Cumple	NO aplica	Observaciones
1 Polea de Acoplamiento	✓			
2 Polea de Rodadura delantera	✓			
3 Polea de Rodadura trasera	✓			
4 Polea Guia	✓			
5 Mordaza Movil		✓		Pequeña Rayada
6 Mordaza fija		✓		
7 Resorte principal izquierdo	✓			
8 Resorte principal derecho	✓			
9 Canal mordazas		✓		Rayada
10 Forro de Friccion	✓			
11 Lengueta delantera	✓			
12 Lengueta trasera	✓			
13 Corona de Cierre	✓			
14 Barra de suspension (2)				
15 Armazon de 4 puntos				
16 Rodillo de accionamiento a distancia				
17 Palanca de accionamiento a distancia				
18 Tolvillos				
19 Brazo apertura puerta				
20 Cilindro de Freno				
21 Pernos de Suspension				
22 Biela derecha 1				
23 Biela derecha 2				
24 Biela izquierda 1				
25 Biela izquierda 2				
26 Pintura exterior Cabina		✓		Pintada en columnas de esquineros.
27 Pintura interior Cabina		✓		
28 Almohadillas de goma (4)				
29 Juntas Puertas		✓		rota
30 Acrilico o vidrio frontal				
31 Acrilico o vidrio trasero				
32 Acrilico Lateral		✓		Sin pelicula
33 Pasamanos interno				
34 Ventana Abatible interior delantera				
35 Ventana Abatible interior trasera				
36 Acrilico o Vidrio seguridad delantero				
37 Acrilico o Vidrio seguridad trasero				
38 Ventana de guillotina delantera		✓		Manivela rayada Manivela rayada
39 Ventana de guillotina trasera		✓		
40 Soportes para acrilicos internos				
41 Puerta izquierda				
42 Puerta derecha		✓		Pintada en ventanas pelada en alrededor
43 Mecanismo de apertura de puerta		✓		
44 Estribo				
45 Estribo de guia				
46 Techo de la Cabina				
47 Antenas Wlan y soportes externas				
48 Liston de rozamiento				
49 Patas de transporte				
50 Silla delantera				
51 Silla trasera				
52 Panel Solar delantero				
53 Panel solar trasero				

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de Identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	7966182	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaime Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Bismar Gomez	1090237654	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 03-06-26

Numero Cabina: C103





Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1 Polea de Acoplamiento	/			
2 Polea de Rodadura delantera	/			
3 Polea de Rodadura trasera	/			
4 Polea Guia	/			
5 Mordaza Movil		/		Ajuste
6 Mordaza fija		/		Ajuste
7 Resorte principal izquierdo	/			
8 Resorte principal derecho	/			
9 Canal mordazas		/		Ajuste
10 Forro de Friccion	/			
11 Lengüeta delantera	/			
12 Lengüeta trasera	/			
13 Corona de Cabina	/			
14 Barra de suspension (2)				
15 Armazon de 4 puntos				
16 Pulsito de accionamiento a distancia				
17 Palanca de accionamiento a distancia				
18 Teléfono				
19 Brazo apertura puerta				
20 Cilindro de Freno				
21 Pernos de Suspensión				
22 Biela derecha 1				
23 Biela derecha 2				
24 Biela izquierda 1				
25 Biela izquierda 2				
26 Pintura exterior Cabina		/		Retirar la calcomanía de los ejes
27 Pintura Interior Cabina		/		
28 Almohadillas de guia (4)				
29 Juntas Puertas		/		Retirar toda película
30 Acrilico o vidrio frontal				
31 Acrilico o vidrio trasero		/		Quitar rastro película
32 Acrilico Lateral		/		
33 Pasamanos interno				
34 Ventana Abatible interior delantera				
35 Ventana Abatible interior trasera				
36 Acrilico o vidrio esquinero delantero				
37 Acrilico o vidrio esquinero trasero				
38 Ventana de guillotina delantera				
39 Ventana de guillotina trasera				
40 Soportes para acrilicos internos		/		Seguir cambio Vota película en ejes bajo fuido en ejes
41 Puerta izquierda		/		
42 Puerta derecha		/		
43 Mecanismo de apertura de puerta				
44 Eje/s				
45 Eje/s de guia				
46 Techo de la Cabina				
47 Antenas Wlan y soportes antenas				
48 Cinturon de rozamiento				
49 Patas de transporte				
50 Silla delantera				
51 Silla trasera				
52 Panel Solar delantero				
53 Panel solar trasero				

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661925	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Perez	1090227655	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0003688

Fecha: 03-04-24

Numero Cabina: 2104.

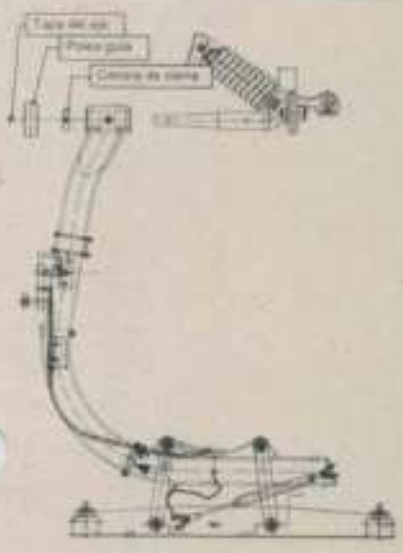



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Roles de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Montaza Movil		✓		Dañado
6	Montaza Fija		✓		Dañado
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal montazas		✓		Dañado
10	Pomo de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Cuerpo de Cierre	✓			
14	Barra de suspension 10	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de acoplamiento a distancia	✓			
17	Palanca de acoplamiento a distancia	✓			
18	Tolvillas	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspension	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		✓		Ordinaria en deficiencia pelada en exteriores
27	Pintura interior Cabina		✓		pelada en exteriores
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero		✓		opaco mal empañado
32	Acrilico Lateral		✓		En perfil interno
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio exterior delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio exterior trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda	✓			
42	Puerta derecha	✓			
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Zuncho de guia	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Llaves de ocupamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales: La cabina Fuera de operacion por limite de desgaste superado

Informacion de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661835	TRANSMILENIO SA	
Ellen Sara ortiz	1095806468	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Perez	1082227656	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 03-06-26

Numero Cabina: C105





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rotadura delantera	✓			
3	Polea de Rotadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Montaje Movil		✓		Ok ajuste
6	Montaje fija		✓		Ajuste
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal montajes		✓		Ajuste.
10	Perno de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Camara de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (I)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Tetafias	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspension	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		✓		pelados en colores exteriores
27	Pintura interior Cabina		✓		
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas		✓		Junta de puerta izquierda trasera rota
30	Acrilico o vidrio frontal		✓		Acrilico frontal roto
31	Acrilico o vidrio trasero		✓		Acrilico trasero roto rallado roto y sin pelicula
32	Acrilico Lateral		✓		
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera		✓		Ajuste.
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera		✓		Vidrio trasero roto. Soporte roto
40	Soportes para acrilicos interiores		✓		
41	Puerta izquierda		✓		pelados en colores
42	Puerta derecha		✓		pelados en colores
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Eje cilindro	✓			
45	Eje cilindro de giro	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Asientos ofasi y soportes antenas	✓			
48	Llaves de rozamiento	✓			
49	Palas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Bonilla	79169825	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier Ortiz	1049580641	CABLEMOVIL SAS	
Brayan Perez	1090227056	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 03-06-2026

Numero Cabina: 106

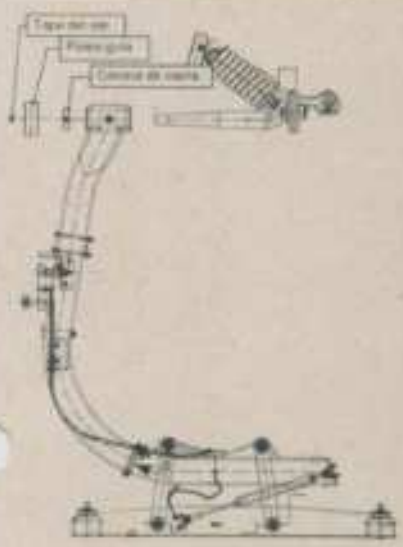



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Poleas de Acoplamiento	✓			
2	Poleas de Rodadura delantera	✓			
3	Poleas de Rodadura trasera	✓			
4	Poleas Guia	✓			
5	Horquilla Movil		✓		Dejarla
6	Horquilla fija		✓		Dejarla
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal horquillas		✓		Dejarla
10	Perno de Presion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Cabeza de Cierre	✓			
14	Barra de suspension III	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Radios de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Telefax	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina	✓			
27	Pintura interior Cabina		✓		Pintada sin colores reglamentarios
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Lonas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		✓		Pintada en colores reglamentarios
42	Puerta derecha		✓		Pintada en colores reglamentarios
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Anclajes Wire y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma:
Juan Calos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Brayan Perez	1090227658	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 03-oct-2025

Numero Cabina: C107.

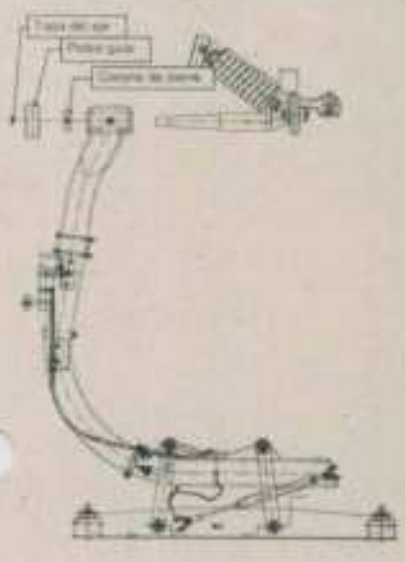



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil		✓		Desgaste.
6	Mordaza fija		✓		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas		✓		Desgaste
10	Perno de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Tasefles	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		✓		Peladas en algunas zonas
27	Pintura interior Cabina		✓		
28	Acrimatillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral		✓		vidrio fijo
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio exterior delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio exterior trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		✓		Pelada en algunas
42	Puerta derecha		✓		Pelada en algunas
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Tornillo de giro	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Antenas Wifi y soportes anteriores	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Suelo delantero	✓			
53	Panel suelo trasero	✓			

Observaciones Generales: Cabina fuera de operacion por limite de desgaste superado

Información de los participantes


Nombre:	Numero de identificacion:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661875	TRANSMILENIO SA	
Ellen Sara Ortiz	1095804484	CABLEMOVIL SAS	
Brandon Stacy	1090237658	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 03-06-2024
Numero Cabina: 2108

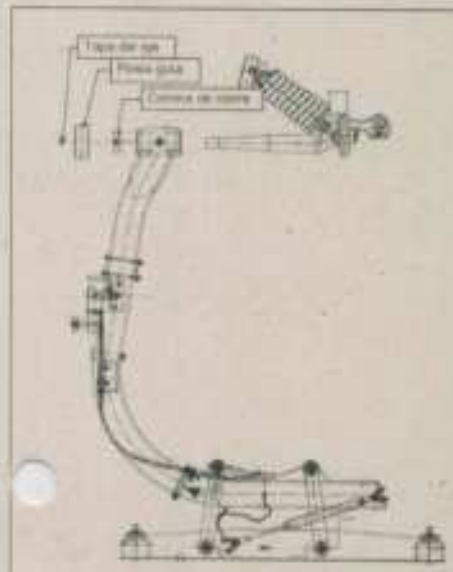



Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1 Polea de Acoplamiento	✓			
2 Polea de Rodadura delantera	✓			
3 Polea de Rodadura trasera	✓			
4 Polea Guia	✓			
5 Mordaza Movil		✓		Desajuste
6 Mordaza fija				Desajuste
7 Resorte principal izquierdo	✓			
8 Resorte principal derecho	✓			
9 Canal mordazas		✓		Desajuste
10 Forro de Friccion	✓			
11 Langüeta delantera	✓			
12 Langüeta trasera	✓			
13 Cerrojo de Cierre	✓			
14 Barra de suspension (I)	✓			
15 Armazon de 4 puntos	✓			
16 Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17 Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18 Telefono	✓			
19 Brazo apertura puerta	✓			
20 Cilindro de Freno	✓			
21 Perros de Suspension	✓			
22 Biela derecha 1	✓			
23 Biela derecha 2	✓			
24 Biela izquierda 1	✓			
25 Biela izquierda 2	✓			
26 Pintura exterior Cabina		✓		Pelados en columnas y techo
27 Pintura interior Cabina		✓		
28 Amortiguadores de goma (4)	✓			
29 Juntas Puertas		✓		Junta de puerta rota
30 Acrilico o vidrio frontal	✓	✓		
31 Acrilico o vidrio trasero				
32 Acrilico Lateral		✓		Vidrio trizado
33 Pasamanos interno	✓			
34 Ventana Abatible interior delantera	✓			
35 Ventana Abatible interior trasera	✓			
36 Acrilico o Vidrio seguridad delantero	✓			
37 Acrilico o Vidrio seguridad trasero	✓			
38 Ventana de guillotina delantera	✓			
39 Ventana de guillotina trasera	✓			
40 Soportes para acrilicos internos	✓			
41 Puerta izquierda		✓		pelados en abajos
42 Puerta derecha		✓		pelados en abajos
43 Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44 Estribo	✓			
45 Estribo de guia	✓			
46 Techo de la Cabina	✓			
47 Antenas Wifi y soportes antenas	✓			
48 Llaves de cuarentena	✓			
49 Pasos de transporte	✓			
50 Silla delantera	✓			
51 Silla trasera	✓			
52 Panel Solar delantero	✓			
53 Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier Ortiz	1093802481	CABLEMOVIL SAS	
Bermudez Henry	1040237658	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 03-02-2026
Numero Cabina: C104





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Montaje Movil		✓		Regusto
6	Montaje fija				Regusto
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal montaje		✓		Regusto
10	Perno de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Cortina de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Tolvillas	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perno de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina	✓			
27	Pintura interior Cabina		X		pelusa en especial
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas		✓		rota junta
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral		✓		Regulo
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Apoltrona interior delantera	✓			
35	Ventana Apoltrona interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		✓		pelusa en abrigo
42	Puerta derecha		✓		pelusa en abrigo
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Cantos	✓			
45	Cantos de giro	✓			
46	Techo de la Cabina		✓		pelusa en pintura
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Camilo Gonzalez	79.661.829	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo Ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Diaz	1090227655	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha:
Numero Cabina: C 110





	Descripción	Conforme	No conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Accionamiento	✓			
2	Polea de Retadora delantera	✓			
3	Polea de Retadora trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil		✓		Desgaste.
6	Mordaza fija		✓		Desgaste.
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordaza		✓		Desgaste.
10	Forro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Telefono	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Puntos de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela Izquierda 1	✓			
25	Biela Izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		✓		Pelada en colores laterales
27	Pintura Interior Cabina	✓	✓		pelada en colores laterales
28	Acrecitaditas de goma (8)	✓			
29	Juntas Puertas		✓		Junta rota.
30	Acrilico o vidrio frontal		✓		Ventana Rayada
31	Acrilico o vidrio trasero		✓		Vidrio rayado
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos Interno		✓		Rayado
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		✓		Pelada en exterior
42	Puerta derecha		✓		pelada en exterior.
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Eje/s	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Antenas Wifi y soportes antenas	✓			
48	Union de rodamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales: 6 cabina fuera de operacion por limite de desgaste superado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661823	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaus ortiz	1049586 y 81	CABLEMOVIL SAS	
Bayron Yanez	1090287696	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002668

Fecha: 05-06-26
Numero Cabina: C111





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	/			
2	Polea de Rodadura delantera	/			
3	Polea de Rodadura trasera	/			
4	Polea Guia	/			
5	Mordaza Movil		/		Desgaste
6	Mordaza Fija		/		Desgaste.
7	Resorte principal izquierdo	/			
8	Resorte principal derecho	/			
9	Canal mordazas		/		Desgaste
10	Forro de Friccion	/			
11	Lengüeta delantera	/			
12	Lengüeta trasera	/			
13	Cuerpo de Cierre	/			
14	Barra de suspension (2)	/			
15	Armazon de 4 puntos	/			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	/			
17	Palanca de accionamiento a distancia	/			
18	Tensiones	/			
19	Brazo apertura puerta	/			
20	Cilindro de Freno	/			
21	Pernos de Suspension	/			
22	Biela derecha 1	/			
23	Biela derecha 2	/			
24	Biela izquierda 1	/			
25	Biela izquierda 2	/			
26	Pintura exterior Cabina		/		Pintura cabina exterior
27	Pintura interior Cabina		/		Pintura cabina interior
28	Acrocnadillos de gorra (4)	/			
29	Llaves Puertas	/			
30	Acrilico o vidrio frontal		/		
31	Acrilico o vidrio trasero	/			
32	Acrilico Lateral	/			
33	Pasamanos interno	/			
34	Ventana Abatible interior delantera	/			
35	Ventana Abatible interior trasera	/			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	/			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	/			
38	Ventana de guillotina delantera		/		Desgaste
39	Ventana de guillotina trasera		/		Desgaste
40	Soportes para acrilicos laterales	/			
41	Puerta izquierda		/		Pintura deteriorada
42	Puerta derecha		/		Pintura deteriorada
43	Mecanismo de apertura de puerta	/			
44	Espejo	/			
45	Espejo de guia	/			
46	Techo de la Cabina	/			
47	Antenas Wifi y soportes antenas	/			
48	Ubicion de rociadores	/			
49	Patas de transporte	/			
50	Silla delantera	/			
51	Silla trasera	/			
52	Panel Solar delantero	/			
53	Panel solar trasero	/			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Juan Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Ellen Julieth Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Brayan Yesid	1090227656	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002588

Fecha: 04-06-26

Numero Cabina: 112





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	/			
2	Polea de Rozadura delantera	/			
3	Polea de Rozadura trasera	/			
4	Polea Guía	/			
5	Horquilla Movil		/		Desgaste
6	Horquilla Fija		/		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	/			
8	Resorte principal derecho	/			
9	Canal montadas		/		Desgaste
10	Puno de Friccion	/			
11	Lengüeta delantera	/			
12	Lengüeta trasera	/			
13	Cuerpo de Cierre	/			
14	Barra de suspension (2)	/			
15	Articulon de 4 puntos	/			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	/			
17	Palanca de accionamiento a distancia	/			
18	Taladros	/			
19	Brazo apertura puerta	/			
20	Cilindro de Freno	/			
21	Perno de Suspension	/			
22	Biela derecha 1	/			
23	Biela derecha 2	/			
24	Biela izquierda 1	/			
25	Biela izquierda 2	/			
26	Pintura exterior Cabina		/		Pelusas Columna ejes lado Pelusas cabina esquinas
27	Pintura interior Cabina		/		
28	Almohadillas de goma (4)	/			
29	Juntas Puertas	/			
30	Acrilico o vidrio frontal	/			
31	Acrilico o vidrio trasero	/			
32	Acrilico Laterales	/			
33	Pasamanos interno	/			
34	Ventana Abatible interior delantera	/			
35	Ventana Abatible interior trasera	/			
36	Acrilico o Vidrio exquinero delantero	/			
37	Acrilico o Vidrio exquinero trasero	/			
38	Ventana de guitarra delantera		/		Rajada esquina
39	Ventana de guitarra trasera		/		
40	Soportes para acrilicos internos	/			
41	Puerta izquierda		/		Pelusas ejes lado
42	Puerta derecha		/		Pelusas ejes lado
43	Mecanismo de apertura de puerta	/			
44	Cerrojo	/			
45	Ejercito de guia	/			
46	Techo de la Cabina		/		pelusitas
47	Antenas Wlan y soportes antenas	/			
48	Ojeton de movimiento	/			
49	Polea de transporte	/			
50	Silla delantera	/			
51	Silla trasera	/			
52	Panel lateral delantero	/			
53	Panel lateral trasero	/			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Gonzalez	79661 823	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Brayan Perez	1090237654	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002S88

Fecha:

Numero Cabina: C113





	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento				
2	Polea de Rodadura delantera				
3	Polea de Rodadura trasera				
4	Polea Guia				
5	Mordaza Movil				
6	Mordaza fija				
7	Resorte principal izquierdo				
8	Resorte principal derecho				
9	Carro mordazas				
10	Perno de friccion				
11	Lengüeta delantera				
12	Lengüeta trasera				
13	Cordon de Cierre				
14	Barra de suspension 10				
15	Armazon de 4 puntos				
16	Rodillo de accionamiento a distancia				
17	Palanca de accionamiento a distancia				
18	Telefax				
19	Brazo apertura puerta				
20	Cilindro de Freno				
21	Pernos de Suspension				
22	Riela derecha 1				
23	Riela derecha 2				
24	Riela izquierda 1				
25	Riela izquierda 2				
26	Pintura exterior Cabina	✓			Pintura color ewing
27	Pintura interior Cabina	✓			Pintura color ewing
28	Antivandalicas de goma (6)				
29	Juntas Puertas				
30	Acrilico o vidrio frontal				
31	Acrilico o vidrio trasero				
32	Acrilico Lateral	✓			Izquierdo
33	Pasamanos interno				
34	Ventana Abatible interior delantera				
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			Falta tornillo
36	Acrilico o Vidrio izquierdo delantero				
37	Acrilico o Vidrio izquierdo trasero				
38	Ventana de guillotina delantera	✓			Vidrio empuñadura.
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos				
41	Puerta izquierda	✓			Rayones
42	Puerta derecha	✓			Pintura
43	Mecanismo de apertura de puerta				
44	Estribo				
45	Zapato de guia				
46	Techo de la Cabina				
47	Antenas Wlan y soportes antenas				
48	Liston de rozamiento				
49	Pulsa de transporte				
50	Silla delantera				
51	Silla trasera				
52	Panel lateral delantero				
53	Panel lateral trasero				

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Juan Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Edgar Javier Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Brayan Perez	1090227656	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha:

Numero Cabina: C114





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acostamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Forro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Carcasa de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Tasellos	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		✓		pendiente pintarla
27	Pintura interior Cabina		✓		
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero		✓		pendiente.
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera		✓		empuñadura pendiente.
39	Ventana de guillotina trasera		✓		
40	Soportes para acrilicos internos		✓		
41	Puerta izquierda		✓		pendiente pintarla
42	Puerta derecha		✓		pendiente.
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Eje/pin	✓			
45	Eje/pin de guia	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Anclajes Wan y soportes internos	✓			
48	Lateral de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales: Sencilla vinjeta C114 terminada

Información de los participantes

Nombres:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Yara ortiz	1049580044	CABLEMOVIL SAS	
Bayron Perez	1010227655	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA000/2688

Fecha: 5-06-26

Numero Cabina: 2115





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Pasa de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntas	✓			
16	Rodillo de encostramiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Taleñas	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		✓		Retoques Cabina Bizcocho Retoques Cabina Amarillo
27	Pintura interior Cabina		✓		
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas		✓		Roto Empujado
30	Acrilico o vidrio frontal		✓		
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Acrilica interior delantera	✓			
35	Ventana Acrilica interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera		✓		Bizcocho Empujado
39	Ventana de guillotina trasera		✓		
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		✓		Retoques Retoques
42	Puerta derecha		✓		
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Antenas Wifi y soportes antenas	✓			
48	Ubicion de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad:	Firma:
Juan Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier Ortiz	1023806482	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Daza	1090127055	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 05-06-16

Numero Cabina: C.116

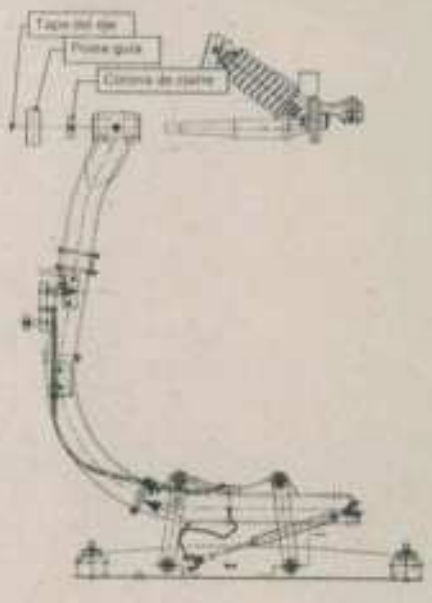

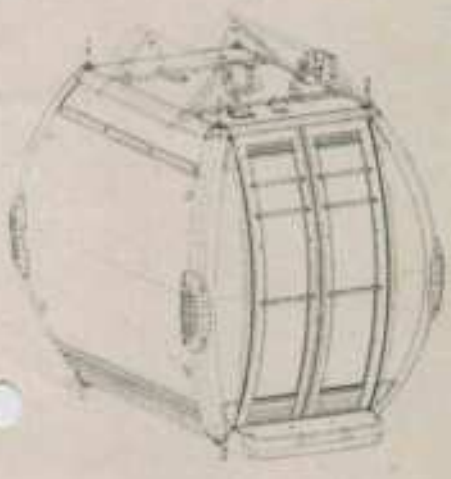

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Horquilla Movil	✓			
6	Horquilla fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Forro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Clame	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Taliflex	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras
27	Pintura interior Cabina		X		Peladuras
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilicos Laterales	✓			
33	Pasamanos Interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos inoxmus	✓			
41	Puerta izquierda		X		Estribo rayado
42	Puerta derecha		X		Vidrio roto
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Fanbo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Rayado
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales: Foro de pin de carga roto

A6 Techo rayado

26 Peladura en panel frontal derecho

26 Peladura en panel trasero derecho

26 Peladura en panel frontal izquierdo

A2 Tapa de puerta inferior derecha rota

A1 Estribo de puerta izquierda rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Andres Albarracin	1'030.629.042	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes O.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Bermudez Dany	1090227058	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 05-06-26

Numero Cabina: 5117





	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Forro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Tensfles	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspension	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Pelados
27	Pintura Interior Cabina		X		Pelados
28	Amortiguadores de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas		X		Rotas
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		Estribos rayados
42	Puerta derecha		X		Estribos rayados
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Techo	✓			
45	Techo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales: 38. Pelados en piso trasero derecho
36. Pelados en piso frontal derecho
34. Pelados en piso interno trasero derecho
28. Pelados en piso frontal izquierdo
29. Goma de puerta izquierda rota
29. Goma de puerta derecha rota
41-42 Estribos de puertas rayados

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andres Arbelaez	1'030.629.047	TRANSMILENIO SA	
Edwin James O.	1.095.856.481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Pang	1092217058	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 05-06-16

Numero Cabina: C-18

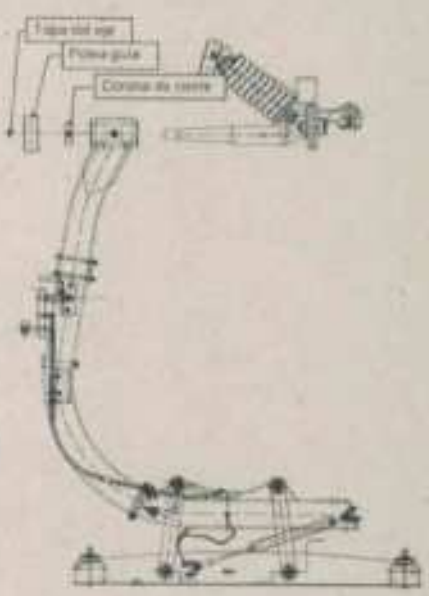

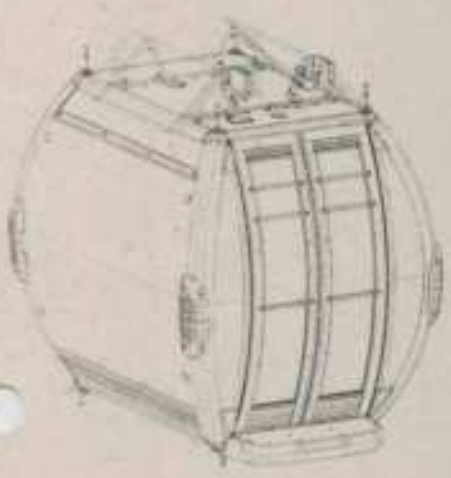

	Descripción	Cantidad	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	/			
2	Polea de Rodadura delantera	/			
3	Polea de Rodadura trasera	/			
4	Polea Guia	/			
5	Montaña Movil		X		Desgaste
6	Montaña fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	/			
8	Resorte principal derecho	/			
9	Cartel montanas		X		Desgaste
10	Foro de Friccion	/			
11	Lengueta delantera	/			
12	Lengüeta trasera	/			
13	Corona de Cierre	/			
14	Barra de suspension (I)	/			
15	Armazon de 4 puntos	/			
16	Pedillo de accionamiento a distancia	/			
17	Palanca de accionamiento a distancia	/			
18	Telefax	/			
19	Brazo apertura puerta	/			
20	Cilindro de Freno	/			
21	Pernos de Suspension	/			
22	Biela derecha 1	/			
23	Biela derecha 2	/			
24	Biela izquierda 1	/			
25	Biela izquierda 2	/			
26	Pintura exterior Cabina	/			
27	Pintura interior Cabina		X		Presenta Rayones
28	Almohadillas de goma (4)	/			
29	Juntas Puertas		X		Gomas rotas
30	Acrilico o vidrio frontal	/			
31	Acrilico o vidrio trasero	/			
32	Acrilico Lateral	/			
33	Pasamanos interno	/			
34	Ventana Abatible interior delantera	/			
35	Ventana Abatible interior trasera	/			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	/			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	/			
38	Ventana de guillotina delantera		X		Pelicula rayada
39	Ventana de guillotina trasera		X		Pelicula rayada
40	Soportes para acrilicos internos		X		Soporte roto
41	Puerta izquierda		X		Estribos rayados
42	Puerta derecha		X		estribos rayados
43	Mecanismo de apertura de puerta	/			
44	Estribo	/			
45	Estribo de guia	/			
46	Techo de la Cabina		X		Rayado.
47	Arandelas Wilan y soportes antenas	/			
48	Liston de rotamiento	/			
49	Patas de transporte	/			
50	Silla delantera	/			
51	Silla trasera	/			
52	Panel lateral delantero	/			
53	Panel lateral trasero	/			

Observaciones Generales: 1-6-9 Pinza presenta desgaste
27 Pintura en panel interno techo derecho
27 Pintura en panel interno frontal izquierdo
29 Goma puerta derecha rota
29 Goma puerta izquierda rota
40. Soporte acrilico frontal roto
38-39. Peliculas de ventanillas de guillotina rayadas
41-42. Estribos de puerta rayados
46. Techo rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andres Alvarado	1032627042	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jaimes O.	1.095806481	CABLEMOVIL SAS	Edwin Jaimes
Bernardo Perez	1090227658	O.D.T	Bernardo

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 05-06-26

Numero Cabina: C119

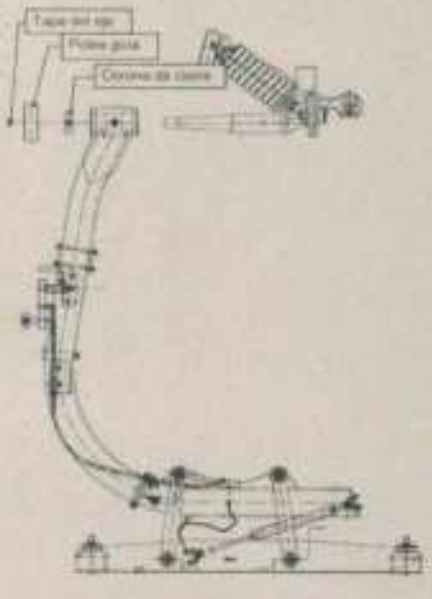

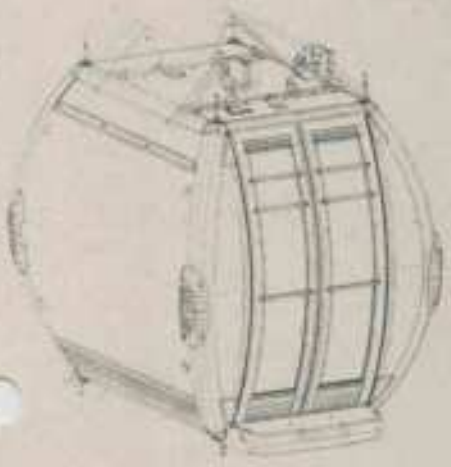

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	/			
2	Polea de Rodadura delantera	/			
3	Polea de Rodadura trasera	/			
4	Polea Guia	/			
5	Horquilla Movil		x		Derecha
6	Horquilla fija		x		Derecha
7	Resorte principal izquierdo	/			
8	Resorte principal derecho	/			
9	Canal monitaje		x		Derecha
10	Foro de Friccion	/			
11	Lengüeta delantera	/			
12	Lengüeta trasera	/			
13	Cursora de Cierre	/			
14	Barra de suspension (J)	/			
15	Armazon de 4 puntos	/			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	/			
17	Palanca de accionamiento a distancia	/			
18	Tolvaflex	/			
19	Brazo apertura puerta	/			
20	Cilindro de Freno	/			
21	Pernos de Suspension	/			
22	Biela derecha 1	/			
23	Biela derecha 2	/			
24	Biela izquierda 1	/			
25	Biela izquierda 2	/			
26	Pintura exterior Cabina	/			
27	Pintura interior Cabina	/			
28	Almohadillas de goma (4)	/			
29	Juntas Puertas	/			
30	Acrilico o vidrio frontal	/			
31	Acrilico o vidrio trasero	/			
32	Acrilico Lateral	/			
33	Pasamanos interno	/			
34	Ventana Abertira interior delantera	/			
35	Ventana Abertira interior trasera	/			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	/			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	/			
38	Ventana de guillotina delantera	/			
39	Ventana de guillotina trasera	/			
40	Soportes para acrilicos internos	/			
41	Puerta izquierda		x		Estriba rayada
42	Puerta derecha		x		Estriba rayada
43	Mecanismo de apertura de puerta	/			
44	Estribo	/			
45	Estribo de guia	/			
46	Techo de la Cabina	/			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	/			
48	Ustun de rozamiento	/			
49	Parlas de transporte	/			
50	Silla delantera	/			
51	Silla trasera	/			
52	Panel Solar delantero	/			
53	Panel solar trasero	/			

Observaciones Generales: S-G-N Pinza presenta desgaste

en el Estribo de puertas rayadas

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andres Alvarado	1.030.627.042	TRANSMILENIO SA	
Erik N Jaiks D.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Bermon Yony	1090337058	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 05-06-24

Numero Cabina: C120

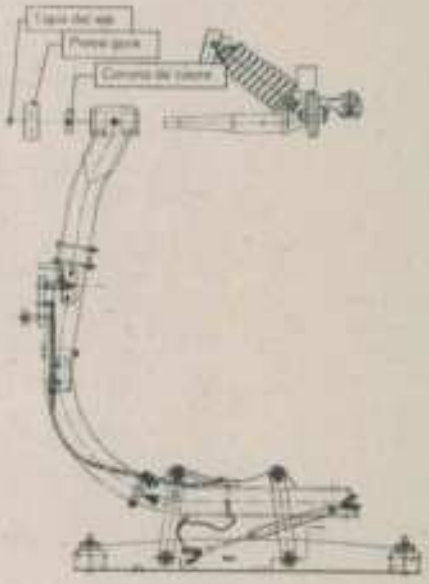



Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1 Polea de Acoplamiento	/			
2 Polea de Rodadura delantera	/			
3 Polea de Rodadura trasera	/			
4 Polea Guia	/			
5 Horquilla Movil	/			
6 Horquilla fija	/			
7 Resorte principal izquierdo	/			
8 Resorte principal derecho	/			
9 Canal monpasas	/			
10 Forro de Friccion	/			
11 Lengueta delantera	/			
12 Lengueta trasera	/			
13 Corona de Cierre	/			
14 Barra de suspension (3)	/			
15 Armazon de 4 puntos	/			
16 Rodillo de accionamiento a distancia	/			
17 Palanca de accionamiento a distancia	/			
18 Teleflex	/			
19 Brazo apertura puerta	/			
20 Cilindro de Freno	/			
21 Perros de Suspension	/			
22 Biela derecha 1	/			
23 Biela derecha 2	/			
24 Biela izquierda 1	/			
25 Biela izquierda 2	/			
26 Pintura exterior Cabina		X		Peladuras
27 Pintura interior Cabina	/			
28 Amortiguadoras de goma (4)	/			
29 Juntas Puertas		X		Cuma toda
30 Acrilico o vidrio frontal	/			
31 Acrilico o vidrio trasero	/			
32 Acrilicos Laterales	/			
33 Pasamanos interno	/			
34 Ventana Abatible interior delantera	/			
35 Ventana Abatible interior trasera	/			
36 Acrilico o Vidrio esquinero delantero	/			
37 Acrilico o Vidrio esquinero trasero	/			
38 Ventana de guillotina delantera		X		Pelicula rayada
39 Ventana de guillotina trasera		X		Pelicula rayada
40 Soportes para acrilicos internos	/			
41 Puerta izquierda		X		Estribo rayado
42 Puerta derecha		X		Estribo rayado
43 Mecanismo de apertura de puerta	/			
44 Estribo	/			
45 Estribo de guia	/			
46 Techo de la Cabina	/			
47 Antenas Wlan y soportes antenas	/			
48 Liston de ruzamiento	/			
49 Patas de transporte	/			
50 Silla delantera	/			
51 Silla trasera	/			
52 Panel Solar delantero	/			
53 Panel solar trasero	/			

Observaciones Generales: 26 Peladuras en panel izquierdo trasero
29. Cuma de puerta derecha toda
38-39. Peliculas de acrilico ventanillas guillotina presentan daños
41-42. Estribos de puertas rayadas
46. Techo rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
ANDRES ALBARRACÍN	1030 639 012	TRANSMILENIO SA	
EDWIN JAIMES O.	1.095 806 481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Deniz	1090127656	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 05-06-16

Numero Cabina: C121

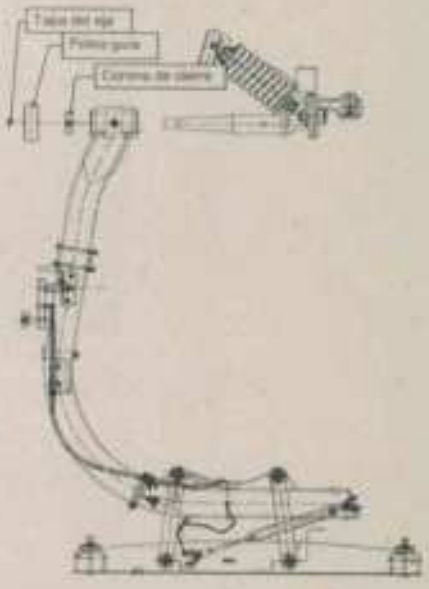

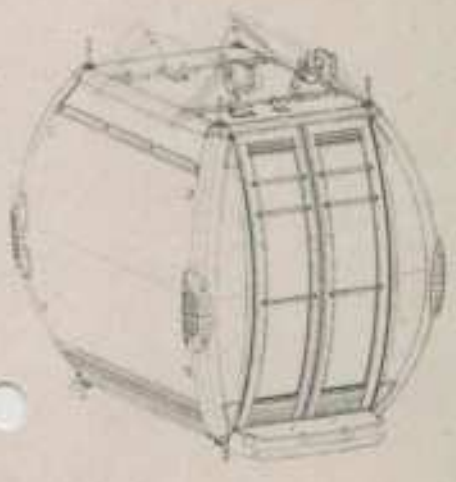

	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Montara Movil	✓			
6	Montara fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal montaras	✓			
10	Foro de Friccion	✓			
11	Lengüete delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (I)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Telefax	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspension	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladura
27	Pintura interior Cabina		X		Peladura
28	Amortiguos de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas		X		Rotas
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Rayado
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Rayado
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos		X		Roto
41	Puerta izquierda		X		Roto
42	Puerta derecha		X		Roto
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina	✓			
47	Anclajes Wan y soportes internos	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales: 16 Peladura en panel frontal derecho.
16 Peladura en panel trasero izquierdo
27 Peladura en panel interno trasero derecho y frontal derecho.
29 Cuatro de puertas rotas
30 Acrilico interno trasero mediano rayado
31 Policarbonato frontal rayado
40 Cuatro de soporte acrilico interno trasero roto
41-42. Estribos de puertas rayados

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andres Alexander	1'030 629 042	TRANSMILENIO SA	
Elkin James O.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Perez	1090287655	O.D.T	

TransMiCable
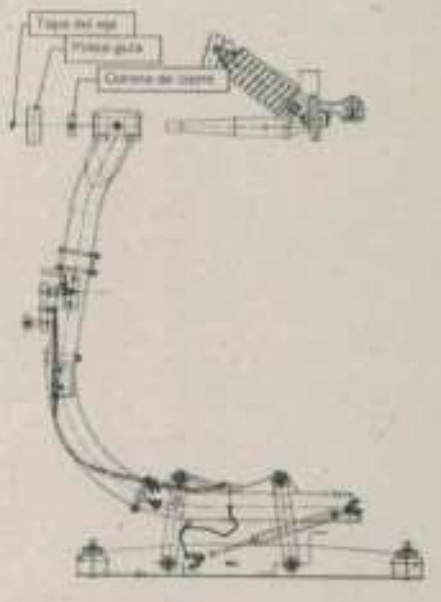
FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 05-06-20

Numero Cabina: 5122



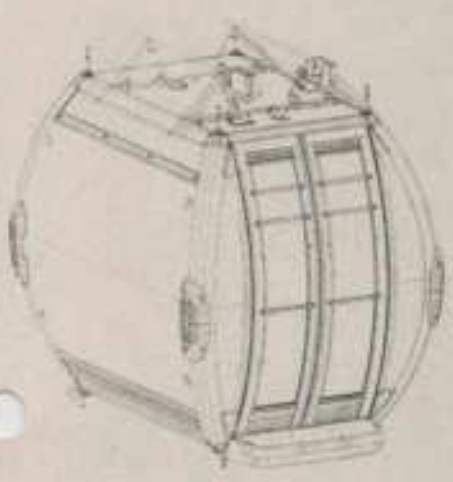

	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	/			
2	Polea de Rodadura delantera	/			
3	Polea de Rodadura trasera	/			
4	Polea Guia	/			
5	Mordaza Hoist	/			
6	Mordaza fija	/			
7	Resorte principal izquierdo	/			
8	Resorte principal derecho	/			
9	Canal mordazas	/			
10	Foro de Friccion	/			
11	Lengüeta delantera	/			
12	Lengüeta trasera	/			
13	Corona de Cierre	/			
14	Barra de suspension (2)	/			
15	Armazon de 4 puntos	/			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	/			
17	Palanca de accionamiento a distancia	/			
18	Telaflex	/			
19	Brazo apertura puerta	/			
20	Cilindro de Freno	/			
21	Perros de Suspensión	/			
22	Biela derecha 1	/			
23	Biela derecha 2	/			
24	Biela Izquierda 1	/			
25	Biela Izquierda 2	/			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladura
27	Pintura interior Cabina		X		Peladura
28	Almohadillas de goma (4)	/			
29	Juntas Puertas		X		Rotas
30	Acrilico o vidrio frontal	/			
31	Acrilico o vidrio trasero	/			
32	Acrilico Lateral	/			
33	Pasamanos interno	/			
34	Ventana Abatible interior delantera	/			
35	Ventana Abatible interior trasera	/			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	/			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	/			
38	Ventana de guillotina delantera		X		Película rayada
39	Ventana de guillotina trasera		X		Película rayada
40	Soportes para acrilicos internos	/			
41	Puerta izquierda		X		Forro roto
42	Puerta derecha		X		Forro roto
43	Reconocimiento de apertura de puerta	/			
44	Estribo	/			
45	Estribo de guia	/			
46	Techo de la Cabina		X		Techo rayado
47	Antenas Wlan y soportes antenas	/			
48	Liston de rozamiento	/			
49	Patas de transporte	/			
50	Silla delantera	/			
51	Silla trasera	/			
52	Panel Solar delantero	/			
53	Panel solar trasero	/			

Observaciones Generales: 26 Peladura en panel izquierdo y Pintura en distinto tono panel frontal derecho
29. Peladura en los cuatro paneles internos
29. Forros de puertas rotos
38-39. Peliculo de acrilicos ventanillas de guillotina con desgaste
41-42. Estribos de puertas rayados
46. Techo rayado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
ANDRES ALGARRAGA	1.030.627.042	TRANSMILENIO SA	
ELKIN JAIME O.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Perez	1070227655	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 05-06-26

Numero Cabina: C173

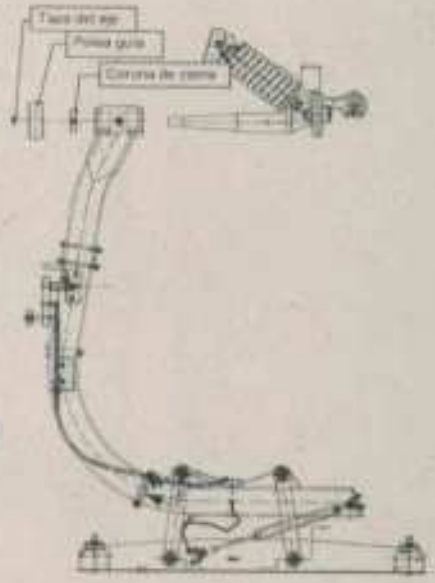



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	/			
2	Polea de Rodadura delantera	/			
3	Polea de Rodadura trasera	/			
4	Polea Guia	/			
5	Mordaza Movil	/			
6	Mordaza fija	/			
7	Resorte principal izquierdo	/			
8	Resorte principal derecho	/			
9	Canal mordazas	/			
10	Forro de Friccion	/			
11	Lengüeta delantera	/			
12	Lengüeta trasera	/			
13	Corona de Cierre	/			
14	Barra de suspension (J)	/			
15	Armazon de 4 puntos	/			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	/			
17	Palanca de accionamiento a distancia	/			
18	Taleflex	/			
19	Brazo apertura puerta	/			
20	Cilindro de Freno	/			
21	Perno de Suspensión	/			
22	Biela derecha 1	/			
23	Biela derecha 2	/			
24	Biela izquierda 1	/			
25	Biela izquierda 2	/			
26	Pintura exterior Cabina	/			
27	Pintura interior Cabina		X		Peladura.
28	Amortiguadores de goma (4)	/			
29	Juntas Puertas	/			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Rayado
31	Acrilico o vidrio trasero	/			
32	Acrilico Lateral	/			
33	Pasamanos Interno	/			
34	Ventana Abatible interior delantera	/			
35	Ventana Abatible interior trasera	/			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	/			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	/			
38	Ventana de guillotina delantera		X		Rayado
39	Ventana de guillotina trasera		X		Rayado
40	Soportes para acrilicos internos	/			
41	Puerta izquierda		X		rayado
42	Puerta derecha		X		Rayado
43	Mecanismo de apertura de puerta	/			
44	Cambo	/			
45	Fondo de guia	/			
46	Techo de la Cabina	/			
47	Antenas Wlan y soportes antenas	/			
48	Liston de rozamiento	/			
49	Patas de transporte	/			
50	Silla delantera	/			
51	Silla trasera	/			
52	Panel Solar delantero	/			
53	Panel solar trasero	/			

Observaciones Generales: 27. Peladura en panel interno trasero y frontal derecha.
30. Policarbonato trasero rayado
38-39. Pelicula de acrilico ventanas de guillotinas presentan desgaste
41-42. Estribos de puertas rayados

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
ANDRES ALBARRACIN	1.030.677.042	TRANSMILENIO SA	
EDWIN JAIMES D.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Brandon Perez	1090227658	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 08-06-2026

Numero Cabina: C.124.

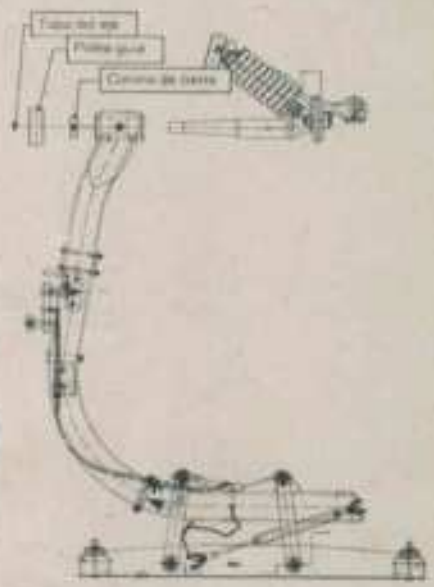



	Descripción	Cantidad	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Perno de Friccion	✓			
11	Lengueta delantera	✓			
12	Lengueta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Telefax	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		regular. retoques opacos
27	Pintura interior Cabina		X		regular retoques opacos
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Rayado
31	Acrilico o vidrio trasero		X		rayado.
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio escurreno delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio escurreno trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		Rayado
42	Puerta derecha		X		rayado
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Rayado
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javier Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Bayardo Perez	1090227058	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MSD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 08-06-2026

Numero Cabina: C-125

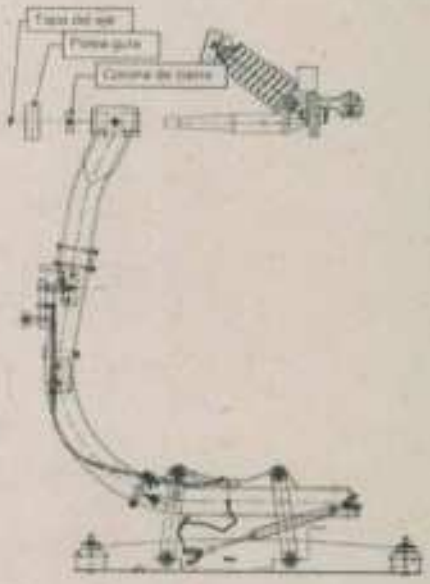



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Anclamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Perno de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Felpitas	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina	✓			
27	Pintura interior Cabina		X		pelusa colores opuestos
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		pelusa en el pie
42	Puerta derecha	✓			
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Rayitas
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaime Ortiz	1049806481	CABLEMOVIL SAS	
Brandon Stevy	1090227658	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 08-06-2026

Numero Cabina: C126

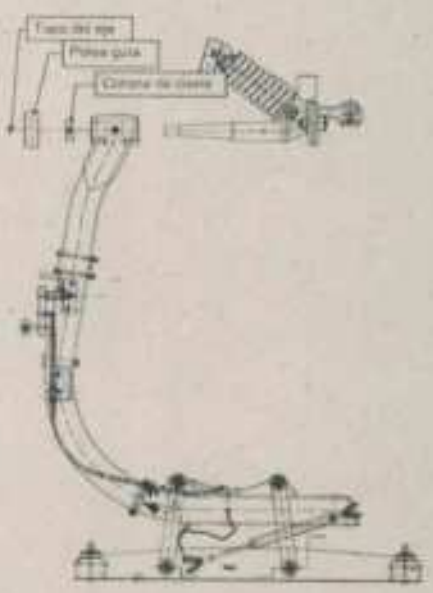

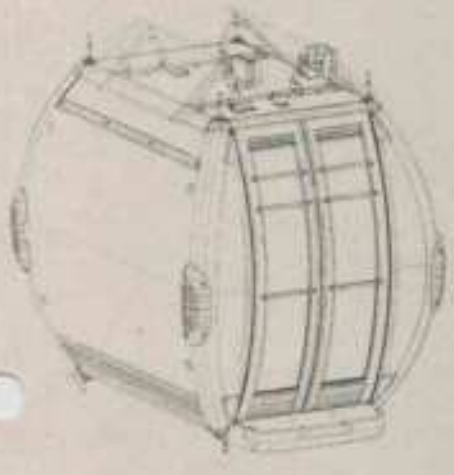

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Montaza Movil	✓			
6	Montaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal montazas	✓			
10	Foro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (I)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Telefias	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspension	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		pintura
27	Pintura interior Cabina		X		pintura columna equipos
28	Amortiguadores de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas		X		Falta Parte Izquierda
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Roto
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Laterel		X		Roto
33	Pasamanos interno		X		Roto
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		Roto
42	Puerta derecha		X		Roto
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Roto
47	Antenas Wlan y siguros antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombres:	Número de Identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jans Ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Diaz	1090227658	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002668

Fecha: 08-06-2026

Numero Cabina: C 127





	Descripción	Cantidad	No Cantidad	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Forro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Telefono	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno		X		OXIDADO
21	Perno ye Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina	✓			
27	Pintura interior Cabina	✓			
28	Acolchadillos de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		RAYADO - ROTO
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Laterial		X		RAYADO
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda	✓			
42	Puerta derecha	✓			
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Cenicero	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		RAYADO.
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javier Ortiz	1049386481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Perez	1090227058	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 08-06-2026

Numero Cabina: C128

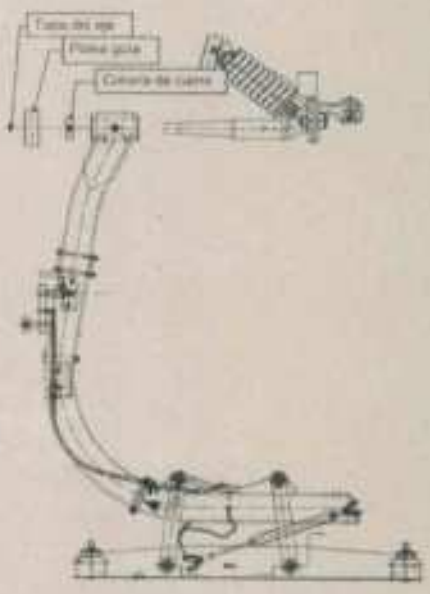



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Foro de Fricción	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (J)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Teleflex	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela Izquierda 1	✓			
25	Biela Izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Deficiente
27	Pintura Interior Cabina		X		Deficiente retoque y aplicación
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Laterel	✓			
33	Pasamanos Interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		Requiere ajuste
42	Puerta derecha		X		Requiere ajuste
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Perfil de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Deficiente
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Listón de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javier Ortiz	1043804481	CABLEMOVIL SAS	
Brandon Pony	1090217656	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 08-06-2026

Numero Cabina: C129

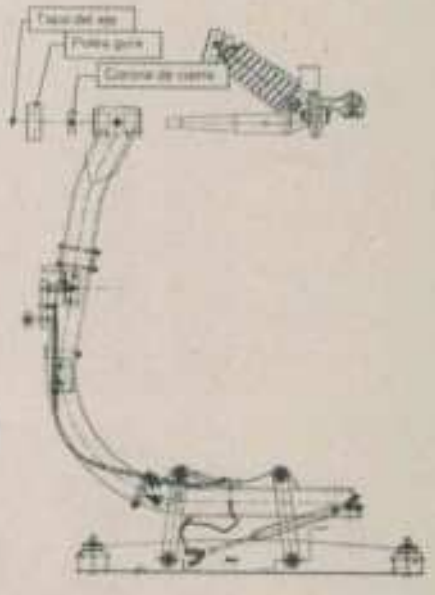



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Forro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (1)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Teleflex	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela Izquierda 1	✓			
25	Biela Izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Oxidado.
27	Pintura interior Cabina		X		Pintura retocar.
28	Almohaditas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Roto
31	Acrilico o vidrio trasero	✓			
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		Roto
42	Puerta derecha		X		Roto
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Roto
47	Arandelas Wizer y soportes antiarias	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	7969825	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaramillo	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Brandon Daza	1090227658	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 05-06-2026

Numero Cabina: C130

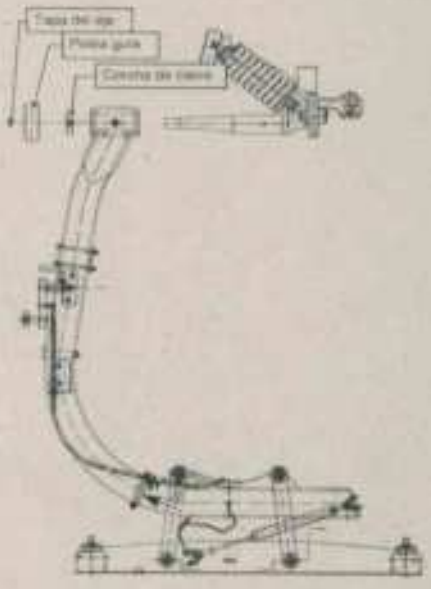



	Descripcion	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Horquilla Movil	✓			
6	Horquilla fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal monteaje	✓			
10	Fuelle de Friccion	✓			
11	Lengueta delantera	✓			
12	Lengueta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (2)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Teleflex	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Perros de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Requiere pulidos retoques esquinas
27	Pintura interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas		X		roto.
30	Acrilico o vidrio frontal		X		rayado
31	Acrilico o vidrio trasero		X		rayado
32	Acrilico Laterales		X		roto.
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		rayado estribos
42	Puerta derecha		X		rayado estribos
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		rayado
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación	Entidad	Firma
Juan carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaus Ortiz	1093806481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Pena	1090227658	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCIÓN/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 08-06-2026

Numero Cabina: C131





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Foro de Friccion	✓			
11	Lengueta delantera	✓			
12	Lengueta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (3)	✓			
15	Armarun de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Taseflex	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspensión	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela izquierda 1	✓			
25	Biela izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Fundido
27	Pintura interior Cabina		X		pérdida columna agujeros
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Fundido
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		Impacto trasero
42	Puerta derecha		X		
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Fundido
47	Antenas Wan y soportes antenas	✓			
48	Liston de rozamiento	✓			
49	Palas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	7966825	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jans Ortiz	1093802481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Perez	1090227858	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO
CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 08-06-2026.

Numero Cabina: C132

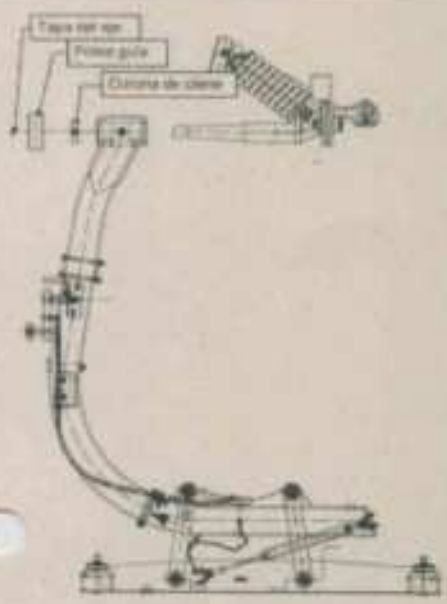



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	✓			
2	Polea de Rodadura delantera	✓			
3	Polea de Rodadura trasera	✓			
4	Polea Guia	✓			
5	Mordaza Movil	✓			
6	Mordaza fija	✓			
7	Resorte principal izquierdo	✓			
8	Resorte principal derecho	✓			
9	Canal mordazas	✓			
10	Forro de Friccion	✓			
11	Lengüeta delantera	✓			
12	Lengüeta trasera	✓			
13	Corona de Cierre	✓			
14	Barra de suspension (I)	✓			
15	Armazon de 4 puntos	✓			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	✓			
17	Palanca de accionamiento a distancia	✓			
18	Taladtex	✓			
19	Brazo apertura puerta	✓			
20	Cilindro de Freno	✓			
21	Pernos de Suspension	✓			
22	Biela derecha 1	✓			
23	Biela derecha 2	✓			
24	Biela Izquierda 1	✓			
25	Biela Izquierda 2	✓			
26	Pintura exterior Cabina		X		Juguete pelado (domo equipo)
27	Pintura Interior Cabina		X		
28	Almohadillas de goma (4)	✓			
29	Juntas Puertas	✓			
30	Acrilico o vidrio frontal	✓			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Roto.
32	Acrilico Lateral	✓			
33	Pasamanos Interno	✓			
34	Ventana Abatible interior delantera	✓			
35	Ventana Abatible interior trasera	✓			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	✓			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	✓			
38	Ventana de guillotina delantera	✓			
39	Ventana de guillotina trasera	✓			
40	Soportes para acrilicos internos	✓			
41	Puerta izquierda		X		Rayado
42	Puerta derecha		X		Rayado.
43	Mecanismo de apertura de puerta	✓			
44	Estribo	✓			
45	Estribo de guia	✓			
46	Techo de la Cabina		X		Estado
47	Antenas Wlan y soportes antenas	✓			
48	Ubton de rozamiento	✓			
49	Patas de transporte	✓			
50	Silla delantera	✓			
51	Silla trasera	✓			
52	Panel Solar delantero	✓			
53	Panel solar trasero	✓			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez	79661825	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jose Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Bernardo Pang	1090227658	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002888

Fecha: 13.06.2026

Número Cabina: 2133

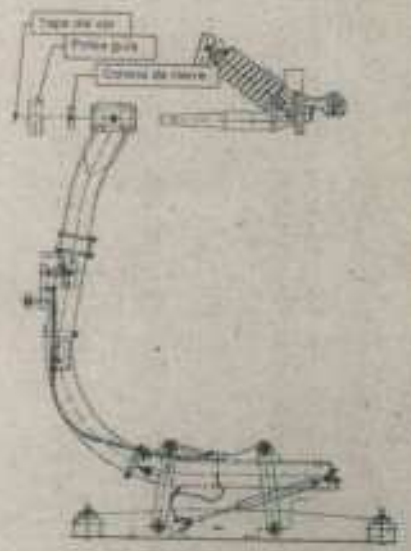

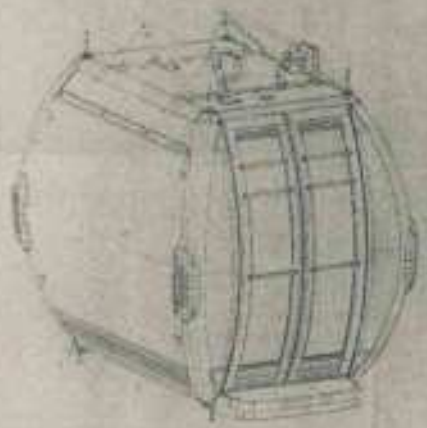

	Descripción	Cantidad	No Existe	NO APLICA	Observaciones
1	Polea de Accionamiento	X			
1	Polea de Rodadura delantera	X			
2	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil	X			NUEVO
6	Horquilla fija	X			NUEVO
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal Horquillas	X			NUEVO
10	Patin de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Cuerpo de Cierre	X			
14	Barra de suspension U	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rueda de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefono	X			
19	Sensor apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Ramal de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Pintura Retocada
27	Pintura interior Cabina		X		Retocada en Partes
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Vidrios Puertas		X		Rotos Rotos
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Partido (Hoy)
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos traseros	X			
41	Puerta izquierda		X		Rayadas
42	Puerta derecha		X		Rayadas
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Cenefa	X			
45	Perfil de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Pintura Pelada
47	Antenas Wifi y Mástil de antenas	X			
48	Letrero de identificación	X			
49	Faros de trabajo	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad:	Firma:
Fabian León	80'210'783	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier O.	1.095.800.981	CABLEMOVIL SAS	
Jairo Figueroa	5'972.071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 16 MDD Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 13-06-2026

Numero Cabina: C134

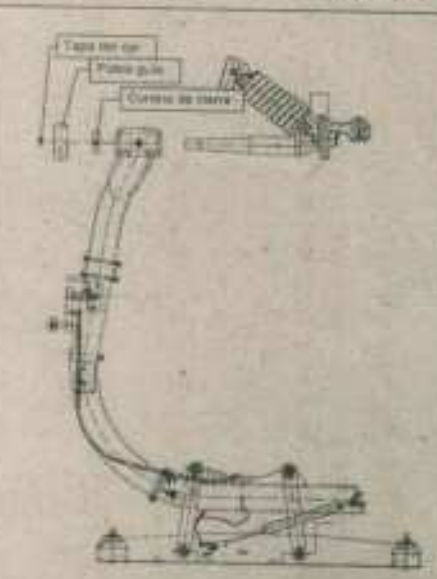



	Descripción	Cantidad	No Funciona	No aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rotadura delantera	X			
3	Polea de Rotadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Perno de Fricccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Acrissol de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tijeritas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Estadizian pasta
27	Pintura interior Cabina		X		Rozaduras en pintura
28	Ammortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		derecha rota
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilicos Laterales	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interno delantera	X			
35	Ventana abatible interno trasero	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos		X		Oxidado, toca pintura
41	Puerta izquierda		X		Pintura rayada
42	Puerta derecha		X		Pintura rayada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Cenicero	X			
45	Extintor de gas	X			
46	Techo de la Cabina		X		Pintura pelada
47	Antenas Wifi y soportes antenas	X			
48	Ojillos de mantenimiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de Identificación:	Entidad:	Firma:
Fabian León	80710783	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier B.	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772271	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10-MDD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 13-06-2026

Numero Cabina: C135

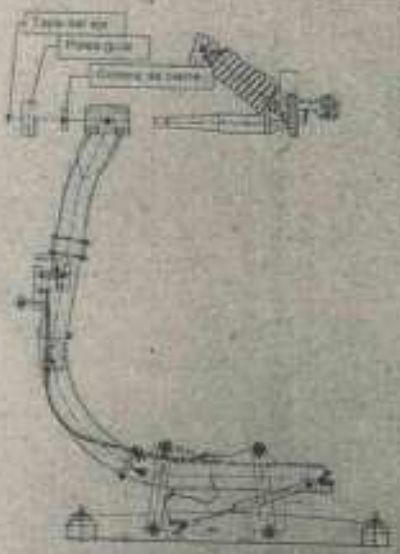



1. Polea de Accionamiento	X			
2. Polea de Retorno delantera	X			
3. Polea de Retorno trasera	X			
4. Eje de Guía	X			
5. Horquilla Movil	X			
6. Horquilla Fija	X			
7. Resorte principal izquierdo	X			
8. Resorte principal derecho	X			
9. Dados Portadores	X			
10. Perno de Fricción	X			
11. Tenglorio Inferior	X			
12. Tenglorio Trasero	X			
13. Cuerpo de Cierre	X			
14. Barra de suspensión (1)	X			
15. Armazon de Cabina	X			
16. Rodillo de acondicionamiento a distancia	X			
17. Palanca de acondicionamiento a distancia	X			
18. Telefax	X			
19. Pulsador apertura puerta	X			
20. Cinturon de Piso	X			
21. Perno de Suspension	X			
22. Piso delantero 1	X			
23. Piso delantero 2	X			
24. Piso izquierdo 1	X			
25. Piso izquierdo 2	X			
26. Techo interior Cabina		X		Golpe columna exterior
27. Pintura interior Cabina		X		Pintura pintura
28. Techo Cabina (4)				
29. Juntas Puertas		X		Desgaste caucho
30. Accionamiento frontal	X			
31. Accionamiento trasero	X			
32. Accion Lateral	X			
33. Pasamanos interno	X			
34. Ventana Abertura interno delantera	X			
35. Ventana Abertura interno trasera	X			
36. Accionamiento mecanismo deslizante	X			
37. Accionamiento izquierdo trasero	X			
38. Ventana de guillotina delantera	X			
39. Ventana de guillotina trasera	X			
40. Soportes para portatubos internos	X			
41. Puerta Izquierda		X		Pintura desgaste
42. Puerta Delantera		X		Pintura desgaste
43. Mecanismo de apertura de puerta	X			
44. Espejo	X			
45. Cenicero	X			
46. Techo de la Cabina		X		Pintura 10/2012
47. Accesorios y acciones externas	X			
48. Cenicero trasero	X			
49. Pasamanos izquierdo	X			
50. Silla delantera	X			
51. Silla trasera	X			
52. Pasamanos derecho	X			
53. Puerta trasera	X			

Observaciones Generales: 26- Golpe en columna exterior izq. frontal

Información de los participantes

Nombre	Numero de Identificación		Firma
Fabian Lasso	80 210763	TRANSMILENIO SA	
Erin John U.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5792071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOE Ciudad Bolivar WAA0002588

Fecha: 13-06-2026

Numero Cabina: C136

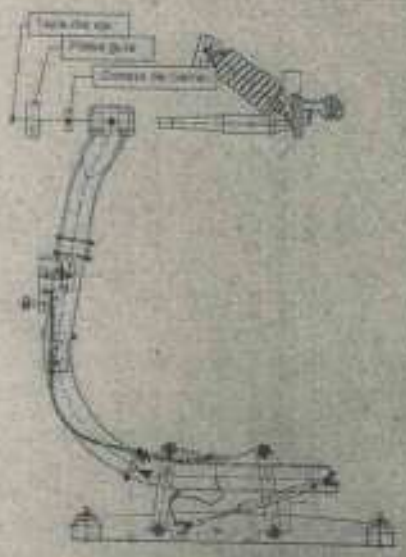



1 Polea de Apoyo trasera	X			
2 Polea de Rodadura delantera	X			
3 Polea de Rodadura trasera	X			
4 Polea Guia	X			
5 Mordaza Movil	X			
6 Mordaza Fija	X			
7 Polea principal izquierda	X			
8 Polea principal derecha	X			
9 Cabezotes laterales	X			
10 Perno de Presion	X			
11 Lengüeta delantera	X			
12 Lengüeta trasera	X			
13 Cuerpo de Cierre	X			
14 Barra de Apoyabrazo	X			
15 Soporte de Alfombra	X			
16 Punto de acoplamiento a cabina	X			
17 Palanca de acoplamiento a cabina	X			
18 Tuercas	X			
19 Brazo apertura puerta	X			
20 Chapon de Piso	X			
21 Perno de Suspension	X			
22 Base delantera 1	X			
23 Base delantera 2	X			
24 Base izquierda 1	X			
25 Base izquierda 2	X			
26 Vidrio exterior Cabina		X		Pintura rayada
27 Vidrio interior Cabina		X		Pintura rayada
28 Autoadhesivo de guia (4)	X			
29 Juntas Puertas		X		1 de 2 y del vidrio
30 Actuador puerta trasera	X			
31 Actuador puerta delantera	X			
32 Actuador lateral	X			
33 Espejo retrovisor	X			
34 Ventana Abatible delantera izquierda	X			
35 Ventana Abatible delantera derecha	X			
36 Ventana fija puerta trasera izquierda	X			
37 Ventana fija puerta trasera derecha	X			
38 Ventana fija puerta delantera	X			
39 Ventana fija puerta trasera	X			
40 Soportes para anticolisiones	X			
41 Puerta izquierda		X		Pintura rayada
42 Puerta derecha		X		Pintura rayada
43 Mecanismo de apertura de puerta	X			
44 Cenefa	X			
45 Zocalo trasero	X			
46 Techo de Cabina	X			
47 Antenas Wimag acoples antenas	X			
48 Cinturon de seguridad	X			
49 Pegas de Carpeteria	X			
50 Silla delantera	X			
51 Silla trasera	X			
52 Panel lateral izquierdo	X			
53 Panel lateral trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Numero de Identificación	Empresa	Firma
Fabian Leon	80210783	TRANSMILENIO SA	
Elkin David	1095906948	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5172071	O.D.T	

TransMICable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 18 HQD Ciudad Bolívar WAA0012686

Fecha: 13-06-2026

Numero Cabina: C137

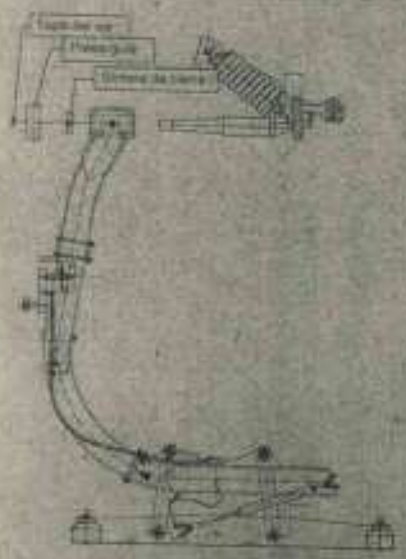



1	Pinza de Acoplamiento	X	✓	
2	Pinza de Portadora delantera	X		
3	Pinza de Portadora trasera	X		
4	Pin de Guia	X		
5	Mordaza Hoyo		X	Desgaste
6	Mordaza Fija		X	Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X		
8	Resorte principal derecho	X		
9	Cuna Horizontal		X	Desgaste
10	Patin de Freno	X		
11	Leva de freno delantera	X		
12	Leva de freno trasera	X		
13	Cuerpo de Freno	X		
14	Barra de accionamiento (1)	X		
15	Articulación a cuerpo	X		
16	Resorte de accionamiento e retorno	X		
17	Pasador de accionamiento e retorno	X		
18	Tuercas	X		
19	Piston apertura puerta	X		
20	Cilindro de Freno		X	oxidación visible
21	Pantin de Suspension	X		
22	Ventana lateral 1	X		
23	Ventana lateral 2	X		
24	Ventana lateral 3	X		
25	Ventana lateral 4	X		
26	Pintura exterior Cabina		X	Pintura rayada
27	Pintura interior Cabina		X	Pintura rayada
28	Almohadilla de goma (4)	X		
29	Vidrios Puertas		X	Vidrios rotos
30	Vidrio cuadro frontal	X		
31	Vidrio cuadro trasero	X		
32	Acrilico lateral	X		
33	Parachoque interno	X		
34	Ventana Abertura interior delantera	X		
35	Ventana Abertura interior trasera	X		
36	Asiento y Vidrio seguridad delantero	X		
37	Asiento y Vidrio seguridad trasero	X		
38	Ventana de guillotina delantera		X	Adhesivo retirado
39	Ventana de guillotina trasera		X	Adhesivo retirado
40	Topones para acciones mecanicas	X		
41	Puerta izquierda		X	Ventana rota
42	Puerta derecha		X	Ventana rallada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X		
44	Estribo	X		
45	Cerradura guia	X		
46	Techo Interior Cabina	X		
47	Luces de Warning exteriores amarillas	X		
48	Letrero identificador	X		
49	Piloto de Emergencia	X		
50	Silla delantera	X		
51	Silla trasera	X		
52	Panel Bajo delantero	X		
53	Panel bajo trasero	X		

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Numero de Identificación	Empresa	Firma
Fabian León	80210783	TRANSMILENIO SA	
Edwin Luis G.	1095805418	CABLEMOVIL SAS	
Darwin F. Garcia	5772021	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10-M30 Ciudad Bolívar WAA0002888

Fecha: 13-06-2026

Número Cabina: C138

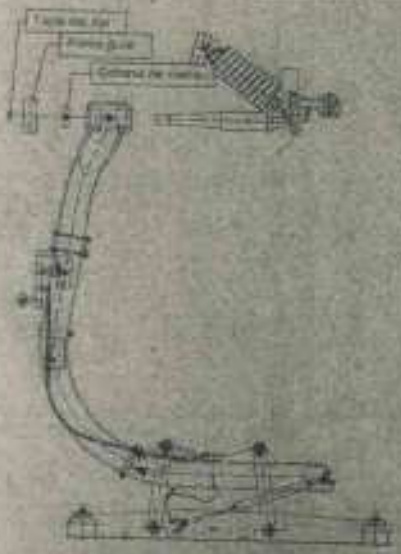



1 Puerta de acceso trasera	X			
2 Puerta de Ventanilla delantera	X			
3 Puerta de Ventanilla trasera	X			
4 Puerta Ojo	X			
5 Ventana Movil		X		Ventana
6 Ventana fija		X		derecha
7 Asiento principal delantero	X			
8 Asiento principal trasero	X			
9 Cenicero trasero		X		Descartado
10 Barra de Protección	X			
11 Lengüeta delantera	X			
12 Lengüeta trasera	X			
13 Cuerno de Cabra	X			
14 Barra pasajero delantero	X			
15 Triángulo de Puertas	X			
16 Punto de accionamiento a tracción	X			
17 Punto de accionamiento a frenado	X			
18 Tacómetro	X			
19 Botón apertura puerta	X			
20 Cinturón de Puerta	X			
21 Barra de Suspensión	X			
22 Base cenicero	X			
23 Base lengüeta 2	X			
24 Base lengüeta 1	X			
25 Base lengüeta 3	X			
26 Ventana anterior Cabina		X		Retrovisor - exterior
27 Ventana trasera Cabina		X		Quebrado Ventana
28 Almohadilla de goma (3)				
29 Cenicero puertas				
30 Asiento vidrio frontal		X		Descartado Cinta
31 Asiento vidrio trasero		X		Roto
32 Asiento Lateral		X		Descartado
33 Pasamanos interno		X		Ventana lateral
34 Ventana Abatible delantera	X			
35 Ventana abatible interior trasera	X			
36 Ventana vidrio seguridad delantera	X			
37 Ventana vidrio seguridad trasera	X			
38 Ventana de guardia delantera	X			
39 Ventana de guardia trasera	X			
40 Cojines de asiento interior	X			
41 Cenicero izquierda				
42 Cenicero derecha		X		Ventana Descartada
43 Recubrimiento de apertura de puerta	X			Ventana Descartada
44 Estribo	X			
45 Protección de agua	X			
46 Techo de la cabina		X		Ventana
47 Antena de Wifi y accesorios antenas	X			
48 Cubierta de asiento	X			
49 Pasamanos techo	X			
50 Soporte asientos	X			
51 Piso cabina	X			
52 Panel estructural	X			

Observaciones Generales: 6 cabina fuera de servicio por motivo de desgaste excesivo


Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Empresa	Firma
Fabian Leon	CC 1070[illegible]	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier D.	1095[illegible]	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5972274	O.D.T	

TransMiCable — FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la Instalación
Nombre del sistema: 10-MGD Ciudad Bolívar WAA0002698

Fecha: 13 08 2018
Numero Cabina: C139

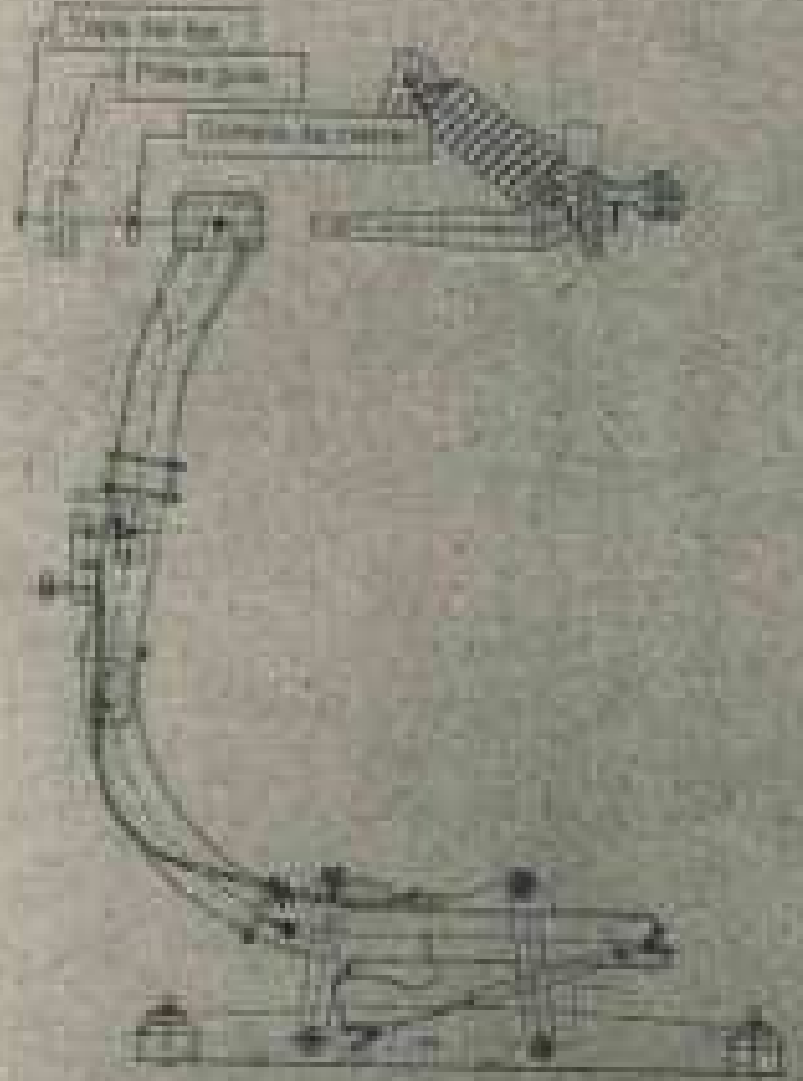



#	Componente	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Observaciones
1	Poleas de Acoplamiento	X			
2	Poleas de Protección delantera	X			
3	Poleas de Protección trasera	X			
4	Polea Guía	X			
5	Tirantera Piñón	X			
6	Pin Garra	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	[illegible]	X			
10	[illegible]	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	[illegible] de Cable	X			
14	[illegible]	X			
15	Amortiguador de puerta	X			
16	Rodillo de accionamiento a [illegible]	X			
17	Palanca de accionamiento a [illegible]	X			
18	Teléfono	X			
19	Botón [illegible] puerta	X			
20	Cilindro de Pinza	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Brazo derecho 1	X			
23	Brazo derecho 2	X			
24	Brazo izquierdo 1	X			
25	Brazo izquierdo 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Rayones en pintura
27	Pintura interior Cabina		X		Adhesivos en puertas
28	Señalética/adhesivos [illegible]	X			
29	Gomas Puertas		X		123 y demás detalles
30	Acrílico [illegible] frontal	X			
31	Acrílico [illegible] trasero	X			
32	Acrílico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana abatible [illegible] delantera	X			
35	Ventana abatible [illegible] trasera	X			
36	Acrílico Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrílico Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrílicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Rayado
42	Puerta derecha		X		adhesivo
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	[illegible]	X			
46	Techo de la Cabina	X			
47	[illegible]	X			
48	[illegible]	X			
49	[illegible]	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	[illegible] delantero	X			
53	[illegible] trasero	X			

Observaciones Generales: Señalética trasero Ciudad Bolívar (d)

Información de los participantes


Nombre	Número de Identificación	Empresa	Firma
Fabian León	80210963	TRANSMILENIO SA	[signature]
Elkin Torres O.	1095908 09...	CABLEMOVIL SAS	[signature]
Darwin Figuera	5772091	O.D.T	[signature]

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 12 MGD Ciudad Bolívar WAA0002888

Fecha: 13-04-2026
Número Cabina: C140

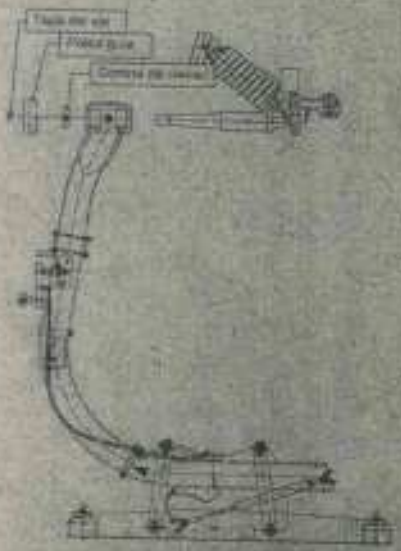



1. Puerta de acceso anterior	X			
2. Puerta de acceso posterior	X			
3. Puerta de acceso lateral	X			
4. Puerta Cola	X			
5. Manija Fija		6		Derecha Izquierda
6. Manija Cola				
7. Seguro principal puerta	X			
8. Seguro principal lateral	X			
9. Cerradura Cola		2		Derecha
10. Pomo de Puertas	X			
11. Ventana Delantera	X			
12. Ventana lateral	X			
13. Ventana Cola	X			
14. Ventana Puerta	X			
15. Bisagra Puerta	X			
16. Amortiguador Puerta	X			
17. Pasillo de acondicionamiento a cabina	X			
18. Pasillo de acondicionamiento a cabina	X			
19. Cuartas	X			
20. Seguro anterior puerta	X			
21. Cojinete de Freno	X			
22. Cojinete de Suspensión	X			
23. Silla delantera 1	X			
24. Silla delantera 2	X			
25. Silla trasera 1	X			
26. Silla trasera 2	X			
27. Ventana lateral Cabina		X		Ventana Izquierda Ventana Derecha
28. Ventana Frontal Cabina				
29. Luces de emergencia				
30. Cierre Puertas				
31. Ventana posterior		X		Izquierda
32. Ventana Lateral				
33. Asiento Lateral				
34. Pasamanos interno				
35. Ventana Abertura Mantenimiento Delantera				
36. Ventana Abertura Vidrio Trasera				
37. Ventana Abertura Mantenimiento Delantera				
38. Ventana Abertura Vidrio Trasera				
39. Ventana de ventilación Delantera				
40. Ventana de ventilación Trasera				
41. Soporte para Luces Internas				
42. Puerta Lateral				
43. Puerta Cabina		X		Izquierda
44. Mecanismo de apertura de puerta		X		Derecha
45. Cenicero				
46. Asiento Lateral				
47. Techo de Cabina				
48. Luces de Cabina				
49. Luces de emergencia				
50. Pasillo de Cabina				
51. Pasillo de Cabina				
52. Pasillo de Cabina				
53. Pasillo de Cabina				
54. Pasillo de Cabina				
55. Pasillo de Cabina				
56. Pasillo de Cabina				
57. Pasillo de Cabina				
58. Pasillo de Cabina				
59. Pasillo de Cabina				
60. Pasillo de Cabina				
61. Pasillo de Cabina				
62. Pasillo de Cabina				
63. Pasillo de Cabina				
64. Pasillo de Cabina				

Observaciones Generales: Entrega de vidrio trasero (Transmilenio)

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Empresa	Firma
Fabian Leon	80210783	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier C	1095[illegible]481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Forero	5772044	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolívar WA4000268

Fecha: 14-06-2016

Numero Cabina: C141

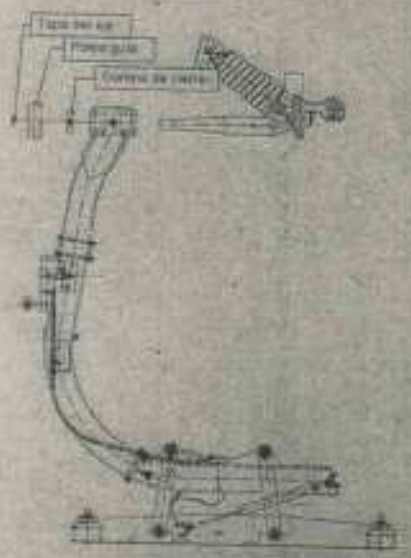



1	Polea de Rodadura delantera	X		
2	Polea de Rodadura trasera	X		
3	Polea Guía	X		
4	Portabloque Móvil	X		
5	Portabloque Fijo	X		
6	Resorte principal izquierdo	X		
7	Resorte principal derecho	X		
8	Cabina de cabina	X		
9	Perno de Pivote	X		
10	Longitud delantera	X		
11	Longitud trasera	X		
12	Cabina de Cabina	X		
13	Barra de cabina (Eje)	X		
14	Armazón de cuerpo	X		
15	Asiento de acondicionamiento a intemperie	X		
16	Palanca de acondicionamiento a intemperie	X		
17	Teatinos	X		
18	Brazo apertura puerta	X		
19	Cabina de Freno	X		
20	Perno de Suspensión	X		
21	Rin delantero 1	X		
22	Rin delantero 2	X		
23	Rin trasero 1	X		
24	Rin trasero 2	X		
25	Puerta exterior Cabina		X	Pintura Cabinas En Relación Pintura En
26	Puerta Interior Cabina		X	
27	Ventanas laterales (general)	X		Rotas
28	Lunas Puertas		X	
29	Acrílico costado frontal	X		
30	Acrílico costado trasero	X		
31	Acrílico Lateral	X		
32	Pasamanos interno	X		
33	Ventana Abatible interior delantera	X		
34	Ventana Abatible interior trasera	X		
35	Acrílico Vidrio exterior delantero	X		
36	Acrílico Vidrio exterior trasero	X		
37	Ventana de guillotina delantera	X		
38	Ventana de guillotina trasera	X		
39	Soportes para acrílicos internos	X		
40	Puerta izquierda		X	Pinturas Estado Bue
41	Puerta derecha		X	Pinturas Estado Bue
42	Mecanismo de apertura de puerta	X		
43	Techo	X		
44	Techo de goma	X		
45	Techo de Cabina	X		
46	Acrílicos Viseras exteriores	X		
47	Letrero identificativo	X		
48	Patas de Empotre	X		
49	Silla delantera	X		
50	Silla trasera	X		
51	Faros Solar delantero	X		
52	Faros solar trasero	X		

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Numero de identificación:	Entidad:	Firma:
Fabian Tibaduiza	1053327774	TRANSMILENIO SA	
Elkin James O.	1.093.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Jose Jacome	1235307	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 15 MOD Ciudad Bolívar WAA0002668

Fecha: 14-06-2026

Numero Cabina: C442

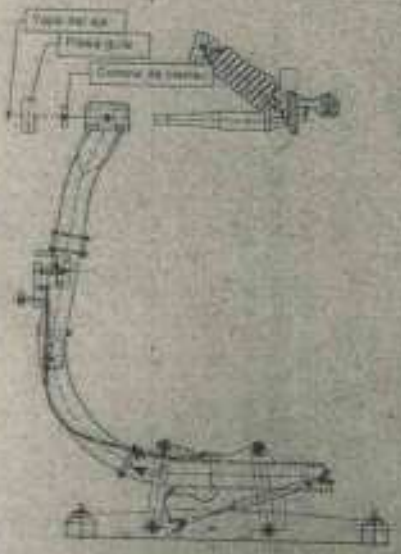



1. Pinza de Acoplamiento 1	X			
2. Pinza de Acoplamiento delantera 2	X			
3. Pinza de Acoplamiento trasera	X			
4. Pinza Guia	X			
5. Mordaza Fija	X			
6. Mordaza Móvil	X			
7. Rodete principal izquierdo	X			
8. Rodete principal derecho	X			
9. Calas Portadas	X			
10. Perno de Fricción	X			
11. Ranglona delantera	X			
12. Ranglona trasera	X			
13. Cuerpo de Cabina	X			
14. Barra de suspensión (1)	X			
15. Anclaje de Apoyos	X			
16. Pulsador de accionamiento e Alarma	X			
17. Palanca de accionamiento e Alarma	X			
18. Teclas	X			
19. Riel apertura puerta	X			
20. Cadena de freno	X			
21. Perno de Suspensión	X			
22. Riel delantero 1	X			
23. Riel delantero 2	X			
24. Riel izquierdo 1	X			
25. Riel izquierdo 2	X			
26. Vidrio exterior Cabina		X		Polividrio Templado Fijo
27. Vidrio interior Cabina		X		Polividrio Templado Fijo
28. Antideslizante de grilla (4)	X			
29. Grilla Puertas	X			
30. Anclaje Puerta trasera	X			
31. Anclaje Puerta delantera	X			
32. Apoyo Cabina	X			
33. Pasamanos interno	X			
34. Ventana Abatible interno delantera	X			
35. Ventana Abatible interno trasera	X			
36. Anclaje Vidrio exterior delantero	X			
37. Anclaje Vidrio exterior trasero	X			
38. Ventana de ventilación delantera	X			
39. Ventana de ventilación trasera	X			
40. Soporte pasamanos interno		X		Soporte Central Roto
41. Puerta izquierda		X		Cilindro Estan Roto
42. Puerta derecha		X		Trinquete Estan Roto
43. Mecanismo de apertura de puerta	X			
44. Techo	X			
45. Techo de Seguridad	X			
46. Techo de la Cabina		X		Polividrio Roto Delant.
47. Anclajes Wasty soportes antideslizantes	X			
48. Cubierta cuadrilátero	X			
49. Patas de Transporte	X			
50. Viga Inferior	X			
51. Viga trasera	X			
52. Riel inferior delantero	X			
53. Riel inferior trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Empresa	Firma
Fabian Tibaduiza	1033512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo C.	1075266782	CABLEMOVIL SAS	
Jose Jaime	1235309	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 10-MGD [illegible] WAA0002088

Fecha: 14-06-2016

Número Cabina: C143

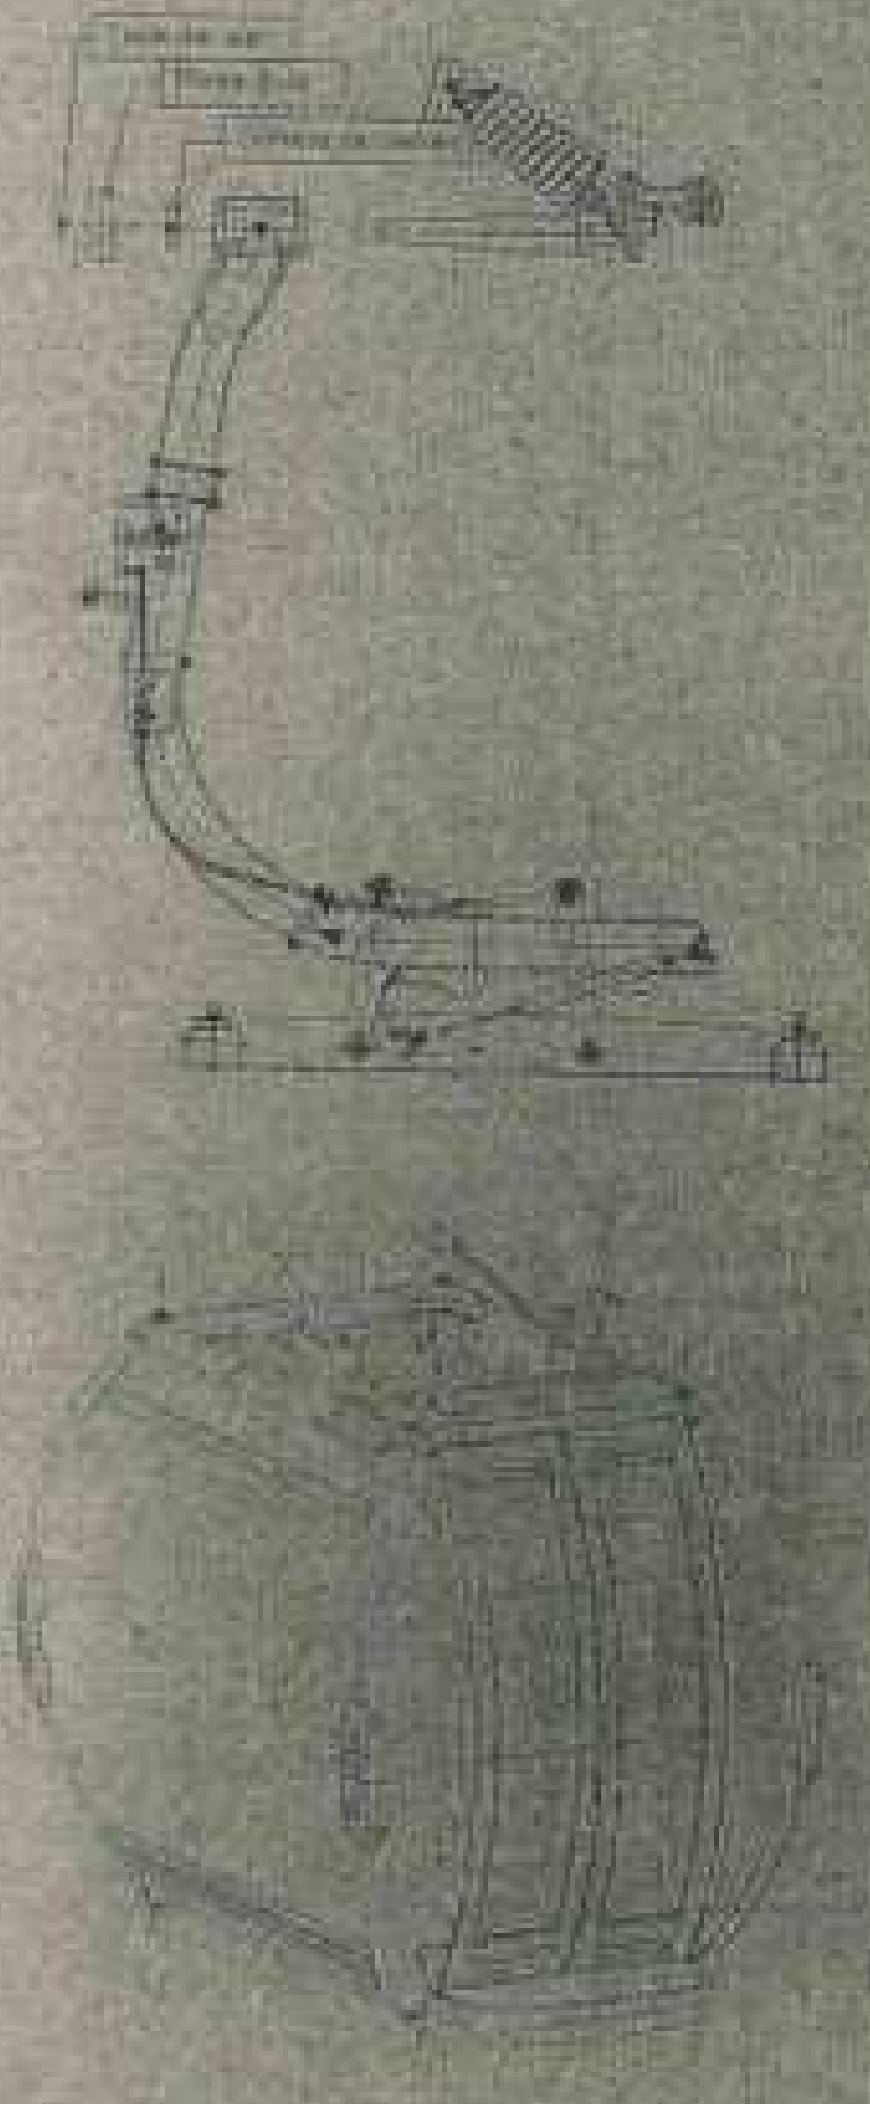

1 [illegible]	X			
2 [illegible]	X			
3 [illegible]	X			
4 [illegible]	X			
5 [illegible]	X			
6 [illegible]	X			
7 [illegible]	X			
8 [illegible]	X			
9 [illegible]	X			
10 [illegible]	X			
11 [illegible]	X			
12 [illegible]	X			
13 [illegible]	X			
14 [illegible]	X			
15 [illegible]	X			
16 [illegible]	X			
17 [illegible]	X			
18 [illegible]	X			
19 [illegible]	X			
20 [illegible]	X			
21 [illegible]	X			
22 [illegible]	X			
23 [illegible]	X			
24 [illegible]	X			
25 [illegible]	X			
26 [illegible]		X		[illegible]
27 [illegible]		X		[illegible]
28 [illegible]	X			
29 [illegible]		X		Fotos
30 [illegible]	X			
31 [illegible]		X		Vidrio Rayado
32 [illegible]	X			
33 [illegible]	X			
34 [illegible]	X			
35 [illegible]	X			
36 [illegible]	X			
37 [illegible]	X			
38 [illegible]	X			
39 [illegible]	X			
40 [illegible]	X			
41 [illegible]		X		[illegible]
42 [illegible]		X		[illegible]
43 [illegible]				
44 [illegible]	X			
45 [illegible]	X			
46 [illegible]	X			
47 [illegible]	X			
48 [illegible]	X			
49 [illegible]	X			
50 [illegible]	X			
51 [illegible]	X			
52 [illegible]	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación		Firma
Fabian Tibaduiza	1033612774	TRANSMILENIO SA	[firma]
Erick Julio C	1 [illegible]	CABLEMOVIL SAS	Erick J
José [illegible]	1255[illegible]	O.D.1	[firma]

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10-MGD Ciudad Bolívar WAA0033888

Fecha: 14-06-2026

Número Cabina: C144

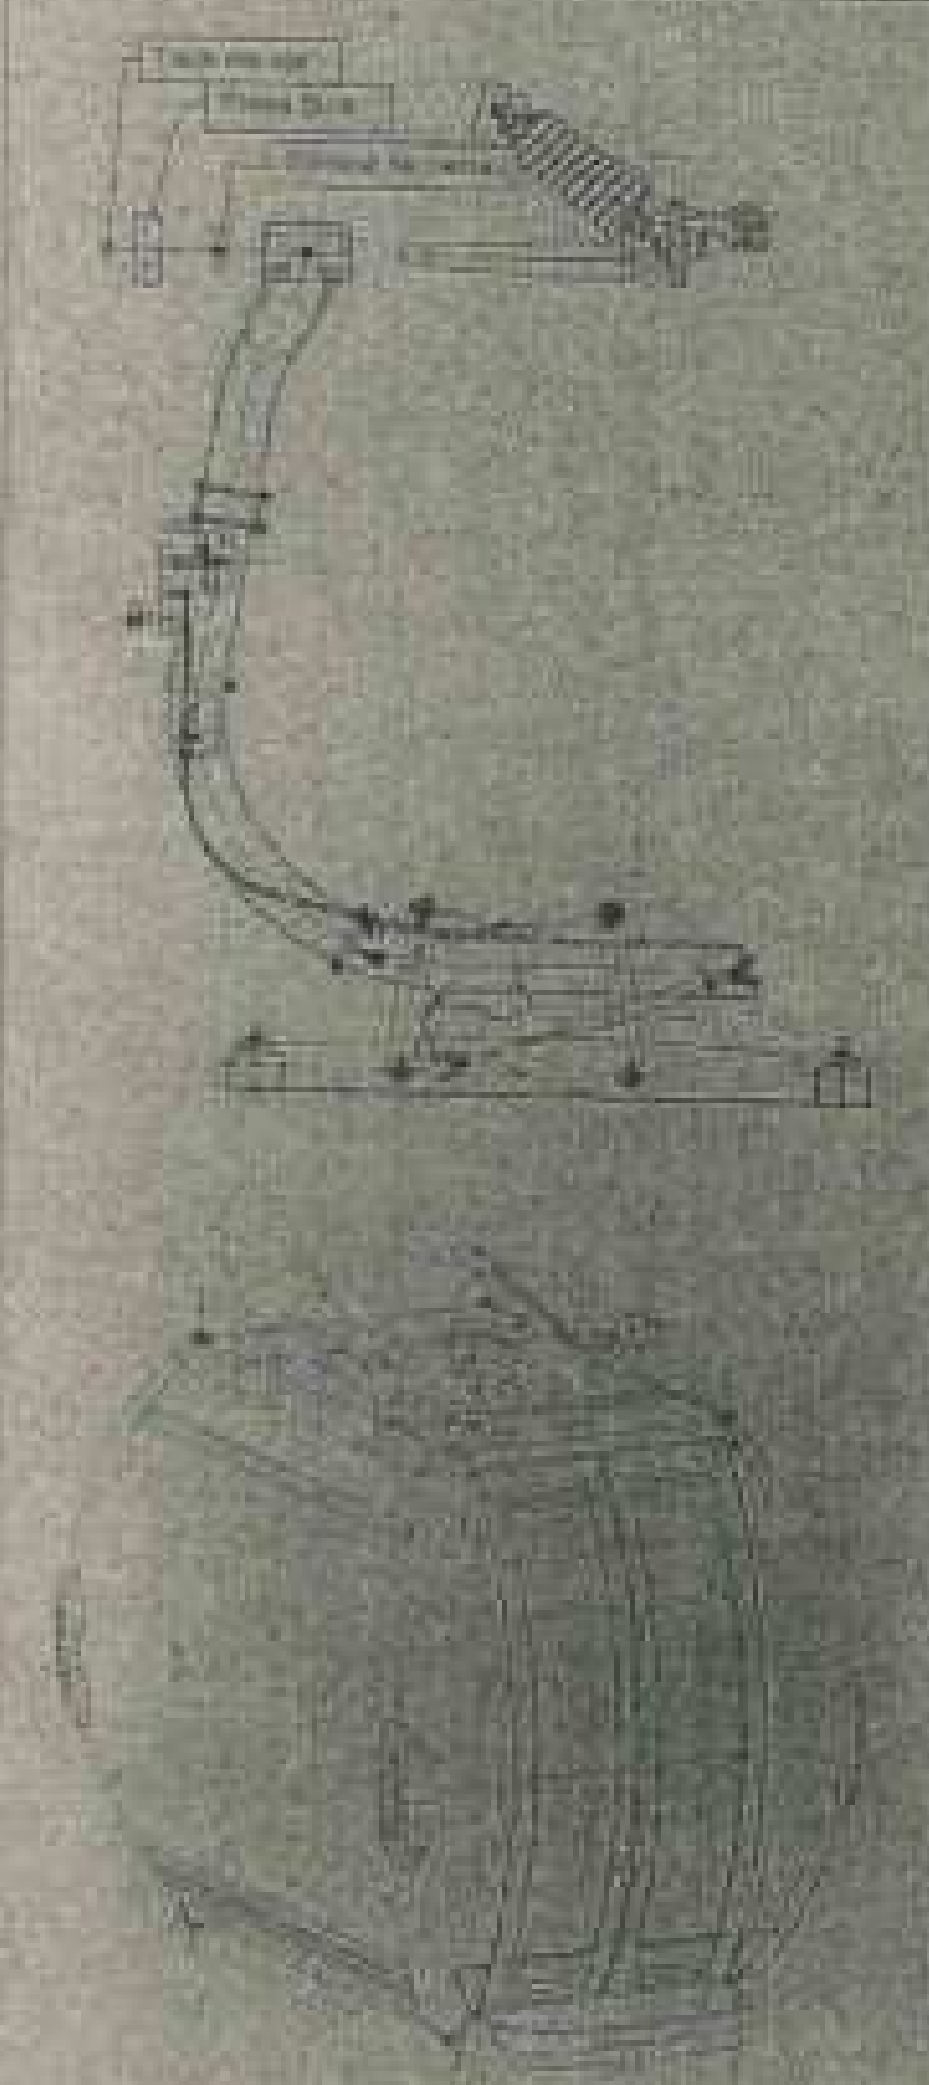

Ítem	Bien	Mal	Observaciones
[illegible]	X		
[illegible]		X	Pintura Columna Esquinas
[illegible]	X		
[illegible]		X	Rotas
[illegible]		X	Calcomanías Estado Emergencia
[illegible]		X	Calcomanía En techo Cod.
[illegible]		X	Pintura Techo

Observaciones Generales:

Información de los participantes


Nombre	Número de identificación	Empresa	Firma
Fabian Tabordaza	1053512774	TRANSMILENIO SA	[signature]
Efrain Jesus C	1095808824	CABLEMOVIL SAS	[signature]
Jose Jaime	1233561	O.D.T	[signature]

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la Instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA00C2858

Fecha: 11-06-2026
Número Cabina: C145

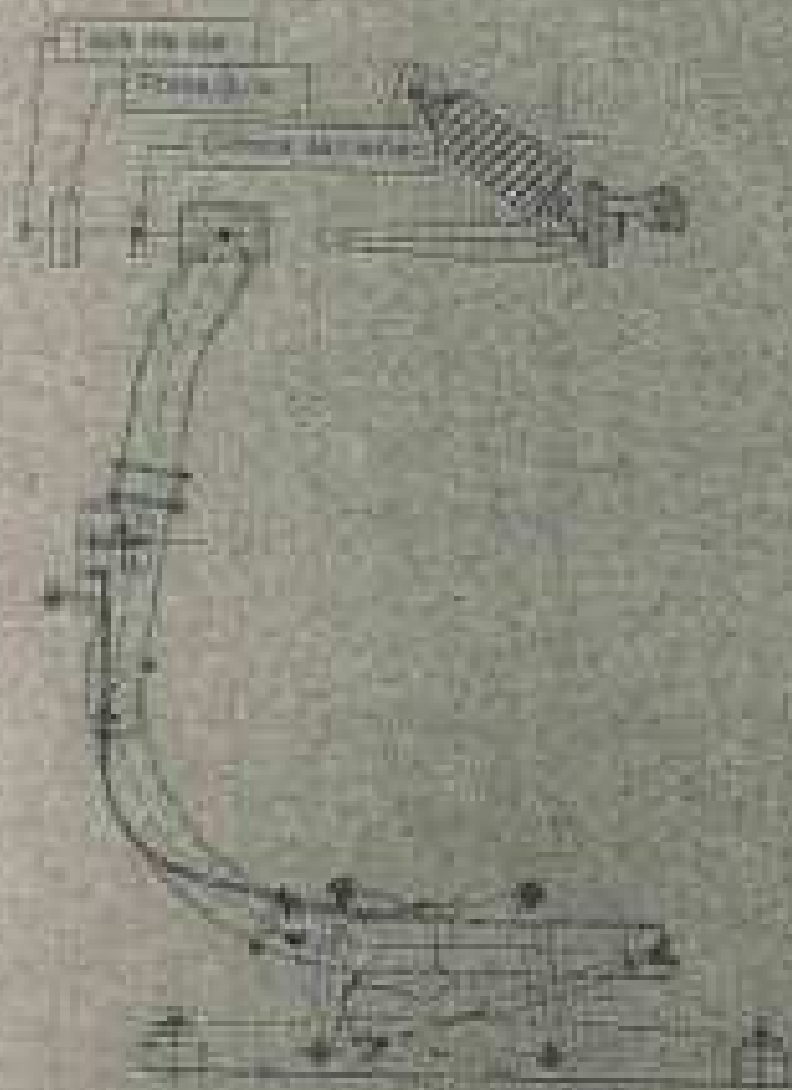



Item				Observaciones
1 [illegible]	X			
2 [illegible]	X			
3 [illegible]	X			
4 [illegible]	X			
5 [illegible]	X			
6 [illegible]	X			Nuevo
7 [illegible]	X			Nuevo
8 [illegible]	X			
9 [illegible]	X			
10 [illegible]	X			Nuevo
11 [illegible]	X			
12 [illegible]	X			
13 [illegible]	X			
14 [illegible]	X			
15 [illegible]	X			
16 [illegible] acoplamiento a distancia	X			
17 Palanca de acoplamiento a distancia	X			
18 [illegible]	X			
19 [illegible]	X			
20 [illegible]	X			
21 [illegible]	X			
22 [illegible]	X			
23 [illegible]	X			
24 [illegible]	X			
25 [illegible]	X			
26 [illegible]	X			
27 [illegible]	X			
28 [illegible]		X		Plastico [illegible]
29 [illegible]	X			
30 [illegible]	X			
31 [illegible]	X			
32 [illegible]	X			
33 [illegible]	X			
34 [illegible]	X			
35 [illegible]	X			
36 [illegible]	X			
37 [illegible]	X			
38 [illegible]	X			
39 [illegible]	X			
40 [illegible]	X			
41 Puerta izquierda		X		Plastico [illegible]
42 Puerta derecha		X		Plastico [illegible]
43 [illegible]	X			
44 [illegible]	X			
45 [illegible]	X			
46 [illegible]	X			
47 [illegible]	X			
48 [illegible]	X			
49 [illegible]	X			
50 [illegible]	X			
51 [illegible]	X			
52 [illegible]	X			
53 [illegible]	X			

Observaciones Generales:
no techo rayado

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Empresa	Firma
Fabian Tibaduiza	1035812774	TRANSMILENIO SA	[signature]
Elvin Jair [illegible]	1.095806[illegible]	CABLEMOVIL SAS	[signature]
José Cáceres	1236302	O.D.T	[signature]

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalacion

Nombre del sistema: MGD Cerro Bolivar WAADCC2668

Fecha: 14-06-2016

Numero Cabina: Cabina

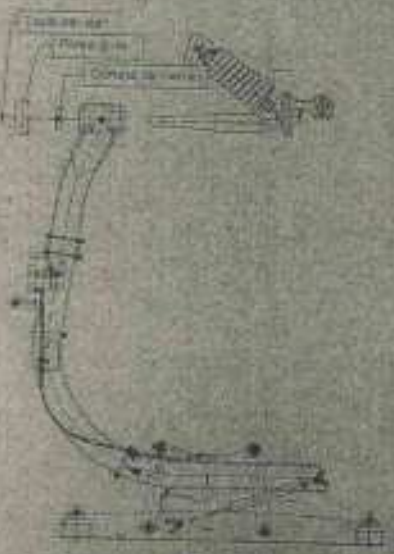



		X	Desgaste Desgaste
		X	Desgaste Desgaste
		X	Con Grado y Desgaste
		X	Fondo Cabina Izq Fondo Cabina Izq
		X	Roto.
		X	Ribetes Estado Cerca Ribetes Estado Cerca
		X	Pisadera Estado Vol

Observaciones Generales:

- Proteger Pin de carga Roto

Identificación de los participantes

Nombre	Numero de Identificación		
Fabian Tibaduiza	1033611774	TRANSMILENIO SA	
Carlos Jair V.	1095801481	CABLEMOVIL SAS	
Jose Rincon	1235303	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: MGD Cable Railway WAA000366

Fecha: 11/06/2016

Número Cabina: 297

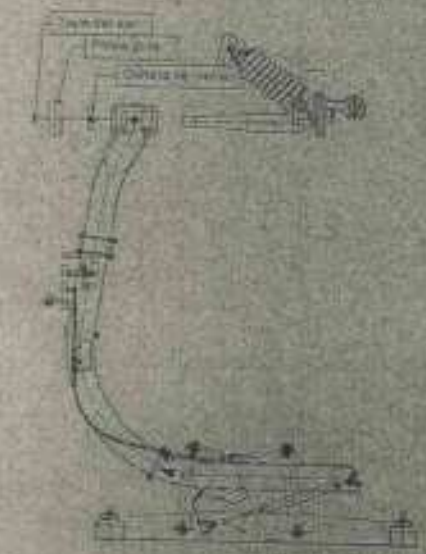



	X		
	X		
	X		
	X		
	X	X	Brigerle Delgado
	X		
	X		
	X		
	X	X	Dorgen V.
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X	X	Con Optimos / Dorgen
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X	X	Felipe Cardona / Jeiver Cano
X		X	Rafael Felipe Tapia
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X	X	Felipe Cardona Cano Jeiver Cano Erazo
	X		
	X		
	X	X	Rafael Felipe Tapia
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		
	X		

Observaciones Generales

- Golpe en costado derecho frontal

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación		Firma
Fabian Tibaduiza	1033517774	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jaimes O.	1094806481	CABLEMOVIL SAS	
Oscar Orozco	1235362	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0003688

Fecha: 14-06-2016

Numero Cabina: 048

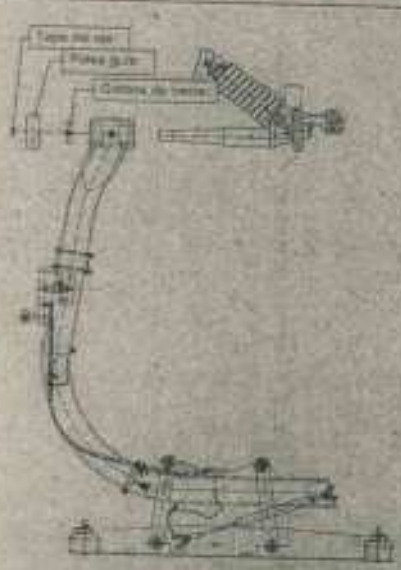



1 Poleas de Recirculación	X			
2 Poleas de Portadora delantera	X			
3 Poleas de Portadora trasera	X			
4 Polea Guia	X			
5 Mordaza Main		X		Desgaste
6 Mordaza Fija				Desgaste
7 Pedal de principal (izquierdo)	X			
8 Soporte principal derecho	X			
9 Cabrestantes		X		Desgaste
10 Punto de Impacto	X			
11 Lengueta delantera	X			
12 Lengueta trasera	X			
13 Cuchilla de Cierre	X			
14 Barra de suspension (c)	X			
15 Amortiguador de Impacto	X			
16 Punto de acoplamiento a cabina	X			
17 Palanca de acoplamiento a mordaza	X			
18 Tacones	X			
19 Placa apertura puerta	X			
20 Cilindro de Freno		X		Oxidado / Desgaste
21 Perno de Suspension	X			
22 Riel delantero 1	X			
23 Riel delantero 2	X			
24 Riel trasero 1	X			
25 Riel trasero 2	X			
26 Pintura exterior Cabina		X		Pintura exterior con rayones y golpes
27 Pintura interior Cabina		X		
28 Almohadilla puerta grilla (4)	X			
29 Juntas Puertas		X		Rotos
30 Anclaje cubrito frontal	X			
31 Anclaje cubrito trasero	X			
32 Anclaje cabina	X			
33 Pasamanos interno	X			
34 Ventana Puerta principal delantera	X			
35 Ventana Puerta principal trasera	X			
36 Anclaje Vidrio seguridad delantero	X			
37 Anclaje Vidrio seguridad trasero	X			
38 Ventana de guillotina delantera	X			
39 Ventana de guillotina trasera	X			
40 Soportes para acrilicos interiores	X			
41 Puerta izquierda		X		Pintura Estado Grave Rotura y Corte Emisor
42 Puerta derecha				
43 Mecanismo de apertura de puerta	X			
44 Cenicero	X			
45 Extintor de agua	X			
46 Techo de la Cabina		X		Pintura Deterioro Rayos
47 Anclajes Vidrio soportes anclajes	X			
48 Cubrimiento piso	X			
49 Pasos de transporte	X			
50 Silla delantera	X			
51 Silla trasera	X			
52 Panel lateral delantero	X			
53 Panel lateral trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1035127774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes O.	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Jose Jacome	1255567	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 16 MGD Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 11-06-2026

Numero Cabina: C149

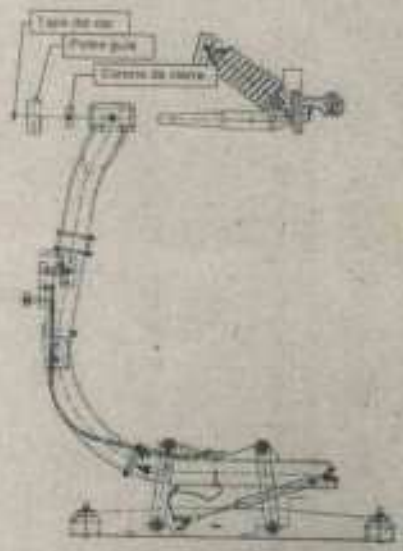



	Descripción	Cantidad	No Funciona	NO existe	Observaciones
1	Polea de Accionamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Horquilla Movil	X			Ajustar
6	Horquilla fija	X			Ajustar
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal Horquillas	X			Ajustar
10	Perno de Frizzion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Cerrojo de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Amortiguador de impacto	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Tensores	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		Adecuacion rotulos
21	Perno de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Retoques
27	Pintura Interior Cabina		X		Retoques
28	Amortiguadores de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Faltan 4 goma Tapa
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Rayado
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		(3) Rayados
33	Pasamanos interno		X		Pintura Rayada
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintura (3) Rayado
42	Puerta derecha		X		Pintura (3) Rayado
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Retoques pintura
47	Antenas Wiany soportes antenas	X			
48	Ubicación de rotulo tarifa	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad:	Firma:
Fabian Leon	80210783	TRANSMILENIO SA	
Ellen James O	1098806484	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCIÓN/ENTREGA
CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 11-06-2026

Numero Cabina: 150

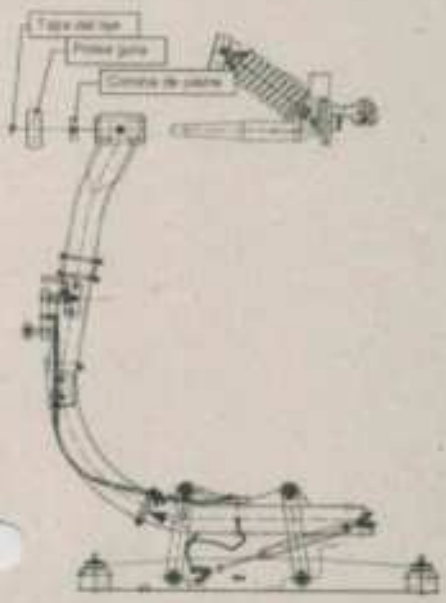



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Furro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladro	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		12 zonas
27	Pintura interior Cabina		X		12 zonas
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		rayado
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera		X		rayado
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Poladura Techo
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: Falla de protección del pin de carga roto

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabián León	80210783	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes O.	1.095 896 481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5712071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 11-06-2026

Numero Cabina: C151

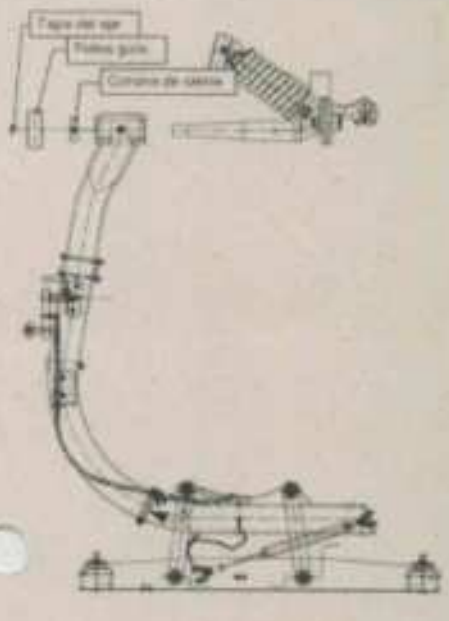



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal montajes	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Perno de suspension (3)	X			
15	Armazon de 6 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros				
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		Oxidación rotulos
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela Izquierda 1	X			
25	Biela Izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Peladuras pintura
27	Pintura Interior Cabina		X		Peladuras pintura
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Ambos rotos
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Rayado
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Rayado
32	Acrilico Lateral		X		Rayado
33	Pasamanos Interno		X		Peladuras
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos		X		Soporte roto Partido
41	Puerta Izquierda		X		Pintura rayada
42	Puerta derecha		X		Pintura rayada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Peladuras pintura
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales: Falla de protección de pinza carga roto

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabian León	80210763	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes O.	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figuera	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCIÓN ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002686

Fecha: 11-06-2026

Numero Cabina: C152

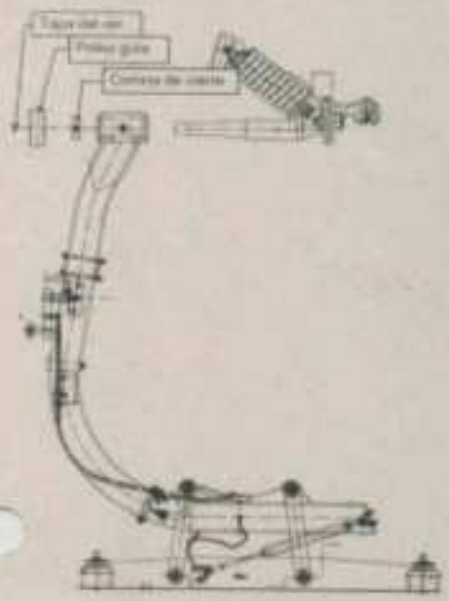

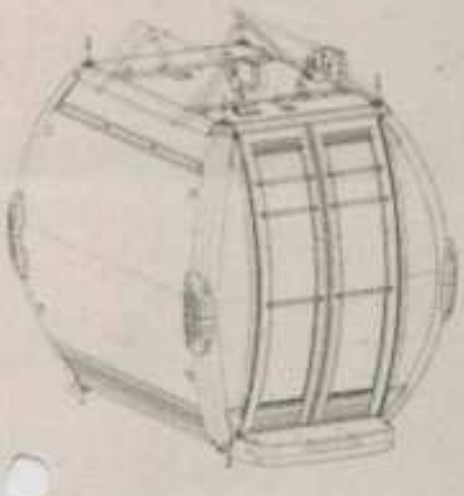

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste
10	Forro de Friccion		X		Fuera externos
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perno de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Raladuras Pintura
27	Pintura Interior Cabina		X		Raladuras Pintura
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Inguadeto rota
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera		X		Raladuras
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintura rasada
42	Puerta derecha		X		Pintura 12/3/26
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Raladura Pintura
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Union de cuzamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabián León	80210783	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jaime O.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	577207	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 11-06-2026

Número Cabina: C153

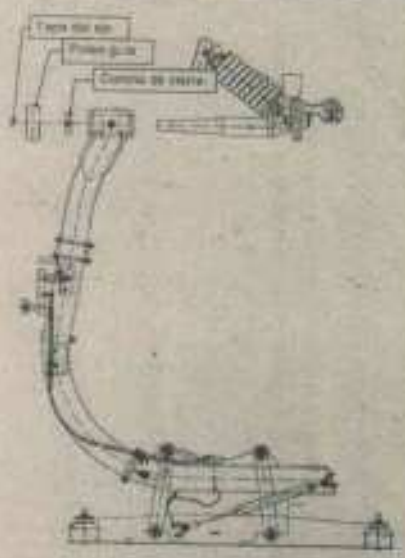



	Descripción	Cabina	No Existe	NO APLICA	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			NUEVO
6	Mordaza fija	X			NUEVO
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			NUEVO
10	Perno de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (2)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de acoplamiento a distancia	X			
17	Palanca de acoplamiento a distancia	X			
18	Tarjetas	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno		X		cambiado y desen
21	Perno de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Retoques pintura
27	Pintura interior Cabina		X		Retoques pintura
28	Antichoques de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal		X		Retoques
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Retoques
32	Acrilico Lateral		X		Retoques y pintado
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintura lijada
42	Puerta derecha		X		Pintura lijada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Patines	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Retoques pinturas
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Union de rodamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de Identificación:	Entidad:	Firma:
Fabián León	802107783	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaus D.	1.095.806.428	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772021	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 11-06-2026

Numero Cabina: C164

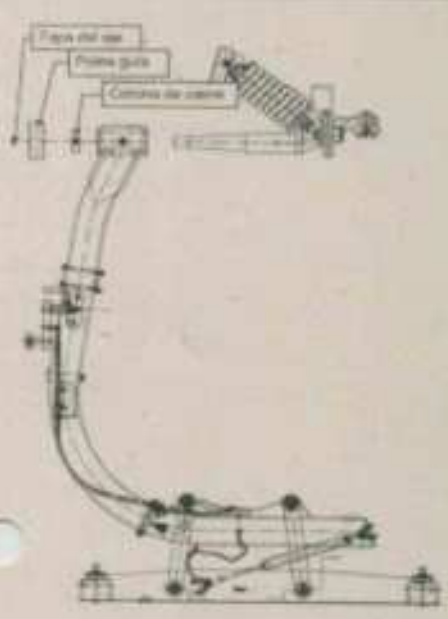



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Taladros	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Paladuis
27	Pintura interior Cabina		X		Paladuis
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Izquierda rota
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero		X		Rayaduis
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Frotuis rayada
42	Puerta derecha		X		Frotuis rayada
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Paladuis
47	Antenas Wlan y soportes antenas	X			
48	Liston de rozamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabián Leon	80210783	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jairo Ot	1095806481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 11-06-2026

Numero Cabina: C153

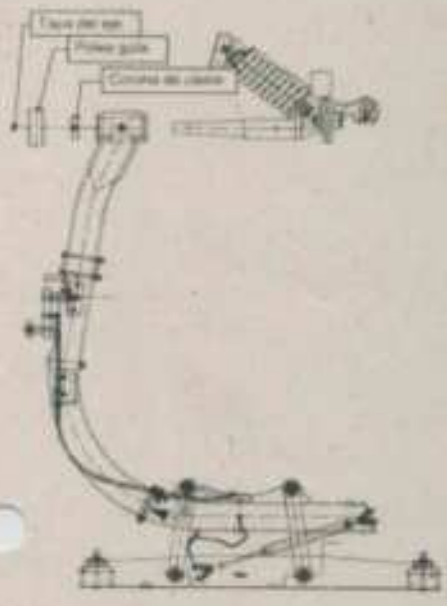



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			NOAPLICA
6	Mordaza fija	X			NOAPLICA
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			NOAPLICA
10	Polea de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (3)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Teleflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Pintura rasada
27	Pintura Interior Cabina		X		Pintura
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas		X		Derecha rota
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral		X		Partido
33	Pasamanos Interno	X			
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio esquinero delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio esquinero trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera		X		Rayada
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Rayadura
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Pintura pintado
47	Antenas Wifan y soportes antenas	X			
48	Lamin de nuzamiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabián León	80210783	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes O.	1.095.806.481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCIÓN/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 11-06-2026

Numero Cabina: C156

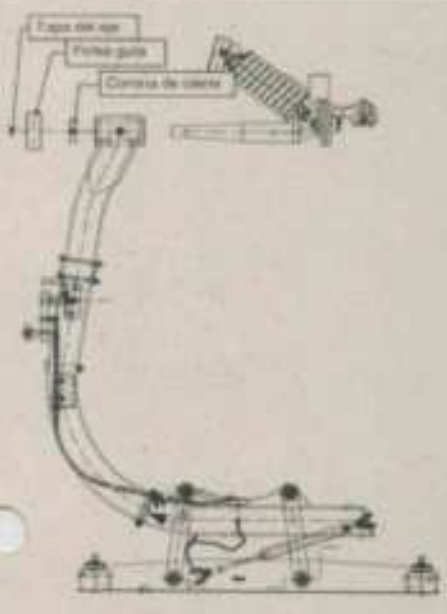



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil		X		Desgaste
6	Mordaza fija		X		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas		X		Desgaste
10	Forro de Friccion	X			
11	Lengueta delantera	X			
12	Lengueta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telaflex	X			
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Pernos de Suspension	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquierda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina		X		Paladeiza pintura
27	Pintura interior Cabina		X		Paladeiza pintura
28	Almohadillas de goma (4)	X			
29	Juntas Puertas	X			
30	Acrilico o vidrio frontal	X			
31	Acrilico o vidrio trasero	X			
32	Acrilico Lateral	X			
33	Pasamanos Interno		X		Paladeiza
34	Ventana Abatible interior delantera	X			
35	Ventana Abatible interior trasera	X			
36	Acrilico o Vidrio asiento delantero	X			
37	Acrilico o Vidrio asiento trasero	X			
38	Ventana de guillotina delantera	X			
39	Ventana de guillotina trasera	X			
40	Soportes para acrilicos internos	X			
41	Puerta izquierda		X		Pintura izquierda
42	Puerta derecha		X		Pintura izquierda
43	Mecanismo de apertura de puerta	X			
44	Estribo	X			
45	Estribo de guia	X			
46	Techo de la Cabina		X		Paladeiza pintura
47	Amarres Villarry soportes amarres	X			
48	Union de mordimiento	X			
49	Patas de transporte	X			
50	Silla delantera	X			
51	Silla trasera	X			
52	Panel Solar delantero	X			
53	Panel solar trasero	X			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Fabián León	80210783	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaimes D.	1.095 806 481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolívar WAAC002888

Fecha: 17-06-2016

Número Cabina: C137

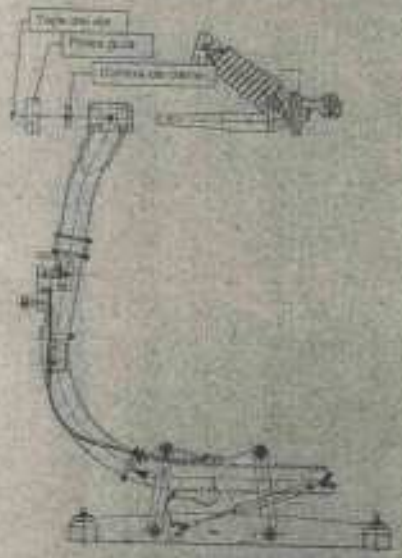



1	Polea de tensionamiento			
2	Polea de Retorno delantero			
3	Polea de Retorno trasero			
4	Polea Guia			
5	Mordaza Movil			
6	Mordaza Fija	X		Daños y Desgaste
7	Resorte principal izquierdo			
8	Resorte principal derecho			
9	Cuña mordaza	X		Desgaste.
10	Forro de Friccion			
11	Lengueta delantera			
12	Lengueta trasera			
13	Correa de Clavija			
14	Barra de suspension (2)			
15	Armazon de 4 puntos			
16	Punto de acoplamiento a mordaza			
17	Punto de acoplamiento a balancin			
18	Tornillos			
19	Brazo apertura puerta			
20	Cilindro de Freno			
21	Varilla de suspension			
22	Viga derecha 1			
23	Viga izquierda 1			
24	Viga izquierda 2			
25	Pintura exterior Cabina	X		Peladuras Golpes Rayas
26	Pintura Interior Cabina	X		Peladuras Golpes Rayas
27	Almohadillas de goma (4)			
28	Chapa Puertas			
29	Acrilico costado Frontal	X		Rallon Rayon
30	Acrilico Puesto Trasero			
31	Acrilico Lateral	X		Rallon Rayon
32	Pasamanos Interior	X		Pasamanos de C136
33	Ventana Acrilico interior delantera			
34	Ventana Acrilico interior trasera			
35	Acrilico Puesto conductor delantero			
36	Acrilico Puesto conductor trasero			
37	Ventana de guillotina delantera			
38	Ventana de guillotina trasera			
39	Soportes para acrilicos interior	X		Roto
40	Puerta Izquierda	X		Golpeada Estribo Enrejado
41	Puerta Derecha	X		Golpeada Estribo Enrej
42	Mecanismo de apertura de puerta			
43	Techo			
44	Techo Inferior			
45	Techo de la Cabina	X		Rladura Por Dentro
46	Antenas Wlans y puntos externos			
47	Cinturon de seguridad			
48	Pared de transporte			
49	Silla delantera			
50	Silla trasera			
51	Pared lateral delantero			
52	Pared lateral trasero			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512724	TRANSMILENIO SA	
Edwin Davis Ortiz	1098604[illegible]	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figuera	5772021	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 HGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 12-06-2026

Numero Cabina: C15B

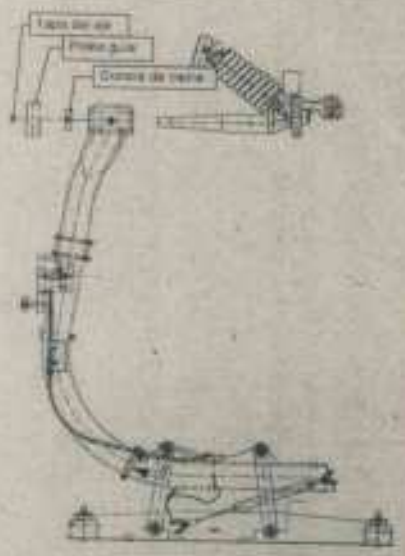



	Descripción	Cantidad	Nº Diagnóstico	Nº Actual	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento				
2	Polea de Rodadura delantera				
3	Polea de Rodadura trasera				
4	Polea Guia				
5	Mordaza Movil		A		Desgaste
6	Mordaza fija		A		Desgaste
7	Resorte principal izquierdo				
8	Resorte principal derecho				
9	Canal mordazas		A		Desgaste
10	Perno de Presion				
11	Lengüeta delantera				
12	Lengüeta trasera				
13	Cuerda de Carga				
14	Barra de Suspension (I)				
15	Armazon de 4 puntos				
16	Apoyo de acoplamiento a distancia				
17	Palanca de acoplamiento a distancia				
18	Telefax				
19	Boton apertura puerta				
20	Cilindro de Freno				
21	Perno de Suspension				
22	Biela corredor 1				
23	Biela derecha 2				
24	Biela izquierda 1				
25	Biela izquierda 2				
26	Pintura exterior Cabina		S		Pintura Columnas Esquinas
27	Pintura interior Cabina		X		Pintura Columnas Esquinas
28	Almohadillas de goma (4)				
29	Juntas Puertas		A		Rotas
30	Acrilico o vidrio frontal				
31	Acrilico o vidrio trasero				
32	Acrilico Lateral				
33	Pasamanos Interno				
34	Ventana Abatible interior delantera				
35	Ventana Abatible interior trasera				
36	Acrilico o Vidrio escurreri delantero				
37	acrilico o Vidrio escurreri trasero				
38	ventana de guillotina delantera				
39	ventana de guillotina trasera				
40	Aspersor para acrilicos interiors				
41	Puerta izquierda		A		Pintura Estado Grafiti
42	Puerta derecha		X		Pintura Estado Grafiti
43	Mecanismo de apertura de puerta				
44	Cenfro				
45	Centro de guia				
46	Techo de la Cabina		A		Pintura Rota Oxidada
47	Antigas Wiscy soportes externos				
48	Liston de rozamiento				
49	Patas de transporte				
50	Silla delantera				
51	Silla trasera				
52	Panel boar delantero				
53	Panel boar trasero				

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de identificación	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elen Lara D	1095806948	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolivar WAA0002686

Fecha: 12-08-2016

Numero Cabina: 2159

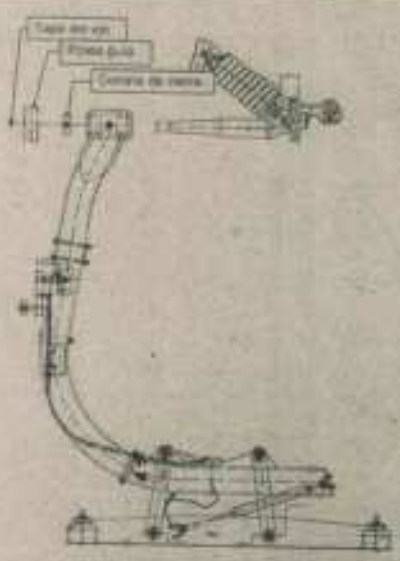

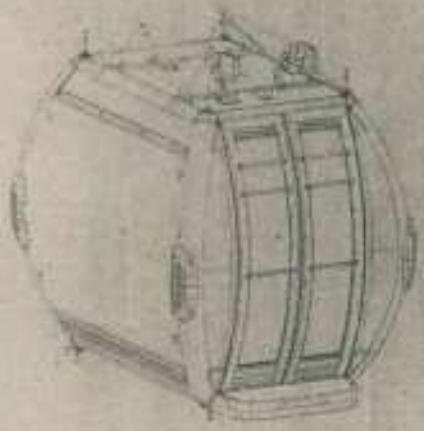

	Descripción	Cantidad	No Conforme	NO APLICA	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento				
2	Polea de Retadura delantera				
3	Polea de Retadura trasera				
4	Polea Guia				
5	Horquilla Movil		X		Pegaste
6	Horquilla fija		X		Pegaste
7	Resorte principal izquierdo				
8	Resorte principal derecho				
9	Cañas montajes		X		Pegaste
10	Perno de Friccion				
11	Lengüeta delantera				
12	Lengüeta trasera				
13	Concha de Cierre				
14	Barra de suspension (2)				
15	Armazon de 4 puntos				
16	Rodillo de accionamiento a distancia				
17	Palanca de accionamiento a distancia				
18	Tacaños				
19	Brazo apertura puerta				
20	Cerrojo de Pierre				
21	Perros de Suspension				
22	Riel derecho 1				
23	Riel derecho 2				
24	Riel Izquierdo 1				
25	Riel Izquierdo 2				
26	Pintura exterior Cabina		X		Pintada Columna Blanca
27	Pintura Interior Cabina		X		Pintada Columna Esquinas
28	Antideslizantes de goma (4)				
29	Vidrios Puertas		X		Roto / Toci Roto
30	Acrilico o vidrio frontal				
31	Acrilico o vidrio trasero				
32	Acrilico Lateral				
33	Pasamanos interno				
34	Ventana Abatible interior delantera				
35	Ventana Abatible interior trasera				
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero				
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero				
38	Ventana de guillotina delantera				
39	Ventana de guillotina trasera				
40	Soportes para acrilicos laterales				
41	Puerta izquierda		X		Pintada Estribo Entrada
42	Puerta derecha		X		Pintada Estribo Entrada
43	Mecanismo de apertura de puerta				
44	Espejo				
45	Cerrojo de guia				
46	Techo de la Cabina		X		Pintadura Piso Ubicado
47	Antenas WiFi y soportes antenas				
48	Liston de rozamiento				
49	Pasos de transporte				
50	Silla delantera				
51	Silla trasera				
52	Panel lateral delantero				
53	Panel lateral trasero				

Observaciones Generales: 6 cabina Fecha de elevacion en limite de desbloque cerrado

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad:	Firma
Fabian Tibaduiza	1053517774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Javier O.	1095806401	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	577-2771	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MOD Ciudad Bolivar WAA0002888

Fecha: 17-06-2016

Numero Cabina: C160

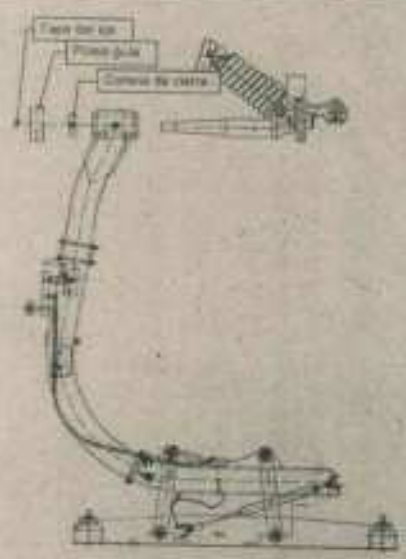

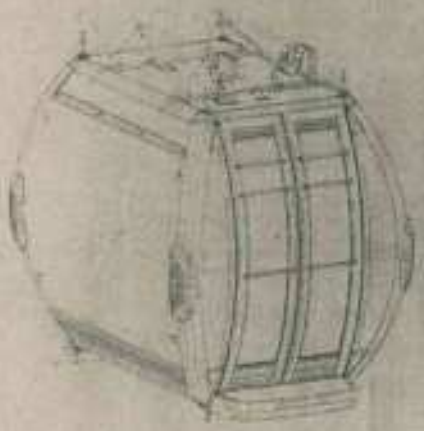

	Descripción	Cantidad	No. Posiciones	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Accionamiento				
2	Polea de Retorno delantera				
3	Polea de Retorno trasera				
4	Polea Guia				
5	Mordaza Movil		5		Pasando
6	Mordaza Fija		5		Pasando
7	Resorte principal izquierdo				
8	Resorte principal derecho				
9	Canal mordazas		X		Pasando
10	Perno de Friccion				
11	Lengueta delantera				
12	Lengueta trasera				
13	Correa de Cierre				
14	Barra de suspension (2)				
15	Armazon de 4 puntos				
16	Rodillo de acompañamiento a distancia				
	Palanca de acompañamiento a distancia				
17	Tijeritas				
18	Brazo apertura puerta				
19	Corona de Freno				
20	Pernos de Suspension				
21	Silla derecha 1				
22	Silla derecha 2				
23	Silla izquierda 1				
24	Silla izquierda 2				
25	Pintura exterior Cabina		1		Pintado Exterior Cabina
26	Pintura interior Cabina		1		Pintado Interior Cabina
27	Amortiguadores de goma (4)				
28	Turbos Puertas		1		Puertas
29	Acrilico o vidrio frontal				
30	Acrilico o vidrio trasero		1		Acrilico Puerta
31	Acrilico Lateral				
32	Pasamanos interno				
34	Ventana Abatible interior delantera				
35	Ventana Abatible interior trasera				
36	Acrilico o vidrio seguridad delantero				
37	Acrilico o vidrio seguridad trasero				
38	Ventana de guillotina delantera				
39	Ventana de guillotina trasera				
40	Soportes para acrilicos internos				
41	Puerta izquierda		1		Pintado Estilo Cabina
42	Puerta derecha		1		Pintado Estilo Cabina
43	Mecanismo de apertura de puerta				
44	Estribo				
45	Estribo de guia				
46	Techo de la Cabina		X		Pintado Techo Delantero
47	Antenas Wi-Fi y accesorios antenas				
48	Liston de cubrimiento				
49	Pase de transporte				
50	Silla delantera				
51	Silla trasera				
52	Panel Solar delantero				
53	Panel solar trasero				

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053512774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jose V.	1098806481	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 19 MOD Ciudad Bolívar WAA0000688

Fecha: 12-06-2016

Número Cabina: C161

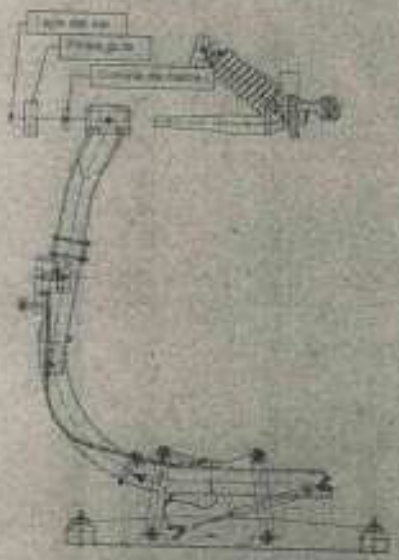



1. Polea de Acoplamiento			
2. Polea de Retención delantera			
3. Polea de Retención trasera			
4. Polea Guía			
5. Rodamiento			
6. Horquilla	X		Desgaste
7. Resorte principal izquierdo	Y		Desgaste
8. Resorte principal derecho			
9. Cable Portador	X		Desgaste
10. Portal de Fricción			
11. Seguro delantero			
12. Seguro trasero			
13. Cuerpo de Garra			
14. Balde de suspensión (1)			
15. Amortiguador de plomo			
16. Rueda de accionamiento a distancia			
17. Palanca de accionamiento a distancia			
18. Ventas			
19. Eje apertura puerta			
20. Cordón de Freno			
21. Tornillo de Suspensión			
22. Silla interior 1			
23. Silla interior 2			
24. Silla trasera 1			
25. Silla trasera 2			
26. Pintura exterior Cabina	X		Pintura Columna Izquierda
27. Pintura interior Cabina	X		Pintura Columna Izquierda
28. Ventanillas de ventilación			
29. Vidrios Puertas	X		Rotos
30. Vidrio Frontal			
31. Vidrio Lateral Izquierdo			
32. Vidrio Lateral			
33. Pasamanos interno			
34. Ventana Anatomía mayor de arriba			
35. Ventana Anatomía mayor trasera			
36. Vidrio Lateral Izquierdo delantero			
37. Vidrio Lateral Izquierdo trasero			
38. Ventana de guía lateral delantera			
39. Ventana de guía lateral trasera			
40. Soportes para vidrios internos			
41. Puerta izquierda	X		Pintura Lateral Exterior
42. Puerta derecha	X		Pintura Exterior Lateral
43. Mecanismo de apertura puerta			
44. Cenicero			
45. Cenicero trasero			
46. Techo de la Cabina	X		Pintura Piso Interior
47. Antenas internas/externas antenas			
48. Letrero de identificación			
49. Patas de transporte			
50. Silla delantera			
51. Silla trasera			
52. Panel Guía Izquierdo			
53. Panel guía trasero			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Empresa	Firma
Fabian Tibaduiza	1053517774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo O.	1095806781	CABLEMOVIL SAS	
Darwin Figueroa	5772071	O.O.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS


Datos de la instalación

Nombre del sistema: TD MGO Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 17/06/2016

Número Cabina: C162

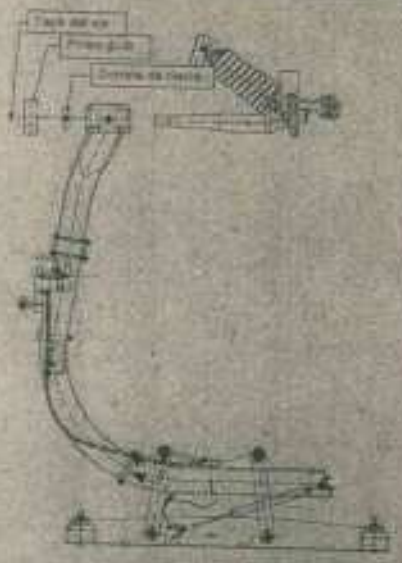

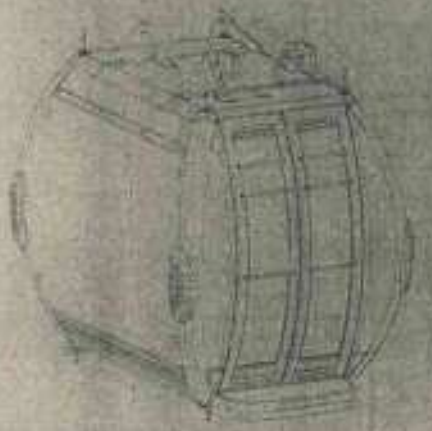

1. Prisa de Rodadura			
2. Prisa de Rodadura delantera			
3. Prisa de Rodadura trasera			
4. Prisa Guía			
5. Rodillos Guía			
6. Horquilla			Nuevo Usado
7. Resorte principal izquierdo			
8. Resorte principal derecho			
9. Cerrojo			
10. Perno de Fricción			Nuevo
11. Leva Guía delantera			
12. Leva Guía trasera			
13. Cojinete de Carro			
14. Balde de suspensión (J)			
15. Articulación de suspensión			
16. Palanca de accionamiento a distancia			
17. Palanca de accionamiento a distancia			
18. Tensión			
19. Brazo elástico puerta			
20. Cilindro de Freno			
21. Perno de la Articulación			
22. Rodillo derecho 1			
23. Rodillo derecho 2			
24. Rodillo izquierdo 1			
25. Rodillo izquierdo 2			
26. Rodillo anterior Cabina	V		Pintadera Columnas Equipo
27. Rodillo trasero Cabina	X		Pintadera Columnas Equipo
28. Bisagras de goma (4)			
29. Cojines Puertas			
30. Accesorio eléctrico frontal			
31. Accesorio eléctrico trasero			
32. Acción Cerrojo			
33. Ventanas interno	V		Roto
34. Ventana Acceso Interior de Cabina	X		Pantalla Rompio
35. Ventana Acceso Interior trasera			
36. Acción y Cierre asiento delantero			
37. Acción y Cierre asiento trasero			
38. Cerrojo de goma de apertura			
39. Ventana de goma trasera			
40. Soportes para extintor interno			
41. Puerta izquierda	X		Pintadera Extintor Equipo
42. Puerta derecha	X		Pintadera Extintor Equipo
43. Manija interna de apertura de puerta			
44. Techo			
45. Cerrojo de goma			
46. Techo de la Cabina	R		
47. Antenas y luces exteriores anteriores			
48. Cierre de la cabina			
49. Patas de transporte			
50. Silla delantera			
51. Silla trasera			
52. Panel Guía delantero			
53. Panel Guía trasero			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Entidad	Firma
Fabian Tibaduiza	1053807774	TRANSMILENIO SA	
Elkin Soto D.	1095808+121	CABLEMOVIL SAS	
Harvin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: TP MGD Ciudad Bolívar WAA0002668

Fecha: 12-06-2026

Número Cabina: C163

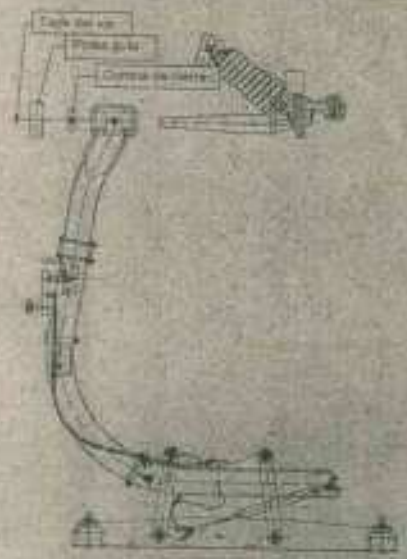



1 Polea de Accionamiento			
2 Polea de Retadora delantera			
3 Polea de Retadora trasera			
4 Polea Guia			
5 Horquilla Motriz			
6 Horquilla Fija			Nueva Vieja
7 Resorte principal izquierdo			
8 Resorte principal derecho			
9 Cuerpo Horquillas			Nueva
10 Eje de Presión			
11 Zapatera delantera			
12 Zapatera trasera			
13 Cuerpo de Cierre			
14 Eje de suspensión (1)			
15 Amortiguadores			
16 Rodachin de acoplamiento a mordaza			
17 Balancin de acoplamiento a mordaza			
18 Tornillos			
19 Eje adentro puerta			
20 Cuerpo de Freno			
21 Tornillo de Suspensión			
22 Polea derecha 1			
23 Polea derecha 2			
24 Polea izquierda 1			
25 Polea izquierda 2			
26 Vidrio posterior Cabina	X		Pésimo estado Empañ
27 Vidrio anterior Cabina	X		Pésimo estado Empañ
28 Rodachines de puerta (4)			
29 Bisagras Puertas	X		Roto
30 Vidrio lateral frontal			
31 Vidrio lateral Trasero	X		Vidrio Rayado
32 Vidrio trasero			
33 Pasamanos interno			
34 Ventana abertura interior delantera			
35 Ventana abertura interior trasera			
36 Vidrio abertura exterior delantero			
37 Vidrio abertura exterior trasero			
38 Ventana de guillotina delantera			
39 Ventana de guillotina trasera			
40 Angulos para asientos internos			
41 Puerta izquierda	X		Pésimo estado Empañ
42 Puerta derecha	X		Pésimo estado Empañ
43 Mecanismo de apertura de puerta			
44 Asientos			
45 Asiento trasero			
46 Techo de la Cabina	X		Presenta Fuga Filtración
47 Anclajes adicionales			
48 Cierre de seguridad			
49 Patas de transporte			
50 Guia delantera			
51 Guia trasera			
52 Rodachin delantero			
53 Rodachin trasero			

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre	Número de Identificación	Empresa	Firma
Fabian Tibaduiza	1053817774	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jaimes D	1099[illegible]21	CABLEMOVIL SAS	
Dewin Figueroa	5772071	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA CABINAS

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar WAA0002688

Fecha: 12-6-2016

Numero Cabina: C769

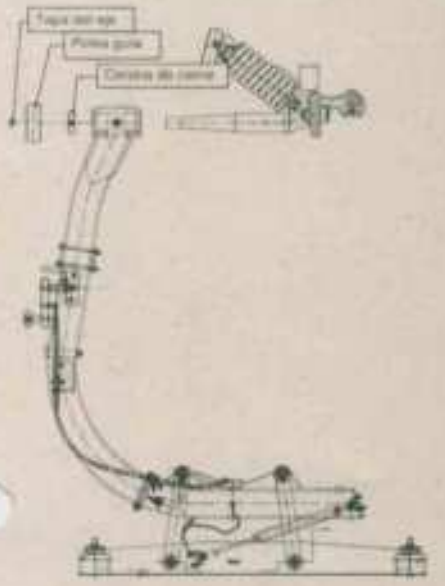



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Polea de Acoplamiento	X			
2	Polea de Rodadura delantera	X			
3	Polea de Rodadura trasera	X			
4	Polea Guia	X			
5	Mordaza Movil	X			
6	Mordaza fija	X			
7	Resorte principal izquierdo	X			
8	Resorte principal derecho	X			
9	Canal mordazas	X			
10	Foro de Friccion	X			
11	Lengüeta delantera	X			
12	Lengüeta trasera	X			
13	Corona de Cierre	X			
14	Barra de suspension (I)	X			
15	Armazon de 4 puntos	X			
16	Rodillo de accionamiento a distancia	X			
17	Palanca de accionamiento a distancia	X			
18	Telefono			X	
19	Brazo apertura puerta	X			
20	Cilindro de Freno	X			
21	Perros de Suspensión	X			
22	Biela derecha 1	X			
23	Biela derecha 2	X			
24	Biela izquieda 1	X			
25	Biela izquierda 2	X			
26	Pintura exterior Cabina			X	
27	Pintura interior Cabina			X	
28	Almohadillas de goma (4)			X	
29	Juntas Puertas			X	
30	Acrilico o vidrio frontal			X	
31	Acrilico o vidrio trasero			X	
32	Acrilico Lateral			X	
33	Pasamanos interno			X	
34	Ventana Abatible interior delantera			X	
35	Ventana Abatible interior trasera			X	
36	Acrilico o Vidrio seguridad delantero			X	
37	Acrilico o Vidrio seguridad trasero			X	
38	Ventana de guillotina delantera			X	
39	Ventana de guillotina trasera			X	
40	Soportes para acrilicos internos			X	
41	Puerta izquierda	X			
42	Puerta derecha	X			
43	Mecanismo de apertura de puerta			X	
44	Estribo			X	
45	Estribo de guia			X	
46	Techo de la Cabina			X	
47	Antenas Wlan y soportes antenas			X	
48	Liston de resamiento			X	
49	Patas de transporte			X	
50	Silla delantera	X		X	
51	Silla trasera			X	
52	Panel Solar delantero			X	
53	Panel solar trasero			X	

Observaciones Generales:

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Norman J. Lozano	7030656716	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes O.	1.095806481	CABLEMOVIL SAS	
José Vidarte	1235307	O.D.T	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA EQUIPOS DE RESPALDO

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 28/05/2026

Estacion Tunal

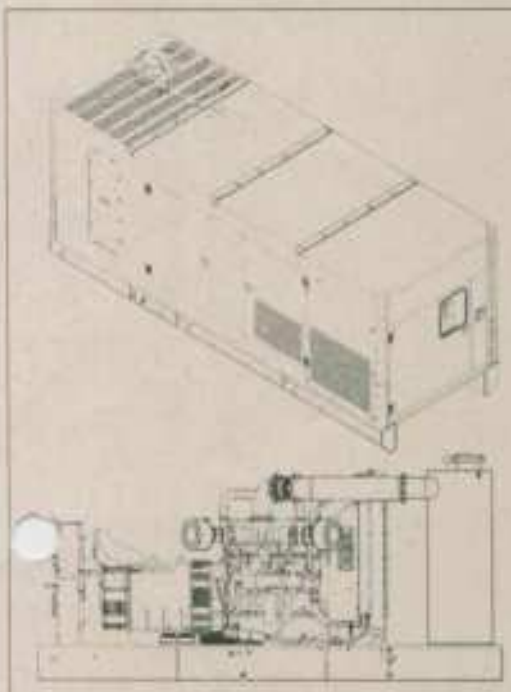

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Generador Caterpillar 1			✓	
2	Generador Caterpillar 2			✓	
3	Generador Caterpillar 3			✓	
4	Generador Motasa	✓			
5	Estado Gabinete UPS BORN	✓			
7	Gabinete Transformador dpd	✓			
8	Gabinete Baterias 1 dpd	✓			
9	Gabinete Baterias 2 dpd			✓	
10	Tableros Transferencia 1	✓			
12	Tableros Transferencia 2			✓	
13	Tableros Transferencia 3			✓	

Observaciones Generales:

* Se evidencia tapa de acceso a cableado subterraneo suelta
* Se identifica Puerta a tierra suelta tapa acceso cableado
* Se identifica tapa de malla refrigerante, con oxidacion o suciedad lo cual dificulta ver nivel
* Se evidencia Faltante Prensa estopa cableado Principal
* Se identifican canaletas, gotiendes cuarto UPS (electrico)
* Se evidencia humedad de aceite Por los empaques del cartel
* Se identifica ducto refrigerante con mancha Por Posible Fuga (realizar limpieza)
* Se identifica cableado con Pegatinas sueltas
* No se realizan ni se comprueba vida util en baterias de UPS, sin embargo Personal de ODT compartira el ultimo informe de mantenimiento, el cual resulto en Enero de 2025

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andres Hernandez	1023932943	TRANSMILENIO SA	
Elian James Ortiz	1095800481	CABLEMOVIL	
Miguel A. Borrero	1030671170	ODT	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA
EQUIPOS DE RESPALDO

Datos de la instalación

Nombre del sistema: *10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688*

Fecha: 28/05/2026.

Estacion Juan Pablo II

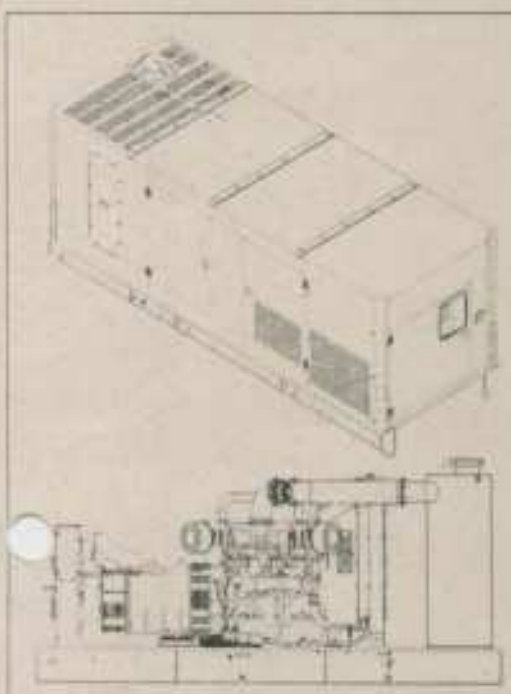

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Generador Caterpilar 1			✓	
2	Generador Caterpilar 2			✓	
3	Generador Caterpillar 3			✓	
4	Generador Hodasa	✓			
5	Estado Gabinete UPS BORR	✓			
6	Gabinete Transformador dpd	✓			
7	Gabinete Baterias 1 dpd	✓			
8	Gabinete Baterias 2 dpd			✓	
10	Tablerros Transferencia 1	✓			
11	Tablerro Transferencia 2			✓	
12	Tablerro Transferencia 3			✓	

Observaciones Generales:

* Se identifico Cadena de seguridad Suelta tapa refrigerante.
* Se identifico Falta Aislamiento en ducto de escape.
* Se identifico Puntos de oxidación, Posible Fuga en ducto escape.
* Se identifico nivel de refrigerante bajo.
* Se identifica Falta de prensa estopa cubierta de la acometida, alimentación de Precalentador Suelta adicionalmente toma corriente Suelta y terminales que no le corresponden
* Se evidencia humedad de aceite, Por los empaques del carter.
* NO Se realiza, ni se comprueba vida util baterias de UPS Sin embargo Personal de ODT compartira el ultimo informe de mantenimiento, el cual Se realizo en fechas de 2025

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andres Hernandez	1023932943	TRANSMILENIO SA	
Ellen James Ortiz	1095806481	CABLEMOVIL	
Miguel A Borilla	1030676190	ODT	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA EQUIPOS DE RESPALDO

Datos de la instalación

Nombre del sistema: *10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688*

Fecha: 29/05/2026

Estacion Montes

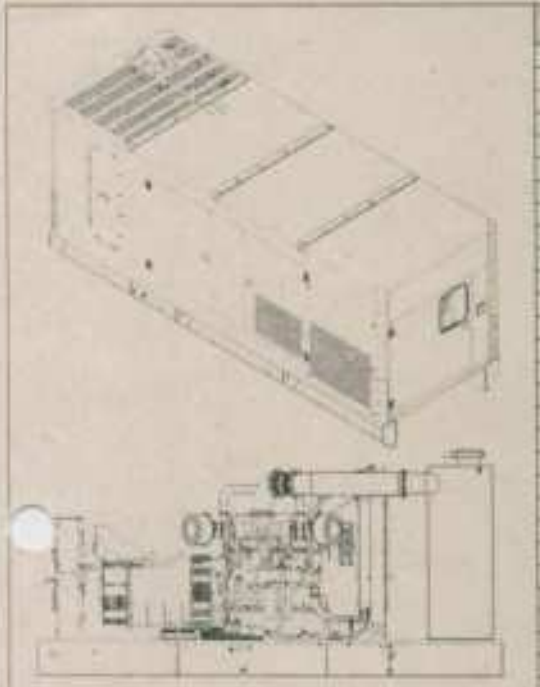

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Generador Caterpillar 1		X		
2	Generador Caterpillar 2		X		
3	Generador Caterpillar 3		X		
4	Generador Modasa			X	
5	Estado Gabinete UPS BORRI	✓			
6	Gabinete Transformador dpd	✓			
7	Gabinete Baterias 1 dpd	✓			
8	Gabinete Baterias 2 dpd			✓	
9	Tableros Transferencia 1	✓			
10	Tableros Transferencia 2			✓	
11	Tableros Transferencia 3			✓	

Observaciones Generales:

* Planta 1: * Se evidencia humedad de aceite por los empaques carter.
* Se identifica cargador de baterias deteriorado.
* Se identifica 2 baterias deterioradas
* Se identifica boton esterno de stop de emergencia Suelto.

Planta 2: Se identifican 2 baterias deterioradas.
* Se identifica boton esterno de stop de emergencia Suelto
* Se evidencia humedad de aceite por los empaques del carter.

Planta 3: Se evidencia cargador de baterias dañado.
* Se identifica boton esterno de stop emergencia Suelto.

UPS: Boton enter se encuentra en mal estado.
* Se evidencia alarma de servicio en UPS.

Información de los participantes

Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andrés Hernández	1023932943	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes Ortiz	1095806484	CABLEMOVIL	
Miguel A Borrero	1030531170	ODT	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA EQUIPOS DE RESPALDO


28/05/2026

Datos de la instatación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolivar WAA0002688

Fecha: 29/05/2026

Estacion Paraiso.

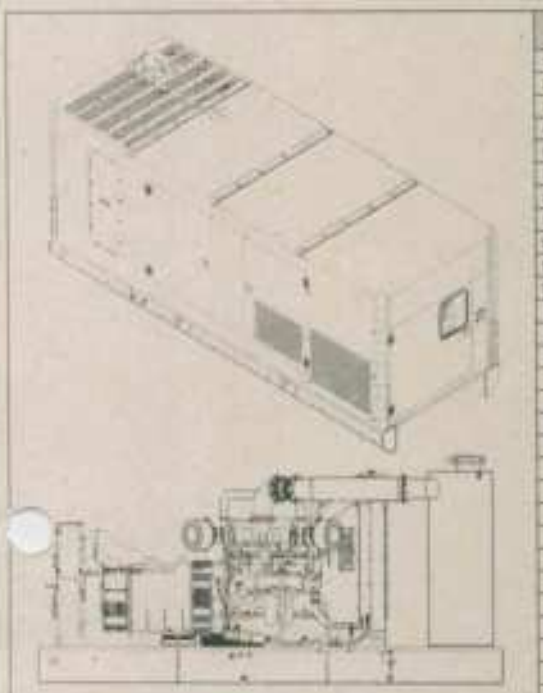

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Generador Caterpillar 1			✓	
2	Generador Caterpillar 2			✓	
3	Generador Caterpillar 3			✓	
4	Generador Modasa	✓			
5	Estado Gabinete UPS BORRI	✓			
7	Gabinete Transformador dpd	✓			
8	Gabinete Baterias 1 dpd		✓		
9	Gabinete Baterias 2 dpd		✓		
10	Tableros Transferencia 1	✓			
12	Tableros Transferencia 2			✓	
13	Tableros Transferencia 3			✓	

Observaciones Generales:

* Se evidencia ausencia Prensa estopa en alimentacion Precalentador.
* Se identifica Parte frontal con rayadura.
* Se identifica humedad de aceite por los empaques del carter.
* Se identifica caja (Guarda proteccion cableado electrico) Sucia.
* Se identifica boton interior de inicio (Pegado) en UPS.
* al comprobar el funcionamiento de la UPS, se identifico que no hay respaldo de las baterias.

Información de los participantes


Nombre:	Número de identificación:	Entidad	Firma
Andres Hernandez.	1023932443.	TRANSMILENIO SA	
Edwin Jaques Ort.	1095804481	CABLEMOVIL	
Miguel A. Bonilla.	1030631170	ODT	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002588

Fecha: 11 Mayo 2026
Numero Torre: Pilona 1

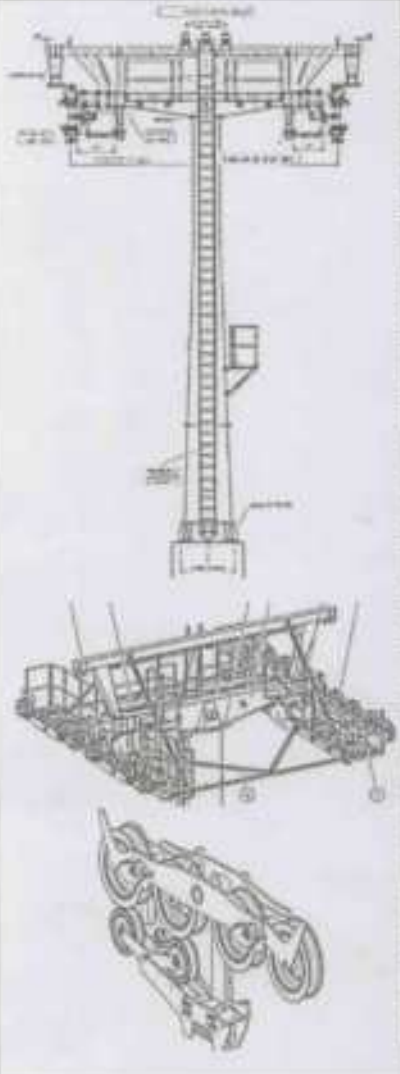

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteta			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Rostro		✓		
5	Travesaños	✓			
6	Letreros de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras	✓			
11	Pasarelas		✓		
12	Plataformas de Mantenimiento		✓		
13	Plataformas de Descanso			✓	
14	Poleas 420C	✓			
15	Poleas 501C			✓	
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines	✓			
20	Racopcatdas	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas		✓		
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs		✓		
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida	✓			
29	Polea Paranayus ascendente	✓			
30	Polea Paranayus descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar			✓	
32	Estado Caja LOOP21			✓	
33	Caja de conexiones electricas Sup.		✓		
34	Caja de conexiones electricas Inf.		✓		
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos			✓	
39	Puerta Escalera y antivandalico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones literales: 4 Tornillo de ajuste superior salida descendente no pertenece
6. Señaletica mensula en mal estado
11. Fisura en pasarela Pasillo 1, entrada descendente
12. Fisura en plataforma de mantenimiento lado anclaje entrada descendente
17. Faltante arandela plastica conjunto de balanc entrada ascendente; eje principal entrada ascendente con oxidación.
18. Tornillo de ambas poleas pulpadano descendente no pertenece
22. Tornillo alineadores porta horquillas descendente en la linea
24. Conectores de RPD 1-2 y horquillas 1-2 en caja de distribución en mal estado
31. No es posible verificar su estado debido ya que no es posible abrirla
33. Falta tornillo en clavija
34. Cerraz de alineacion en mal estado
39. Abolladura en puerta superior en mal estado; Cierre de la puerta no es original Faltante tope inferior y superior en mal estado; Faltante de arandela en tornillo superior
38. Cierre de la caja en mal estado. cierre de apertura de tapa destapacable.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Fabian León	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Nicolas Bermudez Pinto	O.D.T	

4.2 Juego de herramientas nº ID 11511746

Adecuado para conjuntos de polea: sujetadoras 420C
Carga útil: 1x -43 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 2 poleas 64 kN, carga útil	2	11016644
Conectador para levantar el cable con bulones para 2R-4R	1	11043157
Estrobo, diámetro 20,0 mm; longitud 3,0 m	1	11109849
Estrobo, diámetro 20,0 mm; longitud 1,0 m	1	11109847
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Eslabón de suspensión AW22, carga útil 7,6 toneladas	1	11003592
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Eslabón de suspensión AW13, carga útil 2,3 toneladas	1	11003591
Grillete 3/4", carga útil 4,75 t	2	11434961
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	20m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 24 mm, longitud 100 mm	1	10532316
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M20	1x10	10542044
Polea 420C LW 93 DIÁM 455, DI-Láminas	1	10870719
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

es mal ha

Falta un

1

Estrobo de 1 metro falta y tiene una de 2 metros de 10x

Palanca tirfor

Bolso Herramientas Pilonas 7

N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565 C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA/002688

Fecha: 13 Mayo 2026

Número Torre: Pilona 2



	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mergavelota			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Letreros de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso			✓	
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Ocupacion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recogecables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas		✓		
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs		✓		
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas	✓			
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antivandalico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

5. Tornillería oxidada lado Valle
6. Se identifica ausencia de señalética en Mensula
10. Iluminación lampara led y led apagado
17. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en conjunto de bulonerias
18. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en conjunto de balancines
22. Se identifica ausencia de tornillo alineador superior en ambos sentidos
24. Conector de caja RPD 4-3 en mal estado
28. Puntos de oxidación en linea de vida tramo 1 y 2
37. Tapa interna de la puerta en mal estado.

Información de los participantes


Nombre:	Entidad:	Firma:
Andres Hernández Martinez	TRANSMILENIO SA	
Elkin Soto C.	CABLEMOVIL S.A.S	Elkin Soto
Juan David Cardenas Arciniegas	O.D.T	

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002888

Fecha: 12 Mayo 2020
Número Torre: 3

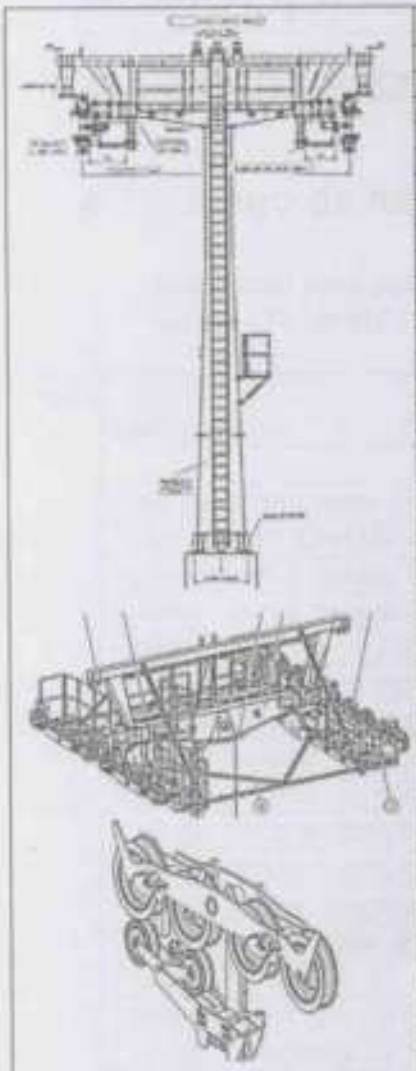

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Manguetota			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Letreros de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento		✓		
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 42DC			✓	
15	Poleas 80YC	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Rascantes Balancines			✓	
20	Recogecables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RFD (4)	✓			
24	Funcionamiento RFDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.		✓		
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Soler			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antivandalico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

5. Tornillería con oxidación en ambos sentidos
6. Se identifica ausencia de señaliticas en medio de la manada
10. Iluminación lampara led 1 led apagado
12. Plataforma de mantenimiento lado montaña sentido ascendente pendiente
17. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en conjunto de balancines
18. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en conjunto de balancines
26. - 27. Caja de alimentación y datos 1 - 2 tornilleria no corresponde
28. Punto de oxidación en linea de vida tramo 2
33. No es posible realizar verificación interna mal estado de la tornilleria (Tornillos pegados?
35. Una de las chapas averiadas
39. Tope inferior de puerta en mal estado - Abolladura en la misma

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Andrés Hernández Martínez	TRANSMILENIO SA	
Erwin Jesus Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Juan David Cadena P.	O.D.T	

Bolso Herramientas Pilonas 3.

Nº	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1	✓
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1	✓
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1	✓
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1	✓
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1	✓
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1	✓
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1	✓
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1	✓
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1	✓
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1	✓
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1	✓
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1	✓
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1	✓
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1	✓
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1	✓
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1	✓
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1	✓
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1	✓
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1	✓
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1	✓
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1	✓
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1	✓
23	10158139	NT. CUTTER	1500 (ANCHO) 30540 CORT.	1	✓
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1	✓
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1	✓
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2	✓
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20	X
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1	X

* Horquilla de seguridad 14, Faltantes 6.
* Falta cinta textil.

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: *10 MGD Ciudad Bolívar AA0003699*

Fecha: 12 Mayo 2026

Número Torre: 14

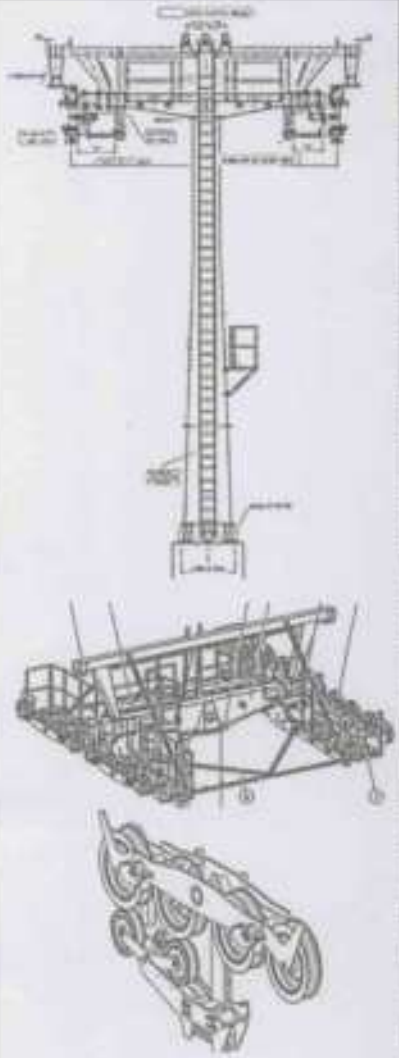

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Aranazamiento			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Letrero de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Polea 420C			✓	
15	Polea 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recojevables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RFD (4)	✓			
24	Fucionamiento RFDs	✓			
25	Brazo carrete	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente				
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multiple	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antivandalico		✓		
40	Tornillos pasarelas		✓		
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 6. Se identifica ausencia señalitica en manzana
10. Reflecta de escalones con 2 led fundidos
17-18. Se identifica ausencia de arandelas en ejes principales conjunto de balancines.
26. Camara # 1 con cinta suelta en su domo.
26-27. Caja de alimentacion de datos 1 y 2 en mal estado, carcasas sueltas caja de camaras despegada.
28 Linea de vida con oxidacion
35. Chapa sin ojal caja de herramientas en mal estado
39 Falta tornillo de puerta antivandalica
40. Arandela Faltan marca de torque en tornileria.

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez.	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	Elkin Jaimes
Jose Chicome	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C, S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIAM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

(1) Cuyca de apriete seguridad de bloqueo del pasador con oxido y varios hilos revenidos

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002888

Fecha: 22 Mayo 2024

Número Torre: 5

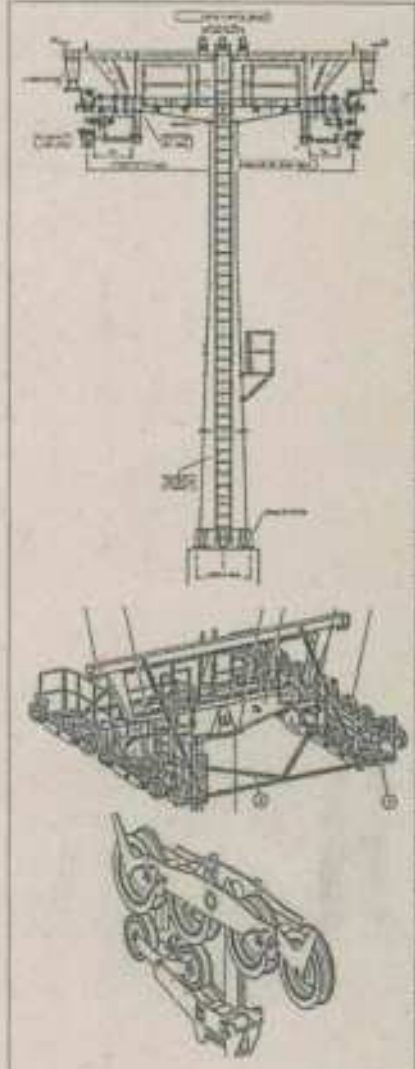

	Descripción	Cumple	No Cumple	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Cabalete levantacable	✓			
4	Nicetes	✓			
5	Trenzadera	✓			
6	Latticina de antes		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Polea 400C			✓	
15	Polea 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente	✓			
18	Balancin Descendente	✓			
19	Resortes Balancines			✓	
20	Rodamientos	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, pinta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1	✓			
27	Camara 2	✓			
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multijoy	✓			
32	Estado Caja LOOP21		✓		
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas	✓			
36	Proteccion Sotar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico	✓			
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 6. Semillas en mensula mal estado
28. Linea de vida con oxidacion
10. Iluminacion lampara led. 1 led en mal estado
22. Tornilleria caja loop 21 en mal estado

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	Firma
ANDRES ALCARAZON	TRANSMILENIO SA	
EDEN ZAG GIL	CABLEMOVIL S.A.S	
LUIS RODRIGUEZ MARQUEZ	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C, S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

Bolso Herramientas Pilonas 5				
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

falta mariposa

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002888

Fecha: 13 Mayo 2025

Numero Torre: 6



	Descripción	Conforme	No Conforme	No aplica	Observaciones
1	Mangueteta			✓	
2	Anemometro	✓			
3	Caballete levantacable	✓			
4	Roseta	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Latrerca de avisa		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnición Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recogecables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RFD (4)	✓			
24	Funcionamiento RFDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida	✓			
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21		✓		
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antirrebotes		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 5 Se identifico tornilleria con oxidacion
6. Se identifico manguito no tiene
10. Iluminacion lampara led 1 led apagado
17-18 Se identifico ausencia de arandela plastica eje principales conjunto de balancines
20-21 Caja de alimentacion y cables 1 y 2 en mal estado
32 Tornilleria no corresponde
35 Chapa de caja de herramientas en mal estado
39 Tope de goma inferior en mal estado.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Fabian Lasso	TRANSMILENIO SA	
Elkin James Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	Elkin James O.
Jose Cocom	O.D.Y	

	Bolso Herramientas Pilonas 6			
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

Falta mariposas

Felipe Duque

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002588

Fecha: 13 Mayo 2026

Numero Torre: 9

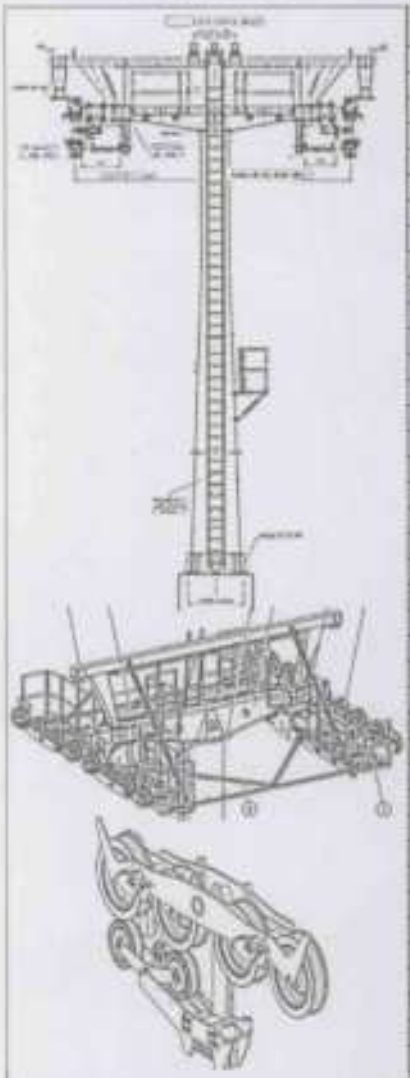

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Cabalete seccionable	✓			
4	Roseta	✓			
5	Tranquilos	✓			
6	Lamina de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasamanos	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Rerpecutores	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1	✓			
27	Camara 2	✓			
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP31	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas	✓			
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antivandalicos		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

6. Señaletica Mensula no tiene
10. Iluminaria solo prende 1 Led.
13. Se identifica ausencia cremallera plastica ejes principales conjunto de balancines
18. Se identifica ausencia cremallera plastica ejes principales conjunto de balancines
28. Linea de vida presenta oxidacion
39 Puerta con abolladuras.

Información de los participantes

Nombre:	Entidad:	Firma
Jefferson Cardenas N	TRANSMILENIO SA	
Eric Jaime Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Carlos Felipe Duque Arevalo	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN


Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA000E69

Fecha: 13 Mayo 2026
Numero Torre: 8

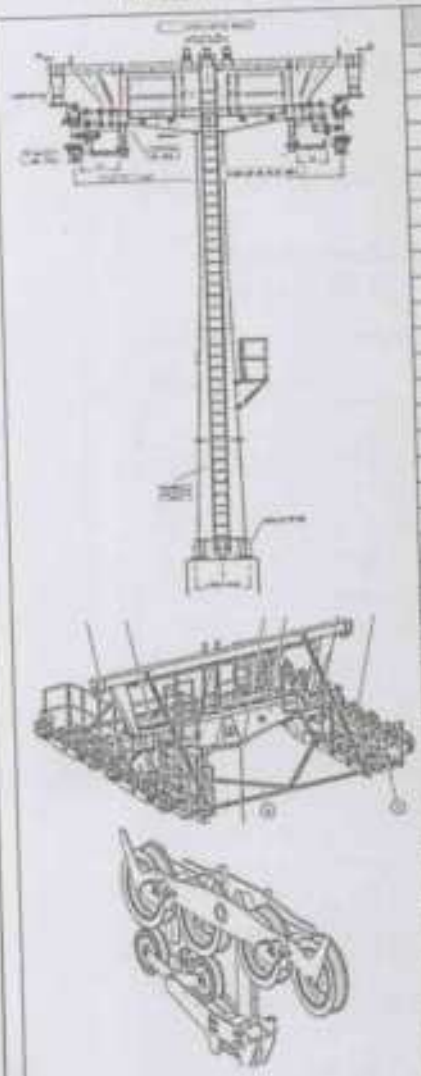

	Descripción	Contratista	No Contratista	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteta			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Latrerna de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje				
10	Escaleras	✓			
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C	✓		-	
15	Poleas 501C	-		✓	
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente	✓	✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recojecables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RFID (4)	✓			
24	Funcionamiento RFIDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente		✓		
30	Polea Pararayos descendente		✓		
31	Estado Caja Multiple	✓			
32	Estado Caja LOOP21		✓		
33	Caja de conexiones electricas Sup	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Abrazadera	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antiestatico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones literales: 16. Señaletica de mangueta no tiene
17. Faltante arandelas plasticas en ejes principales conjunto de balancines
18. Faltante arandelas plasticas en ejes principales conjunto de balancines
20-21 Caja de alimentación y datos 1 y 2 en mal estado
28 Inicio de linea de vida presenta oxidación, pese a estar cubierta con yee
29-30 Se identifica desgaste en canal
32. Tornilleria no corresponde
35. Chapa de caja de herramientas en mal estado
39 Tope de goma inferior y superior en mal estado

Información de los participantes

Nombre	Entidad
Fabián León	TRANSMILENIO SA
Elkin Soler Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S
Juan David Cueda	O.D.T

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 19 PDD Ciudad Bolívar AA0002688

Fecha: 13 Mayo 2026

Numero Torre: 9

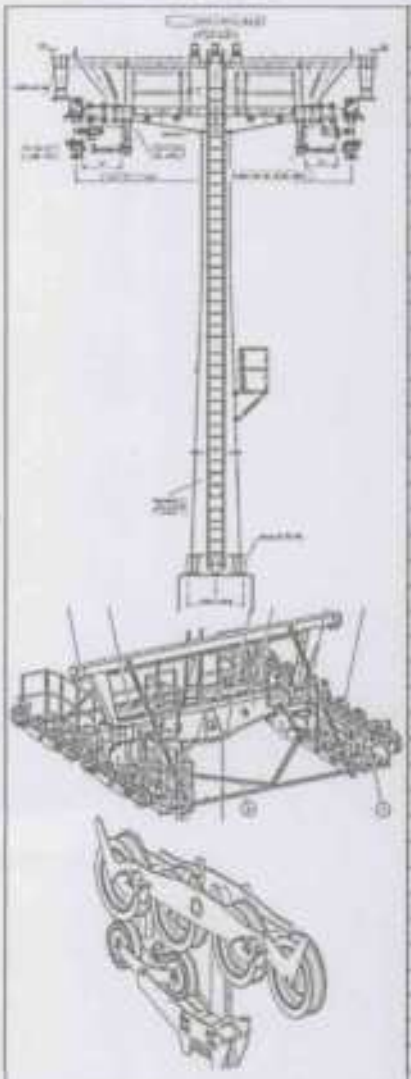

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete tensionable	✓			
4	Rieles	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Latperos de anlaje		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tuerfios Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras	✓			
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente	✓			
18	Balancin Descendente	✓			
19	Resortes Balancines	✓			
20	Recuperadores	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1	✓			
27	Camara 2	✓			
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente				
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf	✓			
35	Estado Caja de herramientas	✓			
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificación Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico	✓			
40	Tornillos pasarelas		✓		
41	Tornillos plataformas		✓		

Observaciones Generales:

6. Señalitico mensula en mal estado
28. Linea de vida con oxidación
90 - 91. Falta marcación de torque

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas N	TRANSMILENIO SA	
Edwin Javier Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Carlos Felipe Duque Arevalo	O.D.T	

4.3 Juego de herramientas nº ID 11511747

Adecuado para conjuntos de polea: soporte-compresión 420C
Carga útil: 1x +64 kN / -27 kN


Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 2 poleas 64 kN, carga útil	2	11016644
Aparejo con 2 poleas 64 kN, carga útil	1	11016671
Conectador para levantar el cable con bulones para 2R-4R	1	11043157
Levantapoleas para 4P/4S 420C-VERST	4	10759981
Estrobo, diámetro 16,0 mm; longitud 23,0 m	1	11511766
Estrobo, diámetro 16,0 mm; longitud 1,0 m	2	11163832
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Eslabón de suspensión AW16, carga útil 3,5 toneladas	3	11163843
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Eslabón de suspensión AW13, carga útil 2,3 toneladas	1	11003591
Grillete 5/8", carga útil 3,25 t	4	11434960
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	30m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 420C	1	10535102
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 24 mm, longitud 100 mm	1	10532316
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M20	1	10542044
Polea 420C LW 93 DIAM 455, DI-Láminas	1	10870719
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

Bolso Herramientas Pilonas 9				
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002688
Fecha: 15 Mayo 2026
Numero Torre: 10

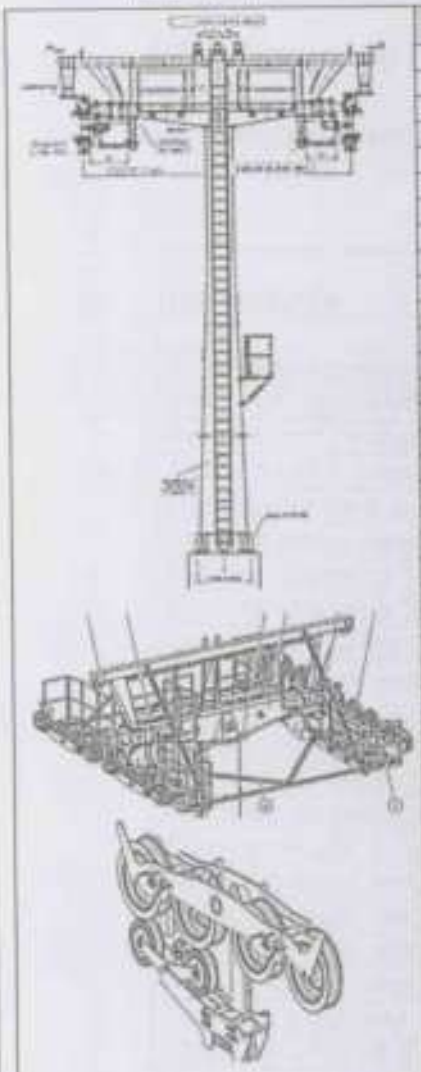

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Rosetra	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Latrarros de extro		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C.	✓			
15	Poleas 501C			✓	
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente	✓			
18	Balancin Descendente	✓			
19	Resortes Balancines	✓			
20	Retrojecutores	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida	✓			
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21		✓		
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas	✓			
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion		✓		
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico	✓			
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

6. Señaliticas en mensula en mal estado.
10. Iluminación lampara led. 2 led apagado
26. Se identifico corroza de alimentación y datos cristalizada y rota
27. Se identifico corroza de alimentación y datos cristalizada y rota
32. Tornilleria tapa de caja en mal estado.
39. Se detecto cable desalineado balanza ascendente

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
ALEX TOLLES	TRANSMILENIO SA	ALEX TOLLES
Edwin Jairo Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	Edwin Jairo
Harold Bocanegra	O.D.T	

Bolso Herramientas Pilonas 10				
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	————	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G007565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	————	1


Pilon 3

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002688

Fecha: 13 Mayo 2026
Numero Torre: 11

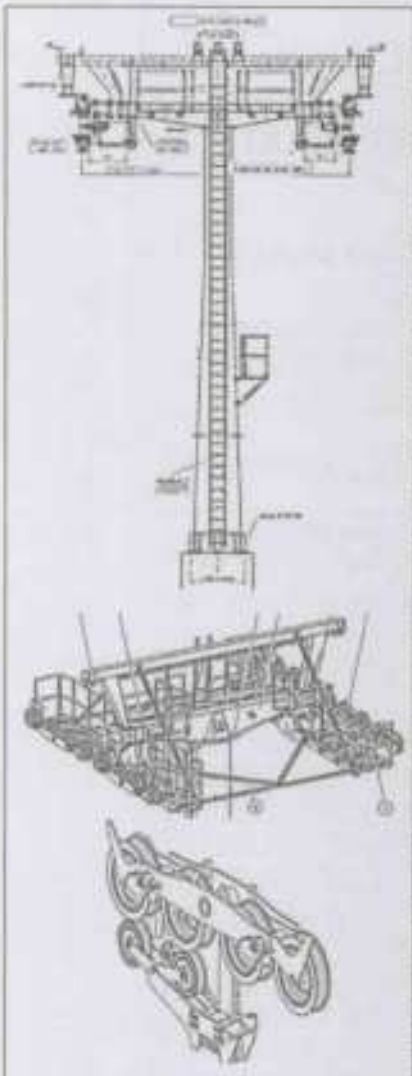

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Manganeseta	✓			
2	Amortiguador			✓	
3	Caballete levantamiento	✓			
4	Roseta	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Letreros de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente	✓			
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recojacables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21		✓		
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar	✓			
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 6 Señalitica en mensula no tiene
10. Iluminación lamparas led. 2 leds encendidos.
11 Se identifica ausencia de arandela plastica balancin entrada ascendente
28 Puntos de oxidación en linea de vida
32 Tornilleria tapa de la caja en mal estado
35. Chapa de caja de herramienta en mal estado
39. Tope de goma inferior de puerta en mal estado.

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	Firma
ALEX TORRES	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
Edwin Jours Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	Edwin Jours
Harold Baron Hernandez	G.D.T	Harold Baron

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002858

Fecha: 15 Mayo 2026

Numero Torre: 12

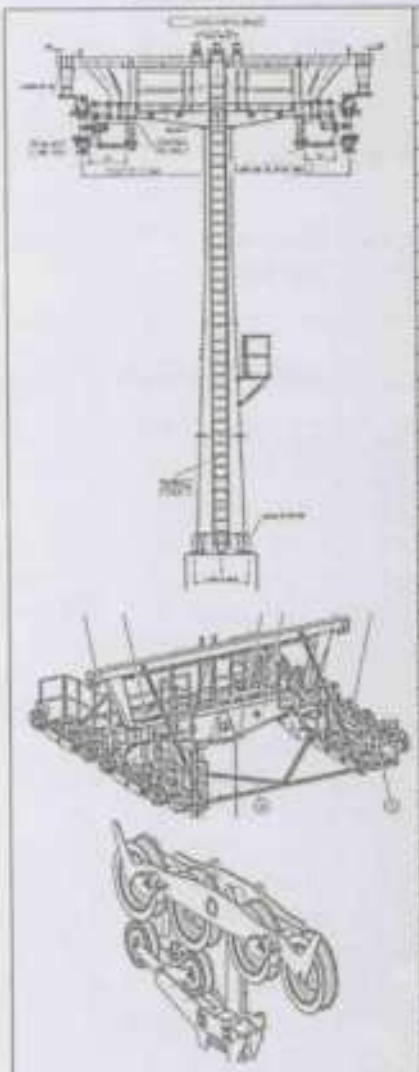

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteta			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Ricotra	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Latreros de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C.			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Reorjecables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Parayos ascendente	✓			
30	Polea Parayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar		✓		
32	Estado Caja LOOP21			✓	
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar	✓			
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antiventalillo	✓			
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

6. Señaletica en mensula no tiene
10. Iluminación Lampara led. 2 leds apagados
17. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en ejes principales conjunto de balancin
18. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en ejes principales conjunto de balancin
28. Puntos de oxidación en linea de vida
31. Se identifica ausencia de 1 tornillo
35. Chapa de cierre de caja de herramientas en mal estado.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
ALEX TORRES	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
Edwin Jaimes ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	Edwin Jaimes
Harold Daza Hernandez	O.D.T	

Bolso Herramientas Pilonas 12				
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

Falta 1

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002689

Fecha: 11 Mayo 2026

Numero Torre: 13

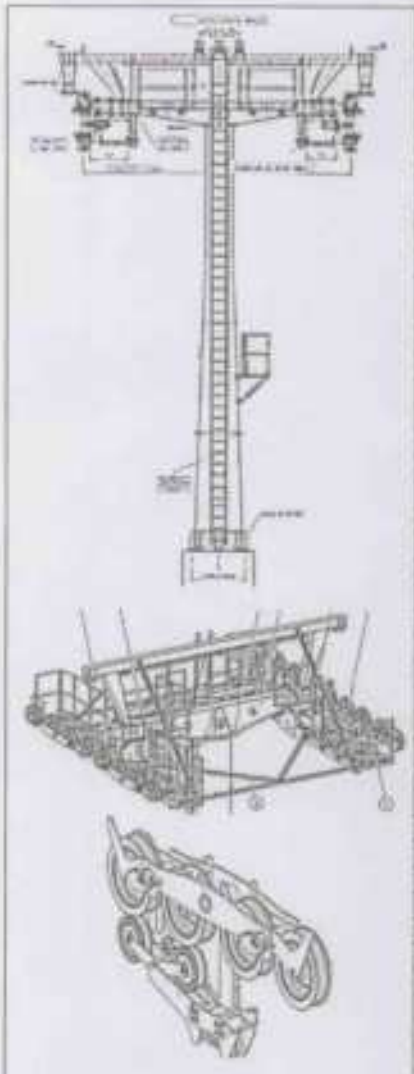

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Riostra		✓		
5	Travesaños	✓			
6	Latarca de avion		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas		✓		
12	Plataformas de Mantenimiento		✓		
13	Plataformas de Descanso			✓	
14	Polaas 420C		✓		
15	Polaas 501C			✓	
16	Guarnicion Polaas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente	✓			
19	Resortes Balancines	✓			
20	Resortecables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas		✓		
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs		✓		
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente		✓		
30	Polea Pararayos descendente		✓		
31	Estado Caja Multipar			✓	
32	Estado Caja LOOP21			✓	
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.		✓		
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar		✓		
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antiandalico			✓	
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 4 Tornillo inferior cuatro entrada ascendente y cuatro salida descendente con oxidación.
6. Señaliticas mensula en mal estado.
10. Lampara de iluminación de escalera en mal estado.
11. Pasarela 1 entrada descendente con refuerzo soldado y oxidación en soporte. Pasarela 3 entrada descendente con oxidación en soporte.
12. Fisura en plataforma de mantenimiento lado valle entrada ascendente.
14. Polea 1 entrada ascendente para cambio (Rodamiento en mal estado)
17. Amortiguadores sueltos.
22. Porta horquilla polea pararrayos ascendente con prensa soporte estopa suelta.
29. Conector de RPD en caja de distribución 1-3 en mal estado.
28. Puntos de fijación con presencia de oxidación.
Puntos de guia superior con oxidación.
29. Polea desentrada. 30. Polea desentrada.
34. Presento breakers apagados y faltante corazo en corazo en cable de alimentación.
35. Cierre de caja en mal estado. 36. Presento oxidacion en la parte superior.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Fabián Leon	TRANSMILENIO SA	
Edwin Soler, Otro	CABLEMOVIL S.A.S	
Victor Bermudez Rojas	O.D.T	

4.4 Juego de herramientas nº ID 11511748

Adecuado para conjuntos de polea: sujetadoras 420C
Carga útil: 1x -43 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11016872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 2 poleas 64 kN, carga útil	2	11016644
Conectador para levantar el cable con bulones para 2R-4R	1	11043157
Estrobo, diámetro 20,0 mm; longitud 10,0 m	1	11511764
Estrobo, diámetro 20,0 mm; longitud 1,0 m	1	11109847
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Eslabón de suspensión AW22, carga útil 7,6 toneladas	1	11003592
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Eslabón de suspensión AW13, carga útil 2,3 toneladas	1	11003591
Grillete 3/4", carga útil 4,75 t	2	11434961
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	20m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C, S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 24 mm, longitud 100 mm	1	10532316
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M20	10	10542044
Polea 420C LW 93 DIÁM 455, DI-Láminas	1	10870719
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

Bolso Herramientas Pilonas 13

N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

NO

Boca Abierta

NO

SI

Boca Fija.

NO

Pendiente


16

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002689

Fecha: 15 - Mayo 2026
Numero Torre: 19

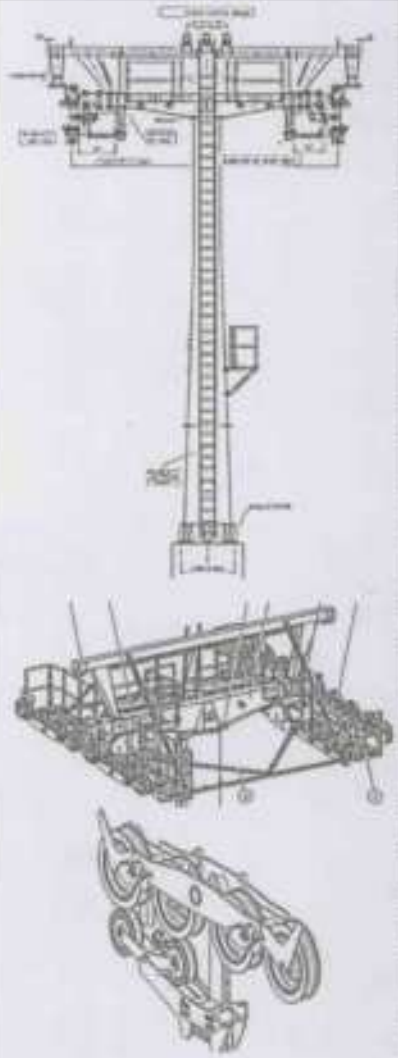

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteta			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Cabadete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Letrero de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasantes	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Reactes Balancines			✓	
20	Removibles	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1	✓			
27	Camara 2	✓			
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multigw	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas	✓			
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y enbrandalico		✓		
40	Tornillos pasantes		✓		
41	Tornillos plataformas		✓		

Observaciones Generales: 5. Tornillera con oxidación.
6. Señalitica en mensula no tiene.
10. Se identifica ausencia lampara led.
17. Se identifica de arandela plastica en ejes principales conjunto de balancines.
18. Se identifica de arandela plastica en ejes principales conjunto de balancines.
28. Se identifica puntos de oxidacion
39. Se identifica abolladuras puerta parte superior.
40. Puntos de oxidación y tornilleria sin marcar torque
41. Puntos de oxidación y tornilleria sin marcar torque.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Jefferson Cardenas	TRANSMILENIO SA	
Edgar Jaimes Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Sandra Andres Gomez	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

Bolso Herramientas Pilonas 14					
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1	✓
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1	✓
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1	✓
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1	✓
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1	✓
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1	✓
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1	✓
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1	✓
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1	✓
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1	✓
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1	✓
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1	✓
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1	✓
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1	✓
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1	✓
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1	✓
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1	✓
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1	✓
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1	✓
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1	✓
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1	✓
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1	✓
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30S40 CORT.	1	✓
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1	✓
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1	✓
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2	✓
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20	Falta 1
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1	✓

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002688

Fecha: 22 Mayo 2026

Numero Torre: T3

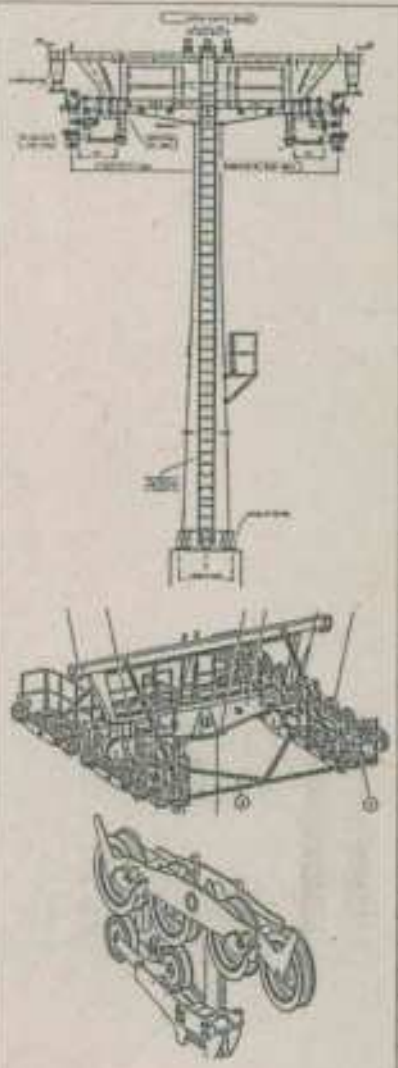

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangavelocidad			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Cabalete levantacable	✓			
4	Roseta	✓			
5	Tranvesaños		✓		
6	Letreros de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras	✓			
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C.			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recipcatolas		✓		
21	Bulonas de suspension	✓			
22	Horquillas porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polos Pararayos ascendente	✓			
30	Polos Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion		✓		
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico	✓			
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 5. Tornilleria con oxidación
6. Señaliticas en mensula no tiene
12-15. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en ejes principales conjunto balancines
20. Se identifica zonas de oxidacion en recipcatable balancin ascendente
26. Caja de conexion y datos en mal estado
28. Linea de vida con puntos de oxidacion
35. Chapa de cierre caja de herramientas 1 en mal estado
37. Se identifica balancin ascendente y descendente desalineado.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Andrés Herrador Martinez	TRANSMILENIO SA	
Ellen Jaimes Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	Ellen Jaimes
N/A y TERCERO.	O.D.T	N/A

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

1. Chapa de cierre caja de herramientas en mal estado.
8. 1 eslinga de longitud 1.0m en mal estado, no hay.

Bolso Herramientas Pilonas 15				
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565.A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1


22. No hay destornillador.
27. Faltante de 1 horquilla de seguridad. (19/20).

TransMiCable

FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación
Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0003688

Fecha: 16 Mayo 2026
Numero Torre: 10

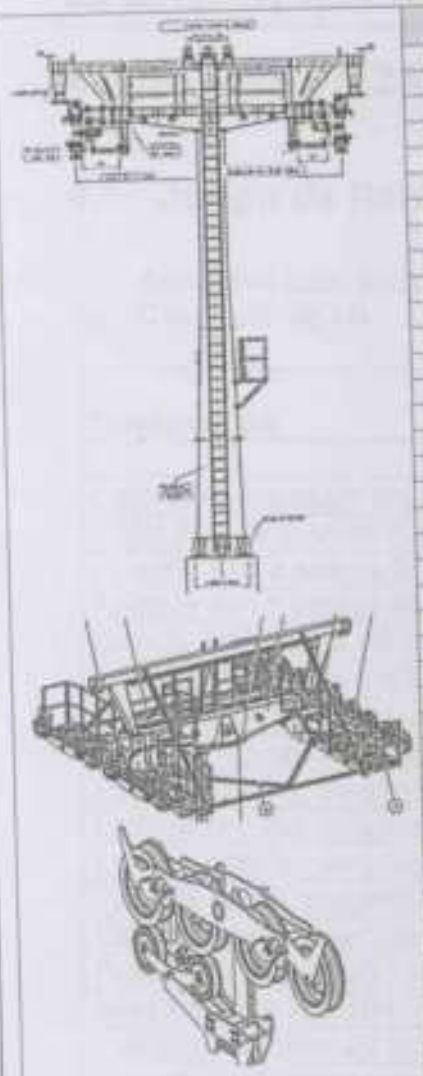

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Manguerotes			✓	
2	Anemometro	✓			
3	Cabalete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Latrarra de exito		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Polaas 420G.			✓	
15	Polaas 507C	✓			
16	Guarnicion Polaas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente	✓			
19	Rasortas Balancines			✓	
20	Rociadadores	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (8)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas	✓			
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Abrasion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalica	✓			
40	Tornillos pasantes	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:
5. Tornillería con oxidación
6. Señalética en ménsula no tiene
10. Se identifica ausencia lamparas led.
17. Se identifica ausencia de arandelas plasticas ejes principales en conjunto balancines
26. Caja de alimentación y datos camara 1 en mal estado.
27. Caja de alimentación y datos camara 2 en mal estado
28. Puntos de oxidación.

Información de los participantes	Entidad	Firma
Nombre:		
Eduardo Gomez	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
José Urcome	O.D.T	

Bolso Herramientas Pilonas 16					
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1	✓
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1	✓
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1	Falta llave
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1	✓
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1	✓
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1	✓
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1	✓
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1	✓
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1	✓
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1	✓
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1	✓
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1	✓
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1	✓
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1	✓
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1	✓
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1	✓
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1	✓
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1	✓
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1	✓
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1	✓
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1	✓
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1	✓
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1	✓
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1	✓
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1	✓
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2	✓
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20	✓
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1	✓

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 84GD Ciudad Bolivar AA0002688

Fecha: 16 Mayo 2026

Numero Torre: 13

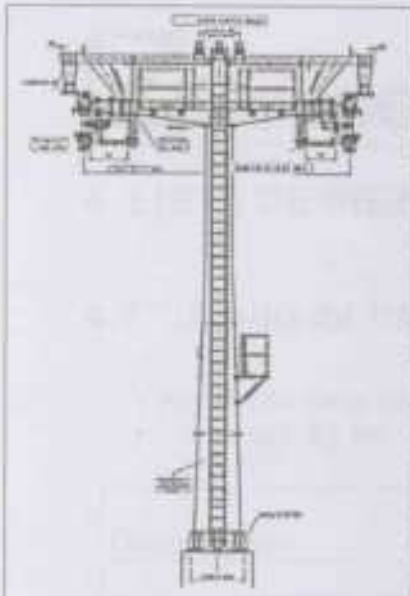





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Aramamento			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Latiguera de avion		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recipirables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs		✓		
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar		✓		
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar	✓			
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico	✓			
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 5. Tornilleria en oxidación.
6. Señaletica en mensula no tiene
10. Iluminación lampara led. 1 led apagado
17. Se identifico ausencia de arandela plastica en ejes principales conjunto de balancines
18. Se identifico ausencia de arandela plastica en ejes principales conjunto de balancines
29. Se identifico conectes en caja de distribucion RPD 1 y 2 partido.
28. Se identifico puntos de oxidación.
31. Se identifica ausencia de un tornillo
33. Chapa de herramientas en mal estado

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	TRANSMILENIO SA	
Elkin James ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Jose Linares	O.D.T	

Bolso Herramientas Pilonas 17

N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1	✓
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1	✓
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1	✓
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1	✓
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1	✓
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1	✓
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1	✓
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1	✓
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1	✓
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1	✓
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1	✓
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1	✓
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1	✓
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1	✓
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1	✓
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1	✓
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1	✓
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1	✓
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1	✓
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1	✓
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1	✓
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1	✓
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30S40 CORT.	1	✓
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1	✓
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1	✓
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2	1 interruptor sin mariposa
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20	Falta horquillas.
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1	✓

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la Instalación

Nombre del sistema: III MSD Ciudad Bolívar AA6000888

Fecha: 11 - 05 - 2026

Numero Torre: 18

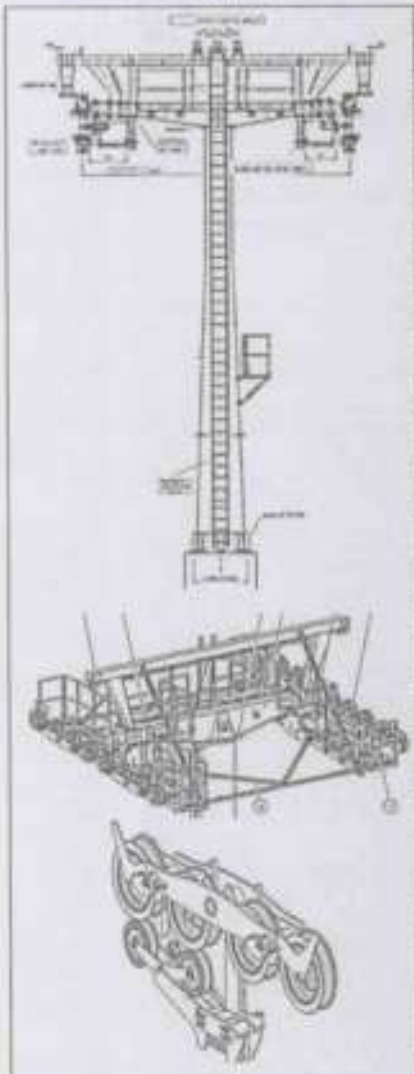

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueleta			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacables	✓			
4	Roseta	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Letrero de aviso		✓		
7	Fusiles	✓			
8	Tornillos Fusiles	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso			✓	
14	Poleas 420C.	✓			
15	Poleas 501C			✓	
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines	✓			
20	Recojecables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar		✓		
32	Estado Caja LOOP21			✓	
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar	✓			
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antivandalos	✓			
40	Tornillos pasarelas		✓		
41	Tornillos plataformas		✓		

Observaciones Generales: 6. Señalitica en mensula no tiene

10. Se identifica lampara led encendida - directa

17-18 Se identica ausencia arandelas plasticas ejes principales conjunto balancines

28. Linea de vida presenta oxidación

31. No es posible verifica su estado "tornillos pegados"

35. Chapa caja de herramienta en mal estado

40-41 Tornillería sin marca de torque

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	Firma
ALEX FABIAN TORRES	TRANSMILENIO SA	ALEX TORRES
Edwin Jaime Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	Edwin Jaime
Miguel Bravo	O.D.T	

	Bolso Herramientas Pilonas 18				
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1 ✓	
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1 ✓	
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1 ✓	
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1 ✓	
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1 ✓	
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1 ✓	
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1 X	FALTA
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1 ✓	
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1 ✓	
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1 ✓	
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1 ✓	
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1 X	FALTA
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1 ✓	
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1 ✓	
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1 ✓	
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1 X	FALTA
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1 ✓	
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1 ✓	
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1 ✓	
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1 X	
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1 ✓	
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1 ✓	
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1 ✓	
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1 ✓	
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1 ✓	
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2 ✓	
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A	20	19 FALTAN 2
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1 ✓	

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Sobre de la instalación

Nombre del sistema: I2 MSD Ciudad Bolívar AA0002688

Fecha: 16 Mayo 2026

Numero Torre: 19

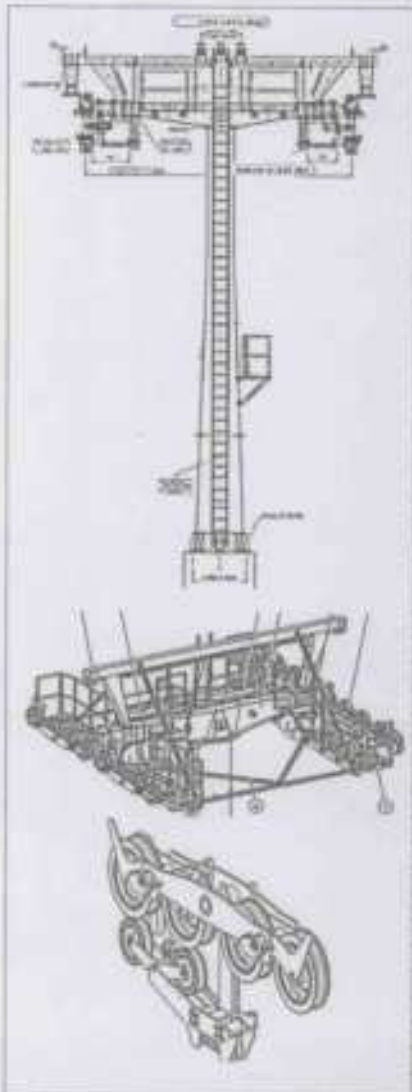

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueviento			✓	
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Listrones de avion		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras	✓			
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso			✓	
14	Poleas 420C.	✓			
15	Poleas 501C			✓	
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines	✓			
20	Rasgacables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida	✓			
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas inf.		✓		
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 6. Señalitica mensula no tiene

17. Se identifico ausencia de arandela plastica ejes principales conjunto de balancines

18. Se identifico ausencia de arandela plastica ejes principales conjunto de balancines

34. No se encuentra llave para realizar la verificación interna.

35. Chapa caja de herramientas en mal estado

39. Topes de goma inferior y superior en mal estado - pueden con atolladura.

Chapa de cierre en mal estado - cerraza enturnalatica cristalizada y rota.

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	Firma
Eduardo Gomez	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jaimes ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
JESE JACOME	O.D.T	

Estrobo, diámetro 16,0 mm; longitud 1,0 m	2	11109847	✓
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962	✓
Eslabón de suspensión AW22, carga útil 7,6 toneladas	1	11003592	✓

Bolso Herramientas Pilonas 79

N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1	✓
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOO	1	✓
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1	✓
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1	Falta llave
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1	✓
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1	✓
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1	✓
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1	✓
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1	✓
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1	✓
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1	✓
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1	✓
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1	✓
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1	✓
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1	✓
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1	✓
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1	✓
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1	✓
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1	✓
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1	✓
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1	✓
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1	✓
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1	✓
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1	✓
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1	✓
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2	✓
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20	Faltan 6 horquillas
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1	✓

Miguel

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002688

Fecha: 14 Mayo 2024

Número Torre: 28

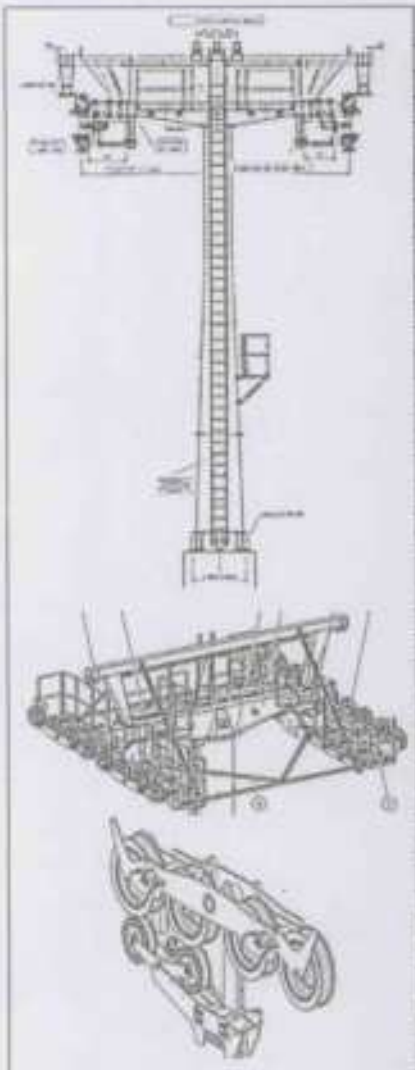

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Manguevuelta		✓		
2	Anemometro			✓	
3	Caballete levantacable	✓			
4	Roseta	✓			
5	Trasteadhos		✓		
6	Latreria de astro		✓		
7	Postes	✓			
8	Tornillos Postes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente	✓			
19	Resortes Balancines			✓	
20	Rerojacables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas		✓		
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar		✓		
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y antivandalico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

1. Se evidencia manguevuelta "Rota"
5. Se evidencia tornillería con oxidación
6. Señalética en mensula en linea
10. Iluminación tampara led - 1 led apagado
17. Se identifica ausencia de arandela planas en ejes principales conjunto balancines
22. Tornillos superiores base porta horquilla "no tiene" Ascendente y descendente"
26-28. Se identifica coraza acometida electrica y datos "Rota"
28 - Linea de vida presenta oxidación
31. Se identifica ausencia 2 tornillos en la tapa
35 - Chapa caja de herramientas en mal estado
39. Se identifica abolladura partes inferior, medial y Superior.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Eduardo Garcia 10192	TRANSMILENIO SA	
Elkin Sanz 20112	CABLEMOVIL S.A.S	
Miguel Cruz	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo	
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872	Cortada
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763	✓
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576	✓
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595	✓
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962	✓
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959	✓
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443	✓
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242	✓
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373	Falta 1 una dimensión
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335	✓
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106	✓
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346	✓
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696	✓
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909	✓
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100	✓
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343	✓
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077	✓
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308	✓
Bolso de material	1	20934500	✓
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088	✓

Bolso Herramientas Pilonas 20

N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8 5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

Faltan 20

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGO Ciudad Bolívar AA0002688

Fecha: 19 Mayo 2026

Numero Torre: 29

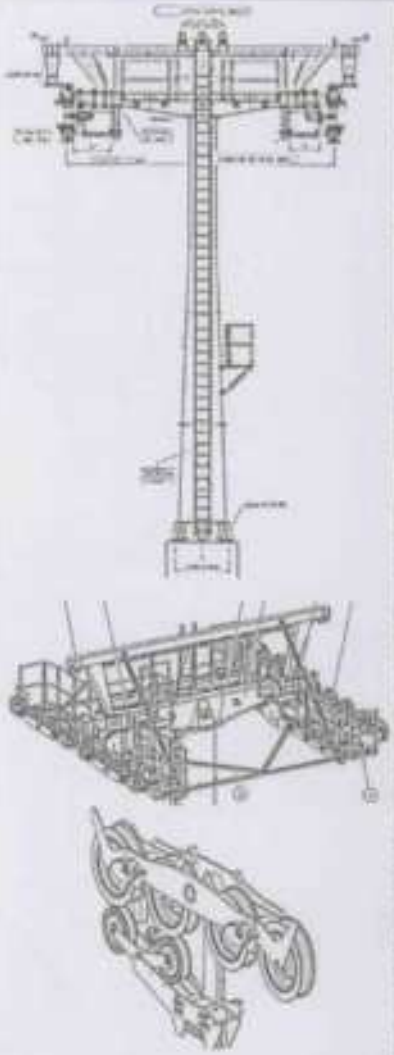

	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Manganeteta		-	✓	
2	Anemometro			✓	
3	Cabalieto Invertacable	✓			
4	Roseta	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Latheria de acero		✓		
7	Fusiles	✓			
8	Tornillos Fusiles	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pescantes	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 301C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Recogacables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas		✓		
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos				
39	Puerta Escalera y entrevalstico		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

5. Torniller con oxidación
6. Seguridad mecanica no tiene
10. Iluminacion lampara led - 3 led apagados
11-18 Se identifica ausencia manchon plastico en ejes principales conjunto balancines
22 Tornillos superior base porta horquillas. No tiene ascendente - descendente
26-27 Caja de alimentación y datos en mal estado. Candado en mal estado
28 Linea de vida con oxidación
35. Chapa caja de herramientas en mal estado
39. Se identifica ausencia de tornilleria en bisagra

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Eduardo Canal Lopez	TRANSMILENIO SA	
Elkin Jairo ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Miguel Grasi	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

Bolso Herramientas Pilonas 20

N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTRÉL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	————	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5,5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	————	1

Faltan 10

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES

Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 HGO Ciudad Bolivar 4/4/2026 88

Fecha: 14 Mayo 2026

Numero Torre: 22

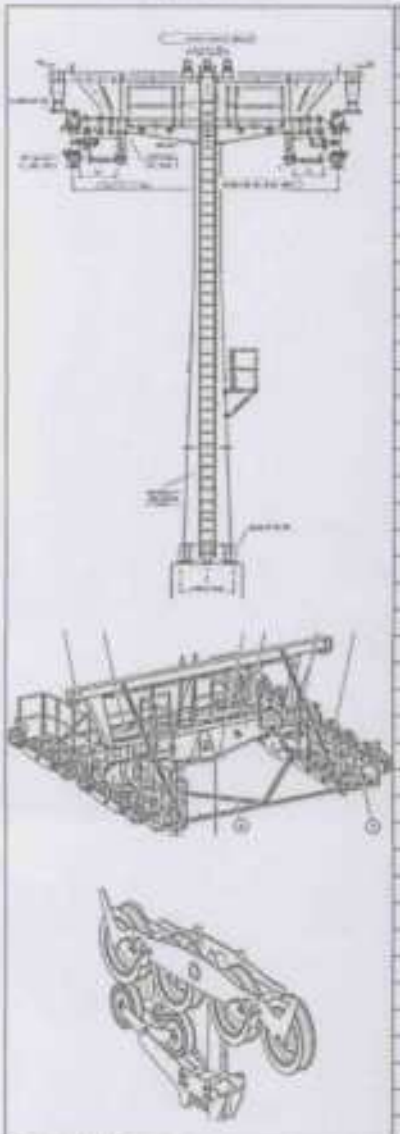

	Descripción	Contorno	No Contorno	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteria			✓	
2	Arriostrados			✓	
3	Cabalete levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños		✓		
6	Lateros de acero		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso	✓			
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guardacon Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente	✓			
18	Balancin Descendente	✓			
19	Resortes Balancines	✓			
20	Rodamientos			✓	
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, yoke horquillas	✓			
23	Balizas RFID (A)	✓			
24	Posicionamiento RFIDs	✓			
25	Bloco camaras	✓			
26	Camara 1	✓			
27	Camara 2	✓			
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar		✓		
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.	✓			
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Almacen	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y entramadillo		✓		
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales:

5. Se identifica tornillería con oxidación.
6. Señalética en ménsula no llega.
10. Iluminación tapapies led no funciona - Se identifica impacto
28. Puntos de oxidación en loca de viela
31. Se identifica ausencia de 1 tornilla en la tapa
35. Chapa caja de herramientas en mal estado
39. Se identificacon abolladuras.

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	Firma
Andrés Hernández	TRANSMILENIO SA	
Edwar Jaimes Ortiz	CABLEMOVIL S.A.S	
Jaider Gómez	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08.2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

Bolso Herramientas Pilonas 22				
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1 X
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2 X
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020127G002565 A.	20 X
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1

12- Falta llave 13 x 15 redonda
26. Falta 20 horquillas de seguridad
27. Falta 2 Mariposas de interruptor de horquilla.

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MSD Ciudad Bolívar AA0002888

Fecha: 21 Mayo 2026

Número Torre: 23

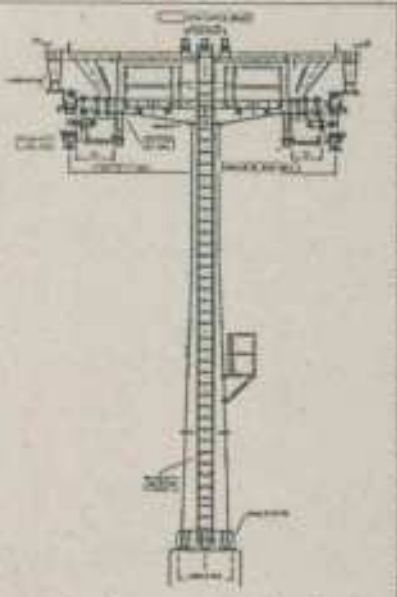





	Descripción	Conforme	No Conforme	NO aplica	Observaciones
1	Mangueretes			✓	
2	Anemometro		✓		
3	Cabrestante levantacable	✓			
4	Riostra	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Letreros de aviso	✓			
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso			✓	
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Resguardos	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras	✓			
26	Camara 1		✓		
27	Camara 2		✓		
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21		✓		
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.		✓		
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar			✓	
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalica	✓			
40	Tornillos pasarelas	✓			
41	Tornillos plataformas	✓			

Observaciones Generales: 2. Veleta (direccion de viento presenta desgaste en su sistema de Rotacion
10. Se identifica ausencia de lampara led
13. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en ejes principales conjunto de balancines
18. Se identifica ausencia de arandelas plasticas en ejes principales conjunto de balancines
26. Caja de conexión y datos en mal estado
27. Caja de conexion y datos en mal estado
28 Linea de vida con puntos de oxidación
32. Tornilleria no corresponde
34. No es posible realizar verificacion interna
35. Chapa de cierre de caja de herramientas en mal estado.

Información de los participantes

Nombre:	Entidad	
Jefferson Cardenas N.	TRANSMILENIO SA	
C.C. 1.136.885.873	CABLEMOVIL S.A.S	Elkin Jaimes
	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo	
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872	✓
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763	✓
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576	✓
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595	✓
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962	✓
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959	✓
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443	✓
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242	x
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373	✓
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335	FALTA 1
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106	✓
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346	✓
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696	INCOMPLETO
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909	✓
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100	✓
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343	✓
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077	✓
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308	✓
Bolso de material	1	20934500	✓
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088	✓

- HACE FALTA LAS 2 ESLINGAS CIECULAR, LONGITUD 1,0
- HACE FALTA 1 ESLINGA CIECULAR, LONGITUD 4,0.
- CABLE DE POLIAMIDA INCOMPLETO EN SU METRAJE

	Bolso Herramientas Pilonas 3			
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1 ✓
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1 ✓
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1 ✓
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1 ✓
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1 ✓
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1 ✓
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1 ✓
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1 ✓
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1 ✓
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1 ✓
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1 ✓
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1 ✓
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1 ✓
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1 ✓
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1 ✓
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1 ✓
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1 ✓
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1 ✓
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1 ✓
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1 ✓
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1 ✓
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1 ✓
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1 ✓
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1 ✓
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1 ✓
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2 ✓
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20 Faltan 5
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1 ✓

Guy
Derecho

TransMiCable


FORMATO DE RECEPCION/ENTREGA TORRES


Datos de la instalación

Nombre del sistema: 10 MGD Ciudad Bolívar AA0002688

Fecha: 21 Mayo 2024

Numero Torre: 24

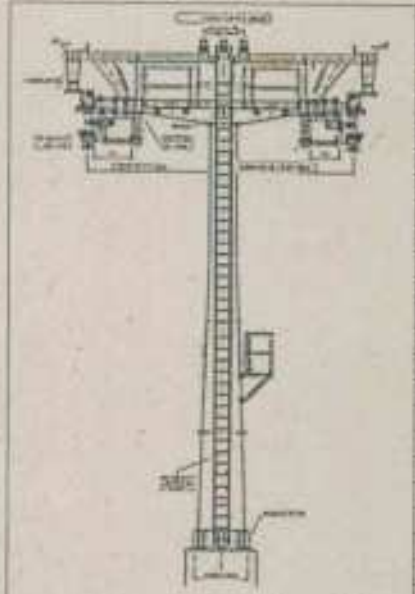





	Descripción	Condiciones	No Conformes	NO aplica	Observaciones
1	Mangueteta	✓			
2	Anemometro			✓	
3	Cabalete levantacable	✓			
4	Roseta	✓			
5	Travesaños	✓			
6	Letrero de aviso		✓		
7	Fustes	✓			
8	Tornillos Fustes	✓			
9	Bulones de Anclaje	✓			
10	Escaleras		✓		
11	Pasarelas	✓			
12	Plataformas de Mantenimiento	✓			
13	Plataformas de Descanso			✓	
14	Poleas 420C			✓	
15	Poleas 501C	✓			
16	Guarnicion Poleas	✓			
17	Balancin Ascendente		✓		
18	Balancin Descendente		✓		
19	Resortes Balancines			✓	
20	Reciprocables	✓			
21	Bulones de suspension	✓			
22	Horquillas, porta horquillas	✓			
23	Sensores RPD (4)	✓			
24	Funcionamiento RPDs	✓			
25	Brazo camaras			✓	
26	Camara 1			✓	
27	Camara 2			✓	
28	Linea de vida		✓		
29	Polea Pararayos ascendente	✓			
30	Polea Pararayos descendente	✓			
31	Estado Caja Multipar	✓			
32	Estado Caja LOOP21	✓			
33	Caja de conexiones electricas Sup.	✓			
34	Caja de conexiones electricas Inf.		✓		
35	Estado Caja de herramientas		✓		
36	Proteccion Solar	✓			
37	Verificacion Alineacion	✓			
38	Verificacion de Angulos	✓			
39	Puerta Escalera y antivandalico	✓			
40	Tornillos pasarelas		✓		
41	Tornillos plataformas		✓		

Observaciones Generales: 6. Señaletica en mensula no tiene
10. Iluminación lampara led 2 led no funciona
17-18 Se identifica ausencia de arandelas plasticas en ejes principales conjunto de balancines.
28. Se identifica linea de vida con oxidación
34. No es posible realizar verificaciones internas
35. Chapas de cierre caja de herramientas en mal estado
40. Tornilleria sin marcación de torque
41 Tornilleria sin marcación de torque.

Información de los participantes

Nombre	Entidad	Firma
Juan Carlos Gonzalez Chaca	TRANSMILENIO SA	
ELKIN JAIMES 07912	CABLEMOVIL S.A.S	ELKIN JAIMES
JOSE' VACCHE	O.D.T	

4 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO


4.1 Juego de herramientas nº ID 11511745

Adecuado para conjuntos de poleas: portantes 501 C
Carga útil: 96 kN

Designación	Cantidad	Número de artículo
Caja para depositar el juego de herramientas en la torre	1	11018872
Tirfor HIT 16 CHAMPION 20 m	1	10019763
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016576
Aparejo con 3 poleas 96 kN, carga útil	1	11016595
Grillete 7/8", carga útil 6,5 t	1	11434962
Grillete 1/2", carga útil 2,0 t	1	11434959
Polipasto de palanca carga útil 1,5 t, altura de elevación 5,0 m	2	11441443
Eslinga circular, longitud 1,0 m	2	11139242
Eslinga circular, longitud 2,0 m	3	10087373
Eslinga circular, longitud 4,0 m	3	10115335
Eslinga circular, longitud 6,0 m	3	10535106
Pata de cabra, longitud 1200 mm	2	10119346
Cable de poliamida, diámetro 12 mm	40m	10529696
Polea SRL-KG 08 2T HOFER	1	10725909
Levantacable tipo 501C; S-420C	1	10535100
Punzón, diámetro 29 mm, longitud 100 mm	1	10532343
Tuerca autofijadora todo metálico para bulón de polea M24	1	10542077
Polea 501C LW 100 DIÁM 525, DI-Láminas	1	10870308
Bolso de material	1	20934500
Bolso de herramientas con varias herramientas	1	11004088

	Bolso Herramientas Pilonas 24			
N°	ID ARTICULO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
1	12184197	BOLSA DE MATERIAL	150X150X500 NERI	1
2	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN	DIN 911 ACOD	1
3	10015933	LLAVE	DIN 3110 EC 8X10	1
4	10015942	LLAVE	DIN 3110 EC13X15	1
5	10392098	LLAVE	DIN 3110 EC16X18	1
6	10015943	LLAVE	DIN 3110 EC17X19	1
7	10015944	LLAVE	DIN 3110 EC22X24	1
8	10015945	LLAVE	DIN 3110 EC30X36	1
9	10015964	LLAVE	DIN 894 EC 41	1
10	10015967	LLAVE	DIN 894 EC 46	1
11	10090104	LLAVE	DIN 838 EC 8X10	1
12	10090550	LLAVE	DIN 838 EC13X15	1
13	10397173	LLAVE	DIN 838 AL16X18, LLAVE ESTREL	1
14	10090551	LLAVE	DIN 838 EC17X19	1
15	10090552	LLAVE	DIN 838 EC22X24	1
16	10015982	LLAVE	DIN 838 EC30X36	1
17	10016568	MARTILLO DE PLASTICO	———	1
18	10090106	MARTILLO DE. MEC.	DIN 1041 1500G C. MA	1
19	10101570	LLAVE CORREDIZA	DIN 8976 L=250 C.PR	1
20	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX.	L= 200 DIN	1
21	10016595	PATA DE CABRA, CUADR.	400 X 14 CON	1
22	10101043	DESTORNILLADOR	DIN 265-B 1,0X 5.5 L1	1
23	10158139	NT. CUTTER	L500 (ANCHO) 30540 CORT.	1
24	10097553	LIMA ½ CAÑA	12" 300MM 30X8.5 1/2	1
25	10023302	MANGO DE LIMA	MADERA L=120MM 250-35	1
26	10530985	INTERRUPT. DE HORQUILLA DE SEG. RACO	20032744G002565.C	2
27	11456353	HORQUILLA DE SEGURIDAD	20020927G002565 A.	20
28	10681766	CINTA TEXTIL	———	1


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C001	**0340-26**	19/05/2026	20	Desgaste en rótula		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se cambia rotula en mal estado
			26	Peladuras/Abolladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en techo
C002	**0352-26**	19/05/2026	26/27	Peladuras columnas esquineras	 	ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			38	Seguro averiado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se reemplaza seguros de ventana en presencia de personal de Tmsa. 7/6/26
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en techo
C003	**0334-26**	19/05/2026	26/27	Abolladura y peladura columnas esquineras	 	ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			30	Acrílico fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se reemplaza acrílico fisurado en presencia de personal de Tmsa 7/6/26
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C004	**0311-17**	19/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación.
			26/27	Peladura columnas esquineras	 	ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			31	Acrílico fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C005		19/05/2026	26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Gomas rotas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se reemplaza gomas de puerta en presencia de personal de Tmsa 7/6/26
			31	Acrílico fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			32	Acrílico fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura laminas horizontales		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C006		19/05/2026	26/27	Peladura parales		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			32	Acrílico fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C007		19/05/2026	26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Gomas rotas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se reemplaza goma de puerta en presencia de personal de Tmsa 7/6/26
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES		FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			46	Peladura perfíl delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			47	Conexión remendada		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se reemplaza cinta, recubrimiento de cable de conexión 4/6/26 Dany Bermon
C008		19/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			31	Señaletica mal estado/Fisurado Trasero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de señaletica
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Color distinto perfil		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se realiza corrección de pintura, color corresponde a uso normal de la operación y conserva pintura original del fabricante
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C009		19/05/2026	26	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			32	Acrílico fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C010		19/05/2026	31	Acrílico rayado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C011		19/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C012		19/05/2026	32	Acrílico fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura en los estribos
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C013		19/05/2026	26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Pendiente cinta antideslizante		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente instalar cinta andideslizante
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C014	**0414-17**	19/05/2026	10	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se inspecciona pieza y no se evidencia fisura, no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional bajo los parámetros del fabricante
			26	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			31	Vidrio trasero rayado -exterior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladuras estribos emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C015	**0302-17**	20/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se inspecciona pieza y no se evidencia fisura, no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional bajo los parámetros del fabricante
			26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rotas parte inferior Der/Izq		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza cambio de goma de puerta (izq-der) 8/6/2026
			41/42	Peladuras estribos esquineros		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C016	**0445-17**	20/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza correctivo de pintura
			30	Vidrio frontal rayado exterior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio trasero rayado -exterior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			34	Rayado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladuras estribos esquineros		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza correctivo de pintura
			Obs.	Escobillas límite de desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se verifican de pines de carga y no se videncia desgaste, no se cambia elemento debido a que se encuentra funcional
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se inspecciona pieza y no se evidencia fisura, no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional bajo los parámetros del fabricante
C017	**0357-17**	20/05/2026	26/27	Peladuras columnas esquineras esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			30	Vidrio frontal rayado exterior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladuras estribos emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			Obs.	Escobillas límite de desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se verifica estado y correcta conexión en riel carga (pines) no se cambia elemento debido a que se encuentra funcional y cuenta con vida útil
			26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior puerta izquierda		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
C018	**0342-17**	20/05/2026	41/42	Peladuras estribos emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			Obs.	Escobillas límite de desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia elemento debido a que su nivel de vida útil no ha llegado a su limite, se cambian forros de pines de carga
			26/27	Peladuras/Abolladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza correctivo de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C019	**0385-17**	20/05/2026	29	Rota inferior derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			32	Rayado parte inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladuras estribo emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza correctivo de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza correctivo de pintura
C020	**0383-25**	20/05/2026	26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			41/42	Peladuras estribo emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza correctivo de pintura
C021			26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza correctivo de pintura
			29	Rota parte inferior derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza cambio de goma de puerta (der) 8/6/2026
			30	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladuras estribo emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C022	**0438-17**	20/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			32	Roto parte inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			34	Rayado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C023	**0433-26**		26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior Der/Izq		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c023 cambio de goma puerta (derecha)
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C024	**0431-17**	20/05/2026	27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Abolladura y peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C025	**0391-17**	20/05/2026	27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c025 cambio de goma puerta (derecha)
			31	Acrílico roto inferior izquierdo		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C026	**0444-26**		32	Roto parte superior/Sin pelicula protección		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C027	**0337-26**	21/05/2026	10	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se verifica novedad, no se cambia elemento debido que se encuentra funcional
			26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior puerta derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c027 cambio de goma puerta (derecha)
			32	Sin película de protección		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C028	**0419-17**	21/05/2026	32	Sin película de protección		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			Obs.	Escibillas Limite desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c028 se verifica estado y correcta conexión en riel carga (pines)
			5/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C029	**0396-17**	21/05/2026	41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			Obs.	Señaletica Transmicable letra "A" dañada		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de señaletica
C030	**0336-17**	21/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	Peladuras columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior izquierda		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c030 cambio de goma puerta (izquierda)
			32	Sin película de seguridad		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C031	**0401-17**	21/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c031 cambio de goma puerta (derecha)
			32	Sin película de seguridad		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
C032	**0325-24**	21/05/2026	26	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c032 cambio de goma puerta (derecha)
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C033	**0360-17**	21/05/2026	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Rota inferior derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41	Tope inferior no corresponde		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		c033 cambio de tope de goma de puerta (inferior izq)
			42	Peladuras estribo emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C034	**0393-17**	22/05/2026	9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil de techo		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C035	**0426-17**		27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			29	Rota parte inferior puerta derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		c035 cambio de goma puerta (derecha)
			30	Acrilico Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		pendiente revisar novedad
			32	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			41	peladura en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			42	peladura en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
C036	**0346-17**		5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			32	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			41	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			42	peladura en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C037	0421-17		6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			32	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguseguridad del componente.
			41	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguseguridad del componente.
			42	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguseguridad del componente.
			46	Peladura en perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
C038	0454-25		27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			29	Rota parte inferior puerta derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		c038 cambio de goma puerta (derecha)
			41	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguseguridad del componente.
			42	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguseguridad del componente.
			51	Base de espaldar partido		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad, espaldar se encontraba suelto por ausencia de un tornillo, se ajusta en presencia de Tmsa. 4/6/26
C039	0323-17		26	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			29	Rota parte inferior puerta derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		pendiente cambio de goma


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			42	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta
C040	0349-25		26 - 27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			29	Rota parte inferior puerta derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		pendiente cambio de goma
			41	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			42	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			46	Peladura en perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C041	0367-17		27	Peladura en columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura
			29	Rota parte inferior puerta derecha		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		pendiente cambio de goma
			41	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			42	sin película de protección inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se verifica novedad en presencia de Tmsa, se evidencia faltante de película inferior en acrílico posterior, no se instala debido a que no afecta seguridad del componente.
			46	Peladura en perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	Alex Torres		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C042	**0370-25**	25/05/2026	26-27	peladuras en columnas esquinas, abolladura		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			34	marco con abolladura exterior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			5, 6, 9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
C043	**0418-17**	25/05/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			32	fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C044	**0373-17**	25/05/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	rota		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			30	fisura lado izquierdo inferior		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			31	vidrio rayado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C045	**0402-17**	25/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ	VERIFICAR ACRILICO FISURADO PARA CAMBIAR	
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C046	**0329-26**	25/05/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	rota		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C047	**0425-17**	25/05/2026	9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			46	Techo fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C048	**0447-17**	25/05/2026	9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C049	**0449-17**	25/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza correctivo de pintura
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C050	**0452-17**	25/05/2026	6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		se realiza cambio de forro de fricción por uno nuevo
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			46	Techo fisurado		ELKIN JAIMES	DARIO DELGADO	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C051	**0363-17**	26/05/2026	9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza cambio de forro de fricción por uno nuevo
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	Rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			47	Antena izquierda conexión averiada		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza ajuste de conexión
C052	**0305-17**	26/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C053	**0457-17**	26/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C054	**0316-26**	26/05/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		revisar techo


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C055	**0306-17**	26/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			20	Juego axial en rotula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se cambia pasador y tuercas de rotula
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
C056	**0376-17**	26/05/2026	20	Juego axial en rotula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se cambia pasador y tuercas de rotula
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	Roto		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza cambio de forro de fricción por uno nuevo
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C057	**0427-17**	26/05/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	Roto		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			32	no tiene pelicula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C058	0434-17	26/05/2026	9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se verifica estado de forro de fricción, no se evidencia fisura
			20	Juego axial en rotula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se limpia puntos de oxido y se aplica antioxidante
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C059	0390-17	27/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			30	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			32	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C060	0335-26	27/05/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			30	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			32	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			28	Goma izquierda delantera rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se revisa estado de parachoques, no se evidencia rotura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C061	**0403-26**	27/05/2026	30	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C062	0422-17	27/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se verifica estado de forro de fricción, no se evidencia fisura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			30	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C063	0382-17	27/05/2026	6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma
			30	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
C064	0359-17	27/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			36	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
C065	0381-17	27/05/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		revisar techo
			50	Falta tornillo en espaldar de silla		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se instalan tornillos faltantes
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C066	**0351-17**	27/05/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			29	rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		pendiente cambio de goma


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	EDUARDO GOMEZ		se realiza corrección y trabajo de pintura en techo
C067	**0314-26**	**28/05/2026**	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			36	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C068	**0389-26**	**28/05/2026**	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura




RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C069	**0356-25**	**28/05/2026**	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
C070	**0415-17**	**28/05/2026**	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		revisar techo
C071	**0428-17**	**28/05/2026**	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Forro de friccion fisurado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se verifica estado de forro de fricción, no se evidencia fisura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			31	Pelicula de acrilico en mal estado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad




RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C072	**0416-25**	**28/05/2026**	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C073	**0362-17**	**28/05/2026**	36	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C074	**0301-17**	**28/05/2026**								



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C074	0361-17	28/05/2026	41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C075	1188-18	29/05/2026	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			31	Acrilico trasero fisurado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			33	Falta tornillo en espaldar de silla		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se instalan tornillos faltantes
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			5, 6, 9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operació. Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C076	**0388-17**	**29/05/2026**	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			33	Falta tornillo en espaldar de silla		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se coloca tornillo José burgos 14/06/2025
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección y trabajo de pintura en techo
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C077	**0409-17**	**29/05/2026**	31	Acrilico trasero rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico parte superior rayado, fisurado.		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C078	**0319-26**	**29/05/2026**	32	Acrilico fisurado parte superior		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C078	0315-26	29/05/2026	41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			50	Tornillo espaldar		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se instalan tornillos faltantes
C079	0324-17	29/05/2026	5, 6, 9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			20	Cilindro de freno presenta oxidacion		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C080	0318-26	29/05/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico rayado parte superior		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C081	0313-17	29/05/2026	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			33	Falta tornillo en espaldar de silla		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se coloca tornillo José burgos 14/06/2025
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección y trabajo de pintura en techo
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C082	0435-17	29/05/2026	32	Acrilico rayado parte superior		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			33	Falta tornillo en espaldar de silla		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se coloca tornillo José burgos 14/06/2025
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C083	**0327-25**	**1/06/2026**	29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			33	Peladura de pintura		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C084	**0461-25**	**1/06/2026**	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico partido parte superior		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C085	**0331-17**	**1/06/2026**	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico partido parte superior		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			40	Soporte acrilico partido		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C086	0420-17	1/06/2026	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			20	Oxidacion en rotula de cilindro de freno		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se limpian puntos de oxido y se aplica antioxidante
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico partido parte superior, sin pelicula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			36	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			20	Oxidacion en rotula de cilindro de freno		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se cambia rotula en mal estado



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C087	0400-17	1/06/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico partido parte inferior		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C088	0394-26	1/06/2026	20	Oxidacion en rotula de cilindro de freno		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico partido parte inferior		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico rayado, sin pelicula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C089	**0379-17**	**1/06/2026**	29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico rayado, sin pelicula		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C090	**0347-17**	**1/06/2026**	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C091	**0411-17**	**1/06/2026**	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	RICARDO ALZATE	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C092	0455-17	2/06/2026	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico sin pelicula		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			40	Soporte acrilico partido		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C093	0442-25	2/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico sin pelicula		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura




RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		revisar techo
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Falta arandela tope puerta		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se instala arandela
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
C094	**0326-25**	**2/06/2026**	31	Acrilico partido y rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico rayado y sin pelicula		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			47	Antena trasera rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza ajuste de antena
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente cambio de goma
C095	**0354-17**	**2/06/2026**	30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C096	0322-25	2/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			31	Vidrio rayado y acrilico partido		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico rayado y sin pelicula		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		revisar techo
			5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			31	Vidrio rayado y señalitica		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
C097	0392-17	2/06/2026	32	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C097	0352-17	2/06/2026	33	Pintura pelada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			38	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			39	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C098	0366-25	2/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	No tiene tope de puerta		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se instala tope nuevo
			30	Acrilico partido		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			32	Vidrio rayado y sin pelicula		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C099	0358-27	2/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			29	Tope puerta en mal estado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se instala tope nuevo
			30	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C099	0358-27	2/06/2026	32	Vidro rayado y acrilico roto		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			40	Soporte acrilico partido		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	JEFFERSON CARDENAS		se realiza corrección de pintura
C0100	0404-17	3/06/2026	5,6,9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico partido parte inferior		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico parte superior rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	techo pelado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		revisar techo
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C101	**0407-17**	3/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico parte superior rayado, fisurado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		revisar techo
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C102	**0410-17**	3/06/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			38	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			39	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C103	**0320-17**	3/06/2026	6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente cambio de goma
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico parte rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			40	Soporte en mal estado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C104	**0368-17**	3/06/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			31	Acrilico Rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			32	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente cambio de goma
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
C105	0397-17	3/06/2026	31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			35	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			39	ventana de guillotina rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			40	Soporte en mal estado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.






RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C106	**0417-17**	3/06/2026	6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C107	**0344-17**	3/06/2026	5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			31	Vidrio trasero rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C108	**0343-17**	3/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C109	**0371-25**	3/06/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente cambio de goma
			32	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			6	desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente cambio de goma



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C110	**0446-17**	3/06/2026	30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio trasero rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			33	pasamanos rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
C111	**0365-7**	5/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			38	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			39	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			5	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			6	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C112	**0408-17**	5/06/2026	9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			38	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			39	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C113	**0441-17**	5/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			32	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			35	Ventana abatible rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			38-39	ventana de guillotina rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C114	**0333-26**	5/06/2026	31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C114	0355-25	5/06/2026	38	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			39	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C115	0361-25	5/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente cambio de goma
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			38	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			39	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C116	0406-25	5/06/2026	N/A	Forro de pin de carga interno roto		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambiar forro
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Peladura en paral frontal derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Peladura en paral trasero derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Peladura en paral frontal izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			42	Tope de puerta inferior derecha roto		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se coloca tope puerta, Giovanni murillo y marcela Ramírez 15/06/2026



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41	Estribo puerta izquierda rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
C117	**0451-17**	**5/06/2026**	26	Peladura en paral trasero derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Peladura en paral frontal derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno trasero derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno frontal izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			29	Goma de puerta izquierda rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			29	Goma de puerta derecha rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			41-42	Estribos de puertas rayados		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			5-6-9	Pinza presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			27	Peladura en paral interno trasero derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno frontal izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
C118	**0386-17**	**5/06/2026**	29	Goma de puerta derecha rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			29	Goma de puerta izquierda rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			40	Soporte de acrilicos frontal roto		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			38-39	Pelicula de acrilico ventanillas presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41-42	Estribos de puertas rayados		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
C119	**0312-17**	**5/06/2026**	5-6-9	Pinza presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			41-42	Estribos de puertas rayados		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
C120	**0324-25**	**5/06/2026**	26	Peladura en paral trasero izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			29	Goma de puerta derecha rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			38-39	Pelicula de acrilico ventanillas presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			41-42	Estribos de puertas rayados		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Peladura en paral frontal derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Peladura en paral trasero izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno trasero derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno frontal derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			30	Policarbonato frontal rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
C121	**0399-26**	**5/06/2026**	40	Goma de soporte interna trasera rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se coloca tope puerta, Giovanni murillo y marcela Ramírez 15/06/2026
			31	Acrilico interno trasero mediano rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			29	Goma de puerta derecha rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			29	Goma de puerta izquierda rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			41-42	Estribos de puertas rayados		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			46	Techo rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Pintura con tono distinto paral frontal derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			26	Peladura en paral trasero izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno trasero derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
C122	0398-26	5/06/2026	27	Peladura en paral interno frontal derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno trasero izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	Peladura en paral interno frontal izquierdo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			29	Goma de puerta derecha rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			29	Goma de puerta izquierda rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			41-42	Estribos de puertas rayados		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			38-39	Pelicula de acrilico ventanillas presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			27	Peladura en paral interno trasero derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C123	**0307-25**	**5/06/2026**	30	Policarbonato trasero rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			27	Peladura en paral interno frontal derecho		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			38-39	Pelicula de acrilico ventanillas presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			41-42	Estribos de puertas rayados		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
C124		8/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			31	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C125		8/06/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			41	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		revisar techo
			26	peladuras		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C126		**8/06/2026**	29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			30	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			33	Pasamanos rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
C127		8/06/2026	20	Cilindro de freno presenta oxidacion		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio trasero rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C128		8/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			26	peladuras		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C129		8/06/2026	27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
C130		**8/06/2026**	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente cambio de goma
			30	Acrilico rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			31	Vidrio trasero rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			32	Acrilico parte rayado.		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	ANDRES ALBARRACIN		revisar techo
C131		8/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			31	Vidrio trasero rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad




RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		revisar techo
C132		8/06/2026	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			31	Vidrio trasero rayado		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DANY BERMON	Juan Gonzalez		revisar techo
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota Izq y der		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente cambio de goma
C133	**0332-17**	**13/06/2026**	40	Separador de Acrilidco partido		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		revisar techo
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C134	**0339-17**	**13/06/2026**	29	Junta puerta rota derercha		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente cambio de goma
			40	Separador partido tracero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		revisar techo
C135	**0377-17**	**13/06/2026**	26	Golpe y peladura en columna exterior izq. Frontal		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota derercha		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente cambio de goma
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		revisar techo
C136	**0338-17**	**13/06/2026**	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota derercha		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente cambio de goma
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			5-6-9	Pinza presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			20	Oxidaciion rotulas rotula		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C137	**0353-17**	**13/06/2026**	26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota dererecha		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente cambio de goma
			38	Rayón acrílico de puertas izquierda		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			39	Acrílico de puertas derecha		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
C138	**0459-17**	**13/06/2026**	5-6-9	Pinza presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota Izquierda		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente cambio de goma
			31	Vidrio lateral		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			32	Vidrio trasero rayado y acrilico interior rot		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico Roto		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			46	Peladura en techo		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		revisar techo


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C139	**0310-17**	**13/06/2026**	26	Peladuras y decoloracion de pintura en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			29	Junta puerta rota Izquierda y derecha		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente cambio de goma
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			Opservacion	Señaletica Ciudad Bolivar (d)		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
C140		**13/06/2026**	5-6-9	Pinza presenta desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			30	Rayadura de acrilico		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
			41-42	peladuras en estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		se realiza corrección de pintura
			Opservacion	Señaletica Vidrio trasero (Tranmilenio)		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIÁN LEÓN		pendiente verificar novedad
C141	**0453-26**	**14/06/2026**	26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C142	**0345-26**	**14/06/2026**	29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			34	Ventana rayada		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		verificar novedad
			40	Soporte lateral roto		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C143	**0300-26**	**14/06/2026**	26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			31	Vidrio Rayado		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C144	**0458-26**	**16/06/2026**	27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C145	**0355-26**	**16/06/2026**	27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C145	0355-20	16/06/2026	41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C146	0436-17	16/06/2026	5-6-9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisurado		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se verifica estado de forro de fricción, no se evidencia fisura
			20	Con oxido y desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
				Protector de pin de carga roto		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambiar forro
C147	0440-17	16/06/2026	5-6-9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			20	Con oxido y desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas/Falta tope		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C148	**0372-17**	**16/06/2026**	5-6-9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			20	Con oxido y desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			20	Oxidaciion rotulas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			29	Tope y goma izquierad en mal estado		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente cambio de goma
			30	Rayado		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
C149	**0298-26**	**11/06/2026**	32	Rayado		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			33	Pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			41	Pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			42	Pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
C150	0375-26	11/06/2026	31	Rayado		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			39	Pelicula de acrilico ventanillas presenta desgaste		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
			20	Oxidacion en rotulas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C151	0309-26	11/06/2026	29	Ambas rotas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente cambio de goma
			30	Acrilicos rayados		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			31	Acrilicos rayados		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			32	Acrilicos rayados		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			33	Pasamanos rayado		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			40	Separador partido		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			41	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			42	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
			5-6-9	Pinza presenta desgaste		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			10	Fisura en los extremos		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se verifica estado de forro de fricción, no se evidencia fisura
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C152	**0328-17**	**11/06/2026**	27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			29	Izquierda rota		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente cambio de goma
			38	Rayadura acrilico ventana		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			41	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			42	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
C153	**0387-26**	**11/06/2026**	20	Oxidacion en rotulas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilicos rayados		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			31	Acrilicos rayados		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			32	Acrilicos rayados		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad




RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
			41	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			42	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
C154	0369-26	11/06/2026	29	Izquierda rota		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			31	Acrilicos rayados		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			41	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			29	Derecha rota		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente cambio de goma
C155	0456-26	11/06/2026								



RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C155	0458-20	11/06/2026	32	Acrilicos partido		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			38	Pelicula de acrilico ventanillas presenta desgaste		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		pendiente verificar novedad
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
C156	0460-17	11/06/2026	5-6-9	Pinza presenta desgaste		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			27	peladuras en columnas		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			33	Pasamanos rayado		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			41	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			42	pintura rayada		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura en techo		Elkin Jaimes	DARWIN FIGUERA	Fabián León		revisar techo
			5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			30	Acrilico Rayado		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C157		**46185**	32	Acrilico Rayado		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			33	Pasamanos de la cabina C156		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			40	Soporte roto		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C158	**0432-17**	**12/06/2026**	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C159	**0348-17**	**12/06/2026**	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas y tope roto		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura


RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C160	**0448-17**	**12/06/2026**	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante. Cabina fuera de operación por limite de desgaste en el cuerpo de la mordaza fija
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			31	Acrilico Roto		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C161	**0439-17**	**12/06/2026**	5/6/9	Desgaste		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		no se cambia debido a que el elemento se encuentra funcional y no afecta la seguridad ni la operación y se encuentra bajo los parámetros del fabricante.
			26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
C162	**0374-25**	**12/06/2026**	26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			32	Acrilico lateral Roto		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			33	Pasamanos rayado		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura

RECEPCION CABINAS

CABINA	PINZA	FECHA	ITEM	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
C163	**0395-17**	**12/06/2026**	26/27	Peladura columnas esquineras		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			29	Juntas rotas		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente cambio de goma
			31	Vidrio rayado		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		pendiente verificar novedad
			41/42	Peladura estribos de emergencia		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura
			46	Peladura perfil delantero		ELKIN JAIMES	DARWIN FIGUERA	FABIAN TIBADUIZA		se realiza corrección de pintura

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 1	4	11/05/2026	4) Tornillo de ajuste superior salida descendente no pertenece.		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		tornillos fueron reemplazados en mantenimiento de 1500 horas , presentaban desgaste. no se cambian nuevamente debido a que se encuentran funcionales y no afecta la seguridad ni la operación.
	6	12/05/2026	6) Señalitica mensula en mal estado.		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		se instala señalética nueva con los datos y características especificas de la pilona.
	11	13/05/2026	11)Fisura en pasarela posicion 1 entrada descendente.		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		se realiza corrección de soldadura
	12	14/05/2026	12)fisura en plataforma de mantenimiento lado monte		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		se envía personal de la ODT a revisar novedad, nose evidencia fisura, la calida de la imagen no permite identificar la zona exacta del reporte.
	17	15/05/2026	17)Faltante arandela plastica conjunto de balancin antrada ascendente. Eje principal entrada ascendente con exidacion..	 	Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	18	16/05/2026	18) Tornillo de ambas poleas palpadoras descendente, (no pertenecen).		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		tornillos fueron reemplazados en mantenimiento de 1500 horas , presentaban desgaste. no se cambian nuevamente debido a que se encuentran funcionales y no afecta la seguridad ni la operación.
	22	17/05/2026	22) Tornillos alineadores porta horquillas descendiemte no los tiene.		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		se instalan tornillos faltantes en los soportes de los porta horquillas
	24	18/05/2026	24)Conectores RPD 1-2 y horquillas 1-2 en caja de distribucion en mal estado.		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		se verifica novedad, se ajustan los conectores que se encontraban flojos sin novedad.
	31	19/05/2026	31) No es posible verificar el estado, debido a que no es posible abrir.		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		se cambia tornillo que se encontraba en mal estado
	33	20/05/2026	33) Uno de sus tornillos en tapa no pértece. Faltante tornillo en clavija de 110 v.	 	Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		se instala tornillo faltante quedando sin novedad
	34	21/05/2026	34) Corazza de alimentacion en mal estado.		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		**pendiente ajuste de coraza**
	35	22/05/2026	35)Cierre de caja en mal estado. Correa de la apertura de la ,tapa desilachada	 	Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	23/05/2026	39) Abolladuras en puerta supérior e inferior. Faltande arandela en tornillo superior. Cierre de puerta no es el original.	 	Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		cierre de puerta no se cambia, no afecta la seguridad y s encuentra funcional. se repara abolladura de puerta en zona superior e inferior
	Piezas de recambio, Bolso de herramientas	24/05/2026	**Herramienta faltante** Falta pata de cabra 400*14 Falta dos llaves 13x15 Falta una llave CORREDIZA Cinta textil Faltan 2 horquillas de seguridad Estrobo 20 mm; longitud 1 m. Pata cabra longitud 1200mm. Palanca Tirfor		Elkin Jaimes Ortiz	Xiomara Bermudez	Fabián León		**pendiente reposición de inventario**
	4	11/02/2026	Tornillo inferior riostra entrada ascendente y riostra salida descendente con oxidación.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	6	12/02/2026	Señalética ménsula en mal estado	 	Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se instala señalética nueva con los datos y características especificas de la pilona.


FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 13	10	13/02/2026	Lámpara de iluminación de escalera fuera de servicio		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		novedad está programado su atención viernes 17 de julio y sabado 18 de julio
	11	14/02/2026	Pasarela 3 entrada descendente con oxidación en soporte.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	11	15/02/2026	Pasarela1 entrada descendente con refuerzo soldado. y oxidación en su soporte.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		*pieza con tratamiento de soldadura certificada y avalada por Tmsa *se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	12	16/02/2026	Fisura en plataforma de mantenimiento lado valle entrada ascendente.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se envía personal de la ODT a revisar novedad, nose evidencia fisura, la calida de la imagen no permite identificar la zona exacta del reporte.
	14	17/02/2026	Polea 1 entrada ascendente con rodamientos en mal estado.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se verifica novedad y se cambia polea 1 entrada ascendente
	17	18/02/2026	Amortiguadores sueltos.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se realiza ajuste de amortiguadores
	22	19/02/2026	Porta horquillas polea para rayos ascendente con prensa estopa suelto.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se verifica novedad y se ajusta la prensa estopa que se encontraba floja.
	24	20/02/2026	Conector ir RPD en caja de distribución 4-3 en mal estado.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se verifica novedad, se realiza limpieza de conectores y se ajustan.
	28	21/02/2026	Punto de fijación con presencia de oxidación. Punto de guía superior con oxidación.	 	Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		s e verifica novedad, se limpian puntos de oxido y se aplica galvanizante
	29	22/02/2026	Polea descentrada.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**novedad está programado su atención viernes 17 de julio y sabado 18 de julio**
	30	23/02/2026	Polea descentrada		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**novedad está programado su atención viernes 17 de julio y sabado 18 de julio**
	34	24/02/2026	Presenta breakers apagados y faltante coraza en cable de alineación.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**novedad está programado su atención viernes 17 de julio y sabado 18 de julio**
	35	25/02/2026	Cierre de caja en mal estado.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**


FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
	36	26/02/2026	Presenta oxidación en la árte superior.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		s e verifica novedad, se limpian puntos de oxido y se aplica galvanizante
	Piezas de recambio, Bolso de herramientas	27/02/2026	**Herramienta faltante** Falta una llave 41 Falta una llave 13x15 Falta una llave CORREDIZA Mango de lima * Faltan 4 horquillas de seguridad Dos eslinga circular, longitu 1m Tres eslingas circular, longitud 2m Tres eslingas circular, longitud 4m Tres eslingas circular, longitud 6m		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**pendiente reposición de inventario**
	6	11/05/2026	* Señaletica en mensula no tiene		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	12/05/2026	* se identifico lampara leed encendida directa		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		**ya se está reparando**
	17 - 18	13/05/2026	* Se identifico ausencia arandelas plasticas ejes principales conjunto de balancines		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	28	14/05/2026	* Linea de vidad presenta oxidacion		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		se realiza limpieza e puntos e oxido y se aplica galvanizante en frio
TORRE 18	31	15/05/2026	* No es posible verificar su esstado tornillos pegados		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		se realiza apertura de caja de alimentación, se verifica estado de sus componentes, no se evidencia novedad
	35	16/05/2026	* Chapa caja de herramientas en mal estado		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	40 - 41	17/05/2026	* Tornilleria sin marcar de torque		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		se realiza marcado de tornillería
	Piezas de recambio	18/05/2026	* Falta 1 eslinga circular longitud 6.0 m * Falta 1 punzón diámetro 24 mm longitud 100 mm * Falta 1 tuerca auto fijadora todo metálico para bulón de polea m20		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		**pendiente reposición de inventario**



FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
	Bolso de herramientas	19/05/2026	* falta una llave 22x24 * falta una llave 13x15 * falta una llave 30x36 * faltan 2 horquillas de seguridad		Elkin Jaimes Ortiz	Miguel Grass	Alex Torres		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 2	5	12/05/2026	Tonilleria oxidada lado valle		Elkin Jaimes Ortiz				se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	6	13/05/2026	Se identifica ausencia de señalética en mensula						se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	14/05/2026	Iluminación lámpara led un led apagado						**ya se está reparando**
	17-18	15/05/2026	Se identifica ausencia de arandelas plásticas en conjunto de balancín ascendente y Descendente						en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	22	16/05/2026	Se identifica ausencia de tornillo alineado superior en ambos sentidos						se instalan tornillos faltantes en los soportes de los porta horquillas
	24	17/05/2026	Conector en caja rpd 43 en mal estado						se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	28	18/05/2026	Punto de oxidación en línea de vida tramo 1 y 2						se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	39	19/05/2026	Tope inferior de puerta en mal estado						se instala tope de goma nuevo
	Piezas de recambio, Bolso de herramient	20/05/2026	**Faltante de herramienta:** *18 horquillas de seguridad faltan 2 *Falta Palanca de Tirfor hit 16						**pendiente reposición de inventario**
TORRE 3	5	12/05/2026	Tornillería en oxidación en ambos sentidos		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	6	13/05/2026	se identifica ausencia de señalética en ménsula		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	14/05/2026	iluminación lámpara led un led apagado		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		**ya se está reparando**
	12	15/05/2026	plataforma de mantenimiento lado montaña salida ascendente pendiente por cambiar		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		**ya se compró a Doppelmayr**
	17-18	16/05/2026	se identifica ausencia de arandelas plásticas en conjunto de balancines sentido ascendente y descendente		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	26-27	17/05/2026	caja de alimentación y datos 1 y 2 tornillería no corresponde		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		se cambian tronillos en mal estado
	28	18/05/2026	punto de oxidación en línea de vida tramo 2		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	33	19/05/2026	no es posible realizar verificación interna mal estado de la tornillería en caja de conexiones eléctricas		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		se cambian tronillos en mal estado
	35	20/05/2026	una de las chapas averiadas		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**


FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
	39	21/05/2026	tope inferior de puerta de mal estado abolladura en la mitad		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		se instala tope de goma nuevo
	Piezas de recambio, Bolso de herramientas	22/05/2026	**Faltante de herramienta:** *Chapa de cierre izquierdo en mal estado *Faltante de eslinga de 2m *Faltante cable de poliamida diámetro 12 mm *9 tuercas auto fijadoras falta una 1 *Faltante de un grillete de 1/2 en aparejo de tres poleas *Faltante horquillas de seguridad faltan 6 ya que son 14 *Faltante cinta textil	 	Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Andrés Hernández		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 4	6	12/05/2026	Letreros de aviso falta señalética de carga de ménsula		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	12/05/2026	Reflector de escaleras con dos led fundidos.		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		**ya se está reparando**
	17-18	12/05/2026	Se evidencia ausencia de arandelas elasticas en ejes principales		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	26	12/05/2026	Cámara # 1 con cinta suelta en su domo.		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		**se realizó ajuste por parte de proveedor lira, a la espera de evidencia fotográfica**
	26 - 27	12/05/2026	Caja de cámaras despegada.		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		**se realizó ajuste por parte de proveedor lira, a la espera de evidencia fotográfica**
	26-27	12/05/2026	Caja de alimentacion de datos 1 y 2 en mal estado carcasas sueltas		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		**novedad está programado su atención viernes 17 de julio y sabado 18 de julio**
	28	12/05/2026	Linea de vida presenta oxidacion		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	35	12/05/2026	Caja de herramientas con chapa sin un ojal (izquierdo)		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	12/05/2026	Falta tornillo en la puerta antivandálico		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		se instala tornillo faltante
	40	12/05/2026	Pasarela faltan marcas de torque en tornillería		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		se realiza marcaje de tornillería

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
	Piezas de recambio	12/05/2026	Guaya de aparejo seguridad de bloqueo del pasador on óxido y varios hilos reventados.		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		**al momento no se puede subsanar, caja se encuentra sellada**
	bolso de herramientas	12/05/2026	Falta de mariposa de porta horquillas en maleta de repuesto		Anderson Torres	Miguel Grass	Juan Gonzalez		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 6	5	12/05/2026	Tornillo con oxidacion lado monte		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	6	13/05/2026	Señaletica en mensula no tiene		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	14/05/2026	Iluminacion escalera apagado un bombillo (apagado)		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**ya se está reparando**
	17 -18	15/05/2026	Faltan arandelas plásticas en ejes principales conjunto de balancines.	 	Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	26-27	16/05/2026	Caja de conexion y datos de camara 1 y 2 en mal estado		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**se realizó ajuste por parte de proveedor lira, a la espera de evidencia fotográfica**
	32	17/05/2026	Tornilleria no corresponde		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se realiza cambio de tornillería en clase conexión
	35	18/05/2026	Cierre de caja de herramienta en mal estadso en mal estado.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	19/05/2026	Puerta escalera antivandálico con topes en mal estado		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		se cambian topes en mal estado
	Bolso de herramientas	20/05/2026	**Herramienta faltante** * Falta mariposas de interruptor de horquillas.		Elkin Jaimes Ortiz	Juan Cepeda	Fabián León		**pendiente reposición de inventario**
	6	13/05/2026	Letreros de aviso falta señalética de carga de ménsula		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	13/05/2026	Reflector de escaleras prende 1 led		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		**ya se está reparando**
TORRE 7	17-18	13/05/2026	Se identifica ausencia de arandela plastica ejes principales conjunto de balancines		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
	28	13/05/2026	Linea de vida presenta oxidación en varios puntos.		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	39	13/05/2026	Puerta antivandálica con leves dobleses.		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		se realiza ajuste en dobles de lamina de puerta
TORRE 8	6	13/05/2026	Letreros de aviso falta señalética de carga de ménsula		Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	17 -18	14/05/2026	Faltan arandelas plásticas en ejes principales conjunto de balancines.	 	Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	26-27	15/05/2026	Caja de conexion y datos en mal estado		Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		**se realizó ajuste por parte de proveedor lira, a la espera de evidencia fotográfica**
	28	16/05/2026	Línea de vida oxidación en la parte inferior (inicio)		Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		se verifica novedad, se limpian puntos con oxido y se aplica galvanizante
	29-30	17/05/2026	Polea para rayo se evidencia desgaste anormal interno.	 	Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		se limpia punto de oxido y se aplica galvanizante en frio
	32	18/05/2026	Tornilleria no correspone		Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		se realiza cambio de tornillería en clase conexión
	35	19/05/2026	Caja de herramientas con chapa sin un ojal (izquierdo derecho).		Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	20/05/2026	Puerta escalera antivandálico con topes en mal estado		Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		se instalan topes de goma nuevos
	Bolso de herramientas	21/05/2026	Herramienta faltante * Falta mariposas de interruptor de horquillas. * Faltan 4 horquillas del paquete.		Elkin Jaimes	Juan Cepeda	Fabián León		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 9	6	13/05/2026	Letreros de aviso falta señalética de carga de ménsula		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	28	13/05/2026	Linea de vida presenta oxidación en varios puntos.		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	40-41	13/05/2026	Pasarela faltan marcas de torque en tornillería		Anderson Torres	Felipe Duque	Jefferson Cardenas		se realiza marcaje de tornillería

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 20	1	14/05/2026	Se evidencia mangaveleta rota		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se realiza cambio de manga veleta
	5	14/05/2026	Se evidencia tornilleria con oxidacion		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se realiza limpieza e puntos de oxido y se aplica galvanizante en frio
	6	14/05/2026	no tiene señalética en ménsula.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	14/05/2026	Iluminacion lamparada red, 1 led apagado		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		**ya se está reparando**
	17	14/05/2026	Se identifica Ausencia arandela plástica eje principal conjunto balancín.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	22	14/05/2026	Falta tornillos superiores base porta horquilla no tienen ascendente y ascendente.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se cambian tornillos en mal estado
	26 - 27	14/05/2026	Se identifica Coraza acometida electrica y de datos rota.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se realiza ajuste de coraza en mal estado
	28	14/05/2026	Linea de vida presenta oxidación.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	31	14/05/2026	Ausencia de tornillo en tapa.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se cambian tornillos en mal estado
	35	14/05/2026	Chapa caja de herramientas en mal estado.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	14/05/2026	Se identifica abolladura partes inferiores, mitad y superior.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		se realiza ajuste de abolladura
	Piezas d Recambio, bolso de herramientas	14/05/2026	* Faltante caja de herramientas. * Faltan dos mariposas de porta horquilla. * Falta eslinga de 2 metros y otra está dañada.		Ekin Jaimes	Miguel Grass	Eduardo Gomez		**pendiente reposición de inventario**


FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 21	5	14/05/2026	Tornillos con oxidación.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	6	14/05/2026	Letreros de aviso falta señalética de carga de ménsula		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	14/05/2026	Lámpara led con un bombillo funcionando.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		**ya se está reparando**
	17-18	14/05/2026	Faltante arandela plástica eje principal conjunto balancín ascendente.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	22	14/05/2026	Faltante tornillo alineador corto de porta horquillas		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		se instala tornillo faltante
	26 - 27	14/05/2026	Caja de alimentación y datos en mal estado, coraza en mal estado.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		se realizó ajuste por parte de proveedor lira, a la espera de evidencia fotográfica
	28	14/05/2026	Oxidación linea de vida.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	35	14/05/2026	Caja de herramientas chapa en mal estado.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	14/05/2026	Puerta antivandálico faltante tornillo chapa de la mitad.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		se instala tornillo faltante
	Bolso de herramientas	14/05/2026	* Bolso faltante de 10 horquillas.		Deivith Castellanos	Miguel Grass Jadid Useche	Eduardo Gomez		**pendiente reposición de inventario**
	5	14/05/2026	Travesaño con oxidación en tornillería		Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	6	14/05/2026	Faltante señalética ménsula de carga		Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	14/05/2026	Escalera de acceso con golpe o impacto - Lampara led no funciona	 	Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		**ya se está reparando**

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 22	28	14/05/2026	Oxidación en línea de vida		Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	31	14/05/2026	Falta 1 tornillo de la tapa caja múltiple		Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		se repone tornillo faltan
	35	14/05/2026	Caja de herramientas con Argollas de chapa dañadas.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	14/05/2026	Escalera con Golpe en tapas internas y golpeadas.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		se realiza ajuste de laminas internas de escalera
	Bolso de herramientas	14/05/2026	**Faltante en herramientas** Falta llave 13*15 redonda Falta 20 horquillas de seguridad Falta mariposa en porta horquilla	 	Anderson Torres	Jaider Gomez	Andrés Hernández		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 10	6	15/05/2026	Señaléticas en ménsula en mal estado		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	15/05/2026	iluminación lámpara led 2 leds apagados		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**ya se está reparando**
	26	15/05/2026	se identifica coraza de alimentación y datos cristalizada y rota		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**pendiente ajuste de coraza**
	27	15/05/2026	se identifica coraza de alimentación y datos cristalizada error		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**pendiente ajuste de coraza**
	32	15/05/2026	tornillería tapa de caja en mal estado		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se cambian tornillos en mal estado
	37	15/05/2026	Se detectó cable desalineado balancín ascendente		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**novedad está programado su atención viernes 17 de julio y sabado 18 de julio**
	Bolso de herramientas	15/05/2026	* Faltan 3 horquillas		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 11	6	15/05/2026	señaléticas en ménsula no tiene		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	15/05/2026	iluminaria lámpara led 2 leds apagados		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**ya se está reparando**
	17	15/05/2026	se identifica ausencia de arandela plástica balancín entrada ascendente		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	28	15/05/2026	Puntos de oxidación en línea de vida		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	32	15/05/2026	tornillería tapa de la caja en mal estado		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se cambian tornillos en mal estado
	35	15/05/2026	chapa de caja de herramientas en mal estado		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
	39	15/05/2026	3tope de goma inferior de puerta en mal estado		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se cambian topes en mal estado
	Piezas de recambio	15/05/2026	* chapa de caja en malestar * Eslinga circular 1.0 m pendiente 2 * Eslinga circular 2.0 m pendiente 1		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 12	6	15/05/2026	señalética en ménsula no tiene		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	15/05/2026	iluminaria lámpara led 2 leds apagados		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**ya se está reparando**
	17	15/05/2026	se identifica ausencia de arandela plástica en eje principal conjunto de balancines		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	18	15/05/2026	se identificó ausencia de arandela plástica en eje principal conjunto de balancín		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	28	15/05/2026	punto de oxidación en línea de vida		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	31	15/05/2026	se identificó ausencia de un tornillo		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		reponer tornillos
	35	15/05/2026	chapa de cierre de caja de herramientas en mal estado		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	Bolso de herramientas	15/05/2026	* falta una horquilla * Chapa en mal estado		Elkin Jaimes	Harold Baron	Alex Torres		**pendiente reposición de inventario**
	5	15/05/2026	oxidación en travesaños tornillería.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Jefferson Cardenas		se verifica novedad, se limpian puntos con oxido y se aplica galvanizante
	6	15/05/2026	falta señalética de aviso carga de mensula.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Jefferson Cardenas		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	17-18	15/05/2026	se identifico falta de arandela plastica en ejes principales conjunto de balancines		Anderson Torres	Jaider Gomez	Jefferson Cardenas		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
TORRE 14	28	15/05/2026	oxidación en paso de línea de vida.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Jefferson Cardenas		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	39	15/05/2026	puerta de escalera doblada en parte superior y inferior.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Jefferson Cardenas		se realiza ajuste de laminas internas de escalera
	40 - 41	15/05/2026	falta marcación de tornillería en plataforma y pasarelas.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Jefferson Cardenas		se realiza marcaje de tornillería
	Bolso de herramientas	15/05/2026	horquilla de seguridad falta 1, solo hay 19.		Anderson Torres	Jaider Gomez	Jefferson Cardenas		**pendiente reposición de inventario**
	5	16/05/2026	tornillos con oxidación		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	6	16/05/2026	Señalépticas en ménsula no tiene.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	16/05/2026	ausencia lámpara led.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**ya se está reparando**


FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 16	17	16/05/2026	ausencia arandelas plástica ejes principales balancín ascendente.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	26	16/05/2026	caja alimentación de datos camara 1 en mal estado.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**se realizó ajuste por parte de proveedor lira, a la espera de evidencia fotográfica**
	27	16/05/2026	caja alimentación de datos camara 2 en mal estado.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**se realizó ajuste por parte de proveedor lira, a la espera de evidencia fotográfica**
	28	16/05/2026	puntos oxidación.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	Piezas de recambio y obslso de herramientas	16/05/2026	* Faltante eslinga 2 metros mal estado. * Falta llave de 8*10 fija		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 17	5	16/05/2026	tornillos con oxidación.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	6	16/05/2026	no tiene señalética.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	10	16/05/2026	lámpara led 1 bombilla fundida.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**ya se está reparando**
	17	16/05/2026	ausencia arandelas plástica en eje principal conjunto balancín.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	18	16/05/2026	ausencia arandelas plástica conjunto balancín		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	24	16/05/2026	se identifica conector en caja RPD 1-2 dañado.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se realiza limpieza de contactos y se ajustan bornes
	28	16/05/2026	se identifica puntas con óxido		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio


FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
	31	16/05/2026	ausencia de tornillo		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se realiza cambio de tornillería en clase conexión
	35	16/05/2026	chapa caja herramienta mal estado.		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	Bolso de herramientas	16/05/2026	un interruptor sin mariposas no hay horquillas de seguridad		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**pendiente reposición de inventario**
	6	16/05/2026	no tiene señalética		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se instala señalética nueva
	17	16/05/2026	ausencia de arandelas plástica eje principal balancín		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	18	16/05/2026	ausencia de arandelas plástica balancín		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
TORRRE 19	34	16/05/2026	no se encuentra llave para verificación		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		se realiza apertura de caja de alimentación, se verifica estado de sus componentes, no se evidencia novedad
	35	16/05/2026	chapa caja herramienta en mal estado		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	39	16/05/2026			Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**pendiente arreglar seguro de puerta antivandálica**
	Piezas d Recambio, bolso de herramientas	16/05/2026	falta palanca tirfor. - falta llave de 13*15 - faltan 6 horquillas de seguridad		Elkin Jaimes	Kenis Florz Juan Bernal	Eduardo Gomez		**pendiente reposición de inventario**
	2	21/05/2026	Veleta direccion de viento presenta desgaste en su sitema de rotacion		Deyvith Castellanos	Juan Bernal Felipe Murcia	Jefferson Cardenas		se realiza ajuste de vibración y se instala nuevamente
	10		Hace falta la lampara led escalera.		Deyvith Castellanos	Juan Bernal Felipe Murcia	Jefferson Cardenas		**ya se está reparando**
	17-18		falta arandelas plasticasen ejes principales conjunto de balancines.		Deyvith Castellanos	Juan Bernal Felipe Murcia	Jefferson Cardenas		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad de Tmsa

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 23	26 - 27	21/05/2026	Caja de conexión y datos en mal estado, coraza de alimentacion en mal estado.		Deyvith Castellanos	Juan Bernal Felipe Murcia	Jefferson Cardenas		se verifica novedad, se evidencia desgaste normal
	28		Linea de vida con puntos de oxidacion.		Deyvith Castellanos	Juan Bernal Felipe Murcia	Jefferson Cardenas		se verifica novedad, se cambian los tornillos
	32		Tornillos de caja de Loop21 no corresponden		Deyvith Castellanos	Juan Bernal Felipe Murcia	Jefferson Cardenas		se verifica novedad, se cambian los tornillos
	Piezas d Recambio, bolso de herramientas		* Hace falta las 2 eslinga circular, longitud 1,0. * Hace falta una eslinga circular, longitud 4,0 * Cable de poliamida incompleto en su metraje. * Horquilla de seguridad falta 5, solo hay 15.		Deyvith Castellanos	Juan Bernal Felipe Murcia	Jefferson Cardenas		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 15	5	22/05/2026	Tornillería con oxidación		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	6	22/05/2026	señalética faltante en ménsula de carga		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	17-18	22/05/2026	se identifica ausencia de arandelas plásticas en ejes principales ascendente y descendente		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	20	22/05/2026	recoge cables balancines ascendente con oxidación		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	26	22/05/2026	caja de conexión y datos en mal estado		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		se cambian tornillos en mal estado
	28	22/05/2026	puntos de oxidación en línea de vida		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		se limpia puntos de oxido y se aplica anticorrosivo frio
	35	22/05/2026	chapa de cierre caja herramientas en mal estado		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	37	22/05/2026	Se evidencia balancin desalineado sentido ascendente y descendente		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		**novedad está programado su atención viernes 17 de julio y sabado 18 de julio**
	Piezas de recambio y obslo de herramientas	22/05/2026	**Faltante de herramienta:** *Eslinga de longitud 1,0 m en mal estado ya no hay. *Destornillador faltante DIN 265B. *Faltante 1 horquilla de seguridad 19/20.		Elkin Jaimes	Ricardo Fonseca	Andrés Hernández		**pendiente reposición de inventario**
TORRE 5	6	22/05/2026	Señaléticas de mensula en mal estado		Anderson Torres	Luis Rodriguez	Andrés Albarracín		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24
	28	22/05/2026	Línea de vida con oxidación		Anderson Torres	Luis Rodriguez	Andrés Albarracín		se limpia punto de oxido y se aplica galvanizante en frio
	10	22/05/2026	1 led de la lámpara de iluminación, no funciona		Anderson Torres	Luis Rodriguez	Andrés Albarracín		**ya se está reparando**
	32	22/05/2026	Tornillería de la caja Loop21 en mal estado		Anderson Torres	Luis Rodriguez	Andrés Albarracín		se cambian tornillos en mal estado
	6	21/05/2026	señalética en mensual no tienen.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		se instala señalética nueva inspección 250h semana 24

FORMATO RECEPCION COMPONENTE ELECTROMECANICO

N° TORRE	ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
TORRE 24	10	21/05/2026	luminación lámpara led solo funcionan 2.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		**ya se está reparando**
	17-18	21/05/2026	se evidencia ausencia de arandelas elásticas en ejes principales conjunto de balancines en las entradas.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		en las consideraciones técnicas emitidas por el fabricante no se considera el uso de dichas arandelas, y las actividades inherentes a las inspecciones de torres son responsabilidad Tmsa
	28	21/05/2026	línea de vida con puntos de oxidación.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		se realiza limpieza de oxido y se aplica galvanizante en frio
	34	21/05/2026	caja de conexiones electricas no es posible realizar verificación interna.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		se realiza apertura de caja de alimentación, se verifica estado de sus componentes, no se evidencia novedad
	35	21/05/2026	chapas de caja de herramientas en mal estado.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		**se solicitará desmonte de chapa al operador CableMovil en su etapa operativa para reparación**
	40	21/05/2026	tornillería sin marcación de torque.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		se realiza marcaje de tornillería
	41	21/05/2026	tornillería sin marcación de torque.		Anderson Torres	Gary Toro	Juan Gonzalez		se realiza marcaje de tornillería

FORMATO RECEPCION Y ENTREGA ESTACIONES

ITEM	FECHA	OBSERVACIONES	FOTOGRAFIA / EVIDENCIA	NOMBRE ENCARGADO CABLEMOVIL	NOMBRE ENCARGADO ODT	NOMBRE ENCARGADO TMSA	FOTO DE SUBSANACION	OBSERVACION DE SUBSANACION
9,14,19,26,28,33	11/06/2026	*Se evidencia fisuras y microfisuras en correas trapozoidales en posiciones 4 a la 15 *Se evidencia correa en mal estado posicion 10-11 *Se evidencia fisuras y microfisuras en correas trapozoidales en posiciones 4 a la 15 *Se evidencia fisuras y microfisuras en correas trapozoidales en posiciones 5 a la 9 *Se evidencia fisuras y microfisuras en correas trapozoidales en posiciones 11 y 12 *Se evidencia fisuras y microfisuras en correas trapozoidales en posiciones 1 a la 6		Elkin Jaimes	Carlos Rosario	Eduardo Gómez		no se cambia elemento debido a que su condición no representa riesgo para la operación y cumple con los criterios establecidos por el fabricante. no presentan ninguna de las siguientes condiciones "elongación","deshilachamiento".
35	11/06/2026	Se evidencia aguja W2 fuera de servicio		Elkin Jaimes	Carlos Rosario	Eduardo Gómez		aguja permanece fija desde contrato de operador cablemovil por fallas en el resorte del riel de acoplamiento.
47	11/06/2026	Se evidencia deformacion en estructura riel guia inicio y salida de las curvas F1 y F3, F2 a la salida FE1 a la salida y entrada de los transportadores FA3 y FA4.		Elkin Jaimes	Carlos Rosario	Eduardo Gómez		
48	11/06/2026	Se evidencia deformacion en biga (golpe) en riel de rodadura especificamente transportador F3.		Elkin Jaimes	Carlos Rosario	Eduardo Gómez		no se subsana novedad debido a que dicha deformación es producto de manipulación externa a la odt, en etapas previas a la recepcion del sistema.

ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTEO	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA
10370625	INTERRUPT.PROXIM.F2 GS(VERDE) PULSOR M18 9914-1736 ANALOG.	pcs	2	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11248402	CONTACTOR K3-18ND10.180 CA (1S) BENEDIKT&JAEGER	pcs	2	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10031064	CART.DE FUS.BT+AF TAM.1 200A 500V (ASAS CONDUCT.) CERÁMICO	pcs	6	3	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10873444	INSERTO P. FUSIBLE PLANO 15A DIN 72581 Nº ART.0913676 PHOENIX	pcs	20	3	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	6/07/2026
10637815	FUSIBLE SEMIC.690V FLUSH END 1250A BUSSMANN NO.ART.: 170M6466	pcs	16	4	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10593193	CARGADOR SKYLLA-TG 24/50 AJUSTADO VICTRON ENERGY	pcs	2	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	15/07/2026
10958637	FUENTE ALIM./CONM. QUINT POWER 10A QUINT-PS/3CA/24CC/10	pcs	2	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10015945	LLAVE DIN3110 EC30X 36 LLAVE DE 2 BOCAS CROMATIZADA	pcs	2	0		PENDIENTE	8/07/2026
10015986	LLAVE DIN 838 EC41X 46 LLAVE ESTR.2BOC.ACOD.CROMATIZ.	pcs	1	0		PENDIENTE	8/07/2026
10962859	CINTA MÉTRICA SOLA DOPP L=3M UNI-MATIC CON CLIP P. CINTURÓN	pcs	1	0		PENDIENTE	8/07/2026
10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX L= 200 DIN 5746 1000V AISLADO VDE	pcs	1	0		PENDIENTE	8/07/2026
10097560	JUEGO PUNZ.P.GRUPILLA, 6 PIEZ. 3/4/5/6/8/10 PORTADOR D.PLÁST.	pcs	1	0		PENDIENTE	8/07/2026
10016858	PISTOLA DE ENGRASADO TIPO PALANCA MATO4500 CON TUBO300MM 4044	pcs	2	1	USADO SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10013177	PISTOLA APLICADORA DE SILICONA CON AVANCE HEXAGONAL	pcs	1			PENDIENTE	
10579023	LLAVE DE ESTR. DIN3118 EC24X27 DE DOS BOCAS ABIERTAS, INCROM.	pcs	1			PENDIENTE	
10824781	CAJA DE HERRAMIENTAS C.MALETÍN EN LA BARANDILLA	pcs	4	4	TUNAL SIN NOVEDAD, JUAN PABLO SIN LLAVE, MANITAS SIN LLAVE, MIRADOR SIN LLAVE	PENDIENTE	9/07/2026
10859679	CAJA D.HERRAMIENTAS P.ESTACIÓN COMPLETA CON HERRAMIENTAS	pcs	4	4	TUNAL: USADAS , FALTA BRISTOL # 2, 2 ESPACIOS VACIOS. JUAN PABLO: USADAS, 2 ESPACIOS VACIOS. MANITAS: FALTA LLAVES BTISTOL, GALGAS Y LAVE EXPANSIVA, 2 ESPACIPS VACIOS. MIRADOR: USADAS, FALTA MARTILLO, Y LLAVE BRISTOL 6, 2 ESPACIOS VACIOS	PENDIENTE	9/07/2026
11317735	TORNILLO ISO 4017-8.8U M16X200 GIC TORN. HEXAG.	pcs	4	3	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11136880	TUERCA HEXAG. ISO 4032-8 M16 GIC	pcs	4			PENDIENTE	
10872696	ARANDELA DIN 7349-17 300HV, FLZNNC-720H-L, REV.DE ZINC LAM.	pcs	4	3	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11183638	LEVANTACABLE CONJ.D.POL.DE ENTRADA T-1449 TECNOSERVICE	pcs	1	1	USADO, TORNILLO Y RODAMIENTO DAÑADO SIN NOVEDAD	PENDIENTE	6/07/2026
10095188	CINTA ADH.PVC 766 AMAR./NEGRA 50MM x 33M 3M	pcs	3	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	9/07/2026
10366305	CALIBRAD.PARA APRIETE UNIG A CON VISUALIZACIÓN DIGITAL	pcs	1	0	DISPOSITIVO EN CALIBRACION	PENDIENTE	7/07/2026
11445159	POLIPASTO SILVERLINE STIRA S 1,0T 8M EL./3M MANUBRIO HEBETECH	pcs	1	0		PENDIENTE	8/07/2026
10824702	SUSPENSIÓN P. BARRA 120 COMPL. P.BARRA DE SUSPENS.120 DT/AGA	pcs	1			PENDIENTE	
10824714	SOPORTE PARA UNIDAD DE SUJECIÓN GIC	pcs	1			PENDIENTE	
10824724	UNIDAD DE SUJECIÓN 120 PARA SUSPENSIÓN 120	pcs	1			PENDIENTE	
10824751	CONTRAMORDAZA BG 120 P.UNIDAD D.SUJECIÓN 120/100/80	pcs	1			PENDIENTE	
10864691	VEHÍCULO DE SUSP. COMPL. A 108 P. PINZA DESEMBRAGABLE A 108	pcs	3			PENDIENTE	
10418000	PERF.PROT.B. R=150 TORN.INCL. P.ZÓCALO DE HORMIGÓN CLD/MGD	pcs	2			PENDIENTE	
10044918	TORN.HALFEN 50/30 4.6 M16X 50 TORNILLO HALFEN C.TUERCA, GALV	pcs	8		8 EN PRESTAMO A DOPPELMAYR, AUTORIZADO POR LEONARDO HENRIQUEZ	PENDIENTE	
10872696	ARANDELA DIN 7349-17 300HV, FLZNNC-720H-L, REV.DE ZINC LAM.	pcs	8	0		PENDIENTE	7/07/2026
10019763	TIRFOR HIT 16 CHAMPION 20M TRACCIÓN: 1600 KG	pcs	2	2	1 COMPLETA Y1 UND SIN GUAYA, PRESTAMO A DOPPELMAYR AUTORIZO LEONARDO HENRIQUEZ	PENDIENTE	8/07/2026
10430270	ANTICAÍDAS "FALLBLOC 2" VERIFIC. CE, C.MANUAL DE SERV.	pcs	2			PENDIENTE	
10531665	LEVANTAPOLEAS 4P/4S 401C/420C BÁSC.2P.AC60/110 526-780 GALV.	pcs	4	0		PENDIENTE	
11313174	PISTOLA DE ENGRASAR C. PALANCA DE MANO C.PZ ANGUL. P. MANT.CP	pcs	1			PENDIENTE	
10739043	ANGULO DE CRUCE EMBRAGUE 2.701850.2 90°DREHBAR TECALEMIT	pcs	1			PENDIENTE	
10542044	TUERCAS AUTOFIJ.D.RECAMBIO M20 STOVER,P.PERNO POLEA 401C;420C	pcs	1			PENDIENTE	
10542077	TUERCAS AUTOFIJ.D.RECAMBIO M24 INLOG, P. EJE DE POLEA 501C	pcs	1			PENDIENTE	
10117503	PUNZON P.GRUPILLA ESP.DIA. 8.0 CON ESCALON (SEGUN DIN 6445)	pcs	1			PENDIENTE	
11183789	LLAVE DINAMOMÉTRICA 10-50NM VDE CON 1/2" ACC. 984350 KNIPEX	pcs	1	0	USADO, PENDIENTE CERTIFICADO DE CALIBRACION	PENDIENTE	8/07/2026
10130582	LLAVE DINAMOM. 4550 60-300NM C.ACCION. 1/2" TORCMAST.RAHSOL	pcs	1	0	PENDIENTE CERTIFICADO DE CALIBRACION	PENDIENTE	8/07/2026
10012358	PIEZA DE ACOPLAMIENTO DIN3123 MACHO 3/4"- HEMBRA CUADR. 1/2"	pcs	1			PENDIENTE	
10000313	ANILLO RETEN. DIN 471 30X2 FOSFAT.	pcs	10	7	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10323091	APARATO DESLIZ.PINZA 35KN DM52 P.PINZA DESEMBR.DT108 COMPL.	pcs	1			PENDIENTE	
10322832	APARATO DESLIZAM.PINZAS 35KN PARA DIA.CABLE 38-56MM	pcs	1			PENDIENTE	
10334683	ADAPTADOR P.PINZA DT108/A108-C P.35KN P.AP.DESL.PINZA,41-56MM	pcs	1			PENDIENTE	
10153905	MANDÌB.SUJ.INFER. DIA.52 35KN P.APARATO DE DESLIZAM.PINZAS	pcs	1			PENDIENTE	
10324094	APARATO DE CONTROL P.APAR.DP P.APAR.DESLIZAM.PINZAS 25+35KN	pcs	1			PENDIENTE	
10324108	BARRA DESLIZAM. DM 52 P.PINZA DESEMBRAGABLE, DISP	pcs	1			PENDIENTE	
10969865	PERNO DE CONTROL DIÁ.52 -10% L=260 GALVAN.	pcs	1			PENDIENTE	
11094201	DISP.D.APERTURA A108 CABLE P. PINZA EN CABLE	pcs	2	0		PENDIENTE	6/07/2026
10406773	LLAVE DINAMOM. 8564 750-2000NM C.ACCIONAM. 1 PULG. RAHSOL	pcs	1	0	EN CALIBRACION	PENDIENTE	7/07/2026
11530241	LLAVE DINAMOMÉTRICA 4550 110-550NM C. 3/4" ACC. TORCOFIX RAHS	pcs	1			PENDIENTE	
11420025	BOLT ISO 4017-10.9U M20X50 HDG HEXAG. BOLT	pcs	16	12	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026

ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTEO	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA
11536090	INSTRUM. MED. SPM LEONOVA EMERALD EME400 SPM HDM/HDC	pcs	1	1	USADO, PENDIENTE CERTIFICADO DE CALIBRACION	PENDIENTE	10/07/2026
	MAGNETÓGRAFO PARA VERIFICACIÓN DEL CABLE PORTADOR TRACTOR (LF+LMA) SOFTWARE LIBRE PARA ADQUISICIÓN DE CUALQUIER DIÁMETRO DE CABLE.	pcs	1	1	USADO SIN NOVEDAD, PENDIENTE CERTIFICADO	PENDIENTE	9/07/2026
11441696	POLIPASTO SILVERLINE STIRA S 3,0T 8M EL./3M MANUBRIO HEBETECH	pcs	2	2	PENDIENTE CERTIFICADO DE CALIBRACION	PENDIENTE	9/07/2026
11507409	POLIPASTO SILVERLINE STIRA S 5,0T 3M CARR./2,5M HANDK HEBETEC	pcs	2	2	PENDIENTE CERTIFICADO DE CALIBRACION	PENDIENTE	9/07/2026
10689732	HERRAM.DE SUJEC. P.CORREAS UNI GALVANIZADA, COMPUESTA DE:	pcs	1			PENDIENTE	
11155135	HERRAMIENTA DE AJUSTE PARA COJINETE DE NEUMÁTICO UNIG	pcs	1			PENDIENTE	
10560637	HERRAMIEN.AJUSTE RPD 420C/501C PARA CABLE DIA.49-60	pcs	1			PENDIENTE	
10535996	CALIBRE AJUST. X=15MM TIPO 420 C PARA RPD	pcs	1			PENDIENTE	
10384367	CUBIERTA DESACTIVACION 115X92 PARA RPD	pcs	1			PENDIENTE	
11178143	ACEITE P.ENGRANAJES SP 80W-90 BARRIL A 210L	pcs	4	0	NO SE ENTREGA 400 LT (2 UNIDADES) DE ESTE ELEMENTO PORQUE FUE USADO POR LA UTCB SEGÚN EL ACTA # ACABMANT-002 DEL 25 DE AGOSTO DE 2019	PENDIENTE	15/07/2026
11178142	ACEITE P.ENGRANAJES ACEITE DE ENGRANAJES SP 80W-90, BARRIL A 60L	pcs	2			PENDIENTE	
10722369	CAJA INTERR.AUX. ZCK-J1H29S33 INTERR.ESPEC. CON VÁLV.INTEGR.	pcs	20	14	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10875889	DÍNAMO TACOMÉTR. TDP 0,2LT-1 IP56, MAX.4000RPM, 0.15V/MIN-1	pcs	2	1	1 UND USADO, SE RECIBE SIN PRUEBAS NI VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO. CABLEMOVIIL SAS NO ASUME RESPONSABILIDAD POR FALLAS PREEXISTENTES Y EL ELEMENTO SERA DEVUELTO A TRANSMILENIO SA. EN LA MISMA CONDICION QUE FUE RECIBIDO.	PENDIENTE	6/07/2026
10020271	ZAPATA FRENO 260X120/20 COMPL. P.FRENO EMERG. 50KN	pcs	4			PENDIENTE	
11200310	POLEA V 500 CL.100 DIÁ.505 C.ARO LAT. ACERO SIN NIPLE ENGRASE	pcs	8	8	3 USADAS SIN EJE, 5 USADAS CON EJE	PENDIENTE	8/07/2026
10501989	RRB DIN 625/1- 6310-2RS1-C3GLE VT210 (90% +/-5%)ROD.RAN.BOLAS	pcs	140	114	NO SE ENTREGA 6 UNIDAD DE ESTE ELEMENTO PORQUE FUE USADO POR LA UTCB SEGÚN EL ACTA # ACABMANT-002 DEL 25 DE AGOSTO DE 2019	PENDIENTE	15/07/2026
10000313	ANILLO RETEN. DIN 471 30X2 FOSFAT.	pcs	160	0		PENDIENTE	7/07/2026
11423097	PASADOR DE SUJECIÓN CONNEX 10X50 S REVEST. GEOMET 321	pcs	160	80	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
11092123	TENSOR P.CORREAS ALUM. 14 GRADOS PERFIL D.CORREA XPC	pcs	4	2	USADOS SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10305638	CONSOLA CORREA UNIG FVZ	pcs	4	2	USADOS SIN NOVEDAD(SOPORTE TENSOR)	PENDIENTE	8/07/2026
10622234	RUEDA NEUMAT.COMPL.DOPPELM. G PRESIÓN 3,5 - 5,0 BAR	pcs	80	45	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10082482	CORREA TRAP.XPC LA=1900 MM DIN 7753-1	pcs	564	531	NO SE ENTREGA 2 UNIDAD DE ESTE ELEMENTO PORQUE FUE USADO POR LA UTCB SEGÚN EL ACTA # ACABMANT-002 DEL 25 DE AGOSTO DE 2019	PENDIENTE	15/07/2026
10117555	FILTRO 0240 D 010 ON HYDAC	pcs	2	0		PENDIENTE	7/07/2026
11519546	MOTOR REPUESTO EL. FKF 450L/6C BS45 CPL. BS 45/CDA=245 1 CAJA D.BORNES	pcs	1	0		PENDIENTE	9/07/2026
11672776	VENTANA DELANTERA 1850x1849x5 H=1570mm, PC, 5mm	pcs	12	11	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
11240650	VENTANA DE PUERTA 332x5 H=928mm, PC gris 133	pcs	12	11	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
11104812	PROTECCION DE ESQUINA H=539mm	pcs	24	22	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11149155	TORNILLO i-6kt A2 5.5 x50	pcs	200	193	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11008206	Tapon de goma; automata puerta	pcs	80	71	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11411937	Cierre girable EMKA 4kt 8mm	pcs	24	23	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11187776	Junta de puerta, centro izquierda, L=2055mm VMQ	pcs	12	11	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
11187775	Junta de puerta, centro derecha, L=2055mm VMQ	pcs	12	9	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10000313	ANILLO RETEN. DIN 471 30X2 FOSFAT.	UND	40	0		PENDIENTE	7/07/2026
10247398	ARANDELA SEGUR. NORDLOCK NL8 RECUB.DE LA	UND	40			PENDIENTE	
11120363	PASADOR DE SUJECION CONNEX 6X45 REVEST.	UND	620	10	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
11423097	PASADOR DE SUJECIÓN CONNEX 10X50 S REVES	UND	620	0		PENDIENTE	8/07/2026
10571303	PASADOR DE SUJECIÓN CONNEX 6x55 S REVEST	UND	600	67	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10020271	ZAPATA FRENO 260X120/20 COMPL. P.FRENO E	UND	2			PENDIENTE	
10639368	INTERRUPTOR LLAVE B5SATT 0 DOALU DIA.30	UND	1	1	FALTA LLAVE	PENDIENTE	6/07/2026
10639344	PULSADOR NEGRO B5D SW DO ALUM. DIA.30 BE	UND	1	0	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	6/07/2026
10274814	CABEZAL I.FIN.R.AL FR.ZCK-E676 TAQUÉ DE	UND	15	12	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10501992	RRB DIN 625/1- 6307-2RS1-C3GLE VT210	UND	30	8	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10560637	HERRAMIEN.AJUSTE RPD 420C/501C PARA CABL	6 PIEZAS	1			PENDIENTE	
10867451	CONTACTOR AF300-30-22 1SFL557001R7022 AB	UND	1	0		PENDIENTE	7/07/2026
10247957	INTERR.DE PROXIM. N°ART.I95007 I9-3023BB	UND	30	28	SIN NOVEDAD, 1 EN PRESTAMO A DOPPELMAYR AUTORIZADO POR LEONARDO HENRIQUEZ	PENDIENTE	6/07/2026
11152201	INSERTO P. FUSIBLE PLANO 20A DIN 72581 N	UND	10	9	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	6/07/2026
10261450	FILTRO 0030 D 005 ON HYDAC	UND	2	0		PENDIENTE	7/07/2026
10258849	POLIPASTO DE TRINQUETE KITO 9T CADENA L=	UND	2	0		PENDIENTE	8/07/2026
10461436	GUARN.DE GOMA 403 403X 93/R38	UND	10	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10434107	GUARN.DE GOMA 420 422X 93/R34	UND	30	27	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10160318	NEUMÁTICO "DOPPELMAYR-K"	UND	321	57	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026


ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTEO	OBSERVACIONES	ESTADO	FECHA
10572111	DISP.P.REEMPLAZO DE COJINETES P. POLEAS	UND	1			PENDIENTE	
10012714	NUEZ LARGA ANLL30X3/4" L K32L-30 PARA LL	UND	1	0		PENDIENTE	8/07/2026
10016858	PISTOLA DE ENGRASADO TIPO PALANCA MATO45	UND	3	0		PENDIENTE	8/07/2026
10317357	ARO DE GOMA 290X44 SIN RANURA PARA POLEA	UND	3	2	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10796747	TUERCA AUTOFIJ. INLOC - 8 M20	UND	100	20	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10252061	TUERCA AUTOFIJ. INLOC - 8 M24 C.ELEM.DE	UND	100	2	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10450482	ZAPATA DE FRENO 190X120X27	UND	4	2	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10870308	POLEA DE LINEA 501	UND	10	10	USADAS CON POROSIDAD EN EL CUERPO, 1 UND SIN EJE	PENDIENTE	8/07/2026
10539289	GUARN. DE GOMA C 258X69 / R30/CONCAV.	UND	8	2	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11023367	APOYO NEUMAT. TRANSP. ACCIONAMIEN. POR F	UND	10	9	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10441667	FORRO DE FRICCION DT,AGA	UND	60	35	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10000452	CHAVETA 4.0X36 GALVAN.	UND	200			PENDIENTE	
11825068	DC - DC CONVERTER 12V 2,5A 30W	UND	5	3	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11825066	SWITCHING POWER SUPPLY 5000W 48V (CLOSED	UND	1	1	USADO PENDIENTE VERIFICAR CON TICS EL ESTADO	PENDIENTE	8/07/2026
11820922	BATTERY CHARGER BE-DC-USV-24-10 24VDC/10	UND	10	6	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11820912	LACOM L-322AGN WIRELESS (BULK 10) BUSSIN	UND	10	3	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11820900	SWITCHING POWER SUPPLY 240 WATT 48V (DIN	UND	2	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11787591	BATTERY BE-12V-55AH-12-FT	UND	10			PENDIENTE	
11675189	SOLAR MODULE 100W MONO / CL-100WM	UND	6	4	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
11644233	HEMISPHERICC IO-INDOOR CAMERA FOR CEILIN	UND	5	4	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11644226	FO DUPLEX PATCHCABLE 9/ 125, ST/LC, 1M	UND	2			PENDIENTE	
11644223	SERVER-APPLIANCE PERFONRMANCE V6 USB-BAC	UND	1	1	USADO PENDIENTE VERIFICAR CON TICS EL ESTADO	PENDIENTE	7/07/2026
11644219	CORDIS SKS-SERVER FOR 19"	UND	1	1	USADO PENDIENTE VERIFICAR CON TICS EL ESTADO	PENDIENTE	9/07/2026
11515924	PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA	UND	2	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	9/07/2026
11312797	DISPOSITIVO DINAMOMÉTRICO MANUAL KMG-LIT	UND	1	1	PENDIENTE CERTIFICADO CALIBRACION	PENDIENTE	7/07/2026
11304626	NIPLE DE ENGRASE EN 6 DIN 714	UND	100	31	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11152738	PIEZAS P. INSPECCION A108-C	UND	326			PENDIENTE	
11152479	CHAVETA 4.0X40 GALVAN.	UND	100	96	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
11128792	POLEA DE RODADURA DIA. 180 MM7SN pre mou	UND	364	248	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10861892	POLEA GUIA DIA. 158 MM A104/8VM Pre moun	UND	364	278	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
10629356	HYDRAULIC FILTER UNIT	UND	1	1	USADO, PENDIENTE VERIFICAR ESTADO	PENDIENTE	9/07/2026
10621876	SACO DE VIENTO	UND	3			PENDIENTE	
10487942	MANDIBULA MOVIL A 108-C DIA.52 MECANIZ.C	UND	5	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	8/07/2026
10487923	MANDIBULA FIJA A 108-C DIA.52 MECANIZ.CA	UND	5			PENDIENTE	
10338999	TUBO PROT.P.CABLE TORN_20-V0	MTS	1			PENDIENTE	
10292406	TUERCA ALMENADA DIN 979-04 M30X2	UND	60	58	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	7/07/2026
1178590	BATTERY BE-12V-45AH-10	UND	4	4	USADAS PENDIENTE VERIFICAR ESTADO	PENDIENTE	7/07/2026
10484451	GRASA LUBRICANTE MOBILITH SHC 460 CART.	UND	5	4	SIN NOVEDAD, (4 CANECAS DE 16 KL)	PENDIENTE	9/07/2026
11424859	ACEITE HIDRAULICO DOPP SYNT 70+8 (210LT)	BARRIL	2			PENDIENTE	
10686238	LOCTITE/WEICON - TRABAROSCAS 50ML	UND	20	7	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	16/07/2026
LUB0032	ACEITE KLUBERSYNT EG 4 -220 - MOTORES (5GL)	UND	1			PENDIENTE	
LUB0036	SILICONA LOCTATITE CRC GL - IND MULTIPRO (5GL=19LT)	UND	6	264	(30GL=113.4 LT=284 LATAS DE 400 ML)	PENDIENTE	7/07/2026
LUB0034	MOBIL 15W 40 -MOTOR EMERGENCIA Y PLANTAS	BARRIL	2			PENDIENTE	
LUB0010-EX	GRASA MOBILGREASE XHP 222 (16KG)EXCENTO	UND	2	1	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	9/07/2026
RAL5003	PINTURA AZUL ESMALTADA PARA RESORTES DE (1/4 GL)	UND	2	1	SIN NOVEDAD, UN TARRO DE UN GALON	PENDIENTE	8/07/2026
RAL7016	PINTURA GRIS ESMALTADA PARA RESORTES DE (1/4 GL)	UND	1	0		PENDIENTE	8/07/2026
V220C	SHELL GADUS S3 220 - TORRES (18KL)	UND	11	6	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	9/07/2026
LUB0033	SHELL SPIRAX S2 80W-90 - REDUCTOR (210LT)	BARRIL	4			PENDIENTE	
12022560	TARJETA MCCU 3.0 SYSTEM,	UND	12	2	SIN NOVEDAD	PENDIENTE	9/07/2026

RECEPCION ENTREGA ELEMENTOS FUERA DEL ACTA CONTRACTUAL						
ID	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	CONTEO	OBSERVACIONES	ESTADO
10688148	Balancin Poleas 501 Soporte	1	UND			PENDIENTE
11436807	Balancin Polea 501 Compresion	1	UND			PENDIENTE
11437155	Balancin Polea 501 Compresion	1	UND			PENDIENTE
10467111	Balancin Combinado	1	UND			PENDIENTE
10688150	Balancin Poleas 501 Soporte	1	UND			PENDIENTE
11495893	Aguja de entrada a Parking	1	UND	1	Nuevo sin Uso, SIN MOTOR HUSILLO	PENDIENTE
10396994	Plataforma de Mantenimiento de Pilonas	13	UND		Usado Funcional - Partes con Oxido	PENDIENTE
------	Regla de medicion de pines de carga	1	UND		Sin Novedad Usado Funcional	PENDIENTE
------	Regla de medicion de polea de cierre de puertas	1	UND		Sin Novedad Usado Funcional	PENDIENTE
------	Escalera Zarges de mantenimiento de parking	1	UND	1	PENDIENTE CERTIFICADO	PENDIENTE
10530985	BREAK FORK SWITCH	1	PCS		Nuevo	PENDIENTE
11456353	BREAK FORK DIA 4,5 L=122 STAT,B	30	PCS		Nuevo	PENDIENTE

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE



TransMiCable-CTO 2671-23

CONS	Pre Check	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SECC	FECHA DE INSTALACIÓN	CANT	ID N°	FABRICANTE	Costo	Hrs-OP	T.E.V.U	SERIAL	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	Mantenimiento	Proximo Mantenimiento
1	OK	CCO ThinkStation P510 Platform Specifications ..Intel C612 Platform Controller Hub (PCH) Up to one 145W Intel Xeon E5-2600 v4 or E5-1600 v4 family processors. 22 cores up to 2.2GHz, 16 cores up to 2.6GHz, 14 cores up to 2.6GHz, 12 cores up to 2.2GHz, 10 cores up to 2.4GHz, 8 cores up to 3.4GHz, 6 cores up to 3.6GHz, 4 cores up to 3.7GHz Or up to one Intel Xeon E5-2600 v3 or E5-1600 v3 processors (not available in EMEA).	TUNAL	SOFTWARE	Dic 28/2023	1	N/A	LENOVO	S/D	10176	5-7 Años años	N/A	 	Febrero del 2026	Proximo Operador
2	OK	GMAO Procesador: Pentium o superior Memoria RAM: Mínimo 4 GB de RAM Sistema Operativo: Windows 2012 o superior Servidor Web: Internet Information Services (IIS) 6.5 o superior Características HTTP: Asegurar que las características HTTP estén activadas en IIS .NET Framework: Versión 3.5 o superior Espacio en Disco Duro: 50 MB libres como mínimo, para la aplicación, software de base y el componente TD Mobile (runtime) Certificado SSL: Necesario si se utiliza una IP pública para acceder al módulo web Acceso a Red Corporativa: El servidor debe tener acceso a los servidores de base de datos y archivos adjuntos	TUNAL	SOFTWARE	Dic 28/2023	1	N/A	HP	S/D	10176	5-7 Años años	8CQ224013C		Febrero del 2026	Proximo Operador
3	OK	LOOP21 Sistemas de comunicación en cabinas (ZABBIX –LOOP21)	TUNAL	SOFTWARE	Dic 28/2023	1	N/A		S/D	10176	5-7 Años años	N/A		Febrero del 2026	Proximo Operador
4	OK	BIRAL	TUNAL	SOFTWARE	Dic 28/2023	1	N/A	LENOVO	S/D	10176	5-7 Años años	Equipo : SMJ0KHJWP Pantalla: V90C9DT6		Febrero del 2026	Proximo Operador

Nota: Las Licencias pertientes a plataformas de software estan vigentes bajo la vigencia del contrato

* El equipo Servidor de Infomante, pertenece a inventario de Rolita.
* El equipo Biral, pertenece a inventario Rolita.
* El equipo de Telefonia Cable, pertenece a inventario Rolita.





LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE



Inventario Salvedades TransMiCable-CTO 2671-23

CONS	Estado	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SECC	FABRICANTE	SERIAL	FECHA DE INSTALACION	TIEMPO ESTIMADO DE VIDA	TIEMPO ACTUAL	TIEMPO DE VIDA REMANENTE AÑOS	Bueno	Regular	Malo	Registro Fotográfico - Equipos TIC'S	Mantenimiento	Proximo Mantenimiento
13	OK	NVR HEN64304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP	TUNAL	CCTV	Honeywell	A170500417	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
14	OK	NVR HEN16304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP	TUNAL	CCTV	Honeywell	B297000211	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
15	OK	NVR HEN64304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP	TUNAL	CCTV	Honeywell	B297000209	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
16	OK	NVR HEN64304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP	TUNAL	CCTV	Honeywell	B297000207	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
17	OK	NVR HEN64304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP	TUNAL	CCTV	Honeywell	A170500440	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
18	OK	NVR HEN16304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP		CCTV	Honeywell	B297000212	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
19	OK	NVR HEN64304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP	TUNAL	CCTV	Honeywell	B297000208	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
20	OK	NVR HEN64304 NVR, 64CH, H265 4K 12MP	TUNAL	CCTV	Honeywell	A170500443	2018	10 años	7 años	3	X				5/12/2025	15/06/2026
236	OK	Mezclador	MANITAS	Auditorio	Sound Craft	K179N0504534	2018	8 años	7 años	1	X				5/12/2025	15/06/2026
236	OK	Equipamento loop21 cabina 25	N/A	Server	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 38	N/A	Server	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 40	N/A	Server	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 42	N/A	Server	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 85	N/A	Server	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 18	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 61	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 72	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 73	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 90	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 92	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 93	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 112	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 125	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 126	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 128	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 142	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 143	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 151	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 157	N/A	Baterias	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 39	N/A	Acces Point	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Equipamento loop21 cabina 162	N/A	Acces Point	Dopplemayr	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Entrega documentación funional Fibra Optica hilos activos-respaldo	N/A	validación documental pruebs Fibra optica	UTP-Patch panle	N/A	2018	10 años	7 años	3	X					
236	OK	Validación Puntos de red intermitencias estaciones tunal,juan pablo,mirador ,manitas	N/A	Puntos de red intermitencia oficinas		N/A		10 años	7 años	3	X					
