INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COMPONENTES

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA DE LA CONVENCIÓN, MEDIANTE INTERVENCIONES INMEDIATAS Y PUNTUALES DESTINADAS A PREVENIR EL DETERIORO Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FÍSICA DEL INMUEBLE (BIC)

MINIMA CUANTÍA No. MC 008 2026

GENERALIDADES

Innovación Colombia S.A.S. ejecutó las actividades correspondientes al proyecto de apuntalamiento preventivo y temporal de la estructura de cubierta de la Casa de la Convención, inmueble declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional y ubicado en el Centro Histórico de Rionegro.

La intervención se desarrolló con el propósito de atender las condiciones de vulnerabilidad estructural evidenciadas durante la evaluación técnica, las cuales identificaron un deterioro progresivo de los elementos de madera ocasionado por el ataque de termitas, la humedad prolongada y la pérdida de capacidad resistente de varios componentes de la cubierta.

Teniendo en cuenta la importancia patrimonial del inmueble y el riesgo existente sobre su estabilidad, Innovación Colombia S.A.S. ejecutó el suministro, transporte, instalación y aseguramiento de un sistema de apuntalamiento temporal mediante guaduas estructurales, garantizando el soporte de las zonas comprometidas y contribuyendo a disminuir el riesgo de colapso parcial o total de la cubierta mientras se desarrollan las intervenciones definitivas de restauración.

Las actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, aplicando procedimientos constructivos adecuados para la protección del patrimonio cultural, priorizando la seguridad de la edificación, de los trabajadores y de las personas que hacen uso del inmueble.

Con la ejecución de este proyecto se logró estabilizar temporalmente la estructura de cubierta, controlar el riesgo inmediato asociado al deterioro de los elementos estructurales y preservar las condiciones necesarias para la conservación del inmueble hasta la realización de las obras de recuperación definitiva.

OBJETIVO

Garantizar la ejecución segura de las actividades de apuntalamiento preventivo y temporal de la estructura de cubierta de la Casa de la Convención, mediante la implementación de medidas de prevención y control de riesgos, el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el uso adecuado de los elementos de protección personal y la aplicación de prácticas de trabajo seguras, con el fin de proteger la integridad de los trabajadores, preservar la estabilidad del inmueble y prevenir incidentes y accidentes durante el desarrollo de la intervención

ALCANCE DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

- Identificación de peligros y valoración de los riesgos asociados a las actividades del proyecto.
- Implementación de medidas de prevención y control para los riesgos identificados.
- Inducción y capacitación del personal en normas y procedimientos de trabajo seguro.
- Verificación de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social y entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Inspección de herramientas, equipos y áreas de trabajo antes y durante la ejecución de las actividades.
- Señalización y delimitación de las zonas de intervención para proteger a trabajadores y terceros.
- Supervisión del cumplimiento de los lineamientos del SG-SST y de la normatividad vigente durante la ejecución del proyecto.

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS.

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

- En cuanto a la identificación de Peligros evaluación y valoración de riesgos, de donde se identificarán los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa.
- En cumplimiento de la normativa vigente, se realizó la Autoevaluación Inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando el nivel de cumplimiento del contratista frente a los Estándares Mínimos establecidos.
- La evaluación consideró los componentes administrativos, operativos y de mejora continua, permitiendo identificar el estado inicial del sistema y las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento integral.
- Durante el periodo se continuó con la aplicación y actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPEVR).

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades de apuntalamiento preventivo y temporal de la estructura de cubierta de la Casa de la Convención, Municipio de Rio Negro se contó con un equipo interdisciplinario de trabajo conformado por personal técnico, operativo y de apoyo, quienes desarrollaron las labores en concordancia con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

DATOS PERSONALES		DATOS SEGURIDAD SOCIAL		
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
MIGUEL PABON GELVEZ	91471147	MAESTRO DE OBRA	SURA	SURA
GUILLERMO TORO B	3313502	INGENIERO CIVIL	SURA	SURA
ADRIAN ANDRES QUINTERO MENDEZ	1035234316	OPERARIO DE OBRA	SURA	SURA
CARLOS ENRIQUE RODAS HOYOS	8333038	MAESTRO DE OBRA	SURA	SAVIA SALUD EPS
JUAN CARLOS RODAS URREGO	1036599535	OPERARIO DE OBRA	SURA	SURA
WILSON ESTEBAN CIRO P	1128402411	INGENIERO CIVIL	SURA	NUEVA ESP
MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA	1054561956	PROFESIONAL SST	SURA	SALUD TOTAL
JORGE ENRIQUE VELASQUEZ PEÑA	93418855	APOYO SST	SURA	SURA
LISNELIA ANAYA URBINA	37557438	OPERARIO DE OBRA	SURA	NUEVA ESP

Durante la ejecución del proyecto se garantizó que todo el personal vinculado contara con afiliación activa al Sistema General de Seguridad Social (EPS, ARL, AFP y demás entidades que aplicaran), en cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente, previo al inicio de las actividades, cada trabajador recibió la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual se socializaron los riesgos propios del proyecto, las medidas de prevención y control, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), los procedimientos de trabajo seguro y el plan de atención de emergencias. Asimismo, se realizó el reconocimiento del área de trabajo para identificar las condiciones del sitio, los peligros presentes, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y las medidas de seguridad establecidas, garantizando que el personal desarrollara sus labores de manera segura y conforme a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

AFILIACIÓN DE PERSONAL Y ANULACIÓN POR NO INGRESO A OBRA

Durante la ejecución del proyecto también se realizaron procesos de afiliación al Sistema de Seguridad Social para personal que se tenía previsto vincular a las actividades de obra. En cumplimiento de los requisitos contractuales, dicho personal fue postulado y se solicitó su respectivo ingreso a las instalaciones. Sin embargo, estas personas finalmente no se presentaron a laborar debido a eventualidades manifestadas por ellas mismas, por lo que no hicieron ingreso efectivo al proyecto. En consecuencia, la empresa procedió a realizar la anulación de las afiliaciones correspondientes, garantizando la actualización de la información y el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

ANEXOS FOTOGRAFICO DE RECURSOS HUMANOS

ARL | sura

Medellín, 26 de Junio de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INNOVACION COLOMBIA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 RIESGO 5			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96%		
C91471147	PABON GELVEZ MIGUEL	05/05/2026		51168221	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C3313502	TORO B GUILLERMO	05/05/2026		13721821	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C8333038	RODAS HOYOS CARLOS ENRIQUE	26/06/2026		138W231e	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1036599535	RODAS URREGO JUAN CARLOS	26/06/2026		x167d165	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C1128402411	CIRO PIEDRAHITA WILSON ESTEBAN	14/05/2026		E1461081	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C98418865	VELASQUEZ PEÑA JORGE ENRIQUE	29/05/2026		kl230JBo	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C37557438	ANAYA URBINA LISNELIA	26/05/2026		14918322	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
Centro de trabajo: 0000002001 ADMINISTRATIVO			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96%		
C1064561966	MARTINEZ GARCIA MARIA ALEJANDRA	01/04/2026		59150P15	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C680126626177458S3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/06/2026 12:44:13 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.253.232.40, 192.230.104.15, 172.16.42.57

Anulación

Reporte de anulación

< Regresar

Contrato	Documento	Empresa
096182219	N900693735	INNOVACION COLOMBIA SAS

Coberturas borradas exitosamente para el trabajador.

Doc. de identidad	Nombre trabajador	Inicio de cobertura	Fin de cobertura	Tipo Cotizante	Código de transacción
C1048441357	RAMIREZ BARRIOS ARMANDO JOSE	19/05/2026		DEPENDIENTE	14721421

ARL

Reporte de anulación

< Regresar

Contrato	Documento	Empresa
096182219	N900693735	INNOVACION COLOMBIA SAS

Coberturas borradas exitosamente para el trabajador.

Doc. de identidad	Nombre trabajador	Inicio de cobertura	Fin de cobertura	Tipo Cotizante	Código de transacción
C1138079209	HERNANDEZ GOMEZ SEBASTIAN DAVID	19/05/2026		DEPENDIENTE	58203401

sura Gestión administrativa Gestión de riesgos laborales Mi resumen RU Ruben Karina Forero Munoz Última con... 28/05/26

ARL

Reporte de anulación

< Regresar

Contrato	Documento	Empresa
096182219	N900693735	INNOVACION COLOMBIA SAS

Coberturas borradas exitosamente para el trabajador.

Doc. de identidad	Nombre trabajador	Inicio de cobertura	Fin de cobertura	Tipo Cotizante	Código de transacción
C16367028	MURILLO FENEIS	05/05/2026		DEPENDIENTE	197140ac

Fecha Proceso 01/06/2026 15:15:40 **Dirección IP** 191.156.231.127, 192.230.104.15, 172.16.42.57

EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION EN SST

1. Califique el cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente tabla:
2. **Insatisfactorio:** No tiene claros los conocimientos. Existen múltiples aspectos a mejorar.
3. **Bueno:** Muestra claros conocimientos, pero aún puede mejorar más.
4. **Alto desempeño:** Muestra total dominio del conocimiento, puede enseñar y compartir a los demás.

MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA 1054561956

ADRIAN ANDRES QUINTERO MENDEZ 1035234316

MIGUEL PABON GELVEZ 91471147

CARLOS ENRIQUE RODAS HOYOS 8333038

GUILLERMO TORO B 3313502

LISNELIA ANAYA URBINA 37557438

JUAN CARLOS RODAS URREGO 1036599535


JORGE ENRIQUE VELASQUEZ PEÑA 93418855

WILSON ESTEBAN CIRO P 1128402411

1. Que se quiere lograr con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?


Selecciones una respuesta:

9 respuestas



2. Seleccione responsabilidades que tiene usted frente al sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo:

9 respuestas




3. Si presenta un accidente o incidente cuando se debe reportar y a través de que mecanismo:

9 respuestas



4.Selecciones un riesgos a los que está expuesto en su trabajo:

9 respuestas

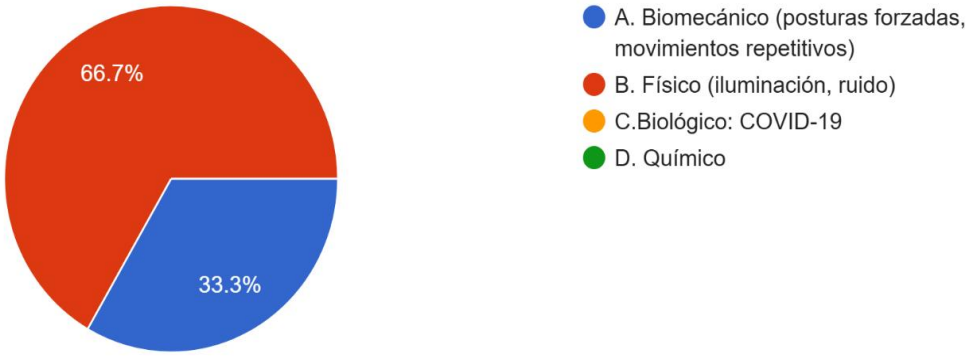

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Durante este periodo se desarrollaron jornadas de educación de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de charlas de 5 minutos que buscan generar una cultura de autocuidado, fortalecer conocimientos, potencializar competencias, desarrollar habilidades y actitudes, así como fomentar la participación de todo el personal en el cumplimiento de los objetivos

TEMA	DIRIGIDO A	FECHA
Inducción inicial y puesto de trabajo	Todo el Personal	20/06/2026 - 01/06/2026
Inspección preoperacional de herramientas	Todo el Personal	20/06/2026 - 01/06/2026
Orden y limpieza	Todo el Personal	20/06/2026 - 01/06/2026
Reporte de accidente e incidentes	Todo el Personal	20/06/2026 - 01/06/2026
Uso de elementos de protección personal	Todo el Personal	20/06/2026 - 01/06/2026

NOMBRE INDICADOR	**CAPACITACION EN SG.SST**
TIPO	Resultado
DEFINICION	Muestra de porcentaje de personas que reciben capacitaciones
UNIDAD DE MEDICION	Porcentual
FORMULA	Nº de personas que asisten a capacitaciones /Nº

PLANILLA DE CAPACITACION

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

INNOVACION COLOMBIA SAS
Área Seguridad y salud en el Trabajo

TEMA:
Inspeccion preoperacional de Herramientas
Uso de elementos de protección personal
Seguridad en el Trabajo
Reporte de accidentes e incidentes
Entrega de Epp

FECHA: Abierta para ingresos

LUGAR: CASA DE LA CONVENCION

CC	APELLIDO Y NOMBRE	FIRMA
91971147	Mibael Parson Beltez	Miguel P.
3313 502.	Guillermo Toro.	
1035234316.	Adrian Andres. Quintero.	AdrianQ.
83330338.	Carlos Enrique Rodas.	Carlos Enrique Rodas
1036599535	Juan Carlos Rodas.	Juan Rodas.
1128402411.	Wilson Esteban Cire.	Wilson Cairo
9341 8555	Jose Enrique. Volasco.	
3755738.	Linney Anay Urbina.	Cisneys.
1013328166.	Natalia. Gomez Cabrera	Natalia G
1006 484.567	Jose Luis Duran Muñoz	

Alejandra Ramirez Cadiz
1053766945
AD. seguridad y salud en el trabajo

REGISTRO, REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES, INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

Durante el periodo ejecutado, NO se registraron accidentes laborales dentro del proyecto. Este resultado refleja el cumplimiento de las medidas de prevención implementadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones regulares y el uso adecuado de equipos de protección personal, lo que ha contribuido a mantener un ambiente de trabajo seguro y controlado.

N°	Fecha	CC.	Nombre empleado	Sexo	Cargo	Mecanismo	Tipo de lesión	Parte del cuerpo	Agente del accident	Descripción del accident
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabla 3. Reporte de incapacidad laboral

Fecha	Cedula	Nombre trabajador	Incapacidad		Total, días	Diagnostico
			Inicia	Termina		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total, días incapacitantes						

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL

Durante el periodo ejecutado, NO se registraron accidentes laborales dentro del proyecto. Este resultado refleja el cumplimiento de las medidas de prevención implementadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones regulares y el uso adecuado de equipos de protección personal, lo que ha contribuido a mantener un ambiente de trabajo seguro y controlado.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EMERGENCIA

En cumplimiento del objeto contractual correspondiente a las actividades de apuntalamiento preventivo y temporal de la estructura de cubierta de la Casa de la Convención, ubicada en la región de Rionegro, Antioquia, se realizó por parte del personal de Innovación Colombia S.A.S. un reconocimiento previo de las condiciones de seguridad de la instalación, con el propósito de identificar los elementos de atención de emergencias, las rutas de evacuación y los puntos seguros definidos por la entidad, garantizando el desarrollo de las actividades bajo condiciones seguras y de conformidad con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Durante la inspección se verificaron las condiciones generales de la infraestructura y se socializó con el personal contratista la información necesaria para la actuación en caso de una emergencia, obteniéndose los siguientes resultados:

1. RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Se identificó la ubicación de los equipos y recursos destinados para la atención inicial de emergencias, entre ellos:

- Botiquines de primeros auxilios.
- Camillas para atención y traslado de lesionados.
- Extintores portátiles distribuidos en diferentes áreas de la infraestructura.

Se evidenció que estos elementos se encuentran ubicados en lugares visibles y de fácil acceso, permitiendo una respuesta oportuna en caso de presentarse una situación de emergencia.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN

El personal contratista realizó un recorrido por las diferentes áreas donde se ejecutarán las actividades con el fin de identificar las rutas de evacuación existentes, las salidas de emergencia y los posibles recorridos para una evacuación segura.

Como parte del proceso de inducción al sitio de trabajo, se informó a todos los trabajadores sobre la importancia de seguir las rutas establecidas por la entidad y atender las instrucciones impartidas por el personal responsable de la atención de emergencias en caso de una eventual evacuación.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO

Durante el reconocimiento también se verificó el punto de encuentro definido por la entidad para la concentración del personal una vez realizada la evacuación.

Se informó al personal contratista la ubicación de este punto, indicando que, ante cualquier emergencia, deberán dirigirse de manera ordenada hasta dicho lugar para facilitar el conteo del personal y verificar que todas las personas hayan evacuado de forma segura.







4. VERIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

Se observó la existencia de señalización preventiva e informativa en diferentes sectores de la instalación, correspondiente a salidas de emergencia, ubicación de equipos contra incendio y elementos de primeros auxilios.

No obstante, se evidenció que la infraestructura no cuenta con un plano general de evacuación visible, mediante el cual se identifiquen claramente las rutas de evacuación, salidas de emergencia, ubicación de equipos de emergencia y punto de encuentro, lo que puede dificultar la orientación inmediata de trabajadores y visitantes en caso de una contingencia.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS POR EL CONTRATISTA

Con el fin de reducir los riesgos durante la ejecución de las actividades, el contratista adoptó las siguientes medidas preventivas:

- Socialización de las rutas de evacuación identificadas con todo el personal antes del inicio de las labores.
- Verificación permanente de que las áreas de circulación permanezcan libres de obstáculos.
- Identificación de los equipos de emergencia más cercanos al frente de trabajo.
- Sensibilización al personal sobre el procedimiento de actuación en caso de incendio, sismo o cualquier otra situación de emergencia.

	**AREA PASILLOS CASA CONVENSION** Durante la inspección se verificó la existencia de dos (2) extintores de agua a presión, tipo A, con capacidad de 10 libras, ubicados estratégicamente en los pasillos de la instalación. Se constató que ambos extintores se encuentran en buen estado físico, cuentan con mantenimiento y recarga vigentes, poseen su etiqueta de inspección y vigencia debidamente actualizada, y se encuentran correctamente señalizados, permitiendo su fácil identificación y acceso en caso de emergencia.
	**ENTRADA DE CADA OFICINA** Agente: Multipropósito ABC Se realizó la inspección visual del extintor multipropósito, verificando que se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento. Durante la revisión se evidenció que todos sus accesorios (manómetro, pasador de seguridad, sello de seguridad, manguera y boquilla) se encuentran completos y en óptimas condiciones. Asimismo, se verificó que la etiqueta de inspección y mantenimiento se encuentra vigente, cumpliendo con los requisitos establecidos para su uso en caso de emergencia.
	**SEGUNDA OFICINA** **Elemento:** Camilla de emergencia **Fecha de vencimiento:** No aplica. **Observaciones:** Se realizó la inspección de la camilla de emergencia, evidenciando que se encuentra en buen estado de conservación, limpia, funcional y disponible para su uso en caso de una eventualidad.

	**SEGUNDA OFICINA** **Elemento:** Botiquín de primeros auxilios **Fecha de vencimiento:** Conforme a los elementos contenidos. **Observaciones:** Se evidencia que la maleta del botiquín se encuentra en buen estado físico, debidamente identificada y con los insumos organizados. Los elementos inspeccionados cuentan con fecha de vencimiento vigente a la fecha de la revisión, encontrándose aptos para su uso en caso de emergencia.
 	**SEÑALIZACION PARA EVACUACION** Se evidencia señalización deteriorada y ausencia de señalización en algunos sectores, por lo que se recomienda su reposición e instalación para garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y una adecuada orientación durante situaciones de emergencia. No obstante, como medida preventiva, se realizó un recorrido con el personal presente en la obra, durante el cual se identificaron las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los elementos de emergencia, brindando la correspondiente socialización y capacitación para que, en caso de presentarse un evento o una emergencia, el personal conozca el procedimiento a seguir y las rutas de evacuación establecidas.

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se realizó la entrega de la dotación y de los Equipos de Protección Personal (EPP) requeridos para la ejecución segura de las actividades. Durante la entrega, se verificó que cada trabajador recibiera los elementos correspondientes a los riesgos asociados a su cargo, en buen estado y con las especificaciones técnicas requeridas. Asimismo, se brindó capacitación sobre el uso correcto, inspección, mantenimiento, almacenamiento y cuidado de los EPP, enfatizando la responsabilidad de cada trabajador en su utilización permanente y adecuada para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Finalmente, se dejó constancia de la entrega mediante el registro y firma del trabajador como evidencia del cumplimiento de esta actividad.

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	ESTADO
1	Gafas de seguridad en policarbonato	**1**	**Nuevo**
2	Guantes recubiertos en poliuretano	**1**	**Nuevo**
3	Casco de seguridad con protección contra impacto de objetos (golpes)	**1**	**Nuevo**
4	Tapabocas	**5**	**Nuevo**
5	Camisa de manga larga	**1**	**Nuevo**
6	Chaleco de alta visibilidad con cintas reflectivas	**1**	**Nuevo**
7	Buso de dotación	**1**	**Nuevo**
8	Bota de seguridad	**1**	**Nuevo**
9	Arnés de cuerpo completo	**1**	**Nuevo**
10	Eslinga de impacto	**1**	**Nuevo**

REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PLANILLA DE ENTREGA

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

INNOVACION COLOMBIA SAS
Área Seguridad y salud en el Trabajo

ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de Dotacion
Entrega de equipos de altura arnes- Eslinga -Linea de vida
Entrega de Elementos de protección personal

FECHA: Abierta para ingresos

LUGAR: CASA DE LA CONVENCION

CC	APELLIDO Y NOMBRE	FIRMA
91471147	Hibel Pabon Beltez	
3313 502.	Guillermo Toro.	
1035234316.	Adrian Andres. Quintero.	
83330038.	Carlos Enrique Rodas.	
1036599535	Juan Carlos Rodas.	
1128402411.	Wilson Esteban Cano.	
9341855	Jose Enrique. Velasquez.	
3755738.	Linneys Anay Urbina.	
1033281166.	Natalia. Gomez Calderon	
1006 484.567	Jose Ino Quiñonez Moñoz	

Alejandra Moreno Cadena
1054561946
AD. seguridad y salud en el trabajo

CERTUFICADO DE ARNES Y FICHA TECNICA



SGS COLOMBIA S.A.S.
C&P-F490101
ORDEN No. 4510-37141
CERTIFICADO No. CRS20396
ORDEN CERT. No. CO-CERT220900768-02
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Comercial EP S.A.S.
Carrera 80 B No. 41 - 10, Medellín, Antioquia, Colombia

Certifica que el producto identificado como ARNÉS, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Comercial EP S.A.S., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

ANSI/ASSE Z359.11:2014 : Safety Requirements for Full Body Harnesses


Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá D.C., Colombia

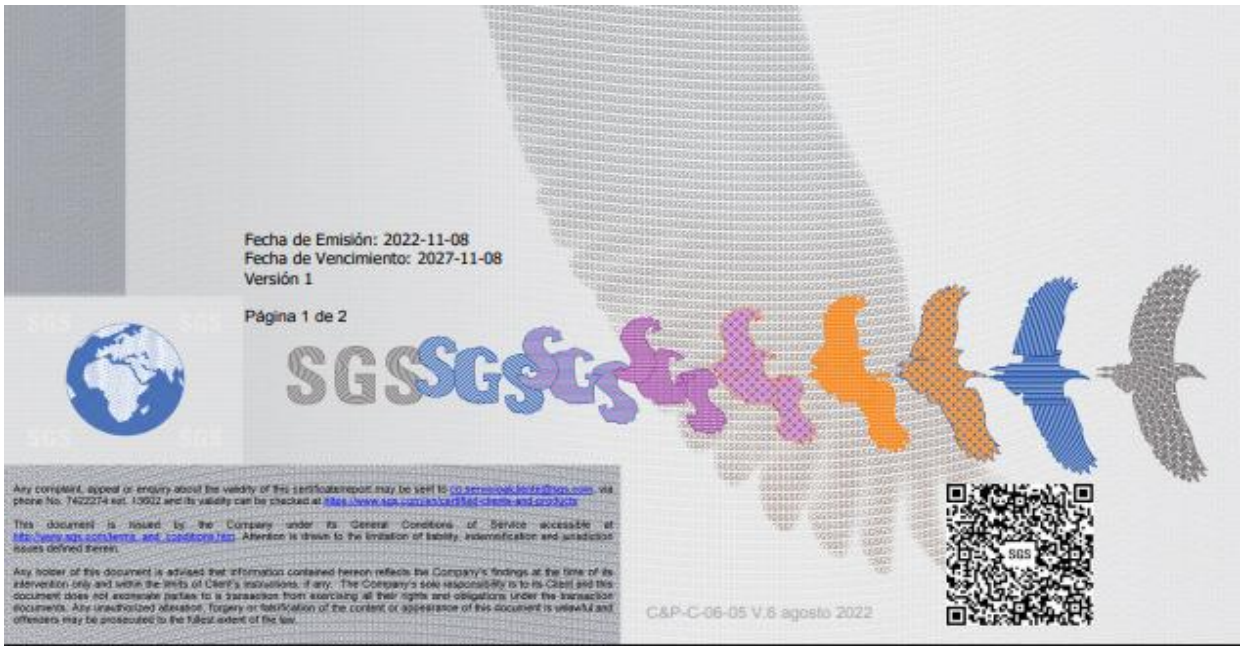

Fecha de Emisión: 2022-11-08
Fecha de Vencimiento: 2027-11-08
Versión 1

Página 1 de 2

C&P-C-06-05 V.6 agosto 2022

FICHA TÉCNICA

REF EP-1204DI

ARNÉS DE SEGURIDAD EN 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO

www.comercialep.com



USO DEL PRODUCTO

Especial para trabajos eléctricos y en altura que requieren máxima seguridad y libertad de movimiento. El arnés dieléctrico de 4 argollas permite detención de caídas, posicionamiento, restricción y ascenso o descenso controlado sin riesgo de conducción eléctrica. Ideal para labores de mantenimiento, instalación y rescate en entornos con riesgo eléctrico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Arnés dieléctrico multipropósito de 4 argollas, diseñado para detención de caídas, posicionamiento y rescate en trabajos eléctricos y en altura. Fabricado en reata de poliéster de alta resistencia con herrajes no conductores, garantiza seguridad y confort durante largas jornadas. Su estructura en "X" distribuye el peso uniformemente y permite total libertad de movimiento.
Cumple con la norma ANSI/ASSE Z359.11-2014.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

ELEMENTO	Q	NORMA	RESISTENCIA	MATERIAL	PESO
Reata		ANSI Z359.11-2014	Mayor a 22.2 kN	Poliéster	
Hebilla conexión	3	ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22.2 kN	Acero / Polímero	112 kg
Argolla D Dorsal	1	ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22.2 kN	Acero / Polímero	172 kg
Argolla D Lateral	2	ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22.2 kN	Acero / Polímero	172 kg
Argolla D Frontal	1	ANSI Z359.12-2009	Mayor a 22.2 kN	Acero / Polímero	172 kg
Porta Eslinga	2	ANSI Z359.11-2014	Menor a 500 N	Polietileno	5,4 g

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

PRUEBAS	NORMA	VALOR MEDIO	¿CUMPLE?
Resistencia Estática (Ensayo realizado para los puntos de conexión dorsal, frontal y lateral	ANSI Z359.11-2014	16 kN en cada punto de conexión. No se rompió, deshilachó ni se soltó el torso de prueba. No tiene deslizamiento en las hebillas ajustadoras.	Cumple
Rendimiento dinámico Simulando una caída de pie. (Ensayo realizado para los puntos de conexión dorsal, pectoral y frontal)	ANSI Z359.11-2014	La Fuerza de Impacto generada es mayor a 16 kN. El ángulo de reposo es: Dorsal: Entre 8o y 29o El estiramiento del arnés está en el rango 50-250 mm El arnés sostuvo el torso de prueba por mas de 5 minutos.	Cumple
Rendimiento dinámico Simulando una caída de cabeza (Ensayo realizado solo para el punto de conexión dorsal).	ANSI Z359.11-2014	La Fuerza de Impacto generada es mayor a 16 kN. El ángulo de reposo está en el rango de 8o y 29o El arnés sostuvo el torso de prueba por más de 5 minutos.	Cumple
Prueba del indicador de caída	ANSI Z359.11-2014	Luego de la caída se activó el indicador de caída.	Cumple


VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Antes del inicio de las actividades se realizó la inspección preoperacional de los equipos que serán utilizados en la ejecución de las labores, con el fin de verificar que se encuentren en condiciones seguras de funcionamiento. Durante la inspección se revisaron aspectos como el estado general del equipo, la integridad de sus componentes, sistemas de seguridad, conexiones, accesorios, controles, niveles (cuando aplica), ausencia de fugas, estado de cables o mangueras, señalización, etiquetas de identificación y mantenimiento vigente. Se constató que los equipos inspeccionados cumplen con las condiciones requeridas para su operación, no evidenciando fallas o condiciones que representen un riesgo para los trabajadores. En caso de identificarse alguna anomalía, el equipo deberá ser retirado de servicio de manera inmediata hasta que se realicen las acciones correctivas correspondientes.

Equipos Eléctricos	Observaciones de Equipos Eléctricos
	Se realizó la inspección preoperacional del taladro, verificando el estado general de la carcasa, cable de alimentación, enchufe, gatillo de encendido, mandril, brocas y demás componentes. Se evidenció que el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, sin daños visibles que comprometan la seguridad de su operación, por lo que es apto para su uso**.**
	Se realizó la inspección preoperacional de la pulidora, verificando el estado general del equipo, cable de alimentación, enchufe, interruptor, empuñadura, guarda de protección, disco y sistema de ventilación. Se evidencia que el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento, sin daños visibles que afecten la seguridad durante su operación.
	Se realizó la inspección preoperacional de la cortadora circular, verificando el estado general del equipo. Se evidencia que es un equipo nuevo, en excelentes condiciones, con la carcasa, guarda de protección, disco, cable de alimentación, enchufe, interruptor y demás componentes completos y sin daños visibles. El equipo presenta un funcionamiento adecuado y es apto para su operación, siempre que se utilice conforme a las instrucciones del fabricante y con los elementos de protección personal requeridos.

Formato de Inspección Preoperacional de Equipos y Herramienta

Formato 1

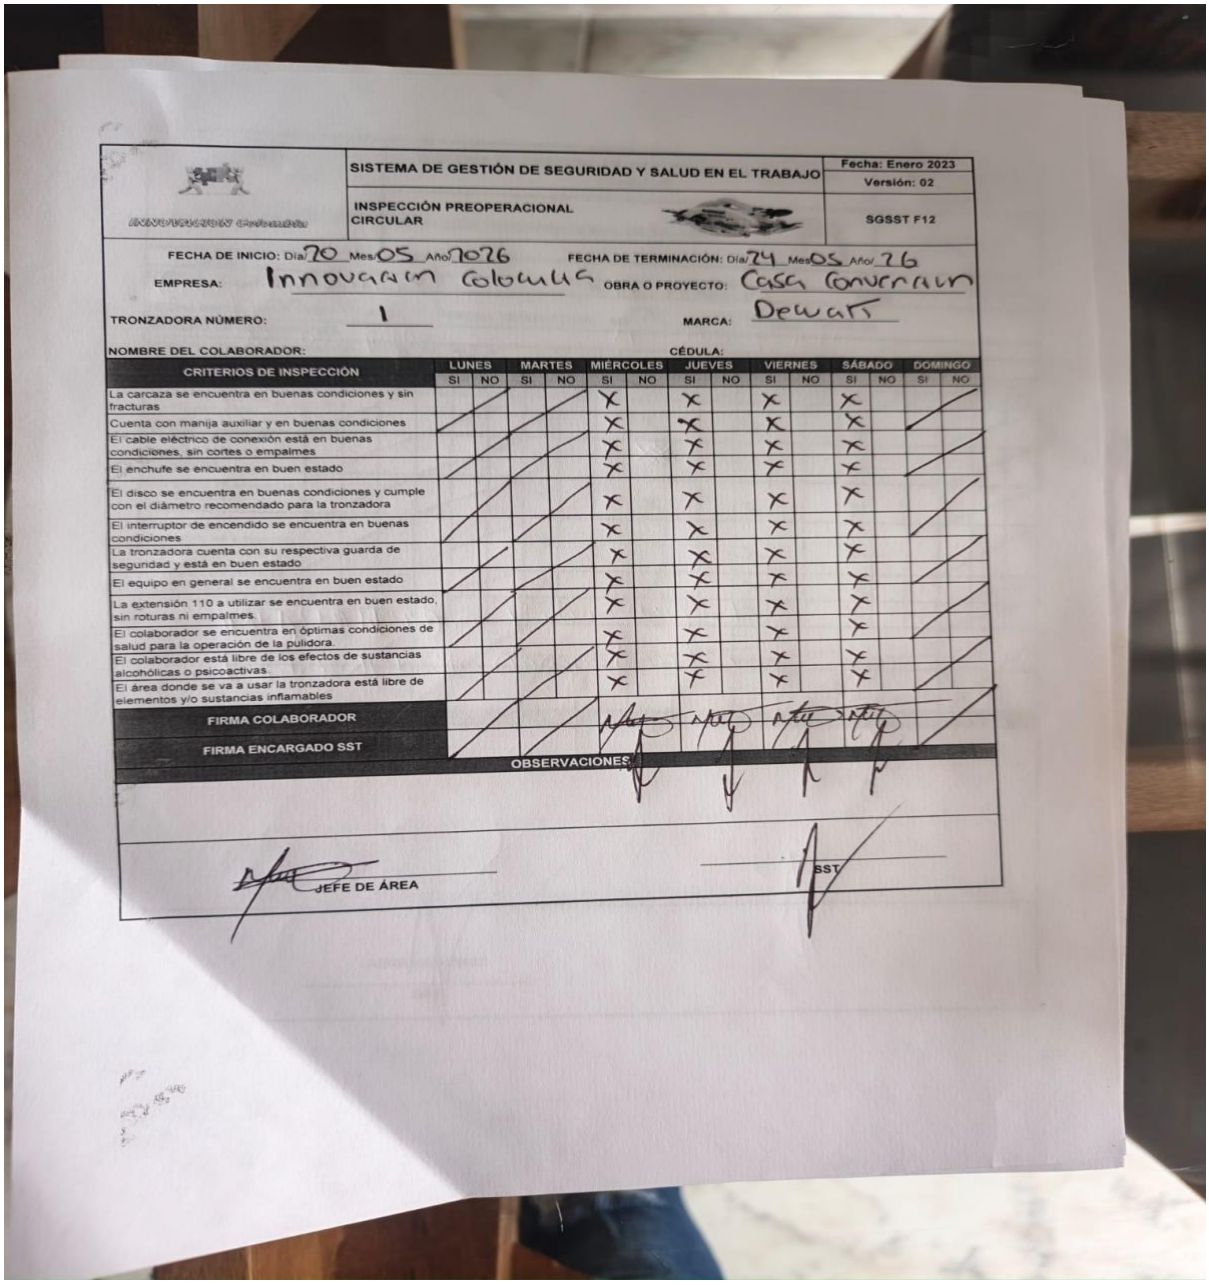

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: Enero 2023

Versión: 02

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CIRCULAR

SGSST F12

FECHA DE INICIO: Día 20 Mes 05 Año 2026 FECHA DE TERMINACIÓN: Día 24 Mes 05 Año 26

EMPRESA: Innovacion Colombia OBRA O PROYECTO: Casa Conversion

TRONZADORA NÚMERO: 1 MARCA: Dewalt

NOMBRE DEL COLABORADOR: CÉDULA:


CRITERIOS DE INSPECCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La carcaza se encuentra en buenas condiciones y sin fracturas					X		X		X		X			
Cuenta con manija auxiliar y en buenas condiciones					X		X		X		X			
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones, sin cortes o empalmes					X		X		X		X			
El enchufe se encuentra en buen estado					X		X		X		X			
El disco se encuentra en buenas condiciones y cumple con el diámetro recomendado para la tronzadora					X		X		X		X			
El interruptor de encendido se encuentra en buenas condiciones					X		X		X		X			
La tronzadora cuenta con su respectiva guarda de seguridad y está en buen estado					X		X		X		X			
El equipo en general se encuentra en buen estado					X		X		X		X			
La extensión 110 a utilizar se encuentra en buen estado, sin roturas ni empalmes.					X		X		X		X			
El colaborador se encuentra en óptimas condiciones de salud para la operación de la pulidora.					X		X		X		X			
El colaborador está libre de los efectos de sustancias alcohólicas o psicoactivas.					X		X		X		X			
El área donde se va a usar la tronzadora está libre de elementos y/o sustancias inflamables					X		X		X		X			
FIRMA COLABORADOR														
FIRMA ENCARGADO SST														

OBSERVACIONES:

JEFE DE ÁREA

SST

Formato 2

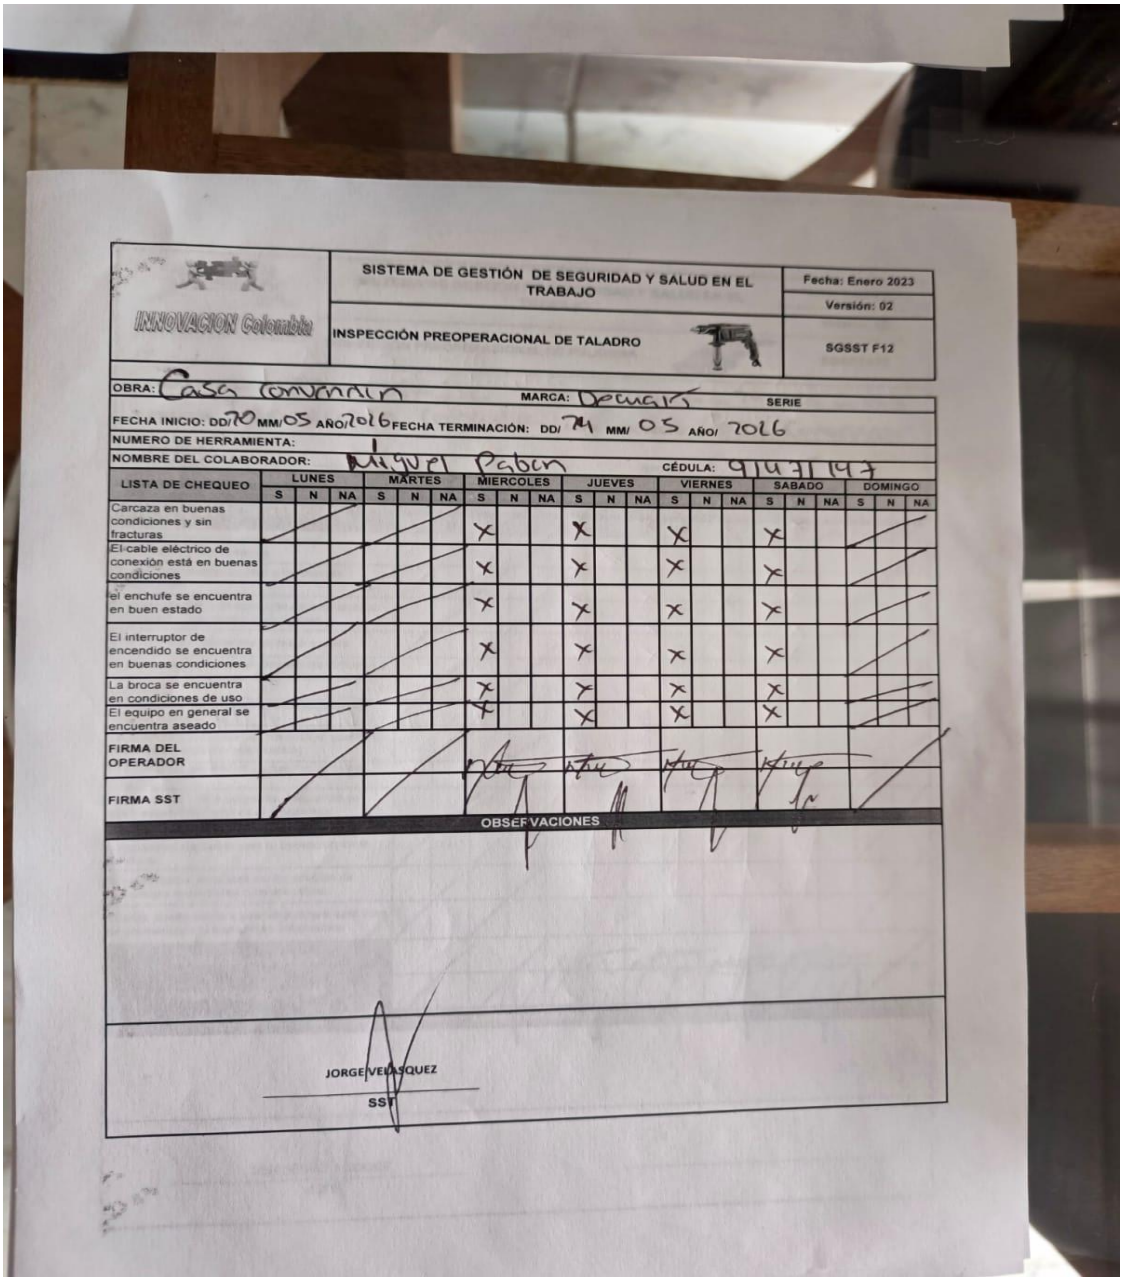

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: Enero 2023
INNOVACION Colombia		Versión: 02
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	SGSST F12

OBRA: Casa comunal MARCA: Dewalt SERIE

FECHA INICIO: DD/ 20 MM/ 05 AÑO/ 2016 FECHA TERMINACIÓN: DD/ 24 MM/ 05 AÑO/ 2016

NUMERO DE HERRAMIENTA:


NOMBRE DEL COLABORADOR: Miguel Pabon CÉDULA: 9147147

LISTA DE CHEQUEO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Carcaza en buenas condiciones y sin fracturas							X			X			X			X					
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones							X			X			X			X					
el enchufe se encuentra en buen estado							X			X			X			X					
El interruptor de encendido se encuentra en buenas condiciones							X			X			X			X					
La broca se encuentra en condiciones de uso							X			X			X			X					
El equipo en general se encuentra aseado							X			X			X			X					
FIRMA DEL OPERADOR																					
FIRMA SST																					

OBSERVACIONES

JORGE VELASQUEZ
SST

Formato 3

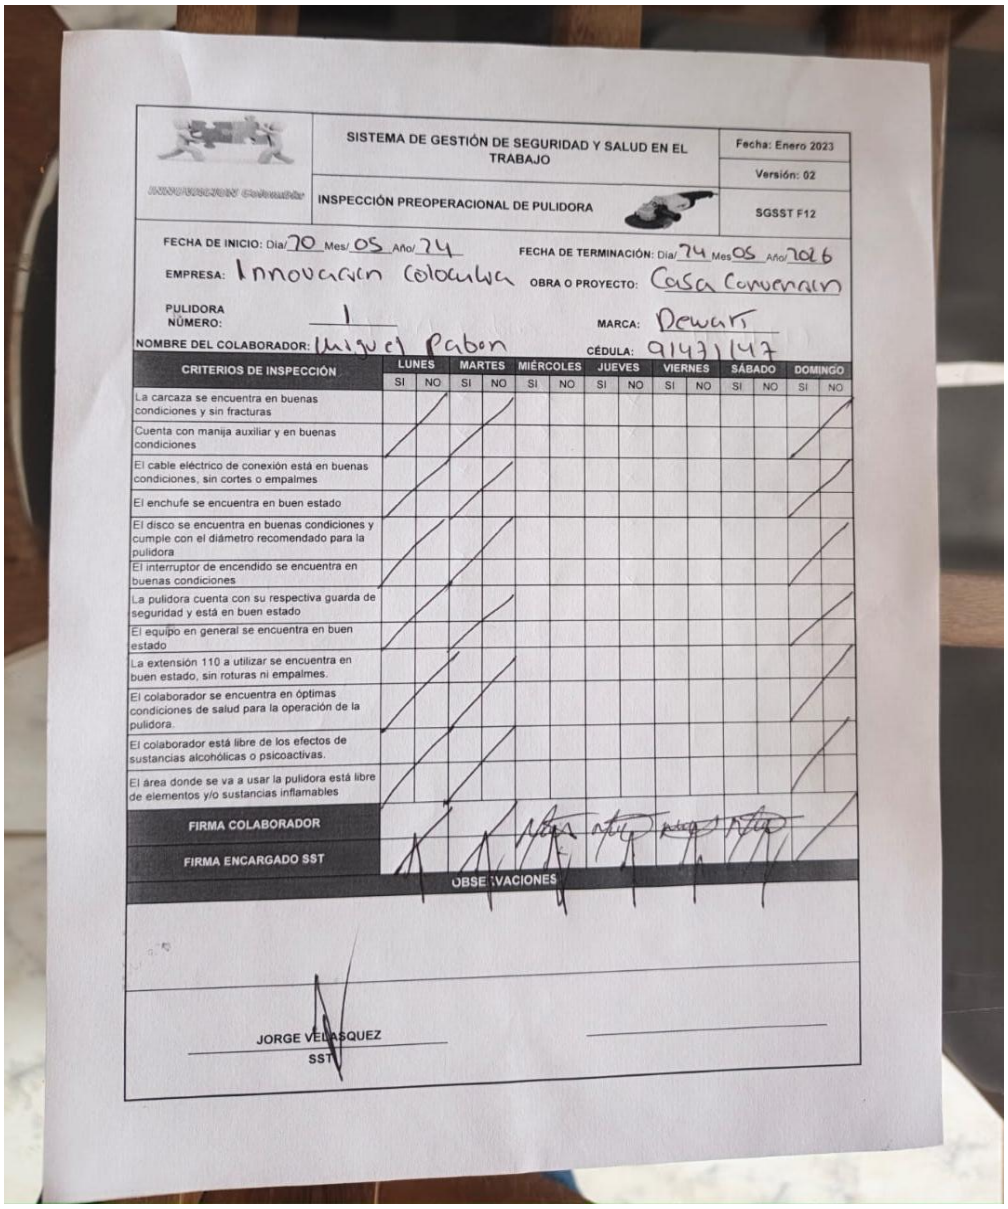

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: Enero 2023

Versión: 02

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA

SGSST F12

FECHA DE INICIO: Día/ 20 Mes/ 05 Año/ 24 FECHA DE TERMINACIÓN: Día/ 24 Mes 05 Año/ 2026

EMPRESA: Innovacion colombia OBRA O PROYECTO: Casa Convencion

PULIDORA NÚMERO: 1 MARCA: Dewalt

NOMBRE DEL COLABORADOR: Miguel Pabon CÉDULA: 9147147

CRITERIOS DE INSPECCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La carcaza se encuentra en buenas condiciones y sin fracturas														
Cuenta con manija auxiliar y en buenas condiciones														
El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones, sin cortes o empalmes														
El enchufe se encuentra en buen estado														
El disco se encuentra en buenas condiciones y cumple con el diámetro recomendado para la pulidora														
El interruptor de encendido se encuentra en buenas condiciones														
La pulidora cuenta con su respectiva guarda de seguridad y está en buen estado														
El equipo en general se encuentra en buen estado														
La extensión 110 a utilizar se encuentra en buen estado, sin roturas ni empalmes.														
El colaborador se encuentra en óptimas condiciones de salud para la operación de la pulidora.														
El colaborador está libre de los efectos de sustancias alcohólicas o psicoactivas.														
El área donde se va a usar la pulidora está libre de elementos y/o sustancias inflamables														
FIRMA COLABORADOR														
FIRMA ENCARGADO SST														

OBSERVACIONES

JORGE VELASQUEZ
SST

INSPECCION DE ANDAMIOS

La inspección preoperacional del andamio tiene como finalidad verificar, antes del inicio de cada jornada de trabajo o posterior a cualquier modificación, traslado o evento que pueda afectar su estabilidad, que la estructura se encuentre en condiciones seguras para su utilización. Esta inspección permite identificar oportunamente condiciones inseguras que puedan generar riesgos de colapso, caídas de personas o materiales, atrapamientos o cualquier otro incidente asociado al uso del andamio.


Durante la inspección se verifica el estado general de todos los componentes estructurales, incluyendo marcos, diagonales, travesaños, plataformas de trabajo, barandas de protección, rodapiés, escaleras de acceso, bases, gatos niveladores, ruedas con sistema de bloqueo (cuando aplique), pasadores, seguros, uniones y sistemas de anclaje. Se confirma que cada elemento se encuentre correctamente instalado, asegurado y libre de deformaciones, fisuras, corrosión, desgaste excesivo, soldaduras fracturadas, piezas faltantes o cualquier otro daño que pueda comprometer la resistencia y estabilidad de la estructura.

Asimismo, se inspecciona que el andamio se encuentre completamente nivelado, aplomado y apoyado sobre una superficie firme, estable y con capacidad suficiente para soportar las cargas de trabajo previstas. Se verifica el correcto funcionamiento de los sistemas de estabilización, el adecuado bloqueo de ruedas en andamios móviles y la instalación de amarres o anclajes cuando las condiciones de altura y diseño lo requieran.

De igual manera, se comprueba que las plataformas de trabajo estén completamente instaladas, debidamente aseguradas, limpias y libres de materiales, herramientas u obstáculos que puedan generar riesgos de tropiezos, resbalones o caídas. Se verifica que los accesos sean seguros, que las barandas y rodapiés estén instalados de acuerdo con los requisitos de seguridad y que exista protección colectiva para prevenir caídas a diferente nivel.

Como parte de la inspección, también se revisa que el andamio cuente con la señalización correspondiente, identificación de la capacidad máxima de carga, tarjeta o registro de inspección vigente y que el área de trabajo permanezca delimitada, ordenada y libre de condiciones que representen riesgos para los trabajadores o terceros.

Finalmente, se determina si el andamio cumple con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por la normativa vigente y los procedimientos internos de la organización, emitiendo el concepto de Apto para Uso o No Apto para Uso. En caso de detectarse alguna condición insegura, el andamio deberá ser retirado de servicio o intervenido antes de autorizar su utilización, garantizando la protección de los trabajadores y la ejecución segura de las actividades en altura.

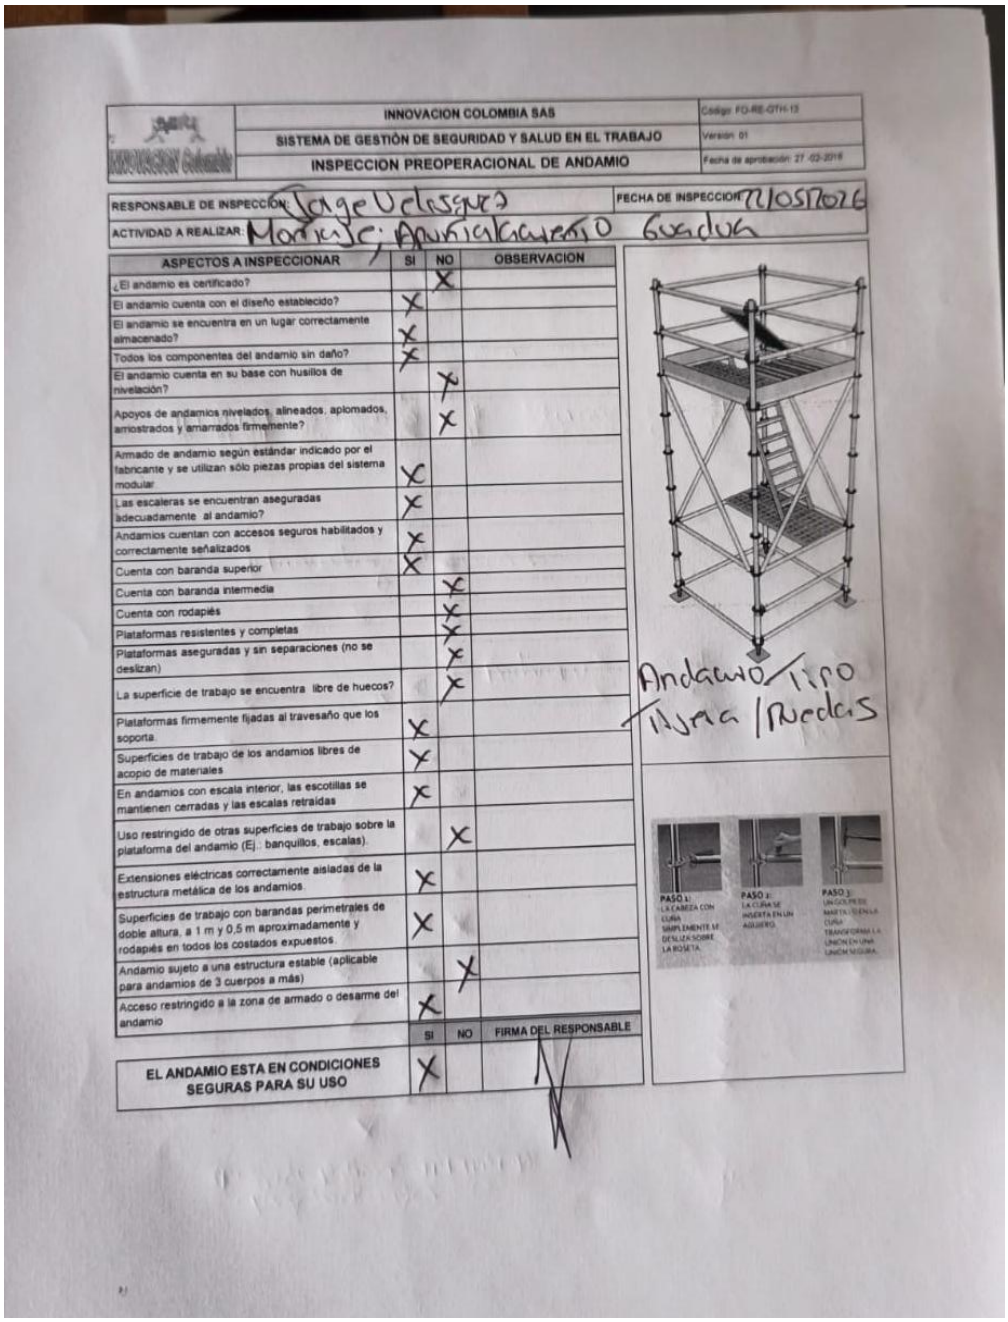

	INNOVACION COLOMBIA SAS	Código: FO-RE-GTH-13
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Fecha de aprobación: 27 -02-2018


RESPONSABLE DE INSPECCION: Jorge Uclesgue? FECHA DE INSPECCION: 21/05/2026

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje; Apuntalamiento Guardia

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACION
¿El andamio es certificado?		X	
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		
Todos los componentes del andamio sin daño?	X		
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?		X	
Apoyos de andamios nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados firmemente?		X	
Armado de andamio según estándar indicado por el fabricante y se utilizan sólo piezas propias del sistema modular	X		
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		
Andamios cuentan con accesos seguros habilitados y correctamente señalizados	X		
Cuenta con baranda superior	X		
Cuenta con baranda intermedia		X	
Cuenta con rodapiés		X	
Plataformas resistentes y completas		X	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		X	
La superficie de trabajo se encuentra libre de huecos?		X	
Plataformas firmemente fijadas al travesaño que los soporta.	X		
Superficies de trabajo de los andamios libres de acopio de materiales	X		
En andamios con escala interior, las escotillas se mantienen cerradas y las escalas retraídas	X		
Uso restringido de otras superficies de trabajo sobre la plataforma del andamio (Ej.: banquillos, escalas).		X	
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructura metálica de los andamios.	X		
Superficies de trabajo con barandas perimetrales de doble altura, a 1 m y 0,5 m aproximadamente y rodapiés en todos los costados expuestos.	X		
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)		X	
Acceso restringido a la zona de armado o desarme del andamio	X		

	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE
EL ANDAMIO ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	X		

Andamio Tipo Tijera / Ruedas

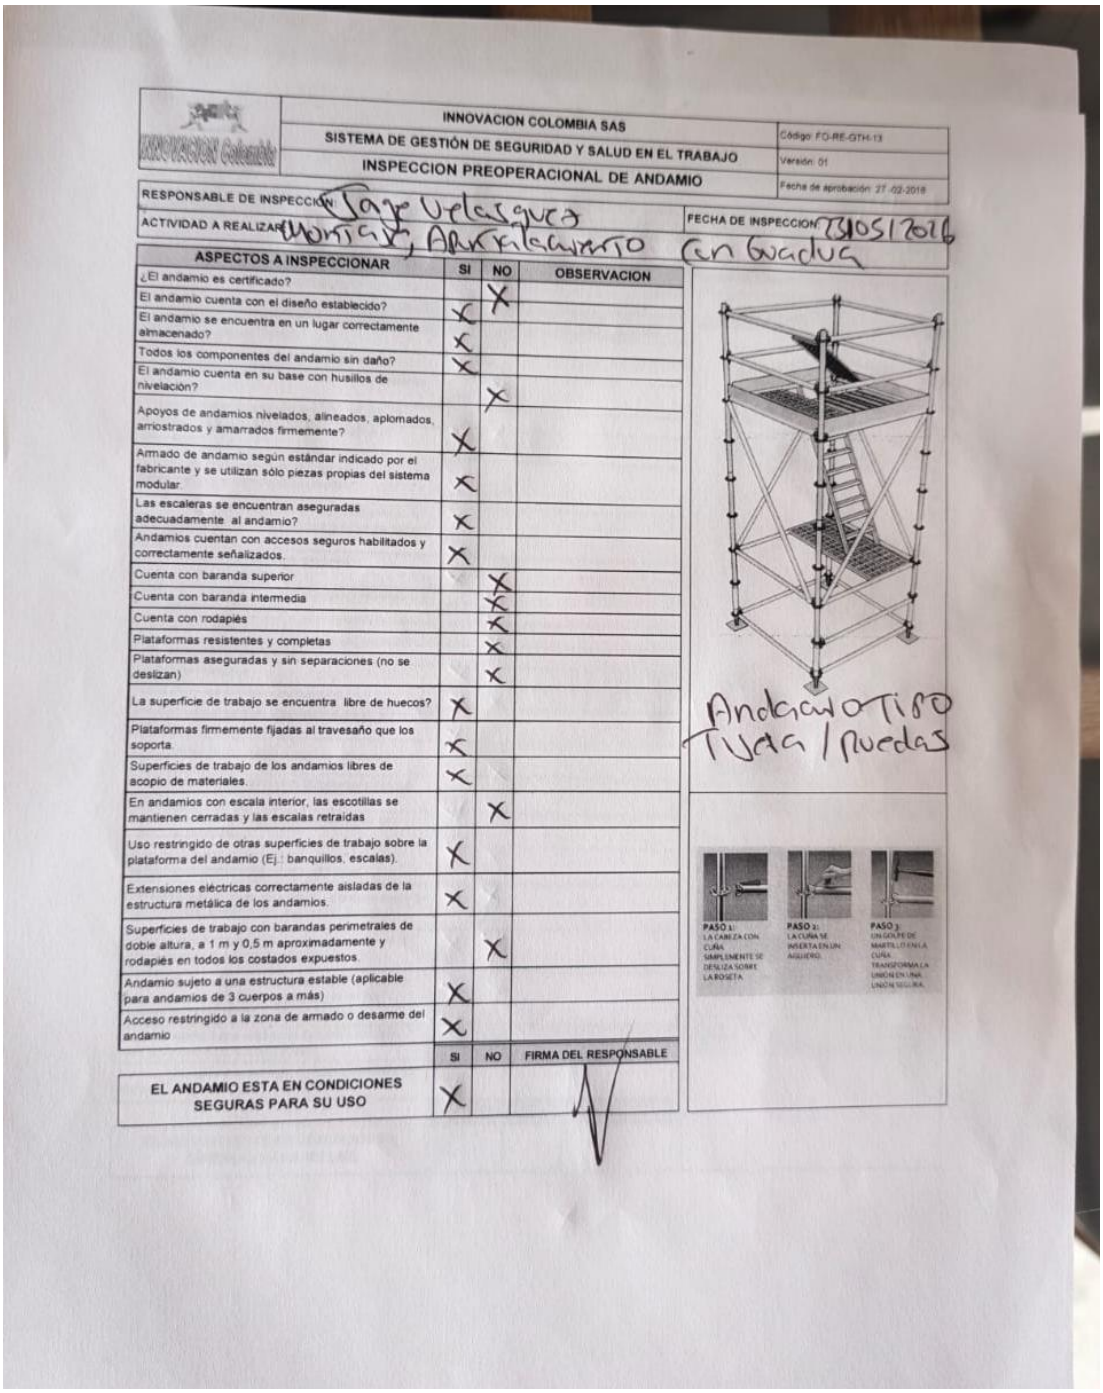

INNOVACION COLOMBIA SAS		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FO-RE-GTH-13
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Versión: 01
		Fecha de aprobación: 27-02-2018

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jorge Velasquez

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje, Arrestamiento con Guadua

FECHA DE INSPECCION: 13/05/2016

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACION
¿El andamio es certificado?		X	
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		
Todos los componentes del andamio sin daño?	X		
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?		X	
Apoyos de andamios nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados firmemente?	X		
Armado de andamio según estándar indicado por el fabricante y se utilizan sólo piezas propias del sistema modular.	X		
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		
Andamios cuentan con accesos seguros habilitados y correctamente señalizados.	X		
Cuenta con baranda superior		X	
Cuenta con baranda intermedia		X	
Cuenta con rodapiés		X	
Plataformas resistentes y completas		X	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		X	
La superficie de trabajo se encuentra libre de huecos?	X		
Plataformas firmemente fijadas al travesaño que los soporta.	X		
Superficies de trabajo de los andamios libres de acopio de materiales.	X		
En andamios con escala interior, las escotillas se mantienen cerradas y las escalas retraídas		X	
Uso restringido de otras superficies de trabajo sobre la plataforma del andamio (Ej.: banquillos, escalas).	X		
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructura metálica de los andamios.	X		
Superficies de trabajo con barandas perimetrales de doble altura, a 1 m y 0,5 m aproximadamente y rodapiés en todos los costados expuestos.		X	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	X		
Acceso restringido a la zona de armado o desarme del andamio	X		

	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE
EL ANDAMIO ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	X		

Andamio Tipo Tijera / Ruedas

Dirección: Calle 29sur número 13ª-25 Soacha Cundinamarca 316 4418845
Correo electrónico: innovacioncolombia.sas@gmail.com


	INNOVACION COLOMBIA SAS	Código: FO-RE-GTH-13
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Fecha de aprobación: 27 -02- 2018

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jorge Velasquez — FECHA DE INSPECCION: 21/05/2026

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje, Aprovisionamiento en Fachada

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACION
¿El andamio es certificado?		X	
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		
Todos los componentes del andamio sin daño?	X		
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?		X	
Apoyos de andamios nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados firmemente?	X		
Armado de andamio según estándar indicado por el fabricante y se utilizan sólo piezas propias del sistema modular.	X		
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		
Andamios cuentan con accesos seguros habilitados y correctamente señalizados.	X		
Cuenta con baranda superior		X	
Cuenta con baranda intermedia		X	
Cuenta con rodapiés		X	
Plataformas resistentes y completas		X	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		X	
La superficie de trabajo se encuentra libre de huecos?	X		
Plataformas firmemente fijadas al travesaño que los soporta.	X		
Superficies de trabajo de los andamios libres de acopio de materiales.	X		
En andamios con escala interior, las escotillas se mantienen cerradas y las escalas retraídas		X	
Uso restringido de otras superficies de trabajo sobre la plataforma del andamio (Ej.: banquillos, escalas)	X		
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructura metálica de los andamios.	X		
Superficies de trabajo con barandas perimetrales de doble altura, a 1 m y 0,5 m aproximadamente y rodapiés en todos los costados expuestos.		X	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	X		
Acceso restringido a la zona de armado o desarme del andamio	X		

	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE
EL ANDAMIO ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	X		

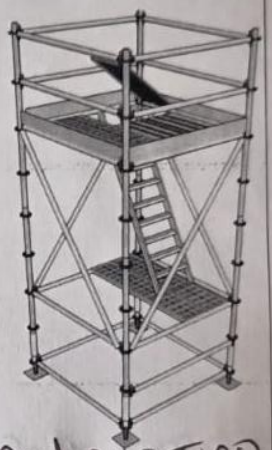

Andamio Tipo Torre / Ruedas




INNOVACION Colombia	INNOVACION COLOMBIA SAS	Código: FO-RE-GTH-13
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Fecha de aprobación: 27-02-2018

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jorge Velasquez — FECHA DE INSPECCION: 20/05/16

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje e instalacion andamio tubular Cuadra


ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACION
¿El andamio es certificado?		X	
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		
Todos los componentes del andamio sin daño?	X		
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?		X	
Apoyos de andamios nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados firmemente?	X		
Armado de andamio según estándar indicado por el fabricante y se utilizan sólo piezas propias del sistema modular.	X		
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		
Andamios cuentan con accesos seguros habilitados y correctamente señalizados.	X		
Cuenta con baranda superior	X		
Cuenta con baranda intermedia		X	
Cuenta con rodapiés		X	
Plataformas resistentes y completas		X	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	X		
La superficie de trabajo se encuentra libre de huecos?	X		
Plataformas firmemente fijadas al travesaño que los soporta.	X		
Superficies de trabajo de los andamios libres de acopio de materiales.		X	
En andamios con escala interior, las escotillas se mantienen cerradas y las escalas retraídas	X		
Uso restringido de otras superficies de trabajo sobre la plataforma del andamio (Ej.: banquillos, escalas).	X		
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructura metálica de los andamios.		X	
Superficies de trabajo con barandas perimetrales de doble altura, a 1 m y 0,5 m aproximadamente y rodapiés en todos los costados expuestos.		X	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	X		
Acceso restringido a la zona de armado o desarme del andamio	X		

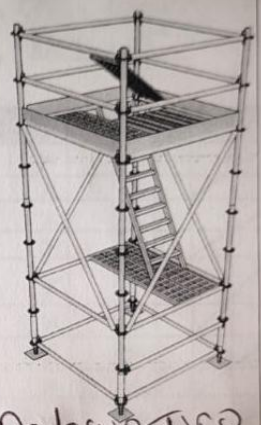

Andamio Tipo Torre/Ruedas



	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE
EL ANDAMIO ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	X		

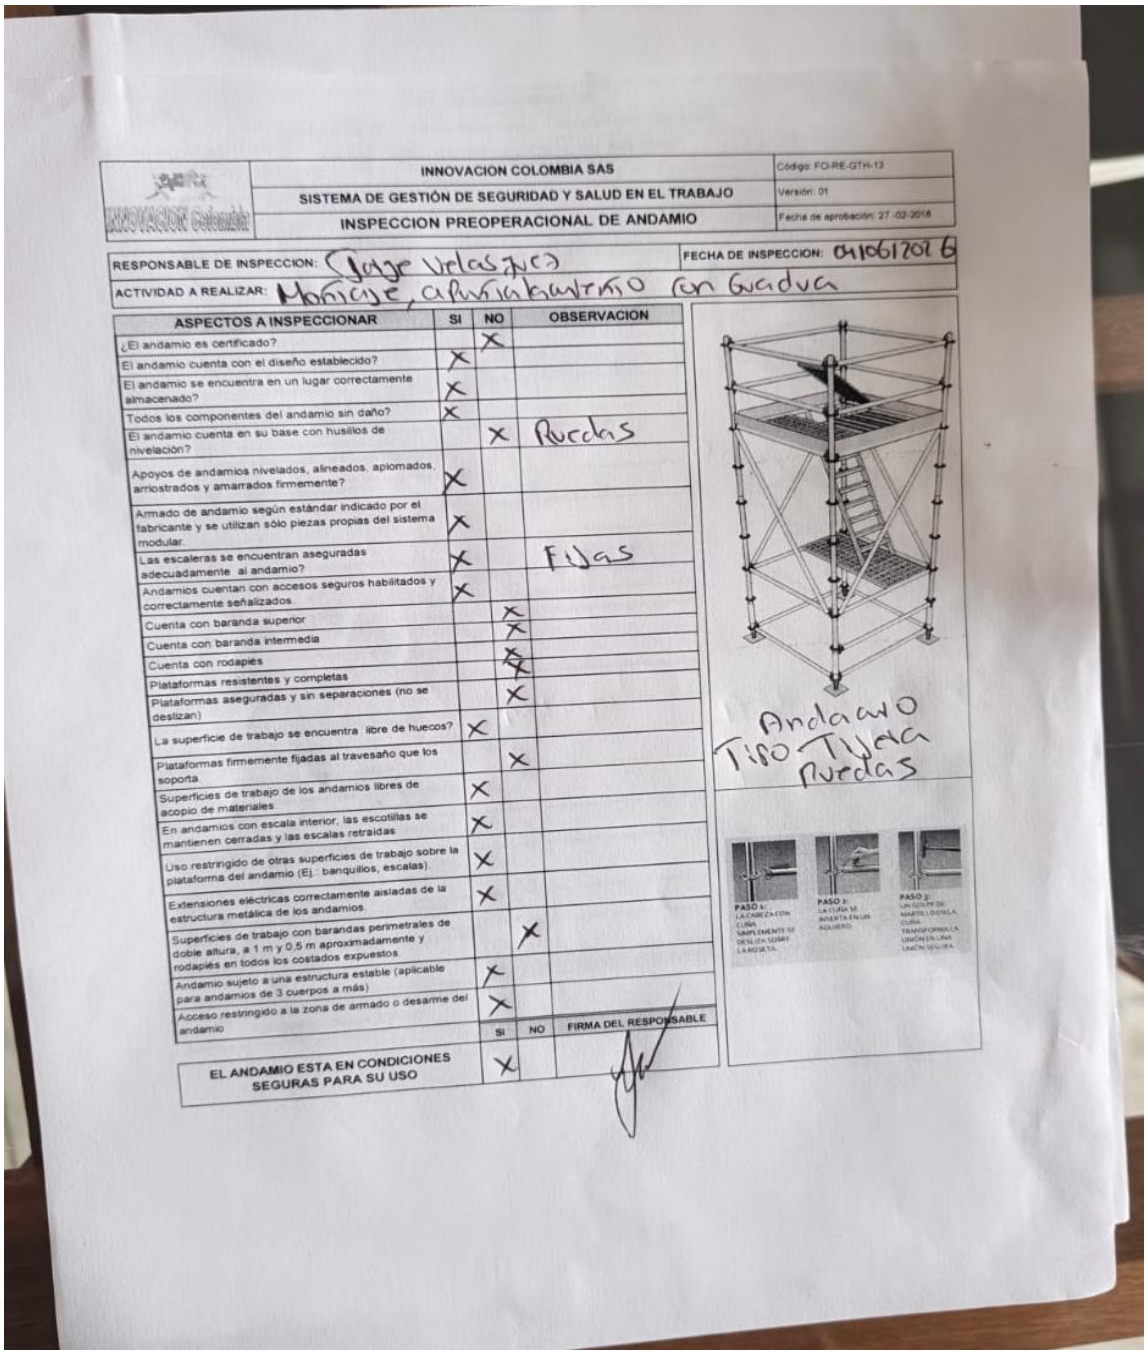

INNOVACION COLOMBIA SAS		Código: FO-RE-GTH-13
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Fecha de aprobación: 27-02-2018

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jorge Velasquez — FECHA DE INSPECCION: 04/06/2018


ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje, aplicación entrenamiento con Guadua

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACION
¿El andamio es certificado?		X	
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		
Todos los componentes del andamio sin daño?	X		
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?		X	Ruedas
Apoyos de andamios nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados firmemente?	X		
Armado de andamio según estándar indicado por el fabricante y se utilizan sólo piezas propias del sistema modular.	X		
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		Fijas
Andamios cuentan con accesos seguros habilitados y correctamente señalizados	X		
Cuenta con baranda superior		X	
Cuenta con baranda intermedia		X	
Cuenta con rodapiés		X	
Plataformas resistentes y completas		X	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		X	
La superficie de trabajo se encuentra libre de huecos?	X		
Plataformas firmemente fijadas al travesaño que los soporta		X	
Superficies de trabajo de los andamios libres de acopio de materiales	X		
En andamios con escala interior, las escotillas se mantienen cerradas y las escalas retraidas	X		
Uso restringido de otras superficies de trabajo sobre la plataforma del andamio (Ej.: banquillos, escalas)	X		
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructura metálica de los andamios.	X		
Superficies de trabajo con barandas perimetrales de doble altura, a 1 m y 0,5 m aproximadamente y rodapiés en todos los costados expuestos.		X	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	X		
Acceso restringido a la zona de armado o desarme del andamio	X		

	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE
EL ANDAMIO ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	X		

Andamio Tipo Tijera Ruedas

Dirección: Calle 29sur número 13ª-25 Soacha Cundinamarca 316 4418845
Correo electrónico: innovacioncolombia.sas@gmail.com

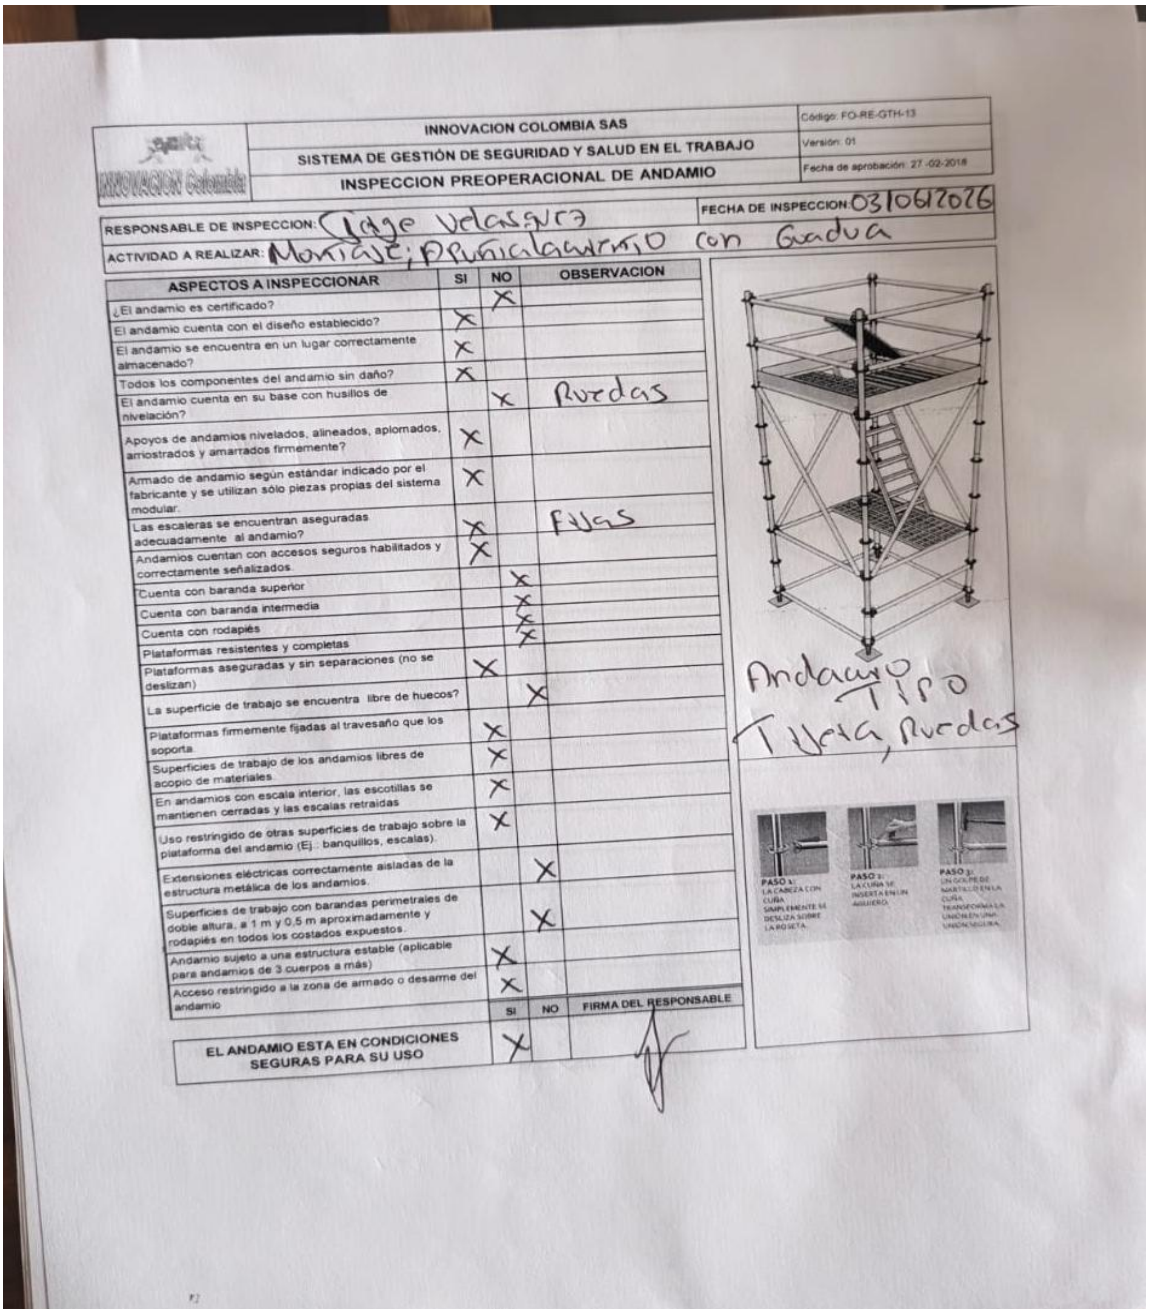

	INNOVACION COLOMBIA SAS	Código: FO-RE-GTH-13
INNOVACION Colombia	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Fecha de aprobación: 27-02-2018

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jorge Velasquez — FECHA DE INSPECCION: 03/06/2026

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje, Reubicamiento con Grua

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACION
¿El andamio es certificado?		X	
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		
Todos los componentes del andamio sin daño?	X		
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?		X	Ruedas
Apoyos de andamios nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados firmemente?	X		
Armado de andamio según estándar indicado por el fabricante y se utilizan sólo piezas propias del sistema modular.	X		
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		Fijas
Andamios cuentan con accesos seguros habilitados y correctamente señalizados	X		
Cuenta con baranda superior		X	
Cuenta con baranda intermedia		X	
Cuenta con rodapiés		X	
Plataformas resistentes y completas		X	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	X		
La superficie de trabajo se encuentra libre de huecos?		X	
Plataformas firmemente fijadas al travesaño que los soporta	X		
Superficies de trabajo de los andamios libres de acopio de materiales	X		
En andamios con escala interior, las escotillas se mantienen cerradas y las escalas retraídas	X		
Uso restringido de otras superficies de trabajo sobre la plataforma del andamio (Ej.: banquillos, escalas).	X		
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructura metálica de los andamios.		X	
Superficies de trabajo con barandas perimetrales de doble altura, a 1 m y 0,5 m aproximadamente y rodapiés en todos los costados expuestos.		X	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	X		
Acceso restringido a la zona de armado o desarme del andamio	X		

	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE
EL ANDAMIO ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	X		

Andamio Tipo Torre, Ruedas


Dirección: Calle 29sur número 13ª-25 Soacha Cundinamarca 316 4418845
Correo electrónico: innovacioncolombia.sas@gmail.com

INNOVACION COLOMBIA SAS	INNOVACION COLOMBIA SAS	Código: FO-RE-GTH-13
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Fecha de aprobación: 27 -02-2018

RESPONSABLE DE INSPECCION: Jaye Velasquez — FECHA DE INSPECCION: 02/06/2026

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje, Aprovisionamiento con Guadua

ASPECTOS A INSPECCIONAR	SI	NO	OBSERVACION
¿El andamio es certificado?		X	
El andamio cuenta con el diseño establecido?	X		
El andamio se encuentra en un lugar correctamente almacenado?	X		
Todos los componentes del andamio sin daño?	X		
El andamio cuenta en su base con husillos de nivelación?		X	Ruedas
Apoyos de andamios nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados firmemente?	X		
Armado de andamio según estándar indicado por el fabricante y se utilizan sólo piezas propias del sistema modular.	X		
Las escaleras se encuentran aseguradas adecuadamente al andamio?	X		Fijas
Andamios cuentan con accesos seguros habilitados y correctamente señalizados.	X		
Cuenta con baranda superior		X	
Cuenta con baranda intermedia		X	
Cuenta con rodapiés		X	
Plataformas resistentes y completas		X	
Plataformas aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)		X	
La superficie de trabajo se encuentra libre de huecos?	X		
Plataformas firmemente fijadas al travesaño que los soporta.	X		
Superficies de trabajo de los andamios libres de acopio de materiales.	X		
En andamios con escala interior, las escotillas se mantienen cerradas y las escalas retraídas		X	
Uso restringido de otras superficies de trabajo sobre la plataforma del andamio (Ej.: banquillos, escalas).	X		
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructura metálica de los andamios.	X		
Superficies de trabajo con barandas perimetrales de doble altura, a 1 m y 0,5 m aproximadamente y rodapiés en todos los costados expuestos.		X	
Andamio sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	X		
Acceso restringido a la zona de armado o desarme del andamio	X		

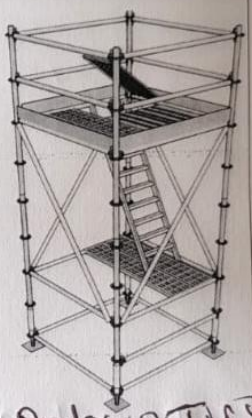

Andamio Tipo Torre con Ruedas.



	SI	NO	FIRMA DEL RESPONSABLE
EL ANDAMIO ESTA EN CONDICIONES SEGURAS PARA SU USO	X		

COMPONENTE SOCIAL

Durante la ejecución de las actividades de apuntalamiento preventivo y temporal de la estructura de cubierta de la Casa de la Convención, se evidenció que los trabajos se desarrollan en un área previamente aislada y señalizada, restringiendo el ingreso a personal ajeno a la ejecución del contrato. MC 008 2026 Objeto CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA DE LA CONVENCIÓN, MEDIANTE INTERVENCIONES INMEDIATAS Y PUNTUALES DESTINADAS A PREVENIR EL DETERIORO Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FÍSICA DEL INMUEBLE (BIC)

La infraestructura donde se realizan las labores permanece fuera de servicio y no presenta afluencia de público ni desarrollo de otras actividades simultáneas, por lo que no se generan afectaciones a la comunidad, usuarios o personal externo.

El ingreso al área de trabajo está autorizado únicamente para el personal operativo de la empresa Innovaccion Colombia S.A.S., encargado de la ejecución de las actividades contratadas. Adicionalmente, el único personal externo presente corresponde al guarda de seguridad privada de la empresa THOR LTDA quien cumple funciones de control de acceso y vigilancia de las instalaciones.

Las actividades se desarrollan bajo condiciones seguras, manteniendo el aislamiento del área de intervención, minimizando cualquier interacción con terceros y garantizando la protección tanto de los trabajadores como de la infraestructura intervenida.

OFICINA1	OFICINA 2	OFICINA 3
		
OFICINA4	OFICINA 5	ZONAEXTERIOR
		

INNOVACION COLOMBIA SAS

ACTA DE REUNIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO No. MC-008-2026

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato de ejecución de obras de primeros auxilios para la conservación del inmueble denominado Casa de la Convención, mediante intervenciones inmediatas y puntuales destinadas a prevenir el deterioro y garantizar la estabilidad física del inmueble (BIC).

Contratista: Innovaction Colombia S.A.S.

Lugar: Casa de la Convención, Municipio de Rionegro, Antioquia.

Fecha: Abierta Segun Ingresos Depersonal.

Hora de inicio: 9:30 Am

Hora de finalización: 10:00 Am.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socializar con el personal vinculado a la ejecución del Contrato No. MC-008-2026 las actividades a desarrollar durante la intervención del inmueble denominado Casa de la Convención, dando a conocer el alcance del contrato, las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los lineamientos ambientales, el componente social y las obligaciones que deberán cumplirse durante la ejecución de las obras.

TEMAS DESARROLLADOS

1. Presentación del Contrato No. MC-008-2026 y su objeto.
2. Alcance de las actividades de apuntalamiento preventivo y temporal de la estructura.
3. Delimitación y aislamiento del área de intervención.
4. Control de ingreso al sitio de trabajo.
5. Uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP).
6. Procedimientos seguros para trabajos de apuntalamiento.
7. Gestión ambiental durante la ejecución de la obra.
8. Manejo y disposición adecuada de los residuos generados.
9. Cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Recomendaciones generales para el desarrollo de las actividades.

INNOVACION COLOMBIA SAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó la socialización del Contrato No. MC-008-2026 con el personal operativo de **Innovaction Colombia S.A.S.**, dando a conocer el objeto contractual, el cual consiste en la ejecución de obras de primeros auxilios para la conservación del inmueble denominado Casa de la Convención mediante intervenciones inmediatas y puntuales destinadas a prevenir el deterioro y garantizar la estabilidad física del Bien de Interés Cultural.

Durante la reunión se explicó que las actividades consisten en el apuntalamiento preventivo y temporal de la estructura utilizando elementos como guadua, tablas de madera, pernos y tornillería en acero, garantizando la estabilidad de la cubierta durante la intervención.

Asimismo, se informó que las labores se desarrollan en un área previamente aislada y señalizada, sin presencia de usuarios o comunidad, permitiendo únicamente el ingreso del personal autorizado de Innovaction Colombia S.A.S. y del guarda de seguridad perteneciente a la empresa **THOR LTDA**, encargado del control de acceso a las instalaciones.

En materia ambiental se socializó que los residuos generados corresponden principalmente a retales de madera, guadua y residuos ordinarios producidos por el personal (botellas plásticas, bolsas y empaques de alimentos), los cuales serán gestionados mediante un punto temporal de acopio para los residuos de madera y guadua y la utilización de los puntos ecológicos existentes dentro de la infraestructura. Igualmente, se recordó la prohibición de realizar vertimientos o generar contaminación durante la ejecución de la obra.

Finalmente, se reiteró la obligación de cumplir los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, el uso permanente de los elementos de protección personal, el mantenimiento del orden y aseo del área de trabajo y el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas para la correcta ejecución del contrato.

COMPROMISOS

- Cumplir con el objeto y alcance del Contrato No. MC-008-2026.
- Utilizar permanentemente los elementos de protección personal.
- Mantener el área de trabajo debidamente delimitada y señalizada.
- Realizar la correcta separación y disposición de los residuos generados.
- Utilizar el punto temporal de acopio para los residuos de madera y guadua.
- Depositar los residuos ordinarios en los puntos ecológicos establecidos.
- Reportar cualquier condición insegura o novedad presentada durante la ejecución de las actividades.
- Cumplir con los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo y las disposiciones ambientales establecidas para el proyecto.

INNOVACION COLOMBIA SAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	Nombre y Apellidos	Empresa	Cargo	Cédula	Firma
1	Miguel pason G.	Innovaction S.A.S. Colombia	MAESTRO DE OBRA	9147147	Miguel pason
2	GUILLERMO TORO.	Innovaction S.A.S. Colombia	DIRECTOR OBRA	3313502	
3	ADRIAN QUINTERO M.	Innovaction S.A.S. Colombia	ayudante de obra	103523.4316.	Adrian Q
4	Carlos Rodas Hoyos.	Innovaction S.A.S. Colombia	maestro de obra.	8333038	Carlos Enrique Rodas
5	Juan Carlos Rodas	Innovaction S.A.S. Colombia	ayudante obra	1036845135	Juan Rodas
6	wilson CIRO	Innovaction S.A.S. Colombia	resede obra	1128402411.	Wilson Ciro
7	Enrique. Velazquez	Innovaction S.A.S. Colombia	apoyo sst	93418855	
8	Maria Alejandra M.	Innovaction S.A.S. Colombia	Profesional SST	1054561956	Alejandra M
9	Lisney Anaya.	Innovaction S.A.S. Colombia	ayudante obra	37557438.	Lisnelia
10	Adriana arango	THOR LTDA	Guarda de Seguridad		Adriana arango.
11	Lino Quina Muñoz	Innovacion colombia	ayudante.		

CIERRE DE LA REUNIÓN

No se presentaron observaciones adicionales por parte de los asistentes. Se deja constancia de que los participantes recibieron la socialización de los aspectos técnicos, sociales, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con la ejecución del Contrato No. MC-008-2026 y manifiestan haber comprendido la información suministrada.

ELABORÓ

Nombre: Alejandra Martínez Caviedes

Cargo: A.D- Seguridad y Salud En El Trabajo.

Empresa: Innovaction Colombia S.A.S.

Firma: Alejandra Martínez Caviedes

COMPONENTE AMBIENTAL

Las actividades ejecutadas corresponden al apuntalamiento de la estructura mediante la utilización de elementos constructivos como guadua, tablas de madera y pernos con tornillería en acero, sin emplear sustancias químicas, combustibles, pinturas, solventes u otros materiales que puedan generar contaminación del suelo, agua o aire.

Los residuos generados durante la ejecución de los trabajos corresponden principalmente a:

- Retales de madera.
- Retales de guadua.
- Residuos ordinarios generados por el personal (botellas plásticas, bolsas y empaques de alimentos e hidratación).

Para garantizar una adecuada gestión ambiental, se dispone de un punto temporal de acopio destinado al almacenamiento de los residuos de madera y guadua, facilitando su recolección y disposición final conforme a los procedimientos establecidos.

Adicionalmente, la empresa cuenta con un convenio con **Maderas El Herrero**, entidad encargada de realizar la recolección de los retales de guadua y sobrantes de madera generados durante la ejecución del proyecto, con el fin de promover su aprovechamiento y brindarles una segunda vida útil mediante procesos de reutilización, contribuyendo así a la reducción de residuos y al fortalecimiento de las prácticas de economía circular y gestión ambiental responsable.

Los residuos ordinarios son depositados en los puntos ecológicos existentes dentro de la infraestructura de la Casa de la Convención, realizando la respectiva separación en la fuente de acuerdo con la clasificación establecida.

Durante la ejecución de las actividades no se evidenciaron derrames de sustancias contaminantes, emisiones, vertimientos ni afectaciones ambientales asociadas al desarrollo del contrato.

PUNTO DE ACOPIO GUADUA	PUNTO ECOLOGICO	PUNTO DE ACOPIO MADERA







PLANILLA DE CAPACITACION

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

INNOVACION COLOMBIA SAS
Área Seguridad y salud en el Trabajo

TEMA:

Normatividad Ambiental
Clasificación de residuos (orgánicos, inorgánicos ,no reciclables manejo especial
Codigo de colores y tipo de contenedores
Orden y Limpieza en el Trabajo
Practicas sostenibles , consumo responsable, reducción de plásticos y valorización de residuos

FECHA: Abierta para ingresos | **LUGAR: CASA DE LA CONVENCION**

CC	APELLIDO Y NOMBRE	FIRMA
91471147	Miguel Pabon Beltez	Miguel P.
3313502.	Guillermo Toro.	
1035234316.	Adrian Andres. Quintero.	AdrianQ.
83330338.	Carlos Enrique Rodas.	Carlosenrique rodas
1036599535	Juan Carlos Rodas.	Juan Rodas.
1128402411.	Wilson Esteban Cire.	Wilson Cerro
93418555	Jose Enrique. Volasco.	
3355738.	Linney Aray urbina.	Lisney.
1013328166.	Natalia. Gomez Cardenas	Natalia G
1006484.567	Jose Ivan Quiñonez Moñoz.	

Alejandra Gomez Cadel
1054664945
AD. seguridad y salud en el trabajo

COMPONENTE LEGAL

Durante el periodo evaluado se verificó que las actividades ejecutadas se desarrollan en cumplimiento del objeto del Contrato No. MC-008-2026, conforme a las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente aplicable a la conservación de bienes de interés cultural.

Se evidenció que el personal vinculado a la ejecución de la obra cuenta con la documentación requerida para el ingreso y desarrollo de las actividades, incluyendo afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, entrega de elementos de protección personal, permisos de trabajo y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando estos son requeridos,Asimismo, las labores se ejecutan dentro de un área debidamente delimitada y señalizada, garantizando el control de acceso, el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y la protección de la infraestructura intervenida.

Durante el periodo reportado no se presentaron requerimientos por parte de autoridades competentes, sanciones, incumplimientos contractuales, conflictos con terceros, reclamaciones de la comunidad ni situaciones jurídicas que afecten el desarrollo normal del contrato.

COMPONENTE FINANCIERO

Durante el periodo correspondiente al presente informe se constató que las actividades ejecutadas se desarrollan conforme a la programación física establecida para el contrato, utilizando los recursos humanos, técnicos y materiales previstos para la ejecución de las obras, Los materiales empleados en las actividades de apuntalamiento corresponden principalmente a guadua, madera (tablas), pernos y tornillería en acero, sin evidenciar desperdicios significativos ni utilización de materiales diferentes a los contemplados para la intervención.

La gestión de los recursos se realiza de manera eficiente mediante el adecuado almacenamiento y aprovechamiento de los materiales, procurando minimizar pérdidas y optimizar su utilización durante la ejecución de la obra.

A la fecha del presente informe no se evidencian hechos que generen sobrecostos, reclamaciones económicas, suspensiones por causas financieras o situaciones que afecten el equilibrio económico del contrato. La ejecución financiera avanza de manera concordante con el desarrollo físico de las actividades programadas, conforme a las condiciones contractuales.

CONCLUSIONES

En el desarrollo del proyecto se promovieron y fortalecieron espacios de socialización, capacitación y participación dirigidos a todo el personal vinculado, con el propósito de garantizar una ejecución integral, segura, organizada y conforme a los lineamientos establecidos en el contrato. Estos escenarios permitieron divulgar de manera oportuna los procedimientos de trabajo, las responsabilidades de cada participante y las medidas preventivas necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades, fomentando una cultura de prevención, autocuidado, cumplimiento y mejora continua.

En el componente social, las actividades desarrolladas favorecieron la comunicación permanente entre el contratista, el personal ejecutor y los diferentes actores relacionados con el proyecto, fortaleciendo el trabajo en equipo, la participación activa, el respeto por la comunidad y la generación de un ambiente laboral basado en la cooperación, la responsabilidad y el compromiso con el cumplimiento de los objetivos contractuales.

En el componente ambiental, se reforzó la importancia de implementar buenas prácticas para la protección de los recursos naturales, el manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución de las actividades, el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, promoviendo el desarrollo de las obras bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

Desde el componente legal y jurídico, se socializaron las obligaciones derivadas del contrato, la normatividad vigente aplicable, los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades de los trabajadores y del contratista, así como los procedimientos internos orientados al cumplimiento de los requisitos legales, fortaleciendo el conocimiento normativo y reduciendo el riesgo de incumplimientos durante la ejecución contractual.

En el componente financiero, se dio a conocer la importancia de realizar una adecuada administración de los recursos asignados al proyecto, promoviendo la transparencia, el control, la eficiencia en la utilización de los recursos públicos o privados y el cumplimiento de las obligaciones administrativas y contractuales, aspectos fundamentales para garantizar la correcta ejecución del contrato y la sostenibilidad del proyecto.

De igual manera, las jornadas de capacitación permitieron reforzar los procedimientos relacionados con la identificación de peligros, valoración de riesgos, uso adecuado de los elementos de protección personal, atención de emergencias, inspecciones preoperacionales, señalización, trabajo seguro y demás actividades orientadas a preservar la integridad física de los trabajadores y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales.

Como resultado de estas acciones, se consolidó un entorno de trabajo más seguro, participativo y organizado, en el que el personal adquirió herramientas técnicas, legales y operativas que fortalecen el desempeño de sus funciones y facilitan el cumplimiento de las metas del proyecto.

Dirección: Calle 29sur número 13ª-25 Soacha Cundinamarca 316 4418845
Correo electrónico: innovacioncolombia.sas@gmail.com
