1088

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			Puerto Gaitán
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	**Versión:** 06	**Vigencia:** 30/06/2026	

1090-1461

Puerto Gaitán, 31 de julio de 2026

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Karen P
Fecha 05 AGO 2026
Hora: 10:37 pm

Doctor (a)
ALEJANDRA CASTILLO BLANDÓN
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán

REF. Proyecto BPIN 202500000031783 – Contrato de interventoría No. 1701 del 09 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META " (Proceso CM-SI-010-2025).

Asunto: Remisión de documentos para el pago del Acta Parcial No. 1 del contrato en referencia.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito remitir a sus despachos la documentación correspondiente al trámite de pago del Acta Parcial No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025, con el fin de que se adelanten las actuaciones administrativas de su competencia para la correspondiente gestión y pago.

La documentación remitida ha sido revisada y cuenta con los soportes requeridos para continuar con el trámite respectivo, de conformidad con los procedimientos administrativos establecidos por la Entidad.

Agradezco la atención prestada y solicito comedidamente dar el trámite correspondiente, quedando esta Secretaría atenta a cualquier información o documentación adicional que se requiera.

Atentamente,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Karen P
Fecha 13 AGO 2026
Hora: 11:00 pm

ING. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó: Ing. Luz Adriana Hernández Cantor - Directora técnica De Seguimiento De Proyectos De Infraestructura
Aprobó: Ing. Christian Julián Fernández Reyes - Secretario De Infraestructura

Escanea este código

Encuesta de Satisfacción

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / WhatsApp 3208632489 - 3117775374
E-mail: atencionalciudadano@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/alcaldiadepuertogaitan

1099

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

51-0179
10:51 am
17 JUL 2026 Adriana

PUERTO GAITAN – 17/07/2026

Señor(a)
ING. CHRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía municipal – Puerto Gaitán, Meta

Ref.: Contrato de Interventoría **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META".**

Asunto: Solicitud de cobro de Acta Parcial No. 01 del contrato de interventoría No. 1701 de 2025

En calidad del Contrato de Interventoría "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META". Nos permitimos remitir a la entidad contratante la documentación para la presentación correspondiente al Acta Parcial de Interventoria No. 01, por valor de Doscientos tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos ($203.458.536,00 M/CTE), correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026.

El presente cobro corresponde a un avance parcial del 68,66% para un acumulado de 68,66% de la obra ejecutada, quedando un saldo del 31,34% del valor total del contrato por ejecutar.

Cordialmente,

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5
Utinterpolicia2025@gmail.com

1090

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	LISTA DE CHEQUEO PAGOS PARCIALES DE CONTRATOS OBRA PÚBLICA E INTERVENTORIA Infraestructura		Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-22	Version:05	Fecha:10-01-2025

CONTRATO No. 1701 DE 2025	DIA 9 MES DICIEMBRE	AÑO: 2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".	
CONTRATISTA : UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025		
PERIODO DEL INFORME DESDE	DIA 18 MES DICIEMBRE	AÑO: 2025
HASTA	DIA 31 MES MAYO	AÑO: 2026

GFI			SCO					
No	FORMATO	DOCUMENTO/TRAMITE	DOCUMENTOS					RESPONSABLE
			GFI	SCO	SI	NO	N/A	
1	INF-FR-22	Verificación de la lista de Chequeo	X	X	X			Interventor Supervisor designado
2	-	Copia Minuta de contrato, adicionales, modificatorias, prorrogas, etc.	X	N/A	X			Interventor Supervisor designado
3	-	Copia del certificado de registro presupuestal	X	N/A	X			Interventor Supervisor designado
4	-	Factura	X	N/A	X			Contratista
5	-	Certificación bancaria	X	X	X			Contratista
6	-	Rut Primera Cuenta	X	N/A	X			Contratista
7	INF-FR-74 INF-FR-80	Informe de parcial de obra / informe de parcial de interventoría	N/A	X	X			Contratista
8	SCO-FR-101	Certificación de cumplimiento	X	X	X			Interventoria
9	SCO-FR-109	Certificado Pago Seguridad Social (Supervision a interventoria)	X	X	X			Supervisor designado
10	INF-FR-55	Certificado Pago Seguridad Social (Interventoria a obra)	X	X	X			Interventoria
11		certificado del revisor fiscal (incluir soportes del revisor) en caso de no tener revisor fiscal debe estar firmado solo por el R/L	X	X	X			Interventoria
12		Verificación pago seguridad social integral Salud, pensión y riesgos Anexando dos fotocopia de las planillas legibles y comprobante de pago	X	X	X			Interventoria
13		Informe de interventoria / informe de supervisión	N/A	X	X			Supervisor designado
14	INF-FR-26	formato de pago parcial	X	X	X			
15	INF-FR-11/23	Formato de acta de Pago Parcial o final	N/A	X	X			Supervisor designado
16	INF-FR-20	Memorias de calculo	N/A				X	Contratista
17	INF-FR-83	Planos rotulados y firmados	N/A				X	
18	SCO-FR-100	Informe de inversion y buen manejo del anticipo (si aplica)	N/A				X	Contratista
19		CD (con toda la información en formato Word, PDF, dwg, mpp, en otros.)	N/A				X	Contratista

NOTA:	Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento que puede servir de prueba, tipificada en la Ley Penal como delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que conlleva

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

1691

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES DE PARCIAL DE INTERVENTORÍA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-80	Version:02	Vigencia:10-01-2025

Ciudad y Fecha: Puerto Gaitán

Contrato de Interventoría No.: 1701 DE 2025

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

Radicado No: Fecha: _____ / _____ / _____

Periodo del informe: Desde: 18/12/2025 Hasta: 31/05/2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	***INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO***					
1,01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			
2	***INFORMACION DEL CONTRATO***					
2,01	**Cuadro de trazabilidad :** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			
3	***INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO***					
3,01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			
3,02	Informe Jurídico del estado de cumplimiento e incumplimiento del contrato	X	X			
4	***INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO***					
4,01	Ordenes de pago efectuadas (desembolso de anticipo y pagos parciales).	X	X			
4,02	Información de avance financiero de interventoría	X	X			
4,03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de interventoría.	X	X			
4,04	Relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de interventoría	X	X			
4,05	Relación de Registros Presupuestales de cada contrato de interventoría.	X	X			
4,06	Relación de BPIN y rubros presupuestales de cada contrato de interventoría.	X	X			
5	***INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO***					
5,01	grafico de avance obra programado vs ejecutado de las actividades contratas (financiera, porcentajes) si aplica	X	X			
5,02	Justificación de los capítulos a cobrar con sus respectivos soportes en anexos	X	X			
6	***INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO***					
6,01	Cuadro de relación de personal de obra (profesional - operativo), tipo de vinculación; personal propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) y organigrama de personal	X	X			
7	***CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS EN EL PERIODO A COBRAR***					
8	***CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)***					
9	***ANEXOS***					
9,01	Registro fotográfico de avancen de obra (fuente propia)	X	X			
9,02	Resultados de los laboratorios tomados en el periodo a cobrar	X	X			
9,03	verificación de los certificados de calidad de los materiales , calidad de materiales (anexar de acuerdo al tipo de obra y obligaciones legales, calibración de equipos utilizados en los ensayos o levantamientos topográficos)				X	
9,04	Paz y salvo de los trabajadores retirados al corte	X	X			
10	***CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)***	X	X			

NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoría, deben allegarse por la interventoría conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Reviso

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
R/L interventoría

Aprobó

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Nota: Se debe paginar los informes

CERTIFICACION BANCARIA

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025 identificado(a) con NITPJ 9020144195 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH SuperdÃ-a JurÃ-dica No. 351356043 desde el 17 de diciembre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

INF-FR-80
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA (18 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2026)

INTERVENTORÍA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

La interventoría del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 se constituye como el mecanismo de control integral para la ejecución del proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán – Meta. Su alcance es multidisciplinario, abarcando los componentes técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La interventoría actúa como mecanismo de control y vigilancia permanente del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad, funcionalidad y correcta inversión de los recursos asignados al proyecto. Dicha labor de control y vigilancia se ha ejercido de manera continua y permanente durante el periodo reportado, adaptando los procesos de supervisión a las condiciones particulares de ejecución del proyecto, el cual se desarrolla en una infraestructura operativa y habitada por personal de la Fuerza Pública, lo que ha demandado un seguimiento riguroso en materia de seguridad, logística y mitigación de riesgos de manera diaria.

Dentro del alcance contractual de la interventoría se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:
Ejecución de la supervisión y control técnico sobre las actividades desarrolladas en obra, garantizando su correcta ejecución bajo las condiciones especiales del sitio.
- Seguimiento y evaluación continua al cumplimiento del cronograma físico y financiero, analizando los rendimientos condicionados por la operatividad de la estación.
- Verificación y cubicación de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas en el periodo.
- Control de calidad de materiales, procesos constructivos y seguimiento a los ensayos de laboratorio requeridos.
- Seguimiento administrativo, contractual y documental para el correcto ordenamiento del expediente del proyecto.
- Verificación y exigencia en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con énfasis en la mitigación de riesgos por la coexistencia de personal civil y policial.
- Revisión, validación y trámite de actas, informes y soportes contractuales generados durante el periodo reportado.
- Control, registro y seguimiento diario al ingreso y permanencia de maquinaria, personal y equipos en las instalaciones de la obra.
- Emisión oportuna de conceptos técnicos, recomendaciones y observaciones dirigidas a la entidad contratante para la toma de decisiones

1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

Puerto Gaitán es un municipio ubicado en el departamento de Meta. Incluye una extensa área de estructura plana conocida como las Sabanas de la Altillanura, cuyo eje principal es el río Meta. El municipio es un rectángulo irregular circunscrito por el río Meta al norte, los ríos Manacacias y Yucao al oeste, el río Iteviare al sur y una línea recta al este. Forma el extremo noreste del departamento de Meta, siendo el municipio más alejado de la capital departamental, Villavicencio, a una distancia de 212 kilómetros al oriente.

Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco. Entre las principales actividades económicas del Municipio se encuentran la ganadería, pesca, explotación de hidrocarburos, agricultura, turismo y recreación.

Límites del municipio: Puerto Gaitán es el cuarto municipio más grande de Colombia y segundo del Meta. Se encuentra ubicado en las coordenadas 3° 05' y 4° 08' Latitud Norte y 71° 05' y 72° 30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 kilómetros cuadrados y limita por el norte con el departamento del Casanare; por el sur

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

con los municipios de Mapiripán y San Martín; por el oriente con el departamento del Vichada y por el occidente con los municipios de Puerto López y San Martín.

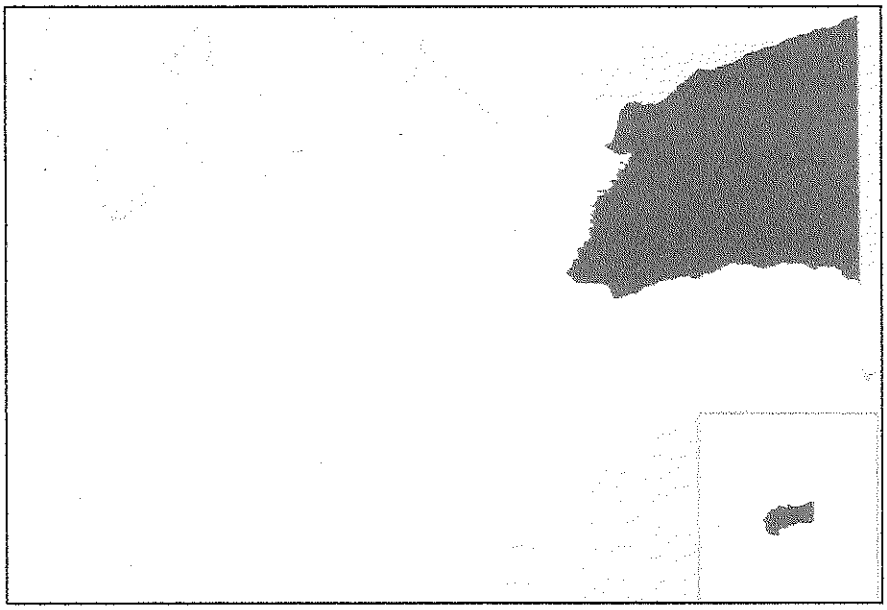


Imagen 1: Localización de la cabecera municipal de Puerto Gaitán-Meta.
***Fuente:** es.wikipedia.org/.*

1.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

El proyecto para la construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, específicamente en la Carrera 10 No. 16-15A.

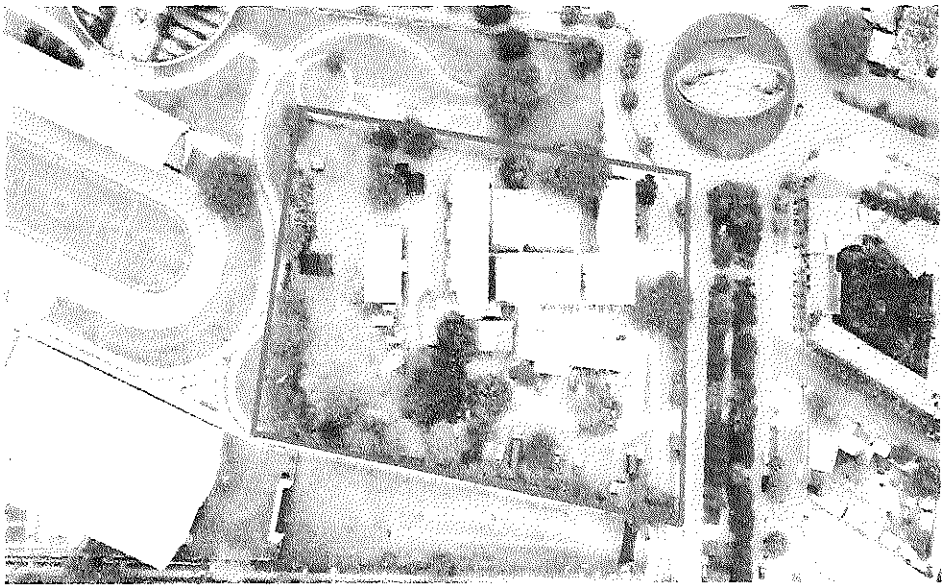


Imagen 2: Imagen aérea del proyecto

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.

De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.

La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.

En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.

Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

1.5. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2. INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	UTINTERPOLICIA2025@GMAIL.COM
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
MODIFICATORIA N°1:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 Modificación a la cláusula decima octava del contrato de interventoría.

Tabla 1. Información del contrato

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

3.1. VERIFICACIÓN DE POLIZAS

SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	09/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	09/08/2026	09/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/12/2025	09/08/2029	$14,815,654.70	
SEGUROS DEL ESTADO	30-40-101025734 ANEXO 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	Aprobada
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	
SEGÚN MODIFICATORIA No.01						
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

Tabla 2. Verificación de polizas

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. ÓRDENES DE PAGO EFECTUADAS Y AVANCE FINANCIERO PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO


RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
N/A	$		
N/A	$		
TOTALES	**$**		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	$ 00		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	**$ 00**

Tabla 3. Órdenes de pago efectuadas

Nota aclaratoria financiera: Se deja constancia expresa de que EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO TIENE ANTICIPO, ASÍ QUEDÓ ESTABLECIDO EN LA MINUTA DEL CONTRATO. Al no haberse pactado la entrega de este recurso, la ejecución financiera de la interventoría se rige exclusivamente mediante la modalidad de pagos parciales contra entrega y aprobación de los informes de actividades mensuales, manteniendo un saldo por amortizar equivalente a cero ($0,00) durante toda la vigencia contractual.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

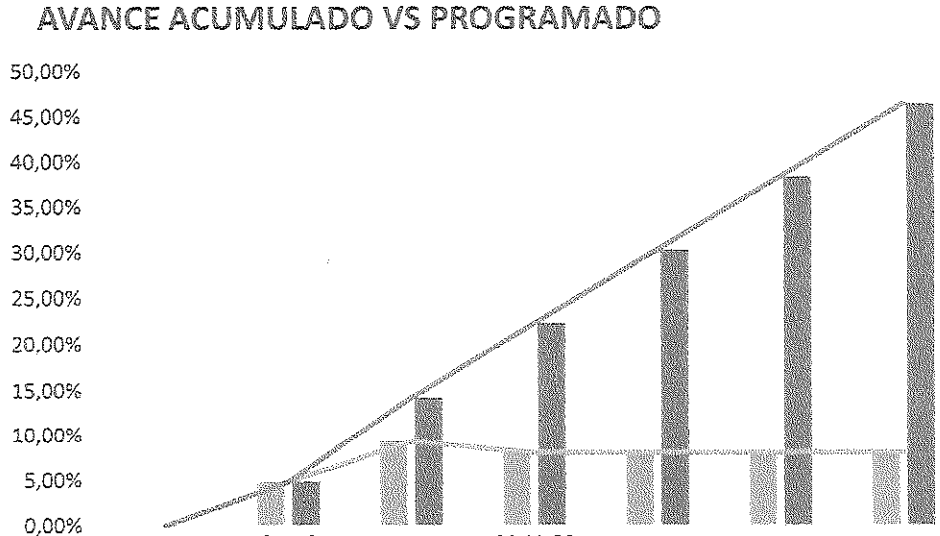4.2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA



	Inicio	18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	01 AL 31 DE MARZO DE 2026	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	01 AL 31 DE MAYO 2026
% PROGRAMADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
ACUMULADO PROGRAMADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%	46,44%
%EJECUTADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
EJECUTADO ACUMULADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%	46,44%

% PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO %EJECUTADO EJECUTADO ACUMULADO

4.3. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$296.313.094
VALOR PROYECTO ACTUALIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 01 – 35%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO No. 02 – 15%	$ 0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

Tabla 4. Balance financiero

4.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN, REGISTROS Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de interventoría:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.3.3.4.01-R. B CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 74.136.286.00	DIS.2025002849	RES.2025004220
	$ 222.176.808,00	DIS. 2026000009	RES.2026000003
TOTALES	**$ 296.313.094,00**		

Tabla 5. CDP Y RP

5. INFORMACIÓN TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO


CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345	$297.199.233	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987	$484.937.220	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087	$706.564.307	5,15%	16,41%	$95.934.936,12	$379.838.767,96	2,23%	8,82%
31/05/2026	$331.938.505	$1.038.502.812	7,71%	24,12%	$189.309.686	$569.148.454	4,40%	13,22%

Tabla 6. Avance de obra programado vs ejecutado

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA		
	Infraestructura		
	Código: INF-FR-80	Versión: 04	Vigencia: 10-01-2025

TABLA DE SEGUIMIENTO FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

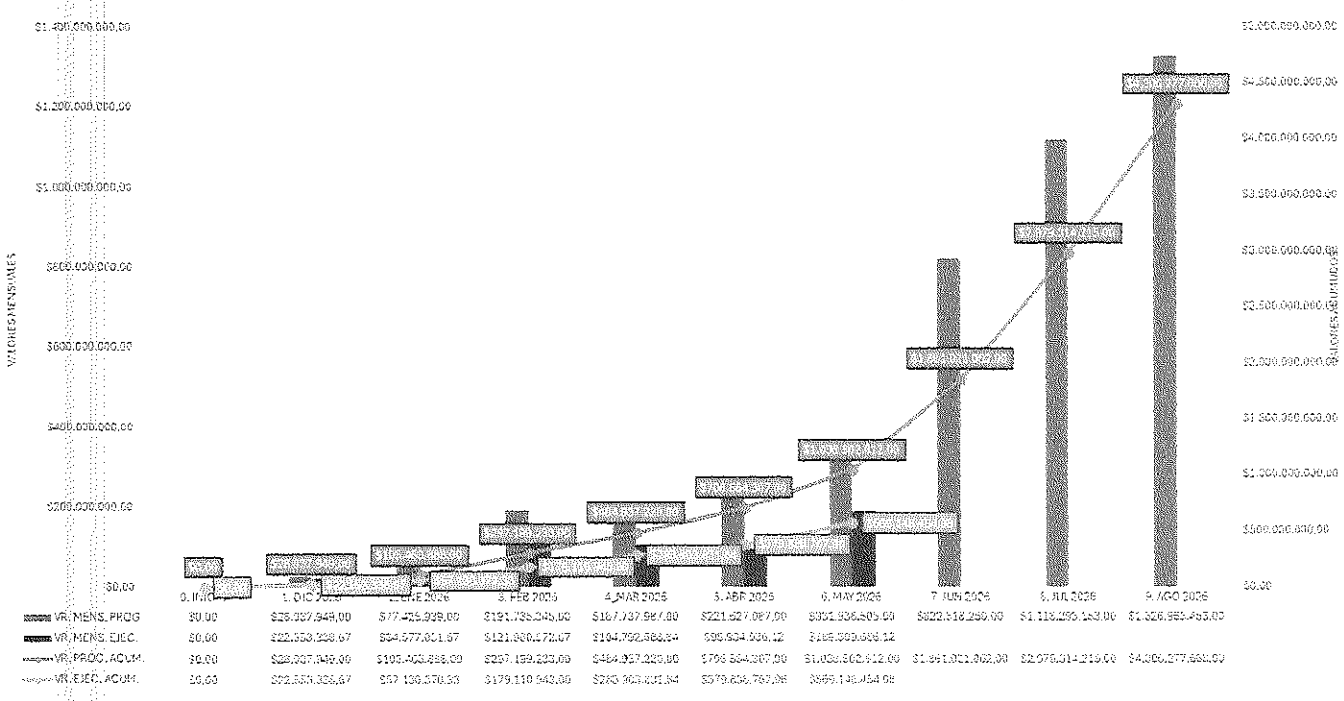
TABLA DE SEGUIMIENTO $



	0. INICIO	1. DIC 2025	2. ENE 2026	3. FEB 2026	4. MAR 2026	5. ABR 2026	6. MAY 2026	7. JUN 2026	8. JUL 2026	9. AGO 2026
VR. MENS. PROG	$0,00	$26.037.948,00	$77.425.939,00	$191.736.245,00	$167.737.967,00	$221.627.087,00	$391.936.505,00	$822.318.250,00	$1.118.250.163,00	$1.326.985.483,00
VR. MENS. EJEC.	$0,00	$22.553.268,67	$54.977.601,67	$121.930.672,67	$164.792.568,54	$96.624.036,12	$146.969.656,12			
VR. PROG. ACUM.	$0,00	$26.037.948,00	$103.463.887,00	$295.199.223,00	$462.937.225,00	$708.564.397,00	$1.100.502.912,00	$1.941.821.162,00	$3.060.071.325,00	$4.387.056.808,00
VR. EJEC. ACUM.	$0,00	$22.553.268,67	$77.530.870,33	$199.461.543,00	$364.254.111,54	$460.878.147,66	$607.847.803,78			

TABLA DE SEGUIMIENTO DE PORCENTAJES DEL CONTRATO DE OBRA

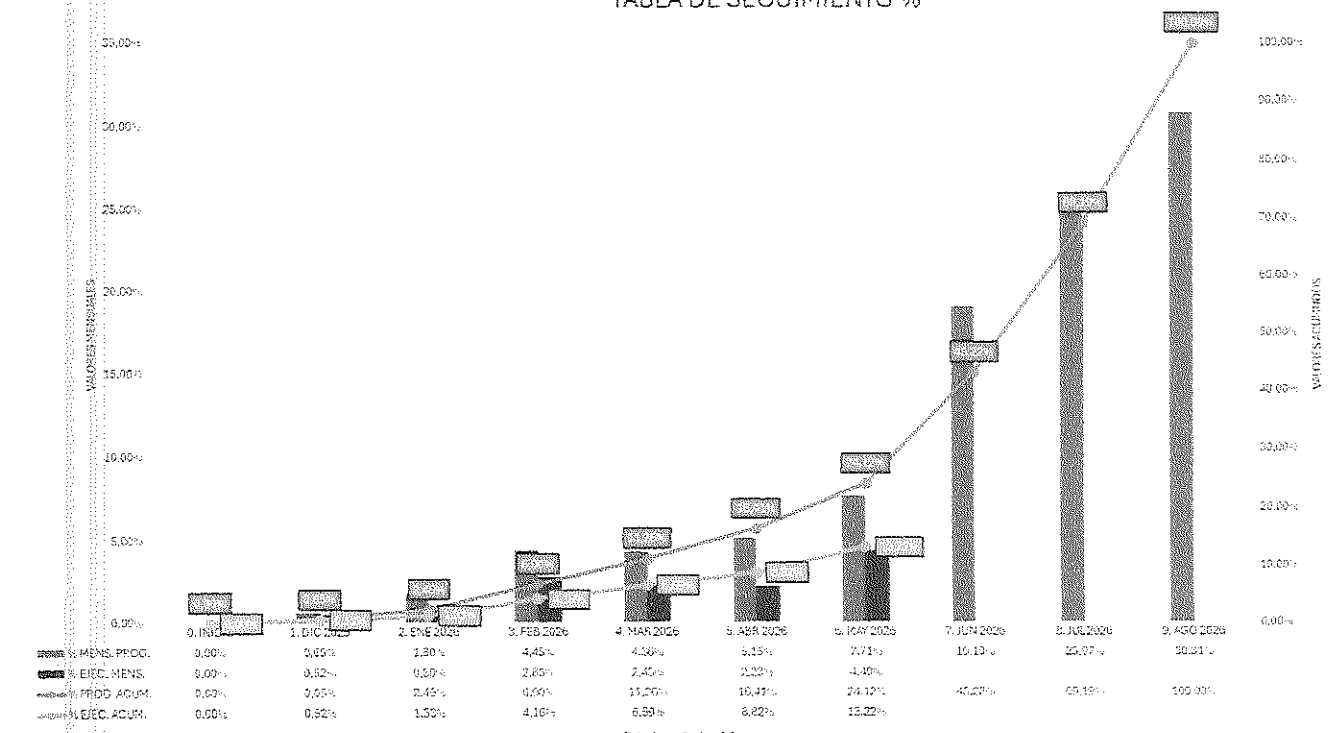TABLA DE SEGUIMIENTO %



	0. INICIO	1. DIC 2025	2. ENE 2026	3. FEB 2026	4. MAR 2026	5. ABR 2026	6. MAY 2026	7. JUN 2026	8. JUL 2026	9. AGO 2026
% MENS. PROG.	0,00%	0,59%	1,80%	4,45%	4,38%	5,15%	7,71%	10,10%	25,97%	30,81%
% EJEC. MENS.	0,00%	0,52%	0,50%	2,83%	2,40%	2,33%	4,40%			
% PROG. ACUM.	0,00%	0,59%	2,40%	6,85%	11,20%	16,45%	24,12%	45,07%	69,19%	100,00%
% EJEC. ACUM.	0,00%	0,52%	1,80%	4,16%	8,59%	8,82%	13,22%			

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

5.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS CAPITULOS A COBRAR

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 1701-2025 y como soporte de la presente Acta Parcial de Cobro No.01, la firma interventora presenta la justificación detallada de las funciones desempeñadas por cada uno de los profesionales, personal técnico y costos administrativos vinculados al proyecto durante el período el 18 de diciembre del 2025 al 31 de mayo del 2026, describiendo las actividades desarrolladas en el marco del ejercicio de sus cargos y la contribución de cada uno al cumplimiento del objeto del contrato de interventoría. Los soportes de legalización correspondientes a cada profesional se encuentran debidamente relacionados y adjuntos en los Anexos del presente informe.

- **PERSONAL PROFESIONAL**

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ejerció la dirección integral y la coordinación general de todas las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas desarrolladas por el equipo de interventoría en el marco del seguimiento y control del Contrato de Obra No. 1683 de 2025. En el desempeño de su cargo, este profesional cumplió las siguientes funciones principales:

Dirigió y coordinó el equipo interdisciplinario de interventoría, impartiendo los lineamientos técnicos y administrativos requeridos para el ejercicio eficiente y oportuno de las funciones de seguimiento y control sobre la ejecución del contrato de obra, garantizando la coherencia técnica de los conceptos y pronunciamientos emitidos por la interventoría durante el período.

Realizó visitas técnicas de inspección y recorridos de verificación a los frentes de obra activos, con el propósito de constatar directamente las condiciones de ejecución, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y emitir los conceptos técnicos y avales requeridos sobre las actividades ejecutadas por el contratista

.

Emitió los pronunciamientos técnicos, conceptos de interventoría, avales de modificaciones contractuales y demás documentos técnicos requeridos durante el período, en ejercicio de las facultades de control y certificación propias de su cargo, garantizando que las actuaciones de la interventoría estuvieran fundamentadas en la verificación objetiva de las condiciones reales de obra.

Suscribió y tramitó la totalidad de las comunicaciones formales dirigidas al contratista y a la entidad contratante durante el período de reporte, incluyendo oficios técnicos, memorandos, solicitudes de información, requerimientos al contratista y demás comunicaciones propias del ejercicio de las funciones de interventoría, garantizando la trazabilidad documental del proceso de seguimiento y control.

Presidió y participó en los comités técnicos de obra, reuniones de coordinación y demás espacios de articulación interinstitucional realizados durante el período, representando técnica y administrativamente a la interventoría ante la entidad contratante, el contratista y demás actores del proyecto.

Ejerció el seguimiento y control sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista en materia técnica, administrativa, financiera y de seguridad social, verificando la vigencia de las garantías contractuales, el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la obra y el cumplimiento de las demás obligaciones legales y contractuales aplicables.

Revisó, analizó y aprobó los informes de avance de obra, las memorias de cantidades, los análisis de precios unitarios y demás documentación técnica y financiera presentada por el contratista como soporte de las actas parciales de cobro, garantizando la veracidad, consistencia y concordancia de la información con las condiciones reales verificadas en campo.

Supervisó la elaboración y presentación oportuna de los informes mensuales de interventoría ante la entidad contratante, garantizando que su contenido reflejara de manera objetiva y documentada el estado real de avance, las condiciones de ejecución y las situaciones técnicas y administrativas relevantes del período de reporte.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: Durante el período de reporte, el Residente de Interventoría ejerció las funciones de seguimiento técnico continuo, inspección diaria en campo y control de calidad de las actividades constructivas desarrolladas por el contratista en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025. En el desempeño de su cargo, este profesional cumplió las siguientes funciones principales:

Mantuvo presencia continua en el área de obra durante los horarios de ejecución de las actividades constructivas, realizando el seguimiento diario de los frentes de trabajo activos, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales y el control de los procesos constructivos ejecutados por el contratista, garantizando que las obras se desarrollaran conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas del proyecto y la normativa técnica vigente aplicable.

Realizó la verificación, medición y aprobación de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista durante el período de reporte, efectuando las mediciones en campo requeridas, comparando los volúmenes ejecutados con los planos aprobados y las memorias de cálculo del proyecto, y certificando las cantidades que sirven de base para el reconocimiento económico en las actas parciales de cobro del contrato de obra.

Ejerció el control de calidad de los materiales, insumos y procesos constructivos utilizados por el contratista durante el período, verificando que los materiales empleados cumplieran con las especificaciones técnicas contractuales, las normas técnicas colombianas aplicables y los estándares de calidad exigidos por el proyecto, y solicitando los ensayos de laboratorio y pruebas de control de calidad requeridas para certificar la conformidad técnica de los materiales y elementos incorporados a la obra.

Elaboró los informes técnicos de avance de obra correspondientes al período de reporte, documentando de manera objetiva el estado de avance de cada frente de trabajo activo, las cantidades ejecutadas, los materiales utilizados, las condiciones de ejecución verificadas y las observaciones técnicas identificadas durante las inspecciones de campo, sirviendo como insumo principal para la elaboración del informe mensual de interventoría presentado ante la entidad contratante.

Verificó el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo en los frentes de obra activos durante sus recorridos diarios de inspección, identificando condiciones inseguras o incumplimientos a los procedimientos de seguridad establecidos y comunicándolos oportunamente al profesional HSEQ de la interventoría y al contratista para su corrección inmediata.

Sirvió de enlace técnico permanente y directo entre la interventoría, el contratista y la entidad contratante en los asuntos técnicos del día a día de la obra, atendiendo las consultas técnicas del contratista, tramitando oportunamente las solicitudes de concepto y aprobación requeridas durante la ejecución y reportando al director de Interventoría las situaciones técnicas relevantes identificadas en campo.

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: ejerció las funciones de seguimiento, inspección técnica y verificación del cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ) implementado por el contratista en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, en el desempeño de su cargo, este profesional cumplió las siguientes funciones principales:

Realizó inspecciones técnicas periódicas a los frentes de obra activos durante el período de reporte, con el propósito de verificar el establecimiento y mantenimiento de las condiciones seguras de trabajo requeridas para el desarrollo de las actividades constructivas, identificando condiciones inseguras, actos inseguros o incumplimientos a los procedimientos de seguridad establecidos, y gestionando su corrección oportuna mediante los requerimientos formales al contratista.

Verificó la correcta implementación y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del contratista, constatando que los peligros asociados a las actividades constructivas ejecutadas durante el período fueran identificados, valorados y controlados conforme a la jerarquía de controles establecida por la normativa de seguridad y salud en el trabajo vigente.

Verificó el desarrollo y documentación de las jornadas de socialización de procedimientos seguros de trabajo, charlas de seguridad, inducciones al personal nuevo y capacitaciones en materia de prevención de riesgos laborales realizadas por el contratista durante el período, constatando la existencia de los registros de asistencia

y soportes documentales correspondientes y la pertinencia técnica de los temas abordados en relación con las actividades constructivas del período.

Realizó la inspección técnica del uso, estado y adecuación de los Elementos de Protección Personal (EPP) suministrados por el contratista al personal en obra, verificando que los EPP utilizados correspondan a los requeridos para cada actividad según la matriz de peligros y riesgos vigente, que se encuentren en buen estado de conservación y que su uso sea consistente y permanente durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Efectuó el seguimiento y verificación de la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto durante el período de reporte, constatando que las medidas de señalización vial, dispositivos de canalización, control de ingreso y salida de vehículos, manejo de residuos sólidos y demás medidas de gestión ambiental y de tránsito establecidas en dichos planes fueran implementadas conforme a lo aprobado y en concordancia con la normativa aplicable.

Revisó, analizó y aprobó los formatos, registros y documentos del Sistema de Gestión HSEQ diligenciados por el contratista durante el período de reporte, verificando su completitud, veracidad y concordancia con las actividades ejecutadas en campo, y emitiendo las observaciones y recomendaciones técnicas pertinentes para el mejoramiento continuo del sistema de gestión implementado.

- **PERSONAL TECNICO**

TOPOGRAFO:
Durante el período de un (1) mes correspondiente al Acta Parcial del Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025, el profesional Topógrafo desarrolló de manera permanente las actividades de seguimiento, control y verificación topográfica requeridas para el adecuado ejercicio de la interventoría técnica sobre el Contrato de Obra No. 1683 de 2025.

En cumplimiento de sus funciones, realizó la revisión y verificación de los levantamientos topográficos ejecutados por el contratista, el control de la cartera de coordenadas, la comprobación de los puntos de referencia (BM), ejes y alineamientos del proyecto, así como la validación de las actividades de localización, trazado y replanteo de las diferentes estructuras proyectadas, verificando su correspondencia con los diseños aprobados, las especificaciones técnicas, la normatividad aplicable y la información cartográfica del proyecto.

Así mismo, efectuó verificaciones planimétricas y altimétricas de las excavaciones, cimentaciones, rellenos, niveles de fundación y demás elementos construidos, brindando apoyo técnico durante las inspecciones de campo y en la revisión de los ajustes derivados de las modificaciones técnicas presentadas durante la ejecución del contrato.

CADENERO: Durante el período de un (1) mes correspondiente al Acta Parcial del Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025, el Cadenero prestó apoyo permanente a las actividades topográficas desarrolladas por la Interventoría, contribuyendo al cumplimiento de las labores de seguimiento, control y verificación técnica del Contrato de Obra No. 1683 de 2025.

En desarrollo de sus funciones, apoyó la materialización de puntos de control, instalación y conservación de estacas y referencias topográficas, manejo de prismas, cintas y demás equipos auxiliares, medición de distancias, levantamientos planimétricos y altimétricos, localización de ejes, replanteo de estructuras y verificación de niveles, facilitando la obtención de información precisa para el control topográfico de la obra.

Igualmente, participó en las jornadas de inspección técnica realizadas por la Interventoría para la verificación de excavaciones, cimentaciones, rellenos, estructuras y demás actividades ejecutadas por el contratista, suministrando el apoyo operativo requerido para garantizar la confiabilidad de las mediciones y de los registros de campo.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

- **COSTOS ADMINISTRATIVOS**

Durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, la Interventoría mantuvo la infraestructura administrativa, logística y operativa necesaria para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento, control, vigilancia y supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y de seguridad y salud en el trabajo del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, en cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.

Los costos administrativos incurridos durante el período corresponden a gastos indispensables para el normal funcionamiento de la Interventoría, los cuales permitieron asegurar la continuidad de las actividades de control contractual, la elaboración y revisión de la documentación técnica, la atención de comités de obra, reuniones técnicas, visitas de inspección y la permanente comunicación entre la Entidad Contratante, el contratista y la Interventoría.

En consecuencia, se justifica el reconocimiento de los siguientes costos administrativos:

ALQUILER DE OFICINA: Durante el período objeto de cobro se dispuso de un espacio físico destinado al funcionamiento administrativo de la Interventoría, el cual permitió el desarrollo de las actividades de coordinación técnica y administrativa, revisión documental, elaboración de informes mensuales, actas, conceptos técnicos, control contractual, archivo de la información del proyecto y atención de reuniones de seguimiento con las diferentes partes involucradas. La disponibilidad permanente de estas instalaciones constituyó un recurso indispensable para garantizar la adecuada prestación del servicio de interventoría.

ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO: El alquiler de equipos de cómputo permitió contar con las herramientas tecnológicas necesarias para el procesamiento, análisis y control de la información técnica y administrativa del contrato. Estos equipos fueron utilizados para la elaboración de informes mensuales de interventoría, revisión de diseños, análisis de presupuestos, programación de obra, control de avances físicos y financieros, elaboración de conceptos técnicos, manejo de bases de datos, procesamiento de información topográfica, almacenamiento documental y demás actividades inherentes a la ejecución del contrato de interventoría.

COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO Y DEMÁS MEDIOS DE COMUNICACIÓN): Los servicios de comunicación fueron requeridos de manera permanente durante todo el período contractual para garantizar la coordinación entre la Entidad Contratante, el contratista de obra, la Interventoría y las diferentes entidades involucradas en el proyecto. Estos servicios permitieron el intercambio oportuno de información técnica, la atención de requerimientos contractuales, la convocatoria de comités de obra, la remisión de informes, conceptos, observaciones, oficios, planos, registros fotográficos y demás documentación necesaria para el adecuado desarrollo del contrato.

PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, IMPRESIÓN DE PLANOS, INFORMES, TINTA, ACTAS Y MATERIAL DE OFICINA: Durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026 fue necesario disponer de insumos de papelería y reproducción documental para la elaboración, impresión, revisión, organización y archivo de los informes mensuales de interventoría, actas de obra, actas de comité, comunicaciones oficiales, conceptos técnicos, planos, formatos de seguimiento, registros de inspección, listas de chequeo, informes HSEQ, documentación administrativa y demás soportes requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Estos insumos constituyen elementos esenciales para garantizar la trazabilidad documental, el control técnico y la adecuada administración del contrato.

- **ESTUDIOS PRELIMINARES**

LABORATORIO DE INTERVENTORÍA
(INCLUYE EQUIPO COMPLETO Y ENTREGA DE ENSAYOS Y RESULTADOS)
La Interventoría dispuso de los servicios de laboratorio especializados requeridos para el desarrollo de las actividades de control de calidad de los materiales y procesos constructivos ejecutados en el Contrato de Obra No. 1683 de 2025, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas vigentes y requisitos contractuales aplicables.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

En desarrollo de las funciones de vigilancia y control, la Interventoría realizó el seguimiento a la toma de muestras, verificación de procedimientos de ensayo y revisión de los resultados emitidos por el laboratorio, correspondientes principalmente al control de calidad del concreto empleado en elementos estructurales como zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas aéreas y placa de entrepiso, así como a los demás materiales que, de acuerdo con la programación de obra y las especificaciones técnicas, requirieron evaluación mediante ensayos de laboratorio.

Así mismo, se verificó que el laboratorio contara con el equipo técnico y humano necesario para la ejecución de los ensayos, garantizando la confiabilidad de los resultados obtenidos y la emisión oportuna de los respectivos informes técnicos, los cuales constituyen soporte fundamental para la aceptación de las actividades ejecutadas y la verificación del cumplimiento de las resistencias, propiedades físicas y parámetros de calidad exigidos en el contrato.

La disponibilidad permanente de este servicio permitió a la Interventoría ejercer un control técnico efectivo sobre la calidad de los materiales incorporados a la obra, identificar oportunamente posibles desviaciones y emitir conceptos técnicos debidamente sustentados para la aprobación de las actividades ejecutadas.

TOPOGRAFÍA

(INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS-AIM 2020)

La Interventoría dispuso del equipo topográfico completo, conformado por tránsito, nivel y demás elementos complementarios establecidos en la Resolución AIM 2020 y demás especificaciones técnicas aplicables, con el propósito de garantizar el adecuado control geométrico de las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra No. 1683 de 2025.

El equipo topográfico fue utilizado para desarrollar las actividades de revisión, verificación y control de la localización, trazado y replanteo de las obras, comprobación de ejes estructurales, alineamientos, cotas, niveles, excavaciones, cimentaciones, rellenos, elementos estructurales y demás componentes del proyecto, verificando permanentemente que la ejecución se ajustara a los planos aprobados, diseños, cartera de coordenadas, especificaciones técnicas y tolerancias permitidas.

Igualmente, la disponibilidad de los equipos permitió efectuar controles planimétricos y altimétricos, verificar los puntos de referencia (BM), realizar comprobaciones topográficas durante las diferentes etapas constructivas y apoyar técnicamente la revisión de los ajustes de diseño identificados durante la ejecución del proyecto, suministrando información confiable para la toma de decisiones por parte de la Interventoría.

La utilización permanente del equipo topográfico constituyó un recurso técnico indispensable para garantizar la precisión geométrica de la obra, prevenir desviaciones constructivas, verificar cantidades ejecutadas y respaldar técnicamente los conceptos emitidos por la Interventoría respecto del cumplimiento de las especificaciones contractuales.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

PERSONAL (NOMBRE Y IDENTIFICACION)	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES C,C 80.074.961	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C 1.121966360	CADENERO

ORGANIGRAMA DE PERSONAL



NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.1. RELACIÓN PLANILLA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025.

PERIODO (18/12/2025 – 31/12/2025)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079307728
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1079307728
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079307728
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079307728
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1079307728
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079307728

PERIODO (01/01/2026 – 31/01/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079327449
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1079327449
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1079327449
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079327449
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1079327449
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1079327449

PERIODO (01/02/2026 – 28/02/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1080093207
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1080093207
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1080093207
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1080093207
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1080093207

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1080093207
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1080093207

PERIODO (01/03/2026 – 31/03/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1080489038
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1080489038
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1080489038
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1080489038
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1080489038
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1080489038
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1080489038

PERIODO (01/04/2026 – 30/04/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1081588607
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1081588607
41.952.332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1081588607
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1081588607

PERIODO (01/05/2026 – 31/05/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1082450092
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.121.844.182	GAVIRIRA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1082450092

1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1082450092

7. CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS OBRA VS INTERVENTORIA q

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE OBRA, PERIODO (01/02/2026 – 28/02/2026)

Fecha de Muestreo	Elemento / Estructura	Ubicación en Obra	Diseño de Concreto (f'c) PSI	Proveedor / Planta	Edad de Ensayo (días)	No. Cilindro	Código de Muestra
22/02/2026	ZAPATAS	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	7	1	M1
22/02/2026	ZAPATAS	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	28	2	M2
23/02/2026	PEDESTALES	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	7	3	M1
23/02/2026	PEDESTALES	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	14	4	M2
23/02/2026	PEDESTALES	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	28	5	M3
25/02/2026	VIGA CIMENTACION	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	7	6	M1
25/02/2026	VIGA CIMENTACION	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	14	7	M2
25/02/2026	VIGA CIMENTACION	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	28	8	M3
27/02/2026	COLUMNA FILA A, B, C	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	7	9	M1
27/02/2026	COLUMNA FILA A, B, C	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	14	10	M2
27/02/2026	COLUMNA FILA A, B, C	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	28	11	M3
28/02/2026	COLUMNA FILA D, E, F	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	7	12	M1
28/02/2026	COLUMNA FILA D, E, F	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	14	13	M2
28/02/2026	COLUMNA FILA D, E, F	ALOJAMIENTOS	3000	MEZCLA EN OBRA	28	14	M3

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA, PERIODO (01/03/2026 – 31/03/2026)

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO		ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
		(PSI)	(Mpa)										(PSI)	(Mpa)		
RDG-6	ZAPATAS	f'c 3000 PSI	21	..	12-feb-26	7	19-feb-26	103	8769	8332	2228	106.4	1,860	13.0	62.0%	6
						14	26-feb-26	104	8772	8495	2209	149.8	2,466	17.3	82.2%	6
						28	12-mar-26	105	8806	8659	2198	180.6	3,038	21.3	101.3%	6
RDG-7	VIGA CIMENTACIÓN	f'c 3000 PSI	21	..	14-feb-26	7	21-feb-26	103	8767	8332	2227	106.4	1,860	13.0	62.0%	4
						14	28-feb-26	105	8802	8659	2162	147.5	2,481	17.4	82.7%	6
						28	14-mar-26	104	8739	8495	2158	179.7	3,082	21.6	102.7%	4
RDG-8	COLUMNA FILA A.B.C	f'c 3000 PSI	21	..	16-feb-26	7	26-feb-26	104	8802	8495	2222	106.1	1,864	13.0	61.8%	4
						14	4-mar-26	105	8749	8659	2122	143.2	2,469	16.9	80.3%	4
						28	16-mar-26	104	8782	8495	2162	179.7	3,062	21.6	102.7%	4
RDG-9	COLUMNA FILA D.E.F	f'c 3000 PSI	21	..	19-feb-26	7	26-feb-26	103	8768	8332	2241	104.9	1,823	12.8	60.8%	4
						14	5-mar-26	103	8733	8332	2207	137.4	2,402	16.8	80.1%	4
						28	19-mar-26	105	8829	8659	2189	179.6	3,021	21.2	100.7%	5
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA, PERIODO (01/03/2026 – 31/03/2026)

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO		ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
		(PSI)	(Mpa)										(PSI)	(Mpa)		
RDG-1	ZAPATAS ALOJAMIENTOS	f c 3000 PSI	21	-	22-feb.-26	7	1-mar-26	104	3792	8495	2199	107.2	1,838	12.9	61.3%	5
						14	8-mar-26	104	3808	8495	2208	141.0	2,412	16.9	80.0%	4
						28	22-mar-26	105	3817	8659	2204	183.0	3,079	21.6	102.6%	4
RDG-2	PEDESTALES - ALOJAMIENTOS	f c 3000 PSI	21	-	23-feb.-26	7	2-mar-26	103	3762	8332	2257	107.8	1,895	13.2	62.8%	6
						14	9-mar-26	105	3831	8659	2190	145.6	2,443	17.1	81.6%	6
						28	23-mar-26	103	3776	8332	2232	172.1	3,009	21.1	100.3%	5
RDG-3	VIGA CIMENTACIÓN - ALOJAMIENTOS	f c 3000 PSI	21	-	26-feb.-26	7	4-mar-26	103	3779	8332	2268	107.1	1,872	13.1	62.4%	4
						14	11-mar-26	103	3747	8332	2248	142.4	2,490	17.4	83.0%	4
						28	26-mar-26	104	3723	8495	2162	179.0	3,070	21.5	102.3%	4
RDG-4	COLUMNA FILA A, B, C - ALOJAMIENTOS	f c 3000 PSI	21	-	27-feb.-26	7	6-mar-26	104	3722	8495	2130	107.9	1,859	13.0	61.7%	5
						14	13-mar-26	104	3732	8495	2157	144.7	2,482	17.4	82.7%	6
						28	27-mar-26	105	3737	8659	2153	178.7	3,066	21.9	100.2%	6
RDG-5	COLUMNA FILA D, E, F - ALOJAMIENTOS	f c 3000 PSI	21	-	28-feb.-26	7	7-mar-26	105	3832	8659	2174	108.4	1,824	12.8	60.8%	4
						14	14-mar-26	105	3737	8659	2154	146.4	2,463	17.2	82.1%	6
						28	28-mar-26	103	3791	8332	2220	174.0	3,042	21.3	101.4%	5

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA, PERIODO (01/04/2026 – 30/04/2026)

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO		ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
		(PSI)	(Mpa)										(PSI)	(Mpa)		
RDG-10	PLACA CONTRAPISO	f'c 3000 PSI	21	..	6-abr.-26	7	13-abr-26	104	3749	8496	2171	110.2	1,890	13.2	63.0%	6
						14	20-abr-26	103	3825	8332	2261	142.8	2,468	17.4	82.9%	6
						28	4-may-26	103	3768	8332	2261	177.3	3,100	21.7	103.3%	6
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA, PERIODO (01/05/2026 – 31/05/2026)

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO		ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
		(PSI)	(Mpa)										(PSI)	(Mpa)		
RDG-11	PLACA ENTREPISO	f'c 3000 PSI	21	..	4-may-26	7	11-may-26	104	3839	8496	2260	108 8	1,866	13 1	62 2%	5
						14	18-may-26	105	3737	8669	2163	147 6	2,461	17 4	82 7%	6
						28	1-jun-26	104	3821	8495	2249	181 8	3,118	21 8	103 9%	5
RDG-12	VIGA CIMENTACIÓN	f'c 3000 PSI	21	..	9-may-26	7	16-may-26	104	3725	8495	2193	110 2	1,890	13 2	63 0%	5
						14	23-may-26	103	3770	8332	2240	133 6	2,421	16 9	80 7%	4
						28	6-jun-26	105	3832	8659	2213	179 7	3,023	21 2	100 8%	4
RDG-13	VIGA AEREA	f'c 3000 PSI	21	..	14-may-26	7	21-may-26	103	3723	8332	2254	106 0	1,869	13 0	61 6%	6
						14	28-may-26	103	3728	8332	2193	141 7	2,477	17 3	82 6%	5
						28	11-jun-26	105	3840	8659	2195	178.7	3,006	21.0	100.2%	4
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
						..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

8. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DE EQUIPOS)

La firma interventora Unión Temporal Inter Policía 2025 certifica que, durante el período objeto de cobro, aportó, operó y mantuvo a total disposición del proyecto el equipo técnico e instrumental especializado exigido contractualmente para el correcto ejercicio del control integral de la obra.

8.1. RELACIÓN DE EQUIPOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Equipo de Topografía (Bajo Especificaciones AIM 2020): Se garantizó en campo la disponibilidad y operación del instrumental topográfico compuesto por tránsito (estación total), nivel de precisión y elementos complementarios (trípodes, bastones, prismas, miras y carteras de campo). Este equipo se utilizó para la verificación de los ejes estructurales, niveles de excavación de zapatas, control de pedestales y vigas de cimentación de los alojamientos.

Laboratorio de Interventoría (Equipo Completo y Ensayos): Se dispuso en el sitio de la obra del equipo completo requerido para el control de calidad del concreto mezclado en obra (moldes cilíndricos normalizados, cono de Abrams para medición de asentamiento, varilla compactadora y termómetro de inmersión). El ítem se ejecutó de manera continua durante el periodo, garantizando el muestreo en los vaciados, el curado y la posterior entrega de los resultados de ensayos de resistencia (roturas a 7, 14 y 28 días) de los elementos estructurales inspeccionados.

Equipos de Cómputo y Sistemas Administrativos: Computadores portátiles utilizados en el proyecto por el personal de interventoría para el procesamiento de datos de campo, revisión de planos y la consolidación de los informes mensuales.

Equipos de Comunicación y Registro: Dispositivos móviles de comunicación y captura fotográfica digital empleados para el reporte de novedades y el registro diario de evidencias en los frentes de trabajo.

9. ANEXOS

9.1. REGISTRO FOTOGRAFICO
9.2. RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA
9.3. CERTIFICACION Y NOMINAS DEL PERSONAL

Ing. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

REGISTRO FOTOGRAFICO

18 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2026


INTERVENTORIA

UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025


PUERTO GAITAN - META

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	358

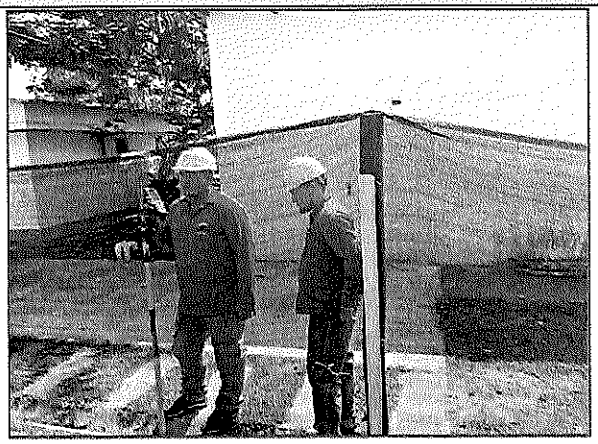

1.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	m2	358

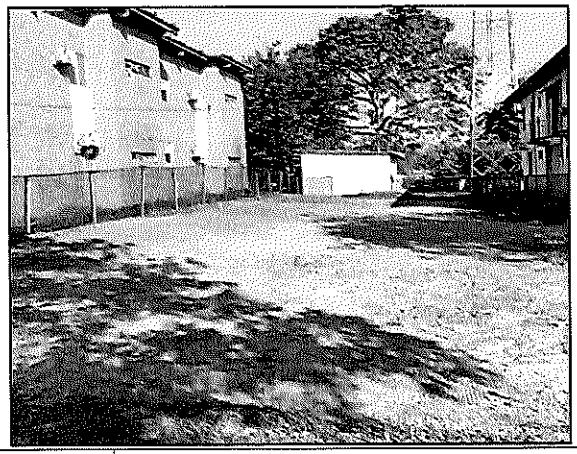





2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	161,18





UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	1047,67
			
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	107,86

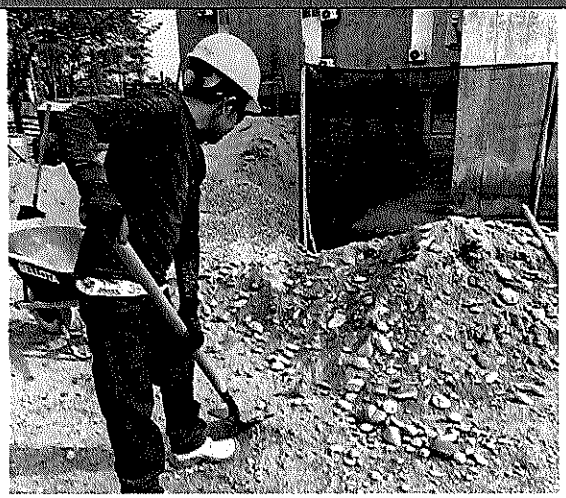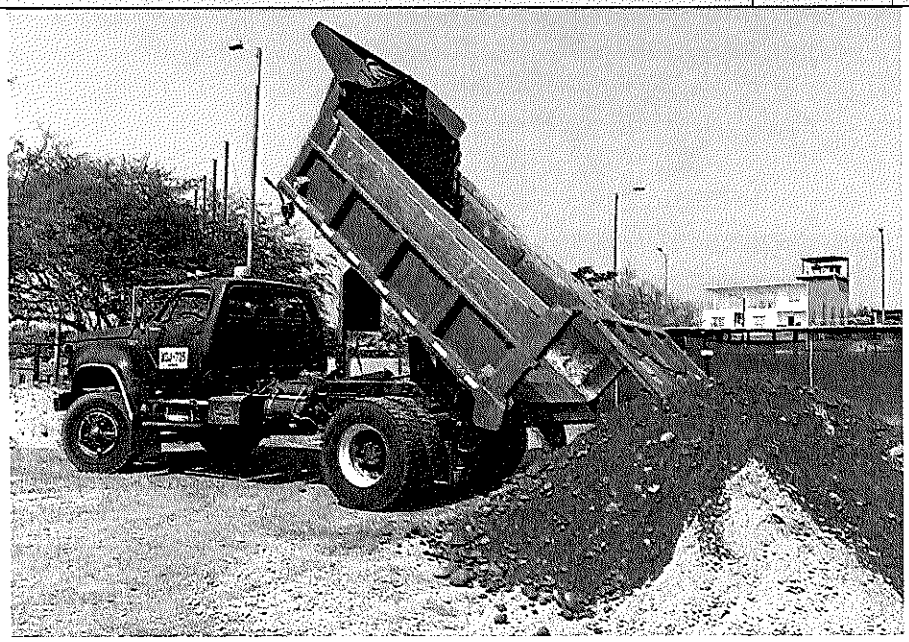UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	 		
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	12339,18
			
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	3,75

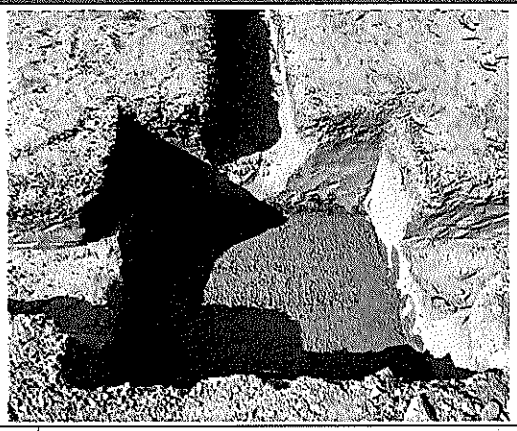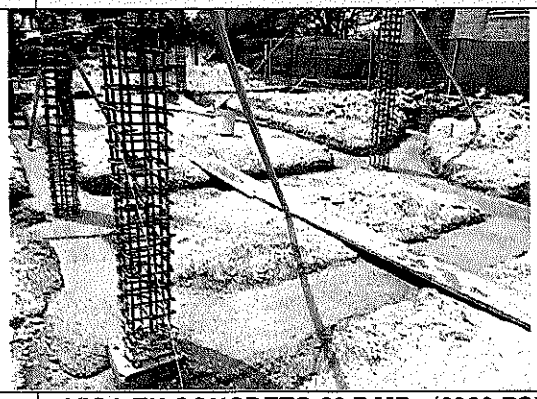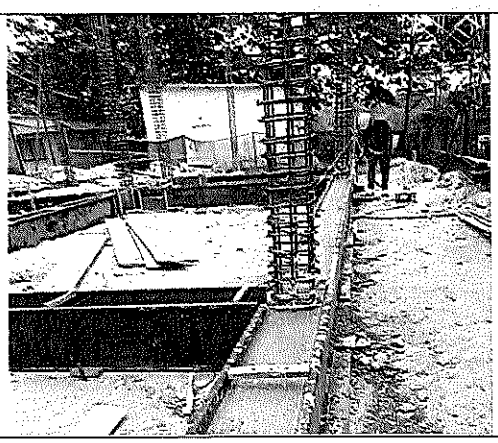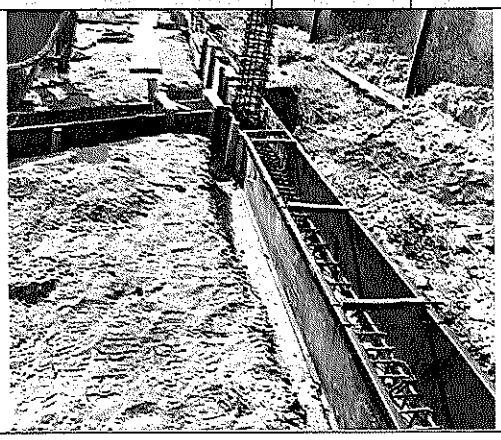UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	 		
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	9,06
	 		
3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	15,18
	 		


UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	6,16

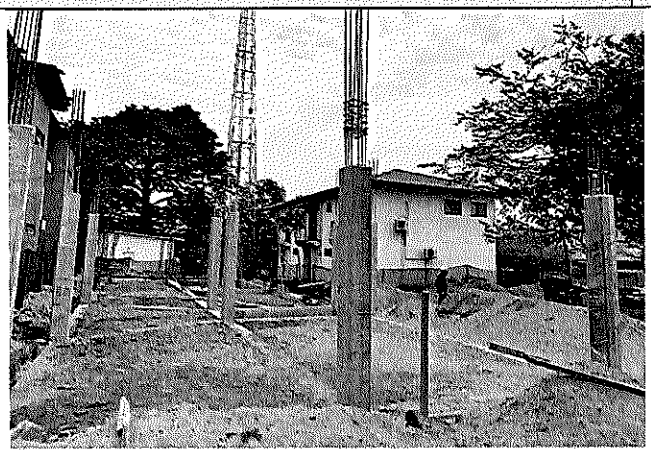



3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	23

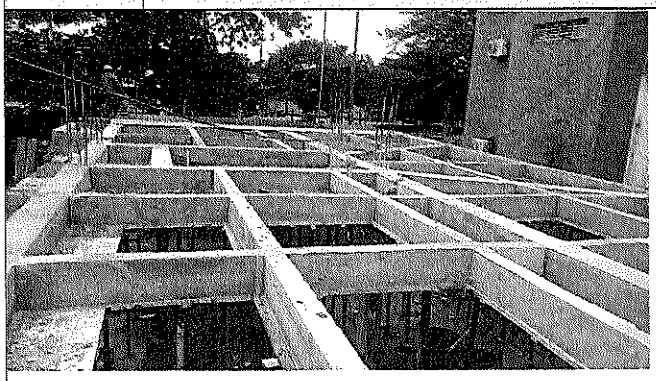

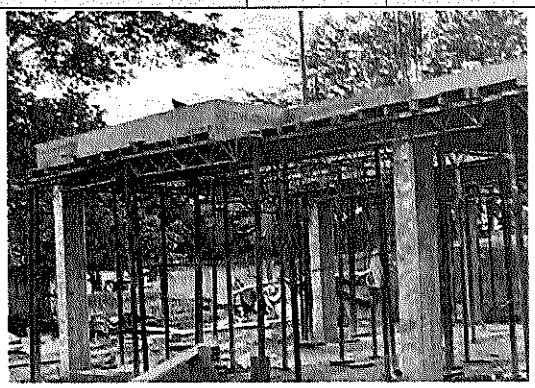


3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	27,1

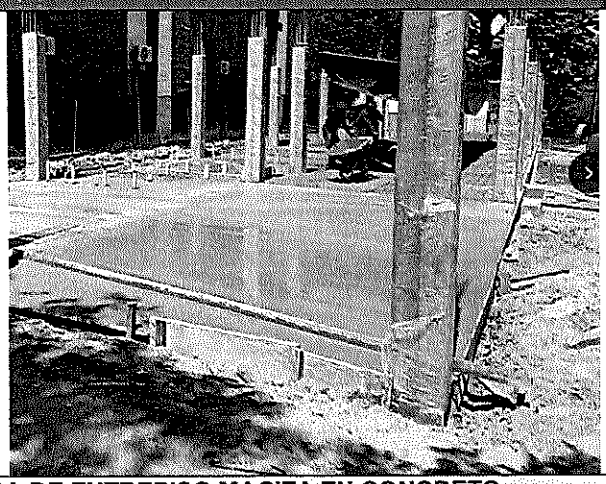
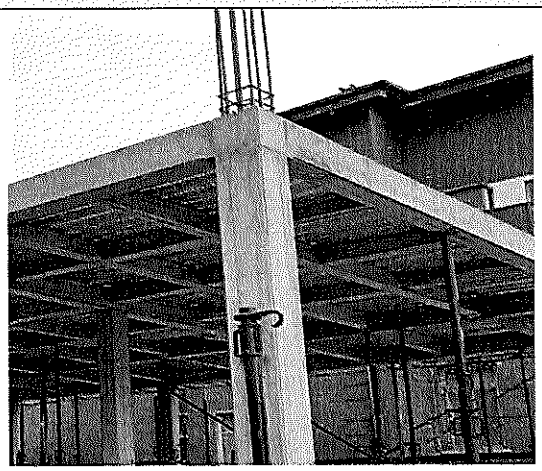
UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
3.7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	28,41
			
3.8	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	0,15



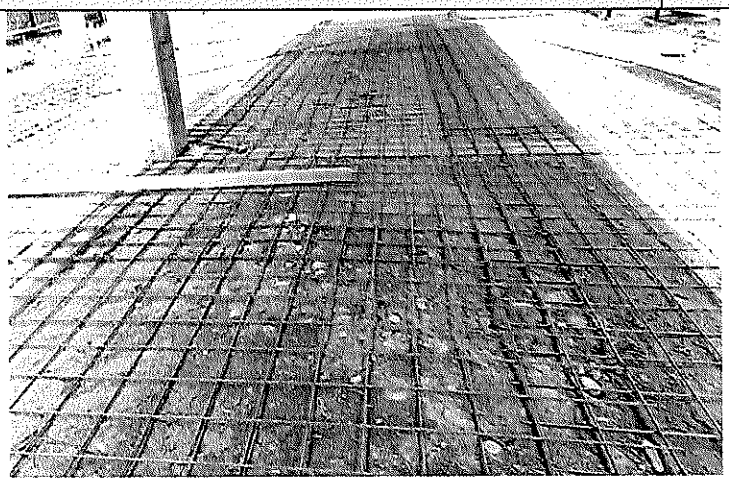
UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
3.9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	861,13
			
3.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	7563,91

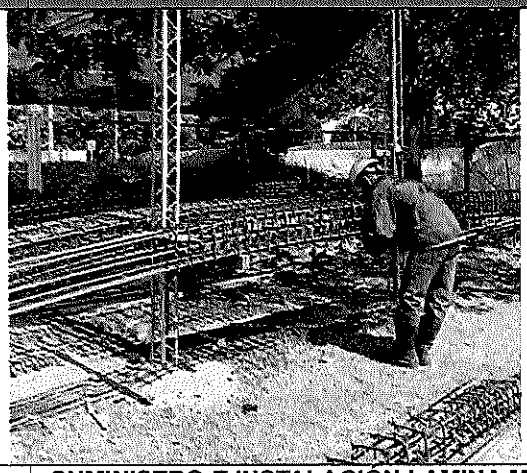
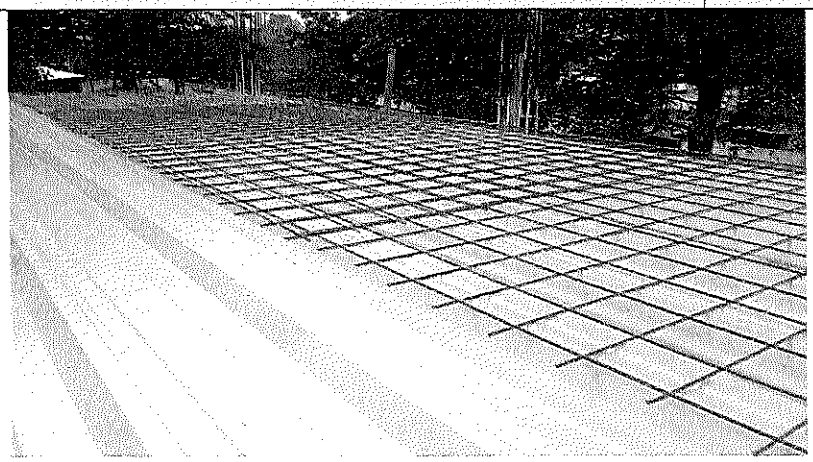
UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	 		
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	m2	286,02
			
4.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	24

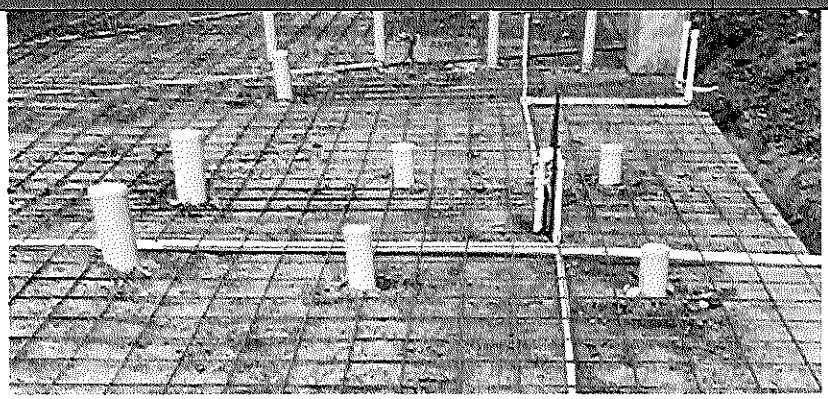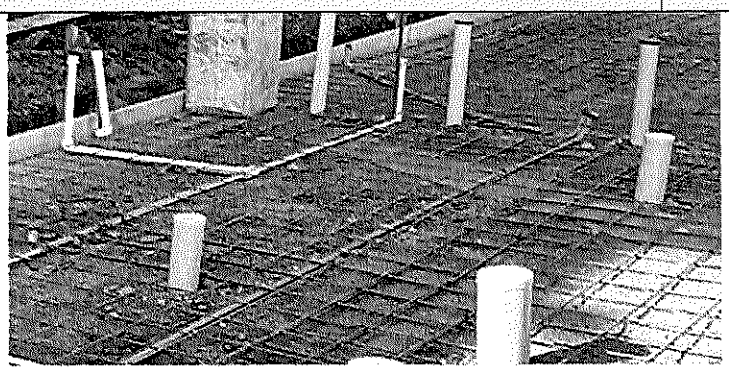
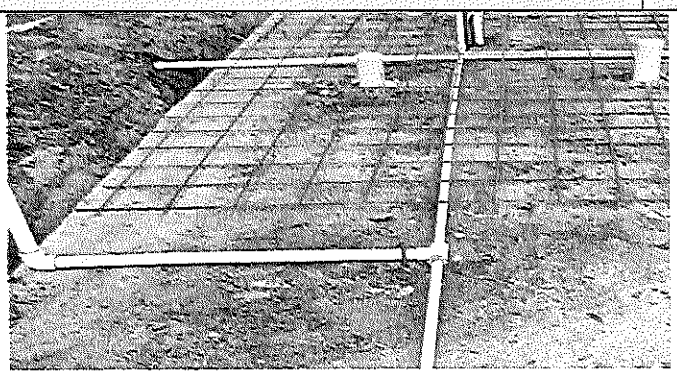
UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
4.3	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	6
			
4.6	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20
			
4.9	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	13

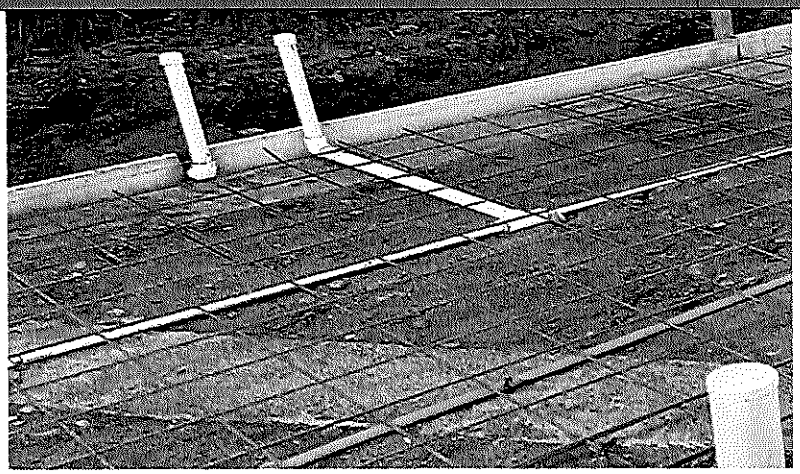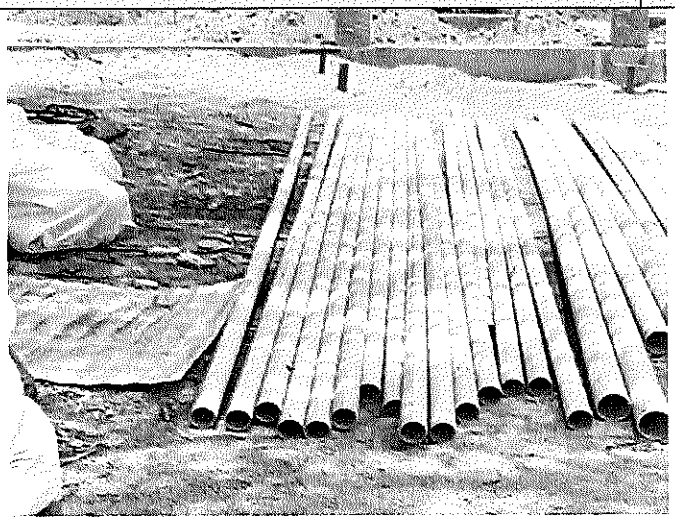
UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	48
			
5.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	10,71

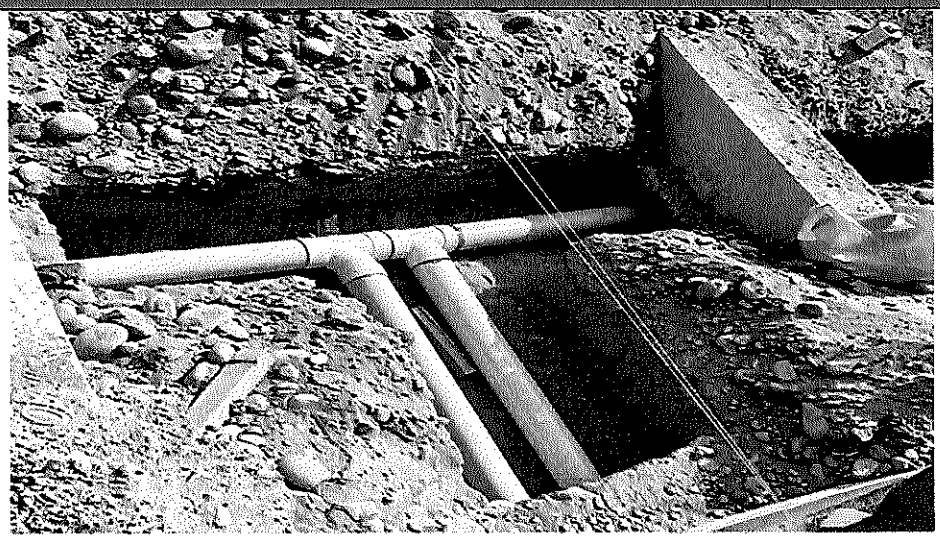
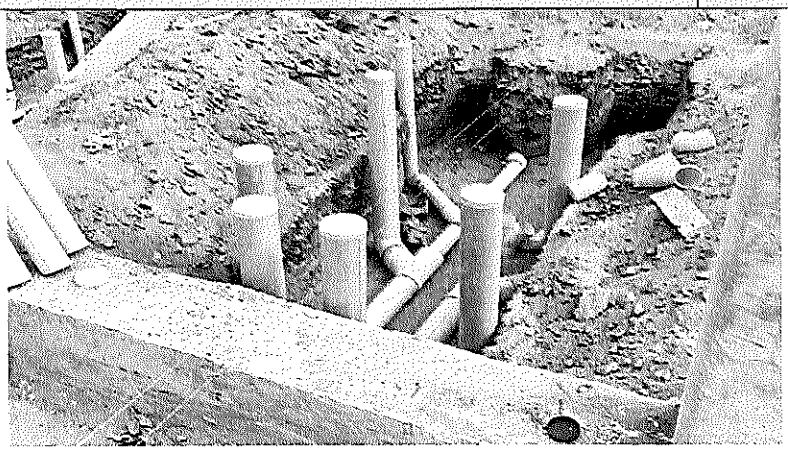
UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	60
			
5.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	14

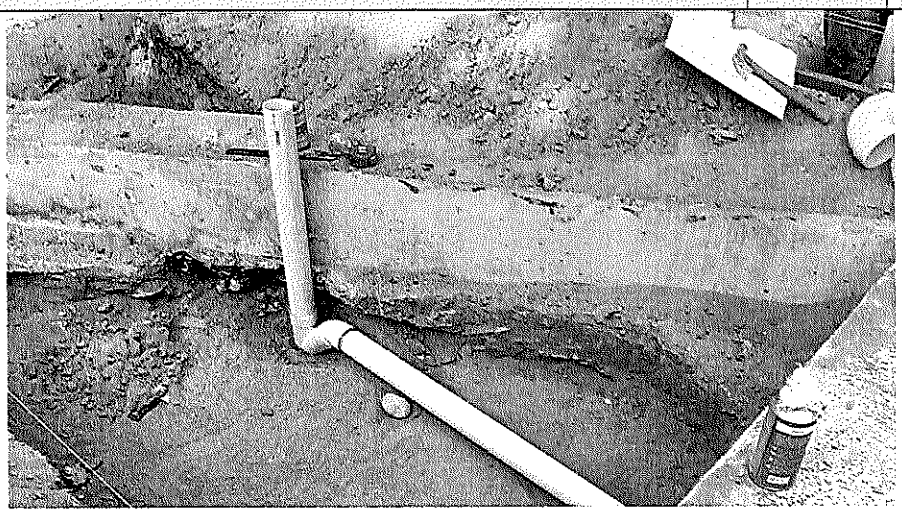UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8
			
5.7	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	u	2

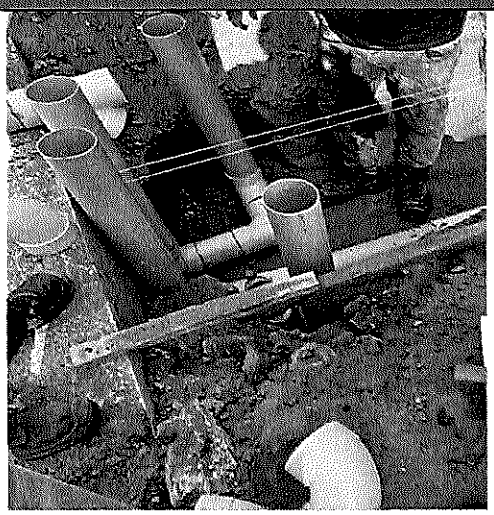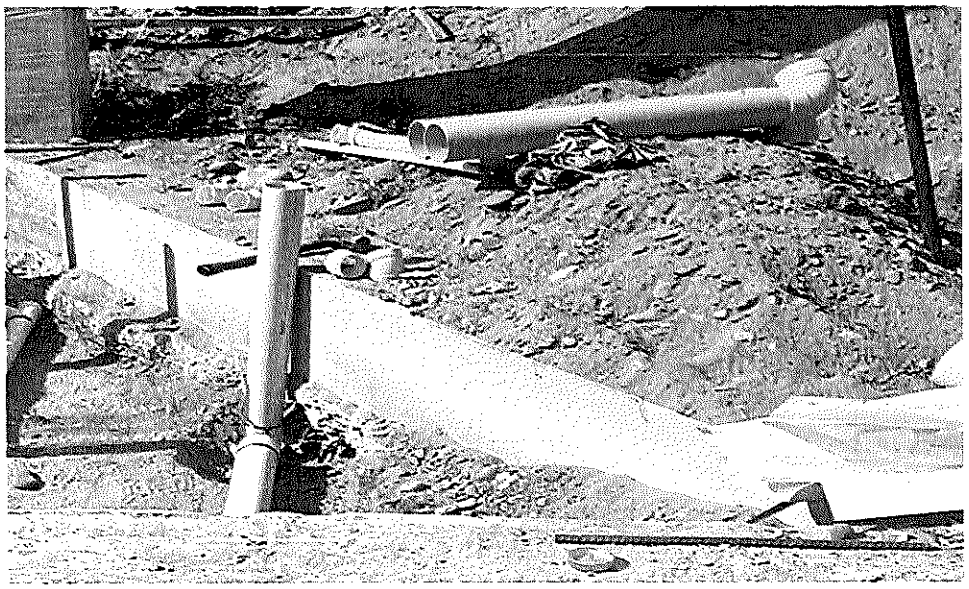UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
5.8	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8
			

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.10	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	136




5.11	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	38

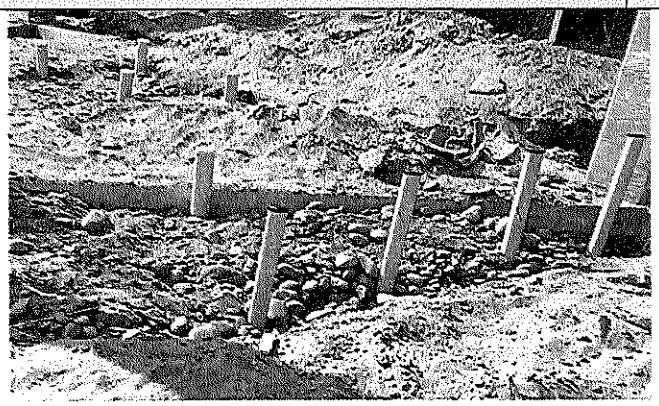


5.12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	86

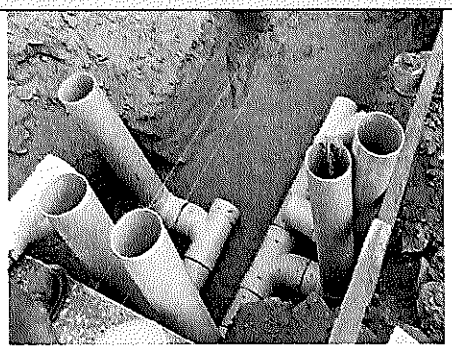


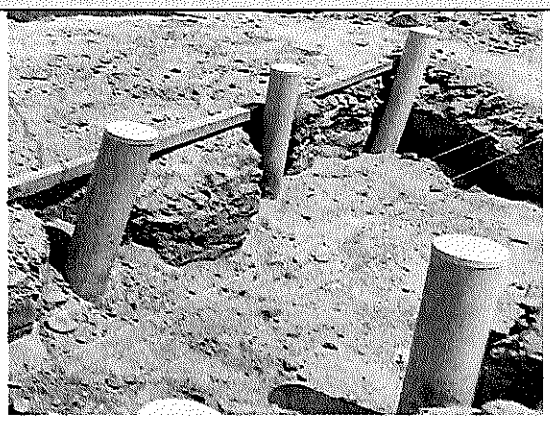
UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	u	10
			
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	u	8
			
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	u	1

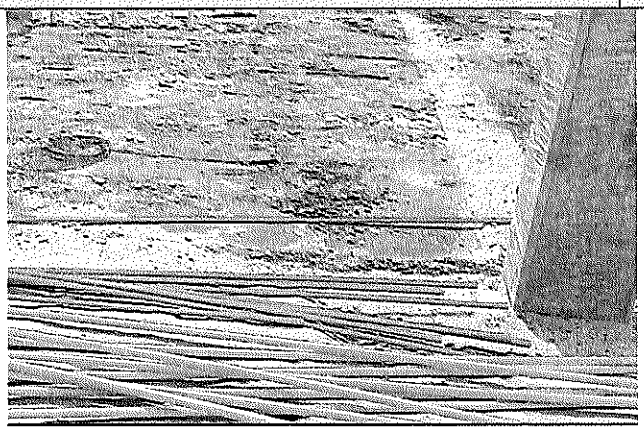UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 3/4 "	m	150
			
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 1 "	m	16

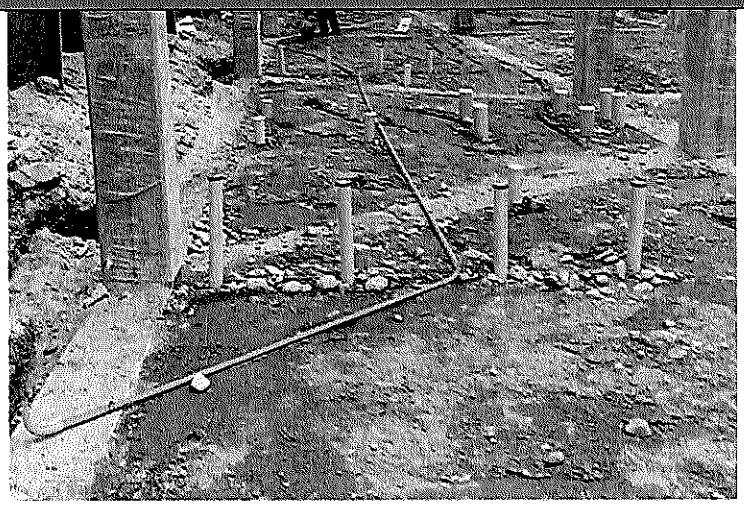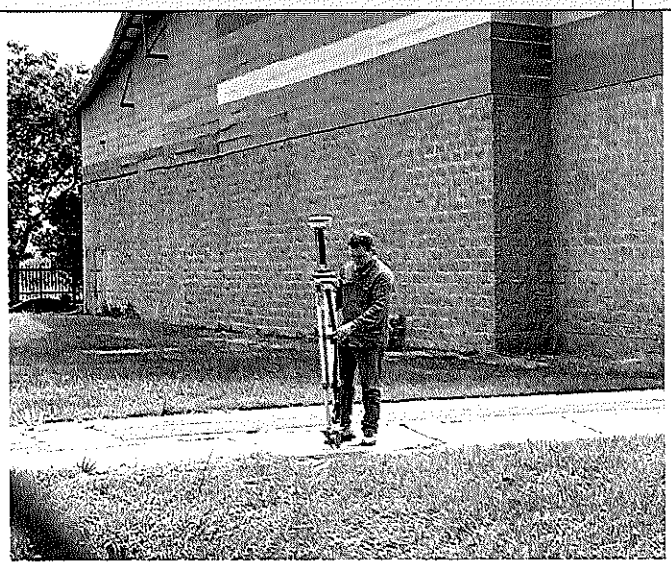UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
			
20.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	134,34
			

2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS

LABORATORIO
RAMCODES
INGENIERIA Y ENSAYOS

		I-CON-RAM-002
VERSIÓN	CÓDIGO	FECHA DE VIGENCIA
001	I-CON-001	01-01-17

Villavicencio, 11 de junio del 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
Ciudad.

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
Tema: Informe de resistencia a la compresión de concretos.

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud para la realización del ensayo de resistencia a la compresión simple a muestras cilíndricas de concreto elaboradas y transportadas por ustedes. Me permito informar que estas fueron probadas de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 673-10, con el fin determinar su resistencia a los siete, catorce y veintiocho días de curado.

En virtud de lo anterior entrego los resultados de veinticuatro (24) muestras falladas.

El presente informe consta de tres (03) páginas y no debe reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio, los resultados contenidos en él se relacionan únicamente con las muestras ensayadas.

Quedo en espera de cualquier inquietud.

Sin otro particular.

INGRID ARANGUREN BEJARANO
Especialista en diseño y construcción de Vías y aeropistas
Especialista en Patología de la Construcción
Especialista en Gerencia Estratégica
Gerente de RAMCODES Ingenieria y Ensayos

RAMCODES	LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES,CONCRETOS Y PAVIMENTOS	VERSIÓN	001
		CODIGO	F-CON-001
		FECHA DE VIGENCIA	1/01/2017
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO		CON-RAMW-01
	ESPECIFICACION/NORMA: INV E-410-13 Y NTC 673-10		

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.				
DIRIGIDO A:	UNIÓN TEMPORAL INTEEPOLICIA 2025	NIT:	902014419-5	FECHA DE ENTREGA:	jueves, 11 de junio de 2026
CONTACTO:	ING. MIGUEL CIPAGAUTA	CELULAR:	3183308319	CORREO:	utinterpolicia2025@gmail.com
DESCRIPCION:	MUESTRAS ELABORADAS EN OBRA	MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	DEPARTAMENTO:	META

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (Mpa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
RDG-6	ZAPATAS	f'c 3000 PSI	21	--	12-feb.-26	7	19-feb-26	103	3769	8332	2228	106.4	1,360	13.0	62.0%	6
						14	26-feb-26	104	3772	8495	2209	143.8	2,466	17.3	82.2%	6
						28	12-mar-26	105	3806	8659	2198	180.6	3,038	21.3	101.3%	6
RDG-7	VIGA CIMENTACIÓN	f'c 3000 PSI	21	--	14-feb.-26	7	21-feb-26	103	3767	8332	2227	106.4	1,360	13.0	62.0%	4
						14	28-feb-26	105	3802	8659	2152	147.5	2,481	17.4	82.7%	5
						28	14-mar-26	104	3739	8495	2158	179.7	3,082	21.6	102.7%	4
RDG-8	COLUMNA FILA A.B.C	f'c 3000 PSI	21	--	18-feb.-26	7	25-feb-26	104	3832	8495	2222	108.1	1,854	13.0	61.8%	4
						14	4-mar-26	105	3749	8659	2122	143.2	2,409	16.9	80.3%	4
						28	18-mar-26	104	3782	8495	2182	179.7	3,082	21.6	102.7%	4
RDG-9	COLUMNA FILA D.E.F	f'c 3000 PSI	21	--	19-feb.-26	7	26-feb-26	103	3763	8332	2241	104.3	1,823	12.8	60.8%	4
						14	5-mar-26	103	3793	8332	2207	137.4	2,402	16.8	80.1%	4
						28	19-mar-26	105	3829	8659	2189	179.6	3,021	21.2	100.7%	5
RDG-10	PLACA CONTRAPISO	f'c 3000 PSI	21	--	6-abr.-26	7	13-abr-26	104	3743	8495	2171	110.2	1,890	13.2	63.0%	5
						14	20-abr-26	103	3825	8332	2261	142.3	2,488	17.4	82.9%	6
						28	4-may-26	103	3763	8332	2261	177.3	3,100	21.7	103.3%	6

OBSERVACIONES: _____

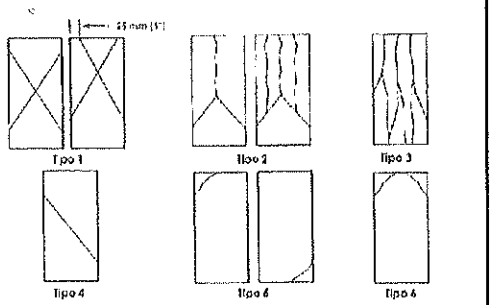
REVISO Y APROBO:

Ing. Ingrid Aranguren Bejarano

Gerente de RAMCODES Ingeniería y Ensayos

*Este informe no es válido, sin la firma y sello original.

TIPO DE FALLA



RAMCODES	LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES,CONCRETOS Y PAVIMENTOS	VERSIÓN	001
		CODIGO	F-CON-001
		FECHA DE VIGENCIA	1/01/2017
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	CON-RAMW-01	
	ESPECIFICACION/NORMA: INV E-410-13 Y NTC 673-10		

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.						
DIRIGIDO A:	UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025	NIT:	902014419-5	FECHA DE ENTREGA:	jueves, 11 de junio de 2026		
CONTACTO:	ING. MIGUEL CIPAGAUTA	CELULAR:	3183308319	CORREO:	utinterpolicia2025@gmail.com		
DESCRIPCION:	MUESTRAS ELABORADAS EN OBRA	MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	DEPARTAMENTO:	META		

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (Mpa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
RDG-11	PLACA ENTREPISO	f'c 3000 PSI	21	--	4-may.-26	7	11-may-26	104	3839	8495	2260	108.8	1,366	13.1	62.2%	6
						14	18-may-26	105	3797	8659	2168	147.5	2,481	17.4	82.7%	6
						28	1-jun-26	104	3821	8495	2249	161.8	3,118	21.8	103.9%	5
RDG-12	VIGA CIMENTACIÓN	f'c 3000 PSI	21	--	9-may.-26	7	16-may-26	104	3725	8495	2193	110.2	1,890	13.2	63.0%	6
						14	23-may-26	103	3770	8332	2240	138.6	2,421	16.9	80.7%	4
						28	6-jun-26	105	3832	8659	2213	179.7	3,023	21.2	100.8%	4
RDG-13	VIGA AEREA	f'c 3000 PSI	21	--	14-may.-26	7	21-may-26	103	3723	8332	2234	106.0	1,358	13.0	61.8%	6
						14	28-may-26	103	3728	8332	2193	141.7	2,477	17.3	82.6%	6
						28	11-jun-26	105	3840	8659	2195	178.7	3,000	21.0	100.2%	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES: _____

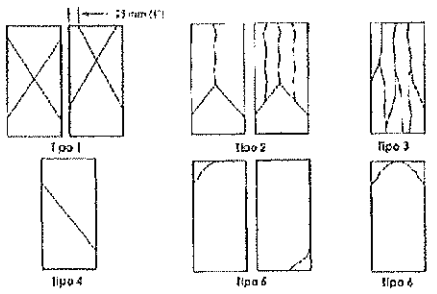
REVISO Y APROBO:

Ing. Ingrid Aranguren Bejarano

Gerente de RAMCODES Ingeniería y Ensayos

*Este informe no es válido, sin la firma y sello original

TIPO DE FALLA



3. CERTIFICACION Y NOMINAS DEL PERSONAL

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18-12-2025 AL 31-12-2025

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	X		13	3.500.000	1.516.667	-	1.516.667	60.667	60.667	121.333	1.395.333	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	X		13	1.423.500	616.850	107.941	724.791	24.674	24.674	49.348	675.443	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	X		13	3.558.750	1.542.125	-	1.542.125	61.685	61.685	123.370	1.418.755	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	X		13	1.423.500	616.850	107.941	724.791	24.674	24.674	49.348	675.443	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	X		13	1.423.500	616.850	107.941	724.791	24.674	24.674	49.348	675.443	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA	X		13	1.708.200	740.220	107.941	848.161	29.609	29.609	59.218	788.944	
						5.649.562	431.765	6.081.326	225.982	225.982	451.965	5.629.361	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 AL 31-01-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	140.000	140.000	280.000	3.220.000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3.558.750	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
						14.062.370	996.380	15.058.750	562.495	562.495	1.124.900	13.933.760	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 AL 28-02-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	140.000	140.000	280.000	3.220.000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3.558.750	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISELL JOHANNA	X		25	1.750.905	1.459.088	207.579	1.666.667	58.364	58.364	116.727	1.549.940	
						15.521.458	1.203.959	16.725.417	620.858	620.858	1.241.717	15.483.700	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-03-2026 AL 31-03-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	140.000	140.000	280.000	3.220.000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3.558.750	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISELL JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
						15.813.275	1.245.475	17.068.750	632.531	632.531	1.265.062	15.793.688	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	140.000	140.000	280.000	3.220.000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3.558.750	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 41952332	VILLAREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISELL JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
						15.813.275	1.245.475	17.058.750	632.531	632.531	1.265.062	15.793.688	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2026 AL 31-05-2026

Datos del Afiliado		NOV		DIAS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R			SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	140.000	140.000	280.000	3.220.000	
CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3.558.750	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISELL JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
						14.062.370	996.380	15.058.750	562.495	562.495	1.124.990	13.933.760	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

ELABORO

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180,143-T

APROBO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

SCO-FR-101
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

1149

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OTROS CONTRATOS DIFERENTES A CPS			Puerto Gaitán Potencia Natural
	CONTRATACIÒN			
	Código: SCO-FR-101	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de Puerto Gaitán, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato **No 1701 de 2025**, que, **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025**, identificado con NIT N° 902.014.419-5, que cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del acta parcial No 1 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 29 días del mes de julio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

SCO-FR-109
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL (SUPERVISION A INTERVENTORIA)

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL OTRO TIPO DE CONTRATOS			Puerto Gaitán
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-109	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato N° 1701 de 2025, que, el UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025, identificado con NIT N° 902.014.419-5, representada legalmente por DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO con C.C. N° 86.088.145, cumplió en el periodo del 18 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026, con el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSIÓN y ARL) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de interventoría suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a las planillas 1079307728, 1079327449, 1080093207, 1080489038, 1081588607, 1082450092; pagadas entre el 14 de marzo de 2026 al 03 de junio de 2026; con pago a COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION, ARL SURA, COFREM, COMPENSAR, NUEVA EPS, SANITAS, correspondiente al periodo de diciembre2025/enero 2026, febrero, marzo, abril y mayo de 2026, relacionadas a continuación:

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	VALOR IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	TOTAL
dic/2025 - ene/2026	1079307728	14/03/2026	5.649.562	226.200	904.100	393.600	226.200	1.750.100
ene/2026 - feb/2026	1079327449	14/03/2026	14.062.370	562.800	2.250.200	978.900	562.800	4.354.700
feb/2026 - mar/2026	1080093207	14/03/2026	15.521.458	621.200	2.483.700	986.600	621.200	4.712.700
mar/2026 - abr/2026	1080489038	8/04/2026	15.813.275	632.900	2.530.400	986.100	632.900	4.782.300
abr/2026 - may/2026	1081588607	1/06/2026	15.813.275	632.900	2.530.400	988.100	632.900	4.784.300
may/2026 - jun/2026	1082450092	3/06/2026	14.062.370	562.800	2.250.200	866.200	562.800	4.242.000
VALOR TOTAL								24.626.100

Esta certificación forma parte integral del acta parcial N° 01 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 18 AGO 2026, con destino a la carpeta contractual.

CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

1152

INF-FR-55
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL (INTERVENTORIA A OBRA)

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO DE CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATISTA DE OBRA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-55	**Versión:** 04	**Vigencia: 10-01-2025**	

EL SUSCRITO INTERVENTOR DE LA OBRA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de **INTERVENTOR** del contrato de Obra N° 1683 de 2025, que, la **UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN** identificado con NIT. 902.011.453-2. cumplió en los periodos comprendidos desde el 18 de diciembre de 2025 al **20 MAYO** de 2026, realizo el pago conforme a los documentos soporte del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) y parafiscales (Sena, ICBF y Caja de compensación familiar) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Obra suscrito con la Alcaldía del Municipio de Puerto Gaitán-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PAGO SIMPLE Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social a SANITAS, NUEVA EPS, FAMISANAR, CAPITAL SALUD, PIJAOSALUD, COLPENSIONES, PROTECCION, COLFONDOS, PORVENIR, SURA Y COFREM. Correspondientes a los meses DICIEMBRE del año 2025 y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL del año 2026 como se relaciona a continuación:

MES	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	IBC	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	INTERESES MORA	TOTAL
12/2025	1079534316	14/02/2026	$000	$160.500	$542.900	$279.400	$160.500	$23.000	$1.166.300
01/2026	1079310169	14/02/2026	$000	$611.600	$1.569.200	$804.800	$462.800	$9.600	$3.545.700
02/2026	1080013781	14/03/2026	$000	$668.300	$2.391.000	$1.162.100	$668.300	$13.300	$4.903.000
03/2026	1080488841	08/04/2026	$000	$1.032.700	$3.847.800	$1.796.000	$1.032.700	$0	$7.709.200
04/2026	1081588727	15/05/2026	$000	$1.067.905	$3.988.100	$1.857.000	$1.067.905	6.600	$7.987.500
TOTAL									$25.311.700

Se verifico y se avala el cumplimiento del pago de los aportes de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de compensación familiar)

Esta certificación forma parte integral del acta para pago parcial No. 01 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Puerto Gaitán – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

NOMBRE: DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO identificado con la cedula de ciudadanía 86.088.145 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025 identificado con Nit. 902.014.419-5, y JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.848.323 y Tarjeta profesional 180143-T en mi condición de CONTADOR PUBLICO, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes hasta la fecha, en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, treinta y un (31) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR PUBLICO
T.P 180143-T

1156

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

No. 1.121.848.323



CASTRO GALVIS

JHON ALEXANDER

COL | 1.75 | M

15 ENE 1989 | O+


VILLAVICENCIO (META)

18 ENE 2007, VILLAVICENCIO

08 SEPT 2032

CO

0038845599



REGISTRADOR NACIONAL


ICCOL0038845998520O1<<<<<<<<<<
8901158M3209088COL1121848323<1
CASTRO<GALVIS<<JHON<ALEXANDER<

1157

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

180143-T



JHON ALEXANDER
CASTRO GALVIS
C.C. 1121848329
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 191841

109739

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

VERIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 09:21:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079307728

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 14/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121844182	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.642.125	$ 246.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.642.125	$ 61.700	6,960	$ 1.642.125	$ 107.400	(CCF34) COFREM	$ 1.642.125	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.600
CC 1121892054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.616.667	$ 242.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.616.667	$ 60.700	6,960	$ 1.616.667	$ 105.600	(CCF34) COFREM	$ 1.616.667	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.700
CC 1121866360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 616.650	$ 98.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 616.650	$ 24.700	6,960	$ 616.650	$ 43.000	(CCF34) COFREM	$ 616.650	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 740.220	$ 118.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 740.220	$ 29.700	6,960	$ 740.220	$ 51.600	(CCF34) COFREM	$ 740.220	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.500
CC 80074961	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 616.650	$ 98.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 616.650	$ 24.700	6,960	$ 616.650	$ 43.000	(CCF34) COFREM	$ 616.650	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PROTECCION	$ 616.650	$ 98.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 616.650	$ 24.700	6,960	$ 616.650	$ 43.000	(CCF34) COFREM	$ 616.650	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.649.562	$ 5.649.562	$ 5.649.562	$ 5.649.562	$ 804.100	$ 226.200	$ 393.600	$ 226.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.100	$ 75.100	$ 1.825.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 09:21:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079307728

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 14/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1121844182	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.542.125	$ 248.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.542.125	$ 61.700	6,960	$ 1.542.125	$ 107.400	(CCF34) COFREM	$ 1.542.125	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.600
CC 1121892654	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.516.667	$ 242.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.516.667	$ 60.700	6,960	$ 1.516.667	$ 105.600	(CCF34) COFREM	$ 1.516.667	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.700
CC 1121956360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 616.650	$ 98.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 616.650	$ 24.700	6,960	$ 616.650	$ 43.000	(CCF34) COFREM	$ 616.650	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 740.220	$ 118.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 740.220	$ 29.700	6,960	$ 740.220	$ 51.600	(CCF34) COFREM	$ 740.220	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.500
CC 80074981	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 616.650	$ 98.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 616.650	$ 24.700	6,960	$ 616.650	$ 43.000	(CCF34) COFREM	$ 616.650	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 616.650	$ 98.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 616.650	$ 24.700	6,960	$ 616.650	$ 43.000	(CCF34) COFREM	$ 616.650	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.649.562	$ 5.649.562	$ 5.649.562	$ 5.649.562	$ 904.100	$ 226.200	$ 393.600	$ 226.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.750.100	$ 75.100	$ 1.625.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1169

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 09:24:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079327449

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 14/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121844162	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121852054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074001	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 2.250.200	$ 562.800	$ 978.900	$ 562.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.354.700	$ 108.700	$ 4.463.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 09:24:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079327449

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 14/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121844182	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.559.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.559.750	$ 142.400		$ 3.559.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.559.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121892054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000		$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100		$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100		$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074961	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100		$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO BARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100		$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 2.250.200	$ 562.800	$ 978.900	$ 562.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.354.700	$ 108.700	$ 4.463.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 09:28:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080093207

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 14/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00	X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.459.088	$ 69.400	0,522	$ 1.459.088	$ 7.700	(CCF34) COFREM	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000
CC 1121844182	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS003) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.500
CC 1121892654	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121666360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074961	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.350

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.521.458	$ 15.521.458	$ 15.521.459	$ 15.521.458	$ 2.493.700	$ 621.200	$ 986.600	$ 621.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.712.700	$ 33.600	$ 4.746.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

11 63

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-14, 09:28:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080093207

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 14/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Sanitario	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.459.088	$ 69.400	0,522	$ 1.459.088	$ 7.700	(CCF34) COFREM	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000
CC 1121844182	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121882054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966380	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41052332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074951	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.521.458	$ 15.521.458	$ 15.521.458	$ 15.521.458	$ 2.483.700	$ 621.200	$ 986.600	$ 621.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.712.700	$ 33.600	$ 4.746.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-08, 11:01:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080489038

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 08/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1121844182	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	0,080	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121892054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	0,080	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121866350	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,080	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,080	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074051	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,080	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,080	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 2.530.400	$ 632.900	$ 988.100	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.784.300	$ 0	$ 4.784.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-08, 11:01:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080489038

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 08/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.500
CC 1121844182	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.500
CC 1121892054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074951	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053763	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 2.530.400	$ 632.900	$ 988.100	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.784.300	$ 0	$ 4.784.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-01, 03:57:23 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1081588607

Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 01/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1121844182	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	8,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121692054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	8,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	8,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 41952332	RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	8,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 80074961	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	8,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	8,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.120.734	$ 14.120.734	$ 14.120.734	$ 14.120.734	$ 2.259.600	$ 565.200	$ 870.300	$ 565.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.260.300	$ 76.700	$ 4.337.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

154

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2026-05-20, 04:42:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1081588607

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

Fecha límite de pago: 2026-05-07

GUARDADA 28/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025				
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META		
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC86088145		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 41952332	VILLARREAL GONZALEZ RUBY JOHANNA	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074901	ORTIZ FUENTES FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053763	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISSELL JOHANA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 9.200	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1121644182	CAVERA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.658.750	$ 569.400	EPS SANITAS	$ 3.658.750	$ 142.400	ARL SURA	$ 3.658.750	$ 247.700	COFREM	$ 3.658.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121692054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	ARL SURA	$ 3.500.000	$ 243.600	COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121955360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 121.900	COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 15.813.275	$ 2.530.400	$ 0	$ 0	$ 632.900	$ 988.100	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.784.300	$ 44.900	$ 4.829.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-03, 02:27:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082450092

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 03/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600
CC 1121844182	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121892054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121866360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 60074981	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 66953753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.052.370	$ 14.052.370	$ 14.052.370	$ 14.052.370	$ 2.250.200	$ 562.800	$ 866.200	$ 662.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.242.000	$ 0	$ 4.242.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-03, 02:27:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082450092

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 03/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1121844182	JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.760	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.760	$ 142.400	6,960	$ 3.558.760	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.760	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121892654	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121966360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80074961	FERNANDO ORTIZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053753	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 14.062.370	$ 2.250.200	$ 562.800	$ 866.200	$ 562.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.242.000	$ 0	$ 4.242.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO INFORME DE SUPERVISION			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Código: INF-FR-27	Versión: 03	Vigencia: 10-01-2025	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META".

PROYECTO BPIN No 202500000031783 CUYO OBJETO ES LA" CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META"

INFORME DE SUPERVISIÓN
PARCIAL No 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

18 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

INFORME DE SUPERVISIÓN – PARCIAL No 1
(Periodo del 18 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026)
PROYECTO BPIN No 202500000031783 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION BASICA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS CM-SI-010-2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1701 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
NIT:	902.014.419-5
REPRESENTANTE:	DIEGO ARMANDO CARDOZO GUERRERO
No CEDULA DE CIUDADANÍA	86.088.145 DE VILLAVICENCIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA	*utinterpolicia2025@gmail.com*
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META
TIEMPO Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA INICIO:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
CÓDIGO BPIN	202500000031783
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

PRORROGA/ ADICION Nº	MOTIVO	FECHA PRORROGA	PERIODO PRORROGA	NUEVA FECHA TERMINACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. INFORMACION FINANCIERA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP No.	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	Valor
DIS.2025002849	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$74.136.286,00
DIS.2026000009	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$222.176.808,00

2.2 Registro Presupuestal

RP No.	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	Valor
RES.2025004220	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$74.136.286,00
RES.2026000003	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$222.176.808,00

2.3 Relación de pagos

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
TOTAL			

MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
MODIFICATORIA N.°1 (16/12/2025):	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

VERIFICACION DE POLIZAS

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO		30-44-101068027 ANEXO 0
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	09/12/2026	$59,262,618.80
CALIDAD DEL SERVICIO	09/08/2026	09/08/2031	$59,262,618.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/12/2025	09/08/2029	$14,815,654.70
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		Aprobada	

MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO		30-40-101025734 ANEXO 0
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		Aprobada	

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
ACTA DE INICIO	SEGUROS DEL ESTADO		30-44-101068027 ANEXO 2
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		Aprobada	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON LA MODIFICATORIA No 1 DEL CONTRATO

MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
MODIFICATORIA N°1	SEGUROS DEL ESTADO		30-44-101068027 ANEXO 3
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		Aprobada	

II. PERSONAL DE INTERVENTORIA

A continuación, se presenta la relación del personal vinculado a la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para la construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta", quienes son responsables del desarrollo de las actividades de seguimiento, control y verificación de la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, de conformidad con las obligaciones contractuales establecidas.

NOMBRE	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES C.C 80.074.961	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C 1.121966360	CADENERO
GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ C.C 1.006.874.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVA


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

A continuación, se relaciona el avance financiero del proyecto BPIN No 2023505680012 CUYO OBJETO ES LA" CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN META"

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta


CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345	$297.199.233	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987	$484.937.220	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087	$706.564.307	5,15%	16,41%	$95.934.936,12	$379.838.767,96	2,23%	8,82%
31/05/2026	$331.938.505	$1.038.502.812	7,71%	24,12%	$189.309.686	$569.148.454	4,40%	13,22%

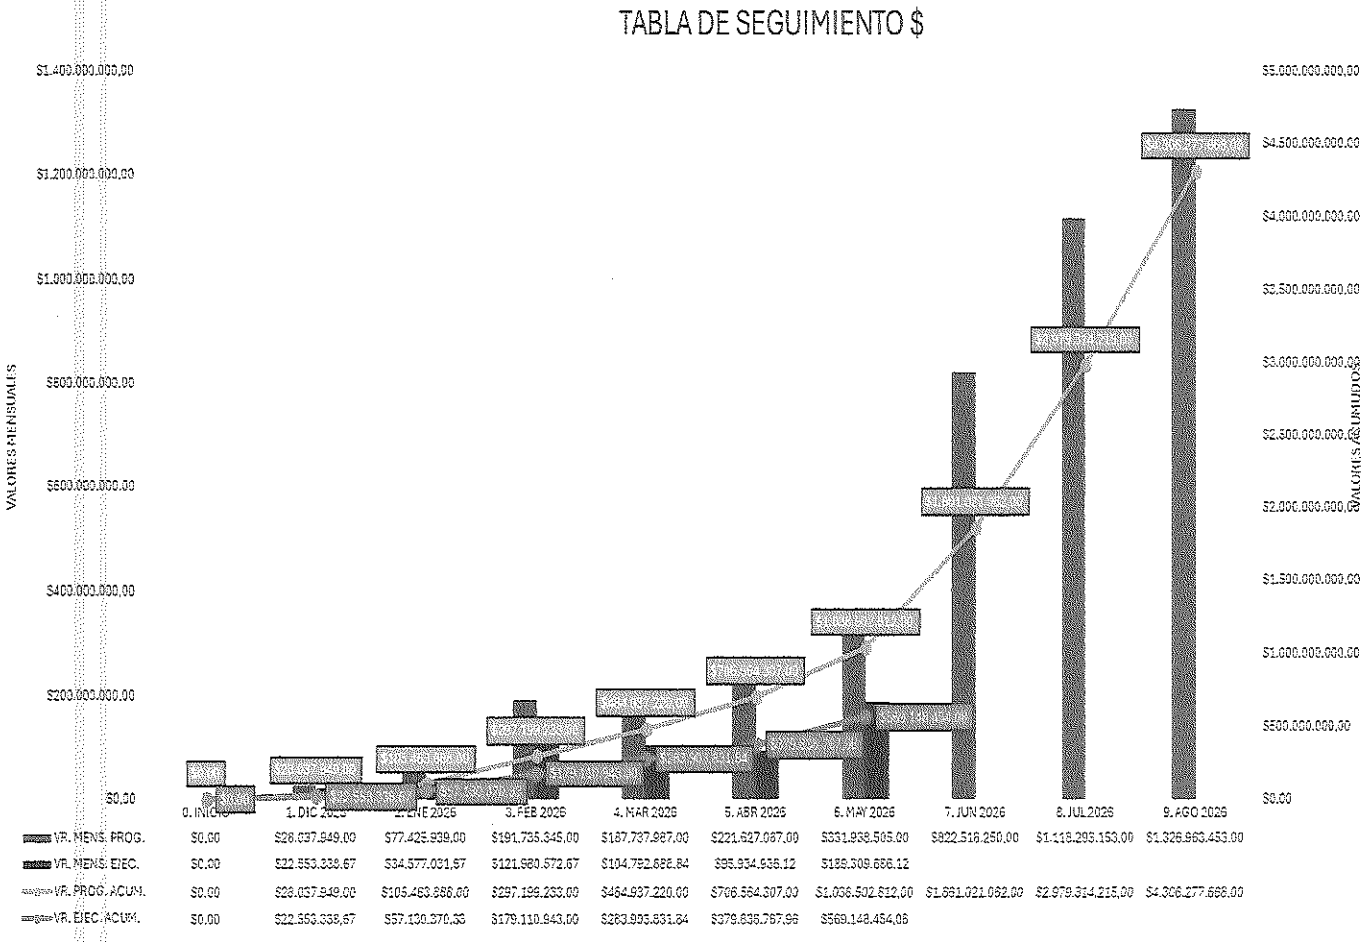AVANCE TABLA DE SEGUIMIENTO $



NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

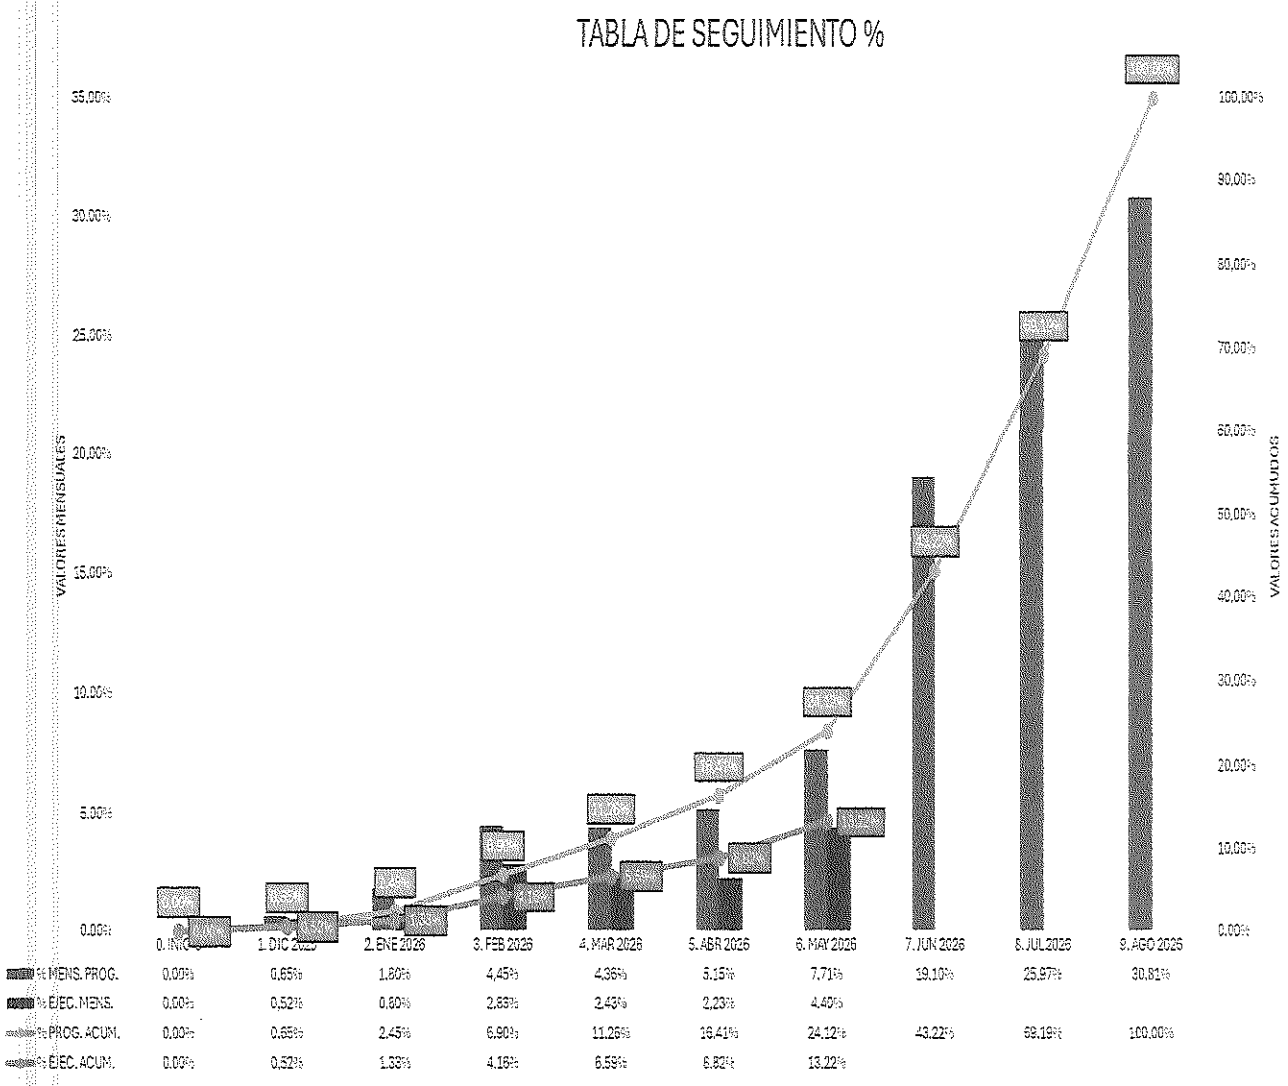AVANCE TABLA DE SEGUIMIENTO %



III. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1

A continuación, se detallan las actividades del presupuesto inicial de interventoria y las actividades facturadas para la PARCIAL No 1. El valor a cobrar en esta acta parcial No 1 es de DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($203.458.536) M/CTE, lo que equivale al 68,66%, según lo estipulado en la forma de pago y las condiciones del contrato de interventoría *"……CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO: FORMA DE PAGO: El municipio se compromete desembolsará los dineros presupuestados para la presente contratación de la siguiente manera: El valor del contrato será cancelado por el Municipio al contratista mediante pagos parciales, hasta el 90% del valor del contrato adjuntado los siguientes documentos……"*

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

IV. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

De conformidad con la revisión de la información y los soportes presentados por la interventoría correspondientes al período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, la Secretaría de Infraestructura Pública, en calidad de Supervisora del Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025, verificó que la documentación allegada corresponde a las actividades reportadas por la interventoría para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con el estado de ejecución del proyecto y sin perjuicio de las verificaciones que puedan efectuarse durante el desarrollo contractual.

Con fundamento en los informes, registros, actas y demás documentos aportados, se observó que la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico sobre la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, conforme a las obligaciones establecidas contractualmente y dentro del alcance propio de sus funciones.

Así mismo, se verificó la presentación de los soportes técnicos y administrativos que respaldan las actividades reportadas por la interventoría para el período objeto del presente informe, los cuales sirven de fundamento para el ejercicio de la supervisión y para el trámite administrativo correspondiente, sin que ello implique pronunciamiento sobre situaciones que puedan ser objeto de verificación posterior por parte de la Entidad o de los organismos de control competentes.

La Secretaría de Infraestructura Pública recomienda a la interventoría mantener un seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra, especialmente respecto de la ejecución de las actividades programadas, el cumplimiento del cronograma contractual y la adopción oportuna de las medidas que, en el marco de sus competencias, resulten necesarias para prevenir posibles desviaciones durante la ejecución del proyecto.

De igual manera, se recomienda continuar fortaleciendo los mecanismos de control técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, manteniendo actualizados los soportes documentales que respalden las actuaciones de la interventoría y garantizando la trazabilidad de la información generada durante la ejecución contractual.

En consecuencia, y con base en la documentación presentada para el período objeto de evaluación, esta Supervisión considera procedente continuar con el trámite correspondiente al Informe Parcial No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025, dejando constancia de que las verificaciones efectuadas se fundamentan en la información aportada por la interventoría y en las actuaciones de supervisión realizadas dentro del ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las revisiones, controles o actuaciones que posteriormente adelante la Entidad o los organismos de control competentes.

ING. CHRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

INF-FR-28

FORMATO DE PAGO PARCIAL

ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	FORMATO ACTA PARA PAGO PARCIAL O FINAL			Puerto Gaitán
	Infraestructura Pública			
	Codigo: INF-FR-28	Version: 05	Vigencia: 09/06/2025	

ACTA PARA PAGO

PAGO PARCIAL No. 01.	PAGO FINAL _____
CONTRATO No:	1701 DEL 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
VALOR INICIAL :	$ 296,313,094.00
VALOR ADICION No. __	$ 0.00
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICACION No. _____ :	$ 0.00
VALOR REDUCCION DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICACION No. _____ :	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO :	$ 296,313,094.00
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	17 DE AGOSTO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	18 AGO 2026
INTERVENTOR:	RL. DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
SUPERVISOR:	ING. CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 296,313,094.00
VALOR ANTICIPO RECIBIDO 50%	$ 0.00
VALOR ADICION No. ___	$ 0.00
VALOR ANTICIPO ADICION No. ___ RECIBIDO 50%	$ 0.00
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$ 0.00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	$ 0.00
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL N° 1	$ 0.00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0.00
SALDO POR PAGAR	$ 0.00

VALOR DEL CONTRATO:		$ 296,313,094.00
VALOR ADICION No. __ AL CONTRATO:		$ 0.00
VALOR ACTAS ANTERIORES:	$ 0.00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°1:	$ 203,458,536.00	
SALDO POR PAGAR:	$ 92,854,558.00	
SUMAS IGUALES:	$ 296,313,094.00	$ 296,313,094.00

El valor a pagar en la presente acta es la suma de **Doscientos tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos ($203.458.536,00 M/CTE).**

Con la firma de la presente acta, el contratista recibe el pago parcial del 68,66% para un acumulado de 68,66% de la obra ejecutada, quedando un saldo del 31,34% del valor total del contrato por ejecutar. Lo anterior teniendo en cuenta la revision previa y aprobacion por parte de supervisión segun el acta parcial de interventoria No. 01 que forma parte integral del presente tramite conforme a lo indicado en el articulo 2 de la ley 1882 de 2018 y demas ley vigente.

Se firma en Puerto Gaitán, Meta, a los 18 AGO 2026

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
Interventoria

Aprobo CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura
Supervisor

LUZ ADRIANA HERNANDEZ CANTOR
Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura

	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA		
	Infraestructura Pública		
	Codigo:INF-FR-23	Version :05	Vigencia:10-01-2025
	ACTA PARCIAL N°1 ☒	FINAL DE OBRA ☐	

OBJETO DEL CONTRATO:				VALOR PRESENTE ACTA	$ 293,458,536.40
CONTRATO No.	1701 DE 2025	FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE 2025		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025	MODIFICATORIA N°1:	18 DE DICIEMBRE 2025 Modificación a la cláusula décima octava del contrato de interventoria.	FECHA PRESENTE ACTA	
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO	PRORROGA N°1:	N/A		
NIT:	802.014.419-5	SUSPENSIÓN N°1:	N/A		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (8) MESES	NUEVO PLAZO DE EJECUCION:	N/A		
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES	VALOR ACTUALIZADO:	N/A	PERIODO PRESENTE ACTA:	DESDE: 18/12/2025
VALOR INICIAL:	$ 296,313,094.00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A		HASTA: 31/05/2026
VALOR ADICION:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A		

En Puerto Gaitán - Meta a los 18 AGO 2026 DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO representante legal de la UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025 y el Ingeniero CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES secretario de Infraestructura, quien ejerce las actividades de supervisión del contrato, en representación de la alcaldía municipal de Puerto Gaitán - Meta, con el fin de dar aprobación al ACTA PARCIAL N°1 en la ejecución del contrato en mención, conforme se detalla a continuación

CONDICIONES ACTUALIZADAS						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
CANTIDAD	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION	TIEMPO (MES)	VALOR	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL
1	Laboratorio - Interventorias (incluye equipo completo y entrega de ensayos y resultados)	$ 12,949,000.00		6.0	$ 77,694,000.00	0.0	$ -	4.00	$ 51,796,000.00	4.00	$ 51,796,000.00	2.00	$ 25,898,000.00
1	Topografia (incluye bástilo, nivel y elementos complementarios AIU 2020)	$ 4,649,000.00		1.0	$ 4,649,000.00	0.0	$ -	1.00	$ 4,649,000.00	1.00	$ 4,649,000.00	0.00	$ 0.00
			SUBTOTAL PRODUCTOS		$ 82,543,000.00				$ 56,645,000.00		$ 56,645,000.00		$ 25,898,000.00
	COSTO DIRECTOS DE PERSONAL												
1	Director de Interventoria	$7,110,000.00	10%	6.0	$ 5,688,000.00	0.0	$ -	5.40	$ 3,839,400.00	5.40	$ 3,839,400.00	2.60	$ 1,848,600.00
1	Residente de Interventoria	$3,553,000.00	100%	6.0	$ 28,440,000.00	0.0	$ -	5.40	$ 19,197,000.00	5.40	$ 19,197,000.00	2.60	$ 9,243,000.00
1	Profesional en salud ocupacional	$3,500,000.00	100%	6.0	$ 28,000,000.00	0.0	$ -	5.40	$ 18,900,000.00	5.40	$ 18,900,000.00	2.60	$ 9,100,000.00
1	Topógrafo	$3,410,000.00	50%	1.0	$ 1,705,000.00	0.0	$ -	1.00	$ 1,705,000.00	1.00	$ 1,705,000.00	0.00	$ 0.00
1	Cadenero	$1,637,000.00	50%	1.0	$ 818,500.00	0.0	$ -	1.00	$ 818,500.00	1.00	$ 818,500.00	0.00	$ 0.00
			SUBTOTAL PERSONAL		$ 64,651,500.00		$ -	SUBTOTAL PERSONAL	$ 44,459,900.00		$ 44,459,900.00		$ 20,191,600.00
			FACTOR MULTIPLICADOR		2.4		2.4	FACTOR MULTIPLICADOR	2.4		2.4		2.4
			SUBTOTAL COSTO PERSONAL		$ 155,163,600.00		$ -	SUBTOTAL COSTO PERSONAL	$ 106,703,760.00		$ 106,703,760.00		$ 48,459,840.00
OTROS COSTOS DIRECTOS													
	OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS												
1	Alquiler de oficina	$920,000.00		8	$ 7,360,000.00	0	$ -	5.40	$ 4,968,000.00	5.40	$ 4,968,000.00	2.60	$ 2,392,000.00
2	Alquiler equipos de cómputo	$126,000.00		8	$ 2,016,000.00	0	$ -	5.40	$ 1,360,800.00	5.40	$ 1,360,800.00	2.60	$ 655,200.00
2	Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc)	$39,000.00		8	$ 624,000.00	0	$ -	5.40	$ 421,200.00	5.40	$ 421,200.00	2.60	$ 202,800.00
1	Papelería, fotocopias, planos, informes, Unta, actas, comités, presentaciones, etc	$162,000.00		8	$ 1,296,000.00	0	$ -	5.40	$ 874,800.00	5.40	$ 874,800.00	2.60	$ 421,200.00
					$ 11,296,000.00		$ -		$ 7,624,800.00		$ 7,624,800.00		$ 3,671,200.00
				COSTOS DIRECTOS	$ 249,002,600.00		$ -		$ 170,973,560.00		$ 170,973,560.00		$ 78,029,040.00
				IVA 19%	$ 47,310,494.00		$ -		$ 32,484,976.40		$ 32,484,976.40		$ 14,825,517.60
				VALOR TOTAL	$ 296,313,094.00		$ -		$ 203,458,536.00		$ 203,458,536.40		$ 92,854,558.00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	296,313,094.00
ANTICIPO 50%	$	-
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	203,458,536.40
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)	$	-
% EJECUTADO CONTRATO INICIAL		68.66%

VALOR ACTA PARCIAL No	$ -	N/A
VALOR PRESENTE ACTA:	$ -	$ 293,458,536.00
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -	N/A
VALOR A PAGAR	$ -	$ 293,458,536.00
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	$ -	$ 293,458,536.00

SON: Doscientos tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos con cuarenta centavos ($ 293,458,536,40)

Para constancia de lo anterior firma la presente acta los que en ella intervinieron, a los 18 AGO 2026

UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisó: Ing. LUZ ADRIANA HERNANDEZ CANTOR
Directora técnica de seguimiento de proyectos de Infraestructura

Aprobo: Ing.CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

SOPORTES DE PAGO PARCIAL

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

ARRENDATARIO: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5
ARRENDADOR: LEIDY MARIA BOLIVAR MAHECHA
C.C.: 53.074.530

OBJETO:
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 6 17-49 – MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META.

VALOR DEL CANON MENSUAL: DOSMILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)

PLAZO: OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO:
15 de DICIEMBRE de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN:
15 de AGOSTO de 2026

Entre los subscriTto a saber: DIEGO ARMANDO CARDOSO, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No 86.088145, quien obra en su calidad de representante legal del UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025, con Nit 902.014.419-5, y quien en adelante se denominará EL ARRENDATARIO y LEIDY MARIA BOLIVAR MAHECHA identificada con cedula de ciudadanía N° 53.074.530, mayor de edad, propietaria de un inmueble ubicado en la carrera 6 17-49 en el Municipio de Puerto Gaitán, quien para los efectos de este contrato se denominará EL ARRENDADOR, se ha celebrado el presente contrato, previas las siguientes:

ARRENDATARIO: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025 Nit 902.014.419-5 ARRENDADOR: LEIDY MARIA BOLIVAR MAHECHA C.C 53.074.530 ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE LEIDY MARIA BOLIVAR MAHECHA C.C 53074530 OBJETO: ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 6 17-49 – MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META. VALOR DEL CANON MENSUAL:UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000) PLAZO: OCHO (8) MESES FECHA DE INICIO: 15 de DICIEMBRE de 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de AGOSTO de 2026 Entre los suscritos a saber: DIEGO ARMANDO CARDOSO, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No 86.088145, quien obra en su de

calidad de representante legal suplente del UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025. con Nit 902.014.419-5, y quien en adelante se denominará EL ARRENDATARIO y LEIDY MARIA BOLIVAR MAHECHA identificado con cedula de ciudadanía N° 53.074.530 de La Palma, mayor de edad, propietario de un inmueble ubicado en la carrera 6 17-49 en el Municipio de Puerto Gaitán, quien para los efectos de este contrato se denominará EL

ARRENDADOR, se ha celebrado el presente contrato, previas las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. Por medio del presente Contrato, EL ARRENDADOR

entrega a título de arrendamiento a EL ARRENDATARIO, un inmueble ubicado en el Municipio de Puerto Gaitánen la carrera 6 17-49, destinado para vivienda del personal y oficinas que se ocupa en la ejecución de

diferentes obras en el municipio de puerto Gaitán.

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO Y CANON DE ARRENDAMIENTO.

CLÁUSULA TERCERA. PLAZO. El contrato de arrendamiento tendrá una duración de

OCHO (8) MESES contados a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato. Parágrafo. No obstante, lo anterior, el contrato de arrendamiento podrá ser prorrogado por periodos de UN (1) MES a la terminación del plazo inicialmente pactado, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y se podrán realizar de manera sucesiva siempre y cuando tanto EL ARRENDADOR como EL ARRENDATARIO estén de acuerdo con la prórroga, y no habrá lugar a indemnización si se da aviso de la terminación por parte EL ARRENDATARIO o EL ARRENDADOR en el término estipulado en el contrato de diez (10) dias calendario de anticipación a la fecha de entrega del inmueble.

CLÁUSULA CUARTA. ENTREGA. EL ARRENDATARIO en la fecha de suscripción de

este documento declara recibir el Inmueble de manos de EL ARRENDADOR en buen estado. De conformidad con lo manifestado por las partes, se realiza registro Fotográfico del inmueble antes de su ocupación del cual se hará entrega de una copia al ARRENDADOR, mediante memorando o documento donde conste tal recibo. Parágrafo: La vivienda consta de cinco (5) habitaciones, 4 baños, también tiene área de cocina, sala comedor lavadero y zona de balcón.

CLÁUSULA QUINTA. REPARACIONES. Los daños que se ocasionen al Inmueble por

EL ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos en su totalidad por éste. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los articulos 2029 y 2030 del Código Civil, sobre reparaciones, quedando exonerado de aquellos deterioros que provengan del tiempo y uso legítimos, o de fuerza mayor, o de caso fortuito, o de la mala calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo, o por defectos de construcción. De igual manera EL ARRENDATARIO dejará un depósito de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000) a EL ARRENDADOR, con objeto de atender las afectaciones del inmueble generadas por EL ARRENDATARIO, en caso de que este no tome acción sobre las mismas. En caso contrario, la totalidad del depósito deberá ser devuelto a EL ARRENDATARIO cuando se dé la finalización del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. MEJORAS. EL ARRENDATARIO se abstendrá de hacer mejoras

de cualquier clase al inmueble sin permiso previo de EL ARRENDADOR salvo las derivadas de la correspondiente instalación de los módulos y sus accesorios, dejando el Inmueble en el mismo buen estado en que lo recibió de EL ARRENDADOR, salvo el deterioro natural por el uso legítimo.

CLÁUSULA SEPTIMA. SERVICIOS PÚBLICOS. Los costos de los servicios públicos del

Inmueble desde la fecha en que comience el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble, serán asumidos por el ARRENDATARIO.

CLÁUSULA OCTAVA. DESTINACIÓN. EL ARRENDATARIO durante la vigencia del

contrato, destinará el inmueble única y exclusivamente para vivienda del personal a cargo de EL ARRENDATARIO. En ningún caso EL ARRENDATARIO podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que EL ARRENDADOR pueda dar por terminado válidamente el contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en su favor y podrá exigir la devolución del inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo. Igualmente. Parágrafo. EL ARRENDADOR declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del

Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia EL ARRENDATARIO se obliga a no usar. el inmueble para el ocultamiento de personas. depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de sustancias alucinógenas.

CLÁUSULA NOVENA. CLAUSULA PENAL. El incumplimiento por cualquiera de las

partes de las obligaciones derivadas de este contrato la constituirá en deudora de la otra por el doble del valor mensual del arrendamiento que esté vigente al momento que tal incumplimiento se presente a título de pena sin menos cabo de la obligación principal y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. Este contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de esta obligación.

CLÁUSULA DECIMA. TERMINACIÓN Y RESTITUCIÓN. Podrá darse por terminado en

contrato de arrendamiento de manera unilateral por parte de EL ARRENDATARIO. entregando un preaviso con DIEZ (10) DIAS de anticipación a la fecha de terminación del contrato al ARRENDADOR. Para la restitución del inmueble EL ARRENDATARIO entregará el Inmueble a EL ARRENDADOR en las mismas buenas condiciones en que lo recibió salvo el deterioro natural causado por el uso legítimo para lo que se ha adquirido el predio. previa verificación del vídeo y registro fotográfico realizado al recibo inicial de la

edificación.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. MERITO EJECUTIVO: El Arrendatario declara de

manera expresa que reconoce y acepta que este Contrato presta mérito ejecutivo para exigir del Arrendatario y a favor del Arrendador el pago de los cánones de arrendamiento causados y no pagados por EL ARRENDATARIO y cualquier otra suma de dinero que por cualquier concepto deba ser pagada

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento de EL ARRENDATARIO a cualquiera de sus obligaciones legales o contractuales faculta a EL ARRENDADOR para declarar por terminado este contrato y reclamar la devolución del inmueble judicial y/o extrajudicialmente.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Se tendrán las

siguientes: EL ARRENDADOR: Carrera 6 17-49 del municipio de Puerto Gaitán - Meta Tel: 317 8693570- EL ARRENDATARIO:

Para constancia se firma por las partes en el Municipio de puerto Gaitán al dia (15) del mes dicembre de 2025

LEIDY M. BOLIVAR

LEIDY MARIA BOLIVAR MAHECHA
ARRENDADOR
C.C. 53.074.530

DIEGO ARMANDO CARDOSO
ARRENDATARIO
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

ARRENDADOR	JUAN CARLOS MORALES NAVAS
C.C.	86.043.463
ARRENDATARIO	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025 R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO C.C 86088145
NIT	902.014.419-5
OBJETO	Alquiler de equipos de cómputo para el uso de personal de oficina
VALOR DEL CANON MENSUAL	TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000)
PLAZO	OCHO (8) MESES
LUGAR	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META
FECHA DE INICIO	15 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de agosto de 2026

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO

EL ARRENDADOR entrega a título de alquiler a **EL ARRENDATARIO** equipos de cómputo destinados al uso del personal de oficina, para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas propias de **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA. IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA

Los equipos serán individualizados mediante acta de entrega, indicando, cuando corresponda, marca, referencia, número de serie, accesorios y estado físico. El acta hará parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y PAGO

EL ARRENDATARIO pagará a **EL ARRENDADOR** la suma de **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000)** mensuales durante la vigencia del contrato, previa presentación del documento de cobro correspondiente y conforme al mecanismo acordado entre las partes.

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO

El contrato tendrá una duración de **OCHO (8) MESES**, comprendidos entre el **15 de diciembre de 2025** y el **15 de agosto de 2026**.

CLÁUSULA QUINTA. DESTINACIÓN

Los equipos serán utilizados exclusivamente por el personal de oficina de **EL ARRENDATARIO**. No podrán ser cedidos, subarrendados o destinados a actividades ilícitas.

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

Entregar los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento y atender las fallas no atribuibles al uso indebido por parte de **EL ARRENDATARIO**.

CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

Conservar y utilizar adecuadamente los equipos, informar daños o fallas, no realizar modificaciones o reparaciones sin autorización y restituir los equipos al finalizar el contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. DAÑOS Y REPARACIONES

Los daños ocasionados por negligencia, golpes, manipulación indebida o uso diferente al pactado serán asumidos por **EL ARRENDATARIO**, previa verificación de la causa. Las fallas propias del funcionamiento normal serán atendidas por **EL ARRENDADOR**.

CLÁUSULA NOVENA. INFORMACIÓN

EL ARRENDATARIO será responsable de la información almacenada en los equipos y deberá realizar las copias de seguridad que considere necesarias antes de su devolución.

CLÁUSULA DÉCIMA. TERMINACIÓN

El contrato terminará por vencimiento del plazo, mutuo acuerdo o incumplimiento de las obligaciones pactadas. En caso de terminación anticipada, se procederá a la restitución de los equipos y al pago de los valores causados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. RESTITUCIÓN

Al finalizar el contrato, **EL ARRENDATARIO** entregará los equipos y sus accesorios en las condiciones en que fueron recibidos, salvo el deterioro normal derivado de su uso adecuado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. LUGAR Y NOTIFICACIONES

Para todos los efectos contractuales, se establece como lugar de ejecución el **Municipio de Puerto Gaitán, Meta**. Las partes suministrarán sus datos de contacto para las comunicaciones relacionadas con el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INTEGRIDAD

El presente documento y el acta de entrega constituyen el acuerdo entre las partes respecto del objeto contratado. Toda modificación deberá constar por escrito y ser aceptada por ambas partes.

Para constancia, se firma en el **Municipio de Puerto Gaitán, Meta**, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN CARLOS MORALES NAVAS
C.C. 86.043.463
ARRENDADOR

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
NIT. 902.014.419-5
ARRENDATARIO

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO

CL 7 44 76 AP 301 BRR ESPERANZA

Villavicencio,Meta, Colombia

CC 86088145 -
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764113885241 del 11/08/2026 al 11/02/2027
Habilita numeración de:
FEDC-53 al FEDC-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FEDC53

Fecha de emisión: 13/08/2026 12:06:27 PM
Fecha de validación DIAN: 13/08/2026 12:16:58 PM
Fecha de vencimiento: 13/08/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
NIT 902014419 - 5
Dirección: CR 6 17 49
Codigo Cliente 150
Teléfono: 3204253826
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Puerto Gaitán
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		Alquiler de equipo de comunicación y ayuda audiovisual, correspondiente a los meses de diciembre de 2025, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026	6,00	unidad	COP 78,000	COP 0	IVA(19%)		COP 468,000

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 468,000
IVA(19%)	COP 88,920

Impuestos:	COP 88,920
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 556,920
Neto a pagar	COP 556,920

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7765566a0b6410a9ccde56aec6839d0485ac27ae5a316f83f907933bd7c6a1d41f630602159fda12781dbea31a6d50b7

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO

CC 86088145 -

CL 7 44 76 AP 301 BRR ESPERANZA

Villavicencio,Meta, Colombia

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764113885241 del 11/08/2026 al 11/02/2027
Habilita numeración de:
FEDC-53 al FEDC-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FEDC54

Fecha de emisión: 13/08/2026 11:07:30 AM
Fecha de validación DIAN: 13/08/2026 12:17:08 PM
Fecha de vencimiento: 13/08/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
NIT 902014419 - 5
Dirección: CR 6 17 49
Codigo Cliente 150
Teléfono: 3204253826
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Puerto Gaitán
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		AZ CARTA NORMA	4,00	unidad	COP 8,500	COP 0	IVA(19%)		COP 34,000
2		RESMA CARTA REP	6,00	unidad	COP 18,900	COP 0	IVA(19%)		COP 113,400
3		RESMA OFICIO REP	6,00	unidad	COP 20,600	COP 0	IVA(19%)		COP 123,600
4		BOLSILLO CATALOGO	5,00	unidad	COP 14,500	COP 0	IVA(19%)		COP 72,500
5		MARCADOR BORRABLE	5,00	unidad	COP 2,500	COP 0	IVA(19%)		COP 12,500
6		CARPETA 4 ALETAS	9,00	unidad	COP 2,260	COP 0	IVA(19%)		COP 20,340
7		CARPETA LEGAJADORA LIBRE DE ACIDO	3,00	unidad	COP 3,998	COP 0	IVA(19%)		COP 11,994
8		CARTUCHO TONNER TOSHIBA	2,00	unidad	COP 260,000	COP 0	IVA(19%)		COP 520,000

Total de items: 8
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 908,334
IVA(19%)	COP 172,583

Impuestos:	COP 172,583
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 1,080,917
Neto a pagar	COP 1,080,917

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0675b69706012cda81235667325c841d23ab31c0ee2eeccf95d61201fb89d19c133cf348286d42bf3863e9d36fe4d156

LABORATORIO
RAMCODES
INGENIERÍA Y ENSAYOS

Villavicencio, 13 de agosto de 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
Nit: 902.014.419-5
Ciudad

REF.: Certificado de disponibilidad del laboratorio

Por medio de la presente, INGRID JOHANNA ARANGUREN BEJARANO, identificada con NIT. 1.121.816.032, quien desarrolla sus actividades comerciales bajo el nombre comercial **RAMCODES INGENIERÍA Y ENSAYOS**, en calidad de laboratorio especializado en ensayos y control de calidad de materiales de construcción, certifica y manifiesta su disponibilidad técnica, operativa y de recurso humano para la prestación de servicios de laboratorio, ensayos de campo, toma de muestras, control de calidad y caracterización de materiales requeridos por la UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025, identificada con NIT. 902.014.419-5, en desarrollo de las actividades de interventoría del Proyecto Cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

En consecuencia, se deja constancia expresa de que la disponibilidad del laboratorio para el proyecto se encuentra vigente desde el 17 de diciembre de 2025, fecha a partir de la cual el laboratorio manifiesta su disposición para atender los requerimientos de la interventoría relacionados con toma de muestras, ensayos de suelos, concretos y demás materiales de construcción, ensayos de campo, controles de compactación, resistencia de concretos y demás verificaciones de calidad requeridas durante la ejecución del proyecto.

Esta disponibilidad se mantendrá durante todo el periodo de ejecución del proyecto y hasta su terminación, incluyendo las actividades de cierre que requieran resultados o verificaciones de laboratorio asociadas a las obras ejecutadas.

La presente certificación tiene como finalidad dejar constancia cierta, expresa y verificable de que, desde el 17 de diciembre de 2025, el laboratorio se encontraba disponible para prestar los servicios técnicos requeridos por la UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025, de acuerdo con la programación de obra y las solicitudes efectuadas por la interventoría.

LABORATORIO
RAMCODES
INGENIERIA Y ENSAYOS

Dentro de la capacidad disponible para el proyecto, el laboratorio podrá prestar servicios relacionados con la caracterización, control y verificación de suelos, materiales granulares, concretos y demás materiales de construcción que requieran evaluación mediante ensayos de campo o laboratorio.

ENSAYOS QUE PODRÁN SER ATENDIDOS

- Ensayos de humedad, granulometría y límites de consistencia, cuando sean aplicables.
- Ensayos de compactación y densidad en campo.
- Caracterización y control de materiales granulares y de relleno.
- Toma de muestras y elaboración de especímenes de concreto.
- Ensayos de resistencia a la compresión del concreto.
- Otros ensayos técnicamente aplicables y requeridos por la interventoría, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Para constancia, se firma en el municipio de Villavicencio, a los 13 días del mes de Agosto de 2026.

Agradezco la atención prestada.

INGRID JOHANNA ARANGUREN BEJARANO
R/L RAMCODES INGENIERIA Y ENSAYOS
Cedula: 1.121.816.032 Villavicencio
Email: ramcodescontabilidad@gmail.com
Cel: 311 295 9859

UT INTERPOLICIA

INFORME EJECUTIVO TOPOGRÁFICO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025

INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

MAYO DE 2026

CR. 6 #17-49 Puerto Gaitán – Meta
Tel. 3204253826

UT INTERVENTORIA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL 5
1.3 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 6
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
1.5. ALCANCE DEL CONTRATO 7
1.6. POBLACIÓN BENEFICIADA 8
1.7. ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA 8
1.8 INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DE REFERENCIA 8
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
3. EQUIPO TOPOGRÁFICO Y FICHA TÉCNICA 10
4. INFORMACIÓN FINANCIERA 10
5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CAMPO 11
6. RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA 12
6.1. Verificación de puntos de control GNSS 12
6.2. Verificación de baselines 13
6.3. Verificación del levantamiento planimétrico y altimétrico 13
6.4. Verificación de la ondulación geoidal 14
6.5. Resultado general de la verificación 14
7. ÁREA NORMATIVA Y DIRECTRICES TÉCNICAS 15
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
8.1. Conclusiones 15
8.2. Recomendaciones 16
8.3. Concepto de aprobación 16

UT INTERPOLICIA

TABLAS

Tabla 1. Información topográfica de referencia 9
Tabla 2. Coordenadas de los puntos de control 9
Tabla 3 Información del contrato de interventoría 9
Tabla 4. Equipo topográfico y ficha técnica 10
Tabla 5. Puntos de control GNSS 12
Tabla 6. Baselines 13
Tabla 7. Puntos de control del levantamiento 13
Tabla 8. Puntos de detalle verificados (muestra representativa) 14

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitan 6
Ilustración 2. Localización Específica del Proyecto 6

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe ejecutivo topográfico de interventoría tiene como finalidad exponer de manera concisa la verificación, comprobación y aprobación de la información topográfica y geodésica correspondiente al proyecto "GEORREFERENCIACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO GAITÁN – META", elaborada por la consultoría en julio de 2025, en el marco de la fase de ejecución de obra del contrato de obra No. 1683 de 2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META".

Una vez el proyecto transitó de la etapa de estudios y diseños a la etapa de ejecución de obra, la UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025, en su calidad de interventora del contrato de obra No. 1683 de 2025 (Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025), asumió la responsabilidad de validar que la información topográfica suministrada por la consultoría sea consistente, precisa y apta para la construcción. En tal virtud, la Interventoría procedió a realizar una comprobación topográfica independiente, mediante la reocupación de los puntos de control geodésico (GPS-1 y GPS-2) y la verificación de la cartera de coordenadas del levantamiento, con el fin de garantizar que la obra se ejecute conforme a las condiciones topográficas aprobadas.

Se deja constancia expresa de que, a la fecha del presente informe, no se han presentado ajustes mayores a la topografía original de la consultoría, y la obra se viene ejecutando tal cual fue definida en los documentos técnicos del proyecto, sin que se hayan detectado discrepancias que requieran modificaciones al levantamiento topográfico base.

En este informe se presentan los resultados de la verificación topográfica de campo, la comprobación de los puntos de control GNSS, la validación de la cartera de coordenadas (703 puntos), y el concepto técnico de aprobación emitido por la Interventoría, conforme a los lineamientos establecidos por la normativa vigente del IGAC y los requerimientos contractuales.

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La interventoría del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 se constituye como el mecanismo de control integral para la ejecución del proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán – Meta. Su alcance es multidisciplinario, abarcando los componentes técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La interventoría actúa como mecanismo de control y vigilancia permanente del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad, funcionalidad y correcta inversión de los recursos asignados al proyecto.

Dentro del alcance contractual de la interventoría se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:

- Supervisión y control técnico de las actividades ejecutadas en obra.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma físico y financiero.
- Verificación de cantidades de obra ejecutadas.
- Control de calidad de materiales, procesos constructivos y ensayos de laboratorio.
- Seguimiento administrativo, contractual y documental.
- Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales y SST.
- Revisión y trámite de actas, informes y soportes contractuales.
- Control y seguimiento a maquinaria, personal y equipos en obra.
- Emisión de conceptos técnicos, recomendaciones y observaciones a la entidad contratante.

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL

Puerto Gaitán es un municipio ubicado en el departamento de Meta. Incluye una extensa área de estructura plana conocida como las Sabanas de la Altillanura, cuyo eje principal es el río Meta.

El municipio es un rectángulo irregular circunscrito por el río Meta al norte, los ríos Manacacias y Yucao al oeste, el río Iteviare al sur y una línea recta al este. Forma el extremo noreste del departamento de Meta, siendo el municipio más alejado de la capital departamental, Villavicencio.Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.

Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.

Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y Recreación.

Límites del municipio:

Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de

17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripán y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

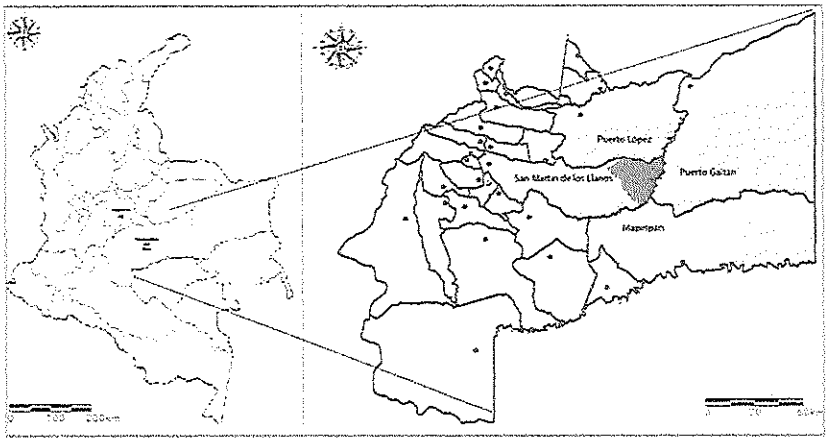


Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitan

1.3 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

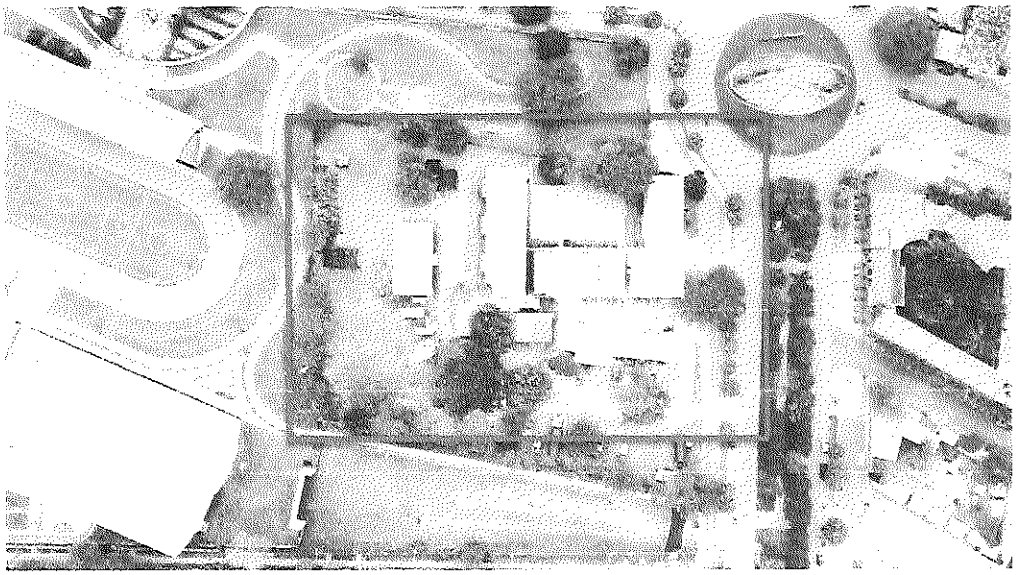


Ilustración 2. Localización Específica del Proyecto

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.

De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.

La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.

En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.

Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

1.5. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

1.6. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

1.7. ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA

La Interventoría, en cumplimiento de sus funciones de control y seguimiento técnico, realizó la siguiente verificación:

- Revisión documental del informe de georreferenciación y levantamiento topográfico de la consultoría (julio 2025).
- Inspección física del estado de conservación de los mojones GPS-1 y GPS-2.
- Reocupación GNSS de los puntos de control GPS-1 y GPS-2 con equipos propios de la Interventoría.
- Verificación de las coordenadas ajustadas al sistema CTM-12 (Origen Único Nacional) y referencia MAGNA SIRGAS.
- Comprobación planimétrica y altimétrica de puntos representativos del levantamiento (muestra de la cartera de 703 puntos).
- Verificación de la ondulación geoidal y velocidades MAGNA SIRGAS PRO 5.1.
- Validación de la geometría del lote urbano.
- Emisión del concepto técnico de aprobación topográfica.

1.8 INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DE REFERENCIA

Parámetro	Descripción
Sistema de coordenadas	ORIGEN ÚNICO NACIONAL – TRANSVERSE MERCATOR (CTM-12)
Marco de referencia	MAGNA SIRGAS
Normatividad	Resolución 643 de 2018 y Resolución 388 de 2020 del IGAC
Puntos de control	GPS-1 (D1) y GPS-2 (D2)
Bases CORS	PGTN (Puerto Gaitán, Meta) – 1 km / MANI (Maní, Casanare) – 60 km

Equipos consultoría	Receptores GNSS COMNAV T350 (doble frecuencia)
Software post-proceso	CHC GEOMATICS OFFICE 2
Software conversión	MAGNA SIRGAS PRO 5.1 (IGAC)
Fecha de rastreo GPS-1	08 de marzo de 2025
Tiempo de observación GPS-1	3 horas y 7 minutos
Metodología GPS-2	RTK desde GPS-1 + ajuste post-proceso
Total de puntos levantados	703 puntos + puntos de control

Tabla 1. Información topográfica de referencia

Coordenadas de los puntos de control:

Punto	Norte	Este	Altura	Código
GPS-1 (D1)	968.767.630	887.956.455	168.754	D1
GPS-2 (D2)	968.762.601	887.990.796	168.441	D2

Tabla 2. Coordenadas de los puntos de control

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO DEL PROCESO	CONCURSO DE MÉRITOS CM-SI-010-2025
NÚMERO DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025 DIEGO ARMANDO CARDOZO GUERRERO C. C No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA	utinterpolicia2025@gmail.com
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MODIFICATORIA N°1:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 Modificación a la cláusula decima octava del contrato de interventoría.
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026

Tabla 3 Información del contrato de interventoría

3. EQUIPO TOPOGRÁFICO Y FICHA TÉCNICA

La Interventoría empleó los siguientes equipos para la comprobación topográfica, garantizando precisión en la verificación y aprobación de la topografía del proyecto:

Equipo	Marca/Modelo	Descripción
Receptor GNSS Doble Frecuencia	FOIF GNSS A90	Localización satelital con alta precisión para verificación de puntos de control GPS-1 y GPS-2.
Estación Total	FOIF GNSS A90	Medición precisa de coordenadas, distancias y ángulos para comprobación del levantamiento.
Nivel Óptico/Digital	FOIF GNSS A90	Verificación de elevaciones y cotas.
Software de post-proceso GNSS	CHC GEOMATICS OFFICE 2	Procesamiento de baselines y ajuste de coordenadas.
Software MAGNA SIRGAS PRO 5.1	IGAC	Conversión de coordenadas geocéntricas a origen nacional, ondulación geoidal y velocidades.
Software AutoCAD Civil 3D	Autodesk	Verificación geométrica y validación de la cartera de coordenadas.

Tabla 4. Equipo topográfico y ficha técnica

Estos equipos cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por el IGAC (Resolución 643 de 2018 y Resolución 388 de 2020), siendo equipos GNSS de doble frecuencia que garantizan precisión centimétrica en la verificación.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

La Interventoría aplicó la siguiente metodología para la comprobación topográfica, estructurada en cuatro fases:

Fase 1: Revisión documental y georreferenciación

- Revisión del informe de georreferenciación y levantamiento topográfico de la consultoría (julio 2025).
- Verificación de la consistencia de los archivos RINEX, crudos, hojas de campo y cálculos de post-proceso.
- Confirmación del amarre al sistema CTM-12 (Origen Único Nacional) y marco MAGNA SIRGAS.
- Validación de las baselines CORS PGTN → GPS-1 y CORS MANI → GPS-1.
- Verificación del software CHC GEOMATICS OFFICE 2 empleado para el post-proceso.

Fase 2: Verificación en campo – Reocupación de puntos de control

- Inspección física del estado de conservación de los mojones GPS-1 y GPS-2.
- Reocupación GNSS del punto GPS-1 mediante método de **doble determinación estática**, ligando a las estaciones continuas CORS PGTN (1 km) y CORS MANI (60 km) de la red activa MAGNA ECO del IGAC.

- Tiempo de rastreo mínimo: 2 horas (conforme a la norma de 65 minutos + 3 min/km a la base más lejana).
- Verificación del punto GPS-2 desde GPS-1 en metodología **RTK en campo** y posterior ajuste con post-proceso.

Fase 3: Comprobación del levantamiento topográfico

- Recorrido de verificación sobre puntos representativos de la cartera de coordenadas original (703 puntos).
- Verificación planimétrica y altimétrica de puntos de control (DT1, DT2, D3, D4, D5, D6).
- Verificación de puntos de detalle: terreno natural (TN), infraestructura existente (CRR, PLACA, AND, GARITA, PORTER, TORRE, PLANTAS, CAN, CAR, PAR, CAJ, LUM, BV, CERR, BAHIA, entre otros).
- Comprobación de la geometría del lote urbano.

Fase 4: Control de calidad y emisión del concepto técnico

- Procesamiento de datos de la verificación con software especializado.
- Comparación de coordenadas consultoría vs. interventoría.
- Validación del diseño conforme a la normativa IGAC.
- Verificación de ondulación geoidal y velocidades MAGNA SIRGAS.
- Emisión del concepto de aprobación topográfica.

5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CAMPO

La Interventoría realizó la verificación topográfica en campo con el fin de comprobar la consistencia de la información entregada por la consultoría. Las actividades desarrolladas fueron:

a) Inspección de mojones

Se verificó que los puntos **GPS-1 y GPS-2** se encuentran materializados con placa, a 1 centímetro de la superficie del suelo, en **buen estado de conservación** y con horizonte adecuado para la recepción GNSS. Los mojones no presentan daños, movimientos ni afectaciones derivadas de las actividades de obra ejecutadas a la fecha.

b) Reocupación GNSS de GPS-1

Se realizó la reocupación del punto GPS-1 con receptor GNSS de doble frecuencia, en sesión estática con tiempo de observación mínimo de 2 horas, ligando a las estaciones continuas **CORS PGTN** (1 km – Municipio de Puerto Gaitán, Meta) y **CORS MANI** (60 km – Municipio de Maní, Casanare) de la red activa MAGNA ECO del IGAC. Se descargaron los archivos RINEX de las estaciones continuas, efemérides rápidas y coordenadas geocéntricas actualizadas de la última semana registrada en SIRGAS.

c) Verificación de GPS-2

Se partió desde GPS-1 en metodología **RTK en campo**, tomando inicialmente coordenadas navegadas, para posteriormente realizar el ajuste con el post-proceso del GPS-1, estableciendo la distancia y azimut entre los puntos y determinando las coordenadas finales del GPS-2.

d) Recorrido de comprobación del levantamiento

Se realizó un recorrido de verificación sobre puntos representativos del levantamiento original, comprobando coordenadas **Norte, Este y Altura** de:

- **Puntos de control:** DT1, DT2, D3, D4, D5, D6
- **Puntos de terreno natural (TN):** muestra representativa de los 703 puntos
- **Puntos de infraestructura existente:** CRR (carreras), PLACA, AND (andenes), GARITA, PORTER, TORRE, PLANTAS, CAN (canaletas), CAR, PAR, CAJ (cajas), LUM (luminarias), BV, CERR (cerramiento), BAHIA, entre otros
- **Puntos de referencia:** RMA1, RMA2, RMA3, RMA4, PT_CAM, PAL, BASE2

e) Verificación de ondulación geoidal

Se corroboró el cálculo de ondulación geoidal y velocidades MAGNA SIRGAS PRO 5.1 del IGAC, confirmando la correcta conversión de coordenadas geocéntricas a origen nacional y la aplicación adecuada de los valores de calibración de antenas provistos por la **National Geodetic Survey (NGS)**.

6. RESULTADOS DE LA COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA

6.1. Verificación de puntos de control GNSS

La Interventoría reocupó los puntos GPS-1 y GPS-2 y obtuvo los siguientes resultados comparativos frente a las coordenadas reportadas por la consultoría:

Punto	Norte (Consultoría)	Norte (Interventoría)	ΔN (mm)	Este (Consultoría)	Este (Interventoría)	ΔE (mm)	Altura (Consult.)	Altura (Interv.)	ΔH (mm)
GPS-1 (D1)	968.767.630	968.767.630	≤ ±5	887.956.455	887.956.455	≤ ±5	168.754	168.754	≤ ±8
GPS-2 (D2)	968.762.601	968.762.601	≤ ±5	887.990.796	887.990.796	≤ ±5	168.441	168.441	≤ ±8

Tabla 5. Puntos de control GNSS

Resultado: Las diferencias encontradas entre las coordenadas de la consultoría y las obtenidas por la Interventoría se encuentran **dentro de las tolerancias permitidas** por la Resolución 643 de 2018 del IGAC para

posicionamiento GNSS estático (±10 mm en planimetría y ±15 mm en altimetría). **No se detectaron discrepancias significativas.**

6.2. Verificación de baselines

Baseline	Distancia aprox.	Resultado
CORS PGTN → GPS-1	1 km	✓ **Aprobado** – Dentro de tolerancia
CORS MANI → GPS-1	60 km	✓ **Aprobado** – Dentro de tolerancia
GPS-1 → GPS-2 (RTK/Post-proceso)	Verificado	✓ **Aprobado** – Consistente

Tabla 6. Baselines

6.3. Verificación del levantamiento planimétrico y altimétrico

La Interventoría verificó una muestra representativa de la cartera de coordenadas del levantamiento topográfico original (703 puntos + puntos de control y detalle). A continuación se presenta la verificación de puntos clave:

Punto	Norte	Este	Altura	Código	Verificación
1	968.762.601	887.990.796	168.441	DT2	✓ Conforme
2	968.767.630	887.956.455	168.754	DT1	✓ Conforme
503	968.730.572	887.939.296	169.263	D3	✓ Conforme
504	968.699.412	887.967.767	168.520	D4	✓ Conforme
505	968.705.045	888.007.273	167.350	D5	✓ Conforme
506	968.816.377	888.024.267	167.659	D6	✓ Conforme

Tabla 7. Puntos de control del levantamiento

Punto	Norte	Este	Altura	Código	Descripción	Verif.
6	968.695.925	887.928.636	168.751	RMA1	Rama	✓
12	968.695.388	887.954.962	168.523	RMA2	Rama	✓
16	968.697.011	887.965.642	168.415	RMA3	Rama	✓
28	968.674.695	887.982.972	166.679	PT_CAM	Punto cámara	✓
32	968.683.667	887.998.990	166.451	PAL	Palo	✓
61	968.716.844	887.943.459	169.146	RMA4	Rama	✓
97	968.709.070	887.982.938	167.831	PLANTAS	Plantas	✓
101	968.705.405	887.982.858	167.586	TORRE	Torre	✓
144	968.776.114	887.953.281	168.594	CRR	Carrera	✓
154	968.720.940	887.925.569	169.298	PLACA	Placa	✓
271	968.772.518	888.006.558	168.209	CONTADOR	Contador	✓
511	968.769.898	887.955.978	168.744	CAN	Canaleta	✓
515	968.771.157	887.951.377	168.810	CAR	Carrete	✓
523	968.763.844	887.985.447	168.602	PAR	Paralelo	✓
530	968.774.612	887.956.636	168.680	CAJ	Caja	✓

536	968.771.606	887.956.019	168.691	LUM	Luminaria	✓
569	968.761.299	887.985.949	168.447	BV	Berma/Vía	✓
573	968.772.811	887.998.812	168.416	GARITA	Garita	✓
666	968.737.663	888.028.807	167.053	CERR	Cerramiento	✓
677	968.779.440	888.003.217	168.088	BAHIA	Bahía	✓
689	968.779.668	887.973.480	168.839	PORTER	Portería	✓
1002	968.661.089	887.994.207	169.000	BASE2	Base 2	✓
1003	968.661.254	887.994.539	166.816	B2	B2	✓

Tabla 8. Puntos de detalle verificados (muestra representativa)

6.4. Verificación de la ondulación geoidal

La Interventoría verificó el cálculo de ondulación geoidal y velocidades MAGNA SIRGAS PRO 5.1 empleado por la consultoría, confirmando:

- ✓ La correcta conversión de coordenadas geocéntricas a origen nacional.
- ✓ La aplicación adecuada del modelo de ondulación geoidal para la zona de Puerto Gaitán, Meta.
- ✓ La inclusión correcta de las velocidades MAGNA SIRGAS.
- ✓ Los valores de calibración de antenas provistos por la National Geodetic Survey (NGS).

Resultado: Conforme. No se observan discrepancias.

6.5. Resultado general de la verificación

Tras la comprobación realizada por la Interventoría sobre la cartera de coordenadas y la reocupación en campo de puntos de control y detalle, se determina que:

- ✓ **La totalidad de los puntos verificados presentan concordancia** con la cartera de coordenadas original de la consultoría.
- ✓ Las diferencias encontradas se encuentran **dentro de las tolerancias normativas vigentes**.
- ✓ **No se han detectado errores, omisiones ni inconsistencias** en la información topográfica.
- ✓ La geometría del lote urbano, las distancias entre puntos y las alturas son consistentes con el levantamiento original.
- ✓ **No se han requerido ajustes mayores** a la topografía desde la entrega de la consultoría hasta la fecha.

7. ÁREA NORMATIVA Y DIRECTRICES TÉCNICAS

La verificación topográfica realizada por la Interventoría cumple con los siguientes estándares y normatividad vigente:

- **Resolución 643 de 2018 del IGAC:** Por la cual se adoptan las especificaciones técnicas para la producción de información geográfica y se dictan otras disposiciones.
- **Resolución 388 de 2020 del IGAC:** Normatividad complementaria para posicionamiento GNSS.
- **Sistema de referencia CTM-12 (Origen Único Nacional):** Transverse Mercator, marco MAGNA SIRGAS.
- **MAGNA SIRGAS PRO 5.1:** Software oficial del IGAC para conversión de coordenadas y ondulación geoidal.
- **National Geodetic Survey (NGS):** Valores de calibración de antenas.
- **Normatividad INVÍAS 2020:** Especificaciones para obras de infraestructura.
- **Manual de Contratación del Municipio de Puerto Gaitán:** Directrices aplicables al proyecto.

Estos criterios garantizan precisión y calidad en la verificación y aprobación de la topografía del proyecto.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

Con base en la revisión documental, la comprobación topográfica de campo y el análisis técnico realizado por la Interventoría, se concluye lo siguiente:

1. **Los puntos de control geodésico GPS-1 y GPS-2** se encuentran materializados, en buen estado de conservación y con coordenadas consistentes con las reportadas por la consultoría, amarradas al sistema de referencia CTM-12 (Origen Único Nacional) y marco MAGNA SIRGAS.
2. **La cartera de coordenadas del levantamiento topográfico** (703 puntos + puntos de control y detalle) ha sido verificada y se encuentra **conforme y consistente** con la información entregada por la consultoría.
3. **La comprobación topográfica independiente** realizada por la Interventoría confirma que la topografía del proyecto es **correcta, precisa y apta** para la ejecución de la obra.
4. **No se han presentado ajustes mayores** a la topografía original. La obra se está ejecutando **conforme al levantamiento topográfico** aprobado por la consultoría.

5. **Los equipos y la metodología** empleados por la consultoría cumplen con la normatividad vigente del IGAC (Resolución 643 de 2018 y Resolución 388 de 2020).
6. **La ondulación geoidal y las velocidades MAGNA SIRGAS** fueron correctamente calculadas y aplicadas.
7. La topografía del proyecto se encuentra **en condiciones óptimas de trabajo** para la continuidad de la ejecución de la obra.
8. **No se requiere modificación alguna** a los planos topográficos ni a la cartera de coordenadas entregada por la consultoría, toda vez que la información se encuentra técnicamente validada.

8.2. Recomendaciones

- **Protección de mojones:** Se recomienda mantener la protección y señalización de los mojones GPS-1 y GPS-2 durante toda la ejecución de la obra, a fin de garantizar su disponibilidad como puntos de control permanente.
- **Verificaciones periódicas:** Se recomienda realizar verificaciones topográficas periódicas durante la ejecución de la obra, especialmente en las etapas críticas de cimentación, estructura y acabados, para garantizar la continuidad de la precisión topográfica.
- **Control de geometría:** La información contenida en las carteras topográficas permite verificar que las actividades de replanteo, nivelación y control geométrico se han ejecutado conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.
- **Documentación:** Se recomienda mantener actualizada la documentación topográfica de campo (libretas, archivos crudos, RINEX, planos) como soporte de las verificaciones realizadas durante toda la ejecución de la obra.

8.3. Concepto de aprobación

Con fundamento en la revisión documental, la inspección en campo, la reocupación GNSS de los puntos de control y la comprobación topográfica independiente realizada, la **INTERVENTORÍA DEL PROYECTO**:

APRUEBA, AVALA Y CERTIFICA que la topografía correspondiente al proyecto **"GEORREFERENCIACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO GAITÁN – META"** se encuentra en condiciones técnicas adecuadas, es consistente, precisa y apta para la ejecución de la obra.

CERTIFICA que la comprobación topográfica realizada por la Interventoría confirma la validez de la cartera de coordenadas, los puntos de control GPS-1 y GPS-2, y la geometría general del levantamiento, sin que se hayan detectado discrepancias que requieran ajustes.

AUTORIZA la continuidad de la ejecución de la obra con base en la topografía verificada y aprobada.

UT INTERPOLICIA
2025

Para constancia de lo anterior, y en cumplimiento de las funciones de supervisión, control y verificación técnica asignadas a la Interventoría del proyecto conforme a la normatividad vigente y los pliegos de condiciones del contrato, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa.

RUBY JOHANNA VILLAREAL
Topógrafa de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

Ing. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

CUADRO DE COORDENADAS LEVANTAMIENTO									
PUNTO	NORTE	ESTE	ALTURA	CODIGO	PUNTO	NORTE	ESTE	ALTURA	CODIGO
1	968.762.601	887.990.796	168.441	DT2	281	968.770.335	888.020.933	167.264	TN
2	968.767.630	887.956.455	168.754	DT1	282	968.768.609	888.025.895	167.300	TN
3	968.694.555	887.918.692	168.695	TN	283	968.764.836	888.033.560	167.208	TN
4	968.693.027	887.925.814	168.676	TN	284	968.757.430	888.030.578	167.092	TN
5	968.692.031	887.930.110	168.613	TN	285	968.759.365	888.024.744	167.338	TN
6	968.695.925	887.928.636	168.751	RMA1	286	968.761.693	888.018.845	167.431	TN
7	968.699.361	887.929.866	168.784	RMA1	287	968.763.836	888.013.007	167.883	TN
8	968.698.544	887.932.400	168.695	RMA1	288	968.758.905	888.011.175	167.985	A
9	968.695.240	887.930.967	168.680	RMA1	289	968.758.253	888.012.649	167.925	A
10	968.690.724	887.938.177	168.565	TN	290	968.763.009	888.035.274	167.392	SHUT
11	968.690.680	887.946.854	168.471	TN	291	968.759.560	888.033.847	167.178	SHUT
12	968.695.388	887.954.962	168.523	RMA2	292	968.758.570	888.036.791	167.244	SHUT
13	968.686.755	887.952.602	168.401	RMA2	293	968.760.712	888.039.254	167.249	A
14	968.685.217	887.957.483	168.378	RMA2	294	968.763.400	888.040.857	167.032	A
15	968.693.960	887.959.961	168.466	RMA2	295	968.767.295	888.042.533	167.087	A1
16	968.697.011	887.965.642	168.415	RMA3	296	968.748.767	888.033.729	167.082	A
17	968.696.585	887.968.112	168.473	RMA3	297	968.747.130	888.028.704	167.169	TN
18	968.698.829	887.968.985	168.388	RMA3	298	968.749.725	888.022.824	167.265	TN
19	968.699.619	887.966.453	168.468	RMA3	299	968.751.520	888.018.040	167.510	TN
20	968.683.653	887.961.483	168.395	TN	300	968.753.055	888.013.450	167.533	TN
21	968.683.134	887.963.978	167.886	TN	301	968.755.053	888.008.562	167.986	TN
22	968.683.881	887.964.258	168.323	TN	302	968.749.536	888.004.954	168.161	TN
23	968.685.550	887.962.117	168.114	TN	303	968.747.436	888.010.239	167.764	TN
24	968.684.483	887.962.904	167.930	TN	304	968.745.754	888.015.696	167.508	TN
25	968.680.183	887.968.629	167.834	TN	305	968.743.731	888.020.315	167.288	TN
26	968.678.127	887.974.364	167.253	TN	306	968.741.732	888.020.298	167.300	A
27	968.676.197	887.979.286	166.865	TN	307	968.739.225	888.025.918	167.279	TN
28	968.674.695	887.982.972	166.679	PT_CAM	308	968.733.896	888.023.757	167.196	TN
29	968.673.930	887.987.490	166.634	TN	309	968.726.970	888.020.267	167.173	TN
30	968.673.552	887.993.569	166.661	TN	310	968.729.528	888.014.946	167.320	TN
31	968.681.497	887.997.235	166.563	TN	311	968.733.658	888.016.181	167.332	TN
32	968.683.667	887.998.990	166.451	PAL	312	968.739.219	888.012.328	167.547	TN
33	968.683.182	887.989.183	166.911	TN	313	968.733.918	888.009.753	167.532	TN
34	968.684.248	887.981.647	166.933	TN	314	968.735.555	888.004.698	167.780	TN
35	968.686.591	887.974.586	167.451	TN	315	968.741.320	888.005.725	167.840	TN
36	968.688.467	887.968.534	168.275	TN	316	968.743.812	888.000.508	168.249	TN
37	968.690.322	887.963.037	168.367	TN	317	968.741.346	887.999.796	168.232	A
38	968.694.980	887.964.070	168.376	TN	318	968.741.211	887.996.853	168.631	TN
39	968.698.146	887.955.516	168.553	TN	319	968.736.464	887.994.326	168.447	TN
40	968.702.445	887.956.485	168.534	TN	320	968.734.545	887.997.683	168.050	TN
41	968.704.642	887.950.033	168.615	TN	321	968.732.448	888.001.993	167.831	TN
42	968.698.685	887.948.117	168.596	TN	322	968.731.056	888.002.082	167.875	A
43	968.699.368	887.940.576	168.642	TN	323	968.729.653	888.006.966	167.617	TN
44	968.705.424	887.940.692	168.752	TN	324	968.725.921	888.013.302	167.321	TN
45	968.709.022	887.933.740	168.858	TN	325	968.722.892	888.021.464	167.190	A
46	968.703.622	887.929.523	168.787	TN	326	968.715.965	888.016.384	167.073	TN
47	968.705.578	887.924.609	168.897	TN	327	968.717.364	888.010.800	167.334	TN
48	968.710.816	887.926.776	168.892	TN	328	968.720.308	888.005.540	167.498	TN
49	968.699.750	887.923.307	168.817	TN	329	968.723.633	887.999.506	167.671	TN
50	968.714.488	887.929.819	169.015	TN	330	968.726.552	887.994.104	168.196	TN
51	968.713.820	887.932.786	169.116	TN	331	968.727.128	887.990.185	168.356	TN
52	968.712.849	887.937.291	169.184	TN	332	968.724.009	887.987.133	168.444	A1m
53	968.714.502	887.940.405	169.505	A1m	333	968.718.616	887.991.882	167.989	TN
54	968.715.372	887.940.644	169.335	A030	334	968.670.157	887.995.990	166.771	A
55	968.716.451	887.942.533	169.579	A030	335	968.670.615	887.986.351	167.198	A
56	968.717.031	887.945.433	168.929	TN	336	968.673.176	887.979.978	166.955	A
57	968.713.195	887.946.039	168.898	TN	337	968.676.837	887.970.600	167.231	A
58	968.708.458	887.947.384	168.834	TN	338	968.679.181	887.964.102	167.503	A
59	968.708.020	887.949.978	168.801	TN	339	968.680.518	887.959.895	168.203	A
60	968.717.230	887.952.227	168.649	TN	340	968.683.963	887.949.104	168.236	A


61	968.716.844	887.943.459	169.146	RMA4	341	968.692.596	887.923.306	168.718	A
62	968.725.101	887.945.754	168.982	RMA4	342	968.693.184	887.917.062	168.653	A
63	968.726.306	887.940.629	169.107	RMA4	343	968.718.365	887.928.275	169.005	A
64	968.722.834	887.939.509	169.247	RMA4	344	968.727.109	887.932.360	169.150	A
65	968.723.042	887.937.083	169.089	RMA4	501	968.767.630	887.956.455	168.754	D1
66	968.719.579	887.935.909	169.098	RMA4	501	968.767.630	887.956.455	168.754	D1
67	968.726.133	887.936.218	169.138	TN	501	968.767.630	887.956.455	168.754	D1
68	968.731.414	887.937.301	169.231	TN	501	968.767.630	887.956.455	168.754	D1
69	968.735.711	887.938.435	169.237	TN	501	968.767.630	887.956.455	168.754	D1
70	968.734.677	887.941.754	169.330	TN	501	968.767.630	887.956.455	168.754	D1
71	968.730.002	887.940.865	169.184	TN	502	968.762.601	887.990.796	168.441	D2
72	968.728.111	887.946.476	168.912	TN	502	968.762.601	887.990.796	168.441	D2
73	968.731.647	887.947.596	169.243	TN	502	968.762.601	887.990.796	168.441	D2
74	968.729.897	887.953.413	169.231	TN	502	968.762.601	887.990.796	168.441	D2
75	968.725.250	887.952.047	168.821	TN	503	968.730.572	887.939.296	169.263	D3
76	968.720.017	887.950.678	168.696	TN	503	968.730.572	887.939.296	169.263	D3
77	968.717.802	887.956.773	168.635	TN	503	968.730.572	887.939.296	169.263	D3
78	968.723.288	887.958.243	168.830	TN	503	968.730.572	887.939.296	169.263	D3
79	968.728.237	887.959.395	169.216	TN	504	968.699.412	887.967.767	168.520	D4
80	968.726.535	887.965.158	169.135	TN	505	968.705.045	888.007.273	167.350	D5
81	968.721.521	887.964.223	168.733	TN	505	968.705.045	888.007.273	167.350	D5
82	968.716.313	887.963.057	168.636	TN	505	968.705.045	888.007.273	167.350	D5
83	968.714.922	887.968.927	168.417	TN	506	968.816.377	888.024.267	167.659	D6
84	968.719.943	887.970.426	168.568	TN	506	968.816.377	888.024.267	167.659	D6
85	968.725.070	887.971.652	169.146	TN	511	968.769.898	887.955.978	168.744	CAN
86	968.724.506	887.974.128	168.733	TN	512	968.766.178	887.970.101	168.750	CAN
87	968.721.178	887.973.536	168.594	TN	513	968.741.887	887.963.544	168.741	CAN
88	968.720.409	887.976.048	168.632	TN	514	968.745.660	887.949.490	168.744	CAN
89	968.717.242	887.975.220	168.371	TN	515	968.771.157	887.951.377	168.810	CAR
90	968.714.181	887.974.535	168.069	TN	516	968.768.632	887.960.787	168.728	CAR
91	968.711.507	887.973.740	168.209	TN	517	968.769.216	887.960.929	168.741	CAR
92	968.710.036	887.978.027	167.998	TN	518	968.766.744	887.970.259	168.722	CAR
93	968.712.976	887.979.187	167.955	TN	519	968.766.192	887.970.088	168.717	CAR
94	968.715.972	887.979.965	168.193	TN	520	968.766.070	887.970.658	168.731	CAR
95	968.714.809	887.984.426	167.604	TN	521	968.762.626	887.986.274	168.594	CAR
96	968.711.696	887.983.454	167.872	TN	522	968.761.875	887.986.007	168.586	CAR
97	968.709.070	887.982.938	167.831	PLANTAS	523	968.763.844	887.985.447	168.602	PAR
98	968.709.646	887.981.229	167.967	PLANTAS	524	968.766.889	887.973.942	168.757	PAR
99	968.705.026	887.979.706	167.797	PLANTAS	525	968.766.455	887.974.610	168.720	EXT INCEN
100	968.704.549	887.981.473	167.769	PLANTAS	526	968.770.996	887.975.058	168.847	PAR
101	968.705.405	887.982.858	167.586	TORRE	527	968.771.729	887.972.361	168.823	PAR
102	968.703.950	887.987.303	167.613	TORRE	528	968.771.752	887.971.410	168.756	PAR
103	968.708.555	887.988.758	167.703	TORRE	529	968.775.846	887.956.004	167.805	PAR
104	968.709.936	887.984.187	167.993	TORRE	530	968.774.612	887.956.636	168.680	CAJ
105	968.713.748	887.994.886	168.043	A	531	968.773.874	887.956.455	168.714	CAJ
106	968.713.060	887.996.905	167.621	A	532	968.773.700	887.957.200	168.719	CAJ
107	968.715.004	887.997.987	167.625	A	533	968.771.411	887.956.346	168.690	CAJ E
108	968.716.407	887.995.798	167.875	A	534	968.771.341	887.956.694	168.689	CAJ E
109	968.713.302	888.001.120	167.455	TN	535	968.770.974	887.956.635	168.687	CAJ E
110	968.710.206	888.006.358	167.381	TN	536	968.771.606	887.956.019	168.691	LUM
111	968.707.367	888.011.584	167.232	TN	537	968.770.980	887.955.871	168.690	LUM
112	968.699.657	888.008.119	167.186	TN	538	968.771.146	887.955.225	168.707	LUM
113	968.702.243	888.002.145	167.287	TN	539	968.770.074	887.953.888	168.708	A60
114	968.704.709	887.995.268	167.528	TN	540	968.765.508	887.951.709	168.659	A20
115	968.699.958	887.991.931	167.294	TN	541	968.763.010	887.950.954	168.665	A40
116	968.696.014	887.997.723	167.168	TN	542	968.760.640	887.949.643	168.723	A20
117	968.692.438	888.004.279	167.122	TN	543	968.758.310	887.948.767	168.895	A60
118	968.694.968	888.002.444	167.335	A1m	544	968.754.297	887.946.969	168.861	A40
119	968.687.791	888.002.396	167.011	TN	545	968.758.989	887.950.461	168.944	MON
120	968.689.081	887.995.064	167.006	TN	546	968.758.717	887.951.531	168.946	MON
121	968.690.768	887.988.013	166.857	TN	547	968.757.666	887.951.246	168.948	MON
122	968.692.791	887.981.691	167.257	TN	548	968.742.508	887.945.560	168.111	PAR


123	968.694.741	887.974.947	167.567	TN	549	968.747.759	887.941.567	168.798	CAR
124	968.700.332	887.976.108	167.890	TN	550	968.747.215	887.941.312	168.794	CAR
125	968.702.296	887.970.751	168.094	TN	551	968.741.863	887.963.557	168.738	CAR
126	968.706.373	887.971.046	168.194	TN	552	968.741.118	887.963.952	168.722	CAR
127	968.705.664	887.977.318	167.934	TN	553	968.737.593	887.963.641	168.732	PAR
128	968.698.169	887.984.250	167.432	TN	554	968.744.393	887.948.794	168.933	LUM
129	968.711.808	887.972.142	168.544	AND	555	968.744.918	887.948.929	168.927	LUM
130	968.711.135	887.971.010	168.555	PA	556	968.745.080	887.948.332	168.919	LUM
131	968.703.168	887.968.839	168.435	PA	557	968.744.232	887.944.822	169.133	AND
132	968.702.024	887.969.449	168.402	AND	558	968.738.784	887.965.164	169.491	AND
133	968.701.947	887.969.170	168.312	CJ	559	968.741.589	887.968.652	169.454	PAR
134	968.701.656	887.969.844	168.338	CJ	560	968.744.733	887.969.491	169.388	PAR
135	968.700.957	887.969.601	168.313	CJ	561	968.746.792	887.968.534	169.296	PAR
136	968.701.097	887.968.781	168.300	AND	562	968.752.633	887.970.113	169.197	PAR
137	968.702.745	887.962.695	168.457	AND	563	968.752.262	887.971.497	169.229	PAR
138	968.703.728	887.962.942	168.453	AND	564	968.757.095	887.972.807	169.175	PAR
139	968.707.086	887.950.756	168.737	AND	565	968.758.923	887.972.332	169.140	PAR
140	968.707.761	887.951.897	168.759	PA	566	968.763.837	887.973.650	169.126	PAR
141	968.715.467	887.984.271	167.998	PA	567	968.771.103	887.973.841	168.766	AND
142	968.721.220	887.986.227	168.605	PA	568	968.762.187	887.984.936	168.607	AND
143	968.717.457	887.977.176	168.356	PA	569	968.761.299	887.985.949	168.447	BV
144	968.776.114	887.953.281	168.594	CRR	570	968.775.244	887.989.658	168.271	BV
145	968.776.953	887.950.571	168.588	CRR	571	968.775.721	887.988.633	168.418	PAR
146	968.767.862	887.949.697	169.015	CRR	572	968.772.519	888.000.681	168.406	PAR
147	968.768.549	887.948.387	169.115	ILUM	573	968.772.811	887.998.812	168.416	GARITA
148	968.755.215	887.942.904	168.900	ILUM	574	968.770.462	887.997.977	168.481	GARITA
149	968.754.838	887.944.253	168.868	CRR	575	968.769.995	887.999.692	168.543	GARITA
150	968.742.479	887.938.936	169.335	CRR	576	968.773.287	887.997.411	168.271	BV
151	968.735.931	887.935.827	168.955	CRR	577	968.772.427	887.996.799	168.291	BV
152	968.736.545	887.934.587	168.936	ILUM	578	968.771.848	887.996.818	168.306	BV
153	968.724.193	887.930.343	168.880	CRR	579	968.769.042	887.998.087	168.338	BV
154	968.720.940	887.925.569	169.298	PLACA	580	968.744.484	887.988.931	168.652	BV
155	968.719.746	887.926.677	169.184	PLACA	581	968.748.034	887.986.787	168.612	BV
156	968.717.908	887.926.911	169.232	PLACA	582	968.749.086	887.982.657	168.614	BV
157	968.716.680	887.926.328	169.244	PLACA	583	968.752.720	887.983.404	168.734	LUM
158	968.715.800	887.925.071	169.284	PLACA	584	968.753.001	887.983.489	168.740	LUM
159	968.715.662	887.923.781	169.323	PLACA	585	968.753.078	887.983.196	168.740	LUM
160	968.715.997	887.922.769	169.311	PLACA	586	968.766.335	887.986.765	168.565	LUM
161	968.711.321	887.924.464	168.913	CRR	587	968.766.258	887.987.054	168.563	LUM
162	968.711.023	887.923.654	168.944	CJ	588	968.766.556	887.987.129	168.555	LUM
163	968.711.330	887.923.003	168.871	CJ	589	968.760.926	887.984.547	168.622	LUM
164	968.710.601	887.922.643	168.866	CJ	590	968.755.986	887.983.244	168.719	LUM
165	968.702.250	887.920.164	168.779	CRR	591	968.754.528	887.981.608	168.722	PAR
166	968.705.567	887.919.293	168.845	PLACA	592	968.739.170	887.977.476	168.851	PAR
167	968.703.388	887.919.373	168.797	PLACA	593	968.733.852	887.977.570	169.481	PAR
168	968.701.304	887.918.876	168.758	PLACA	594	968.728.203	887.976.034	168.770	PAR
169	968.699.405	887.917.957	168.717	PLACA	595	968.727.975	887.977.137	168.591	AND
170	968.697.803	887.916.575	168.666	PLACA	596	968.744.681	887.981.780	168.720	AND
171	968.696.574	887.914.843	168.637	PLACA	597	968.742.943	887.988.591	168.704	AND
172	968.695.794	887.912.797	168.590	PLACA	598	968.743.808	887.989.956	168.824	PAR
173	968.692.958	887.915.809	168.455	CRR	599	968.740.206	887.986.012	168.567	PAR
174	968.692.796	887.915.470	168.588	CJ	600	968.728.358	887.982.738	168.556	PAR
175	968.692.026	887.915.165	168.565	CJ	601	968.723.550	887.978.946	168.365	PAR
176	968.692.360	887.914.383	168.561	CJ	602	968.711.130	887.970.997	168.425	PAR
177	968.692.245	887.914.338	168.587	ILUM	603	968.703.183	887.968.823	168.422	PAR
178	968.690.033	887.925.557	168.553	CRR	604	968.702.040	887.969.480	168.389	AND
179	968.686.743	887.936.353	168.287	CRR	605	968.701.996	887.969.512	168.389	AND
180	968.686.419	887.936.156	168.331	CJ	606	968.711.852	887.972.153	168.541	AND
181	968.686.258	887.936.928	168.334	CJ	607	968.711.835	887.972.135	168.547	AND
182	968.685.430	887.936.753	168.314	CJ	608	968.717.886	887.975.809	168.495	AND
183	968.685.391	887.936.557	168.214	ILUM	609	968.720.895	887.976.738	168.581	AND
184	968.683.942	887.945.925	168.037	CRR	610	968.721.576	887.974.290	168.552	AND

185	968.683.114	887.941.089	167.686	PLACA	611	968.727.997	887.976.005	168.556	AND
186	968.682.937	887.943.890	167.619	PLACA	612	968.727.820	887.977.179	168.597	AND
187	968.682.608	887.946.484	167.552	PLACA	613	968.728.495	887.980.238	168.565	AND
188	968.681.988	887.949.257	167.546	PLACA	614	968.728.350	887.981.003	168.538	AND
189	968.681.224	887.951.832	167.521	PLACA	615	968.733.483	887.982.418	168.599	AND
190	968.680.359	887.954.386	167.492	PLACA	616	968.733.676	887.981.720	168.579	AND
191	968.679.191	887.957.029	167.449	PLACA	617	968.739.185	887.983.199	168.571	AND
192	968.677.959	887.959.352	167.443	PLACA	618	968.739.758	887.980.459	168.575	AND
193	968.676.554	887.961.634	167.369	PLACA	619	968.741.420	887.985.292	168.562	AND
194	968.680.180	887.959.023	167.580	CRR	620	968.727.692	887.981.549	168.519	AND
195	968.677.612	887.967.781	167.565	CRR	621	968.727.112	887.979.490	168.595	CAJ
196	968.678.155	887.964.506	167.588	CJ	622	968.727.396	887.978.469	168.598	CAJ
197	968.677.871	887.965.282	167.572	CJ	623	968.728.460	887.978.793	168.596	CAJ
198	968.677.127	887.965.039	167.574	CJ	624	968.730.731	887.980.116	168.591	CAJ
199	968.677.166	887.964.621	167.518	ILUM	625	968.730.727	887.980.115	168.591	CAJ
200	968.674.777	887.974.699	167.517	CRR	626	968.730.402	887.981.260	168.599	CAJ
201	968.672.410	887.980.466	167.453	CRR	627	968.731.575	887.981.611	168.601	CAJ
202	968.670.669	887.982.012	167.380	CJ	628	968.734.539	887.980.499	168.578	CAJ
203	968.669.877	887.981.698	167.391	CJ	629	968.734.292	887.981.487	168.578	CAJ
204	968.669.521	887.982.461	167.401	CJ	630	968.735.266	887.981.753	168.574	CAJ
205	968.669.913	887.982.749	167.359	ILUM	631	968.735.262	887.977.937	169.501	AND
206	968.669.940	887.986.456	167.320	CRR	632	968.727.971	887.977.124	168.755	RAM
207	968.669.594	887.990.972	167.170	CRR	633	968.728.199	887.976.064	168.777	RAM
208	968.669.185	887.996.465	166.906	CRR	634	968.733.555	887.978.696	169.306	RAM
209	968.667.860	887.997.504	166.805	ILUM	635	968.734.980	887.978.988	169.320	RAM
210	968.668.065	887.997.946	166.740	CJ	636	968.735.278	887.977.969	169.318	RAM
211	968.667.754	887.998.728	166.712	CJ	637	968.733.798	887.977.607	169.319	RAM
212	968.666.989	887.998.392	166.734	CJ	638	968.738.546	887.980.078	168.758	RAM
213	968.667.296	887.997.668	166.764	CJ	639	968.738.899	887.978.815	168.773	RAM
214	968.667.791	887.998.820	166.718	AND	640	968.735.112	887.943.472	169.365	PAR
215	968.672.743	888.001.252	166.665	AND	641	968.734.200	887.946.747	169.421	PAR
216	968.672.746	888.001.226	166.669	CRR	642	968.733.291	887.946.502	169.400	PAR
217	968.673.892	887.998.682	166.804	CRR	643	968.732.368	887.949.863	169.406	PAR
218	968.672.809	888.001.193	166.674	CRR	644	968.732.594	887.952.588	169.390	PAR
219	968.682.795	888.005.960	166.685	AND	645	968.731.622	887.956.252	169.373	PAR
220	968.684.114	888.003.531	166.799	CRR	646	968.730.704	887.955.998	169.378	PAR
221	968.691.738	888.007.173	166.780	CRR	647	968.729.779	887.959.361	169.356	PAR
222	968.691.301	888.008.600	166.678	ILUM	648	968.729.578	887.963.695	169.394	PAR
223	968.691.454	888.009.191	166.621	CJ	649	968.729.030	887.965.767	169.384	PAR
224	968.691.153	888.009.874	166.621	CJ	650	968.728.111	887.965.537	169.388	PAR
225	968.690.353	888.009.512	166.650	CJ	651	968.727.176	887.968.898	169.372	PAR
226	968.703.650	888.012.825	166.793	CRR	652	968.717.485	887.977.254	168.638	PAR
227	968.713.502	888.020.470	166.611	CRR	653	968.715.719	887.954.137	168.809	PAR
228	968.714.551	888.017.992	166.809	CRR	654	968.716.851	887.953.524	168.813	AND
229	968.714.334	888.019.650	166.685	ILUM	655	968.707.770	887.951.947	168.847	PAR
230	968.725.093	888.026.041	166.593	AND	656	968.707.117	887.950.785	168.847	AND
231	968.726.528	888.023.695	166.792	CRR	657	968.715.509	887.984.272	168.257	PAR
232	968.738.234	888.029.286	166.821	CRR	658	968.721.625	887.985.972	168.214	PAR
233	968.737.670	888.030.557	166.649	ILUM	659	968.726.947	887.987.815	168.608	PAR
234	968.737.169	888.030.870	166.619	CJ	660	968.738.831	887.991.077	168.637	PAR
235	968.737.892	888.031.200	166.622	CJ	661	968.741.901	887.995.048	168.847	PAR
236	968.737.598	888.031.936	166.581	CJ	662	968.740.759	887.994.634	168.849	AND
237	968.748.591	888.037.198	166.561	AND	663	968.739.483	887.992.312	168.614	AND
238	968.749.700	888.034.761	166.785	CRR	664	968.725.761	887.988.537	168.587	AND
239	968.761.548	888.040.361	166.789	CRR	665	968.771.063	888.005.889	168.418	PAR
240	968.760.930	888.041.619	166.620	ILUM	666	968.737.663	888.028.807	167.053	CERR
241	968.761.156	888.042.197	166.580	CJ	667	968.669.395	887.996.384	166.766	CERR
242	968.760.785	888.042.959	166.550	CJ	668	968.670.129	887.986.580	166.789	CERR
243	968.760.019	888.042.606	166.520	CJ	669	968.677.798	887.967.842	167.384	CERR
244	968.768.576	888.046.682	166.546	AND	670	968.682.407	887.952.019	167.855	CERR
245	968.769.386	888.044.098	166.713	CRR	671	968.693.290	887.916.171	168.693	CERR
246	968.768.177	888.043.228	166.929	CR	672	968.769.375	888.043.763	166.801	CERR

247	968.769.439	888.043.702	166.782	BR	673	968.768.514	888.041.710	167.135	CER
248	968.769.687	888.043.772	166.603	BR	674	968.773.363	888.024.139	167.340	BROCH
249	968.773.226	888.031.760	166.825	BR	675	968.774.959	888.018.084	167.387	BROCH
250	968.773.041	888.031.723	167.021	BR	676	968.778.378	888.003.287	168.224	CER
251	968.771.388	888.031.216	167.353	CR	677	968.779.440	888.003.217	168.088	BAHIA
252	968.773.344	888.024.066	167.339	BRO	678	968.772.671	888.000.720	168.407	BAHIA
253	968.774.848	888.024.160	167.150	BR	679	968.783.317	887.986.463	167.953	BAHIA
254	968.775.042	888.024.225	167.021	BR	680	968.784.927	887.981.193	168.047	BAHIA
255	968.776.510	888.018.166	167.123	BR	680	968.784.927	887.981.194	167.797	BAHIA
256	968.776.287	888.018.062	167.296	BR	681	968.782.423	887.981.226	168.008	BAHIA
257	968.774.920	888.018.147	167.404	BRO	682	968.780.660	887.982.085	168.090	BAHIA
258	968.777.425	888.008.217	167.877	CR	683	968.778.738	887.984.745	168.273	BAHIA
259	968.777.427	888.008.205	167.851	BR	684	968.777.609	887.989.098	168.332	BAHIA
260	968.778.545	888.008.446	167.541	BR	685	968.776.575	887.989.950	168.393	BAHIA
261	968.778.750	888.008.490	167.355	BR	686	968.778.080	887.979.644	168.356	PAR
262	968.779.912	888.003.550	167.487	BR	687	968.778.815	887.979.823	168.365	PAR
263	968.779.721	888.003.530	167.689	BR	688	968.779.492	887.977.306	168.836	PAR
264	968.779.523	888.003.504	168.097	BR	689	968.779.668	887.973.480	168.839	PORTER
265	968.779.408	888.003.225	168.037	BR	690	968.783.777	887.958.081	168.637	PAR
266	968.778.335	888.003.350	168.187	CR	691	968.784.019	887.957.350	168.601	CERR
267	968.772.616	888.000.728	168.445	BR	692	968.790.500	887.960.453	168.378	CERR
268	968.772.526	888.000.892	168.352	BR	693	968.789.298	887.961.215	168.444	A60
269	968.771.204	888.005.694	168.398	BR	694	968.784.308	887.991.772	168.031	A100
270	968.771.161	888.005.886	168.396	BR	695	968.772.813	888.059.931	166.075	BV
271	968.772.518	888.006.558	168.209	CONTADOR	696	968.777.921	888.042.149	166.420	BV
272	968.784.053	887.957.076	168.567	CRR	697	968.782.377	888.026.710	166.728	BV
273	968.790.740	887.960.194	168.434	CRR	698	968.787.268	888.009.710	167.062	BV
274	968.790.887	887.959.406	168.386	PT	699	968.792.956	887.989.917	167.434	BV
275	968.772.108	888.008.713	168.085	CJ	700	968.796.498	887.977.701	167.573	BV
276	968.771.559	888.010.708	168.010	CJ	701	968.798.802	887.969.552	167.773	BV
277	968.770.444	888.010.342	168.092	CJ	702	968.797.588	887.962.835	168.100	BV
278	968.770.942	888.008.530	168.137	CJ	703	968.793.591	887.952.749	168.267	BV
279	968.773.387	888.011.293	167.726	TN	1002	968.661.089	887.994.207	169.000	BASE2
280	968.771.725	888.016.228	167.434	TN	1003	968.661.254	887.994.539	166.816	B2

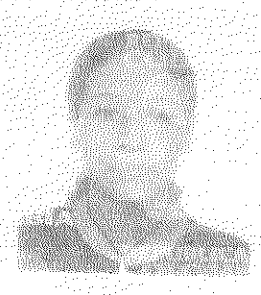REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 41952332
VILLARREAL GONZALEZ
APELLIDOS
RUBY JOHANNA
NOMBRES
Ruby Johanna Villarreal G
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1982
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-ABR-2000 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN DIEGUE ESCOBAR

INDICE DERECHO



A-2500100-98082771-F-0041952332-20000901 13112 00200A 02 078847200

República de Colombia

Nombre: RUBY JOHANNA VILLARREAL GONZALEZ


Cedula: 41.962.332

Licencia Profesional No.: **01-12479**

Resolución: 02-2480 - 01/09/2009

* Experiencia o fecha de grado: 09/09/2005

TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA
SENA - ARMENIA



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolucion Motivada y el Certificado de Vigencia

la documentacion integral acredita al titular para ejercer la profesion de TOPOGRAFO en la Republica de Colombia de acuerdo a la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

* La experiencia se contara a partir de la fecha de grado para los efectos de posesión de cargos públicos únicamente.

CARLOS MARIO LOPERA GIRALDO
PRESIDENTE

ELIANA MARIA AVILA JIMENEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

Para cualquier informacion comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia Email:info@cpnt.org.calle 33 No 7-27 Of 502 Tel 2881490

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CONFIERE A

RUBY JOHANNA VILLAREAL GONZALEZ

CC.41.952.332

EL TITULO DE

TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA

OLGA LUCIA QUINTERO OCAMPO
SUBDIRECTOR DE CENTRO

Armenia, 9 de Septiembre de 2005
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

2559050

CENTRO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO
DE LA CONSTRUCCION PARA EL EJE CAFETERO
CENTRO DE FORMACION

SGC2005DE00031 09/09/2005
No Y FECHA DE REGISTRO

121
