Oscar Javier Godoy

Ricaurte, Cundinamarca, 03 de julio de 2026

Doctor

CAMPO ELÍAS PRADA ORTIZ
Alcalde Municipal
Municipio de Ricaurte – Cundinamarca

Ingeniera

ELIANA ANDREA CARVAJAL RICO
Directora de Servicios Públicos – Supervisora del Contrato de Consultoría No. 311-2025

Asunto: Entrega del Informe Final de Interventoría – Contrato de Consultoría No. 311-2025 (Proceso SECOP II: CMA 003-2025)

Respetados:

En mi calidad de contratista e interventor del Contrato de Consultoría No. 311-2025, cuyo objeto correspondió a la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera del Convenio de Asociación No. 297-2025 – Gasificación Domiciliaria de las veredas Callejón, Casablanca y El Portal, municipio de Ricaurte, Cundinamarca, me permito hacer entrega formal del Informe Final de Interventoría correspondiente al período de ejecución comprendido entre el 20 de agosto de 2025 y el 28 de marzo de 2026, fecha de terminación del contrato con las prórrogas No. 001 y No. 002 debidamente suscritas.

El presente informe recoge de manera integral el seguimiento técnico, administrativo y financiero adelantado durante todo el período de ejecución del convenio supervisado, destacándose los siguientes resultados:

- Ejecución de 497 de las 500 conexiones domiciliarias programadas (99,4% de cumplimiento), en los estratos 1 y 2 de las veredas Callejón, Casablanca y El Portal.
- Ejecución total de la infraestructura de distribución de redes: 27,167 km de tubería de polietileno instalada, probada y certificada conforme a las normas NTC 3728, CREG 067/95 y el Manual de Construcción de AVANGAS S.A.S. E.S.P.
- Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad de materiales, seguridad industrial y manejo ambiental durante todo el período de ejecución, sin accidentes laborales ni observaciones técnicas que afectaran la calidad de los trabajos.
- Verificación del flujo de fondos aportados por el Municipio de Ricaurte, con una ejecución del 99,4% sobre el presupuesto asignado ($1.229.755.806 de $1.237.199.000 programados).
- Las 3 conexiones no ejecutadas corresponden a predios con restricciones de acceso o situaciones jurídicas en trámite, ajenas a la voluntad del contratista, y no constituyen incumplimiento contractual.

Oscar Javier Godoy

El informe incorpora, así mismo, los resultados de los ensayos de resistencia del concreto empleado en la reposición de andenes, realizados por el laboratorio CONSTRUCSUELOS Y.A., cuyos resultados de rotura a 28 días fueron recibidos con posterioridad a la fecha de terminación del convenio por el tiempo de curado exigido por la norma, y se incorporan como soporte técnico complementario para el proceso de liquidación.

Se anexan al presente informe los soportes documentales correspondientes: registro fotográfico de las obras por sectores, certificaciones de calidad y cumplimiento, bitácoras de actividades diarias, listado de usuarios conectados y contratos de prestación del servicio suscritos (497), planos récord de la infraestructura de redes construida, y los reportes de ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con la recomendación consignada en el numeral 11 del presente informe, se solicita respetuosamente adelantar la liquidación del Convenio de Asociación No. 297-2025 dentro de los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional que se estime pertinente frente al contenido del presente informe.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
Ingeniero Civil – Matrícula Profesional 252020 89432 CND
Interventor – Contrato de Consultoría No. 311-2025
Proceso SECOP II: CMA 003-2025
Anexos: Informe Final de Interventoría y soportes documentales (Anexos No. 1 al 7, según se relacionan en el numeral 12 del informe).

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE

CUNDINAMARCA

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 311-2025

Proceso SECOP II: CMA 003-2025

CAMPO	INFORMACIÓN
Contratista	Oscar Javier Godoy Bautista – C.C. 79.049.924 de Bogotá D.C.
Objeto	SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Valor del Contrato	$174.952.970 M/CTE (incluido IVA)
Fecha de Inicio	20 de agosto de 2025
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Prórroga No. 001	2 meses – Hasta el 28 de febrero de 2026
Prórroga No. 002	1 mes – Hasta el 28 de marzo de 2026
Fecha de Terminación (con prórrogas)	28 de marzo de 2026

Fecha del presente Acta	28de marzo de 2026
Supervisora	Ing. Eliana Andrea Carvajal Rico – Directora de Servicios Públicos
Meta ejecutada	**497 instalaciones domiciliarias de 500 programadas (99,4%)**

1. PRESENTACIÓN

El presente documento constituye el Informe Final de Interventoría correspondiente al Contrato de Consultoría No. 311-2025, suscrito entre el Municipio de Ricaurte – Cundinamarca y el señor Oscar Javier Godoy Bautista, identificado con C.C. No. 79.049.924 de Bogotá D.C., en calidad de interventor.

El informe recoge el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado durante todo el período de ejecución comprendido entre el 20 de agosto de 2025 y el 28 de marzo de 2026, en cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Consultoría No. 311-2025, cuyo objeto fue la interventoría al Convenio de Asociación No. 297-2025 celebrado entre el Municipio de Ricaurte y la empresa AVANGAS S.A.S. E.S.P.

Las actividades de interventoría abarcaron visitas técnicas periódicas a los frentes de trabajo, revisión de informes de avance, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas, control documental, seguimiento al plan de trabajo de socialización, control de calidad y seguridad industrial, y verificación del avance físico-financiero del convenio supervisado.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ASPECTO	DETALLE
Tipo de contrato	Contrato de Consultoría
No. de contrato	311-2025
Proceso SECOP II	CMA 003-2025
Entidad contratante	Municipio de Ricaurte – Cundinamarca (NIT: 890.680.059-1)
Secretaría ejecutora	Dirección de Servicios Públicos
Contratista	Oscar Javier Godoy Bautista – C.C. 79.049.924 de Bogotá D.C. – Ing. Civil Mat. 252020 89432 CND
Representante del Municipio	Ronald Felipe Salazar Abril – Alcalde – C.C. 11.229.026
Valor del contrato	$174.952.970 M/CTE (incluido IVA)
Forma de pago	Actas parciales previa aprobación del supervisor y acreditación de aportes parafiscales
CDP	No. 2025001008 del 7 de julio de 2025
Fecha de legalización	13 de agosto de 2025
Fecha de inicio	20 de agosto de 2025
Terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Prórroga No. 001	2 meses – nueva fecha: 28 de febrero de 2026
Prórroga No. 002	1 mes – nueva fecha: 28 de marzo de 2026
Fecha terminación definitiva	28 de marzo de 2026
Plazo total ejecutado	7 meses y 11 días (20 agosto 2025 – 28 marzo 2026)

3. OBJETO DEL CONVENIO SUPERVISADO

La interventoría tuvo como objeto principal supervisar el Convenio de Asociación No. 287-2025 suscrito entre el Municipio de Ricaurte y AVANGAS S.A.S. E.S.P., cuyo propósito fue: **SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

El valor total del proyecto asciende a $2.496.058.528 M/CTE, con la siguiente estructura de financiación:

APORTANTE	VALOR (M/CTE)	CONCEPTO
Municipio de Ricaurte	$1.237.199.000	Subsidio derecho de conexión e instalación interna Estrato 1 y 2
AVANGAS S.A.S. E.S.P.	$1.258.859.528	Infraestructura de distribución, equipos normativos y financiación red interna (10% a 60 meses TMR 2%)
TOTAL	**$2.496.058.528**	

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Ricaurte se encuentra ubicado en la Región del Alto Magdalena, al sur del Departamento de Cundinamarca, en la Provincia del Alto Magdalena. Limita al norte con el municipio de Nilo, al oriente con Tocaima, al sur con Girardot y al occidente con el río Magdalena.

Su cabecera municipal se sitúa a una altitud aproximada de 284 m.s.n.m., con temperatura promedio anual de 28 °C, a 148 km de Bogotá D.C. y a 4 km de Girardot. El municipio tiene

una extensión total de 128 km² y una población estimada de 14.000 habitantes (proyección DANE 2025).

Las veredas intervenidas fueron:

- Vereda Callejón
- Vereda Casablanca
- Vereda El Portal

5. AVANCE FÍSICO ACUMULADO – PERÍODO AGOSTO 2025 / MARZO 2026

5.1 Infraestructura de Distribución de Redes

Durante el período de ejecución, la interventoría realizó seguimiento permanente a la construcción de la infraestructura de distribución de gas a cargo de AVANGAS S.A.S. E.S.P. El cuadro siguiente resume el avance final verificado en campo:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Total	Valor Total ($)	Avance Final	% Avance	Valor Ejecutado ($)
1	Tubería PEAD ¾" Zona Verde (TPE3/4ZV)	mts	12167	$361.293.420	12.167 mts	100%	$361.293.420
2	Tubería PEAD 1" Zona Verde (TPE1ZV)	mts	5000	$169.127.470	5.000 mts	100%	$169.127.470
3	Tubería PEAD 2" Zona Verde (TPE2ZV)	mts	10000	$515.681.731	10.000 mts	100%	$515.681.731
4	Cruce Paso Especial 60m	GLO	60	$78.000.000	60 unidades	100%	$78.000.000
TOTAL	**27.167 km de redes instaladas**		**27167**	**$1.124.102.621**	**27.167 mts**	**100%**	**$1.124.102.621**

5.2 Conexiones Domiciliarias

El proyecto contemplaba la ejecución de 500 conexiones domiciliarias distribuidas en los estratos 1 y 2 de las veredas Callejón, Casablanca y El Portal. A continuación, se presenta el resumen del avance final certificado por la interventoría:

DESCRIPCIÓN	META TOTAL	EJECUTADO	% EJECUTADO	NO EJECUTADO
Conexiones Domiciliarias (Estrato 1 y 2)	500	**497**	**99,4%**	3
Usuarios con contrato firmado	500	497	99,4%	3
Centros de medición instalados y certificados	500	**497**	**99,4%**	3
Usuarios con servicio en operación	500	**497**	**99,4%**	3

Las 3 conexiones no ejecutadas corresponden a predios con restricciones de acceso o situaciones jurídicas en trámite, documentadas en los registros de la interventoría. El interventor certificó que estas situaciones son ajenas a la voluntad del contratista y no constituyen incumplimiento contractual.

5.3 Cronograma de Ejecución de Conexiones

VEREDA / MES	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-Feb-Mar 26	TOTAL
Programado (conexiones)	100	100	100	100	100	—	**500**
Ejecutado (conexiones)	0	66	142	180	79	30	497

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO

6.1 Especificaciones Técnicas Verificadas

La interventoría verificó durante toda la ejecución el cumplimiento de las siguientes normas técnicas y documentos contractuales:

- NTC 2505 (4.ª actualización) – Instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales.
- NTC 3728 – Construcción de redes de distribución de gas combustible.
- NTC 3853 – Seguridad en instalación de redes de gas natural.
- Resolución CREG 067 de 1995 – Reglamento Único de Distribución de Gas Combustible (RUDG).
- Manual de Construcción de Redes y Acometidas de AVANGAS S.A.S. E.S.P.
- Manual de Construcción de Acometidas, Centros de Medición e Instalaciones Internas de AVANGAS S.A.S. E.S.P.

6.2 Materiales Empleados

La interventoría certificó que los materiales utilizados cumplen con los estándares de calidad exigidos:

- Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) fabricada por EXTRUCOL S.A., con certificación ISO e ICONTEC NTC 1746.
- Tubería multicapa PE/AL/PE para instalaciones internas, conforme a NTC 2505.
- Racores de latón bronce libres de corrosión galvánica, con sellado correcto y sin evidencia de filtraciones.
- Centros de medición y regulación instalados en zonas ventiladas y accesibles, conforme a NTC 3728.

6.3 Calidad de la Obra

Durante toda la ejecución no se presentaron observaciones técnicas que afectaran la calidad o trazabilidad de los trabajos. La interventoría emitió las certificaciones de calidad correspondientes a cada acta parcial verificada. Las compactaciones, profundidades de zanja y señalización temporal cumplieron en todo momento con los lineamientos del RUDG y la Resolución CREG 067 de 1995.

6.4 Ensayos de Resistencia del Concreto – Reposición de Andenes

Dentro del alcance contratado, la interventoría adelantó el control de calidad del concreto empleado en la reposición de los andenes intervenidos durante la instalación de la red de

distribución. Para el efecto, a través del laboratorio CONSTRUCSUELOS Y.A. se realizaron seis (6) tomas de muestras con ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto de 6", a edades de 7, 14 y 28 días, de conformidad con la norma INV E-410-13, frente a una resistencia de diseño de 210 kg/cm² (3.000 PSI). El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos a los 28 días:

Muestra	Fecha de Toma	Fecha de Rotura (28 días)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (PSI)	% Resistencia de Diseño
1	03/03/2026	31/03/2026	212,0	3.029	101,0%
2	05/03/2026	02/04/2026	222,8	3.183	106,1%
3	07/03/2026	04/04/2026	214,4	3.063	102,1%
4	09/03/2026	06/04/2026	214,3	3.061	102,0%
5	11/03/2026	08/04/2026	210,9	3.012	100,4%
6	13/03/2026	10/04/2026	215,5	3.079	102,6%

La totalidad de las muestras alcanzó a los 28 días resistencias entre 210,9 y 222,8 kg/cm² (entre el 100,4% y el 106,1% de la resistencia de diseño), cumpliendo el mínimo del 100% exigido y garantizando la durabilidad y estabilidad de los andenes repuestos, los cuales fueron entregados en condiciones iguales o superiores a las existentes antes de la intervención.

Los reportes de laboratorio correspondientes reposan en el expediente de la interventoría y hacen parte de los soportes del presente informe. Se precisa que los resultados de rotura a 28 días fueron recibidos con posterioridad a la fecha de terminación del convenio, dado el tiempo de curado exigido por la norma, por lo cual se incorporan como soporte técnico complementario y serán tenidos en cuenta dentro del proceso de liquidación del Convenio de Asociación No. 297-2025, actualmente pendiente de trámite.

6.5 Personal Vinculado a la Interventoría

Para el desarrollo del Contrato de Consultoría No. 311-2025, la interventoría contó con el siguiente personal, el cual acreditó la idoneidad, formación profesional y experiencia exigidas en los documentos del proceso:

CARGO	NOMBRE	PROFESIÓN – MATRÍCULA	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Oscar Javier Godoy Bautista	Ingeniero Civil – Mat. 252020 89432 CND	10%
Residente de Interventoría	Gonzalo Adolfo Figueredo Camacho	Ingeniero Civil – Mat. 25202168568 CND	100%
Profesional SST	Aida Lucía López Jiménez	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo – C.C. 39.575.576	40%
Técnico Inspector	Fredy Avelino Coy Castañeda	Técnico instalador de gas combustible – Certificación ITICCOL TUVCPi3894	100%

Durante todo el período de ejecución, el interventor acreditó la afiliación y el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, como requisito para el trámite de cada acta parcial de pago, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

7.1 Personal Vinculado al Proyecto

La interventoría verificó en todo el período que el personal vinculado al proyecto por parte de AVANGAS S.A.S. E.S.P. cumplió con los requisitos de ley: salario igual o superior al mínimo legal vigente, afiliación y pago oportuno al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales), pago de parafiscales y prestaciones sociales.

No se presentaron accidentes laborales durante el período de ejecución del convenio.

7.2 Socialización y Manejo de Comunidades

AVANGAS S.A.S. E.S.P. cumplió con el Plan de Trabajo de Socialización del Proyecto, realizando las jornadas con la comunidad de las veredas Callejón, Casablanca y El Portal. No se registraron inconformidades por parte de la comunidad durante la ejecución de la obra. La totalidad del personal no calificado fue vinculado de la mano de obra local del municipio de Ricaurte.

7.3 Comités Técnicos

Se realizaron comités técnicos con el Conveniente y el Supervisor de la Dirección de Servicios Públicos, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría. Las actas correspondientes reposan en el archivo del proyecto.

7.4 Documentación de la Interventoría

La interventoría produjo y radicó oportunamente los siguientes documentos durante el período de ejecución:

- Informes de avance (agosto 2025 – marzo 2026).
- Acta de inicio del contrato de interventoría (20 de agosto de 2025).
- Actas de comité técnico.
- Certificaciones de calidad y cumplimiento de actas parciales.
- Registros fotográficos por sectores (inicio y terminación de obras).
- Bitácoras de actividades diarias en medio impreso.
- Trámite de prórrogas No. 001 y No. 002.
- Presente Informe Final.

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO

8.1 Flujo de Fondos – Aportes del Municipio

Los recursos aportados por el Municipio de Ricaurte en el marco del Convenio de Asociación No. 297-2025 se destinaron exclusivamente al subsidio del derecho de conexión e instalación interna de los usuarios beneficiarios de los estratos 1 y 2. La interventoría verificó la correcta inversión de los recursos conforme al flujo de fondos aprobado.

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Subsidio Derecho de Conexión (Estrato 1)	$930.155 × 500 = $465.077.500	$930.155 × 497 = $462.287.035	99,4%
Subsidio Red Interna (Estrato 1 – 90%)	$1.544.243 × 500 = $772.121.500	$1.544.243 × 497 = $767.468.771	99,4%
TOTAL, MUNICIPIO	**$1.237.199.000**	**$1.229.755.806**	**99,4%**

Nota: El saldo no ejecutado ($7.423.194) corresponde a las 3 instalaciones por causas ajenas al contratista y estará sujeto a lo que defina la liquidación del convenio.

8.2 Aporte AVANGAS S.A.S. E.S.P.

La interventoría verificó que AVANGAS S.A.S. E.S.P. ejecutó la totalidad de la infraestructura de distribución de redes (27,167 km) y la cofinanciación del 10% de la red interna de los usuarios, conforme a los compromisos del convenio. El valor ejecutado por AVANGAS en el componente de redes asciende a $1.124.102.621 M/CTE.

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL

Durante todo el período de ejecución, la interventoría verificó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas de seguridad industrial aplicables. No se registraron accidentes de trabajo. El personal contó con la dotación básica de protección personal requerida para cada actividad. Las áreas de intervención se mantuvieron libres de residuos y escombros conforme a la normativa ambiental vigente.

10. CONCLUSIONES

Con base en el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado durante todo el período de ejecución del Convenio de Asociación No. 297-2025, la interventoría presenta las siguientes conclusiones:

- Se ejecutaron 497 conexiones domiciliarias programadas (99,4% de cumplimiento), cubriendo los estratos 1 y 2 de las veredas Callejón, Casablanca y El Portal del Municipio de Ricaurte – Cundinamarca.
- Las 3 conexiones pendientes corresponden a predios con restricciones de acceso o situaciones jurídicas en trámite, documentadas debidamente en el expediente, y no constituyen incumplimiento del contratista.
- Se formalizaron 497 contratos de prestación del servicio entre los usuarios beneficiarios y AVANGAS S.A.S. E.S.P. (99,4% de la meta), lo cual constituye la base contractual para la liquidación del proyecto.
- La infraestructura de distribución de redes fue ejecutada en su totalidad: 27,167 km de tubería de polietileno instalada, probada y certificada conforme a las normas NTC 3728, CREG 067/95 y el Manual de Construcción de AVANGAS.
- Los materiales empleados en las instalaciones internas (tubería multicapa PE/AL/PE, racores de latón bronce) cumplen con las exigencias de la NTC 2505 (4.ª actualización) y cuentan con fichas técnicas y certificados de conformidad.
- El concreto empleado en la reposición de los andenes intervenidos cumplió con la resistencia de diseño de 210 kg/cm² (3.000 PSI): las seis (6) muestras ensayadas por el laboratorio CONSTRUCSUELOS Y.A. alcanzaron a los 28 días resistencias entre el 100,4% y el 106,1% de la especificada, conforme a la norma INV E-410-13.
- No se presentaron accidentes laborales durante el período de ejecución. El plan de manejo ambiental fue aplicado satisfactoriamente.
- Los recursos del Municipio de Ricaurte destinados al subsidio de conexión e instalación interna fueron ejecutados de manera transparente y eficiente, con una ejecución del 99,4% sobre el presupuesto asignado.
- El proyecto alcanzó su objetivo misional: garantizar el acceso al servicio público domiciliario de gas combustible a los hogares de menores ingresos de la zona rural de Ricaurte, contribuyendo al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

11. RECOMENDACIONES

- Adelantar la liquidación del Convenio de Asociación No. 297-2025 dentro de los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
- Mantener actualizado el sistema de información de usuarios en la plataforma SECOP II y en los archivos de la Dirección de Servicios Públicos.
- Verificar el funcionamiento óptimo de las instalaciones durante el primer año de prestación del servicio, con énfasis en el desempeño de los centros de medición y las instalaciones internas.

12. ANEXOS

Hacen parte integral del presente Informe Final de Interventoría los siguientes documentos, los cuales reposan en el expediente del contrato y en la plataforma SECOP II:

- Anexo No. 1 – Registro fotográfico de las obras por sectores (inicio y terminación).
- Anexo No. 2 – Certificaciones de calidad y cumplimiento
- Anexo No. 3 – Bitácoras de actividades diarias.
- Anexo No. 4 – Acta de inicio del contrato y prórrogas No. 001 y No. 002.
- Anexo No. 5 – Listado de usuarios conectados y contratos de prestación del servicio suscritos (497).
- Anexo No. 6 – Planos récord de la infraestructura de distribución de redes construida.
- Anexo No. 7 – Reportes de ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto – Laboratorio CONSTRUCSUELOS Y.A. (reposición de andenes).

13. FIRMA DEL INTERVENTOR

OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
Ingeniero Civil – Matrícula Profesional 252020 89432 CND
INTERVENTOR – Contrato de Consultoría No. 311-2025
Proceso SECOP II: CMA 003-2025
Ricaurte – Cundinamarca, 28 de marzo de 2026

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



ANEXOS

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



CERTIFICADO REPORTE ACCIDENTALIDAD

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

Oscar Javier Godoy

CERTIFICA:

El suscrito **OSCAR** JAVIER GODOY **BAUTISTA**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 79.049.924 de Bogotá D.C., actuando como Interventor Técnico, Administrativo y Financiero en el marco del Contrato de Consultoría No. 311-2025, cuyo objeto es la "SINFRA-SP-016 **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** PARA **EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS** CALLEJÓN, **CASABLANCA Y EL PORTAL DEL** MUNICIPIO **DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."**,

CERTIFICO que durante todo el período de ejecución del Convenio de Asociación No. 297-2025, comprendido entre el **20 de agosto de 2025** y el **28 de marzo de 2026**, no se presentaron accidentes laborales en ninguno de los frentes de trabajo de las veredas Callejón, Casablanca y El Portal del Municipio de Ricaurte.

Certifico igualmente que **AVANGAS S.A.S. E.S.P.** dio cumplimiento a la totalidad de las normas legales y técnicas vigentes en materia de seguridad industrial, prevención y control de accidentes de trabajo, incluyendo las disposiciones del artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 122 y 133 de la Ley 9 de 1979, y los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, verificados por el suscrito interventor en cada visita técnica realizada a los frentes de obra.

La presente certificación se expide con ocasión del proceso de liquidación del convenio.

Dado en Ricaurte – Cundinamarca, a los **28 días del** mes de marzo **de 2026**.

OSCAR JAVIER GODOY
Director de Interventoría
Cedula N° 79.049.924.
Ingeniero Civil
MTP-25202 089432-CND

749

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

Oscar Javier Godoy

FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Objeto: *"SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.."*

Convenio: No. 297 de 2025

Periodo de seguimiento: 20 de Agosto de 2025 a Corte al 30 de marzo de 2026

Responsable: Interventoría Técnica – Ing. Óscar Javier Godoy Bautista

Entidad Supervisora: Dirección de Servicios Públicos – Municipio de Ricaurte

Aspecto / Actividad	Impacto Potencial	Medida de Manejo Ambiental	Evidencia Verificada	Cumplimiento	Observaciones
Excavación y apertura de zanja	Generación de material sobrante y polvo	Reutilización y disposición controlada de material; humectación del área	Registro fotográfico y reporte diario de obra	☑ Cumple	Se realizaron labores de limpieza y retiro de excedentes.
Instalación de tubería PEAD	Riesgo de contaminación por residuos plásticos	Recolección selectiva.	Evidencia fotográfica	☑ Cumple	No se evidencian residuos abandonados.
Transporte de materiales	Emisión de polvo y ruido	Control de velocidad y rutas establecidas	Reporte de transporte y actas de vecindad	☑ Cumple	Cumplimiento dentro de límites permitidos.

Manejo de residuos sólidos	Acumulación de residuos en obra	Clasificación, almacenamiento temporal y disposición final	Empresa recolectora	☑ Cumple	Se recomienda reforzar el control diario de almacenamiento.
Seguridad industrial y señalización	Riesgo para peatones y operarios	Instalación de señalización y EPP completos	Inspección visual y lista de chequeo	☑ Cumple	Personal cuenta con EPP conforme a norma.
Comunicación con comunidad	Posibles molestias o quejas	Socialización de obras y atención a inquietudes	Acta de socialización y registro de PQRS	☑ Cumple	No se reportan afectaciones ni quejas.

Durante el periodo de análisis, la interventoría verificó que las **actividades constructivas cumplen con las medidas establecidas**, garantizando el manejo adecuado de residuos, control de emisiones y condiciones de seguridad en los frentes de obra.

Se recomienda fortalecer el control en el almacenamiento temporal de residuos sólidos no aprovechables.

OSCAR JAVIER GODOY
Director de Interventoría
Cedula N° 79.049.924.
Ingeniero Civil
MTP-25202 089432-CND

Oscar Javier Godoy

CERTIFICA:

El suscrito **OSCAR JAVIER GODOY** BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía N.º 79.049.924 de Bogotá D.C., actuando como Interventor Técnico, Administrativo y Financiero en el marco del Contrato de Consultoría No. 311-2025, cuyo objeto es la **"SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE** ASOCIACIÓN **CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.",**

CERTIFICO que durante todo el periodo de ejecución del convenio comprendido entre el **20 de agosto de 2025** y el **28 de marzo de 2026**, las medidas y alternativas planteadas en el **Plan de Manejo Ambiental** para prevenir, mitigar y reducir los impactos negativos generados por la construcción de las redes de distribución de gas domiciliario, fueron cumplidas estrictamente por el personal responsable de la ejecución de las obras a cargo de **AVANGAS S.A.S. E.S.P.**, y debidamente vigiladas y verificadas por el suscrito interventor en cada visita técnica realizada a los frentes de trabajo de las veredas Callejón, Casablanca y El Portal del Municipio de Ricaurte.

A la presente certificación se adjunta la ficha de seguimiento ambiental correspondiente al período total de ejecución del proyecto, la cual forma parte integral del expediente del Convenio de Asociación No. 297-2025.

La presente certificación se expide con ocasión del proceso de liquidación del convenio.

Dado en Ricaurte – Cundinamarca, a los **28 días del mes de marzo de 2026**.

OSCAR JAVIER GODOY
Director de Interventoría
Cedula N° 79.049.924.
Ingeniero Civil
MTP-25202 089432-CND

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONAL DE OBRA

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			901214635
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		AVANDAB SAS E.S.P
DIRECCIÓN:	CRA 200 #78 B3	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	TELÉFONO:	3134182
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			78868303211	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	octubre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1026207269

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301- PROTECCIÓN	9	$ 1.227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 455.600	$ 300	$ 455.900
SUBTOTALES										$ 911.200	$ 700	$ 911.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 114.000	$ 100	$ 0	$ 114.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
SUBTOTALES													$ 228.000	$ 300	$ 0	$ 228.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 396.400	$ 396.400	$ 300	$ 0	$ 396.700
SUBTOTALES									$ 396.400	$ 300	$ 0	$ 396.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 57.000	$ 100	$ 57.100
CCF21	CCF21-CAFAM	3	$ 171.000	$ 200	$ 171.200
SUBTOTALES			$ 228.000	$ 300	$ 228.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN (ADMIN, DIAS COT., IBC, COTIZACIÓN, FSP SUBSISTENCIA, FSP SOLIDARIDAD, APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR, APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO, INDICADOR TARIFA ESPECIAL, TOTAL APORTE) | SALUD (ADMIN, DIAS COT., IBC, COTIZACIÓN, VALOR ADRES, TOTAL APORTE) | ARP (ADMIN, DIAS COT., IBC, CENTRO DE TRABAJO, TOTAL APORTE) | PARAFISCALES (DIAS COT., IBC, CCF ADMIN, CCF TOTAL APORTE, SENA TOTAL APORTE, ICBF TOTAL APORTE, ESAP TOTAL APORTE, MINEDU TOTAL APORTE)

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TPC COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | PRP | ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901214525
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AVANGAS SAS E.S.P
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 800 #78 80	TELÉFONO:	3139122
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE ENUMERADO PAGO APORTES SALUD, MENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			70000484847	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1910370884

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
230301	230301-PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	4	$ 751.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.900	$ 0	$ 751.900
SUBTOTALES										$ 1.435.300	$ 0	$ 1.435.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 43.700
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 43.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 157.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.700	$ 0	$ 0	$ 157.700
SUBTOTALES													$ 359.100	$ 0	$ 0	$ 359.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ERP VALOR	INCAPACIDAD ERP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 624.400	$ 624.400	$ 0	$ 0	$ 624.400
SUBTOTALES									$ 624.400	$ 0	$ 0	$ 624.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	3	$ 171.000	$ 0	$ 171.000
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 188.100	$ 0	$ 188.100
SUBTOTALES			$ 359.100	$ 0	$ 359.100

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | IRG | RET | TDE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT. | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901214525
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AVANGAS SAS E.S.P
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 103 97B 83	TELÉFONO:	7139122
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	0-MENOS DE 200 COTIZANTES
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		Construcción de proyectos de servicio público.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			79104046297	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (dia/mes/año):			2025/12/16	NUMERO AUTORIZACIÓN:			2026000000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 455.600	$ 2.900	$ 456.500
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 227.800	$ 1.500	$ 229.300
230301	230301-PORVENIR	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 911.200	$ 5.800	$ 917.000
SUBTOTALES										$ 1.594.600	$ 10.200	$ 1.604.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL															
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 228.000	$ 1.500	$ 0	$ 229.500
SUBTOTALES		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 57.000	$ 400	$ 0	$ 57.400
													$ 399.000	$ 2.700	$ 0	$ 401.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	INCAPACIDAD EP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 693.700	$ 0	$ 693.700	$ 4.400	$ 0	$ 698.100
SUBTOTALES										$ 693.700	$ 4.400	$ 0	$ 698.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 228.000	$ 1.500	$ 229.500
CCF21	CCF21-CAFAM	3	$ 171.000	$ 1.100	$ 172.100
SUBTOTALES			$ 399.000	$ 2.600	$ 401.600

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INGRESOS: ING, RET, TDE, TAE, TDP, TAP, VSP, COR, VST, SLN, IGE, IGM, LMA, VAC, AVP, VCT, VAS	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF ADMIN	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065434042	CARVAJAL SATAN JULLY JINELDET	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 000000003	$ 99.100	CCF10-COMFABOY	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1038900515	TOTES TABARES JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 000000001	$ 99.100	CCF10-COMFABOY	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1067015647	MORALES VERGARA DENYS TOMAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 000000003	$ 99.100	CCF10-COMFABOY	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098208888	FRANCO FORERO RAFAEL CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 000000003	$ 99.100	CCF10-COMFABOY	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1133388	GARCIA ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 000000001	$ 99.100	CCF21-CAFAM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098208236	HUERTAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 000000001	$ 99.100	CCF21-CAFAM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	PT 8000781	QUINTERO CONTRERAS ANTHONY WILLIAM	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		230301-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 000000001	$ 99.100	CCF21-CAFAM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.106.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901284636
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVANGAS SAS E.S.P
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 80D 37B 80	TELÉFONO:	3139132
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	E-MENOS DE 300 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	LINEA		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7999286180	TIPO DE PLANILLA:			E EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:			2071

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 455.600	$ 300	$ 455.900
230301	230301-PORVENIR	8	$ 994.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 994.800	$ 700	$ 995.500
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES										$ 1.678.200	$ 1.200	$ 1.679.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 77.900	$ 0	$ 100	$ 0	$ 77.900	$ 100	$ 0	$ 78.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 57.000	$ 100	$ 0	$ 57.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 228.000	$ 200	$ 0	$ 228.200
SUBTOTALES													$ 419.900	$ 500	$ 0	$ 420.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 730.100	$ 730.100	$ 500	$ 0	$ 730.600
SUBTOTALES									$ 730.100	$ 500	$ 0	$ 730.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 228.000	$ 200	$ 228.200
CCF21	CCF21-CAFAM	4	$ 191.900	$ 200	$ 192.100
SUBTOTALES			$ 419.900	$ 400	$ 420.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	TRABAJA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INN
1	CC 1033454942	CARVAJAL CATAN JULLY VALENTY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																
2	CC 1030809513	TEPUS TABARES JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																
3	CC 1007013841	MONSALVE ROSAYU DAVIS TOVARA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																
4	CC 1090396888	PORERO FRANCO RAFAEL CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																
5	CC 1123333	GARCIA ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																
6	CC 1236736	HUERGO HAREZ ELIAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI	09	15														
7	CC 72003239	HUERTAS RODRIGUEZ OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																
8	PT 8000781	CUNTERO CONTRERAS ANTHONY WILLIAMS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																

Nº	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
6	230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
8	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
2	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
4	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
5	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
6	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900
7	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
8	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

Nº	ARP ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000003	$ 99.100
2	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100
3	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000003	$ 99.100
4	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000003	$ 99.100
5	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100
6	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950	000000008	$ 36.400
7	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100
8	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	000000001	$ 99.100

Nº	PARAFISCALES CCF	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CCF10-COMFABOY	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CCF10-COMFABOY	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CCF10-COMFABOY	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CCF10-COMFABOY	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CCF21-CAFAM	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CCF21-CAFAM	$ 521.950	CCF21-CAFAM	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CCF21-CAFAM	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CCF21-CAFAM	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.250.700

Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901214435
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AVANCES SAS E.S.P
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 100 #25 B 53	TELÉFONO:	3188122
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	BANCOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE ENUMERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	9083028964		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO		2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/06		NUMERO AUTORIZACIÓN:				30666367

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 0	$ 1.120.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										$ 1.961.400	$ 0	$ 1.961.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 280.400
SUBTOTALES:													$ 490.700	$ 0	$ 0	$ 490.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 853.300	$ 853.300	$ 0	$ 0	$ 853.300
SUBTOTALES:									$ 853.300	$ 0	$ 0	$ 853.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 280.400	$ 0	$ 280.400
CCF21	CCF21-CAFAM	3	$ 210.300	$ 0	$ 210.300
SUBTOTALES:			$ 490.700	$ 0	$ 490.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CON | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT. | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901214535
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AVANCSIS SAS E.S.P
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 80D #79 65	TELÉFONO	3138933
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de proyectos de servicio (F)[Sec.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA.			89622182	TIPO DE PLANILLA			E EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2026
DIAS DE MORA.			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).			2026/03/13	NUMERO AUTORIZACIÓN.			137886240

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 280.200	$ 1.300	$ 281.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 560.400	$ 2.600	$ 563.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 850.000	$ 3.900	$ 853.900
SUBTOTALES										$ 1.690.600	$ 7.800	$ 1.698.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 400	$ 0	$ 70.100	$ 400	$ 0	$ 70.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.700	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 212.700	$ 1.000	$ 0	$ 213.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 400	$ 0	$ 70.100	$ 400	$ 0	$ 70.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 400	$ 0	$ 70.100	$ 400	$ 0	$ 70.500
SUBTOTALES				$ 0		$ 0		$ 0					$ 423.000	$ 2.200	$ 0	$ 425.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EP VALOR	INCAPACIDAD EP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 735.500	$ 735.500	$ 3.400	$ 0	$ 738.900
SUBTOTALES									$ 735.500	$ 3.400	$ 0	$ 738.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	3	$ 210.300	$ 1.000	$ 211.300
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 212.700	$ 1.000	$ 213.700
SUBTOTALES			$ 423.000	$ 2.000	$ 425.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | PENSIONADO | NOVEDADES: INGRESO | RETIRO | TDE | TAE | TDP | TAP | DIAS | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES CCF DIAS COT. | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

760

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



PLANILLAS SEGURIDAD INTERVENTORÍA

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-08, 07:50:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1074646607

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 08/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Documento	CC79049924	**Teléfono**	2238558
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Identificación**	
Representante Legal		**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00																		0	30	30	30	(05-14) COLPENSIONES	$ 4.270.500	$ 683.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.270.500	$ 533.900	0,522	$ 4.270.500	$ 22.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.270.500	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.300	$ 533.900	$ 22.300	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.200	$ 3.400	$ 1.268.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-23, 01:10:02 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Número Planilla:** 1078626567

Nro Planilla Corregida: 1076414512 **Periodo Cotización:** septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 23/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA		
Documento	CC79049924	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2238558
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	MET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00	R								A								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 170.800	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00	R								G	X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.270.500	$ 683.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.270.500	$ 513.000	0,522	$ 4.270.500	$ 22.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.270.500	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 455.500	$ 355.900	$ 14.800	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843.300	$ 8.400	$ 851.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148688 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 877 071 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-04, 03:27:26 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Número Planilla:** 1077762444

Nro Planilla Corregida: 1077166403 **Periodo Cotización:** octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 04/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA		
Documento	CC79049924	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2238558
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00									A									0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 170.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.000
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	09									C	X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.270.500	$ 683.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.270.500	$ 510.000	0,522	$ 4.270.500	$ 22.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.248.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 2.847.000	$ 0	$ 455.500	$ 355.900	$ 14.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.200	$ 12.600	$ 838.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402552 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-04, 02:13:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1077762501

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 04/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA		
Documento	CC79049924	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2238558
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.270.500	$ 683.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.270.500	$ 533.900	0,522	$ 4.270.500	$ 22.300	(CCF29) COLSUBSIDIO	$ 4.270.500	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.300	$ 533.900	$ 22.300	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.200	$ 0	$ 1.265.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-17, 10:11:14 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077764880

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 17/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA		
Documento	CC79049924	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2238558
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.270.500	$ 683.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.270.500	$ 533.900	0,522	$ 4.270.500	$ 22.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.270.500	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 4.270.500	$ 683.300	$ 533.900	$ 22.300	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.265.200	$ 0	$ 1.265.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6845444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

295

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-11, 02:59:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1079588466

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 11/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA		
Documento	CC79049924	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2238558
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00																	0	30	30	30	30	(25 14) COLPENSIONES	$ 5.253.000	$ 840.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 5.253.000	$ 656.700	0.522	$ 5.253.000	$ 27.500	(CCF22) COL8UB6DIO	$ 5.253.000	$ 31.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.556.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.253.000	$ 5.253.000	$ 5.253.000	$ 5.253.000	$ 840.500	$ 656.700	$ 27.500	$ 31.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.556.300	$ 5.100	$ 1.561.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6435080 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

746

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 05:39:13 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1079589314

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 09/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA		
Documento	CC79049824	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2238558
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79049824	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.253.000	$ 840.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 5.253.000	$ 656.700	1.044	$ 5.253.000	$ 54.900	(CCF33) COLSUBSIDIO	$ 5.253.000	$ 31.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.583.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.253.000	$ 5.253.000	$ 5.253.000	$ 5.253.000	$ 840.500	$ 656.700	$ 54.900	$ 31.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.583.700	$ 3.300	$ 1.587.000

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6845444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-24, 08:46:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 10803000726

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 24/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA		
Documento	CC79049924	**Dirección**	CL 74BIS NORTE #84 - 24 BOGOTA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2238558
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	57	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.750.000	$ 600.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.750.000	$ 468.800	0,522	$ 3.750.000	$ 19.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.750.000	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.110.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	[Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor] EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000	$ 600.000	$ 468.800	$ 19.600	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.110.900	$ 0	$ 1.110.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146699 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

Entre los suscritos a saber: de una parte, **OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 79.049.924 de Bogotá D.C.**, actuando en nombre propio en su calidad de interventor del proceso de contratación SINFRA-SP-016, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATANTE**; y de la otra parte, **FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.099.205.682**, Técnico, portador de la matrícula/tarjeta técnica **No. TUVCPI3894**, actuando en nombre propio, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el CONTRATANTE, en su calidad de interventor, adelanta el proceso **SINFRA-SP-016 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN** cuyo objeto es "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". 2. Que, para la correcta ejecución de la interventoría, el CONTRATANTE requiere contar con un **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA** que apoye las labores del equipo de trabajo. 3. Que el CONTRATISTA cuenta con la idoneidad, experiencia y matrícula técnica vigente para la prestación de dichos servicios, y manifestó su compromiso de participar en el equipo de trabajo. 4. Que el presente contrato es de naturaleza civil y no genera relación laboral alguna entre las partes.

PRIMERA. — OBJETO. El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar sus servicios como **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**, en el marco del proceso de contratación SINFRA-SP-016 correspondiente a la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio de asociación cuyo objeto es "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

SEGUNDA. — ALCANCE Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA desempeñará las labores propias del **INSPECTOR DE INTERVENTORÍA**, entre ellas: 1. Apoyar técnicamente el seguimiento a la ejecución de las instalaciones de gas domiciliario objeto del convenio. 2. Verificar en campo el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las conexiones y redes internas. 3. Apoyar la toma de mediciones, registros fotográficos y evidencias de la ejecución. 4. Apoyar la elaboración de los informes técnicos y la consolidación de la información. 5. Realizar el acompañamiento en campo requerido por la interventoría. 6. Dedicar el tiempo requerido para el desarrollo de las labores asociadas a su especialidad, de conformidad con los pliegos de condiciones. 7. Las demás inherentes a su rol y a la naturaleza del contrato.

TERCERA. — VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato corresponde a honorarios mensuales por la suma de **$2.850.000 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**

M/CTE). El valor total corresponderá a la sumatoria de las mensualidades causadas durante la ejecución efectiva del contrato, conforme al plazo establecido en la cláusula quinta.

CUARTA. — FORMA DE PAGO. El CONTRATANTE pagará los honorarios en mensualidades vencidas, previa presentación de la cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, la certificación de cumplimiento y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral como trabajador independiente, dentro de los **cinco (5)** días hábiles siguientes a su radicación.

QUINTA. — PLAZO Y VIGENCIA. El plazo de ejecución del presente contrato inicia el **20 de agosto de 2025** y se extenderá **hasta la terminación de las actividades objeto del contrato**, por tratarse de un contrato de prestación de servicios cuya duración se encuentra ligada a la ejecución del objeto contractual y a la vigencia del proceso de interventoría SINFRA-SP-016.

SEXTA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1. Ejecutar con calidad, idoneidad y oportunidad el objeto contratado. 2. Aportar su conocimiento técnico. 3. Presentar los informes y entregables en los plazos acordados. 4. Guardar reserva sobre la información conocida en desarrollo del contrato. 5. Afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral como trabajador independiente y acreditar dicho pago para cada pago. 6. Atender las observaciones e instrucciones del CONTRATANTE. 7. Mantener vigente su matrícula técnica. 8. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

SÉPTIMA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 1. Pagar los honorarios en la forma pactada. 2. Suministrar oportunamente la información y los soportes necesarios para la ejecución del objeto. 3. Impartir las instrucciones requeridas y ejercer la supervisión. 4. Expedir los certificados de cumplimiento a que haya lugar. 5. Las demás que se deriven del presente contrato.

OCTAVA. — NATURALEZA DEL CONTRATO. El presente contrato es de naturaleza civil y no genera relación laboral ni el pago de prestaciones sociales entre las partes. El CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y no estará subordinado al CONTRATANTE.

NOVENA. — SUPERVISIÓN. La supervisión y coordinación del presente contrato estará a cargo del CONTRATANTE, en su calidad de interventor, o de quien este designe, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones y expedirá los certificados correspondientes.

DÉCIMA. — CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se obliga a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información técnica, administrativa, financiera y de cualquier índole que conozca con ocasión del contrato, obligación que subsistirá aún después de su terminación.

DÉCIMA PRIMERA. — PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS. Los informes, documentos y productos elaborados por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual serán de propiedad del CONTRATANTE una vez cancelados los valores correspondientes, sin perjuicio de los derechos morales de autor que correspondan al CONTRATISTA.

DÉCIMA SEGUNDA. — CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE.

DÉCIMA TERCERA. — CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones, la parte incumplida pagará a título de pena una suma equivalente al **10%** del valor total del contrato, sin perjuicio del cobro de los perjuicios adicionales a que haya lugar.

DÉCIMA CUARTA. — TERMINACIÓN. El presente contrato podrá terminarse por: 1. Cumplimiento del objeto y terminación de las actividades. 2. Mutuo acuerdo. 3. Incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. 4. Fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

DÉCIMA QUINTA. — INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación de terceros derivada de sus actuaciones u omisiones en la ejecución del contrato.

DÉCIMA SEXTA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan con ocasión del presente contrato se resolverán preferentemente mediante arreglo directo entre las partes y, de no lograrse, se acudirá a los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a la jurisdicción ordinaria competente.

DÉCIMA SÉPTIMA. — PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para constancia se firma en **Bogotá D.C.**, a los **veinte (20) días del mes de agosto de 2025**.

EL CONTRATANTE,

OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
C.C. No. 79.049.924 de Bogotá D.C.
Interventor SINFRA-SP-016

EL CONTRATISTA,

FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
C.C. No. 1.099.205.682
Técnico — M.T. TUVCPI3894

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099205682
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-10
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	32121156
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32121156
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
337	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230901	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	860003790	ARL SURA	1	$ 1.423.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1089205682
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-10
FECHA DE PAGO:	2025-09-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	24339118
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24339118
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099205662
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-10-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10 ✓
NÚMERO PLANILLA:	38039763
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38039763
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
337	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 180.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 230.400
14-11	860069790	ARL SURA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 418.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099205882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	36380615
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36380615
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.000	$ 360.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.800	$ 460.800
14-11	860069796	ARL SURA	1	$ 2.880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 15.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 835.900	$ 835.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1069205682
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-14
FECHA DE PAGO:	2025-12-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36310811
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36310811
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099205882
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-11
FECHA DE PAGO:	2026-01-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01 ✓
NÚMERO PLANILLA:	37173689
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37173689
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099205682
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-02-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36182678
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36182678
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
37	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FREDY AVELINO COY CASTAÑEDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099205662
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-14
FECHA DE PAGO:	2026-03-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03 ✓
NÚMERO PLANILLA:	46823062
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	46823062
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
37	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	860303780	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/05/2026

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Entre los suscritos a saber: de una parte, **OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 79.049.924 de Bogotá D.C.**, actuando en nombre propio en su calidad de interventor del proceso de contratación SINFRA-SP-016, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATANTE**; y de la otra parte, **GONZALO ADOLFO FIGUEREDO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.032.356.864**, Ingeniero Civil con Matrícula Profesional **No. 25202-168568-CND**, actuando en nombre propio, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el CONTRATANTE, en su calidad de interventor, adelanta el proceso **SINFRA-SP-016 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN** cuyo objeto es "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". 2. Que, para la correcta ejecución de la interventoría, el CONTRATANTE requiere contar con un profesional que desempeñe el rol de **Residente de Interventoría.** 3. Que el CONTRATISTA cuenta con la idoneidad, experiencia y matrícula profesional vigente para la prestación de dichos servicios, y manifestó su compromiso de participar en el equipo de trabajo. 4. Que el presente contrato es de naturaleza civil y no genera relación laboral alguna entre las partes.

PRIMERA. — OBJETO. El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar sus servicios profesionales como **Residente de Interventoría**, en el marco del proceso de contratación SINFRA-SP-016 correspondiente a la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio de asociación cuyo objeto es "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

SEGUNDA. — ALCANCE Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA desempeñará las labores propias del Residente de Interventoría, entre ellas: 1. Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución del convenio objeto de interventoría. 2. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas de las instalaciones de gas domiciliario. 3. Apoyar la elaboración de informes de interventoría y demás documentos requeridos. 4. Efectuar el seguimiento al avance físico y financiero de las actividades. 5. Atender los requerimientos del CONTRATANTE y de la entidad contratante. 6. Dedicar el tiempo requerido para el desarrollo de las labores asociadas a su especialidad, de conformidad con los pliegos de condiciones. 7. Las demás inherentes a su rol y a la naturaleza del contrato.

TERCERA. — VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato corresponde a honorarios mensuales por la suma de **$4.450.000** (**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS** M/CTE). El valor total corresponderá a la sumatoria de las mensualidades causadas durante la ejecución efectiva del contrato, conforme al plazo establecido en la cláusula quinta.

CUARTA. — FORMA DE PAGO. El CONTRATANTE pagará los honorarios en mensualidades vencidas, previa presentación de la cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, la certificación de cumplimiento y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral como trabajador independiente, dentro de los **cinco (5)** días hábiles siguientes a su radicación.

QUINTA. — PLAZO Y VIGENCIA. El plazo de ejecución del presente contrato inicia el **20 de agosto de 2025** y se extenderá **hasta la terminación de las actividades objeto del contrato**, por tratarse de un contrato de prestación de servicios cuya duración se encuentra ligada a la ejecución del objeto contractual y a la vigencia del proceso de interventoría SINFRA-SP-016.

SEXTA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1. Ejecutar con calidad, idoneidad y oportunidad el objeto contratado. 2. Aportar su conocimiento técnico y profesional como Ingeniero Civil. 3. Presentar los informes y entregables en los plazos acordados. 4. Guardar reserva sobre la información conocida en desarrollo del contrato. 5. Afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral como trabajador independiente y acreditar dicho pago para cada pago. 6. Atender las observaciones e instrucciones del CONTRATANTE. 7. Mantener vigente su matrícula profesional. 8. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

SÉPTIMA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 1. Pagar los honorarios en la forma pactada. 2. Suministrar oportunamente la información y los soportes necesarios para la ejecución del objeto. 3. Impartir las instrucciones requeridas y ejercer la supervisión. 4. Expedir los certificados de cumplimiento a que haya lugar. 5. Las demás que se deriven del presente contrato.

OCTAVA. — NATURALEZA DEL CONTRATO. El presente contrato es de naturaleza civil y no genera relación laboral ni el pago de prestaciones sociales entre las partes. El CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica, administrativa y directiva, y no estará subordinado al CONTRATANTE.

NOVENA. — SUPERVISIÓN. La supervisión y coordinación del presente contrato estará a cargo del CONTRATANTE, en su calidad de interventor, o de quien este designe, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones y expedirá los certificados correspondientes.

DÉCIMA. — CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA se obliga a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información técnica, administrativa, financiera y de cualquier índole que conozca con ocasión del contrato, obligación que subsistirá aún después de su terminación.

DÉCIMA PRIMERA. — PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS. Los informes, documentos y productos elaborados por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual serán de propiedad del CONTRATANTE una vez cancelados los valores correspondientes, sin perjuicio de los derechos morales de autor que correspondan al CONTRATISTA.

DÉCIMA SEGUNDA. — CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE.

DÉCIMA TERCERA. — CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones, la parte incumplida pagará a título de pena una suma equivalente al **10%** del valor total del contrato, sin perjuicio del cobro de los perjuicios adicionales a que haya lugar.

DÉCIMA CUARTA. — TERMINACIÓN. El presente contrato podrá terminarse por: 1. Cumplimiento del objeto y terminación de las actividades. 2. Mutuo acuerdo. 3. Incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. 4. Fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

DÉCIMA QUINTA. — INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación de terceros derivada de sus actuaciones u omisiones en la ejecución del contrato.

DÉCIMA SEXTA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan con ocasión del presente contrato se resolverán preferentemente mediante arreglo directo entre las partes y, de no lograrse, se acudirá a los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a la jurisdicción ordinaria competente.

DÉCIMA SÉPTIMA. — PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para constancia se firma en **Bogotá D.C.**, a los **veinte (20) días del mes de agosto de 2025.**

EL CONTRATANTE,

OSCAR JAVIER **GODOY** BAUTISTA
C.C. No. 79.049.924 de Bogotá D.C.
Interventor SINFRA-SP-016

EL CONTRATISTA,

GONZALO FIG

GONZALO ADOLFO FIGUEREDO
C.C. No. 1.032.356.864
Ingeniero Civil — M.P. 25202-168568-CND
Residente de Interventoría

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	89348704	**Total a pagar:**	$1,229,000
Fecha de vencimiento:	15/09/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	29/08/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1735488966
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$677,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$529,300
						$1,229,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2025
Número de Radicación:	90280690	**Total a pagar:**	$1,229,000
Fecha de vencimiento:	16/10/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	02/10/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	**Número Autorización:**	1820045122
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$677,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$529,300
						$1,229,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	91201144	**Total a pagar:**	$1,229,000
Fecha de vencimiento:	19/11/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	05/11/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número Autorización:**	1905473365
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$677,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$529,300
						$1,229,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADA

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356854
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	92013427	**Total a pagar:**	$1,229,000
Fecha de vencimiento:	16/12/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/12/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1978148104
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$677,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$529,300
						$1,229,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	92489887	**Total a pagar:**	$1,229,000
Fecha de vencimiento:	19/01/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	19/12/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	2021732591
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$677,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$529,300
						$1,229,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	46582100	**Total a pagar:**	$508,300
Fecha de vencimiento:	26/07/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	25/07/2026	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	Corrección	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número Autorización:**	50234809
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$9,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$280,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$218,900
						$508,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2026
Número de Radicación:	47532100	**Total a pagar:**	$8,323
Fecha de vencimiento:	30/07/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	29/07/2026	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	Corrección enero	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número Autorización:**	50334809
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$123
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$4,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$3,600
						$8,323

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe Informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2026
Número de Radicación:	61722144	**Total a pagar:**	$1,228,800
Fecha de vencimiento:	16/03/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/03/2026	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	107456429
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$677,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$529,300
						$1,228,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	GONZALO ADOLFO FIGUEREDO CAMACHO	**NIT:**	1032356864
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2026
Número de Radicación:	71049960	**Total a pagar:**	$1,228,800
Fecha de vencimiento:	17/04/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	30/03/2026	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número Autorización:**	179107557
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$22,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$677,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$529,300
						$1,228,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL (SST)

Entre los suscritos a saber: de una parte, **OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 79.049.924 de Bogotá D.C.**, actuando en nombre propio en su calidad de interventor del proceso de contratación SINFRA-SP-016, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATANTE**; y de la otra parte, **AIDA LUCÍA LÓPEZ JIMÉNEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **39.575.576 de Girardot**, Profesional en Salud Ocupacional, titular de la Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo **No. 11968 del 21 de septiembre de 2015**, otorgada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., actuando en nombre propio, quien para efectos del presente contrato se denominará la **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el CONTRATANTE, en su calidad de interventor, adelanta el proceso **SINFRA-SP-016 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN** cuyo objeto es "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". 2. Que para la correcta ejecución de la interventoría, el CONTRATANTE requiere contar con un **Profesional en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo)** que apoye las labores del equipo de trabajo. 3. Que la CONTRATISTA cuenta con la idoneidad, experiencia y licencia SST vigente para la prestación de dichos servicios, y manifestó su compromiso de participar en el equipo de trabajo. 4. Que el presente contrato es de naturaleza civil y no genera relación laboral alguna entre las partes.

PRIMERA. — OBJETO. La CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar sus servicios como **Profesional en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo)**, en el marco del proceso de contratación SINFRA-SP-016 correspondiente a la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio de asociación cuyo objeto es "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

SEGUNDA. — ALCANCE Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. En desarrollo del objeto, la CONTRATISTA desempeñará las labores propias del Profesional en Salud Ocupacional, entre ellas: 1. Apoyar la implementación y el seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicable a la ejecución del proyecto. 2. Realizar inspecciones de seguridad en los frentes de obra. 3. Verificar el uso de los elementos de protección personal y el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. 4. Apoyar la elaboración de los informes y matrices en materia de SST. 5. Promover acciones de prevención de accidentes e incidentes de trabajo. 6. Dedicar el tiempo requerido para el desarrollo de las labores asociadas a su especialidad, de conformidad con los pliegos de condiciones. 7. Las demás inherentes a su rol y a la naturaleza del contrato.

TERCERA. — VALOR DEL CONTRATO Y DEDICACIÓN. El valor del presente contrato corresponde a honorarios mensuales por la suma de **$1.780.000 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE)**, correspondientes a una **dedicación del cuarenta por ciento (40%)**. El valor total corresponderá a la sumatoria de las mensualidades causadas durante la ejecución efectiva del contrato, conforme al plazo establecido en la cláusula quinta.

CUARTA. — FORMA DE PAGO. El CONTRATANTE pagará los honorarios en mensualidades vencidas, previa presentación de la cuenta de cobro por parte de la CONTRATISTA, la certificación de cumplimiento y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral como trabajador independiente, dentro de los **cinco (5)** días hábiles siguientes a su radicación.

QUINTA. — PLAZO Y VIGENCIA. El plazo de ejecución del presente contrato inicia el **20 de agosto de 2025** y se extenderá **hasta la terminación de las actividades objeto del contrato**, por tratarse de un contrato de prestación de servicios cuya duración se encuentra ligada a la ejecución del objeto contractual y a la vigencia del proceso de interventoría SINFRA-SP-016.

SEXTA. — OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. 1. Ejecutar con calidad, idoneidad y oportunidad el objeto contratado. 2. Aportar su conocimiento profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Presentar los informes y entregables en los plazos acordados. 4. Guardar reserva sobre la información conocida en desarrollo del contrato. 5. Afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral como trabajador independiente y acreditar dicho pago para cada pago. 6. Atender las observaciones e instrucciones del CONTRATANTE. 7. Mantener vigente su licencia SST. 8. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

SÉPTIMA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 1. Pagar los honorarios en la forma pactada. 2. Suministrar oportunamente la información y los soportes necesarios para la ejecución del objeto. 3. Impartir las instrucciones requeridas y ejercer la supervisión. 4. Expedir los certificados de cumplimiento a que haya lugar. 5. Las demás que se deriven del presente contrato.

OCTAVA. — NATURALEZA DEL CONTRATO. El presente contrato es de naturaleza civil y no genera relación laboral ni el pago de prestaciones sociales entre las partes. La CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y no estará subordinada al CONTRATANTE.

NOVENA. — SUPERVISIÓN. La supervisión y coordinación del presente contrato estará a cargo del CONTRATANTE, en su calidad de interventor, o de quien este designe, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones y expedirá los certificados correspondientes.

DÉCIMA. — CONFIDENCIALIDAD. La CONTRATISTA se obliga a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información técnica, administrativa, financiera y de cualquier índole que conozca con ocasión del contrato, obligación que subsistirá aún después de su terminación.

DÉCIMA PRIMERA. — PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS. Los informes, documentos y productos elaborados por la CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual serán de propiedad del CONTRATANTE una vez cancelados los valores correspondientes, sin perjuicio de los derechos morales de autor que le correspondan.

DÉCIMA SEGUNDA. — CESIÓN. La CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE.

DÉCIMA TERCERA. — CLÁUSULA PENAL. En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones, la parte incumplida pagará a título de pena una suma equivalente al **10%** del valor total del contrato, sin perjuicio del cobro de los perjuicios adicionales a que haya lugar.

DÉCIMA CUARTA. — TERMINACIÓN. El presente contrato podrá terminarse por: 1. Cumplimiento del objeto y terminación de las actividades. 2. Mutuo acuerdo. 3. Incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes. 4. Fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

DÉCIMA QUINTA. — INDEMNIDAD. La CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación de terceros derivada de sus actuaciones u omisiones en la ejecución del contrato.

DÉCIMA SEXTA. — SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan con ocasión del presente contrato se resolverán preferentemente mediante arreglo directo entre las partes y, de no lograrse, se acudirá a los mecanismos alternativos de solución de conflictos o a la jurisdicción ordinaria competente.

DÉCIMA SÉPTIMA. — PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para constancia se firma en **Bogotá D.C.**, a los **veinte (20) días del mes de agosto de 2025**.

EL CONTRATANTE,

OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
C.C. No. 79.049.924 de Bogotá D.C.
Interventor SINFRA-SP-016

LA CONTRATISTA,

AIDA LUCÍA LÓPEZ JIMÉNEZ
C.C. No. 39.575.576 de Girardot
Prof. Salud O. — Lic. SST 11968/2015

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 38575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-10
FECHA DE PAGO:	2025-09-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	36182139
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36821139
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 39575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-10
FECHA DE PAGO:	2025-09-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	36336120
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36336120
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
307	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/11/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 39575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-10-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	38036755
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38036755
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900168354	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 180.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 230.400
14-11	860003790	ARL SURA	1	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 418.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 39575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	36930820
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36930820
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E P S S.A.	1	$ 2.880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.000	$ 360.000
230301	900224808	PORVENIR	1	$ 2.880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.800	$ 460.800
14-11	860003780	ARL SURA	1	$ 2.880.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 15.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 835.900	$ 835.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 39575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-14
FECHA DE PAGO:	2025-12-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	36330820
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36330820
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
5037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	860803780	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 39575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-12
FECHA DE PAGO:	2026-01-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36163677
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36163677
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	860003780	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 38575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	38162665
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38162665
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	860002780	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA LUCIA LÓPEZ JIMÉNEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC- 39575576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	38823056
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38823056
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
1037	800156364	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2026

803

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



LISTADO DE USUARIOS EN SERVICIO

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

Nº ITEM	# DE MATRICULA	NOMBRE	APELLIDO 1	APELLIDO 2	CEDULA	VEREDA	CELULAR	Nº MEDIDOR	Nº DE CERTIFICADO	NOMBRE DEL CERTIFICADOR	EMPRESA QUE CERTIFICA
1	722	Nini Yojana	Herrera	Bautista	36251841	Callejon	3196782309	20250020810	114269	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
2	723	Francisco Javier	Herrera	Bautista	80493212	Callejon	3118572391	20250020837782	114268	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
3	3021	Maria Aireth	Rivera	Narvaez	20781925	Callejon	3143397169	20250020838078	115243	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
4	3023	Dora Lucia	Forero	Colorado	21110182	Callejon	3115364131	20250020818159	115250	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
5	3024	Barbara Ruth	Carvajal	Ruiz	20822656	Callejon	3194136431	20250020818504	115244	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
6	3030	Policarpo	Alvarado	Torres	19311999	Callejon	3105874168	20250020837998	114263	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
7	3034	Cielo Mireya	Calderon	Carvajal	1069175485	Callejon	3157083044	20250020818158	115245	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
8	3037	Cecilia Ignolia	Bustos	Varon	30003713	Callejon	3142432133	20250020817986	115240	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
9	3047	Jose Raul Eduardo	Carvajal	Rodriguez	79144126	Callejon	3139416202	20250020249990	114266	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
10	3048	Diana	Perdomo	Avila	52229258	Callejon	3143397169	20250020837943	115242	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
11	3052	Susana	Martinez	Gonzalez	53129587	Callejon	3193250807	20250020837897	114278	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
12	3054	Yolanda	Bustos	Baron	39557273	Callejon	3222271212	20250020818326	114259	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
13	3056	Luz Mila	Gomez	Venegas	20815065	Callejon	3134288498	20250020820253	114260	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
14	3059	Haidy Jasmin	Varon	Orjuela	65820015	Callejon	3134437853	20250020818164	114256	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
15	3060	Maria Rosalba	Sanchez	Coronado	41709781	Callejon	3158839080	20250020837815	115239	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
16	3061	Luz Estella	Bustos	Baron	39590182	Callejon	3106691971	20250020818326	114262	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
17	3062	Erika Tatiana	Vargas	Varon	1069177244	Callejon	3118838434	20250020837984	114257	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
18	3064	Gabriel	Abondano	Cruz	19380764	Callejon	3227094212	20250020837777	114271	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
19	3066	Lisandro	Vargas	Pedreros	86003715	Callejon	3177128580	20250020837947	114258	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
20	3068	Maria Yolanda	Barrreo	Cardozo	41796249	Callejon	3165897238	20250020818204	114273	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
21	3069	Fidel	Nuñez	Suarez	14216357	Callejon	3165897238	20250020837887	114274	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
22	3070	Teresa	Pedriza	Gonzalez	28510874	Callejon	3143312407	20250020817988	114265	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
23	3071	Luis Enrique	Pedriza		19166684	Callejon	3143312407	20250020817915	115241	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
24	3072	Jairo	Reyo		19327196	Callejon	3143060834	20250020837821	114254	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
25	3073	Anibal	Laguna	Ospina	s	Callejon	3204316664	20250020837781	114267	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
26	3092	Olegario	Vargas	Pedreros	7489633	Callejon	3133746075	20250020817990	115224	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
27	3681	Maria Yisenia	Medina	Hernandez	1069177381	Callejon	3182003846	20250020837989	115227	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
28	3074	Gabriel David	Lozano	Ros	1070669971	Callejon	3148781787	20250020837891	114146	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
29	3076	Heiner Norberto	Rojas	Franco	3158697	Callejon	3224044596	20250020838074	114270	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
30	3078	Candida Rosa	Mojica	Araujo	20875814	Callejon	3123244807	20250020817918	114277	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
31	3807	Juan Manuel	Cortes	Gonzalez	79450120	Callejon	3132569815	20250020824993	114265	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
32	3202	Edgar Alfnso	Moreno	Melo	19385309	Callejon	3232841527	20250020824994	114262	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
33	3203	Alvaro	Rodriguez	Cortes	3150436	Callejon	3118858877	20250020818308	115210	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
34	3402	Hector	Matta	Portela	3150714	Callejon	3103782634	20250020838138	115249	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
35	3403	Andres	Blanco		80666850	Callejon	3228058565	20250020824997	114264	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
36	3434	Nini Yohana	Suarez	Londoño	39580746	Callejon	3218911921	20250020824998	115248	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
37	3466	Nelly	Espita	Arciniegas	20822311	Callejon	3228307352	20250020837973	114147	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
38	3485	Carmenza	Herrera	Gomez	21075148	Callejon	3209640151	20250020824999	114261	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
39	3486	Nelson Mateo	Aguilar	Leal	18353587	Callejon	3115135089	20250020817926	114272	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
40	3035	Lizeth Paola	Medina	Vega	1069179096	Callejon	3182003646	20250020837971	115225	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
41	3024	Lina Johana	Londoño	Molina	1069178180	Callejon	3123244807	20250020818360	115235	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
42	3201	Jairo	Peñuela	Del Basto	11314474	Callejon	3108740801	20250020817917	115206	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
43	3077	Estefany Hasbleydi	Londoño	Molina	1069177711	Callejon	3123244807	20250020817924	115236	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
44	3075	Jorge Eliecer	Mendoza	Malagon	4172224l	Callejon	3112662995	20250020817983	115231	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
45	3065	Yesica Alejandra	Bustos	Hernandez	1069178585	Callejon	3182848770	20250020818202	115207	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
46	3058	Ruben Dario	Gongora	Bautista	1069174357	Callejon	3504090624	20250020817911	115211	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
47	3057	Benjamin	Carvajal		282517	Callejon	3114214132	20250020818305	115234	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
48	3055	Argemira	Bautista	Bernal	20875733	Callejon	3112403678	20250020817969	115212	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
49	3053	Juan Carlos	Carvajal	Rodriguez	19444380	Callejon	3192416270	20250020837899	115205	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
50	3051	Jose Eduardo	Tovar	Miranda	3080285	Callejon	3203351864	20250020817985	115219	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
51	3050	Domingo	Medina	Perez	79513310	Callejon	3182003646	20250020838072	115226	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
52	3049	Ana Milena	Vargas	Bustos	20876093	Callejon	3107976310	20250020817990	115215	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
53	3046	Jorge Enrique	Bustos		19115758	Callejon	3143764751	20250020840254	115201	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
54	3044	Luis Angel	Bustos	Hernandez	1069836378	Callejon	3185087303	20250020837987	115208	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
55	3042	Didier Anderson	Gongora	Tapazco	1069174848	Callejon	3125799934	20250020837780	115203	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
56	3041	Aura Cristina	Gongora	Tapazco	1069179818	Callejon	3173968409	20250020817975	115204	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
57	3040	Orfilia	Tapazco	Varon	20876574	Callejon	3319191857	20250020818206	115202	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
58	3039	Yarli Piero	Rodriguez	Quintero	1077142297	Callejon	3212425483	20250020817919	115230	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
59	3038	Yuri Milena	Reyes	Vargas	1069177564	Callejon	3219209579	20250020817921	115216	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
60	3036	Yolanda	Vargas	Bustos	20876129	Callejon	3208788904	20250020817980	115213	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
61	3035	Ana Olga	Bustos	De Vargas	30002928	Callejon	3206283127	20250020818323	115214	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
62	3033	Marina	Hernandez	Cuellar	20084707	Callejon	3143397169	20250020837967	115223	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
63	3032	Ana Luz Linda	Moreno	Gomez	39611377	Callejon	3143230990	20250020817926	115238	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
64	3031	Myriam	Quiroga		51627740	Callejon	3232841527	20250020817912	115209	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
65	3029	Yina Caterine	Lopez	Forero	1069174351	Callejon	3194955578	20250020817923	115218	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
66	3028	Jhon Fredy	Solarte	Carvajal	11295690	Callejon	3163310436	20250020818309	115232	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
67	3027	Lucila	Molina		39436021	Callejon	3186495683	20250020838137	115217	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
68	3026	Leonidas	Carvajal	Cruz	11298859	Callejon	3114214132	20250020818261	115233	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
69	3025	Nubia Stella	Rodriguez		51611904	Callejon	3234360139	20250020824997	115220	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
70	3835	Robinson Farid	Bonilla	Gualtero	1105680064	Callejon	3002900043	20250020837948	114275	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
71	3022	Flor Myriam	Galindo	Mozo	40035966	Callejon	3134248366	20250020837972	115237	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
72	3020	Campo Elias	Rincon	Tellez	11374480	Callejon	3124051504	20250020838071	115223	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
73	3019	Marjoth	Quintero	De Ruiz	26449741	Callejon	3439	20250020837970	115221	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
74	725	Raul Leoni	Bautista	Bernal	11318507	Callejon	3214718934	20250020837781	115228	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
75	724	Sindy Lorena	Bautista	Vargas	1069176828	Callejon	3227094912	20250020837822	115229	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
76	3441	Pablo Emilio	Valencia	Ramirez	80260786	Callejon	3208842491	20250020825074	115248	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
77	3444	Berenice	Rincon	Tellez	21116348	Callejon	3014460832	20250020825130	115247	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
78	3832	William Fernando	Bulla	Gonzalez	79658887	Casablanca	3004829708	20250020818302	114093	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
79	3830	Branden Estiven	Carvajal	Sanchez	1069179227	Casablanca	3126401455	20250020818231	114356	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
80	3829	Luz Herminda	Romero	Reyes	20879000	Casablanca	3176518688	20250020818268	114359	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
81	3827	Sandra Milena	Vargas	Reyes	20875990	Casablanca	3163543219	20250020817973	114360	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
82	3826	Luis Humberto	Jimenez	Belarano	3098980	Casablanca	3176643361	20250020818183	114354	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
83	3824	Sol Angel	Bernal	Rodriguez	39584712	Casablanca	3185782326	20250020818177	114352	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
84	3823	Jenny	Reyes	Bernal	1069174843	Casablanca	3165787466	20250020818235	114003	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
85	3821	Maria Margarita	Herran	Castro	28427270	Casablanca	3158843161	20250020818033	114121	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
86	3818	Edier Samir	Romero	Vargas	1069175713	Casablanca	3184779172	20250020824994	114109	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
87	3817	Orlando	Vasquez	Beatriz	3150775	Casablanca	3245443954	20230020023950	115180	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
88	3816	Luz Dare	Carvajal	Betancourt	20878719	Casablanca	3157599927	20250020818237	114004	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
89	3814	Efren Alberto	Chiquisa	Rodriguez	1069925498	Casablanca	3154972857	20250020823485	114023	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
90	3813	Luz Estella	Jaramillo	Huertas	51669185	Casablanca	3182459869	20250020818038	114238	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
91	3812	Luz Estella	Salazar		40396647	Casablanca	3124457788	20250020838140	114138	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
92	3811	Evangelina	Ariza	Nieto	65749949	Casablanca	3218795031	20250020818264	114030	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
93	3810	Carlos Jose	Alvadan	Cardenas	3047171	Casablanca	3202162817	20250020823461	114365	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
94	3809	Luis Epifanio	Castillo	Silva	3078772	Casablanca	3118882366	20250020818160	114329	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
95	3805	Adonai	Carvajal	Betancourt	11317562	Casablanca	3143045678	20250020817936	115175	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
96	3804	Miriam	Carvajal	Garcia	39575098	Casablanca	3197879499	40535020022507	115171	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
97	3803	Hector	Castañeda	Romero	11221474	Casablanca	3144381849	20250020817940	114018	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
98	3802	Kely Yurani	Diaz	Graciano	1069081698	Casablanca	3215349449	20250020817916	114104	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
99	3801	Geiler Alonso	Diaz	Graciano	1069175526	Casablanca	3154387844	20250020818200	114103	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.

100	3800	Luz Elena	Cardozo	Rodriguez	39573731	Casablanca	3116241046	20250201800	114113	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
101	3799	Jose Leonidas	Cardenas	Rivera	5874055	Casablanca	3177571661	20250203804	114153	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
102	3301	Luis Carlos	Londoño	Rotavista	17063345	Casablanca	3197606333	20250201819	114246	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
103	3304	Alba Cecilia	Mour	Castañeda	28927323	Casablanca	3156998536	20250203807	114331	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
104	3306	Manuel Antonio	Gaitan	Beltran	19275629	Casablanca	3138783997	20250201796	114278	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
105	3749	Luz Mary	Romero	Reyes	39562601	Casablanca	3166171478	18211000840	114358	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
106	3307	Norma Isabel	Plata	Rodriguez	28627298	Casablanca	3136537648	20250202512	114287	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
107	3747	Cecilia	Quevedo	Mejia	39551192	Casablanca	3178008958	20250201797	114048	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
108	3745	Luz Heminda	Reyes	De Romero	20816280	Casablanca	3102265030	20250201818	114360	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
109	3741	Jeremias	Bernal	Rodriguez	328467	Casablanca	3177923690	20250201818	114351	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
110	3740	Linda Dayan	Beltrel	Cuellar	1098992099	Casablanca	3114718894	40939483907	114383	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
111	3739	Roberto	Cardozo	Molina	11297406	Casablanca	3124548501	20250201819	114011	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
112	3738	Aviaad	Carvajal	Betancourt	11320122	Casablanca	3114490233	20250201823	114363	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
113	3737	Ninfa Celeni	Carvajal	Betancourt	39574836	Casablanca	3114490233	20250201818	114355	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
114	3736	Martha Lucia	Sanchez		20781755	Casablanca	3166737323	20250201800	114030	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
115	3309	Lucy Deicy	Pinada	Garzia	30271884	Casablanca	3186755139	20250202256	115188	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
116	3734	Milly Johanna	Diaz	Graciano	1069174701	Casablanca	3166884475	20250202411	114106	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
117	3733	Luyor Gladis	Gonzalez		52085578	Casablanca	3134200573	20250201801	114038	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
118	3732	Zulma	Gonzalez	Ricaurte	21078837	Casablanca	3178008958	20250201628	114330	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
119	3731	Dimas	Vargas	Celis	11303340	Casablanca	3107950890	20250201791	114084	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
120	3728	Carlos Ignacio	Acevedo	Campos	2385885	Casablanca	3136521887	20250203804	114133	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
121	3727	Moises	Salazar	Cayzedo	11314234	Casablanca	3115052976	20250201798	114026	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
122	3726	Maera Soryg	Reyes	Rodriguez	80493368	Casablanca	3177142122	20250203796	115177	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
123	3725	Luz Adriana	Rivas	Calderon	1069174234	Casablanca	3225976446	20250203804	114039	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
124	3724	Maria Helena	Reyes	Rodriguez	39578303	Casablanca	3166322579	20250203779	114341	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
125	3723	Diana Carolina	Rodriguez	Rodriguez	1069924383	Casablanca	3502907398	20250201793	114046	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
126	3722	Luz Mary	Muñoz	Vasquez	41778806	Casablanca	3117782233	20250201830	114374	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
127	3719	Rene	Rodriguez	Montealegre	3103874	Casablanca	3143341197	20250203789	115182	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
128	3718	Carlos Alberto	Acosta	Rey	19492491	Casablanca	3114823893	20250201797	114322	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
129	3717	Liliana	Capera	Guzman	52539701	Casablanca	3124561214	20250201817	114188	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
130	3714	Sandra Milena	Salamanca	Cruz	52373591	Casablanca	3150187733	20250201796	114032	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
131	3713	Genri	Castro	Muñoz	10616895	Casablanca	3223196777	20250201786	114391	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
132	3712	Vicente	Fuentes	Devia	2932164	Casablanca	3506560932	20250201803	114112	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
133	3709	Antonio Maria	Torres	Chaparro	98190385	Casablanca	3142523207	20250202408	114397	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
134	3708	Miguel Angel	Vasquez	Callejas	5883664	Casablanca	3134548812	20250201827	114398	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
135	3707	Leido Libia	Rodriguez	Coronado	20875984	Casablanca	3105888937	20250203461	114338	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
136	3706	Blanca Cecilia	Castellanos	Reyes	51566073	Casablanca	3107598006	20250201793	114377	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
137	3703	Mary	Perdomo	Sanchez	40355887	Casablanca	3178931579	20250202411	114118	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
138	3702	Valvina Alderiris	Betancourt	Garzia	52714722	Casablanca	3184250695	20250201793	114047	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
139	3700	Andres Lucero	Rodriguez	Rodriguez	20781851	Casablanca	3165943956	20250201826	115174	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
140	3698	Martha Isabel	Romero	Diaz	65834359	Casablanca	3165018204	20250202348	114049	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
141	3696	Roque Jacinto	Romero	Simonja	11301783	Casablanca	3167182276	20250201800	114015	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
142	3695	Rosalba	Segura	de Bernal	23802980	Casablanca	3143986933	20250201784	114040	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
143	3694	Miriam	Romero	Rivas	20811812	Casablanca	3003062716	20250201785	114041	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
144	3693	Idarson	Romero	Reyes	80493391	Casablanca	3006331784	20250201795	114395	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
145	3692	Hernan	Romero	Reyes	11323343	Casablanca	3142333163	20250201803	114396	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
146	3691	Oscar	Romero	Reyes	11321492	Casablanca	3126852285	20250201820	114387	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
147	3690	Maria Nelly	Reyes	de Romero	20781553	Casablanca	3197780280	20250201819	114384	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
148	3689	Jair	Romero	Reyes	31042774	Casablanca	3167016247	20250201784	114392	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
149	3688	Mireya	Romero	Reyes	52053680	Casablanca	3197780280	20250201821	114383	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
150	3685	Elisabeth	Jimenez	Gongora	20813196	Casablanca	3142346428	20250201686	114007	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
151	3682	Blanca Nelly	Pinto		23798702	Casablanca	3222332652	20250202412	114044	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
152	3679	Bertilda	Romero	De Lopez	20781513	Casablanca	3118816331	20250201794	114037	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
153	3677	Leidy Angelica	Moreno	Garcia	20781924	Casablanca	3222115463	20250202411	114114	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
154	3676	Sara judith	Quijano	Rodriguez	51966558	Casablanca	3123678545	20250201828	114130	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
155	3675	Emma Graciela	Bautista	Villalobos	39564368	Casablanca	3154082795	20250202414	114371	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
156	3674	Luz Myriam	Bautista	Villalobos	39552750	Casablanca	3204000782	20250201800	114017	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
157	3673	Yaribeth	Galeano	Ibarra	39567453	Casablanca	3202018501	20250203481	114339	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
158	3672	Jorge Enrique	Garcia		79250533	Casablanca	3160729698	20250201816	114139	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
159	3671	Daniel	Pardo	Brigard	80411783	Casablanca	3017041845	20250201828	114043	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
160	3670	Miguel	Pardo	Brigard	79520939	Casablanca	3017041845	20250201799	114042	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
161	3669	Adelaida	Peñuela	Montaña	20876132	Casablanca	3134523775	20250201791	114087	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
162	3668	Victor	Barbosa	Albadan	3057051	Casablanca	3159263058	20250201816	114086	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
163	3667	Yamile	Cortes	Mongui	52872915	Casablanca	3044568389	20250201817	114323	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
164	3666	Delia	Fotesca	Camacho		Casablanca	3004029708	20250203786	114398	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
165	3665	John	Edvar	Hernandez	80493336	Casablanca		20250201825	114128	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
166	3664	Orlando	Hernandez		11298372	Casablanca	3112336324	20250202348	114046	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
167	3663	Beatriz Elena	Diaz	Herrera	39406094	Casablanca	3182039582	20250201817	114019	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
168	3662	Lilia	Ricaurte	Callixto	369585	Casablanca	3197803798	20250202348	114021	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
169	3661	Lilia Isabel	Gonzalez	Ricaurte	21078363	Casablanca	3166028663	20250202348	114022	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
170	3660	Tomas	Vargas	Celis	11221356	Casablanca	3139543151	20250201830	114124	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
171	3659	Cecilia	Garcia	Vanegas	39562958	Casablanca	3185797308	20250202411	114122	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
172	3658	Maria Oliva	Godoy	Ortegon	24226778	Casablanca	3204000618	20250201793	114102	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
173	3649	Jose Pablo	Romero	Rivas	11303094	Casablanca	3174701793	20250201801	114137	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
174	3648	Mariana Constanza	Lenis	Moreno	39583178	Casablanca	3183041847	20250201799	114117	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
175	3647	Maria del Pilar	Lenis	Moreno	39573331	Casablanca	3180374936	20250201830	114116	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
176	3645	Rudesinda	Garzon	Sanchez	39599982	Casablanca	3187274126	20250201784	114380	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
177	3644	Javier	Reyes	Rodriguez	80493081	Casablanca	3154808947	20250203787	114343	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
178	3643	Pedro Pablo	Soler	Moyano	10080364	Casablanca	3138337070	20250201815	114138	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
179	3642	Flor Alba	Cordoba	Martinez	39555459	Casablanca	3158907398	20250201797	114129	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
180	3640	Francisco Rafael	Valencia	de Aguas	19583001	Casablanca	3174257880	20250201803	114120	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
181	3639	Yuraris	Valencia	Sanchez	1069175309	Casablanca	3158894370	20250201792	114119	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
182	3638	Antonio	Fonseca	Rueda	31778808	Casablanca	3157091334	20250203815	114325	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
183	3636	Gentil	Molina	Reyes	3038650	Casablanca	3184913159	20250201818	114392	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
184	3635	Maria Mercedes	Vargas	DE Chacon	20818371	Casablanca	3134452440	20250201799	114111	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
185	3634	Jose Vicente	Castro	Cubillos	17098798	Casablanca	3163572483	20250203803	114035	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
186	3600	Damariz	Romero	Rivas	20875452	Casablanca	3183607741	20250203814	114393	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
187	3598	Beatriz	Rodriguez	Romero	20816531	Casablanca	3158899695	20250201823	114002	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
188	3590	Benjamin	Carvajal	Betancourt	88002612	Casablanca	3105984407	20250201818	114384	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
189	3589	Yuri Natalia	Carvajal	Montealegre	1069177433	Casablanca	3183274818	20250201818	114381	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
190	3588	Ludy	Romero	Reyes	20876123	Casablanca	3163701107	20250201819	114008	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
191	3586	Didier Alonso	Diaz	Herrera	71937950	Casablanca	3166984475	20250202411	114103	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
192	3584	Nancy	Molina	Vargas	20875961	Casablanca	3202262344	20250201800	114393	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
193	3583	Luis Carlos	Barbosa	Albadan	11324200	Casablanca	3166029249	20250204025	114345	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
194	3582	Yoreseves Javier	Reyes	Vargas	1069925689	Casablanca	3163938730	20250203787	114344	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
195	3581	Javier	Reyes	Ricardo	3150415	Casablanca	3123722880	20250203787	114342	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
196	3580	Leidy	Romero	Sanchez	1069174628	Casablanca	3167095808	40695120250	114010	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
197	3578	Yamile Andrea	Rodriguez	Caicedo	1069924282	Casablanca	3197227258	20250203789	115183	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
198	3577	Didier Anderson	Reyes	Bernal	80493671	Casablanca	3158899695	20250201793	114001	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
199	3576	Maria del Pilar	Vargas	Reyes	20876178	Casablanca	3175540859	20250201797	114390	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
200	3575	Betzaie	Bernal	Rodriguez	39559910	Casablanca	3158899695	20250201823	114353	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.

201	3574	Oscar Rodolfo	Rodriguez	Rodriguez	11321883	Casablanca	3178897516	20250201809[illegible]	114009	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
202	3573	Libardo	Rodriguez	Salazar	328218	Casablanca	3138036029	20250201826[illegible]	114107	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
203	3572	Nestor Giovanny	Sanchez	Machaca	79705617	Casablanca	3133563947	20250201798[illegible]	115186	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
204	3570	Marisela	Cruz	Moreno	52286090	Casablanca	3138129105	20250203781[illegible]	114087	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
205	3569	Nubia	Vargas	Bustos	39571362	Casablanca	3184779172	20250201793[illegible]	114108	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
206	3568	Oscar Oduyer	Acevedo	Hernandez	3104300	Casablanca	3125781205	20250203813[illegible]	114135	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
207	3566	Katherine	Olaya	Villalba	1069177017	Casablanca	3213712378	20250203804[illegible]	114134	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
208	3565	Monica Paola	Benavides	Ramos	52706454	Casablanca	3182958840	20250201792[illegible]	115179	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
209	3562	Nelson	Oliveros	Machacha	11303353	Casablanca	3162953827	20250201794[illegible]	114025	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
210	3561	Alfonso	Molina	Reyes	17032253	Casablanca	3152455314	20250202034[illegible]	114370	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
211	3560	Alba Luz	Alvarado	Cardenas	39847778	Casablanca	3209049885	20250202414[illegible]	114018	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
212	3558	Lady Johanna	Jimenez	Gomez	52735987	Casablanca	3197836421	20250201832[illegible]	114125	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
213	3557	Gabriel	Leal	Sanchez	11315179	Casablanca	3165821043	40535923025[illegible]	114381	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
214	3556	Yesica Lorena	Arias	Salazar	1069175906	Casablanca	3176539690	20250201800[illegible]	114375	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
215	3555	Hilda Maria	Rodriguez	de Rodriguez	26844280	Casablanca	3155056154	20250201800[illegible]	114027	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
216	3553	Maria Ismer	Rodriguez	Ricardo	20875364	Casablanca	3176137272	20250202411[illegible]	114028	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
217	3498	Oscar Yesid	Perdomo	Rodriguez	1069174395	Casablanca	3152125110	20250202411[illegible]	114131	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
218	3415	Nicolas	Molina	Vargas	80493486	Casablanca	3168321035	20250201817[illegible]	114248	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
219	3489	Francisco Antonio	Diaz	Robles	10109805	Casablanca	3153423208	20250201828[illegible]	114127	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
220	3420	Bertulfo	Calleias		11300972	Casablanca	3197608333	20230203417[illegible]	114245	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
221	3487	Oscar Orlando	Martinez	Martinez	7173628	Casablanca	3053898924	20250202411[illegible]	114123	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
222	3484	Laura Daniela	Cadinas	Molina	1069179059	Casablanca	3164913159	20250201787[illegible]	114034	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
223	3483	José Armando	Duque	Pineda	11220914	Casablanca	3153794674	20250201783[illegible]	114379	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
224	3482	Rosa Elvira	Pineda	De Duque	26844088	Casablanca	3153794674	20250201793[illegible]	114378	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
225	3480	Ramon Angel	Muñoz	Hoyos	80.214.24	Casablanca	3057987570	20250201828[illegible]	114326	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
226	3479	Mauricio	Muñoz	Hoyos	1033791822	Casablanca	3057987570	20250201799[illegible]	114327	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
227	3477	Luis Javier	Suarez	Becerra	19480258	Casablanca	3133618958	20250202348[illegible]	114236	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
228	3476	Lucas	Galindo	Rincon	93434585	Casablanca	3152886225	20250201816[illegible]	115180	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
229	3475	Gloria Aurora	Riaño	Sastoque	35486193	Casablanca	3206891042	20250204027[illegible]	114394	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
230	3472	James Eduardo	Romero	Cardenas	1069176202	Casablanca	3154362066	18211000835	114357	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
231	3471	Sandra Milena	Penagos	Mendez	20761844	Casablanca	3213984408	20250201826[illegible]	114395	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
232	3469	Cesar Humberto	Torres	Gonzalez	80036136	Casablanca	3138036029	20250202347[illegible]	114101	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
233	3468	Katherine Juliette	Torres	Gonzalez	1032408311	Casablanca	3138036029	20250201818[illegible]	114400	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
234	3467	Roberto	Mendoza	Garcia	19280917	Casablanca	3138036029	40535923025[illegible]	114399	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
235	3453	Angel Alberto	Bautista	Montaña	80493600	Casablanca	3134550658	20250202256[illegible]	115198	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
236	3464	Carmen Rosa	Marin		20815366	Casablanca	3150903599	20250202441[illegible]	114373	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
237	3463	Jhon Alexis	Arias	Salazar	80493657	Casablanca	3159376236	20250204024[illegible]	114332	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
238	3461	Heidy Yurani	Bautista	Rodriguez	1069178839	Casablanca	3214457809	20250202334[illegible]	114024	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
239	3460	Elena Patricia	Pulido	Cortes	20878249	Casablanca	3151559002	20250201823[illegible]	114009	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
240	3459	Andri Yarid	Carvajal	Pulido	1069179455	Casablanca	3114490233	20250201823[illegible]	114006	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
241	3458	Yamile	Marin	Peña	39647684	Casablanca	3143158177	20230203417[illegible]	115184	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
242	3457	Cristobal	Albadan		6937184	Casablanca	3138418754	20250203461[illegible]	114340	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
243	3456	Consuelo	Rodriguez	Romero	20761714	Casablanca	3123722880	20250203787[illegible]	115176	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
244	3454	Felix Antonio	Cardenas	Guerrero	80493389	Casablanca	3152508579	20250202348[illegible]	114033	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
245	3437	Elizabeth	Izquierdo	Grisales	26234323	Casablanca	3207098345	20250202512[illegible]	115190	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
246	3451	Angie Lorena	Pinzon	Falando	1013617417	Casablanca	3132562847	20250202513[illegible]	114148	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
247	3439	Flor Eugenia	Romero	Rivas	39560484	Casablanca	3176946491	20250203787[illegible]	115187	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
248	3438	Jose Manuel	Cardenas		3042784	Casablanca	3132807342	20250202414[illegible]	114012	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
249	3427	Juan Pablo	Cardenas	Rodriguez	11323878	Casablanca	3182392528	20230203563[illegible]	114367	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
250	3425	Manuel Antonio	Perdomo	Sanchez	11290512	Casablanca	3204915328	20250203779[illegible]	114328	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
251	3424	Jenifer Daniela	Villamizar	Romero	1003580345	Casablanca	3173680653	20250202409[illegible]	114110	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
252	3423	Amalia	Romero	Reyes	20875839	Casablanca	3173680653	20250201826[illegible]	114009	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
253	3419	Medardo	Vargas	Celis	80493534	Casablanca	3107950890	20250201829[illegible]	114085	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
254	3417	Edgar	Arias	Salazar	80493013	Casablanca	3198647199	20250202345[illegible]	114376	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
255	3463	Porfidio de Jesus	Rocha	Uscategui	7250588	Casablanca	3174861289	20250201832[illegible]	114240	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
256	3466	Jose Adolfo	Caicedo	Marin	11323804	Casablanca	3158993408	20250202251[illegible]	115192	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
257	3412	Juan Carlos	Cardenas	Vargas	1069926303	Casablanca	3182986366	20250202414[illegible]	114366	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
258	3411	Jimmy	Cespedes		3104260	Casablanca	3044588386	20250202412[illegible]	114324	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
259	3410	Maria del Rosario	Galindo	Guataquira	24197484	Casablanca	3134843848	20250201800[illegible]	114132	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
260	3473	Bertha Empevalina	Simbaqueva	Chavarro	24197843	Casablanca	3118849851	20250203804[illegible]	115194	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
261	3409	Lucrecia	Rios	Llevano	20820791	Casablanca	3158883646	20250201825[illegible]	115166	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
262	3408	Diego Fernando	Romero	Cardenas	7	Casablanca	3155137034	20250201818[illegible]	114388	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
263	3406	Hermidas	Castro	Galeano	8004713	Casablanca	3187932711	20250202348[illegible]	115172	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
264	3405	Luis Fernando	Castro	Reyes	1069925122	Casablanca	3159680980	20250201794[illegible]	115173	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
265	3404	Maria del Carmen	Erazo	Erazo	52066847	Casablanca	3130668785	20250201801[illegible]	114036	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
266	3488	Ana Lilia	Sanchez		20368133	Casablanca		20250202512[illegible]	114247	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
267	3346	Pedro	Reyes	Romero	80493290	casablanca	3183004680	20250203790[illegible]	115159	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
268	3345	Guillermina	Romero	Rivas	40361364	casablanca	3213680808	20250203787[illegible]	115158	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
269	3490	Ana Isabel	Torres	Sanchez	51888978	Casablanca		20250202513[illegible]	115187	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
270	3344	Oscar Jesid	Rojas	Niñez	79992211	casablanca	3113572318	20250203779[illegible]	114237	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
271	3343	luisa Fernada	Torres	Cabrera	52868114	casablanca	3118741757	20250203790[illegible]	115170	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
272	3337	Diana Patricia	Castro	Vasquez	53314332	Casablanca	3138339098	20250203460[illegible]	114336	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
273	3336	Juan Pablo	Romero	Alturo	80493423	Casablanca	3114579294	20250203460[illegible]	114334	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
274	3600	Francy Elena	Rodriguez	Romero	20376259	Casablanca	3246442954	20230203417[illegible]	114344	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
275	3332	Hernan	Romero	Rivas	11296067	Casablanca	3181795177	20250203461[illegible]	114335	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
276	3691	Fany Rocio	Moreno	Guzman	28723467	Casablanca	3196758503	20250201800[illegible]	114343	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
277	3684	Carlos Alberto	Rodriguez		11307628	Casablanca	3186825483	20250203777[illegible]	114242	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
278	3326	Yuri Magaly	Aguilar	Torres	1193224402	Casablanca	3174824306	20250203787[illegible]	115156	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
279	3323	Jenifer Natalia	Rodriguez	Lopez	1000588395	Casablanca	3204570021	20250203779[illegible]	115161	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
280	3322	Yineth	Cardenas	Rodriguez	20761875	Casablanca	3182392528	20250202414[illegible]	114013	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
281	3589	Mariano	Vargas	Reyes	80493018	Casablanca	3157999911	20250201829[illegible]	114239	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
282	3321	Olga Lucila	Araujo	Reyes	30848672	Casablanca	3144381899	40535820259[illegible]	114050	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
283	3317	Sandra Paola	Romero	Alturo	20876638	Casablanca	3114579294	20250201799[illegible]	114337	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
284	3318	Yamile Andrea	Rodriguez	Obando	39583192	Casablanca	3152246582	20250201826[illegible]	114369	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
285	3657	Emilcen	Calderon	Cruz	39583019	Casablanca	3152233914	40535320259[illegible]	114268	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
286	3315	Jose Manuel	Cardenas	Rodriguez	11315055	Casablanca	3118491568	20250201797[illegible]	114372	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
287	3312	Luz Maria	Cardenas	Rodriguez	39569013	Casablanca	3210842987	20250202348[illegible]	114368	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
288	3310	Omaira	Cardenas	Rodriguez	20876037	Casablanca	3184096807	20250201792[illegible]	114014	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
289	3308	Oemary	Valderrama	Carvajal	1117820748	Casablanca	3151599163	20250201803[illegible]	114118	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
290	3302	Jose Alejandro	Alarcon	Bernal	3104071	Casablanca	3004617018	20250203807[illegible]	114098	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
291	3681	Blanca Maria	Palomino	Cubides	41501707	Casablanca	3509936821	20250201816[illegible]	114241	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
292	3684	Carmen Rosa	Albadan	de Barbosa	20819632	Casablanca	3132480992	20250202256[illegible]	115188	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
293	3690	Rosaly	Sanchez	Avendaño	39558727	Casablanca	3108515381	20250201816[illegible]	115191	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
294	3715	Yeison Alexander	Gonzales	Sepulveda	1030600640	Casablanca	3137322346	20250209417[illegible]	114266	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
295	3748	Aniceto	Rincon	Rodriguez	17157178	Casablanca	3214838585	20250202256[illegible]	114256	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
296	3808	Maria Roxana	Salazar		30004418	Casablanca	3118395330	20250203804[illegible]	114126	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
297	3443	Sara Valentina	Hernandez	Gonzalez	1011086265	Casablanca	3105615275	20250202507[illegible]	115193	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
298	3445	Jorge Alirio	Rodriguez	Garcia	1069174895	Casablanca	3186204195	20250203314[illegible]	114265	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
299	4000	Judy Marcela	Rodriguez	Cortes	20761959	El Portal	3158880864	20250203798[illegible]	114099	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
300	3998	Jherman Jair	Moran	Bautista	1069177136	El Portal	3219141958	20250201819[illegible]	114311	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
301	3996	Brayan Delber	Moran	Bautista	1003834150	El Portal	3153804889	20250201819[illegible]	114313	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.

302	3997	Sneider Stiven	Moran	Bautista	1069177478	El Portal	3171483950	20250220041119	114312	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
303	3996	Jineth Milena	Moran	Bautista	1069178374	El Portal	3112137702	20250220161343	114309	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
304	3995	Romario	Moran	Bautista	1069178532	El Portal	3059706360	20250220161021	114307	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
305	3993	Edison	Vargas	Suarez	1069174099	El Portal	3224406168	20250220379000	114210	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
306	3992	Luz Adriana	Vargas	Suarez	20878198	El Portal	3143837072	20250220181155	114208	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
307	3991	Jhon Faber	Calcedo	Alvarado	1070816651	El Portal	3106121080	20250220182258	114051	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
308	3990	Arcenio	Montaña	Cardozo	11300573	El Portal	3124015994	20250220378701	115151	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
309	3989	Marisela	Alvarado	Montaña	39573349	El Portal	3164787842	20250220182211	114171	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
310	3988	Ancizar	Calcedo	Ruiz	14261205	El Portal	3118597526	20250220179481	114172	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
311	3987	Nancy	Montaña		39586296	El Portal	3134899592	20250220241211	114170	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
312	3986	Lisandro	Hernandez	Salazar	11220284	El Portal	3126659298	20250220192991	114169	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
313	3985	Sirley	Rodriguez	Nieto	1069178517	El Portal	3118089816	20250220401511	114176	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
314	3983	Guillermo de Jesus	Martinez	Cardona	16505367	El Portal	3156493658	20250220379501	114302	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
315	3982	Tatiana	Ramirez	Bucuru	39578305	El Portal	3007788525	20250220241421	114198	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
316	3981	Eduardo	Jutinico		3047038	El Portal	3217899983	20250220183031	114199	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
317	3979	Lilia	Alvarado	Montaño	39571964	El Portal	3153707587	20250220181531	114156	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
318	3978	Nubia Janneth	Quintero	Morales	51844439	El Portal	3143032483	20250220179791	114165	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
319	3977	Jessica	Hernandez	Alvarado	1069177558	El Portal	3153707587	20250220179791	114154	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
320	3976	Ingrid Paola	Rubio	Zambrano	1111169409	El Portal	3027784748	20250220341011	114197	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
321	3975	Derly Johana	Salazar	Feria	1069824442	El Portal	3107536877	20250220179521	114225	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
322	3973	Blanca Maria	Briñez	Guzman	28964984	El Portal	3138445114	20250220341381	114095	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
323	3972	Trinidad	Bolivar	Martinez	41774118	El Portal	3189159446	20250220179921	114314	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
324	3971	Jose Yesid	Bautista	Martinez	11313149	El Portal	3189038389	20250220181521	114306	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
325	3969	Ana Cristina	Gonzalez	Erazo	52758872	El Portal	3187319429	20250220402751	114158	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
326	3968	Benita	Diaz	Montaña	39586232	El Portal	3508671335	20250220179531	114180	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
327	3967	Graciela	Montaña	Cardozo	39610911	El Portal	3223660437	20250220379261	114194	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
328	3966	Arturo	Daniel	Orjuela	11284357	El Portal	3156243699	20250220341401	114078	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
329	3965	Luz Stella	Garcia		39586294	El Portal	3115707439	20250219019	114204	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
330	3964	Jesus Aracell	Plata	Rodriguez	39557423	El Portal	3154910237	20250220379691	114097	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
331	3963	Luz Marina	Rincon	Sanchez	48367181	El Portal	3168880879	20250220402761	114059	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
332	3962	Lucia	Posada	Hernandez	52655253	El Portal	3173543590	20250220378891	114200	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
333	3961	Ana Cilenia	Gutierrez	Rubiano	41452657	El Portal	3105561401	20250220381551	114317	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
334	3960	Antonio	Guayara	Clavijo	3150665	El Portal	3181806471	20250220403691	114058	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
335	3958	Greisy Alejandra	Devia	Gutierrez	20876182	El Portal	3155894152	20250220182621	114092	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
336	3957	Humberto Hernando	Rincon	Lopez	4562226	El Portal	3132311170	20250220378661	114190	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
337	3956	Hilda Johana	Escorcia	Duarte	52788453	El Portal	3216893095	20250220179561	114161	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
338	3955	Mirta Encarnacion	Solarte	Erazo	59790512	El Portal	3197152903	20250220340931	114147	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
339	3954	Beatriz	Higuera	Uribe	51596723	El Portal	3143287138	20250220180091	114157	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
340	3953	Noralba	Franco		41538972	El Portal	3114862635	20250220340951	114159	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
341	3828	Teresa	Bautista	Martinez	39566545	El Portal	3143718661	20250220183061	114318	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
342	3826	Sulay	Medina	Gallo	52728263	El Portal	3183487342	20250220181511	114213	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
343	3822	Alba Marina	Herran	Castro	28627888	El Portal	3505818701	20250220178331	114070	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
344	3820	Maria Paula	Mariano	Navarro	1005872441	El Portal	3238778151	20250220377971	114321	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
345	3808	Yamile	Barrera	Montaña	39586369	El Portal	3114639469	20250220402741	114220	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
346	3798	Jose Ricardo	Lizcano	Lizcano	79789384	El Portal	3202339430	20250220378201	114223	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
347	3089	Clara Ines	Tapiero	Garcia	52280157	El Portal	3175770648	20250220181611	114291	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
348	3797	Jose Geovanni	Rodriguez	Cortes	14263540	El Portal	3144008500	20250220379461	114100	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
349	3796	Jose San Jacinto	Rojas	Alvarado	3250560	El Portal	3155887215	20250220240911	114141	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
350	3795	Luz Estella	Garcia		65822428	El Portal	3175430047	20250220241001	114094	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
351	3793	Maria Aide	Hernandez	Maheche	30327553	El Portal	3224120463	20250220183181	114068	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
352	3792	Nidia Ines	Urrea	Acosta	51693322	El Portal	3209606036	20250220179541	114064	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
353	3791	Yulieth Paola	Maestre	Arias	49723545	El Portal	3144004764	20250220378951	115154	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
354	3789	Maria Ismar	Suarez	Duque	39558146	El Portal	3107926771	20250220180171	114207	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
355	3787	Monica Andrea	Cardozo	Hernandez	1069174526	El Portal	3186839535	20250220179771	114183	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
356	3785	Jesus Alvaro Antenor	Jimenez	Monteya	19142934	El Portal	3167514755	20250220179451	114078	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
357	3784	Diana Rocio	Hernandez	Maheche	1069175810	El Portal	3158836080	20250220180311	115153	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
358	3783	Jose Ismael	Hernandez	Maheche	11328650	El Portal	3177565343	20250220181571	114189	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
359	3782	Maribel	Rodriguez	Nieto	1069924471	El Portal	3196839873	20250220402641	114175	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
360	3779	Roberto	Lopez	Espitia	19334700	El Portal	3167514755	20250220402651	114077	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
361	3778	Sandra Patricia	Feria	Cortes	39781811	El Portal	3107936977	20360220181311	114228	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
362	3777	William	Ardila	Medina	80373929	El Portal	3167514755	20250220401531	114079	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
363	3776	Luis Guillermo	Gomez		2918223	El Portal	3214261431	20250220401581	115168	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
364	3774	Jose Fredy	Diaz	Quintero	80469535	El Portal	3224306798	20250220401541	114080	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
365	3773	Luz Albenis	Diaz	Quintero	52474771	El Portal	3167514755	20250220402631	114081	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
366	3772	Luz Mila	Parra	Bautista	20876157	El Portal	3218509087	20250220378161	114224	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
367	3770	Aurelio	Hernandez	Salazar	11322154	El Portal	3187595014	20250220179291	114181	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
368	3769	Blanca Milena	Marin	Briñez	39573983	El Portal	3114899873	20250220180181	114148	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
369	3768	Jose Orlando	Cortes	Rodriguez	11312452	El Portal	3017041848	20250220182221	114183	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
370	3765	Javier Alejandro	Bernal	Rueda	79399992	El Portal	3233030706	20250220182201	115155	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
371	3764	Maryuri Marleny	Ocampo	Gomez	1192787322	El Portal	3219337799	20250220182891	114301	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
372	3763	Maria Rosa	Cuy	Ortiz	20568998	El Portal	3118301833	20250220381531	114203	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
373	3762	Luz Marina	Cortes	Rodriguez	20875865	El Portal	3134029363	20250220182391	114066	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
374	3760	Maria Yolanda	Franco	Hernandez	51936596	El Portal	3144325770	20250220182401	114195	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
375	3759	Guillermina	Montaña	de Alvarado	20821809	El Portal	3158363488	20250220378231	114193	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
376	3758	Sonia	Pachon	Castiblanco	39739965	El Portal	3214685490	20250220181981	114182	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
377	3756	Alvaro	Carvajal	Herrera	14349697	El Portal	3204871357	20250220180151	114212	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
378	3755	Samir Alfredo	Gutierrez	Torres	78111777	El Portal	3144287553	20250220378641	114056	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
379	3754	Aldemar	Calcedo	Ruiz	14250720	El Portal	3183497818	20250220182151	114153	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
380	3752	Maria Elena	Saenz	Flores	39558364	El Portal	3026731539	20250220378251	114303	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
381	3751	Ofilia	Salazar		39558329	El Portal	3183828362	20250220182181	114140	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
382	3750	Ana Marlen	Cruz	De Rojas	35373895	El Portal	3155887216	20250220381421	114229	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
383	3742	Yuisner	Cantillo	Baldarriaga	1070585506	El Portal	3164272079	20250220241371	114091	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
384	3736	Jorge	Rodriguez	Cortes	1069924143	El Portal	3184439736	20250220379741	114191	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
385	3730	Carlos Augusto	Rojas	Cruz	80155351	El Portal	3155887516	20250220381541	114164	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
386	3318	Gerardo	Vargas	Olaechica	5801748	El Portal	3153220781	20250220182461	114289	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
387	3721	Yuli Alejandra	Lopez	Garcia	1093772461	El Portal	3178485588	20250220378881	114098	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
388	3711	Luis Carlos	Pedreros	Buitrago	11303896	El Portal	3173721656	20250220240881	114233	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
389	3325	Pedro Joaquin	Salcedo	Gonzalez	6017882	El Portal	3204471634	20250220225661	114299	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
390	3887	Ferney Andres	Bautista	Montaña	1069179111	El Portal	3217718931	20250220379211	114192	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
391	3886	Jose Javier	Barbosa	Montaño	11207051	El Portal	3186288379	20250220402781	114219	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
392	3883	Luis Antonio	Cruz	Sanchez	3208071	El Portal	3219579810	20250220240921	114184	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
393	3880	Maria Nelly	Piñeros	Amaya	1069174369	El Portal	3184923557	20250220180071	114144	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
394	3327	Cecilia Eunice	Prieto	Duarte	35313674	El Portal	3219105873	20250220402511	114293	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
395	3856	Jose	Herrera	Alvarado	79317047	El Portal	3123049021	20250220378171	114227	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
396	3855	Mireya	Ruiz	Silva	51731004	El Portal	3126833280	20250220378201	114228	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
397	3854	Keren Liseth	Gonzalez	Devia	1069175747	El Portal	3155864152	20250220179511	114074	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
398	3853	Carmenza	Cartagena	Diaz	20818065	El Portal	3177457937	20250220240981	114214	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
399	3852	Orlay	Rodriguez	Cortes	3104373	El Portal	3104788614	20250220377931	114187	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
400	3851	Maria Nelly	Gracia	Garavito	51597279	El Portal	3164272079	20250220179681	114073	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
401	3334	Exenever	Garcia			el portal	3142482568	20250220402471	114280	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.
402	3342	Nasli Yuliet	Guayara	Yara	1069179306	El Portal	3224037600	20250220401581	114072	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S.

403	3632	Danilo	Cardozo	Martinez	14249903	El Portal	3214645709	20250219022	114068	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
404	3631	Hilberto	Sanchez	Quintana	19134160	El Portal	3192339836	20250018285	114178	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
405	3630	Luz farid	Rodriguez	Gutierrez	20875932	El Portal	3175890244	20250024123	114179	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
406	3629	Maria Dora	Reyes		41483723	El Portal	3134824797	20250018298	114231	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
407	3628	Leslie Yulie	Cruz	Reyes	52278736	El Portal	3134824797	20250024087	114230	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
408	3625	Flor Stella	Cruz	Reina	41480655	El Portal	3134824797	20250018219	114232	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
409	3624	Manuel	Bautista	Martinez	79350648	El Portal	3038423425	20250037944	114316	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
410	3623	Jose Willian	Vargas	Suarez	80493710	El Portal	3219186978	20250018279	114208	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
411	3622	Hernando	Medina		91301413	El Portal	3185012224	20250024138	114304	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
412	3621	Higinio	Guayara	Clavijo	80493035	El Portal	3186853924	20250017991	114053	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
413	3620	Ruben Antonio	Saldarriaga	Cardozo	80493987	El Portal	3186773360	20250037796	115180	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
414	3619	Olga Lucia	Saldarriaga	Cardozo	39593070	El Portal	3186773360	20250034809	114090	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
415	3618	Carmen Alicia	Cantillo	Reyares	20761923	El Portal	3142018356	20250037857	115183	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
416	3617	Laura Ines	Ramos	Jimenez	39827019	El Portal	3124891817	20250018013	114166	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
417	3616	Yeyni	Vargas	Gutierrez	1069174120	El Portal	3212093882	20250040155	114167	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
418	3615	Dora	Gutierrez		20875583	El Portal	3212093882	20250017997	114215	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
419	3614	Leydi	Milena	Rodriguez	20878354	El Portal	3153784759	20250040268	114174	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
420	3613	Leonilde	Vera	de Gomez	203351291	El Portal	3214381421	20250038141	114221	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
421	3612	Gabriel	Hernandez	Mahecha	80493958	El Portal	3157364833	20250018322	115181	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
422	3611	Edelmira	Gualtero		33905050	El Portal	3214557915	20250040267	114173	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
423	3610	Angie Daniela	Amaya	Diaz	1000136413	El Portal	3177275032	20250018258	114075	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
424	3608	Gloria Stephanie	Bermudez	Ospina	1069176865	El Portal	3106282132	20250038151	114218	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
425	3607	Aleyda	Castillo	Ortiz	39581837	El Portal	3123287083	20250024096	115182	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
426	3606	Guillermo	Corredor		80495136	El Portal	3189321278	20250037949	114093	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
427	3604	Gloria	Marin	Brihez	39575563	El Portal	3176461803	20250024135	114096	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
428	3603	Ana Elvia	Diaz	Montaña	20875555	El Portal	3159367885	20250018010	114061	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
429	3601	Gloria Omaira	Romero	Mariño	51833916	El Portal	3133911170	20250037924	114222	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
430	3596	Jose David	Gutierrez	Barrero	79511056	El Portal	3200872707	20250038045	114151	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
431	3595	Gilberto	Bautista	Martinez	11302661	El Portal	3143716661	20250018195	114308	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
432	3593	Carolina	Diaz	Cortes	1069176322	El Portal	3163490804	20250018192	114062	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
433	3592	Maria Nelly	Villamil	Toscano	20915501	El Portal	3167095908	20250040157	114055	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
434	3585	Luz Ade	Rodriguez	Gutierrez	20875833	El Portal	3132130772	20250240277	114196	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
435	3580	Jesus Antonio	Ramirez	Torres	19384384	El Portal	3138370196	20250038078	114189	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
436	3564	Esneider	Diaz	Cortes	1069175698	El Portal	3151283357	20250017995	114065	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
437	3562	Victor Manuel	Rodriguez	Gutierrez	17844451	El Portal	3128008838	20250018242	114216	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
438	3551	Luz Stella	Diaz	Cortes	1069174558	El Portal	3151283357	20250018241	114084	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
439	3413	Esther Julia	Arteaga	Ballesteros	51796570	El Portal	3102004656	20250024141	114290	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
440	3496	Jorge Eliecer	Borda	Vasquez	19451197	El Portal	3143421520	20250040252	115185	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
441	3495	Alvaro	Diaz	Garcia	5880949	El Portal	3212181736	20250018290	114348	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
442	3494	Erika Gisela	Garcia	Diaz	1015448538	El Portal	3139741805	20250018287	114347	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
443	3493	Guillermo	Santos	Tafur	3045806	El Portal	3112137702	20250018291	114349	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
444	3492	Jose Leonardo	Bermudez	Ospina	1069177365	El Portal	3509136458	20250018293	114350	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
445	3491	Jose Simonal	Garcia	Rojas	93130875	El Portal	3133466880	20250018292	114348	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
446	3401	Hector Alfonso	Muñoz	Ruiz	80417369	El Portal	3219790563	20250033142	115300	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
447	3478	Camilo	Reyes		2322736	El Portal	3125917361	20250024120	114057	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
448	3453	Francisco Javier	Sanchez	Gomez	1053770142	El Portal	3227878609	20250037890	114301	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
449	3421	Carlos Mario	Forero	Posada	80430207	El Portal	3144360771	20250240152	114177	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
450	3407	Irene Marcela	Moreno	Moreno	1014284644	El Portal		20250037898	114182	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
451	3348	Alvaro Andres	Bautista	Popo	10497288	El Portal	3022240279	20250037894	115179	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
452	3340	Icaro Vernette	Rojas	Cardenas	79177626	El Portal	3212432264	20250024995	115184	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
453	3339	Fernanda Catalina	Velandia	Soto	52322064	El Portal	3123603060	20250240248	115152	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
454	3499	Juan Domigo	Diaz	Padilla	1106306991	El Portal	3208747304	20250038157	114298	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
455	3338	Eloisa	Diaz	Garcia	28628002	El Portal	3133714030	20250202564	115188	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
456	3333	Juan Ramon	Diaz	Ramiro	1106306948	El Portal	3106086909	20250038158	114206	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
457	3331	Luisa Maria	Bermudez	Ospina	1069178197	El Portal	3219166500	20250038156	114217	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
458	3330	Ulises	Diaz	Garcia	5880471	El Portal	3115707439	20250037798	114205	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
459	3597	Jaime	Suarez	Caviedes	3150849	El Portal	3208756845	20250018288	114211	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
460	3328	Clementina	Guayara	Clavijo	39588958	El Portal	3184597779	20250040071	114052	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
461	3802	Rosa Evelia	Cruz	Reina	35335657	El Portal	3022158326	20250024996	114249	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
462	3833	Ana Belba	Diaz	Barrera	20818737	El Portal	3002369801	20250018283	114300	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
463	3099	Isabel	Bautista	Martinez	20471878	El Portal	3213780741	20250018193	114320	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
464	3878	Yeni Paola	Piñeros	Arraya	1069624983	El Portal	3159208129	20250202562	115197	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
465	3098	Margarita Maria	Ruiz		39719234	El Portal	3134368708	20250024139	114142	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
466	3097	Eley	Cortes	Rodriguez	39580152	El Portal	3154227136	20250037845	114188	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
467	3096	Blanca Nubia	Alfonso	Espitia	39589891	El Portal	3115039564	20250018244	114310	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
468	3095	Adelayda	Peña	Pedraza	20878112	El Portal	3180940419	20250018297	114082	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
469	3094	Lucia	Pedraza	Salazar	20920154	El Portal	3203978717	20250018307	114150	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
470	3093	Maria Lourdes	Perez	Paez	39588113	El Portal	3219203141	20250018020	114195	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
471	3091	Hector Jose	Rivera	Vera	7333865	El Portal	3027411060	20250037874	114319	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
472	3090	Jesus Emigdio	Gonzalez	Gonzalez	19225018	El Portal	3164272079	20250017967	114071	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
473	3088	Martha	Montaño		39585785	El Portal	3153062730	20250018345	114143	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
474	3086	Santiago	Peñuela	Malaver	3047190	El Portal	3186773684	20250038136	114235	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
475	3085	Rosalbina	Peñuela	Montaño	39570788	El Portal	3186773684	20250038135	114234	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
476	3084	Maria Elena	Rodriguez	Chingate	39580800	El Portal	3203980236	20250024124	114149	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
477	3083	Elsa Maria	Hernandez	Mahecha	20878090	El Portal	3175819812	20250024102	114146	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
478	3082	Zenaida	Carrino	Peña	34599833	El Portal	3194816372	20250018020	114315	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
479	3081	Mirella	Montaño	Sainz	39580080	El Portal	3025214880	20250037922	114305	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
480	3080	Rosalba	Pallares	Lopez	57400299	El Portal	3028408874	20250037919	114089	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
481	3079	Omayra	Cortes	Diaz	1069175700	El Portal	3504502995	20250018295	114160	SANTIAGO GONZALEZ	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
482	3743	David Fabian	Bautista	Carcino	1069177477	El Portal	3161084503	20250025073	115199	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
483	3781	Hector Ariel	Gonzalez	Hernandez	79721458	El Portal	3144435770	20250017943	114283	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
484	3787	Franny	Parra	Bautista	1069177379	El Portal	3103169451	20250037818	114279	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
485	3780	Janneth	Cortes	Rodriguez	20875877	El Portal	3166764828	20250038075	114295	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
486	3796	Jose Antonio	Diaz	Montaño	11310393	El Portal	3151263357	20250018194	114083	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
487	3790	Jhon Jairo	Cortes	Diaz	1069174591	El Portal	3183624032	20250017965	114145	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
488	3959	Alirio	Belarano	Rojas	3209223	El Portal	3115106113	20250025078	114296	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
489	3970	Carlos Alberto	Torres	Salamanca	11291709	El Portal	3122733798	20250037778	115195	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
490	3974	Alvaro	Gutierrez	Jaramillo	14196634	El Portal	3222869841	20250024122	114284	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
491	3994	Edwin Libardo	Beltran	Rueda	80793563	El Portal	3204641758	20250201916	115196	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
492	3440	Luz Angela	Rojas		39830448	El portal	3108187765	20250022583	114294	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
493	3442	Mario Isaias	Piñeros		388 395	El portal	3108890815	20250025078	114292	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
494	3446	Gina Paola	Garcia	Riascos	30983697	El Portal	3103075628	20250233138	114297	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
495	3341	Sergio	Sanchez	Rueda	80153428	El portal	3504570777	20250024991	114281	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
496	3439	Julia Cristina	Bernal	Rueda	52119074	El portal	3213927173	20250025133	114282	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S
497	3481	Martha Isabel	Ospina	Garcia	20878109	Portal	3204225024	20250018294	114202	JUAN SEBASTIAN SANABRIA	1A INGENIERIA Y GAS S.A.S

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



BITÁCORA DE OBRA

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

Convenio 029-2025-SIUFA-SP-018
Proyecto: Legalización domiciliaria redes Casablanca, Cabrera y El Portal. Contratista Avances SAS
06 Enero de 2026
Reunión
Se inician actividades del proyecto como: Instalaciones de las labores ejecutadas en el año 2025. De la Continuidad a la ejecución de Instalaciones Internas domiciliarias en Vereda Casablanca y a las Excavaciones para la red principal en el mismo Sector.
Interventoría
Supervisión Avances

07 Enero de 2026
Se Continua Con las actividades de Instalaciones Internas en vereda Casablanca y Excavaciones en red principal
Interventoría

08 Enero de 2026
Se mantienen las Actividades de Instalaciones Internas domiciliarias y excavaciones en red ppal
Se adiende solicitud Ciudadana presentada por Usuario del Sector Alexander Pareda Sanchez de la Vereda Casablanca, Sector Predio privado. Se realiza la visita y verificación Técnica con los Profesionales de Oficina de Servicios Públicos y se toman las medidas Correctivas sobre la red de gas Instalada. Se realiza y firma Acta de Atención a la Solicitud del Usuario NRO 1747 del 18 Diciembre de la Provincia.
Rémulo Rivera
Interventoría.

09 Enero de 2026
Se mantienen las actividades de Instalaciones Internas y excavación manual para red principal en la Vereda Casablanca
Interventoría

811

Powered by CamScanner

Convenio de Inversión 024-2025-SUCRE-ST-018
Proyecto: Ampliación domiciliaria Veredas Casablanca, Gallegos y El Portal, Municipio: Arboledas Norte
26 de Enero de 2026
Se mantienen instalaciones internas en Casablanca y El Portal. Se realiza el retiro de instalaciones sobrantes domiciliarias en la vereda Gallegos. Continúan trabajos de red principal en Casablanca. Se requiere la excavación Mecánica y Manual para red principal en vda Gallegos
Ing. Residente Obra — Enlace Municipal

27 de Enero de 2026
Se ejecutan instalaciones internas en las veredas Casablanca, El Portal y Gallegos. Excavación mecánica y manual en vereda el Gallegos para Colocación de la red principal. Se realiza la terminación de la Colocación de red principal en la vereda Casablanca

Ing. Residente — Almacenista

29 de Enero de 2026
Se Continuan las instalaciones internas domiciliarias en viviendas del Convenio. Se da inicio a la Excavación manual para la Colocación de la red principal en la vereda El Portal. Identificando el trazado para la Colocación de red en el Portal

Ing. Residente — Enlace Municipal

Cordia 20 de Enero de 2026
Continuidad de las instalaciones internas en las tres veredas. Instalación de red y excavaciones para red principal, Excavaciones mecanicas y manual para red en Vereda Gallegos

Ing. Residente — Enlace Municipal

Powered by CamScanner

Convenio de Asociación [illegible] 2025 [illegible]
Proyecto Construcción complementaria Viviendas [illegible]
Callejón y El Portal. Contratista: [illegible]
21 de Enero de 2026
Avance en instalaciones internas domiciliarias y [illegible]
de instalación de red en el Portal y Excavaciones en [illegible]
el Callejón

Supervisor

Interventor

22 de Enero de 2026
Se mantienen instalaciones internas en las tres Viviendas
Continua instalación de red en el Portal y excavación Manual
en y manual en Callejón

Interventor

23 de Enero de 2026
Se ejecutan instalaciones internas en Viviendas, el Portal
y Callejón junto con instalación de red en el portal y Excavaciones
para red principal en Calle Callejón
24 de Enero de 2026
Continuidad de instalaciones internas domiciliarias en
las tres viviendas intervenidas, se continúa la instala-
ción de red en el portal y excavaciones en Callejón
26 de Enero de 2026
Se sigue la actividad de construcción de instalacio-
nes internas domiciliarias en las tres Viviendas continúan
trabajos de instalación de red en el Portal y excavación
Manual y mecanizada en el Callejón

Supervisor

Interventor

Reporte de Periodo del 27 enero al 31 enero de 2026
El proyecto ha avanzado en instalaciones internas y
se mantienen las instalaciones internas en las tres viviendas
se termina la excavación Manual y Mecanizada de la ins-
talación de red en todo el Callejón

Interventor

Consorcio de Asociación NRO 029-2025-Silvia-Sur-08
Proyecto Gasificación Domiciliaria Vereda Casablanca, Calluga
y El Portal Corregimiento Tuquerres

02-Febrero de 2026
Continuidad de Instalaciones internas en Casablanca, Ca
llejon y El Portal. Avance en la Instalación de Red
principal en el Portal.
Inicio de Certificación de Instalaciones internas
03-febrero de 2026
Continuidad de Instalaciones internas en las tres Veredas y
Avance en red principal en el Portal. se realizan Certi
cación de Instalaciones internas.
04-Febrero de 2026
Se realiza por parte de la supervisión del proyecto (S
visita técnica de verificación en Campo, con el fin de
Constatar el estado actual de las obras ejecutadas.
Asi mismo se realizo la verificación del estado de
Avance de la red principal de gasificación y estable
cer Compromisos vinculantes con el Contratista de Obra
para mitigar los retrasos identificados frente al Cro
nograma vigente. Se levanta y firma acta de visita.
Interventoria Floyd Pedersen
Heinzio Olaya Avanges SAS
05-Febrero de 2026
Avance en Instalaciones internas y trabajos de la red
Principal en el Portal Con supervisión de excavaciones,
Trancisiones y Acometidas
Suspensión de Actividades en Jornada PM por ries
de derrombes en excavacione. Llovia Moderada
06 Febrero de 2026
Continuidad de Instalaciones Internas, Certificacion
y red principal en el portal
Dia con lluvina lo cual Condiciona el rendimiento
en las excavaciones por presencia de lodo.
Interventoria Avanges Elias Hoyos

Convenio de Asociación #110 007-2025 - SOMYLA-FT-018
Proyecto: Certificación domiciliaria Veredas Casablanca, Callejón y El Portal Continuidad - Avances SAS
07-Febrero de 2026
Continuidad de instalaciones internas y red principal en vereda el Portal. Se continuan las certificaciones en las tres veredas. Día nublado con lloviznas pero nivel bajo en excavaciones de Red principal por presencia de lecho
08-Febrero de 2026 (Domingo) No Laboran.
09-Febrero de 2026
Actividades de Instalaciones internas en las tres veredas, Certificaciones de Internas
Lluvia fuerte que obliga a suspención de Actividades
Primero Oliveros
Interventoría
Avances SAS
10 Febrero de 2026
Continuidad de Instalaciones internas, Certificaciones y Trabajos en red principal en El Portal con Revisiones de excavaciones y Colocación de Cinta de seguridad.
11 Febrero de 2026
Avance en Instalaciones internas en Casablanca, Callejón y El Portal así como en la Red principal en El Portal
12 Febrero de 2026
Continuidad de Instalaciones internas y Supervisión de excavaciones, tranciones y acometidas en la red principal del Portal.
13 Febrero de 2026
Avance en Instalaciones internas domiciliarias, Certificaciones de las mismas, Trabajos de red principal El Portal
14 Febrero de 2026
Instalaciones y Certificaciones de internas en las tres veredas.
Día de lluvia Fuerte, Inundación de Algunos Tramos de excavación Correspondiente a red ppal de El Portal.
Interventoría
Avances SAS
E Gas Hurtado

Powered by CamScanner

Convenio de Asociación 078-2025 - 25702 - 01 - 017
Proyecto: Legalización domiciliaria predios Casablanca, La Aldea y El Portal. Contratista: Alvarez SA
23 Febrero de 2026
Continuidad de Certificación e Instalaciones internas y Avance en red principal de El Portal.
24 Febrero de 2026
Avance en instalaciones internas y Certificaciones Finales de red Principal en El Portal
25 Febrero de 2026
Terminación de Instalación de red principal en Predio el Portal, incluyendo verificación de presencia de excavación Transiciones, Hincadas, Colocación de cinta de seguridad y Tapado de excavaciones
26 Febrero de 2026
Continuidad de Instalaciones Internas en Casablanca, Allerión y El Portal. Certificación de instalaciones internas
27 Febrero de 2026
Avance de Instalaciones Internas y Certificaciones
28 Febrero de 2026
Continuidad de Instalaciones internas domiciliarias y Certificaciones alcanzando 410 Certificaciones durante el mes y un acumulado de 473 Instalaciones Certificadas al 28 de Febrero
Casablanca 213
Callejón 73
El Portal 187

Heinerio Olaya D. Interventoria
Elias Hoyos Alvarez

Marzo 01 de 2026
Domingo día No Laboral en Campo

Heinerio Olaya D. Interventoria

Powered by CamScanner

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



ENSAYO DE RESISTENCIA DE COMPRESIÓN

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

CONSTRUCSUELOS Y.A.

Laboratorio de suelos, Diseño y Concreto

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV E - 410 -13

PROYECTO: SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA


LOCALIZACION: VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

No.	CEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA A 28 DIAS	% DE RESISTENCIA REQUERIDA	TIPO DE FALLA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	(%)		
1			210	3000	13/03/2025	20/03/2025	7	267,9	26216,32	144,2	2060	2996	68,7%	
2			210	3000	13/03/2025	27/03/2025	14	309,9	31600,61	173,2	2478	3598	82,5%	
3			210	3000	13/03/2025	10/04/2025	28	385,5	39309,82	216,6	3079	4464	102,6%	

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Dias	39% a 47%	14 Dias	81% a 86%
7 Dias	62% a 68%	28 Dias	100% como mínimo

CILINDROS DE CONCRETO DE 6"



OBSERVACIONES: EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL Y SELLO SECO

Responsable

JAIME ESMITH BAUTISTA LASSO
MP. 25202- 120062 CND

Laboratorista

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
SUELO Y PAVIMENTO

Libro2

Powered by CamScanner

CONSTRUCSUELOS Y.A.

Laboratorio de suelos, Diseño y Concreto.

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV E - 410 -13

PROYECTO: SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA


LOCALIZACION: VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

No.	CEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA 28 DIAS	PORCENTAJE RESISTENCIA	TIPO DE FALLA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	PSI	COMPRESION	
1			210	3000	11/03/2025	18/03/2025	7	255,5	26053,59	142,8	2040	2909	69,8%	
2			210	3000	11/03/2025	25/03/2025	14	307,9	31396,67	172,1	2459	3505	82,0%	
3			210	3000	11/03/2025	08/04/2025	28	377,2	38463,46	210,9	3012	4295	100,4%	

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Dias	39% a 47%	14 Días	81% a 85%
7 Dias	62% a 66%	28 Días	100% como mínimo

CILINDROS DE CONCRETO DE 6"



OBSERVACIONES EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL Y SELLO SECO

Responsable

JAIME ESMITH BAUTISTA LASSO
MP. 25202- 120062 CND

Laboratorista

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
SUELO Y PAVIMENTO

Libro2

Powered by CamScanner

CONSTRUCSUELOS Y.A.

Laboratorio de suelos, Diseño y Concreto.

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV E - 410 -13

PROYECTO: SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA


LOCALIZACION: VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

No.	CEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA 28 DIAS	PORCENTAJE RESISTENCIA	TIPO DE FALLA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kgcm2	PSI	PSI	COMPRESION	
1			210	3000	09/03/2025	16/03/2025	7	248,9	25380,58	139,1	1988	2882	66,3%	
2			210	3000	09/03/2025	23/03/2025	14	309,4	31549,83	173,0	2471	3583	82,4%	
3			210	3000	09/03/2025	06/04/2025	28	383,3	39085,48	214,3	3061	4438	102,0%	

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Dias	39% a 47%	14 Dias	81% a 85%
7 Dias	62% a 68%	28 Dias	100% como minimo

CILINDROS DE CONCRETO DE 6"



OBSERVACIONES: EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL Y SELLO SECO

JAIME ESMITH BAUTISTA LASSO
MP. 25202- 120062 CND

Laboratorista

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
SUELO Y PAVIMENTO

Libro2

Powered by CamScanner

CONSTRUCSUELOS Y.A.

Laboratorio de suelos, Diseño y Concreto.

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV E - 410 -13

PROYECTO: SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA


LOCALIZACION: VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

No.	CEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA ALCANZADA	PORCENTAJE RESISTENCIA	TIPO DE FALLA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	PSI	Diseño Alcanzado	
1			210	3000	07/03/2025	14/03/2025	7	251,9	25686,49	140,8	2012	2917	67,1%	
2			210	3000	07/03/2025	21/03/2025	14	311,5	31763,97	174,1	2488	3607	82,8%	
3			210	3000	07/03/2025	04/04/2025	28	383,5	39105,88	214,4	3063	4441	102,1%	

Porcentaje de resistencia esperado a cada edad

3 Dias	39% a 47%	14 Dias	81% a 86%
7 Dias	62% a 68%	28 Dias	100% como minimo

CILINDROS DE CONCRETO DE 6"



OBSERVACIONES EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL Y SELLO SECO.

JAIME ESMITH BAUTISTA LASSO
MP. 25202- 120062 CND

Laboratorista

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
SUELO Y PAVIMENTO

Libro2

Powered by CamScanner

CONSTRUCSUELOS Y.A.

Laboratorio de suelos, Diseño y Concreto.

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV E - 410 -13

PROYECTO: SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA


LOCALIZACION: VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

No.	CEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA 28 DIAS	% RESISTENCIA ESPECIFICADA COMPROBADA	TIPO DE FALLA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	PSI		
1			210	3000	05/03/2025	12/03/2025	7	272,6	27817,69	152,6	2170	3169	72,6%	
2			210	3000	05/03/2025	19/03/2025	14	319,7	32600,13	178,7	2553	3702	85,1%	
3			210	3000	05/03/2025	02/04/2025	28	398,5	40645,64	222,8	3183	4616	106,1%	

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Dias	39% a 47%	14 Dias	81% a 85%
7 Dias	62% a 68%	28 Dias	100% como minimo

CILINDROS DE CONCRETO DE 6"



OBSERVACIONES EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL Y SELLO SECO

Realizó:

JAIME ESMITH BAUTISTA LASSO
MP 25202- 120062 CND

Laboratorista

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
SUELO Y PAVIMENTO

Libro2

Powered by CamScanner

CONSTRUCSUELOS Y.A.

Laboratorio de suelos, Diseño y Concreto.

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA INV E - 410 -13

PROYECTO: SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA


LOCALIZACION: VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL

No.	CEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		RESISTENCIA 28 DIAS	PORCENTAJE RESISTENCIA	TIPO DE FALLA
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	PSI	COMPRESION	
1			210	3000	03/03/2025	10/03/2025	7	296,3	30214,01	166,6	2366	3431	78,9%	
2			210	3000	03/03/2025	17/03/2025	14	319,7	32600,13	178,7	2553	3702	86,1%	
3			210	3000	03/03/2025	31/03/2025	28	379,3	38677,6	212,0	3029	4392	101,0%	

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad

3 Dias	39% a 47%	14 Dias	81% a 85%
7 Dias	62% a 66%	28 Dias	100% como minimo

CILINDROS DE CONCRETO DE 6"



OBSERVACIONES: EL PRESENTE INFORME NO ES VALIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL Y SELLO SECO

Realizo

JAIME ESMITH BAUTISTA LASSO
MP. 25202- 120062 CND

Laboratorista

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
SUELO Y PAVIMENTO

Libro2

Powered by CamScanner

825

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería


Ricaurte


Marzo de 2.026










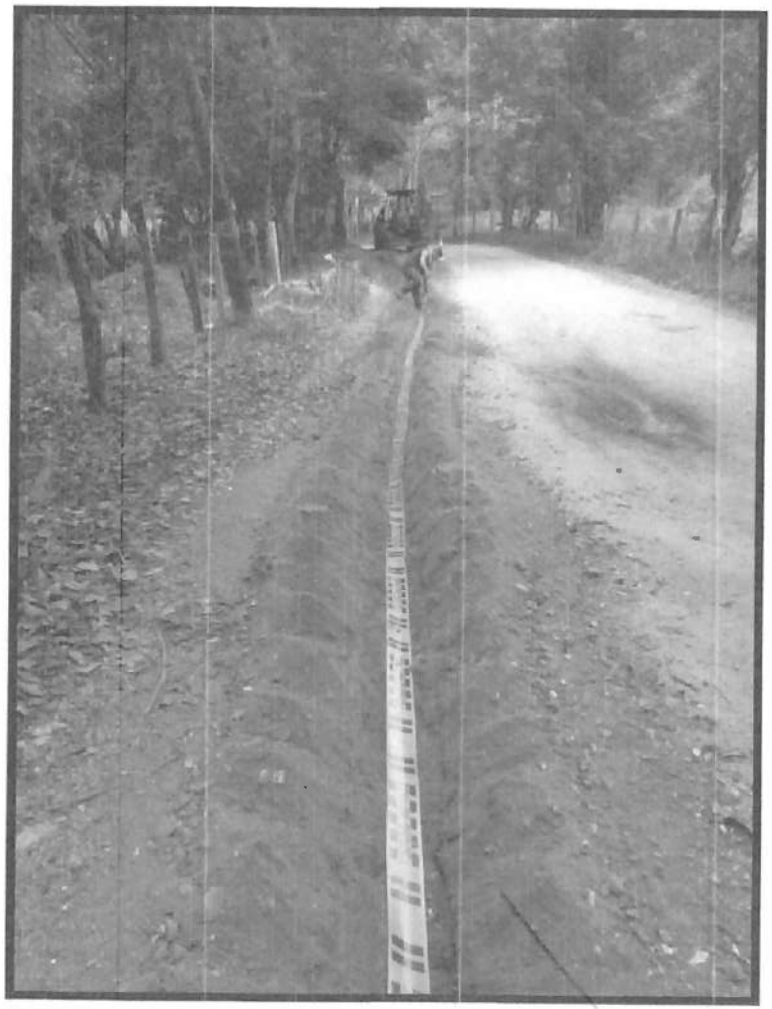

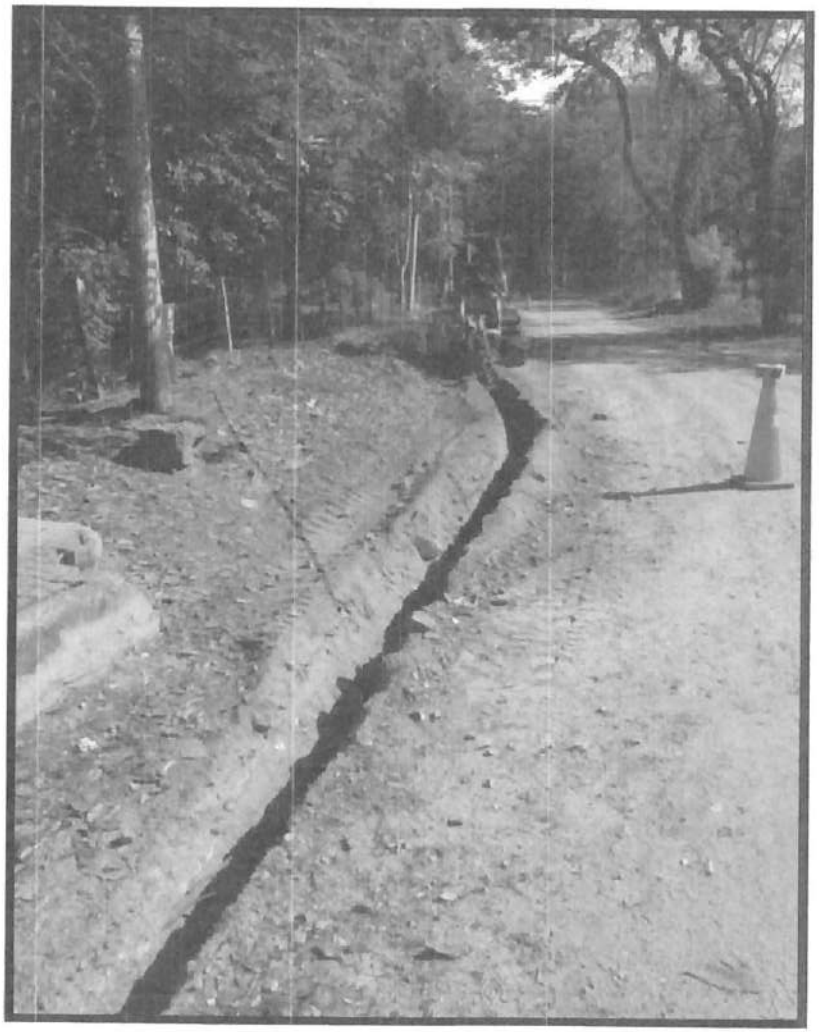


Oscar Javier Godoy


AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

MARZO 2.026



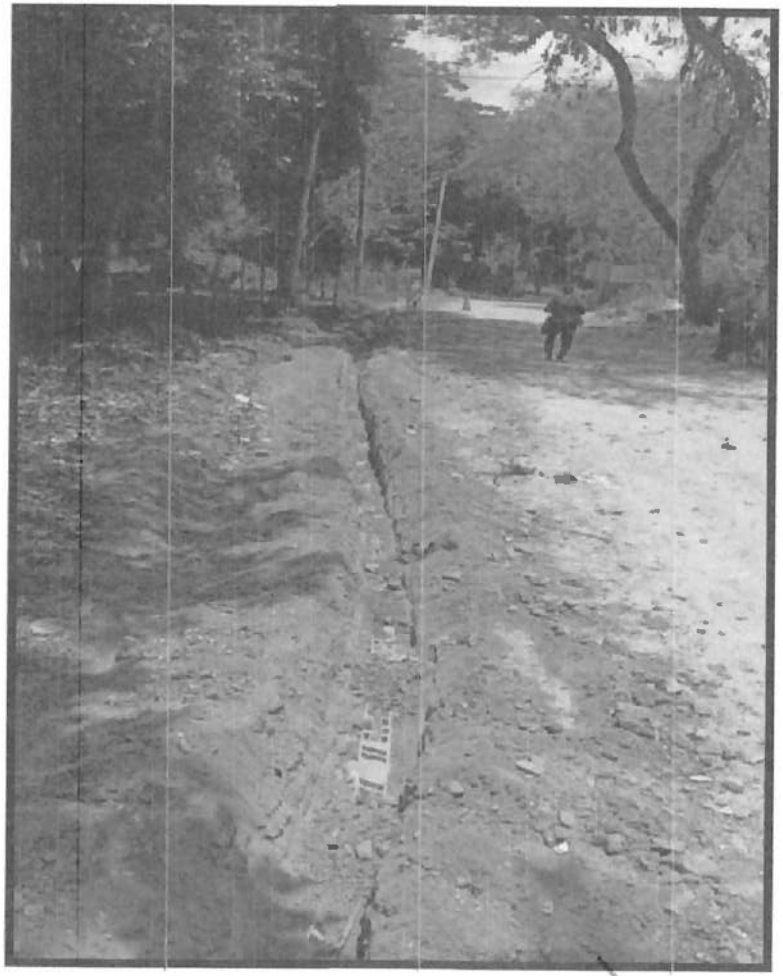

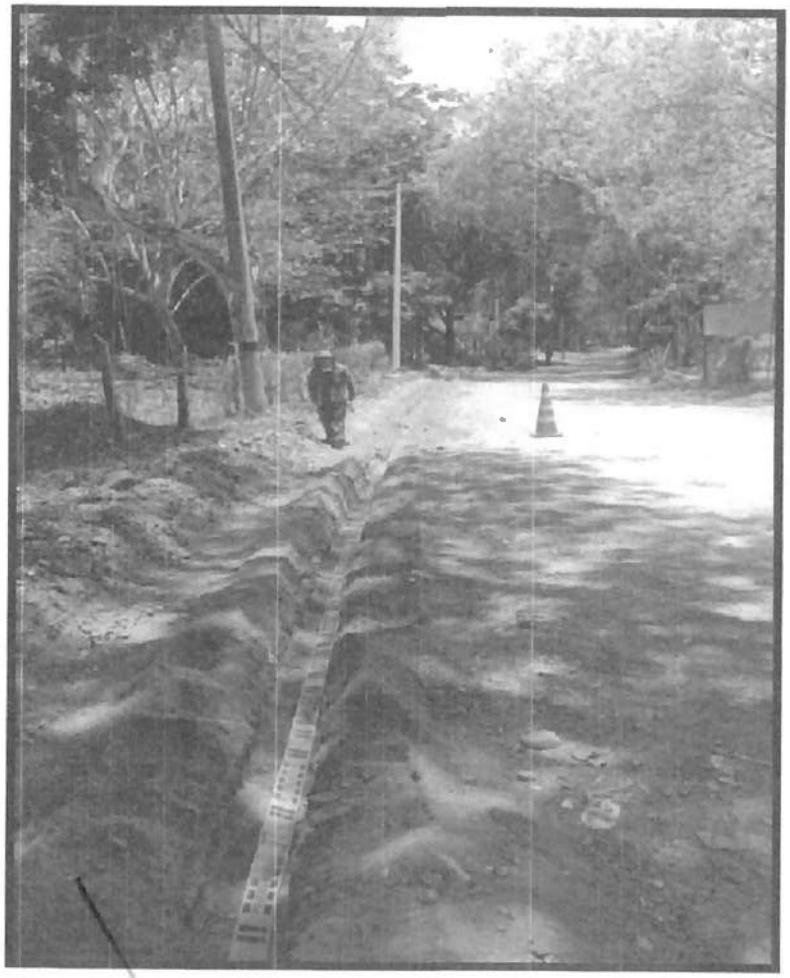


Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería


Ricaurte

MARZO 2.026

32

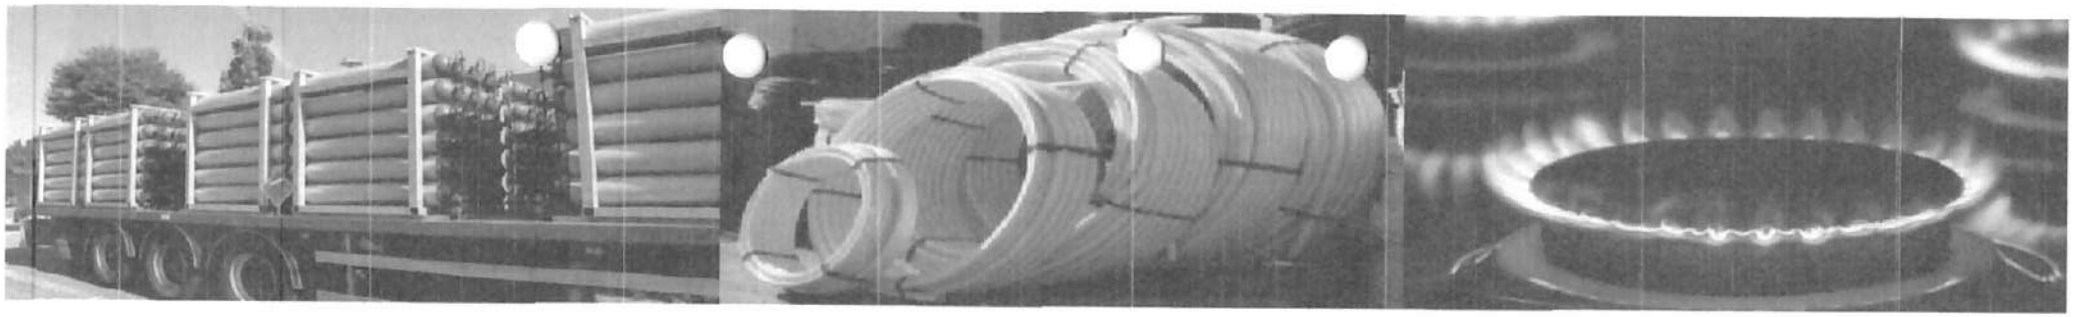



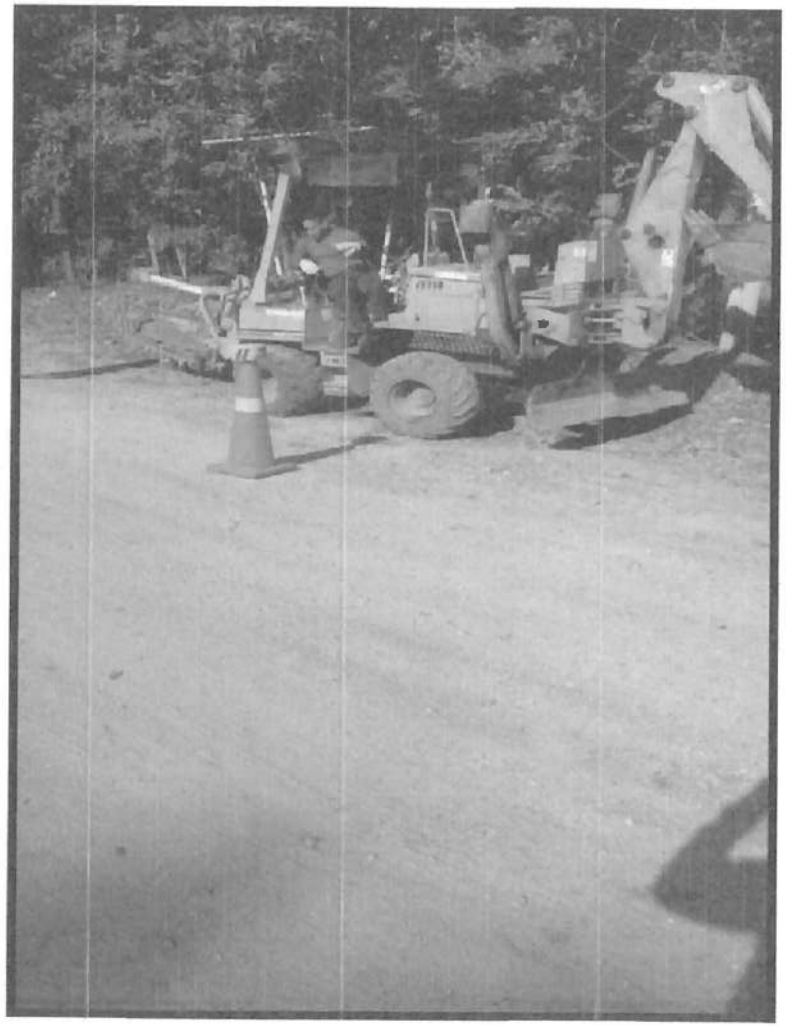



Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

MARZO 2.026



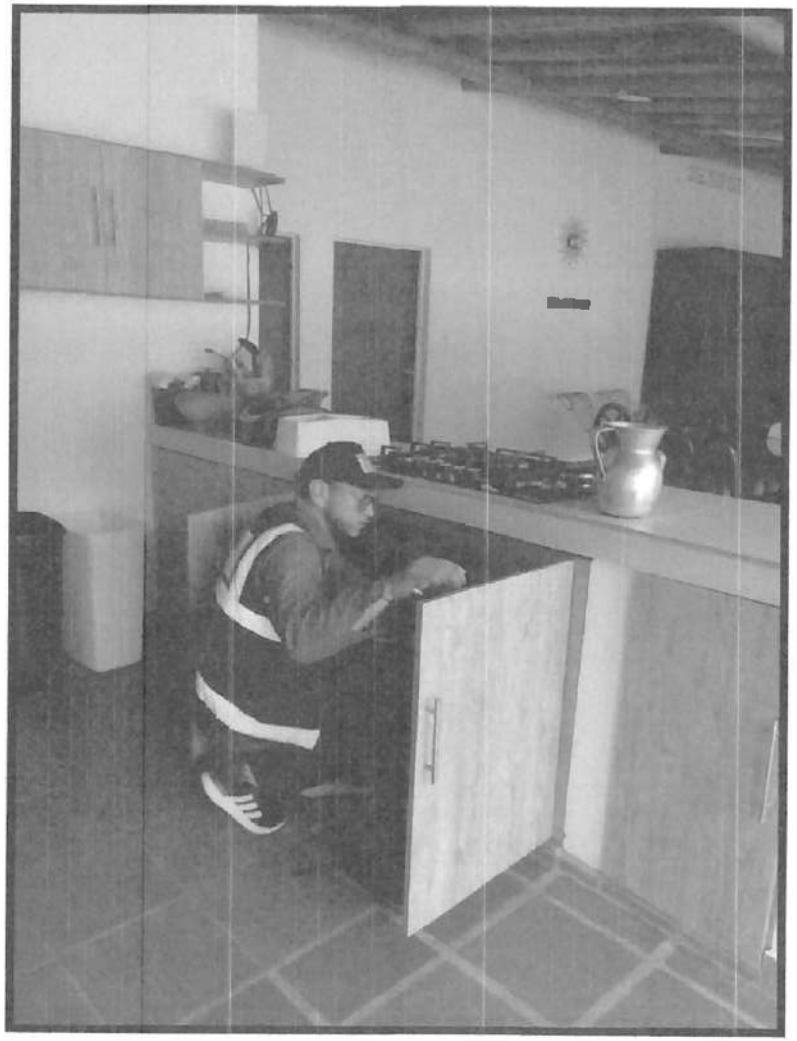




Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte





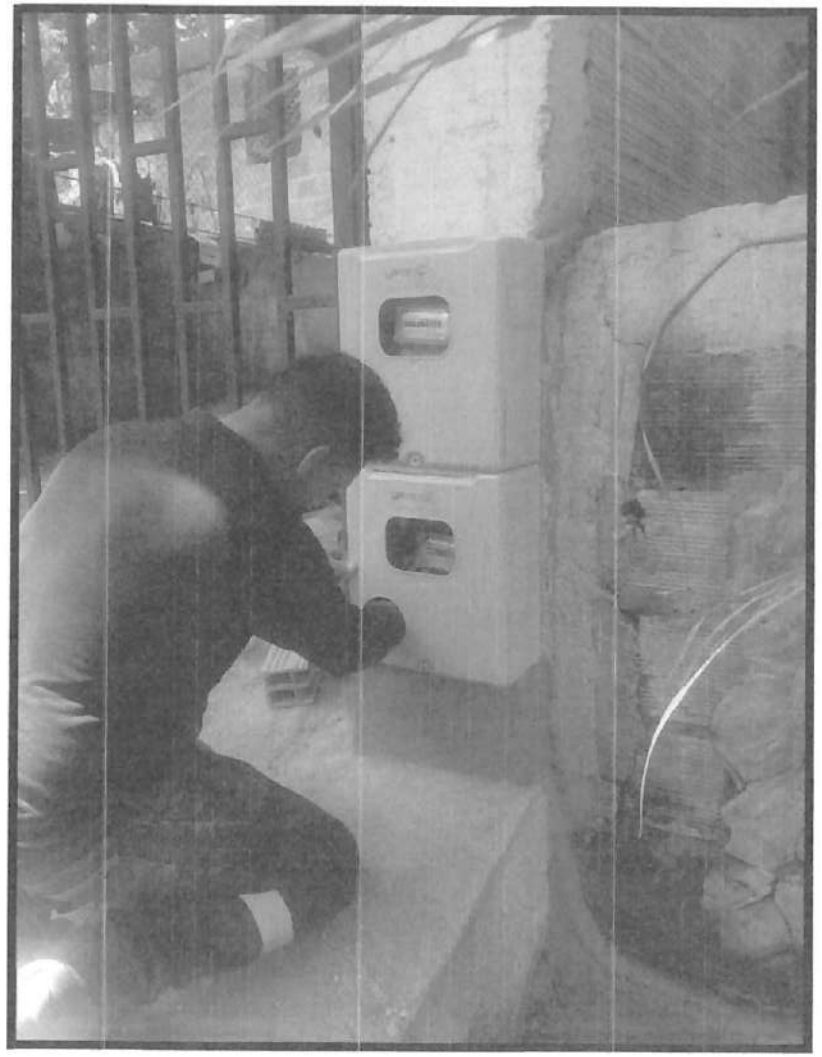


Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

MARZO 2.026



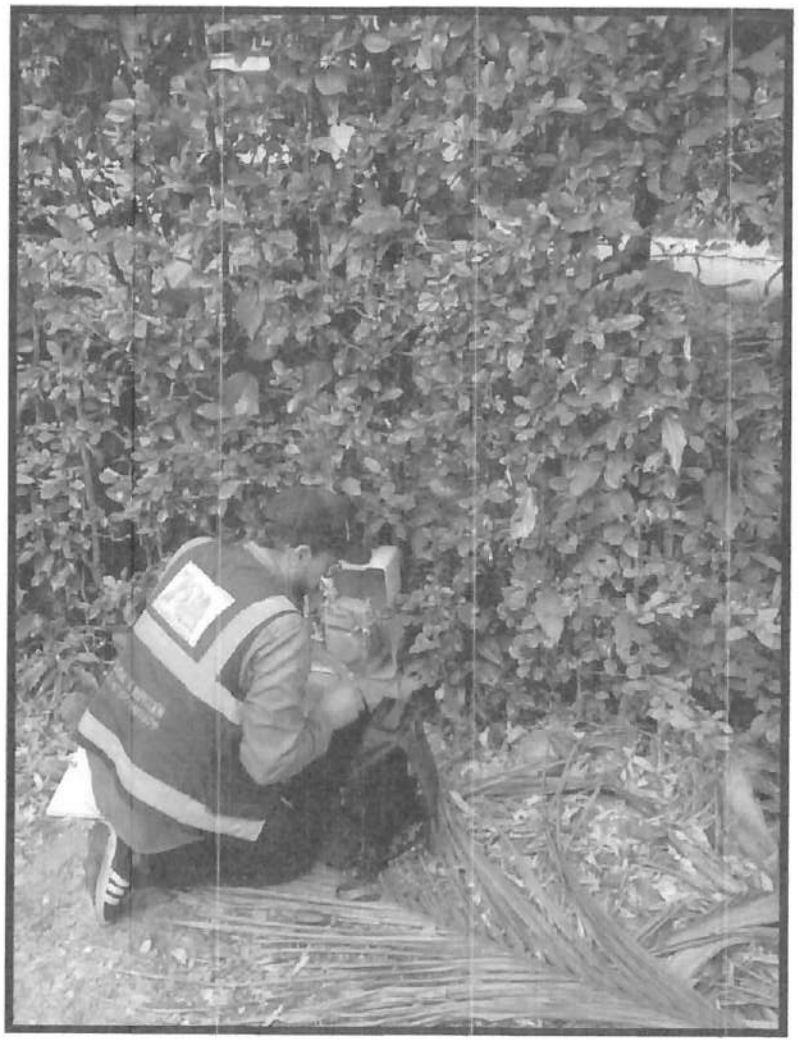





Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

MARZO 2.026

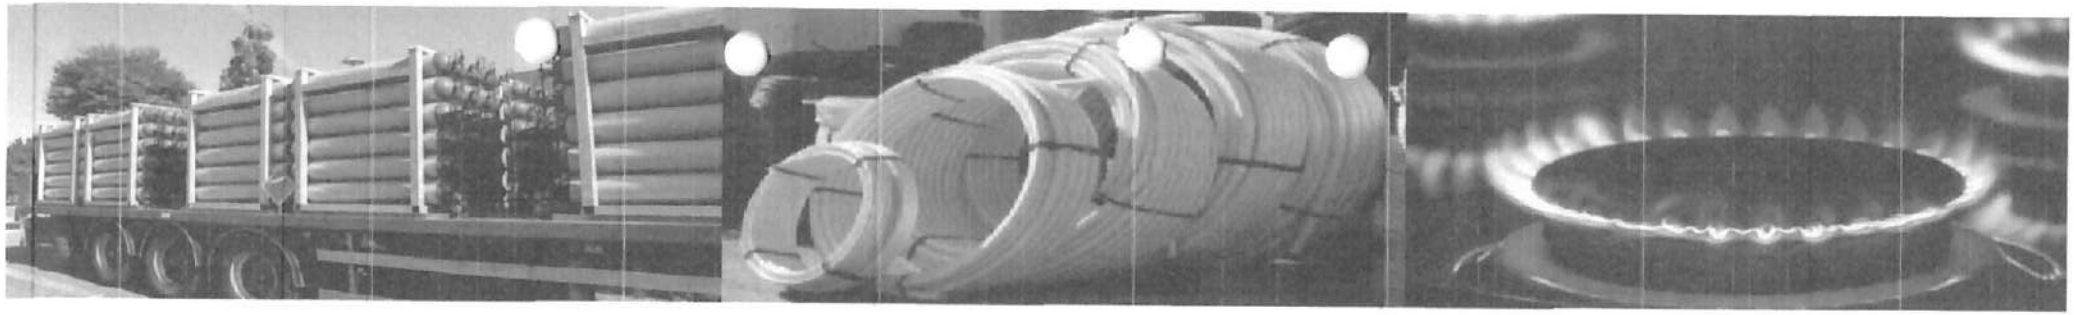

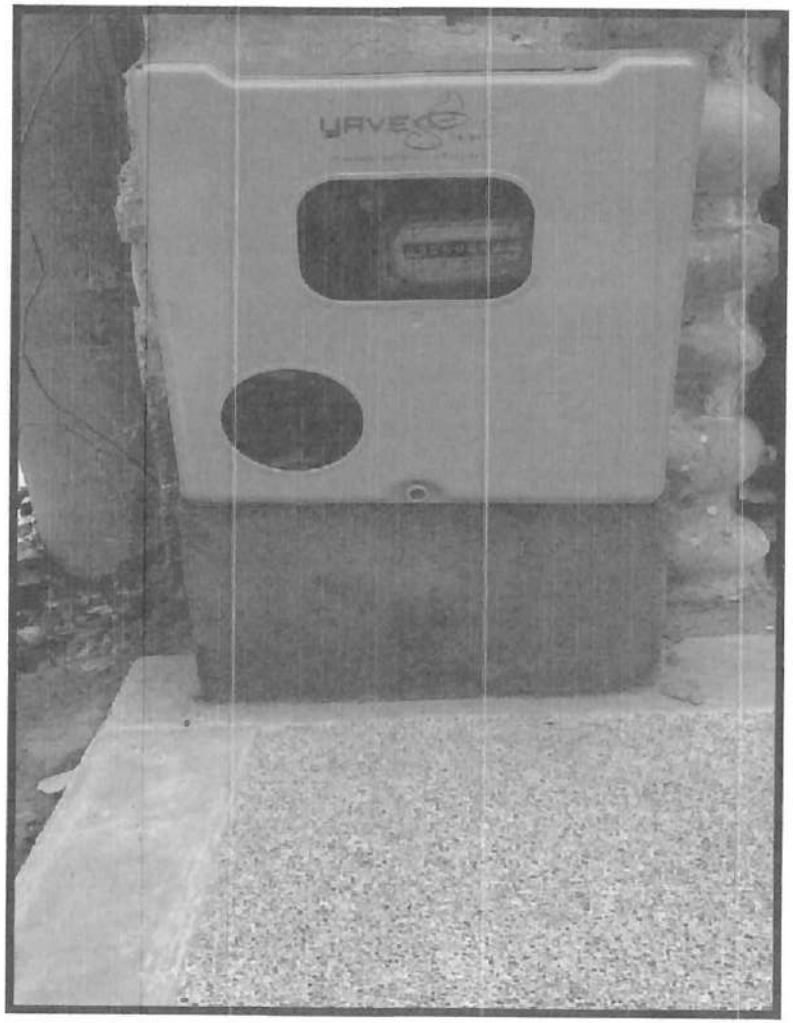




Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

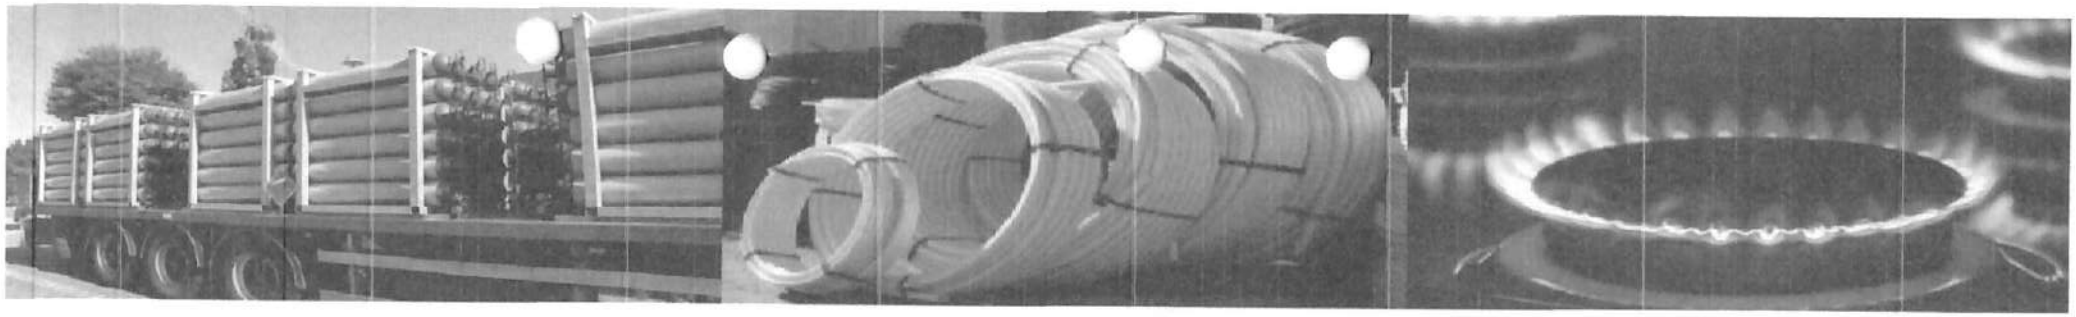




Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte



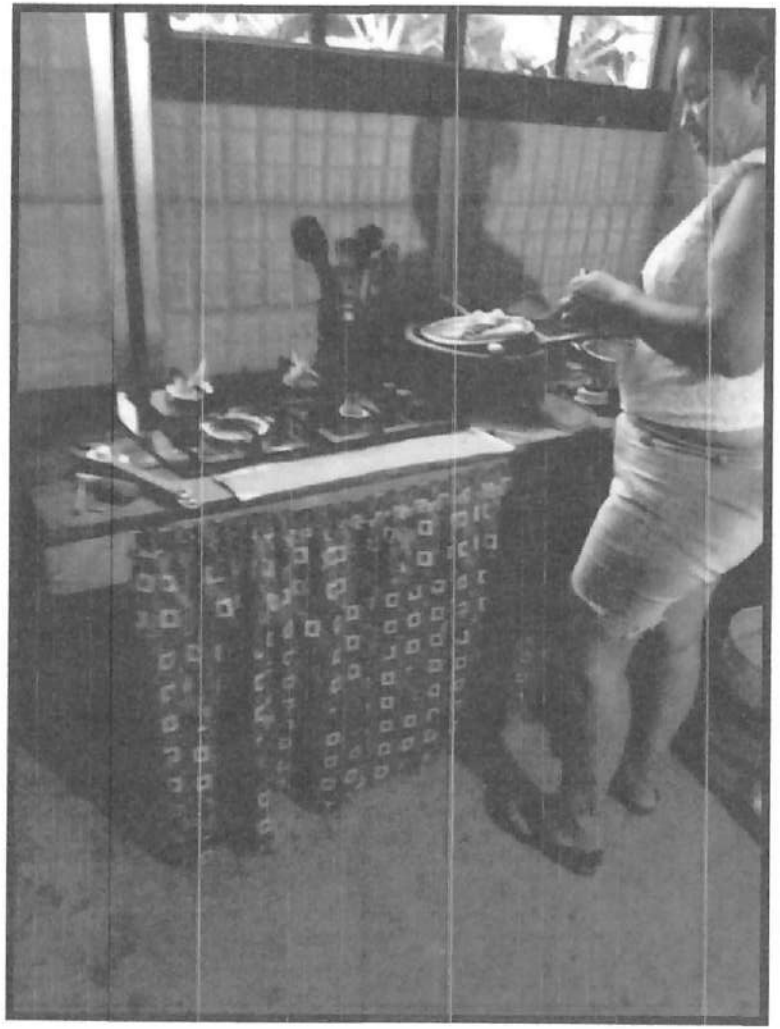





Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte



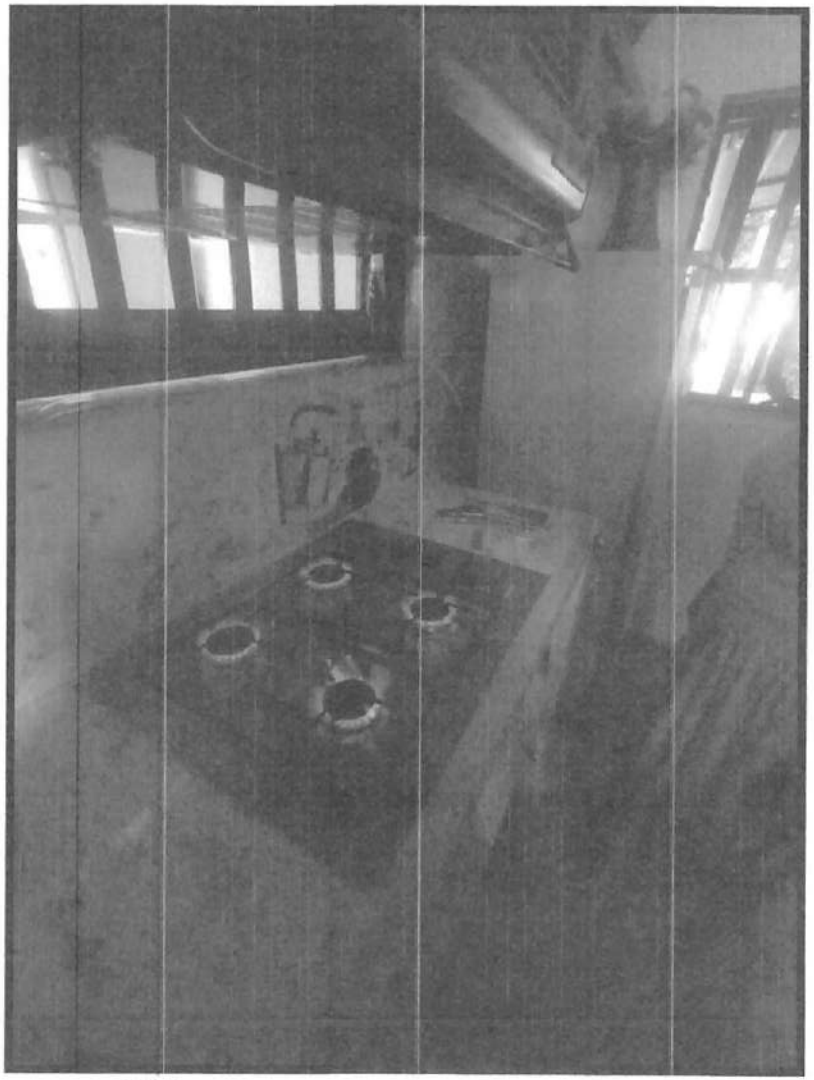

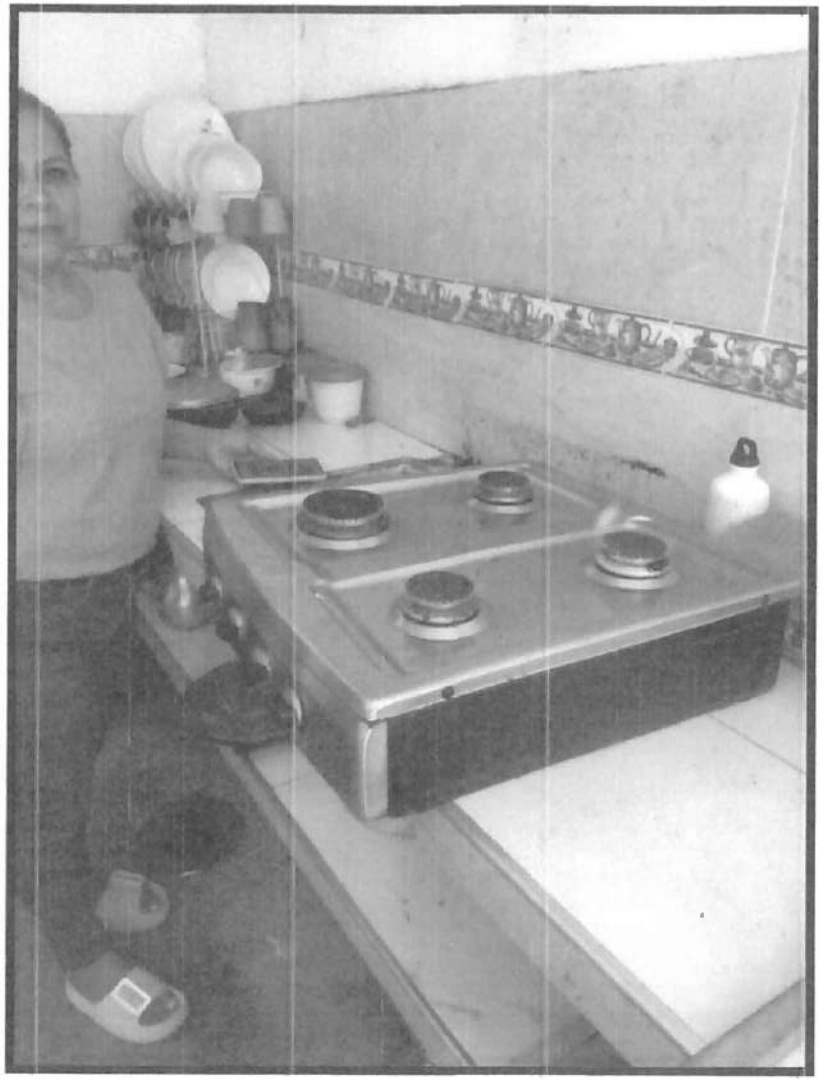

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

MARZO 2.026







Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte







Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

MARZO 2.026

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



FACTURA - CERTIFICADO BANCARIO

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

840

Certificación
Bancaria

Jueves, 21 de mayo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA identificado(a) con CC 79049924, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	69553264863	2009-09-22	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

841

Oscar Javier Godoy
Consultoría, Construcción e Interventoría

OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA

NIT 79049924 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764108784615 del 22/04/2026 al 22/04/2028
Habilita numeración de:
OG-101 al OG-200
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Diagonal 40a No 16-53

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. OG107
Fecha de emisión: 02/06/2026 09:48:29 AM
Fecha de validación DIAN: 02/06/2026 09:50:46 AM
Fecha de vencimiento: 12/06/2026
Plazo (Días): 10
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: MUNICIPIO DE RICAURTE
NIT 890680059 - 1
Dirección: Edificio Palacio Municipal
Codigo Cliente MR
Teléfono: 601 8317743
Dirección Despacho: Edificio Palacio Municipal
Contacto:
Ciudad: Ricaurte
Departamento: Cundinamarca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	PG 311-2025	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Convenio de Asociación SINFRA-SP-018 – Gasificación Domiciliaria Veredas Callejón, Casablanca y El Portal, Ricaurte, Cundinamarca. Contrato No. 311-2025 – CMA 003-2025. Período: 20 de agosto de 2025 al 28 de marzo de 2026.	1,00	unidad	COP 147,019,302.52	COP 0.00	IVA(19%)		COP 147,019,302.52

Total de items: 1
Observaciones
Pago correspondiente al ochenta por ciento (80%) de avance, interventoria técnica, administrativa y financiera del Contrato de Consultoría No. 311-2025, cuyo objeto es realizar la interventoría al convenio de asociación para el fortalecimiento del programa de gasificación domiciliaria mediante el subsidio del derecho de conexión e instalación interna del servicio de gas por redes para los estratos 1 y 2 en las veredas Callejón, Casablanca y El Portal del municipio de Ricaurte,

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Débito Ahorro

Cuenta de ahorros Banco de Bogota 444223788

Subtotal:	COP 147,019,302.52
IVA(19%)	COP 27,933,667.48

Impuestos:	COP 27,933,667.48
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 174,952,970.00
Neto a pagar	COP 174,952,970.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 253fbea7158089d449374f4c1aab28089a65260db1f3e9601ee70f228fd22439563f5de904bedae857be66e2c000ece8

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas

Oscar Javier Godoy
Consultoría, Construcción e Interventoría

CERTIFICACIÓN ACLARATORIA

Asunto: Aclaración de observación registrada en factura Venta No. OG107 – Contrato de Consultoría No. 311-2025

Por medio de la presente, nos permitimos realizar la siguiente aclaración respecto de la factura correspondiente al pago de los servicios de **interventoría técnica, administrativa y financiera del Contrato de Consultoría No. 311-2025**, cuyo objeto es:

"Realizar la interventoría al convenio de asociación para el fortalecimiento del programa de gasificación domiciliaria mediante el subsidio del derecho de conexión e instalación interna del servicio de gas por redes para los estratos 1 y 2 en las veredas Callejón, Casablanca y El Portal del municipio de Ricaurte."

Una vez revisada la información consignada en la factura, se evidenció que en el campo correspondiente a **observaciones** se registró, de manera involuntaria, la expresión **"pago correspondiente al ochenta por ciento (80%) de avance"**.

Al respecto, se certifica que dicha referencia corresponde exclusivamente a un **error de redacción en el texto de la observación de la factura**, siendo lo correcto indicar que el pago corresponde al **cien por ciento (100%) de avance** de las actividades objeto de la facturación.

Se deja expresa constancia de que **los valores económicos registrados en la factura son correctos, corresponden al valor real objeto de cobro y no presentan ninguna afectación, modificación o diferencia** derivada del error antes mencionado.


En consecuencia, la presente certificación se expide con el propósito de **aclarar y precisar el contenido de la observación registrada en la factura**, sin que ello implique modificación alguna de los valores facturados, conceptos cobrados o demás información económica contenida en el documento.

OSCAR JAVIER GODOY
Director de Interventoría
Cedula N° 79.049.924.
Ingeniero Civil
MTP-25202 089432-CND

NELSON PINTO CORZO
CONTADOR PUBLICO
TP 57800-T

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL

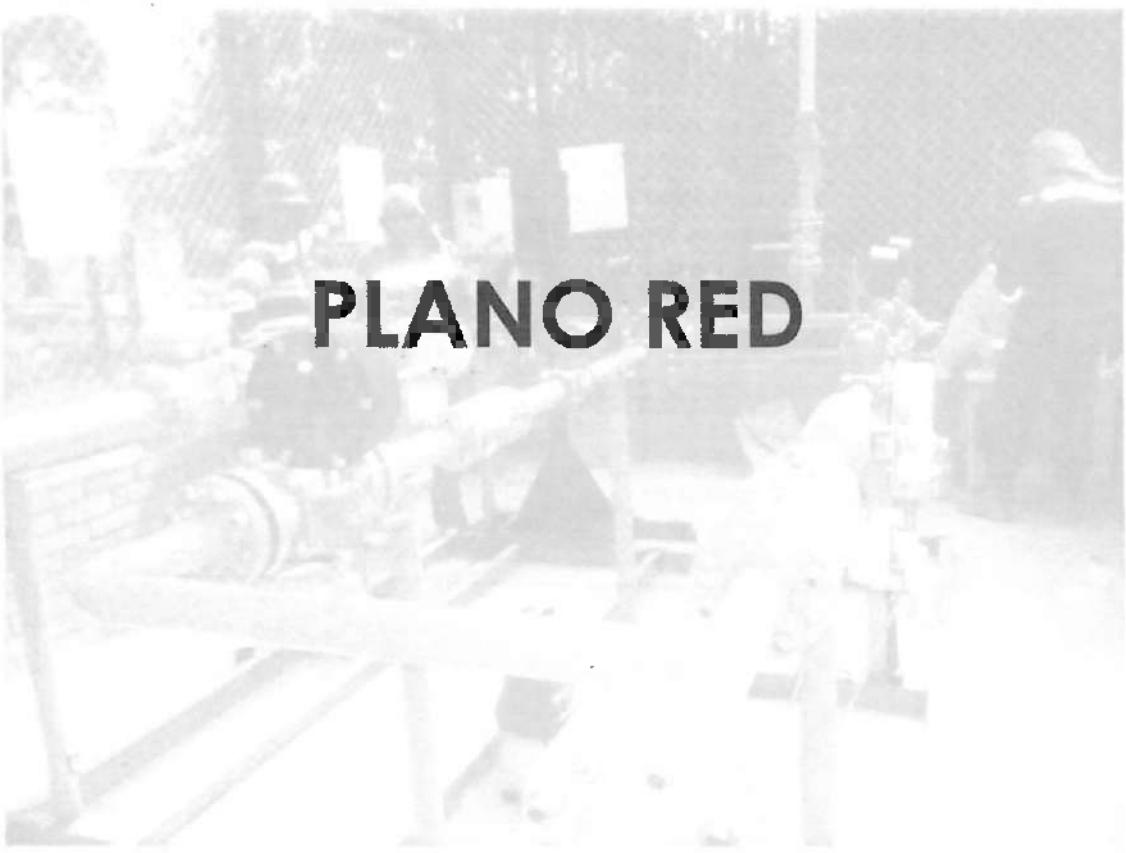

PLANO RED

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO RICAURTE

ELABORO:

AVANGAS Ingeniería

Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE GAS NATURAL COMPRIMIDO POR REDES PARA LAS VEREDAS CASA BLANCA, CALLEJON Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Contiene:

PLANO DE DISEÑO
INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION

CONVENCIONES GENERALES

CENTROS EDUCATIVOS	TUBERÍA PE 4"
IGLESIA	TUBERÍA PE 3"
PUENTE VEHICULAR	TUBERÍA PE 2"
RIO	TUBERÍA PE 1"
VIVIENDAS	TUBERÍA PE 3/4"
POLIVÁLVULA 2"	ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO
POLIVÁLVULA 1"	POLIVÁLVULA 3/4"

Diseño:

OSCAR JAVIER HUERTAS R.
GERENTE AVANGAS S.A.S E.S.P

Aprobó:

OSCAR JAVIER HUERTAS R.
GERENTE AVANGAS S.A.S E.S.P

Escala: 1 : 10.000

Fecha: JUNIO 2026

Plano: 1

968 000 N

967 000 N

966 000 N

965 000 N

927 000 E

928 000 E

929 000 E

SINFRA-SP-016 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYO OBJETO ES "SINFRA-SP-018 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DOMICILIARIA, MEDIANTE EL SUBSIDIO DEL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA A LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POR REDES PARA LAS VEREDAS CALLEJÓN, CASABLANCA Y EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL



ACTAS COMITE

Oscar Javier Godoy

AVANGAS Ingeniería

Ricaurte

Marzo de 2.026

Acta de Comité No. 1					
Fecha:	05-11-2025	**Hora Inicio:**	9:00 a.m.	**Hora Fin:**	10:30 a.m.
Objeto de la Reunión:	Análisis y modificación de la Cláusula Sexta "Forma de Pago" del Convenio de Asociación No. 297-2025 suscrito entre el Municipio de Ricaurte y AVANGAS S.A.S. E.S.P.				
Lugar:	Sala de Juntas – Despacho Municipal				

	Nombre	Cargo
Participantes:	Eliana Andrea Carvajal	Directora – Dirección de servicios públicos
	Ing. Óscar Javier Huertas Rodríguez	Representante Legal – AVANGAS S.A.S. E.S.P.
	Ing. Óscar Javier Godoy Bautista	Interventor – Contrato de Consultoría No. 311-2025
	Ing. Fredy Giovani Alonso Benavides	Profesional Universitario D.S.P.

ORDEN DEL DIA:
1. Presentación de asistentes.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Exposición de la solicitud de ajuste presentada por AVANGAS S.A.S. E.S.P.
4. Concepto de la Interventoría sobre la modificación.
5. Presentación de la propuesta de redacción actualizada de la Cláusula Sexta – Forma de Pago.
6. Análisis y concertación de los cambios.
7. Definición de compromisos y cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 9:00 a.m. del 5 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Ricaurte, se dio inicio al comité convocado mediante Oficio No. 191.19-294-2025, con el propósito de analizar la modificación de la Cláusula Sexta – Forma de Pago del Convenio de Asociación No. 297-2025.

1. Presentación de asistentes

Cada participante se presentó, dejando constancia de su representación institucional y disposición para intervenir en el análisis técnico y jurídico del ajuste propuesto.

El comité revisó la propuesta y acordó su modificación, buscando garantizar mayor claridad en los mecanismos de desembolso y coherencia con el marco normativo vigente.

6. Definición de compromisos y cierre

Los participantes acordaron que la Dirección de Servicios Públicos consolidará la versión final de la Cláusula Sexta – Forma de Pago y la remitirá a la Oficina Jurídica para su revisión y trámite de modificación contractual.

COMPROMISOS			
Ítem	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha de cumplimiento**
1	Incorporar en el documento contractual la nueva redacción aprobada de la Cláusula Sexta – Forma de Pago.	Dirección de Servicios Públicos	5-11-2025
2	Remitir a la Oficina Encargada, la solicitud de modificación para revisión y concepto.	Dirección de Servicios Públicos	5-11-2025

No habiendo otros temas por tratar, se dio por finalizada la reunión siendo las 10:30 a.m. del 5 de noviembre de 2025, firmando en constancia los asistentes.

Firmas:

Nombre	Cargo	Firma
Eliana Andrea Carvajal	Directora – Dirección de servicios públicos	
Ing. Óscar Javier Huertas Rodríguez	Representante Legal – AVANGAS S.A.S. E.S.P.	
Ing. Óscar Javier Godoy Bautista	Interventor – Contrato de Consultoría No. 311-2025	
Ing. Fredy Giovani Alonso Benavides	Profesional Universitario D.S.P.	

Elaborado por: Ing. Fredy Giovani Alonso B.
Profesional Universitario D.S.P.

Revisado por: Ing. Eliana Andrea Carvajal Rico
Directora D.S.P.

Ricaurte Alcaldía Municipal	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE REUNION	FR-GDC-004	
		Fecha Aprob: 01/08/2025	
		Versión:04	Pág. 1 de 3

Acta de Comité No. 1					
Fecha:	24/11/2025	**Hora Inicio:**	8:30 am	**Hora Fin:**	9:30 a.m.
Objeto de la Reunión:	Definición de Estrategias y Compromisos para el Cumplimiento del Convenio de Gasificación Rural veredas Casablanca, Callejón y el Portal del municipio de Ricaurte Convenio 297-2025-SINFRA-SP-018				
Lugar:	Reunión Virtual				

Participantes:	Nombre	Cargo
	Eliana Andrea Carvajal Rico	Directora Oficina Servicios Públicos Ricaurte
	Giovani Alonso	Profesional Oficina de Servicios públicos Ricaurte
	Floyd Paterson	Avangas SAS
	Reineiro Olivera Diaz	Interventoría

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación Asistentes
2. Análisis del estado actual de las instalaciones domiciliarias (Avance físico vs. Programado).
3. Presentación de la propuesta de mitigación por parte del Contratista.
4. Intervención de Interventoría
5. Definición de Compromisos y fechas de entrega
6.
7.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Se inició la reunión a la hora establecida (8:30 am), liderada por la Interventoría del proyecto. El Contratista presentó el estado de avance del proyecto de gasificación rural, reconociendo un desfase en el cumplimiento de las instalaciones domiciliarias frente al cronograma contractual. Se atribuyeron los retrasos a dificultades logísticas y de equipos, condiciones climáticas, llegada de materiales. Tras una discusión profunda sobre las estrategias de mitigación, la Supervisión exigió la presentación formal de documentos técnicos y contractuales que permitan evaluar la situación y garantizar la continuidad del servicio con el

menor impacto a los usuarios y al erario. Como resultado, se definieron los siguientes compromisos inaplazables:

COMPROMISOS			
Ítem	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha de cumplimiento**
1	Elaboración y entrega formal de un Plan de Choque detallado, enfocado en acelerar y garantizar el cumplimiento de las instalaciones domiciliarias de gasificación pendientes, tal como se establece en el Convenio 297-2025	Floyd Paterson (Avangas)	27/11/2025
2	Entrega del nuevo Cronograma de Ejecución, debidamente ajustado y validado, en estricta coherencia con las actividades y plazos definidos en el Plan de Choque	Floyd Paterson (Avangas)	27/11/2025
3	Presentación oficial de la Solicitud de Prórroga del Contrato, incluyendo toda la justificación técnica, financiera y legal necesaria, para su exhaustiva revisión y consideraciones por parte de la Supervisión del proyecto y la Entidad Contratante.	Interventoría	27/11/2025
4	Revisión y Concepto Técnico. La Supervisión se compromete a realizar la revisión y emitir el concepto técnico preliminar sobre los documentos presentados	Supervisión Proyecto	02/12/2025

Ricaurte Alcaldía Municipal	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE REUNION	FR-GDC-004	
		Fecha Aprob: 01/08/2025	
		Versión.04	Pág. 3 de 3

No habiendo otros temas por tratar, se dio por finalizada la reunión siendo las 9:30 am del 24 de noviembre de 2025, firmando en constancia los asistentes.

Firmas:

Nombre	Cargo	Firma
Eliana Andrea Carvajal Rico	Directora Oficina Servicios Públicos Ricaurte	
Giovani Alonso	Profesional Oficina de Servicios públicos Ricaurte	
Floyd Paterson	Avangas SAS	
Reineiro Olivera Diaz	Interventoría	

Elaborado por: Giovani Alonso
