

CARREÑO

CONSTRUYE S.A.S.

NIT. 900663211-7

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

INFORME FINAL DE OBRA



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20260000219

MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

AGOSTO 2026

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

INFORME FINAL DE OBRA

03 DE AGOSTO DEL 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20260000219

OBJETO:
MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

CONTRATISTA:
CARREÑO CONSTRUYE S.A.S
R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO
NIT No. 900663211

ENTREGADO A:

ALCALDIA DE CUBARA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA
SUPERVISOR DE OBRA

ALCALDIA DE CUBARA
AGOSTO DE 2026

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO 8
2.1 DESCRIPCION GENERAL 8
2.2 LOCALIZACION 8
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9
3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 10
3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 10
3.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 11
3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS 11
3.5 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS 12
3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 12
3.7 BITÁCORA DIARIA DE OBRA 13
3.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 13
3.8.1 Socialización del proyecto 13
3.9 VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 13
3.9.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 13
3.9.2 PERSONAL OPERATIVO 14
3.9.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL 15
4. ASPECTOS TECNICOS 16
4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 16
4.2 MODIFICACIONES O ADICIONALES AL CONTRATO 17
4.3 COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 18
4.4.1 Avance Físico de la obra 18
4.4.2 Avance Financiero de la obra 19
4.4.4 Avance del plazo Contractual 22
4.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME 22
5. CONCLUSIONES 38

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de obra pública No. 20260000219 10
Tabla 2. Pólizas actualizadas según Acta de recibo final 11
Tabla 3 Actos Administrativos Contrato de Obra No. 20260000219. 12
Tabla 4. Personal administrativo del contrato de obra pública No. 20260000219 en el mes de julio de 2026. 14
Tabla 5. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- del contrato de obra pública No. 20260000219. 15
Tabla 6. Seguimiento y control de equipo y herramienta utilizada en la ejecución del contrato de obra pública No. 20260000219. 16
Tabla 7. Condiciones contractuales iniciales del contrato de Obra Pública No. ***20260000219.*** 16
Tabla 8. Avance físico del contrato de Obra Pública No. ***20260000219.*** 18
Tabla 9 Avance Financiero del contrato de Obra Pública No. ***20260000219.*** 20

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 *ubicación general Municipio de cubara* *9*
Ilustración 2 *Avance Físico del contrato de Obra Pública No.* ***20260000219.*** *19*
Ilustración 3 *Avance Financiero del contrato de Obra Pública No.* ***20260000219.*** *22*

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía del Municipio de Cubará, en desarrollo del proceso de selección de mínima cuantía No. 20260000219, adjudicó a la empresa **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.**, identificada con NIT 900.663.211-7, representada legalmente por el señor **Wilson Carreño Trujillo**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca (Arauca), el Contrato de Obra **No. 20260000219**, cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**.

La ejecución del contrato se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas, administrativas y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso de contratación **MC-071-2026**, los cuales contienen los lineamientos necesarios para garantizar la adecuada ejecución de las actividades y el cumplimiento del objeto contractual.

El presente informe final tiene como propósito presentar un resumen de las actividades ejecutadas, los aspectos técnicos y los actos administrativos desarrollados durante la ejecución del contrato, comprendida entre el **14 de julio de 2026** y el **30 de julio de 2026**. Asimismo, se describen los resultados obtenidos desde la suscripción del acta de inicio hasta la culminación de las obras, las cuales fueron ejecutadas bajo la supervisión, seguimiento y acompañamiento de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Cubará.

Es importante señalar que, durante el plazo de ejecución contractual, no fue necesario suscribir actas de suspensión, por lo que las actividades se desarrollaron de manera continua, permitiendo el cumplimiento de la programación establecida y la ejecución satisfactoria del objeto contractual.

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

2. ANTECEDENTES Y REVISION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los caminos ancestrales del pueblo indígena U'wa constituyen una red tradicional de movilidad que comunica las diferentes comunidades del Resguardo Unido U'wa y permite el acceso a servicios esenciales como salud, educación, abastecimiento y espacios de participación comunitaria. Estos caminos, además de cumplir una función de conectividad, representan un componente fundamental para la preservación de las prácticas culturales, sociales y ancestrales de la comunidad.

Como parte de esta infraestructura, los puentes peatonales tipo hamaca son elementos indispensables para garantizar el tránsito seguro sobre ríos y quebradas. No obstante, el paso del tiempo, las condiciones climáticas y el desgaste natural han ocasionado el deterioro de estas estructuras, afectando la movilidad de la población y aumentando los riesgos para quienes las utilizan. En particular, el puente peatonal El Zulia presentaba un estado de deterioro que hacía necesaria una intervención para restablecer condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

En atención a esta necesidad, se celebró y ejecutó el contrato para el mantenimiento del puente peatonal El Zulia, con el propósito de recuperar sus condiciones de servicio, garantizar la seguridad de los usuarios y asegurar la continuidad de la conectividad sobre este camino ancestral. Con la ejecución de las actividades de mantenimiento se contribuyó a mejorar las condiciones de movilidad de la comunidad indígena U'wa, favoreciendo el acceso a bienes y servicios esenciales y fortaleciendo la conservación de esta infraestructura de importancia social y cultural.

2.2 LOCALIZACION

Boyacá es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Tunja. Está ubicado en el centro-este del país, en la región andina, limitando al norte con Santander y Norte de Santander, al noreste con Venezuela y Arauca, al este con Casanare, al sur con Cundinamarca y al occidente el río Magdalena con los departamentos de Caldas y Antioquia.

Cubará municipio colombiano. Situado en el extremo nororiental del departamento de Boyacá, en la región del Sarare, piedemonte llanero de la Orinoquía Colombiana, a una altitud de 360 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 24°C, lo que lo sitúa entre los climas cálido y templado. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río Cobaría, (afluente del Río Arauca). El municipio limita al norte con Toledo (Norte de Santander) y el municipio de Páez, estado Apure (Venezuela); al occidente con Concepción, (Santander); al sur con Chiscas y Güicán en Boyacá y al oriente con Saravena en Arauca.

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S



Fuente: Sitio web: www.es.wikipedia.org/wiki/Cubará.

Ilustración 1 ubicación general Municipio de cubara

El contrato de Obra Pública No. **20260000219** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"** se localiza en el municipio de Cubará, específicamente en la comunidad indígena U'wa de Tegría en el sector El Zulia.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20260000219
CONTRATO No:	20260000219
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.
CONTRATISTA:	CARREÑO CONSTRUYE S.A.S

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON CARREÑO TRUJILLO
NIT. No:	900.663.211-7
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) MICTE.
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DÍAS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000256 DEL 22 DE MAYO DE 2026 2026000022 DEL 22 DE MAYO DE 2026
FECHA INICIO:	14 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	13 DE AGOSTO DE 2026
FECHA CORTE INFORME FINAL:	30 DE JULIO DE 2026

3.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Cubara en el Contrato de Obra pública 20260000219, se suscribe con la compañía de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. MC-071-2026 CONTRATO DE OBRA No. 20260000219 en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA DE GARANTÍAS así:

3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas el día 10 de julio de 2026 por la SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A tomadas por la empresa CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L WILSON CARREÑO TRUJILLO con Nit. 900663211 y como beneficiario el municipio de Cubará. Dichas pólizas fueron aprobadas por la secretaria de Planeación y Obras Públicas.

Tabla 1. Pólizas iniciales del contrato de obra pública No. 20260000219

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 4541518				
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR AFIANZADO**	**OBSERVACIONES**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/07/2026	30/10/2026	$ 4.902.397,00	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/08/2026	30/07/2027	$ 9.804.795,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	02/07/2026	30/07/2029	$ 2.451.199,00	

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

E INDEMNIZACIONES LABORALES				

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 013001076405				
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR AFIANZADO**	**OBSERVACIONES**
BÁSICO RESPONSABILIDAD CIVIL	02/07/2026	01/08/2026	$ 350.181.000	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION

Tabla 2. Pólizas actualizadas según Acta de recibo final

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. 4541518				
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR AFIANZADO**	**OBSERVACIONES**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/07/2026	30/10/2026	$ 4.902.397,00	PÓLIZA REVISADA Y APROBADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y CONTRATACION
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	03/08/2026	03/08/2027	$ 9.804.795,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/07/2026	30/07/2029	$ 2.451.199,00	

3.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

No se han generado multas o sanciones al contratista durante el periodo del presente informe de avance de obra.

3.4 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra en el presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

Tabla 3 Actos Administrativos Contrato de Obra No. 20260000219.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
14/07/2026	ACTA DE INICIO	SUSCRIBIR ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20260000219.	**SUPERVISIÓN:** JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20260000219. **CONTRATISTA:** CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO NIT No. 9006632117
03/08/2026	ACTA DE RECIBO FINAL	SUSCRIBIR ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20260000219.	**POR EL MUNICIPIO:** GILDARDO MURCIA BRUITRAGO ALCALDE MUNICIPAL **SUPERVISIÓN:** JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS CON DESIGNACION DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20260000219. **CONTRATISTA:** CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO NIT No. 9006632117

3.5 ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

Durante el presente periodo no se han presentaron comités de Obra a fecha del presente informe de obra.

3.6 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante el presente periodo no se han realizado envíos ni recibidos de correspondencia.

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

3.7 BITÁCORA DIARIA DE OBRA

El 14 de julio de 2026 se hace apertura a la realización de la bitácora de obra, en donde se escribirá los eventos que sucederán diariamente durante el proceso de ejecución del contrato de obra pública No. 20260000219, el responsable de su diligenciamiento diario es el ingeniero residente de obra y el supervisor del contrato, esta bitácora fue aprobada por los profesionales de la obra, se realiza el corte hasta el día 30 de julio de 2026, día en el que se dan por finalizadas las actividades de la ejecución de la obra.

En los anexos del presente informe se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra.

3.8 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.8.1 Socialización del proyecto

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolló dentro del territorio del Resguardo Indígena U'wa, el proceso de socialización se realizó directamente con la comunidad mediante una asamblea comunitaria, respetando sus formas tradicionales de participación y toma de decisiones. En este espacio se presentó el alcance de las actividades de mantenimiento del puente peatonal, los objetivos de la intervención, el cronograma de ejecución y los beneficios esperados, permitiendo a los miembros de la comunidad conocer el proyecto, resolver inquietudes y manifestar sus observaciones, garantizando así un proceso participativo y concertado durante el desarrollo de la intervención.

3.9 VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La supervisión antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

3.9.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

Tabla 4. Personal administrativo del contrato de obra pública No. 20260000219 en el mes de julio de 2026.

No.	NOMBRES	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	CARREÑO TRUJILLO WILSON	17.593.915	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	NUEVA E.P.S	COLFONDOS	POSITIVA	COMFIAR

NOTA: Los profesionales de la parte administrativa del contrato de obra pública SAMC-009-2025 se verifica el sueldo base de cotización de cada profesional de acuerdo al documento del A.I.U presentado por el contratista.

3.9.2 PERSONAL OPERATIVO

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Tabla 6. Personal operativo del contrato de obra pública No. 20260000219 en el mes de julio de 2026.

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	FECHA DE INGRESO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
1	CAMPEROS PEÑA ALCADIO	9.467.069	OFICIAL	14/07/2026	EPS-S COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
2	TEGRIA TEGRIA RUTKUARO	1.049.392.074	AYUDANTE	14/07/2026	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY
3	UNCACIA TARAZONA YEINER FABIAN	1.049.395.684	AYUDANTE	14/07/2026	NUEVA E.P.S. S.A.	PORVENIR	POSITIVA	COMFABOY

El pago de la planilla de seguridad social integral por el contratista, se presentan en los anexos del presente informe, con la respectiva planilla de la nómina firmada por el personal.

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la supervisión realiza seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

CARREÑO CONSTRUYE SAS

Tabla 5. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- del contrato de obra pública No. 20260000219.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO MES 1		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		Para el presente periodo no aplican observaciones
El contratista ha entregado a la supervisión copia de las afiliaciones del personal.	X		Para el presente periodo no aplican observaciones
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		Para el presente periodo no aplican observaciones
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		Para el presente periodo no aplican observaciones
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		Para el presente periodo no aplican observaciones
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		Para el presente periodo no aplican observaciones

3.9.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL

El contratista realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) para cada uno de los meses que se relacionan en el presente informe.

3.10 CONTROL EQUIPO EN OBRA

El supervisor verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

vez que fue necesario.

Tabla 6. Seguimiento y control de equipo y herramienta utilizada en la ejecución del contrato de obra pública No. 20260000219.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
	MES 1		
	SI	NO	
Se verificó que el contratista cuenta con el equipo y herramientas necesarios para la ejecución de las actividades contratadas, los cuales son de su propiedad y se encuentran en buen estado de funcionamiento y conservación, garantizando su disponibilidad para el desarrollo de las actividades contractuales.	X		Para el presente periodo no aplican observaciones

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Municipio de Cubará y la firma contratista **CARREÑO CONTRUYE S.A.S** identificada con el Nit **No. 900.663.211-7** representada legalmente por el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.593.915 de Arauca (Arauca), el cual contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de UN (01) MES. El Contrato de Obra **No. 20260000219**, cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, el día Tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026) se firma el contrato de obra por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) MICTE**, a continuación, se presenta el desglose del presupuesto contratado:

Tabla 7. Condiciones contractuales iniciales del contrato de Obra Pública No. **20260000219.**

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE	M2	125,40	$ 6.431,00	$ 806.447,00
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE	M2	17,80	$ 17.786,00	$ 316.591,00
1.3	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	75,90	$ 47.502,00	$ 3.605.402,00

CARRENO
CONSTRUYE SAS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.4	LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA	ML	338,00	$ 18.119,00	$ 6.124.222,00
2.	CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA				
2.1	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m	ML	198,00	$ 45.526,00	$ 9.014.148,00
2.2	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m	ML	88,23	$ 37.114,00	$ 3.274.568,00
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE				
3.1	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"	ML	144,00	$ 20.912,00	$ 3.011.328,00
3.2	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"	ML	144,00	$ 15.247,00	$ 2.195.568,00
3.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)	UND	74,00	$ 36.280,00	$ 2.684.720,00
3.4	INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)	UND	66,00	$ 44.805,00	$ 2.957.130,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"	M2	125,40	$ 69.044,00	$ 8.658.118,00
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2	17,80	$ 39.477,00	$ 702.691,00
3.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA	M2	28,94	$ 50.979,00	$ 1.475.332,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"	UND	12,00	$ 244.583,00	$ 2.934.996,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"	UND	12,00	$ 105.226,00	$ 1.262.712,00
				TOTAL, COSTO DIRECTO	**$36.860.130,00**
				ADMINISTRACIÓN (24%)	**$ 8.846.431,00**
				IMPREVISTOS (2%)	**$ 737.202,00**
				UTILIDAD (7%)	**$ 2.580.209,00**
				VALOR TOTAL	**$ 49.023.973,00**

4.2 MODIFICACIONES O ADICIONALES AL CONTRATO

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones o adicionales al contrato

CARRENO
CONSTRUYE SAS

de Obra Pública No. **20260000219**.

4.3 COMPENSACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe no se han presentado compensación de mayores y menores cantidades al contrato de Obra Pública No. **20260000219**.

4.4 AVANCE DE LA OBRA

4.4.1 Avance Físico de la obra

Se presenta el avance físico del contrato de Obra Pública No. **20260000219** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, a la fecha del 30 de julio del 2026.

Tabla 8. Avance físico del contrato de Obra Pública No. **20260000219**.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FÍSICO
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE	M2	125,40	125,40	100%
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE	M2	17,80	17,80	100%
1.3	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	75,90	75,90	100%
1.4	LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA	ML	338,00	338,00	100%
2.	**CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA**				
2.1	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m	ML	198,00	198,00	100%
2.2	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m	ML	88,23	88,23	100%
3.	**MANTENIMIENTO DEL PUENTE**				
3.1	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"	ML	198,00	198,00	100%
3.2	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"	ML	88,23	88,23	100%
3.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)	UND	74,00	74,00	100%
3.4	INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)	UND	66,00	66,00	100%

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE FÍSICO
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"	M2	125,40	125,40	100%
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2	17,80	17,80	100%
3.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA	M2	28,94	28,94	100%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"	UND	12,00	12,00	100%
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"	UND	12,00	12,00	100%

La anterior tabla ilustra las cantidades ejecutadas respecto a las contratadas durante el total de días de ejecución, teniendo un avance físico total de 100%.

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas a corte del presente informe, se presenta un avance de ejecución físico del 100%, de lo cual se realizó la ejecución total de las actividades establecidas en la minuta del contrato de Obra Pública No. **20260000219**.



Ilustración 2 Avance Físico del contrato de Obra Pública No. **20260000219**.

4.4.2 Avance Financiero de la obra

A continuación, se presenta el avance financiero del contrato de Obra Pública No. **20260000219** cuyo objeto es **"contrato de Obra Pública No. 20260000219"**, a la fecha del 30 de julio del 2026.

CARREÑO CONSTRUYE

Tabla 9 Avance Financiero del contrato de Obra Pública No. **20260000219.**

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% FINANCIERO EJECUTADO
1.	PRELIMINARES							
1.1	DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE	M2	125,40	$ 6.431,00	$ 806.447,00	125,40	$ 806.447,00	100 %
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE	M2	17,80	$ 17.786,00	$ 316.591,00	17,80	$ 316.591,00	100 %
1.3	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	75,90	$ 47.502,00	$ 3.605.402,00	75,90	$ 3.605.402,00	100 %
1.4	LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA	ML	338,00	$ 18.119,00	$ 6.124.222,00	338,00	$ 6.124.222,00	100 %
2.	CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA							
2.1	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m	ML	198,00	$ 45.526,00	$ 9.014.148,00	198,00	$ 9.014.148,00	100 %
2.2	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m	ML	88,23	$ 37.114,00	$ 3.274.568,00	88,23	$ 3.274.568,00	100 %
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE							
3.1	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"	ML	144,00	$ 20.912,00	$ 3.011.328,00	144,00	$ 3.011.328,00	100 %
3.2	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"	ML	144,00	$ 15.247,00	$ 2.195.568,00	144,00	$ 2.195.568,00	100 %
3.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)	UND	74,00	$ 36.280,00	$ 2.684.720,00	74,00	$ 2.684.720,00	100 %

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% FINANCIERO EJECUTADO
3.4	INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)	UND	66,00	$ 44.805,00	$ 2.957.130,00	66,00	$ 2.957.130,00	100 %
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"	M2	125,40	$ 69.044,00	$ 8.658.118,00	125,40	$ 8.658.118,00	100 %
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2	17,80	$ 39.477,00	$ 702.691,00	17,80	$ 702.691,00	100 %
3.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA	M2	28,94	$ 50.979,00	$ 1.475.332,00	28,94	$ 1.475.332,00	100 %
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"	UND	12,00	$ 244.583,00	$ 2.934.996,00	12,00	$ 2.934.996,00	100 %
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"	UND	12,00	$ 105.226,00	$ 1.262.712,00	12,00	$ 1.262.712,00	100 %
				TOTAL, COSTO DIRECTO	**$ 36.860.130,00**		**$ 36.860.130,00**	100 %
				ADMINISTRACIÓN (24%)	**$ 8.846.431,00**		**$ 8.846.431,00**	100 %
				IMPREVISTOS (2%)	**$ 737.202,00**		**$ 737.202,00**	100 %
				UTILIDAD (7%)	**$ 2.580.209,00**		**$ 2.580.209,00**	100 %
				VALOR TOTAL	**$ 49.023.973,00**		**$ 49.023.973,00**	100 %

CARRENO
CONSTRUYE SAS

La siguiente ilustración muestra el avance financiero realizado durante los 17 días de ejecución, se observa un porcentaje de ejecución financiera del 100% correspondiente a **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 49.023.973,00) MICTE**, de lo cual se realizó la ejecución de las actividades establecidas en el contrato de Obra Pública No. **20260000219**.

RELACION DE AVANCE FINANCIERO	
Valor Total del Contrato	**$ 49.023.973,00**
Valor Total ejecutado	**$ 49.023.973,00**
Porcentaje de ejecución financiera	100%



Ilustración 3 Avance Financiero del contrato de Obra Pública No. **20260000219.**

4.4.4 Avance del plazo Contractual

Con respecto al plazo contractual, establecido en un (1) mes, comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de corte del presente informe, se ha transcurrido el 57 % del plazo total previsto para la ejecución del contrato, durante el cual se han desarrollado las actividades contempladas en el objeto contractual.

4.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Durante el periodo de ejecución del presente informe se realizaron las siguientes actividades del contrato de Obra Pública No. **20260000219** de acuerdo a las especificaciones técnicas y aprobaciones por parte de supervisión.

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

- **ÍTEM 1.1 DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE**

El desmonte de la malla de protección lateral existente consistió en retirar cuidadosamente la malla, incluyendo los elementos de fijación, soportes, accesorios y demás componentes asociados, utilizando herramientas y equipos adecuados y cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos. Los elementos desmontados fueron manipulados y almacenados de manera que se evitara su deterioro, para su posible reutilización, aprovechamiento o disposición final, de acuerdo con las condiciones y especificaciones del proyecto.

ACTIVIDAD:	**DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE**		
ITEM: 1.1		**UNIDAD: M2**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	125,40	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	125,40
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	125,40	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00





CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

- **ÍTEM 1.1 LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE**

La limpieza manual de las estructuras en concreto expuestas a la intemperie consistió en la remoción de suciedad, polvo, residuos, material vegetal, manchas superficiales y demás elementos que se encontraban adheridos a las superficies, mediante el uso de herramientas manuales y elementos adecuados para esta actividad. Los trabajos se realizaron de manera cuidadosa, evitando causar daños o deterioros en el concreto existente y dejando las superficies limpias y en condiciones adecuadas para las actividades posteriores contempladas en el proyecto.

ACTIVIDAD:	**LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE**		
ITEM: 1.2		**UNIDAD: M2**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	17,80	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	17,80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	17,80	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00







CARREÑO
CONSTRUYE SAS

- **ÍTEM 1.3 DESMONTE DE MADERA EXISTENTE**

El desmonte de la madera existente consistió en retirar cuidadosamente los elementos de madera instalados, incluyendo sus elementos de fijación y accesorios asociados, mediante el uso de herramientas y equipos adecuados para la actividad. Los elementos desmontados fueron manipulados y retirados de manera controlada, evitando daños a las estructuras y elementos existentes que permanecieron en el área de intervención. Finalmente, el material retirado fue acopiado y dispuesto de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**DESMONTE DE MADERA EXISTENTE**		
ITEM: 1.3		**UNIDAD: M2**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	75,90	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	75,90
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	75,90	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00

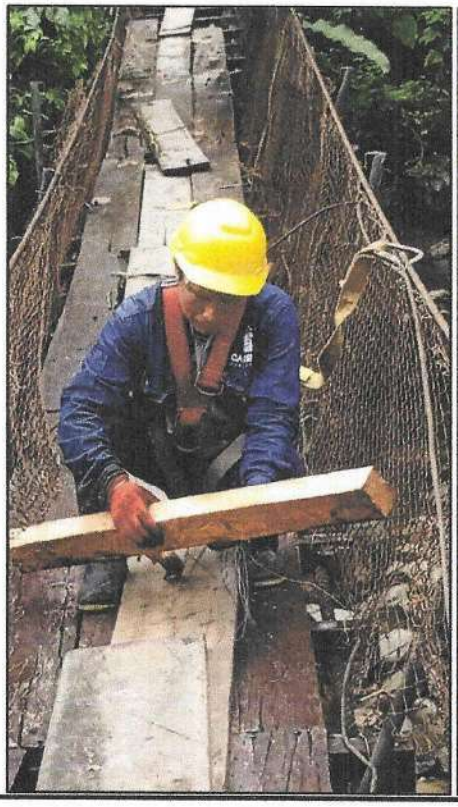

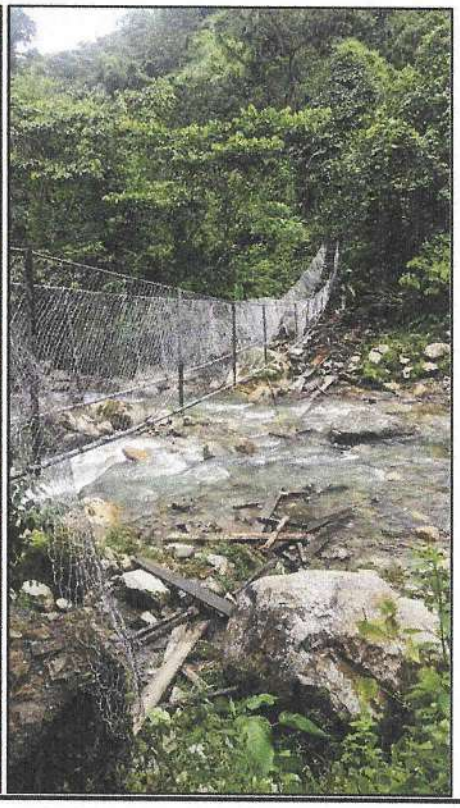

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

- **ÍTEM 1.4 LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA**

La limpieza manual de la guaya principal, pasamos y tubería metálica consistió en la remoción de suciedad, polvo, residuos, óxido superficial y demás elementos adheridos a las superficies, mediante el uso de herramientas manuales y elementos adecuados para la actividad. Los trabajos se realizaron cuidadosamente, procurando no afectar la integridad de los elementos intervenidos y dejando las superficies limpias y libres de materiales que pudieran interferir con las actividades posteriores contempladas en el proyecto.

ACTIVIDAD:	**LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA**		
ITEM: 1.4		**UNIDAD: ML**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	338,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	338,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	338,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00



CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

- **ÍTEM 2.1 CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m**

El corte y transporte de las tablas en madera inmunizada, de dimensiones 0,30 m x 0,03 m, consistió en realizar el corte de las piezas de acuerdo con las dimensiones requeridas y las condiciones establecidas para su instalación. Posteriormente, las tablas fueron cargadas, transportadas a una distancia aproximada de 4 km y descargadas en el sitio destinado para su acopio o instalación, garantizando durante el proceso su adecuada manipulación y conservación, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

ACTIVIDAD:	**CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m**		
ITEM: 2.1		**UNIDAD: ML**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	198,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	198,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	198,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00





CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

- **ÍTEM 2.2 CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m**

El corte y transporte del cuartón en madera inmunizada, de dimensiones 0,09 m x 0,11 m, consistió en realizar el corte de las piezas de acuerdo con las dimensiones requeridas y las condiciones establecidas para su instalación. Posteriormente, los cuartones fueron cargados, transportados a una distancia aproximada de 4 km y descargados en el sitio destinado para su acopio o instalación, garantizando durante el proceso su adecuada manipulación y conservación, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

ACTIVIDAD:	**CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m**		
ITEM: 2.2		**UNIDAD: ML**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	88,23	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	88,23
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	88,23	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00





CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

- **ÍTEM 3.1 TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"**

El tensionamiento de la guaya principal de 1-1/2" consistió en realizar el ajuste y tensionamiento progresivo de la guaya, utilizando las herramientas y elementos adecuados para garantizar la tensión requerida. La actividad se ejecutó verificando la correcta disposición, alineación y fijación de la guaya, asegurando su estabilidad y funcionamiento adecuado de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"**		
ITEM: 3.1		**UNIDAD: ML**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	144,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	144,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	144,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00





CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

- **ÍTEM 3.2 TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"**

El tensionamiento de la guaya para pasamanos de 3/8" consistió en realizar el ajuste y tensionamiento progresivo de la guaya, utilizando las herramientas y elementos adecuados para garantizar la tensión requerida. La actividad se ejecutó verificando la correcta disposición, alineación y fijación de la guaya, asegurando su estabilidad y adecuado funcionamiento como elemento de protección y soporte, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"**		
ITEM: 3.2		**UNIDAD: ML**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	144,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	144,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	144,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00






CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

- **ÍTEM 3.3 INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)**

La instalación de los soportes para piso en cuartón, de dimensiones 0,09 m x 0,11 m x 1,20 m, consistió en ubicar y fijar los elementos de madera en los puntos establecidos, verificando previamente su correcta posición, nivelación y alineación. Los soportes fueron instalados de manera firme y segura, garantizando su estabilidad y adecuada función como elementos de apoyo para el piso, de acuerdo con las dimensiones, condiciones y especificaciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)**		
ITEM: 3.3		**UNIDAD: UND**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	74,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	74,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	74,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00

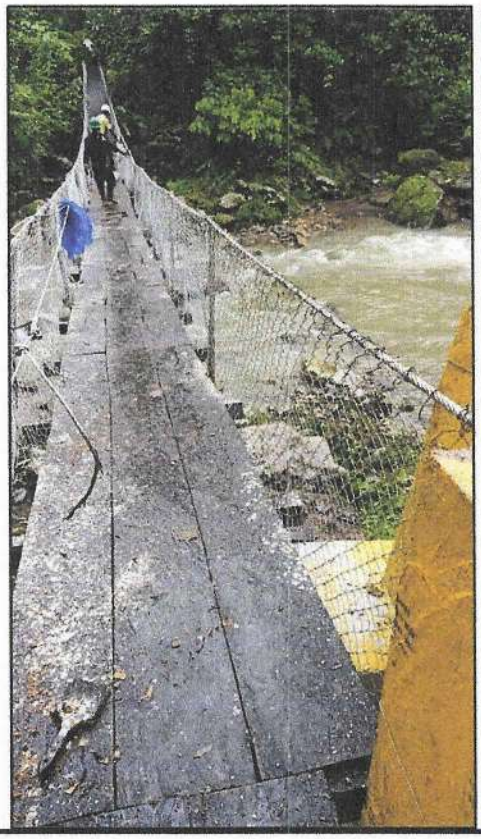




CARREÑO
CONSTRUYE SAS

- **ÍTEM 3.4 INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)**

La instalación del piso en tablas de madera, de dimensiones 0,30 m x 0,03 m x 3,00 m, consistió en la colocación y fijación de las tablas sobre los soportes previamente instalados, verificando su correcta alineación, nivelación, distribución y ajuste. Las tablas fueron instaladas de manera firme y uniforme, garantizando la estabilidad, resistencia y adecuada terminación de la superficie, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)**		
ITEM: 3.4		**UNIDAD: UND**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	66,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	66,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	66,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00

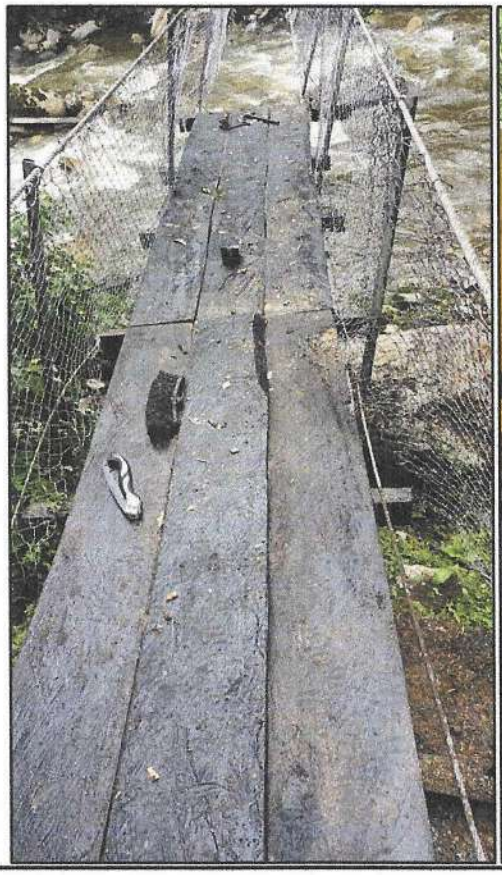



CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

- **ÍTEM 3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"**

El suministro e instalación de la malla eslabonada calibre 13, con abertura de 2" x 2", consistió en proporcionar y transportar el material hasta el sitio de trabajo, para posteriormente realizar su instalación y fijación en los elementos de soporte previamente dispuestos. La malla fue colocada, tensionada y asegurada de manera uniforme, verificando su correcta alineación, estabilidad y firmeza, garantizando su adecuada función como elemento de protección y cerramiento, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"**		
ITEM: 3.5		**UNIDAD: M2**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	125,40	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	125,40
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	125,40	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00





CARRENO
CONSTRUYE S.A.S.

- **ÍTEM 3.6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO**

El suministro y aplicación de pintura epóxica a dos manos sobre las estructuras de concreto consistió en proporcionar los materiales requeridos y preparar previamente las superficies mediante la limpieza y remoción de polvo, suciedad, residuos y demás elementos que pudieran afectar la adherencia del recubrimiento. Posteriormente, se aplicaron dos manos de pintura epóxica de manera uniforme, respetando los tiempos de secado y las condiciones recomendadas para su aplicación. El acabado final presentó una cobertura homogénea y adecuada adherencia, protegiendo las superficies de concreto y mejorando su durabilidad y apariencia, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO**		
ITEM: 3.6		**UNIDAD: M2**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	17,80	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	17,80
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	17,80	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00






CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

- **ÍTEM 3.7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA**

El suministro y aplicación de pintura en esmalte 3 en 1 para exterior, a dos manos, sobre guayas y tubería metálica consistió en proporcionar los materiales requeridos y realizar previamente la limpieza y preparación de las superficies, mediante la remoción de polvo, suciedad, óxido superficial, residuos y demás elementos que pudieran afectar la adherencia del recubrimiento. Posteriormente, se aplicaron dos manos de esmalte de manera uniforme sobre las guayas y tuberías metálicas, garantizando una adecuada cobertura y protección de los elementos frente a las condiciones ambientales, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA**		
ITEM: 3.7		**UNIDAD: M2**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	28,94	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	28,94
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	28,94	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00



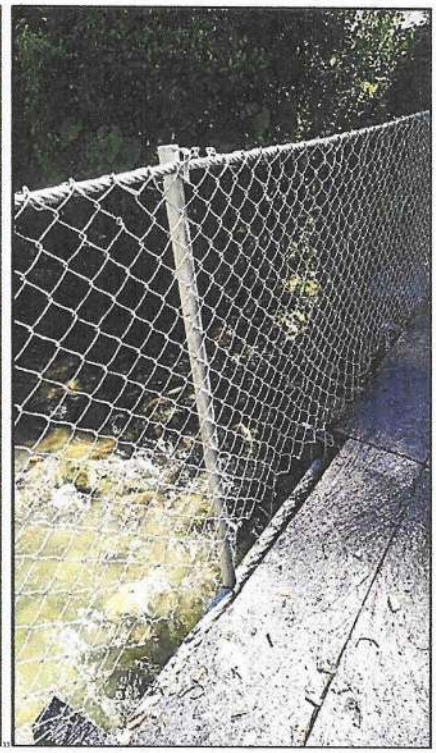

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

- **ÍTEM 3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"**

El suministro e instalación de conectores tipo perro para guaya de 1-1/2" consistió en proporcionar los elementos requeridos y realizar su colocación en los puntos de unión establecidos, efectuando el ajuste y apriete correspondiente para garantizar una sujeción firme y segura de la guaya. La instalación se realizó verificando la correcta ubicación, fijación y ajuste de los conectores, asegurando la estabilidad de las uniones y el adecuado funcionamiento del sistema, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"**		
ITEM: 3.8		**UNIDAD: UND**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	12,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	12,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	12,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00



CARREÑO
CONSTRUYE SAS

- **ÍTEM 3.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"**

El suministro e instalación de conectores tipo perro para guaya de 3/8" consistió en proporcionar los elementos requeridos y realizar su colocación en los puntos de unión establecidos, efectuando el ajuste y apriete correspondiente para garantizar una sujeción firme y segura de la guaya. La instalación se realizó verificando la correcta ubicación, fijación y ajuste de los conectores, asegurando la estabilidad de las uniones y el adecuado funcionamiento del sistema, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas para el proyecto.

ACTIVIDAD:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"**		
ITEM: 3.9		**UNIDAD: UND**	
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	12,00	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA:	12,00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:	12,00	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	CANTIDAD POR JECUTAR:	0,00



CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con la ejecución del Contrato de Obra Pública No. **20260000219** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**. El estado actual del proyecto presenta un balance de obra ejecutada de acuerdo con las especificaciones técnicas y proceso constructivo del proyecto y en general con las normas técnicas de construcción vigentes y rigentes en Colombia para este tipo de obras. De lo cual se puede resaltar lo siguiente:

- Se garantizó la ejecución de las actividades del contrato de obra No. 20260000219 que tiene como objeto: **"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, las cuales se ejecutaron dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de las obras ejecutadas.

- De acuerdo al seguimiento realizado a la ejecución del Contrato de obra No. **20260000219**, a la fecha del presente informe, se presentan los siguientes rendimientos: Avance físico general (100%) y Avance Financiero de 100% correspondiente a **$49.023.973,00 M/CTE**.

- La empresa **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S** representada legalmente por el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO**, suministró la dotación y elementos de protección personal al personal vinculado a la obra, y dio cumplimiento estricto con las obligaciones de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales requeridos para el desarrollo de las actividades.

- Como se puede evidenciar en el presente informe, se dio cumplimiento a lo estipulado en la minuta del contrato de obra No. **20260000219** cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**, con el desarrollo y ejecución de las actividades de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto y en los tiempos estipulados para el desarrollo de las mismas.

ELABORADO Y APROBADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
NIT 900.663.211-7
RESIDENTE DE OBRA

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

6. ANEXOS

ANEXO 1. BITACORA DE OBRA
ANEXO 2. PAGO NOMINA, PAZ Y SALVO PERSONAL
ANEXO 3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
ANEXO 4. MEMORIAS DE CÁLCULOS
ANEXO 5. CERTIFICACIÓN CAJA DE COMPENSACIÓN Y FIC
ANEXO 6. COPIA ACTA DE RECIBO FINAL
ANEXO 7. FACTURA ELECTRONICA
ANEXO 8. CERTIFICACIÓN BANCARIA

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

ANEXO 1

BITACORA DE OBRA

CARREÑO CONSTRUYE S.A.S	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026
		VERSION 2026
	BITACORA DIARIA DE OBRA	

FECHA:	martes, 14 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	1
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	MAÑANA	TARDE
SOLEADO		
SECO		
NUBLADO	X	X
LLUVIA PASAJERA		X
LLUVIA FUERTE	X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:

SEÑALIZACION

CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se ejecutaron actividades correspondientes al desmonte de la malla de protección lateral existente, realizando el retiro progresivo de la malla instalada en los laterales del puente.

La jornada se desarrolló bajo condiciones de cielo nublado, presentándose lluvias intermitentes durante diferentes momentos del día, las cuales generaron pausas temporales en las actividades.

Durante la jornada se alcanzó un avance de 60,00 m², equivalente al 47,85 % del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026	
		VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	miércoles, 15 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	2
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO/DURACION		
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**		**AM**	**PM**
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS		SOLEADO		
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA		SECO		
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR		NUBLADO	X	X
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA		LLUVIA PASAJERA		
						LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron y finalizaron las actividades correspondientes al desmonte de la malla de protección lateral existente, efectuando el retiro de los elementos restantes ubicados en los laterales del puente y dejando las superficies despejadas para continuar con las actividades de mantenimiento previstas.

Durante la jornada se ejecutó un alcance de 65,40 m², equivalente al 52,15 % del ítem contratado. Con esta actividad se completó la cantidad total contratada de 125,40 m².

EQUIPOS EN OBRA		
DESCRIPCION	**CANT**	**ESTADO**
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**		

ACCIDENTES EN OBRA			
OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	**X**
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	**X**

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026
		VERSION 2026
	BITACORA DIARIA DE OBRA	

FECHA:	jueves, 16 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	3
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO/DURACION		
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**		**AM**	**PM**
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS		SOLEADO		X
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA		SECO		
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR		NUBLADO	X	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA		LLUVIA PASAJERA	X	
						LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se ejecutaron actividades correspondientes al desmonte de la madera existente, realizando el retiro progresivo de los elementos de madera que conformaban el piso existente del puente.

Durante la jornada se presentaron condiciones de cielo nublado y lluvias ocasionales, generando interrupciones temporales de las labores y retomándose los trabajos durante los períodos de mejores condiciones climáticas.

Durante la jornada se alcanzó un avance de 38,00 m², equivalente al 50,07 % del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA		
DESCRIPCION	**CANT**	**ESTADO**
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**		

ACCIDENTES EN OBRA			
OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026	
		VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	viernes, 17 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	4
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO/DURACION		
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**		**AM**	**PM**
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS		SOLEADO		X
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA		SECO		
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR		NUBLADO	X	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA		LLUVIA PASAJERA		
						LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron las actividades de desmonte de la madera existente, realizando el retiro de los elementos restantes que presentaban condiciones para ser reemplazados dentro de las actividades de mantenimiento del puente.

Durante la jornada se ejecutó un alcance de 37,90 m², equivalente al 49,93 % del ítem contratado, completando así la cantidad total prevista de 75,90 m².

EQUIPOS EN OBRA		
DESCRIPCION	**CANT**	**ESTADO**
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**		

ACCIDENTES EN OBRA			
OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	**X**
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	**X**

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026	
		VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	sábado, 18 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	5
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO/DURACION		
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**		**AM**	**PM**
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS		SOLEADO		X
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA		SECO		
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR		NUBLADO	X	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA		LLUVIA PASAJERA	X	
						LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se ejecutaron actividades de limpieza manual de las estructuras de concreto a la intemperie y se inició la limpieza manual de la guaya principal, pasamanos y tubería metálica.

La jornada presentó cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes, por lo cual se presentaron pausas temporales en las actividades, especialmente durante los períodos de mayor precipitación.

Durante la jornada se ejecutaron 8,90 m² de limpieza de estructuras de concreto y 120,00 ml de limpieza de guaya principal, pasamanos y tubería metálica.

EQUIPOS EN OBRA		
DESCRIPCION	**CANT**	**ESTADO**
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**		

ACCIDENTES EN OBRA			
OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	**X**
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	**X**

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026
		VERSION 2026
	BITACORA DIARIA DE OBRA	

FECHA:	domingo, 19 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	6
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO		X
SECO		
NUBLADO	X	
LLUVIA PASAJERA		
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:

SEÑALIZACION

CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron las actividades de limpieza manual de la guaya principal, pasamanos y tubería metálica, completando el retiro de suciedad y material superficial presente sobre los elementos metálicos.

Asimismo, se finalizaron las actividades correspondientes a la limpieza manual de las estructuras de concreto a la intemperie.

Durante la jornada se ejecutaron 218,00 ml de limpieza de guaya principal, pasamanos y tubería metálica, equivalentes al 64,50 % del ítem contratado, completando la cantidad total de 338,00 ml. Igualmente, se ejecutaron 8,90 m² de limpieza de estructuras de concreto, completando el 50,00 % restante del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026	
		VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	lunes, 20 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	7
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegria, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO		
SECO		
NUBLADO	X	X
LLUVIA PASAJERA	X	
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:

SEÑALIZACION

CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se iniciaron las actividades correspondientes al corte y transporte de tablas y cuartones en madera inmunizada, realizando el dimensionamiento y traslado del material requerido para las posteriores actividades de instalación.

Durante la jornada se presentaron condiciones nubladas con lluvias intermitentes, por lo que las actividades se desarrollaron de manera alternada de acuerdo con las condiciones climáticas existentes.

Durante la jornada se ejecutaron 100,00 ml de tablas, equivalentes al 50,51 % del ítem contratado, y 44,115 ml de cuartón, equivalentes al 50,00 % del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L. CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE S.A.S	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026 VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	martes, 21 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	8
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegria, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO	X	X
SECO		
NUBLADO		
LLUVIA PASAJERA		
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:

SEÑALIZACION

CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron y finalizaron las actividades de corte y transporte de tablas y cuartones en madera inmunizada, completando el suministro y traslado del material requerido para las actividades posteriores de instalación del piso y sus respectivos soportes.

Durante la jornada se ejecutaron 98,00 ml de tablas, equivalentes al 49,49 % restante del ítem contratado, y 44,115 ml de cuartón, equivalentes al 50,00 % restante, completando las cantidades contratadas de 198,00 ml de tablas y 88,23 ml de cuartón.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	**X**
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	**X**

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L. CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026	
		VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	miércoles, 22 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	9
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO		X
SECO		
NUBLADO	X	
LLUVIA PASAJERA		
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se iniciaron las actividades de tensionamiento de la guaya principal de 1½", realizando los trabajos necesarios para recuperar y ajustar la tensión de la guaya existente.

De igual manera, se inició el tensionamiento de la guaya para pasamanos de 3/8", realizando el ajuste correspondiente para garantizar las condiciones requeridas para la posterior intervención del puente.

Asimismo, se realizó el suministro e instalación de conectores tipo perro para guaya de 1½" completando los elementos de fijación previstos.

Asimismo, se realizó el suministro e instalación de conectores tipo perro para guaya de 3/8", completando los elementos de fijación previstos.

Durante la jornada se ejecutaron 72,00 ml de tensionamiento de guaya principal de 1½", equivalentes al 50,00 % del ítem contratado, y 72,00 ml de tensionamiento de guaya para pasamanos de 3/8", equivalentes al 50,00 % del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE S.A.S	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026 VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	jueves, 23 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	10
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO	X	X
SECO		
NUBLADO		
LLUVIA PASAJERA		
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron y finalizaron las actividades de tensionamiento de la guaya principal de 1½" y de la guaya para pasamanos de 3/8", completando los trabajos de ajuste y tensionamiento previstos para los elementos intervenidos.

Durante la jornada se ejecutaron 72,00 ml adicionales de guaya principal de 1½" y 72,00 ml adicionales de guaya para pasamanos de 3/8", completando en ambos casos el 100 % de las cantidades contratadas, correspondientes a 144,00 ml por cada ítem.

Asimismo, se realizó el suministro e instalación de conectores tipo perro para guaya de 1½" completando los elementos de fijación previstos.

Asimismo, se realizó el suministro e instalación de conectores tipo perro para guaya de 3/8", completando los elementos de fijación previstos.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026
		VERSION 2026
	BITACORA DIARIA DE OBRA	

FECHA:	viernes, 24 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	11
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO	X	
SECO		
NUBLADO		X
LLUVIA PASAJERA		X
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se ejecutaron actividades correspondientes a la instalación de soportes para piso en cuartón, realizando la colocación y fijación de los elementos destinados a conformar la estructura de soporte del nuevo piso del puente.

Durante la jornada se presentaron condiciones de cielo nublado y lluvias ocasionales, generándose pausas temporales durante los períodos de precipitación.

Durante la jornada se instalaron 74 unidades de soportes para piso, correspondientes igualmente al 100 % de la cantidad contratada.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026	
		VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	sábado, 25 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	12
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO/DURACION		
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**		**AM**	**PM**
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS		SOLEADO		
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA		SECO		
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR		NUBLADO	X	X
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA		LLUVIA PASAJERA		
						LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se ejecutaron las actividades correspondientes a la instalación del piso en tabla de madera, realizando la colocación de las tablas previamente cortadas y transportadas, sobre los soportes instalados, conformando progresivamente la superficie de circulación del puente.

Durante la jornada se instalaron 66 unidades de piso en tabla, correspondientes al 100 % del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA		
DESCRIPCION	**CANT**	**ESTADO**
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**		

ACCIDENTES EN OBRA			
OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026
		VERSION 2026
	BITACORA DIARIA DE OBRA	

FECHA:	domingo, 26 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	13
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA						**ESTADO DEL TIEMPO/DURACION**		
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**		**AM**	**PM**
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS		SOLEADO		X
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA		SECO		
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR		NUBLADO	X	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA		LLUVIA PASAJERA		
						LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					**SEÑALIZACION**		
CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se iniciaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de malla eslabonada calibre 13 de 2" × 2", realizando la colocación progresiva de la malla de protección lateral sobre la estructura del puente y efectuando su respectiva fijación.

Durante la jornada se alcanzó un avance de 62,70 m², equivalente al 50,00 % del ítem contratado, cuya cantidad total correspondía a 125,40 m².

EQUIPOS EN OBRA		
DESCRIPCION	**CANT**	**ESTADO**
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**		

ACCIDENTES EN OBRA			
OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026 VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	lunes, 27 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	14
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO	X	X
SECO		
NUBLADO		
LLUVIA PASAJERA		
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:

SEÑALIZACION

CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron y finalizaron las actividades de suministro e instalación de malla eslabonada calibre 13 de 2" × 2", completando la instalación de la protección lateral prevista para el puente.

Adicionalmente, se iniciaron las actividades correspondientes al suministro y aplicación de pintura epóxica a dos manos sobre las estructuras de concreto, realizando la preparación y aplicación del recubrimiento sobre las superficies previamente limpiadas.

Durante la jornada se ejecutaron 62,70 m² de instalación de malla, completando el 50,00 % restante del ítem, y 8,90 m² de pintura epóxica, equivalentes al 50,00 % del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026 VERSION 2026	
	BITACORA DIARIA DE OBRA		

FECHA:	martes, 28 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	15
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO	X	X
SECO		
NUBLADO		
LLUVIA PASAJERA		
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:

SEÑALIZACION

CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se finalizaron las actividades correspondientes al suministro y aplicación de pintura epóxica a dos manos sobre las estructuras de concreto, completando el recubrimiento previsto para las superficies intervenidas.

Posteriormente, se iniciaron las actividades de suministro y aplicación de pintura en esmalte 3 en 1 exterior para guayas y tubería metálica, realizando la aplicación del recubrimiento sobre los elementos previamente sometidos al proceso de limpieza.

Durante la jornada se ejecutaron 8,90 m² de pintura epóxica, completando el 50,00 % restante del ítem contratado, y 10,00 m² de pintura en esmalte, equivalentes al 34,55 % del ítem contratado.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026
		VERSION 2026
	BITACORA DIARIA DE OBRA	

FECHA:	miércoles, 29 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	**16**
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO/DURACION		
CARGO	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**	**CARGO**	**CANTIDAD**		**AM**	**PM**
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS		SOLEADO	X	X
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA		SECO		
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR		NUBLADO		
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA		LLUVIA PASAJERA		
						LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL					SEÑALIZACION		
CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:	CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron las actividades correspondientes al suministro y aplicación de pintura en esmalte 3 en 1 exterior para guayas y tubería metálica, dando continuidad al proceso de acabado de los elementos metálicos previamente limpiados y preparados.

Durante la jornada se alcanzó un avance de 10,00 m², equivalente al 34,55 % del ítem contratado, acumulando un avance de 20,00 m² en la actividad de pintura en esmalte.

EQUIPOS EN OBRA		
DESCRIPCION	**CANT**	**ESTADO**
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**		

ACCIDENTES EN OBRA			
OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	**X**
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	**X**

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L. CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE	CONTROL DE OBRA	CC-CO-014-2026
		VERSION 2026
	BITACORA DIARIA DE OBRA	

FECHA:	jueves, 30 de julio de 2026	**HOJA NUMERO:**	17
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARÁ		
CONTRATISTA:	CARREÑO CONTRUYE S.A.S R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO		
CONTRATO DE OBRA N°: 20260000219	**OBJETO:**	"MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."	
LOCALIZACION:	Comunidad Indígena Tegría, sector El Zulia, municipio de Cubará, Boyacá.		

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANTIDAD
INGENIERO	1	TOPOGRAFO		TUBEROS	
MAESTRO		CADENEROS		ALMACENISTA	
OFICIAL	1	OPERARIOS		ORNAMENTADOR	
AYUDANTES	2	CONDUCTORES		ELECTRICISTA	

ESTADO DEL TIEMPO/DURACION

	AM	PM
SOLEADO	x	X
SECO		
NUBLADO		
LLUVIA PASAJERA		
LLUVIA FUERTE		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASCO: **X**	BOTAS: **X**	GUANTES: **X**	GAFAS: **X**	CARNET:

SEÑALIZACION

CONOS:	CINTA REFLECTIVA: **X**	SEÑALES PREVENTIVAS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el transcurso del día se continuaron y finalizaron las actividades correspondientes al suministro y aplicación de pintura en esmalte 3 en 1 exterior para guayas y tubería metálica, completando la aplicación del acabado previsto sobre los elementos metálicos intervenidos.

Durante la jornada se ejecutó un alcance de 8,94 m², equivalente al 30,89 % del ítem contratado, completando así la cantidad total contratada de 28,94 m² y finalizando las actividades contempladas en el presupuesto contrato.

EQUIPOS EN OBRA

DESCRIPCION	CANT	ESTADO
Diferencial Industrial de 5 Toneladas	1	1
Motosierra A Gasolina	1	1
Kit Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE = **1** BUENO = **2** DEFICIENTE = **3**

ACCIDENTES EN OBRA

OCURRIO ALGUN ACCIDENTE?			
SI		NO	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeñaba:			
Hubo lesion?			
SI		NO	X

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L: CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARRENO
CONSTRUYE S.A.S

ANEXO 2

PAGO NOMINA, PAZ Y SALVO PERSONAL

CARREÑO CONSTRUYE SAS

PERSONAL OPERATIVO PARA EL CONTRATO No. MC-071-2026

LIQUIDACION DE NOMINA DEL 15 AGOSTO A 25 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	No. CONTRATO	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	DIAS TRABAJADOS	SALARIO	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	PRIMA	VACACIONES	TOTAL NOMINA	
1	MC-071-2026	CAMPERO PEÑA ALCADIO	9.467.069	OFICIAL	17	2.877.900	1.630.810	141.154	147.663	1.477	147.663	67.949	2.136.716	Alcadio Campero B.
2	MC-071-2026	YEIMER FABIAN UNCACIA TARAZONA	1.049.395.684	AYUDANTE	17	2.142.990	1.214.361	141.154	112.960	1.130	112.959	50.598	1.633.161	Fabian Uncacia T
3	MC-071-2026	TEGRIA TEGRIA RUTKUARO	1049392074	AYUDANTE	17	2.142.990	1.214.361	141.154	112.959	1.130	112.959	50.598	1.633.160	Zoltega Tegria.
						-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALES				-	4.059.532	423.462	373.582	3.736	373.581	169.144	5.403.037	

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONSTRUYE SAS
REVISO

NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO
AUXILIAR CONTABLE
ELABORO

MAYERNY DIAZ
CONTADOR
APROBO

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

PAZ Y SALVO

Yo YEINER FABIAN UNCACIA TARAZONA con documento de identidad 1.049.395.684, por la presente declaro que he cumplido con todas mis obligaciones y compromisos adquiridos con la empresa CARREÑO CONSTRUYE, en el proyecto que tuvo como objeto "MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ", realizado entre el 14 de Julio de 2026 al 30 de Julio de 2026.

Confirmo que a la fecha no existe saldo pendiente ni deuda alguna entre ambas partes, y que he recibido el pago correspondiente por todos los servicios prestados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:

YEINER FABIAN UNCACIA TARAZONA
C.C 1.049.395.684

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

PAZ Y SALVO

Yo ARCADIO CAMPEROS PEÑA con documento de identidad 9.467.069, por la presente declaro que he cumplido con todas mis obligaciones y compromisos adquiridos con la empresa CARREÑO CONSTRUYE, en el proyecto que tuvo como objeto "MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ", realizado entre el 14 de Julio de 2026 al 30 de Julio de 2026.

Confirmo que a la fecha no existe saldo pendiente ni deuda alguna entre ambas partes, y que he recibido el pago correspondiente por todos los servicios prestados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:

Arcadio Campero P.
ARCADIO CAMPEROS PEÑA
C.C 9.467.069

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

PAZ Y SALVO

Yo RUTKUARO TEGRIA TEGRIA con documento de identidad 1.049.392.074, por la presente declaro que he cumplido con todas mis obligaciones y compromisos adquiridos con la empresa CARREÑO CONSTRUYE, en el proyecto que tuvo como objeto "MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ", realizado entre el 14 de Julio de 2026 al 30 de Julio de 2026.

Confirmo que a la fecha no existe saldo pendiente ni deuda alguna entre ambas partes, y que he recibido el pago correspondiente por todos los servicios prestados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:

Rutkuaro Tegria.

RUTKUARO TEGRIA TEGRIA
C.C 1.049.392.074

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

ANEXO 3

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38284887
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-08-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CARRENO CONSTRUYE SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900663211	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 16A 24 27	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4210	CORREO ELECTRÓNICO	WILCARTRU@GMAIL.COM	TELÉFONO	8820232
FAX	3173792511	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	17593915	PRIMER APELLIDO	CARREAO	SEGUNDO APELLIDO	TRUJILLO
PRIMER NOMBRE	WILSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 07	Año: 2026	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$5.979.582		38284887

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-9467069	01	No	No	No	15	223	5411202	Fijo	CAMPEROS PEÑA ALCADIO	$2.877.900
CC-17593915	01	No	No	No	81	736	5421002	Fijo	CARREÑO TRUJILLO WILSON	$1.750.905
CC-1049392074	01	No	No	No	15	223	5411202	Fijo	TEGRIA TEGRIA RUTKUARO	$2.142.990
CC-1049395684	01	No	No	No	15	223	5411202	Fijo	UNCACIA TARAZONA YEINER FABIAN	$2.142.990

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 9467069	X	2026-07-14	X	2026-07-30																								0		
CC - 17593915																												0		
CC - 1049392074	X	2026-07-14	X	2026-07-30																								0		
CC - 1049395684	X	2026-07-14	X	2026-07-30																								0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9467069	PORVENIR	17	$1.630.810	0.1600000	$261.000	$0	$0	$261.000	$0	$0	$0
CC - 17593915	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1049392074	PORVENIR	17	$1.214.361	0.1600000	$194.300	$0	$0	$194.300	$0	$0	$0
CC - 1049395684	PORVENIR	17	$1.214.361	0.1600000	$194.300	$0	$0	$194.300	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9467069	EPS-S COOSALUD	17	$1.630.810	0.1250000	$203.900	$0	0	$0	0	$0	17	$1.630.810	2	0.0696000	$113.600
CC - 17593915	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200
CC - 1049392074	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17	$1.214.361	0.1250000	$151.800	$0	0	$0	0	$0	17	$1.214.361	2	0.0696000	$84.600
CC - 1049395684	NUEVA E.P.S. S.A.	17	$1.214.361	0.1250000	$151.800	$0	0	$0	0	$0	17	$1.214.361	2	0.0696000	$84.600

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-9467069	COMFABOY	17	$1.698.759	0.0400000	$68.000	0.0200000	$34.000	0.0300000	$51.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17593915	COMFIAR	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049392074	COMFABOY	17	$1.264.959	0.0400000	$50.600	0.0200000	$25.300	0.0300000	$38.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049395684	COMFABOY	17	$1.264.959	0.0400000	$50.600	0.0200000	$25.300	0.0300000	$38.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$649.600	$0	$0	$0	$0	1	$500	$0	$0	$650.100
COLFONDOS	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	1	$300	$0	$0	$280.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$203.900	$0	0	$0	0	$0	$203.900	1	$200	$0	$204.100	$0	0	$0	$0	$204.100	$0	$0	$204.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$151.800	$0	0	$0	0	$0	$151.800	1	$200	$0	$152.000	$0	0	$0	$0	$152.000	$0	$0	$152.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$370.700	$0	0	$0	0	$0	$370.700	1	$300	$0	$371.000	$0	0	$0	$0	$371.000	$0	$0	$371.000

237

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$292.000	0	$0	$0	$292.000	1	$300	$292.300	0	$0	$0	$292.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	1	$70.100	1	$100	$70.200
COMFABOY	3	$169.200	1	$200	$169.400
SENA	4	$119.700	1	$100	$119.800
ICBF	4	$179.600	1	$200	$179.800
ESAP	0	$0	1	$0	$0
MinEdu	0	$0	1	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$727.100
PENSIONES	2	$930.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$292.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$239.600
SENA	1	$119.800
ICBF	1	$179.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.489.200

CARREÑO
CONSTRUYE SAS

ANEXO 4

MEMORIAS DE CÁLCULOS

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		1.1	UNIDAD:
1.	PRELIMINARES	DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE	M2



UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA			
Desmonte De Malla De Protección	66,00		0,95	62,70	2,00	125,40
				TOTAL, CONTRATADO		125,40
				TOTAL, EJECUTADO		125,40
				TOTAL, POR EJECUTAR		0,00
				PORCENTAJE EJECUTADO		100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	PRELIMINARES	1.2	UNIDAD:
1.		LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE	M2



UBICACIÓN	MEDIDAS ESTRUCTURAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA			
Limpieza De Pilares (0,3m X 0,25m X 1,5M)	0,30	0,25	1,50	1,65	4,00	6,60
Limpieza de Dados de Anclaje (2m X 1,2m X 0,5m)	2,00	1,20	0,50	5,60	2,00	11,20
TOTAL, CONTRATADO						17,80
TOTAL, EJECUTADO						17,80
TOTAL, POR EJECUTAR						0,00
PORCENTAJE EJECUTADO						100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		1.3	UNIDAD:
1.	PRELIMINARES	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2



UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA			
Demonte Madera Existente - Tablas y Listones	66,00	1,15		75,90	1,00	75,90

TOTAL, CONTRATADO	75,90
TOTAL, EJECUTADO	75,90
TOTAL, POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	PRELIMINARES	1.4	UNIDAD:
1.		LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA	ML



UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	DIAMETRO	PERIMETRO			
Cable de Acero Principal 1-1/2"	72,00	0.0381			2,00	144,00
Cable de Acero Pasamanos 3/4"	72,00	0.0191			2,00	144,00
Tuberia metalica 1"	1,00	0,0334			50,00	50,00
				TOTAL, CONTRATADO		338,00
				TOTAL, EJECUTADO		338,00
				TOTAL, POR EJECUTAR		0,00
				PORCENTAJE EJECUTADO		100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		2.1	UNIDAD:
2.	CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m	ML



UBICACIÓN	MEDIDAS			LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
	ANCHO DE LA TABLA	ANCHO DEL PISO	LONGITUD DEL PISO			
Tablas Para Piso	0,30	0,90	66,00	198,00	1,00	198,00

TOTAL, CONTRATADO	198,00
TOTAL, EJECUTADO	198,00
TOTAL, POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		2.2	UNIDAD:
2.	CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,09m x 0,11m	ML



UBICACIÓN	MEDIDAS			LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
	SEPARACIÓN ENTRE CUARTÓN	LONGITUD CUARTÓN	LONGITUD DEL PISO			
Cuartón Para Soporte Piso	0,91	1,20	66,00	88,23	1,00	88,23
				TOTAL, CONTRATADO		88,23
				TOTAL, EJECUTADO		88,23
				TOTAL, POR EJECUTAR		0,00
				PORCENTAJE EJECUTADO		100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE S.A.S

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	3.1	UNIDAD:
3.		TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"	ML



UBICACIÓN	MEDIDAS			LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	DIAMETRO	PERIMETRO			
Cable de Acero Principal 1/2"	72,00	0.0381			2,00	144,00
				TOTAL, CONTRATADO		144,00
				TOTAL, EJECUTADO		144,00
				TOTAL, POR EJECUTAR		0,00
				PORCENTAJE EJECUTADO		100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	3.2	UNIDAD:
3.		TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"	ML



UBICACIÓN	MEDIDAS			LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	DIAMETRO	PERIMETRO			
Cable de Acero Principal 1/2"	72,00	0.0191			2,00	144,00
				TOTAL, CONTRATADO		144,00
				TOTAL, EJECUTADO		144,00
				TOTAL, POR EJECUTAR		0,00
				PORCENTAJE EJECUTADO		100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	3.3	UNIDAD:
3.		INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)	UND



UBICACIÓN	MEDIDAS			LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
	LONGITUD DEL PISO	SEPARACIÓN ENTRE CUARTÓN	LONGITUD CUARTÓN			
Cuartón Para Soporte Piso	66,00	0,91	1,20		73,53	74,00

TOTAL, CONTRATADO	74,00
TOTAL, EJECUTADO	74,00
TOTAL, POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE...

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	3.4	UNIDAD:
3.		INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0.03m X 3,00m)	UND



UBICACIÓN	MEDIDAS			LONGITUD DEL PISO	CANTIDAD	TOTAL
	ANCHO DE LA TABLA	ANCHO DEL PISO	LONGITUD DE TABLA			
Tablas Para Piso	0,30	0,90	3,00	66,00	66,00	66,00
				TOTAL, CONTRATADO		66,00
				TOTAL, EJECUTADO		66,00
				TOTAL, POR EJECUTAR		0,00
				PORCENTAJE EJECUTADO		100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S.
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	3.5	UNIDAD:
3.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"	M2



UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA			
Malla Eslabonada Cal.13 Para Proteccion Lateral	66,00		0,95	62,70	2,00	125,40

TOTAL, CONTRATADO	125,40
TOTAL, EJECUTADO	125,40
TOTAL, POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		3.6	UNIDAD:
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2



UBICACIÓN	MEDIDAS ESTRUCTURAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	ANCHO	ALTURA			
Pintura Para Pilares (0,3m X 0,25m X 1,5M)	0,30	0,25	1,50	1,65	4,00	6,60
Pintura Para Dados de Anclaje (2m X 1,2m X 0,5m)	2,00	1,20	0,50	5,60	2,00	11,20
TOTAL, CONTRATADO						17,80
TOTAL, EJECUTADO						17,80
TOTAL, POR EJECUTAR						0,00
PORCENTAJE EJECUTADO						100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		3.7	UNIDAD:
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA	M2



UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	DIAMETRO	PERIMETRO			
Cable de Acero Principal 1-1/2"	66,00	0.0381	0,1197	7,9002	2,00	15,80
Cable de Acero Pasamanos 3/4"	66,00	0.0191	0,0598	3,9468	2,00	7,89
Tuberia metalica 1"	1,00	0,0334	0,1049	0,1049	50,00	5,25
				TOTAL, CONTRATADO		28,94
				TOTAL, EJECUTADO		28,94
				TOTAL, POR EJECUTAR		0,00
				PORCENTAJE EJECUTADO		100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESUS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE S.A.S

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		3.8	UNIDAD:
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"	UND



UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	DIAMETRO	PERIMETRO			
Conector Tipo Perro Para Cable de Acero Principal 1-1/2"					12,00	12,00

TOTAL, CONTRATADO	12,00
TOTAL, EJECUTADO	12,00
TOTAL, POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARREÑO CONSTRUYE

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 20260000219

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.

MEMORIAS DE CALCULO

ÍTEM		3.9	UNIDAD:
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"	UND



UBICACIÓN	MEDIDAS			AREA	CANTIDAD	TOTAL
	LONG	DIAMETRO	PERIMETRO			
Conector Tipo Perro Para Cable de Acero 3/8"					12,00	12,00

TOTAL, CONTRATADO	12,00
TOTAL, EJECUTADO	12,00
TOTAL, POR EJECUTAR	0,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

ELABORADO:

WILSON CARREÑO TRUJILLO
R/L CARREÑO CONTRUYE S.A.S
Residente De Obra

APROBADO:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

CARRENO
CONSTRUYE S.A.S

ANEXO 5

CERTIFICACIÓN CAJA DE COMPENSACIÓN Y FIC

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CARRE¿O CONSTRUYE S.A.S identificado con el NIT 900663211, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
20260000219	MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL	CUBARA	122,600	2026-08	19-AGO-2026	168599430
		Total	122,600			

Expedido por el SENA, a los diecinueve (19) dias del mes de Agosto de 2026

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2026-08-19

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 4235275884 y el Número de Certificado: 881394

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7912206

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA	
No.	168599430

FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	08	2026
FECHA VENCIMIENTO		
22	08	2026

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador CARREÑO CONSTRUYE **NIT o C.C.** 900663211

Dirección CR 16A 24 27 **Teléfono** +57,3173792511

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 122,600.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 122,600.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7912206(3900)000000122600(96)20260822

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 **REFERENCIA No.** 168599430

Ciudad | D | M | A | NIT 900663211 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CARREÑO CONSTRUYE

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7912206

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA	
No.	168599430

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	08	2026
FECHA VENCIMIENTO		
22	08	2026

Nombre Pagador CARREÑO CONSTRUYE — **NIT o C.C.** 900663211

Dirección CR 16A 24 27 — **Teléfono** +57,3173792511

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 122,600.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 122,600.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7912206(3900)000000122600(96)20260822

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 — **REFERENCIA No.** 168599430

Ciudad | D | M | A | NIT 900663211 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CARREÑO CONSTRUYE

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S.

ANEXO 6

COPIA ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No:	20260000219	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
		14/07/2026	$ 49.023.973,00
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ,	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
		UN (01) MES	N/A
CONTRATISTA:	CARREÑO CONSTRUYE S.A.S. NIT. No. 900.663.211-7 R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL
		13/08/2026	$ 49.023.973,00
		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
INTERVENTORIA :	N/A	1/08/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	DIECINUEVE (19) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	63,33%	100%
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	14/07/2026 - 01/08/2026	ESTADO DEL CONTRATO:	
		FINALIZADO	

ACTA DE RECIBO FINAL

En el Municipio de Cubará, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **20260000219**, el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO** R/L. **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT 900.663.211-7 en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **20260000219**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
1.	PRELIMINARES								
1.1	DESMONTE DE MALLA DE PROTECCIÓN LATERAL EXISTENTE	M2	125,4	$ 6.431,00	$ 806.447,00	125,4	$ 806.447,00	125,4	$ 806.447,00
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO A LA INTEMPERIE	M2	17,8	$ 17.786,00	$ 316.591,00	17,8	$ 316.591,00	17,8	$ 316.591,00
1.3	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	75,9	$ 47.502,00	$ 3.605.402,00	75,9	$ 3.605.402,00	75,9	$ 3.605.402,00
1.4	LIMPIEZA MANUAL DE GUAYA PRINCIPAL, PASAMOS Y TUBERÍA METÁLICA	ML	338,00	$ 18.119,00	$ 6.124.222,00	338,00	$ 6.124.222,00	338,00	$ 6.124.222,00
2.	CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA								
2.1	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0.03m	ML	198,00	$ 45.526,00	$ 9.014.148,00	198,00	$ 9.014.148,00	198,00	$ 9.014.148,00
2.2	CORTE Y TRANSPORTE (4 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0.09m x 0,11m	ML	88,23	$ 37.114,00	$ 3.274.568,00	88,23	$ 3.274.568,00	88,23	$ 3.274.568,00

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No:	20260000219	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ,	14/07/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
		UN (01) MES	N/A
CONTRATISTA:	CARREÑO CONSTRUYE S.A.S. NIT. No. 900.663.211-7 R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL
		13/08/2026	$ 49.023.973,00
		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
INTERVENTORIA :	N/A	1/08/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	DIECINUEVE (19) DÍAS	$ 0,00
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	14/07/2026 - 01/08/2026	63,33%	100%
		ESTADO DEL CONTRATO:	
		FINALIZADO	

ACTA DE RECIBO FINAL

En el Municipio de Cubará, a los tres (03) dias del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadania número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaria Única del Circulo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **20260000219**, el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO** R/L. **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT 900.663.211-7 en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **20260000219**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDAD EJECUTADA EN ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
3.	MANTENIMIENTO DEL PUENTE								
3.1	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PRINCIPAL DE 1-1/2"	ML	144,00	$ 20.912,00	$ 3.011.328,00	144,00	$ 3.011.328,00	144,00	$ 3.011.328,00
3.2	TENSIONAMIENTO DE GUAYA PARA PASAMANOS 3/8"	ML	144,00	$ 15.247,00	$ 2.195.568,00	144,00	$ 2.195.568,00	144,00	$ 2.195.568,00
3.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,09m X 0,11m X 1,20m)	UND	74,00	$ 36.280,00	$ 2.684.720,00	74,00	$ 2.684.720,00	74,00	$ 2.684.720,00
3.4	INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,30m X 0,03m X 3,00m)	UND	66,00	$ 44.805,00	$ 2.957.130,00	66,00	$ 2.957.130,00	66,00	$ 2.957.130,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA CAL. 13 DE 2" X 2"	M2	125,40	$ 69.044,00	$ 8.658.118,00	125,40	$ 8.658.118,00	125,40	$ 8.658.118,00
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M2	17,80	$ 39.477,00	$ 702.691,00	17,80	$ 702.691,00	17,80	$ 702.691,00
3.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE 3 EN 1 EXTERIOR A DOS MANOS PARA GUAYAS Y TUBERÍA METÁLICA	M2	28,94	$ 50.979,00	$ 1.475.332,00	28,94	$ 1.475.332,00	28,94	$ 1.475.332,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 1-1/2"	UND	12,00	$ 244.583,00	$ 2.934.996,00	12,00	$ 2.934.996,00	12,00	$ 2.934.996,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA 3/8"	UND	12,00	$ 105.226,00	$ 1.262.712,00	12,00	$ 1.262.712,00	12,00	$ 1.262.712,00

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: A-AD-GC-F-036 Versión: 03
	ACTA DE RECIBO FINAL	Fecha: 02/07/2024 Pagina:

CONTRATO DE OBRA No:	20260000219	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ,	14/07/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
		UN (01) MES	N/A
CONTRATISTA:	CARREÑO CONSTRUYE S.A.S. NIT. No. 900.663.211-7 R/L: WILSON CARREÑO TRUJILLO C.C. No. 17.593.915 Arauca, Arauca.	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL
		13/08/2026	$ 49.023.973,00
		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
INTERVENTORIA :	N/A	1/08/2026	$ 49.023.973,00
		PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	DIECINUEVE (19) DÍAS	$ 0,00
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	14/07/2026 - 01/08/2026	63,33%	100%
		ESTADO DEL CONTRATO:	
		FINALIZADO	

ACTA DE RECIBO FINAL

En el Municipio de Cubará, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Circulo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **20260000219**, el señor **WILSON CARREÑO TRUJILLO** R/L. **CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.** NIT 900.663.211-7 en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **20260000219**.

TOTAL COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO			
COSTO INDIRECTO DE OBRA (ADMINISTRACION 24%)	$ 36.860.130,00	$ 36.860.130,00	$ 36.860.130,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (IMPREVISTOS 2%)	$ 8.846.431,00	$ 8.846.431,00	$ 8.846.431,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (UTILIDAD 7%)	$ 737.203,00	$ 737.203,00	$ 737.203,00
VALOR TOTAL DE OBRA	$ 2.580.209,00	$ 2.580.209,00	$ 2.580.209,00
	$ 49.023.973,00	$ 49.023.973,00	$ 49.023.973,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.023.973,00
VALOR ANTICIPO (30%):	N/A
VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 49.023.973,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 49.023.973,00
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO:	100,00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 49.023.973,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

WILSON CARREÑO TRUJILLO
CARREÑO CONSTRUYE S.A.S.
Representante Legal

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas.
Supervisor

GILDARDO MURCIA BUITRAGO
Alcalde Municipal

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

ANEXO 7

FACTURA ELECTRONICA

DG 2 # 6 -58 BRR EL JARDIN, CUBARA-BOYACA ecconstruye.sas@gmail.com 3173792511

CARREÑO
CONSTRUYE S.A.S

Factura Electrónica De Venta

Represe

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 20 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 14/08/2026 03:04 PM
Fecha de Emisión: 14/08/2026 03:04 PM
Fecha de Vencimiento: 03/09/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: CARREÑO CONSTRUYE S.A.S

Nombre Comercial: CARREÑO CONSTRUYE S.A.S
Nit del Emisor: 900663211
Correo Electrónico: cconstruye.sas@gmail.com
Teléfono: 312 8257434
Dirección: CR 16 A 24 27
Departamento: ARAUCA
Municipio: SARAVENA
Pais: Colombia

Receptor: MUNICIPIO DE CUBARA

Razón Social: MUNICIPIO DE CUBARA
Identificación: 800099196
Correo Electrónico: alcaldia@cubara-boyaca.gov.co
Teléfono: 310 2574494
Dirección: C 4 4 43
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 49
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOYACÁ
Municipio: CUBARÁ
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	071-2026	MC-071-2026	LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA No 20260000219 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL EL ZULIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	1.00	unidad	36,495,178.29	36,495,178.29	0.00	**36,495,178.29**
2	0010	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	1.00	unidad	8,758,842.79	8,758,842.79	0.00	**8,758,842.79**
3	0011	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	1.00	unidad	729,903.57	729,903.57	0.00	**729,903.57**
4	0012	UTILIDAD	UTILIDAD	1.00	unidad	2,554,662.48	2,554,662.48	485,385.87	**3,040,048.35**

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 48,538,587.13
Monto Bruto:	COP 48,538,587.13
Monto IVA:	COP 485,385.87
Total Venta:	COP 49,023,973.00
ReteRenta 2% :	COP 970,771.74
Total Retenciones :	COP 970,771.74
Total a pagar:	COP 48,053,201.26
Saldo Restante:	COP 48,053,201.26

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764109305883 entre los rangos de Facturación del 65 al 100 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2026-05-04 al 2027-05-04.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Detalles:
Son: CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UNO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS
Cuentas Bancarias
ahorros BANCO DAVIVIENDA 506100135074 (**Pesos**)

No Somos grandes contribuyentes. Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1 231 de julio 17 de 2009. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento.

Código unico de Factura -CUFE :

e9fe87e86f201fc2dc5b1ba7989c043ea277df7951846bb56edb92e3a721e9e74c700b2511fb437942f252ca94826950

Firma Digital:

B2EjxH/G9qTIU6tPjejCOqdqHf4FryuBnA920ymKgRrHWMJsvQUlGMmD8WKLxyOR ufYRBRyzmbT/CUyfh4peqvbpT2n/CaraLHk8shsayxfjpdlbYLsucUcIcEB5/57v SUeMIDY8rMWOjb3uGDCZ/3iz28aR44uMfLSXzkC1996HlhxbUrBN4jTmCjdZpLwc Ql6IE08amz7NpwhRBJUO4JaFM4bTvYfx9TEY3JyySrvs/D4RgxcVguNgqVKL7e1V K4c4FGWaSnaClgsPbg2hkiOEo5gSlf7RwBDr34UGbo6PEEDF6zlpKW8DEgbV489J zvvCvPZgsFHYgtHFfQMkAg==

CARRENO
CONSTRUYE SAS

ANEXO 8

CERTIFICACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

SARAVENA, ARAUCA, 14/08/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CARRENO CONSTRUYE SAS** con **NIT 900.663.211-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	506100135074
Saldo a la fecha	$6,354,144.50 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO
