Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026

SUSCRIPCIÓN	3282 de 30/12/2024		CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	27/04/2026	HASTA	26/05/2026

I. DATOS DEL CONTRATO					
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE MOVILIDAD				
Nombre Contratista	UNIÓN TEMPORAL PINWATER				
No. Identificación (CC – NIT)	901.901.869-8				
Objeto Contratual	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA-CUNDINAMARCA			Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	$ 3,668,238,444.00			Reserva presupuestal	No
Plazo Total del Contrato**	17 MESES y 15 DIAS			Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	13				
Valor del pago en numeros	$				96,278,958.00
Valor del pago en letras	NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENYOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE				
No. CRP y fecha de expedición	6647 de 31/12/2024	8 del 02/01/2025	7139 del 23/12/2025	2381 del 13/03/2026	2671 del 16/04/2026
No. Del rubro de CRP	0112-A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-2	0112-V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-2	0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-125	0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-2	0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-55
No. Del rubro de CRP			0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-40		
No. Del rubro de CRP			0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-55		
No. Del rubro de CRP			0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-97.1		
No. Del rubro de CRP			0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119-98		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)	31/12/2024- 16/03/2026- 20/04/2026				
Fecha de Inicio contrato:	31/12/2024		Fecha de Terminación contrato:	15/6/2026	
Dependencia:	DESPACHO				
Supervisor – Cargo:	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA-SERCRETARIO DE DESPACHO				
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DE BOGOTA			Actividad economica CIIU	4210
Numero de cuenta	299372305			Regimen en ventas	Responsable de IVA
Tipo de cuenta	CORRIENTE			No. Factura	FF13

*Debe incluir el valor de las adiciones si aplica

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica

II. CUMPLIMIENTO SECÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en el contrato, estudios previos, pliego de condiciones, aclaraciones que surjan en el mismo y la oferta presentada por el CONTRATISTA.	Ejecución del contrato y presentación del informe mensual	Anexo CD e informe
2. Allegar dentro de los términos previstos los documentos y garantías requeridas para el inicio del contrato.	Se presentaron polizas al inicio de la ejecución del contrato	Anexo CD e informe
3. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1174 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios	Ejecución del contrato y presentación del informe mensual	Anexo CD e informe
4. Garantizar la vinculación del personal necesario e idóneo para el cumplimiento del objeto contractual, ya sea este mano de obra no calificada o el requerido dentro de su equipo de trabajo que le permita cumplir con lo establecida en la Resolución 1885 de 2015, Manual de Señalización Visual y Dispositivos de Control de Tránsito	Se da cumplimiento atendiendo de manera oportuna.	Anexo CD e informe
5. Contar con todos los equipos y elementos necesarios para realizar los procesos de señalización conforme a las solicitudes que realice la entidad contratante	Se da cumplimiento atendiendo de manera oportuna y agil al proceso de demarcación.	Anexo CD e informe

Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026

SUSCRIPCIÓN	3282 de 30/12/2024		CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	27/04/2026	HASTA	26/05/2026

6. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Se da cumplimiento atendiendo de manera oportuna y agil al proceso de demarcación.	Anexo CD e informe
7. El contratista debe realizar visita in situ detallada luego de suscribir el acta de inicio a fin de realizar un diagnóstico preciso del estado de la señalización del municipio de Soacha.	Se realicen visitas en conjunto con interventoria y SMS, las cuales son detallas en los informes mens	Anexo CD e informe
8. Presentar plan de trabajo y cronograma una vez los diseños sean entregados por parte del contratante y revisados por parte del contratista, el cual debe ser aprobado la entidad contratante.	Presentado parcialmente según la información suministrada por la entidad contratante	Anexo CD e informe
9. Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, como cierre de Vías y demás documentación que se requiera para la iniciación y ejecución de las actividades que dan cumplimiento al objeto contractual.	Se han cumplido.	Anexo CD e informe
10. Realizar la ejecución contractual de acuerdo a la necesidad y priorización presentada por la entidad contratante.	Se han cumplido. Ejecución del contrato y presentación del informe mensual.	Anexo CD e informe
11. Garantizar el servicio inmediato para realizar trabajos menores, entendiéndose por éstos, los desplazamientos de personal técnico del contratista al lugar donde sea Anexo CD requerido	Se han cumplido.	Anexo CD e informe
12. Garantizar la calidad de los suministros a entregar, que sean nuevos y que cuenten con las garantías respectivas, al igual que los trabajos que realice.	Se han cumplido, Información entregada en informe mensual.	Anexo CD e informe
13. Presentar informes técnicos mensuales de los trabajos realizados mediante bitácora detallada, con su respectivo registro fotográfico a color, en donde se visualice los porcentajes de ejecución.	Se han cumplido.	Anexo CD e informe
14. Presentar un informe final, soportando el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones específicas.	Para este mes no se ejecutó esta actividad	Anexo CD e informe
15. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la entidad contratante., que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Se han cumplido.	Anexo CD e informe
16. Atender durante la vigencia del contrato todas las recomendaciones que efectúe la interventoria del contrato, que se consideren pertinentes para la adecuada ejecución del objeto contractual.	Se han cumplido.	Anexo CD e informe
17. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, Se han cumplido económicas, financieras y comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.	Se han cumplido.	Anexo CD e informe
18. Informar de manera oportuna cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.	Se han cumplido.	Anexo CD e informe

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	mayo
No. Planilla	
ITEM	ENTIDAD
SALUD	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL
PENSIÓN	
ARL	

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	3,078,526,000.00
VALOR ADICIONES	$	589,712,444.00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	3,668,238,444.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	3,290,457,292.00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	

Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026

SUSCRIPCIÓN	3282 de 30/12/2024		CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	27/04/2026	HASTA	26/05/2026

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89.70%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	$ 377.781.152,00		

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: MAYO DE 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA CARGO: Secretario de Movilidad CEDULA DE CIUDADANIA: 79.988.891 DE BOGOTA FECHA DE SUPERVISIÓN: DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

NOMBRE CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PINWATER
CARGO O PERFIL:	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	901.901.869-8
No. DE CONTACTO:	300 2918425

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

UNION TEMPORAL PINWATER

Actividad Económica 4210 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NIT: 901901869 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764088344325
Fecha 04/02/2025 - 04/02/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE1 al FE1000
Email: 901901869@recepciondefacturas.co
Teléfono: 3135781137

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	02	06	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE13

Nombre/Razón Social:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	**NIT:**	800094755	**Fecha de firmado:**	02/06/2026 14:56:17
Dirección:	CALLE 13 #7-30	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	7305500
Email:	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 01 del 2026	**Hora emisión:**	14:56:16	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	01/07/2026	**Total de Lineas:**	11		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR.UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	021	32,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI CONTABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16,DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO YPOSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. - UND -	94				$650.869,03	$20.827.808,96
2	022	39,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG. STCON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO YPOSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739 - UND-	94				$479.966,4	$18.718.689,6
3	5	4,00	RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DESEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE(TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). -UND-	94				$79.738,07	$318.952,28
4	012	26,74	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO. PINTURA ACRILICAEN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DEVIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC1360-M2-	MTK				$41.175,26	$1.101.026,45
5	014	44,82	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARAMARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS PORVOLUMEN.-M2-	MTK				$29.502,86	$1.322.318,19
6	025	217,49	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1). -M2 -	MTK				$17.116,46	$3.722.658,89
7	26	14,61	RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO. -M3-	D90				$1.623.983,96	$23.726.405,66
8	NP1	34,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES	MTK				$109.950,36	$3.785.590,89
9	AIU1	1,00	ADMINISTRACION Contrato de Servicios AIU por concepto de ntrato de Servicios AIU por conceptode IMPLEMENTARLA SENALIZACIONVIALVERTICALYHORIZONTAL DISPOSITIVOSPARALAREGULACION DEL	EA				$14.704.689,2	$14.704.689,2

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No.299322305 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE UNION TEMPORAL PINWATER

Firma Digital:

OGLw4N9nfgJ8cqsw2XkNx6mZoJaLj75m84VyyQB4cGd9AF8XTm3x5aYVXWk5zsZmrAvDnzYFOBxw2zrMxaTzxOux
rsIDsMzxKKdbBhl8/
XOLwJNP0Kp93xmoDEaUYGzCFUojqcyKC2tnQ+47KRGcxhr0juRLp0Qg1mRbcYuDjq8XLBXEHih8132eikVD95avxg9
WBkstSRCUEo4Zk98ljr3hu5q5oe5mcMJXYv3CfB7kAgUEwHYzU8MI7Tf2C6EDWkLdTdU2h/4Kdv+N9QonfTHbIHLAQ
k0G4mtbWyQoKjLBANcQm5YxFkZL4cvNdDJE7plL3XcU+TeiwsSPadeFqA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
			TRÁNSITO YDISEÑOS EINTERVENCIÓNDELESPACIO PÚBLICOMEDIANTEURBANISMOTÁCTICOEN CUMPLIMIENTO DELAESTRATEGIADESEGURIDAD VIAL DELACIUDAD DESOACHA-CUNDINAMARCA- 20%						
10	AIU2	1,00	IMPREVISTOS 5%	EA				$3.676.172,55	$3.676.172,55
11	AIU3	1,00	UTILIDAD 5%	EA	IVA	19,00%	$698.472,78	$3.676.172,55	$3.676.172,55

Notas:

SON: (noventa y seis millones doscientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos cero centavos)

CUFE: e54543f1066a6c23f04e546aefb84397b308b31445d540aa3475ee9beb77effdf12e733b863a904eb71138d857bb3ac

Subtotal:	$95.580.485,22
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$698.472,78
Total:	$96.278.958,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.676.172,55	19,00%	$698.472,78

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No.299322305 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE UNION TEMPORAL PINWATER

Firma Digital:
O5Lw4N9nfgJ8cqsw2XxNx6mZoJaLj/5m84VyyQB4cGd9AF8XTm3x5aYVXWk5zsZmrAv0nzYFOBxw2zrMxaTzxDux
rsIDsMzxKKdbBhI8/
XOLwJNP0Kp93kmoDEaUYGzCFUojqcyKC2tnQ+47KRGcxhr0juRLp0Qg1mRbcYuDjq8XLBXEHih8132eikVD95avxg9
W8kstSRCUEo4Zk98ljr3hu5q5oe5mcMJXYv3CfB7kAgUEwHYzU8MI7Tf2C6EDWkLdTdU2n/4Kdv+N9QonfTHblHLAQ
k0G4mtbWyQoKjLBANcQm5YxFkZL4cvNdDJE7plL3XcU+TewsSPadeFqA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

UNION TEMPORAL
PINWATER

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Yo, **HARBEY CERÓN MELO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.542.779 y con Tarjeta Profesional No. 198930-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contador de la **Unión Temporal Pinwater**, identificada con NIT **901.901.869-8**, certifico que, luego de examinar los estados financieros de la unión temporal y sus empresas integrantes, **Pintuvial SAS** (NIT **900.011.073-1**) y **Waterblasting SAS** (NIT **900.886.294-5**), de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, durante los últimos cuatro (4) meses del año **2026**, han realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud, ARL) y parafiscales exigidos por la ley.

En consecuencia, declaro que la **Unión Temporal Pinwater** y sus empresas integrantes, **Pintuvial SAS** y **Waterblasting SAS**, se encuentran al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002** y el **artículo 23 de la Ley 1150 de 2007**.

Dado en Bogotá, en el mes de mayo 2026

Atentamente,

HARBEY CERÓN MELO
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 198930-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1071E4B60FF9585

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HARBEY CERON MELO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94542779 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 198930-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122930-T



HARBEY
CERON MELO
C.C. 94542779
RESOLUCION INSCRIPCION 008
UNIVERSIDAD DEL VALLE

FECHA 27/01/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

211145

200628

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.542.779

CERON MELO
APELLIDOS

HARBEY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1985
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-NOV-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-3100100-85126663-M-0094542779-20040805 0341904218A 02 161809012

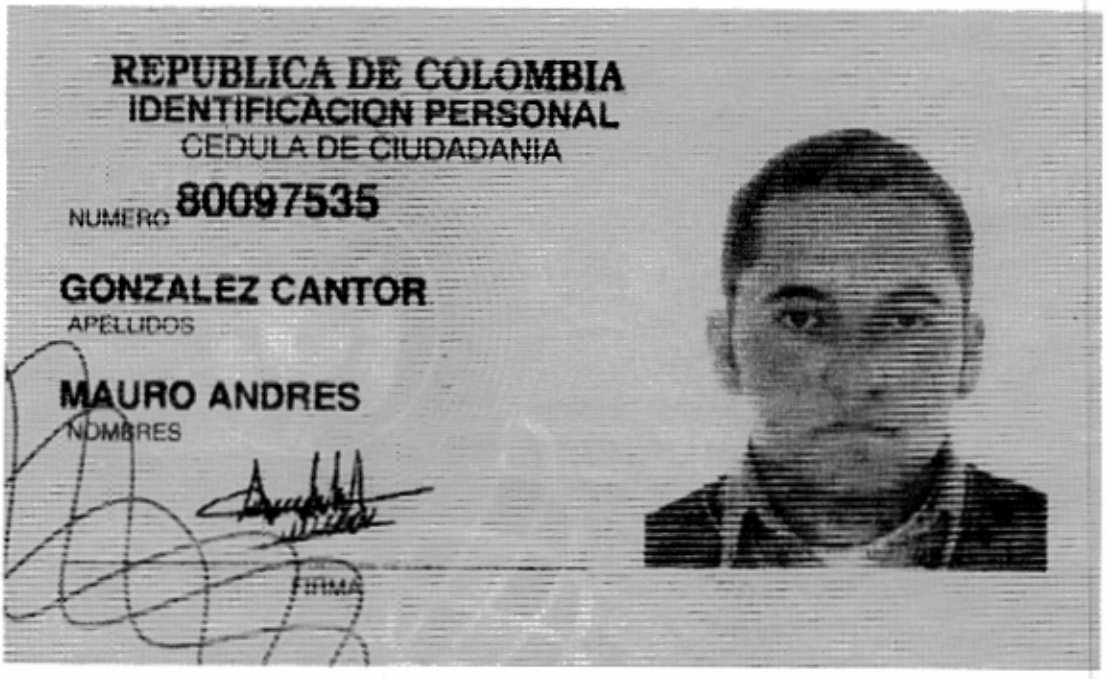

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80097535

GONZALEZ CANTOR
APELLIDOS

MAURO ANDRES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

15-FEB-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-1500102-70105243-M-80097535-20020708 0734002186A 01 991392404

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL PINWATER identificado(a) con NIT 9019018698 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 299322305 desde el 13 de Enero de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de Julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141183126054

(415)7707212489984(8020) 000014118312605 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 8 6 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL PINWATER

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 # 140 - 65

42. Correo electrónico pintuvial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 9 1 8 4 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 1 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficianos Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-05-26 / 11:27:31AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SALAS GUZMAN ANGELA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Alcaldía de SOACHA | Secretaria de Movilidad

SUSPENSION No.1 Al contrato de obra **No. 3282 DE 2024** cuyo objeto consiste en "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA." celebrado entre el **MUNICIPIO DE SOACHA** con NIT 800094755-7 y la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. 901901869-8

Entre los suscritos EDINSON JAIR VELÁSQUEZ ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadania numero 79.988.891 expedida en Bogotá D.C., en su calidad Secretario de Movilidad, nombrado mediante Resolución No. **1645** del 15 de agosto de 2025 cargo para el cual tomó posesión el mismo dia según consta en el acta No. 0098 de fecha 15 de agosto de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA**, con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con **NIT. 901901869-8**, por medio del presente escrito, procede a realizar **SUSPENSIO** al contrato de **OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE No. 3282 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que el dia **30 de diciembre de 2024** se celebró el contrato de obra **No. 3282 de 2024** cuyo objeto fue "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA." **2)**. Que el dia 31 de diciembre de 2024 se inició la ejecución del contrato 3282-2024 de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual. **3)**. Que el dia 25 de marzo de 2025, se realizó la modificacion N.1 al contrato de obra, para la adición de items no previsto al anexo técnico. **4)**. Que el dia 06 de noviembre de 2025, se realizo la modificación N.2 al contrato de obra, para la adición de un item para el Suministro y anclaje de resalto portatil de caucho con alta resistencia al impacto con caucho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8cm. (Incluye accesorios y materiales para fijación resolución 20243040045005) metro lineal. **5)**. Que el dia 10 de diciembre de 2025, se realizo una adicion presupuestal por el valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MTCE ($42.475.207), quedando como valor final de contrato la suma de TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($3.078.526.000) **6)**. Qué durante reunión presencial el dia 19 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la secretaria de movilidad, el contratista UNION TEMPORAL PINWATER, La interventoría CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC y la Secretaria de Movilidad de Soacha, concretan suspender el contrato de obra 3282-2024 y contrato de interventoria 3283-2024. **7)**. Que el 19 de diciembre, el contratista UNION TEMPORAL PINWATER, emitio oficio Ref.0074:PW, solicitando la suspensión del contrato de obra, por los motivos que a continuación se relacionan.

1. En el marco de la ejecución del contrato de infraestructura de transporte que se adelanta en la ciudad de Soacha, se evidencia la necesidad de suspender temporalmente su ejecución entre el 22 de diciembre de 2026 y el 20 de enero de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas:

   - Durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 se activa a nivel el Plan Éxodo los cuales generan un incremento significativo del flujo vehicular en los principales corredores de salida e ingreso a la ciudad.

   - La Autopista Sur, corredor estratégico que comunica a Bogotá con el sur del país actualmente presenta altos niveles de congestión en esta temporada, así mismo la intervención simultánea de obras del sistema TransMilenio, tales como ejecución de Obras de Gran Impacto en el Corredor Vial Bogotá-Girardot (Autopista Sur), de manera simultánea, se desarrollan Contrato de Obra No. 60-EFR-2019 (cuyo objeto es la construcción de la Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en Soacha Fases II y III, Lote 1: Calle 24 a Calle 15 sur) en el corredor Bogotá - Girardot, las cuales generan:

     - Desvíos por las calles del municipio, generando mas trafico de lo habitual en horas no pico.
     - Restricciones operativas impuestas por el concesionario y las autoridades competentes.

- Estas condiciones impiden la correcta ejecución de las actividades contractuales, así como la garantía de calidad y durabilidad de la señalización instalada.

- La continuidad de las actividades contractuales durante este periodo implicaría
  - Aumento del riesgo de accidentalidad para usuarios, trabajadores y peatones
  - Afectación grave a la movilidad, generando represamientos prolongados y deterioro del servicio público de transporte
  - Dificultades operativas para el ingreso de maquinaria, personal técnico y materiales al frente de obra.
  - Posible incumplimiento de cronogramas parciales, no imputables al contratista

- Desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito y seguridad vial, la ejecución de obras en condiciones de congestión extrema no es técnicamente viable, toda vez que impide implementar adecuadamente los planes de manejo de tránsito y compromete la seguridad operacional del corredor

- Por lo anterior, La suspensión del Contrato 3282-2024 es una medida prudente y necesaria en el marco de la gestión contractual, justificada por los planes éxodo y retorno, obras de gran impacto en la Autopista Sur, lo que constituye un obstáculo operacional insuperable para la ejecución en el periodo solicitado, así las cosas la suspensión se solicita a partir del 22 de diciembre de 2025, con un reinicio el 20 de enero de 2026 , esto se propone para evitar retrasos a la ejecución de actividades de manera no continua.

8). Que la interventoría solicito mediante oficio OF-INT-3283-2024-0108, solicita la suspensión del contrato de interventoría 3283-2024, por los temas citados en la reunión del día 19 de diciembre de 2025. **9).** Que la suspensión contractual se realiza con el fin de cumplir con los fines establecidos en el estudio previo y de esta manera cumplir con el artículo 3° de la constitución política siguiente: Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley. **10).** Que el artículo 1501 del código civil establece los elementos esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos: Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. **11).** Que la constitución política garantiza la actividad económica y la libre iniciativa privada dentro de los límites del derecho y principio de libertad. **12).** Que es una expresión de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad, cuya manifestación es el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato estatal. **13).** Que la Corte Constitucional establecido la libertad contractual es lo siguiente: "Esta libertad reconoce, como punto de partida por lo menos, en cada sujeto un centro de autonomía para celebrar o no celebrar un determinado contrato - lo que implica libre albedrío y autoresponsabilidad - y para definir su contenido, configurándose así el plan regulador y de distribución de riesgos entre las personas a quienes se aplica la regla contractual. En un mercado de libre competencia, conforme al diseño del Constituyente (CP art. 333), la libertad contractual surge como mecanismo virtualmente idóneo para decidir la ubicación más ventajosa de los bienes y recursos económicos y garantizar la eficiencia de la estructura productiva y el bienestar general de la sociedad, constitucionalmente tutelado como integrante del bien común (CP art. 333) (T-240-93. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz). **14).** Que la presente suspensión corresponde a la finalidad de garantizar el objeto del contrato y la necesidad establecida en el estudio. **15).** Que la suspensión del contrato es excepcional y obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno los fines establecidos en el estudio previo. **16).** Que de acuerdo con los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 "(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e interés de los administrados que colaboraran entre ellas en la consecución de dichos fines. **17).** Que referente a las modificaciones de los contratos estatales la Corte Constitucional señalo mediante la sentencia C-300-12 "Por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales sirve el contrato. **18).** Que las partes del contrato acuerdan las siguiente: **PRIMERO-SUSPENDER** el contrato de obra No3282-2024 a partir del día 22 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta el análisis de la entidad, hasta el día 20 de enero de 2026/**SEGUNDO – REINICIO:** Que el contrato de obra tendrá como fecha de reinicio el 21 de enero de 2026 quedando como nueva fecha de terminación el día 30 de enero de 2026/ **TERCERO – ANEXOS**: Hacen parte integral de la presente suspensión contractual, la solicitud carta remitida por parte del contratista

solicitando la suspensión del contrato de obra 3282-2024, oficio remitido por la interventoria solicitando la suspensión del contrato de interventoria 3283-2024 y acta de reunión del dia 19 de diciembre 2025. **CUARTO – VIGENCIA Y PERFECCIONAMIENTO:** Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del proceso contractual **3282-2024** junto con **sus anexos**, que no fueron objeto de modificación en el presente documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no **sean contrarios** a la presente suspensión. La presente suspensión requiere para su perfeccionamiento la aceptación de la plataforma SECOP II

En constancia se firma en Soacha, Cundinamarca a los 22 días de diciembre de 2025

POR EL MUNICIPIO

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
SECRETARIO DE MOVILIDAD-
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: [illegible] Contratista SM- Contrato 3338-2025

Elaboró: [illegible] Contratista SM- Contrato 0057-2025

Elaboró: [illegible] - Profesional Especializado SMOUTT

ACLARATORIO No. 1 Al acta de suspensión N 1 contrato de obra **No. 3282 DE 2024** cuyo objeto consiste en "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCION DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TACTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA " celebrado entre el **MUNICIPIO DE SOACHA** con NIT 800094755-7 y la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. 901901869-8

Entre los suscr tos EDINSON JAIR VELÁSQUEZ ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía numero 79.986.891 expedida en Bogotá D.C., en su calidad Secretario de Movilidad (E), nombrado mediante Resolucion No 0189 de del 13 de febrero de 2025, cargo para el cual tomó posesión el dia 17 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE SOACHA , con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. **901901869-8**, por medio del presente escrito, procede a realizar **MODIFICACION** al contrato de OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **No. 3282 DE 2024** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1)** Que el dia 30 de diciembre de 2024 se celebro el contrato de obra **No. 3282 de 2024** cuyo objeto fue **"IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA."** **2)**. Que el dia 31 de diciembre de 2024 se inicio la ejecución del contrato 3282-2024 de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual. **3)**. Que el dia 25 de marzo de 2025 se realizó la modificación N 1 al contrato de obra, para la adición de items no previsto al anexo tecnico. **4)** Que el dia 06 de noviembre de 2025, se realizo la modificación N 2 al contrato de obra, para la adición de un item para el Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con caucho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8cm, (incluye accesorios y materiales para fijación resolución 20243040045005) metro lineal. **5)**. Que el dia 10 de diciembre de 2025, se realizo una adición presupuestal por el valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CE ($42.475.207) quedando como valor final de contrato la suma de TRES MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($3.078.526.000) **6)** Que el dia 22 de diciembre se suscribió la suspensión del contrato de obra 3282-2024. **7)** Que por error de transcripción en el acta de suspensión del contrato de obra 3282. CONSIDERACIONES, numeral 7 ITEM Numero 1, se estableció que: *"En el marco de la ejecución del contrato de infraestructura de transporte que se adelanta en la ciudad de Soacha, se evidencia la necesidad de suspender temporalmente su ejecución entre el 22 de diciembre de 2026 y el 20 de enero de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas:"* siendo correcto: *"En el marco de la ejecución del contrato de infraestructura de transporte que se adelanta en la ciudad de Soacha, se evidencia la necesidad de suspender temporalmente su ejecución entre el 22 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas:"* **8)**. Que la modificación contractual se realiza con el fin de cumplir con los fines establecidos en el estudio previo y de esta manera cumplir con el articulo 3° de la constitución política siguiente Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley. **9)**. Que el articulo 1501 del código civil establece los elementos esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en el, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una clausula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de clausulas especiales. **10)** Que la constitución política garantiza la actividad economica y la libre iniciativa privada dentro de los limites del derecho y principio de libertad. **11)**. Que es una expresión de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad, cuya manifestación es el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato estatal. **12)**. Que la Corte Constitucional estableció la libertad contractual es lo siguiente. "Esta libertad reconoce, como punto de partida por lo menos, en cada sujeto un centro de autonomía para celebrar o no celebrar un determinado contrato - lo que implica libre albedrío y autoresponsabilidad - y para definir su contenido, configurándose así el plan regulador y de distribución de riesgos entre las personas a quienes se aplica la regla contractual. En un mercado de libre competencia, conforme al diseño del Constituyente (CP art. 333), la libertad contractual surge como mecanismo virtualmente idóneo para decidir la ubicación más ventajosa de los bienes y recursos económicos y garantizar la eficiencia de la estructura productiva y el bienestar general de la sociedad, constitucionalmente tutelado como integrante del bien común (CP art. 333) (T-240-93. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) **13)** Que la

presente **modificacion** corresponde a la finalidad de garantizar el objeto del contrato y la necesidad establecida en el estudio. **14).** Que la **modificacion** del contrato es excepcional y obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno los **fines establecidos en el estudio previo. 15). Que de acuerdo con los** fines de la contratacion estatal consagrados en el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 "(...) **las entidades** buscan el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de **los** servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados **que colaboraran entre ellas en la consecución de dichos fines. 16).** Que referente a las **modificaciones** de los contratos estatales la Corte Constitucional señalo mediante la sentencia C-300-12 "Por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean necesario para **lograr** su finalidad y en aras de la realización de **los fines del estado, a los cuales sirve el contrato.**" **17). CLAUSULA PRIMERA MODIFICAR** el acta de suspensión del contrato de obra 3282, CONSIDERACIONES, numeral 7 ITEM Numero 1 quedando así:

> *7). Que el 19 de diciembre, el contratista UNION TEMPORAL PINWATER, emitio oficio Ref 0074-PW, solicitando la suspensión del contrato de obra, por los motivos que a continuación se relacionan:*
>
> 1. *En el marco de la ejecución del contrato de infraestructura de transporte que se adelanta en la ciudad de Soacha, se evidencia la necesidad de suspender temporalmente su ejecución entre el 22 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas*

CLAUSULA SEGUNDA- VIGENCIA Y PERFECCIONAMIENTO: Es entendido que **todos** los términos, condiciones, estipulaciones y clausulas del proceso contractual **3282-2024** junto con sus anexos, que no fueron objeto de modificación en el presente documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente **modificatorio**. La **presente modificación** requiere para su perfeccionamiento la aceptación de la **plataforma** SECOP II.

En constancia se **firma** en Soacha, Cundinamarca a los 05 **dias de enero** de 2026

POR EL MUNICIPIO

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
SECRETARIO DE MOVILIDAD-
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboracion Juridica: Julian Antonio Lucas Caicedo Contratista SM- Contrato 3038-2025

AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No1 del contrato de obra No. 3282 DE 2024 cuyo objeto consiste en "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA" celebrado entre el **MUNICIPIO DE SOACHA** con NIT 800094755-7 y la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. 901901869-8

Entre los suscritos **EDINSON JAIR VELÁSQUEZ ACOSTA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.868.891 expedida en Bogotá D.C., en su calidad **Secretario de Movilidad**, nombrado mediante Resolución No. **1645** del 15 de agosto de 2025 cargo para el cual tomó posesión el mismo día según consta en el acta No. 0098 de fecha 15 de agosto de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA**, con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. 901901869-8, por medio del presente escrito procede a realizar **SUSPENSIO** al contrato de OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **No. 3282 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1) Que el día 30 de diciembre de 2024 se celebró el contrato de obra **No. 3282 de 2024** cuyo objeto fue **"IMPLEMENTAR** LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA."

2) Que el día 31 de diciembre de 2024 se inició la ejecución del contrato 3282-2024 de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual.

3). Que el día 25 de marzo de 2025, se realizó la modificación N.1 al contrato de obra, para la adición de ítems no previsto al anexo técnico.

4). Que el día 06 de noviembre de 2025, se realizó la modificación N 2 al contrato de obra, para la adición de un ítem para el Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con caucho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8cm. (Incluye accesorios y materiales para fijación resolución 20243040045005) metro lineal.

5). Que el día 10 de diciembre de 2025, se realizó una adición presupuestal por el valor de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MTCE ($42.475.207), quedando como valor final de contrato la suma de TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($3.121.001.207)

6). Que el día 22 de diciembre de 2025, se suspendió el contrato de obra 3282-2024, teniendo en cuenta la reunión realizada el día 19 de diciembre de 2025, en las instalaciones de la secretaria de movilidad.

7). Que mediante oficios de referencia 0073/PW, y oficio OF-INT-3283-2024-0109 del 15 de enero del 2026, el contratista UNION TEMPORAL PINWATER y CONSORCIO INTERVIAL PCI-IC, solicitan la ampliación a la suspensión No1 del contrato 3282-2024, por el termino de 45 días.

8). Que una vez verificados los documentos de solicitud de suspensión del contrato de obra 3282-2024 y contrato de interventoría 3283-2024, la secretaria de movilidad determina que

En atención a solicitud del proveedor UNION TEMPORAL PINWATER mediante oficio 0073/PW y la viabilidad dada por la interventoría CONSORCIO INTERVIAL mediante oficio No. OF-INT-3283-2024-0109; la solicitud de ampliar la suspensión 45 días adicionales

CamScanner

teniendo con la finalidad de mitigar las condiciones externas, proteger los fines estatales y los recursos públicos al evitar la ineficiente o nula ejecución de obras durante un periodo en el que la cadena de suministro está inactiva; dada la imposibilidad de acceder a insumos, compromete la ejecución óptima del contrato, lo cual contraviene el principio de la continua y eficiente prestación de los servicios (Ley 80 de 1993, Art. 3°).

La imposibilidad de reiniciar labores el 21 de enero se sustenta en dos ejes principales:

> Desabastecimiento de Materiales: El cese de actividades de los proveedores, motivado por mantenimientos y vacaciones colectivas de fin de año, se configura como una circunstancia ajena a la voluntad del contratista (Unión Temporal Pinwater), que imposibilita de manera temporal el cumplimiento de las obligaciones, en cuanto a que el proveedor principal (Pinturo) presenta un represamiento de órdenes desde diciembre, los tiempos de despacho habituales (12-16 días) se han duplicado debido a la temporada; las tachas solares son un insumo importado, con un tiempo de tránsito estimado de un (1) mes, lo que imposibilita su instalación inmediata, en cuanto a la Señalización Vertical el proveedor retomó labores el 13 de enero y está evacuando pedidos previos por orden cronológico.
> Disponibilidad de Personal. Se ha reportado la desvinculación de personal por cambio de anualidad, el contratista se encuentra en fase de reclutamiento, exámenes medicos y afiliaciones al Sistema de Seguridad Social lo que también ha llevado a retrasos en tiempos de entrega de insumos.

Así las cosas la ampliación de la suspensión del Contrato 3282-2024 es una medida prudente y necesaria en el marco de la gestión contractual, protección del presupuesto, al evitar pagos de personal y maquinaria en sitio (stand-by) sin insumos para trabajar. Asegurar que los materiales utilizados (pinturas y dispositivos) cumplan con las fichas técnicas y no sean sustituidos por elementos de menor calidad debido a la urgencia. Así mismo, la suspensión no genera sobrecostos ni afecta la vigencia del contrato, garantizando una ejecución continua y eficiente una vez superados los retrasos de los proveedores.

9). Que la suspensión contractual se realiza con el fin de cumplir con los fines establecidos en el estudio previo y de esta manera cumplir con el artículo 3° de la constitución política siguiente: Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley.

10). Que el artículo 1501 del código civil establece los elementos esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos: Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

11). Que la constitución política garantiza la actividad económica y la libre iniciativa privada dentro de los límites del derecho y principio de libertad.

12). Que es una expresión de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad, cuya manifestación es el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato estatal.

13). Que la Corte Constitucional establecido la libertad contractual es lo siguiente: "Esta libertad reconoce, como punto de partida por lo menos, en cada sujeto un centro de autonomía para celebrar o no celebrar un determinado contrato - lo que implica libre albedrío y autoresponsabilidad - y para definir su contenido, configurándose así el plan regulador y de distribución de riesgos entre las personas a quienes se aplica la regla contractual. En un mercado de libre competencia, conforme al diseño del Constituyente (CP art. 333), la libertad contractual

CamScanner

surge como mecanismo virtualmente idóneo para decidir la utilización más ventajosa de los bienes y recursos económicos y garantizar la eficiencia de la estructura productiva y el bienestar general de la sociedad, constitucionalmente tutelado como integrante del bien común (CP art 333) (T-240-93 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz).

14) Que la presente suspensión corresponde a la finalidad de garantizar el objeto del contrato y la necesidad establecida en el estudio.

15). Que la suspensión del contrato es excepcional y obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno los fines establecidos en el estudio previo.

16). Que de acuerdo con los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 "(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e interés de los administrados que colaboraran entre ellas en la consecución de dichos fines.

17). Que referente a las modificaciones de los contratos estatales la Corte Constitucional señalo mediante la sentencia C-300-12 "Por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales sirve el contrato.

18). Que las partes del contrato acuerdan las siguiente:

PRIMERO-AMPLIAR LA SUSPENSIÓN No 1 Del contrato de obra No 3282-2024 a partir del día 21 de enero de 2026, teniendo en cuenta el análisis de la entidad, por el termino de 45 días, hasta el día 06 de marzo de 2026

SEGUNDO – REINICIO: Que el contrato de obra tendrá como fecha de reinicio el 07 de marzo de 2026, quedando como nueva fecha de terminación el día 15 de marzo de 2026.

TERCERO – ANEXOS: Hacen parte integral de la presente ampliación a la suspensión No1 la solicitud, carta demitida por parte del contratista solicitando la suspensión del contrato de obra 3282-2024, oficio remitido por la interventoría solicitando la suspensión del contrato de interventoría 3283-2024.

CUARTO – VIGENCIA Y PERFECCIONAMIENTO: Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del proceso contractual 3282-2024 junto con sus anexos, que no fueron objeto de modificación en el presente documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios a la presente suspensión. La presente suspensión requiere para su perfeccionamiento la aceptación de la plataforma SECOP II.

En constancia se firma en Soacha, Cundinamarca a los 21 días de enero de 2026

POR EL MUNICIPIO

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
SECRETARIO DE MOVILIDAD-
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboración Jurídica: Julian Antonio Lucas Cacedo Contratista SM- Contrato 0035-2026
Elaboración Financiera: Cristian Camilo Castaño Contratista SM- Contrato 0182-2026
Elaboración Técnica: Gladys Gómez Suarez - Profesional Especializado SM/DOTT

CamScanner

Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJ-FR-037
	ACTA DE REACTIVACION DE CONTRATO No 3282-2024	Versión: 1.0
		Fecha 23/07/2024

CONTRATO Nº. Y FECHA DE SUSCRIPCION	3282 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
OBJETO	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA
VALOR	TRES MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MICRE ($3.121.001.207)
CONTRATISTA (nombre y cédula)	U.T. PINWATER
PLAZO	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO QUE FALTA POR EJECUTAR	9 DIAS

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia que se superaron los motivos por los cuales se dio origen a la suspensión del contrato mencionado así.

Que el contratista, la interventoría y la secretaria de movilidad, convienen suspender el contrato de obra 3282-2024, a partir del día 22 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta el análisis de la entidad, hasta el día 20 de enero de 2026

Que por solicitud del contratista y la interventoría solicitan la ampliación a la suspensión del contrato No.1, a partir del 21 de enero de 2026 hasta el día 06 de marzo de 2026.

Teniendo en cuenta el concepto C-037 de 2025 emitido desde la Subdirección de Gestión Contractual de la ANCP - CCE, el día 20 de febrero de 2025, manifiesta lo siguiente:

SUSPENSIÓN – Procedencia - Causales

> *En primer lugar, debe indicarse que, no existe disposición normativa que consagre de forma expresa las causales de suspensión del contrato estatal. Sobre el particular, el la Sección Tercera del Consejo de Estado, se refirió a los eventos en los cuales procede la suspensión del contrato, en los siguientes términos: "La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impiden, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o estatal) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo [...]" (Entrasa fuera del texto).*

Por lo anterior, se procede a la reactivación del contrato No. 3282- 2024 el día **07 de marzo de 2026**, quedando como nueva fecha de terminación el día **15 de marzo de 2026.**

Firma	Firma
NOMBRE: EDWISON JAIR VELASQUEZ ACOSTA SECRETARIO DE MOVILIDAD	NOMBRE: MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL PINWATER

Proyectó y Revisó: Adrián Antonio Lucas Caicedo Día: [illegible] de 2026 - Profesional Especializado Sec. Movilidad

Escaneado con CamScanner

MODIFICATORIO No. 5 ADICION No2 Y PRORROGA No1, Al contrato de obra No. 3282 DE 2024 cuyo objeto consiste en "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA." celebrado entre el **MUNICIPIO DE SOACHA** con NIT 800094755-7 y la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. 901901869-8

Entre los suscritos EDINSON JAIR VELÁSQUEZ ACOSTA, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.988.891 expedida en Bogotá D.C., en su calidad Secretario de Movilidad, nombrado mediante Resolución No. 1645 del 15 de agosto de 2025 cargo para el cual tomó posesión el mismo día según consta en el acta No. 0098 de fecha 15 de agosto de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO** DE SOACHA , con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL **MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con **NIT. 901901869-8**, por medio del presente escrito, procede a realizar **MODIFICACION** al contrato de OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE No. 3282 DE 2024, previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1) Que el día 30 de diciembre de 2024 se celebró el contrato de obra **No. 3282 de 2024** cuyo objeto fue "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA."

2) Que el día 31 de diciembre de 2024 se dio inicio a la ejecución del contrato 3282-2024 de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual

3). En atención a condusión emitida en reunion realizada el 20 de Febrero de 2026, el contratista de obra UNION TEMPORAL PINWATER, la interventoria al contrato de obra realizada por CONSORCIO INTERVIAL y la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA, con acta adjunta, una vez revisado el BANCO DE SOLICITUDES DE SEÑALIZACION, se evidencia que se tienen priotizados y viabilizados 79 puntos de los cuales se tienen puntos criticos como las instituciones educativas y de salud en las diferentes comunas; lo cual representa un riesgo para la vida e integridad de los actores viales (peatones, ciclistas y conductores).

BANCO DE SOLICITUDES	
PUNTOS VISITADOS Y VIABILIZADOS	
COMUNA 1	19
COMUNA 2	21
COMUNA 3	6
COMUNA 4	0
COMUNA 5	22
COMUNA 6	11
TOTAL	79

De los 79 puntos, los cuales fueron inspeccionados y viabilizados por parte del Equipo Técnico de la Direccion Operativa de Tránsito y Transporte se tienen Zonas Escolares, señales de inventario para renovación, señalización vertical inexistente, mantenimiento de reductores y pompeyanos existentes y construccion de reductores de velocidad tipo parabólico.

4). Para la presente adición se cuenta con un presupuesto oficial, por la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 92.691.782),** respaldado

con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2367 del 12 de marzo de 2026, Gastos inversión – Rubro 0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2 Recurso propio, Destinación Libre. Ordinario, Otros servicios de la administración pública n.c.p.

5). Que la modificación contractual se realiza con el fin de cumplir con los fines establecidos en el estudio previo y de esta manera cumplir con el artículo 3° de la constitución política siguiente: Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley.

6). Que el artículo 1501 del código civil establece los elementos esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

7). Que la constitución política garantiza la actividad económica y la libre iniciativa privada dentro de los límites del derecho y principio de libertad.

8). Que es una expresión de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad, cuya manifestación es el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato estatal.

9). Que la Corte Constitucional establecido la libertad contractual es lo siguiente: "Esta libertad reconoce, como punto de partida por lo menos, en cada sujeto un centro de autonomía para celebrar o no celebrar un determinado contrato - lo que implica libre albedrío y autoresponsabilidad y para definir su contenido, configurándose así el plan regulador y de distribución de riesgos entre las personas a quienes se aplica la regla contractual. En un mercado de libre competencia, conforme al diseño del Constituyente (CP art. 333), la libertad contractual surge como mecanismo virtualmente idóneo para decidir la utilización más ventajosa de los bienes y recursos económicos y garantizar la eficiencia de la estructura productiva y el bienestar general de la sociedad, constitucionalmente tutelado como integrante del bien común (CP art. 333). (T-240-93. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz)

10). Que la presente modificación corresponde a la finalidad de garantizar el objeto del contrato y la necesidad establecida en el estudio.

11). Que la modificación del contrato es excepcional y obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno los fines establecidos en el estudio previo.

12). Que de acuerdo con los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 "(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e interés de los administrados que colaboraran entre ellas en la consecución de dichos fines

13). Que referente a las modificaciones de los contratos estatales la Corte Constitucional señalo mediante la sentencia C-300-12 "Por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales sirve el contrato."

14). Que las partes del contrato acuerdan las siguientes clausulas, así:

CLAUSULA PRIMERA: **ADICIONAR** el contrato de obra No.3282-2024 la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($92.691.782).**

CLAUSULA SEGUNDA **IMPUTACION PRESUPUESTAL.** Para la presente adición se cuenta con un presupuesto oficial, por la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($92.691.782).** respaldado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2367 del 12 de marzo de 2026, Gastos Inversión – Rubro 0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 2, Recurso propio, Destinación Libre. Ordinario, Otros servicios de la administración pública n.c.p.

CLAUSULA TERCERA-MODIFICAR LA CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 3282-2024 ASI: teniendo en cuenta la presente adición, el valor final del contrato de obra **No3282-2024**, es por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($3.213.692.989) M/CTE

CLÁUSULA CUARTA – PRORROGAR el contrato de obra No3282-2024, por un tiempo de un (01) mes, contados a partir del día 16 de marzo de 2026

CLÁUSULA QUINTA MODIFICAR LA CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de mayo de 2026

CLÁUSULA SEXTA ANEXOS Hacen parte integral de la presente modificación contractual, la solicitud de comité contractual, acta de reunión del 20 de febrero de 2026, certificado de disponibilidad presupuestal No. 2307, del 12 de marzo de 2026, justificación de la necesidad de la modificación del mencionado contrato, suscrita por la supervisión del contrato y referida en la parte considerativa de la presente modificación.

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA Y PERFECCIONAMIENTO: Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del proceso contractual **3282-2024** junto con sus anexos, que no fueron objeto de modificación en el presente documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente modificatorio. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de la plataforma SECOP II.

En constancia se firma en Soacha, Cundinamarca a los 13 días de marzo de 2026

POR EL MUNICIPIO

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
SECRETARIO DE MOVILIDAD-
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboración Jurídica: Julian Antonio Lucas Calzado Contratista SM- Contrato 0035-2026
Elaboración Financiera: Cladian Camilo Castaño Contratista SM- Contrato 0152 2026
Elaboración Técnica: Gladys Gómez Suarez - Profesional Especializado SMMOVIT

CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC NIT. 901901746-0	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ V.1	VERSION: 1
		CODIGO: PCI-2025
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 2-02-20225

FECHA PRESENTE ACTA:	20 de Febrero de 2026
CONTRATO / CONVENIO N°	CONTRATO DE OBRA 3282-2024 CONTRATO DE INTERVENTORIA 3283-2024
OBJETO	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA.

LECTURA ACTA ANTERIOR

NO APLICA

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
N.A	N.A

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Se reúne interventoria, secretaria de movilidad y contratista (unión temporal pintwater), en instalaciones de la secretaria de movilidad, en donde se trataron las actividades propuestas en los recorridos realizados en el mes de noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que el municipio tiene bastantes necesidades en cuanto a movilidad, por lo que algunas actividades planteadas no cuentan con los recursos económicos suficientes en el presente contrato para su ejecución.

Por lo anterior se llega a la conclusión de realizar una adición y prorroga del mismo, para así generar mayor cobertura de necesidades en todas las comunas de municipio y poder implementar as actividades propuestas en los mencionados recorridos.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 2307

NIT 800094756-7
CALLE 13 7-30
7535580

NOM_NIVEL

Fecha de Expedición: 12 marzo 2026 **Prórrogas:** 0

Fecha de Vencimiento: 31 diciembre 2026

Solicitante: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Objeto: ADICION No.2 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 328/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TACTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA BMP20250000044114

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-inversión		
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.0 2.009.91119 - 2	Otros servicios de la administración publica n.c.p.	$ 92.691.782,00
	Recurso Propio-Libre Destinacion ORDINARIO	
	TOTAL CERTIFICADO	$ 92.691.782,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

ACLARATORIO No. 1 AL ACTA DE MODIFICACION No5 ADICION No2 Y PRORROGA No1 Al contrato de obra **No.** 3282 DE 2024 cuyo objeto consiste en "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA." celebrado **entre el MUNICIPIO DE SOACHA** con NIT 800094755-7 y la **UNION TEMPORAL PINWATER identificado con NIT. 901901869-8**

Entre los suscritos EDINSON JAIR VELÁSQUEZ ACOSTA, **identificado** con la **cedula de ciudadania** número 79.988.891 expedida en Bogotá D.C., en su calidad **Secretario de Movilidad, nombrado mediante** Resolución **No. 1645** del 15 de agosto de 2025 cargo para el cual tomó posesión el mismo día según consta en el acta No. 0098 de fecha 15 de agosto de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que **delegó la contratación en sus diferentes etapas**, en cabeza de los Secretarios del Despacho, **actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA** , con NIT 800094755-7, quien para los efectos del **presente contrato se denomina EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra, la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. 901901869-8, por medio del presente escrito, procede **ACLARAR** el acta de modificación no5 adición no2 y prorroga no1 al contrato de obra de infraestructura de transporte **No. 3282 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1) Que el día 30 de diciembre de 2024 se celebró el contrato de obra **No. 3282 de 2024** cuyo **objeto** fue "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA."

2) Que el día 31 de diciembre de 2024 se dio Inicio a la ejecución del contrato 3282-2024 de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

3) En atención a conclusión emitida en reunión **realizada** el 20 de Febrero de 2026, el contratista de obra UNION TEMPORAL PINWATER, la interventoria al contrato de obra realizada por CONSORCIO INTERVIAL y la SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA, con acta adjunta, una vez revisado el BANCO DE SOLICITUDES DE SEÑALIZACION, se evidencia que se tienen priorizados y viabilizados 79 puntos de los cuales se tienen puntos críticos como las instituciones educativas y de salud en las diferentes comunas; lo cual representa un riesgo para la vida e integridad de los actores viales (peatones, ciclistas y conductores).

4) Que, en atención **a lo anterior, el día** 13 de marzo de 2026 se suscribió acta de **ADICION No2 Y PRORROGA No1**, al contrato de obra **No.** 3282 DE 2024, y por error de transcripción en la cláusula quinta modificar la clausula 4. plazo del contrato, se estableció como fecha de terminación el día 15 de mayo de 2026, siendo correcto el día 15 de abril de 2026

5. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, mediante este documento se aclara: CLÁUSULA QUINTA MODIFICAR LA CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO, quedando como nueva fecha de terminacion el 15 de abril de 2026.

6) Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 2021 Artículo 45 "*Corrección de errores formales*. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".

En constancia se firma en Soacha, Cundinamarca a los 25días de marzo de 2026.

POR EL MUNICIPIO

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
Secretario de Movilidad

Proyectó y Revisó Julian Antonio Lucas Calcado Abogado Contratista Sec Movilidad CTO-0035-2026

MODIFICATORIO 5, ADICIÓN 2 Y PRÓRROGA 1, al Contrato de Obra **3282 DE 2024**, cuyo objeto consiste en *"IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"*, celebrado entre el **MUNICIPIO DE SOACHA**, NIT. 800094755-7 y la **UNION TEMPORAL PINWATER**, NIT 901901869-8

Entre los suscritos **EDINSON JAIR VELÁSQUEZ ACOSTA**, identificado con la cedula de ciudadanía 79.988.891 expedida en Bogotá D.C., en su calidad Secretario de Movilidad, nombrado mediante Resolucion 1645 del 15 de agosto de 2025, cargo para el cual tomó posesión el mismo dia según consta en el Acta 0098, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 1o de diciembre de 2021 modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representacion del **MUNICIPIO DE SOACHA**, NIT. 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la **UNION TEMPORAL PINWATER**, NIT. 901901869-8, representada legalmente por **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR identificado** con CC 80.097.535 de Bogotá por medio del presente escrito, procede a realizar **MODIFICACIÓN al contrato** de OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE No **3282 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**.

1) Que el 30 de diciembre de 2024 **se celebró el** contrato de obra **3282 de 2024**, cuyo objeto es *"IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"*.

2) Que el 31 de diciembre de 2024 se inició la ejecución del contrato 3282-2024 de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

3) Que el 25 de marzo de 2025, se suscribió la modificación 1, por la cual se incluyeron ítems no previstos al anexo técnico

4) Que el 6 de noviembre de 2025, se suscribió la modificación 2, por la cual se incluyó un ítem al anexo técnico, teniendo en cuenta la necesidad presentada por el municipio.

5) Que el 10 de diciembre de 2025, se suscribió la modificación 3 y adición 1 por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($42 475 207) M/CTE**

6) Que el 22 de diciembre de 2025, se suscribió la suspensión 1 al contrato de obra, hasta el 20 de enero de 2026

7) Que el 21 de enero de 2026 se amplió la suspensión del contrato hasta el dia 6 de marzo, cuyo reinicio se daria a partir del 7 de marzo de 2026.

8) Que el 7 de marzo de 2026, se dio reinicio al contrato de obra, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de marzo de 2026

9) Que el 13 de marzo de 2026, se suscribió la adición 2 y prorroga No 1 por un mes y por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($92.691.782) M/CTE**

10) Que teniendo en cuenta que adicionar recursos a un contrato vigente se encuentra dentro de los principios de eficiencia administrativa en la contratación pública en Colombia, aprovechando la logística

11) y precios unitarios ya pactados, es mucho más beneficioso que iniciar un nuevo proceso de selección dado que retrasaría la atención de las solicitudes ciudadanas. La Secretaría de Movilidad en atención a las peticiones ciudadanas relacionadas con reductores de velocidad, señalización vertical y horizontal

realiza Visitas Técnicas para evaluar cada situación teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Accidentalidad en el sector.
- Si se encuentra en una Zona Escolar o cerca de la misma.
- Infracciones de tránsito presentadas.
- Flujo y volúmenes de los diferentes actores viales.
- Composición vehicular en la zona.
- Tendencia de las Velocidades.
- Análisis geométrico de la vía.

Una vez emitidos los conceptos técnicos, se registra en el Banco de Solicitudes de la Dirección Operativa de Tránsito y Transporte; a la fecha hay 134 registros de los cuales la Comuna 3 tiene la mayor cantidad especificamente el sector Ciudad Verde.



12) Que, para la presente adición se cuenta con un presupuesto oficial, por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($454.545.455) M/CTE.**, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **2501** del 14 de abril de 2026, Gastos Inversión – Rubro 0112 - 2 3 24 08 038 02 2 3 2 02.02.009 91119 - 55, Recurso de la Nación. Destinación Específica. SGP GENERAL – LIBRE INVERSIÓN, Otros servicios de la administración pública n c p

13) Que el artículo 1501 del código civil establece los elementos esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos: Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

14) Que la constitución política garantiza la actividad económica y la libre iniciativa privada dentro de los límites del derecho y principio de libertad

15) Que es una expresión de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad, cuya manifestación es el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato estatal.

16) Que la Corte Constitucional establece la libertad contractual es lo siguiente: "Esta libertad reconoce como punto de partida por lo menos, en cada sujeto un centro de autonomía para celebrar o no celebrar un determinado contrato - lo que implica libre albedrío y autorresponsabilidad y para definir su contenido, configurándose así el plan regulador y de distribución de riesgos entre las personas a quienes se aplica la regla contractual. En un mercado de libre competencia, conforme al diseño del Constituyente (CP art. 333), la libertad contractual surge como mecanismo virtualmente idóneo para decidir la utilización más ventajosa de los bienes y recursos económicos y garantizar la eficiencia de la estructura productiva y el bienestar general de la sociedad, constitucionalmente tutelado como integrante del bien común (CP art. 333). (T-240-93. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz).

17) Que la presente modificación corresponde a la finalidad de garantizar el objeto del contrato y la necesidad establecida en el estudio previo, toda vez que a lo largo del proceso se han presentado limitantes presupuestales que con el tiempo se han solventado con la incorporación de recursos

18) Que la modificación del contrato es excepcional y obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno los fines establecidos en el estudio previo.

19) Que de acuerdo con los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 3o de la Ley 80 de 1993 "(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e interés de los administrados que colaboraran entre ellas en la consecución de dichos fines.

20) Que referente a las modificaciones de los contratos estatales la Corte Constitucional señalo mediante la sentencia C-300-12 "Por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales sirve el contrato".

Teniendo en cuenta lo anterior, LAS PARTES del contrato acuerdan las siguientes cláusulas

CLÁUSULA PRIMERA. - ADICIONAR al contrato de obra **3282-2024** la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($454.545.455) M/CTE**

CLÁUSULA SEGUNDA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL. Para la presente adición se cuenta con un presupuesto oficial, por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($454 545 455) M/CTE**., respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **2501** del 14 de abril de 2026. Gastos Inversión – Rubro 0112 - 2 3 24 08 038 02 2 3 2 02 02 009 91119 - 55, Recurso de la Nación, Destinación Específica. SGP GENERAL – LIBRE INVERSIÓN. Otros servicios de la administración pública n.c.p.

CLÁUSULA TERCERA. - MODIFICAR la **CLÁUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO 3282-2024** la cual quedara así

El valor del Contrato es por la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.668.238.444) M/CTE**

La ciudad de Soacha deducirá del valor del acta de pago, las retenciones sobre impuestos y demás descuentos de ley según sea el caso a través de la Secretaría de Hacienda:

BASE DE DESCUENTOS Y RETENCIONES CAUSACIÓN POR MANTENIMIENTO			
CONCEPTO	**%**	**BASE GRAVABLE**	**SOPORTE LEGAR**
FONDO ADULTO MAYOR	3	Valor factura antes de IVA	Capitulo II Acuerdo Municipal No 030 de Diciembre 9 de 2020 Art 125 y Art 127
FONDO PROCULTURA	1.7	Valor factura antes de IVA	Capitulo I Acuerdo Municipal No 030 de Diciembre 09 de 2020 Art 118. Modificado por el Acuerdo 10 de 30 de Abril 2024, Art. 1
RETEFUENTE PERSONA JURIDICA	6	Valor factura antes de IVA	Estatuto Tributario Nacional TITULO 4 TABLA ANUAL - DIAN
RETEFUENTE PERSONA NATURAL	4	Valor factura antes de IVA	
RETEICA	7 X MIL	Valor factura antes de IVA	Acuerdo Municipal N°030 de Diciembre 9 de 2020 Art 57
RETEIVA	15	Valor IVA facturado	Estatuto Tributario Nacional TITULO 2 CAPITULO 1
TASA PRO-DEPORTE	1.5	Valor factura antes de IVA	Acuerdo Municipal No 09 del 30 de abril de 2024

CLÁUSULA CUARTA. - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra **3282-2024**, por el término de dos (2) meses, contabilizados a partir del 16 de abril de 2026.

CLÁUSULA QUINTA. - MODIFICACIÓN MODIFICAR LA CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO la cual quedará así:

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de quince (15) meses sin que supere el 31 de diciembre de 2026, dicho término será contado a partir de la suscripción de las partes

Parágrafo: la nueva fecha de terminación del contrato es el día 15 de junio de 2026

CLAUSULA SEXTA. - ANEXOS: Hacen parte integral de la presente modificación contractual, la solicitud de comité contractual, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **2501** 14 de abril de 2026, la justificación de la necesidad de la modificación, suscrita por la supervisión del contrato y referida en la parte considerativa de la presente modificación.

CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA Y PERFECCIONAMIENTO: Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato de Obra **3282-2024**, junto con sus anexos, que no fueron objeto de modificación en el presente documento, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente modificatorio. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de la plataforma SECOP II.

Elaboración Financiera: Cristen Camilo Castaño Contratista SM- Contrato 0152-2026
Elaboración Técnica: Gladys Gomez Suarez - Profesional Especializado SMDOTT
Revisó: Katherin Bruges Romero- Profesional especializada- Cto 054-2026- Despacho

ACLARATORIO No. 2 AL ACTA DE MODIFICACION No6 ADICION No3 Y PRORROGA No2 Al contrato de obra No. 3282 **DE 2024** cuyo objeto consiste en "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA" celebrado entre el **MUNICIPIO DE SOACHA** con NIT 800094755-7 y la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT 901901869-8

Entre los suscritos **HAYDEN BARRAGAN MORA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 80 236 678 de Bogotá D.C. en su calidad Secretario de Movilidad (E) nombrado mediante **Resolución No. 1158** del 16 de abril de 2026, cargo para el cual tomo posesión el día 17 de abril de 2026, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA**, con NIT 800094755-7 quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, la **UNION TEMPORAL PINWATER** identificado con NIT. 901901869-8, por medio del presente escrito, procede **ACLARAR** el acta de modificación no5 adición no2 y prorroga no1 al contrato de obra de infraestructura de transporte **No. 3282 DE 2024**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**.

1) Que el día 30 de diciembre de 2024 se celebró **el contrato de obra No. 3282 de 2024** cuyo objeto fue "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA."

2) Que el día 31 de diciembre de 2024 se dio inicio a la ejecución del contrato 3282-2024 de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual

3). Que el día 25 de marzo de 2025, se realizo la modificación No1, por la cual se incluyeron ítems al anexo técnico, no previstos

4). Que el día 06 de noviembre de 2025, se realizó la modificación No2, por la cual se incluyó un ítem al anexo técnico, teniendo en cuenta la necesidad presentada por el municipio.

5). **Que el día 10 de diciembre de 2025, se realizó modificación No3.**, Adición No.1 por el valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 42.475.207).**

6) Que el día 22 de diciembre de 2025, se realizo suspensión No.1 al contrato de obra, hasta el día 20 de enero de 2026

7). Que el día 21 de enero de 2026 se amplió la suspensión del contrato hasta el día 06 de marzo y que cuyo reinicio se daría a partir del 07 de marzo de 2026

8). Que el día 07 de marzo de 2026, se dio reinicio al contrato de obra, quedando como nueva fecha de terminación el día 15 de marzo de 2026

9). Que el día 13 de marzo de 2026 se realizó adición No.2, por el valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($92.691.782) M/CTE**, y prorroga No 1 al contrato de obra quedando como nueva fecha de terminación el día 15 de abril de 2026.

10). Que el día 15 de abril de 2026, se realizó adición No.3, por el valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($454.545.455)**, y prorroga No.2 al contrato de obra, quedando como nueva fecha de terminación el día 15 de junio de 2026

11). Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, mediante este documento se aclara: **QUE EN EL ENCABEZADA DEL ACTA DE MODIFICACION**, por error de transcripción se estableció **MODIFICATORIO** No. 5 **ADICION No2 Y PRORROGA No1**, siendo correcto **MODIFICATORIO No. 6 ADICION No3 Y PRORROGA No2.**

12) Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 2021 Artículo 45 "*Corrección de errores formales.* En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios

en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".

En constancia se firma en Soacha, Cundinamarca a los 21 días de abril de 2026.

POR EL MUNICIPIO

HAYDEN BARRAGAN MORA
Secretario de Movilidad (E)

Proyectó y Revisó: Juan Antonio Lucas Caicedo Abogado Contratista Sec. Movilidad CTO-0035-2026

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7365500

Vigencia Fiscal 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 2671

Fecha de Compromiso: 16 de abril de 2026

Beneficiario UNION TEMPORAL PINWATER **Nit:** 901901869 - 8

No. C.D.P. 2501 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 14 de abril de 2026

Tipo de Compromiso Adicion

Contrato 3282/2024 **Fecha:** 30/12/2024 **Vence:** 31/12/2026

Objeto: ADICION No 3 Y PRORROGA No 2 AL CONTRATO 3282/2024 - IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TACTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL, DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA BMP202500000044114.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión **Recurso de la Nacion-Destinación Especifica** SGP GENERAL - LIBRE INVERSION		
0112 2 3 24 08 038 02 2 3 2 02 02 009 91 119 - 55	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	$ 454.545.455,00
	Total Compromiso	$454.545.455,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Mayo	$113.636.363,00
Junio	227.272.728,00
Julio	113.636.364,00
Valor Total	$454.545.455,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: AMMARIN

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

DETALLE DE LA GARANTÍA

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	APROBAR Y PUBLICAR	Aprobado	GRUPO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA MOVILIDAD - ORDENADOR DEL GASTO	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	21 días de tiempo transcurrido

Id de la garantía: CO1.WRT.1578945

Referencia de la garantía: 11-44-101245373 ANEXO 6

Estado: Aprobada

Justificación:
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Número de poliza: 11-44-101245373 ANEXO 6

Tomador: UNION TEMPORAL PINWATER

DETALLE DE LA GARANTÍA

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBAR Y PUBLICAR	Aprobado	GRUPO DE CONTRATACIÓN SECRETARIA MOVILIDAD - ORDENADOR DEL GASTO	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	21 días de tiempo transcurrido

Id de la garantía CO1.ARRT.19782161

Referencia de la garantía 1° 43 %1072656 ANEXO 3

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 11-40-101072656 ANEXO 3

Tomador UNION TEMPORAL PINWATER

DETALLE DE LA GARANTÍA

.1	APROBAR Y PUBLICAR	Aprobado	GRUPO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA MOVILIDAD : ORDENADOR DEL GASTO	ANDRES HERNANDO LAÑAS HOMBRO	1 día de tiempo transcurrido [illegible]

Id de la garantía CO1.WRT.16058094

Referencia de la garantía 11-40-101072856 ANEXO 0

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 11-40-101072856 ANEXO 0

Tomador UNION TEMPORAL PAVIMETER

Beneficiario ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

DETALLE DE LA GARANTÍA

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	APROBAR Y PUBLICAR	Aprobado	GRUPO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA MOVILIDAD - ORDENADOR DEL GASTO	ANDRES HERNANDO LAÑAS ROMERO	1 día de tiempo transcurrido (31/12/2024 3:45:38 PM) [illegible]

Id de la garantía CO1.WRT.16056202

Referencia de la garantía 11-44-101245373 ANEXO 0

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ☐ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Numero de póliza 11-44-101245373 ANEXO 0

Tomador UNION TEMPORAL PINWATER

DETALLE DE LA GARANTÍA

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	APROBAR Y FIRMAR	Aprobado	GRUPO DE CONTRATACIÓN SECRETARIA MOVILIDAD ORDENADOR DEL GASTO	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	12 días de tiempo transcurrido

Id de la garantía: CO1.ART.18678324

Referencia de la garantía: 1°44-101745375 ANEXO 3

Estado: Aprobado

Justificación: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios

DETALLE DE LA GARANTÍA

.1	APROBAR Y PUBLICAR	Aprobado	GRUPO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA MOVILIDAD :: ORDENADOR DEL GASTO	ANDRES HERNANDO LANAS ROMERO	1 día de tiempo transcurrido

Id de la garantía CO1.WRT.16855094

Referencia de la garantía 11-40-101072856 ANEXO 6

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 11-40-101072856 ANEXO 6

Tomador [redacted]

Beneficiario ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

DETALLE DE LA GARANTÍA

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	APROBAR Y PUBLICAR	Aprobado	GRUPO DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA MOVILIDAD :: ORDENADOR DEL GASTO	ANDRES HERNANDO LAÑAS ROMERO	1 día de tiempo transcurrido [illegible]

Id de la garantía CO1.WRT.18066232

Referencia de la garantía 11-44-101245373 ANEXO 0

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Numero de póliza 11-44-101245373 ANEXO 0

Tomador UNION TEMPORAL PINTWATER

DETALLE DE LA GARANTÍA

MUNICIPIO DE SOACHA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24/06/2026 **No. 38**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/06/2026

Responsable: UNION TEMPORAL PINWATER **Nit:** 901901869

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 3282 30/12/2024 **Factura** FE13 02/06/2026

Comentarios: Sin comentarios

Cat.	Elem.	R.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	643	5	SEÑALES VERTICALES SP,SR, SISG CON TABLERO LAMINADO DE ACERO-S MOVILIDAD 2025-CTO 3282	Unidad	39.00	479,966.20	18,718,681.80
	643	6	SEÑALES VERTICALES SP,SR, SISG CON TABLERO LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO DUPLEX -S MOVILIDAD 2025-CTO 3282	Unidad	32.00	650,869.03	20,827,808.96
	643	14	SEÑALES VERTICALES	Unidad	4.00	79,738.07	318,952.28

TOTAL ENTRADA **39,865,450,84**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
19059001	Bienes de consumo almacén	39,865,450,84	
24906080	Integración Almacén		39,865,450,84
		39,865,450,84	**39,865,450,84**

JEFE GENERAL DEL ALMACEN

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 15

CONTRATO DE OBRA No. 3282-2024

Cuyo objeto es: "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"

PERIODO

27 DE ABRIL DE 2026 AL 26 DE MAYO DE 2026


CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL PINKWATER
NIT. 901901869-8

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
NIT. 901901746-0

VERSIÓN 2

Mayo de 2026

CONTROL DE REVISIONES

Elaborado por: **INGENIERO JULIAN EDUARDO ROLDAN GORDILLO** Residente de Obra	Firma 
Presentado por: **INGENIERO MAURICIO LAVERDE ACOSTA** Director de Obra	Firma 
Aprobado por: **INGENIERO PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA** Director de Interventoría CONSORCIO INTERVIAL PCI PC	Firma 

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Descripción	Observaciones y/o modificaciones
0	29-05-2026	Informe mensual V-0	
1	01-06-2026	Informe Mensual V-1	Cantidades de obra Certificados de Calidad
2	03-06-2026	Informe Mensual V-2	Cambio de Fecha Periodo

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3 PERIODO DE REPORTE 6
4 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO 6
5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 6
5.1 Descripción y alcance del contrato 6
5.2 Seguimiento al programa de obra 7
6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS 9
6.1 Actividades realizadas. 9
6.1.1 Actividades de inspección en puntos específicos de resaltos. 9
6.1.2 Relación de avance. 10
6.1.3 Puntos con garantías. 10
6.1.4 Bitácora 10
6.1.5 Registro mensual del estado general del tiempo. 10
7 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 13
7.1.1 Ítems contractuales ejecutados. 13
8 REGISTRO FOTOGRAFICO 17
8.1.2 Cantidades ejecutadas. 17
9 GESTIÓN, AVANCE Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PMT´S 17
10 GESTIÓN Y AVANCE 17
10.1 Recursos utilizados por el contrato de obra 17
10.1.1 Personal técnico 17
10.1.2 Personal operativo 18
10.1.3 Pausas activas. 19
10.1.4 Entrega de dotación. 19
10.1.5 Equipos utilizados 20
11 MATERIALES UTILIZADOS. 21
11.1 Listado de proveedores. 21
11.2 Calidad de los materiales. 21
12 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 21
12.1 Comités de seguimiento 21
12.2 Canales de divulgación de información. 21
12.2.1 Canales de divulgación de información interna. 21

12.2.2 Canales de divulgación de información con la comunidad residente de la Ciudad SOACHA. 22
13 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA. 22
13.2.3 Correspondencia recibida. 22
13.2.4 Correspondencia enviada. 23
14 SEGURIDAD SOCIAL 23
14.1 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales 23
15 ESTADO PRESUPUESTAL 23
15.1 Presupuesto ejecutado 23
16 CONCLUSIÓN. 23

UNION TEMPORAL
PINWATER

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 15

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los avances en la ejecución del contrato denominado CONTRATO DE OBRA No. 3282-2024 "Implementación de la Señalización Vial Vertical y Horizontal, Dispositivos para la Regulación del Tránsito y Diseños e Intervención del Espacio Público mediante Urbanismo Táctico, en cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Vial de la Ciudad de Soacha, Cundinamarca". Este contrato fue suscrito entre la Alcaldía de Soacha y la UNIÓN TEMPORAL PINWATER

Se procede a continuación a realizar el respectivo reporte de actividades adelantadas durante el mes de ejecución de mayo.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se relaciona la información general del contrato de obra, es importante precisar, a la fecha del presente informe se mantienen las condiciones iniciales.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

Alcaldía de Soacha	
CONTRATO No.	3282-2024
OBJETO	IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL PINWATER**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	MAURO ANDRES GONZALES CANTOR
NIT	901901869-8
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR INICIAL	$ 3.078.526.000
FECHA DE ADICIÓN N°-1	10/12/2025
VALOR DE ADICIÓN N°-1	$42.475.207

FECHA DE SUSPENSIÓN N°-1	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	21 DE ENERO DE 2026
INICIO DE ACTIVIDADES	07 DE MARZO DE 2026
FECHA DE ADICIÓN N°-2	13 DE MARZO DE 2026
VALOR ADICIÓN DE N°-2	$92.691.782
FECHA DE ADICIÓN N°-3	15 DE ABRIL DE 2026
VALOR ADICIÓN DE N°-3	$454.545.455
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.668.238.444
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JUNIO 2026

Fuente: Elaboración propia

3 PERIODO DE REPORTE

El presente documento contiene el informe de las actividades realizadas durante el mes de mayo, correspondiente al mes No. 15, comprendido entre el 27 de abril de 2026 al 27 de mayo de 2026.

4 ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO

Se deja constancia de que se anexan las pólizas actualizadas correspondientes al contrato, las cuales se encuentran vigentes y cumplen con los requisitos establecidos. Así mismo, se informa que en la carpeta de pólizas reposa el respectivo recibo de pago de las mismas. Estos documentos se adjuntan para su revisión y fines pertinentes, garantizando el adecuado respaldo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Anexo 01. Pólizas.

5 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

5.1 Descripción y alcance del contrato

El alcance del presente contrato consiste en la implementación de elementos de señalización vial vertical y horizontal, dispositivos para la regulación del tránsito, así como el diseño e intervención del espacio público en los sectores de responsabilidad de la Secretaría de Movilidad de Soacha.

Dentro de las actividades y obras contractuales a ejecutar se incluyen: demarcaciones viales, instalación de señales verticales, implementación de dispositivos complementarios para la regulación del tránsito, instalación de defensas metálicas y la ejecución de estrategias de urbanismo táctico. De acuerdo con la planificación establecida durante el proceso de licitación, el contrato de obra se llevará a cabo en el municipio de Soacha, dividiendo el área de intervención en seis comunas y dos corregimientos. Esta división tiene como objetivo optimizar las acciones y la logística necesaria para una atención integral y eficiente de la señalización vial en la ciudad.

• Comuna 1 (compartir)

- Comuna 2 (Soacha central)
- Comuna 3 (la despensa)
- Comuna 4 (Cazucá)
- Comuna 5 (San Mateo)
- Comuna 6 (San Humberto)
- Corregimiento 1 (Chacua - cabrera)
- Corregimiento 2 (El charquito)



Ilustración 1. Localización del proyecto
Fuente: Documentos pre contractuales

5.2 Seguimiento al programa de obra

Durante el periodo de ejecución, se construyeron tres resaltos en asfalto en los siguientes puntos previamente definidos Calle 30 s Cra 12ª, Carrera 11 Calle 30 s, Carrera 15f N 35b-02 Este con el objetivo de contribuir a la reducción de la velocidad vehicular y mejorar la seguridad vial. Estas intervenciones fueron complementadas con la respectiva señalización vertical, y demarcación horizontal parcial mediante la demarcación previa con líneas visibles horizontales sobre el resaltado.

Estado de tramite PMT: Se recibió respuesta por parte de la Secretaria de Planeación el día 14 de mayo de 2026 donde solicitan más información del contrato y puntos a intervenir, se da respuesta por parte del contratista para continuar con el trámite del certificado de exención de licencia de intervención y ocupación del espacio público que nos solicita la Secretaria de ambiente para ellos generar la constancia de la no generación de RCD que solicita la Secretaria de Movilidad para continuar con el tramite de PMT.

Durante el mes de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo actividades correspondientes a la instalación de señalización vertical, conforme a los lineamientos técnicos y normativos establecidos. Estas labores incluyeron la ubicación, montaje y fijación de las señales en los puntos previamente definidos, garantizando su adecuada visibilidad y funcionalidad para la regulación y seguridad del tránsito. Asimismo, se verificó la correcta alineación y estabilidad de cada elemento instalado, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos.

Se realizaron actividades de aplicación de pintura base solvente en los puntos previamente establecidos por la Secretaria de Movilidad de Soacha, conforme a los lineamientos técnicos definidos. Estas actividades incluyeron la preparación de la superficie, la demarcación y la correcta aplicación del material, garantizando su adecuada adherencia, visibilidad y durabilidad. Lo anterior con el fin de fortalecer la señalización vial y contribuir a la seguridad de los usuarios en las zonas intervenidas.

Se realizaron visitas a campo de puntos previos que la Secretaria de Movilidad tiene en su proyección ejecutar. a la fecha solamente se tienen aprobados para ejecución 23 resaltos que a la fecha no complementan la totalidad del dinero pendiente por cobrar.

Es importante mencionar, el porcentaje de avance acumulado a la fecha de corte del presente informe corresponde a 89,70%,

6 ASPECTOS TÉCNICOS, MODIFICACIONES SURGIDAS, PROBLEMAS Y SOLUCIONES APROBADAS

6.1 Actividades realizadas.

6.1.1 Actividades de inspección en puntos específicos de resaltos.

Se dio continuidad de los recorridos en campo en conjunto secretaria de movilidad e interventoría alrededor de los corredores principales de la ciudad de Soacha, donde se iban estableciendo los puntos tentativos de resaltos a inspeccionar, donde se finalizó con 23 puntos para iniciar ejecución de obra:

Nº	ubicación	Barrio
1	Calle 16 S N 11a-23	Ducales Comuna 1
2	Calle 16 S N 11b-34	Ducales Comuna 1
3	Calle 35s N 15a- 05	Santa Ana Sector 1
4	Calle 35s N 14c-81	Santa Ana Sector 1
5	Calle 10 N3-24	Ubaté Comuna 6 Conjunto Colmena
6	Calle 30s Cra 12a	Santa Ana
7	Cra 11 Calle 30 S	Santa Ana
8	Calle 12 N 7-71	Soacha Centro Comuna 2
9	Calle 12 N 6-99	Soacha Centro Comuna 2
10	Tv 19 N 39c-105	Ciudad Verde
11	Yv 19 N 39c-105	Ciudad Verde

12	Calle 7d N 2b-46	Comuna 6 El Altico
13	Cra 23 N 42b-07	Comuna 3 Los Olivos
14	Cra 23 N 41b-20	Comuna 3 Los Olivos
15	CRA 6g CALLE 30	SAN MATEO COMUNA 5
16	Calle 30 N 8-73 E	San Mateo Comuna 5
17	Carrera 15f N 35b-02e	Ciudad Latina Comuna 1
18	Carrera 31 N 17-224 Conjunto Naranjo	Ciudad Verde
19	Calle 33 Cra 3	San Mateo Comuna 5
20	Calle 15 N N7a-55	Centro Soacha Comuna 2
21	Calle 14 N 8-11	Centro Soacha Comuna 2
22	Cra 9 E N 30b-26	San Mateo Comuna 5
23	Conjunto Amaranto	Ciudad Verde

Tabla 2. Resaltos proyectados.

6.1.2 Relación de avance.

Se presenta a continuación la tabla de consolidado de porcentaje de obra, en la cual se realiza la comparación entre el avance ejecutado durante el mes de mayo y el porcentaje total ejecutado con respecto al valor global del proyecto. Esta información permite visualizar el progreso alcanzado en el periodo evaluado y su relación con el cumplimiento acumulado de la obra. Se adjunta tabla porcentaje de ejecución en Anexo 04.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO CON LO CORRADO EN MAYO	PORCENTAJE CORRADO DE LA CUENTA DE ABRIL CON VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS. CALIBRE 16, DUPLEX RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS NORMA 4739.	UND	32,00	28,33%	0,74%	$ 852.313,00	$ 27.274.016,00
2	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISO, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS. CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	39,00	25,49%	0,67%	$ 628.516,00	$ 24.512.124,00
4	5	RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD)	UND	4,00	0,43%	0,01%	$ 104.417,00	$ 417.668,00
9	12	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRIO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4748 Y NTC 1362	M2	26,74	1,58%	0,04%	$ 53.919,00	$ 1.441.794,00
11	14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN	M2	44,82	1,89%	0,05%	$ 38.634,00	$ 1.731.576,00
13	25	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-80 (anteriormente CRR-1)	M2	217,40	5,08%	0,13%	$ 22.414,00	$ 4.874.021,00
14	28	RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO.	M3	14,61	32,27%	0,85%	$ 2.126.897,00	$ 31.069.128,00
15	Nº 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFITI PARA SEÑALES VERTICALES	M2	34,43	5,15%	0,14%	$ 145.000,00	$ 4.992.235,00
					100,00%	2,62%	VALOR TOTAL	[redacted]

Tabla 3. Porcentaje de Ejecución

6.1.3 Puntos con garantías.

Para el periodo comprendido en el presente informe, se presentan los siguientes puntos con garantías. Anexo 02.

6.1.4 Bitácora

Para el periodo comprendido del 27 de abril de 2026 al 26 de mayo de 2026, se registran las actividades realizadas para darle continuidad al contrato, se adjunta el registro de estas actividades para el periodo reportado en el Anexo 03.

6.1.5 Registro mensual del estado general del tiempo.

En la siguiente ilustración se presenta la información relacionada con la precipitación en la ciudad de Soacha durante el mes del presente informe.

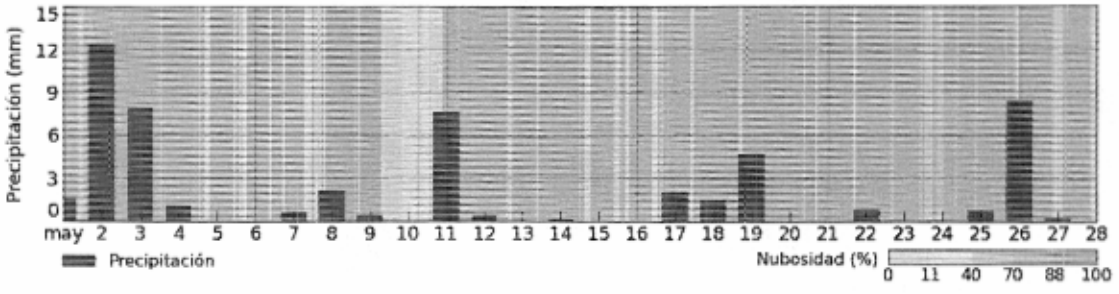


Ilustración 2.Precipitación mayo.

Tomado de: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/weatherarchive/soacha_colombia_3667905

7 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

7.1.1 Ítems contractuales ejecutados.

- Suministro y aplicación de pintura de tráfico, pintura acrílica en frío base solvente para marca vial, con microesfera de vidrio, espesor seco 22 mils, que cumpla la norma ntc 4744 y ntc Cantidad Ejecutada m2.



Fuente: propia

Ilustración 3. Aplicación de pintura M2.

- Suministro y aplicación de imprimante acrílico negro, para marcas viales con espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen. Cantidad Ejecutada 365,91m2



Fuente: propia

Ilustración 4. Aplicación de imprimante M2.

- Construcción de resalto en asfalto Cantidad Ejecutada: Riego de Liga 88,33 m2 Asfalto 5,98m3



Fuente: propia

Ilustración 5. Construcción de resaltos en asfalto

- Suministro e Instalación de Señales Verticales

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	SEÑALES VERTICALES		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	32,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.	UND	39,00
5	RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD)	UND	4,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO		

Tabla 4. Registro Señales Verticales



Fuente: propia

Ilustración 6. Suministro e instalación de señales verticales

Nota: No se realiza la instalación de las Señales verticales en el barrio Ducales calle 16 sur # 11b-34 puesto que las condiciones del andén no lo permitieron debido a que es muy angosto y la señal pega contra la casa impidiendo la instalación del tablero.



Fuente: propia

Ilustración 7. Suministro e instalación de señales verticales

8 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa el registro fotográfico de la ejecución de la obra como soporte visual de las actividades realizadas, el cual puede consultarse en el Anexo 06. En dicho anexo se incluyen las imágenes organizadas con sus respectivos puntos de referencia y direcciones, permitiendo identificar con precisión las ubicaciones y el avance de los trabajos desarrollados.

8.1.1 Cantidades ejecutadas.

Las cantidades ejecutadas y las garantías durante el presente periodo se adjuntan en el Anexo 04.

9 GESTIÓN, AVANCE Y PARTICULARIDADES SOBRE LOS PMT´S

Estado de tramite PMT: Se recibió respuesta por parte de la Secretaria de Planeación el día 14 de mayo de 2026 donde solicitan más información del contrato y puntos a intervenir, se da respuesta por parte del contratista para continuar con el trámite del certificado de exención de licencia de intervención y ocupación del espacio público que nos solicita la Secretaria de ambiente para ellos generar la constancia de la no generación de RCD que solicita la Secretaria de Movilidad para continuar con el tramite de PMT.

10 GESTIÓN Y AVANCE

10.1 Recursos utilizados por el contrato de obra

10.1.1 Personal técnico

Para el periodo comprendido del 27 de marzo de 2026 al 26 de abril de 2026, se contó con el siguiente personal técnico, el cual cumplió con los tiempos establecidos de dedicación, se evidencia la participación de dicho personal en las planillas de pagos parafiscales.

Nombre del interesado	Cargo y/o Rol	Dedicación	N° Planilla
Mauricio Laverde Acosta	Director de obra	50%	84307544
Virginia Rocha	Especialista en tránsito	30%	9505334799
Mauricio Laverde Acosta	Especialista en pavimentos	30%	84307544
Julián Eduardo Roldan Gordillo	Ingeniero residente de obra	100%	6019592650
Carol Natalia López Caviedes	Auxiliar residente de obra	100%	9505334799
Andrés Esteban Orjuela	Auxiliar residente de obra	100%	9505334799
Sergio Zabala	Coordinador de Obra	100%	9505334799
Mauricio Patiño	Urbanista	100%	9505334799

Tabla 5. Personal.

10.1.2 Personal operativo

Para el periodo comprendido del 27 de marzo de 2026 al 26 de abril de 2026 se adelantaron labores de implementación con los siguientes grupos de personal.

#	Personal operativo	N° identificación	N° de Planilla
1	Plata Giraldo Fermin Esneider	16656065	6012874316
2	Pinilla Camacho Harold Steven	1015427027	6012874316
3	Edwin Luis Guerrero Pizza	1073672293	6012874316
4	Beatriz Boyacá	1007407654	9501704476
5	Brayan Blanco	1000002903	9001166
6	Lincoln Chesman Miranda	80190949	81330792
7	Arias Sanchez Sandro David	1010002341	81330792
8	Juan David Souza	1140914249	81330792
9	Jorge Andres Souza	80254730	81330792
10	Julio Hernan Rojas Souza	1023010400	
11	Miguel Felipe Rojas Souza	1073243158	81330792

Tabla 6. Personal operativo.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL:

GRUPO 1. Cuadrilla encargada de la implementación de señales horizontales en acrílica base solvente, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductos, Un (1) Operador y cuatro (4) ayudantes de obra.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL:

GRUPO 2. Cuadrilla encargada de la implementación de señales horizontales en acrílica base solvente, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductos, Un (1) Operador y tres (3) ayudantes de obra.

CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS:

GRUPO 3. Cuadrilla encargada de la implementación de señales horizontales en acrílica base solvente, Conformada de Un (1) supervisor, Un (1) conductos, Un (1) Operador y un (1) ayudantes de obra.

10.1.3 Pausas activas.

Las pausas activas son descansos breves que se realizan durante la jornada laboral para ejercitar el cuerpo, las cuales reducen la fatiga muscular, disminuyen el estrés, previenen trastornos musculoesqueléticos, mejoran el tono físico y aumentan la motivación y productividad.



Ilustración 8. Pausas activas en campo.
Fuente: propia.

10.1.4 Equipos utilizados

Para la ejecución del contrato se han utilizado los equipos relacionados a continuación:

Ítems	Maquinaria	Cantidad
1	Un vehículo de carga con capacidad superior a 5 ton.	2
2	Una maquina delineadora, Auto propulsada, cuyas características mínimas cumplen con lo especificado para ellas en los numerales 2.2 2.3 2.4 2.5 y 2.12 de la NTC 4744.	1
3	Un microscopio de bolsillo con aumento de 30 x o una lupa con linterna para visualizar la distribución de la microesfera.	1
4	Un cronometro para medir el tiempo de secado de la pintura aplicada.	1
5	Un odómetro de precisión electrónica para medir las cantidades ejecutadas en demarcación lineal.	1
6	Un termómetro de contacto o pistola con termómetro digital para medir la temperatura de piso.	1

7	Un micrómetro para medir y controlar el espesor seco de la pintura de aplicada.	1
8	Una galga para medir el espesor húmedo de la pelicula de pintura aplicada.	1
9	Un retroreflectometro, para medir la reflectividad de la señalización horizontal lineal, que suministra las lecturas en milicandelas.	1
10	Una maquina térmica pega tachas.	1
11	Equipo de soldadura.	1
12	Equipo de pintura.	1
13	Equipo de serigrafia (o) su equivalente (impresora láser).	1
14	Equipo de laminación.	1
15	Hoyadoras.	1
16	Picas.	1
17	Palas.	1
18	Niveles de precisión.	1
19	Bateas.	1

Tabla 7. Equipos utilizados.

11 MATERIALES UTILIZADOS.

11.1 Listado de proveedores.

Empresa	Materiales
CEPLAS S.A.S	SEÑALES VERTICALES
MULTIASFALTOS EMULSIONES ASFALTICAS	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1
CHIYE GLASS BEAD (HEBEI) CO LTD	MICROESFERA
AKZONOBEL	PINTURA BASE SOLVENTE AMARILLA
AKZONOBEL	PINTURA BASE SOLVENTE
AKZONOBEL	IMPRIMANTE
AKZONOBEL	MICROESFERA SWARCOFLEX TIPO 1
3M	PAPEL REFLECTIVO-SEÑALES VERTICALES
ACESCO	TUBO REDONDO-SEÑALES VERTICALES

Tabla 8. Proveedores.

Se informa que fueron actualizados los certificados de calidad correspondientes a los materiales utilizados en la ejecución del proyecto. No obstante, queda pendiente la actualización del certificado

de calidad del asfalto, debido a que este documento fue solicitado a la empresa proveedora y se encuentra en espera de su entrega para proceder con su incorporación al expediente correspondiente

11.2 Calidad de los materiales.

Certificación de calidad de los materiales suministrada por cada uno de los proveedores, se relaciona en el Anexo 07. Certificación de calidad.

12 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

12.1 Comités de seguimiento

Las actas realizadas durante el presente periodo se adjuntan en el Anexo 08. Comités de seguimiento.

12.2 Canales de divulgación de información.

12.2.1 Canales de divulgación de información interna.

12.2.1.1 Correo electrónico.

El medio de comunicación principal es por medio de correo electrónico, "pintuwater2025@gmail.com", del cual se reciben y envían información formal del contrato 3282-2024 a todas las partes interesadas.

12.2.1.2 WhatsApp

Como medio de comunicación informal para el manejo de información ágil se cuenta con un grupo de WhatsApp el cual tiene como nombre "SOACHA contrato", en donde participa interventoría y secretaria de movilidad de Soacha, por este medio se notifica programación diaria, avances fotográficos, se realizan preguntas e inquietudes y se resuelven las mismas.

12.2.2 Canales de divulgación de información con la comunidad residente de la Ciudad SOACHA.

Para hacer efectiva la comunicación con la comunidad se utilizan vallas publicitarias instaladas en los camiones de obra.



Ilustración 9. Valla publicitaria instalada.



Ilustración 10. Valla publicitaria identidad grafica SMS.

13 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA.

De acuerdo al seguimiento y control con asunto al presente contrato se adjunta correspondencia enviada y recibida. Anexo 10. Correspondencia.

13.1.1 Correspondencia recibida.

Fecha	Asunto	Consecutivo	Recibido de
04/05/2026	Programación Detallada	OF-INT-3283-2024-117	CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
04/05/2026	Acta de comité 7.05.2026	Correo	CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
22/05/2026	Solicitudes Contrato 3282-2024 Reductores y señalizacion fase 5 solicitud 2	Correo	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
23/05/2026	Solicitud de Programación	OF-INT-3283-2024-0123	SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Tabla 9. Correspondencia recibida.

13.1.2 Correspondencia enviada.

Fecha	Asunto	Consecutivo	Dirigido a
13/05/2026	Solicitud de prórroga de contrato por 30 días calendario	Ref. 0083/PW	CONSORCIO INTERVIAL PCI PC SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Tabla 10. Correspondencia enviada.

14 SEGURIDAD SOCIAL

14.1 Planillas de pago de parafiscales y demás aportes legales

Se hace entrega de copia de los aportes de seguridad del personal. Anexo 06.

15 ESTADO PRESUPUESTAL

15.1 Presupuesto ejecutado

A continuación, se presentan los valores ejecutados durante el periodo reportado en el presente informe. Anexo 10. Formulario 1.

16 CONCLUSIÓN.

- Se ha facturado $3.290.457.292 millones durante la ejecución del proyecto con una ejecución de avance del 89,70%
- A la fecha falta por ejecutar un valor de $377.781.152
- De igual manera, se realizaron actividades de demarcación horizontal, incluyendo la aplicación de pintura de tráfico e imprimantes, que fortalecen la visibilidad y seguridad en la vía. Adicionalmente, la instalación de estoperoles, resaltos y la ejecución de riegos de liga reflejan un progreso integral en las intervenciones orientadas a la regulación de la velocidad y mejora de las condiciones de circulación.
- En conjunto, las actividades desarrolladas durante el periodo muestran un cumplimiento adecuado de las metas programadas, aportando al avance físico del proyecto y garantizando condiciones más seguras para los usuarios de la vía.
- La radicación del PMT actualmente depende del certificado que expida la Secretaría de Plancación.
- "No es posible realizar la instalación de las señales SP-25, ya que el andén donde se tenía proyectada la construcción del resalto es demasiado angosto. Debido a esta condición, el

poste de la señal queda pegado a la vivienda, lo que impide la instalación adecuada del tablero."

- Con base en las actividades ejecutadas durante el mes de mayo, se evidencia un avance en la implementación de señalización vial y obras complementarias asociadas a la seguridad y organización del tránsito. Se destaca la instalación y suministro de señales verticales en diferentes tipologías, así como el retiro y reubicación de elementos existentes, lo cual contribuye a la optimización de la infraestructura vial.

	GESTION FINANCIERA											CODIGO:	GF-FR-010
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL											VERSION	1
												FECHA DE APROBAC	19/09/2025

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL RIVIERA	OBJETO CONTRACTUAL	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD, EL ESPACIO PUBLICO Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL CORREDOR VIAL CARRERA 33 ENTRE CALLES 30 Y 37 Y CARRERA 34 ENTRE CALLES 30 Y 37 EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	0282-2024 DEL 30/12/2024
PLAZO DE EJECUCION	17 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO CONTRATO	31/12/2024
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	15/06/2026

VALOR INICIAL CONTRATO	1.539.263.000,00
VIGENCIA FUTURA	1.539.263.000,00
ADICION 1-2-3	550.712.444,00
VALOR TOTAL CONTRATO	3.660.238.444,00

BALANCE FINANCIERO

CDP	CRP	CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO	RECURSO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA PARCIAL 6	ACTA PARCIAL 7	ACTA PARCIAL 8	ACTA PARCIAL 9	ACTA PARCIAL 10	ACTA PARCIAL 11	ACTA PARCIAL 12	ACTA PARCIAL 13	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
7247-2024	6647-2024	0112-2-3-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-006-01119-3	ORDINARIO (2)	1.539.263.000,00	360.629.795,00	$ 154.603.443,00	$ 957.023.722,00	$ 184.199.057,00	$ 423.190.096,00	$ 152.514.757,00	$ 459.886.153,00	$ 299.856.033,00	$ 154.229.449,00	$ 75.277.280,00	$ 128.394.379,00	$ 141.899.205,00	$ 99.276.968,00	$ 3.390.457.292,00	$ 371.781.152,00
5368-2025	6634-2025	0112-2-3-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-006-01119-3	CONTINUANDO (2)	1.539.263.000,00					$ 230.676.053,00	$ 152.514.757,00	$ 459.886.153,00	$ 299.856.033,00	$ 154.229.449,00	$ 75.277.280,00	$ 128.394.379,00	$ 31.349.971,00		$ 1.539.263.000,00	$ -
5368-2025	7139-2025	0112-2-3-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-006-01119-125	MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE-BALANC	7.213.338,00												$ 7.213.338,00		$ 7.213.338,00	$ -
5368-2025	7139-2025	0112-2-3-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-006-01119-40	MULTAS DE TRANSITO 25% -BALANCE 40	1.416.809,00												$ 1.416.809,00		$ 1.416.809,00	$ -
5368-2025	7139-2025	0112-2-3-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-006-01119-55	SGP GENERAL - LIBRE INVERSION (55)	13.856.491,00												$ 13.856.491,00		$ 13.856.491,00	$ -
5368-2025	7139-2025	0112-2-3-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-00-09-31119-57-1	RENDIMIENTO ORDINARIO (57-1)	14.066.222,00												$ 14.066.222,00		$ 14.066.222,00	$ -
5368-2025	7139-2025	0112-2-3-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-006-01119-58	ORDINARIO - BALANCE (58)	5.933.333,00												$ 5.933.333,00		$ 5.933.333,00	$ -
2307-2025	2281-2025	0112-2-3-24-06-036-02-2-3-2-02-02-009-01119-2	ORDINARIO (2)	92.651.782,00												$ 73.177.127,00	$ 19.914.655,00	$ 93.091.782,00	$ -
2901-2025	2671-2025	0112-2-3-24-08-036-02-2-3-2-02-02-006-01119-55	SGP GENERAL - LIBRE INVERSION (55)	440.949.898,00													$ 78.784.383,00	$ 78.784.383,00	$ 372.781.152,00
TOTAL CONTRATO				3.660.238.444,00	360.629.795,00	154.603.443,00	957.023.722,00	184.199.057,00	423.190.096,00	152.514.757,00	459.886.153,00	299.856.033,00	154.229.449,00	75.277.280,00	128.394.379,00	146.899.205,00	99.276.968,00	3.390.457.292,00	371.781.152,00

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

Proyectó: Juan Maldonado Clo 1121-2026 Profesional Financiero
Aprobó: Cristian Cassiano Cra 0153-2026 Profesional Financiero especializado
