• Retraso del 25% (FOR-CO-03-055, 097, 118),
• Necesidad de nuevas contrataciones administrativas por implementación de nuevas metodologías de intervención de la rasante.
• Reinversiones derivadas de falta de acceso o cierres (FOR-CO-03-099 y 100), • Daños geotécnicos y climáticos extraordinarios.

La ampliación del plazo garantiza:
• Que el contratista no financie injustamente costos adicionales,
• Que la ejecución se mantenga dentro del marco económico pactado.

IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES
(Fuerza mayor geológica - Climática-eventos fortuitos – CPACA – Consejo de Estado)

• Derrumbes masivos (FOR-CO-03-120),
• Pérdida de banca (FOR-CO-03-164),
• Remoción en masa (FOR-CO-03-197),
• Cierres totales por caída de material geológico (FOR-CO-03-149),
• Escorrentía profunda (FOR-CO-03-168),
• Saturación del suelo (FOR-CO-03-270).

Según el Consejo de Estado:

Los fenómenos geológicos y climáticos de carácter extraordinario constituyen fuerza mayor y exoneran de responsabilidad al contratista.

***APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD**.*

El contrato debe ejecutarse dentro de condiciones reales, no hipotéticas.

“La autoridad administrativa debe ajustar el contrato cuando nuevas circunstancias demuestran que el plazo vigente resulta insuficiente para el cumplimiento del objeto.”

VI. CONCLUSIONES TÉCNICAS

1. *Los corredores viales no se encontraban en condiciones reales para ejecutar la secuencia técnica del Anexo Técnico, como quedó demostrado en los oficios FOR-CO03-099, 100, 119, 149, 120, 164, 197, entre otros.*

2. *Las afectaciones geológicas (pérdida de banca, derrumbes, remoción en masa), climáticas (lluvias persistentes) e hídricas (saturación y ausencia de drenajes definidos) constituyeron hechos sobrevinientes no imputables al contratista.*

3. *Estas afectaciones impidieron la ejecución continua de topografía, calicatas, ensayos ONAC, estabilización y reconformación de rasante.*

4. *La Reprogramación V4 refleja la única programación técnicamente posible, construida sobre datos reales del corredor y validada por la Interventoría mediante el documento FORCO-03-384.*

VII. CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

1. *La Interventoría realizó observaciones reiteradas a PMT, PAGA, metodología y programación, generando procesos de revisión y corrección que prolongaron la aprobación de documentos base (FOR-CO-03-029, 046, 054, 358).*

2. *La no habilitación oportuna de frentes, documentada en FOR-CO-03-099 (Ubalá) y FORCO-03-100 (Medina), afectó el inicio real de la ejecución.*

3. *Actividades críticas dependieron de terceros externos (Universidad del Cauca), como se evidencia en el oficio FOR-CO-03-120.*

4. *Las reprogramaciones V1, V2 y V3 fueron consecuencia directa de las condiciones administrativas y operativas evidenciadas en los oficios FOR-CO-03-117, 127 y 160.*

VIII. CONCLUSIONES FINANCIERAS

1. *La entidad no desembolsó oportunamente el anticipo, pese a las solicitudes formales (FOR-CO-03-014, 020, 081).*

2. *El primer 25% tampoco fue desembolsado en los tiempos requeridos, afectando estudios, laboratorio, topografía y ejecución de fases críticas (FOR-CO-03-055, 097, 118).*

3. *La falta de flujo financiero obligó a reprogramar y a aplazar actividades esenciales del contrato.*

4. *La afectación financiera generó impacto técnico directo, lo cual obliga al restablecimiento de la ecuación contractual conforme a la Ley 80 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.*

IX. CONCLUSIONES JURÍDICAS

1. *Según el principio de planeación de la Ley 80, la Entidad debe ajustar el contrato cuando las condiciones reales de ejecución demuestren que el plazo vigente es insuficiente.*

2. *La demora en habilitar frentes, aprobar PMT/PAGA/metodologías de intervención de rasante al no cumplir el Art 237-22 y desembolsar recursos constituye mora administrativa, causante del retraso y exonerarte de responsabilidad para el contratista.*

3. *Los hechos geológicos, climáticos extraordinarios constituyen fuerza mayor, respaldada por jurisprudencia del Consejo de Estado, lo cual impide imputar retrasos al contratista.*

4. *La Interventoría validó la Reprogramación V4 mediante el documento FOR-CO-03-384, lo cual constituye un acto administrativo tácito, a la luz del CPACA.*

X. CONCLUSIÓN PRINCIPAL

Con base en todo lo anterior, el Consorcio SOFAN C-031, en cabeza de su representante legal Andrés Gabriel Sofan Sánchez, solicita respetuosamente:

***QUE SE AMPLÍE EL PLAZO DEL** CONTRATO ICCU–CONTRATO–138–2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026*

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

La prórroga permitirá

1. Dar cumplimiento íntegro al Anexo Técnico.
2. Garantizar la calidad de las intervenciones.
3. Preservar la ecuación económica del contrato.
4. Asegurar la correcta inversión de los recursos públicos.

Aunado a lo expuesto, el contratista Consorcio SOFAN C-03, amplia la solicitud de prórroga mediante comunicado ***SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-472,*** *en el cual solicita ampliar el plazo de ejecución a ocho (8) meses, manifestando, entre otros:*

1. ***Falta de definición oficial del tipo de cuneta***

A pesar de que el Consorcio, en conjunto con la Interventoría, había realizado la validación técnica preliminar y la correspondiente presupuestación del tipo de cuneta a implementar, la Entidad objetó dicha propuesta por considerarla desproporcionada presupuestalmente, solicitando su reevaluación y ajustes. Esta situación ha generado retrasos sustanciales en la ejecución, en tanto la definición final quedó supeditada a nuevas indicaciones institucionales que aún no han sido emitidas.

A la fecha no se ha recibido aprobación institucional respecto al tipo de cuneta que debe construirse en los distintos tramos del corredor. Esta definición afecta directamente:

• El diseño técnico definitivo,
• Cálculos y cantidades de obra,
• Selección de materiales,
• Secuencia de actividades y uso de maquinaria,
• Manejo del drenaje superficial,
• Y estabilidad hidráulica longitudinal del corredor.

Sin esta definición institucional, resulta técnicamente imposible cerrar diseños, programar actividades o ejecutar obra conforme al Anexo Técnico.

2. ***Falta de validación integral de obras hidráulicas***

Si bien el Consorcio ha participado en los recorridos de campo junto con la Interventoría para la definición de las obras hidráulicas, durante dichos recorridos la comunidad ha objetado de manera vehemente la ubicación técnica propuesta, lo cual ha obligado a replantear y discutir nuevamente alternativas ya validadas técnicamente. Esta metodología derivada de la necesidad de atender solicitudes comunitarias se considera técnicamente equivocada, en tanto desplaza el criterio profesional del Contratista y de la Interventoría y condiciona decisiones técnicas a factores externos ajenos al contrato. Como consecuencia directa, la definición de las obras hidráulicas no ha podido concluirse oportunamente.

La ausencia de estas definiciones exacerbada por las objeciones comunitarias durante los recorridos genera retrasos no imputables al contratista y obliga a reestructurar la programación, razón por la cual deben considerarse estos tiempos dentro del plazo contractual.

3. ***Impacto directo sobre el plazo contractual***

• Las condiciones descritas anteriormente generan:
• Reprogramación obligatoria de actividades,
• Ajustes en cantidades de obra,
• Redistribución de maquinaria y personal técnico,
• Aplazamiento de actividades dependientes de definiciones institucionales,
• Y variaciones en la secuencia técnica prevista en la Reprogramación vigente.

Por ello, el plazo previamente solicitado (31 de julio de 2026) resulta insuficiente para garantizar la adecuada ejecución del Anexo Técnico.

4. *Solicitud formal de ampliación del plazo contractual*

Con fundamento en todo lo expuesto, y aplicando los principios de planeación, razonabilidad, colaboración y equilibrio contractual previstos en la Ley 80 de 1993, este Consorcio solicita respetuosamente:

a) *QUE SE AMPLÍE EL PLAZO DEL CONTRATO ICCU–CTO–138–2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026.*

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Toda vez que:

• No existe definición oficial del tipo de cuneta,
• No se han validado las obras hidráulicas en su totalidad,
• El criterio técnico se ha visto afectado por determinaciones comunitarias,
• Y los retrasos generados por estas circunstancias no son imputables al contratista.

Frente a las manifestaciones del contratista de obra CONSORCIO SOFAN C-031, se indica que mediante comunicado 766-458 el interventor CONSORCIO Intervención AC, concluye, entre otros:

I. ANÁLISIS DETALLADO DEL ACTA DE INICIO Y PLANTEAMIENTO CONTRACTUAL

En respuesta a esta consideración, y teniendo en cuenta la cláusula 4 del contrato ICCU-138-2025, como reza a continuación:

"CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato, y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo de 11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra, para la ejecución total de las obras."

Como se evidencia el plazo del contrato no está supeditado únicamente al termino de los 11 meses, sino también a la fecha concreta establecida en la cláusula anterior, a saber, el 31 de diciembre del 2025. En este orden de ideas no hubo reducción del plazo, toda vez que el plazo está claramente definido en la minuta del contrato, a la ocurrencia de una de dos condiciones. Sin embargo, es preciso indicar que a la fecha de inicio del proyecto, y conforme a los resultados de exploración y caracterización, se evidencia la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del proyecto.
…
Si bien, no se evidencia en la trazabilidad del inicio contractual y programación inicial del contrato ICCU-138-2025, limitaciones operativas, administrativas y financieras que hayan afectado gravemente el inicio del contrato, si es importante mencionar que se realizaron acciones de todas

las partes encaminadas al cumplimiento del anexo técnico del contrato, y recomendaciones para el ajuste de documentos requeridos para la ejecución de la Fase de caracterización, en el menor tiempo posible.

II. FUNDAMENTO TÉCNICO.

…

A continuación, se presentan las tablas sobre los tiempos equivalentes a jornadas perdidas por eventos climáticos y eventos de remoción en masa:

Tabla 3. Días Sin ejecución de actividades por lluvias

Mes	Total H Del Mes	% H Lluvias	Total Días
Abril	720	18%	10,8
Mayo	740	14%	8,63333333
Junio	720	44%	26,4
			45,8333333

Fuente: informes mensuales de interventoría de abril, mayo y junio

Estos 46 días de retraso corresponden exclusivamente a la fase 1 del contrato de obra ICCU-138-2025.

Ilustración 1. Días sin ejecución de actividades por fenómenos de remoción en masa

Municipio / Tramo	Evento principal	Fecha de inicio del cierre	Estado al 27/08/2025	Tiempo perdido (días calendario)	Observaciones
Quetame – Yerbabuena – Fómeque	Deslizamiento masivo en sector Algodonal (bloqueo total de la vía Quetame–Puente Quetame, 3.200 m³)	11 de julio de 2025	Municipio continúa incomunicado. No es posible realizar apiques ni levantamiento topográfico.	47 días	No existe fecha definida para restablecimiento de la vía.
Fómeque – Cáqueza (vía Choachí–Ubaque)	Pérdida de banca en sector Empalme–Romero Bajo (cierre total inicial, paso restringido desde 23/08)	11 de julio de 2025	Paso restringido a vehículos livianos; ingreso de maquinaria pesada aún no autorizado.	43 días	Se prevé reinicio de actividades de campo en la primera semana de septiembre, sujeto a condiciones viales.

Fuente: Oficio Sofán SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-160

Estos 47 días de retraso corresponden exclusivamente a la fase 2 del contrato de obra ICCU-138-2025, toda vez que estos eventos son posteriores a la finalización de la fase 1 del contrato.

Así las cosas, se cuantifican 93 días de retraso a corte del 30 de junio, teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas en la Tabla N° 2.

Ahora bien, con respecto a la referencia del Contratista sobre el desembolso de anticipos y trámites de pagos de la Fase de caracterización, esta Interventoría deja claramente establecido que se realizaron los trámites correspondientes dentro de los tiempos legales establecidos. Por lo tanto, el no desembolso de estos no se constituye en una causal de retraso.

III. FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO.

De acuerdo con los argumentos presentados por el contratista, y la respuesta emitida en su momento por la Interventoría se demuestra que los ajustes solicitados a documentos realizados por el contratista y demás observaciones que realiza la interventoría hacen parte de las labores de seguimiento, control y revisión propias del contrato de interventoría, y no son de ninguna manera causales de retrasos administrativos y técnicos.

Ahora bien, con respecto al desarrollo de la fase 2, de caracterización geotécnica, se tiene en cuenta que debido a la caracterización geotécnica no pudo aplicarse directamente el art. 237-INVIAS 2022, ya que dicha norma no contempla el uso de estabilizantes químicos no tradicionales en suelos de tipo granular , sino el articulo 350 INVIAS, que garantiza la aplicación de los aditivos químicos acompañado con una dosificación del 3% de cemento, y que por tal razón fue necesaria la realización de varias mesas de trabajo entre las que sobresalen las del 28 de mayo del 2025, 18 de julio del 2025, 24 de julio del 2025, 03 de septiembre del 2025, 10 de septiembre del 2025, 17 de septiembre del 2025, entre otras con el fin de discutir la metodología de diseño de la estabilización de la rasante con la adición de los químicos no tradicionales.

Adicionalmente, según consta el acta de reunión del día 30 de julio, se acordó entre las partes la priorización de actividades de la fase 1, mientras se tomaba una decisión de fondo teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el mes de julio y la reunión realizada con especialistas de la universidad del cauca, el día 24 de julio del 2025.

…, luego de varias mesas de trabajos, comités de seguimiento y sesión de orientación con los especialistas de la universidad del Cauca, se concluye

que durante los meses de Julio y Agosto se gestaron las condiciones y aclaraciones requeridas para poder elaborar los informes finales de caracterización geotécnica, como consta en el oficio 766-241; toda vez que la naturaleza de las intervenciones no se acogían totalmente a la normativa inicialmente establecida.

Por consiguiente, esta interventoría determina que durante los 120 días comprendidos entre junio y septiembre, no estaban la metodología de diseño suficientemente clara, para definir las fórmulas de trabajo, teniendo en cuenta los resultados de laboratorio adelantados hasta el mes de julio del año 2025, donde se determina la inaplicabilidad del artículo 237-22 de las especificaciones generalas de construcción de carreteras del INVIAS, como se puede constatar en el oficio 766-172 Respuesta oficio ICCU-S-2025-0005729 // Estado de entregables Fase 2 – Contrato de Obra No. ICCU-138 de 2025.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta los retrasos anteriormente descritos, de 93 días relacionados por condiciones de cierres viales por fenómenos de remoción en masa, condiciones climáticas anormales en volumen y épocas de lluvias, y por otro lado, el retraso de 120 días producto de la definición de la metodología para el diseño de la fórmula de trabajo de la intervención de la rasante; y adicionalmente, con base en el rendimiento físico actual, correspondiente a 125 ml/día por frente de obra, y considerando la ejecución simultánea de tres frentes de estabilización para un total de 375 ml/día, se estima un periodo de intervención de 182 días. Este cálculo se realiza sobre un alcance equivalente al 55% de la longitud total inicial de 135,12 km, es decir, aproximadamente 75 km, de los cuales a la fecha se han ejecutado 6,5 k.

A continuación, se presenta el avance físico de las fases del contrato ICCU-138-2025, de acuerdo con la redistribución de actividades viabilizadas mediante el oficio 766-391 Respuesta al oficio SOFAN-FORCO-03-ICCU031-394 – Redistribución de actividades y actualización del Plan de Contingencia:

Tabla 6. Resumen ejecución de fases del contrato ICCU-138-2025

Descripción	Porcentaje/Días
Porcentaje reprogramado acumulado	18,75%
Porcentaje ejecutado acumulado	11,92%
Retraso Total	6,83%
Fase 1: geoposicionamiento y topografía (ejecutado)	99,54%
Fase 2: Caracterización geotécnica (ejecutado)	97,89%
Fase 3: Obra (ejecutado)	4,68%
Retraso en días	19 días

Fuente: informe interventoría semanal N° 33 a corte del 28 de noviembre 2025

Adicionalmente se remite el comunicado 766-430 Actualización Entregables aprobados y en revisión de la Fase I y Fase II del contrato ICCU-138-2025 donde se evidencia el estado actual de los entregables correspondientes a la fase I y II.

Por otro lado, teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista mediante el comunicado SOFANFOR-CO-03-ICCU031-472 Dando alcance al Oficio No. SOFAN–FOR-CO-03-ICCU031–456 – Solicitud de ampliación del plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2026 por falta de definición del tipo de cuneta y de las obras hidráulicas; donde se solicita un mes adicional, a los 7 meses de prorroga solicitados previamente en el comunicado Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-456, y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en evaluación y trámite la solución definitiva para la intervención de cunetas, desde la interventoría se estima necesario contemplar dentro de la prórroga estos 30 días de ejecución, dado el proceso constructivo para las mismas, en consideración de que el material donde se van a ejecutar las mismas es altamente limoso y de alto contenido orgánico.

1. ***CONCEPTO DEL INTERVENTORIA (****comunicado 766-458)*

"(…)
Para finalizar, y considerando cada uno de los argumentos expuestos por el contratista, que evidencian las afectaciones del normal desarrollo de las obras dentro del cronograma del proyecto, esta interventoría en el marco de sus obligaciones considera que los ocho (8) meses solicitados por el contratista para la finalización de las actividades del proyecto, incluidas la intervención de las cunetas, obras hidráulicas y de estabilización, son suficientes para la terminación de las obras, por lo cual se recomienda conceder esta prórroga desde el 1 de enero del 2026 al 31 de agosto del 2026.
(…)"

2. ***CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN ICCU***

Al respecto, el Manual de Contratación ICCU Versión 3 indica que:

(…)

3.3. EN PRORROGAS:

Es posible realizar los prorrogas a todos los proyectos del ICCU siempre y cuando estas cuenten con las justificaciones necesarias.

PARÁGRAFO: *Respecto de los demás contratos que difieran de obra pública, se deberán analizar los casos puntuales para verificar la posibilidad de modificaciones y adiciones.*

(…)

De acuerdo con la solicitud del contrista de obra ***CONSORCIO SOFAN C-031*** *y acogiéndome a lo conceptuado por la interventoría del proyecto* ***CONCORCIO INTERVENCIÓN AC,*** *esta supervisión ICCU, considera necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra* ***ICCU-CTO-138 del 2025*** *"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", con el fin de que se garantice la culminación integral de las actividades previstas en cada una de las fases (I,II y III) del contrato que aún se encuentran en desarrollo.*

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Para el trámite de suscrición de prórroga, se aclara:

No se realizarán adiciones de recursos a ninguna de las actividades de cada fase (I, II y III), en consecuencia, se mantiene el valor del contrato ICCU-CTO-138 de 2025, esto es hasta la suma de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($35.350.235.228,00).

SOLICITUD

Se solicita a la Subdirección de caminos Vecinales - ICCU, aprobación y trámite de solicitud de prórroga al plazo de ejecución del contrato ICCU-CTO-138 de 2025, por el término de ocho (8) meses más, toda vez que es imperioso garantizar que el contratista CONSORCIO SOFAN C-031, cuente con el plazo contractual necesario, para ejecutar el 100% del objeto y alcance contractual ***c).***Que, en el presente Contrato podrán incluirse modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley de contratación, es especial el de la autonomía de la voluntad de las partes; **d)** Que, el artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.", e igualmente que "Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia; **e)** Que, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales y que esta, debe estar al servicio de los interés generales y se desarrolla con fundamento, en la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, así como de los principios de transparencia económica y responsabilidad que rigen las actuaciones contractuales. Por lo anterior, es evidente la prevalencia del interés general y prima sobre las formalidades de la actuación administrativa, pues el régimen jurídico y presupuestal cede ante situaciones excepcionales, con el fin de permitir el cumplimiento del objeto contractual y que la inversión se traduzca en el desarrollo económico, social y ambiental de la región; En consecuencia, de lo anteriormente expuesto las partes. Según lo dispuesto las partes:

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA: Ampliar el plazo de ejecución del presente Contrato de obra **No ICCU 138 de 2025,** hasta el 31 de agosto de 2026;

CLÁUSULA SEGUNDA-COSTOS: El contratista no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente documento**;**

CLÁUSULA TERCERA.-DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente documento: **1.** Oficio suscrito por el contratista; **2**. Oficio suscrito por la interventoría; **3.** El Oficio suscrito por el Supervisor del contrato ICCU; **4.** Oficio suscrito por la Subdirectora técnica de la subdirección de caminos vecinales.

CLÁUSULA CUARTA: El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma **SECOP II.** La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015

Aprobó: *Juan David Ospina Ortegón –Subdirector Técnico -Subdirección de Gestión Contractual*
Proyectó: *Yenny Alejandra Tejero Rojas - Subdirección de Gestión Contractual*

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		SABADO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHIPAQUE	02	13/06/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIPLES LABOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RIOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se programa actividad en el frente de obra a razon de ser sabado en el que hay fin de semana con puente festivo y algunos de los operadores de maquinaria manifestar solicitud de permiso para ausentarse, sumado a restricciones de movilidad de maquinaria en la vía Bogotá - Villavicencio, la cual es la entrada al casco urbano de Chipaque, necesario para entrar con maquinaria y materiales.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202-76393 CND	

Contratista de Obra

Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHIPAQUE	62	14/06/2026	7:00 a. m	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIDISTRIBUIDOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RIOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	OSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasuria para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasuria para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-79382 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHIPAQUE	62	15/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoria	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoria N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoria	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la resarte para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la resarte para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACION TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER LUNES FESTIVO	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoria			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MARTES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHIPAQUE	62	18/08/2026	7:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-139 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRAS Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIFUNCIONAL	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RIOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Saldo y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	OSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Soplelear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Soplelear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se inicio el recorrido al reconocimiento de los tramos a instalase el tratamiento superficial simple, se recibe la emulsión asfaltica y acopio de grava. Así como tambien el traslado de algunos equipos de maquinaria desde el municipio de Choachi hacia el frente de obra de Chipaque	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe 16 tonedalas de emulsión asfalticas en el frente de obra

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 211129 CND	

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CAJOAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MIERCOLES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHIPAQUE	82	17/09/2025	7:00 a. m	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN ALTICARGUERO	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RIOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se realiza instalación de tratamiento superficial simple en el tramo 1 desde el **PR0+200 hasta PR1+240** Y se inicio el tramo 2 desde el **PR1+680 hasta el PR2+080** con la instalación de tratamiento superficial simple	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-164302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		JUEVES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHIPAQUE	02	18/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCION AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE. EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE. EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIFUNCIONAL	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RIOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMION	OSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasanta para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasanta para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACION TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se realiza instalación de tratamiento superficial simple en el tramo 2 desde el PR2+080 hasta PR2+680	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

34

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
			Inicio de labores	Terminacion de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHIPAQUE	02	VIERNES 19/06/2026	7:00 a. m	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMION DISTRIBUIDOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RIOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se realiza instalación de tratamiento superficial simple en el tramo 3 desde el PR4+080 hasta PR4+480 completando asi la instalación del 100% de TSS en este tramo del frente de obra de Chipaque	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411128 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		SABADO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	60	30/05/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presento lloviznas y el día se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto
TORMENTA				
LLUVIOSO	SÍ			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfáltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Soplotear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Soplotear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	CIL	No se programo actividad de instalación de tratamiento superficial simple en el frente de obra debido a que se ha venido presentando clima lluvioso y en esta jornada de sabado el horario no alcanzaria para esperar a que la humedad disminuya	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	60	31/05/2026	7:00 a. m.	2:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	60	1/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	OSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se reanuda la instalación de tratamiento superficial simple que venida de estar pausada por condiciones climaticas. Se realiza la instalación de TSS en el tramo final de la vereda Barronegro.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MARTES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	60	2/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se ocupa el personal en el traslado de maquinaria, PMT y equipos necesarios para la aplicación del TSS desde el tramo final de la vereda Barronegro hacia el tramo inicial de la Vereda La Caja, donde hay pendiente por instalar 400 m lineales de TSS para completar el tramo de vereda la caja.	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

Interventoría			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre. BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MIERCOLES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	60	3/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	SI		
SOLEADO			

OBSERVACIONES: Lloviznas prolongadas durante la jornada de la mañana, escalando a un afirmado saturado durante el resto del día

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se realizo la instalación de TSS durante este día debido a que se presento lloviznas y el día se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto y la aplicación de emulsiones asfálticas requiere que la superficie esté limpia y, fundamentalmente, que esté libre de humedad o saturación, ya que, si la emulsión no logra contacto directo sobre la capa estabilizada, es técnicamente imposible que ligue y confine la grava.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Día sin avance en instalación de TSS por estar en lluvia

FIRMAS

Interventoría			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78383 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		JUEVES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	60	4/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presento lloviznas y el día se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto
TORMENTA				
LLUVIOSO	SI			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se realizo la instalación de TSS durante este día debido a que se presento lloviznas y el día se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto y la aplicación de emulsiones asfálticas requiere que la superficie esté limpia y, fundamentalmente, que esté libre de humedad o saturación, ya que, si la emulsión no logra contacto directo sobre la capa estabilizada, es técnicamente imposible que ligue y confine la grava.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Día sin avance en instalación de TSS por estar en lluvia

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		VIERNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHI	60	5/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presento lloviznas y el dia se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto
TORMENTA				
LLUVIOSO	SI			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se realizo la instalación de TSS durante este dia debido a que se presento lloviznas y el dia se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto y la aplicación de emulsiones asfálticas requiere que la superficie esté limpia y, fundamentalmente, que esté libre de humedad o saturación, ya que, si la emulsión no logra contacto directo sobre la capa estabilizada, es técnicamente imposible que ligue y confine la grava.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Ninguno	

OBSERVACIONES GENERALES

Día sin avance en instalación de TSS por estar en lluvia

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		SABADO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	61	5/06/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Se presento lloviznas y el día se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto
TORMENTA				
LLUVIOSO	SÍ			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se programo actividad de instalación de tratamiento superficial simple en el frente de obra debido a que se ha venido presentando clima lluvioso y en esta jornada de sabado el horario no alcanzaria para esperar a que la humedad disminuya	SI	SI



IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78303 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	61	7/06/2026	7:00 a. m.	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminacion de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHI	61	8/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES	
NUBLADO					
TORMENTA					
LLUVIOSO	SI				
SOLEADO					

OBSERVACIONES	Lloviznas prolongadas durante la jornada de la mañana, escalando a un afirmado saturado durante el resto del día

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RIOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se realizo la instalación de TSS durante este día debido a que se presento lloviznas y el día se mantuvo nublado, lo que acarrea que el porcentaje de humedad se mantenga alto y la aplicación de emulsiones asfálticas requiere que la superficie esté limpia y, fundamentalmente, que esté libre de humedad o saturación, ya que, si la emulsión no logra contacto directo sobre la capa estabilizada, es técnicamente imposible que ligue y confine la grava.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MARTES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	61	9/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimición con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RAMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se reanuda la instalación de tratamiento superficial simple en el tramo de la vereda la Caja, realizando avance de 400 m lineales: Vereda la caja, **400 m lineales desde K1+597 hasta K2+000**	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se completa el 100 % de la instalación de tratamiento superficial simple del tramo vial requerido del municipio de Choachí.

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MIERCOLES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHI	61	10/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoria	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoria N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoria	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE		
NUBLADO				OBSERVACIONES.	Ninguna
TORMENTA					
LLUVIOSO					
SOLEADO					

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NÉSTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Actividad de instalación de tratamiento superficial simple completada Se traslada la maquinaria desde el frente de obra hacia el casco urbano del municipio de Choachí	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		JUEVES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	61	11/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporta del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Rapiarteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se realiza traslado de la maquinaria utilizada en la instalación del TSS desde el casco urbano del municipio de Choachí hacia el municipio de Chipaque.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA CALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		VIERNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / CHOACHÍ	61	12/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				Ninguna
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN MULTIGRAVILLADOR	CAMILO LOPEZ	SI		CAMIÓN MULTI - DISTRIBUIDOR DE GRAVILLA	1	Hace la imprimación con la emulsión asfaltica y la aplicación de la grava
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR MIXTO	RÁMON RÍOS	SI		COMPACTADOR MIXTO	1	Sellado y compactado de la grava
CONDUCTOR DE CAMIÓN	ÓSCAR MOLINA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transporte del personal, herramientas y del PMT
AUXILIAR OPERARIO	CARLOS ADAME	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
AUXILIAR OPERARIO	WALTER GUEVARA	SI		SOPLETEADORA	1	Sopletear la rasante para retirar particulas sueltas de grava o de hojas y material vegetal
VIALISTA	NESTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MORA	SI		N/A	N/A	
VIALISTA	PABLO EMILIO COTRINO	SI		N/A	N/A	
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Actividad de TSS terminada en el frente de obra choachí Queda temporalmente inactivo el frente de obra	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Ninguno	

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-783193 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		SABADO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	60	30/05/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		IBRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE II (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se programo actividad en el frente de obra a razon de venir de dias lluviosos que han impedido realizar la estabilización de capa de afirmado	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	60	31/05/2026	7:00 a. m	2:00 p. m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCION AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		RIO COMPACTADOR BITELLI GHBLIC	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78383 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 211129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	80	1/06/2026	7:00 a. m	5:00 p m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI CV	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del activo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMION NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO YULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR	GL	Se continua capa estabilizada en tramo 4 ubicado en vereda La Pastora, así 200 m lineales entre las abscisas K8+650 a K8+850 con ancho de 4,25 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 212,5 m3 Se utilizo cemento al 4% = 226 bultos de cemento y 175 litros de aditivo	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78363 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-164302	
Nombre: JAIRO GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411128 CND	

Powered by CamScanner

84

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MARTES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	60	2/08/2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Este día presentó lluvias desde la jornada de la mañana
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectacion y aplicación del aditivo quimico
CONDUCTOR CAMÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 5-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE II (APLI 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se continua capa estabilizada en tramo 4 ubicado en vereda La Pastora, así 190 m lineales entre las abscisas K8+850 a K9+040 con ancho de 4,20 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 199,5 m3 Se utilizo cemento al 4% = 212 bultos de cemento y 164 litros de aditivo	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reportó observación

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78383 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411176 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MIERCOLES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	#0	3/06/2026	7:00 a. m	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Se presentó lloviznas durante la jornada de la tarde
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		SI		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		ODRO COMPACTADOR BITELLI DHBLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDYVARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traseqo de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMION NKR	1	Transportar el personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se ocupa el personal de obra en actividades secundarias y no en el estabilizado de capa de afirmado a razón de que la motoniveladora sufrio pinchada de llanta y la logistica para despincharla ocupo media jornada de trabajo entre 7:00 am a 12:00 pm Durante las horas de la tarde se presento lloviznas	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Motoniveladora presentó pinchadura y perdida total de la presión de aire en rueda delantera	

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO A. VARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411125 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		JUEVES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	80	4/06/2026	7:00 a. m	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		BRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 19-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se inicia el tramo 5 de capa estabilizada, ubicado en vereda San Lorenzo, así: 200 m lineales entre las abscisas K9+480 a K9+680 con ancho de 4,20 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 210 m3 Se utilizo cemento al 4% = 223 bultos de cemento y 173 litros de aditivo	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se reubre un viaje de cemento x 200 bultos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78303 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184303	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
			Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	60	VIERNES 5/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE. EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE. EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				SE REPORTA LLOVIZNA CONSTANTE DURANTE LA MAÑANA Y LLOVIZNA TODA LA ANTERIOR NOCHE QUE SATURA LAS VIAS
TORMENTA				
LLUVIOSO	SI			
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C10	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE II (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se recibio viaje de cemento y acopio en el frente de obra, tambien se ocupo la jornada laboral en trasladar tuberia de concreto hacia la ubicación de cada uno de las primeras 4 alcantarillas a construir	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Ninguno	

OBSERVACIONES GENERALES

No se realiza estabilización de capa de afirmado porque el material de afirmado se encontró saturado y durante la jornada de la mañana se presentó lloviznas lo que acarreo que el porcentaje de humedad se mantuviera alto

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

89

BITACORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		SABADO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	01	6/06/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-133 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		IBRO COMPACTADOR BITELLI GIBILI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAXI FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traseigo de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHONJAPO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STYVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE II (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se programo actividad en el frente de obra a razon de vario de dia y noche lluviosos que hacen que el material de afirmado amanezca saturado y el porcentaje de humedad se mantiene durante varias horas del dia, llevando a que un dia sabado no alcance el horario laboral para hacer estabilizado de capa de afirmado	SI	NO

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202-78357 CND	

Contratista

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194202	
Nombre: CARLOS DONALDO MORENO LLANADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-[illegible] CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	61	7/06/2026	7:00 a m	2:00 p m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado o estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		IBRO COMPACTADOR BITELLI GIBLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traseqo de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo quimico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	61	6/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE II (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER LUNES FESTIVO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
			Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	01	MARTES 6/08/2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRACTUAL OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI CHELI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslado de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteo topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE II (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se continua el tramo 5 de capa estabilizada, ubicada en vereda San Lorenzo asi 220 m lineales entre las abscisas K9+680 a K9+900 con ancho de 4.20 m con espesor de 0,25 m Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 231 m3 Se utilizo cemento al 4% = 248 bultos de cemento y 190 litros de aditivo	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reportó observación

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78303 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-144303	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25252-811128 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MIERCOLES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	01	10/06/2026	7:00 a m	5:00 p m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-136 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado o estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		IBRO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 6-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se continua el tramo 5 de capa estabilizada, ubicado en vereda San Lorenzo asf. 200 m lineales entre las asbcisas K9+900 a K10+100 con ancho de 4.20 m con espesor de 0.25 m Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 210 m3 Se utiliza cemento al 4% = 223 bultos de cemento y 173 litros de aditivo	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202-76393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	41	JUEVES	Inicio de labores	Terminación de labores
		11/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-631	Contratista de Interventoria	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoria N°	ICCU-CTO-210 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoria	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Fresenge de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACION TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIÉRREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE II (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se continua el tramo 5 de capa estabilizada, ubicado en vereda San Lorenzo, así 160 m lineales entre las abscisas K10+100 a K10+280 con ancho de 4,20 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 169 m3 Se utiliza cemento al 4% = 201 bultos de cemento y 156 litros de aditivo	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe un viaje de cemento a 200 bultos

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411124 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		VIERNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	81	12/06/2026	7:00 a m	5:00 p m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C19	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se INICIA el tramo 6 de capa estabilizada, ubicado en vereda San Lorenzo, así: 210 m lineales entre las abscisas K10+740 a K10+050 con ancho de 4,20 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 220,5 m3 Se utilizo cemento al 4% = 234 bultos de cemento y 182 litros de aditivo	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Ninguno	

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		SABADO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	42	13/06/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		RODILLO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslado de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACION TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DEBIDO A ENCONTRARNOS EN PUENTE FESTIVO Y ALGUNAS SOLICITUDES DE PERMISO PARA AUSENTISMO POR PARTE DE OPERADORES DE MAQUINARIA DEL GRUPO DE TRABAJO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-164302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	#2	14/06/2026	7:00 a. m.	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI CT	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslado de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicacion del activo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Constructor de Obra

Nombre: WILSON GERARDO [illegible] GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-164302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / PÓMEQUE	62	15/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de concreto y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-05-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER LUNES FESTIVO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-134302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411128 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MARTES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	82	18/08/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		RODILLO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslado de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON QUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se realiza estabilización de capa de afirmado, a razon de que no se conto oportunamente con el suministro de combustible, llevando a que el personal de obra se ocupe en actividades secundarias Se recibio viaje de cemento de 200 bultos	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reportó observacion

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra Nombre: WILSON GERARDO LAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194202	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411176 CND	

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MIERCOLES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	62	17/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Lloviznas y día nublado durante toda la jornada laboral
TORMENTA				
LLUVIOSO	SI	SI		
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		...ORO COMPACTADOR BITELLI CHBLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslado de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se realiza estabilización de capa de afirmado existente a razón de lloviznas constantes durante la jornada laboral.	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78363 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		JUEVES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	42	18/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CANIZARES	SI		IBRO COMPACTADOR BITELLI CHBLI C	1	Soltar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasvejo de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 8-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 13-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS JUSTICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se continua con el tramo 6 de capa estabilizada, ubicado en vereda San Lorenzo, así: 185 m lineales entre las abscisas K10+950 a K11+135 con ancho de 4,40 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 203,5 m3 Se utilizo cemento al 4% = 216 bultos de cemento y 168 litros de aditivo	SI	SI
		Se realizo excavación mecanica y fundida de solado a las alcantarillas #2 y #3		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe un viaje de cemento x 200 bultos

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202 78283 CND	

Contratista de Obra

Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		VIERNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	#2	15/08/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHIRLI C10	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR - FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicacion del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMION NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topograficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se INICIA el tramo 7 de capa estabilizada, ubicado en vereda San Lorenzo, así: 160 m lineales entre las abscisas K12+240 a K12+400 con ancho de 4.20 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 168 m3 Se utilizo cemento al 4% = 179 bultos de cemento y 138 litros de aditivo	SI	SI
	GL	Se instalo la tuberia de las alcantarillas #2 y #3 y se realizo la fundición de los atraques	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Ninguno	

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411126 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		SABADO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	63	20/06/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoria	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoria N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoria	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI CHBLI C1	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslago de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del activo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se ocupa la jornada laboral en limpieza de tramo de cuneta como actividad previo a la estabilización de capa estabilizada de afirmado	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoria

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESICENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	83	21/06/2026	7:00 a. m.	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCION AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-158 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI CT	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Humectación al afirmado estabilizado
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasvigo de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VISALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON CUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-76393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	63	22/06/2026	7:00 a. m	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO EOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CANIZARES	SI		IBRO COMPACTADOR BITELLI GHDLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traseigo de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar el personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se continua el tramo 7 de capa estabilizada ubicado en vereda San Lorenzo, así: 190 m lineales entre las abscisas K12+400 a K12+590 con ancho de 4.20 m con espesor de 0,25 m Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 199.5 m3 Se utilizo cemento al 4% = 212 bultos de cemento y 164 litros de aditivo	SI	SI
		Se realiza el lleno con material comun de excavación a los ecantillos #2 ubicado en PR2+500 y #3 en PR2+700		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-76363 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-164302	
GARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-411125 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MARTES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	63	23/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		RODILLO COMPACTADOR BITELLI CHELI C	1	Bolar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslado de cemento y apoyo en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar el personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se realiza limpieza y conformación de sección de cuneta con cuchilla de motoniveladora para alistar tramo, previo a la estabilización de capa de afirmado existente	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe un viaje de cemento x 200 bultos

FIRMAS

Interventoría			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202-78303 CND	
Contratista de Obra			
Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MIERCOLES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	83	24/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHELI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar el personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUIMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se INICIA el tramo 8 de capa estabilizada, ubicado en vereda Potrero Grande, así: 190 m lineales entre las abscisas K13+160 a K13+350 con ancho de 5.15 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 244,02 m3 Se utilizo cemento al 4% = 268 bultos de cemento y 202 litros de aditivo	SI	SI
		Se realiza figurado y armando de acero de la zarpa y dados de dentellón de la alcantarilla #2		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe un viaje de cemento x 200 bultos

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-19-4302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / COMUNA	SEMANA	FECHA	HORA	
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	45	JUEVES	Inicio de labores	Terminación de labores
		25/09/2025	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRACTUAL OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCION AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-216 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO			
SOLEADO			

OBSERVACIONES:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		RODILLO COMPACTADOR BITELLI GIBELI C	1	Soltar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trocago de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar el personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-09-2025			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-08-2025			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15 CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se continua con el tramo 8 de capa estabilizada ubicado en vereda Potrero Grande, así: 170 m lineales entre las abscisas K13+350 a K13+520 con ancho de 4.50 m con espesor de 0,25 m Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 191,25 m3 Se utilizo cemento al 4% = 203 bultos de cemento y 158 litros de aditivo	SI	SI
		Se realizo la fundición de concreto a la zanja de la alcantarilla #2		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184303	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-411128 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		VIERNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	63	26/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACION CONTRATISTA OBRA		INFORMACION INTERVENTORIA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C10	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Traslado de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 6-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ÍTEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se INICIA el tramo 9 de capa estabilizada, ubicado en vereda Potrero Grande, así: 200 m lineales entre las asbcisas K14+450 a K14+650 con ancho de 4.20 m con espesor de 0,25 m. Lo que representa un volumen de capa estabilizada de 191,25 m3 Se utilizo cemento al 4% = 223 bultos de cemento y 173 litros de aditivo	SI	SI
		Se realiza el figurado y amarre de acero del encole de la caja de alcantarilla #2		

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Ninguno	

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78363 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
			Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	64	SABADO 27/06/2026	7:00 a. m.	1:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN E-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE. EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES. CAMINOS PARA QUEDARSE. EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		VIBRO COMPACTADOR BITELLI GHBLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TECNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APL 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	No se programo actividad en el frente de obra a razon de iniciar fin de semana con puente festivo en el que algunos operadores han solicitado permiso para ausentarse	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 - 411129 CND	

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		DOMINGO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FÓMEQUE	64	28/06/2026	7:00 a. m.	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		RODILLO COMPACTADOR BITELLI GHBLI C	1	Soltar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAX FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado sostenio
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del activo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DÍAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCÓN CUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DIA DE DESCANSO POR SER DOMINGO	SI	SI
	GL		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se tiene observaciones

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Interventoría			
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	
Contratista de Obra			
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 - 411128 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		LUNES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	84	29/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENGIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DIA CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CANIZARES	SI		RIO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C	1	Solar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMION NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar el personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD EN EL FRENTE DE OBRA DÍA DE DESCANSO POR SER LUNES FESTIVO	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

No se reporta observaciones

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre BYRON LEONARDO AGUIRRE DIAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 25202-78303 CND	

Contratista de Obra

Nombre WILTON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-164502	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 411129 CND	

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	HORA	
		MARTES	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ORIENTE / FOMEQUE	54	30/06/2026	7:00 a. m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2026	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-218 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026	Plazo Inicial	Hasta el 31 agosto de 2026

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES	
NUBLADO					
TORMENTA					
LLUVIOSO	SI				
SOLEADO					

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CARGO	NOMBRE	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INSPECTOR DE OBRA	JHON FABER ROMERO	SI		N/A		
OPERADOR MOTONIVELADORA	OSCAR ANDRES GARCIA	SI		MOTONIVELADORA	1	Escarificar y conformar la capa de afirmado a estabilizar
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	MANUEL ESTEBAN CAÑIZARES	SI		BRO COMPACTADOR BITELLI GHIBLI C	1	Sellar y compactar la capa de afirmado estabilizada
OPERADOR TRACTOR MAS FAE	EDWARD ANDRES CHAVEZ ROBLES	SI		TRACTOR + FAE	1	Homogenizar el afirmado existente
OPERADOR RETROCARGADOR	HENRY GALINDO	SI		RETROCARGADOR JCB	1	Trasiego de cemento y ayuda en escarificado y retiro de sobre tamaños
CONDUCTOR VOLQUETA TANQUE	JESUS BUITRAGO	SI		VOLQUETA	1	Transportar el tanque que almacena el agua para la humectación y aplicación del aditivo químico
CONDUCTOR CAMIÓN NKR	GIOVANNI BARRIGA	SI		CAMIÓN NKR	1	Transportar al personal del frente de obra
CADENERO PRIMERO	FABIAN CAMILO ESCAMILLA	SI		ESTACIÓN TOTAL	1	Replanteos topográficos y levantamientos finales
VIALISTA	FERNEY RAIGOSO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS CASTRO JHON JAIRO	SI	INGRESO 4-08-2026			
AYUDANTE DE OBRA	MARTINEZ CASTRO JHONATAN STIVEN	SI	INGRESO 22-06-2026			
AYUDANTE DE OBRA	ROJAS TERREROS LUIS ALFREDO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	EFREN MARTINEZ DIAZ	SI				
AYUDANTE DE OBRA	CARLOS OSWALDO RINCON GUEVARA	SI				
AYUDANTE DE OBRA	WILMER ALBERTO PULIDO RAIGOZO	SI				
AYUDANTE DE OBRA	NICOLAS DAVID GUTIERREZ MOYA	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

FASE / ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
FASE III (APU 15-CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)	GL	Se realiza alistado de tramo conformando parcialmente la sección de cuneta con excavación mecanica. Esto unicamente en la jornada de la tarde, a razon de iniciar día lluvioso	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre SIMON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat Profesional 25202-78383 CND	
Contratista de Obra			
Nombre WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat Profesional 25202-184302	
DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat Profesional 25202 411129 CND	

Powered by CamScanner

Residente obra | Residente [illegible] | Elaboró

01/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias Moderadas

91 A la espera del inicio de actividades se TBS - Tratamiento

02/06/26 to superficial simple.

Residente obra | Residente Interventoria | Elaboró

Norma

Scanned with CamScanner

03/06/26 Estado del Tiempo: Despejado.
Observaciones: Se realiza Visita tecnica de Directores, Especialistas en pavimentos Tanto del Contratista como de Interventoria, para Evaluar y supervisar el tramo del K0+000 al K17+600 anteriormente Estabilizado, Donde se tomaran decisiones en cuanto al proceso constructivo, antes de la Intalación del TSS (Tratamiento superficia

Residente Obra Residente Interventoria Elaboro

04/06/26 al 09/06/26 Estado del Tiempo: Despejado - lluvias Moderadas.
A la Espera que el contratista inicie con Tratamiento Superficial simple. (TSS).

Residente Obra Residente Interventoria Elabora

Norma

Scanned with CamScanner

10/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: Despejado
OBSERVACIONES: Se realizo recorrido con el contratista para la Intervención y definicción de cunetas en Concreto, Se evidencia que en 2 Tramos se observa afectaciones por la lluvias y por la falta de cuneta exactamente el los PR 8+200 al PR8+500 y el PR7+680 al PR7+750 Vereda Valle de jesus. del municipio de Junín, por tal motivo se le hace el llamado al contratista para realizar las Subsanaciones correspondiente de estos tramos antes de la aplicación del tratamiento Superficial Simple (TSS).

Residente Obra Residente Interventoria Elaboro

11/06/26 al 21/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias Moderadas, No se ejecutan Actividades, a la espera a inicio de TSS.

Residente Obra Residente Interventoria Elaboro

Norma

22/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: Despejado
OBSERVACIONES: Se realiza Toma de Cantidades del tramo K5+000 hacia mayores por parte de la Interventoria.
- Se realiza recorrido con personal del contratista para Verificación de Anchos para construcción de cunetas en concreto del tramo Sueva - Junín.

Residente Obra | Residente Interventoria | Elaboró

23/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: Despejado.
No se ejecutan Actividades.

Residente obra | Residente Interventoria | Elaboró

24/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: Despejado
Se realiza recorrido por parte de Interventoria y se evidencia la llegada de la gravilladora y Vobro-llanta al Frente de obra municipio sueva. para el inicio de T.BS.

Residente Obra | Residente Interventoria | Elaboró

Norma

Scanned with CamScanner

25/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: DESPEJADO.
Se realiza recorrido tanto Interventoria como personal del contratista para definición de Anchos y Tramos donde se van a Construir las cunetas en Concreto en el Tramo Sueva - Junín.
- Se evidencia llegada de Insumos y demas materiales para el inicio de tratamiento superficial Simple.
- Se evidencia llegada de minicargador.

Residente Obra | Residente Interventoria | Elaboro

26/06/26 AL 30/06/26 ESTADO DEL TIEMPO: Despejado con lluvias moderadas, Se esta a la espera de inicio de TSS. y verificación de tramos donde se realizara la actividad y se encuentre en optimas condiciones Tecnicas y Climato, para su respectiva aplicación.

Residente Obra | Residente Interventoria | Elaboro

Norma
Scanned with CamScanner

Consorcio SOFAN C-031	CONSORCIO SOFAN C-031	CÓDIGO: FOR-ADM-14
		VERSIÓN: 01
	FORMATO DE REPORTE DE LLUVIAS	FECHA: 01/04/2025

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ÚBALA	7	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tiempo de Ejecución	11 MESES	Tiempo de Ejecución	11 MESES

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS

ACTIVIDAD	FECHA	HORA DE INICIO LLUVIA	HORA FIN LLUVIA	TIPO DE LLUVIA (X)			TIEMPO DE PRECIPITACIÓN	OBSERVACIONES
				Llovizna	Lluvia	Tormenta		
ESTABILIZACION DE RASANTE	lunes, 1 de junio de 2026	4:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	X			12 Horas	No se ejecuto la actividad
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	lunes, 1 de junio de 2026	4:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.	X			12 Horas	Se ejecuto la actividad
ESTABILIZACION DE RASANTE	martes, 2 de junio de 2026	3:00:00 a. m.	11:00:00 p. m.	X			18 Horas	No se ejecuto la actividad
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	martes, 2 de junio de 2026	3:00:00 a. m.	11:00:00 p. m.	X			18 Horas	Se ejecuto la actividad
ESTABILIZACION DE RASANTE	miércoles, 3 de junio de 2026	12:00:00 a. m.	2:30:00 p. m.		X		10 Horas	No se ejecuto la actividad
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	miércoles, 3 de junio de 2026	12:00:00 a. m.	2:30:00 p. m.		X		10 Horas	Se ejecuto la actividad
ESTABILIZACION DE RASANTE	jueves, 4 de junio de 2026	8:00:00 a. m.	6:00:00 p. m.	X			10 Horas	No se ejecuto la actividad
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	jueves, 4 de junio de 2026	8:00:00 a. m.	6:00:00 p. m.	X			10 Horas	Se ejecuto la actividad
ESTABILIZACION DE RASANTE	viernes, 5 de junio de 2026	5:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.			X	11 Horas	No se ejecuto la actividad
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	viernes, 5 de junio de 2026	5:00:00 a. m.	4:00:00 p. m.			X	11 Horas	Se ejecuto la actividad

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES GENERALES

Durante el periodo comprendido entre el 01/06/2026 y el 05/06/2026 se registraron precipitaciones de intensidad y duración variable que afectaron el normal desarrollo de las actividades programadas en el frente de obra. Las lluvias ocasionaron la saturación de la subrasante, incremento en el contenido de humedad de los materiales y condiciones desfavorables para la operación de maquinaria y la ejecución segura de los trabajos. Como consecuencia de estas condiciones climáticas, las actividades de estabilización de rasante no pudieron ejecutarse durante los días 01, 02, 03, 04 y 05 de junio de 2026, debido a que no era posible garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas con la conformación, estabilización y compactación de los materiales, lo que habría comprometido la calidad de la estructura del pavimento. En reemplazo a esta actividad el personal en campo realizo la limpieza de cunetas naturales, alcantarillas existentes y tramos con material de barro o greda.
Respecto a la construcción de alcantarillas, las actividades programadas se ejecutaron de manera parcial o intermitente, debido a la presencia de lluvias prolongadas y a la saturación del terreno, condiciones que impedían realizar excavaciones y demás labores de manera segura y técnicamente adecuada. No obstante, para los días con las ventanas de tiempo dispejadas las condiciones del frente de trabajo permitieron ejecutar las actividades de construcción de alcantarillas; con actividades como excavaciones e instalacion de tubos.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS MIGUEL AGUDELO BARBOSA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ANDERSON LEONARDO SIERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional: CND	

Consorcio SOFAN C-031	CONSORCIO SOFAN C-031	CÓDIGO: FOR-ADM-14
		VERSIÓN: 01
	FORMATO DE REPORTE DE LLUVIAS	FECHA: 01/04/2025

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ÚBALA	14	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tiempo de Ejecución	11 MESES	Tiempo de Ejecución	11 MESES

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS

ACTIVIDAD	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN	TIPO DE LLUVIA (X)			TIEMPO DE PRECIPITACIÓN	OBSERVACIONES
				Llovizna	Lluvia	Tormenta		
ESTABILIZACION DE RASANTE	12/06/2026	12:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	X			12 horas	No se realizó la estabilizacion de rasante previo por exceso de humedad en la rasante

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES GENERALES

El 12/06/2026 se presentaron precipitaciones que ocasionaron un exceso de humedad y la saturación de la rasante, impidiendo alcanzar las condiciones técnicas requeridas para la ejecución de la actividad de estabilización. En consecuencia, no fue posible realizar la conformación, incorporación del agente estabilizante y la compactación de los materiales, ya que su ejecución bajo dichas condiciones habría comprometido el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de la obra y el desempeño esperado de la estructura del pavimento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS MIGUEL AGUDELO BARBOSA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ANDERSON LEONARDO SIERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional: CND	

Consorcio SOFAN C-031	CONSORCIO SOFAN C-031	CÓDIGO: FOR-ADM-14
		VERSIÓN: 01
	FORMATO DE REPORTE DE LLUVIAS	FECHA: 01/04/2025

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ÚBALA	28	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tiempo de Ejecución	11 MESES	Tiempo de Ejecución	11 MESES

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS

ACTIVIDAD	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN	TIPO DE LLUVIA (X)			TIEMPO DE PRECIPITACIÓN	OBSERVACIONES
				Llovizna	Lluvia	Tormenta		
ESTABILIZACION DE RASANTE	22/06/2026	8:00:00 a. m.	2:00:00 a. m.		X		6 horas	No se realizó la estabilizacion de rasante por lluvias y humedad en rasante
ESTABILIZACION DE RASANTE	25/06/2026	8:00:00 a. m.	2:00:00 a. m.			x	6 horas	No se realizó la estabilizacion de rasante por lluvias y humedad en rasante

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES GENERALES

El 22 y 25 de junio se presentaron precipitaciones que ocasionaron un exceso de humedad y la saturación de la rasante, impidiendo alcanzar las condiciones técnicas requeridas para la ejecución de la actividad de estabilización. En consecuencia, no fue posible realizar la conformación, incorporación del agente estabilizante y la compactación de los materiales, ya que su ejecución bajo dichas condiciones habría comprometido el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de la obra y el desempeño esperado de la estructura del pavimento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS MIGUEL AGUDELO BARBOSA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ANDERSON LEONARDO SIERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional: CND	

Consorcio SOFAN C-031	CONSORCIO SOFAN C-031	CÓDIGO: FOR-ADM-14
		VERSIÓN: 01
	FORMATO DE REPORTE DE LLUVIAS	FECHA: 01/04/2025

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
CUNDINAMARCA / ÚBALA	30	6	2026	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tiempo de Ejecución	11 MESES	Tiempo de Ejecución	11 MESES

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS

ACTIVIDAD	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FIN	TIPO DE LLUVIA (X)			TIEMPO DE PRECIPITACIÓN	OBSERVACIONES
				Llovizna	Lluvia	Tormenta		
ESTABILIZACION DE RASANTE	29/05/2026	4:30:00 a. m.	6:00:00 p. m.		X		13.5 HORAS	No se ejecutó la actividad
ESTABILIZACION DE RASANTE	30/05/2026	12:00:00 a. m.	10:00:00 p. m.		X		22 HORAS	No se ejecutó la actividad

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES GENERALES

El 29 y 30 de junio se presentaron precipitaciones que ocasionaron un exceso de humedad y la saturación de la rasante, impidiendo alcanzar las condiciones técnicas requeridas para la ejecución de la actividad de estabilización. En consecuencia, no fue posible realizar la conformación, incorporación del agente estabilizante y la compactación de los materiales, ya que su ejecución bajo dichas condiciones habría comprometido el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de la obra y el desempeño esperado de la estructura del pavimento.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: LUIS MIGUEL AGUDELO BARBOSA	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre: ANDERSON LEONARDO SIERRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional: CND	

Consorcio SOFAN C-031	CONSORCIO SOFAN C-031	CÓDIGO: FOR-ADM-16
		VERSIÓN: 01
	REPORTE DE LLUVIAS	FECHA: 01/05/2025

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	
		INICIO	FIN
CUNDINAMARCA / CHOACHÍ	60 y 61	30/05/2026	12/06/2026

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS


INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Tiempo de Ejecución	Hasta el 31 diciembre 2025	Tiempo de Ejecución	Hasta el 31 diciembre 2025

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS

FECHA	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	TIPO DE LLUVIA (X)			DURACIÓN (hh:mm)	OBSERVACIONES
				Llovizna	Lluvia	Tormenta		
sábado, 30 de mayo de 2026	Instalación de TSS	9:00:00 a. m.	11:30:00 a. m.	SI				Se presentaron lloviznas en diferentes horas a lo largo del estos días, sumado a días nublados que acarrearon que el porcentaje de humedad se mantenga alto por mas horas.
miércoles, 3 de junio de 2026	Instalación de TSS	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	SI				
jueves, 4 de junio de 2026	Instalación de TSS	10:00:00 a. m.	13:00:00 a. m.	SI				
viernes, 5 de junio de 2026	Instalación de TSS	1:00:00 p. m.	3:00:00 p. m.	SI				
sábado, 6 de junio de 2026	Instalación de TSS	7:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.	SI				
lunes, 8 de junio de 2026	Instalación de TSS	10:00:00 a. m.	3:00:00 p. m.	SI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



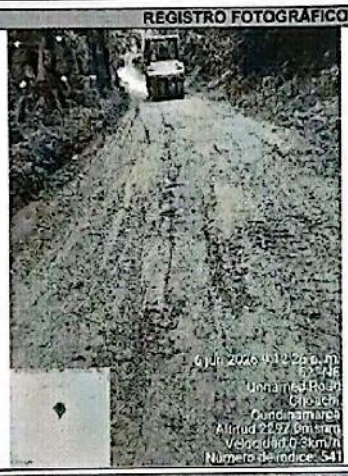



IMPACTO TÉCNICO DE LA LLUVIA EN ACTIVIDADES DE CAMPO

Durante los días programados para la instalación del Tratamiento Superficial Simple (TSS), las lloviznas y precipitaciones continuas representan un factor crítico que limita la ejecución de la actividad. La presencia de humedad sobre la capa estabilizada impide que la emulsión asfáltica se adhiera correctamente al material de base, y evita que la grava se compacte de manera uniforme sobre la superficie, comprometiendo la uniformidad y durabilidad del TSS

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-78393 CND	

Contratista de Obra

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRAS	N° Mat. Profesional: 25202-194302 CND	
Nombre: DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-411129 CND	

Powered by CamScanner

Consorcio SOFAN C-031	CONSORCIO SOFAN C-031	CÓDIGO FOR-ADM-16
		VERSIÓN 01
	REPORTE DE LLUVIAS	FECHA 01/05/2025

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / CIUDAD	SEMANA	FECHA	
		INICIO	FIN
CUNDINAMARCA / FÓMEQUE	SEMANAS 60, 61, 62, 63 y 64 MES DE JUNIO	26/05/2026	30/06/2026

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Contrato Obra N°	ICCU-CTO-138 DE 2025	Contrato Interventoría N°	ICCU-CTO-219 DE 2025
Objeto Proyecto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Objeto Proyecto Interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tiempo de Ejecución	Hasta el 31 diciembre 2025	Tiempo de Ejecución	Hasta el 31 diciembre 2025

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS

FECHA	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	TIPO DE LLUVIA (X)			DURACIÓN (hh:mm)	OBSERVACIONES
				Llovizna	Lluvia	Tormenta		
viernes, 29 de mayo de 2026	Estabilización de capa de afirmado	8:00:00 a. m.	11:30:00 a. m.		SI			Durante estos días se presentaron lloviznas intermitentes en diferentes horarios, sumadas a jornadas mayormente nubladas, lo que provocó que la humedad en la capa de afirmado permaneciera elevada por periodos prolongados, afectando la posibilidad de iniciar y desarrollar oportunamente las actividades programadas de estabilización de capa de afirmado existe.
sábado, 30 de mayo de 2026	Estabilización de capa de afirmado	7:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.		SI			
miércoles, 3 de junio de 2026	Estabilización de capa de afirmado	2:00:00 P. M.	4:00:00 P.M.	SI				
viernes, 5 de junio de 2026	Estabilización de capa de afirmado	7:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.	SI				
sábado, 6 de junio de 2026	Estabilización de capa de afirmado	8:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.	SI				
miércoles, 17 de junio de 2026	Estabilización de capa de afirmado	10:00:00 a. m.	2:00:00 P.M.	SI				
martes, 30 de junio de 2026	Estabilización de capa de afirmado	8:00:00 a. m.	10:30:00 A. M.	SI				

REGISTRO FOTOGRÁFICO



IMPACTO TÉCNICO DE LA LLUVIA EN ACTIVIDADES DE CAMPO

Cuando durante la noche se presentan lluvias, la capa de afirmado existente objeto de ser estabilizada, retiene un alto porcentaje de humedad al inicio de la jornada laboral, lo que afecta directamente la ejecución de las actividades programadas. Esta humedad acumulada impide realizar el escanado, nivelación y compactación efectiva del material, reduciendo el rendimiento diario de estabilización y, en algunos casos, obligando a postergar el inicio de la jornada hasta que la superficie alcance condiciones adecuadas de humedad. Como resultado, se generan demoras en la programación de obra, disminuyendo las horas efectivas de trabajo y afectando la continuidad operativa de los frentes de intervención.

FIRMAS

Interventoría

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: BYRON LEONARDO AGUIRRE DÍAZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-75393 CND	

Contratista de Obra

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO	DIRECTOR DE OBRAS	N° Mat. Profesional: 25202-194302 CND	
Nombre: DARWIN GONZALO MORENO ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-411129 CND	

Powered by CamScanner

ILAB-No.248-2026

Bogotá D.C., junio del 2026

CONSORCIO SOFAN
Bogotá D.C., - Colombia

REFERENCIA: RESULTADO ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: CHIPAQUE

Cordial Saludo.

Tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes con el fin de remitirles los resultados de los ensayos de DEFLECTOMETRIA DE IMPACTO LIVIANO - LWD del informe ILAB-248-2026.

Procedimientos solicitados para el proyecto de la referencia.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud, cambio o modificación que surja en el análisis de este mismo.

Cordialmente,



Director Técnico

TECNISUELOS
Pavimentos & Concretos SAS
Laboratorio de Ingeniería Civil
N.I.: 901.028.209-2

HOJA DE CALCULO : MÉTODO PARA MEDIR DEFLEXIONES MEDIANTE UN DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD) EN SUELOS

Código:	**TS-FT-029-01**
Fecha de Edición:	2019-01-15
Versión :	2
Copia Controlada:	SI / NO

CLIENTE : SOFAN
PROYECTO : CHIPAQUE
DIRECCIÓN: BOGOTA D,C

FECHA DE TOMA: 28/05/2026
FECHA DE INGRESO 29/05/2026
FECHA DE ENSAYO: 28/05/2026
CLASE DE MATERIAL: EXISTENTE

NORMA DE ENSAYO: INVIAS E 826 – 22

Numero de Orden de Servicios: **OSL-2425-2026**

Numero de Informe de Resultados: **ILAB-248-2026**

Punto	Ensayo N°	Radio (mm)	Carga (kN)	S1 (mm)	Presion de Contacto (kPa)	Evd1 (Mpa)	CBR1 %	MR1 (Mpa)	Relacion módulo de conjunto (Econj)
KM 0+250 EJE	1	150	14,51	0,192	821,3	1053,6	48	209	36,4
	2		14,52	0,194	821,8	1043,4	47	208	36,2
	3		14,57	0,194	824,2	1046,5	48	209	36,2
KM 0+450 DERECHO	1	150	14,79	0,202	837,0	1020,6	47	207	35,8
	2		14,83	0,203	839,3	1018,4	47	207	35,7
	3		14,81	0,202	838,2	1022,1	47	207	35,8
KM 0+650 IZQUIERDO	1	150	15,10	0,157	854,5	1340,6	54	225	41,2
	2		15,09	0,157	854,1	1340,0	54	225	41,2
	3		15,11	0,158	855,2	1333,2	53	225	41,1
KM 0+ 850 DERECHO	1	150	14,78	0,416	836,1	495,1	33	165	24,6
	2		14,78	0,416	836,4	495,2	33	165	24,6
	3		14,76	0,416	835,1	494,5	33	165	24,6
KM 1 +050 EJE	1	150	14,64	0,512	828,1	398,4	30	155	22,0
	2		14,65	0,509	829,2	401,3	30	155	22,1
	3		14,62	0,511	827,4	398,8	30	155	22,0
km 1 +200 IZQUIERDO	1	150	14,72	0,211	832,8	972,2	46	204	34,9
	2		14,80	0,211	837,2	977,3	46	204	35,0
	3		14,77	0,211	835,9	975,8	46	204	35,0
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	1	150	14,85	0,378	840,5	547,7	35	171	25,9
	2		14,87	0,380	841,5	545,5	35	170	25,9
	3		14,88	0,380	842,1	545,9	35	170	25,9
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	1	150	14,66	0,420	829,4	486,4	33	164	24,4
	2		14,76	0,423	835,0	486,2	33	164	24,4
	3		14,75	0,420	834,7	489,5	33	165	24,5
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	1	150	15,05	0,239	851,7	877,8	44	197	33,1
	2		15,08	0,240	853,4	875,9	44	197	33,1
	3		15,07	0,239	852,8	878,9	44	198	33,1
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	1	150	14,81	0,349	838,1	591,5	36	175	27,0
	2		14,79	0,350	837,1	589,1	36	174	26,9
	3		14,81	0,348	837,9	593,1	36	175	27,0

TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS Laboratorio de Ingeniería Civil Nit. 901.028.209-2	HOJA DE CALCULO : MÉTODO PARA MEDIR DEFLEXIONES MEDIANTE UN DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD) EN SUELOS	Código:	TS-FT-029-01	
		Fecha de Edición:	2019-01-15	
		Versión :	2	
		Copia Controlada:	SI	NO


CLIENTE : SOFAN
PROYECTO : CHIPAQUE
DIRECCIÓN: BOGOTA D,C
FECHA DE TOMA: 28/05/2026
FECHA DE INGRESO 29/05/2026
FECHA DE ENSAYO: 28/05/2026
CLASE DE MATERIAL: EXISTENTE

NORMA DE ENSAYO INVIAS E 826 – 22

Numero de Orden de Servicios: **OSL-2425-2026**

Numero de Informe de Resultados: **ILAB-248-2026**

Punto	Ensayo N°	Radio (mm)	Carga (kN)	S1 (mm)	Presion de Contacto (kPa)	Evd1 (Mpa)	CBR1 %	MR1 (Mpa)
KM 0+250 EJE	1	150	14,5	0,192	821,3	1053,6	48	209
	2		14,5	0,194	821,8	1043,4	47	208
	3		14,6	0,194	824,2	1046,5	48	209
	PROMEDIO		14,5	0,193	822,4	1047,8	48	209
	CARACTERITICO 85%		14,6	0,194	824,7	1047,1	48	209
	Percentil 85		14,6	0,194	823,5	1051,5	48	209
KM 0+450 DERECHO	1	150	14,8	0,202	837,0	1020,6	47	207
	2		14,8	0,203	839,3	1018,4	47	207
	3		14,8	0,202	838,2	1022,1	47	207
	PROMEDIO		14,8	0,202	838,2	1020,4	47	207
	CARACTERITICO 85%		14,8	0,203	839,5	1022,9	47	207
	Percentil 85		14,8	0,203	839,0	1021,7	47	207
KM 0+650 IZQUIERDO	1	150	15,1	0,157	854,5	1340,6	54	225
	2		15,1	0,157	854,1	1340,0	54	225
	3		15,1	0,158	855,2	1333,2	53	225
	PROMEDIO		15,1	0,157	854,6	1338,0	54	225
	CARACTERITICO 85%		15,1	0,158	855,4	1341,4	54	225
	Percentil 85		15,1	0,158	855,0	1340,4	54	225
KM 0+ 850 DERECHO	1	150	14,8	0,416	836,1	495,1	33	165
	2		14,8	0,416	836,4	495,2	33	165
	3		14,8	0,416	835,1	494,5	33	165
	PROMEDIO		14,8	0,416	835,9	494,9	33	165
	CARACTERITICO 85%		14,8	0,416	836,7	495,4	33	165
	Percentil 85		14,8	0,416	836,3	495,2	33	165
KM 1 +050 EJE	1	150	14,6	0,512	828,1	398,4	30	155
	2		14,7	0,509	829,2	401,3	30	155
	3		14,6	0,511	827,4	398,8	30	155
	PROMEDIO		14,6	0,511	828,2	399,5	30	155
	CARACTERITICO 85%		14,7	0,511	829,6	401,8	30	155
	Percentil 85		14,6	0,512	828,9	400,5	30	155
km 1 +200 IZQUIERDO	1	150	14,7	0,211	832,8	972,2	46	204
	2		14,8	0,211	837,2	977,3	46	204
	3		14,8	0,211	835,9	975,8	46	204
	PROMEDIO		14,8	0,211	835,3	975,1	46	204
	CARACTERITICO 85%		14,8	0,211	837,5	977,6	46	204
	Percentil 85		14,8	0,211	836,8	976,9	46	204
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	1	150	14,9	0,378	840,5	547,7	105	347
	2		14,9	0,380	841,5	545,5	105	346
	3		14,9	0,380	842,1	545,9	105	346
	PROMEDIO		14,9	0,379	841,4	546,3	105	347
	CARACTERITICO 85%		14,9	0,380	842,2	545,9	105	346
	Percentil 85		14,9	0,380	841,9	547,1	105	347
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	1	150	14,7	0,420	829,4	486,4	33	164
	2		14,8	0,423	835,0	486,2	33	164
	3		14,8	0,420	834,7	489,5	33	165
	PROMEDIO		14,7	0,421	833,0	487,4	33	165
	CARACTERITICO 85%		14,8	0,424	835,1	490,2	33	165
	Percentil 85		14,8	0,422	834,9	488,6	33	165
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	1	150	15,1	0,239	851,7	877,8	44	197
	2		15,1	0,240	853,4	875,9	44	197
	3		15,1	0,239	852,8	878,9	44	198
	PROMEDIO		15,1	0,239	852,6	877,5	44	197
	CARACTERITICO 85%		15,1	0,240	853,5	879,5	44	198
	Percentil 85		15,1	0,240	853,2	878,6	44	198
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	1	150	14,8	0,349	838,1	591,5	36	175
	2		14,8	0,350	837,1	589,1	36	174
	3		14,8	0,348	837,9	593,1	36	175
	PROMEDIO		14,8	0,349	837,7	591,2	36	175
	CARACTERITICO 85%		14,8	0,350	838,1	593,9	36	175
	Percentil 85		14,8	0,350	838,0	592,6	36	175

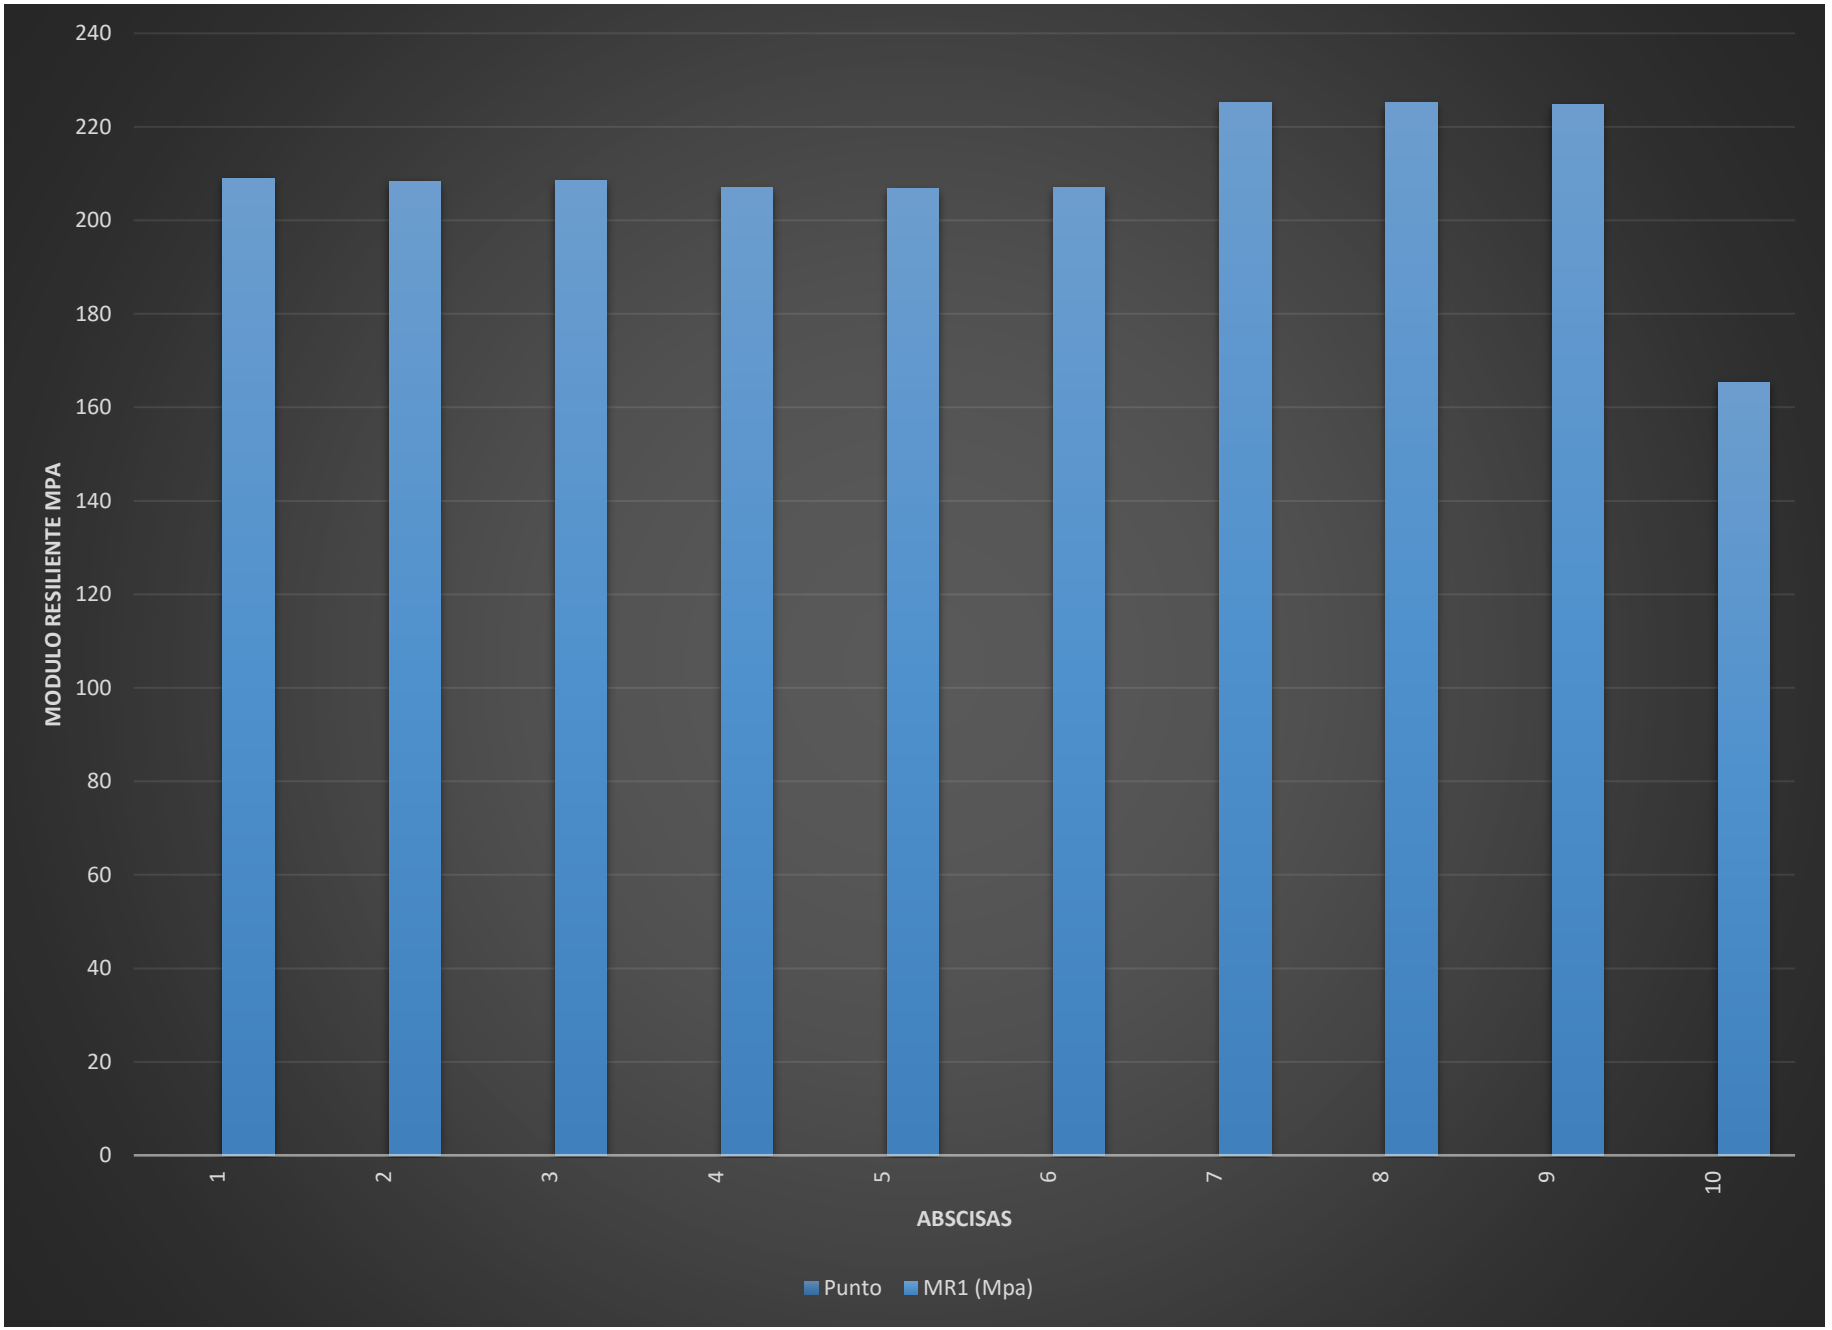
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
MODULO RESILIENTE MPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ABSCISAS
Punto
MR1 (Mpa)

TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 14.0
Point	Weather:
KM 0+250 EJE	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:30:01	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 602830 N 489634

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
13.881	785.5	24.3

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.199	442.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

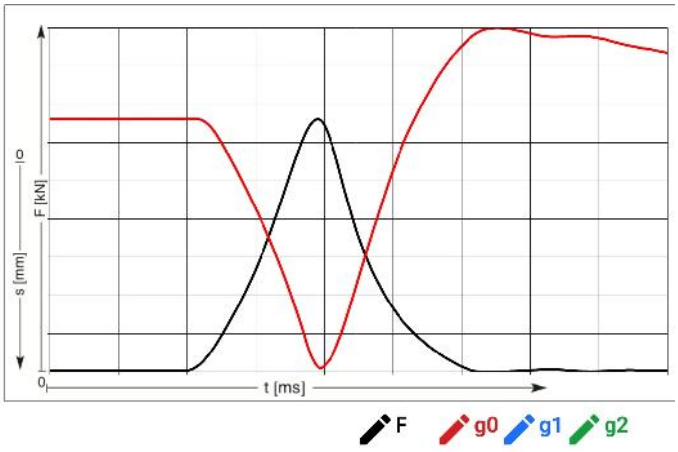



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 14.0
Point	Weather:
KM 0+250 EJE	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:31:06	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 602830 N 489634

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.310	809.8	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.192	474.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

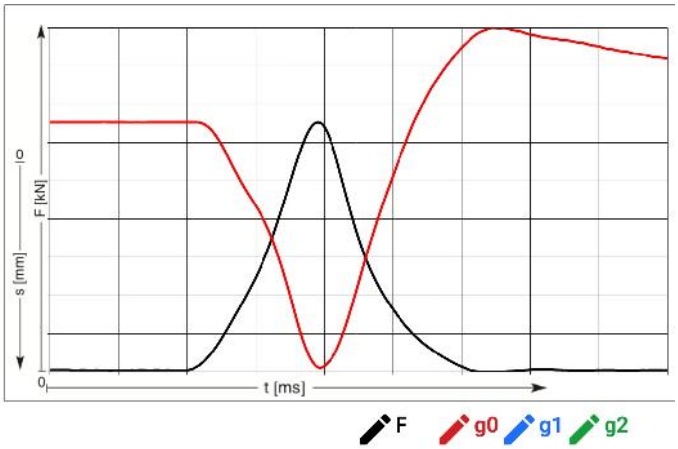



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+250 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:31:14	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602830 N 489634	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.443	817.3	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.191	479.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

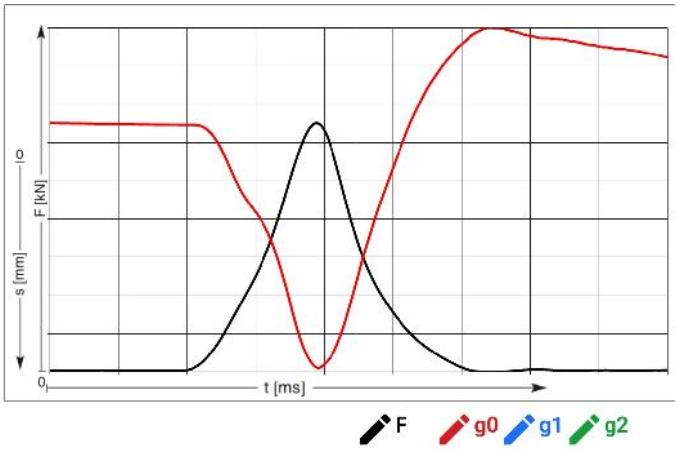



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+250 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:31:21	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602830 N 489634	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.476	819.1	24.1

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.190	483.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

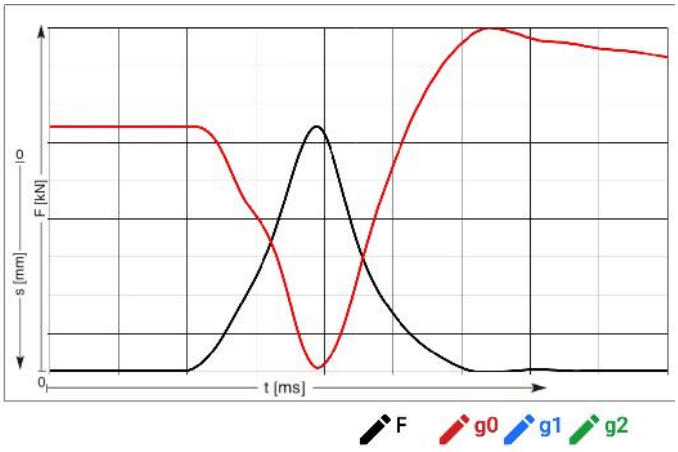



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+250 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:31:29	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602830 N 489634	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.506	820.9	24.1

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.190	485.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

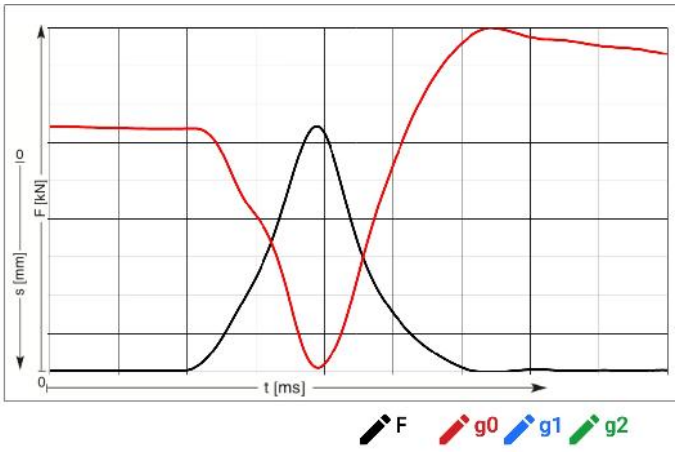



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+250 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:31:44	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602830 N 489634	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.514	821.3	24.1

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.192	480.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

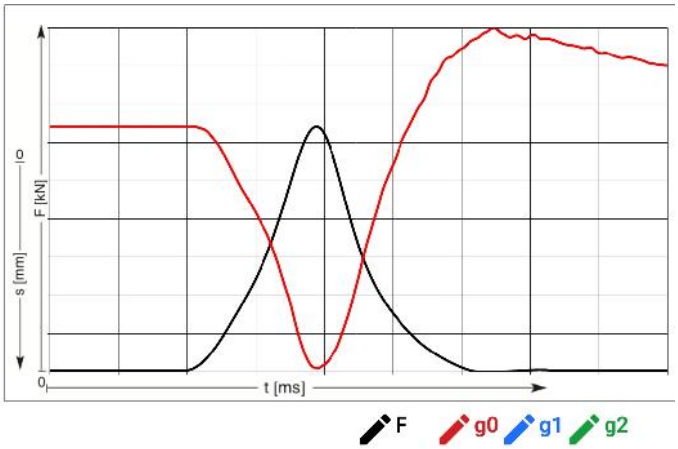



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 14.0
Point	Weather:
KM 0+250 EJE	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:32:24	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 602830 N 489634

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.522	821.8	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.194	475.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

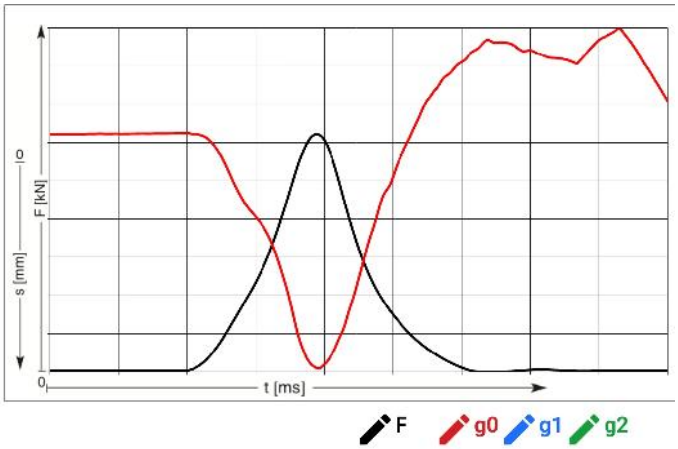



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+250 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:32:31	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602830 N 489634	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.565	824.2	24.1

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.194	475.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

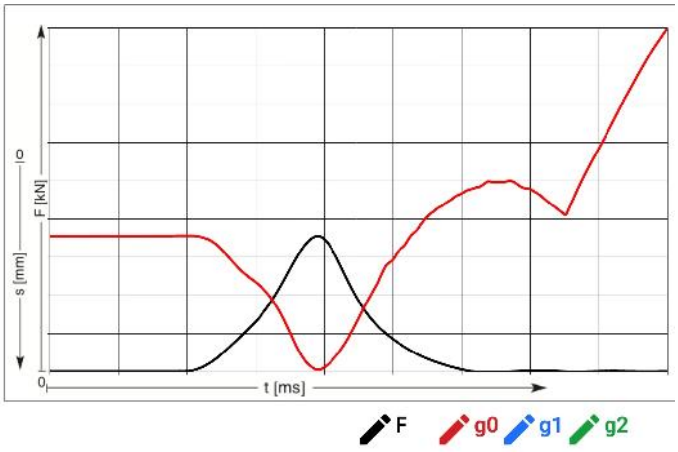



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 14.0
Point	Weather:
KM 0+450 DERECHO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:44:46	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 602839 N 489615

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.628	827.8	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.192	484.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

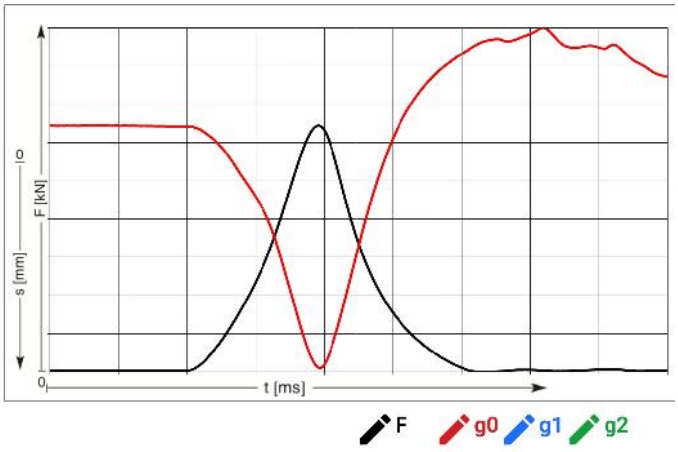



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+450 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:44:54	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602839 N 489615	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.745	834.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.201	467.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

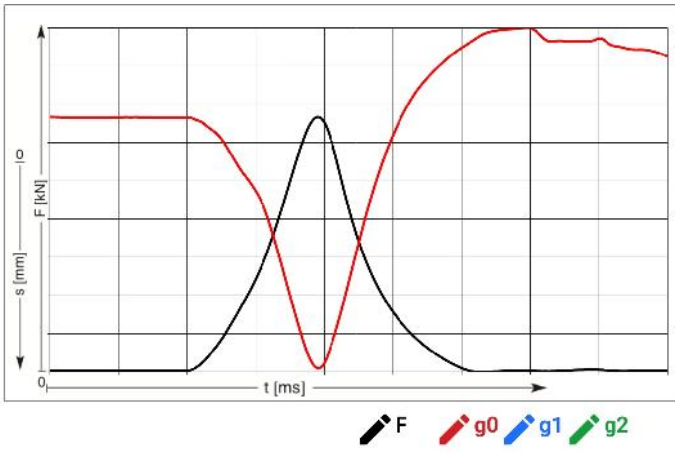



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 14.0
Point	Weather:
KM 0+450 DERECHO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:45:02	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 602839 N 489615

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.754	834.9	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.198	472.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

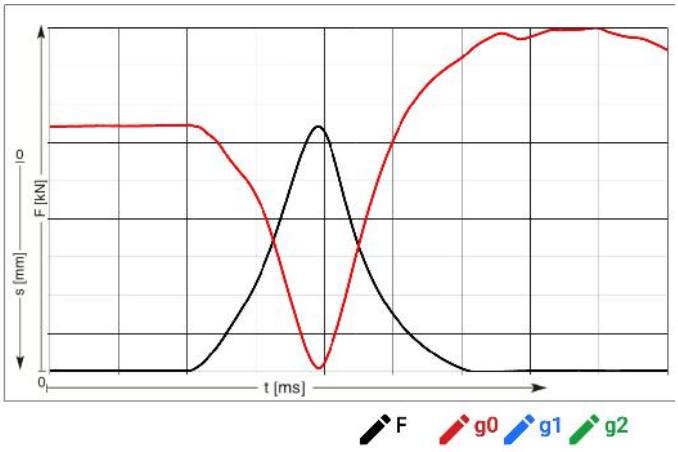



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+450 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:45:09	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602839 N 489615	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.811	838.1	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.200	469.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

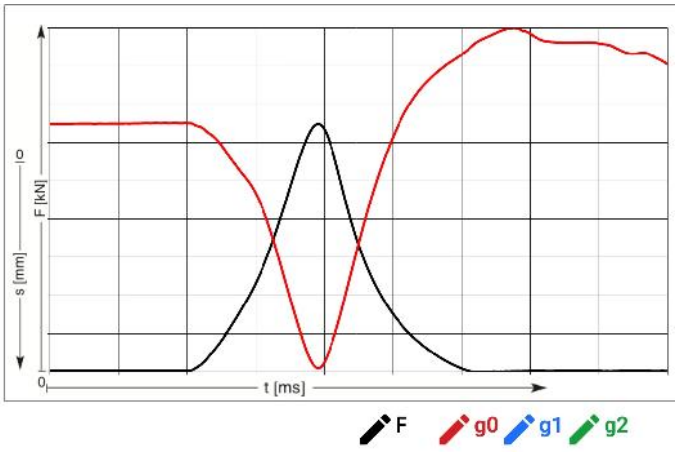



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+450 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:45:15	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602839 N 489615	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.801	837.6	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.201	466.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

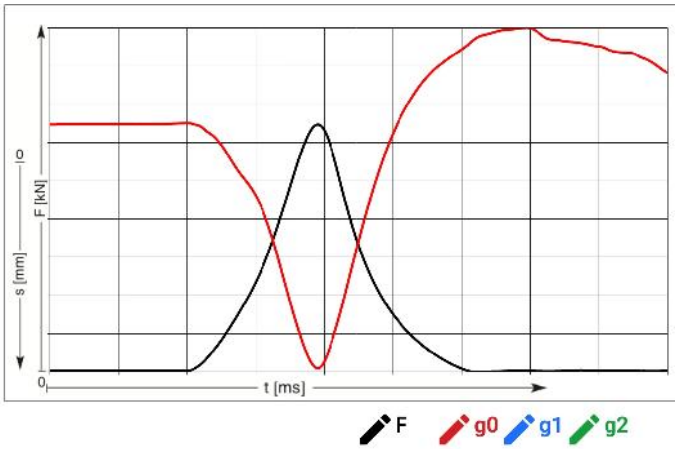



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+450 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:45:23	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602839 N 489615	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.792	837.0	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.202	465.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

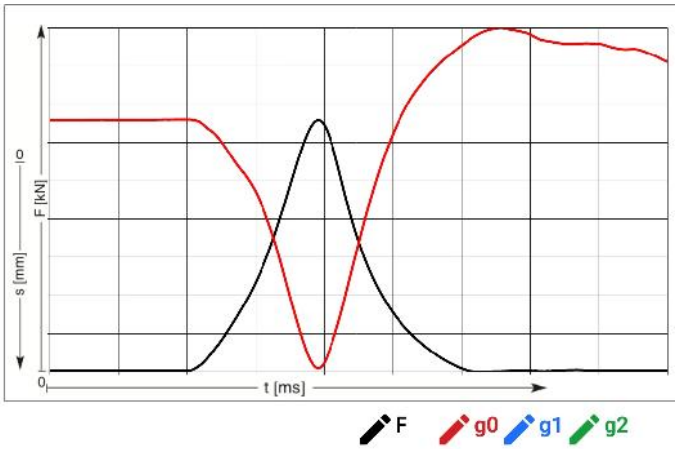



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+450 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:45:30	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W	
UTM	
E 18 602839 N 489615	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.832	839.3	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.203	464.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

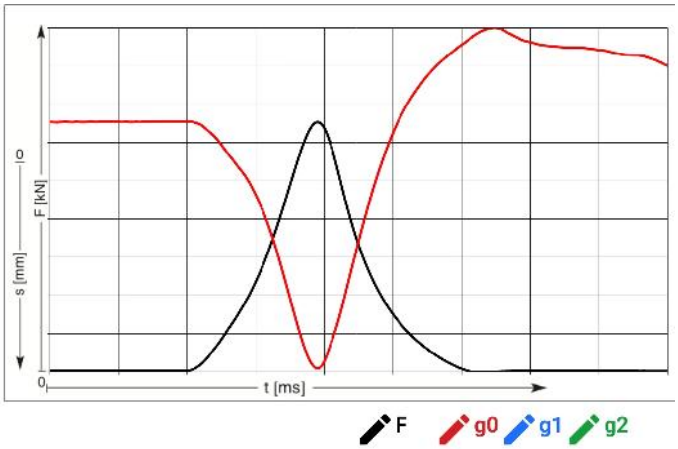



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 14.0
Point	Weather:
KM 0+450 DERECHO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:45:44	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 4.23 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 602839 N 489615

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.812	838.2	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.202	465.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

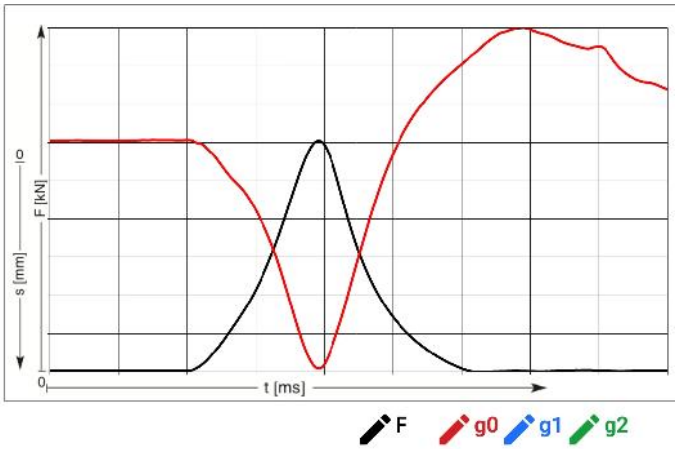



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+650 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:50:26	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 16.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W	
UTM	
E 18 603065 N 489307	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.726	833.3	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.155	602.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

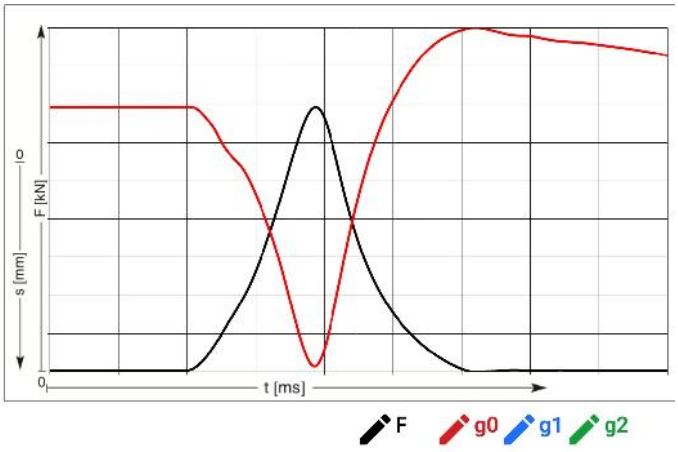



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+650 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:50:34	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 16.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W	
UTM	
E 18 603065 N 489307	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.023	850.1	23.5

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.157	606.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

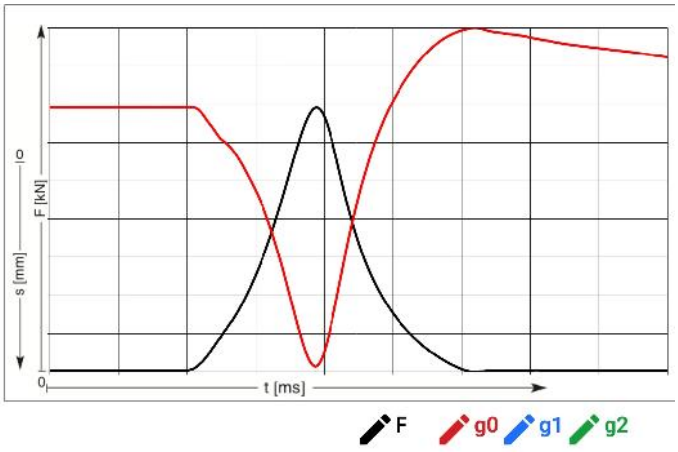



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 16.0
Point	Weather:
KM 0+650 IZQUIERDO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:50:41	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603065 N 489307

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.088	853.8	23.5

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.157	608.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

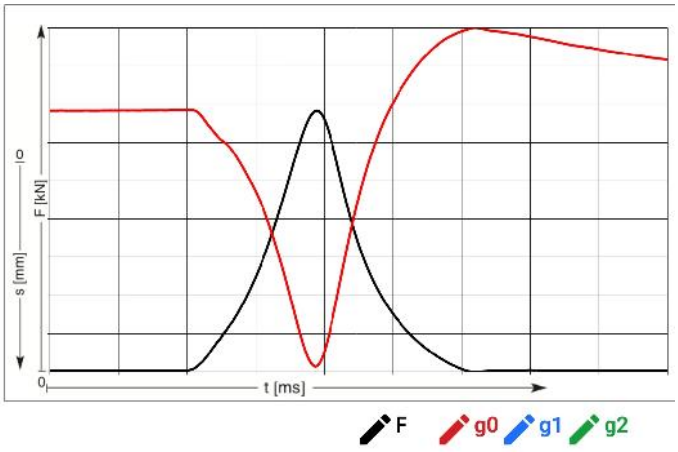



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 16.0
Point	Weather:
KM 0+650 IZQUIERDO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:50:48	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603065 N 489307

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.048	851.5	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.157	609.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

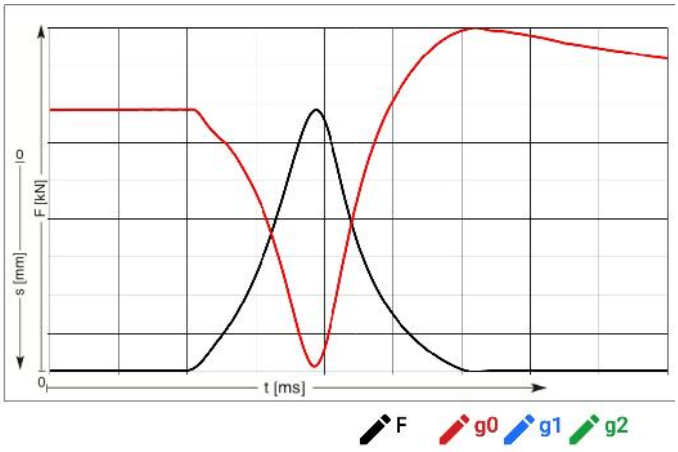



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.2 / 16.0
Point	Weather:
KM 0+650 IZQUIERDO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:50:56	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603065 N 489307

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.083	853.5	23.5

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.157	610.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

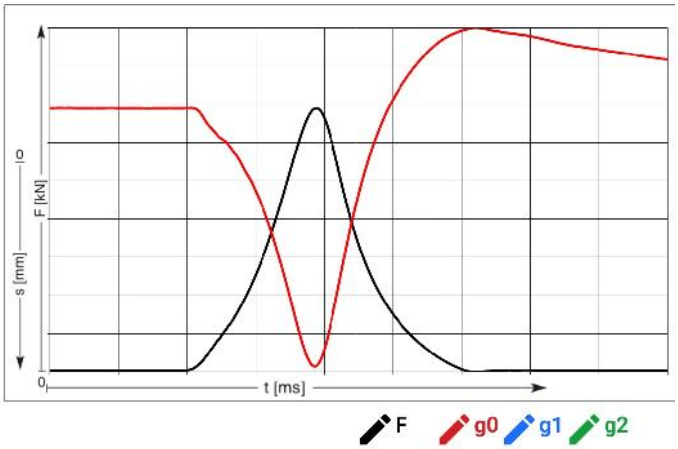



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+650 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:51:04	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 16.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W	
UTM	
E 18 603065 N 489307	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.100	854.5	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.157	611.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

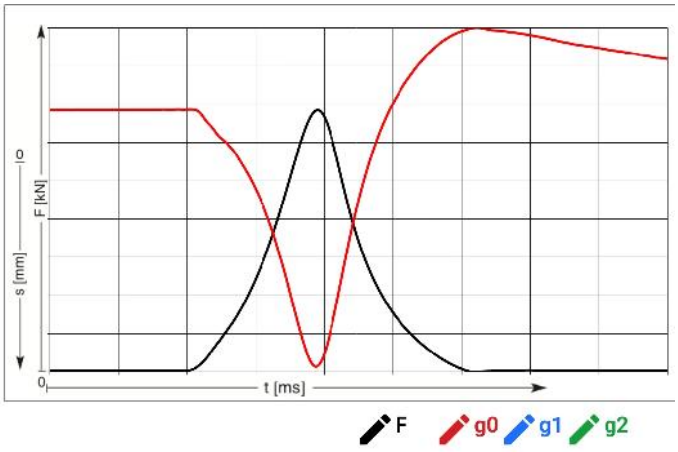



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+650 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:51:31	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 16.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W	
UTM	
E 18 603065 N 489307	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.093	854.1	23.5

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.157	610.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

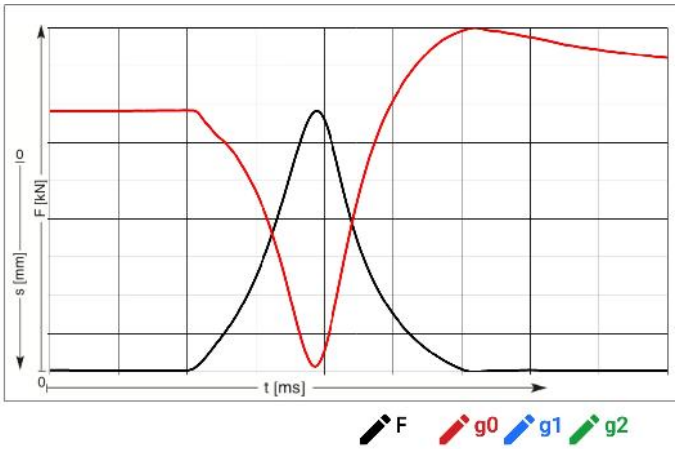



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+650 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:51:39	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.2 / 16.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.34 'N, 74º 4.16 'W	
UTM	
E 18 603065 N 489307	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.113	855.2	23.5

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.158	606.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

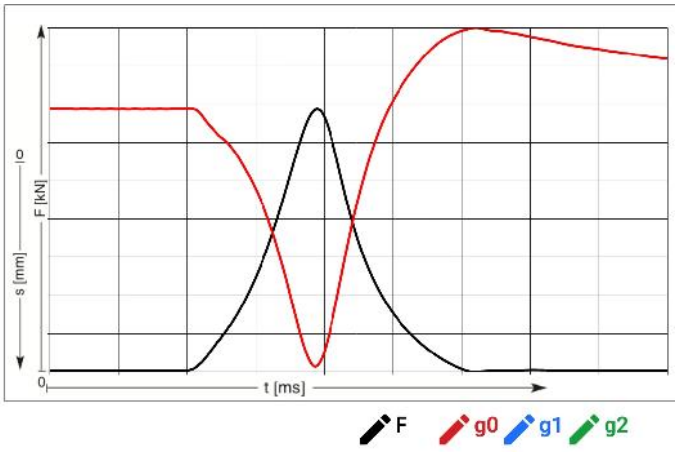



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.6 / 15.0
Point	Weather:
KM 0+ 850 DERECHO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:56:02	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603247 N 489258

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.649	828.9	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.414	224.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

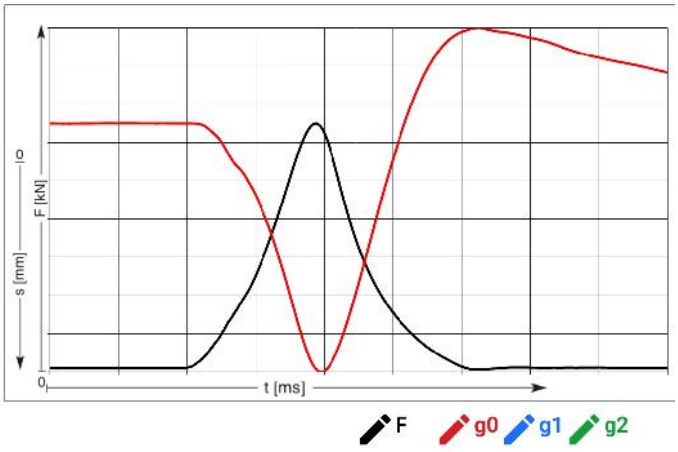



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+ 850 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:56:16	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.6 / 15.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W	
UTM	
E 18 603247 N 489258	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.660	829.6	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.414	225.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

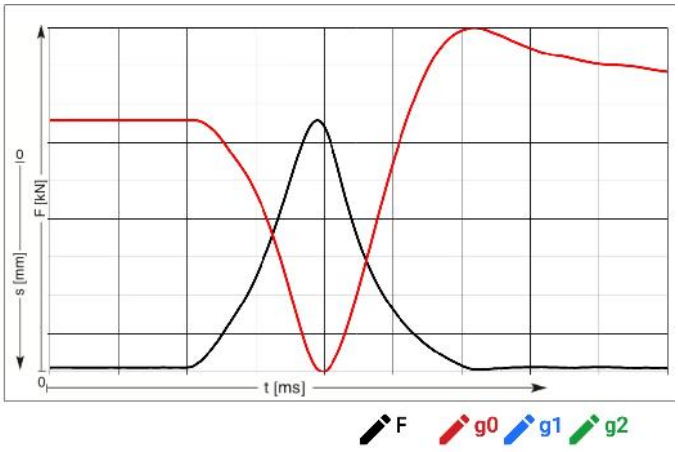



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+ 850 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:56:23	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.6 / 15.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W	
UTM	
E 18 603247 N 489258	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.744	834.3	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.408	229.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

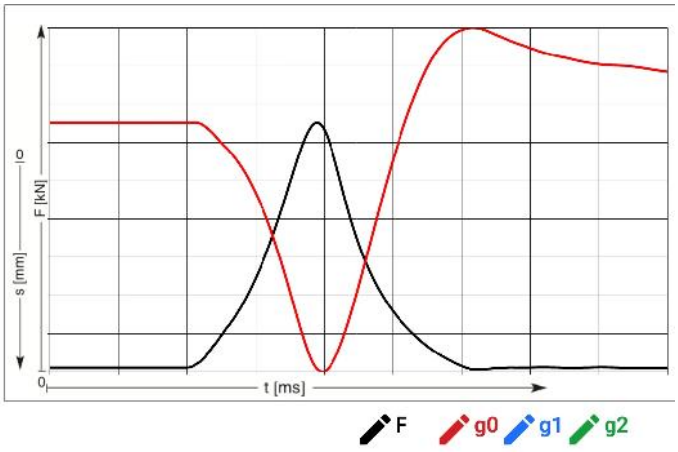



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+ 850 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:56:31	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.6 / 15.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W	
UTM	
E 18 603247 N 489258	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.722	833.0	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.416	225.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

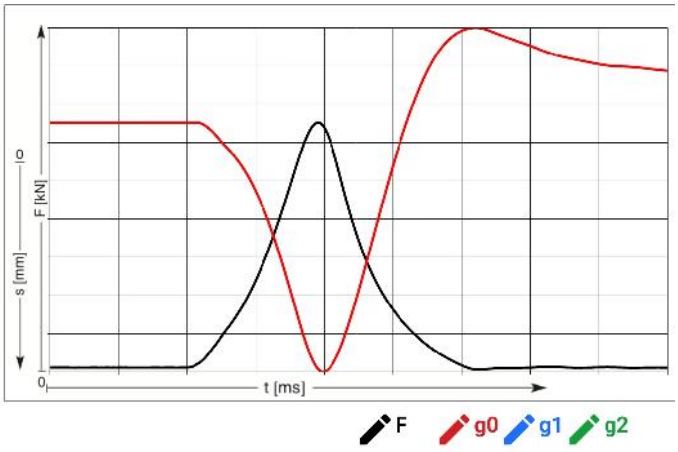



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.6 / 15.0
Point	Weather:
KM 0+ 850 DERECHO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:56:39	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603247 N 489258

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.764	835.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.415	226.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

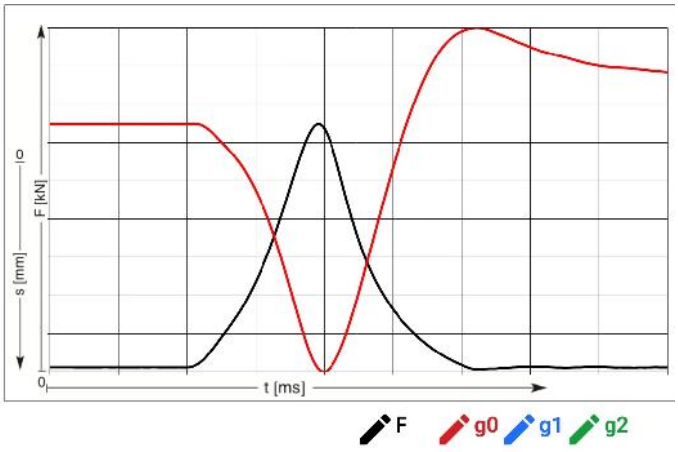



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 0+ 850 DERECHO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 12:56:45	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
17.6 / 15.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W	
UTM	
E 18 603247 N 489258	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.776	836.1	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.416	225.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

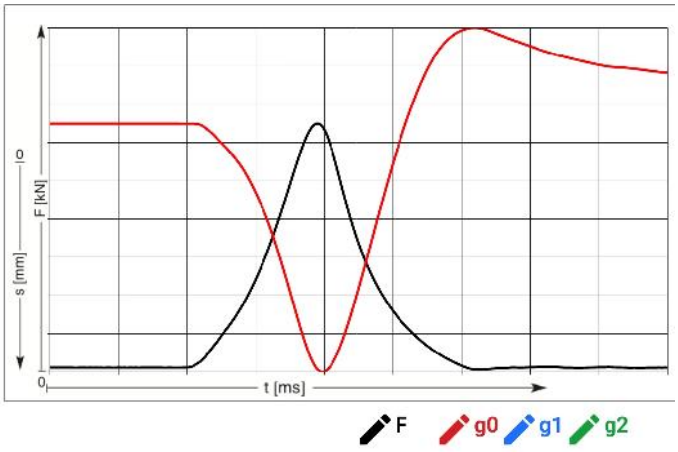



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.6 / 15.0
Point	Weather:
KM 0+ 850 DERECHO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:56:52	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603247 N 489258

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.781	836.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.416	226.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

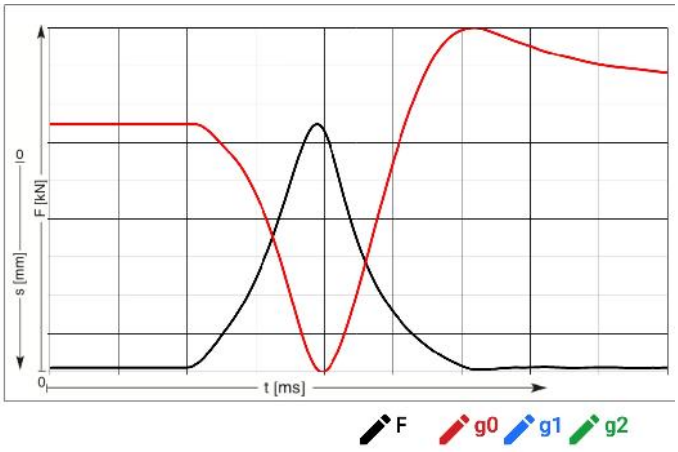



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	17.6 / 15.0
Point	Weather:
KM 0+ 850 DERECHO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 12:56:59	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 4.10 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603247 N 489258

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.758	835.1	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.416	225.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

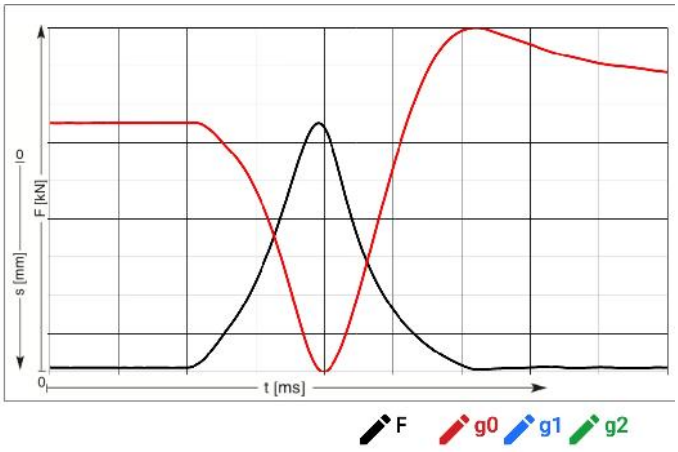



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 +050 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:00:59	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492384	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.515	821.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.514	179.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

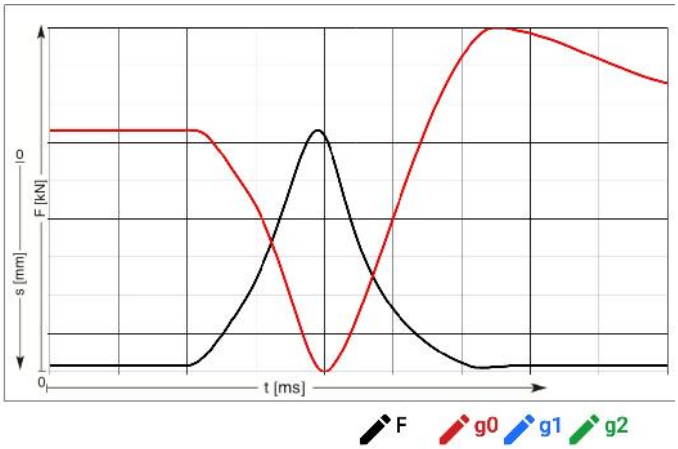



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 +050 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:01:07	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492384	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.589	825.5	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.510	182.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

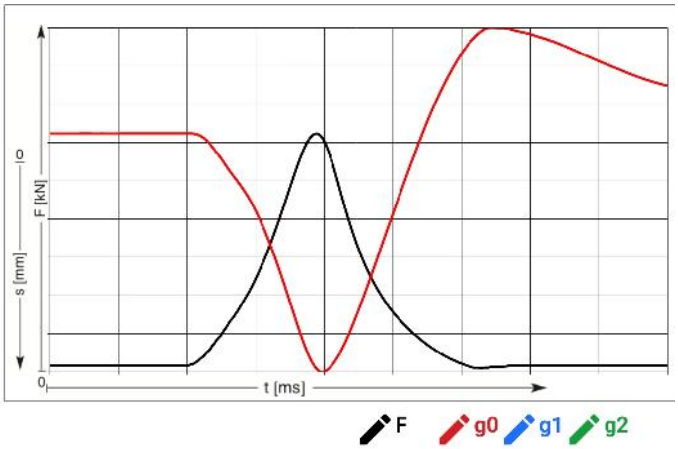



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 +050 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:01:14	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492384	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.619	827.3	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.510	182.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

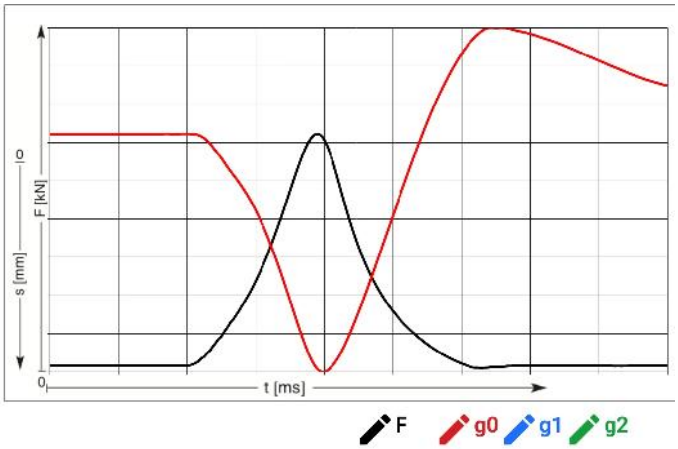



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	15.7 / 14.0
Point	Weather:
KM 1 +050 EJE	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:01:22	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603807 N 492384

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.619	827.2	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.508	182.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

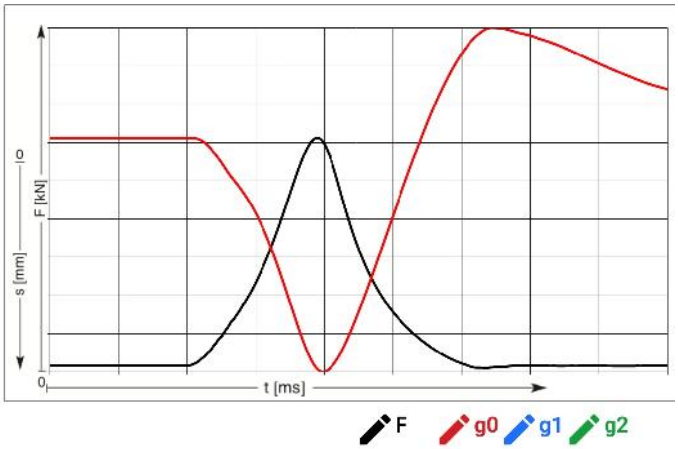



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 +050 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:01:29	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	


Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492384	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.615	827.0	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.512	181.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

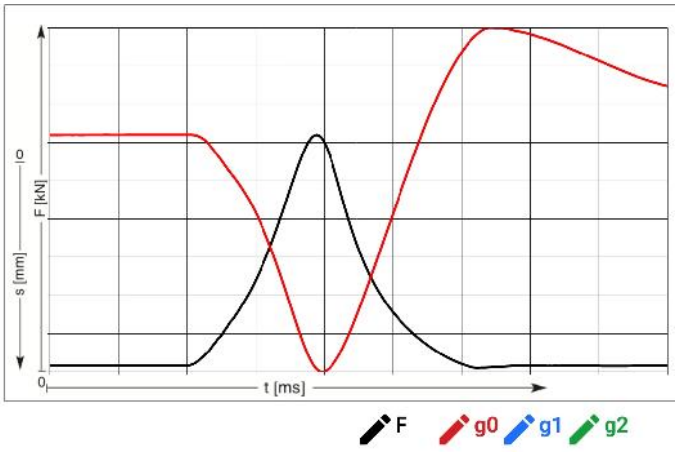

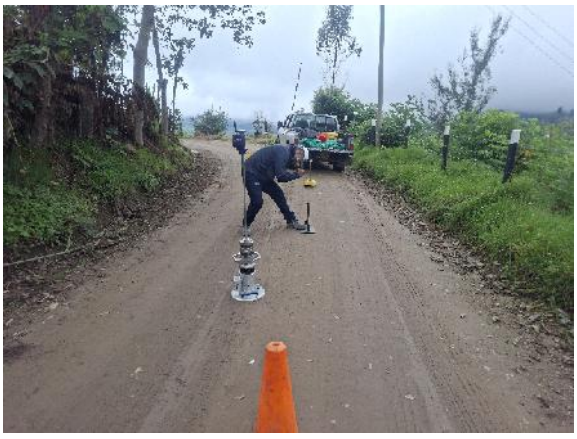

TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 +050 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:01:36	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492384	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.635	828.1	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.512	181.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

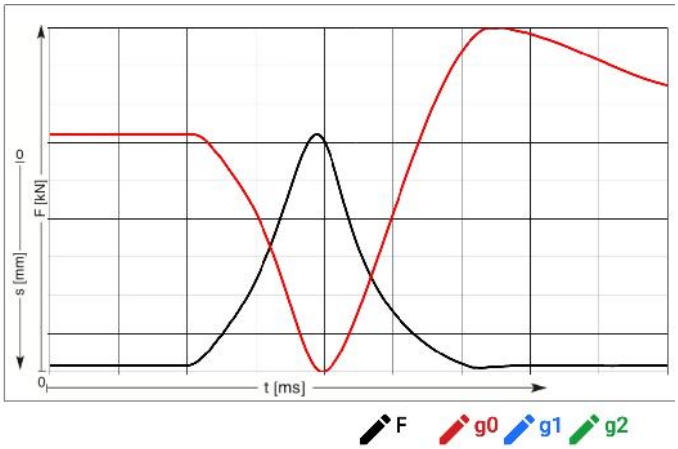



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	15.7 / 14.0
Point	Weather:
KM 1 +050 EJE	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:01:44	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603807 N 492384

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.653	829.2	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.509	182.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

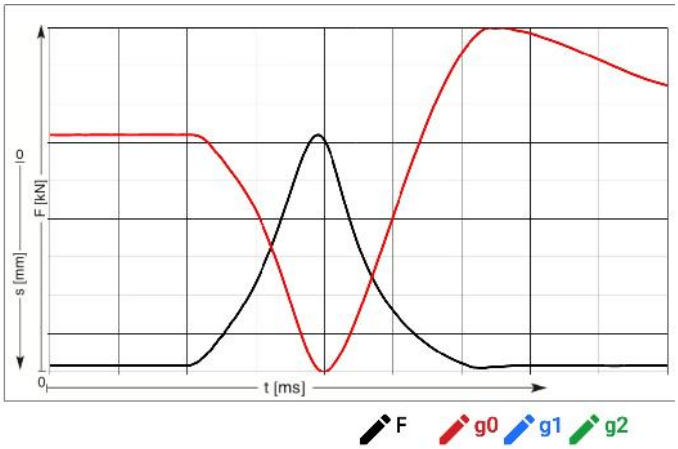



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 +050 EJE	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:01:52	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.15 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492384	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.621	827.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.511	181.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

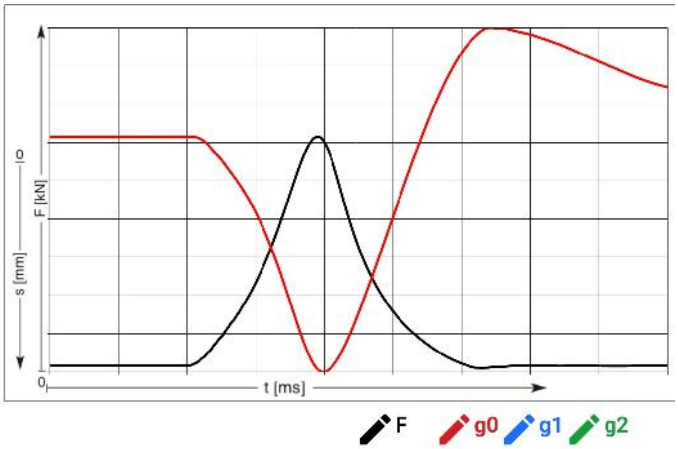



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
km 1 +200 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:07:14	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492418	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.650	829.0	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.211	440.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

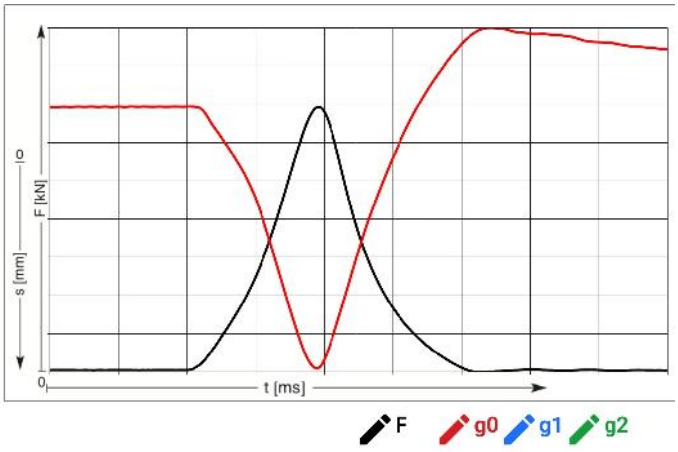



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	15.7 / 14.0
Point	Weather:
km 1 +200 IZQUIERDO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:07:22	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603807 N 492418

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.697	831.6	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.212	441.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

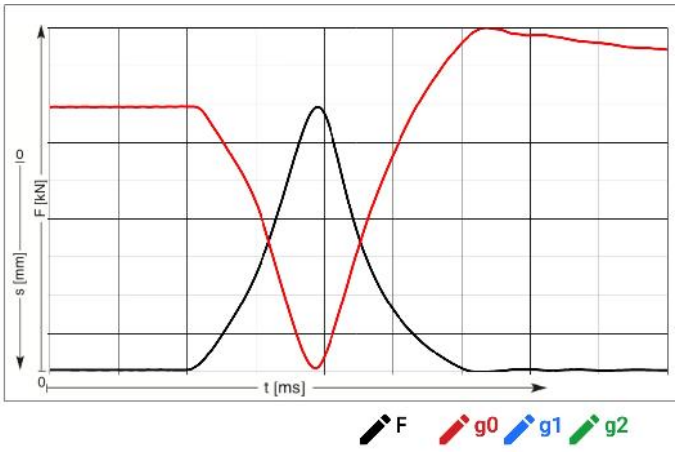



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
km 1 +200 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:07:30	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492418	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.698	831.7	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.211	442.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

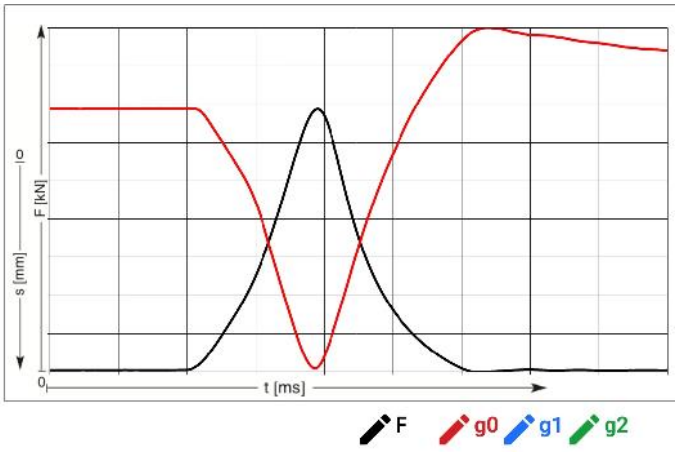



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
km 1 +200 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:07:38	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	
Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492418	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.744	834.3	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.212	442.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

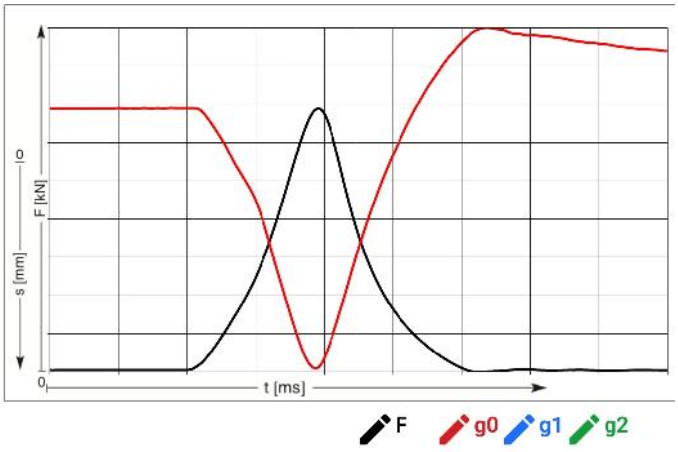



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	15.7 / 14.0
Point	Weather:
km 1 +200 IZQUIERDO	17 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:07:45	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603807 N 492418

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.725	833.3	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.211	442.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

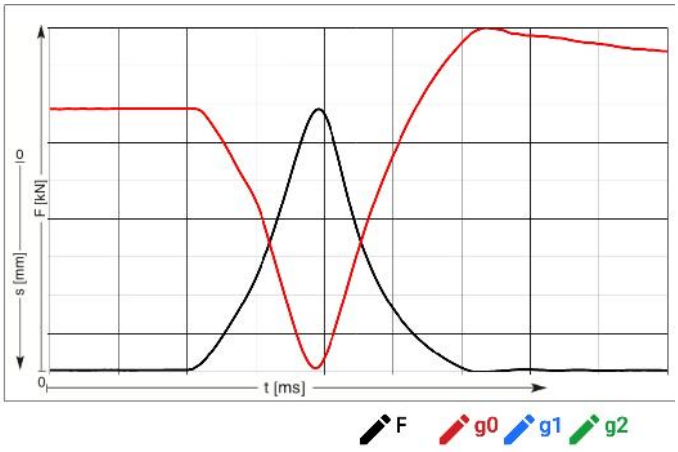



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
km 1 +200 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:07:53	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492418	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.717	832.8	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.211	443.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

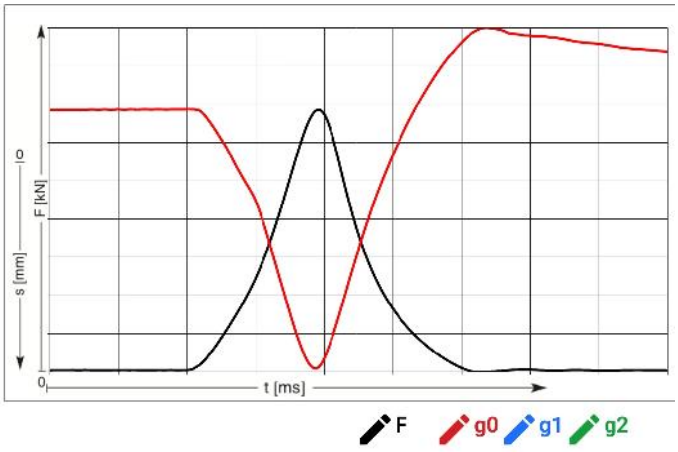



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
km 1 +200 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:08:01	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492418	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.795	837.2	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.211	445.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

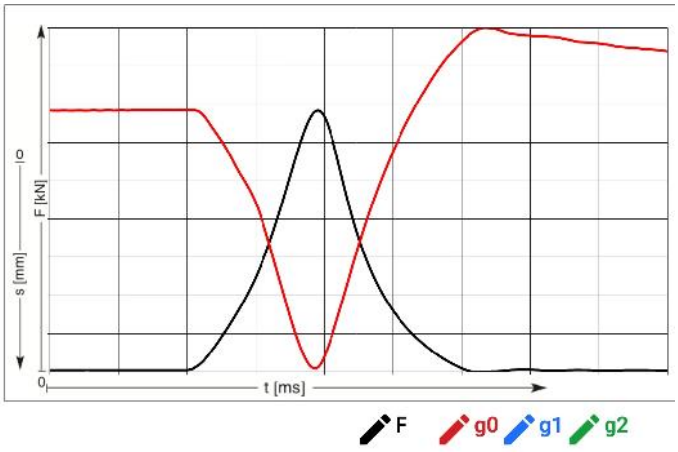



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
km 1 +200 IZQUIERDO	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:08:16	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
15.7 / 14.0	
Weather:	
17 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 27.16 'N, 74º 3.52 'W	
UTM	
E 18 603807 N 492418	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.772	835.9	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.211	444.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

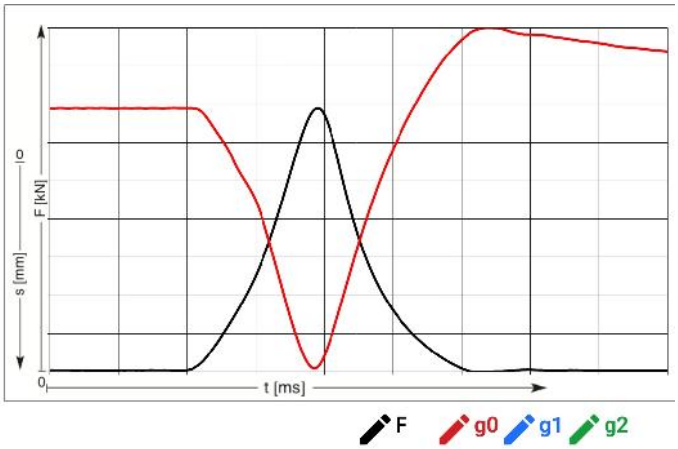



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:14:06	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.5 / 14.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W	
UTM	
E 18 603978 N 489266	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.808	837.9	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.381	247.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

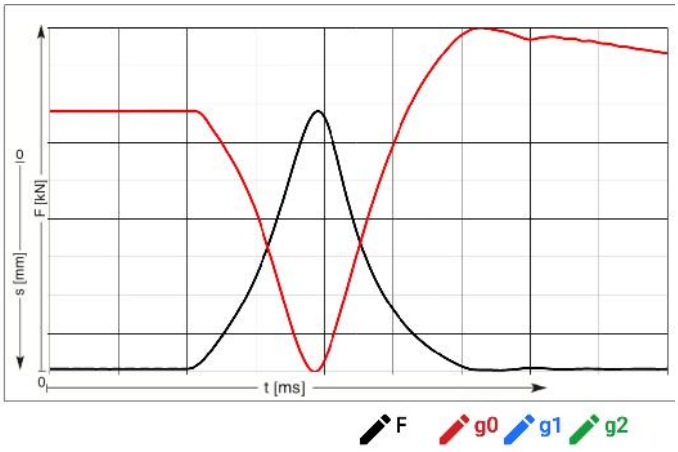



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:14:13	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.5 / 14.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W	
UTM	
E 18 603978 N 489266	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.825	838.9	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.379	248.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

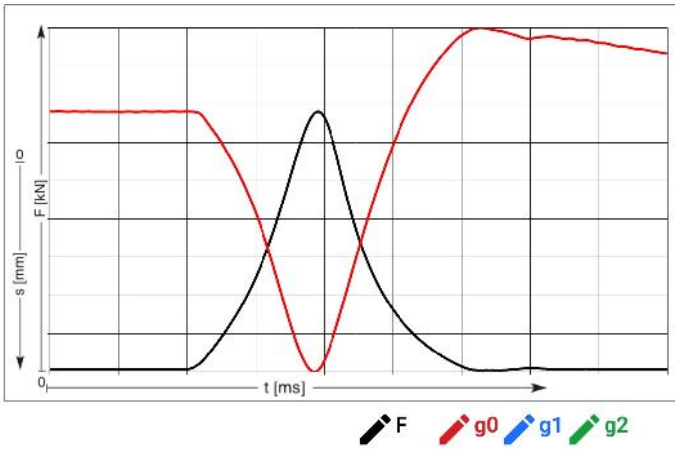



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 14.0
Point	Weather:
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:14:21	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.818	838.5	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.378	249.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

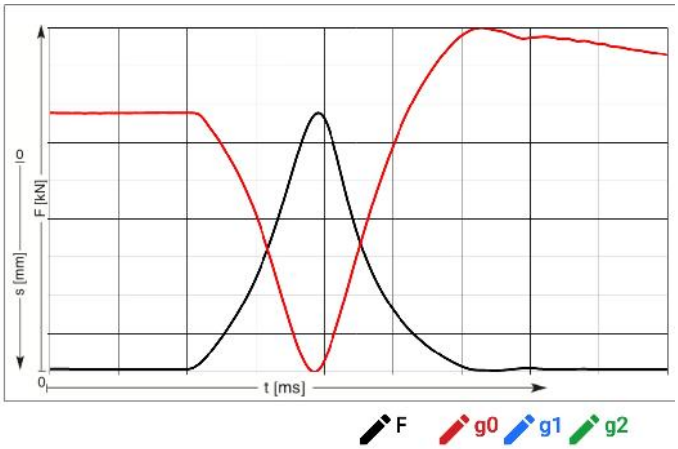



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 14.0
Point	Weather:
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:14:29	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.812	838.2	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.379	248.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

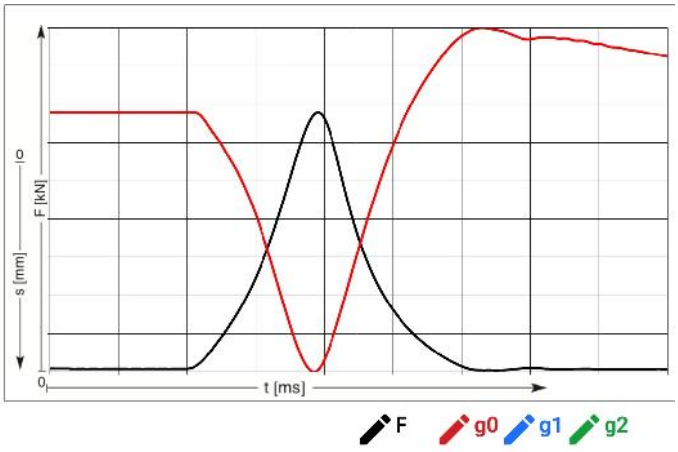



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 14.0
Point	Weather:
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:14:35	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.863	841.1	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.379	249.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

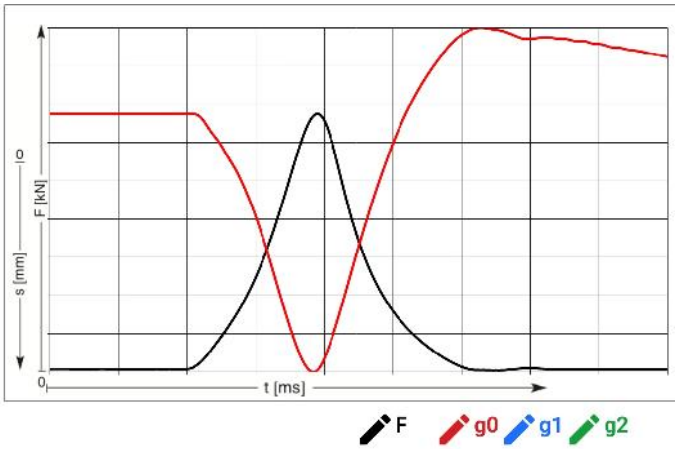



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 14.0
Point	Weather:
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:14:43	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.853	840.5	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.378	249.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

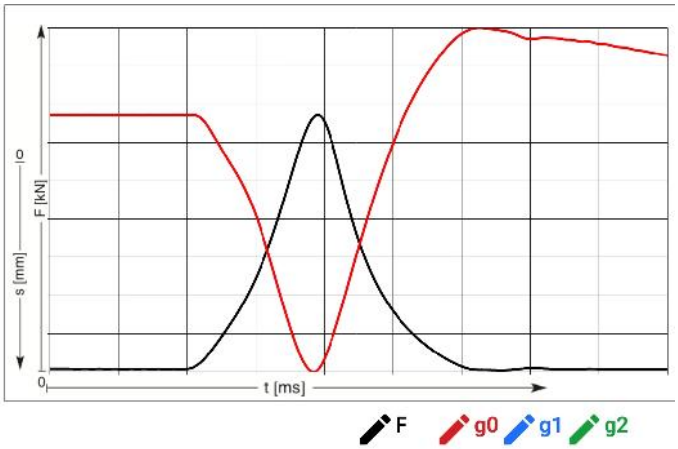



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 14.0
Point	Weather:
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:14:51	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.870	841.5	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.380	248.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

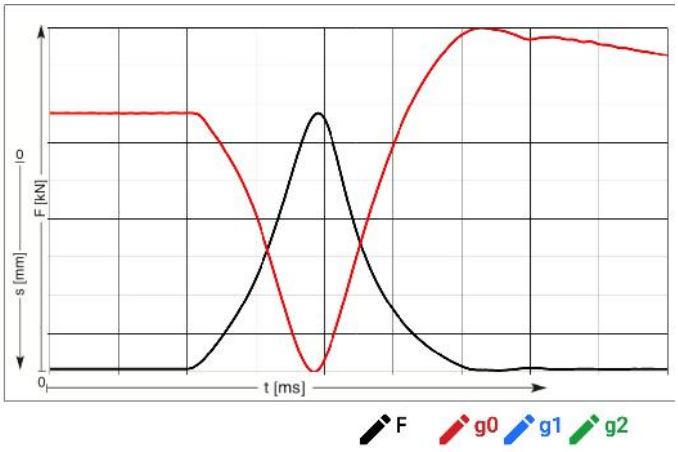



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1 + 700 EJE VIA TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:14:58	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.5 / 14.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W	
UTM	
E 18 603978 N 489266	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.881	842.1	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.380	249.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

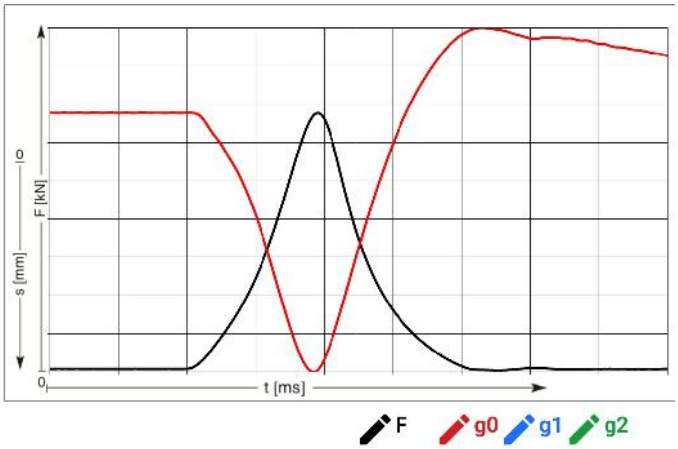



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:19:55	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.5 / 16.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W	
UTM	
E 18 603978 N 489266	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.533	822.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.469	197.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

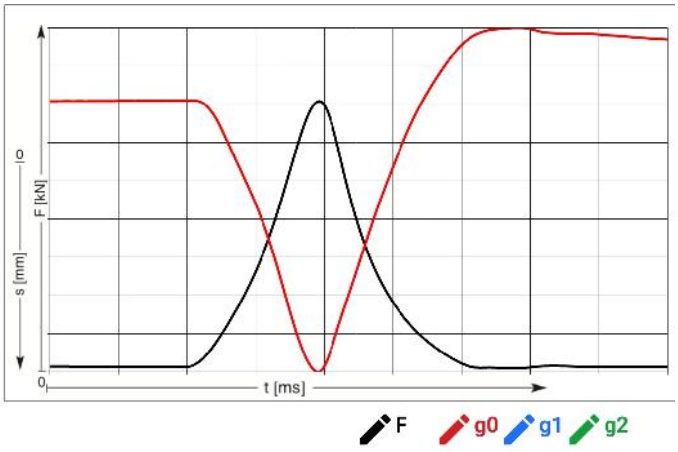



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:20:02	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.5 / 16.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W	
UTM	
E 18 603978 N 489266	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.653	829.2	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.449	207.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

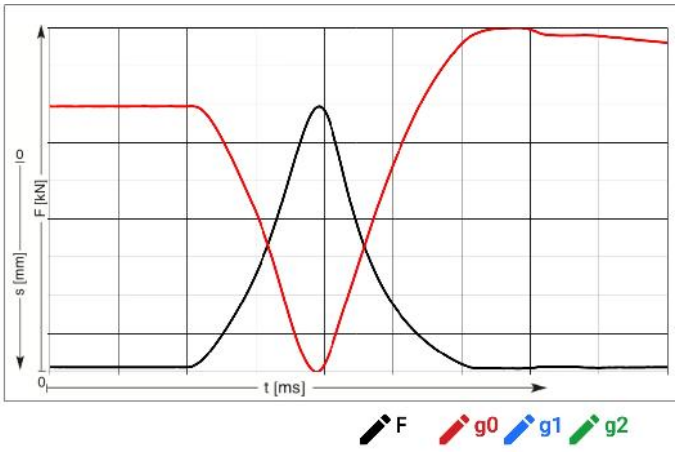



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 16.0
Point	Weather:
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:20:09	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.674	830.3	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.439	212.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

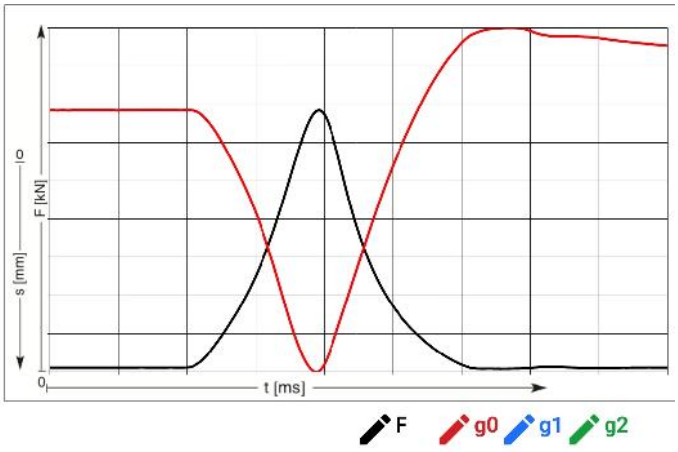



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 16.0
Point	Weather:
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:20:17	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.710	832.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.431	216.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

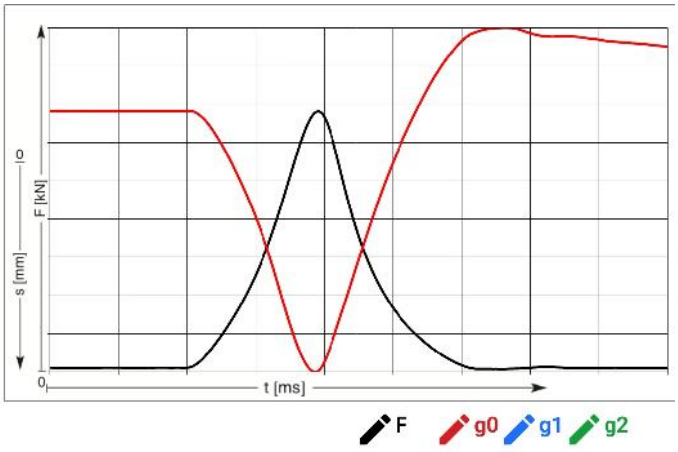



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 16.0
Point	Weather:
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:20:24	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.711	832.5	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.424	220.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

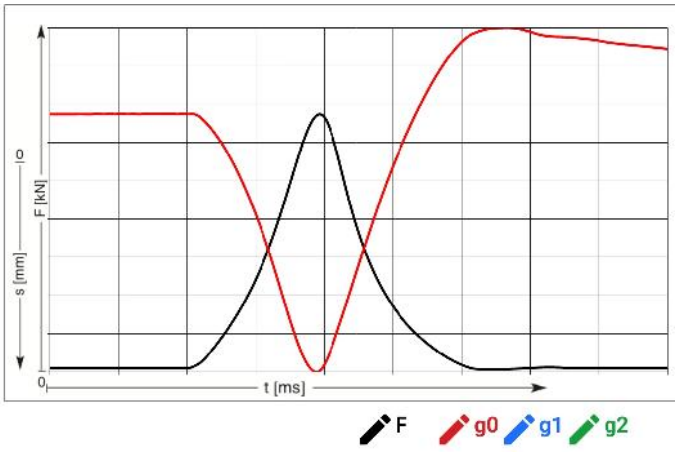



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 16.0
Point	Weather:
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:20:40	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.658	829.4	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.420	221.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

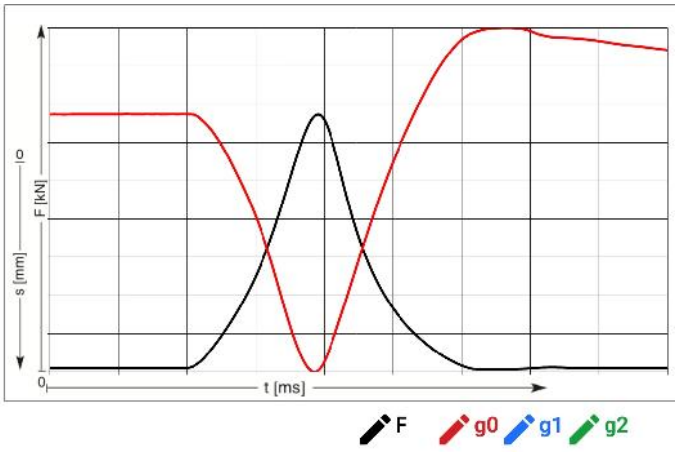



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 16.0
Point	Weather:
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:20:47	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.755	835.0	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.423	222.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

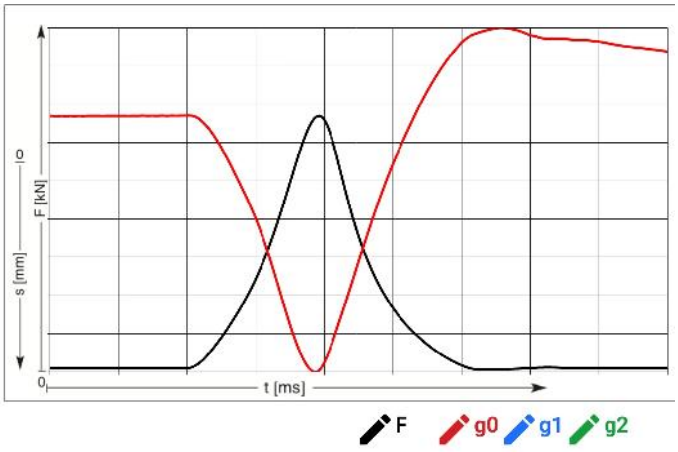



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.5 / 16.0
Point	Weather:
KM 1+900 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:20:54	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.33 'N, 74º 3.46 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 603978 N 489266

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.750	834.7	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.420	223.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

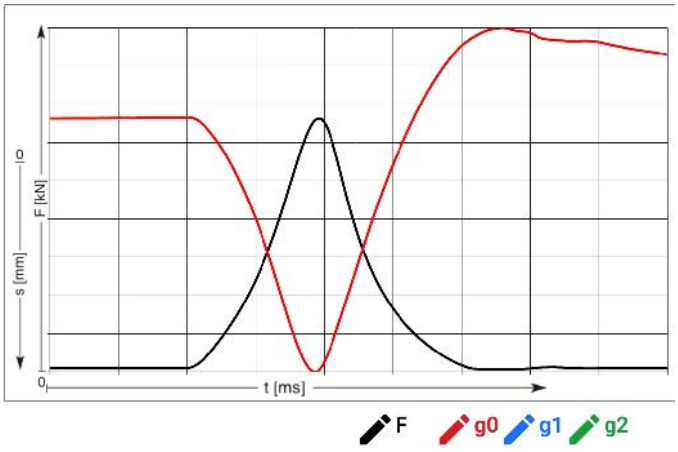



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:24:10	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W	
UTM	
E 18 604109 N 489392	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.427	816.4	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.252	363.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

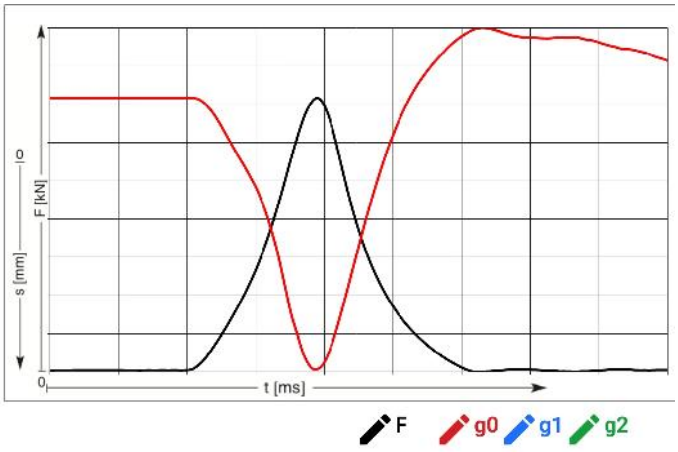



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:24:18	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W	
UTM	
E 18 604109 N 489392	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.927	844.7	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.245	386.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

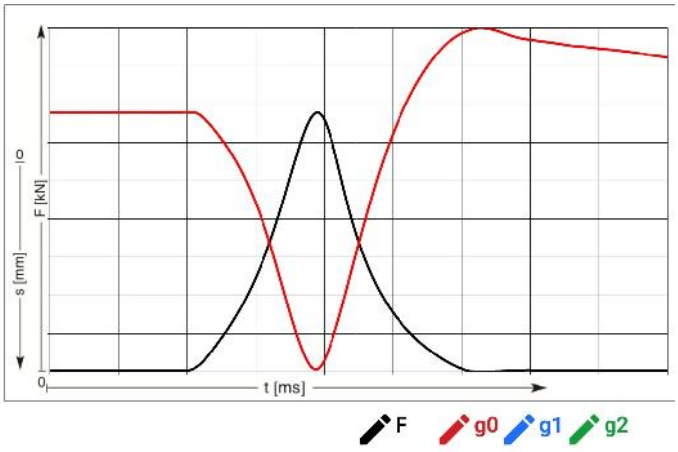



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:24:26	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604109 N 489392

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.968	847.0	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.244	389.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

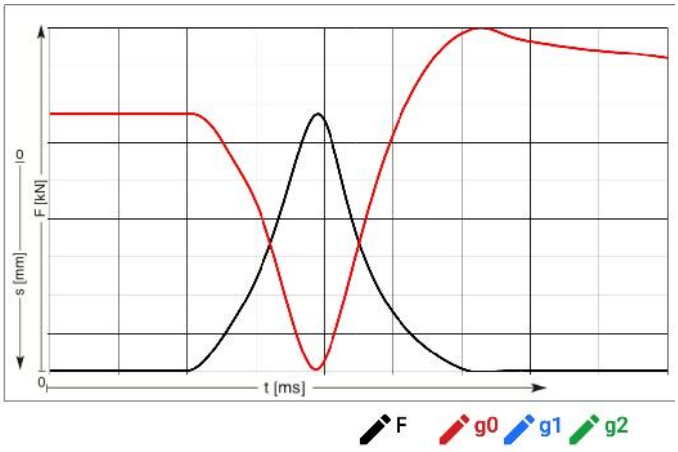



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:24:33	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604109 N 489392

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.009	849.3	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.242	393.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

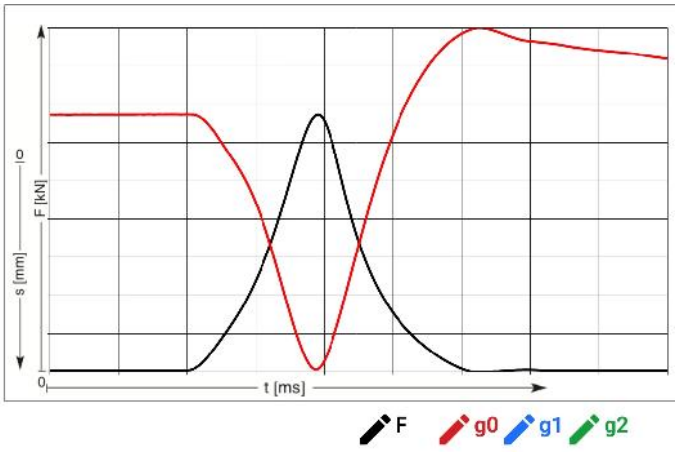



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:24:40	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W	
UTM	
E 18 604109 N 489392	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.024	850.2	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.242	395.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

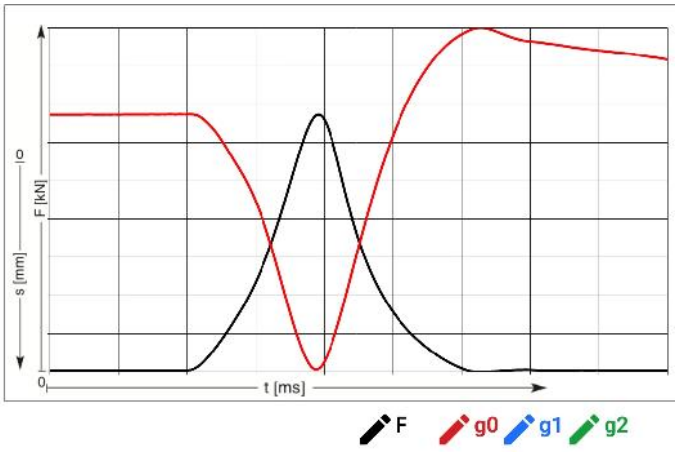



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:24:54	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604109 N 489392

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.051	851.7	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.239	399.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

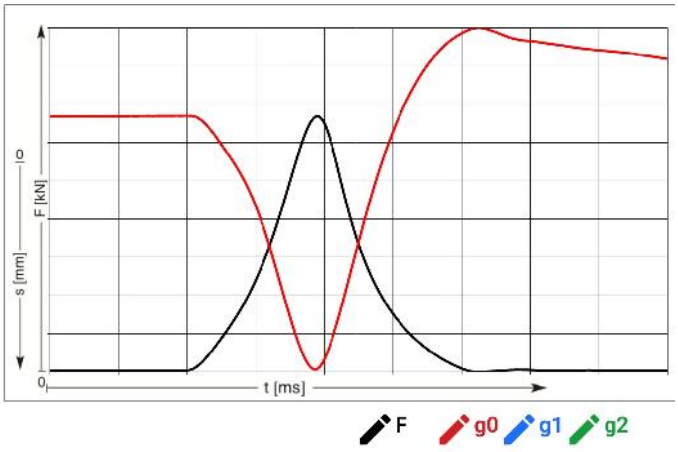



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:25:08	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W	
UTM	
E 18 604109 N 489392	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.082	853.4	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.240	399.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

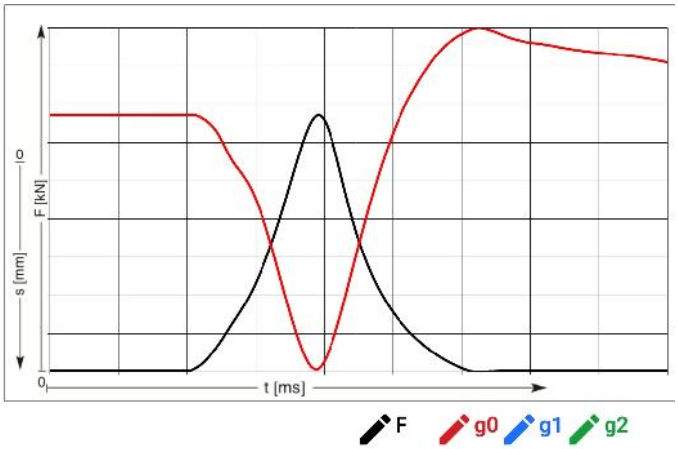



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+100 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:25:15	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.37 'N, 74º 3.42 'W	
UTM	
E 18 604109 N 489392	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.071	852.8	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.239	400.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

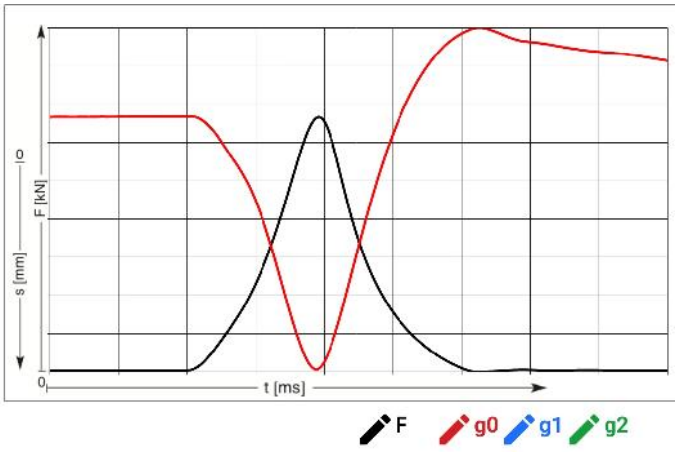



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+300 EJE TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:29:59	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604278 N 489503

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.729	833.5	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.353	265.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

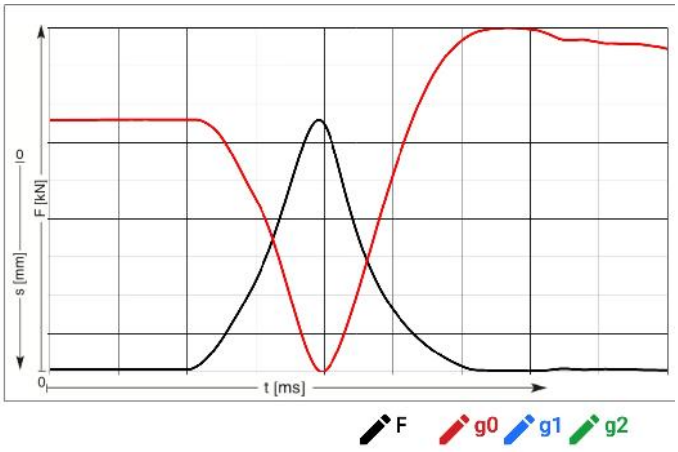



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+300 EJE TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:30:07	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W	
UTM	
E 18 604278 N 489503	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.741	834.1	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.356	263.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

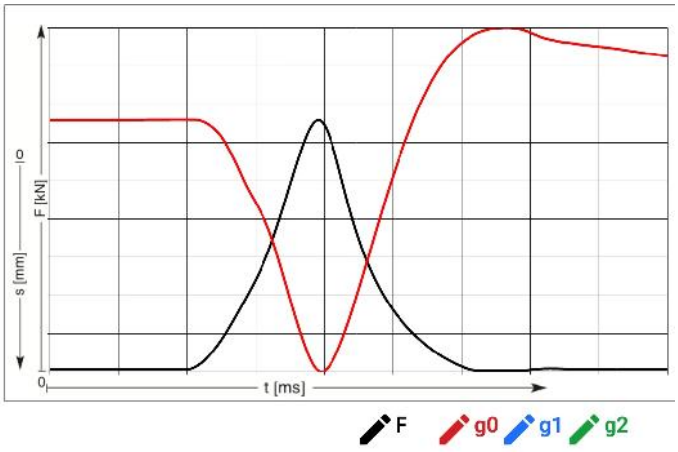



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+300 EJE TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:30:14	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604278 N 489503

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.722	833.1	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.361	259.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

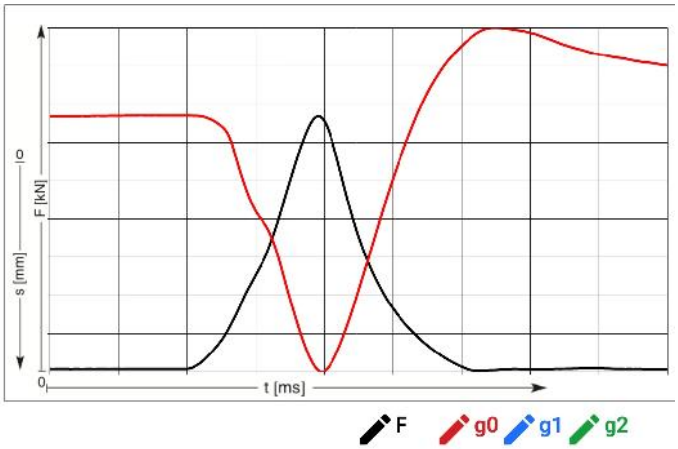



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+300 EJE TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:30:21	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604278 N 489503

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.736	833.8	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.348	269.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

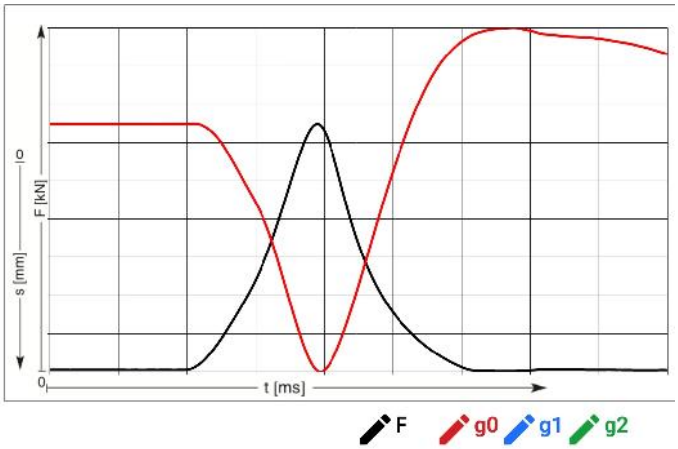



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+300 EJE TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:30:29	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W	
UTM	
E 18 604278 N 489503	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.767	835.6	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.352	266.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

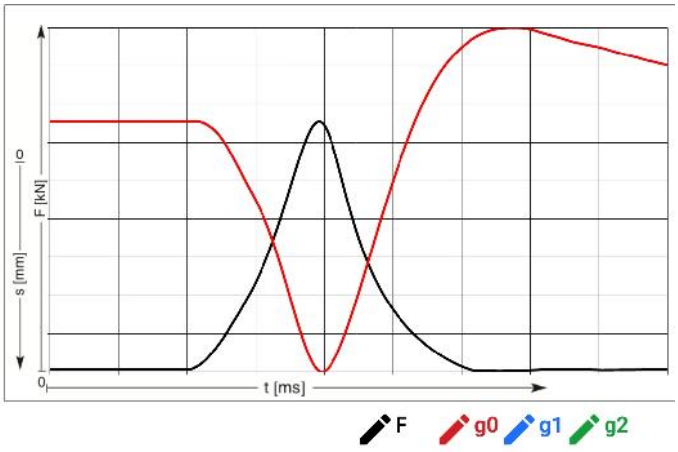



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+300 EJE TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:30:36	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W	
UTM	
E 18 604278 N 489503	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.811	838.1	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.349	269.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

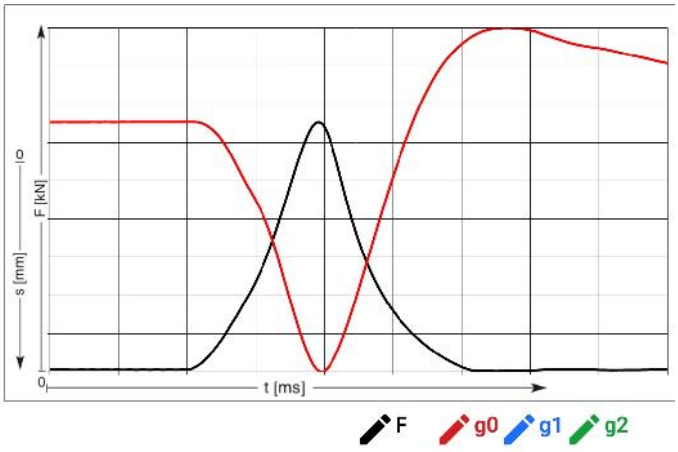



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+300 EJE TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:30:43	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604278 N 489503

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.793	837.1	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.350	268.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

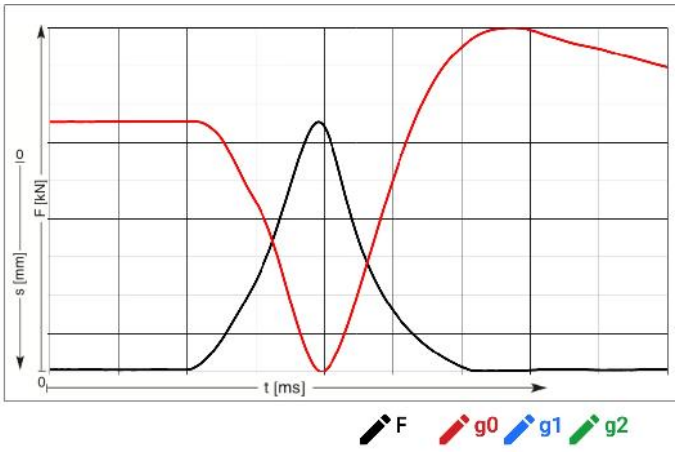



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+300 EJE TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:30:50	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.41 'N, 74º 3.36 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604278 N 489503

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.808	837.9	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.348	270.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

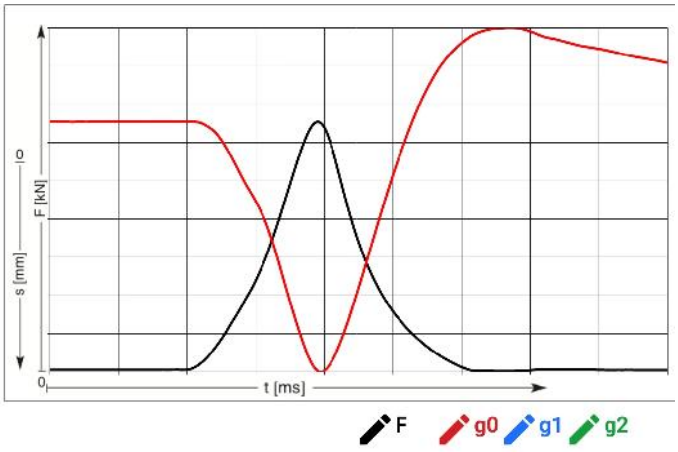



ILAB-No.248-2026

Bogotá D.C., junio del 2026

CONSORCIO SOFAN
Bogotá D.C., - Colombia

REFERENCIA: RESULTADO ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: CHIPAQUE

Cordial Saludo.

Tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes con el fin de remitirles los resultados de los ensayos de DEFLECTOMETRIA DE IMPACTO LIVIANO - LWD del informe ILAB-248-2026.

Procedimientos solicitados para el proyecto de la referencia.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud, cambio o modificación que surja en el análisis de este mismo.

Cordialmente,



Director Técnico

TECNISUELOS
Pavimentos & Concretos SAS
Laboratorio de Ingeniería Civil
N.I.: 901.028.209-2

HOJA DE CALCULO : MÉTODO PARA MEDIR DEFLEXIONES MEDIANTE UN DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD) EN SUELOS

Código:	**TS-FT-029-01**
Fecha de Edición:	2019-01-15
Versión :	2
Copia Controlada:	SI / NO

CLIENTE : SOFAN
PROYECTO : CHIPAQUE
DIRECCIÓN: BOGOTA D,C

FECHA DE TOMA: 28/05/2026
FECHA DE INGRESO 29/05/2026
FECHA DE ENSAYO: 28/05/2026
CLASE DE MATERIAL: EXISTENTE

NORMA DE ENSAYO: INVIAS E 826 – 22

Numero de Orden de Servicios: **OSL-2425-2026**

Numero de Informe de Resultados: **ILAB-248-2026**

Punto	Ensayo N°	Radio (mm)	Carga (kN)	S1 (mm)	Presion de Contacto (kPa)	Evd1 (Mpa)	CBR1 %	MR1 (Mpa)	Relacion módulo de conjunto (Econj)
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	1	150	14,80	0,306	837,3	674,0	38	182	28,9
	2		14,78	0,311	836,4	662,4	38	181	28,6
	3		14,85	0,306	840,5	676,6	38	182	28,9
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	1	150	14,58	0,619	824,8	328,2	27	145	19,9
	2		14,62	0,620	827,5	328,8	27	146	19,9
	3		14,61	0,618	827,0	329,6	27	146	20,0
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	1	150	15,01	0,141	849,5	1484,0	56	232	43,4
	2		14,96	0,140	846,3	1489,0	56	233	43,5
	3		14,99	0,141	848,4	1482,1	56	232	43,4
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	1	150	15,01	0,218	849,4	959,7	46	203	34,7
	2		15,00	0,216	848,9	968,1	46	204	34,8
	3		15,01	0,218	849,5	959,8	46	203	34,7
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	1	150	14,89	0,379	842,6	547,6	35	171	25,9
	2		14,91	0,378	843,9	549,9	35	171	26,0
	3		14,91	0,376	843,8	552,8	35	171	26,1

TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS Laboratorio de ingeniería Civil NIT. 901.028.209-2	HOJA DE CALCULO : MÉTODO PARA MEDIR DEFLEXIONES MEDIANTE UN DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO LIVIANO (LWD) EN SUELOS	Código:	TS-FT-029-01	
		Fecha de Edición:	2019-01-15	
		Versión :	2	
		Copia Controlada:	SI	NO

CLIENTE : SOFAN **FECHA DE TOMA:** 28/05/2026

PROYECTO : CHIPAQUE **FECHA DE INGRESO** 29/05/2026 **CLASE DE MATERIAL:** EXISTENTE


DIRECCIÓN: BOGOTA D.C **FECHA DE ENSAYO:** 28/05/2026

NORMA DE ENSAYO INVIAS E 826 – 22

Numero de Orden de Servicios: **OSL-2425-2026**

Numero de Informe de Resultados: **ILAB-248-2026**

Punto	Ensayo N°	Radio (mm)	Carga (kN)	S1 (mm)	Presion de Contacto (kPa)	Evd1 (Mpa)	CBR1 %	MR1 (Mpa)
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	1	150	14,8	0,306	837,3	674,0	38	182
	2		14,8	0,311	836,4	662,4	38	181
	3		14,9	0,306	840,5	676,6	38	182
	PROMEDIO		14,8	0,308	838,1	671,0	38	182
	CARACTERITICO 85%		14,9	0,312	841,3	679,5	39	182
	Percentil 85		14,8	0,310	839,5	675,8	38	182
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	1	150	14,6	0,619	824,8	328,2	27	145
	2		14,6	0,620	827,5	328,8	27	146
	3		14,6	0,618	827,0	329,6	27	146
	PROMEDIO		14,6	0,619	826,4	328,9	27	146
	CARACTERITICO 85%		14,6	0,620	827,6	329,8	27	146
	Percentil 85		14,6	0,620	827,4	329,4	27	146
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	1	150	15,0	0,141	849,5	1484,0	56	232
	2		15,0	0,140	846,3	1489,0	56	233
	3		15,0	0,141	848,4	1482,1	56	232
	PROMEDIO		15,0	0,141	848,1	1485,0	56	232
	CARACTERITICO 85%		15,0	0,141	848,8	1490,4	56	233
	Percentil 85		15,0	0,141	849,2	1487,5	56	233
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	1	150	15,0	0,218	849,4	959,7	46	203
	2		15,0	0,216	848,9	968,1	46	204
	3		15,0	0,218	849,5	959,8	46	203
	PROMEDIO		15,0	0,217	849,3	962,5	46	203
	CARACTERITICO 85%		15,0	0,218	849,6	969,7	46	204
	Percentil 85		15,0	0,218	849,5	965,6	46	203
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	1	150	14,9	0,379	842,6	547,6	35	171
	2		14,9	0,378	843,9	549,9	35	171
	3		14,9	0,376	843,8	552,8	35	171
	PROMEDIO		14,9	0,378	843,4	550,1	35	171
	CARACTERITICO 85%		14,9	0,378	843,9	553,4	35	171
	Percentil 85		14,9	0,379	843,9	551,9	35	171

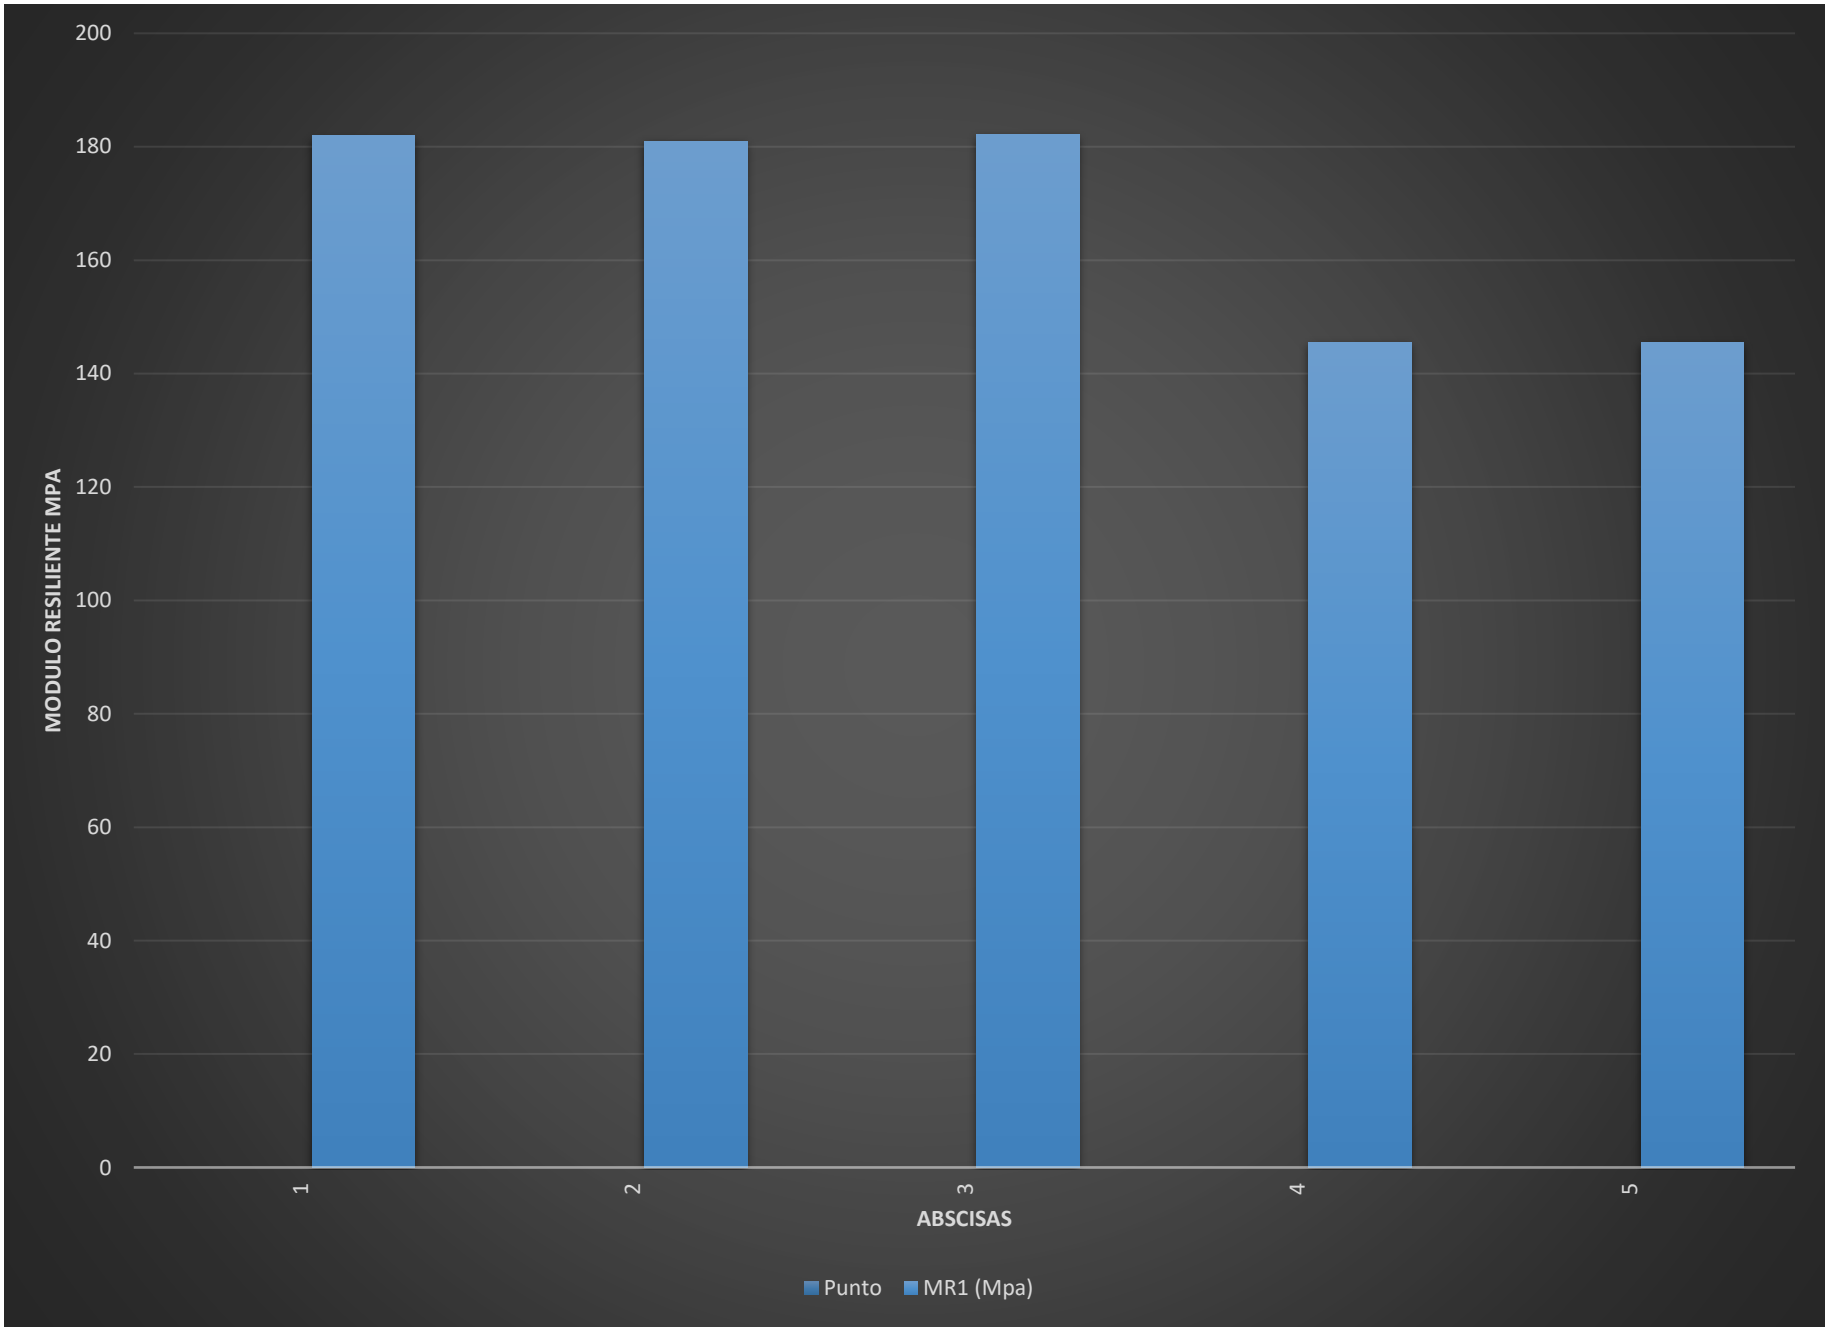
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
MODULO RESILIENTE MPA
1
2
3
4
5
ABSCISAS
Punto
MR1 (Mpa)

TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:36:10	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604438 N 489616

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.767	835.6	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.312	301.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

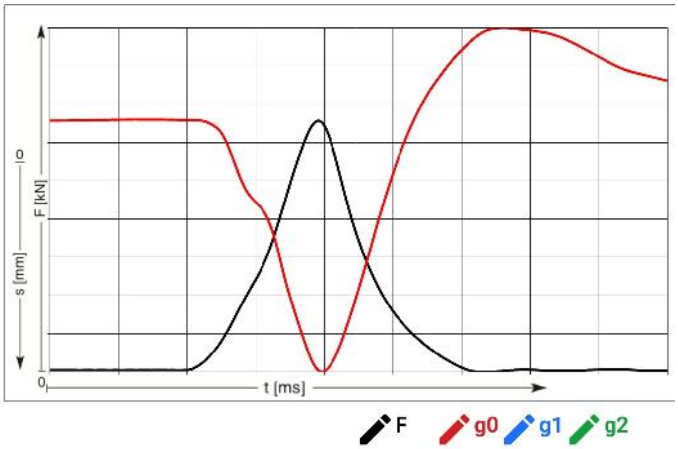



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:36:19	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W	
UTM	
E 18 604438 N 489616	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.764	835.5	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.310	303.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

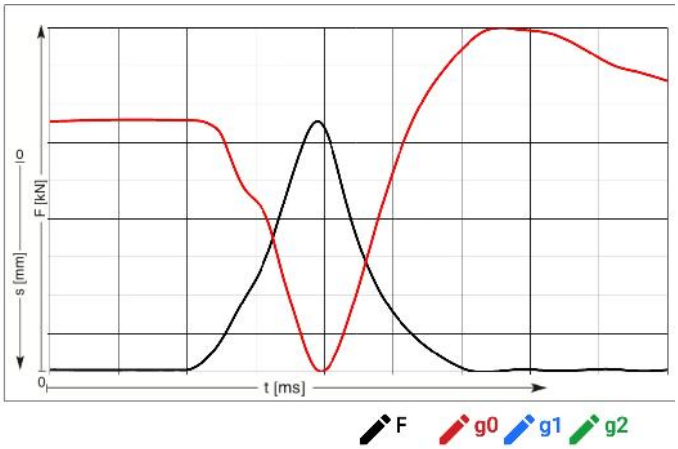



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:36:27	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W	
UTM	
E 18 604438 N 489616	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.762	835.3	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.313	300.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

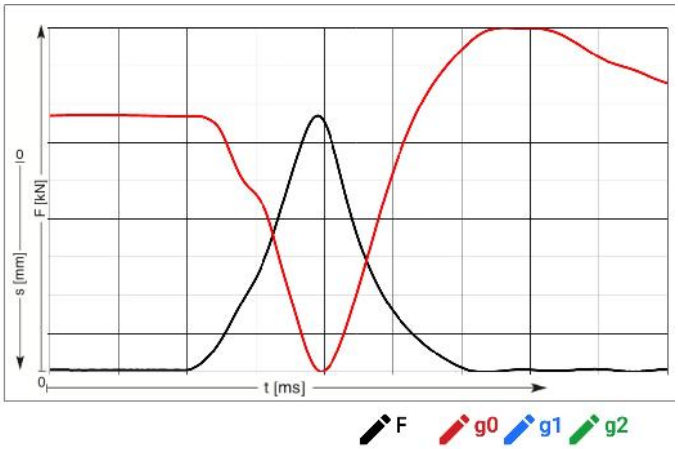



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:36:36	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604438 N 489616

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.761	835.3	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.308	304.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

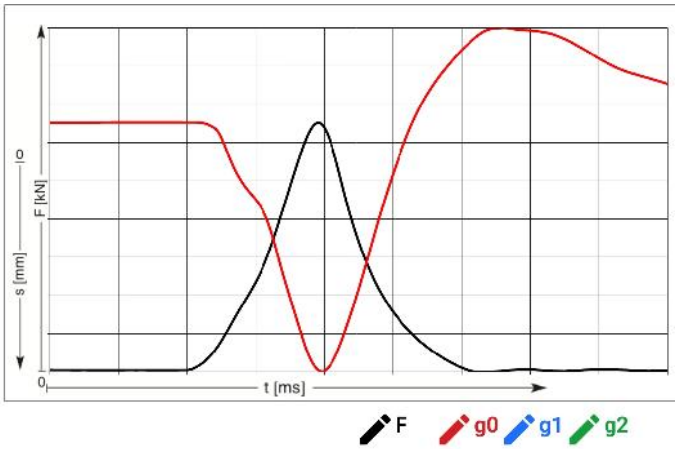



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:36:43	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W	
UTM	
E 18 604438 N 489616	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.794	837.1	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.313	300.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

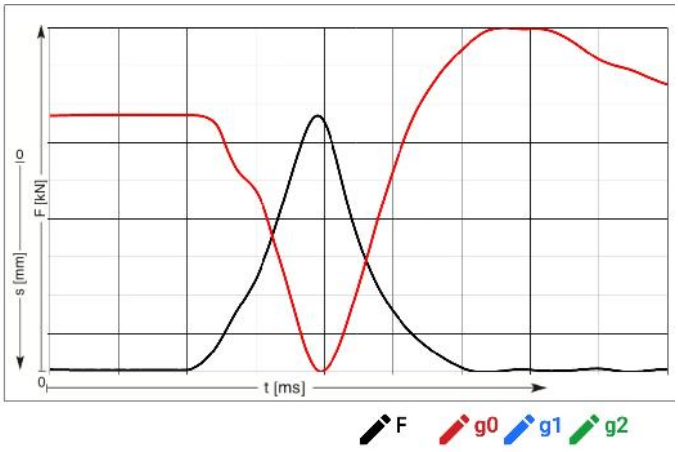



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:36:51	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604438 N 489616

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.797	837.3	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.306	307.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

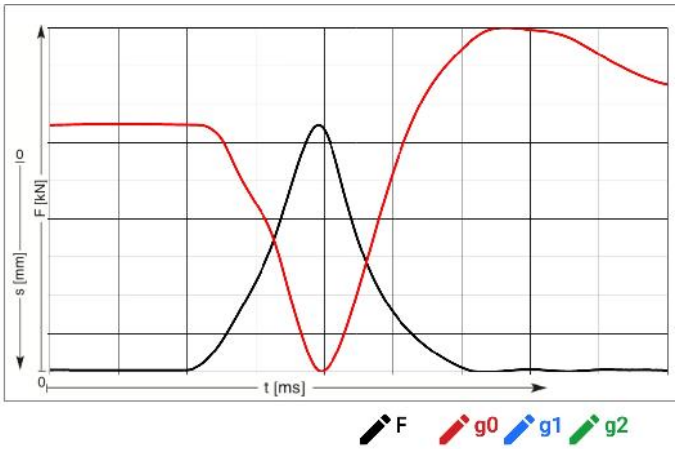



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:36:58	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Nubes	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W	
UTM	
E 18 604438 N 489616	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.781	836.4	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.311	302.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

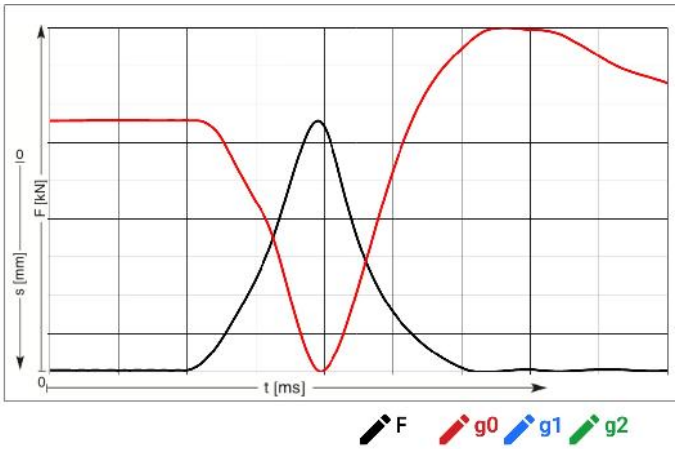



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2+500 DERECHO TRAMO 2	18 Deg. C Nubes
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:37:05	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.44 'N, 74º 3.31 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604438 N 489616

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.854	840.5	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.306	308.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

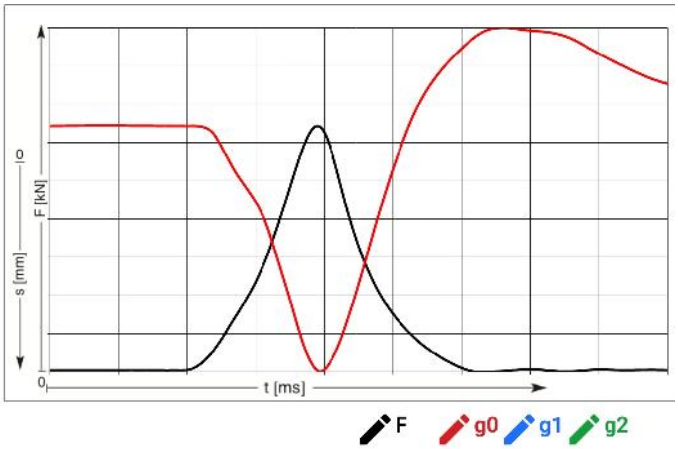



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:42:13	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604472 N 489636

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.498	820.4	24.1

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.657	140.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

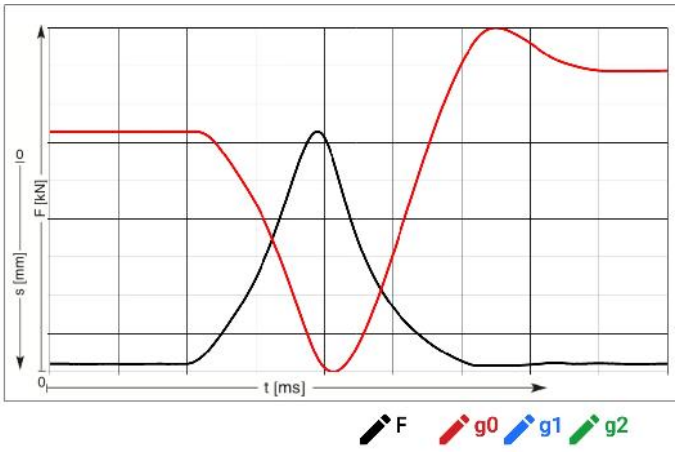



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:42:21	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604472 N 489636

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.509	821.0	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.641	144.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

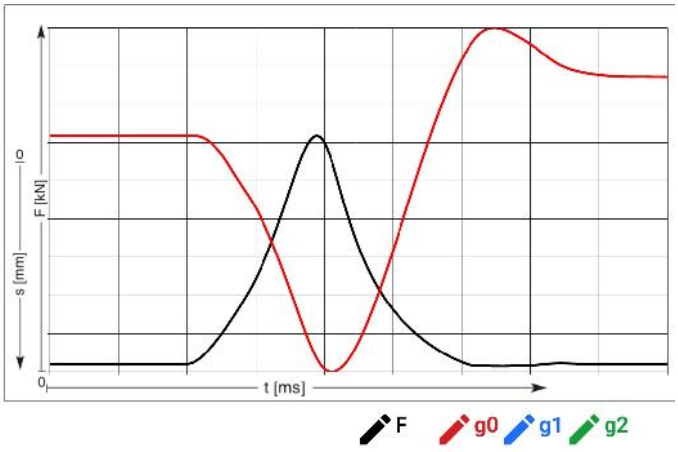



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:42:35	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W	
UTM	
E 18 604472 N 489636	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.555	823.6	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.631	146.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

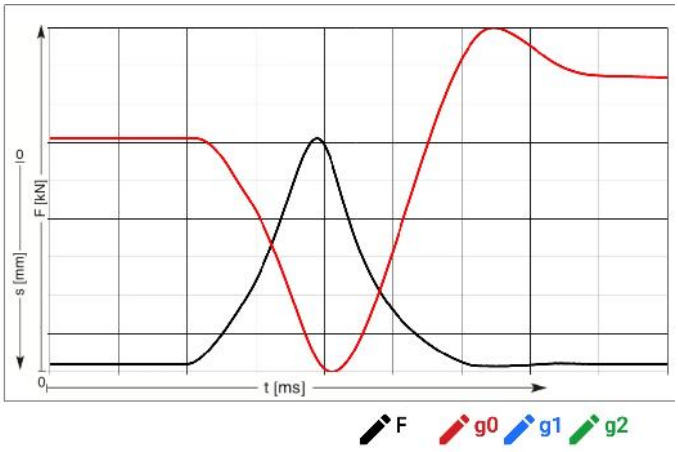



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:42:44	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W	
UTM	
E 18 604472 N 489636	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.587	825.4	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.622	149.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

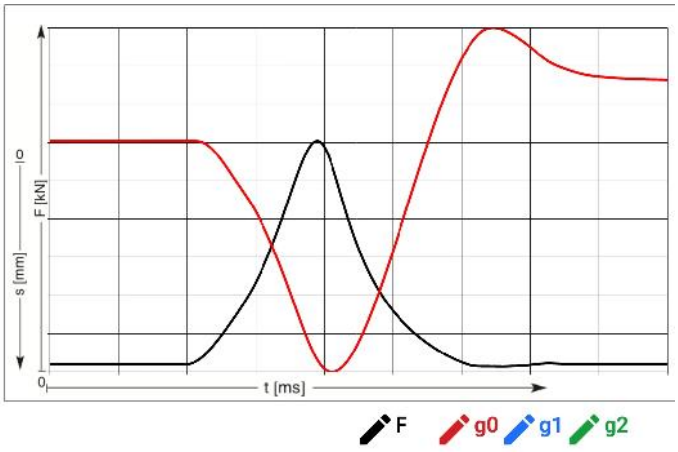



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.1 / 15.0
Point	Weather:
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 13:42:54	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 604472 N 489636

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.603	826.3	24.1

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.620	149.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

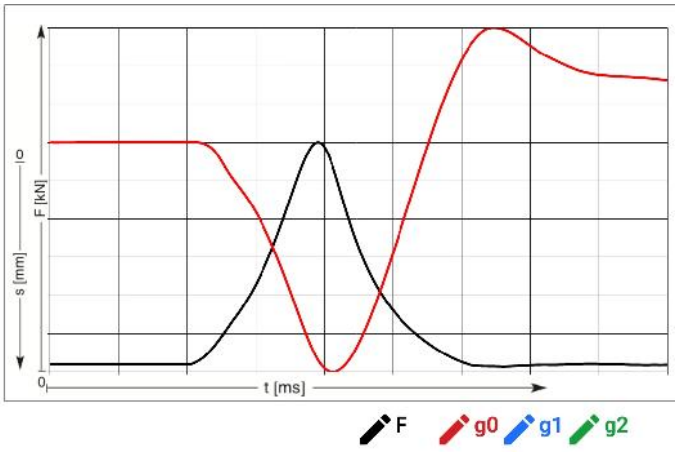



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:43:14	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W	
UTM	
E 18 604472 N 489636	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.575	824.8	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.619	149.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

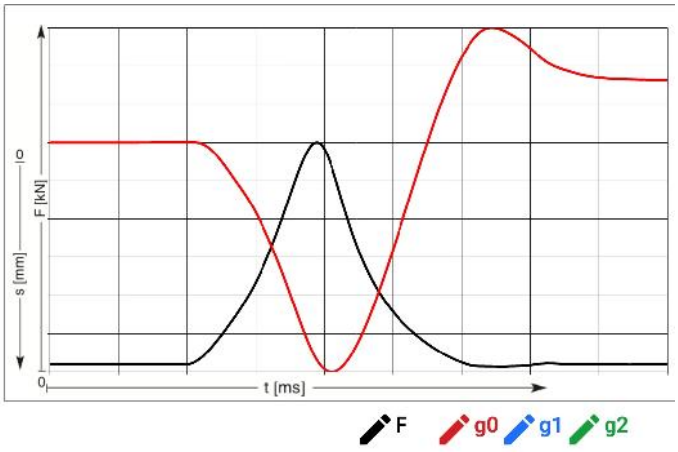



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:43:22	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W	
UTM	
E 18 604472 N 489636	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.624	827.5	24.0

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.620	150.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

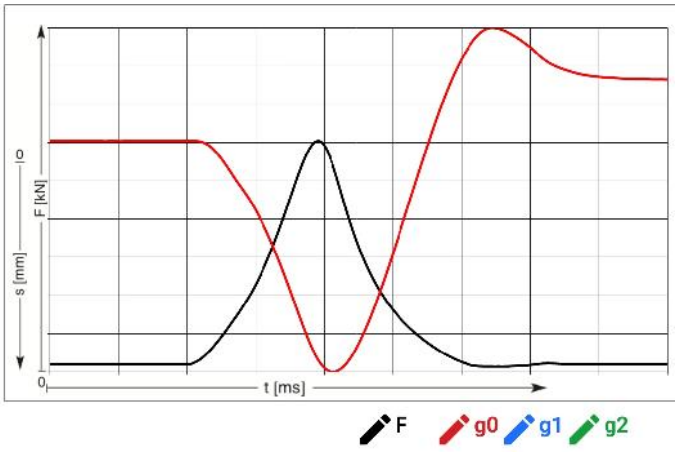



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 2 +680 IZQUIERDO TRAMO 2	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:43:30	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.1 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 25.45 'N, 74º 3.30 'W	
UTM	
E 18 604472 N 489636	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.614	827.0	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.618	150.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

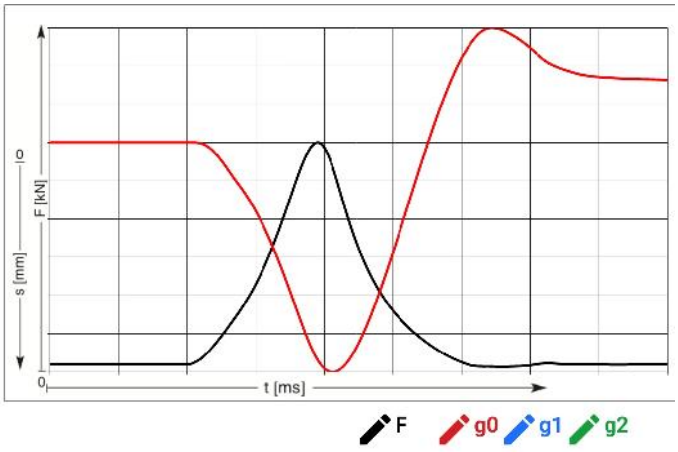



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:55:33	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.653	829.2	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.134	694.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

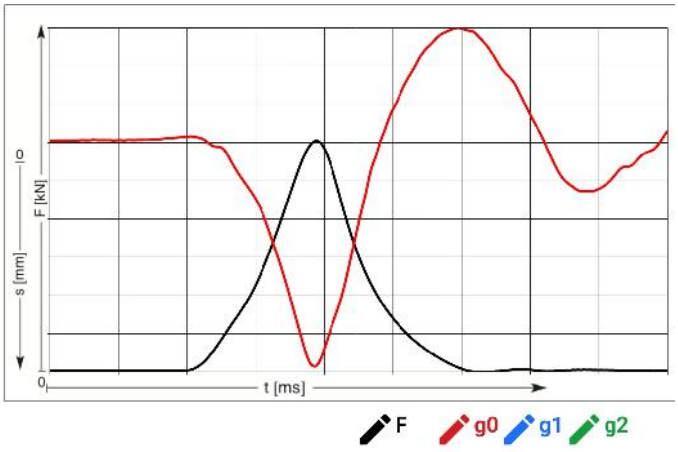



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:55:41	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.974	847.3	23.5

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.143	663.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

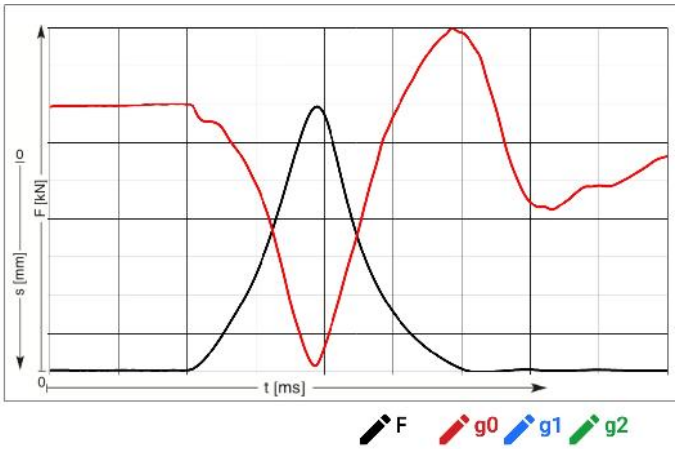



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:55:47	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.996	848.6	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.137	693.2
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

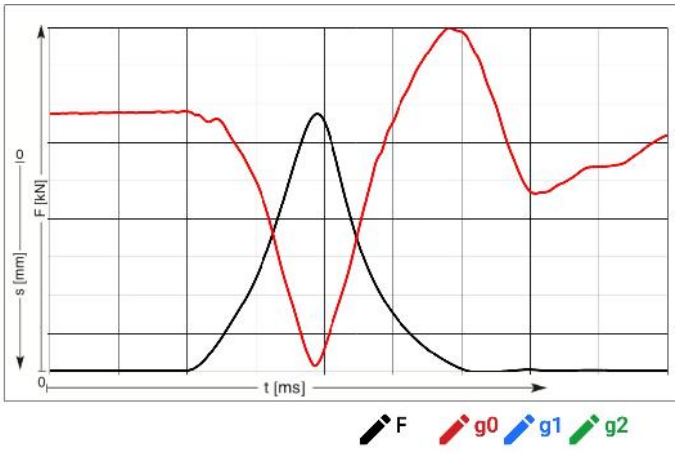



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:55:54	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.012	849.5	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.136	699.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

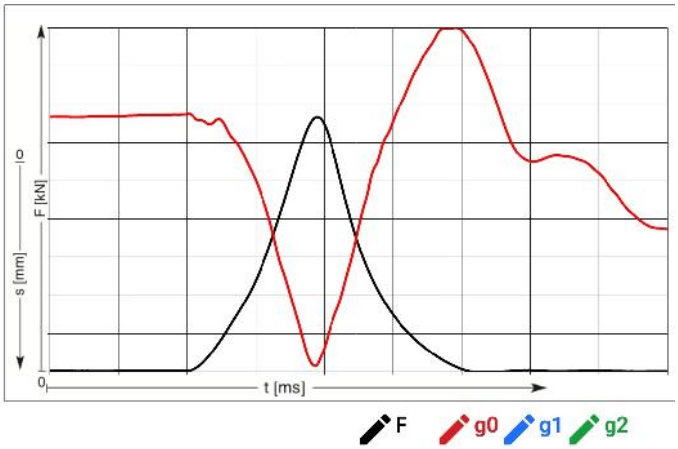



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:56:01	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.043	851.2	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.140	682.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

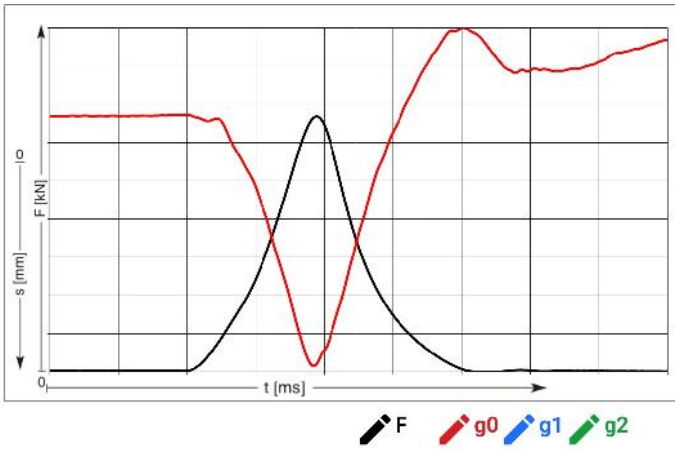



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:56:15	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.013	849.5	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.141	675.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

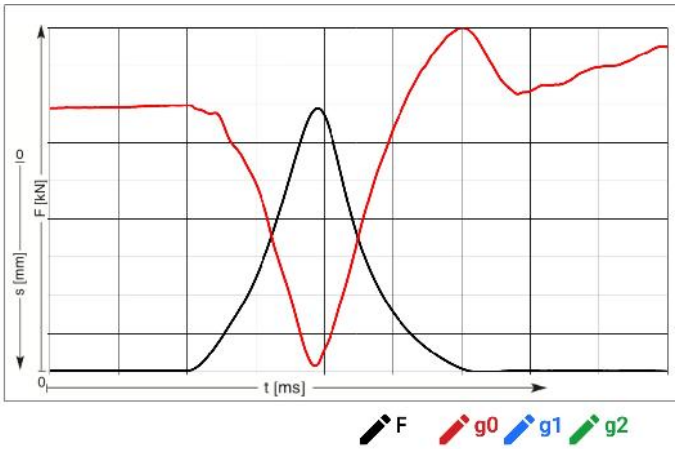



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:56:22	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.956	846.3	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.140	679.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

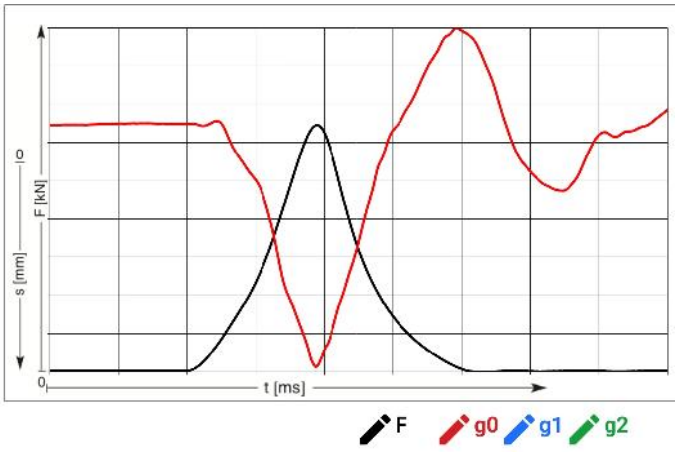



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4 +100 EJE VIA TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 13:56:50	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 15.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.6 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605577 N 490284	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.993	848.4	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.141	673.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

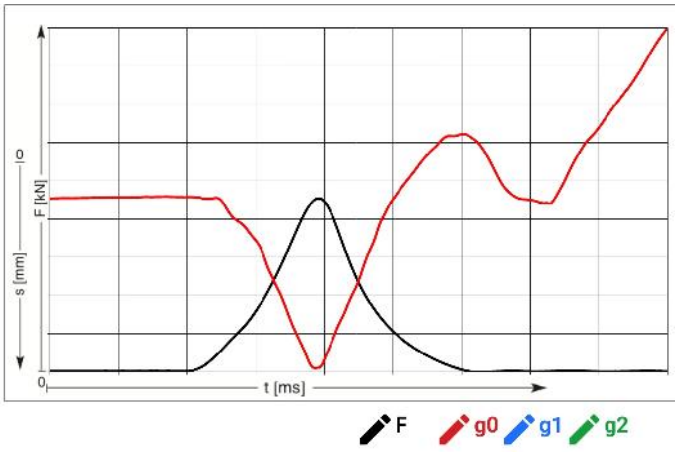



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:01:12	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605564 N 490444

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.407	815.3	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.210	435.5
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

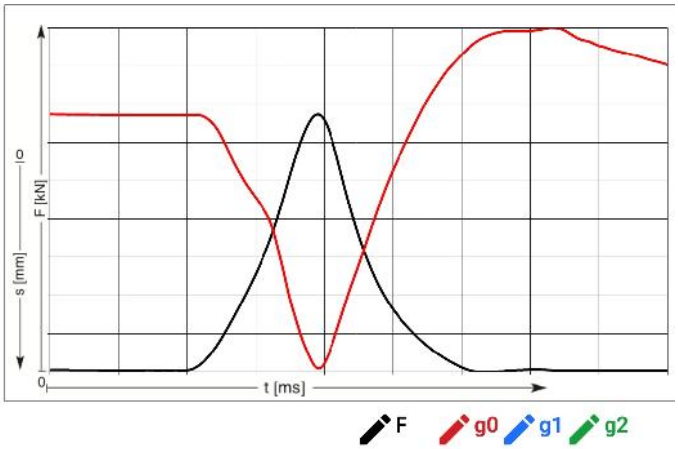



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:01:19	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605564 N 490444

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.835	839.4	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.209	450.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

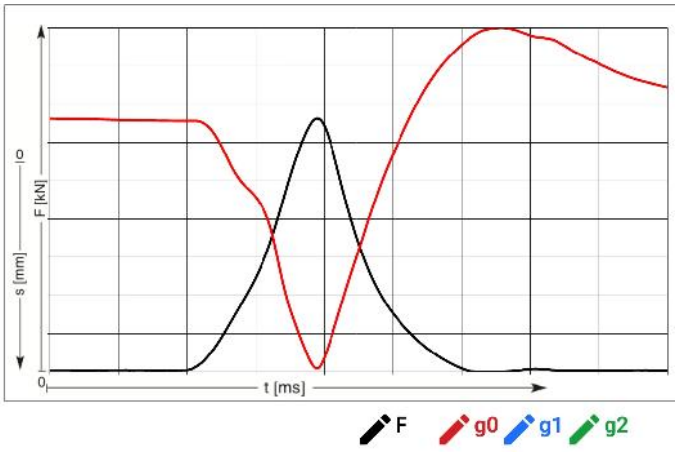



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:01:27	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605564 N 490444

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.921	844.3	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.211	449.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

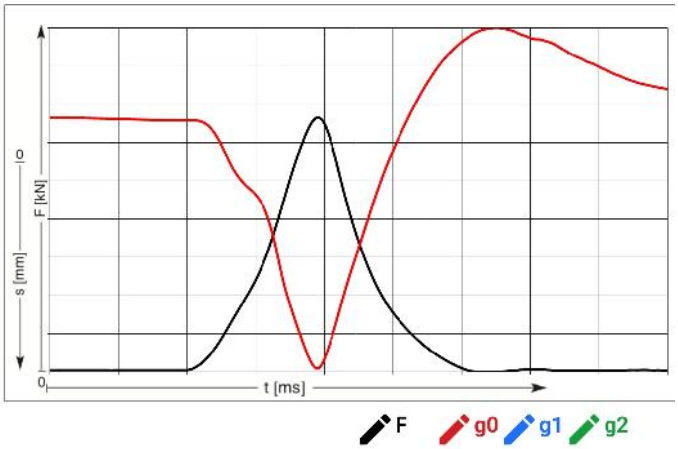



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:01:34	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605564 N 490444

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.958	846.4	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.210	453.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

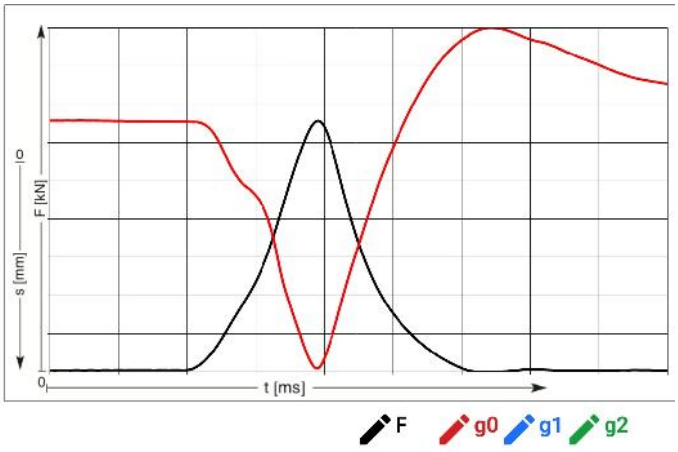



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:01:41	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605564 N 490444

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.013	849.5	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.209	456.0
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

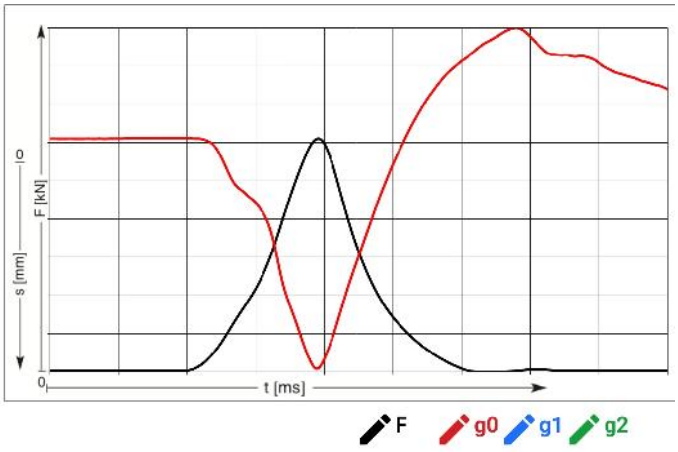



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:01:55	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605564 N 490444

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.010	849.4	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.218	437.6
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

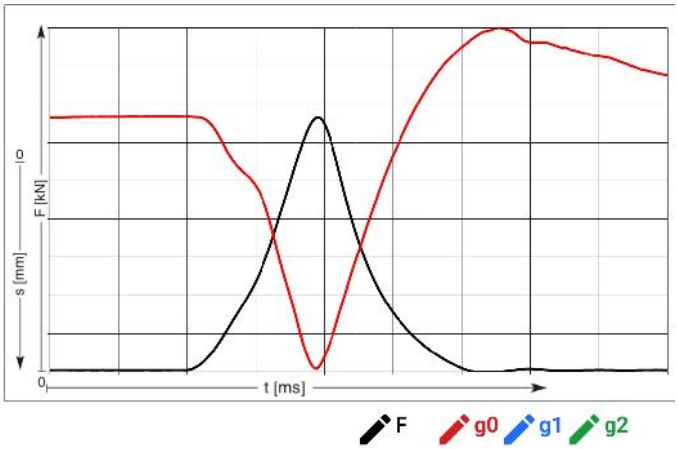



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:02:03	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605564 N 490444

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.002	848.9	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.216	441.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

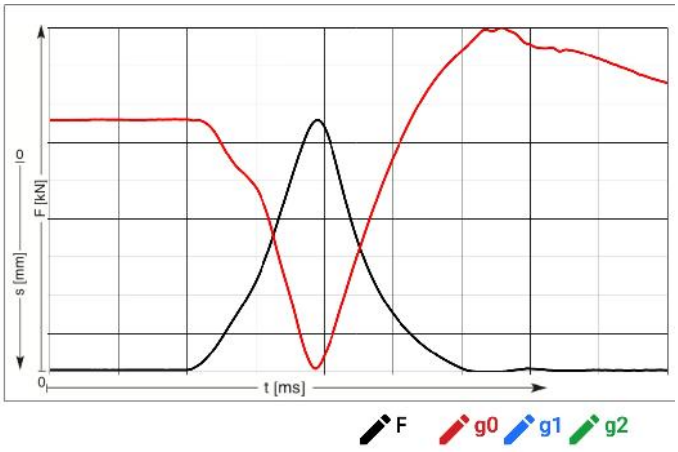



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4+280 DERECHO TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 14:02:10	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 16.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.11 'N, 74º 2.55 'W	
UTM	
E 18 605564 N 490444	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
15.012	849.5	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.218	437.8
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

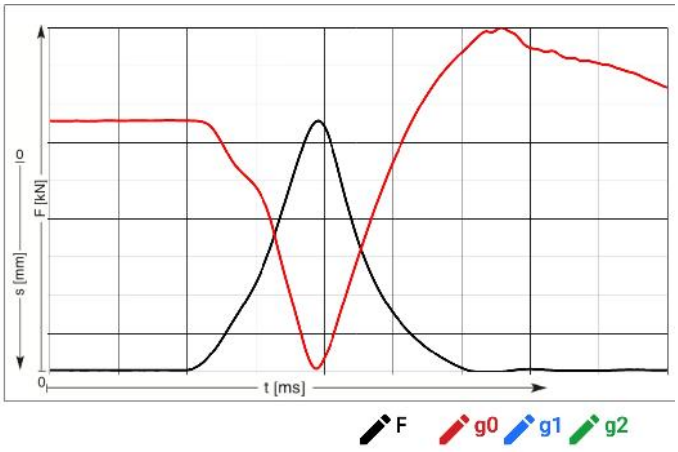



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 14:08:27	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 16.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605576 N 490391	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.796	837.2	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.402	233.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

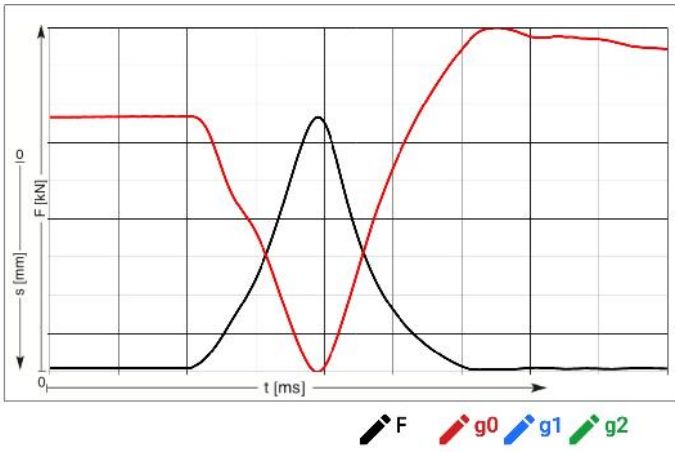



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:08:34	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605576 N 490391

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.830	839.2	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.381	247.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

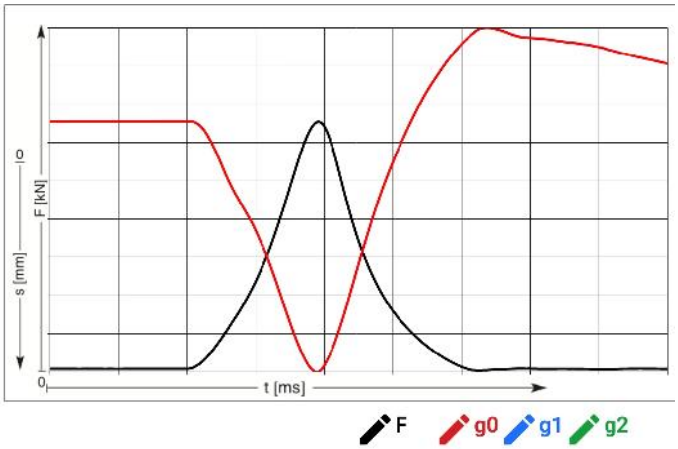



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 14:08:41	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 16.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605576 N 490391	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.873	841.6	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.381	248.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

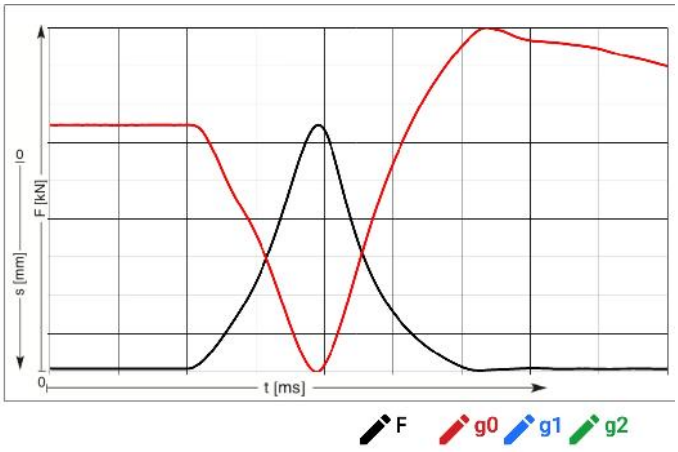



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test

Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07


Client:	
CONSORCIO SOFAN	
Project:	
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	
Point	
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	
Note:	
Operator:	
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	
28.05.2026 14:08:48	
Manufacturer:	
TERRATEST LWD GmbH	
Device Number:	
202109010946	

Layer:	
MATERIAL ESTABILIZADO	
Temperature Air / Surface	
18.4 / 16.0	
Weather:	
18 Deg. C Muy Nuboso	
Soil type	
Soil group	
Consistency:	
GPS Position	
4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W	
UTM	
E 18 605576 N 490391	

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.870	841.5	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.377	250.4
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

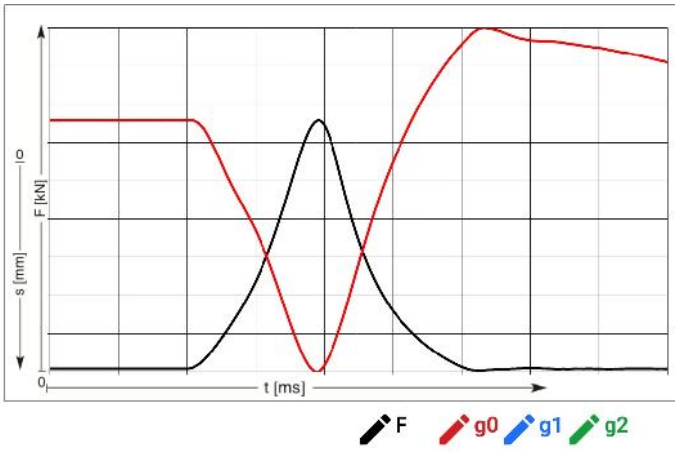



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:08:57	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605576 N 490391

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.873	841.6	23.6

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.378	250.1
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

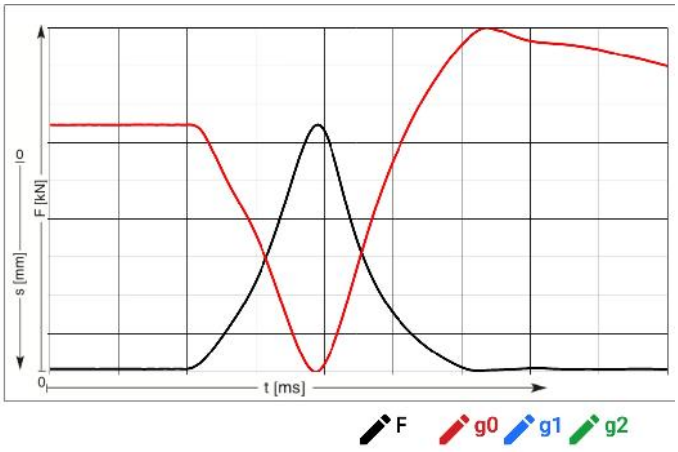



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:09:05	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605576 N 490391

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.891	842.6	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.379	249.7
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

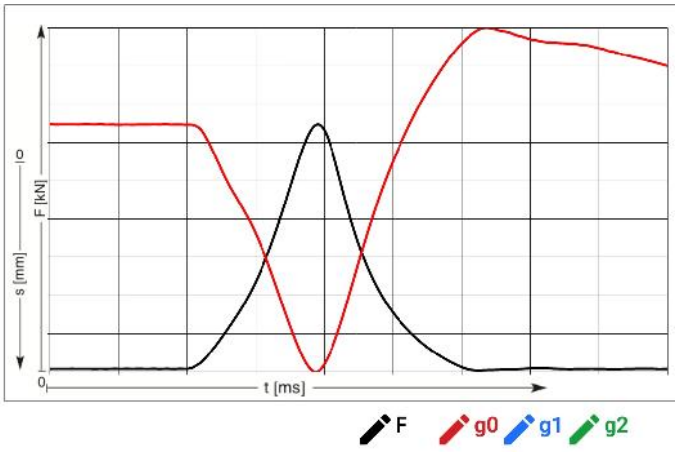



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:09:11	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605576 N 490391

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.914	843.9	23.7

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.378	250.9
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

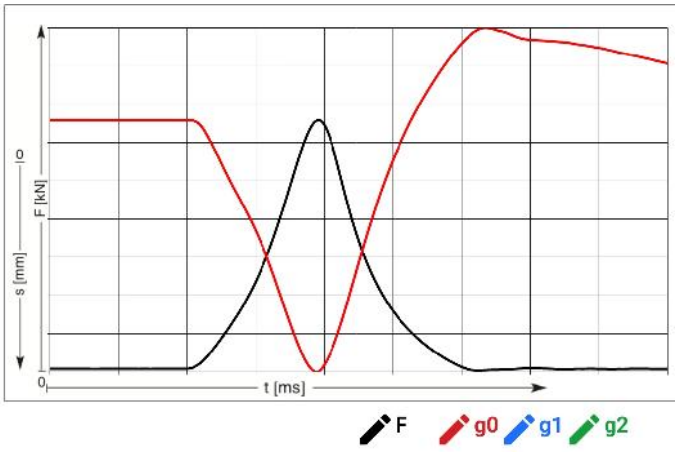



TECNISUELOS S.A.S
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
Phone: 3008667602

Dynamic Plate Load Test


Determination of the dynamic deflection modulus according ASTM E2583 07

Client:	Layer:
CONSORCIO SOFAN	MATERIAL ESTABILIZADO
Project:	Temperature Air / Surface
CONSORCIO SOFAN - CHIPAQUE	18.4 / 16.0
Point	Weather:
KM 4+450 IZQUIERDO TRAMO 3	18 Deg. C Muy Nuboso
Note:	Soil type
Operator:	Soil group
CAMILO ANDRES PINTOR TORRES	
Date/Time:	Consistency:
28.05.2026 14:09:19	
Manufacturer:	GPS Position
TERRATEST LWD GmbH	4º 26.10 'N, 74º 2.54 'W
Device Number:	UTM
202109010946	E 18 605576 N 490391

Force (kN)	Pressure (kPa)	Pulse (ms)
14.912	843.8	23.8

Plate Diameter (mm)	150

Distance (mm)	Deflection (mm)	EMod (MPa)
0	0.376	252.3
0	0.0	0.0
0	0.0	0.0

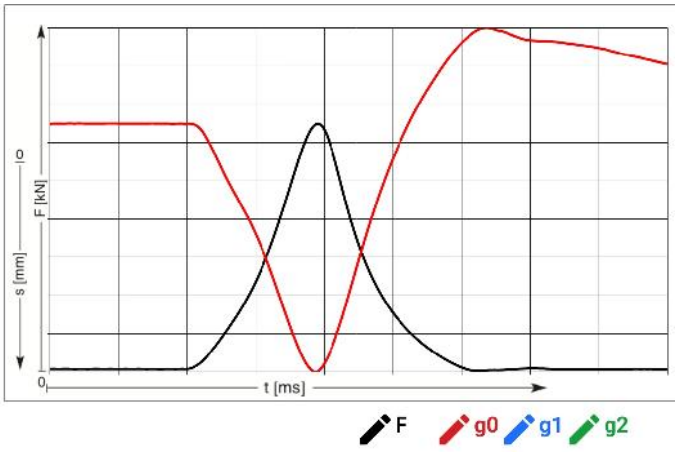



ILAB-No.248-2026

Bogotá D.C., mayo del 2026

SOFAN INGENIERIA SAS
Bogotá D.C., - Colombia

REFERENCIA: RESULTADO ENSAYOS DE LABORATORIO

PROYECTO: CONTRATO ICCU 138 – TRAMO 1 – CHIPAQUE.

Cordial Saludo.

Tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes con el fin de remitirles los resultados de los ensayos de DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL (METODO NUCLEAR) Y del informe ILAB-248-2026.

Procedimientos solicitados para el proyecto de la referencia.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud, cambio o modificación que surja en el análisis de este mismo.

Cordialmente,



Director Técnico

TECNISUELOS
Pavimentos & Concretos SAS
Laboratorio de Ingeniería Civil
NIT.: 901.028.209-2

HOJA DE CALCULO : DENSIDADES CON DENSIMETRO NUCLEAR

Código:	TS-FT-113-02
Fecha de Edición:	2022-01-23
Versión :	3
Copia Controlada:	SI / NO

PROYECTO:	CONTRATO ICCU 138	LOCALIZACION:	TRAMO 1 - CHIPAQUE	FECHA:
DESCRIPCION:	ESTABILIZADO + PROES + CEMENTO	ORDENADO POR:	SOFAN INGENIERIA SAS	28/05/2026

OSL-2425-2026
Numero de orden de servicios

ILAB-248-2026
Numero de informe de laboratorio

ABSCISA	TIPO DE MATERIAL	CAPA Nº	COSTADO			SUELO		REVISION		HUMEDAD DE CAMPO %	PROFUNDIDAD CM	METODO	OBSERVACIONES
			IZQ	EJE	DER	DENSIDAD OPTIMA	DENSIDAD HUMEDA DEL MATERIAL	DENSIDAD SECA DEL MATERIAL	COMPACTACION %				
K0+250	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	X	-	1,740	1,902	1,612	92,6%	17,5%	0,15	B	
K0+450	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	-	X	1,740	1,878	1,655	95,1%	17,4%	0,15	B	
K0+650	ESTABILIZADO	ULTIMA	X	-	-	1,740	1,863	1,853	106,5%	13,5%	0,15	B	
K0+850	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	-	X	1,740	1,841	1,792	103,0%	13,8%	0,15	B	
K1+050	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	X	-	1,740	1,812	1,679	96,5%	13,3%	0,15	B	
K1+200	ESTABILIZADO	ULTIMA	X	-	-	1,740	1,819	1,712	98,4%	17,5%	0,15	B	
K1+700	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	-	X	1,740	1,833	1,643	94,4%	12,9%	0,15	B	
K1+900	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	X	-	1,740	1,849	1,722	99,0%	13,3%	0,15	B	
K2+100	ESTABILIZADO	ULTIMA	X	-	-	1,740	1,836	1,742	100,1%	15,3%	0,15	B	
K2+300	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	X	-	1,740	1,829	1,743	100,2%	11,2%	0,15	B	

TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS Laboratorio de Ingeniería Civil NIT.: 901.028.209-2

REALIZO	REVISO
	
LABORATORISTA: CAMILO A. PINTOR	DIRECTOR TECNICO: WILSON E. PINTOR

El presente formato no deberá ser reproducido ni duplicado sin la autorización firmada y notificada emitida por el laboratorio TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS

TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS Laboratorio de Ingeniería Civil NIT.: 901.028.209-2	**HOJA DE CALCULO : DENSIDADES CON DENSIMETRO NUCLEAR**	Código:	TS-FT-005-02
		Fecha de Edición:	2020-01-23
		Versión :	2
		Copia Controlada:	SI / NO

CLIENTE: SOFAN INGENIERIA SAS

PROYECTO: CONTRATO ICCU 138

10

LOCALIZACIÓN : TRAMO 1 - CHIPAQUE

PROCEDENCIA: -

DESCRIPCIÓN:

FECHA DE TOMA: 28/05/2026

CLASE DE MATERIAL: ESTABILIZADO + PROES + CEMENTO


NORMA DE ENSAYO : INVIAS -161-2013

TS-PT-013-00

OSL-2425-2026

ILAB-248-2026

GRAFICA

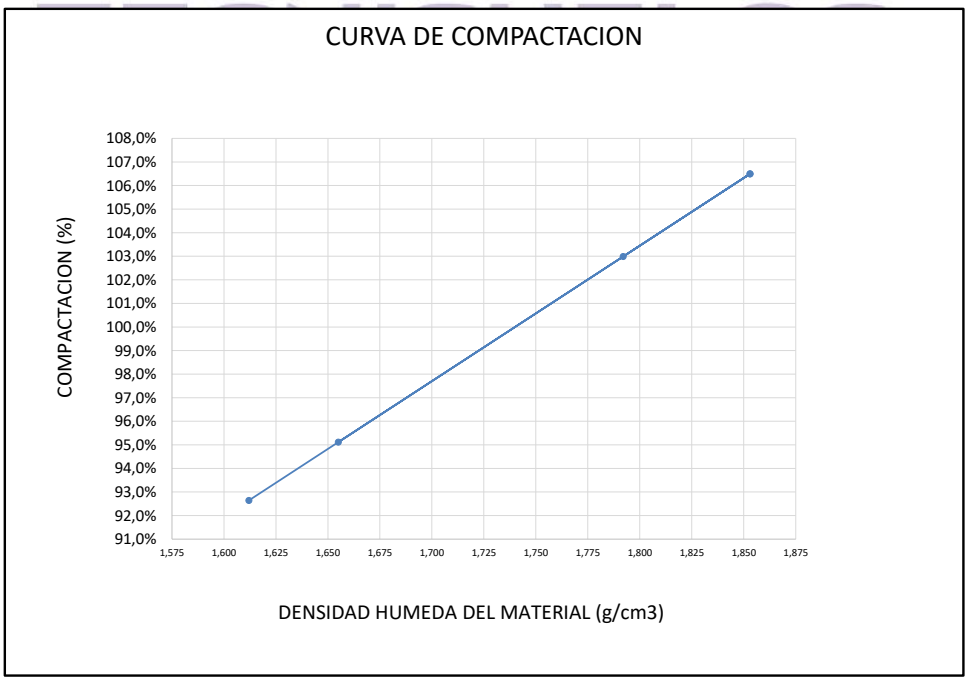

OBSERVACIONES :

LABORATORISTA: CAMILO A. PINTOR

DIRECTOR TECNICO: WILSON E. PINTOR

El presente formato no deberá ser reproducido ni duplicado sin la autorización firmada y notificada emitida por el laboratorio TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS

TECNISUELOS
Pavimentos & Concretos SAS
Laboratorio de Ingeniería Civil
NIT.: 901.028.209-2

HOJA DE CALCULO : DENSIDADES CON DENSIMETRO NUCLEAR

Código:	TS-FT-113-02
Fecha de Edición:	2022-01-23
Versión :	3
Copia Controlada:	SI / NO

PROYECTO:	CONTRATO ICCU 138	LOCALIZACION:	TRAMO 1 - CHIPAQUE	FECHA:	
DESCRIPCION:	ESTABILIZADO + PROES + CEMENTO	ORDENADO POR:	SOFAN INGENIERIA SAS	28/05/2026	

OSL-2425-2026
Numero de orden de servicios

ILAB-248-2026
Numero de informe de laboratorio

ABSCISA	TIPO DE MATERIAL	CAPA Nº	COSTADO			SUELO		REVISION		HUMEDAD DE CAMPO %	PROFUNDIDAD CM	METODO	OBSERVACIONES
			IZQ	EJE	DER	DENSIDAD OPTIMA	DENSIDAD HUMEDA DEL MATERIAL	DENSIDAD SECA DEL MATERIAL	COMPACTACION %				
K2+500	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	-	X	1,740	1,905	1,829	105,1%	13,3%	0,15	B	
K2+680	ESTABILIZADO	ULTIMA	X	-	-	1,740	1,843	1,838	105,6%	11,2%	0,15	B	
K4+100	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	X	-	1,740	1,804	1,940	111,5%	9,8%	0,15	B	
K4+280	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	-	X	1,740	1,812	1,794	103,1%	9,2%	0,15	B	
K4+450	ESTABILIZADO	ULTIMA	-	X	-	1,740	1,803	1,893	108,8%	8,8%	0,15	B	

TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS Laboratorio de Ingeniería Civil NIT.: 901.028.209-2

REALIZO	REVISO
	
LABORATORISTA: CAMILO A. PINTOR	DIRECTOR TECNICO: WILSON E. PINTOR

El presente formato no deberá ser reproducido ni duplicado sin la autorización firmada y notificada emitida por el laboratorio TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS

TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS Laboratorio de Ingeniería Civil NIT.: 901.028.209-2	**HOJA DE CALCULO : DENSIDADES CON DENSIMETRO NUCLEAR**	Código:	TS-FT-005-02
		Fecha de Edición:	2020-01-23
		Versión :	2
		Copia Controlada:	SI / NO

CLIENTE: SOFAN INGENIERIA SAS

PROYECTO: CONTRATO ICCU 138

10

LOCALIZACIÓN : TRAMO 1 - CHIPAQUE

PROCEDENCIA: -

DESCRIPCIÓN:

FECHA DE TOMA: 28/05/2026

CLASE DE MATERIAL: ESTABILIZADO + PROES + CEMENTO


NORMA DE ENSAYO : INVIAS -161-2013

TS-PT-013-00

OSL-2425-2026

ILAB-248-2026

GRAFICA

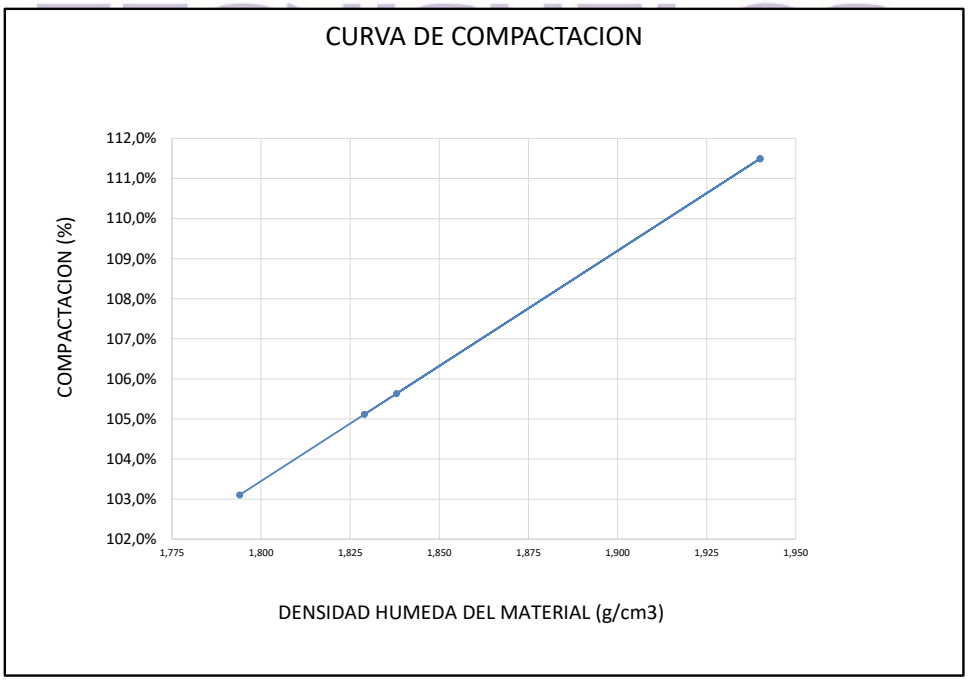

OBSERVACIONES :

LABORATORISTA: CAMILO A. PINTOR

DIRECTOR TECNICO: WILSON E. PINTOR

El presente formato no deberá ser reproducido ni duplicado sin la autorización firmada y notificada emitida por el laboratorio TECNISUELOS Pavimentos & Concretos SAS
