1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **28-04-2026**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **15-07-2026**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		**SI**		**No**	x
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**75.64%**				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING.ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
2.2 PROCESO O ÁREA	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
2.3 CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20260025
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	15-04-2026
3.3 CONTRATISTA	YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	94.458.341-5
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600181 + 202600279
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600215 + 202600360
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 93.955.260
3.8 PLAZO	Hasta 30-06-2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	28-04-2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30-06-2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	SI + $30.249.562
3.17 PRORROGA	SI HASTA 30/07/2026

3.18 OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL AREA DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO IPS ADSCRITA LA RED DE SALUD DE ORIENTE ESE

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto:

EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE ESTE PERIODO:


Elementos entregados

PRODUCTO	DESCRPCION	CANTIDAD
Marco	**Lamina Colld Rolled Cal, 16 con acabado en pintura electrostática en polvo horneable de 2.00 Alto x 0.80 Ancho.**	**12**
Vigas	**Lamina coll rolled cal. 16 de 2.40 Largo x 0.13 Ancho y sus respectivo pines de seguridad**	**48**
Entrepaños	**Juego de entrepaños para cubrir un área de 0,80 mts x 2,400 mts, elaborados en lámina galvanizada cal 22**	**24**
Estantería de 0,40 mts x 0,90 mts x 2,00 mts con seis entrepaños	**Lamina Colld Rolled Cal, 18 con acabado en pintura electrostática en polvo horneable, entrepaños Fabricados en lamina colld Rolled Cal 23, con acabado en pintura electrostática en polvo horneable**	**100**







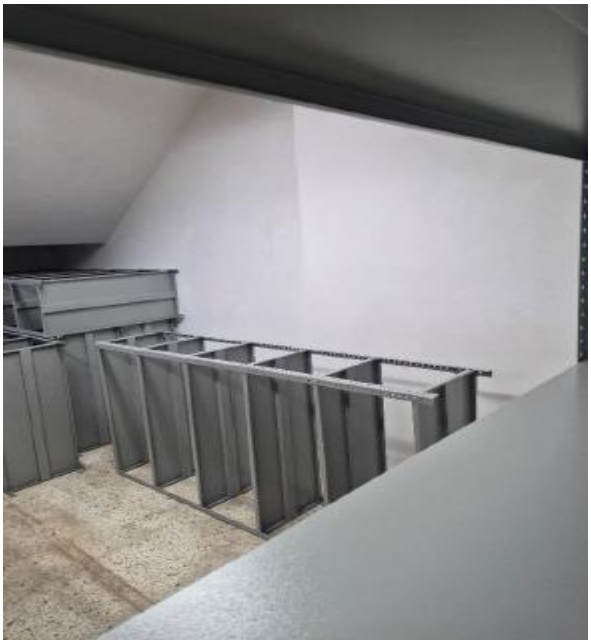

(VER INFORME ANEXO)

FACTURA ELECTRONICA No FE-3843 de 15 DE JULIO DE 2026

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		**A mejorar**		**Satisfactorio**	**X**	**Sobresaliente**		**No Aplica**	

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *ANO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	2026-Junio	2026-07-06	$ 2.463.300
SALUD	2026-Julio	2026-07-06	$ 1.811.200
RIESGOS PROFESIONALES	2026-Junio	2026-07-06	$ 353.000
PARAFISCALES	2026-Junio	2026-07-06	
NUMERO DE PLANILLA			

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 124.204.822	2026-04-15
CUOTAS ANTERIORES		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 93.955.260	2026-07-15
VALOR EJECUTADO	$ 93.955.260	2026-07-15
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$30.249.562	2026-07-15

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No:** __**x**__ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FISICO [ ] CD/DVD [ ] USB [x] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si_X___ No: _____

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

ING. ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
Nombre y firma del Supervisor

Julio 22 de 2026
Fecha de elaboración
