SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA

SANTIAGO DE CALI – RED DE SALUD DEL ORIENTE

PROYECTO: COMPLEMENTO AL CONTRATO No 100.23.15.20260015 “La impermeabilización de los tanques de agua potable subterráneos del Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. (Llano Verde, Diamante, Manuela Beltrán, Decepaz y Orquídeas).”

INFORME FINAL

Periodo: 08 de mayo de 2026 al 30 de junio de 2026.

CONTRATANTE: RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CONTRATISTA: SQUARE INGENIERÍAY CONSULTORÍA

SUPERVISOR: ING. ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ

Santiago de Cali, junio 30 de 2026

1. INTRODUCCION.

La Red de Salud del Oriente adelantó el proceso de contratación mediante la modalidad de solicitud privada de ofertas, el ordenador del gasto la Red de Salud del Oriente, adjudicó el proceso al oferente SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA, representado legalmente por DIEGO FERNANDO MUÑOZ TARQUINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.067.533 de Cali (Valle del Cauca), por un valor de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE** ($**171.815.756**), más el valor de la adición de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($**57.680.934** COP) para un valor total de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA. ($**229.496.690**) dando inicio a las actividades de obra el día 8 de abril del 2026 al contrato **No. 100.23.15.20260015**, celebrado entre LA RED DE SALUD DEL ORIENTE Y SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA identificado con NIT No. 901.439.069-1 y cuyo objeto corresponde a “La impermeabilización de los tanques de agua potable subterráneos del Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. (Llano Verde, Diamante, Manuela Beltrán, Decepaz y Orquídeas).”.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización.

Las actividades de obra se están desarrollando en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E. (Llano Verde, Diamante, Manuela Beltrán, Decepaz y Orquídeas).”

A continuación, se presenta la localización de dicho punto.

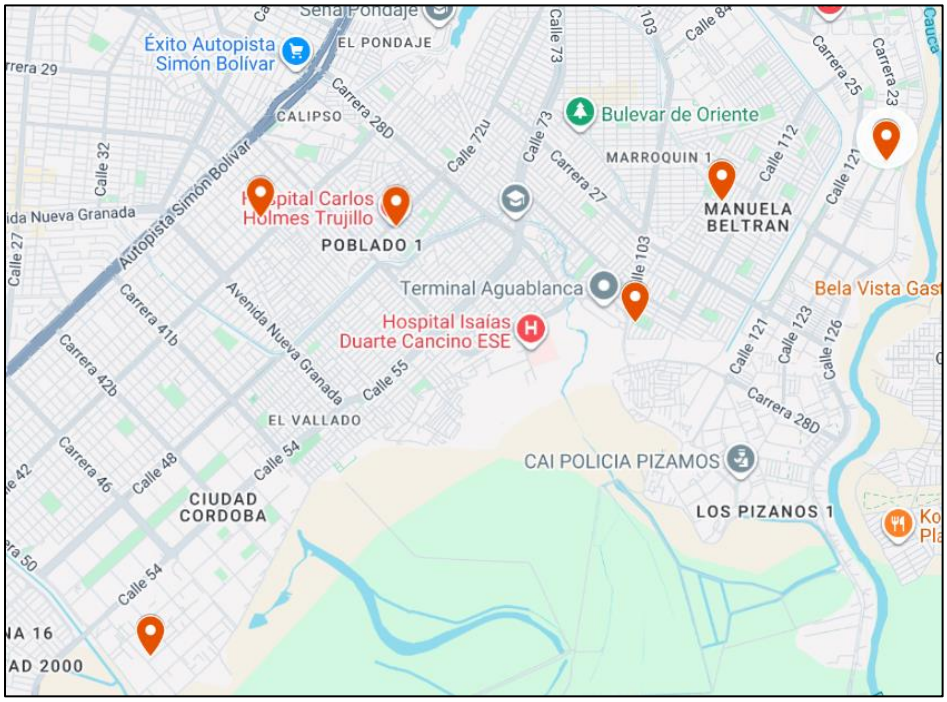


Figura 1. Ubicación de los centros de salud
FUENTE: ELABORACION PROPIA – GOOGLE MAPS

2.2. Características técnicas del proyecto.

El proyecto contempla “Las actividades comprenden desmonte, limpieza, retiro de residuos, preparación y pulido de superficies; así como el suministro e instalación de sistemas de impermeabilización mediante membranas de PVC-P reforzadas, geotextil no tejido y recubrimientos certificados para contacto con agua potable. Incluye además la aplicación de recubrimientos tipo epóxico, instalación de accesorios, y entrega de los tanques en condiciones óptimas de funcionamiento, cumpliendo la normatividad sanitaria vigente”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios técnicos, las actividades generales a desarrollar en el contrato son las siguientes:

➢ HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO

Tabla 1. Actividades contractuales – HCHT

HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
	DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES		
1.1	RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE	M2	174,30
1.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	6,30
1.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	6,30
1.4	PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO	M2	52,25
	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	M2	120,44
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE	M2	52,25
3.2	CONSTRUCCION MEDIA CAÑA	ML	30,24

Nota: El ítem **3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** corresponde a una actividad complementaria que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.

➢ CENTRO DE SALUD LLANO VERDE

Tabla 2. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD LLANO VERDE			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
	DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES		
1.1	RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE	M2	117.8
1.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	6,30
1.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	6,30
1.4	PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO	M2	52,25
	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	M2	83,92
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE	M2	33,47

➢ PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS

Tabla 3. Actividades contractuales

PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
	DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES		
1.1	RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE	M2	26,15
1.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	0,95
1.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	0,95
1.4	PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO	M2	26,15
	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	M2	18,07
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE	M2	7,84
3.2	CONSTRUCCION MEDIA CAÑA	ML	8,70

Nota: El ítem **3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** corresponde a una actividad complementaria que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.

➢ CENTRO DE SALUD DIAMANTE

Tabla 4. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD DIAMANTE			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
	DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES		
1.1	RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE	M2	43,58
1.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,58
1.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	1,58
1.4	PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO	M2	43,58
	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	M2	30,11
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE	M2	13,07
3.2	CONSTRUCCION MEDIA CAÑA	ML	12,20

Nota: El ítem **3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** corresponde a una actividad complementaria que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.

➢ CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN

Tabla 5. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
	DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES		
1.1	RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE	M2	43,58
1.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,58
1.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	1,58
1.4	PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO	M2	43,58
	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	M2	30,11
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE	M2	13,07
3.2	CONSTRUCCION MEDIA CAÑA	ML	18,06

Nota: El ítem **3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** corresponde a una actividad complementaria que no se encontraba contemplada dentro de las condiciones contractuales del proyecto.

CENTRO DE SALUD ADICIONAL AL CONTRATO

➢ CENTRO DE SALUD DECEPAZ

Tabla 6. Actividades contractuales

CENTRO DE SALUD DECEPAZ			
	DESCRIPCION	**UND**	**CANT**
	DESMONTES. RETIROS Y DEMOLICIONES		
1.1	RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE	M2	94,84
1.2	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	3
1.3	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	3
1.4	PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO	M2	94,84
	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	M2	52,39
2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE	M2	22,11
3.1	RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE	M2	52,29
3.2	CONSTRUCCION MEDIA CAÑA	ML	17,78
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EUCOPLUS	M2	52,29
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HEY DI POWDER	M2	25,39

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Contrato No: 100.23.15.20260015

Contratante: RED DE SALUD DEL ORIENTE

Contratista: SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Objeto: La impermeabilización de los tanques de agua potable subterráneos del Hospital Carlos Holmes Trujillo y de las IPS adscritas a la Red de Salud del Oriente E.S.E.

Tabla 2. Información General de contrato

Valor Contrato:	**Inicial: $ 171.815.756**		**Adicional: $ 57.680.934**
	Total: $ 229.496.690		
Valor Ejecutado	**$229.496.690**		
Plazo Contractual:	**Inicial: Ochenta y cinco (85) días**		**Ampliación:**
	Total: Ochenta y cinco (85) días		
Fecha inicio:	**Abril 3 del 2026**	**F. Suspensión:**	**-**
Fecha Finalización:	**30 de junio del 2026**	**Fecha Terminación:**	**30 de junio del 2026**

Pólizas:	Cumplimiento No:	420-47-994000050905	Cumplimiento, Prestaciones sociales y calidad del servicio
	Resp. Civil No:	420-74-994000014024	Amparo responsabilidad civil extracontractual.
	Cumplimiento No: (modificación)	420 47 994000050905	Cumplimiento, Prestaciones sociales y calidad del servicio

4. Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes.

Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar en cada espacio, se realizaron las siguientes intervenciones:

- **HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO**

  - **DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES**

    1.1. RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE
    1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO
    1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
    1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO.

  - **IMPERMEABILIZACION DE TANQUE**

    2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS

    2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE.

  - **COMPLEMENTARIA**

    3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de **CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.

- **CENTRO DE SALUD LLANO VERDE**

  - **DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES**

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO
1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO

  - **IMPERMEABILIZACION DE TANQUE**

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

- **PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS**

  - **DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES**

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO
1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO

  - **IMPERMEABILIZACION DE TANQUE**

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

  - **COMPLEMENTARIA**

3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de **CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.

- **CENTRO DE SALUD DIAMANTE**

  - **DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES**

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO
1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO

  - **IMPERMEABILIZACION DE TANQUE**

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

  - **COMPLEMENTARIA**

3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de **CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.

- **CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN**

  - **DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES**

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO
1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO

  - **IMPERMEABILIZACION DE TANQUE**

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

  - **COMPLEMENTARIA**

3.2. CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA

De acuerdo con la supervisión técnica, la actividad de **CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANA** se implementa en el tanque debido a que este no contaba con esta junta de transición. La ejecución de este elemento permite conformar un sello continuo entre los muros y la losa, garantizando una adecuada impermeabilización y reduciendo el riesgo de filtraciones o pasos de humedad hacia el interior de la estructura.

Como resultado de la supervisión técnica, se evidenció que el tanque de agua potable del Centro de Salud Decepaz presenta deterioro en la membrana impermeabilizante existente, lo que hace necesario su retiro y la instalación de un nuevo sistema de impermeabilización. Esta intervención permitirá unificar las condiciones técnicas con las implementadas en los demás tanques objeto del contrato, garantizando su adecuado funcionamiento y la continuidad de las condiciones de impermeabilidad requeridas.

- **CENTRO DE SALUD DECEPAZ**

  - **DESMONTES, RETIROS Y DEMOLICIONES**

1.1 RASQUETEADA LAVADA SUPERFICIE
1.2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO
1.3 RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.
1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE, PULIDA DE SUPERFICIE CON DISCO DIAMANTADO

  - **IMPERMEABILIZACION DE TANQUE**

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA TIPO PVC, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN DE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLADOR DE POLIURETANO Y CHAZOS. EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS
2.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MAPECOAT DW25 O SIMILAR, CERTIFICACIÓN PARA CONTACTO DE AGUA POTABLE

  - **ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**

3.1 RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE
3.2 CONSTRUCCION MEDIA CAÑA
3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EUCOPLUS
3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HEY DI POWDER

5. **Equipo del contratista de obra.** En resumen, se utilizó el siguiente equipo:

- Herramienta Menor
- Pulidora

6. **Información financiera del contrato de obra.**

El presente informe corresponde a la única cuenta de cobro, se presentan las actividades ejecutadas hasta el día 30 de junio de 2026.

7. Estado general del tiempo.

Durante la ejecución del contrato predominó el tiempo seco, durante algunos días se evidenciaron algunas precipitaciones en todo el día, por lo cual, fue necesario implementar medidas alternas que mitiguen el impacto derivado de las lluvias.

8. Notas Generales del proyecto.

- De manera general, el proyecto se está desarrollando de acuerdo con lo pactado entre las partes teniendo como referencia el cronograma de obra establecido al inicio de proyecto. Algunas áreas de intervención han requerido la implementación de actividades no previstas con el fin de garantizar la uniformidad en las adecuaciones realizadas.

_____
DIEGO FERNANDO MUÑOZ TARQUINO
R. LEGAL
SQUARE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA

9. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO.

REGISTRO FOTOGRAFICO CUENTA

1. HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO	
	
	
	





2. CENTRO DE SALUD LLANO VERDE









SQUARE

INGENIERIA & CONSULTORIA












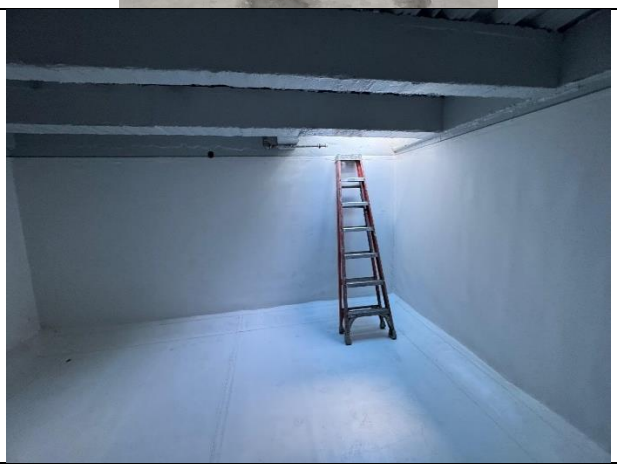

3. PUESTO DE SALUD ORQUIDEAS





















4. CENTRO DE SALUD DIAMANTE





SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA








SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS NIT 901.439.069-1
CARRERA 71A # 10A -50 BARRIO CAPRI, CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTACTO: 3178870380



5. CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRAN










SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA





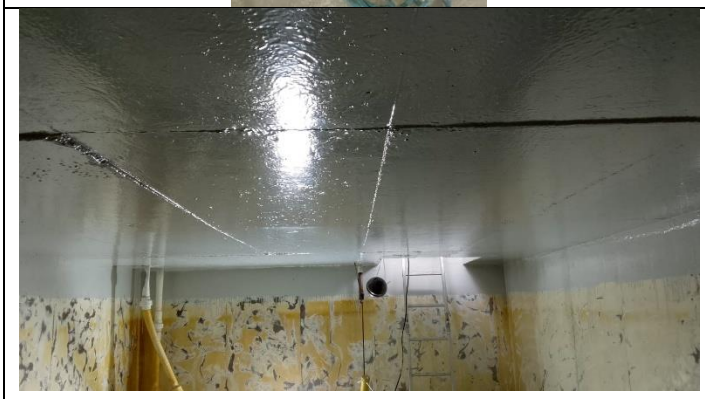













6. CENTRO DE SALUD DECEPAZ





SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA








SQUARE

INGENIERIA & CONSULTORIA

















SQUARE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS NIT 901.439.069-1
CARRERA 71A # 10A -50 BARRIO CAPRI, CALI - VALLE DEL CAUCA
CONTACTO: 3178870380

SQUARE
INGENIERIA & CONSULTORIA



_____

DIEGO FERNANDO MUÑOZ

REPRESENTANTE LEGAL

SQUARE INGENIERÍAY CONSULTORÍA
